



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN PROJETUS
MUNISÍPIU MANATUTO

ABRIL 2023




Elabora Hosi Eng. Munisípiu

SUMÁRIO
RELATÓRIO
IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO
MANATUTO
ABRIL 2023

Prepara Husi :



(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P



(Eng. Jose R. Carlos Gusmão)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P



(Eng. Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projeito ME, ADN, I.P



(Eng. Domingos da Costa X. Silva)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :


(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Bee
Saneamentu, ADN, I.P


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e
Irigasaun, ADN, I.P


(Eng. Deolindo de F. Marques)
Chefe Seksaun ba Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO.....	1
INDICE	3
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Manatuto.....	3
1.3. Lista Projectos	7
II. PROGRESU FISIKU	25
2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan	25
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	26
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	26
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	27
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	27

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.....	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto.....	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto	6
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamentos	7
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Manatuto Por Sectores.....	11
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Manatuto Por Ministerio.....	18
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto	25

I. INTRODUSAUN.


1.1.Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefisiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria

1.2. Perfil Municipio Manatuto

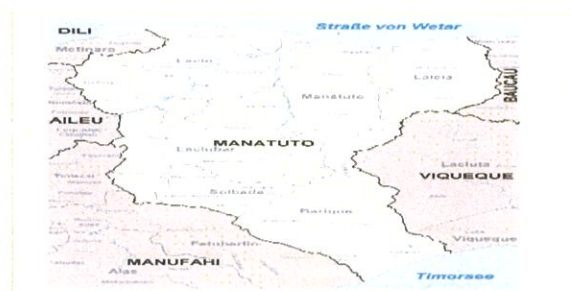

Mapa 2 hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Manatuto iha luan 1,706 km² ho populusaun nain 42,742 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Manatutoiha Postos Administrativos nen (6), Sukus 29 no aldeias 99 , mak hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.

Natarbora		Laclo		Laklubar		Laleia	
Sukus	Aldeia	Sukus	Aldei	Suku	Aldeia	Sukus	Aldeias
Aubeon	2	Hohorai	4	Batara	4	Cairui	7
Barique	2	Locomesak	5	Hatu ma quere k	3	Hatulara n	3
Fatuwaque	2	Uma kaduak	3	Funar	4	Lifau	3
Manehat	3	Uma naruk	4	Mane lima	6		
Uma Boco	2			-	8		
				Sanan a Na'i	4		
Total	11		18		30		13

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 69

Manatuto		Soibada	
sukus	Aldeia	sukus	aldeias
Ailili	2	Fatuma querek	2
Aitekas	4	Leo-hat	2
Cribas	5	Manlala	2
Iliheu	5	Maun Fahe	2
Ma'abat	2	Somoro	2
Sau	2		
	22		10

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Manututu								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	3	3	3			3	
2	Administrasau n no Financas	0	0	0			0	
3	Motorista	1	1	1			1	
4	Seguransa	0	0	0			0	
Total		4					4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto.

ASET ADN,IP MUNICIPIO MANATUTO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	1	1	1				
2	Kareta	1	1	1				
3	Desktop HP / Monitor	1	1	1				
4	Laptop HP	1	1	1				
5	Printer Cannon	1	1	1				
6	UPS	1	1	1				Aát ona
7	Armario File	2	2	2				
8	Armario Tau hena	3	3	3				
9	Meja escritorio	1	1	1				
10	Meja han	1	1	1				
11	Meja TV (kiik)	1	1	1				
12	Kadeira escritorio	6	6	6				
13	Kadeira han	4	4	4				
14	Sofa	1 Set	1 Set	1 Set				
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3	3 Set	3 Set	3 Set				
16	Jeleira	1	1	1				Aát ona
17	Water Dispenser	1	1	1				
18	TV + Parabola	1 Set	1 Set	1 Set				
19	AC	4	4	4				1 aát ona
20	Kipas Angin	4	4	4				
21	Kompor Listrik	1	1	1				Aát ona

22	Kompor Gas	1	1	1				Aát ona
23	Rack sepatu	3	3	3				
24	Rack Piring	1	1	1				
25	Lampu	11	11	11				
26	Water Pump Sanyo	1	1	1				

1.3 : Lista Projectos

Projetu hotu ne'ebe akumulula iha lista ne'e bazeia ba dadus projetu ne'ebe sei la'o hela no mos projetu ne'ebe abandona ona tinan barak, projetu hirak ne'e fahe tuir lista 1.3.1 Projeto Por Fundus Finansiamientos, 1.3.2 Projeto Por Sectors no 1.3.3 Projeto Por Ministerios.

1.3.1 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamientos

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	TOTAL FI+Fundu Covid-19+LM-BS+LM-CD+LM-PT+PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTASEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	10	\$ 2,398,501.20	42.62%
2	Laclo	8	\$ 49,415,129.51	87.56%
3	Laclubar	9	\$ 36,702,834.12	86.17%
4	Laleia	3	\$ 392,472.03	17.27%
5	Manatuto Villa	18	\$ 42,264,184.24	78.90%
6	Soibada	6	\$ 4,286,667.82	85.89%
	Grand Total	54	\$ 135,459,788.92	83.43%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTASEN EXECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0.00%
2	Laclo	3	\$ 48,698,873.04	87.85%
3	Laclubar	2	\$ 35,075,150.37	88.18%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	6	\$ 40,765,491.57	79.91%
6	Soibada	1	\$ 3,553,954.20	93.93%
	Grand Total	12	\$ 128,093,469.18	85.58%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTASEN EXECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0.00%
2	Laclo		\$ -	0.00%
3	Laclubar		\$ -	0.00%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	3	\$ 598,668.36	86.09%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	3	\$ 598,668.36	86.09%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTASEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	2	\$ 404,938.08	54.93%
2	Laclo	2	\$ 240,323.02	76.61%
3	Laclubar	2	\$ 675,432.39	40.19%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	1	\$ 29,275.84	15.92%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	7	\$ 1,349,969.33	50.56%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTASEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	7	\$ 1,876,648.24	38.63%
2	Laclo	1	\$ 223,843.79	56.58%
3	Laclubar	2	\$ 661,982.34	55.55%
4	Laleia	2	\$ 305,588.74	9.25%
5	Manatuto Villa	1	\$ 182,701.57	6.14%
6	Soibada	4	\$ 630,201.31	47.08%
	Grand Total	17	\$ 3,880,965.99	40.08%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTASEN EXECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0.00%
2	Laclo	1	\$ 98,147.27	44.74%
3	Laclubar	2	\$ 202,223.29	25.59%
4	Laleia	1	\$ 86,883.29	45.49%
5	Manatuto Villa	5	\$ 382,490.63	39.44%
6	Soibada	1	\$ 102,512.31	45.66%
	Grand Total	10	\$ 872,256.79	38.16%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTASEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	1	\$ 116,914.88	63.99%
2	Laclo	1	\$ 153,942.39	84.29%
3	Laclubar	1	\$ 88,045.73	10.46%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	2	\$ 305,556.27	28.66%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	5	\$ 664,459.27	45.35%

1.3.2 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Sectors

NO	POR SECTOR	TOTAL MUNICIPIO MANATUTO		
		TOTAL PROYECTO	MOMTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370,511.25	15.83%
2	AGUA E SANEAMIENTO	1	\$ 162,377.94	41.85%
3	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	84.29%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	7	\$ 1,168,395.22	54.65%
5	EDUKASAUN	11	\$ 1,054,958.36	32.61%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1,076,003.44	78.57%
7	ESTRADAS	15	\$ 8,687,169.39	60.14%
8	ESTRADAS E PONTES	1	\$ 394,194.73	0.00%
9	FLOOD CONTROL	2	\$ 432,138.16	74.24%
10	IMPRESTIMO	4	\$ 115,112,106.35	86.66%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157,560.52	41.96%
13	PONTES	1	\$ 3,553,954.20	93.93%
14	SAUDE	3	\$ 467,944.26	72.58%
15	TURISMO	2	\$ 305,556.27	28.66%
	Grand Total	54	\$ 135,459,788.92	83.43%

NO	POR SECTOR	Barique		
		TOTAL PROYECTO	MOMTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370,511.25	15.83%
2	AGUA E SANEAMIENTO	1	\$ 162,377.94	41.85%
3	COMERCIO		\$ -	0.00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 408,460.73	78.09%
5	EDUKASAUN		\$ -	0.00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
7	ESTRADAS	3	\$ 940,115.74	29.92%
8	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
9	FLOOD CONTROL	1	\$ 242,560.14	63.68%
10	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157,560.52	41.96%
13	PONTES		\$ -	0.00%
14	SAUDE	1	\$ 116,914.88	63.99%
15	TURISMO		\$ -	0.00%
	Grand Total	10	\$ 2,398,501.20	42.62%

NO	POR SECTOR	Laclo		
		TOTAL PROYECTO	MOMTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMIENTO		\$ -	0.00%
3	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	84.29%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 50,745.00	34.95%
5	EDUKASAUN	1	\$ 98,147.27	44.74%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 380,582.61	72.08%
7	ESTRADAS	2	\$ 227,158.35	57.07%
8	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
9	FLOOD CONTROL	1	\$ 189,578.02	87.76%
10	IMPRESTIMO	1	\$ 48,314,975.87	87.98%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
13	PONTES		\$ -	0.00%
14	SAUDE		\$ -	0.00%
15	TURISMO		\$ -	0.00%
	Grand Total	8	\$ 49,415,129.51	87.56%

NO	POR SECTOR	Laclubar		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMIENTO		\$ -	0.00%
3	COMERCIO		\$ -	0.00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0.00%
5	EDUKASAUN	2	\$ 202,223.29	25.59%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 695,420.83	82.11%
7	ESTRADAS	4	\$ 1,337,414.73	47.79%
8	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
9	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
10	IMPRESTIMO	1	\$ 34,379,729.54	88.30%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
13	PONTES		\$ -	0.00%
14	SAUDE	1	\$ 88,045.73	10.46%
15	TURISMO		\$ -	0.00%
	Grand Total	9	\$ 36,702,834.12	86.17%

NO	POR SECTOR	Laleia		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	COMERCIO		\$ -	0.00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 277,330.43	0.00%
5	EDUKASAUN	1	\$ 86,883.29	45.49%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
7	ESTRADAS	1	\$ 28,258.31	100.00%
8	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
9	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
10	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
13	PONTES		\$ -	0.00%
14	SAUDE		\$ -	0.00%
15	TURISMO		\$ -	0.00%
	Grand Total	3	\$ 392,472.03	17.27%

NO	POR SECTOR	Manatuto Villa		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMIENTO		\$ -	0.00%
3	COMERCIO		\$ -	0.00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 364,960.55	72.47%
5	EDUKASAUN	6	\$ 565,192.20	28.67%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
7	ESTRADAS	2	\$ 5,590,919.46	69.52%
8	ESTRADAS E PONTES	1	\$ 394,194.73	0.00%
9	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
10	IMPRESTIMO	2	\$ 32,417,400.94	82.96%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
13	PONTES		\$ -	0.00%
14	SAUDE	1	\$ 262,983.65	97.19%
15	TURISMO	2	\$ 305,556.27	28.66%
	Grand Total	18	\$ 42,264,184.24	78.90%

NO	POR SECTOR	Soibada		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMIENTO		\$ -	0.00%
3	COMERCIO		\$ -	0.00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 66,898.51	55.80%
5	EDUKASAUN	1	\$ 102,512.31	45.66%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
7	ESTRADAS	3	\$ 563,302.80	46.05%
8	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
9	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
10	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
13	PONTES	1	\$ 3,553,954.20	93.93%
14	SAUDE		\$ -	0.00%
15	TURISMO		\$ -	0.00%
Grand Total		6	\$ 4,286,667.82	85.89%

1.3.3 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Ministerios

NO	POR MINISTERIO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 305,556.27	28.66%
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 370,511.25	15.83%
3	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 189,578.02	87.76%
4	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29,275.84	15.92%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	27	\$ 129,385,926.71	84.59%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	12	\$ 1,121,856.87	34.00%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277,330.43	0.00%
8	MINISTERIO SAUDE	5	\$ 803,628.97	74.59%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204,687.39	72.06%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 408,460.73	78.09%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
	Grand Total	54	\$ 135,459,788.92	83.43%

NO	POR MINISTERIO	Barique		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PASCAS	1	\$ 370,511.25	15.83%
3	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	7	\$ 1,502,614.34	37.92%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
8	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 116,914.88	63.99%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 408,460.73	78.09%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
	Grand Total	10	\$ 2,398,501.20	42.62%

NO	POR MINISTERIO	Laclo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 189,578.02	87.76%
4	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	4	\$ 48,922,716.83	87.71%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 98,147.27	44.74%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
8	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204,687.39	72.06%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
	Grand Total	8	\$ 49,415,129.51	87.56%

NO	POR MINISTERIO	Laclubar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	6	\$ 36,412,565.10	86.69%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 202,223.29	25.59%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
8	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 88,045.73	10.46%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
Grand Total		9	\$ 36,702,834.12	86.17%

NO	POR MINISTERIO	Laclubar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	6	\$ 36,412,565.10	86.69%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 202,223.29	25.59%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
8	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 88,045.73	10.46%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
	Grand Total	9	\$ 36,702,834.12	86.17%

NO	POR MINISTERIO	Laleia		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	1	\$ 28,258.31	100.00%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 86,883.29	45.49%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277,330.43	0.00%
8	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
	Grand Total	3	\$ 392,472.03	17.27%

NO	POR MINISTERIO	Manatuto Villa		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 305,556.27	28.66%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29,275.84	15.92%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	\$ 38,402,515.13	80.15%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	6	\$ 565,192.20	28.67%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
8	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 598,668.36	86.09%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
	Grand Total	18	\$ 42,264,184.24	78.90%

NO	POR MINISTERIO	Soibada		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESKAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	4	\$ 4,117,257.00	87.38%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 169,410.82	49.67%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
8	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
	Grand Total	6	\$ 4,286,667.82	85.89%

1.4. Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Barique	5,833	1,924	1,617	1,183	1,109
Laclo	8,193	2,250	2,185	1,919	1,838
Laclubar	12,777	3,445	3,571	2,924	2,836
Laleia	3,930	1,181	1,189	817	743
Manatuto	15,446	4,741	4,609	3,109	2,987
Soibada	3,511	237	213	239	259

Fontes : Projeksaun Populasaun bazea ba Census Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1. Progressu Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan nia laran, husi lista #anexu B hatudu progresu aktual fulan ida ne'e ho nia prensentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu prentangen aktual fulan ida ne'e hatudu progresu fisiku komulativu husi prosentun anterior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare iha #anexu B, detallu ba back-up #anexu C, no Instrusaun Servisu #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1. Obtáclo Servisu iha Terenu

Observasaun geral ba projeto hirak nebe mak implementa iha Munisipio Manatuto

1. Projeto Lao la tuir tempo nebee asina entre parte rua
2. Laiha tekniko supervisaun husi projeto nain atu halo kontrolo diaramente
3. Tekniko kompanha la iha tereno
4. Skill badaen neebe mak la dun professional

Obstalku teknik A.D.N hasoru

1. Distansia ne'ebe dook difikulta teknik atu servisu lalais
2. Kondisaun estrada neébe a'at
3. Kontraktor sira ne'ebe mak servisu iha terreno barak mak la tuir Spesifikasaun ne'ebe iha kontartu laran.
4. Planu Mapamentu Enginheiro Munisipiu la konsege realiza tuir planu tamba hare hosi nia distansia ne'ebe dook.
5. Sistema dropbox iha Munisipiu dala ruma iha problema lina internet

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Presija tebes atu aumenta ema iha Munisipiu atu nune bele halo servisu ba administrasaun ne'ebe efektivu.
2. Sebele sistema dropbox tau mos iha dekstop Munisipiu para la bele atraja ami nia servisu.

Note: Asinatura Husi Eng. Municipio Manatuto

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Manatuto						
No	Deskrisaun	Identidade				Asinatura
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	
1	Enjineiru	Quico Adelino Junior	240	Enjineiru EPAS		
		José R. Carlos Gusmão	168	Enjineiru ITI		
		Domingos da Costa X. Silva	250	Enjineiru ITI		

		Adonis Julio Fernandes	152	Enjineiru ME		
2	Enjineira	Olivia Soares	112	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Timoteo da Silva Morais	120	Motorista		

LISTA #ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN

						LOKALIZASAUN PROJETU					Apr-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress	This Month Progress	Komulative Progress
1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	\$ 2,561,405.06	Aug. 25, 2018	63.80%		63.80%
2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manaluto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	SSS/061/MOPTC-2017	\$ 3,029,514.40	Aug. 25, 2017	89.20%		89.20%
3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obrai Unipessoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	\$ 2,362,976.44	June 30, 2015	82.08%		82.08%
4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	ICB/023/MPW-2013	\$ 28,011,854.94	Feb. 10, 2014	94.91%		94.91%
5	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	QCBS/019/MPW-2013	\$ 4,405,546.00	Sept. 3, 2014	73.76%		73.76%
6	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	\$ 79,155.54	Dec. 18, 2019	88.07%		88.07%
7	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	\$ 226,400.73	Dec. 18, 2019	43.70%		43.70%
8	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisiipu Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	019/Janeiro/2020	\$ 29,275.84	March 1, 2020	15.92%		15.92%
9	Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Municipiu Manatuto, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	\$ 262,983.65	09-Dec-20	100.00%		100.00%
10	New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	K-6, UNIPESOAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227	\$ 257,748.51	Jan. 12, 2022	88.89%		88.89%
11	Supply and Installtion Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Fraternity Unipessoal Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227	\$ 77,936.20	Jan. 12, 2022	92.28%		92.28%
12	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	-	\$ 62,996.83	Oct. 15, 2021	51.03%	3.61%	54.64%
13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF RENTAU	-	\$ 64,383.50	Oct. 15, 2021	69.15%	5.56%	74.71%
14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE PE REMBOR	-	\$ 88,918.34	Oct. 15, 2021	46.21%	5.82%	52.03%
15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF OBRATO	-	\$ 66,144.65	Oct. 15, 2021	62.47%	10.53%	73.00%
16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	-	\$ 100,047.31	Oct. 15, 2021	14.58%		14.58%
17	Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda		\$ 182,701.57	Dec. 7, 2022	11.01%		11.01%
18	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda		\$ 394,194.73	April 28, 2022	1.77%	6.73%	8.50%
19	Rehabilitasaun Kampu Foteboli iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/VII/DILI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	\$ 277,330.43	July 18, 2019	0.00%		0.00%
20	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	MPW-W-210055	\$ 28,258.31	June 10, 2021	100.00%		100.00%
21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laleia	Manatuto	MEJD PKRIE EP CAIRUI	-	\$ 86,883.29	Oct. 15, 2021	48.70%	9.47%	58.18%
22	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412	\$ 695,420.83	June 7, 2016	91.52%		91.52%
23	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co., LTD	ICB/04/MPW-2014	\$ 34,379,729.54	Nov. 20, 2014	92.04%	6.50%	98.54%
24	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190035	\$ 481,029.67	Aug. 25, 2020	54.37%		54.37%
25	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020	\$ 194,402.72	Dec. 20, 2019	82.83%		82.83%
26	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	MPW-W-210057	\$ 448,209.39	June 10, 2021	95.04%		95.04%
27	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	MPW-W-210056	\$ 213,772.95	June 10, 2021	7.12%		7.12%
28	Konstrasaun Postu Saude Laclubar Funar- Postu Administrativo Laclubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	MERCY, Unipessoal Lda	04/PDIM-I/MNTT/VIII/2022	\$ 120,962.71	July 28, 2019	11.63%		11.63%
29	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BATARA	-	\$ 102,060.99	Oct. 15, 2021	64.09%	13.78%	77.87%
30	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	-	\$ 100,162.30	Oct. 15, 2021	31.58%	10.63%	42.21%
31	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPESOAL LDA	SSS/013/MOPTC-2017	\$ 3,384,214.14	Feb. 27, 2017	100.00%		100.00%
32	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000024	\$ 164,154.00	March 25, 2020	70.00%		70.00%
33	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	MPW-W-210059	\$ 203,036.57	June 10, 2021	52.40%	4.05%	56.45%
34	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	MPW-W-210060	\$ 196,112.23	June 10, 2021	61.58%	1.76%	63.34%
35	Projetu Rehabilitasaun Ensину Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	RFQ-R : 21/036 - Q	\$ 66,898.51	Nov. 26, 2021	62.93%	3.88%	66.81%
36	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	-	\$ 102,512.31	Oct. 15, 2021	47.73%	0.19%	47.92%
37	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	MPW-W-190157	\$ 242,560.14	Oct. 24, 2019	70.75%		70.75%
38	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	RDTL/PO-2016-11272	\$ 370,511.25	Sept. 13, 2016	17.59%		17.59%
39	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip.Lda	MPWTC - CD - 170003	\$ 15,875.56	Jan. 7, 2017	100.00%		100.00%
40	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/IX/2019	\$ 116,914.88	Sept. 23, 2019	71.10%		71.10%
41	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip Lda	No. Kontratu : MOP-W-190233	\$ 162,377.94	Oct. 8, 2019	46.50%		46.50%
42	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	MPW-W-W-190080	\$ 141,684.96	Aug. 25, 2019	41.78%		41.78%
43	R4D Rural Road Spot Improvement Agnculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We"coi Unipessoal Lda	MPW-W-210062	\$ 343,111.47	June 10, 2021	66.14%	16.35%	82.50%

LISTA #ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN											Apr-23		
					LOKALIZASAUN PROJETU								
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress	This Month Progress	Kumulativo Progress
44	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	MPW-W-210061	\$ 296,211.82	June 10, 2021	18.83%	0.31%	19.14%
45	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	MPW-W-210058	\$ 300,792.46	July 10, 2021	98.30%	0.22%	98.52%
46	New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Barique	Manatuto	Senizu		\$ 408,460.73		95.69%		95.69%
47	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacio	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421	\$ 380,582.61	Sept. 1, 2016	95.99%		95.99%
48	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Sahan I Unip.Lda	SSS/304/MOPTC-2016	\$ 3,314.56	Sept. 27, 2016	100.00%		100.00%
49	Routine Roads Maintenance - Lacio, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Egana, Unip. Lda	MPW-W-190251	\$ 223,836.50	Dec. 13, 2019	68.89%		68.89%
50	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Esa-Un	RDTL:74/GMTAC/XI/2015	\$ 50,745.00	May 2, 2016	38.83%		38.83%
51	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilimano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacio	Manatuto	Surprise Unip. Lda	07/PDIM-II/MNTT/VIII/2016	\$ 153,942.39	Sept. 12, 2016	97.16%		97.16%
52	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacio	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	ICB/07/MPW-2014	\$ 48,314,975.87	May.3, 2016	88.12%		88.12%
53	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lacio	Manatuto	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	-	\$ 98,147.27	Oct. 15, 2021	44.82%		44.82%
54	Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp at Behau	MINISTERIO DA DEFESA	LM-BS	FLOOD CONTROL	Lacio	Manatuto	Baboe Unip Lda		\$ 189,578.02	May 23, 2022	93.39%	4.12%	97.51%

Prepara Husi:

1. Eng. Jose R. Carlos. Gusmão
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

3. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

2. Eng. Domingos D.X.Silva
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

4. Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi:

Eng. Remigio da c.s dos Santos
Eng. Senior ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun, ADN, I.P

Eng/Arch. Francisco Xavier de D. Jeronimo
Eng. Senior ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento,ADN,I.P

Eng. Deolindo de Fatima Marques
ChefeSaksaun ME& ITC, ADN, I.P

Certifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validção De Qualida
ADN,I.P

#ANEXU A

MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	PMIS CODE	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
1	P0281	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	\$ 2,561,405.06	Aug. 25, 2018	63.80%	57.33%	\$ 1,468,479.04	\$ 1,092,926.02	ON-GOING	
2	P0282	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	\$ 3,029,514.40	Aug. 25, 2017	89.20%	79.82%	\$ 2,418,275.38	\$ 611,239.02	ON-GOING	
3	P0326	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obrai Unipessoal, Lda	\$ 2,362,976.44	June 30, 2015	82.08%	76.00%	\$ 1,795,843.89	\$ 567,132.55	ON-GOING	
4	P0377	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	\$ 28,011,854.94	Feb. 10, 2014	94.91%	85.62%	\$ 23,983,565.18	\$ 4,028,289.76	ON-GOING	
5	P0379	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	\$ 4,405,546.00	Sept. 3, 2014	73.76%	66.02%	\$ 2,908,484.28	\$ 1,497,061.72	ON-GOING	
6	P0788	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	\$ 79,155.54	Dec. 18, 2019	88.07%	79.26%	\$ 62,737.67	\$ 16,417.87	ON-GOING	
7	P0789	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	\$ 226,400.73	Dec. 18, 2019	43.70%	10.97%	\$ 24,834.32	\$ 201,566.41	ON-GOING	
8	P0872	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	\$ 29,275.84	March 1, 2020	15.92%	15.92%	\$ 4,660.85	\$ 24,614.99	ON-GOING	
9	P0954	Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Municipiu Manatuto, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip.Lda	\$ 262,983.65	09-Dec-20	100.00%	97.19%	\$ 255,587.87	\$ 7,395.78	FHO	Projecto ne Finaliza ona
10	P2538	New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	K-6, UNIPESOAL LDA	\$ 257,748.51	Jan. 12, 2022	88.89%	74.56%	\$ 192,164.43	\$ 65,584.08	ON-GOING	
11	P2539	Supply and Installtion Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Fraternity Unipessoal Lda	\$ 77,936.20	Jan. 12, 2022	92.28%	86.81%	\$ 67,657.50	\$ 10,278.70	ON-GOING	
12	P1806	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	\$ 62,996.83	Oct. 15, 2021	54.64%	48.32%	\$ 30,440.24	\$ 32,556.59	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 3.61%
13	P1808	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF RENTAU	\$ 64,383.50	Oct. 15, 2021	74.71%	50.49%	\$ 32,504.67	\$ 31,878.83	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 5.56%
14	P1809	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE PE REMBOR	\$ 88,918.34	Oct. 15, 2021	52.03%	44.89%	\$ 39,919.56	\$ 48,998.78	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 5.82%
15	P1811	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF OBRATO	\$ 66,144.65	Oct. 15, 2021	73.00%	50.49%	\$ 33,395.94	\$ 32,748.71	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 10.53%
16	P2041	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	\$ 100,047.31	Oct. 15, 2021	14.58%	14.58%	\$ 14,590.20	\$ 85,457.11	ON-GOING	
17	P1953	Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda	\$ 182,701.57	Dec. 7, 2022	11.01%	6.14%	\$ 11,214.18	\$ 171,487.39	ON-GOING	
18	P1581	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda	\$ 394,194.73	April 28, 2022	8.50%	0.00%	\$ -	\$ 394,194.73	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 6.73%
19	P0627	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip.Lda	\$ 277,330.43	July 18, 2019	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 277,330.43	ON-GOING	
20	P0986	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	\$ 28,258.31	June 10, 2021	100.00%	100.00%	\$ 28,258.31	\$ -	FHO	Projecto ne Finaliza ona

#ANEXU A

MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	PMIS CODE	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
21	P1810	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laleia	Manatuto	MEJD PKRIE EP CAIRUI	\$ 86,883.29	Oct. 15, 2021	58.18%	45.49%	\$ 39,524.89	\$ 47,358.40	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 9.74%
22	P0114	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	\$ 695,420.83	June 7, 2016	91.52%	82.11%	\$ 571,034.27	\$ 124,386.56	ON-GOING	
23	P0378	Road Network Upgrading Sector Project (RNUSP)Upgrading and Maintenance of Laclubar Junction - Natarbora Road (Sta. 100+360 - Sta. 144+995)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD	\$ 34,379,729.54	Nov. 20, 2014	98.54%	88.30%	\$ 30,356,507.52	\$ 4,023,222.02	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 6.50%
24	P0899	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 481,029.67	Aug. 25, 2020	54.37%	11.80%	\$ 126,501.30	\$ 354,528.37	ON-GOING	
25	P0917	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 194,402.72	Dec. 20, 2019	82.83%	74.55%	\$ 144,924.09	\$ 49,478.63	ON-GOING	
26	P0977	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	\$ 448,209.39	June 10, 2021	95.04%	82.05%	\$ 367,756.59	\$ 80,452.80	ON-GOING	
27	P0983	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	\$ 213,772.95	June 10, 2021	7.12%	0.00%	\$ -	\$ 213,772.95	ON-GOING	
28	P2781	Konstrasaun Postu Saude Laclubar Funar- Postu Administrativo Laclubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	MERCY, Unipessoal Lda	\$ 88,045.73	July 28, 2019	11.63%	10.46%	\$ 9,212.19	\$ 78,833.54	ON-GOING	
29	P1803	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BATARA	\$ 102,060.99	Oct. 15, 2021	77.87%	25.60%	\$ 26,125.75	\$ 75,935.24	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 13.78%
30	P1804	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	\$ 100,162.30	Oct. 15, 2021	42.21%	25.59%	\$ 25,626.77	\$ 74,535.53	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 10.63%
31	P0316	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPESSOAL LDA	\$ 3,553,954.20	Feb. 27, 2017	100.00%	93.93%	\$ 3,338,377.84	\$ 215,576.36	ON-GOING	
32	P0932	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	\$ 164,154.00	March 25, 2020	70.00%	70.00%	\$ 114,907.80	\$ 49,246.20	ON-GOING	
33	P0981	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 203,036.57	June 10, 2021	56.45%	41.78%	\$ 84,819.65	\$ 118,216.92	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 4.05%
34	P0984	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 196,112.23	June 10, 2021	63.34%	30.42%	\$ 59,662.31	\$ 136,449.92	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 1.76%
35	P1814	Projetu Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 66,898.51	Nov. 26, 2021	66.81%	55.80%	\$ 37,330.95	\$ 29,567.56	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 3.88%
36	P1807	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	\$ 102,512.31	Oct. 15, 2021	47.92%	45.66%	\$ 46,807.88	\$ 55,704.43	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 0.19%
37	P0940	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	\$ 242,560.14	Oct. 24, 2019	70.75%	63.68%	\$ 154,455.92	\$ 88,104.22	Abandona	
38	P0404	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	\$ 370,511.25	Sept. 13, 2016	17.59%	15.83%	\$ 58,645.87	\$ 311,865.38	Abandona	Abandona
39	P0540	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip.Lda	\$ 15,875.56	Jan. 7, 2017	100.00%	87.26%	\$ 13,853.09	\$ 2,022.47	PHO	Abandona
40	P0784	Konstrusaun Postu Saude Aimetá Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	\$ 116,914.88	Sept. 23, 2019	71.10%	63.99%	\$ 74,817.23	\$ 42,097.65	ON-GOING	
41	P0873	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip Lda	\$ 162,377.94	Oct. 8, 2019	46.50%	41.85%	\$ 67,961.57	\$ 94,416.37	ON-GOING	

#ANEXU A
MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	PMIS CODE	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
42	P0921	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 141,684.96	Aug. 25, 2019	41.78%	36.88%	\$ 52,260.01	\$ 89,424.95	ON-GOING	
43	P0978	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We'coi Unipessoal Lda	\$ 343,111.47	June 10, 2021	82.50%	21.97%	\$ 75,370.79	\$ 267,740.68	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 16.35%
44	P0982	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	\$ 296,211.81	June 10, 2021	19.14%	15.96%	\$ 47,266.94	\$ 248,944.87	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 0.31%
45	P0985	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	\$ 300,792.46	July 10, 2021	98.52%	52.76%	\$ 158,690.94	\$ 142,101.52	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 0.22%
46	P1056	New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Barique	Manatuto	Senizu	\$ 408,460.73	Oct. 18, 2021	95.69%	78.09%	\$ 318,953.66	\$ 89,507.07	ON-GOING	
47	P0061	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacio	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	\$ 380,582.61	Sept. 1, 2016	95.99%	72.08%	\$ 274,330.03	\$ 106,252.58	ON-GOING	
48	P0221	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Sahan I Unip.Lda	\$ 3,314.56	Sept. 27, 2016	100.00%	90.00%	\$ 2,983.11	\$ 331.45	PHO	Falta Retensaun
49	P0926	For Roads & Bridges Maintenance Section : Mantanen Lacio, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Egana, Unip. Lda	\$ 223,843.79	Dec. 13, 2019	68.89%	56.58%	\$ 126,647.74	\$ 97,196.05	ON-GOING	
50	P0692	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Esa-Un	\$ 50,745.00	May 2, 2016	38.83%	34.95%	\$ 17,736.12	\$ 33,008.88	PENDENTE	
51	P0776	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilmano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacio	Manatuto	Surprise Unip. Lda	\$ 153,942.39	Sept. 12, 2016	97.16%	84.29%	\$ 129,753.97	\$ 24,188.42	ON-GOING	
52	P0396	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacio	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	\$ 48,314,975.87	May.3, 2016	88.12%	87.98%	\$ 42,506,027.78	\$ 5,808,948.09	ON-GOING	
53	P1805	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lacio	Manatuto	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	\$ 98,147.27	Oct. 15, 2021	44.82%	44.74%	\$ 43,908.27	\$ 54,239.00	ON-GOING	
54	P2603	Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp at Behau	MINISTERIO DA DEFESA	LM-BS	FLOOD CONTROL	Lacio	Manatuto	Baboe Unip Lda	\$ 189,578.02	May 23, 2022	97.51%	87.76%	\$ 166,368.56	\$ 23,209.46	PHO	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Abril Aumenta 4.12%
		TOTAL							\$ 135,459,788.92				\$ 113,011,764.91	\$ 22,424,814.55		

1. Eng. José R. Carlos, Gusmão
Eng. ba Projeto Infrastrutura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Prepara Husi:
2. Eng. Domingos D.X. Silva
Eng. ba Projeto Infrastrutura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

3. Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Edificiu Público, Be'e
no Saneamento Municipiu Manatuto, ADN, I.P

4. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

Certifika Husi:
Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De
Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon
Chainage 3+000-6+200

No. kontratu : MPW-W-210062

Data Inspesaun : 27/04/ 2023

Fatin Inspesaun : Barique

Koordinadas :


Start Point : Long : -8.996644°, Latetude : 126.084961°

End Point : Long : -8.977311°, Latetude : 126.102659°

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Compania kontinua item
makadam nebe sei falta.

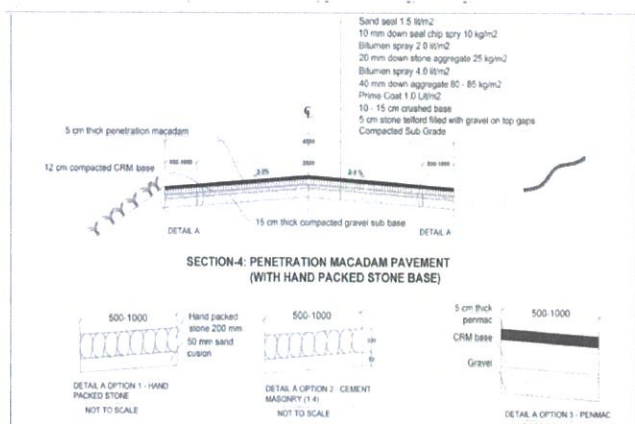

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (BA - 7)

Naran Projeto : RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT AGRICULTURE CENTRE - AUBEON CHAINAGE (STA 3 + 000 - 6 + 200)
No. kontratu : MPW - W - 210062
Postu : Natarbora
Suku : Aubeon
Naran Kompanhia : We' Coi Unip, Lda.

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)						
R-01	General	\$ 2,340.00	\$ 2,340.00	0.68%	\$ -	0.00%	\$ 2,340.00	0.68%
R-03	Earth work	\$ 10,796.77	\$ 10,796.77	3.15%	\$ 0.00	0.00%	\$ 10,796.77	3.15%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 57,631.73	\$ 57,631.73	16.80%	\$ -	0.00%	\$ 57,631.73	16.80%
R - 07	Bituminous pavement	\$ 175,067.20	\$ 74,483.63	21.71%	\$ 50,004.80	14.57%	\$ 124,488.43	36.28%
R-08	Structures	\$ 35,867.39	\$ 36,637.28	10.68%	\$ -	0.00%	\$ 36,637.28	10.68%
R-10	Dayworks	\$ 175.00	\$ 525.00	0.15%	\$ -	0.00%	\$ 525.00	0.15%
R-11	Routine Maintenance	\$ 6,341.00	\$ 6,341.00	1.85%	\$ -	0.00%	\$ 6,341.00	1.85%
R-15	Provisional Sum	\$ 100.00	\$ 100.00	0.03%	\$ -	0.00%	\$ 100.00	0.03%
A	Construction Cost	\$ 288,319.09	\$ 188,855.40	55.04%	\$ 50,004.80	14.6%	\$ 238,860.20	69.6%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 28,831.91	\$ 18,885.54	5.50%	\$ 5,000.48	1.46%	\$ 23,886.02	6.96%
C	General Item	\$ 19,232.79	\$ 14,755.50	4.30%	\$ -	0.00%	\$ 14,755.50	4.30%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 6,727.68	\$ 4,449.93	1.30%	\$ 1,100.11	0.32%	\$ 5,550.03	1.62%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 343,111.47	\$ 226,946.37	66.14%	\$ 56,105.39	16.35%	\$ 283,051.75	82.50%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Domingos D. X. Silva)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irigação
Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (BA-8)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center
Chainage 0+000 - 3+000

No. kontratu : MPW-W-210061

Data Inspesaun : 27/ 04/ 2023

Fatin Inspesaun : Natarbora - Uma Boco- Aubeon

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.996666°, Latetude : 126.084966°

End Point : Long : -9.004681°, Latetude : 126.061377°

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketsa servisu;
Compania continua halo servisu atiru rai
ou embankment.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (BA-8)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center
Chainage 0+000 - 3+000

No. kontratu : MPW-W-210061

Sketch & Foto Desenho

Projetu ne'e paradu kleur ona kuaze tama
tinan ida mak hafoin kontinua servisu fali
fulan marcu de 2023 kompania hahu
servisu iha tereinu item timbunan badan
jalan ba preparasaun aspalt hot mix
(Macadam) tuir implematasaun.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Projetu ne'e paradu kleur ona kuaze tama
tinan ida mak hafoin kontinua servisu fali
fulan marcu de 2023 kompania hahu
servisu iha tereinu item timbunan badan
jalan ba preparasaun aspalt hot mix
(Macadam) tuir implematasaun.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual






#ANEXU C2 (BA -8)

Naran Projeto : RD4 RURAL ROAD ROUTINE MAINTENANCE
No. kontratu : MPW-W-210055
Postu : Natarbora
Suku : Aubeon
Naran Kompanhia : Linoel Unip, Lda

SUMMARY								
SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)						
R-01	General	\$ 2,440.90	\$ 950.00	0.32%	\$ -	0.00%	\$ 950.00	0.32%
R-05	Earth work	\$ 23,170.60	\$ 17,594.16	5.94%	\$ 810.00	0.27%	\$ 18,404.16	6.21%
R-07	Sub-base, Base and Pavement	\$ 56,064.54	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Bituminous pavement	\$ 134,733.55	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-10	Structures	\$ 16,458.42	\$ 11,995.41	4.05%	\$ -	0.00%	\$ 11,995.41	4.05%
R-11	Dayworks	\$ 182.00	\$ 182.00	0.06%	\$ -	0.00%	\$ 182.00	0.06%
R-15	Routine maintenance	\$ 5,357.00	\$ 4,057.00	1.37%	\$ -	0.00%	\$ 4,057.00	1.37%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ 200.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.07%
A	Construction Cost	\$ 238,607.02	\$ 34,978.57	11.81%	\$ 810.00	0.27%	\$ 35,788.57	12.08%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 23,860.70	\$ 3,497.86	1.18%	\$ 81.00	0.03%	\$ 3,578.86	1.21%
C	Generals item	\$ 27,936.02	\$ 15,359.50	5.19%	\$ -	0.00%	\$ 15,359.50	5.19%
D	Tax 2 % x (A+B+C)	\$ 5,808.07	\$ 1,076.72	0.36%	\$ 17.82	0.01%	\$ 1,094.54	0.37%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 296,211.81	\$ 54,912.64	18.83%	\$ 908.82	0.31%	\$ 55,821.46	19.14%


Inspeksaun Husi:

2. Domingos D.X. Silva
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P.

Verifika Husi :

Eng. Remigio da c.s dos Santos
Eng. Senior ba Projecto Infrastrutctura e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika husi :

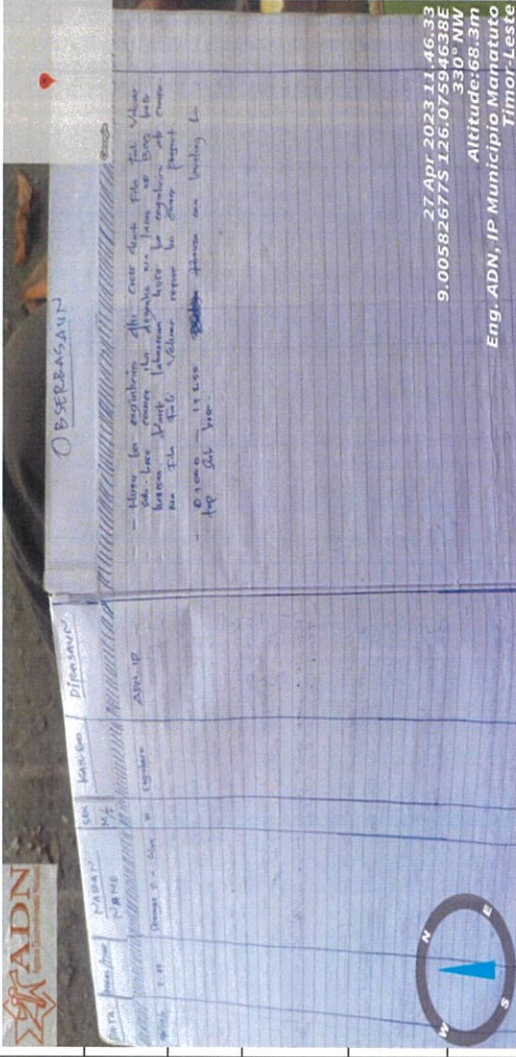Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN.I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (BA-8)				
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000					Asinatura				
Kompanha : Linoel Unipessoal Lda									
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No				
I	27/04/2023	Manatuto/ Barique	1. Domingos D.X. Silva	Eng. Ba Projéitu ITI Munisipiu Manatuto, ADN.I.P	1				



#ANEXU C2 (BA - 9)

Naran Projeto : R4D RUAL ROAD SPOT IMROVEMENT, KEAN LARAN - BARIQUE CHAINAGE 0+000 - 9 + 000
No. kontratu : MPW - W - 210058
Postu : Barique
Suku : Barique
Naran Kompanhia : Gimso ,Unip. Lda

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)						
R-01	General	\$ 2,980.11	\$ 2,980.11	0.99%	\$ -	0.00%	\$ 2,980.11	0.99%
R-03	Earth work	\$ 11,414.65	\$ 11,414.65	3.79%	\$ -	0.00%	\$ 11,414.65	3.79%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 32,040.00	\$ 32,040.00	10.65%	\$ -	0.00%	\$ 32,040.00	10.65%
R-08	Structures	\$ 181,126.91	\$ 194,948.11	64.81%	\$ 590.90	0.20%	\$ 195,539.01	65.01%
R-10	Dayworks	\$ 175.00	\$ 112.00	0.04%	\$ -	0.00%	\$ 112.00	0.04%
R-11	Routine Maintenance	\$ 14,384.50	\$ 10,580.50	3.52%	\$ -	0.00%	\$ 10,580.50	3.52%
R-15	Provisional Sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 242,321.16	\$ 252,075.36	83.80%	\$ 590.90	0.20%	\$ 252,666.26	84.00%
B	Profit (10% x A)	\$ 24,232.12	\$ 25,207.54	8.38%	\$ 59.09	0.02%	\$ 25,266.63	8.40%
C	General Item	\$ 28,341.30	\$ 12,600.00	4.19%	\$ -	0.00%	\$ 12,600.00	4.19%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 5,897.89	\$ 5,797.66	1.93%	\$ 13.00	0.00%	\$ 5,810.66	1.93%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 300,792.46	\$ 872.10	98.30%	\$ 662.99	0.22%	\$ 296,343.55	98.52%

Verifika Husi :

Sertifika husi :

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Domingos DX. Silva)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

(Eng. Remigio da c.s dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA-10)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Gapura and Gabion Wall Protection no Jardim de
Herois de Natarbora

No. kontratu : 215/MACLN/X/2021

Data Inspesaun : 27 Abril 2023

Fatin Inspesaun : Natarbora

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.9711S,

Latetude : 126,04947E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Progressu iha fulan ida ne'e:

Iha parte konstrusaun ba
Gapura ninian agora dadaun
falta deit ona monta portaun
principal no mos portaun kiik
iha parte sorin karuk no los,
hodi finaliza servisu ba
gapura ninian.

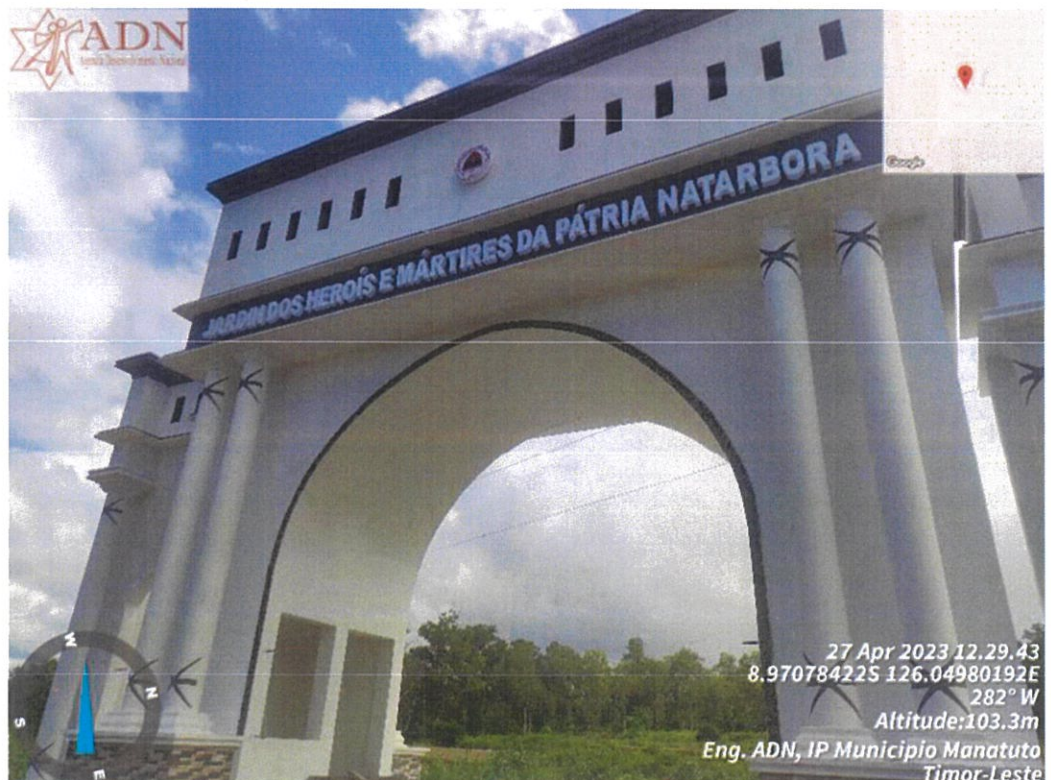



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA-10)

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction of Gapura and Gabion Wall Protection no Jardim de
Heróis de Natarbora


No. kontratu

: 215/MACLN/X/2021

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

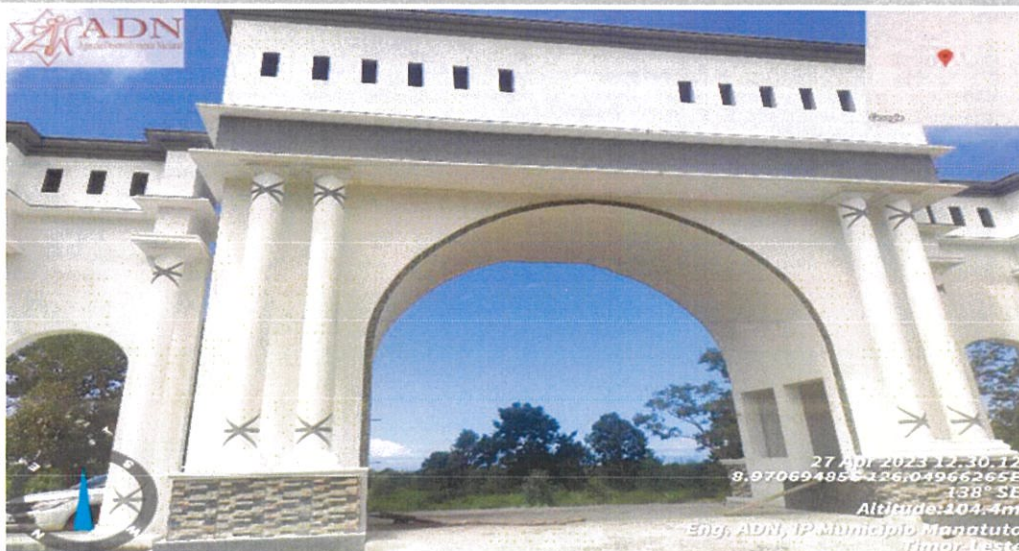

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-8)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara
No. kontratu :

Data Inspesaun : 25 Abril 2023

Fatin Inspesaun : Aisiuun Laclubar

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.7762S,

Latetude : 125,9238E

End Point : Long :

Latetude :


Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Progressu servisu iha fulan ida
ne'e: Ba Classroom Building
agora dadauk fizikamente husi
konstrusaun finalize ona , mas sei
falta item servisu balu iha parte
joinery nian mak seidauk
kompletu.

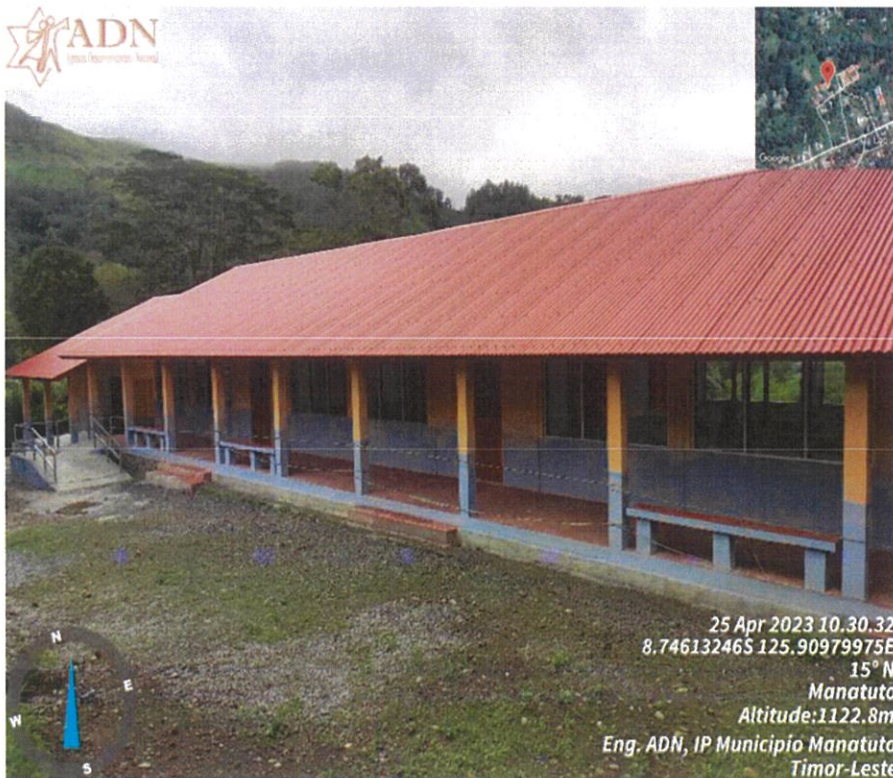

25 Apr 2023 10.30.32
8.74613246S 125.90979975E
15° N
Manatuto
Altitude: 1122.8m
Eng. ADN, IP Municipio Manatuto
Timor-Leste



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-8)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara


No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

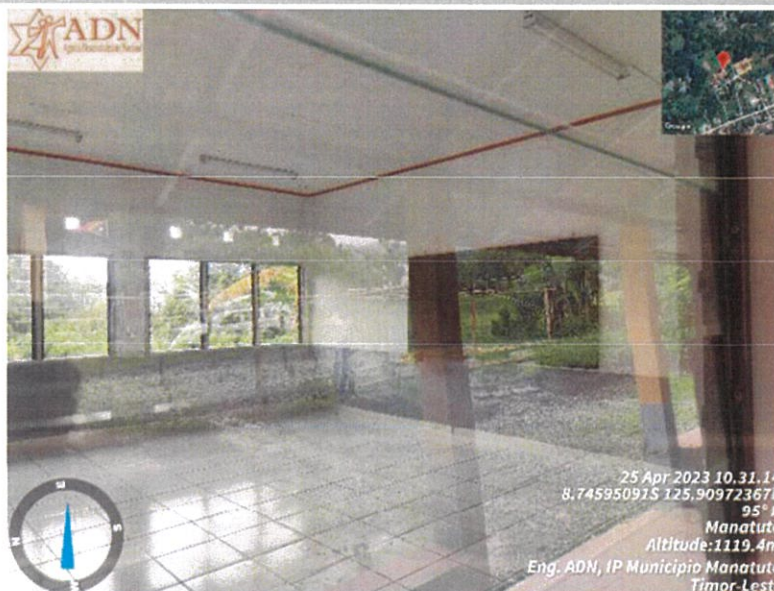


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Progressu servisu iha fulan ida
ne'e: Ba Toilet Building nian
agora dadaun fizikamente
kompleta ona , falta inspesaun fila
fali hodi hare mos parte electrical
no mos plumbing ninian.

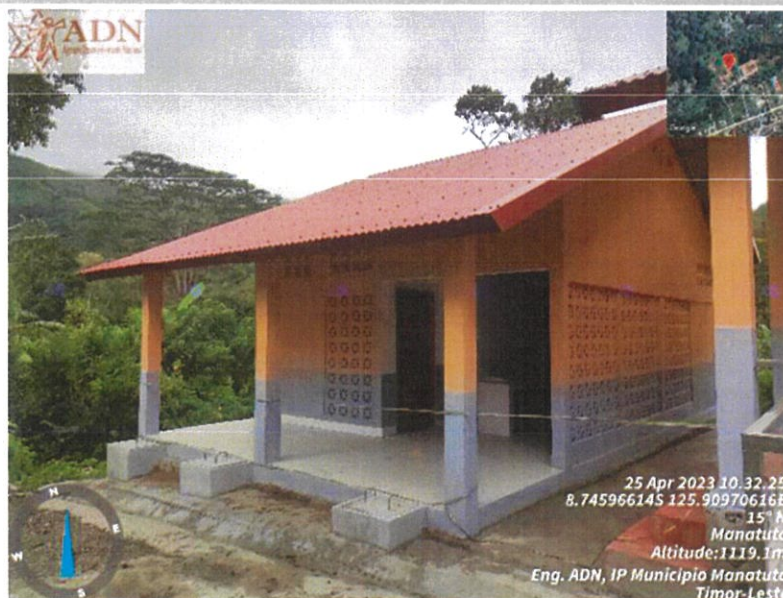



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (LAC-8)

TÍTULO DO PROJECTO : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA EBF BATARA

FATIN PROJEITO : BATARA, MANATUTO

DONO DO PROJEITO : MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY		ORIGINAL CONTRACT		REPORT PROGRESS BY ADN IP					
NO.	WORK DESCRIPTION	AMOUNT US\$	WEIGHT (%)	Previous Progress		Progress April		Up to Date	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	\$ 3,575.00	3.50%	\$ 2,195.00	2.15%	\$ -	0.00%	\$ 2,195.00	2.15%
II	DEMOLITION	\$ 300.00	0.29%	\$ 300.00	0.29%	\$ -	0.00%	\$ 300.00	0.29%
III	CLASSROOM BUILDING	\$ 50,717.94	49.69%	\$ 41,139.70	40.31%	\$ 7,472.93	7.32%	\$ 48,612.63	47.63%
IV	TOILET BUILDING	\$ 25,427.93	24.91%	\$ 16,736.40	16.40%	\$ 5,295.71	5.19%	\$ 22,032.11	21.59%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	\$ 12,700.12	12.44%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 92,720.99	90.85%	\$ 60,371.11	59.15%	\$ 12,768.63	12.51%	\$ 73,139.74	71.66%
B	CONTIGENCY	\$ 3,000.00	2.94%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
C	OVERHEAD	\$ 6,340.00	6.21%	\$ 5,040.50	4.94%	\$ 1,299.50	1.27%	\$ 6,340.00	6.21%
D	GRAND TOTAL	\$ 102,060.99	100.00%	\$ 65,411.61	64.09%	\$ 14,068.13	13.78%	\$ 79,479.74	77.87%

Prepara Husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico no Agua
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-8) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp At Behau, Manatuto Municipality**

No. kontratu :

Data Inspesaun : **05 / 04 /2023**

Fatin Inspesaun : Behau-Laclo

Koordinadas : Start Point : Long : Latitude :

End Point : Long : Latitude :

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos D. X. Silva**

2. Eng. Jose R. C. Gusmao

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item Servisu

Compania finaliza servisu fisicu iha terenu





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-8) Back-up Data


Naran Projeto : Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp At Behau, Manatuto
Municipality

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Servisu;

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

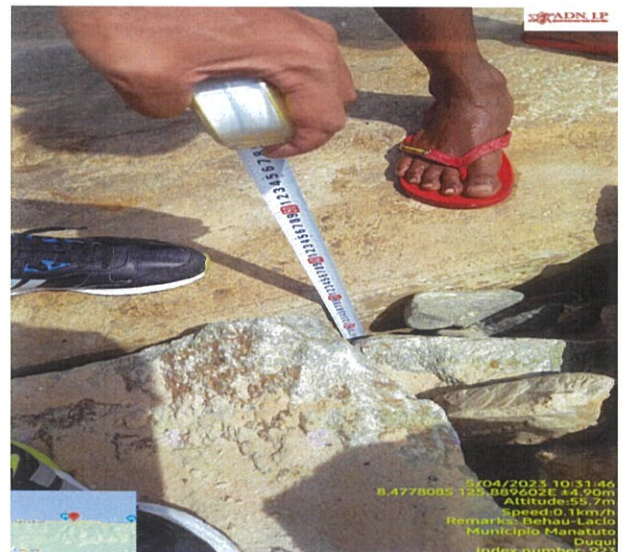



#ANEXU C2 (LA-8)

Projeitu : REHABILITATION OF REINFORCED CONCRETE RAMP AT BEHAU
Fatin Projeitu : Posto Administrativo Lacio, Municipio Manatuto
Contraktor : Baboe Unipessoal, Lda
No. kontratu :

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PERECENT PREVIOUS BILLING	PERECENT PREVIOUS	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
100	Mobilization and Demobilization	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1.05%	\$ -	0.00%	\$ 2,000.00	1.05%
200	Clearing and Grubbing	\$ 250.00	\$ 250.00	0.13%	\$ -	0.00%	\$ 250.00	0.13%
300	Remove of Existing Ramp	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	2.64%	\$ -	0.00%	\$ 5,000.00	2.64%
400	Geobags for Protection	\$ 73,006.50	\$ 73,006.50	38.51%	\$ -	0.00%	\$ 73,006.50	38.51%
500	Dewatering inside the Geobags protection	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	2.11%	\$ -	0.00%	\$ 4,000.00	2.11%
600	Lean Concrete	\$ 5,092.50	\$ 5,092.50	2.69%	\$ -	0.00%	\$ 5,092.50	2.69%
700	Reinforcing Steel	\$ 25,995.42	\$ 22,266.76	11.75%	\$ 3,728.66	1.97%	\$ 25,995.42	13.71%
800	Structure Concrete Class A, 25 Mpa Concrete	\$ 38,918.00	\$ 38,917.86	20.53%	\$ -4,723.92	-2.49%	\$ 34,193.94	18.04%
900	Rouble Mount	\$ 7,047.20	\$ 7,047.20	3.72%	\$ -	0.00%	\$ 7,047.20	3.72%
1000	Precast Concrete A, 25 Mpa	\$ 8,800.00	\$ -	0.00%	\$ 8,800.00	4.64%	\$ 8,800.00	4.64%
1100	Removal of Temporary Geobags for Protection	\$ 19,468.40	\$ 19,468.40	10.27%	\$ -	0.00%	\$ 19,468.40	10.27%
A	Construction Cost	\$ 189,578.02	\$ 177,049.22	93.39%	\$ 7,804.74	4.12%	\$ 184,853.96	97.51%
B	Profit (10% x A)		\$ -	0.00%				
C	OverHead			0.00%				
D	Tax 2 % x (A+B+C)		\$ -	0.00%				
E	Contingency		\$ -	0.00%				
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 189,578.02	\$ 177,049.22	93.39%	\$ 7,804.74	4.12%	\$ 184,853.96	97.51%

Inspeksaun Husi:

(Eng. José R. Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irigação Municipiu
Manatuto, ADN.I.P.
(Eng. Domingos D.X. Silva)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irigação
Municipiu Manatuto, ADN.I.P.

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C.S. dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P.

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN.I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-9)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um**
No. kontratu :

Data Inspesaun : 25 Abril 2023

Fatin Inspesaun : Aisiu-um Laclubar

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.7762S,

Latetude : 125,9238E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : **Quico Adelino Junior**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Progressu fiziku iha fulan ida ne'e: Ba
Classroom ninian finaliza ona servisu
roofing ninian no agora dadaun grupo
kontinua ho servisu plesteran ba parte laran
no mos liur.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-9)

Back-up Data


Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um**

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

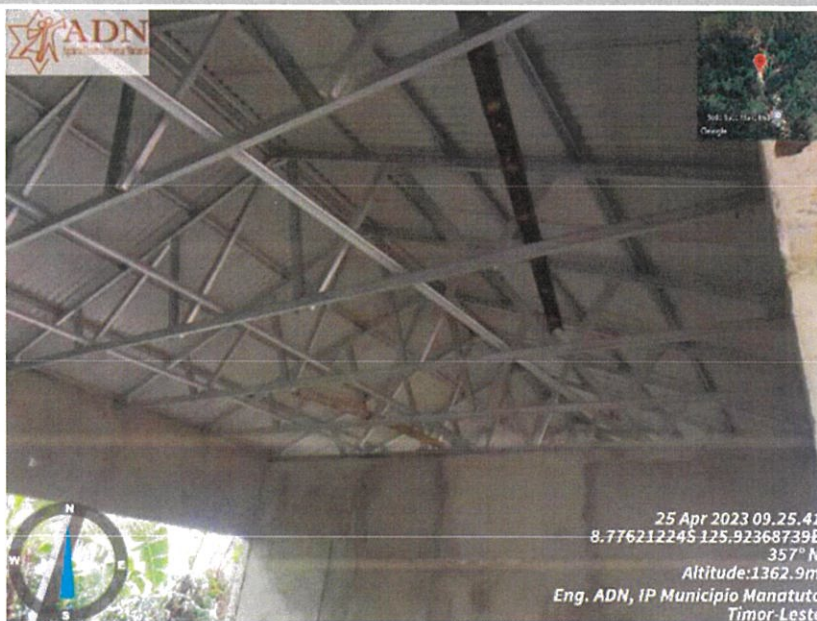


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

Ba Toilet Building ninian komesa ona ho
monta bekesting ba top beam nian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

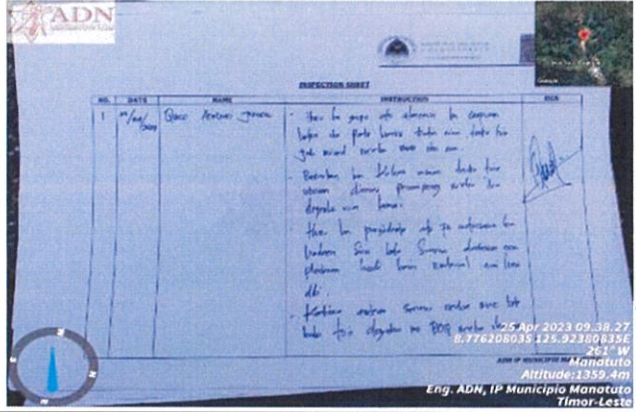

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN.I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D1 (LAC-9) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
					Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um			
					Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO AISIU-UM			
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	25/04/2023	Laclubar	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Husu ba grupo atu atensaun ba campuran beton iha parte haris fatin nian tenke tuir job mixed ne'ebe mak iha ona.		
					2	Bekesting ba kolom ninian tenke tuir ukuran dimensi penampang ne'ebe iha dezenhu nia laran.		
					3	Husu ba presidente do grupo atu fo instrusaun ba badaen sira hodi bele kontinua servisu dadaun ona plesteran hodi hein material mai husi Dili.		
					4	Kontinua aselera servisu ne'ebe mak bele halo tuir dezenhu no BOQ ne'ebe iha ona.		
					5			



#ANEXU C2 (LAC-9)
SUMMARY BOQ

Naran Projektu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um
Lokalidade : Suco Bora, Posto Administrativo Laclubar
Projektu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

		ORIGINAL CONTRACT			PROGRESS REPORT BY A D N					
No	MAIN SUMMARY	Page No		Amount	PROGRESS PREVIOUS		PROGRESS APRIL		TOTAL TO DATE	
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3.075,00	\$ 1.725,00	1,72%	\$ -	0,00%	\$ 1.725,00	1,72%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	\$ 51.145,96	\$ 22.049,90	22,01%	\$ 9.655,11	9,64%	\$ 31.705,01	31,65%
III	TOILET BULDING Tb	TB/39	(i)	\$ 25.155,89	\$ 6.634,14	6,62%	\$ 991,93	0,99%	\$ 7.626,07	7,61%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/24	(i)	\$ 11.445,45						
A	CONSTRUCTION COST			\$ 90.822,30	\$ 30.409,04	30,36%	\$ 10.647,04	10,63%	\$ 41.056,08	40,99%
B	CONTIGENCIA			\$ 3.000,00						
C	OVERHEAD			\$ 6.340,00	\$ 1.220,00	1,22%	\$ -	0,00%	\$ 1.220,00	1,22%
D	GRAND TOTAL			\$ 100.162,30	\$ 31.629,04	31,58%	\$ 10.647,04	10,63%	\$ 42.276,08	42,21%

Verifika Husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projeto Edificio Publico no Agua
Saneamento Municipio Manatuto ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAL-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui
No. kontratu :

Data Inspesaun : 24 Abril 2023

Fatin Inspesaun : Cairui, Laleia

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.6063S,

Latetude : 126,1422E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Progreso servisu iha fulan
ida ne'e: ba Classroom ninian
agora dadaun grupo komesa
ho nahe keramik ba lantai
haris fatin no mos keramik ba
dinding haris fatin ninian.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAL-3)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu
Sketch & Foto Desenho

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui

:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Sketch Item servisu.



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

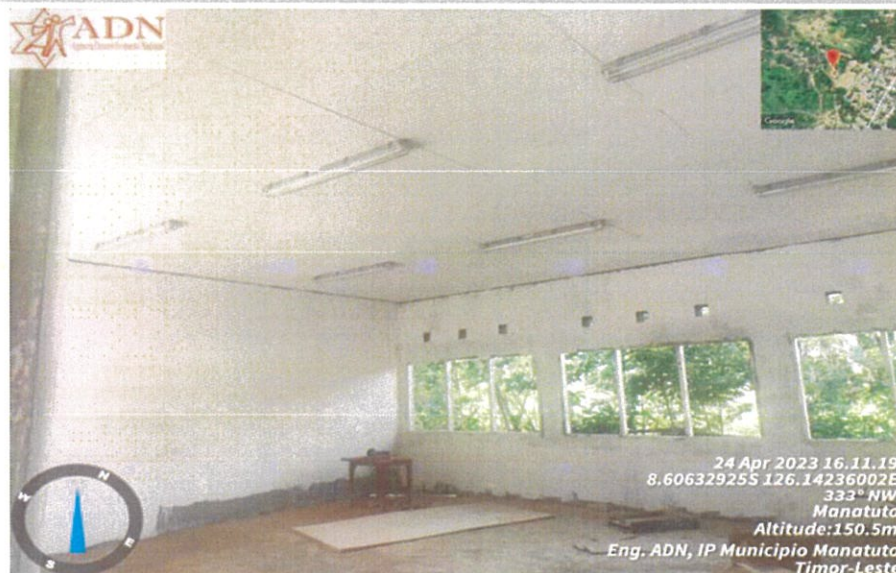



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (LAL-3) SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui

Lokalidade : Suco Cairui, Posto Administrativo Laleia

Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

NO	MAIN SUMMARY	Page No	AMOUNT	PROGRESS REPORT BY ADN IP					
				PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS APRIL		TOTAL TO DATE	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 3.075,00	\$ 1.725,00	1,99%	\$ -	0,00%	\$ 1.725,00	1,99%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47 (i)	\$ 58.021,79	\$ 36.251,11	41,72%	\$ 8.231,39	9,47%	\$ 44.482,50	51,20%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/20 (i)	\$ 7.901,93	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST		\$ 68.998,72	\$ 37.976,11	43,71%	\$ 8.231,39	9,47%	\$ 46.207,50	53,18%
B	CONTIGENCIA		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD		\$ 6.340,00	\$ 4.340,00	5,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.340,00	5,00%
D	GRAND TOTAL		\$ 86.883,29	\$ 42.316,11	48,70%	\$ 8.231,39	9,47%	\$ 50.547,50	58,18%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Reabilitação do Escritorio, ID Emis - 1096
No. kontratu :

Data Inspesaun : 26 Abril 2023

Fatin Inspesaun : Kampung baru, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5349S,

Latetude : 126,0101E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu servisu iha fulan ida
ne'e:

Ba konstrusaun Escritorio ninian
finaliza ona parte ceiling (plafond)
ninian no agora dadaun frupu hahu
monta keramik ba iha parte sala do
escritorio.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



26 Apr 2023 11:13:34
8/53450504S 126/0101094E
180° S
Manatuto
Altitude: 54.6m
Eng. ADN, IP Município Manatuto
Timor-Leste



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-12)

Back-up Data

Naran Projeto

: Reabilitação do Escritório, ID Emis - 1096

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.




26 Apr 2023 11.12.20
8.53484032S 126.01025543E
276° W
Manatuto
Altitude: 87.0m
Eng. ADN, IP Município Manatuto
Timor-Leste

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

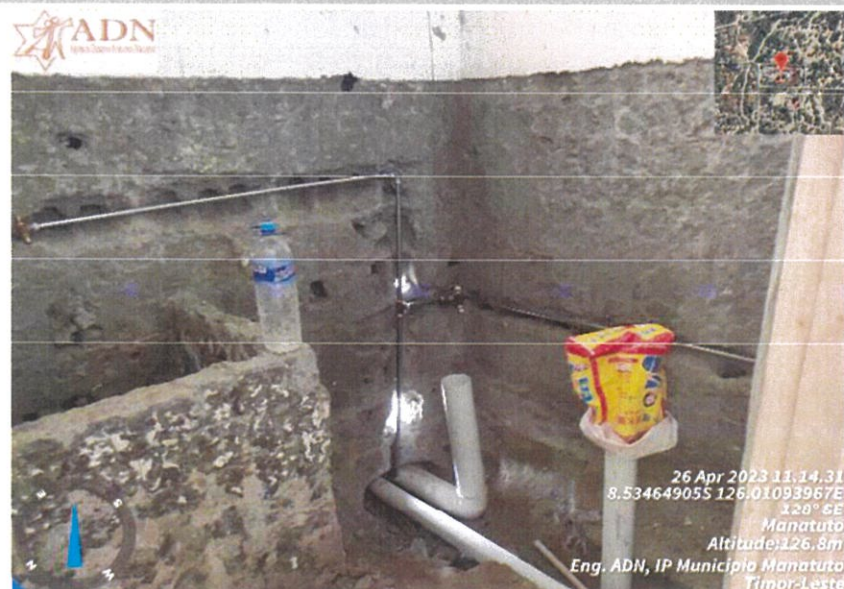

26 Apr 2023 11.14.31
8.53464905S 126.01093967E
120° SE
Manatuto
Altitude: 126.8m
Eng. ADN, IP Município Manatuto
Timor-Leste



#ANEXU C2 (MV-12) SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala
Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

NO.	MAIN SUMMARY	Page No	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY ADN IP					
				Amount	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS APRIL		TOTAL TO DATE	
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3,075.00	\$ 2,125.00	3.37%	\$ -	0.00%	\$ 2,125.00	3.37%
II	REFURBISHED TEACHER OFFICE BUILDING Rf	RF/51	(i)	\$ 50,581.84	\$ 27,203.88	43.18%	\$ 2,272.23	3.61%	\$ 29,476.11	46.79%
A	CONSTRUCTION COST			\$ 53,656.84	\$ 29,328.88	46.56%	\$ 2,272.23	3.61%	\$ 31,601.11	50.16%
B	CONTIGENCIA			\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
C	OVERHEAD			\$ 6,340.00	\$ 2,820.00	4.48%	\$ -	0.00%	\$ 2,820.00	4.48%
D	GRAND TOTAL			\$ 62,996.83	\$ 32,148.88	51.03%	\$ 2,272.23	3.61%	\$ 34,421.11	54.64%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-13)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau
No. kontratu :

Data Inspesaun : 26 Abril 2023

Fatin Inspesaun : Aiteas Manatuto

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5103S,

Latetude : 126,0157E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu Fiziku iha fulan ida

ne'e:

Iha fulan ida ne iha parte
classroom ninian finaliza ona
servisu ba monta keramik no mos
tinta ninian, no agora dadaun
grupu sei halo kompras ba maerial
electrical nian hodi kompleta.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



26 Apr 2023 11.54.31
8.51033967S 126.01592382E
244° SW
Manatuto
Altitude: 66.7m
Eng. ADN, IP Municipio Manatuto
Timor-Leste



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-13)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .





#ANEXU C2 (MV-13) SUMMARY BOQ

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau

Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto

Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY				ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY A D N					
No	MAIN SUMMARY	Page No		Amount	Progress Previous		Progress April		Total To Date		
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3.075,00	\$ 1.950,00	3,03%	\$ 250,00	0,39%	\$ 2.200,00	3,42%	
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	\$ 48.345,34	\$ 40.776,44	63,33%	\$ 3.327,69	5,17%	\$ 44.104,14	68,50%	
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/10	(i)	\$ 3.623,16	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
A	CONSTRUCTION COST			\$ 55.043,50	\$ 42.726,44	66,36%	\$ 3.577,69	5,56%	\$ 46.304,14	71,92%	
B	CONTIGENCY			\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
C	OVERHEAD			\$ 6.340,00	\$ 1.795,00	2,79%	\$ -	0,00%	\$ 1.795,00	2,79%	
D	GRAND TOTAL			\$ 64.383,50	\$ 44.521,44	69,15%	\$ 3.577,69	5,56%	\$ 48.099,14	74,71%	

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projeitu Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor
No. kontratu :

Data Inspesaun : 26 Abril 2023

Fatin Inspesaun : Rembor, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5103S,

Latetude : 126,0157E

End Point : Long :

Latetude :


Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu Fiziku iha fulan ida
ne'e: Iha fulan ida ne'e Ba
Classroom ninian , grupu
hahu ona monta keramik ba
classroom laran no mos
varanda no kuaze atu finaliza
ona.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

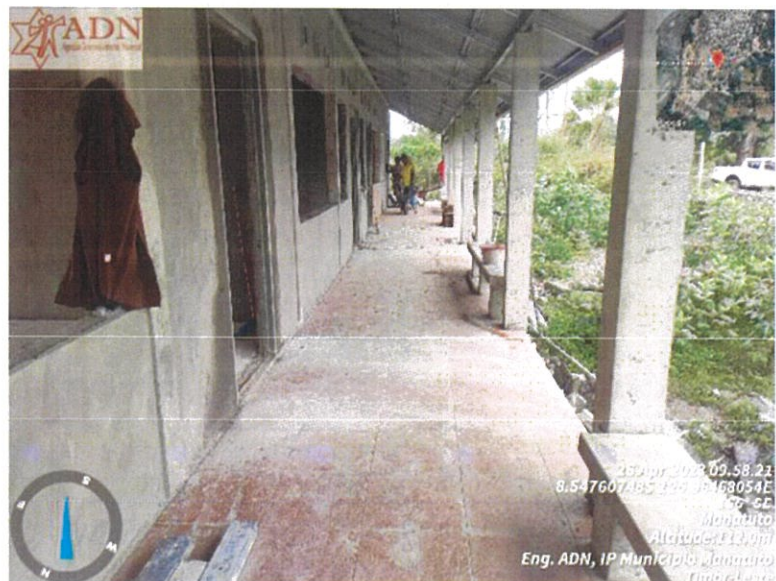



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-14)


Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor

No. kontratu :


Sketch & Foto Desenho



Sketch Item servisu.

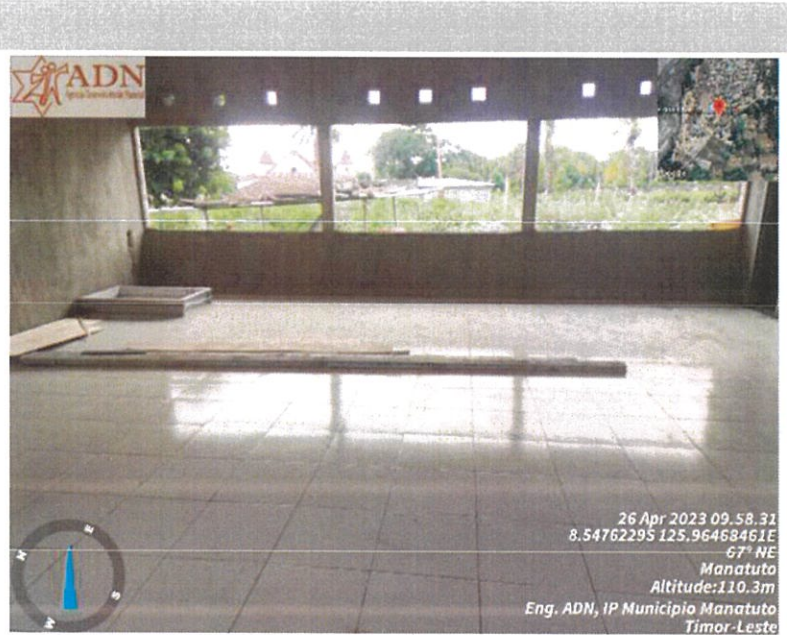

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

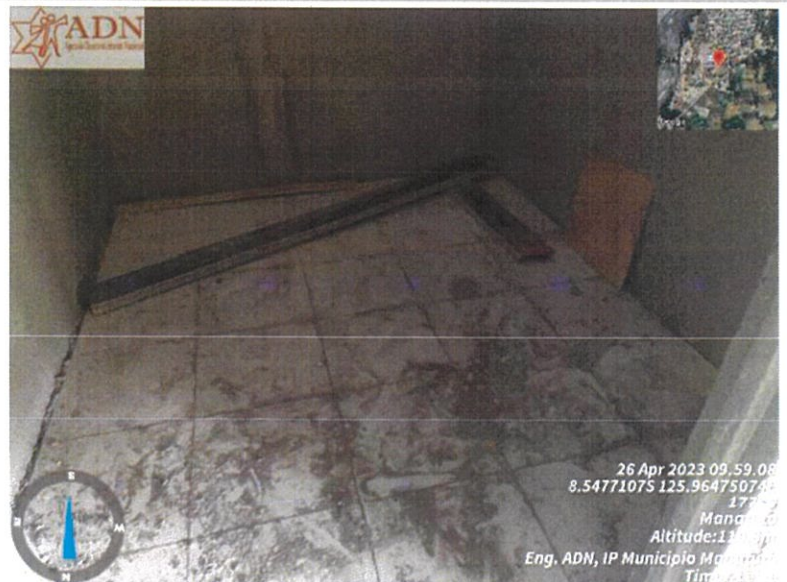

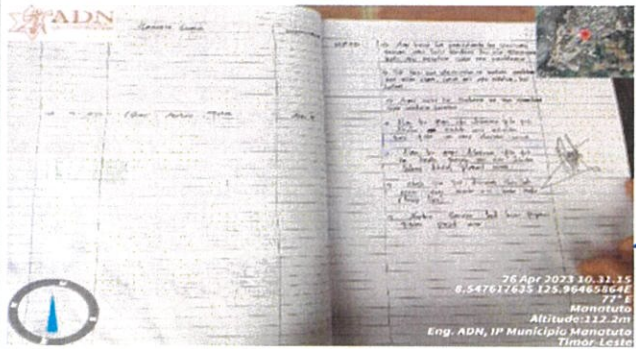 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO ADN. I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D2 (MV-14) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
					Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor			
					Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO REMBOR			
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	26/04/2023	Manatuto Vila	Quico Adelino Junior	Engenheiru ADN IP Municipiu Manatuto	1	Husu ba grupu atu komfirma fila fali konaba medida arus odamatan haris fatin no mos classroom ninian.		
					2	Husu ba grupu atu komfirma fila fali ho tekniku projetu nain nian konaba lubang kontrol plafond ninian.		
					3	Check fila fali keramik sira hotu ne'ebe mak monta ona, tenke metin (labele lian)		
					4	Aselera servisu hodi hasae progressu fiziku projetu nian.		



#ANEXU C2 (MV-14) SUMMARY BOQ

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor
Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto
Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

		ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY ADN IP					
NO	MAIN SUMMARY	Page No	AMOUNT	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS APRIL		PROGRESS TO DATE	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3 (i)	\$ 3,075.00	\$ 1,850.00	2.08%	\$ -	0.00%	\$ 1,850.00	2.08%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47 (i)	\$ 57,778.14	\$ 35,933.21	40.41%	\$ 5,172.80	5.82%	\$ 41,106.01	46.23%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/23 (i)	\$ 9,959.28	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST		\$ 70,812.42	\$ 37,783.21	42.49%	\$ 5,172.80	5.82%	\$ 42,956.01	48.31%
B	CONTIGENCIA		\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
C	OVERHEAD		\$ 6,340.00	\$ 3,310.00	3.72%	\$ -	0.00%	\$ 3,310.00	3.72%
D	GRAND TOTAL		\$ 88,918.34	\$ 41,093.21	46.21%	\$ 5,172.80	5.82%	\$ 46,266.01	52.03%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-15)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato
No. kontratu :

Data Inspesaun : 26 Abril 2023

Fatin Inspesaun : Obrato, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5072S,

Latetude : 125,9953E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu fiziku iha fulan ida ne'e :
ba classroom building nian finaliza

Servisu ba monta keramik,
odamatan no mos janela, no agora
dadaun sei hein material electrical
hodi monta.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-15)

Back-up Data

Naran Projeto


No. kontratu

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu.

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

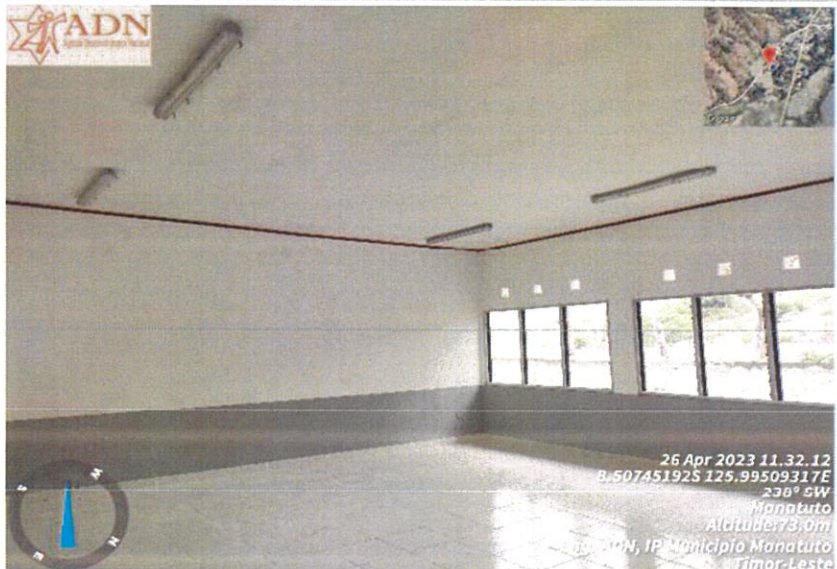

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (MV-15) SUMMARY BOQ

Naran Projektu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato
Lokalidade : Suco Sau, Posto Administrativo Manatuto
Projektu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY		ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY ADN IP					
No	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous Progress		Progress April		Total To Date	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 3.075,00	\$ 1.975,00	2,99%	\$ -	0,00%	\$ 1.975,00	2,99%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	\$ 48.332,46	\$ 37.974,45	57,41%	\$ 6.965,45	10,53%	\$ 44.939,90	67,94%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/11 (i)	\$ 5.397,19	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST		\$ 56.804,65	\$ 39.949,45	60,40%	\$ 6.965,45	10,53%	\$ 46.914,90	70,93%
B	CONTIGENCY		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD		\$ 6.340,00	\$ 1.372,50	2,07%	\$ -	0,00%	\$ 1.372,50	2,07%
D	GRAND TOTAL		\$ 66.144,65	\$ 41.321,95	62,47%	\$ 6.965,45	10,53%	\$ 48.287,40	73,00%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projeto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Supplay & Installation Main Power for Issolation & Lab Building
Ma'abat - Manatuto Municipality
No. kontratu : RDTL - MS - C19 - DNA - DC - 21 - 229

Data Inspesaun : 27 - 04 - 2023

Fatin Inspesaun : Manatuto Villa, Ma'abat

Koordinadas :

Start Point : Long : 8 8.538725S, Latetude : 126.009992E

End Point : Long : 8.5221277S, Latetude : 126.0069137E


Naran Inspector : Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Cabu Baixa Tensaun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Supplay & Installation Main Power for Issolation & Lab Building
Ma'abat - Manatuto Municipality

No. kontratu : RDTL - MS - C19 - DNA - DC - 21 - 229

Sketch Item servisu

Treckshoor mamar



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste halis / kleuk





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Supplay & Installation Main Power for Issolation & Lab Building
Ma'abat - Manatuto Municipality
No. kontratu : RDTL - MS - C19 - DNA - DC - 21 - 229



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Site Clean/tesi ai nebe besik iha linha

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (MV-16)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Supplay and installation Main Power for Isolation and Laboratorium Building
Ma'abat - Manatuto Municipality

Kompanhia : Fraternity Unip. Lda

No	Data Inspeasaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	27/04/2023	Manatuto/ Manatuto Vila	Adonis Julio Fernandes	Tekniku, ME	1	Hadia ou halos poste 12 m nebe kleuk/ halis	
					2	Istika cabu baixa tensaun nebe table	
					3	Cross Check instalasaun Grounding ho installasaun Penankal Petir	
					4	Istika treckschoor nebe mak mamar	
					5	Tesi ai nebe besik iha Linha	
					6		
					7		
					8		
					9		



#ANEXU C1 (MV-18)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0+000-3+000 KM,
Manatuto Municipality.

No. kontratu : RT/094/MOP-2021

Data Inspesaun : 26 / 04 / 2023

Fatin Inspesaun : Rembor-Manatuto Villa

Koordinadas : Start Point : Long : 125.973927°, Latetude : -8.541559°


End Point : Long : 125.963384°, Latetude : -8.549488°

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos D. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Servisu

Compania kontinua servisu item stone Masonry
no lined ditch, ho medida:

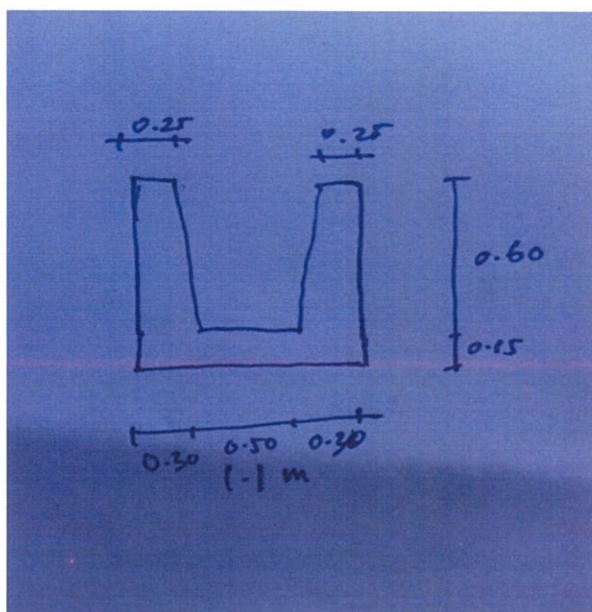

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-18) Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0+000-3+000 KM,
Manatuto Municipality.

No. kontratu : RT/094/MOP-2021

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item Servisu;

Compania hahu ona hada retaining wall, ho medida:


Aas: 1 m

Luan parte leten: 0.30 m

Luan parte okos: 0.60 m

Naruk: 20 m

Tipu: Trapezium

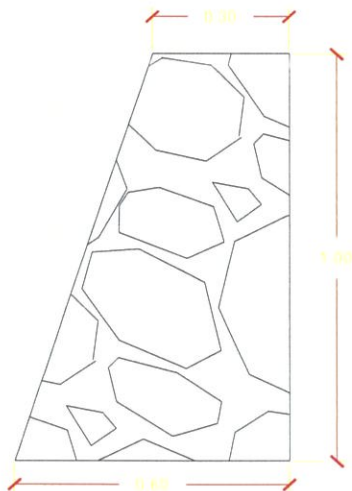



#ANEXU C2 (MV - 18)


Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0 + 000 - 3 + 000 KM, Manatuto Municipality.
No. kontratu : RT/094/MOP-2021
Postu : Manatuto Villa
Sukos : Iliheu
Naran Kompania : Kartini Unip, Lda.

SUMMARY								
SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERECENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)						
R-01	General	\$ 5,800.00	\$ 1,150.00	0.29%	\$ -	0.00%	\$ 1,150.00	0.29%
R-05	Earth work	\$ 25,228.71	\$ 1,522.80	0.39%	\$ -	0.00%	\$ 1,522.80	0.39%
R-07	Sub-base, Base and Pavement	\$ 19,677.48	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Bituminous pavement	\$ 92,905.20	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-10	Structures	\$ 179,017.78	\$ 1,073.15	0.27%	\$ 1,073.15	5.42%	\$ 2,146.30	5.69%
R-11	Dayworks	\$ 175.00	\$ 175.00	0.04%	\$ 175.00	0.00%	\$ 350.00	0.04%
R-15	Routine maintenance	\$ 6,992.32	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 329,996.49	\$ 3,920.95	0.99%	\$ 1,248.15	5.42%	\$ 5,169.10	6.41%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 32,999.65	\$ 392.10	0.10%	\$ 124.82	0.54%	\$ 516.91	0.64%
C	Generals item	\$ 23,472.23	\$ 2,517.25	0.64%	\$ 2,517.25	0.64%	\$ 5,034.50	1.28%
D	Tax 2 % x (A+B+C)	\$ 7,729.37	\$ 136.61	0.03%	\$ 77.80	0.13%	\$ 214.41	0.05%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 394,197.73	\$ 6,966.90	1.77%	\$ 3,968.02	6.73%	\$ 10,934.92	8.39%

Inspeksaun Husi:


1. Domingos da C. X. Silva
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Matatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :


Eng. Remigio da C. S. Dos Santos
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN.I.P

REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE
RDTL

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ADN, I.P.

Naran proyecto : R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0+000-3+000 Km, Manatuto municipality.

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	26/04/2022	Manatuto/ Manatuto Vila	Domingos D. X. Silva	Eng. Ba Projetu ITI Municipiu Manatuto	1
					2
					3
					4
					1
					2
					3
					4

[Signature]



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO -3)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada
Chainage 0+000-2+000

No. kontratu : MPW-W-210059

Data Inspesaun : 18/04/2023

Fatin Inspesaun : Soibada, Buah Rahun

Koordinadas :


Start Point : Long : 8,8399S Latitude: 125,9171E

End Point : Long : 8,82990S Latitude: 125,9223E

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos D. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu plum concrete ho
distansia 95 m

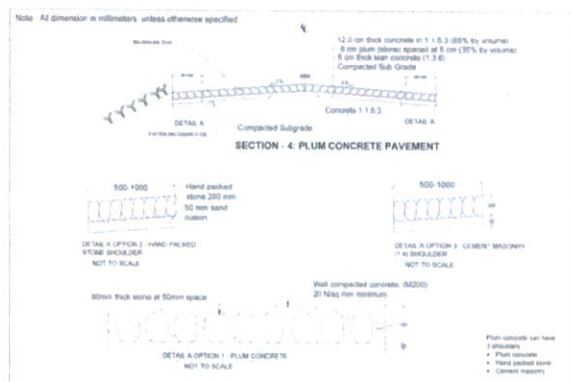

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (SO - 3)

Road Name : Manlala(Manufahi Kiik) - Soibada Chainage start 0 + 000
Municipality : Manatuto Chainage end 2+000
Postu : Soibada Length 2.0 Km
Sukos : Manufahi Kiik

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 2,990.00	\$ 2,970.00	1.46%	\$ -	0.00%	\$ 2,970.00	1.46%
R-03	Earth work	\$ 11,037.21	\$ 12,532.73	6.17%	\$ -	0.00%	\$ 12,532.73	6.17%
R-05	Sub-base, Base and Pavament	\$ 13,353.74	\$ 12,473.94	6.14%	\$ -	0.00%	\$ 12,473.94	6.14%
R-08	Structures	\$ 121,257.00	\$ 43,527.08	21.44%	\$ 7,322.28	3.61%	\$ 50,849.36	25.04%
R-10	Dayworks	\$ 1,750.00	\$ 175.00	0.09%	\$ -	0.00%	\$ 175.00	0.09%
R-11	Routine maintenance	\$ 4,205.00	\$ 4,205.00	2.07%	\$ -	0.00%	\$ 4,205.00	2.07%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ 200.00	0.10%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.10%
A	Construction Cost	\$ 154,792.95	\$ 76,083.75	37.47%	\$ 7,322.28	3.6%	\$ 83,406.03	41.1%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 15,479.29	\$ 7,608.37	3.75%	\$ 732.23	0.36%	\$ 8,340.60	4.11%
C	General Item	\$ 28,783.23	\$ 20,611.00	10.15%	\$ -	0.00%	\$ 20,611.00	10.15%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 3,981.11	\$ 2,086.06	1.03%	\$ 161.09	0.08%	\$ 2,247.15	1.11%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 203,036.57	\$ 106,389.19	52.40%	\$ 8,215.60	4.05%	\$ 114,604.78	56.45%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Domingos D.X. Silva)

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C.S. dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-4)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage
8+000-10+700
No. kontratu : MPW-W-210057

Data Inspesaun : 18 Abril 2023

Fatin Inspesaun : Soibada, Fatuk Makerek

Koordinadas :

Start Point : Long : 8,8510S Latetude : 125,8697E

End Point : Long : 8,8683S Latetude : 125,8736E


Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. C. Gusmão

2. Domingos D. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu: Compania Kontinua servisu
parte lined drain.

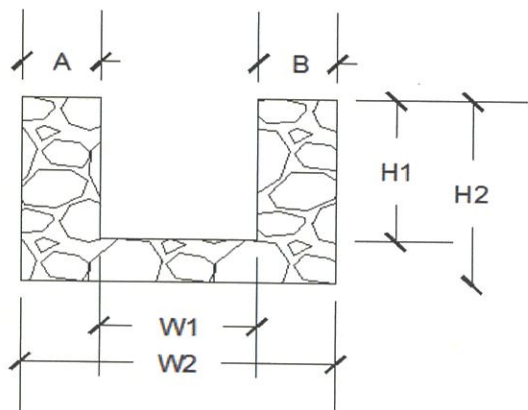

Nota:

A=0.25m, b=0.25m, h1=0.60m, h2=1m

W1=0.50m, w2=1m



18/04/2023 11:33:36
8.860308S 125.87023E ±1.70m
Manatuto, Timor-Leste
Altitude: 1189.1m
Speed: 2.7km/h
Remarks: Solbada
Município Manatuto
Duqul
Index number: 967

#ANEXU C1 (SO-4)

Back-up Data


Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage
8+000-10+700

No. kontratu : MPW-W-210057


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu iha tereinu Compania
kontinua servisu drainage ho tipe Line
drain+wall right

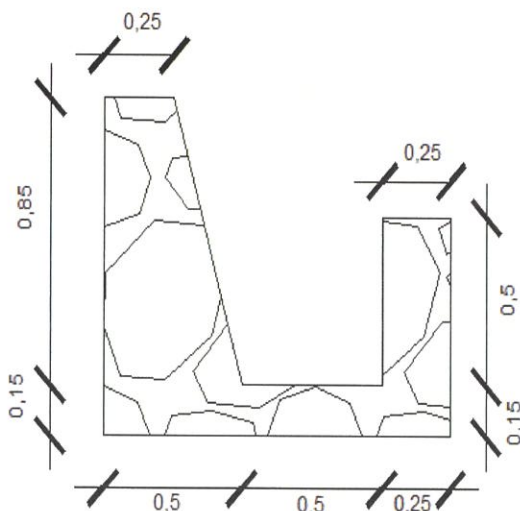

Nota; retaining wall kompania halao iha tinan
kotuk. Fulan ne'e halo kompletu drainagen

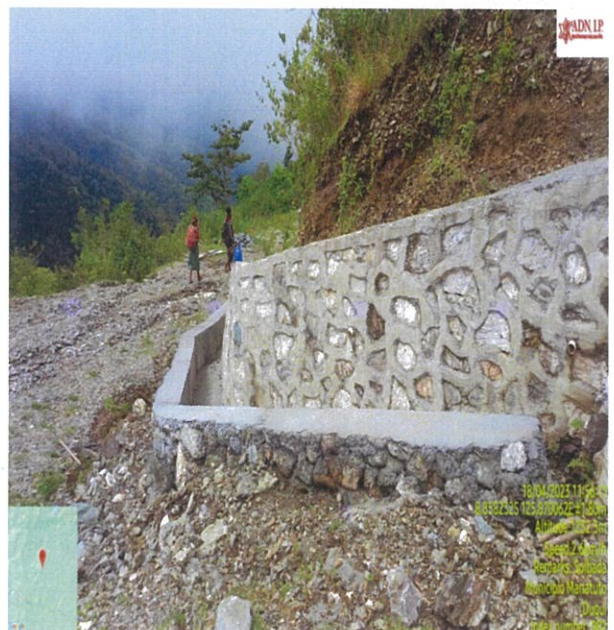



#ANEXU C2 (SO - 4)

PROJECT NAME : R4D RURAL ROAD SPOT IMROVEMET, SOIBADA - FATUMAKEREK CHAINAGE 8+000 - 10+700

CONT.NUMBER : MPW - W - 210060

SUCO SASAHI - FATUMAQUEREC

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERECENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 3,040.00	\$ 3,040.00	1.55%	\$ -	0.00%	\$ 3,040.00	1.55%
R-03	Earth Work	\$ 9,242.27	\$ 30,032.70	15.31%	\$ -	0.00%	\$ 30,032.70	15.31%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 12,677.94	\$ 5,890.59	3.00%	\$ -	0.00%	\$ 5,890.59	3.00%
R - 08	Structure	\$ 119,043.38	\$ 45,708.17	23.31%	\$ 3,073.47	1.57%	\$ 48,781.64	24.87%
R-10	Dayworks	\$ 1,750.00	\$ 595.00	0.30%	\$ -	0.00%	\$ 595.00	0.30%
R-11	Routine Maintenance	\$ 5,800.25	\$ 5,769.20	2.94%	\$ -	0.00%	\$ 5,769.20	2.94%
R-15	Provisional Sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 151,753.84	\$ 91,035.66	46.42%	\$ 3,073.47	1.57%	\$ 94,109.13	48.0%
B	Profit (10% x A)	\$ 15,175.38	\$ 9,103.57	4.64%	\$ 307.35	0.16%	\$ 9,410.91	4.80%
C	General Item	\$ 25,337.67	\$ 18,252.70	9.31%	\$ -	0.00%	\$ 18,252.70	9.31%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 3,845.34	\$ 2,002.78	1.21%	\$ 67.62	0.03%	\$ 2,435.45	1.24%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 196,112.23	\$ 120,394.71	61.58%	\$ 3,448.43	1.76%	\$ 124,208.19	63.34%

Inspeksaun Husi:

1. Eng. Domingo D.X.Silva

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

Eng. Remigio da C. S. Dos Santos
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irrigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (SO- 4)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700

Kompanha : Ryzena Unipessoal Lda

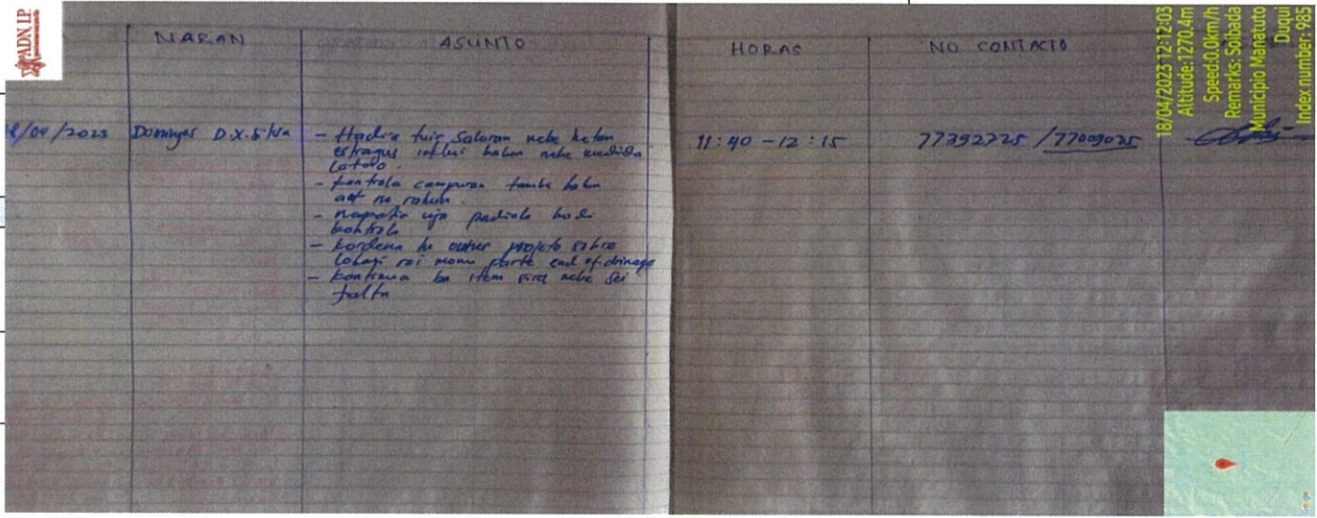No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	18/04/2022	Manatuto/ Soibada	Domingos da C. X. Silva	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada,
Manatuto

No. kontratu :

Data Inspesaun : 18 Abril 2023

Fatin Inspesaun : Manlala, Soibada

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.8602S,

Latetude : 125,9393E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Progressu iha fulan ida ne'e:
Kompanhia hahu ona monta
keramik iha parte varanda ninian.
Iha parte seluk mos kuaze finaliza
ona servisu iha parte pinta parte
laran no mos liur ninian





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-5)

Back-up Data

Naran Projeto

: Rehabilitasaun Ensину Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada,
Manatuto

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Sketch Item servisu.




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

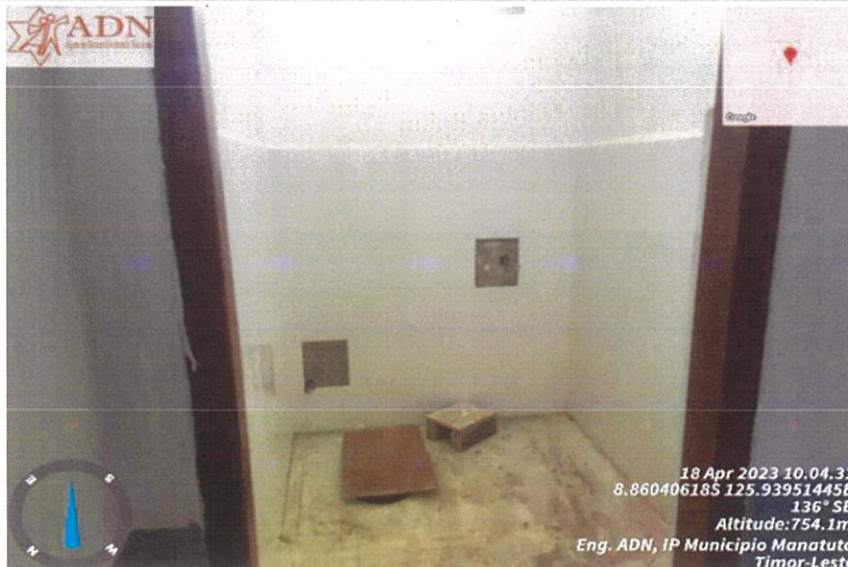

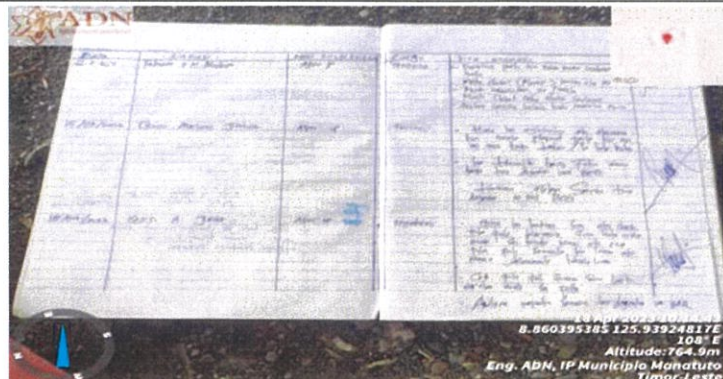 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO  ADN, LP Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D2 (SO-5) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
Naran projeto : Rehabilitasaun Ensину Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto								
Kompanha : Manufahi Kiik Unipesoal, Lda								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	18/04/2023	Soibada	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Husu ba badaen sira atu check fila fali keramik sira hotu ne'ebe mak sei tarutu , husu atu ense fila fali semente ba laran atu nune'e keramik labele lian.		
					2	Check fila fali servisu sira hotu ne'ebe mak sei falta.		
					3	Aselera nafatin servisu tuir dezenhu no mos BOQ.		
					4			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (SO-5) SUMMARY BOQ

NARAN PROJEITO : REHABILITAÇÃO ESCRITÓRIO ESCOLA SECUNDÁRIA TÉCNICA VOCACIONAL SOIBADA

FATIN PROJEITO : MANLALA, SOIBADA, MANATUTO

NO	DESCRIPTION	AMOUNTH \$	PROGRESS REPORT BY A D N					
			PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS APRIL		PROGRESS TO DATE	
			AMOUNT (US\$)	WEIGHT (%)	AMOUNT (US\$)	WEIGHT (%)	AMOUNT (US\$)	WEIGHT (%)
I	PRELIMINARIES (PEKERJAAN PERSIAPAN)	\$ 1.778,89	\$ 978,89	1,46%	\$ -	0,00%	\$ 978,89	1,46%
II	DEMOLITION, CONCRETE & FINISHES (Pek. bongkaran ,beton & Pek.finishes)	\$ 9.586,05	\$ 7.368,83	11,01%	\$ 1.942,22	2,90%	\$ 9.311,05	13,92%
III	STEEL ROOF STRUCTURE & CEILING (Structur Atap Baja dan Plafond)	\$ 18.320,41	\$ 8.686,45	12,98%	\$ 103,50	0,15%	\$ 8.789,95	13,14%
IV	ROOFING (Pek. Atap)	\$ 6.442,56	\$ 6.442,56	9,63%	\$ -	0,00%	\$ 6.442,56	9,63%
V	WINDOWS AND DOORS (Pekerjaan Jendela dan Pintu)	\$ 8.047,00	\$ 5.352,50	8,00%	\$ -	0,00%	\$ 5.352,50	8,00%
VI	PAINTING (Pek. Pengecatan)	\$ 3.144,00	\$ 2.545,09	3,80%	\$ 269,21	0,40%	\$ 2.814,30	4,21%
VII	PLUMBING AND DRAINAGE (Pek. perpipaan)	\$ 2.558,76	\$ 1.123,94	1,68%	\$ -	0,00%	\$ 1.123,94	1,68%
VIII	ELECTRICAL INSTALLATION (full installation)	\$ 2.545,75	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
IX	EXTERNAL ELECTRICAL SERVICES (full installation) (Instalasi listrik bagian luar)	\$ 1.238,64	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
X	EXTERNAL WATER SERVICE PLUMBING (Perpipaan air bersih)	\$ 249,47	\$ 249,47	0,37%	\$ -	0,00%	\$ 249,47	0,37%
XI	EXTERNAL SEWER DRAINAGE (Perpipaan air kotor bagian luar)	\$ 2.803,73	\$ 2.862,94	4,28%	\$ -	0,00%	\$ 2.862,94	4,28%
XII	OVERHEAD							
A	CONSTRUCTION COST	\$ 56.715,25	\$ 35.610,67	53,23%	\$ 2.314,93	3,46%	\$ 37.925,59	56,69%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 5.671,52	\$ 3.561,07	5,32%	\$ 231,49	0,35%	\$ 3.792,56	5,67%
C	OVERHEAD	\$ 3.200,00	\$ 2.100,00	3,14%	\$ -	0,00%	\$ 2.100,00	3,14%
D	TAX (2% x (A+B+C)	\$ 1.311,74	\$ 825,43	1,23%	\$ 50,93	0,08%	\$ 876,36	1,31%
E	CONTINGENCY (10% X A)	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
F	GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)	\$ 66.898,51	\$ 42.097,17	62,93%	\$ 2.597,35	3,88%	\$ 44.694,52	66,81%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Weaihudik
No. kontratu :

Data Inspesaun : 18 Abril 2023

Fatin Inspesaun : Weaihudik

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.8515S,

Latetude : 125,9308E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Progresso fiziku iha fulan ida
ne'e: Iha parte classroom ninian
agora dadauk finaliza ona
servisu plesteran ninian ba parte
liur no mos laran, no grupo
komesa ona ho monta rangka
plafond.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-6)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Weaihudik

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Progresso fiziku iha fulan ida
ne'e: Ba parte konstrusaun
Toilet building ninian komesa
ona monta bekesting ba parte ba
top beam ninian.





#ANEXU C2 (SO-6) SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik
Lokalidade : Manufahi Ki'ik, Posto Administrativo Soibada
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY				ORIGINAL CONTRACT	PROGRESS REPORT BY ADN IP					
No	MAIN SUMMARY	Page No		Amount	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS APRIL		TOTAL TO DATE	
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3.075,00	\$ 2.275,00	2,22%	\$ -	0,00%	\$ 2.275,00	2,22%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	\$ 51.164,59	\$ 34.312,06	33,47%	\$ 121,51	0,12%	\$ 34.433,57	33,59%
III	TOILET BULDING Tb	TB/39	(i)	\$ 25.091,96	\$ 8.984,44	8,76%	\$ 73,00	0,07%	\$ 9.057,44	8,84%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/24	(i)	\$ 13.840,76						
A	CONSTRUCTION COST			\$ 93.172,31	\$ 45.571,51	44,45%	\$ 194,51	0,19%	\$ 45.766,01	44,64%
B	CONTIGENCIA			\$ 3.000,00						
C	OVERHEAD			\$ 6.340,00	\$ 3.355,00	3,27%	\$ -	0,00%	\$ 3.355,00	3,27%
D	GRAND TOTAL			\$ 102.512,31	\$ 48.926,51	47,73%	\$ 194,51	0,19%	\$ 49.121,01	47,92%

Prepara husi :


(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :


(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :


(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO



ADN, I.P.
Agência de
Registo e
Normalização
Nacional, Instituto Público

PLANO INSPESAUN

Naran Eng.		Quico Adelino Junior						2023																																
Município		MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Abril																														OBS		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
MANATUTO VILA (MV)	3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	6	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	7	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																													On Going				
							Actual																																	
	8	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	Baboe Unip Lda	019/Janeiro/2020	LM	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	9	Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Munisipiu Manatuto	Talamori Unip,Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	Fundo Covid-19	MINISTERIO SAUDE	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	10	New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227	Fundo Covid-19	MINESTERIO SAUDE	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	11	Supplay and Installation Main Power For Isolation an Laboratorium Building Maabat Manatuto	MINISTERIO SAUDE	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-229	Fundo Covid-19	MINESTERIO SAUDE	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	12	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MEJD PKRIE EBF RENTAU	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MEJD PKRIE PE REMBOR	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MEJD PKRIE EBF OBRATO	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														On Going			
							Actual																																	

X



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.		Domingos D. X. Silva							2023																													
Município		Manatuto																																				
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Abril																														OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MANATUTO VILA (MV)	1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu refere nia fisiku atinji ona 100% iha terene, falta deit rekomendasaun ikus husi Obras Publico		
							Actual																															
	2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	SSS/061/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu refere nia fisiku atinji ona 100% iha terene, falta deit rekomendasaun ikus husi Obras Publico		
							Actual																															
	4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	ICB/023/MPW-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Observa husi engineiro Nacional parte Imprestimo Loan Project		
							Actual																															
	5	Consultant Supervision (M-L & L-N)	Sinotech Engineering Consultant		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Projetu finaliza ona	
							Actual																															
	16	Rehabilitasaun Estrada Rural Rembor, Chainage 0+000-3+000 Km	Kartini Unipessoal Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Projetu Lao hela	
							Actual																															
LALEIA (LAL)	3	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	As Jazesia Unipessoal Lda	MPW-W-210055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu nee tama ona ba Final hand over(FHO)		
							Actual																															
LACLUBAR (LAC)	2	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD	ICB/04/MPW-2014	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Observa husi engineiro Nacional parte Imprestimo Loan Project		
							Actual																															
	5	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	Hatuwari Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190035	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Projetu refere finaliza ona, hein deit pagamentu ikus husi owner			
							Actual																															
	6	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	Ryzena Unipessoal Lda	MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu refere sei prosesu hela kona ba pagamentu ikus no Compania rekere ba projektu nain sobre volume balun nebe lakon.		
							Actual																															
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	MPW-W-210057	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu paradu		
							Actual																															
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	MPW-W-210056	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Projetu refere paradu desde fulan Outubro tinan 2022 ate ohin loron.	
							Actual																															
SOIBADA (SO)	1	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	FIRDO UNIPESSOAL LDA	SSS/013/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu refere finaliza ona 100% no selu ona 50% husi retensaun, falta deit 50% retensaun nian		
							Actual																															
	4	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	Manufahi Kiik Unip. Lda	MPW-W-210059	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Projetu Lao hela			
							Actual																															
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	Ryzena Unipessoal Lda	MPW-W-210060	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu Lao hela		
							Actual																															

-A

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Domingos D. X. Silva
------------	----------------------

Municipio	Manatuto
-----------	----------

2023

[illegible]

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng. Domingos D. X. Silva)

Eng. ba Projeto Infraestructura Transporte e Irigasaun Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN.I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Mula Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo, ADN.I.P

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Adonis Julio Fernandes
------------	-------------------------------

2023

Municipio	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS
-----------	------------------------------

[illegible]

c. 

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	ABRIL																														OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
LAC	3	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	Hatuwari Unip. Lda	02/PDD- II/MNTT/VII/2015	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															
							Actual																															
SOIBADA	1	Projetu Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	RFQ-R : 21/036 - Q	LM-CD	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	2	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
BARIQUE (BA)	1	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	Tasibala II Const	RDTL/PO-2016-11272	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																															
							Actual																															
	2	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	Malack II Unip. Lda	03/PDIM- I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															
							Actual																															
	3	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	Malaca Unip Lda	No. Kontratu : MOP- W-190233	LM-BS	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	4	New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora	Senizu	-	LM-CD	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																															
							Actual																															
LACLO (LA)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	Anopa Electrical Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000421	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	2	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lacio	Ailili Const. Unip. Lda	02/PDIM- I/MNTT/IX/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																															
							Actual																															
	3	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	Esa-Un	RDTL:74/GMTAC/X //2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																															
							Actual																															
	4	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilmano	Surprise Unip. Lda	07/PDIM- II/MNTT/VIII/2016	PDIM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																															
							Actual																															
	5	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MEJD PKRIE PE REMBOR	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	6	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
TOTAL PROJETO ON-GOING																																						Lakonsege hare tamba limitasaun ba tempo

Note:



Plano Periode inspesaun iha tereinu



Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu



Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili



Inspeaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

 (Adonis Julio Fernandes)
 Eng. Electricidade, ADN, I.P

Sertifika Husi :

 (Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :

 (Eng. Januario Maia Guterres)
 Adjunto Director Executivo, ADN, I.P
