



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU AILEU


SETEMBRO 2022




SUMÁRIO
RELATÓRIO
IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO
AILEU
SETEMBRO 2022

Prepara Husi :


(Eng. Merinho Cuco Lopes de Araújo)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Aileu ADN, I.P



(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Município Aileu ADN, I.P



(Eng. Celvio J. Alves)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Aileu ADN, I.P


(Eng. Rui Lopes)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Aileu ADN, I.P

Verifica Husi :


(Eng. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transporte e Irrigação, ADN, I.P


(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN,

Sertifica Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	1
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	4
1.2 Perfil Municipio Aileu	4
1.3. Lista Projectos.....	6
II. PROGRESU FISIKU	19
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan.....	19
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	19
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	19
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	20
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	20

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.....	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Aileu.....	5
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Aileu	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Aileu Por Fundus Finansiamientos	6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Aileu Por Sectores.....	9
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Aileu Por Ministerio.....	14
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Aileu	18

I. INTRODUSAUN


1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN,I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN,I.P nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekretu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Público (IP), ADN,I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio Aileu

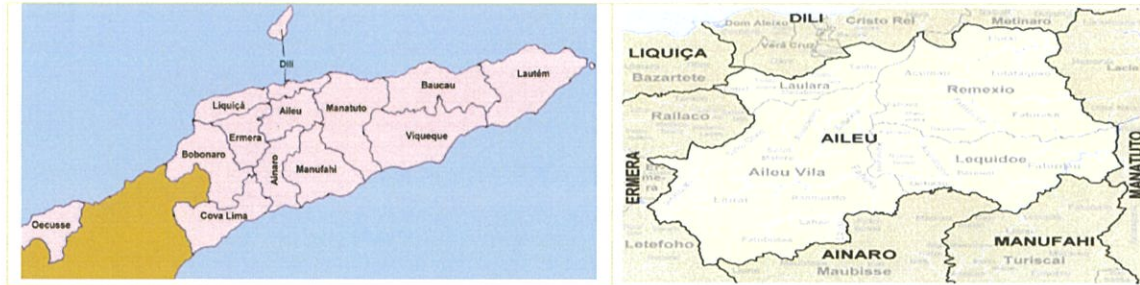

Administrasaun Munisipal Aileu lokalizadu iha parte sul Dili, kapital paiz no mapa 1 hatudu pozisaun jeografika Munisipiu Aileu ne'ebé ho luan hamutuk 729 km² ho populasaun ema na'in 44,325 no densidade demografika ema 50.6 ba km² , tuir Sensus 2015. Topografia Munisipiu Aileu ne'ebé foho dominante liu ho a'as entre 350 m to'o 1,500 m sukat husi tasi. Kapitál maka Aileu Vila iha foho Mota Mantane ho altitude 913 m. Administrasaun Munisipal Aileu iha Postos Administrativos 4, Sukus 31 no aldeias 139.

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos No Aldeias

Aileu villa		Laulara		Lequidoe		Remexio	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Aissirimou	5	Fatisi	5	Aculitoho	3	Acumau	3
Bandudato	3	Cotolau	5	Bereleu	5	Fadabloco	7
Fahiria	6	Madabeno	5	Betulau	3	Fahisoi	3
Fatubossa	7	Talitu	4	Fahisoi	3	Faturas	4
Hoholau	5	Tohumeta	3	Faturilau	2	Hautoho	3
Lahane	5	-	-	Manucasa	2	Suco Liurai	3
Lausi	4	-	-	Namolesso	4	Maumeta	3
Suco Liurai	8	-	-	-	-	Tulataqueo	7
Seloi Malere	6	-	-	-	-	-	-
Saburia	3	-	-	-	-	-	-
Seloi Craik	10	-	-	-	-	-	-
Total	62	-	22	-	22		33

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 17

Tabela 1.1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Aileu

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Aileu								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		3				3	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
Total			4				4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Aileu

ASET ADN, I.P MUNICIPIO AILEU								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1				1	
2	Kareta		1				1	
3	Desktop HP / Monitor		1				1	
4	Laptop HP		1				1	Port ba USB fatin la diak , operasaun labtop Todan
5	Printer Cannon		1				1	
6	UPS		1				1	
7	Armario File		2				1	
8	Armario Tau hena		3				3	
9	Meja escritorio		1				1	
10	Meja han		1				1	
11	Meja TV (kiik)		1				1	
12	Kadeira escritorio		4				4	
13	Kadeira han		4				4	
14	Sofa		1 Set				1	
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3		3 Set				1	Springbed ida Nakles, Sumaso la Iha ba Kuarto Tolu
16	Jeleira		1				1	

17	TV + Parabola		1 Set				1	Reciver hosi Parabola la Utilija
18	Kipas Angin		5				5	Ida Kondisaun att
19	Kompor		1				1	
20	Kompor Gas		1				1	Kondisaun Att no labele uja
21	Rack sepatu		3				3	
22	Rack Piring		1				1	
23	Lampu		11				11	Rua mak att, nebe monta iha Veranda Uma oin no Veranda Kotuk ho Marka Philip
24	Water Pump Sanyo		1				1	

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dados projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamiento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Aileu Por Fundus Finansiamiento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + LM - BS + LM - TP + Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	39	\$ 20,535,155.45	60.18%
2	Laulara	10	\$ 33,293,260.73	64.30%
3	Lequidoe	13	\$ 2,717,699.94	50.84%
4	Remexio	5	\$ 3,471,704.86	35.93%
Grand Total		67	\$ 60,017,820.98	60.64%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	12	\$ 15,626,577.13	68.74%
2	Laulara	7	\$ 32,987,141.18	64.29%
3	Lequidoe	1	\$ 240,048.46	84.76%
4	Remexio	1	\$ 2,567,345.51	34.72%
Grand Total		21	\$ 51,421,112.28	64.26%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	8	\$ 2,425,653.48	27.24%
2	Laulara	3	\$ 306,119.55	65.57%
3	Lequidoe	7	\$ 1,533,192.16	49.50%
4	Remexio	1	\$ 225,714.76	0.00%
Grand Total		19	\$ 4,490,679.95	36.08%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	5	\$ 316,902.42	0.00%
2	Laulara			
3	Lequidoe	1	\$ 128,221.80	0.00%
4	Remexio			
Grand Total		6	\$ 445,124.22	0.00%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	2	\$ 522,720.63	55.50%
2	Laulara			
3	Lequidoe	1	\$ 550,800.00	70.00%
4	Remexio	1	\$ 494,544.48	62.04%
Grand Total		4	\$ 1,568,065.11	62.66%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	9	\$ 1,167,916.80	30.77%
2	Laulara			
3	Lequidoe	3	\$ 265,437.52	12.76%
4	Remexio	2	\$ 184,100.11	26.75%
	Grand Total	14	\$ 1,617,454.43	27.36%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundu-Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	3	\$ 475,384.99	64.46%
2	Laulara			
3	Lequidoe			
4	Remexio			
	Grand Total	3	\$ 475,384.99	64.46%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Aileu Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO AILEU		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO	2	\$ 862,274.82	8.64%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	6	\$ 1,352,303.90	31.90%
3	EDUKASAUN	13	\$ 1,313,542.97	17.17%
4	ELÉCTRICIDADE	3	\$ 1,001,069.36	75.97%
5	ESTRADAS E PONTES	22	\$ 20,163,896.81	73.15%
6	FLOOD CONTROL	3	\$ 137,301.98	0.00%
7	IMPRESTIMO	4	\$ 31,371,351.03	57.94%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	\$ 1,320,533.03	64.79%
9	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS	2	\$ 1,025,800.00	62.61%
10	SAUDE	3	\$ 494,193.39	33.86%
11	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 505,151.90	0.00%
12	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	57.18%
13	TURISMO	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		67	\$ 60,017,820.98	60.64%

NO	SECTOR PROYECTO	Aileu-Vila		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO	2	\$ 862,274.82	8.64%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	5	\$ 1,224,082.10	35.24%
3	EDUKASAUN	8	\$ 864,005.34	16.48%
4	ELÉCTRICIDADE			
5	ESTRADAS E PONTES	10	\$ 2,553,763.66	21.07%
6	FLOOD CONTROL	3	\$ 137,301.98	0.00%
7	IMPRESTIMO	3	\$ 12,531,861.82	81.10%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	1	\$ 717,064.23	53.83%
9	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROYECTOS	1	\$ 475,000.00	54.05%
10	SAUDE	2	\$ 194,247.81	27.49%
11	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 505,151.90	0.00%
12	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	57.18%
13	TURISMO	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		39	\$ 20,535,155.45	60.18%

NO	SECTOR PROJECTO	Laulara		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO			
2	EDIFICIOS PUBLICOS			
3	EDUKASAUN			
4	ELÉCTRICIDADE	2	\$ 761,020.90	73.19%
5	ESTRADAS E PONTES	6	\$ 13,652,436.58	93.89%
6	FLOOD CONTROL			
7	IMPRESTIMO	1	\$ 18,839,489.21	42.53%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	1	\$ 40,314.04	49.04%
9	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS			
10	SAUDE			
11	SEGURANCA NO DEFESA			
12	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
13	TURISMO			
Grand Total		10	\$ 33,293,260.73	64.30%

NO	SECTOR PROJECTO	Lequidoe		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO			
2	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 128,221.80	0.00%
3	EDUKASAUN	3	\$ 265,437.52	12.76%
4	ELÉCTRICIDADE	1	\$ 240,048.46	84.76%
5	ESTRADAS E PONTES	3	\$ 670,091.82	29.12%
6	FLOOD CONTROL			
7	IMPRESTIMO			
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	3	\$ 563,154.76	79.87%
9	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS	1	\$ 550,800.00	70.00%
10	SAUDE	1	\$ 299,945.58	37.98%
11	SEGURANCA NO DEFESA			
12	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
13	TURISMO			
Grand Total		13	\$ 2,717,699.94	50.84%

NO	SECTOR PROJECTO	Remexio		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO			
2	EDIFICIOS PUBLICOS			
3	EDUKASAUN	2	\$ 184,100.11	26.75%
4	ELÉCTRICIDADE			
5	ESTRADAS E PONTES	3	\$ 3,287,604.75	36.45%
6	FLOOD CONTROL			
7	IMPRESTIMO			
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
9	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS			
10	SAUDE			
11	SEGURANCA NO DEFESA			
12	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
13	TURISMO			
Grand Total		5	\$ 3,471,704.86	35.93%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Aileu Por Ministerios

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	6	\$ 445,124.22	0.00%
2	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 505,151.90	0.00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	89.19%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	36	\$ 55,235,060.23	63.37%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	14	\$ 1,484,622.27	15.19%
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	54.05%
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	52.04%
8	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 775,330.57	54.21%
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	7.03%
10	SEFOPE	1	\$ 303,911.46	
Grand Total		67	\$ 60,017,820.98	60.64%

NO	DONO DO PROJECTO	Aileu-Vila		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	5	\$ 316,902.42	0.00%
2	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 505,151.90	0.00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	89.19%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	15	\$ 16,630,099.71	67.12%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	9	\$ 1,035,084.64	13.75%
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	54.05%
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	52.04%
8	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 475,384.99	64.46%
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	7.03%
10	SEFOPE	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		39	\$ 20,535,155.45	60.18%

NO	DONO DO PROJECTO	Laulara		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL			
2	MINISTERIO DA DEFESA			
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	10	\$ 33,293,260.73	64.30%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL			
8	MINISTERIO SAUDE			
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN			
10	SEFOPE			
Grand Total		10	\$ 33,293,260.73	64.30%

NO	DONO DO PROJECTO	Lequidoe		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	1	\$ 128,221.80	0.00%
2	MINISTERIO DA DEFESA			
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	8	\$ 2,024,095.04	60.96%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	3	\$ 265,437.52	12.76%
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL			
8	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 299,945.58	37.98%
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN			
10	SEFOPE			
Grand Total		13	\$ 2,717,699.94	50.84%

NO	DONO DO PROJECTO	Remexio		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL			
2	MINISTERIO DA DEFESA			
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 3,287,604.75	36.45%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 184,100.11	26.75%
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL			
8	MINISTERIO SAUDE			
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN			
10	SEFOPE			
Grand Total		5	\$ 3,471,704.86	35.93%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus populasaun Munisipiu Aileu

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Poduktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Aileu Vila	28,185	8546	7976	6113	5550
Laulara	8,342	2420	2344	1837	1742
Lequidoe	7,913	2407	2192	1698	1616
Remexio	12,868	3389	3448	3035	2996

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompania sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu porsentagen actual fulan ida ne'e hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare'e iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hare'e #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

1. Iha Municipio Aileu Kompania balun sira nia Enjineiru laiha Terenu, no Enjineiru husi Dono do Projeto mos la activu iha terenu.
2. Komposisi betaun ne'ebe fo husi Laboratorio Nacional maibe bainhira halo trail iha terenu husi kompanha kontaktu sira parte Laboratorio Nacional maibe laiha resposta ne'ebe fixu ba iha kompania sira. Maibe liu tiha loron balun husi parte Laboratorio Nacional kontaktu fali sira hodi foti rasik sample.
3. Iha Municipiu Aileu kompania/empreza sira infrenta problema ba rekursu finanseiru nune'e fo inpaktu ba serbisu konstrusaun nian hodi difikulta progress serbisu iha terenu.
4. Tekniku AND, I.P halo observasaun/monitorizasaun direktamente iha terenu hodi hare'e serbisu kompania/empreza sira, maibe sira laiha Site Engineering.
5. Iha projectu balun ne'ebe maka kompania/empreza ladun koopera di'ak ho tekniku AND.IP no teknikus husi Dono projectu, tamba instrusaun nebe'e mak ita fo hanesan prepara *time schedule* hadia *direksi keet* maibe kompania/empreza la halo tuir orientasaun.
6. Bazeia ba planu inspesaun ne'ebe ami halo balun nia implementasaun la tuir planu nebe'e mak aprova husi DE. ADN.IP, tamba iha difikuldade transporte, maibe ami

nafatin tenta ka fahe tempo hodi halo monitorizasaun ba projetu hotu neébe iha Municpiu Aileu.

7. Ba projectu neébe mak abandona no parado ami halo monitorizasaun dala 2 tamba laiha progresu fiziku neébe mak halo iha terenu tuir planu ne'ebe tekniku ADN.IP halo Monitorizasaun.

➤ Obstacle parte Eletricidade

1. Durante halo monitorizasaun ba projeto neébe mak mensiona iha lista projetu Eng. M & E, ADN – I.P, la hasoru kontraktor sira tamba televomel fora da area hotu.
2. Eng. M & E, ADN – I.P, nunka hasoru tekniku husi kompania no parte kompania sempre delega tekniku neébe ba hein iha terenu, maibe tekniku neé rasik laiha konesimentu klean ho orbra refere.
3. Seksaun M & E, AND – I.P, labele kontrola projeto ho maximu tamba Eng. M & E ida hodi kontrola Projeito Linha Electricidade ho Edifisio Publik Iha Municipio Ha'at (4).
4. Projeto eletricidade barak maka espasu ba lina laiha ona, hodi kompanha sira mos la halo servisu kontinuasaun.
5. Motorista menus difikulta ami nia servisu.

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu


1. Husu Superior ADN.IP atu bele hatu'o ba projectu nain konaba projetu hirak ne'ebe maka abandona no parado husi kompania/empreza ne'ebe iha responsabilidade ba projectu ne'e rasik atu bele foti medidas ruma hanesan *Black list* ou Penalidade ba kompania.
2. Ami husi tekniku/engineiru Municpiu ADN.IP husu ba Dono Projectu refere, ba oin kompania/empreza ne'ebe maka laiha responsabilidade no abandona projetu/obra ne'ebe sira halo, husu Governo labele fo tan oportunidade ba kompana hirak ne'e hodi kaer fali obra seluk.

3. Ami husi Engineiru Municipiu ADN.IP sujere ba superior ADN.IP atu bele prepara transporte hanesan motorizada hodi nune'e bele fasilita ami halo monitorizasaun ba projectu neébe ho nia lokalizasaun besik.

➤ Recomendação parte Eletricidade

1. Husu ba parte ITC, ADN – I.P bele kria Folder Sistem ba Seksaun M & E, ADN – I.P.
2. Husu atu aumenta tan rekursu iha Seksaun M & E, ADN – I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Aileu

Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Aileu						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engineiro	Celvio J. Alves	108	Enjineiru ITI		
		Merinho Cuco L. de Araujo	189	Enjineiru EPAS		
		Rui Lopes	077	Enjineiru ITI		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		

2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	João Pedro Cortereal		Motorista		



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											SETEMBRO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
1	Rehabilitation of Sloi Tocoluli roads Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Mendith Uniplda	SSS/061/MOPTK-2015	\$ 218,231.77	Nov. 14, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000 - 8+000 Munisipiu Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Aileu-Vila	Aileu	Caviq Unipessoal Lda in joint venture with Sunnines Unip. Lda	NCB/020/MOP-2019	\$ 717,064.23	Dec. 20, 2019	47.95%	12.41%	60.35%
3	Consultant Design & Supervision Lot 3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Katahira and Engineers International	SSS/043/MPW-2014	\$ 4,069,793.04	Sept. 15, 2014	80.11%	0.00%	80.11%
4	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Laulara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili - Ainaro Road (Lots 1 - 5)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Kunhwa Engineering & Consulting Co., Ltd JV with Dongsung Engineering Co.,Ltd	RFP/020/MOPTC/2017	\$ 2,626,077.78	April 27, 2018	62.57%	3.01%	65.58%
5	Emergency Drainage and Slope Protection Along Aileu to Maubisse Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	My Friend Unip. Lda	MPW-W-014054	\$ 251,677.07	Oct. 5, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
6	Rehabilitation of MSS Office in Aileu	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-BS	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Borudo Matak	RDTL:47/MSS/DNPFAL-DAD/X/2016	\$ 47,720.63	Oct. 24, 2016	77.74%	0.00%	77.74%
7	Programma Turismo Komunitario 2014 Selo / Malere	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Aileu-Vila	Aileu	Miror Raefusa	RDTL/SEFOPE/DNA/DNE/2013-0003	\$ 227,981.87	May 5, 2014	91.20%	0.00%	91.20%
8	Preparation of Master Plan For Municipal Capitals Water Supply and Sanitation (Aileu-Gleno-Liquica) /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	MPW-CS-200028	\$ 827,410.00	May 1, 2020	10.00%	0.00%	10.00%
9	Realization of the Detailed Engineeering Design (DED) includes Reparation of Feasibility Study of the University of Aileu (Bem Serviso)	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Aileu-Vila	Aileu	Bernabad Arquitectura SLP	MPW-S-200024	\$ 475,000.00	March 31, 2020	35.21%	18.84%	54.05%
10	New Construction of laboratory for covid 19 at CHC Aileu Vila	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	Jomy Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-257	\$ 62,128.32	Nov. 4, 2020	95.51%	0.00%	95.51%
11	Konstrusaun, Vedasaun no Jardim ba Edificio DTPSC	Ministerio da Justica	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kablaki Engineering Unip. Lda	004/PDD/DST-AIL/2012	\$ 200,000.00	01-Jul-12	89.19%	0.00%	89.19%
12	Consultancy services for National Road No. 1 - Upgrading Project	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Philcoei International, Inc. In JV with Luis and Associates, Co		\$ 5,835,991.00	Jan. 18, 2013	83.00%	0.00%	83.00%
13	Konstrusaun Fatin isolamentu iha Municipio Aileu, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-255	\$ 281,137.18	Nov. 04, 2020	100.00%	0.00%	100.00%
14	Para a Construsaun de Jardim de Herois de Aileu (New construction of Campas, Gate and Leveling)	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Caramé Unip, Lda	No.: 37/MACLN/IX/2021	\$ 118,769.70	01/09/2021	65.92%	0.00%	65.92%
15	Konstrusaun salas de aulas 3 + Eskritorio + Laboratorio ESTV Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	NCB:01MEJD/DNA/2021	\$ 171,079.30	Dec 3.2021	54.91%	9.92%	64.83%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											SETEMBRO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
16	New Cosntruction Office CSS Aileu District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kevina Unip.Lda	33/MSSI/DGAF/DNA/X I/2021	\$ 427,130.00	Nov. 22, 2021	16.40%	2.02%	18.42%
17	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBC 3 Ciclo Selo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBC 3 CICLO SELOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 152,044.11	Oct. 15, 2021	26.60%	0.31%	26.92%
18	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EPE Mantane	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EPE MANTANE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 84,628.13	Oct. 15, 2021	25.12%	3.37%	28.50%
19	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBF Lacio	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF LACLO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,597.13	Oct. 15, 2021	24.10%	1.31%	25.41%
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Pre-Escolar Cotobauro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE PRE-ESCOLAR COTBAURO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 83,516.10	Oct. 15, 2021	36.09%	2.76%	38.85%
21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Teblor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF TEBLOR	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 102,494.43	Oct. 15, 2021	40.29%	5.75%	46.03%
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Darahe	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF DARAHE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,770.22	Oct. 15, 2021	28.58%	0.58%	29.16%
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESGAM Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE ESGAM AILEU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 140,545.78	Oct. 15, 2021	26.82%	0.00%	26.82%
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 101,409.44	Oct. 15, 2021	28.60%	0.00%	28.60%
25	R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli-Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Oin Unip. Lda	MOP-CD-RFQ-21011	\$ 89,757.77		45.21%	0.00%	45.21%
26	R4D Rural Road Spot Improvement Kirlalo - Lacio Chainage 0+000 - 11+300, Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Fikikay Unipessoal, Lda	MOP-W-NCB-21025	\$ 339,829.64	Oct. 1, 2021	63.98%	0.68%	64.66%
27	New Construction of Fence at CSI Aileu-Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230	BEHALE ENTERPRICE UNIPESSOAL,LDA	\$ 132,119.49	Jan. 14, 2022	77.16%	3.90%	81.07%
28	Consulting services for detailed architecture & engineering design of master plan and new campos the national defence institute	MINISTERIO DA DEFESA	FI	SEGURANCA NO DEFESA	Aileu-Vila	Aileu	PT. Perentjana Djaja	SSS/0111/IDN-2014	\$ 505,151.90	Aug. 18, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
29	Rehabilitasaun Estrada Rural,Aituhularan - Manufoni,Aileu 0+000-1+000 (1.0Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Hatutan Moris Unipessoal Lda	RT/088/MOP-2021	\$ 98,575.19	09-May-22	0.00%	0.00%	0.00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											SETEMBRO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
30	Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	LNG Unipessoal, Lda Jv Star King Construction Unipessoal, Lda	RT/139/MOP-2021	\$ 252,415.36	27-Apr-22	0.00%	0.00%	0.00%
31	Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 2+000-5+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/090/MOP-2021	\$ 353,952.41	28-Apr-22	0.00%	0.00%	0.00%
32	Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu-kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 5+000-8+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/091/MOP-2021	\$ 376,198.79	28-Apr-22	0.00%	0.00%	0.00%
33	Rehabilitasaun Estrada Rural, seloi Kraik- Halmate, Aileu (3.5Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Oin Unip. Lda	RT/092/MOP-2021	\$ 304,850.97	01-May-22	0.00%	0.00%	0.00%
34	Rehabilitasaun Estrada Rural, Raimansu - Fatubesi, Aileu (5.20Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	RACO LDA.	RT/093/MOP-2021	\$ 268,274.69	01-May-22	0.00%	0.00%	0.00%
35	Perfurasau Bee Mos Iha Seloi Ba Fatin Turismo Komunitariu	Ministério da Administração Estatal	PDIM	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Alenta Unip. Lda	48/SMA/AM-AIL/VIII/2021	\$ 34,864.82	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
36	Rehabilitasaun irigasaun Lagoa Seloi kraik incluindo Konstrusaun bareira de proteasun in gabion	Ministério da Administração Estatal	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	Alenta Unip. Lda	004/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 26,311.39	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
37	Konstrusaun Edifisiu Posto Administrativu Aileu Vila	Ministério da Administração Estatal	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Diborna Unip. Lda	001/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 144,735.62	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
38	Konstrusaun Bronjong Proteje Uma Comunidade no Uma Madres Caridade Inklui Toós Comunidade	Ministério da Administração Estatal	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	JOHIJEMAR Unip, Lda	005/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 61,880.06	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
39	Konstrusaun Bronjong Protege Igreja Assembleia de Deus no Uma Comunidade	Ministério da Administração Estatal	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	Padua Unip. Lda	006/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 49,110.53	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
40	New Install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Madabeno to Sarlala Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laulara	Aileu	Aldepo Murak Unip, Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000162	\$ 462,154.02	Aug. 22, 2013	81.19%	0.00%	81.19%
41	Installation New MV Line, transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku to Besilau and Fatuk Hun - Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laulara	Aileu	Oxavijoneli unip, Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000179	\$ 298,866.88	Aug. 22, 2013	81.53%	0.00%	81.53%
42	Rehabilitation of Beducu Sarlala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Mejori, Lda	SSS/0103/MOPTC-2016	\$ 4,451,281.98	Sept. 5, 2016	98.97%	0.00%	98.97%
43	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemos - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 0+000 - Sta. 2+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Aspalink Unip Lda	SSS/120/MOPTC-2015	\$ 4,128,651.62	Dec. 11, 2015	100.00%	0.00%	100.00%
44	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemos - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 2+800 - Sta. 6+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/121/MOPTC-2015	\$ 4,645,457.43	Dec. 11, 2015	100.00%	0.00%	100.00%
45	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laulara	Aileu	CINA WU YI CO.LTD	ICB/018/MOPTC-2017	\$ 17,855,301.27	May 31, 2019	79.61%	0.00%	79.61%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											SETEMBRO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
46	Rural Roads Maintenance Fahisohi - Fadabloco Sta 0+000-8+200, Hotoho - Liquica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Ornai Sta 0+000 - 7+500 in Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laulara	Aileu	Remexio Furak Unip Lda	MPWTC-CD-170004	\$ 40,314.04	July 20, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
47	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Lisimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Fin Los unip.lida	MPW-W190086	\$ 225,977.27	Aug. 16, 2019	88.97%	0.00%	88.97%
48	Laulara Solerema Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Marino Enterprises, Lda	SSS/115/MOPTC-2017	\$ 161,240.04	Sept. 7, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
49	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Emmanuel Milenial	MOP-CD-RFQ-21013	\$ 39,828.24	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
50	Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 -10+400 Dili & Aileu Municipality / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Nautetu I, II Unipessoal Lda	MPW.W-1900081	\$ 494,544.48	Aug. 16, 2019	72.09%	0.00%	72.09%
51	Road Rehabilitation of Remexio to Lacro Sta 0+000-20+000 Package I Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Mendiith UnipLda	SSS/139/MOPTC-2017	\$ 2,567,345.51	Sept. 12, 2017	43.26%	0.00%	43.26%
52	Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Lonacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	\$ 225,714.76	18-Jun-21	22.23%	10.93%	33.16%
53	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 77,252.65	Oct. 15, 2021	18.95%	12.36%	31.31%
54	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 106,847.46	Oct. 15, 2021	22.22%	6.21%	28.43%
55	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lequidoe	Aileu	Cadila Supplie Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000163	\$ 240,048.46	Aug. 22, 2013	94.17%	0.00%	94.17%
56	R4D MPW Rural Roads rehabilitation Project in Aileu Bereleu manucasa Package 2 Sta. 3+500-13+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Seiara Irapiti Unip. Lda	MPWTC-W-015016	\$ 248,750.72	Sept. 7, 2015	97.45%	0.00%	97.45%
57	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadabloco Chainage 0+000 - 8+200, Namalesu - Faturilau Chainage 0+000 - 12+500, Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hautoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+500 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Emmanuel Milenial	MPW-W-190103	\$ 171,685.42	Aug. 21, 2019	76.31%	0.00%	76.31%
58	Rural Roads Periodic Maintenance Aituhaularan - Manufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300, Routine Maintenance Coula Udo Kirlelo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-190174	\$ 142,718.62	Nov. 25, 2019	98.30%	0.00%	98.30%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											SETEMBRO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
59	For Preparation of Detailed Engineering Design For Rehabilitation of "municipio Roads" Package 8 : (Be' Cluru) to Lequidoe Town (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Lequidoe	Aileu	Team Consulting Engineering & Management Co., Ltd JV ATT Consultants Co., Ltd & Triangle Architech Consultant., Lda	MPW-CS-2000021	\$ 550,800.00	March 26, 2020	70.00%	0.00%	70.00%
60	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Faturilau, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	SAUDE	Lequidoe	Aileu	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	\$ 299,945.58	Sept. 6, 2021	72.80%	5.04%	77.83%
61	R4D Rural Road Spot Improvement Nmalesu-Faturilau Chainage 0+000-14+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-210149	\$ 411,620.44	Sept. 21, 2021	45.98%	13.08%	59.06%
62	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 117,171.14	Oct. 15, 2021	33.43%	0.00%	33.43%
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Urdadan	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 73,988.60	Oct. 15, 2021	45.31%	10.05%	55.35%
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 74,277.78	Oct. 15, 2021	43.43%	11.24%	54.67%
65	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	Blackbird Unip. Lda JV Chaicallala Unip. Lda	MOP-CD-NCB-21026	\$ 186,084.05	Oct. 1, 2021	11.24%	0.00%	11.24%
66	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi-Dairlouta Chainage 0+000 - 5+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	Raco Lda.	MOP-CD-RFQ-21012	\$ 72,387.33	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	0.00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											SETEMBRO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
67	Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Lequidoe	Ministério da Administração Estatal	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lequidoe	Aileu	Fitun Foun, Unip Lda	002/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 128,221.80	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%

Prepara Husi :

Verifika Husi :

(Eng. Celso J. Alves)
Engenheiro ba Projektu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun
Município Aileu, ADN, I. P.

(Eng. Rui Lopes)
Engenheiro ba Projektu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun
Município Aileu, ADN, I. P.

(Silvino D. R. R. Soares)
Eng. M & E, Município Aileu, ADN, I. P.

(Eng. Mermhoco L. de Araujo)
Eng. ba Edifício Público no Be'e Saneamento
Município Aileu, ADN, I. P.

(Eng. Remigio Dos Santos)
Engenheiro Senior ba Projektu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, ADN, I. P.

(Deolindo de F. Marques)
Chefe Sec. Projeto M.E & ITC, ADN, I. P.

(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Engenheiro Senior ba Edifício Público no Be'e Saneamento,
ADN, I. P.

Sertifika Husi :
(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I. P.



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL SETEMBRO)

LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	Rehabilitation of Sioi Tocoluli roads Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Mendith UnipLda	SSS/061/MOPTK-2015	\$ 218,231.77	Nov. 14, 2014	100.00%	88.00%	\$ 192,043.96	\$ 26,187.81	PENDENTE	Projeito refere falta 10% rekomendasun ikus iha tinan 2019
2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000 - 8+000 Munisipiu Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Aileu-Vila	Aileu	Caviq Unipessoal Lda in joint venture with Sunnines Unip. Lda	NCB/020/MOP-2019	\$ 717,064.23	Dec. 20, 2019	60.35%	53.83%	\$ 385,974.11	\$ 331,090.12	ON-GOING	
3	Consultant Design & Supervision Lot 3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Katahira and Engineers International	SSS/043/MPW-2014	\$ 4,069,793.04	Sept. 15, 2014	80.11%	80.11%	\$ 3,260,234.80	\$ 809,558.24	ON-GOING	
4	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Laulara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili - Ainaro Road (Lots 1 - 5)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Kunhwa Engineering & Consulting Co., Ltd JV with Dongsung Engineering Co.,Ltd	RFP/020/MOPTC/2017	\$ 3,318,006.82	April 27, 2018	65.58%	65.58%	\$ 2,175,851.72	\$ 1,142,155.10	ON-GOING	
5	Emergency Drainage and Slope Protection Along Aileu to Maubisse Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	My Friend Unip. Lda	MPW-W-014054	\$ 251,677.07	Oct. 5, 2014	100.00%	90.49%	\$ 227,750.76	\$ 23,926.31	ON-GOING	
6	Rehabilitation of MSS Office in Aileu	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-BS	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Borudo Matak	RDTL:47/MSS/DNPFAL-DAD/X/2016	\$ 47,720.63	Oct. 24, 2016	77.74%	69.97%	\$ 33,389.23	\$ 14,331.40	PENDENTE	
7	Programma Turismo Komunitario 2014 Selo / Malere	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Aileu-Vila	Aileu	Miror Raefusa	RDTL/SEFOPE/DNA/DNE/2013-0003	\$ 303,911.46	May 5, 2014	91.20%	71.40%	\$ 217,004.28	\$ 86,907.18	PENDENTE	
8	Preparation of Master Plan For Municipal Capitals Water Supply and Sanitation (Aileu-Gleno-Liquica) /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	MPW-CS-200028	\$ 827,410.00	May 1, 2020	10.00%	9.00%	\$ 74,466.90	\$ 752,943.10	ON-GOING	
9	Realization of the Detailed Engineering Design (DED) includes Reparation of Feasibility Study of the University of Aileu (Bem Serviso)	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Aileu-Vila	Aileu	Bernabad Arquitectura SLP	MPW-S-200024	\$ 475,000.00	March 31, 2020	54.05%	54.05%	\$ 256,732.50	\$ 218,267.50	ON-GOING	Consultant ida ne'e halo pagamento dala 2 iha Fulan Maio nia laran ho total progress 14.64% (8.36% + 6.28%)
10	New Construction of laboratory for covid 19 at CHC Aileu Vila	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	Jomy Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-257	\$ 62,128.32	Nov. 4, 2020	95.51%	85.95%	\$ 53,402.35	\$ 8,725.97	FHO	
11	Konstrusaun, Vedasaun no Jardim ba Edificio DTPSC	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kablaki Engineering Unip. Lda		\$ 200,000.00	01-Jul-12	89.19%	89.19%	\$ 178,371.29	\$ 21,628.71	PENDENTE	
12	Consultancy services for National Road No. 1 - Upgrading Project	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Philcoei International, Inc. In JV with Luis and Associates, Co	nn	\$ 5,835,991.00	Jan. 18, 2013	83.00%	81.01%	\$ 4,727,833.53	\$ 1,108,157.47	ON-GOING	
13	New Construction of Isolation Building	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-255	\$ 281,137.18	Nov. 04, 2020	100.00%	90.00%	\$ 253,023.47	\$ 28,113.71	PHO	
14	New Construction of Campas, Gate And Leveling	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Caramé Unip. Lda	No.: 37/MACLN/IX/2021	\$ 118,769.70	01-Sep-21	65.92%	52.04%	\$ 61,804.39	\$ 56,965.31	ON-GOING	
15	Konstrusaun salas de aulas 3 + Eskritorio + Laboratorio ESTV Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	NCB:01MEJD/DNA/2021	\$ 171,079.30	Dec 3.2021	64.83%	0.00%	\$ -	\$ 171,079.30	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL SETEMBRO)

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL SETEMBRO)																
LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
16	New construction office CSS of Aileu District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kevina Unip.Lda	33/MSSI/DGAF/DNA/XI /2021	\$ 427,130.00	Nov. 22, 2021	18.42%	0.00%	\$ -	\$ 427,130.00	ON-GOING	
17	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBC 3 Ciclo Selo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBC 3 CICLO SELOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 152,044.11	Oct. 15, 2021	26.92%	0.00%	\$ -	\$ 152,044.11	ON-GOING	
18	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EPE Mantane	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EPE MANTANE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 84,628.13	Oct. 15, 2021	28.50%	27.97%	\$ 23,670.49	\$ 60,957.64	ON-GOING	
19	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBF Lacio	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF LACLO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,597.13	Oct. 15, 2021	25.41%	25.12%	\$ 25,023.62	\$ 74,573.51	ON-GOING	
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Pre-Escolar Cotoabauro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE PRE-ESCOLAR COTOBAURO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 83,516.10	Oct. 15, 2021	38.85%	0.00%	\$ -	\$ 83,516.10	ON-GOING	
21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Teblor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF TEBLOR	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 102,494.43	Oct. 15, 2021	46.03%	0.00%	\$ -	\$ 102,494.43	ON-GOING	
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Darahe	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF DARAHE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,770.22	Oct. 15, 2021	29.16%	28.75%	\$ 28,687.58	\$ 71,082.64	ON-GOING	
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESGAM Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE ESGAM AILEU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 140,545.78	Oct. 15, 2021	26.82%	26.42%	\$ 37,129.75	\$ 103,416.03	ON-GOING	
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 101,409.44	Oct. 15, 2021	28.60%	27.47%	\$ 27,858.48	\$ 73,550.96	ON-GOING	
25	R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli-Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Oin Unip. Lda	MOP-CD-RFQ-21011	\$ 89,757.77	Oct. 1, 2021	45.21%	0.00%	\$ -	\$ 89,757.77	ON-GOING	
26	R4D Rural Road Spot Improvement Kiriolo - Lacio Chainage 0+000 - 11+300, Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Fikikay Unipessoal, Lda	MOP-W-NCB-21025	\$ 339,829.64	Oct. 1, 2021	64.66%	34.81%	\$ 118,294.10	\$ 221,535.54	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL SETEMBRO)

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL SETEMBRO)																
LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
27	New Construction of Fence at CSI Aileu-Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	BEHALE ENTERPRICE UNIPESOAL,LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230	\$ 132,119.49	Jan. 14, 2022	81.07%	0.00%	\$ -	\$ 132,119.49	ON-GOING	
28	Consulting services for detailed architecture & engineering design of master plan and new campos the national defence institute	MINISTERIO DA DEFESA	FI	SEGURANCA NO DEFESA	Aileu-Vila	Aileu	PT. Perentjana Djaja	SSS/0111/IDN-2014	\$ 505,151.90	Aug. 18, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 505,151.90	ON-GOING	
29	Rehabilitasaun Estrada Rural,Aituhularan - Manufoni,Aileu 0+000-1+000 (1.0Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Hatutan Moris Unipessoal Lda	RT/088/MOP-2021	\$ 98,575.19	09-May-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 98,575.19	ON-GOING	
30	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	LNG Unipessoal, Lda Jv Star King Construction Unipessoal, Lda	RT/139/MOP-2021	\$ 252,415.36	27-Apr-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 252,415.36	ON-GOING	
31	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 2+000-5+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/090/MOP-2021	\$ 353,952.41	28-Apr-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 353,952.41	ON-GOING	
32	Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu-kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 5+000-8+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/091/MOP-2021	\$ 376,198.79	28-Apr-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 376,198.79	ON-GOING	
33	Rehabilitasaun Estrada Rural, seloi Kraik-Halmate, Aileu (3.5Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Qin Unip. Lda	RT/092/MOP-2021	\$ 304,850.97	01-May-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 304,850.97	ON-GOING	
34	Rehabilitasaun Estrada Rural,Raimansu - Fatubesi,Aileu (5.20Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	RACO LDA.	RT/093/MOP-2021	\$ 268,274.69	01-May-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 268,274.69	ON-GOING	
35	Perfurasau Bee Mos Iha Seloi Ba Fatin Turismo Komunitariu	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Alenta Unip. Lda	48/SMA/AM-AIL/VIII/2021	\$ 34,864.82	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 34,864.82	ON-GOING	
36	Rehabilitasaun irigasaun Lagoa Seloi kraik incluindo Konstrusaun bareira de proteasaun in gabion	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	Alenta Unip. Lda	004/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 26,311.39	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 26,311.39	ON-GOING	
37	Konstrusaun Edifisiu Posto Administrativo Aileu Vila	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Diborna Unip. Lda	001/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 144,735.62	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 144,735.62	ON-GOING	
38	Konstrusaun Bronjong Proteje Uma Comunidade no Uma Madres Caridade Inklui Toós Comunidade	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	JOHIJEMAR Unip,Lda	005/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 61,880.06	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 61,880.06	ON-GOING	
39	Konstrusaun Bronjong Protege Igreja Assembleia de Deus no Uma Comunidade	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	Padua Unip. Lda	006/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 49,110.53	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 49,110.53	ON-GOING	
40	New Install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Madabeno to Sarlala Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Laulara	Aileu	Aldepo Murak Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000162	\$ 462,154.02	Aug. 22, 2013	81.19%	73.07%	\$ 337,695.10	\$ 124,458.92	PENDENTE	Progresu Fisiku nafatin deit tamba laiha ona espasu atu kontinua tan obra ne'e.
41	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku to Besilau and Fatuk Hun - Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Laulara	Aileu	osxavijoneli unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000179	\$ 298,866.88	Aug. 22, 2013	81.53%	73.38%	\$ 219,311.16	\$ 79,555.72	PENDENTE	Progresu Fisiku nafatin deit tamba laiha ona espasu atu kontinua tan obra ne'e.



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL SETEMBRO)

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL SETEMBRO)																
					LOKALIZASAUN PROJETU											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
42	Rehabilitation of Beducu Sarijala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Mejori, Lda	SSS/0103/MOPTC-2016	\$ 4,451,281.98	Sept. 5, 2016	98.97%	85.23%	\$ 3,793,986.33	\$ 657,295.65	ON-GOING	
43	Road Rehabilitation project, Sarijala - Bemós - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 0+000 - Sta. 2+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Aspalink Unip Lda	SSS/120/MOPTC-2015	\$ 4,128,651.62	Dec. 11, 2015	100.00%	99.35%	\$ 4,101,692.64	\$ 26,958.98	FHO	FHO iha Fulan Março 2022
44	Road Rehabilitation project, Sarijala - Bemós - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 2+800 - Sta. 6+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/121/MOPTC-2015	\$ 4,645,457.43	Dec. 11, 2015	100.00%	98.99%	\$ 4,598,764.07	\$ 46,693.36	FHO	FHO iha Fulan Março 2022
45	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laulara	Aileu	CINA WU YI CO.LTD	ICB/018/MOPTC-2017	\$ 18,839,489.21	May 31, 2019	79.61%	42.53%	\$ 8,012,695.11	\$ 10,826,794.10	ON-GOING	Responsavel Eng. ADN Impristimo
46	Rural Roads Maintenance Fahisohi - Fadabloco Sta 0+000-8+200, Hotoho - Liquica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Ornai Sta 0+000 - 7+500 in Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laulara	Aileu	Remexio Furak Unip Lda	MPWTC-CD-170004	\$ 40,314.04	July 20, 2017	100.00%	49.04%	\$ 19,768.44	\$ 20,545.60	ON-GOING	Rekomenadasun Ikus 2018
47	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Lisimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Fin Los unip.Lda	MPW-W190086	\$ 225,977.27	Aug. 16, 2019	88.97%	80.07%	\$ 180,944.94	\$ 45,032.33	ON-GOING	
48	Laulara Solerema Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Marino Enterprises, Lda	SSS/115/MOPTC-2017	\$ 161,240.04	Sept. 7, 2017	100.00%	88.85%	\$ 143,267.06	\$ 17,972.98	PHO	Projeito refere Atinji progreso 100% baseia ba Rekomendasaun ikus 2017. no agora Projeito Impristimo mak halo fali konstrusaun foun
49	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Emmanuel Milenial	MOP-CD-RFQ-21013	\$ 39,828.24	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 39,828.24	ON-GOING	
50	Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 -10+400 Dili & Aileu Municipality / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	Remexio	Aileu	Nautetu I, II Unipessoal Lda	MPW-W-1900081	\$ 494,544.48	Aug. 16, 2019	72.09%	62.04%	\$ 306,821.03	\$ 187,723.45	ON-GOING	
51	Road Rehabilitation of Remexio to Lacio Sta 0+000-20+000 Package I Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Remexio	Aileu	Mendith UnipLda	SSS/139/MOPTC-2017	\$ 2,567,345.51	Sept. 12, 2017	43.26%	34.72%	\$ 891,434.87	\$ 1,675,910.64	ON-GOING	
52	Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Remexio	Aileu	Lonacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	\$ 225,714.76	18-Jun-21	33.16%	0.00%	\$ -	\$ 225,714.76	ON-GOING	
53	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 77,252.65	Oct. 15, 2021	31.31%	27.44%	\$ 21,200.36	\$ 56,052.29	ON-GOING	
54	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 106,847.46	Oct. 15, 2021	28.43%	26.25%	\$ 28,045.29	\$ 78,802.17	ON-GOING	
55	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Lequidoe	Aileu	Cadila Supplie Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000163	\$ 240,048.46	Aug. 22, 2013	94.17%	84.76%	\$ 203,456.68	\$ 36,591.78	PENDENTE	Progresu Fisiku nafatin deit tamba laiha ona espasu atu kontinua tan obra ne'e.



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL SETEMBRO)


MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL SETEMBRO)																
LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
56	R4D MPW Rural Roads rehabilitation Project in Aileu Bereleu manucasa Package 2 Sta. 3+500-13+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Seiara Irapiti Unip. Lda	MPWTC-W-015016	\$ 248,750.72	Sept. 7, 2015	97.45%	87.70%	\$ 218,159.90	\$ 30,590.82	PHO	Projeito refere Atinji deit progreso 97.45% baseia ba Rekomendasaun ikus 2017. no agora Projeito Impristimo mak halo fali konstrusaun foun
57	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 8+200, Namalesu - Faturilau Chainage 0+000 - 12+500, Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hautoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+500 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Emmanuel Milenial	MPW-W-190103	\$ 171,685.42	Aug. 21, 2019	76.31%	68.54%	\$ 117,671.59	\$ 54,013.83	ON-GOING	
58	Rural Roads Periodic Maintenance Aituhaularan - Manufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300, Routine Maintenance Coula Udo Kirelo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-190174	\$ 142,718.62	Nov. 25, 2019	98.30%	79.86%	\$ 113,980.68	\$ 28,737.94	ON-GOING	
59	For Preparation of Detailed Engineering Design For Rehabilitation of "municipio Roads" Package 8 : (Be' Cluru) to Lequidoe Town (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Lequidoe	Aileu	Team Consulting Engineering & Management Co., Ltd JV ATT Consultants Co., Ltd & Triangle Architech Consultant., Lda	MPW-CS-2000021	\$ 550,800.00	March 26, 2020	70.00%	70.00%	\$ 385,560.00	\$ 165,240.00	ON-GOING	
60	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Faturilau, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	SAUDE	Lequidoe	Aileu	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	\$ 299,945.58	Sept. 6, 2021	77.83%	37.98%	\$ 113,916.92	\$ 186,028.66	ON-GOING	
61	R4D Rural Road Spot Improvement Namalesu-Faturilau Chainage 0+000-14+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-210149	\$ 411,620.44	Sept. 21, 2021	59.06%	47.41%	\$ 195,141.27	\$ 216,479.17	ON-GOING	
62	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 117,171.14	Oct. 15, 2021	33.43%	28.91%	\$ 33,878.58	\$ 83,292.56	ON-GOING	
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Urdadan	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 73,988.60	Oct. 15, 2021	55.35%	0.00%	\$ -	\$ 73,988.60	ON-GOING	
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 74,277.78	Oct. 15, 2021	54.67%	0.00%	\$ -	\$ 74,277.78	ON-GOING	
65	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Lequidoe	Aileu	Blackbird Unip. Lda JV Chaicallala Unip. Lda	MOP-CD-NCB-21026	\$ 186,084.05	Oct. 1, 2021	11.24%	0.00%	\$ -	\$ 186,084.05	ON-GOING	



ANEXU A


MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL SETEMBRO)																
LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
66	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi-Dairouta Chainage 0+000 - 5+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Lequidoe	Aileu	Raco Lda.	MOP-CD-RFQ-21012	\$ 72,387.33	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 72,387.33	ON-GOING	
67	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lequidoe	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lequidoe	Aileu	Fitun Foun, Unip Lda	002/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 128,221.80	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 128,221.80	ON-GOING	
TOTAL									\$ 60,709,750.02			59.95%	\$ 36,395,939.33	\$ 24,313,810.69		

Prepara Husi :


(Eng. Celvino J. Alves)
Engenheiro ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun
Municipio Aileu,
ADN, I.P.


(Eng. Rui Lopes)
Engenheiro ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun
Municipio Aileu,
ADN, I.P.


(Eng. Merinho Cuelo L. de Araujo)
Eng. ba Edificio Publiku no Be e Saneamento
Municipio Aileu
ADN, I.P.


(Silvino D. R. R. Soares)
Eng. M & E, Municipio Aileu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, I.P.



ANEXU C1 (AVL - 6)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Campas, Gate, Levelling Area in Garden of Herois
Aileu.
No. kontratu : 37/MACLN/IX/2021

Data Inspesaun : 22 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa , Aisirimou

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.719208862 Latetude : 125.570387095

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Back Fill Ba Area Rate

Ba Projetu ida ne depois de Halot Restus Mortais
Ate Agora companhia seidauk servisu fila fali

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (AVL - 6)

Back-up Data


Naran Projeto : New Construction of Campas, Gate, Levelling Area in Garden of Herois
Aileu.
No. kontratu : 37/MACLN/IX/2021

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Back Fill Ba Area Rate**

Ba Projetu ida ne depois de Halot Restus Mortais
Ate Agora kompanhia seidauk servisu fila fali

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

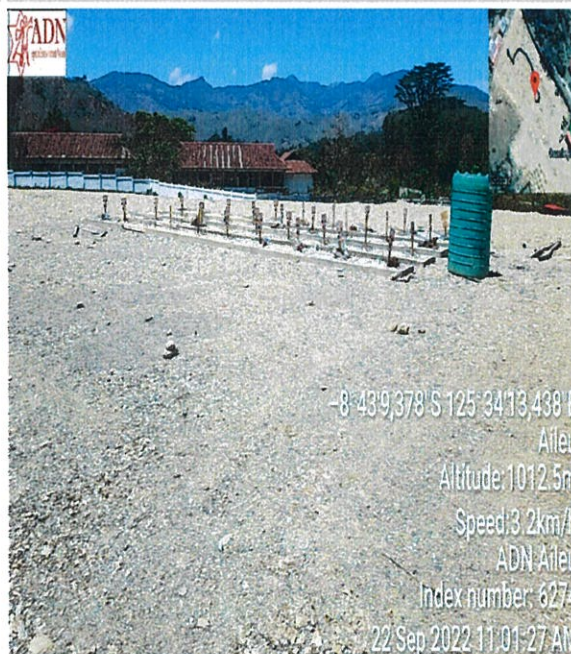

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




ANEXU C1 (AVL - 6)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Campas, Gate, Levelling Area in Garden of Herois Aileu.
No. kontratu : 37/MACLN/IX/2021

Sketch Item servisu

Ba Projetu ida ne depois de Halot Restus Mortais
Ate Agora companhia seidaus servisu fila fali

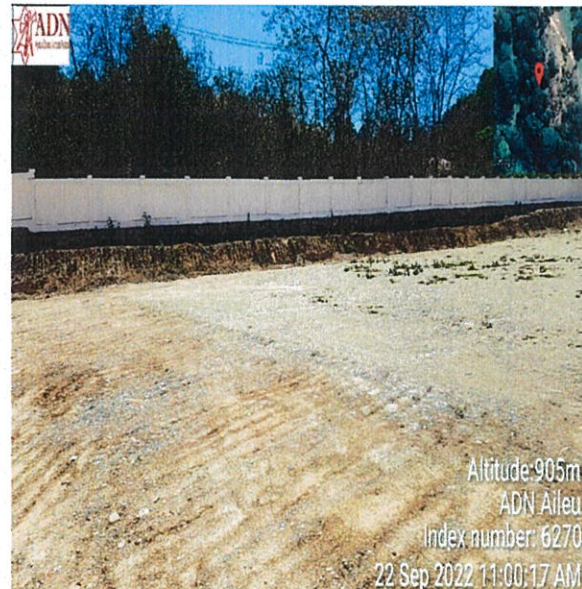

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E
ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : New Construction of Campas, Gate And Leveling					
Kompanha : Caramé Unip.Lda					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	22/09/2022	Aileu Villa, Aileu.	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T 'ADN	1
					2
					3
					4
					5
II	22/09/2022	Aileu Villa, Aileu.	Sergio Pineiro	T. Kompanhia	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5
Ba Projetu ida ne depois de Halot Restus Mortais Ate Agora kompanhia seidauk servisu fila fali					Asinatura



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of of helath Post and doctor s House Building
No. kontratu : RDTL-MS-DNA-ICB-21-073

Data Inspesaun : 08 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe , Faturilau

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item cat tembok doctor house

Volume pinta nebe maka kompanhia halo iha
tereno ba uma doctor house rua ne volume
hamutuk 281,22 m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data


Naran Projeto
No. kontratu

: New Construction of of helath Post and doctor s House Building
: RDTL-MS-DNA-ICB-21-073

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Kompanhia instala Plafon

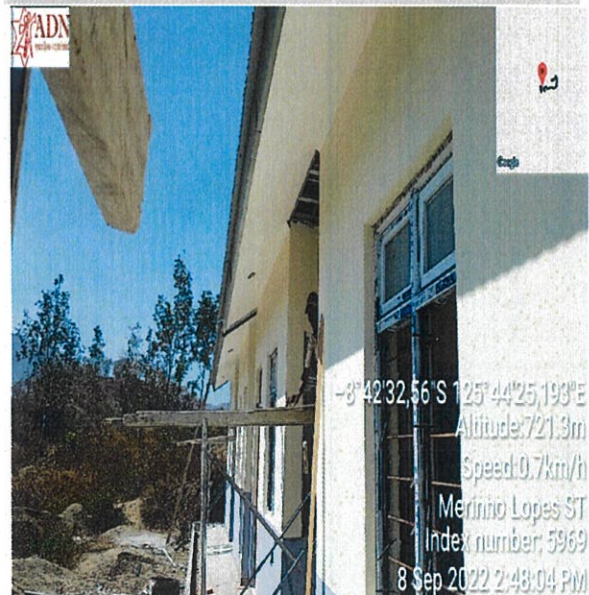

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu **monta keramik ba
dinding**

Monta keramik ba iha Dinding





MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VHI GOVERNO CONSTITUCIONAL



ANEXU C2 (1e - 2)

PROJECT NAME : NEW CONSTRUCTION OF HEALTH POST AND DOCTOR'S HOUSE BUILDING

LOCATION : AILEU - LEQIDOE/FATURILAU MUNICIPALITY-TIMOR LESTE

PROJECT OWNER : MINISTRY OF HEALTH

SUMMARY

No	WORK DESCRIPTION	AMOUNT	WEIGHT	ADN ESTIMATED				WEIGHT	
				PREVIOUS BILLING		THIS BILLING			TO DATE
				AMOUNT	WEIGHT	AMOUNT	WEIGHT		
A	BUILDING A HEALTH POST								
1	PREPARATION WORKS	\$ 4,803.37	1.60%	\$ 2,617.12	0.87%	\$ -	0.00%	\$ 2,617.12	0.87%
2	FOUNDATION WORKS	\$ 4,809.88	1.60%	\$ 4,809.88	1.60%	\$ -	0.00%	\$ 4,809.88	1.60%
3	CONCRETE WORKS	\$ 21,259.39	7.09%	\$ 21,259.39	7.09%	\$ -	0.00%	\$ 21,259.39	7.09%
4	WALL INSSTALLATION AND PLESTERING	\$ 20,287.86	6.76%	\$ 20,287.86	6.76%	\$ -	0.00%	\$ 20,287.86	6.76%
5	CARPENTRY WORKS	\$ 9,792.00	3.26%	\$ 9,792.00	3.26%	\$ -	0.00%	\$ 9,792.00	3.26%
6	ROOFING WORKS	\$ 21,405.58	7.14%	\$ 20,165.58	6.72%	\$ 1,240.00	0.41%	\$ 21,405.58	7.14%
7	CEILING WORKS	\$ 6,996.92	2.33%	\$ 6,996.92	2.33%	\$ -	0.00%	\$ 6,996.92	2.33%
8	FLOOR TILE WORKS	\$ 7,195.85	2.40%	\$ 6,595.78	2.20%	\$ 600.07	0.20%	\$ 7,195.85	2.40%
9	ELECTRICAL WORKS	\$ 8,208.60	2.74%	\$ 2,724.60	0.91%	\$ 712.50	0.24%	\$ 3,437.10	1.15%
10	SANITATION WORKS	\$ 7,251.56	2.42%	\$ 2,957.69	0.99%	\$ 917.00	0.31%	\$ 3,874.69	1.25%
11	PAINTING WORKS	\$ 3,103.65	1.03%	\$ 2,793.28	0.93%	\$ 310.36	0.10%	\$ 3,103.65	1.03%
12	Apron and Drainage Work	\$ 2,117.74	0.71%	\$ 1,233.22	0.41%	\$ 884.52	0.29%	\$ 2,117.74	0.71%
13	TOWER WORKS	\$ 5,919.74	1.97%	\$ 294.45	0.10%	\$ -	0.00%	\$ 294.45	0.10%
14	Provisional Sum for Furniture	\$ 6,500.00	2.17%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
15	FINAL CLEARING	\$ 100.00	0.03%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
TOTAL BUILDING A		\$ 129,752.13	43.26%	\$ 102,527.77	34.18%	\$ 4,664.45	1.56%	\$ 107,192.22	35.74%
B	BUILDING B DOCTOR HOUSE								
1	PREPARATION WORKS	\$ 576.80	0.19%	\$ 576.80	0.19%	\$ -	0.00%	\$ 576.80	0.19%
2	FOUNDATION WORKS	\$ 2,251.48	0.75%	\$ 2,251.48	0.75%	\$ -	0.00%	\$ 2,251.48	0.75%
3	CONCRETE WORKS	\$ 11,196.77	3.73%	\$ 10,762.92	3.59%	\$ 433.85	0.14%	\$ 11,196.77	3.73%
4	WALL INSSTALLATION AND PLESTERING	\$ 6,979.69	2.33%	\$ 6,979.69	2.33%	\$ -	0.00%	\$ 6,979.69	2.33%
5	STAIRS WORKS	\$ 729.88	0.24%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
6	CARPENTRY WORKS	\$ 5,312.00	1.77%	\$ 5,312.00	1.77%	\$ -	0.00%	\$ 5,312.00	1.77%
7	ROOFING WORKS	\$ 8,555.09	2.85%	\$ 8,555.09	2.85%	\$ -	0.00%	\$ 8,555.09	2.85%
8	CEILING WORKS	\$ 3,027.04	1.01%	\$ 3,027.04	1.01%	\$ -	0.00%	\$ 3,027.04	1.01%
9	FLOOR TILE WORKS	\$ 2,910.20	0.97%	\$ 2,451.93	0.82%	\$ 458.26	0.15%	\$ 2,910.20	0.97%



MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional

ANEXU C2 (le - 2)

PROJECT NAME : NEW CONSTRUCTION OF HEALTH POST AND DOCTOR'S HOUSE BUILDING

LOCATION : AILEU - LEQIDOE/FATURILAU MUNICIPALITY-TIMOR LESTE

PROJECT OWNER : MINISTRY OF HEALTH

SUMMARY

No	WORK DESCRIPTION	AMOUNT	WEIGHT	ADN ESTIMATED			
				PREVIOUS BILLING		THIS BILLING	
				AMOUNT	WEIGHT	AMOUNT	WEIGHT
10	ELECTRICAL WORKS	\$ 3,620.00	1.21%	\$ 864.00	0.29%	\$ 294.00	0.10%
11	SANITATION WORKS	\$ 6,753.86	2.25%	\$ 2,820.32	0.94%	\$ 3,076.22	1.03%
12	PAINTING WORKS	\$ 1,108.80	0.37%	\$ 971.20	0.32%	\$ 137.60	0.05%
13	FURNITURE	\$ 4,000.00	1.33%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	TOTAL BUILDING B I UNIT	\$ 57,021.60	19.01%	\$ 44,572.47	14.86%	\$ 4,399.94	1.47%
	2 UNIT BUILDING DOCTOR HOUSE	\$ 114,043.20	38.02%	\$ 89,144.93	29.72%	\$ 8,799.88	2.93%
C	Provisional Sum for External Works	\$ 15,000.00	5.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 258,795.34	86.28%	\$ 191,672.71	63.90%	\$ 13,464.33	4.49%
	CONTRACTOR FEE (10% x I)	\$ 25,879.53	8.63%	\$ 19,167.27	6.39%	\$ 1,346.43	0.45%
	Over head	\$ 4,315.00	1.44%	\$ 3,236.25	1.08%	\$ -	0.00%
	TAX (2% x (I+II+III))	\$ 5,779.80	1.93%	\$ 4,281.52	1.43%	\$ 296.22	0.10%
	CONTINGENCY 2%	\$ 5,175.91	1.73%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	TOTAL PROJECT CONSTRUCTION	\$ 295,945.58	100.00%	\$ 218,357.76	72.80%	\$ 15,106.97	5.04%
						\$ 233,464.73	77.84%

Prepared by

Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Municipio Aileu

Verified by :

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior da Projeto Edificio no Be'e
M05

Approved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

Naran projeto : New Construction of helath Post and doctor s House Building

Kompanha : Kartini Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/09/2022	Lequidoe, Aileu.	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T'ADN	1		
II	8/09/2022	Lequidoe, Aileu.	Emanuel Bas Lelan fernandes	T, M Saude	2		
III					3		
IV					4		
V					5		



ANEXU C1 (AVL - 16)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu

No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230

Data Inspesaun : 27 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa , Aisirimou

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.719208862 Latetude : 125.570387095

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Servisu nebe kompanhia halao iha tereno
hotu ona no hela deit maka servisu adisional
no sei hein justifikasaun husi Owner.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (AVL - 16)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu

No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230

Sketch & Foto Desenho

Servisu nebe kompanhia halao iha tereno
hotu ona no hela deit maka servisu adisional
no sei hein justifikasaun husi Owner.


Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Servisu nebe kompanhia halao iha tereno
hotu ona no hela deit maka servisu adisional
no sei hein justifikasaun husi Owner.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

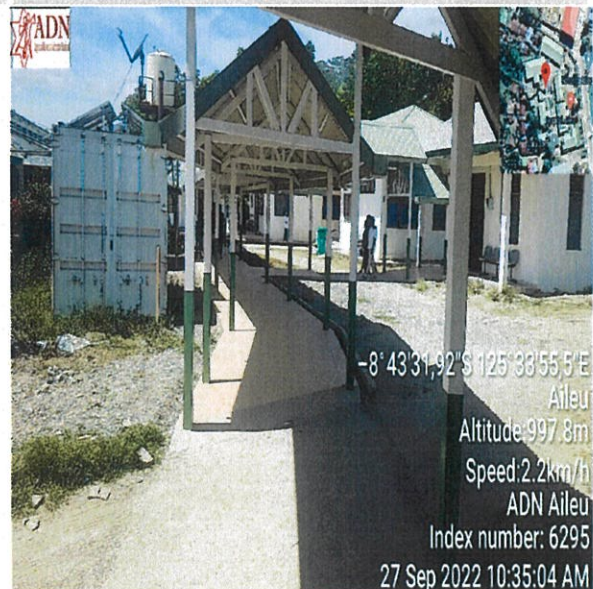



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, LP.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projeto : New Constructio of Fence CSI Aileu- Timor-Leste.
Fatin Projeto : CSI Aileu, Sub Distrito Aileu Vila, Distrito Aileu
Nain Projeto : Ministerio da Saude

ANEXU C2 (AVL- 16)

SUMMARY

No	WORK DESCRIPTION	AMOUNT	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
I	PREPARATION WORKS	\$ 1,629.26	\$ 1,379.26	1.04%	\$ -	0.00%	\$ 1,379.26	1.04%
II	Fundatin Works	\$ 10,036.65	\$ 10,036.65	7.60%	\$ -	0.00%	\$ 10,036.65	7.60%
III	CONCRETED WORKS	\$ 33,766.29	\$ 30,448.56	23.05%	\$ 288.22	0.22%	\$ 30,736.77	23.26%
IV	Wall Instalation And Plesfering	\$ 35,402.78	\$ 32,138.60	24.33%	\$ 533.38	0.40%	\$ 32,671.98	24.73%
V	Others Works	\$ 3,094.75	\$ 439.36	0.33%	\$ 2,155.38	1.63%	\$ 2,594.75	1.96%
VI	PATHWAY WORKS	\$ 20,077.02	\$ 14,242.44	10.78%	\$ 1,616.63	1.22%	\$ 15,859.06	12.00%
VII	Final Clearing	\$ 125.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Coast	\$ 104,131.74	\$ 88,684.86	67.12%	\$ 4,593.61	3.48%	\$ 93,278.47	70.60%
B	Contractor Fee (10%xA)	\$ 10,413.17	\$ 8,868.49	6.71%	\$ 459.36	0.35%	\$ 9,327.85	7.06%
C	Overhead	\$ 4,775.00	\$ 2,387.50	1.81%	\$ -	0.00%	\$ 2,387.50	1.81%
D	Tax(2%(xA+B+C)	\$ 2,386.40	\$ 1,998.82	1.51%	\$ 101.06	0.08%	\$ 2,099.88	1.59%
E	Confingency (10%xA)	\$ 10,413.17	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
f	Grand Total (A+B+C+D+E)	\$ 132,119.49	\$ 101,939.66	77.16%	\$ 5,154.04	3.90%	\$ 107,093.70	81.06%

prepared by :

Eng. Merinho Cico Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Enginheiro Senior na Projeto Edificio no Be e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu					
Kompanha : Behale Interprise Unip.Lda					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	27/09/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T'ADN	1
					2
					3
					4
					5
II	27/09/2022	Aileu, Aileu Villa	Emanuel B.F. Lelan	T. MDS	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5

Servisu nebe kompanhia halao iha tereno hotu ona no hela deit maka servisu adisional no sei hein justifikasaun husi Owner.

[Signature]



ANEXU C1 (AVL- 5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Cinsstruction Office CSS of Aileu District
No. kontratu : No: RDTL : 33/MSSI/ DGAF/DNA/XI/2021

Data Inspesaun : 22 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Aisirimou

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item pengecorsn ba Coloum

Servisu nebe kompanhia halao iha terenu
maka pengecoran ba Coloum

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

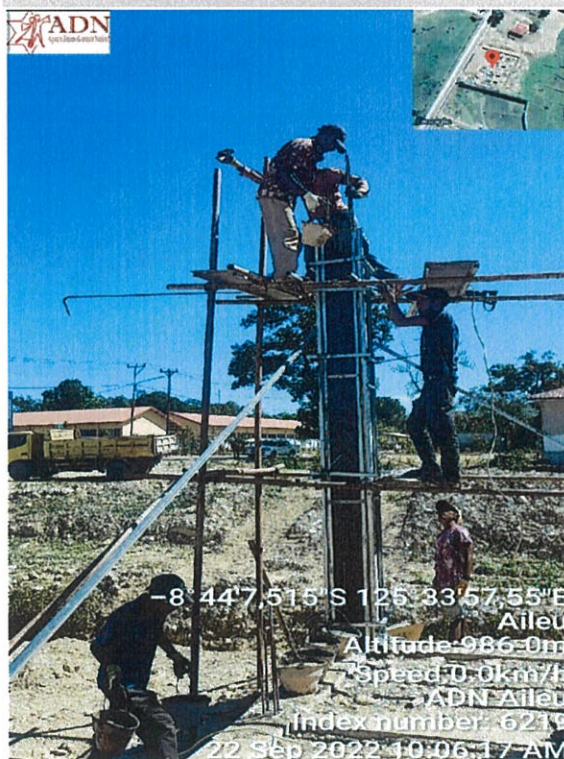



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (AVL- 5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Cnstruction Office CSS of Aileu District
No. kontratu : No: RDTL : 33/MSSI/ DGAF/DNA/XI/2021

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item pasangan batako Security Post

Servisu seluk nebe maka kompanhia halao
maka pasangan batako.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional

Anexu C2 (ALV - 5)

Naran Projetu
Nain ba Projetu
Fatin

: New Construction Office CSSM – Aileu
: Ministry Solidarity Social
: Aileu Villa, Aileu Municipality – Timor Leste

SUMMARY									
NO	DESCRIPTION	AMOUNT	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		UP TO DATE		
			AMOUNT	WEIGHT	AMOUNT	WEIGHT	AMOUNT	WEIGHT	
A	OFFICE	\$ 243,267.14							
I	PREPARATION WORKS	\$ 13,574.50	\$ 6,824.50	1.60%	\$ -	0.00%	\$ 6,824.50	1.60%	
II	EARTH WORKS	\$ 12,268.34	\$ 10,238.94	2.40%	\$ -	0.00%	\$ 10,238.94	2.40%	
III	MASONRY WORKS	\$ 53,876.80	\$ 19,036.63	4.46%	\$ -	0.00%	\$ 19,036.63	4.46%	
IV	CONCRETE WORKS	\$ 81,271.20	\$ 11,892.35	2.78%	\$ 3,607.28	0.84%	\$ 15,499.63	3.63%	
V	ROOFING WORKS	\$ 19,104.02	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
VI	CEILING WORKS	\$ 20,223.77	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
VII	CARPENTRY WORKS	\$ 11,855.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
VIII	ELECTRICAL WORKS	\$ 14,033.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
IX	SANITATION WORKS	\$ 13,209.93	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
X	PAINTING WORKS	\$ 3,850.57	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
B	LANDSCAPE WORKS	\$ 94,245.62	\$ 47,992.42	11.24%	\$ 3,607.28	0.84%	\$ 51,599.70	12.08%	
PARK AND OFFICE PLATFORM WORKS									
I	PRELIMINARY WORKS	\$ 38,009.23	\$ 1,019.52	0.24%	\$ -	0.00%	\$ 1,019.52	0.24%	
II	PARK ELECTRICAL WORKS	\$ 3,179.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
III	FENCE WORKS	\$ 53,057.39	\$ 10,714.29	2.51%	\$ 3,403.42	0.80%	\$ 14,117.71	3.31%	
C	SECURITY POST TWO UNIT	\$ 32,085.31	\$ 11,733.81	2.75%	\$ 3,403.42	0.80%	\$ 15,137.23	3.54%	
I	EARTH AND SAND WORKS	\$ 1,065.73	\$ 147.93	0.03%	\$ -	0.00%	\$ 147.93	0.03%	
II	WALL MASONRY AND PLESTER WORKS	\$ 9,359.81	\$ 1,236.67	0.29%	\$ 370.56	0.09%	\$ 1,607.22	0.38%	
III	CONCRETE WORKS	\$ 5,396.67	\$ 557.00	0.13%	\$ 292.61	0.07%	\$ 849.61	0.20%	
IV	FLOOR WORKS	\$ 1,322.09	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
V	CARPENTRY WORKS	\$ 1,858.40	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
VI	ROOFING AND CEILING WORKS	\$ 3,757.99	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
VII	SANITATION WORKS	\$ 3,755.96	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
VIII	ELECTRICAL WORKS	\$ 5,184.30	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
IX	PAINTING WORKS	\$ 384.35	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
A	BUDGET AT COMPLETION, TOTAL(A+B+C)	\$ 369,598.07	\$ 1,941.59	0.45%	\$ 663.17	0.16%	\$ 2,604.76	0.61%	
B	CONTRACTOR FEE (10%xA)		\$ 61,667.82	14.44%	\$ 7,673.87	1.80%	\$ 69,341.68	16.23%	
C	OVERHEAD		\$ 36,959.81	1.44%	\$ 767.39	0.18%	\$ 6,934.17	1.62%	
D	TAX (2% x (A+B+C))		\$ 4,950.01	0.20%	\$ -	0.00%	\$ 851.00	0.20%	
E	CONTINGENCY (2% x A)		\$ 8,230.16	0.32%	\$ 168.83	0.04%	\$ 1,542.54	0.36%	
F	GRAND TOTAL	\$ 427,130.00	\$ 70,059.31	16.40%	\$ 8,610.08	2.02%	\$ 78,669.39	18.42%	

prepared by :

Verify by :

Approved by :

Eng. Merinho Curo Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio no Be e Mos

Eng. Emerencial da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao de
Qualidade



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 11)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTO TIPO
EPE)

No. kontratu : GRUPU KOMUNITARIO

Data Inspesaun : 07 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu, Selo Malere

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,69808407 Latetude : 125.53881841

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo


2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item **instala Kuda Kuda**

Volume nebe maka instala iha tereno 250,19
kg

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

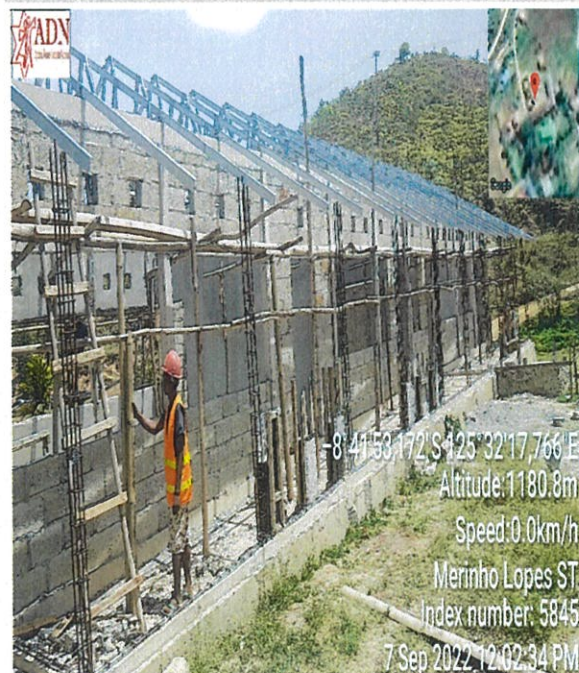



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 11)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTO TIPO
EPE)
No. kontratu : GRUPU KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Plesteran Volume nebe maka instala iha tereno 250,19 kg	 -8° 41' 53,134" S 125° 32' 17,652" E Altitude: 1172.5m Speed: 0.0km/h Merinho Lopes ST Index number: 5846 7 Sep 2022 12:02:45 PM
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 11)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTOTIPO EPE)
LOCATION : SELOI MALERE, AILEU VILA

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ 1,800.00	2.16%	\$ -	0.00%	\$ 1,800.00	2.16%
2	Class Room Building C2	\$ 60,790.89	\$ 26,061.31	31.21%	\$ 2,306.81	2.76%	\$ 28,368.13	33.97%
3	Provisional Sum for Site Works	\$ 9,810.21	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
4	Provisional Sum for Demolition	\$ 500.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Total Construction Cost		\$ 74,176.10	\$ 27,861.31	33.36%	\$ 2,306.81	2.76%	\$ 30,168.13	36.12%
Overhead		\$ 6,340.00	\$ 2,277.50	2.73%	\$ -	0.00%	\$ 2,277.50	2.73%
Contingency		\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Grand Total		\$ 83,516.10	\$ 30,138.81	36.09%	\$ 2,306.81	2.76%	\$ 32,445.63	38.85%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Enginheiro Senior na Projeto Edificio no Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao de
Qualidade

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTOTIPO EPE)					
Kompanha : Grupo Komunitario					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	7/09/2022	Aileu Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T ADN	1
II	7/09/2022	Aileu Villa, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	2
III					3
IV					4
V					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 14)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Data Inspesaun : 07 de Setembro de 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Selo Malere

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.71344607 Latetude : 125.564061

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1. Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projetu refere parado hela ho razaun tamba grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere ho nunee hein pagamento sai maka foin bele halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 14)

Back-up Data


Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

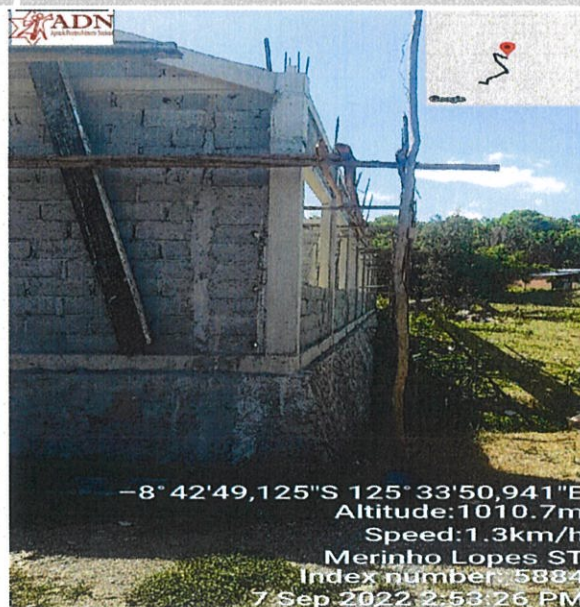

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 14)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE
LOCATION : SELOI - MALERE

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ 1,743.75	1.24%	\$ -	0.00%	\$ 1,743.75	1.24%
2	Class Room Building C (2 Units)	\$ 113,990.70	\$ 34,198.59	24.33%	\$ -	0.00%	\$ 34,198.59	24.33%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 14,140.08	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	Total Construction Cost	\$ 131,205.78	\$ 35,942.34	25.57%	\$ -	0.00%	\$ 35,942.34	25.57%
	Overhead	\$ 6,340.00	\$ 1,755.00	1.25%	\$ -	0.00%	\$ 1,755.00	1.25%
	Contingency	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	Grand Total	\$ 140,545.78	\$ 37,697.34	26.82%	\$ -	0.00%	\$ 37,697.34	26.82%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Enginheiro Senior da Projeto Edificio no Be'e
Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIA LOJENO AGRICULTURAL



ADN, LP.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Investimento Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE					
Kompanha : Grupo Komunitario					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	7/09/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T AND	1
					2
					3
					4
					5
II	7/09/2022	Aileu, Aileu Villa	Joao Dos Reis Mendes	T. MEJD	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					Asinatura
grupo sira la halao servisu ba projetu refere ho razaun katak osan hotu ona atu kontinua servisu ba projetu refere no hein pagamento segundu maka foin bele servisu fila fali					



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Tb
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 08 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Fahisoi - Lequedoe

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projetu refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu eze kuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

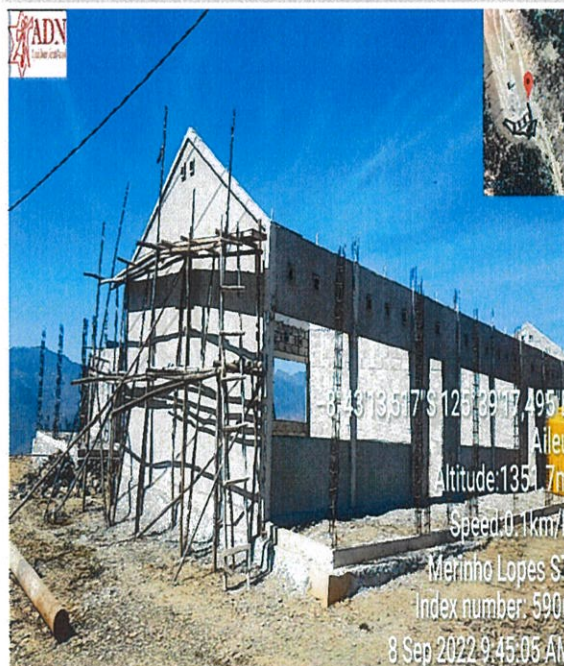



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Tb
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeto refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

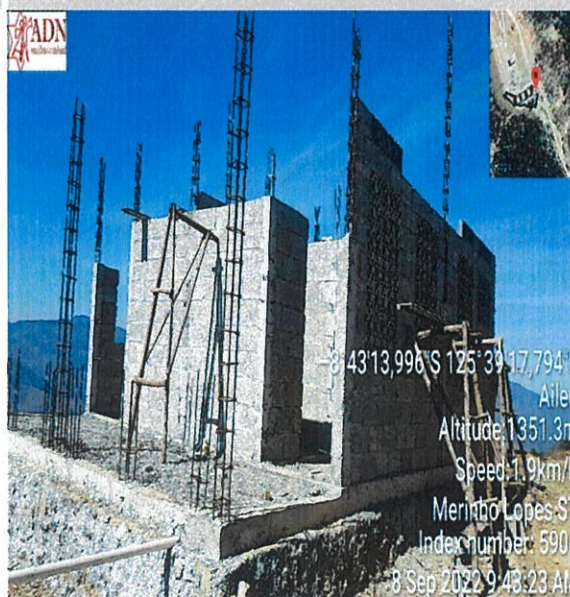

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (LE - 2)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : FAHISOI - LEQUEDOE

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ 1,800.00	1.54%	\$ -	0.00%	\$ 1,800.00	1.54%
2	Class Room Building C	\$ 56,180.86	\$ 22,504.03	19.21%	\$ -	0.00%	\$ 22,504.03	19.21%
3	Toilet Building Tb	\$ 29,383.00	\$ 12,688.60	10.83%	\$ -	0.00%	\$ 12,688.60	10.83%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 19,192.29	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Total Construction Cost		\$ 107,831.14	\$ 36,992.63	31.57%	\$ -	0.00%	\$ 36,992.63	31.57%
Overhead		\$ 6,340.00	\$ 2,185.00	1.86%	\$ -	0.00%	\$ 2,185.00	1.86%
Contingency		\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Grand Total		\$ 117,171.14	\$ 39,177.63	33.44%	\$ -	0.00%	\$ 39,177.63	33.44%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Engenheiro Senior na Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTOPO C) + TB

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	8/09/2022	Lequidoe, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T AND	1			
				2				
				3				
				4				
				5				
II	8/09/2022	Lequidoe, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1			
					2			
					3			
					4			
					5			
III					1			
					2			
					3			
					4			
					5			
IV					1			
					2			
					3			
					4			
					5			
V					1			
					2			
					3			
					4			
					5			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (AVL - 9)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Edifício Pré-Escolar (Protótipo Epe)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 07 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa Sarin, Mantane

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projetu refere parado hela ho razaun tamba grupo osan laiha ona atu eze kuta obra refere ho nunee hein pagamento sai maka foin bele halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

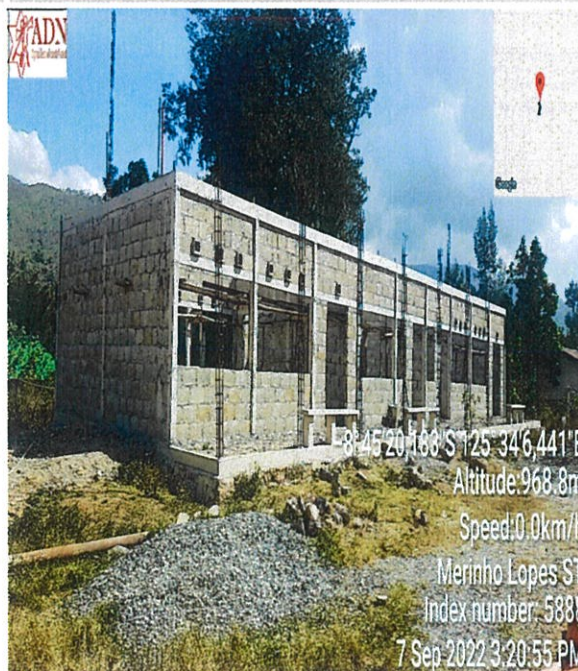



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (AVL - 9)

Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção Edifício Pré Escolar (Prototipo Epe)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere parado hela ho razaun tamba grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere ho nunee hein pagamento sai maka foin bele halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

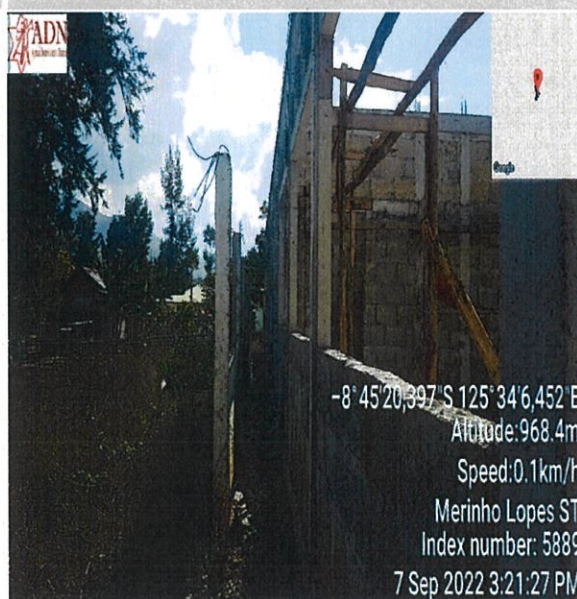

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E O R D E N A M E N T O
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (Av1 - 9)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTOTIPO EPE)
LOCATION : FAHRIA, AILEU VILA

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ 1,800.00	2.13%	\$ 325.00	0.38%	\$ 2,125.00	2.51%
2	Class Room Building C2	\$ 60,790.89	\$ 19,457.52	22.99%	\$ -	0.00%	\$ 19,457.52	22.99%
3	Provisional Sum for Site Works	\$ 10,972.24	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
4	Provisional Sum for Demolition	\$ 450.00	\$ -	0.00%	\$ 450.00	0.53%	\$ 450.00	0.53%
	Total Construction Cost	\$ 75,288.13	\$ 21,257.52	25.12%	\$ 775.00	0.92%	\$ 22,032.52	26.03%
	Overhead	\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 2,079.50	2.46%	\$ 2,079.50	2.46%
	Contingency	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	Grand Total	\$ 84,628.13	\$ 21,257.52	25.12%	\$ 2,854.50	3.37%	\$ 24,112.02	28.49%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Engenheiro Senior da Projeto Edificio no
Be'e Mos

Approved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTOTIPO EPE)

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	7/09/2022	Aileu Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T ADN	1	konstrusaun refere mos parado hela ho razaun grupo Komunitaria sira osan hotu ona no hein pagamento maka servisu foin bele lao fila fali.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	7/09/2022	Aileu Villa, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 3)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 28 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe , Asubli Toho, Urbanan.

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Maske kalen, plesteran no rangka Plafon monta ona maibe ekipa ba iha tereno laiha aktividade ruma nebe grupo sira halao iha tereno tuir informasaun katak grupo osan hotu no hein pagamento maka bele kontinua fali

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

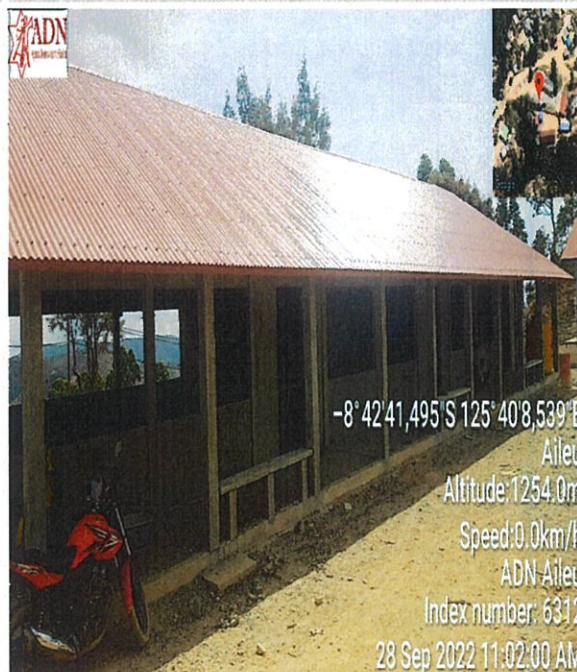



ANEXU C1 (Le - 3)

Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Maske kalen, plesteran no rangka Plafon
monta ona maibe ekipa ba iha tereno laiha
aktividade ruma nebe grupo sira halao iha
tereno tuir informasaun katak grupo osan
hotu no hein pagamento maka bele kontinua
fali

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

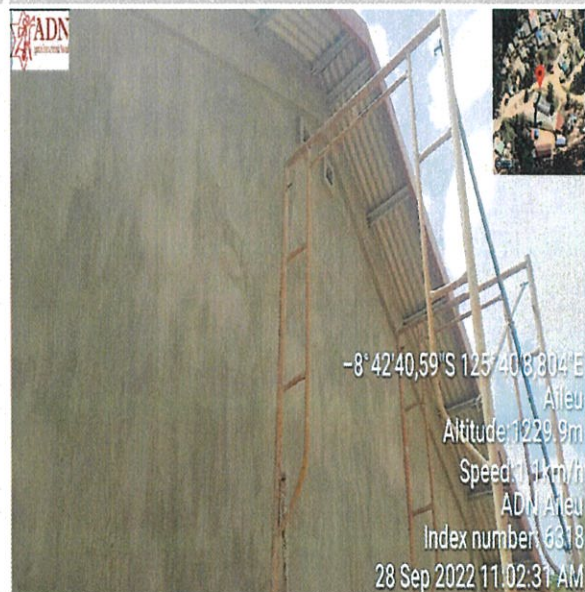

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu a

Maske kalen, plesteran no rangka Plafon
monta ona maibe ekipa ba iha tereno laiha
aktividade ruma nebe grupo sira halao iha
tereno tuir informasaun katak grupo osan
hotu no hein pagamento maka bele kontinua
fali

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E O R D E N A M E N T O
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (LE - 3)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)
LOCATION : URBADAN, SUCO ASUBLI TOHO-LEQUIDOE,AILEU

SUMMARY

NO	ITEM SERVIU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ 1,668.75	2.26%	\$ -	0.00%	\$ 1,668.75	2.26%
2	Class Room Building C	\$ 55,945.00	\$ 29,671.94	40.10%	\$ 7,432.47	10.05%	\$ 37,104.41	50.15%
3	Provisional Sum for Site Works	\$ 5,628.60	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Total Construction Cost		\$ 64,648.60	\$ 31,340.69	42.36%	\$ 7,432.47	10.05%	\$ 38,773.16	52.40%
	Overhead	\$ 6,340.00	\$ 2,185.00	2.95%	\$ -	0.00%	\$ 2,185.00	2.95%
	Contingency	\$ 3,000.00	\$ -	-	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	Grand Total	\$ 73,988.60	\$ 33,525.69	45.31%	\$ 7,432.47	10.05%	\$ 40,958.16	55.36%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Enginheiro Senior da Projeto Edificio no Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/09/2022	Liquidoes, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T AND	1	Maske kalen, plesteran no rangka Plafon monta ona maiibe ekipa ba iha tereno laiha aktividade ruma nebe grupo sira halao iha tereno tuir informasaun katak grupo osan hotu no hein pagamento maka bele kontinua fali	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	28/09/2022	Liquidoes, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU D (ALV - 12)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo komunitario

Data Inspesaun : 14 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Bandudato

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.80143040 Latetude : 125.58728635

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item **kuda kuda no Gording**

Monta Zinc ba uma prototipo C

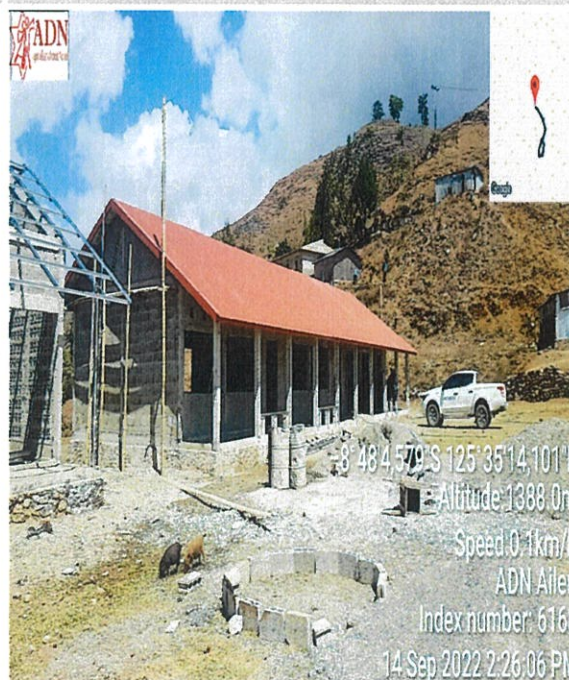



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU D (ALV - 12)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu


: NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
: Grupo komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Plesteran ba Uma**
Prototipo C

Servisu nebe maka grupo halao iha tereno
maka plesteran ba Building protipo C

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

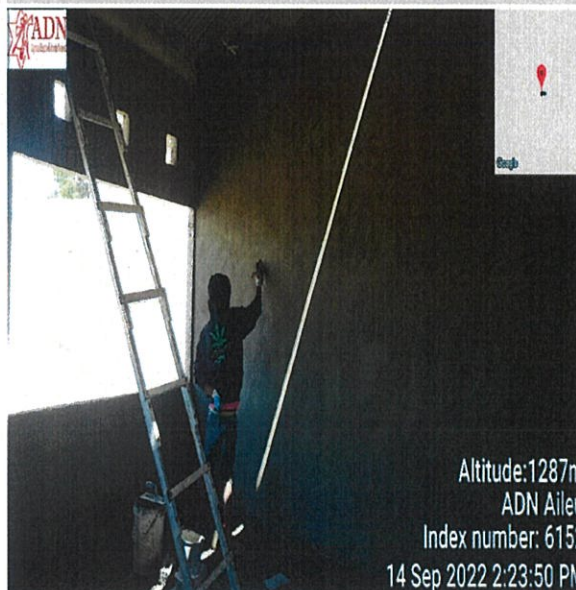

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 12)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : BANDUDATO, AILEU VILA

SUMMARY

NO	ITEM SERVIÇO	VERIFIED BY ADN	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ 1,800.00	1.76%	\$ -	0.00%	\$ 1,800.00	1.76%
2	Class Room Building C	\$ 50,830.97	\$ 26,597.05	25.95%	\$ 4,804.30	4.69%	\$ 31,401.36	30.64%
3	Toilet Building Tb	\$ 25,349.43	\$ 10,706.17	10.45%	\$ 1,084.33	1.06%	\$ 11,790.50	11.50%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 13,449.03	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
5	Provisional Sum for Demolition	\$ 450.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Total Construction Cost		\$ 93,154.43	\$ 39,103.22	38.15%	\$ 5,888.64	5.75%	\$ 44,991.86	43.90%
Overhead		\$ 6,340.00	\$ 2,185.0000	2.13%	\$ -	0.00%	\$ 2,185.00	2.13%
Contingency		\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Grand Total		\$ 102,494.43	\$ 41,288.22	40.28%	\$ 5,888.64	5.75%	\$ 47,176.86	46.03%

prepared by :

Eng. Merinho Cucco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu


Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Engenheiro Senior na Projeto Edificio no
Be e Mos

Approved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controle e
Validação de Qualidade

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB					
Kompanha : Grupo Komunitario					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	10/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T ADN	1
					2
					3
					4
					5
II	10/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5

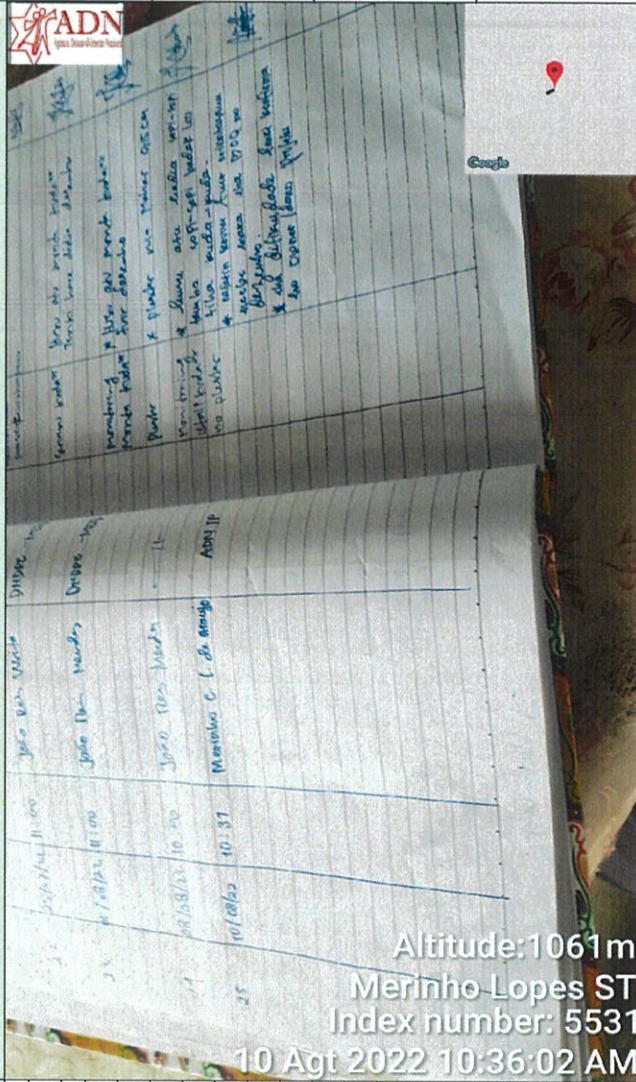

Altitude: 1061m
Merinho Lopes ST
Index number: 5531
10 Aqt 2022 10:36:02 AM

Asinatura



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INAP, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (LE - 4)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTI)
LOCATION : FATUK MARIU, SUCO MANUKASSA -LEQUIDOE,AILEU

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ 1,743.75	2.35%	\$ -	0.00%	\$ 1,743.75	2.35%
2	Class Room Building C	\$ 54,915.20	\$ 28,854.96	38.85%	\$ 8,347.92	11.24%	\$ 37,202.88	50.09%
3	Provisional Sum for Site Works	\$ 6,447.58	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
4	Provisional Sum for Site Demolition	\$ 500.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Total Construction Cost		\$ 64,937.78	\$ 30,598.71	41.19%	\$ 8,347.92	11.24%	\$ 38,946.63	52.43%
Overhead		\$ 6,340.00	\$ 1,660.00	2.23%	\$ -	0.00%	\$ 1,660.00	2.23%
Contingency		\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Grand Total		\$ 74,277.78	\$ 32,258.71	43.43%	\$ 8,347.92	11.24%	\$ 40,606.63	54.67%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Engenheiro Senior na Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

Naran projeto: NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	28/09/2022	Lequidoe, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T AND	1
					2
					3
					4
					5
II	28/09/2022	Lequidoe, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5



ANEXU C1 (Le - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 28 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe, Aileu Suku Manukasa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.


4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Ba projetu ida ne duku ona kalen no tuir
ekipa ADN ba halao monitorizasaun iha
tereno projetu refere la lao tamba grupo nia
orsamento hotu ona no hein pagamento maka
foin bele komesa fali,

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

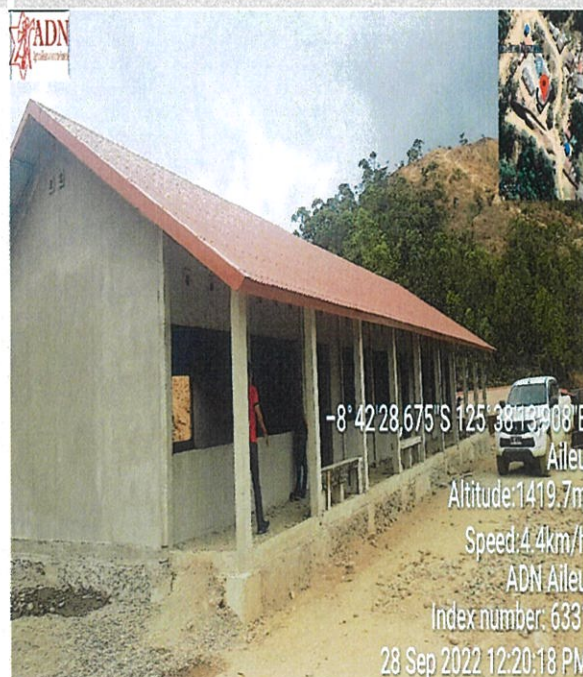



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 4)

Back-up Data


Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Plesteran**

Ba projetu ida ne duku ona kalen no tuir ekipa ADN ba halao monitorizasaun iha tereno projetu refere la lao tamba grupo nia orsamento hotu ona no hein pagamento maka foin bele komesa fali,

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

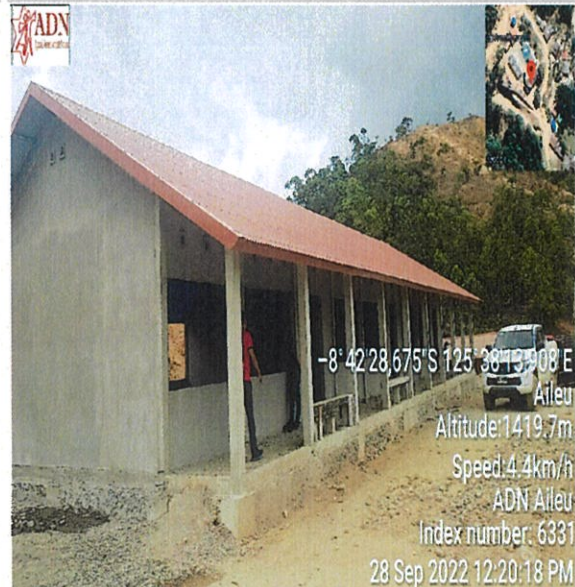

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Plesteran**

Ba projetu ida ne duku ona kalen no tuir ekipa ADN ba halao monitorizasaun iha tereno projetu refere la lao tamba grupo nia orsamento hotu ona no hein pagamento maka foin bele komesa fali,

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C) + TB
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Data Inspesaun : 14 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Suku Liurai (Laclo)

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projetu refere kondisaun parado hela ho
razaun comunidade osan ba eze kuta obra
refere hotu ona no hein pagamento maka foin
bele kontinua fila fali

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C) + TB
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Back Fill Pondasi Toilet**

Projetu refere kondisaun parado hela ho
razaun comunidade osan ba eze kuta obra
refere hotu ona no hein pagamento maka foin
bele kontinua fila fali

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (Av1 - 10)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : LACLO, SUCO LIURAI

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ 1,725.00	1.73%	\$ 300.00	0.30%	\$ 2,025.00	2.03%
2	Class Room Building C	\$ 50,833.58	\$15,639.12	15.70%	\$ 107.12	0.11%	\$ 15,746.24	15.81%
3	Toilet Building Tb	\$ 25,271.72	\$ 4,449.97	4.47%	\$ 587.03	0.59%	\$ 5,037.00	5.06%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 10,876.83	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
5	Provisional Sum for Demolition	\$ 200.00	\$ 200.00	0.20%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.20%
Total Construction Cost		\$ 90,257.13	\$22,014.09	22.10%	\$ 994.15	1.00%	\$ 23,008.24	23.10%
Overhead		\$ 6,340.00	\$ 1,985.00	1.99%	\$ 315.00	0.32%	\$ 2,300.00	2.31%
Contingency		\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Grand Total		\$ 99,597.13	\$23,999.09	24.10%	\$ 1,309.15	1.31%	\$ 25,308.24	25.41%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Enginheiro Senior ba Projeto
Edificio no Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	14/09/2022	Aileu Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T 'ADN	1	Liu husi Monitorzasaun nebe maka ekipa AND halao iha tereno nota katak grupo komuntario PKRIE la halo servisu ruma iha tereno	
					2	Grupo Komunitaria la Servisu Ho Razaun tamba osan laiha ona atu kontinua servisu no hein pagamento maka foin bele servisu	
					3		
					4		
					5		
II	14/09/2022	Aileu Villa, Aileu	Joa dos Reis Mendes	T. MEJD	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXU D (ALV - 15)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 14 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Suku Liurai, Fatubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.


4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Servisu Parado ho Razaun tamba grupo osan
hotu atu executa projetu refere no hein
pagamento segundu maka foin bele continua
fali obra refere

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

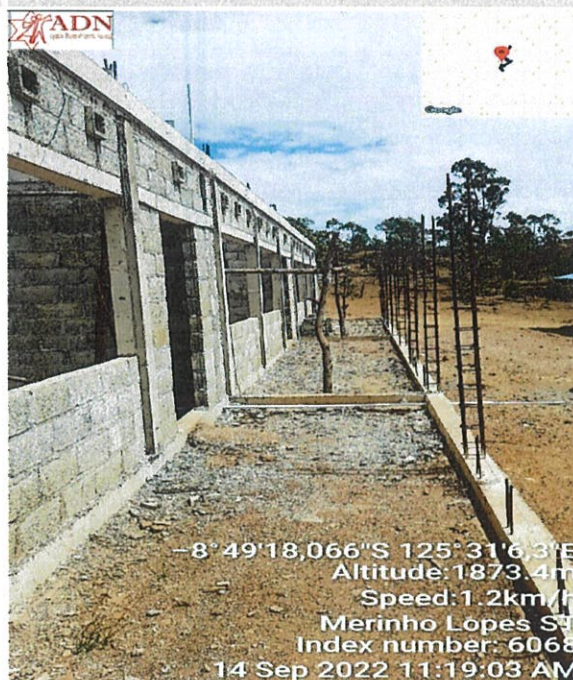



ANEXU D (ALV - 15)

Back-up Data


Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu Parado ho Razaun tamba grupo osan
hotu atu executa projetu refere no hein
pagamento segundu maka foin bele kontinua
fali obra refere


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

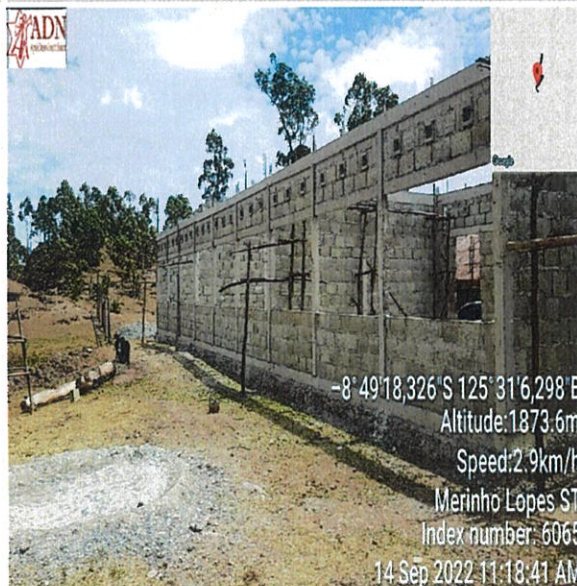

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

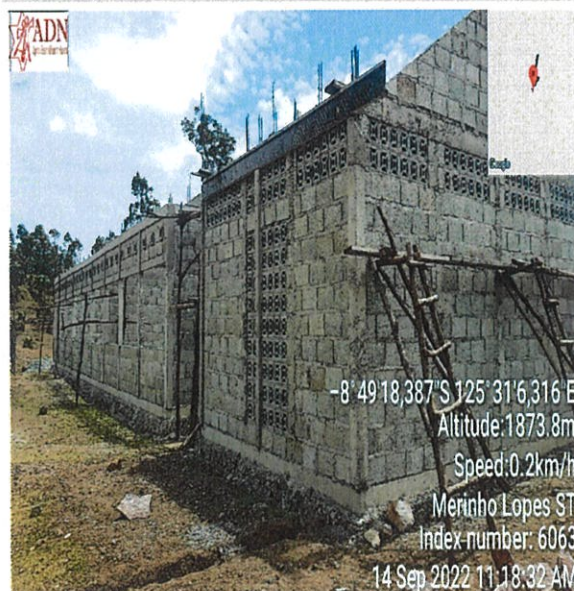



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : FATUBESI, AILEU-VILA

ANEXU C2 (Av1 - 15)

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ 1,800.00	1.77%	\$ -	0.00%	\$ 1,800.00	1.77%
2	Class Room Building C	\$ 51,228.95	\$ 15,011.95	14.80%	\$ -	0.00%	\$ 15,011.95	14.80%
3	Toilet Building Tb	\$ 25,530.78	\$ 9,023.84	8.90%	\$ -	0.00%	\$ 9,023.84	8.90%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 12,234.70	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Total Construction Cost		\$ 92,069.44	\$ 25,835.80	25.48%	\$ -	0.00%	\$ 25,835.80	25.48%
Overhead		\$ 6,340.00	\$ 3,170.00	3.13%	\$ -	0.00%	\$ 3,170.00	3.13%
Contingency		\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Grand Total		\$ 101,409.44	\$ 29,005.80	28.60%	\$ -	0.00%	\$ 29,005.80	28.60%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Engenheiro Senior da Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (RE - 1)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesau : 13 Setembro 2022

Fatin Inspesau : Remexio , tulataqueu, Fatubutik

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item **Plesteran**

Liu husi monotirizasaun nebe maka ekipa
ADN halo iha tereno servisu nebe grupo
halao maka plesteran interior konstrusaun
nian

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

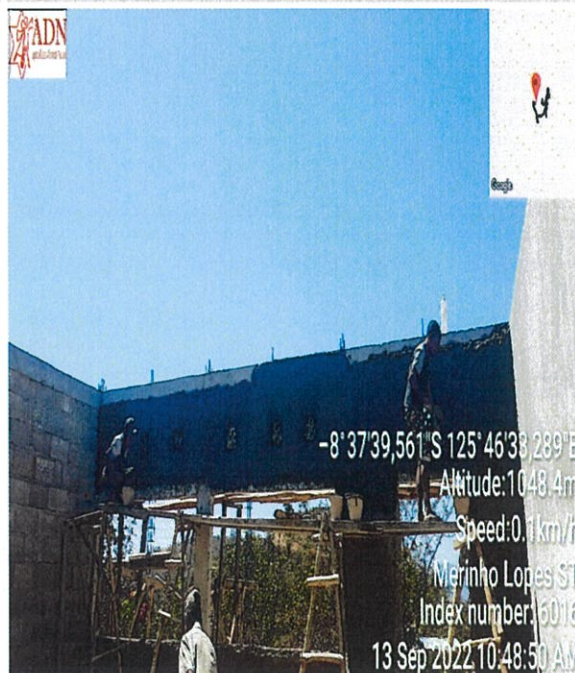



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (RE - 1)

Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **plesteran**

Liu husi monotirizasaun nebe maka ekipa
ADN halo iha tereno servisu nebe grupo
halao maka plesteran interior konstrusaun
nian

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

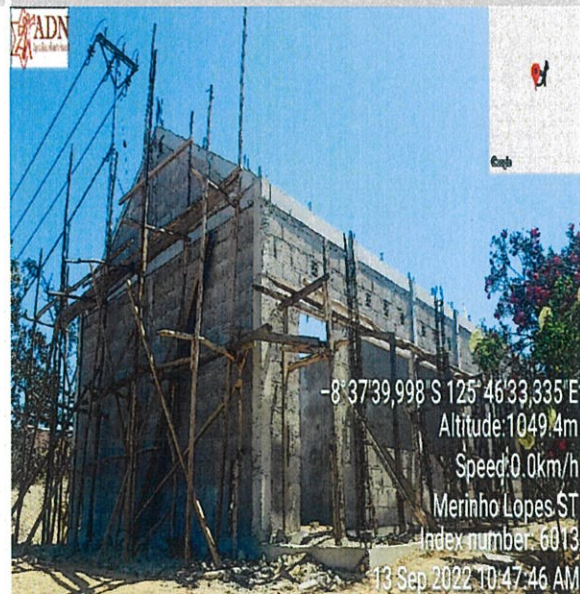

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PIANO
E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Konstrusaun Salas de Aulas 3

Kompanha : Grupo Kominutario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura
I	13/10/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T 'ADN	1			
II	13/10/2022	Aileu, Aileu Villa	Joao dos Reis Mendes	MEJD - DNDPE	2			
IV					3			
					4			
					5			
					1			
V					2			
					3			
					4			
					5			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (RE - 1)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS
LOCATIO : FATUBUTIK, SUCO TULATAQUEU, REMIXIO- AILEU

SUMMARY

NO	ITEM SERVIU	VERIFIED BY ADN	PREVIOUS BILLING			THIS BILLING			UP TO DATE	
			AMOUNT	WEIGHT %		AMOUNT	WEIGHT %		AMOUNT	WEIGHT
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ 1,350.00	1.75%		\$ 775.00	1.00%		\$ 2,125.00	2.75%
2	Class Room Building C	\$ 56,904.27	\$ 13,292.08	17.21%		\$ 6,633.54	8.59%		\$ 19,925.61	25.79%
3	Provisional Sum for Site Works	\$ 7,933.38	\$ -	0.00%			0.00%		\$ -	0.00%
	Total Construction Cost	\$ 67,912.65	\$ 14,642.08	18.95%		\$ 7,408.54	9.59%		\$ 22,050.61	28.54%
	Overhead	\$ 6,340.00	\$ -	0.00%		\$ 2,139.50	2.77%		\$ 2,139.50	2.77%
	Contingency	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%		\$ -	0.00%		\$ -	0.00%
	Grand Total	\$ 77,252.65	\$ 14,642.08	18.95%		\$ 9,548.04	12.36%		\$ 24,190.11	31.31%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio no Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao de Qualidade



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU

No. kontratu : NCB: 01/MEJD/DNA/2021

Data Inspesaun : 22 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Aisirimou

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu installa Keramik

Instala Keramik ba iha Prototipo C



-8° 43'15,62" S 125° 34'14,72" E
Aileu
Altitude: 984.7m
Speed: 0.0km/h
ADN Aileu
Index number: 6261
22 Sep 2022 10:36:35 AM



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU
No. kontratu : NCB: 01/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Instala Arus**
Odamatan ba Escritorio

Instala Arus Odamatan ba Escritorio

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU
No. kontratu : NCB: 01/MEJD/DNA/2021

Sketch Item servisu **Instala Plafon**

Instala Plafon ba Prototipo C



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ANEXU C2 (ALV - 7)

TITULO DO PROJETO: CONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO IA
TECHNICA VOCACIONAL

FATIN PROJETO : AILEU

DONO DO PROJETO : MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO

NO	WORK DESCRIPTION	AMOUNT USD	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		UP TO DATE	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT
I	Preliminaries Works	\$ 2,925.00	\$ 2,925.00	1.71%	\$ -	0.00%	\$ 2,925.00	1.71%
II	Class Room Building C	\$ 56,741.73	\$ 41,294.90	24.14%	\$ 4,110.10	2.40%	\$ 45,405.00	26.54%
III	Teacher Office	\$ 83,864.91	\$ 39,511.70	23.10%	\$ 11,014.24	6.44%	\$ 50,525.94	29.53%
V	Provisional Sum for Site Works	\$ 5,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 148,531.64	\$ 83,731.59	48.94%	\$ 15,124.34	8.84%	\$ 98,855.94	57.78%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 14,853.16	\$ 8,373.16	4.89%	\$ 1,512.43	0.88%	\$ 9,885.59	5.78%
C	OVERHEAD	\$ 4,340.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 3,354.50	\$ 1,842.10	1.08%	\$ 332.74	0.19%	\$ 2,174.83	1.27%
E	TOTAL COST (A+B+C+D)	\$ 171,079.30	\$ 93,946.85	54.91%	\$ 16,969.51	9.92%	\$ 110,916.36	64.83%

prepared by :

Eng. Merinho Cudo Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior do Projeto Edificio no Be'e Mos

Approved by :

Eng. Emerencia da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao de Qualidade

Naran projeto : Konstrusaun Salas de Aulas 3 + Eskritorio ESTV

Kompanha : Mortiles Unip.Lda

No	Data inspesaan	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	22/09/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T'ADN	1 2 3 4 5
II	22/09/2022	Aileu, Aileu Villa	Joao dos Reis Mendes	MEJD - DNDPE	1 2 3 4 5
III	22/09/2022	Aileu, Aileu Villa	Rodolfo dos Reis Mendes	T. Companhia	1 2 3 4 5
IV					1 2 3 4 5
V					1 2 3 4 5



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (AVL - 8)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Escritorio
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 07 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu - Villa Selo-Craik

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Servisu iha tereno la lao ho razaun tamba
badaen sira sei ba koa hare ho nune
aktividade iha tereno la Lao no ekipa ADN
update deit maka item nebe antes Grupo halo
ona

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

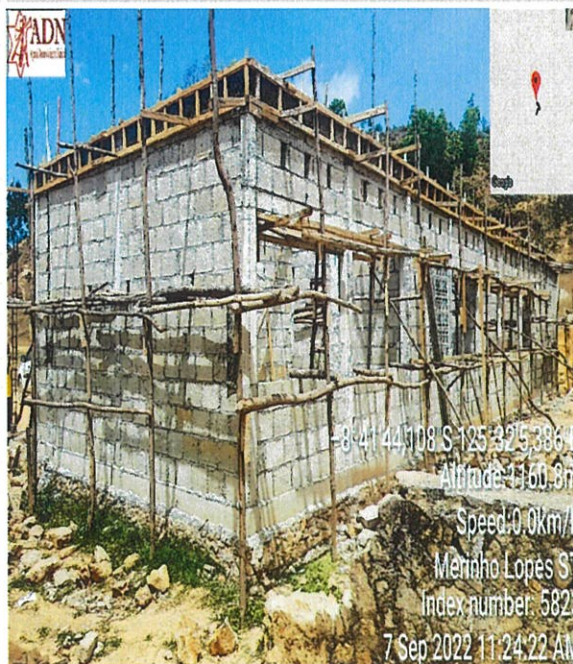




ANEXU C1 (AVL - 8)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Escritorio
No. kontratu : Grupo Komunitario

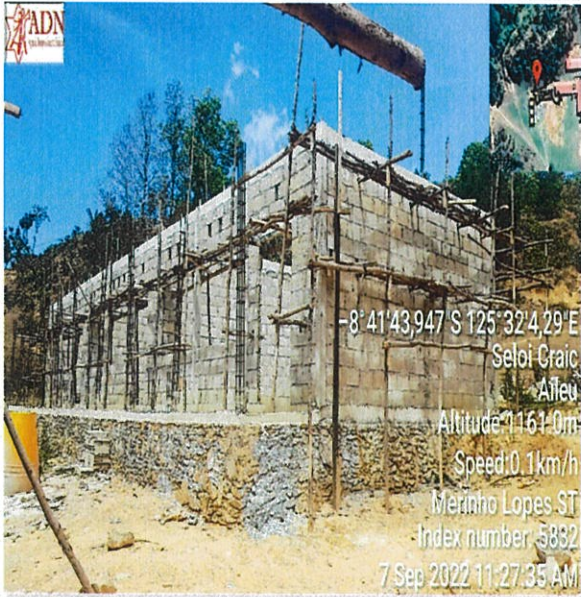Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Servisu is tereno la lao ho razaun tamba badaen sira sei ba koa hare ho nune aktividade iha tereno la Lao no ekipa AND update deit maka item nebe antes Grupo halo ona	 -8 41'43,947 S 125 32'4,29 E Selo Craic Aileu Altitude: 1161.0m Speed: 0.1km/h Merinho Lopes ST Index number: 5882 7 Sep 2022 11:27:35 AM
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (Av1 - 8)
PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+ESCRITORIO
LOCATION : SELOI-CRAIK

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ 1,900.00	1.25%	\$ -	0.00%	\$ 1,900.00	1.25%
2	Class Room Building C	\$ 50,575.14	\$ 14,851.27	9.77%	\$ 140.33	0.09%	\$ 14,991.60	9.86%
3	Teacher Office	\$ 67,964.02	\$ 21,610.10	14.21%	\$ 335.53	0.22%	\$ 21,945.63	14.43%
4	Provesional Sum for Site Works	\$ 21,089.95	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Total Construction Cost		\$ 142,704.11	\$ 38,361.37	25.23%	\$ 475.86	0.31%	\$ 38,837.23	25.54%
Overhead		\$ 6,340.00	\$ 2,085.00	1.37%	\$ -	0.00%	\$ 2,085.00	1.37%
Contingency		\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Grand Total		\$ 152,044.11	\$ 40,446.37	26.60%	\$ 475.86	0.31%	\$ 40,922.23	26.91%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Tekrik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Enginheiro Senior ba Projeto Edificio
no Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN						
Naran projeto : Konstrusaun Salas de Aulas 3 + Eskritorio ESTV						
Kompanha : Grupo Kominutario						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	7/09/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T 'ADN	1	Aktividade iha tereno la lao ho razaun grupo orsamento hotu ho nunee hein pagamento tuir mai mak foin bele rekomenda
					2	
					3	
					4	
					5	
II	7/09/2022	Aileu, Aileu Villa	Joao dos Reis Mendes	MEJD - DNDPE	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
IV					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
V					1	
					2	
					3	
					4	
					5	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 08 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta, Remixio-Aileu

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.


4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item **plesteran ba iha Prototipo C**

Servisu nebe maka grupo Halao iha tereno
mak halao plesteran volume total **125,7 m2**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

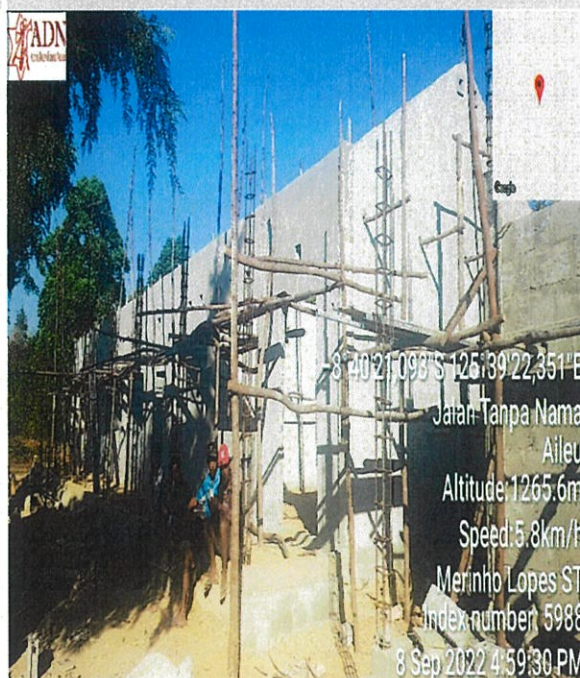



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **plesteran** ba iha
Prototipo C

Servisu nebe maka grupo Halao iha tereno
mak halao plesteran volume total **125,7 m²**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

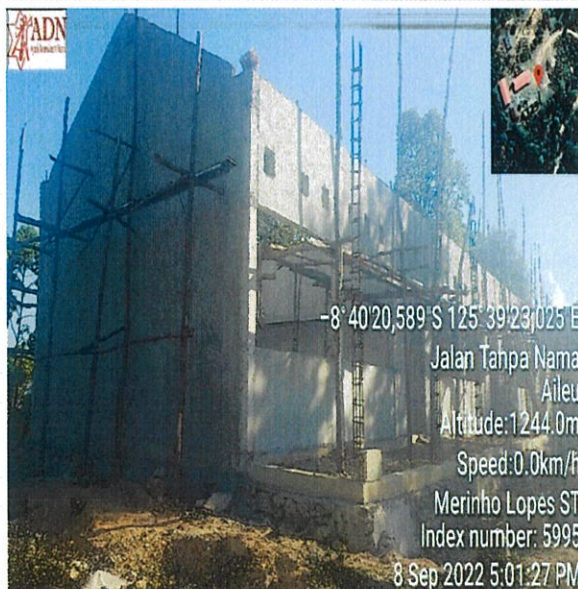

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch Item servisu

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (RE - 2)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : MAUMETA, REMIXIO-AILEU

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ 1,350.00	1.26%	\$ -	0.00%	\$ 1,350.00	1.26%
2	Class Room Building C	\$ 55,454.21	\$ 16,821.63	15.74%	\$ 1,679.81	1.57%	\$ 18,501.44	17.32%
3	Toilet Building Tb	\$ 26,626.00	\$ 5,148.25	4.82%	\$ 3,043.80	2.85%	\$ 8,192.06	7.67%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 11,927.26	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
5	Provisional Sum for Demolition	\$ 425.00	\$ 425.00	0.40%	\$ -	0.00%	\$ 425.00	0.40%
Total Construction Cost		\$ 97,507.46	\$ 23,744.88	22.22%	\$ 4,723.61	4.42%	\$ 28,468.49	26.64%
Overhead		\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 1,914.50	1.79%	\$ 1,914.50	1.79%
Contingency		\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Grand Total		\$ 106,847.46	\$ 23,744.88	22.22%	\$ 6,638.11	6.21%	\$ 30,382.99	28.44%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu


Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Jerônimo
Engenheiro Senior na Projeto Edificio no
Be e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					Asinatura
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB					
Kompanha : Grupo Komunitario					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	8/09/2022	Remexio, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T AND	1
					2
					3
					4
					5
II	8/09/2022	Remexio, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5

8 Sep 2022 5:07:35 PM



ANEXU D (ALV - 13)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 14 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Lausi

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

4.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Projetu refere la servisu ho razaun tamba Grupo sira nia orsamento atu executa obra refere laiha ona no Hein ba Pagamento 2 mak foin bele Kontinua	

ANEXU D (ALV - 13)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere la servisu ho razaun tamba
Grupo sira nia orsamento atu executa obra
refere laiha ona no Hein ba Pagamento 2 mak
foin bele Kontinua

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere la servisu ho razaun tamba
Grupo sira nia orsamento atu executa obra
refere laiha ona no Hein ba Pagamento 2 mak
foin bele Kontinua

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

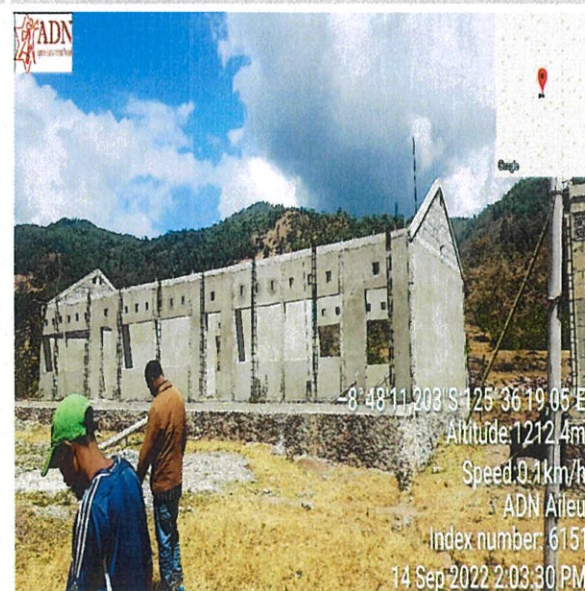



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 13)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : LAUSI, DARAHAE, AILEU

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ 2,293.75	2.30%	\$ -	0.00%	\$ 2,293.75	2.30%
2	Class Room Building C	\$ 50,833.58	\$ 19,140.92	19.19%	\$ -	0.00%	\$ 19,140.92	19.19%
3	Toilet Building Tb	\$ 25,268.20	\$ 5,520.69	5.53%	\$ -	0.00%	\$ 5,520.69	5.53%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 11,253.44	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	Total Construction Cost	\$ 90,430.22	\$ 26,955.36	27.02%	\$ -	0.00%	\$ 26,955.36	27.02%
	Overhead	\$ 6,340.00	\$ 1,560.00	1.56%	\$ 579.50	0.58%	\$ 2,139.50	2.14%
	Contingency	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	Grand Total	\$ 99,770.22	\$ 28,515.36	28.58%	\$ 579.50	0.58%	\$ 29,094.86	29.16%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de
Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Ierpnimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



ADN, LP.

Agência de
Planejamento
Nacional, Instituto Nacional de
Estatística e Informação

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN


Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	14/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T ADN	1	Projetu refere la servisu ho razaun tamba Grupo sira nia orsamento atu executa obra refere laiha ona no Hein ba Pagamento 2 mak foin bele Kontinua	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	14/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

[illegible]

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																		
Naran Eng.	Merinho Cuco L. de Araujo						2022																																		
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																								
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Setembro																														OBS			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																ON GOING		
							Actual																																		
	16	New Construction Of Fence At CSI Aileu	BEHALE INTERPRICE	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																		
							Actual																																		
REMEXIO (RE)	1	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	ON GOING	
							Actual																																		
	2	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	ON GOING	
							Actual																																		
LEQUIDOE (LQ)	1	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Fatuberli, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	ON GOING	
							Actual																																		
	2	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	ON GOING	
							Actual																																		
	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Urdadan	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	ON GOING	
							Actual																																		
	4	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																		ON GOING
							Actual																																		
TOTAL PROJETO ON-GOING																																									

Note:
 Planu Periode inspesaun iha tereinu
 Implementa Planu Periode Inspensaun iha T
 Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili
 Inspesaun Proceso Pagamentu

Prepara Husi:

(Merinho Cuco L. de Araujo)
Eng. Municipiu Aileu

Sertifika Husi:

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade


Aprova Husi:

(Eng. Janurio Maia Gutierrez)
Adjunto Director Executivo

[illegible]

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VULGO GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																		
Naran Eng.	Merinho Cuco L. de Araujo						2022																																		
Municipio	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																								
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Setembro																														OBS			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																		
							Actual																																		
	16	New Construction Of Fence At CSI Aileu	BEHALE INTERPRICE	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																		
							Actual																																		
REMEXIO (RE)	1	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																		
							Actual																																		
	2	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																		
							Actual																																		
LEQUIDOE (LQ)	1	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Fatuberik, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																		
							Actual																																		
	2	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																		
							Actual																																		
	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Urdadan	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																		
							Actual																																		
	4	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																		
							Actual																																		
TOTAL PROJETO ON-GOING																																									

Note:

 Planu Periode inspesaun iha tercinu
  Implementa Planu Periode Inspensaun iha T
  Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili
  Inspesaun Proceso Pagamentu

Prepara Husi:


(Merinho Cuco L. de Araujo)
Eng. Municipiu Aileu

Sertifika Husi:


(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade

Aprova Husi:


(Eng. Janurio Maia Gutierrez)
Adjunto Director Executivo



ANEXU C1 (ALV – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Roads Rehabilitation Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000
- 8+000, Aileu Municipality

No. kontratu : NCB / 020 / MOP – 2019

Data Inspesaun : 02-09-2022

;

Fatin Inspesaun : Selo Malere - Selo Karaik
Koordinadas :

Start Point : Long : S. -8.70428, Latetude: E. 125.52651

End Point : Long : S. -8.71108, Latetude: E. 125.53455

Naran Inspector : 1. Eng. Rui Lopes

2. Eng. Celvio Justino Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Excavation and disposal - soft soil

Fill and compact

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Excavation and disposal - soft soil



Fill and compact



ANEXU C1 (ALV – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Roads Rehabilitation Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000
- 8+000, Aileu Municipality
No. kontratu : NCB / 020 / MOP – 2019

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Stone masonry – finished

Stone masonry – finished

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Stone masonry – finished



Stone masonry – finished





ANEXU C1 (ALV – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Roads Rehabilitation Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000
- 8+000, Aileu Municipality
No kontratu : NCR / 020 / MOP – 2019

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Cement concrete - structural concrete M20

Cement concrete - structural concrete M20



Gabion

Gabion



 REPUBLICA DE TIMOR-LESTE MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público						INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : R4D Rural Roads Rehabilitation Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000 - 8+000, Aileu Municipality Kompanha : Caviq Unip. Lda JV Sunnines Unip. Ld				
Asinatura										
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN										
Inspeksaun pagamento ba IPC No. 03 iha tereno, hamutuk ho tekniko Compania Caviq Unipessoal Lda in joint venture with Sunnines Unip. Lda.										
Halo pagamento baseia ba resultado inspeksaun hamutuk iha tereno										
Husu kompania atu kontinua fali servico iha tereno										



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 2)

Suko Selo Malere and Selo Karnik

Roads Name : Taliforleu - Kolihoho
Contractor : Caviq Unip Lda JV Summies Unip Lda
Contract No : NCB/020/MOP-2019
Contract Value : \$ 717,065.23

Posto Administrative, Aileu Vila

Pay item No.	DESCRIPTION	Original BoQ		Revised BoQ (VO-1)		Progress Monitoring Fulan Abril 2022		Progress to Date (ADN, I.P)			
		CONTRACT AMOUNT (\$)	BILLED %	CONTRACT AMOUNT (\$)	BILLED %	COST \$	BILLED %	9/02/2022		Progress Phisic Up To Date	
								COST \$	BILLED %	COST \$	BILLED %
R-01	General	\$ 9,430.00	1.32%	\$ 6,250.00	0.87%	\$ 4,917.86	0.69%	\$ 160.71	0.02%	\$ 5,078.57	0.71%
R-03	Earth work	\$ 69,556.06	9.70%	\$ 127,145.78	17.73%	\$ 76,315.29	10.64%	\$ 15,452.78	2.16%	\$ 91,768.07	12.80%
R-05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 11,468.93	1.60%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structures	\$ 483,797.46	67.47%	\$ 462,690.87	64.53%	\$ 206,697.58	28.83%	\$ 53,952.52	7.52%	\$ 260,650.10	36.35%
R-10	Dayworks	\$ 260.00	0.04%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 9,554.40	1.33%	\$ 9,554.40	1.33%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 1,000.00	0.14%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)	\$ 585,066.86	81.59%	\$ 605,641.05	84.46%	\$ 287,950.72	40%	\$ 69,566.01	9.70%	\$ 357,496.74	49.86%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 58,506.69	8.16%	\$ 60,564.10	8.45%	\$ 28,793.07	4.02%	\$ 6,956.60	0.97%	\$ 35,749.67	4.99%
C	General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 59,430.61	8.29%	\$ 36,799.00	5.13%	\$ 20,339.00	2.84%	\$ 10,686.00	1.49%	\$ 31,025.00	4.33%
D	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 14,060.08	1.96%	\$ 14,060.08	1.96%	\$ 6,741.26	0.94%	\$ 1,744.17	0.24%	\$ 8,485.43	1.18%
E	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 717,064.23	100.00%	\$ 717,064.23	100.00%	\$ 343,804.05	47.95%	\$ 88,952.79	12.41%	\$ 432,756.84	60.35%

Prepara Husi :

(Eng. Celso J. Alves)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Prepara Husi :

(Eng. Ady Lopes)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Verifica Husi :

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Sertifica Husi :

(Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

ANEXU C1 (AVL - 26)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Periodik Maintenance Kirlalo - Laclo Chainage Star
0+000 - 11+300 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-W-NCB-21025

Data Inspesaun : 14 / 09 / 2022

Fatin Inspesaun : Kirlalo Laclo – Aileu Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.81757), Latetude : (E.125.49602)

End Point : Long : (S. 8.81747), Latetude : (E. 125.49592)

Naran Inspector : 1. Eng. Rui Lopes
2. Eng. Celvio J. Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Cement concrete pavement - plum concrete

Naruk : 50 m



Luan : 1.75 m

Mahar : 0.12 m

Total Volume : 10.50 m³

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Cement concrete pavement - plum concrete

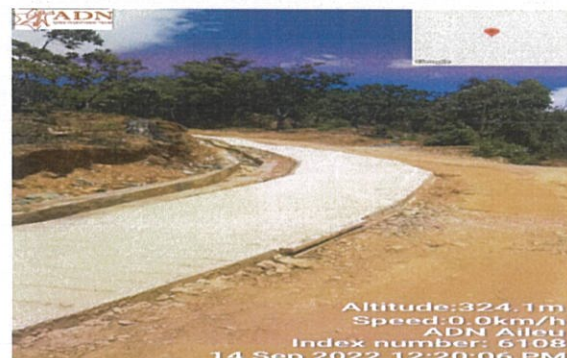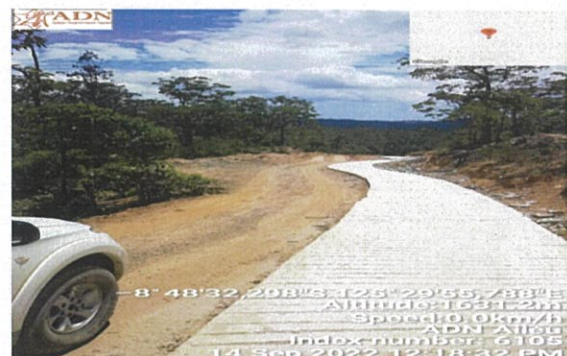

ANEXU C1 (AVL - 26)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Periodik Maintenance Kirlalo - Laclo Chainage Star
0+000 - 11+300 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-W-NCB-21025

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Excavation and disposal - soft soil

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Excavation and disposal - soft soil




Stone masonry - finished

Stone masonry - finished





INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Kirlalo - Lacro Chainage 0+000 - 11+300, Aileu Municipality					
Kompanha : Fikikay Unip. Lda					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	14/09/2022	Aileu / Aileu Villa	Rui Lopes & Celvio J. Alves	Eng. ITI ADN Aileu	
Husu kompania atu halo tuir rekomendasaun ou observasaun nebe orienta ona no husu kompania atu kontinua nafatin servico iha tereno no halo tuir nafatin Dezeno, BoQ no Spek.					Asinatura
					 



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (AVL - 26)

Summary

Roads Name : Kirielo - Lacio
Contractor : Fikikay Unip. Lda
Contract No. : MPW - W - 210147
Contract Value : \$ 339,829.64

Pay item No.	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS PREVIOUS JULY 2022		PROGRESS MONITORING AUGUST 2022		PROGRESS MONITORING PROJECT	
		CONTRACT AMOUNT (\$)	RELATIVE WEIGHTAGE %	AMOUNT (\$)	%	AMOUNT (\$)	%	Progres Phisic Up To Date	AMOUNT (\$)
R-01	General	\$ 6,875.00	2.02%	\$ 3,125.00	0.92%	\$ -	0.00%	\$ 3,125.00	0.92%
R-03	Earth work	\$ 73,511.02	21.63%	\$ 72,849.17	21.44%	\$ 165.20	0.05%	\$ 73,014.37	21.49%
R-05	Sub-base, Base and Pavament	\$ 60,398.77	17.77%	\$ 19,907.29	5.86%	\$ -	0.00%	\$ 19,907.29	5.86%
R-08	Structures	\$ 120,900.85	35.58%	\$ 83,019.47	24.43%	\$ 1,897.51	0.56%	\$ 84,916.98	24.99%
R-10	Dayworks	\$ 140.00	0.04%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 20,570.80	6.05%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 250.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R-11+R-15)	\$ 282,646.44	83.17%	\$ 178,900.92	52.64%	\$ 2,062.71	0.61%	\$ 180,963.63	53.25%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 28,264.64	8.32%	\$ 17,890.09	5.26%	\$ 206.27	0.06%	\$ 18,096.36	5.33%
C	General Items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 22,255.23	6.55%	\$ 16,377.00	4.82%	\$ -	0.00%	\$ 16,377.00	4.82%
D	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 6,663.33	1.96%	\$ 4,263.36	1.25%	\$ 45.38	0.01%	\$ 4,308.74	1.27%
E	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 339,829.64	100.00%	\$ 217,431.37	63.98%	\$ 2,314.36	0.68%	\$ 219,745.74	64.56%

Prepara Husi :

(Eng. Celvino J. Alves)

Prepara Husi :

(Eng Rui Lopes)

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas)

Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

ANEXU C1 (ALV – 30)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000

No. kontratu : RT / 139 / MOP - 2021

Data Inspesaun : 07 – 09 - 2022

Fatin Inspesaun : Seleoi Kraik - Halmate

Koordinadas :

Start Point : Long : S. -8.70117, Latetude: E. 125.53802

End Point : Long : S. , Latetude: E. 125.....

Naran Inspector : 1. Eng. Rui Lopes


2. Eng. Celvio Justino Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Kompania halo hela servisu excavaun iha site

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

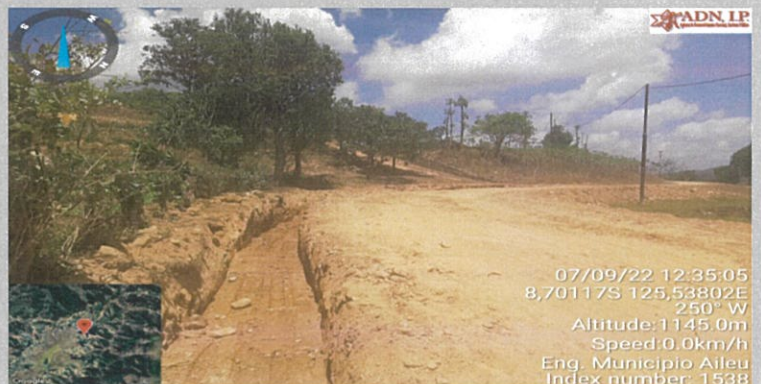

ANEXU C1 (ALV – 31)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 2+000-5+000**

No. kontratu : **RT / 090 / MOP - 2021**

Data Inspesaun : **07 – 09 - 2022**

Fatin Inspesaun : **Seleoi Kraik - Selo Halmate**

Koordinadas :

Start Point : Long : S. 8.70731, Latetude: E. 125.53712

End Point : Long : S. 8.71511, Latetude: E. 125.51614

Naran Inspector : **1. Eng. Rui Lopes**


2. Eng. Celvio Justino Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Kompania halo hela servico excavaun no
atero hela material graver iha site

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

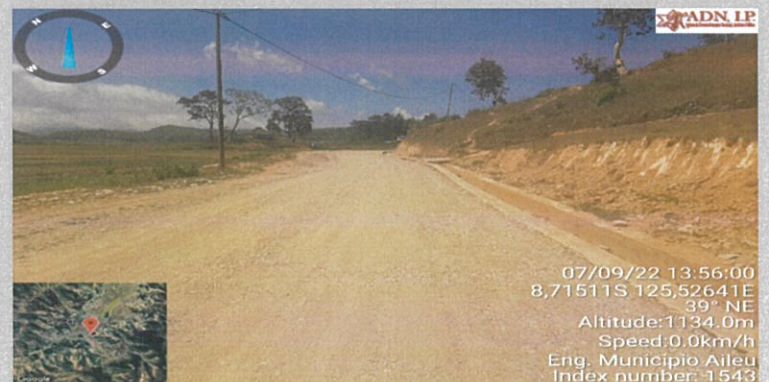

ANEXU C1 (ALV – 32)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu-kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 5+000-8+000**

No. kontratu : **RT / 091 / MOP - 2021**

Data Inspesaun : **07 – 09 - 2022**

Fatin Inspesaun : **Seleoi Kraik - Selo Halmate**

Koordinadas :

Start Point : Long : S. 8.70731, Latetude: E. 125.53712

End Point : Long : S. 8.70838, Latetude: E. 125.52354

Naran Inspector : **1. Eng. Rui Lopes**



2. Eng. Celvio Justino Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Kompania halo hela servico excavasaun no
atero hela material graver iha site

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

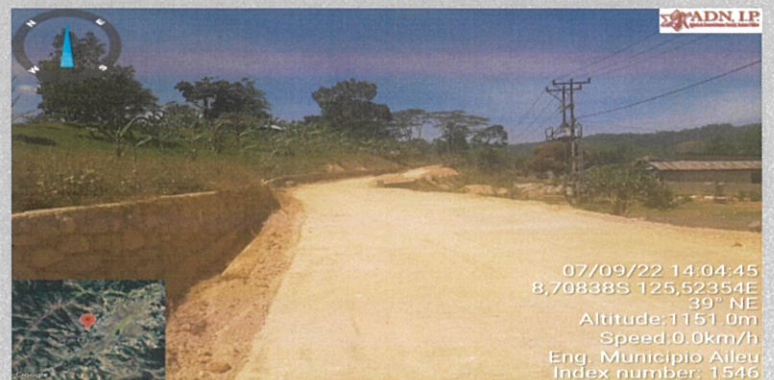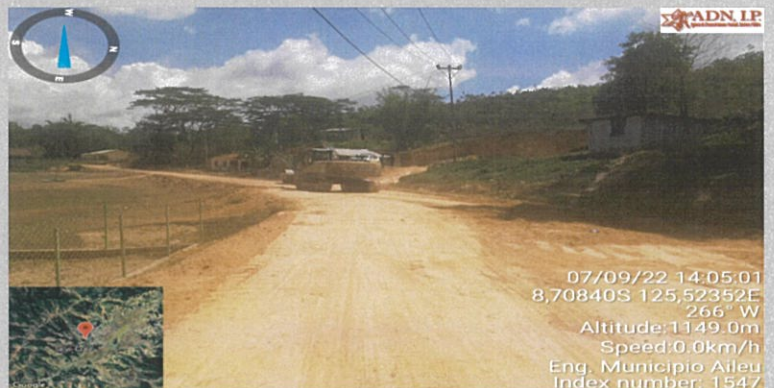

ANEXU C1 (ALV – 33)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Estrada Rural, seloi Kraik- Halmate, Aileu (3.5Km)

No. kontratu : RT / 092 / MOP - 2021

Data Inspesaun : 07 – 09 - 2022

Fatin Inspesaun : Seleoi Kraik - Halmate

Koordinadas :

Start Point : Long : S. -8.718752, Latetude: E. 125.52323

End Point : Long : S. , Latetude: E. 125.....

Naran Inspector : 1. Eng. Rui Lopes

2. Eng. Celvio Justino Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Kompania halo hela servico excavaun no
stoke hela material iha site

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (LE - 34)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi- Dairlouta Chainage
0+000 - 5+000 Aileu Municipality

No. kontratu : RT/093/MOP-2021

Data Inspesaun : 28 / 09 / 2022

Fatin Inspesaun : Fahisoi – Fadabloko, Hautoho-Liquica, Lequidoe

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.69148), Latetude : (E.125.63555)

End Point : Long : (S. 8.68859), Latetude : (E. 125.69591)

Naran Inspector : 1. Eng. Celvio J. Alves



2. Eng. Rui Lopes

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Cement concrete pavement - plum concrete

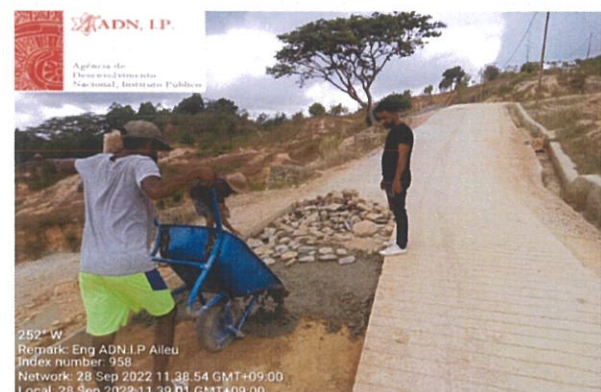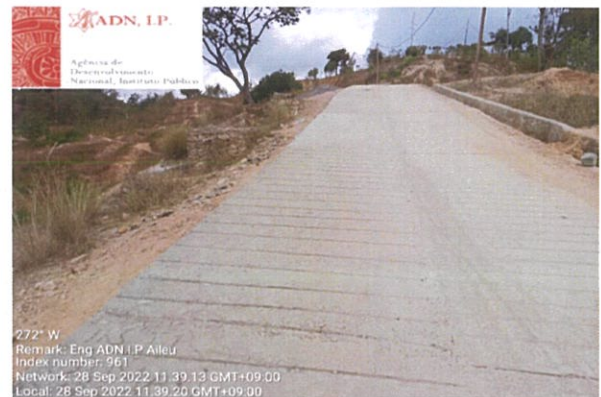

ANEXU C1 (RE - 50)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 - 10+400 Dili & Aileu Municipality / 162

No. kontratu : MPW.W-1900081

Data Inspesaun : 21 / 09 / 2022

Fatin Inspesaun : Hera - Liurai

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.53766), Latetude : (E.125.69851)

End Point : Long : (S. 8.58575), Latetude : (E. 125.69991)



Naran Inspector : Eng. Rui Lopes
Eng. Celvio J. Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Kompania lahalo atifidade servico fisik iha
tereo

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

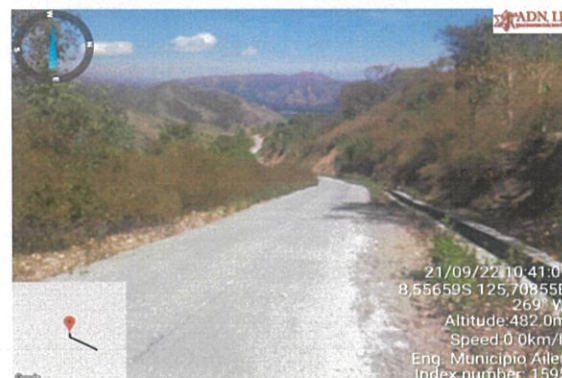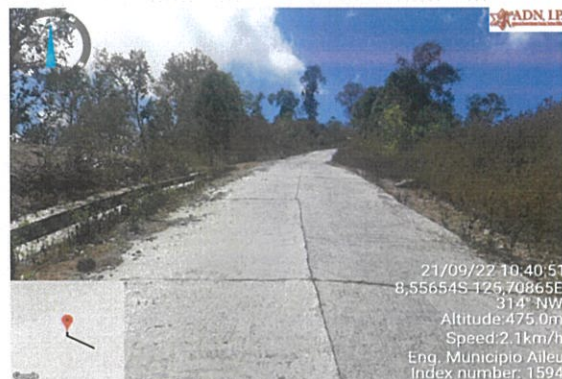

ANEXU C1 (RE – 51)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Rehabilitation of Remexio to Laclo Sta 0+000-20+000 Package
I Aileu Municipality

No. kontratu : SSS / 139 / MOPTC - 2017

Data Inspesaun : 13 – 09 - 2022

Fatin Inspesaun : Remexio

Koordinadas :

Start Point : Long : S. -8.61182, Latetude: E. 125.66034

End Point : Long : S. -8.61741, Latetude: E. 125.76524

Naran Inspector : 1. Eng. Rui Lopes

2. Eng. Celvio Justino Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Subgrade Preparation (Common Material)

Stone Masonry Wall

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Subgrade Preparation (Common Material)



Stone Masonry Wall





ANEXU C1 (RE – 52)

Back-up Data

Naran Projeto : Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu
Municipality

No. kontratu : MPW-W-210068

Data Inspesaun : 21 / 09 / 2022

Fatin Inspesaun : Hera - Liurai

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.557405), Latetude : (E.125.709941)

End Point : Long : (S. 8.562408), Latetude : (E. 125.715361)

Naran Inspector : Rui Lopes

: Celvio J. Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Cement concrete
pavement - plum concrete

Naruk : 350.00 m

Luan : 4.00 m.12


Mahar : 0.12 m

= 168.00 m³

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Cement concrete pavement - plum concrete

Naruk : 350.00 m

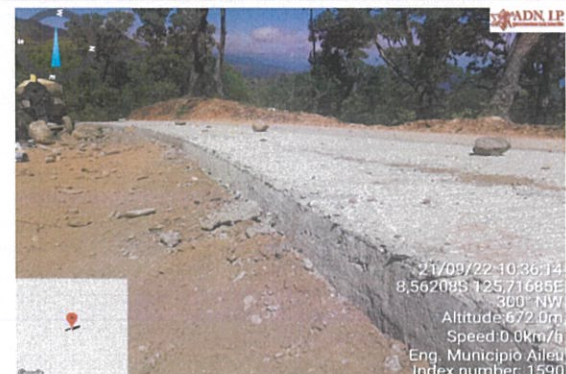




MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU D (RE - 52)

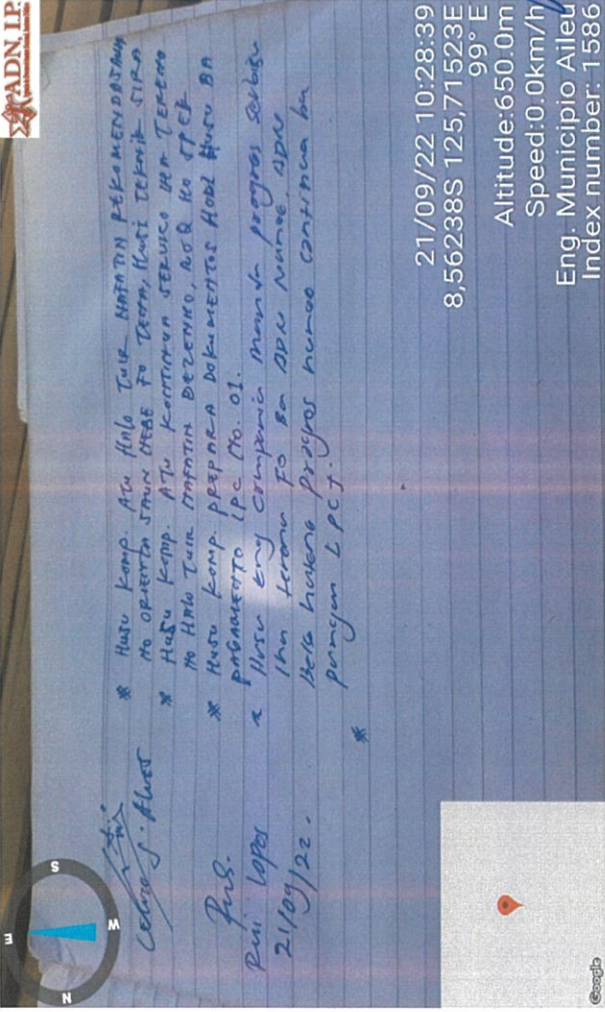INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality					
Kompanha : Lonacca Unip.Lda					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	21/09/2022	Aileu / Remexio, Liurai	Rui Lopes & Celvio J. Alves	Eng. ITI ADN Aileu	
					Asinatura

ANEXU C2 (Re - 52)

NAME OF PROJECT
: SPOT IMPROVEMENT HERA - LIURAI STAR 4+00 - 10+400 DILI
LOCATION OF PROJECT
: HERA - LIURAI, DILI - AILEU
NAME OF CONTRACTOR
: LONACCA UNIPessoal LDA



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VULGARIZADO CONSTITUCIONAL



Backup Data

ITEM NO.	ITEM DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS PREVIOUS AUGUST 2022		PROGRESS MONITORING SEPTEMBER 2022		PROGRESS MONITORING PROJECT		REMARKS
		Amount (USD)	% Billed	Cost (US)	% Billed	Cost (US)	% Billed	Progres Phisic Up To Date		
1	General	\$ 1,780.00	0.79%	\$ 850.00	0.38%	\$ -	0.00%	\$ 850.00	0.38%	
2	Drainage	\$ 44.00	0.02%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
3	Earth work	\$ 9,319.22	4.13%	\$ 254.00	0.11%	\$ -	0.00%	\$ 254.00	0.11%	
4	Sub-base, Base and Pavement	\$ 1,998.38	0.89%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
5	Structures	\$ 148,158.85	65.64%	\$ 38,437.52	17.03%	\$ 21,991.20	9.74%	\$ 60,428.72	26.77%	
6	Dayworks	\$ 182.00	0.08%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
7	Routine maintenance	\$ 7,458.00	3.30%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
8	Provisional sum	\$ 2,000.00	0.89%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
9	Security	\$ 1,440.00	0.64%	\$ 360.00	0.16%	\$ -	0.00%	\$ 360.00	0.16%	
10	Project team	\$ 14,820.00	6.57%	\$ 2,970.00	1.32%	\$ -	0.00%	\$ 2,970.00	1.32%	
11	Safety and protection	\$ 5,249.50	2.33%	\$ 2,229.75	0.99%	\$ -	0.00%	\$ 2,229.75	0.99%	
12	Meetings	\$ 120.00	0.05%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
13	Ceremonial costs	\$ 300.00	0.13%	\$ 150.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ 150.00	0.07%	
14	Mineral fees	\$ 11,324.99	5.02%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
A	Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R-11+R-15)	\$ 170,940.45	75.73%	\$ 39,541.52	17.52%	\$ 21,991.20	9.74%	\$ 61,532.72	27.26%	
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 17,094.04	7.57%	\$ 3,954.15	1.75%	\$ 2,199.12	0.97%	\$ 6,153.27	2.73%	
C	General Items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 33,254.49	14.73%	\$ 5,709.75	2.53%	\$ -	0.00%	\$ 5,709.75	2.53%	
D	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 4,425.78	1.96%	\$ 984.11	0.44%	\$ 483.81	0.21%	\$ 1,467.91	0.65%	
E	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 225,714.76	100.00%	\$ 50,189.53	22.24%	\$ 24,674.13	10.93%	\$ 74,863.66	33.17%	

Prepara Husi :

(Eng. Celso J. Alves)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Prepara Husi :

(Eng. Rui Lopes)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Verifica Husi :

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Sertifica Husi :

(Eng. Emerenciana da V. Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P



ANEXU C1 (Le-61)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Namalesu - Faturilao Chainage
0+000 - 14+000

No. kontratu : MPW - W - 21027

Data Inspesaun : 08 / 09 / 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe, Namalesu, Asbilitoho, Berleu and Faturilao

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.709305), Latetude : (E.125.713868)

End Point : Long : (S. 8.712861), Latetude : (E. 125.682038)

Naran Inspector : 1. Eng. Celvio Justino Alves

2. Eng. Rui Lopes

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Excavation and disposal - soft soil

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Excavation and disposal - soft soil



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Fill and compact

Fill and compact





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le-61)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Namalesu - Faturilao Chainage
0+000 - 14+000
No. kontratu : MPW - W - 21027

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Gabion

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Gabion



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Stone masonry – finished

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Stone masonry - finished





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU D (LE - 61)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Namalesu - Faturilao
Chainage 0+000 - 14+000

Kompanha : LMG Unip.Lda

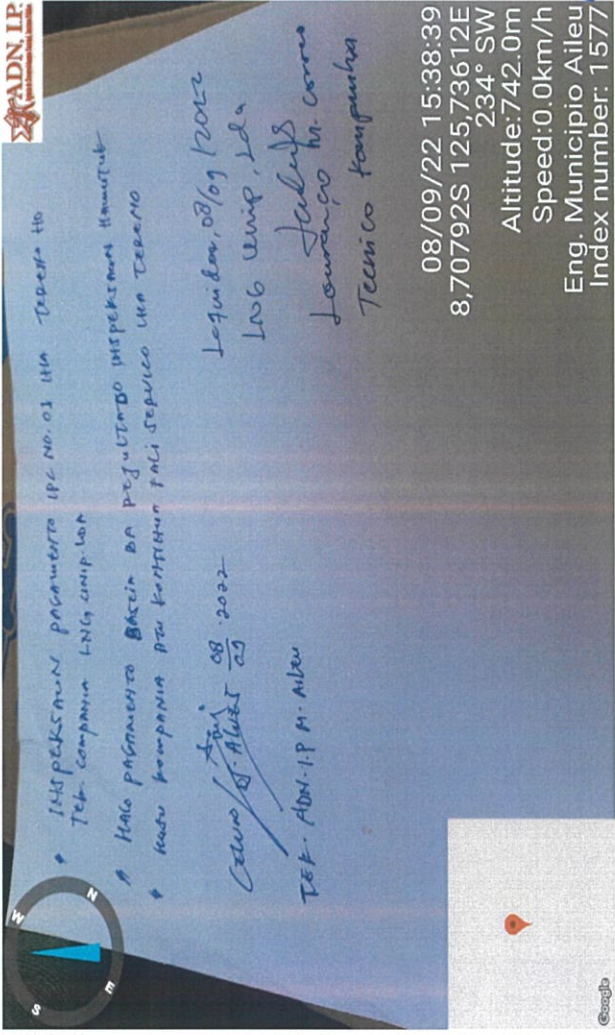No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	09/08/2022	Aileu / Lequidoe	Rui Lopes & Celvio J. Alves	Eng. ITI ADN Aileu			 



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (LE - 61)

Road name	: Nmalesu - Faturilao
Municipality	: Aileu
Posto	: Lequidoe
Sukos	: Nmalesu, Asbilitoho, Berleu and Faturilao

Chainage sta	: 0 + 000
Chainage en	: 14 + 000
Length	: 14.0 Km
Contractor	: LNG Unip. Lda

SUMMARY

Item	Description	Amount US\$		PROGRESS PREVIOUS ABRIL 2022		PROGRESS MONITORING SETEMBRO 2022		PROGRESS PHYSICAL UP TO DATE	
		Amount US\$	% BILLED	Amount US\$	% BILLED	Amount US\$	% BILLED	Amount US\$	% BILLED
R-01	General works	5,325.00	1.29%	2,975.00	0.72%	-	0.00%	2,975.00	0.72%
R-03	Earth work	89,162.52	21.66%	84,266.00	20.47%	13,675.79	3.32%	97,941.79	23.79%
R-05	Sub-base, base and pavement	723.00	0.18%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
R-07	Bituminous pavement	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
R-08	Structures	211,024.80	51.27%	69,979.07	17.00%	31,312.44	7.61%	101,291.51	24.61%
R-10	Dayworks	210.00	0.05%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
R-11	Routine maintenance	27,092.00	6.58%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
R-15	Provisional sum	250.00	0.06%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
A	Construction cost	333,787.31	81.09%	157,220.07	38.20%	44,988.23	10.93%	202,178.30	49.12%
B	Contractor Fee (A x 10%)	33,378.73	8.11%	15,722.01	3.82%	4,498.82	1.09%	20,217.83	4.91%
C	General items	36,383.41	8.84%	11,034.65	3.07%	3,277.50	0.80%	15,022.15	3.65%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	8,070.99	1.96%	3,679.53	0.90%	1,055.29	0.26%	4,748.37	1.15%
E	Total	411,620.44	100.0%	187,656.26	45.98%	53,819.85	13.08%	242,166.65	58.83%

Prepara Husi :

(Eng. Cordeiro J. Alves)

Prepara Husi :

(Eng. Rui Lopes)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Verfika Husi :

(Eng. Remigio da C. do Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerencia da C. Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

<									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note:

Plano Periode inspesaun iha Terrenu

Implementa Plano Periode Inspecoan iha Terrenu

Relatorio avaliasaun mensal iha Dili

Inspecoan Proccesu Pagamentu

Prepara Husi:
(Eng. Celvio Justino Alves)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irrigasaun ADN, LP

Sertifika Husi:
(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, LP

Aprova Husi:
(Eng. Januario da Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN, LP

MINISTÉRIO DO PLANO E DESENVOLVIMENTO REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE ADN, LP Associação de Desenvolvimento Nacional, Lda Associação de Desenvolvimento Nacional, Lda								PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng: Rui Lopes								2022																																
Município								MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																
Município / Posto								Setembro																																OBS
								123456789101112131415161718192021222324252627282930																																
AILEU VILA (AVL)	1	Rehabilitation of Sot Tocolu roads Aileu	Mendith Unip Lda	SSS0110/MOPIC-2015	PI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Pagamento ikus (FHO) 100% baseia ba progresso rekomendasaun iha Setembro 2019 Falta Retensaun (FHO)				
							Actual																																	
	2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Talforleu - Kolohoho Chainage 0+000 - 8+000 Municipality Aileu	Cariq Unipessoal Lda in joint venture with Sunares Unip Lda	RTB/20/MOP-2019	PI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	25	R4D Rural Road Spot Improvement Dausoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	Aileu ba Cin Unip Lda	MOP-CT-RFQ-21011	LM-CT	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	26	R4D Rural Road Spot Improvement Karkelo - Laco Chainage 0+000 - 11+500 Aileu Municipality	Fikakay Unipessoal Lda	MOP-W-RFB-21024	LM-CT	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	29	Rehabilitasaun Estrada Rural Atubuharan - Manofon Aileu 0+000-1+000 (1.0Km)	Hafutan Moris Unipessoal Lda	RT/088/MOP-2021	LM-CT	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
30	Rehabilitasaun Estrada Rural Talforleu -kolohoho (loop around Lake) Chainage Aileu 0+000-2+000	UNG Unipessoal Lda Jv Star King Construction Unipessoal Lda	RT/139/MOP-2021	LM-CT	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
						Actual																																		
31	Rehabilitasaun Estrada Rural Talforleu -kolohoho (loop around Lake) Chainage Aileu 2+000-5+000	Sakaun Unipessoal Lda	RT/090/MOP-2021	LM-CT	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
						Actual																																		
32	Rehabilitasaun Estrada Rural Talforleu -kolohoho (loop around Lake) Chainage Aileu 5+000-8+000	Sakaun Unipessoal Lda	RT/091/MOP-2021	LM-CT	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
						Actual																																		
33	Rehabilitasaun Estrada Rural selo Krak: Halanate Aileu (3.5Km)	Aileu ba Cin Unip Lda	RT/092/MOP-2021	LM-CT	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
						Actual																																		
34	Rehabilitasaun Estrada Rural Raimanu - Fatubosa Aileu (5.20Km)	RACO LDA	RT/093/MOP-2021	LM-CT	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
						Actual																																		
LAULARA (LA)	42	Rehabilitation of Bodi'u Sarila Roads (Ex Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	Mejora Lda	SSS0103/MOPIC-2016	PI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Pagamento ikus (FHO) 98.97% baseia ba progresso rekomendasaun iha Junho 2022 Falta Retensaun (FHO)					
							Actual																																	
	46	Rural Roads Maintenance Fatubosa - Fadaboko Sta 0+000-8+200; Hotoho - Lagaica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Umai Sta 0+000 - 7+500 in Aileu Municipality	Remexio Turak Unip Lda	MPWTC-CT-17/0004	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Pagamento ikus (FHO) 84.68% baseia ba progresso rekomendasaun iha Novembro 2019 Falta Retensaun (FHO)					
							Actual																																	
	47	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Umai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Lusmori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	Tin Los unip Lda	MPW-W190086	LM-CT	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Pagamento ikus (FHO) 88.97% baseia ba progresso rekomendasaun iha Junho 2022 Falta Retensaun (FHO)					
						Actual																																		


Note:

Planu Periode inspesaun iha teresin

Implementa Planu Periode inspesaun iha teresin

Relatorio avaliasaun mensal iha Dili

Inspesaun Proceso Pagamentu

Prepara Husi

 (Eng. Rui Lopes)
 Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun ADN, LP

Sertifika Husi

 (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, LP

Aprova Husi

 (Eng. Januario Maia Guterres)
 Adjunto Director Executivo, ADN, LP

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO DO GOVERNO DA GUINÉ-BISSAU ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Investimentos Públicos							PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng.	Rui Lopes						2022																															
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Setembro																														OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
AILEU VILA (AVL)	1	Rehabilitation of Sioi Tocoluli roads Aileu	Mendith UnipLda	SSS/061/MOPTK-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Pagamento ikus (PHO) 100% baseia ba progresso rekomendasaun iha Setembro 2019 Falta Retensaun (FHO)	
							Actual																															
	2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Talforleu - Kolihoho Chainage 0+000 - 8+000 Munisiplu Aileu	Caviq Unipessoal Lda in joint venture with Sunnines Unip. Lda	NCB/020/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														..	
							Actual																															
	25	R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli- Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	Aileu ba Oln Unip. Lda	MOP-CD-RFQ-21011	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	26	R4D Rural Road Spot Improvement Kirlelo - Lacio Chainage 0+000 - 11+300, Aileu Municipality	Fikikay Unipessoal, Lda	MOP-W-NCB-21024	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	29	Rehabilitasaun Estrada Rural,Aituhularan - Manufoni,Aileu 0+000-1+000 (1.0Km)	Hatutan Moris Unipessoal Lda	RT/088/MOP-2021	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
30	Rehabilitasaun Estrada Rural,Talforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000	LNG Unipessoal, Lda Jv Star King Construction Unipessoal, Lda	RT/139/MOP-2021	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
31	Rehabilitasaun Estrada Rural,Talforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 2+000-5+000	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/090/MOP-2021	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
32	Rehabilitasaun Estrada Rural, Talforleu-kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 5+000-8+000	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/091/MOP-2021	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
33	Rehabilitasaun Estrada Rural, seloi Kralik- Halmate, Aileu (3.5Km)	Aileu ba Oln Unip. Lda	RT/092/MOP-2021	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
34	Rehabilitasaun Estrada Rural,Raimansu - Fatubesi,Aileu (5.20Km)	RACO LDA.	RT/093/MOP-2021	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
LAULARA (LA)	42	Rehabilitation of Beducu Sarlala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	Mejori, Lda	SSS/0103/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Pagamento ikus (PHO) 98.97% baseia ba progresso rekomendasaun iha Junho 2022 Falta Retensaun (FHO)	
							Actual																															
	46	Rural Roads Maintenance Fahisoi - Fadaboko Sta 0+000-8+200, Hotoho - Liqulca Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Ormai Sta 0+000 - 7+500 in Aileu Municipality	Remexio Furak Unip Lda	MPWTC-CD-170004	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Pagamento ikus (PHO) 94.68% baseia ba progresso rekomendasaun iha Novembro 2019 Falta Retensaun (FHO)	
							Actual																															
	47	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Lisimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	Fin Los unip.lda	MPW-W190086	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Pagamento ikus (PHO) 98.97% baseia ba progresso rekomendasaun iha Junho 2022 Falta Retensaun (FHO)	
						Actual																																
48	Laulara Solerema Roads	Marino Enterprises, Lda	SSS/115/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS																																Pagamento ikus (PHO) 98.73% baseia ba progresso rekomendasaun iha Novembro 2017 Falta Retensaun (FHO)	
49	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	Emmanuel Milenial	MPW-W-210141	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
REMEXIO (RE)	50	Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 - 10+400 Dili & Aileu Municipality / 162	Nautetu I, II Unipessoal Lda	MPW-W-1900081	LM-BS	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	51	Road Rehabilitation of Remexio to Lacio Sta 0+000-20+000 Package I Aileu Municipality	Mendith UnipLda	SSS/139/MOPTC-2017	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
						Actual																																
52	Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	Lonacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
LEQUIDAOE (LE)	56	R4D MPW Rural Roads rehabilitation Project in Aileu Bereleu manucasa Package 2 Sta. 3+500-13+000	Selara Irapiiti Unip. Lda	MPWTC-W-015016	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Pagamento ikus (PHO) 97.45% baseia ba progresso rekomendasaun iha Agosto 2017 Falta Retensaun (FHO)	
							Actual																															
	57	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadaboko Chainage 0+000 - 8+200, Namalesu - Faturlau Chainage 0+000 - 12+500, Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hautoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+500 Municipality Aileu / 162	Emmanuel Milenial	MPW-W-190103	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	58	Rural Roads Periodic Maintenance Aituhularan - Manufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300, Routine Maintenance Coula Udo Kirlelo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu / 162	LNG Unip. Lda	MPW-W-190174	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Pagamento ikus (PHO) 98.25% baseia ba progresso rekomendasaun iha Janeiro 2022 Falta Retensaun (FHO)	
							Actual																															
	61	R4D Rural Road Spot Impovement Namalesu - Faturlau Chainage 0+000 - 14+000	LNG Unip. Lda	MPW - W - 210149	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
						Actual																																
65	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadaboko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality	Blackbird Unip. Lda JV Chaikallala Unip. Lda	MOP-CD-NCB-21026	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
66	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi- Dairlouta Chainage 0+000 - 5+000 Aileu Municipality	Raco Lda.	MOP-CD-RFQ-21012	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING							Actual																															
Note: Plano Período Inspesaun iha Terrenu Implementa Plano Período Inspesaun iha Terrenu Relatorio avaliasaun mensal iha Dili Inspesaun Proceso Pagamentu																																						

Note:

Planu Periode Inspesaun iha Terenu

Implementa Planu Periode Inspesaun iha Terenu

Relatorio avallasuan mensal iha Dili

Inspesaun Proceu Pagamentu

Prepara Husi :
(Eng. Rui Lopes)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun ADN, I.P.

Sertifica Husi :
(Eng. Emerenciana Rosa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Avaliacao de Qualidade, ADN, I.P.

Aprova Husi :
(Eng. Januario Maia Gutierrez)
Adjunto Director Executivo ADN, I.P.

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng.	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares						2022																															
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Sept																														OBS
AILEU VILA (AVL)	6	Rehabilitation of MSS Office in Aileu	Borudo Matak	RDTL:47/MSS/DNPFAL-DAD/X/2016	LM	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
							Actual																															
	7	Programma Turismo Komunitario 2014 Selo / Malere	Miror Raefusa	RDTL/SEFOPE/DNA/DNE/2013-0003	LM-TP	SEFOPE	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
							Actual																															
	11	Konstrusaun, Vedasaun no Jardim ba Edificio DTPSC	Kablaki Engineering Unip. Lda		LM	MINISTERIO JUSTICA	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
							Actual																															
	12	New Construction of Isolation Building	Mortiles Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-257	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
							Actual																															
	15	Konstrusaun salas de aulas 3 + Eskritorio + Laboratorio ESTV Aileu	Mortiles Unip.Lda	NCB:01/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUCASAUN	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
							Actual																															
	16	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBC 3 Ciclo Selo	MEJD PKRIE EBC 3 CICLO SELOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
							Actual																															
	17	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EPE Mantane	MEJD PKRIE EPE MANTANE	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
							Actual																															
18	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBF Lacio	MEJD PKRIE EBF LACLO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
						Actual																																
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Pre-Escolar Cotobauro	MEJD PKRIE PRE-ESCOLAR COTOBAURO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
						Actual																																
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Teblor	MEJD PKRIE EBF TEBLOR	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
						Actual																																
21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Darahe	MEJD PKRIE EBF DARAHE	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
						Actual																																
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESGAM Aileu	MEJD PKRIE ESGAM AILEU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
						Actual																																
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
						Actual																																
LAULARA (LA)	24	New Install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Madabeno to Sarlala Aileu District	Aldepo Murak Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000162	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
							Actual																															
	25	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku to Besilau and Fatuk Hun - Aileu District	osxavijoneli unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000179	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
							Actual																															
REMEXIO	36	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
							Actual																															
	37	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
							Actual																															
	38	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	Cadila Supplie Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000163	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
							Actual																															

TUIR FORMASAUN IHA INAP 12 - 16 / 9 / 2022

TUIR FORMASAUN IHA INAP 12 - 16 / 9 / 2022

[Handwritten signature]

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares						2022																																
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Sept																														OBS	
LEQUIDOE (LE)	43	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Fatuberli, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
							Actual																																
	45	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	46	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Urdadan	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	47	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
								Actual																															
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi:




(Silvino D. R. Rebelo Soares)
Eng. Electridade, ADN - I.P

Sertifika Husi:



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN - I.P

Aprova Husi:



(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN - I.P
