



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN PROJETUS
MUNISÍPIU AINARO

JUÑU 2023




SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO AINARO

JUNHO 2023

Prepara Husi :


(Eng. Joaquim de C. Madeira)


Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Ainaro ADN, I.P


(Eng. Romulo J. Marques Henrique)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigação, Município Ainaro ADN, I.P


(Eng. Claudino Soares dos Santos)

Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Ainaro ADN, I.P


(Eng. Jaulino H. Rodrigues)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigação, Município Ainaro ADN, I.P


(Silvino D R R Soares)

Eng. M & E, Município Ainaro ADN, I.P

Verifica Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)

Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P



(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)

Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e
Irigação, ADN, I.P


(Deolindo de F Marques)

Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifica Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)

Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal	3
1.2 Perfil Municipio Ainaro	3
1.3. Lista Projectos	6
II. PROGRESU FISIKU	14
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	14
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	14
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	14
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	15
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	15

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamientos	6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores	8
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio	11
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro	13

I. INTRODUSAUN


1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional, I.P ou ADN, I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN, I.P nian maka atu aseguira katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ADN, I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimento nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvimento nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno caso presiza.

1.2 Perfil Municipio Ainaro

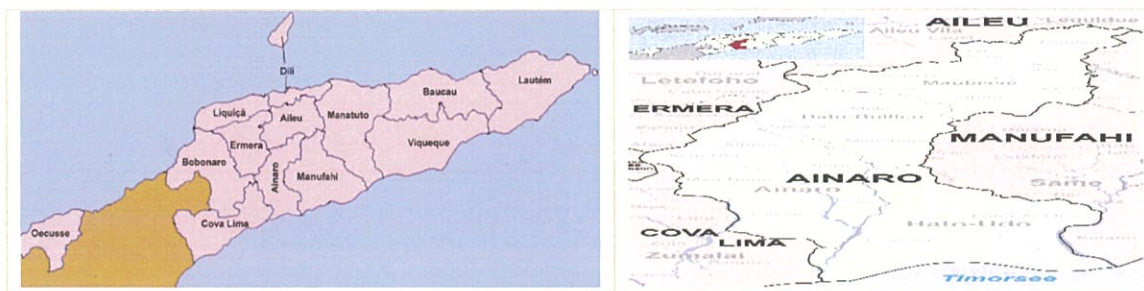

Administrasaun Munisipal Ainaro lokalizadu iha sudoeste paíz no mapa 2. hatudu pozisaun jeográfiku Munisipiu Ainaro ne'ebé ho luan 797 km² ho populasau nain 59,175 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Ainaro iha Postu Administraativo ha'at, Sukus 21 no Aldeias 131 hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1: Ponto Administrativo, Sukus no Total Aldeias/Sukus

Ainaro		Hatu Bulico		Hatu Udo		Maubisse	
Sukus	Aldeias	suku	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Ainaro	7	Mauchiga	7	Foho-Ailico (beikala)	6	Aituto	9
Cassa	5	Mulo	8	Leolima	10	Edi	6
Manutaci	4	Nuno Moge	6	-	-	Fatubessi	6
Mau-Nuno	3	-	-	-	-	Horai-Quic	4
Mau-Ulo	5	-	-	-	-	Liurai	4
Soro	4	-	-	-	2	Manelobas	4
Suro-Craic	4	-	-	-	4	Manetu	7
-	-	-	-	-	-	Maubisse	12
-	-	-	-	-	-	Maulau	10
Total	32	-	21	-	22	-	62

Data husi : Livro 3B OJE 2021, Pajina 22

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro			4			4	
2	Administrasaun no Financas			0			0	
3	Motorista			1			1	
4	Seguransa			0			0	
	Grand Total			5			5	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro

ASET ADN,IP MUNICIPIO AINARO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio			1			1	Moru hadia, monta tralis
2	Kareta			1			1	Kondisaun ladun diák
3	Desktop HP / Monitor			1			1	Diak
4	Laptop HP			1			1	Todan presija update
5	Printer Cannon			1			1	Diak
6	UPS			1			1	Aat
7	Armario File			2			2	Diak
8	Armario Tau hena			2			2	Aat 1
9	Meja escritorio			1			1	Diak
10	Meja han			1			1	Aat
11	Meja TV (kiik)			1			1	Diak
12	Kadeira escritorio			6			6	Diak
13	Kadeira han			4			4	Att 2
14	Sofa			1 Set			1	Diak
15	Springbed +sumasu 4			2 Set			2	Diak (sumasu laiha)
16	Jeleira			1			1	Diak
17	Water Dispenser			1			1	Aat
18	TV + Parabola			1 Set			1	Aat
19	Kipas Angin			5			5	Aat
20	Kompor			1			1	Diak
21	Kompor Gas			1			1	Aat
22	Rack sepatu			3			3	Aat
23	Rack Piring			1			1	Diak
24	Water Pump Sanyo			1			1	Aat

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dados projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamiento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamiento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + PDIM + LM - BS + LM - TP		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	24	\$ 19,705,116.96	58.81%
2	Hatubuilico	12	\$ 7,047,176.63	78.26%
3	Hatudo	11	\$ 2,758,198.43	20.92%
4	Maubisse	22	\$ 6,718,710.92	64.35%
Grand Total		69	\$ 36,229,202.94	60.74%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	10	\$ 16,968,195.22	61.98%
2	Hatubuilico	2	\$ 5,417,567.63	87.48%
3	Hatudo	5	\$ 1,770,459.15	13.94%
4	Maubisse	9	\$ 5,130,827.23	73.68%
Grand Total		26	\$ 29,287,049.23	65.84%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	7	\$ 1,878,227.91	28.68%
2	Hatubuilico	7	\$ 1,379,650.79	44.93%
3	Hatudo	2	\$ 686,368.28	20.86%
4	Maubisse	3	\$ 433,853.68	16.23%
Grand Total		19	\$ 4,378,100.66	31.34%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	3	\$ 450,461.58	63.74%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 84,160.28	87.69%
Grand Total		4	\$ 534,621.86	67.51%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo	1	\$ 24,446.00	90.00%
4	Maubisse			
Grand Total		1	\$ 24,446.00	90.00%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	4	\$ 408,232.25	60.41%
2	Hatubuilico	3	\$ 249,958.21	62.32%
3	Hatudo	3	\$ 276,925.00	59.59%
4	Maubisse	8	\$ 1,045,876.54	36.08%
Grand Total		18	\$ 1,980,992.00	47.69%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Emergency		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 23,993.19	90.00%
	Grand Total	1	\$ 23,993.19	90.00%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO AINARO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	2	\$ 723,536.37	17.29%
2	Educação E Formação	1	\$ 907,735.20	0.00%
3	Edukasaun	18	\$ 2,079,402.69	52.74%
4	Eléctricidade	10	\$ 7,999,431.74	73.14%
5	Estradas E Pontes	15	\$ 16,716,074.59	55.61%
6	Flood Control	2	\$ 108,153.47	88.20%
7	Imprestimo	1	\$ 4,187,508.61	92.29%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	14	\$ 2,500,306.12	57.78%
9	Pontes	1	\$ 273,148.15	12.71%
10	Saude	2	\$ 242,372.02	43.02%
11	Turismo	3	\$ 491,533.98	18.66%
	Grand Total	69	\$ 36,229,202.94	60.74%

NO	SECTOR PROJECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	2	\$ 723,536.37	17.29%
2	Educação E Formação	1	\$ 907,735.20	
3	Edukasaun	4	\$ 520,065.09	65.99%
4	Eléctricidade	3	\$ 2,130,985.59	80.80%
5	Estradas E Pontes	7	\$ 13,995,334.42	62.93%
6	Flood Control			
7	Imprestimo			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 815,683.40	44.91%
9	Pontes	1	\$ 273,148.15	12.71%
10	Saude	2	\$ 242,372.02	43.02%
11	Turismo	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		24	\$ 19,705,116.96	58.81%

NO	SECTOR PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Educação E Formação			
3	Edukasaun	3	\$ 249,958.21	62.32%
4	Eléctricidade	1	\$ 1,230,059.02	71.11%
5	Estradas E Pontes	2	\$ 854,631.59	25.74%
6	Flood Control			
7	Imprestimo	1	\$ 4,187,508.61	92.29%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	4	\$ 444,741.95	88.70%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo	1	\$ 80,277.25	6.83%
Grand Total		12	\$ 7,047,176.63	78.26%

NO	SECTOR PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Educação E Formação			
3	Edukasaun	4	\$ 578,502.86	38.08%
4	Eléctricidade	1	\$ 384,790.42	22.85%
5	Estradas E Pontes	4	\$ 1,482,565.12	13.98%
6	Flood Control			
7	Imprestimo			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	2	\$ 312,340.03	19.72%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		11	\$ 2,758,198.43	20.92%

NO	SECTOR PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Educação E Formação			
3	Edukasaun	7	\$ 730,876.53	51.64%
4	Eléctricidade	5	\$ 4,253,596.71	74.44%
5	Estradas E Pontes	2	\$ 383,543.46	16.18%
6	Flood Control	2	\$ 108,153.47	88.20%
7	Imprestimo			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	5	\$ 927,540.74	67.09%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo	1	\$ 315,000.01	
Grand Total		22	\$ 6,718,710.92	64.35%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat	1	\$ 84,160.28	87.69%
2	Ministerio Das Obras Publicas	40	\$ 31,056,796.15	64.89%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	20	\$ 3,011,583.89	37.14%
4	Ministerio Saude	2	\$ 242,372.02	43.02%
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	22.89%
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria	1	\$ 80,277.25	6.83%
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	2	\$ 796,158.60	42.29%
8	Sefope	2	\$ 411,256.73	20.97%
Grand Total		69	\$ 36,229,202.94	60.74%

NO	DONO DO PROJECTO	Ainara-Vila		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat			
2	Ministerio Das Obras Publicas	13	\$ 16,595,931.31	63.83%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	\$ 1,427,800.29	24.04%
4	Ministerio Saude	2	\$ 242,372.02	43.02%
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	22.89%
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	2	\$ 796,158.60	42.29%
8	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		24	\$ 19,705,116.96	58.81%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal			
2	Ministerio Das Obras Publicas	8	\$ 6,716,941.17	79.71%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	3	\$ 249,958.21	62.32%
4	Ministerio Saude			
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria	1	\$ 80,277.25	6.83%
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope			
Grand Total		12	\$ 7,047,176.63	78.26%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal			
2	Ministerio Das Obras Publicas	6	\$ 2,155,249.57	15.53%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	\$ 602,948.86	40.18%
4	Ministerio Saude			
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope			
Grand Total		11	\$ 2,758,198.43	20.92%

NO	DONO DO PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	1	\$ 84,160.28	87.69%
2	Ministerio Das Obras Publicas	13	\$ 5,588,674.10	69.29%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	7	\$ 730,876.53	51.64%
4	Ministerio Saude			
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope	1	\$ 315,000.01	0.00%
Grand Total		22	\$ 6,718,710.92	64.35%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Produktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Ainaro	16,823	7170	6636	5567	5058
Hato-Udo	10,747	3130	2923	2415	2279
Hato-Builico	13,249	3457	3365	3241	3186
Maubisse	24,672	6378	6309	6222	5764

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu neébe hetan husi progresu fulan ida neé, ikus liu porsentagen actual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detallu bele hareé iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hareé #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Obstaclo neébe ami enjineiru hasoru iha terenu mak hanesan tuir mai ne'e :

1. Kompanhia nia tekniku laiha terenu
2. Kompanhia neébe ka'er obra iha Municipio Ainaro iha hotu Dili
3. Teknik husi Projetu nain ladun halo inspesaun ba iha terenu
4. Kondisaun kareta ne'ebe Suporta Ekipa ADN, I.P iha tereno ho kondisaun ne'ebe sei aat

➤ Obstaclo parte Eletricidade

1. Durante Eng ADN, I.P halo monitorin directur kompahnia nunka iha fatin projeto e delega ema balun mak sempre hein iha fatin projeto.
2. Kompahnia balun mak to agora sedauk hadia konstruk Linha MV & LV nebe mak avaria.
3. Iha kompahnia seluk hein hela karta termo de entrega 10% husi EDTL – EP municipio ate agora sedauk fo ba kompahnia.
4. Seksaun M & E - ADN, I.P sempre hasoru mak kona ba motorist.
5. Seksaun M & E – ADN, I.P labele kontrola masimu projeto electricidade ho edificio public tamba Eng M & E – ADN, I.P ida kontrola municipio ha'at (4).

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Buka solusaun ba projetu ne'ebe parado
2. Sistema Internet iha Municipio lalao ho diak ho difikulta enjineiru nia servisu
3. Kondisaun Rezidesia Oficial ADN, I.P Municipio Ainaro ne'ebe presija atu hadia:
 - Be'e
 - Moru
 - Tralis Jenela

➤ Recomendação parte Eletricidade

1. Seksaun M & E husu parte rekursu Humanu atu aumenta tan funsionario M & E.
2. Seksaun M & E – ADN, I.P husu ba ITC tenki kria folder sistem keta ida mai iha seksaun M & E – ADN, I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Ainaro

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engineiro	Romulo J. M. Henrique	174	Enjineiru ITI		
		Joaquim de C. Madeira	167	Enjineiru EPAS		
		Claudino Soares Dos Santos	243	Enjineiru EPAS		
		Jaulino H. Rdrigues	237	Enjineiru ITI		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		

2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Lucas Alberto Soares Pereira	195	Motorista		



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL JUNHO)

					Lokalizasaun Projeto										STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)		
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	78.52%	\$ 355,512.32	\$ 97,263.04	ON-GOING	Kompanha Ezekuta tarde tamba impacto husi Pandemia, tamba kuase material hotu-hotu Fabrikasi, tamba neé mak importasaun laiha.
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilio Unip., Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	87.87%	\$ 334,820.71	\$ 46,223.20	ON-GOING	Kompanha Ezekuta tarde tamba impacto husi Pandemia, tamba kuase material hotu-hotu Fabrikasi, tamba neé mak importasaun laiha.
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Caloko and Hatobulico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	88.36%	79.52%	\$ 1,031,531.81	\$ 265,634.51	ON-GOING	Kompanha Ezekuta tarde tamba impacto husi Pandemia, tamba kuase material hotu-hotu Fabrikasi, tamba neé mak importasaun laiha.
4	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Consorcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC- 2016	\$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	88.00%	\$ 110,219.55	\$ 15,029.94	PHO	Projeto 100% iha tinan 2016 maibe to agora companhia sedauk husu pagamento retensaun 10%
5	Emergency Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	91.02%	81.92%	\$ 3,543,740.61	\$ 782,035.89	ON-GOING	Projeto lao hela
6	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3,717,215.92	July 1, 2013	93.22%	71.00%	\$ 2,639,364.12	\$ 1,077,851.80	ON-GOING	Projeto lao hela
7	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	49.52%	43.43%	\$ 2,162,279.76	\$ 2,816,071.23	ON-GOING	Projeto lao hela
8	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	91.76%	80.75%	\$ 147,667.55	\$ 35,197.14	ON-GOING	Hela 10%
9	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Heróis Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 619,220.25	April 10, 2019	54.62%	54.37%	\$ 336,663.10	\$ 282,557.15	ON-GOING	Projeto lao hela
10	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	84.00%	\$ 27,553.61	\$ 5,248.26	ON-GOING	Projeto lao hela
11	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208,089.56	July 29, 2019	97.82%	87.86%	\$ 182,832.44	\$ 0.70	PHO	100% falta retensaun 10%
12	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	94.77%	85.29%	\$ 25,075.68	\$ 4,325.46	PHO	Projeto refere 100% ona tur volume nebe iha tereno, falta retensaun 10%
13	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	89.59%	\$ 86,232.55	\$ 10,024.17	FHO	Projeto ferere ramata ona, husu atu hare fila fali dadus pagamento nebe iha.
14	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Lau Sta. 0+000 - 1+200 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33,889.94	June 18, 2021	48.12%	43.31%	\$ 14,678.12	\$ 19,211.82	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
15	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	\$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	12.71%	\$ 34,707.48	\$ 238,440.67	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2016
16	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	37.19%	\$ 79,200.00	\$ 133,770.88	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2015
17	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600,016.84	July 25, 2016	66.84%	31.84%	\$ 191,070.62	\$ 408,946.22	ON-GOING	Projeto refere parado 2017, Projeto Refere komesa halo fali ona Servisu Setembro 2022
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	78.68%	58.21%	\$ 57,367.38	\$ 41,187.36	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL JUNHO)

					Lokalizasaun Projetu											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	Ainara	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	65.07%	43.66%	\$ 45,015.75	\$ 58,091.29	ON-GOING	
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	Ainara	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	80.48%	52.56%	\$ 57,981.37	\$ 52,332.38	ON-GOING	
21	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainara District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	Ainara	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	\$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	32.64%	22.89%	\$ 125,100.22	\$ 421,497.80	ON-GOING	
22	New Construction of ESCOLA CAFE building in Ainara Municipality	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	Ainara-Vila	Ainara	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB/133/MEJD-2021	\$ 907,735.20	June 1, 2022	4.67%	0.00%	\$ -	\$ 907,735.20	ON-GOING	
23	New Construction of Entry Gate no Jardim de herois de Ainara	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	Ainara	BETUA CALDA UNIPESSOAL LDA	38/MACLN/X/2021	\$ 176,938.35	Jan. 1, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 176,938.35	ON-GOING	
24	Road Maintenance Project - Zumalai (Covalima) to Jct Cassa Ainara and Hatu-Udo Sta 0+100 - 12+810	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainara-Vila	Ainara	Expres Distribution Services Unip. Lda	MPW-W-230007	\$ 195,631.33	Jan. 11, 2023	65.87%	0.00%	\$ -	\$ 195,631.33	ON-GOING	
25	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainara	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no kontratu	\$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	90.00%	\$ 22,001.40	\$ 2,444.60	PHO	1 bulan periode garanti
26	New Construction of Electrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELÉCTRICIDADE	Hatudo	Ainara	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384,790.42	Jul1,26,2021	32.23%	22.85%	\$ 87,913.49	\$ 296,876.93	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
27	Road Maintenance Section - Ainara - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainara	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	13.75%	\$ 39,581.06	\$ 248,312.97	PENDENTE	Projeto refere parado 2019, Aktividade iha terreno laiha ona tamba seidauk iha amandemen kontrakt ba VO nebe ADN verifika ona
28	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	55.37%	55.37%	\$ 54,188.25	\$ 43,684.55	ON-GOING	
29	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	78.77%	79.86%	\$ 54,587.17	\$ 13,769.64	ON-GOING	
30	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	73.36%	50.81%	\$ 56,249.32	\$ 54,446.07	ON-GOING	
31	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	\$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	53.32%	18.32%	\$ 55,243.87	\$ 246,333.99	ON-GOING	
32	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainara	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	\$ 411,500.10	08-Mar-22	38.70%	0.00%	\$ -	\$ 411,500.10	ON-GOING	
33	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainara	Bermuana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	\$ 448,953.98	08-Mar-22	30.93%	0.00%	\$ -	\$ 448,953.98	ON-GOING	
34	Rural Road Rehabilitation of Foho Allico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainara	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	\$ 295,599.61	08-Mar-22	25.83%	20.41%	\$ 60,344.67	\$ 235,254.94	ON-GOING	
35	Rural Road Rehabilitation of Foho AiLico-Foho Bobe Chainage 6+000-7+900, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainara	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	\$ 326,511.43	08-Mar-22	92.16%	44.98%	\$ 146,860.44	\$ 179,650.99	ON-GOING	
36	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	97.43%	96.68%	\$ 156,198.58	\$ 5,355.61	FHO	
37	Rural Roads Routine Maintenance Ainara - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	79.19%	\$ 21,935.23	\$ 5,765.84	ON-GOING	Projetu refere ramata ona husu atu hare fila fali dadus pagamento



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL JUNHO)

					Lokalizasaun Projetu											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
38	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	92.66%	83.39%	\$ 162,743.65	\$ 32,407.05	ON-GOING	
39	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	98.74%	88.87%	\$ 53,620.66	\$ 6,715.33	PHO	
40	Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76,554.69	June 18, 2021	77.79%	70.01%	\$ 53,593.69	\$ 22,961.00	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
41	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	92.29%	\$ 3,864,572.08	\$ 322,936.53	ON-GOING	
42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Hatubuilico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	79.02%	71.11%	\$ 874,731.27	\$ 355,327.75	ON-GOING	
43	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	43.26%	45.16%	\$ 30,622.04	\$ 37,179.22	ON-GOING	
44	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	85.10%	81.08%	\$ 81,604.85	\$ 19,044.66	ON-GOING	
45	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	54.31%	53.44%	\$ 43,559.26	\$ 37,948.18	ON-GOING	
46	Rural Road Rehabilitation Hatubuilico - Santuario Nain Feto Ramelau Chainage 0+000 - 2+450 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	Ainaro	Leotilya, Unipessoal Lda	MOP/CD/NCB- R/ERD22001	\$ 778,076.90	July 15, 2022	24.92%	21.38%	\$ 166,356.71	\$ 611,720.19	ON-GOING	
47	Fornesimento Konstrusaun Uma Laku Ramelau	MINISTERIO TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA	LM-CD	TURISMO	Hatubuilico	Ainaro	DELONG UNIPESSOAL LDA	RFP	\$ 80,277.25	Aug. 1, 2022	7.59%	6.83%	\$ 5,481.12	\$ 74,796.13	ON-GOING	
48	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	79.95%	74.87%	\$ 176,861.91	\$ 59,362.99	ON-GOING	
49	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	80.64%	70.87%	\$ 144,085.67	\$ 59,212.83	ON-GOING	
50	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	83.32%	\$ 475,776.61	\$ 95,267.77	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no presija hadia fali nia konstrusaun
51	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	77.57%	69.81%	\$ 458,718.70	\$ 198,379.10	ON-GOING	
52	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurilala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	90.00%	\$ 896,415.58	\$ 99,601.73	PHO	Hein 10 % retensaun EDTL Munisipiu maka seidauk entrega
53	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	43.84%	\$ 452,656.17	\$ 579,755.90	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL JUNHO)

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL JUNHO)																
					Lokalizasaun Projeto											
NU.	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
54	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	88.54%	\$ 882,792.12	\$ 114,233.03	ON-GOING	Projeto nia la bele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no sei hein kompanha atu submete dokumentus
55	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	87.04%	\$ 73,728.12	\$ 10,978.14	ON-GOING	Projeto refere ramata ona iha 2019 husu atu hare fila fali dadus pagamento
56	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 84,160.28	July 29, 2019	100.00%	87.69%	\$ 73,802.68	\$ 10,357.60	ON-GOING	Projeto refere companhia sei hatama pagamento adicional
57	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34,371.15	June 18, 2021	90.58%	81.52%	\$ 28,020.65	\$ 6,350.50	ON-GOING	
58	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	70.57%	62.10%	\$ 219,207.07	\$ 133,793.79	PHO	
59	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	16.64%	\$ 8,373.26	\$ 41,936.96	ON-GOING	Projeto refere sei parado iha tinan 2019
60	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maneobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANEOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	28.49%	28.16%	\$ 27,909.50	\$ 71,184.64	ON-GOING	
61	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	84.08%	84.08%	\$ 77,948.39	\$ 14,758.21	ON-GOING	
62	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	79.91%	77.37%	\$ 66,906.32	\$ 19,565.18	ON-GOING	
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	76.77%	72.62%	\$ 71,050.84	\$ 26,790.45	ON-GOING	
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	26.34%	26.34%	\$ 39,491.20	\$ 110,425.00	ON-GOING	
65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	51.30%	50.02%	\$ 47,495.61	\$ 47,456.05	ON-GOING	
66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	42.41%	42.40%	\$ 46,591.34	\$ 63,303.80	ON-GOING	
67	Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	AILESU UNIPESOAAL LDA	RFQ-CD-MOP-22006	\$ 23,993.19	28-Jun-22	100.00%	90.00%	\$ 21,593.87	\$ 2,399.32	PHO	
68	Rural Road Maintenance and Rehabilitation of Maubise - Urlepha (Access to Edi Maneobas) Chainage 0+000 - 3+000 and Urlepha-Rita Chainage 0+000 - 2+150	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainaro	Balada	RT/004/MOP-2021	\$ 349,172.31	May 30, 2022	22.32%	9.74%	\$ 34,024.37	\$ 315,147.94	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL JUNHO)

					Lokalizasaun Projetu										STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)		
69	New Construction of Turismo comunitario Flexa- Maubisse Ainaro Municipality	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Maubisse	Ainara	Formandus Centro CNEFP - Tibar	DNFP/DGFPE/SEFOP E/2002	\$ 315,000.01	Feb. 27, 2023	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 315,000.01	ON-GOING	
TOTAL									\$ 36,229,202.94			60.64%	\$ 21,970,029.17	\$ 13,569,745.03		

(Eng. Joaquim de C. Madera)
Eng. ba Edifício Público no Bep Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Claudino Soares Dos Santos)
Eng. ba Edifício Público no Bep Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

Prepara Husi :

(Eng. Romulo J. Marques Henrique)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Jaulino N. Rodrigues)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Silvino D. R. R. Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainara ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



												Jun-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-1	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	0.00%	87.24%
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-2	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	0.00%	97.63%
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-3	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	88.36%	0.00%	88.36%
4	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-4	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
5	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-5	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	91.02%	0.00%	91.02%
6	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-6	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3,717,215.92	July 1, 2013	93.22%	0.00%	93.22%
7	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-7	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	49.52%	0.00%	49.52%
8	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-8	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	91.76%	0.00%	91.76%
9	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-9	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489,653.83	April 10, 2019	54.62%	0.00%	54.62%
10	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Sta 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-10	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	0.00%	93.39%
11	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	ANV-11	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208,089.56	July 29, 2019	97.82%	0.00%	97.82%
12	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	ANV-12	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	94.77%	0.00%	94.77%
13	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	ANV-13	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
14	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Lau Sta. 0+000 - 1+200 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-14	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33,889.94	June 18, 2021	48.12%	0.00%	48.12%
15	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	ANV-15	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	\$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	0.00%	64.84%
16	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	ANV-16	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	0.00%	41.32%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



												Jun-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
17	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainara-Vila	ANV-17	Ainara	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600,016.84	July 25, 2016	66.84%	0.00%	66.84%
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-18	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	78.11%	0.57%	78.68%
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-19	Ainara	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	53.90%	11.16%	65.07%
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-20	Ainara	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	74.99%	5.49%	80.48%
21	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainara District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	ANV-21	Ainara	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	\$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	32.64%	0.00%	32.64%
22	New Construction of ESCOLA CAFE building in Ainara Municipality	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	Ainara-Vila	ANV-22	Ainara	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB/133/MEJD-2021	\$ 907,735.20	June 1, 2022	4.67%	0.00%	4.67%
23	New Construction of Entry Gate no Jardim de herois de Ainara	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	ANV-23	Ainara	BETUA CALDA UNIPESSOAL LDA	38/MACLN/X/2021	\$ 176,938.35	Jan. 1, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
24	Road Maintenance Project - Zumalai (Covalima) to Jct Cassa Ainara and Hatu-Udo Sta 0+100 - 12+810	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainara-Vila	ANV-24	Ainara	Expres Distribution Services Unip. Lda	MPW-W-230007	\$ 195,631.33	Jan. 11, 2023	65.29%	0.58%	65.87%
25	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-1	Ainara	Simbissa Unip.Lda	la menciona no contrato	\$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
26	New Construction of Eletrial Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	HA-2	Ainara	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384,790.42	Jul1,26,2021	32.23%	0.00%	32.23%
27	Road Maintenance Section - Ainara - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-3	Ainara	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	0.00%	15.00%
28	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-4	Ainara	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	55.37%	0.00%	55.37%
29	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-5	Ainara	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	78.77%	0.00%	78.77%
30	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-6	Ainara	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	53.99%	19.37%	73.36%
31	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	HA-7	Ainara	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	\$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	50.00%	3.31%	53.32%
32	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-8	Ainara	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	\$ 411,500.10	08-Mar-22	12.70%	26.00%	38.70%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



												Jun-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
33	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-9	Ainaro	Bermuana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	\$ 448,953.98	08-Mar-22	29.20%	1.73%	30.93%
34	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-10	Ainaro	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	\$ 295,599.61	08-Mar-22	25.83%	0.00%	25.83%
35	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 6+000-7+900, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-11	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	\$ 326,511.43	08-Mar-22	92.16%	0.00%	92.16%
36	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-1	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	97.43%	0.00%	97.43%
37	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-2	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
38	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-3	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	92.66%	0.00%	92.66%
39	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-4	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	98.74%	0.00%	98.74%
40	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	HTB-5	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76,554.69	June 18, 2021	77.79%	0.00%	77.79%
41	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	HTB-6	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	0.00%	92.29%
42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	HTB-7	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	79.02%	0.00%	79.02%
43	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-8	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	43.26%	0.00%	43.26%
44	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-9	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	85.10%	0.00%	85.10%
45	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-10	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	54.31%	0.00%	54.31%
46	Rural Road Rehabilitation Hatubuilico - Santuario Nain Feto Ramelau Chainage 0+000 - 2+450 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	HTB-11	Ainaro	Leotilya, Unipessoal Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD22001	\$ 778,076.90	July 15, 2022	24.92%	0.00%	24.92%
47	Fornesimento Konstrusaun Uma Laku Ramelau	MINISTERIO TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA	LM-CD	TURISMO	Hatubuilico	HTB-12	Ainaro	DELONG UNIPESSOAL LDA	RFP	\$ 80,277.25	Aug. 1, 2022	7.59%	0.00%	7.59%
48	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-1	Ainaro	Bermuana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	79.95%	0.00%	79.95%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



												Jun-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
49	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-2	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	80.64%	0.00%	80.64%
50	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-3	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	0.00%	93.00%
51	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-4	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	77.57%	0.00%	77.57%
52	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Dauriala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-5	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
53	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-6	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	0.00%	48.72%
54	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-7	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	0.00%	98.38%
55	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-8	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
56	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-9	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 84,160.28	July 29, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
57	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	MBS-10	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34,371.15	June 18, 2021	90.58%	0.00%	90.58%
58	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-11	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	70.57%	0.00%	70.57%
59	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-12	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	0.00%	40.00%
60	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-13	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	28.49%	0.00%	28.49%
61	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-14	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	84.08%	0.00%	84.08%
62	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-15	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	77.34%	2.56%	79.91%
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-16	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	61.76%	15.01%	76.77%
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-17	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	26.34%	0.00%	26.34%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

												Jun-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-18	Ainara	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	49.19%	2.11%	51.30%
66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-19	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	38.31%	4.10%	42.41%
67	Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-20	Ainara	AILESU UNIPESOAAL LDA	RFQ-CD-MOP-22006	\$ 23,993.19	28-Jun-22	100.00%	0.00%	100.00%
68	Rural Road Maintenance and Rehabilitation of Maubise - Urlepha (Access to Edi Manelobas) Chainage 0+000 - 3+000 and Urlepha-Rita Chainage 0+000 - 2+150	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	MBS-21	Ainara	Balada Unipessoal Lda	RT/004/MOP-2021	\$ 349,172.31	May 30, 2022	22.32%	0.00%	22.32%
69	New Construction of Turismo comunitario Flexa-Maubisse Ainara Municipality	Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu	LM-TP	TURISMO	Maubisse	MBS-22	Ainara	Formandus Centro CNEFP - Tibar	DNFP/DGFPE/SEFOPE/2002	\$ 315,000.01	Feb. 27, 2023	0.00%	0.00%	0.00%

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Claudino Soares Dos Santos)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Romulo J. Marques Henrique)
Eng. ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Juliano H. Rodrigues)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Silvino D.R.S. Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainara ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X.D.D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P.

(Deolindo de F. Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXU-ANV-22

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Data Inspesaun : 20/06/2023

Fatin Inspesaun : LUAN CADOI / Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long :-9°9,176'S Latetude: 125, 32°9,042 E.

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Ekipa TEkniku ADN, IP halo Inspesaun
iah Tereno, hodi kontrola Progreso
fisiku, no kualidade implemetnasaun
rojeito husi grupu komunitario, progresso
fisiku atinje ona to iha pinta no keramik.



Sketch & Foto Desenho



ANEXU-ANV-22

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Ekipa TEkniku ADN, IP halo Inpesaun
iah Tereno, hodi kontrola Progreso
fisiku, no kualidade implemetnasaun
rojeito husi grupu komunitario, progresso
fisiku atinje ona to iha pinta no keramik.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



PROJECT NAME
LOCATION
AINARO

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL LUAN CADOI
: SUCO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA . MUNICIPIO

SUMMARY

MAIN SUMMARY		Page No	Amount	PREVIOUS MOUNT		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ 3,575.00	\$ 2,500.00	2.54%	\$ -	0.00%	\$ 2,500.00	2.54%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 49,729.55	\$ 47,488.31	48.18%	\$ -	0.00%	\$ 47,488.31	48.18%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US\$ 25,016.07	\$ 24,289.25	24.65%	\$ 558.81	0.57%	\$ 24,848.06	25.21%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US\$ 10,894.12	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 89,214.74	\$ 74,277.56	75.37%	\$ 558.81	0.57%	\$ 74,836.37	75.93%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 2,702.50	2.74%	\$ -	0.00%	\$ 2,702.50	2.74%
GRAND TOTAL			US\$ 98,554.74	\$ 76,980.06	78.11%	\$ 558.81	0.57%	\$ 77,538.87	78.68%

Inspesaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Públiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Públiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Públiku no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade,
ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO IX GOVERNO CONSTITUCIONAL				 Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público				INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
Kompanha : Grupo Komunitari				INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN							
Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Município de Ainaro (EBF. LUAN CADODI)				Asinatura							
											
											



ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainara Posto Administrativo de
Ainara Municipio de Ainara (EBF LIAS)

Data Inspesaun : 20/06/2023

Fatin Inspesaun : Ainara Vila

Koordinadas :

Start Point : -9°6'42,882°S Latetude: 125 °32'2.67"E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

Ekipa teknico ADN. IP halo
inspesaun iha tereno, hodi
kontrola progresso fisico iha
tereno, fo orientasaun ba GK
atu mantein Qualidade. E
servisu refere atinji ona iha
pinta.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Network time is not synchronized
Local: 20 Jun 2023 15:48:19 GMT+09:00
215° SW
Remark: EBF LIAS
Index number: 2783





ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Sketch & Foto Desenho

Ekipa tecnico ADN. IP halo
inspesaun iha tereno, hodi
kontrola progresso fisico iha
tereno, fo orientasaun ba GK
atu mantein Qualidade. E
servisu refere atinji ona iha
monta azuleju no pinta.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



PROJECT NAME :KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA ESCOLA BASICA FILIAL LIAS
LOCATION : SUCO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO ANARU VILA , MUNICIPIO ANARU

SUMMARY						
MAIN SUMMARY			Page No	Amount	PREVIOUS MONTH	
					AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES		PP/3	US\$ 3,575.00	\$ 2,275.00	2.21%
II	CLASSROOM BUILDING C		C/39 (i)	US\$ 50,185.26	\$ 35,525.58	34.46%
III	TOILET BUILDING TB		CB/50	US\$ 25,178.89	\$ 15,434.17	14.97%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK		SW/24 (i)	US\$ 14,827.89	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST				US\$ 93,767.04	\$ 53,234.75	51.63%
CONTINGENCY				US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%
OVERHEAD				US\$ 6,340.00	\$ 2,345.00	2.27%
GRAND TOTAL				US\$ 103,107.04	\$ 55,579.75	53.90%
					\$ 11,508.44	11.16%
					\$ 64,743.18	62.79%
					\$ -	0.00%
					\$ 2,345.00	2.27%
					\$ 67,088.18	65.07%

Inspesau Husi :
(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Anarú
ADN, I.P.

Verifika Husi :
(Arc. Francisco X. D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Anarú
ADN, I.P.

Sertifika Husi :
(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Município de Ainaro (EBF LIAS)					
Kompanha : Grupo Komunitario					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	22/05/2023	Ainaro	Joaquim Madeira & Claudio S. Santos	Tech AND.IP	1
Husu ba Grupu atu monta keramik ho diak, hodi bele garantia qualidade de servisu					Asinatura



ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Data Inspesaun : 06/06/2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long 8,9976S Latetude: 125,505,6E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Ekipa teknico ADN. IP halo
inspeksaun iha tereno, hodi
kontrola progresso fisico iha
tereno. GK sia servisu
progresso atinge ona ba Nahe
Karamik, Cellling, no pinta
ona 3 sala de aulas.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Ekiba tecnico ADN. IP halo inspeksaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico iha tereno. GK sia servisu progresso atinge ona ba Nahe Karamik, Cellling, no pinta ona 3 sala de aulas.



Sketch & Foto Desenho



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : KONSSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA ESCOLA SECUNDARIA GERAL
LOCATION : SUCO AINARO VILA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

MAIN SUMMARY			VERIFIED BY AND, IP		PREVIOUS SETEMBRO		THIS BILLING		UP TO DATE	
		Page No		Amount	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$	3,075.00	\$ 1,800.00	1.68%	\$ -	0.00%	\$ 1,800.00	1.68%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	US\$	56,061.73	\$ 47,918.72	43.44%	\$ 6,056.10	5.49%	\$ 53,974.82	48.93%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US\$	30,953.49	\$ 30,724.17	27.68%	\$ -	0.00%	\$ 30,724.17	27.68%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24	US\$	10,883.53						
CONSTRUCTION COST				US\$ 100,973.75	80,442.89	72.80%	\$ 6,056.10	5.49%	\$ 86,499.00	78.29%
CONTINGENCY				US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%			\$ -	0.00%
OVERHEAD				US\$ 6,340.00	\$ 2,222.00	2.20%			\$ 2,222.00	2.20%
GRAND TOTAL				US\$ 110,313.75	\$ 82,664.89	75.00%	\$ 6,056.10	5.49%	\$ 88,721.00	80.49%

Inspesaun Husi :

Verifica husi :

Sertifika Husi :

Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Arc. Francisco X.D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN						
Naran projeto : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA ESCOLA SECUNDARIA GERAL FERNANDO LASAMA DE ARAUJO AINARO						
Kompanha : Grupo Komunitario						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN
I	11/05/2023	Ainaro Villa	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1	Ekipa AND. IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola kualidade de Implementasaun iha tereno, atinje ona ba monta keramik, e Grupu agora monta mos keramik ba Wastafel iha Haris fatin nian.
						Asinatura
						
						



ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto
Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Data Inspesaun : 20-06-2023

Fatin Inspesaun : Hut-seo / Hato-udo - vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -9°9'7"902'S Latetude: 125°34'55,668 E

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Ekipa tekniku ADN. IP halo inspesaun
ba progresso fisiku iha tereno, Tekniku
husi ADN. IP mos observa fisiku iha
tereno. Atinge on aba kakuluk husi
Classroom nian ho Haris Fatin nian




ANEXU- HA - 7 # Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto
Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa tekniku ADN. IP halo inspesaun
ba progresso fisiku iha tereno, Tekniku
husi ADN. IP mos observa fisiku iha
terenoKeramik ba Haris Fatin nian mos
remata ona, Urinor ho Wastafell mos
monta hotu ona.

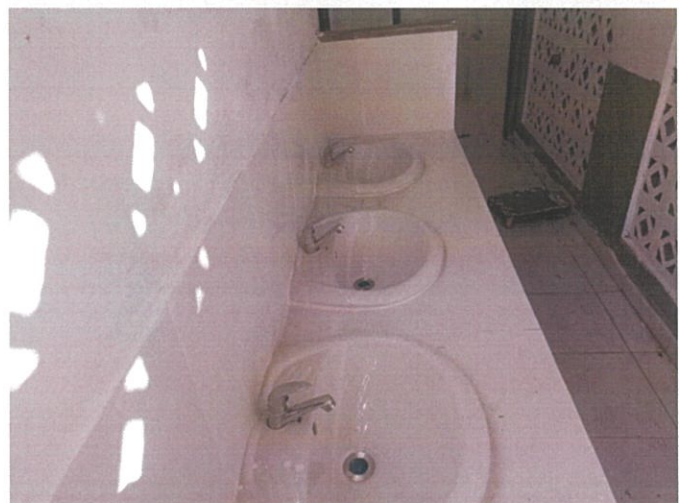



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN. IP
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto
Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa tekniku ADN. IP halo inspesaun
ba progresso fisiku iha tereno, Tekniku
husi ADN. IP Observa ba Profil tank
monta ona.





PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO PROTOTIPO CA + TB, EBF HUTSEO
LOCATION : HATU UDO, MUNICIPIO AINARO

MAIN SUMMARY

ANEXU- HA - 7

NO	ITEM DESCRIPTION	PAGE NO	AMOUNT	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 2,982.93	\$ 1,632.93	1.48%	\$ -	0.00%	\$ 1,632.93	1.48%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	CA/39	\$ 63,158.05	\$ 43,593.63	39.38%	\$ 11,684.16	10.56%	\$ 55,277.79	49.94%
III	BUILDING Tb	TB/39	\$ 25,465.79	\$ 12,328.52	11.14%	\$ 9,755.99	8.81%	\$ 22,084.51	19.95%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORK		\$ 9,748.62	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Total Construction Cost		\$ 101,355.39	\$ 57,555.08	51.99%	\$ 21,440.15	19.37%	\$ 78,995.23	71.36%
B	Overhead		\$ 6,340.00	\$ 2,210.00	2.00%	\$ -	0.00%	\$ 2,210.00	2.00%
C	Contingency		\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	Grand Total		\$ 110,695.39	\$ 59,765.08	53.99%	\$ 21,440.15	19.37%	\$ 81,205.23	73.36%

Responsable Husi :

Verifica Husi :

Sertifica Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu
Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Arc. Francisco X D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN						
Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Município de Ainaro(EBF. HUT-SEO)						
Kompanha : Grupo Komunitari						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	20/06/2023	Hut-seo/Hato-udo Vila	Joaquim Madeira & Claudino Soares dos Santos	Teknico AND. IP	1	 
Husu ba Grupu atu aselera servisu, husu ba Engineeiro atu mantein iha tereno hodi fo orientasaun ba badaen sira hodi executa servisu tuir b of q no desenho.						

ANEXU- HA - 36 # Back-up Data



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projeto : Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021

Data Inspesaun : 20-06-2023

Fatin Inspesaun : Hato-udo Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :9,1246S, Latetude: 125,6119E.

End Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira
: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Teacher Room

Ekipa ADN.IP halo
inspesaun ba progresso fisico
ih tereno, hodi kontrola
kualidade de implementasaun
husi kompanha, no observa
progresso fisiku iha tereno,
progresso lao hela, e
aproveita mos hodi hein
pedido pagamento nebee mak
submete ona ba Owner.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

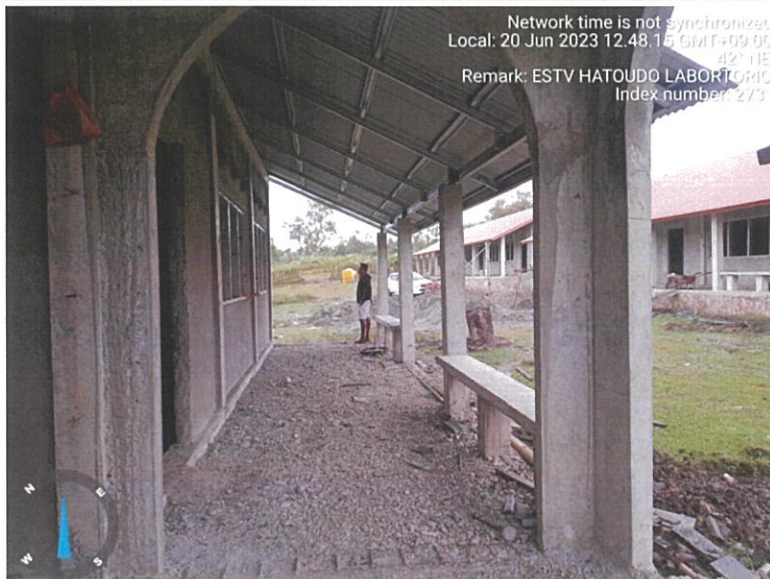

ANEXU- HA - 36 # Back-up Data



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projeto
Nu. Contract

: Projeitu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
: NCB:02/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Teacher Room

Ekipa ADN.IP halo
inspesaun ba progresso fisiko
iha tereno, hodi kontrola
kualidade de implementasaun
husi kompanha, no observa
progresso fisiku iha tereno,
progresso lao hela, e
aproveita mos hodi hein
pedido pagamento nebee mak
submete ona ba Owner.



ANEXU- HA - 36 # Back-up Data



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projeto
Nu. Contract

: Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
: NCB:02/MEJD/DNA/2021

Laboratory room

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa ADN.IP halo
inspesaun ba progresso fisico
ih tereno, hodi kontrola
kualidade de implementasaun
husi kompanha, no observa
progresso fisiku iha tereno,
progresso lao hela, e
aproveita mos hodi hein
pedido pagamento nebee mak
submete ona ba Owner.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO : PROJETO KONSTRUSAUN FOUN BA ESTV HATU-UDO , AINARO
LOCATION : SUCO LEO LIMA,
POSTO ADMINISTRATIVO : HATO UDO VILA ,
MUNICIPIO : AINARO

SUMMARY

MAIN SUMMARY		Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ 1,752.92	\$ 1,040.42	0.34%	\$ -	0.00%	\$ 1,040.42	0.34%
II	CLASSROOM BUILDING C (2 UNITS)	C/39 (i)	US\$ 124,045.06	\$ 71,895.09	23.84%	\$ -	0.00%	\$ 71,895.09	24%
III	TEACHER OFFICE	CB/50	US\$ 88,628.36	\$ 37,196.62	12.33%	\$ 9,987.86	3.31%	\$ 47,184.48	15.65%
IV	LABORATORY COMPUTER (IT)	LB	US\$ 40,059.64	\$ 23,531.47	7.80%	\$ -	0.00%	\$ 23,531.47	7.80%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US\$ \$ 10,500.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 264,985.98	\$ 133,663.60	44.32%	\$ 9,987.86	3.31%	\$ 143,651.47	47.63%
CONTRACTOR FEE (10% X A)			US\$ 26,498.60	\$ 13,366.36	4.43%	\$ -	0.00%	\$ 13,366.36	4.43%
OVERHEAD			US\$ 4,180.00	\$ 800.00	0.27%	\$ -	0.00%	\$ 800.00	0.27%
TAX (2%X (A+B+C))			US\$ 5,913.29	\$ 2,956.60	0.98%	\$ -	0.00%	\$ 2,956.60	0.98%
CONTINGENCY			US\$ 9,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
GRAND TOTAL			US\$ 301,577.87	\$ 150,786.56	50.00%	\$ 9,987.86	3.31%	\$ 160,774.42	53.31%

0.00%

Inspesaun Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. da Edifício Público no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.

(Arc. Francisco D.D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXU-MBS-12# Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Escola Básica Filial Russulau Suco Manetu, Posto Administrativo Maubisse, Município Ainaro

Data Inspesaun : 07/06/2023

Fatin Inspesaun : Russulau/Maubisse

Koordinadas :

Start Point : Long, 8,8341SLatetude: End 125,5842E

Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa Tekniku ADN, IP. Halo inspesaun progresso fisiku ba projeto refere atinje ona ba roofing



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU-MBS-12# Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Escola Básica Filial Russulau Suco Manetu, Posto Administrativo Maubisse, Município Ainaro

Ekpa Tekniku ADN, IP. Halo inspesaun progresso fisiku ba projeto refere atinje ona ba roofing.





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

LOCATION

: SUCO MANETU, POSTO ADMINISTRATIVO MAUBISSE , MUNICIPIO
AINARO

SUMMARY

MAIN SUMMARY		Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,079.26	\$ 1,355.26	1.43%	\$ -	0.00%	\$ 1,355.26	1.43%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 71,553.70	\$ 43,942.28	46.28%	\$ 2,002.72	2.11%	\$ 45,945.00	48.39%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 10,978.70	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 85,611.66	\$ 45,297.54	47.71%	\$ 2,002.72	2.11%	\$ 47,300.26	49.82%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,410.00	1.48%	\$ -	0.00%	\$ 1,410.00	1.48%
GRAND TOTAL			US\$ 94,951.66	\$ 46,707.54	49.19%	\$ 2,002.72	2.11%	\$ 48,710.26	51.30%

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X. D. D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciano da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade,
ADN, I.P.

[illegible]



#ANEXU-MBS-17# Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Data Inspesaun : 07/06/2023

Fatin Inspesaun : Lumluli/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long -8'471,122 S: Latetude: 125'41'11'238'E

End Point : Long : -8'471,122 S, Latetude: 125'41'11'238'E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Ekipa tekniku ADN.IP halo
inspesaun iha tereno, observa
GK halao hela servisu ba
kakuluk nian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Observasaun uha tereno no foto aktual




#ANEXU-MBS-17# Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Sketch & Foto Desenho

Ekipa tekniku ADN.IP halo
inspesaun iha tereno, observa
GK halao hela servisu ba
kakuluk nian.

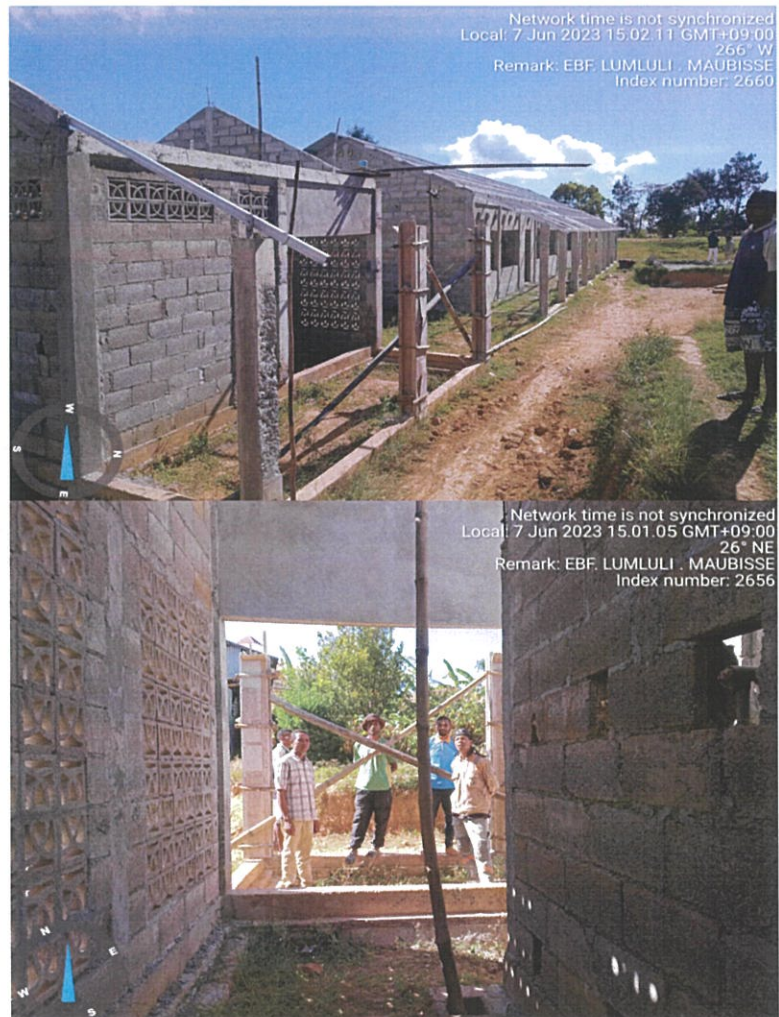

Sketch & Foto Desenho



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



PROJECT NAME
LOCATION

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL LUMULU
: MAULAU, MAUBISSE, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

MAIN SUMMARY		Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ 3,575.00	\$ 1,600.00	1.46%	\$ -	0.00%	\$ 1,600.00	1.46%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 51,213.93	\$ 29,153.18	26.53%	\$ 4,506.79	4.10%	\$ 33,659.97	30.63%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US\$ 260,811.65	\$ 10,038.16	9.13%	\$ -	0.00%	\$ 10,038.16	9.13%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US\$ 20,088.04	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 335,688.62	\$ 40,791.34	37.12%	\$ 4,506.79	4.10%	\$ 45,298.13	41.22%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,310.00	1.19%	\$ -	0.00%	\$ 1,310.00	1.19%
GRAND TOTAL			US\$ 345,028.62	\$ 42,101.34	38.31%	\$ 4,506.79	4.10%	\$ 46,608.13	42.41%

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Bee Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X.D.D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Bee Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun
de Qualidade,
ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 1975 EDU MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO IX GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN IP Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					
--	--	--	--	--	--



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA
LOKASI : SUCO AITUTU, POSTO ADMINISTRATIVO MAUBISSE VILA
MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,079.26	\$ 3,079.26	3.15%	\$ -	0.00%	\$ 3,079.26	3.15%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 71,306.28	\$ 54,305.30	55.50%	\$ 14,684.69	15.01%	\$ 68,989.99	70.51%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 14,115.75	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 88,501.29	57,384.56	58.65%	14,684.69	15.01%	\$ 72,069.25	73.66%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 3,040.00	3.11%	\$ -	0.00%	\$ 3,040.00	3.11%
GRAND TOTAL			US\$ 97,841.29	60,424.56	61.76%	14,684.69	15.01%	\$ 75,109.25	76.77%

Prepared By :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Teknik ADN, I.P Municipio Ainaro

(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Teknik ADN, I.P Municipio Ainaro

Verified By :

(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Engenheiro Senior Edificio Publico e Agua Saneamento ADN, I.P

Verified By :

(Eng. Emerciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade ADN, I.P.



Nome	Local	Rede	Assinatura	Data	Observações
João Paulo Maciel	Local	Rede	[Assinatura]	07/08/2022	Fuiz em trabalho, não pude ir pessoalmente, por isso foi entregue digitalmente. O arquivo encontra-se no Box.
Cláudio Santos	Local	Rede	[Assinatura]	07/08/2022	Fuiz em trabalho, não pude ir pessoalmente, por isso foi entregue digitalmente.
Lucas	Local	Rede	[Assinatura]	07/08/2022	Fuiz em trabalho, não pude ir pessoalmente, por isso foi entregue digitalmente.
Silvia S. Silva	Local	Rede	[Assinatura]	07/08/2022	Fuiz em trabalho, não pude ir pessoalmente, por isso foi entregue digitalmente.



ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Data Inspesaun : 26/05/2023

Fatin Inspesaun : Bermoli/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long -84834'638''S, Latetude: 125'39'26.238' E

End Point : Long : -84834'638''S, Latetude: 125'39'26.238' E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

bservasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba progresso fisico iha tereno, hodi kontrola maibe GK sira sedauk kontinua servisu tamba hein hela pedido pagamento nebee mak Tecnico ADN, IP sei halo hela verifikasaun ba dokumentos pagamento nebee tama ona.



Observasaun iha tereno no Foto Aktual




ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Sketch & Foto Desenho

Ekipa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba progresso fisico iha tereno, hodi kontrola maibe GK sira sedauk kontinua servisu tamba hein hela pedido pagamento nebee mak Tecnico ADN, IP sei halo hela verifikasaun ba dokumentos pagamento nebee tama ona.

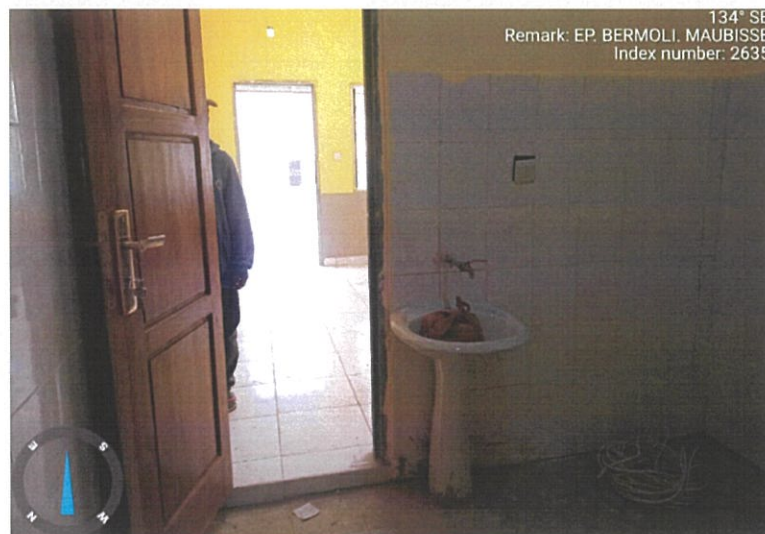

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch & Foto Desenho




ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Ekipa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba progresso fisico iha tereno, hodi kontrola maibe GK sira sedauk kontinua servisu tamba hein hela pedido pagamento nebee mak Tecnico ADN, IP sei halo hela verifikasaun ba dokumentos pagamento nebee tama ona.

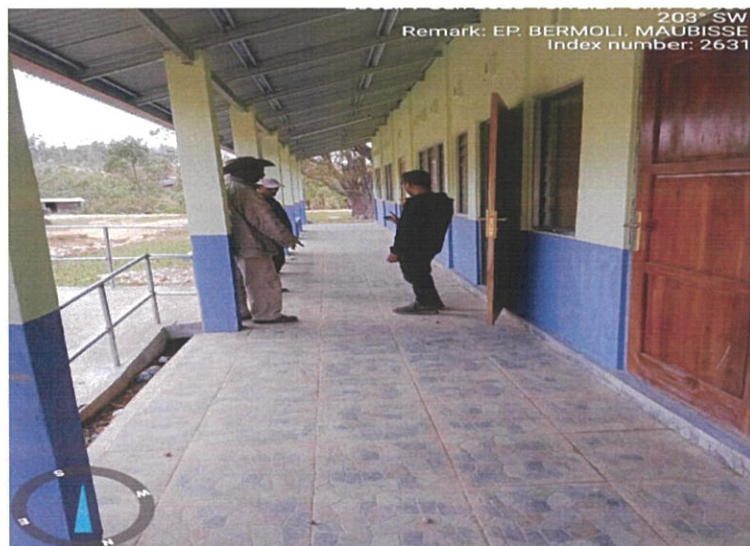



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME

: NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO

BERMOLI

LOCATION

: POSTU ADMINISTRATIVO MAUBISSE, SUCO MANLAU, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY										
MAIN SUMMARY			Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		THIS MONTH	
					AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS		PP/3	US\$ 3,079.26	\$ 3,079.26	3.56%	\$ -	0.00%	\$ 3,079.26	3.56%
II	CLASSROOM BUILDING C2		C/39 (i)	US\$ 61,149.43	\$ 57,462.06	66.45%	\$ 2,214.98	2.56%	\$ 59,677.05	69.01%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS		SW/24 (i)	US\$ 12,902.81	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST				US\$ 77,131.50	\$ 60,541.32	70.01%	2,214.98	2.56%	\$ 62,756.31	72.57%
CONTINGENCY				US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD				US\$ 6,340.00	\$ 6,340.00	7.33%	\$ -	0.00%	\$ 6,340.00	7.33%
GRAND TOTAL				US\$ 86,471.50	\$ 66,881.32	77.34%	\$ 2,214.98	2.56%	\$ 69,096.31	79.91%

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciano da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN IP
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO
BERMOLI

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	12/04/2023	Maubise/Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino Soares Santos	Teknico	1	Husu grupu mantein nafatin servisu no kontrola servisu didiak atu nunee hein pagamento 50% nian hodi kontinua fila fali servisu	
II					2	husu ba grupu atu entrega desenho ba teknico AND. IP iha tempo badak nia laran	





ITI
AINARO



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.
No. kontratu : SSS/142/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 14/06/2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'15,612''S Latetude: 125°30'39,876''E

End Point : Long : - 9°3'51,231''S Latetude: 125°30'37,065''E


Naran Inspector : 1. Romulo J.M Henrique

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Laiha aktividade servisu iha tereno

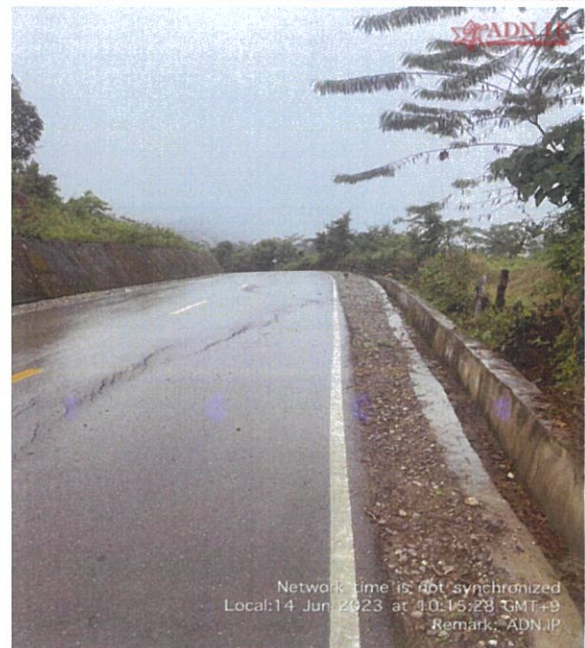



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-5)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.
: SSS/142/MOPTC-2017

Laiha aktividade servisu iha tereno





ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai
Package II Municipality Ainaro**
No. kontratu : **SSS/141/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : 14/06/2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'15,612''S Latetude: 125°30'39,876''E

End Point : Long : - 9°3'51,231''S Latetude: 125°30'37,065''E

Naran Inspector : **1. Romulo J.M Henrique
2. Jaulino H. Rodrigues**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

**Projetu refere atizi ona 100% iha tinan
2020**



Kondisaun Estrada Sarai – Ainaro Vila



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai
Package II Municipality Ainaro
No. kontratu : SSS/141/MOPTC-2017

Projetu Refere atizi ona 100% iha tinan
2020



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu Refere atizi ona 100% iha tinan
2020





ANEXU C1 (ANV-09)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos
Herois Municipality Ainaro.

No. kontratu : 35/MACLNSEACLN/X/2019

Data Inspesaun : 01/06/2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'59,904''S Latetude: 125°30'12,588''E

End Point : Long : - 9°1'59,496''S Latetude: 125°30'10,206''E

Naran Inspector : 1. Romulo J.M Henrique
2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Laiha aktivisades servisu iha tereno





ANEXU C1 (ANV-09)

Back-up Data

Naran Projeto


: New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardim dos
Heroes Municipality Ainaro.

No. kontratu

: 35/MACLNSEACLN/X/2019

Kondisaun iha Tereno

Laiha aktifidade servisu iha tereno

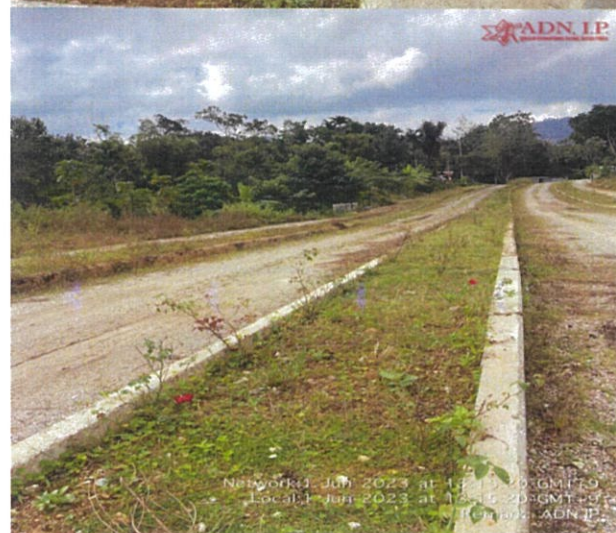



ANEXU C1 (ANV-09)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos
Herois Municipality Ainaro.

No. kontratu : 35/MACLNSEACLN/X/2019

Data Inspesaun : 22/06/2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'59,904''S Latetude: 125°30'12,588''E

End Point : Long : - 9°1'59,496''S Latetude: 125°30'10,206''E

Naran Inspector : 1. Romulo J.M Henrique
2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Inspeksaun Pagamento



Kondisaun iha Tereno



ANEXU C1 (ANV-09)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos
Heroes Municipality Ainaro.
No. kontratu : 35/MACLNSEACLN/X/2019

Inspeksaun Pagamento





ANEXU C1 (ANV-09)

Back-up Data


Naran Projeto

: New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos
Heroes Municipality Ainaro.

No. kontratu

: 35/MACLNSEACLN/X/2019

Inspeksaun Pagamento

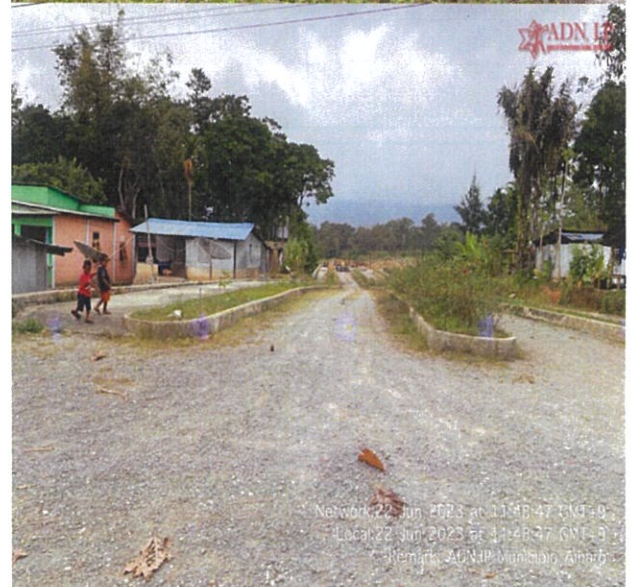



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Roads Name : CONSTRUSAUN ROADWAY, PATHWAY / SIDEWALK AND BOX CULVERT
Lokasi : Alnaro Vila
Contractor : BALADA Unip. Lda

Pay Item No.	CONTRACT DESCRIPTION	SUMMARY										OBSERVASUN
		PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE BILL						
		Amount	Percent	Amount	Percent	Amount	Percent					
100	General Requirements	\$ 37,498.00	6.06%	\$ 24,749.00	4.00%	\$ -	0.00%	\$ 24,749.00	4.00%			
200	Earth Works	\$ 40,858.27	6.60%	\$ 40,858.20	6.60%	\$ -	0.00%	\$ 40,858.20	6.60%			
300	Subbase and Base Course	\$ 36,013.97	5.82%	\$ -	0.00%	\$ 32,943.00	5.32%	\$ 32,943.00	5.32%			
400	Surface Course	\$ 48,040.75	7.76%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
500	Bridge Construction	\$ 99,438.22	16.06%	\$ 94,015.21	15.18%	\$ 1,500.00	0.24%	\$ 95,515.21	15.43%			
600	Drainage and Slope Protection Works	\$ 63,777.92	10.30%	\$ 63,777.92	10.30%	\$ -	0.00%	\$ 63,777.92	10.30%			
700	Miscellaneous Structure	\$ 98,948.12	15.98%	\$ 12,030.22	1.94%	\$ 26,769.29	4.32%	\$ 38,799.51	6.27%			
	ADDITIONAL (Ba item hanesan Contrato Original)											
200	Section 200 Earth Works	\$ 1,288.00	0.21%	\$ -	0.00%	\$ 1,091.20	0.18%	\$ 1,091.20	0.18%			
500	Section 500 Bridge Construction	\$ 15,664.32	2.53%	\$ -	0.00%	\$ 745.92	0.12%	\$ 745.92	0.12%			
600	Section 600 Drainage and Slope Protection Work	\$ 36,338.00	5.87%	\$ -	0.00%	\$ 27,339.40	4.42%	\$ 27,339.40	4.42%			
	ADDITIONAL (ba item feun)											
100	Section 100 General Requirements	\$ 2,200.00	0.36%	\$ -	0.00%	\$ 2,200.00	0.36%	\$ 2,200.00	0.36%			
200	Section 200 Earth Works	\$ 1,757.00	0.28%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
500	Section 500 Bridge Construction	\$ 12,894.19	2.08%	\$ -	0.00%	\$ 6,883.38	1.11%	\$ 6,883.38	1.11%			
600	Section 600 Drainage and slope protection works	\$ 22,834.40	3.69%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
700	Miscellaneous Works	\$ 20,484.00	3.31%	\$ -	0.00%	\$ 12,324.00	1.99%	\$ 12,324.00	1.99%			
	Overhead for additional works	\$ 2,220.00	0.36%	\$ -	0.00%	\$ 6,060.00	0.98%	\$ 6,060.00	0.98%			
A	Total Contract original	\$ 424,575.25	68.57%	\$ 235,430.55	38.02%	\$ 61,212.29	9.89%	\$ 296,642.85	47.91%			
B	Total Additional	\$ 113,459.91	18.32%	\$ -	0.00%	\$ 50,583.90	8.17%	\$ 50,583.90	8.17%			
C	Total Contract Original + Adicional	\$ 538,035.16	86.89%	\$ 235,430.55	38.02%	\$ 111,796.20	18.05%	\$ 347,226.75	56.07%			
D	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 53,803.52	8.69%	\$ 23,543.06	3.80%	\$ 11,179.62	1.81%	\$ 34,722.67	5.61%			
E	Overhead + Overhead for additional works	\$ 15,240.00	2.46%	\$ 3,210.40	0.52%	\$ 6,060.00	0.98%	\$ 6,060.00	0.98%			
F	General Item (A+B+C)	\$ 607,078.67	98.04%	\$ 262,184.01	42.34%	\$ 129,035.82	20.84%	\$ 388,009.42	62.66%			
G	Tax (2% x C)	\$ 12,141.57	1.96%	\$ 5,243.68	0.85%	\$ 2,580.72	0.42%	\$ 7,760.19	1.25%			
H	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 619,220.25	100.00%	\$ 267,427.69	43.19%	\$ 131,616.53	21.26%	\$ 395,769.61	63.91%			
										progress previous 43.44 % diferente ba progres Anterior 54.62% tamba penambahan Item Additional		

Inspeasaun Hual :

Eng. ba Projeta Infraestruturas, Tránsito e Organismo Municipal Alnaro
ADN, I.P.

Verifica Hual :

Eng. Senora ba Projeta Infraestruturas e Irigasaun,
ADN, I.P.

Sertifica Hual :

Eng. Emenglanha, Coordenadora da Unidade de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXU C1 (ANV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta. 0+000 -
5+500, Mau - Ulo Lau Sta. 0+000 - 1+200 Ainaro Municipality
No. kontratu : MPW-W-210064

Data Inspesaun : 01/06/2023

Fatin Inspesaun : Mau Nunu – Mau Ulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -9°0'17,574''S Latetude: 125°29'48,294''E

End Point : Long : -9°0'48,138''S Latetude: 125°28'39,018''E

Naran Inspector : 1. Romulo J.M. Henrique
2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno

Servico iha tereno Parado hela





ANEXU C1 (ANV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta. 0+000 -
5+500, Mau - Ulo Lau Sta. 0+000 - 1+200 Ainaro Municipality
No. kontratu : MPW-W-210064

Service iha tereno Parado hela





ANEXU C1 (ANV-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal
of Ainaro.

No. kontratu : NCB/087/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 01/06/2023

Fatin Inspesaun : Mau Lo – Mau Nunu

Koordinadas :

Start Point : Long : -9°2'45,223''S Latetude: 125°31'17,356 ''E

End Point : Long : -9°0'59,325''S, Latetude: 125°29'12,324''E

Naran Inspector : 1. Romulo J.M Henrique
2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico iha Tereno parado hela





ANEXU C1 (ANV-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal
of Ainaro.
No. kontratu : NCB/087/MOPTC-2016

Servico iha Tereno parado hela



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico iha Tereno parado hela



ANEXU C1 (HA-24)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02), Casa - Hatu - udo (A13).

No. kontratu : NCB/219/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 14/06/2023

Fatin Inspesaun : Casa – Hatu Udo

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°8'13,374''S, Latetude: 125°32'36,181''E

End Point : Long : - 9°6'3,84''S, Latetude: 125°40'54,588''E

Naran Inspector : 1. Eng. Romulo J.M Henrique

: 2. Eng. Jaulino H. Rodrigues

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
Companhia sedauk halo servisu iha tereno



Kondisaun Estrada nebe Parado



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HA-29)

Back-up Data

Naran Projeto

: Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000
- 2+000, Ainaro Municipality

No. kontratu

: RT/005/MOP-2021



Companhia sei halo Servico servico
Embankment





ANEXU C1 (HA-29)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000
- 2+000, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/005/MOP-2021

Data Inspesaun : 14/06/2023

Fatin Inspesaun : Foho Ailico - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°39'50.32"E, Latetude: 9° 6'33.41"S

End Point : Long : 125°39'38.96"E, Latetude: 9° 7'18.82"S

Naran Inspector : 1. Romulo J.M Henrique

2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia sei halo Servico servico
Embankment





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (HA-29)

Roads Name : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality
Lokasi : Foho Ailico - Hatu udo
Contractor : Delong Unip. Lda

ORIGINAL CONTRACT			SUMMARY							
Pay item No.	DESCRIPTION	Amount	Percent	PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE BILL		
				Amount	Percent	Amount	Percent	Amount	Percent	
R-01	General	\$ 6,950.00	1.69%	\$ 1,300.00	0.32%	\$ -	0.00%	\$ 1,300.00	0.32%	
R-03	Earth work	\$ 43,611.24	10.60%	\$ -	0.00%	\$ 40,206.89	9.77%	\$ 40,206.89	9.77%	
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 18,288.99	4.44%	\$ -	0.00%	\$ 7,168.15	1.74%	\$ 7,168.15	1.74%	
R-08	Structure	\$ 256,013.68	62.21%	\$ 32,947.53	8.01%	\$ 39,351.23	9.56%	\$ 72,298.76	17.57%	
R-10	Dayworks	\$ 700.00	0.17%	\$ -	0.00%	\$ 700.00	0.17%	\$ 700.00	0.17%	
R-11	Routine maintenance	\$ 16,855.60	4.10%	\$ 8,458.80	2.06%	\$ -	0.00%	\$ 8,458.80	2.06%	
R-15	Provisional sum	\$ 2,000.00	0.49%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
A	Total - net cost in USD	\$ 344,419.51	83.70%	\$ 42,706.33	10.38%	\$ 87,426.27	21.25%	\$ 130,132.60	31.62%	
B	Profit (Net costx %); 10%	\$ 34,441.95	8.37%	\$ 4,270.63	1.04%	\$ 8,742.63	2.12%	\$ 13,013.26	3.16%	
C	OVER HEAD	\$ 24,570.00	5.97%	\$ 4,270.63	1.04%	\$ 8,742.63	2.12%	\$ 13,013.26	3.16%	
D	Tax ((net cost + profit+ Over head) x 2 %)	\$ 8,068.63	1.96%	\$ 1,024.95	0.25%	\$ 2,098.23	0.51%	\$ 3,123.18	0.76%	
Total-Gross Cost			\$ 411,500.10	100.00%	\$ 52,272.54	12.70%	\$ 107,009.76	26.00%	\$ 159,282.30	38.71%

Inspesaun Husi :

(Eng. Romulo J.M. Henrique) (Eng. Jaulino H. Rodrigues)
Eng. ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Eng. Remigio Da C. Dos Santos.)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXU C1 (HA-30)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage
2+000-3+500, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/006/MOP-2021

Data Inspesaun : 14/05/2023

Fatin Inspesaun : Foho Ailico - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°39'38.96"E, Latetude: 9° 7'18.82"S

End Point : Long : 125°39'49.62"E, Latetude: 9° 7'49.69"S

Naran Inspector : 1. Romulo J.M Henriques

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Hada stone monsorny





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HA-30)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage
2+000-3+500, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/006/MOP-2021

Hada stone masonry

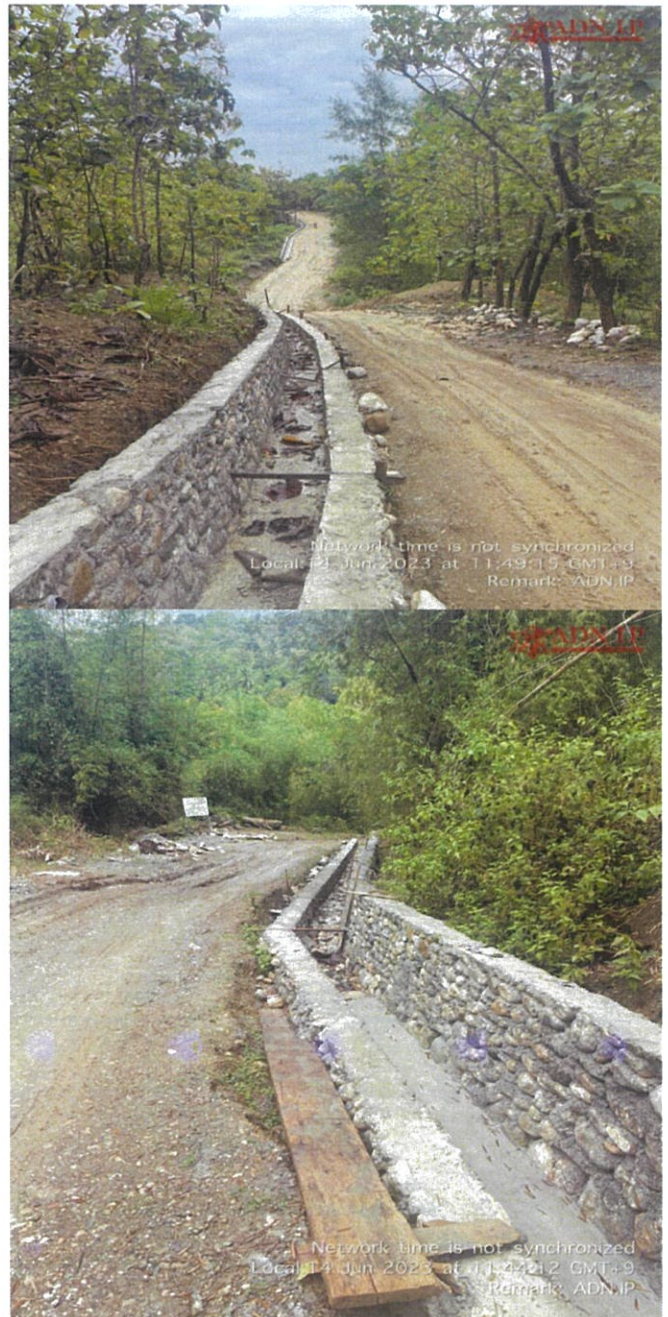




ANEXU C1 (HA-30)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage
2+000-3+500, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/006/MOP-2021

Hada stone monsorny

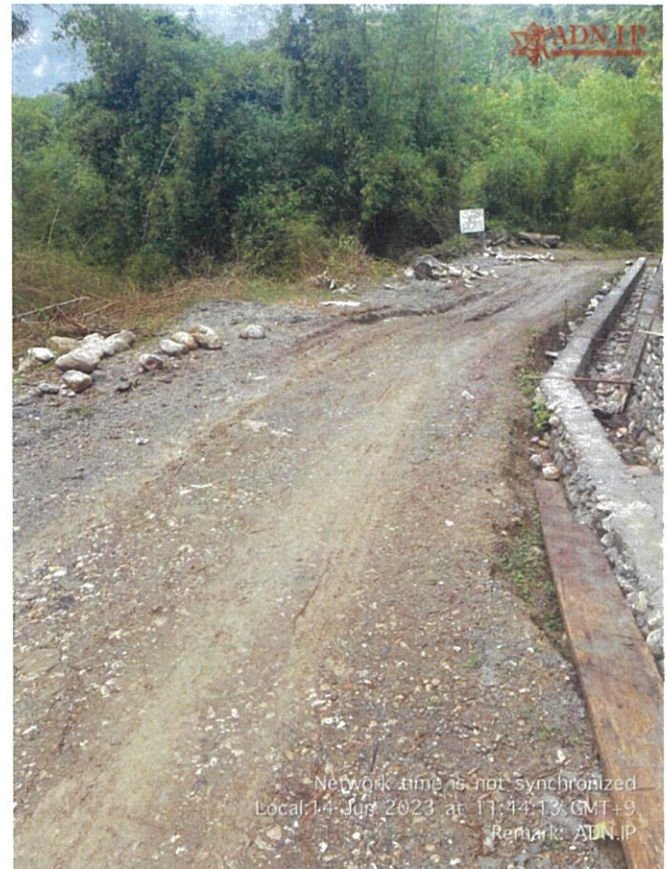



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (HA-30)

Roads Name : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chamage 2+000-3+500, Ainaro Municipality
Lokasi : Foho Ailico - Hatu udo
Contractor : BERMAU/ANA Unip. Lda

Pay item No.	DESCRIPTION	Amount	Percent	PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE BILL	
				Amount	Percent	Amount	Percent	Amount	Percent
R-01	General	\$ 6,450.00	1.44%	\$ 650.00	0.14%	\$ -	0.00%	\$ 650.00	0.14%
R-03	Earth work	\$ 24,479.16	5.45%	\$ 24,172.10	5.38%	\$ -	0.00%	\$ 24,172.10	5.38%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 3,285.48	0.73%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structure	\$ 340,216.87	75.78%	\$ 76,540.93	17.05%	\$ 6,329.80	1.41%	\$ 82,870.73	18.46%
R-10	Dayworks	\$ 700.00	0.16%	\$ 700.00	0.16%	\$ -	0.00%	\$ 700.00	0.16%
R-11	Routine maintenance	\$ 4,033.00	0.90%	\$ 4,033.00	0.90%	\$ -	0.00%	\$ 4,033.00	0.90%
R-15	Provisional sum	\$ 1,000.00	0.22%	\$ 1,000.00	0.22%	\$ -	0.00%	\$ 1,000.00	0.22%
A	Total - net cost in USD	\$ 380,164.51	84.68%	\$ 107,096.03	23.85%	\$ 6,329.80	1.41%	\$ 113,425.83	25.26%
B	Profit (Net costx %): 10%	\$ 38,016.45	8.47%	\$ 10,709.60	2.39%	\$ 632.98	0.14%	\$ 11,342.58	2.53%
C	OVER HEAD	\$ 21,970.00	4.89%	\$ 10,709.60	2.39%	\$ 632.98	0.14%	\$ 11,342.58	2.53%
D	Tax ((net cost + profit+ Over head) x 2 %)	\$ 8,803.02	1.96%	\$ 2,570.30	0.57%	\$ 151.92	0.03%	\$ 2,722.22	0.61%
Total-Gross Cost		\$ 448,953.98	100.00%	\$ 131,085.54	29.20%	\$ 7,747.68	1.73%	\$ 138,833.22	30.92%

Inspesasaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Romulo J.M. Henriques) (Eng. Jaulino H. Rodrigues)
Eng. ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Remigio Da C. Dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXU C1 (HA-31)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Project - Zumalai (Covalima) to JCT Cassa Ainaro and Hatu-Udo
No. kontratu : MPW-W-230007

Data Inspesaun : 14/06/2023

Fatin Inspesaun : Foho Ailiko - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°27'26.46"E, Latetude: 9°10'35.71"S

End Point : Long : 125°41'14.27"E, Latetude: 9° 5'31.88"S

Naran Inspector : 1. Romulo J.M Henrique
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

**Projetu refere kontinua Kontinua
servico Embankment**





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HA-31)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Project - Zumalai (Covalima) to JCT Cassa Ainaro
and Hatu-Udo
No. kontratu : MPW-W-230007

Projetu refere kontinua Kontinua
servico Embankment





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Contract No. : MPW-W-230007
Contract Name : Road Maintenance Project - Zumalai (Covalima) to JCT Cassa Ainaro and Hatu-Udo
Contractor : EDS Express Distribution Services Diverses Unip. Lda.

CONTRACT			SUMMARY					
Bill No.	Item Description	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage	UP TO DATE BILL
100	GENERAL REQUIREMENT	\$ 5,600.00	2.86%	\$ 2,800.00	1.43%	\$ -	0.00%	\$ 2,800.00
200	EARTHWORK	\$ 112,788.56	57.65%	\$ 108,930.16	55.68%	\$ 1,015.10	0.52%	\$ 109,945.26
300	SUB BASE AND BASE COURSE	\$ 21,840.00	11.16%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 24,200.00	12.37%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUCTURE	\$ 8,340.00	4.26%	\$ 2,112.00	1.08%	\$ -	0.00%	\$ 2,112.00
A	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 172,768.56	88.31%	\$ 113,842.16	58.19%	\$ 1,015.10	0.52%	\$ 114,857.26
B	PROFIT AND OVERHEAD 10% X A	\$ 17,276.86	8.83%	\$ 11,384.22	5.82%	\$ 101.51	0.05%	\$ 11,485.73
C	OVERHEAD	\$ 1,750.00	0.89%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
D	TAX 2% X (A+B+C)	\$ 3,835.91	1.96%	\$ 2,504.53	1.28%	\$ 22.33	0.01%	\$ 2,526.86
E	GRAND TOTAL (A+B+C+D)	\$ 195,631.33	100.00%	\$ 127,730.91	65.29%	\$ 1,138.94	0.58%	\$ 128,869.85

Inspesaun Husi :


(Romulo J.M. Henrique) (Eng. Romulo H. Rodrigues)
Eng. ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :


(Eng. Remigio de C. Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)



ANEXU C1 (MBS-45)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 -
6+400 Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/021/MOP-2019

Data Inspesaun : 20/06/2023

Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'4,044''S, Latetude: 125°35'48,432''E

End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

Naran Inspector : 1. Romulo J.M Henrique

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado





ANEXU C1 (MBS-45)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 -
6+400 Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/021/MOP-2019

Projetu refere sei parado



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado





ANEXU C1 (MBS-46)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 -
7+800 Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/022/MOP-2019

Data Inspesaun : 20/06/2023

Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'4,044''S, Latetude: 125°35'48,432''E


End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

Naran Inspector : 1. Romulo J.M. Henrique
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Serevico iha tereno Remata ona

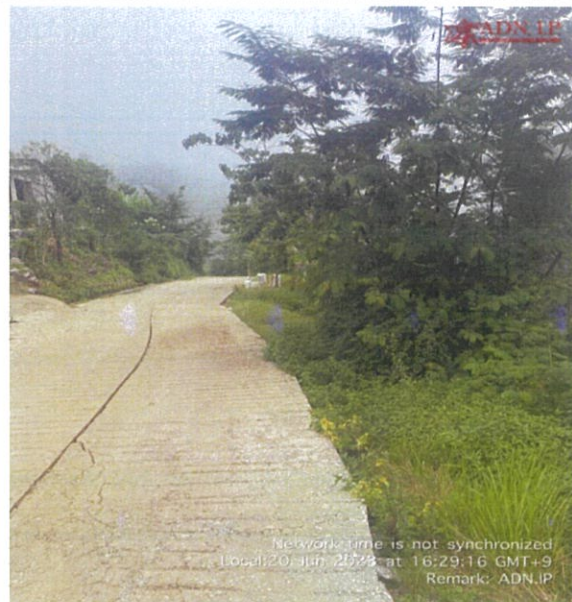



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-46)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 -
7+800 Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/022/MOP-2019

Serevico iha tereno Remata ona



Sketch & Foto Desenho

Saluran Tipe 2

Serevico iha tereno Remata ona





ANEXU C1 (MBS-64)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu
Administrativo Maubessi, Municipio Ainaro
No. kontratu : RFQ-CD-MOP-22006

Data Inspesaun : 20/06/2023

Fatin Inspesaun : Fleixa Maubessi

Koordinadas :


Start Point : Long : - 9 109383 Latetude: 125'664008

Naran Inspector : 1. Romulo J.M Henrique
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno

Projeto refere hela 10 %

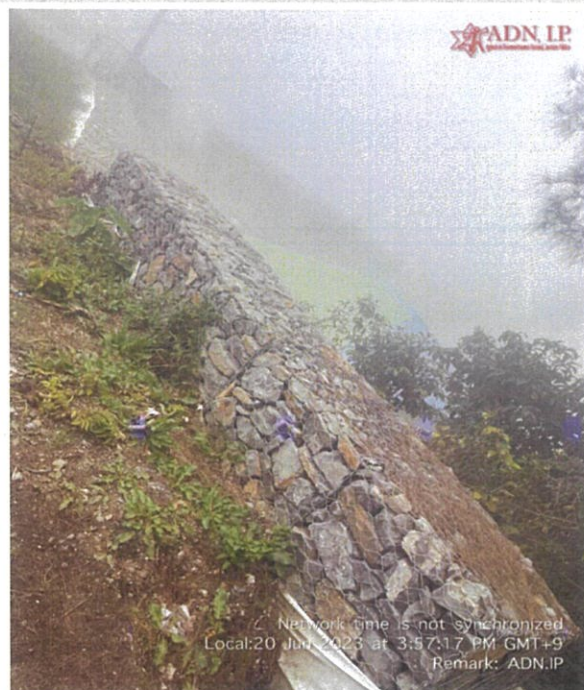



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-64)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu
Administrativo Maubessi, Municipio Ainaro
No. kontratu : RFQ-CD-MOP-22006

Projeto refere hela 10 %





Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 -
5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality.
No. kontratu : MPW-W-210065

Data Inspesaun : 20/06/2023

Fatin Inspesaun : Lesuati Mausiga

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E


Naran Inspector : 1. Romulo J.M Henrique

: 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico iha tereno parado hela

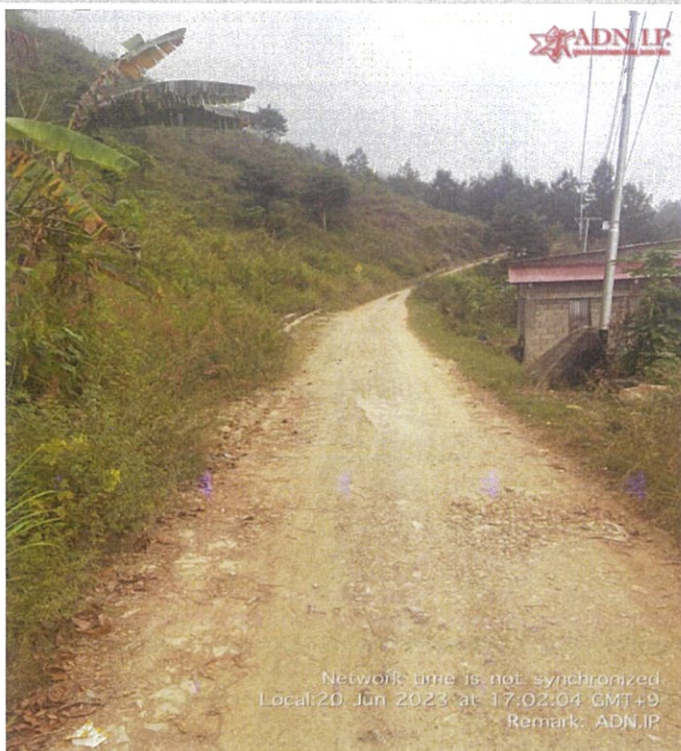



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Back-up Data

Naran Projeto

: Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality.

No. kontratu

: MPW-W-210065

Servico iha tereno parado hela



Servico iha tereno parado hela





Naran Eng.	Romulo J.M Henrique																																						
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Th	fr	Sa	Su	Ma	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Ma	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Ma	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	OBS						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
AINARO VILA (ANY)	4	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	Emergency Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III Ainaro Municipality	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	6	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaly	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	9	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/ 2019	LM-CD	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																																
							Actual																																
	10	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	14	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Lau Sta. 0+000 - 1+200 Ainaro Municipality	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	15	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	17	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 - municipal of Ainaro	Ei Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	18	Road Maintenance Project - Zumalai (Covalima) to Jct Cassa Ainaro and Hatu-Udo Sta 0+100 - 12+810	Expres Distribution Services Unip. Lda	MPW-W-230007	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
HATUDO (HA)	23	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	24	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	29	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	30	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	31	Rural Road Rehabilitation of Foho Allico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	32	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	34	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	35	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	36	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																

[illegible]

