



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL IMPLEMENTASAUN PROJETUS MUNISÍPIU LIQUIÇÁ

MAIU 2023



SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO LIQUICA MAIO 2023

Prepara Husi :



(Eng. Juninho Antonio A. Da Cruz)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Liquica ADN, I.P


(Eng. Domingos S. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Liquica ADN, I.P


(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. ba Projeto Mechanical Electrical
Município Liquica ADN, I.P

Verifica Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e
Irigação, ADN, I.P


(Deolindo de Fatima Marques)
Chefe Seksaun ba Projeto M. E & ITC, ADN, I.P

Sertifica Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO.....	1
I. INTRODUSAUN.	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Liquica	3
1.3 Lista Projecto.....	7
II. PROGRESU FISIKU	18
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan.....	18
III OBSTÁKLU IHA TERENU.....	18
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	18
VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU	19
4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu.....	19

INDICE TABELA

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquica	5
Tabela 1. 2: Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquica.....	5
Tabela 1.3. 1 Projecto Municipio Liquica Por Fundus Financiamento	7
Tabela 1.3. 2 Projecto Municipio Liquica Por Sectores	10
Tabela 1.3. 3 Projecto Municipio Liquica Por Ministerios	14
Tabela 4. 1 Dadus Populasaun Munisipiu Liquica.....	18

I. INTRODUSAUN.

1.1 Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu aseguira katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba Projeto sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio Liquica



Mapa hatudu pozisaun Administrasaun Munisipal Liquica iha luan area 543 km² ho populasaun nain – 63.403 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Liquica iha Postu Administrativu tolu (3) , Sukus 23 no aldeias 134, mak hanesan hatudu iha Tabela 1

Tabela 1: Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.

Bazartete		Liquica		Maubara	
sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Fahilelo	3	Açumano	4	Gugleur	11
Fatumasi	4	Darulete	4	Guiço	5
Lauhata	5	Dato	10	Lissadila	7
Leorema	10	Hatuquesi	8	Maubaralissa	5
Maumeta	4	Leotala	5	Vatuboro	5
Metagou	3	Loidahar	4	Vatuvou	10
Motaulun	3	Luculai	4	Vaviquinia	7
Tibar	4	-	-	-	-
Ulmera	9	-	-	-	-
Total	45	-	39	-	50

Data husi: Livro 3B OJE 2021, pag 58

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquica

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Liquica								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro			3			3	
2	Administrasaun no Financas			0			0	
3	Motorista			1			1	
4	Seguransa			0			0	
Total				4			4	

Tabela 1. 2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquica

ASSET ADN,IP MUNICIPIO LIQUICA								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio			1				
2	Kareta			1				
3	Desktop HP / Monitor			1				
4	Laptop HP			1				
5	Printer Cannon			1				
6	UPS			1				
7	Armario File			1				
8	Armario Tau hena			3				
9	Meja escritorio			1				
10	Meja han			1				
11	Meja TV (kiik)			1				
12	Kadeira escritorio			6				
13	Kadeira han			4				

14	Sofa			1 Set				
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3			3 Set				
16	Jeleira			1				
17	Water Dispenser			1				Aát
18	TV + Parabola			1 Set				
19	AC			4				
20	Kipas Angin			1				
21	Kompor			1				
22	Kompor Gas			1				
23	Rack sepatu			3				
24	Rack Piring			1				
25	Lampu			11				
26	Water Pump Sanyo			0				

1.3 Lista Projecto

Projeto hotu ne'ebe akumula iha lista ne'e bazeia ba dados Projeto nebe sei la'o hela no mos Projeto nebe abandona ona iha tinan barak nia laran, Projeto hirak ne'e fahe tui lista tabela 1.3.1 Projeto Por Fundus Financiamento, Tabela 1.3.2 Projeto Por Sector no tabela 1.3.3 Projeto Por Ministerio, no lista detallu kada Projeto bele hare iha #Aneksu A.

Tabela 1.3. 1 Projeto Municipio Liquica Por Fundus Financiamento



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM (CD + BS + TP + FUNDO COVID etc..) + EMERGENCY + PDIM			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	26	\$9,994,924.89	\$3,470,475.15	34.72%
2	LIQUICA VILA	28	\$6,536,646.23	\$2,951,665.77	45.16%
3	MAUBARA	23	\$11,933,568.73	\$8,366,718.02	70.11%
	Grand Total	77	\$28,465,139.85	\$14,788,858.94	51.95%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	4	\$7,489,606.18	\$2,214,796.66	29.57%
2	LIQUICA VILA	6	\$3,749,637.24	\$1,666,256.59	44.44%
3	MAUBARA	6	\$8,985,274.03	\$7,487,497.85	83.33%
	Grand Total	16	\$20,224,517.45	\$11,368,551.10	56.21%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM -CD			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	9	\$903,783.80	\$420,905.30	46.57%
2	LIQUICA VILA	11	\$1,833,608.92	\$820,732.28	44.76%
3	MAUBARA	9	\$1,038,932.08	\$485,422.60	46.72%
	Grand Total	29	\$3,776,324.80	\$1,727,060.18	45.73%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM -BS			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	4	\$264,355.05	\$109,620.38	41.47%
2	LIQUICA VILA	2	\$178,518.94	\$144,064.85	80.70%
3	MAUBARA	2	\$344,450.27	\$228,841.80	66.44%
	Grand Total	8	\$787,324.26	\$482,527.03	61.29%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM -TP			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	4	\$289,002.61	\$179,679.34	62.17%
2	LIQUICA VILA	8	\$597,947.63	\$320,612.05	53.62%
3	MAUBARA	3	\$359,595.59	\$164,955.77	45.87%
	Grand Total	15	\$1,246,545.83	\$665,247.16	53.37%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FUNDO - COVID			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	\$124,725.48	\$44,268.56	35.49%
2	LIQUICA VILA				
3	MAUBARA				
Grand Total		2	\$124,725.48	\$44,268.56	35.49%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	EMERGENCY			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	\$769,262.43	\$501,204.91	65.15%
2	LIQUICA VILA				
3	MAUBARA	2	\$1,148,871.06		
Grand Total		4	\$1,918,133.49	\$501,204.91	26.13%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	1	\$154,189.34	-	-
2	LIQUICA VILA	1	\$176,933.50		
3	MAUBARA	1	\$56,445.70	-	-
Grand Total		3	\$387,568.54	-	-

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

Tabela 1.3. 2 Projeto Municipio Liquica Por Sectores



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$23,950.17	\$16,726.74	69.84%
2	AGUA E SANEAMENTO	3	\$293,629.77	\$167,315.56	56.98%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	4	\$333,652.02	\$33,401.02	10.01%
4	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	17	\$2,314,878.59	\$891,275.44	38.50%
5	ELÉCTRICIDADE	7	\$6,985,634.87	\$2,740,591.91	39.23%
6	ESTRADAS E PONTES	37	\$15,684,193.73	\$10,071,349.21	64.21%
7	MANUTENÇÃO, REAB. E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS	1	\$585,119.40	\$-	0.00%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$224,232.82	\$40,744.14	18.17%
9	PORTOS	1	\$1,394,750.00	\$657,275.92	47.12%
10	SAUDE	2	\$124,725.48	\$44,268.56	35.49%
11	TURISMO	2	\$500,373.00	\$125,910.44	25.16%
GRAND TOTAL		77	\$28,465,139.85	\$14,788,858.94	51.95%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	AGRICULTURA	1	\$23,950.17	\$16,726.74	69.84%
2	AGUA E SANEAMENTO	2	\$122,664.12	\$94,609.06	77.13%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$154,189.34	\$-	
4	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	6	\$620,756.13	\$367,989.60	59.28%
5	ELÉCTRICIDADE	2	\$5,296,850.84	\$1,578,737.87	29.81%
6	ESTRADAS E PONTES	12	\$3,651,788.81	\$1,368,143.32	37.47%
7	MANUTENÇÃO, REAB. E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES				
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN				
9	PORTOS				
10	SAUDE	2	\$124,725.48	\$44,268.56	35.49%
11	TURISMO				
Grand Total		26	\$9,994,924.89	\$3,458,105.44	34.72%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR	LIQUICA VILA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO				
3	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$123,016.98	\$33,401.02	27.15%
4	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	8	\$1,334,526.87	\$358,330.07	26.85%
5	ELÉCTRICIDADE	2	\$896,984.00	\$525,578.75	58.59%
6	ESTRADAS E PONTES	13	\$2,563,135.56	\$1,336,335.87	52.14%
7	MANUTENÇÃO, REAB. E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES				
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$224,232.82	\$40,744.14	18.17%
9	PORTOS	1	\$1,394,750.00	\$657,275.92	47.12%
10	SAUDE				
11	TURISMO				
Grand Total		28	\$6,536,646.23	\$2,951,665.77	45.16%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR	MAUBARA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$170,965.65	\$72,706.50	42.53%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$56,445.70	\$-	
4	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	3	\$359,595.59	\$164,955.77	45.87%
5	ELÉCTRICIDADE	3	\$791,800.03	\$636,275.29	80.36%
6	ESTRADAS E PONTES	12	\$9,469,269.36	\$7,366,870.02	77.80%
7	MANUTENÇÃO, REAB. E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES	1	\$585,119.40		
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN				
9	PORTOS				
10	SAUDE				
11	TURISMO	2	\$500,373.00	\$125,910.44	25.16%
Grand Total		23	\$11,933,568.73	\$8,366,718.02	70.11%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

Tabela 1.3. 3 Projeto Municipio Liquica Por Ministerios



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	ESTATAL	3	\$387,568.54		
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	2	\$71,249.49	\$57,470.88	80.66%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	47	\$23,449,092.97	\$12,896,753.99	55.00%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	17	\$2,314,878.59	\$891,275.44	38.50%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$99,484.80	\$82,502.69	82.93%
6	MINISTERIO SAUDE	2	\$124,725.48	\$44,268.56	35.49%
7	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$1,394,750.00	\$657,275.92	47.12%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$500,373.00	\$125,910.44	25.16%
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	2	\$123,016.98	\$33,401.02	27.15%
Grand Total		77	\$28,465,139.85	\$14,788,858.94	51.95%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	ESTATAL	1	\$154,189.34		
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$23,950.17	\$16,726.74	69.84%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	15	\$8,971,818.97	\$2,958,987.56	32.98%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	6	\$620,756.13	\$367,989.60	59.28%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$99,484.80	\$82,502.69	82.93%
6	MINISTERIO SAUDE	2	\$124,725.48	\$44,268.56	35.49%
7	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN				
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL				
Grand Total		26	\$9,994,924.89	\$3,470,475.15	34.72%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	LIQUICA VILA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	ESTATAL	1	\$176,933.50		
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$47,299.32	\$40,744.14	86.14%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	15	\$3,460,119.56	\$1,861,914.62	53.81%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	8	\$1,334,526.87	\$358,330.07	26.85%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU				
6	MINISTERIO SAUDE				
7	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$1,394,750.00	\$657,275.92	47.12%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	2	\$123,016.98	\$33,401.02	27.15%
Grand Total		28	\$6,536,646.23	\$2,951,665.77	45.16%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	MAUBARA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	ESTATAL	1	\$56,445.70		
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS				
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	17	\$11,017,154.44	\$8,075,851.81	73.30%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	3	\$359,595.59	\$164,955.77	45.87%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU				
6	MINISTERIO SAUDE				
7	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN				
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$500,373.00	\$125,910.44	25.16%
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL				
Grand Total		23	\$11,933,568.73	\$8,366,718.02	70.11%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

Tabela 4. 1 : Dadus Populasaun Munisipiu Liquica

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2023				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Bazartete	31,983	9,158	9,039	7,089	6,697
Liquiça	25,334	6,978	7,348	5,672	5,337
Maubara	25,234	7,088	6,802	5,766	5,578

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi Progressu servisu nebe kompanha sira atinji iha fulan neé nia laran, husi lista nebe iha #Anexu B hatudu progressu aktual fulan ida neé ho nia persentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento nebe hetan husi progressu fulan ida neé, ikus liu persentagen aktual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativa husi porsento anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detailho bele hare iha #Anexu B, detallu ba Backup Fotografia #Anexu C1, Detallu ba Backup BoQ #Anexu C2 no Instrusaun servisu bele hare #Anexu D

III. OBSTÁKLU IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Durante iha Fulan ida nia laran, problema nebe ami enjineiru municipio hasoru mak hanesan :

1. Projeto lao tarde
2. Companhia balun servisu la tuir spesifikasaun
3. Companhia balun servisu la iha Site Engineer
4. Difikulidade ba Ekipa ADN M.Liquica hasoru susar ba Be'e mos


VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu

1. Rekomenda ba Kompanhia sira servisu tuir spesifikasaun nebe iha ona
2. Rekomenda ba Kompanhia sira tenke iha Site Engineer iha terenu

Rekomenda ba ADN.I.P. Nacional liu-liu ba Superior sira hodi hare ba Edificio ADN.I.P.

Note : Assinatura Husi Enjineiru Municipio Liquica

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Liquica					
No	Deskrisaun	Identidade			
		Naran Kompletu e Asinatura	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia
1	Enjineiru	 Juninho António A. Da Cruz	216	Enjineiru EPAS	
		 Domingos S. Martins	160	Enjineira ITI	
		 Camilio de Jesus	061	Enjineiru METIC	

2	Enjineira	 Nencia F.O. do Rêgo	173	Enjineira VEBD	
3	Motorista	 Rui Antonio Gaio	029	Motorista	



#ANEXO A

Lista Geral Projeto On-going Municipio Liquica - Maio 2023

NU	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESO FISIKU (%)	PROGRESO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECT	OBSERVA SAUN
1	New Installation MV, LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	BAZARTETE	LIQUICA	Mina Petro Leste Unip, Lda	RDTL-11004589	\$ 499,250.84	Oct. 22, 2010	100.00%	90.00%	\$ 449,325.76	\$ 49,925.08	ABANDONA	Defeltu Grave no la Funsiona
2	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRICULTURA E PESÇAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019-19726	\$ 23,950.17	Dec. 5, 2019	77.60%	69.84%	\$ 16,726.74	\$ 7,223.43	ON-GOING	Provezorlamente servisu paradu hela
3	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	\$ 67,492.69	Nov. 10, 2019	61.37%	55.24%	\$ 37,280.23	\$ 30,212.46	ON-GOING	
4	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuals Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	\$ 23,179.32	Oct. 22, 2019	79.42%	52.23%	\$ 12,106.37	\$ 11,072.90	ON-GOING	Provezorlamente servisu paradu hela
5	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	\$ 66,557.90	Oct. 23, 2020	73.90%	66.51%	\$ 44,268.56	\$ 22,289.34	ON-GOING	ongoing
6	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Alpeio-Liquica	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDTU/MP/E/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	\$ 99,484.80	Sept. 9, 2019	92.14%	82.93%	\$ 82,502.69	\$ 16,982.11	PHO	Falta retensi
7	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	EMERGENCIA	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Sail Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	\$ 502,473.28	Sept. 20, 2021	100.00%	99.75%	\$ 501,204.91	\$ 1,268.37	FHO	FHO
8	Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	Aquarius Construction Unip.Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 154,189.34	Aug. 31, 2021	9.33%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
9	R4D Rural Road Spot Improvement Fahlebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-NCB-R -21030	\$ 149,732.87	Oct. 01, 2021	53.64%	29.06%	\$ 43,507.04	\$ 106,225.83	ON-GOING	
10	R4D Rural Road Spot Improvement Fahlebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-RFQ - 21017	\$ 88,852.44	Oct. 01, 2021	50.57%	13.35%	\$ 11,862.47	\$ 76,989.97	ON-GOING	
11	R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa - Fahlebo Chainage 0+000-7+000, Iliquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Hatuleo Unip Lda	MPW-W-210144	\$ 88,425.80	Oct. 01, 2021	97.88%	81.72%	\$ 72,258.53	\$ 16,167.27	ON-GOING	
12	Rural Road Spot Improvement Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000 -10+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	CRAELEKI BERCOLI UNIPESOAAL LDA	MPW-W-210145	\$ 62,024.04	Oct. 01, 2021	69.08%	59.23%	\$ 36,734.04	\$ 25,290.00	ON-GOING	
13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahlebo - Bucumera Chainage 0+000+6+500I Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	TM Calleba Unip.Lda	MPW-W-210158	\$ 158,465.33	Oct. 01, 2021	59.94%	41.98%	\$ 66,517.54	\$ 91,947.79	ON-GOING	
14	Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	ZYC UNIPESOAAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	\$ 58,167.58	11/01/2022	24.74%	0.00%	\$ -		ON-GOING	
15	Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	U-Rema Unip. Lda.	NCB:15/MEJD/DNA/2021	\$ 264,260.83	1/11/2021	76.17%	57.15%	\$ 151,030.03	\$ 113,230.80	ON-GOING	
16	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE BAURA	-	\$ 9,072.12	15/10/2021	47.14%	0.00%	\$ -		ON-GOING	
17	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Ermeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE ERMETA	-	\$ 86,365.84	15/10/2021	70.24%	70.12%	\$ 60,563.88	\$ 25,801.96	ON-GOING	
18	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE CASSAIT	-	\$ 78,250.89	15/10/2021	61.59%	61.17%	\$ 47,866.87	\$ 30,384.02	ON-GOING	
19	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Bogoro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE ESG-PARALELO	-	\$ 115,313.76	15/10/2021	61.97%	61.79%	\$ 71,248.59	\$ 44,065.17	ON-GOING	
20	Engineering Procurement Construction-Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning Extension Transformer Bay Of The Existing 150/20KV Liquica Substation to Supply Power to Tibar Bay Port	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	BAZARTETE	LIQUICA	China Shandong International Economic And Technical Cooperation Group. LTD	RFP/054/MOP-2021	\$ 4,797,600.00	Dec. 16, 2021	35.26%	23.54%	\$ 1,129,412.11	\$ 3,668,187.89	ON-GOING	
21	Supervision Consultant for Construction of Intersection In the Existing Dili - Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road - A03) Sta. 0+000 - Sta. 0+620	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Leio Engineering Unipessoal Lda	RFP/072/MOP-2021	\$ 154,000.00	Dec. 14, 2021	79.80%	75.81%	\$ 116,748.95	\$ 37,251.05	ON-GOING	
22	Construction of Intersection in the Existing Dili-Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road-A03)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Aitula Construction, Lda	RT/070/MOP-2021	\$ 2,038,755.34	Dec. 1, 2021	88.40%	25.47%	\$ 519,309.84	\$ 1,519,445.50	ON-GOING	
23	R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Maumeta - Metagou - Bazartete Chainage 0+000 - 10+000, Cunaba - Lukulal Chainage 0+000 - 2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	AP Santava Unip. Lda	MOP/CD/RFQ/ERD/22006	\$ 41,712.18	Aug. 29, 2022	24.28%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	



24	R4D Rural Roads Routine Maintenance : Libaloa - Fahilebo Chainage 0 + 000 - 7 + 000, Fahilebo - Fatumasi Chainage 0 + 000 - 2 + 300, Fahilebo - Bucumera Chainage 0 + 000 - 6 + 500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Ambou Unip. Lda	MOP/CD/RFO/ERD/22004	\$ 61,864.99	Aug. 29, 2022	31.81%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
25	R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Metagou-Albenu Chainage 0 + 000 - 7 + 600, Taitabi-Kutulau Chainage 0 + 000 - 1 + 700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MPW-W-220147	\$ 38,693.39	Aug. 29, 2023	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
26	Obra Konstrusaun ba Rekuperasaun Estragus husi Chelas 04 Abril 2021 Moru Proteksaun Estrada Nacional Tibar-Gleno (Nasuta), Suco Tibar Posto Adm. Bazartete, Municipio Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergencia	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	FIKIKAY, Unipessoal, Lda	MPW-W-230009	\$ 266,789.15	Feb. 6, 2023	37.88%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
27	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	ECT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	\$ 1,394,750.00	May 17, 2017	47.12%	47.12%	\$ 657,275.92	\$ 737,474.08	ON-GOING	
28	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Liquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Konl Leopa, Alpelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	LIQUICA VILA	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CCI-PEN : 00000371	\$ 276,484.00	July 6, 2016	92.77%	83.49%	\$ 230,841.25	\$ 45,642.75	Paradu	La lha ona espasu atu kontinua
29	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0 + 000 - 5 + 000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raeiti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	\$ 452,362.93	Dec. 20, 2019	97.15%	86.79%	\$ 392,619.64	\$ 59,743.29	ON-GOING	
30	Manutensaun Kanals Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Banlr Lema Unip.Lda	RDTL 0000	\$ 47,299.32	Aug. 18, 2021	95.71%	86.14%	\$ 40,744.14	\$ 6,555.18	PHO	
31	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 176,933.50	Aug. 31, 2021	3.83%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
32	R4D Rural Road Spot Improvement Beriakuldu-Laberiaka Chainage 0 + 000-2 + 500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21025	\$ 131,219.62	Oct. 01, 2021	88.11%	78.74%	\$ 103,320.71	\$ 27,898.91	ON-GOING	
33	R4D Rural Road Spot Improvement Taitabi - Kutulau Chainage 0 + 000-1 + 700, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MOP - CD - NCB-R - 21036	\$ 123,631.72	Oct. 01, 2021	89.79%	55.75%	\$ 68,927.23	\$ 54,704.49	ON-GOING	
34	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou - Albenu Chainage 0 + 000-7 + 600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	MOP - CD - NCB -R - 21038	\$ 238,739.71	Oct. 01, 2021	82.88%	52.78%	\$ 126,004.90	\$ 112,734.81	ON-GOING	
35	R4D Rural Road Spot Improvement Dato - Loidahar Chainage 0 + 000-12 + 300, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Luquell Oan Unipessoal Lda	MOP-CD-NCB-R - 21039	\$ 188,589.13	Oct. 01, 2021	85.82%	63.30%	\$ 119,370.39	\$ 69,218.74	ON-GOING	
36	R4D Rural Road Spot Improvement Albenu - Asumanu - Leurema Chainage 5 + 000 - 10 + 000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Calulu, Unip Lda	MOP - CD - NCB -R - 21035	\$ 162,215.27	Oct. 01, 2021	72.51%	62.80%	\$ 101,878.04	\$ 60,337.23	ON-GOING	
37	R4D Rural Road Spot Improvement Albenu-Asumanu-Leurema Chainage 0 + 000-5 + 000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Vicaroman, Unip Lda	MOP - CD NCB - R - 21034	\$ 165,363.43	Oct. 01, 2021	87.85%	77.84%	\$ 128,723.68	\$ 36,639.75	ON-GOING	
38	R4D Rural Road Spot Improvement Beriakuldu - Laberiaka Chainage 2 + 500-5 + 400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Claridade Unip,Lda	MPW-W-210163	\$ 167,071.89	Oct. 01, 2021	64.80%	42.49%	\$ 70,992.44	\$ 96,079.45	ON-GOING	
39	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0 + 000-2 + 000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Craeleki Bercoli, Unip Lda	MPW-W-210143	\$ 76,423.05	Oct. 01, 2021	77.68%	49.95%	\$ 38,170.38	\$ 38,252.67	ON-GOING	
40	Projeltu Konstrusaun foun ESG publico 01 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	Roman Furak Unip,Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	\$ 167,079.099	Nov. 1, 2021	55.08%	42.57%	\$ 71,119.04	\$ 95,960.05	ON-GOING	
41	For Roads Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara, Carimbala - Loes (A03)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Chantei Chander Unipessoal Lda	MPW-W-210202	\$ 112,505.280	13/12/2021	96.58%	84.93%	\$ 95,546.18	\$ 16,959.10	ON-GOING	
42	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Mauboque	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBC MAUBOQUE	-	\$ 112,530.010	15/10/2021	64.50%	64.04%	\$ 72,061.99	\$ 40,468.02	ON-GOING	
43	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBC 1,2,3 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBC 1,2,3 LIQUICA	-	\$ 99,456.040	15/10/2021	62.64%	62.52%	\$ 62,183.88	\$ 37,272.16	ON-GOING	
44	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Loidahar	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE LOIDAHAR	-	\$ 79,735.630	15/10/2021	62.57%	62.57%	\$ 49,889.00	\$ 29,846.63	ON-GOING	
45	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Laciolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE Ebf 1,2 LACIOLEMA	-	\$ 89,650.660	15/10/2021	63.88%	63.60%	\$ 57,017.76	\$ 32,632.90	ON-GOING	
46	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Tolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF 1,2 TOLEMA	-	\$ 88,407.020	15/10/2021	52.10%	52.10%	\$ 46,058.40	\$ 42,348.62	ON-GOING	
47	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Luculai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF 1,2 LUCULAI	-	\$ 5,151.290	15/10/2021	50.48%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
48	Consultant Services to Supervise EPC Contractor for the Up-Gradation of Liquica 150/20kV Substation to Supply Power to Tibar Bay Port	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	LIQUICA VILA	LIQUICA	PT. Artefak Arkindo (Indonesia) JV with Jazicasnu Unipessoal Lda	RFP/054/MOP-2021	\$ 620,500.000	Dec. 16, 2021	50.00%	4750.00%	\$ 294,737.50	\$ 325,762.50	ON-GOING	



49	New Construction of "Escola CAFE" Building at Liquica Municipality	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	RICS Unipessoal Lda	NCB/138/MEJD-2021	\$ 692,517.120	June 8, 2022	4.66%	0.00%	\$ -	\$ 692,517.12		
50	New Construction Of Water Drill Installation and House For Panel No Jardim Dos Heróis De Liquica	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACÃO NACIONAL	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalka Unipessoal, Lda	12/MACLN/XI/2022	\$ 43,007.950	Nov. 1, 2022	34.66%	26.23%	\$ 11,279.95	\$ 31,728.00	ON-GOING	
51	New Construction Of Excavation Work Wall, Levelling Work and Pavement Work No Jardim De Heróis De Liquica	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACÃO NACIONAL	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara Unip Lda	26/MACLN/XI/2022	\$ 80,009.030	Nov. 23, 2022	32.89%	1.11%	\$ 22,121.07	\$ 57,887.96	ON-GOING	
52	Rehabilitasaun Estrada,Bebadiri - Lebokaliako Chainage , Liquica 0+000 - 5+000 (5.0 Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raelti Unip. Lda	RT/003/MOP-2021	\$ 313,023.19	March 8, 2022	57.76%	29.00%	\$ 90,782.28	\$ 222,240.91	ON-GOING	
53	R4D Rural Roads Rehabilitasaun Estrada Rural Dato - Liquica Package I Sta. 0+000-2+500, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Kay Megi Lara Unip. Lda JV Nheu Unip. Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD/220010	\$ 344,788.120	Aug. 29, 2022	22.15%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
54	R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Albeno-Asumanu-Leurema Chainage 0+000 - 10+000, Dato-Loldahar Chainage 0+000 - 12+300, Beriakulidu-Laberliaka Chainage 0+000 - 5+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Claridade Unip,Lda	MPW-W-220148	\$ 87,202.220	Aug. 29, 2022	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
55	Addt. Poste Ilga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Fu Unip,Lda	RDTL - 0000	\$ 13,000.00	Jan. 1, 2016	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	Kontratu ladauk lha no fiziku la eziste
56	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	\$ 288,760.22	July 6, 2016	85.11%	75.36%	\$ 217,606.07	\$ 71,154.15	ON-GOING	
57	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	\$ 275,000.00	Dec. 27, 2016	40.00%	0.00%	\$ 104,500.00	\$ 170,500.00	ON-GOING	ADN, I.P la hare
58	Rehabilitasaun Sistema be'e mos lha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	MAUBARA	LIQUICA	Oceania Const Unip,Lda	NCB-MOP-190051	\$ 170,965.65	Jan. 3, 2019	54.99%	42.53%	\$ 72,706.50	\$ 98,259.15	ON-GOING	Provizoriamente paradu hela
59	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Dongsung Engineering Co.Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	\$ 7,693,101.00	May 3, 2017	87.42%	76.97%	\$ 6,725,312.12	\$ 967,788.88	ON-GOING	
60	R4D Rural Road Maintenance Beriakulidu - Laberliaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Lullana Unip,Lda	MPW-W-190098	\$ 50,702.59	Aug. 28, 2019	95.90%	86.31%	\$ 43,761.73	\$ 6,940.86	PHO	
61	Konstrusaun Moru Haleu no Posto Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	MAUBARA	LIQUICA	Rafiq Unipessoal, Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	\$ 56,445.70	July 21, 2021	16.32%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	ADN, I.P La Hare
62	R4D Rural Road Spot Improvement Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Rito - Pu, Unipessoal,Lda	MOP -CD-RFQ - 21013	\$ 67,382.23	Oct. 01, 2021	31.94%	21.35%	\$ 14,389.17	\$ 52,993.06	ON-GOING	
63	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Malibo, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21033	\$ 152,622.90	Oct. 01, 2021	66.20%	50.97%	\$ 77,792.62	\$ 74,830.28	ON-GOING	
64	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia)-Maubaralisa Chainage 0+000-4+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Nheu, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21027	\$ 173,484.62	Oct. 01, 2021	100.00%	90.00%	\$ 156,135.30	\$ 17,349.32	ON-GOING	
65	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 0+000-4+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Murak, Unipessoal Lda	MPW-W-210157	\$ 153,049.65	Oct. 01, 2021	80.22%	62.06%	\$ 94,989.12	\$ 58,060.53	ON-GOING	
66	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Meta Loe Crae Bau Unip,Lda	MPW-W-210160	\$ 198,698.25	Oct. 01, 2021	69.87%	51.14%	\$ 101,607.79	\$ 97,090.46	ON-GOING	
67	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo -Gisu Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Nazico Unip Lda	-	\$ 114,789.50	Oct. 01, 2021	57.72%	41.04%	\$ 47,107.97	\$ 67,681.53	ON-GOING	
68	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina) - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Lullana Unip,Lda	MPW-W-210161	\$ 213,930.25	Oct. 01, 2021	74.88%	49.44%	\$ 105,774.20	\$ 108,156.05	ON-GOING	
69	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Gariana	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MAUBARA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF GARIANA	-	\$ 117,902.04	Oct. 15, 2021	43.03%	20.01%	\$ 50,732.50	\$ 67,169.54	ON-GOING	
70	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Tafo Manuhulu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MAUBARA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF TAPO MANUHULU	-	\$ 100,033.33	Oct. 15, 2021	52.28%	50.96%	\$ 50,972.29	\$ 49,061.04	ON-GOING	
71	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Maubara/Batuvou	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MAUBARA	LIQUICA	MEJD PKRIE ESG-PARALELO MAUBARA/BATUVOU	-	\$ 141,660.22	Oct. 15, 2021	44.65%	20.41%	\$ 63,250.98	\$ 78,409.24	ON-GOING	
72	Feasibility study for New Construction of Industrial Park in Liquica, Timor Leste	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	HABERAN UNIPESOAAL LDA (TIMOR LESTE) in Joint Venture with PT ITS TEKNO SAINS (INDONESIA)	RFP/077/MTCI-2021	\$ 225,373.00	March 24, 2022	10.00%	9.50%	\$ 21,410.44	\$ 203,962.56	ON-GOING	
73	Installation foun ba Linha de Media Tensaun, Baixa Tensaun e Baixadas em Liquica - Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Nia construction, Lda	0000	\$ 490,039.81	Dec. 4, 2012	94.93%	85.44%	\$ 418,669.22	\$ 71,370.59	Paradu	Defeltu balun ladauk hadia ate a data
74	Calamidade, Obra Construção de Recuperação de Calamidade Muro Estrutura Protecção de Ponte em Loes, Pacote II, (Sta. 0+000 -Sta. 0+080 & Sta. 0+200 -Sta. 0+440)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	EMERGENCIA	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES	MAUBARA	LIQUICA	Conjunto Mulheres Empresarial de Timor (CEMT), Lda	MPW-W 220256	\$ 585,119.40	Nov. 30, 2022	0.80%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

75	R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Barcau - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500, Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Nheu Unip.Lda	MOP/CD/RFQ/ERD/22008	\$ 45,935.36	Aug. 29, 2022	28.20%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
76	R4D Rural Road Periodic Maintenance: Malaisera-Lisadila Chainage 0+000 - 9+600, Samaropo-Gisu 0+000 - 2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Rafio Unip. Lda	MOP/CD/RFQ/ERD/22009	\$ 41,821.35	Aug. 29, 2023	20.42%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
77	Obra Construção de Recuperação de Calamidade Moru Estrutura Protecção Ponte Loes, Pacote I (Sta. 0+080 to Sta. 0+200) Postu Adm. Maubara, Município Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergencia	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Centelzilumen Unip. Lda	MPW-W-220252	\$ 563,751.66	Nov. 29, 2022	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
TOTAL									\$ 28,465,139.85				\$ 14,788,858.94	51.95%		



(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Eng. ba Edificio Publiku Agua e Saneamento, ADN,I.P


(Eng. Domingos S. Martins)
Eng. ba Projektu Infrastrutura Transporte e Irigasaun, ADN,I.P


(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. Mekanikal e Elektrial ADN,I.P

VERIFIKA HUSI,

(Eng. Remigio da C.S.dos Santos)
Engineru Senior ba Projektu Infrastrutura Transporte e Irigasaun
ADN,I.P


(Arq. Francisco Xavier D D. Jeronimo)
Engineru Senior ba Projektu Edificio Publiko
no Be'e Saneamento ADN,I.P


(Eng. Deolindo de Fatima Marques)
Chefe Seksaun Mekanikal
e Elektrial & ITC ADN,I.P

SERTIFIKA HUSI,

(Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade, ADN,I.P



ANEXO B

PROGRESSU FISICO MUNICIPIO LIQUICA



											May-23		
NU	NARAN PROJETU	DONO DO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	OBSERVASAUN	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Commulative Progress (%)
1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	BAZARTETE	LIQUICA	Mina Petro Leste Unip, Lda	RDTL-11004589	\$ 499,250.84	Abandona	100.00%	0.00%	100.00%
2	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	\$ 23,950.17	Provizionamente Servisu Paradu	77.60%	0.00%	77.60%
3	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	\$ 67,492.69	Provizionamente Servisu Paradu	41.01%	20.36%	61.37%
4	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	\$ 23,179.32	Provizionamente Servisu Paradu	79.42%	0.00%	79.42%
5	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	FUNDO COVID	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	\$ 66,557.90	Servisu refere seidaun 100%	73.90%	0.00%	73.90%
6	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasau Iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM -CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AN D/DA- RFO/TX/2019/EDIFICIO	\$ 99,484.80	PHO	92.14%	0.00%	92.14%
7	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Sali Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	\$ 502,473.28	PHO	100.00%	0.00%	100.00%
8	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 154,189.34	ADN, I.P la hare	9.33%	0.00%	9.33%
9	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-NCB-R -21030	\$ 149,732.87	ongoing	53.64%	0.00%	53.64%
10	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000-2+300 , Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-RFQ - 21017	\$ 88,852.44	ongoing	50.57%	0.00%	50.57%
11	R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa-Fahilebo Chainage 0+000-7+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Hatuleo Unip Lda	MPW-W-210144	\$ 88,425.80	ongoing	97.88%	0.00%	97.88%
12	Rural Road Spot Improvement Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000 - 10+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Craeleki Bercoli Unip,Lda	MPW-W-210145	\$ 62,024.04	ongoing	69.08%	0.00%	69.08%
13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	TM Caileba Unip,Lda	MPW-W-210158	\$ 158,465.33	ongoing	59.94%	0.00%	59.94%
14	Supply and installation connection for isolation and laboratorium Building Maumeta Liquica	MINISTERIO DA SAUDE	Fundo Covid	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	ZYC UNIPESOAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	\$ 58,167.58	ongoing	24.74%	0.00%	24.74%
15	Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM -BS	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	U-Rema Unip. Lda.	NCB:15/MEJD/DNA/2021	\$ 264,260.83	ongoing	76.17%	0.00%	76.17%
16	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE BAURA	-	\$ 9,072.12	ongoing	47.14%	0.00%	47.14%
17	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Ermeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE ERMETA	-	\$ 86,365.84	ongoing	70.12%	0.12%	70.24%
18	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE CASSAIT	-	\$ 78,250.89	ongoing	61.17%	0.42%	61.59%
19	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Bogoro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE ESG-PARALELO	-	\$ 115,313.76	ongoing	61.79%	0.18%	61.97%
20	Engineering Procurement Construction-Design, Suplly, Installation, Testing and Commissioning Extension Transformer Bay Of The Existing 150/20KV Liquica Substation to Suplly Power to Tibar Bay Port	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	BAZARTETE	LIQUICA	China Shandong International Economic And Technical Cooperation Group. LTD	RFP/054/MOP-2021	\$ 4,797,600.00	ongoing	35.26%	0.00%	35.26%
21	Supervision Consultant for Construction of Intersection in the Existing Dili - Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road - A03) Sta. 0+000 - Sta. 0+620	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Lelo Engineering Unipessoal Lda	RFP/072/MOP-2021	\$ 154,000.00	ongoing	79.80%	0.00%	79.80%
22	Construction of Intersection in the Existing Dili-Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road-A03)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Aitula Construction, Lda	RT/070/MOP-2021	\$ 1,738,869.60	ongoing	88.40%	0.00%	88.40%
23	R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Maumeta - Metagou - Bazartete Chainage 0+000 - 10+000, Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 - 2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	AP Santava Unip. Lda	MOP/CD/RFQ/ERD/22006	\$ 41,712.18	Aug. 29, 2022	24.28%	0.00%	24.28%
24	R4D Rural Roads Routine Maintenance : Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000, Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300, Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000 - 6+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Ambou Unip. Lda	MOP/CD/RFQ/ERD/22004	\$ 61,864.99	Aug. 29, 2022	31.81%	0.00%	31.81%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

25	R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Metagou-Aibenu Chainage 0+000 - 7+600, Taltabi-Kutulau Chainage 0+000 - 1+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MPW-W-220147	\$ 38,693.39	Aug. 29, 2023	0.00%	0.00%	0.00%
26	Obra Konstrusaun ba Rekuperasaun Estragus husi Cheias 04 Abril 2021 Moru Proteksaun Estrada Nacional Tibar-Gleno (Nasuta), Suco Tibar Posto Adm. Bazartete, Municipio Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergencia	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	FIKIKAY, Unipessoal, Lda	MPW-W-230009	\$ 266,789.15	Feb. 6, 2023	0.00%	37.88%	37.88%
27	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	\$ 1,394,750.00	ongoing	47.12%	0.00%	47.12%
28	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Liquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	LIQUICA VILA	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	\$ 276,484.00	ongoing	92.77%	0.00%	92.77%
29	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAU	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raeli Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	\$ 452,362.93	ongoing	97.15%	0.00%	97.15%
30	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAU	LIQUICA VILA	LIQUICA	Banir Lema Unip,Lda	RDTL 0000	\$ 47,299.32	PHO	95.71%	0.00%	95.71%
31	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAU	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 176,933.50	ADN, I.P la hare	3.83%	0.00%	3.83%
32	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21025	\$ 131,219.62	ongoing	88.11%	0.00%	88.11%
33	R4D Rural Road Spot Improvement Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MOP - CD - NCB-R - 21036	\$ 123,631.72	ongoing	89.79%	0.00%	89.79%
34	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou - Aibenu Chainage 0+000-7+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	MOP - CD - NCB-R - 21038	\$ 238,739.71	ongoing	82.14%	0.75%	82.88%
35	R4D Rural Road Spot Improvement Dato - Loidahar Chainage 0+000-12+300, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Luqueli Oan Unipessoal Lda	MOP-CD-NCB-R - 21039	\$ 188,589.13	ongoing	85.82%	0.00%	85.82%
36	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 5+000-10+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Caiulu, Unip Lda	MOP - CD - NCB - R - 21035	\$ 162,215.27	ongoing	72.51%	0.00%	72.51%
37	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leurema Chainage 0+000-5+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Vicaroman, Unip Lda	MOP - CD NCB - R - 21034	\$ 165,363.43	ongoing	87.85%	0.00%	87.85%
38	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu - Laberlaka Chainage 2+500-5+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Claridade Unip,Lda	MPW-W-210163	\$ 167,071.89	ongoing	64.80%	0.00%	64.80%
39	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Craeleki Bercoli, Unip Lda	MPW-W-210143	\$ 76,423.05	ongoing	77.68%	0.00%	77.68%
40	Projeitu Konstrusaun foun ESG publico 01 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM -CD	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	Roman Furak Unip,Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	\$ 167,079.10	ongoing	54.78%	0.30%	55.08%
41	Roads Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (AO3)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	CHANTEL CHANDER, UNIPESSOAL LDA	MPW-W-210202	\$ 112,505.28	ongoing	96.58%	0.00%	96.58%
42	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Mauboque	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBC MAUBOQUE	-	\$ 112,530.01	ongoing	64.04%	0.46%	64.50%
43	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBC 1,2,3 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBC 1,2,3 LIQUICA	-	\$ 99,456.040	ongoing	62.52%	0.12%	62.64%
44	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Loidahar	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE LOIDAHAR	-	\$ 79,735.63	ongoing	50.10%	12.47%	62.57%
45	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Laclema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE Ebf 1,2 LACLOLEMA	-	\$ 89,650.66	ongoing	63.60%	0.28%	63.88%
46	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Tolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF 1,2 TOLEMA	-	\$ 88,407.02	ongoing	52.10%	0.00%	52.10%
47	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Luculai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF 1,2 LUCULAI	-	\$ 5,151.29	ongoing	50.48%	0.00%	50.48%
48	Consultant Services to Supervise EPC Contractor for the Up-Gradaion of Liquica 150/20kV Substation to Supply Power to Tibar Bay Port	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	LIQUICA VILA	LIQUICA	PT. Artefak Arkindo (Indonesia) JV with Jazicasnu Unipessoal Lda	RFP/054/MOP-2021	\$ 620,500.00	ongoing	50.00%	0.00%	50.00%
49	New Construction of "Escola CAFE" Building at Liquica Municipality	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	FI	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	RICS Unipessoal Lda	NCB/138/MEJD-2021	\$ 692,517.12	ongoing	0.00%	4.66%	4.66%
50	New Construction Of Water Drill Installation and House For Panel No Jardim Dos Herois De Liquica	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	12/MACLN/XI/2022	\$ 43,007.95	ongoing	33.99%	0.66%	34.66%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

51	New Construction Of Excavation Work Wall, Levelling Work and Pavement Work No Jardim De Herois De Liquica	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara Unip Lda	26/MACLN/XI/2022	\$ 80,009.03	ongoing	32.75%	0.14%	32.89%
52	Rehabilitasaun Estrada, Bebadiri - Lebokalako Chainage , Liquica 0+000 - 5+000 (5.0 Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raelti Unip. Lda	RT/003/MOP-2021	\$ 313,023.19	ongoing	57.76%	0.00%	57.76%
53	R4D Rural Roads Rehabilitasaun Estrada Rural Dato - Liquica Package I Sta. 0+000-2+500, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Kay Megi Lara Unip. Lda JV Nheu Unip. Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD/220010	\$ 344,788.12	ongoing	22.15%	0.00%	22.15%
54	R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Aibeno-Asumanu-Leurema Chainage 0+000 - 10+000, Dato-Loidahar Chainage 0+000 - 12+300, Berlakuudu-Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA/ LV34	LIQUICA	Claridade Unip,Lda	MPW-W-220148	\$ 87,202.22	Aug. 29, 2022	0.00%	0.00%	0.00%
55	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Fu Unip,Lda	RDTL - 0000	\$ 13,000.00	ongoing	0.00%	0.00%	0.00%
56	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	\$ 288,760.22	ongoing	85.11%	0.00%	85.11%
57	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	\$ 275,000.00	ADN, I.P la hare	40.00%	0.00%	40.00%
58	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	MAUBARA	LIQUICA	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	\$ 170,965.65	Provisionamente Servisu Paradu	54.99%	0.00%	54.99%
59	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	\$ 7,693,101.00	ongoing	87.42%	0.00%	87.42%
60	R4D Rural Road Maintenance Berlakuudu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-190098	\$ 50,702.59	PHO	95.90%	0.00%	95.90%
61	Konstrusaun Moru Haleu no Posto Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAU	MAUBARA	LIQUICA	Rafiq Unipessoal, Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	\$ 56,445.70	ADN, I.P la hare	16.32%	0.00%	16.32%
62	R4D Rural Road Spot Improvement Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Rito - Pu, Unipessoal,Lda	MOP -CD-RFQ - 21013	\$ 67,382.23	ongoing	31.94%	0.00%	31.94%
63	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Malibo, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21033	\$ 152,622.90	ongoing	66.20%	0.00%	66.20%
64	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia)-Maubaralisa Chainage 0+000-4+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Nheu, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21027	\$ 173,484.62	ongoing	100.00%	0.00%	100.00%
65	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 0+000-4+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Murak, Unipessoal Lda	MOP - CD- NCB-R- 21032	\$ 153,049.65	ongoing	80.22%	0.00%	80.22%
66	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia) - Maubaralisa - Chainage 8+400-12+500)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Meta Loe Crae Bau Unip,Lda	MPW-W-210160	\$ 198,698.25	ongoing	69.15%	0.72%	69.87%
67	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo -Gisu Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Nazico Unip Lda	MPW-W-210152	\$ 114,789.50	ongoing	57.72%	0.00%	57.72%
68	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina) - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-210161	\$ 213,930.25	ongoing	74.36%	0.53%	74.88%
69	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Gariana	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MAUBARA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF GARIANA	-	\$ 117,902.04	ongoing	20.01%	23.02%	43.03%
70	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Tapo Manuhulu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MAUBARA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF TAPO	-	\$ 100,033.33	ongoing	50.96%	1.32%	52.28%
71	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Maubara/Batuvou	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MAUBARA	LIQUICA	MEJD PKRIE ESG-PARALELO	-	\$ 141,660.22	ongoing	32.35%	12.30%	44.65%
72	Feasibility study for New Construction of Industrial Park in Liquica, Timor Leste	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	HABERAN UNIPessoal LDA (TIMOR LESTE) in Joint Venture with PT ITS TEKNO SAINS (INDONESIA)	RFP/077/MTCI-2021	\$ 225,373.00	ongoing	10.00%	0.00%	10.00%
73	Installation foun ba Linha de Media Tensaun, Baixa Tensaun e Baixadas em Liquica - Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Nia construction, Lda	0000	\$ 490,039.81	ongoing	94.93%	0.00%	94.93%
74	Calamidade, Obra Construcao de Recuperacao de Calamidade Muro Estrutura Protecao de Ponte em Loes, Pacote II, (Sta. 0+000 - Sta. 0+080 & Sta. 0+200 - Sta. 0+440)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES	MAUBARA	LIQUICA	Conjunto Mulheres Empresarial de Timor (CEMT), Lda	MPW-W 220256	\$ 585,119.40	ongoing	0.52%	0.29%	0.80%




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



75	R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Barcau - Maubarlisa Chainage 0+000 - 12+500, Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Nheu Unip.Lda	MOP/CD/RFQ/ERD/22008	\$ 45,935.36	ongoing	28.20%	0.00%	28.20%
76	R4D Rural Road Periodic Maintenance: Malaisera-Lisadila Chainage 0+000 - 9+600, Samaropo-Gisu 0+000 - 2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Rafio Unip. Lda	MOP/CD/RFQ/ERD/22009	\$ 41,821.35	ongoing	20.42%	0.00%	20.42%
77	Obra Construção de Recuperação de Calamidade Moru Estrutura Protecção Ponte Loes, Pacote I (Sta. 0+080 to Sta. 0+200) Postu Adm. Maubara, Município Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergencia	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA/MBR25	LIQUICA	Centeliziumen Unip. Lda	MPW-W-220252	\$ 563,751.66	ongoing	0.00%	0.00%	0.00%


INSPESAUN HUSI,



(Eng. Domingos Soares Martins)
Engineru ba Projeitu Infrastrutura
Transporte
e Irigasaun ADN, I.P


(Eng. Juninho António Abrantes da Cruz)
Engineru ba Projeitu Edificio Publiku Agua
e
Saneamento ADN, I.P


(Eng. Camilo de Jesus)
Engineru ba Projeitu Mekanikal
e Elektrikal ADN, I.P

VERIFIKA HUSI,


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Engineru Senior ba Projeitu
Infrastrutura Transporte e Irigasaun
ADN, I.P


(Arq. Francisco Xavier D. D. Jeronimo)
Engineru Senior ba Projeitu Edificio
Publiku
Agua e Saneamento ADN, I.P


(Eng. Deolindo de Fatima Marques)
Chefe Departamentu Mekanikal
e Elektrikal & ITC ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI,


(Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 – (BZT6)
Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica
Kompania : Milcha Naupai Unip. Lda.
No. kontratu : (RFQ:19/029-Q-R)

Data Inspesaun : 10 Maio 2023

Fatin Inspesaun : Bazartete - Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : S - 8.604923, Latetude :

End Point : Long : E +125° 366751, Latetude :

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2.

Sketch & Foto Desenho

Ekipa ADN, IP Munisipiu Liquisa nian halao
inspesaun ba projeitu MEJD – Konstrusaun
Foun EBF Hatugara Bazartete, Liquica
lokaliza iha suku Hatugara, postu Bazartete,
munisipiu Liquisa. Neebe implementa husi
kompania Milcha Unip. Lda.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 – (BZT6) Back-up Data

Naran Projeto
Kompania
No. kontratu

: Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica
: Milcha Naupai Unip. Lda.
: (RFQ:19/029-Q-R)

Sketch & Foto Desenho

Iha inspesaun pagamentu ba projeitu refere
halao kordenasaun ho ekipa projeitu nain hare
ba servisu fiziku neebe lao ona, ho balu
finaliza ona iha terenu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Ekipa nafatin foo instrusaun ba kompania no
trabaliador sira hodi aselera servisu no
prosesu stock material mai iha terenu tenki
lao lais.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEKSU C2 - (BZT6)				VERIFIED BY ADN, I P					
No	ITEM SERVISU	ORIGINAL CONTRACT	VERIFIED BY ADN, I P	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL TO DATE	
		AMOUNT (\$)	AMOUNT (\$)	AMOUNT (\$)	PERCENT (%)	AMOUNT (\$)	PERCENT (%)	AMOUNT (\$)	PERCENT (%)
I	PRELIMINARIES	\$ 2.400,00	\$ 2.229,26	\$ 1.529,45	2,27%	\$ -	0,00%	\$ 1.529,45	2,27%
II	GROUNDWORK	\$ 3.769,72	\$ 3.099,76	\$ 3.099,76	4,59%	\$ -	0,00%	\$ 3.099,76	4,59%
III	CONCRETEWORK	\$ 11.519,86	\$ 9.172,77	\$ 7.577,42	11,23%	\$ 1.152,24	1,71%	\$ 8.729,66	12,93%
IV	STONE MASONRY AND MASONRY BLOCKWORK	\$ 5.331,94	\$ 5.702,18	\$ 5.679,68	8,42%	\$ 22,50	0,03%	\$ 5.702,18	8,45%
V	STEEL ROOF STRUCTURE & CEILING	\$ 10.675,78	\$ 9.565,09	\$ 4.395,16	6,51%	\$ 2.236,80	3,31%	\$ 6.631,95	9,83%
VI	ROOFING	\$ 6.601,05	\$ 5.730,29	\$ -	0,00%	\$ 5.067,26	7,51%	\$ 5.067,26	7,51%
VII	JOINERY FIXTURES	\$ 1.159,00	\$ 1.104,05	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
VIII	WINDOWS	\$ 3.222,00	\$ 3.222,00	\$ -	0,00%	\$ 2.520,00	3,73%	\$ 2.520,00	3,73%
IX	DOORS AND HARDWARE	\$ 1.085,00	\$ 1.085,00	\$ -	0,00%	\$ 420,00	0,62%	\$ 420,00	0,62%
X	PAINTING	\$ 3.293,30	\$ 2.486,52	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
XI	FINISHES	\$ 6.113,99	\$ 5.572,77	\$ 907,90	1,35%	\$ 830,86	1,23%	\$ 1.738,76	2,58%
XII	ELETRICAL INSTALLATION	\$ 1.868,90	\$ 2.837,50	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
XIII	SUMMARY SITE WORK	\$ 2.078,77	\$ 3.551,17	\$ 1.479,41	2,19%	\$ -	0,00%	\$ 1.479,41	2,19%
A	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 59.119,31	\$ 55.358,37	\$ 24.668,77	36,55%	\$ 12.249,66	18,15%	\$ 36.918,43	54,70%
B	CONTRACTOR FEE 10 %	\$ 5.911,93	\$ 5.535,84	\$ 2.466,88	3,66%	\$ 1.224,97	1,81%	\$ 3.691,84	5,47%
C	OVERHEAD	\$ -	\$ 2.275,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	TAXS 2% x (A + B + C)	\$ 1.300,62	\$ 1.263,38	\$ 542,71	0,80%	\$ 269,49	0,40%	\$ 812,21	1,20%
E	CONTIGENCY	\$ 1.160,81	\$ 1.160,81	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
F	GRAND TOTAL	\$ 67.492,66	\$ 65.593,40	\$ 27.678,36	41,01%	\$ 13.744,12	20,36%	\$ 41.422,48	61,37%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineiru ba Edifisiu Publiku Agua Saneamentu,
ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineiru ba Projeitu
Edificio Publiku Agua Saneamento
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ
ADN, I.P.


#ANEXU D - (BZT6)



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica

MILCHA NAUPAI UNIP. LDA.

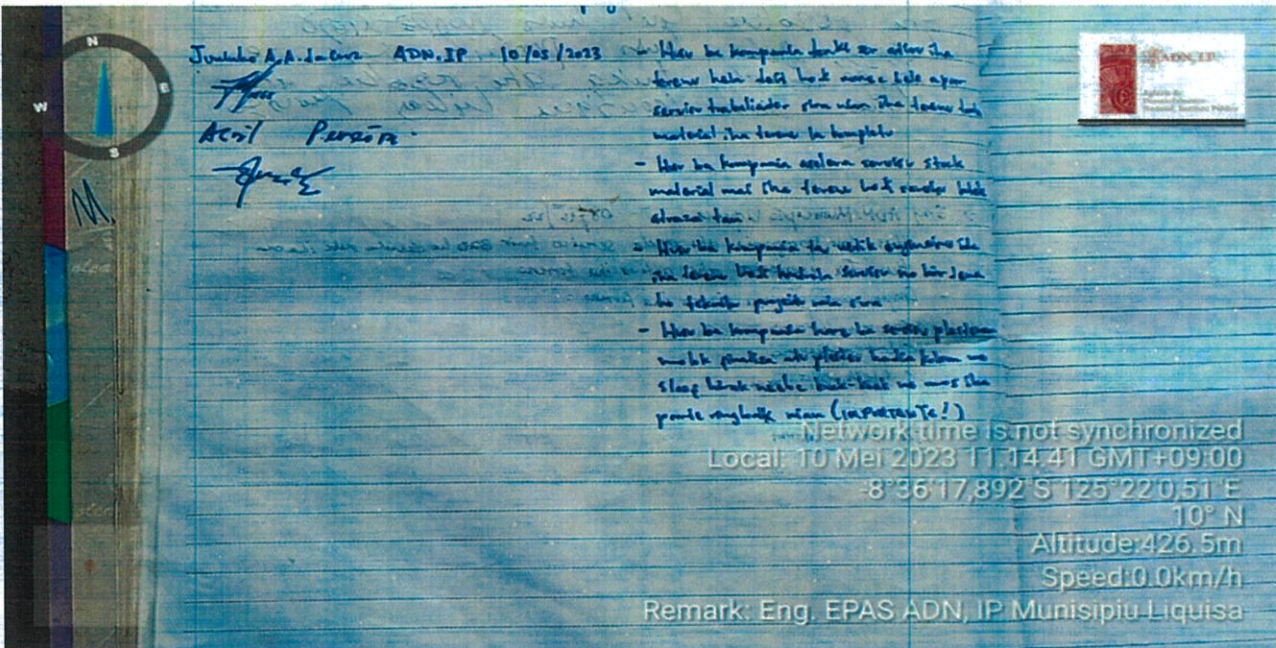No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	10/05/2023	Hatugara, Bazartete	Juninho António Abrantes da Cruz	Enjeineiru ADN, IP Liquisa		 Juninho A.A. da Cruz ADN, IP 10/05/2023 Verificou-se a existência de uma fonte de água subterrânea na zona da Hatugara, Bazartete, Município de Liquisa. Observações: - A água é cristalina e doce. - Não há contaminação por produtos químicos ou outros poluentes. - A água é utilizada para consumo humano. - Não há contaminação por produtos químicos ou outros poluentes. - A água é utilizada para consumo humano. Assinatura:  Network time is not synchronized Local: 10 Mai 2023 11:14:41 GMT+09:00 8°36'17,892" S 125°22'0,51" E 10° N Altitude: 426.5m Speed: 0.0km/h Remark: Eng. EPAS ADN, IP. Municipiu Liquisa	



#ANEXU C1 – (BZT25)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Ermeta
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 04 Maio 2023

Fatin Inspesaun : Fahilebo - Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : S 8° 38' 12. 154'', Latetude :

End Point : Long : E 125° 24' 35. 457'', Latetude :

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2.

Sketch & Foto Desenho

Ekipa ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu husi MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Ermeta iha suku Fahilebo, postu Bazartete, munisipiu Liquisa, projeitu nee implementa husi servisu grupu komunitariu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 – (BZT25)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Ermeta
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekapa ADN, IP Munisipiu Liquisa akompania
Inagurasaun “Serimonia Entrega Plaka
Inagurasaun Primeira no Segunda Faze ba
Eskola Konstrusaun no Reabilitasaun husi
MEJD”.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Iha serimonia nee mos hetan partisipasaun
husi Diretor Jeral MEJD, Diretor Nasional
Ensino, Superintendente MEJD,
Administrador Liquisa no Administrador
Bazartete, Komandante PNTL Liquisa, Amu
Reverendu Liquisa no prezidenti grupu
komunitariu Liquisa.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJETO : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA EPE ERMETA
FATIN PROJETO : FAHILEBO, BAZARTETE
DONO DO PROJETO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

# ANEXU C2 - (BZT25)					VERIFIED BY A D N , I P												
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO		AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU						PREVIOUS BILLING	BILLED %	THIS BILLING	BILLED %	TOTAL TO DATE	BILLED %	
					FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%	TOTAL PROGRESU	%							
I	PRELIMINARIES	PP/3		US\$ \$ 3.075,00	\$ 1.487,50	1,72%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,72%	\$ 1.487,50	1,72%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,72%	
II	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47	(i)	US\$ \$ 59.793,47	\$ 54.638,38	63,26%	\$ 100,65	0,12%	\$ 54.739,03	63,38%	\$ 36.732,52	42,53%	\$ 17.905,86	20,73%	\$ 54.638,38	63,26%	
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/23	(i)	US\$ \$ 14.157,37	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
A	CONSTRUCTION COST			US\$ \$ 77.025,84	\$ 56.125,88	64,99%	\$ 100,65	0,12%	\$ 56.226,53	65,10%	\$ 38.220,02	44,25%	\$ 17.905,86	20,73%	\$ 56.125,88	64,99%	
B	OVERHEAD			US\$ \$ 6.340,00	\$ 4.438,00	5,14%	\$ -	0,00%	\$ 4.438,00	5,14%	\$ 2.536,00	2,94%	\$ 1.902,00	2,20%	\$ 4.438,00	5,14%	
C	CONTIGENCY			US\$ \$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
D	GRAND TOTAL			US\$ \$ 86.365,84	\$ 60.563,88	70,12%	\$ 100,65	0,12%	\$ 60.664,53	70,24%	\$ 40.756,02	47,19%	\$ 19.807,86	22,93%	\$ 60.563,88	70,12%	

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho Antonio Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua
Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineru ba Projeitu
Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koodenadora UCVQ, ADN, I.P.



#ANEXU C1 – (BZT26)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 17 Maio 2023

Fatin Inspesaun : Lauhata - Bazartete, Liquisa

Koordinadas :

Start Point : Long : S 8° 34' 19.391", Latetude :

End Point : Long : E 125° 27' 52.593", Latetude :

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2.

Sketch & Foto Desenho

Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu foun husi MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EPE Cassait iha suku Lauhata, Bazartete, Liquisa projeitu nee kaer husi servisu grupu komunitariu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 – (BZT26)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Servisu grupu refere nia progresu iha terenu atinji
too iha item rampa ba defisiensia iha eskola oin
no sorin karuk, no pinta tiha ona besi no *sloof*.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Reprezentante tekniku grupu nian mos hatudu
ona material hirak neebe stock ona iha terenu tuir
kontinuasaun servisu iha terenu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





# ANEXU C2 - (BZT26)					VERIFIED BY A D N , I P											
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO		AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU						PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL BILLED	
					FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%	TOTAL PROGRESU	%	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3		US\$ \$ 3.075,00	\$ 1.487,50	1,90%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,90%	\$ 1.487,50	1,90%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,90%
II	PROVISIONAL SUM FOR DEMOLITION	DM/3		US\$ \$ 686,50	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
III	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47	(i)	US\$ \$ 57.955,41	\$ 42.575,36	54,41%	\$ 325,48	0,42%	\$ 42.900,84	54,82%	\$ 32.292,96	41,27%	\$ 10.282,41	13,14%	\$ 42.575,36	54,41%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/19	(i)	US\$ \$ 7.193,98	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST			US\$ \$ 68.910,89	\$ 44.062,86	56,31%	\$ 325,48	0,42%	\$ 44.388,34	56,73%	\$ 33.780,46	43,17%	\$ 10.282,41	13,14%	\$ 44.062,86	56,31%
B	OVERHEAD			US\$ \$ 6.340,00	\$ 3.804,00	4,86%	\$ -	0,00%	\$ 3.804,00	4,86%	\$ 2.536,00	3,24%	\$ 1.268,00	1,62%	\$ 3.804,00	4,86%
C	CONTIGENCY			US\$ \$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	GRAND TOTAL			US\$ \$ 78.250,89	\$ 47.866,86	61,17%	\$ 325,48	0,42%	\$ 48.192,34	61,59%	\$ 36.316,46	46,41%	\$ 11.550,41	14,76%	\$ 47.866,86	61,17%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento,
ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineru ba Projeitu
Edifício Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT26)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA EPE
CASSAIT

GRUPU KOMUNITARIU

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	17/05/2023	Lauhata, Bazartete	Juninho António Abrantes da Cruz	Enjineiru ADN, IP Liquisa			
II	26/05/2023	Lauhata, Bazartete	Juninho António Abrantes da Cruz	Enjineiru ADN, IP Liquisa			



#ANEXU C1 – (BZT27)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG- Paralelo Bogoro
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 30 Maio 2023

Fatin Inspesaun : Bogoro – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : S 8° 35' 36.980'', Latetude :

End Point : Long : E 125° 23' 58.119'', Latetude :

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2.

Sketch & Foto Desenho

Ekpa enjineiru ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu Foun MEJD PKRIE Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Bogoro, lokaliza iha suku Bogoro, postu Bazartete, munisipiu Liquisa, neebe implementa husi servisu Grupu Komunitariu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 – (BZT27)


Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG- Paralelo Bogoro
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Progresu fiziku iha terenu grupu servisu hela ba item *pengecoran lantai* iha varanda ninian, ho nia medida tuir spec no design neebe iha ona.


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

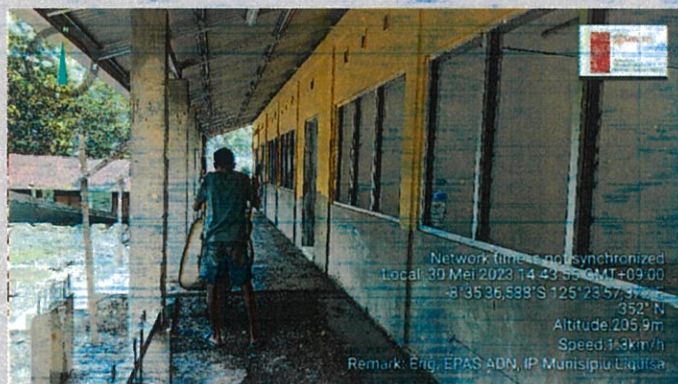

Sketch & Foto Desenho

Servisu konstrusaun *Tb* ninian atinji progresu ba item *finishes* ba *keramik* haris fatin ninian ba rai no didin *porcelain*.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

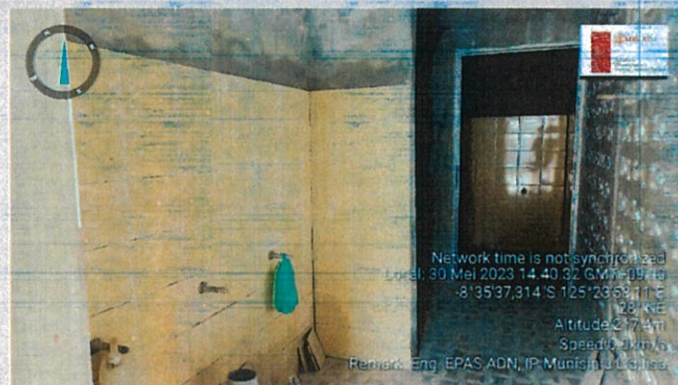



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJETO : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA ESG-PARALELO BOGORO
FATIN PROJETO : MOTAILUN, BAZARTETE
DONO DO PROJETO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

# ANEXU C2 - (BZT27)						VERIFIED BY A D N , I P											
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU						PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL BILLED	
						FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%	TOTAL PROGRESU	%	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3			US\$ 3.075,00	\$ 1.487,50	1,29%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,29%	\$ 1.487,50	1,29%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,29%
II	CLASSROOM BUILDING CA	CA/39	(i)		US\$ 65.492,93	\$ 52.622,55	45,63%	\$ 159,36	0,14%	\$ 52.781,91	45,77%	\$ 37.842,94	32,82%	\$ 14.779,61	12,82%	\$ 52.622,55	45,63%
III	TOILET BUILDING Tb	TB/39	(i)		US\$ 24.504,47	\$ 13.334,54	11,56%	\$ 44,82	0,04%	\$ 13.379,36	11,60%	\$ 5.629,90	4,88%	\$ 7.704,65	6,68%	\$ 13.334,54	11,56%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/28	(i)		US\$ 12.901,36	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST				US\$ 105.973,76	\$ 67.444,59	58,49%	\$ 204,18	0,18%	\$ 67.648,77	58,66%	\$ 44.960,34	38,99%	\$ 22.484,25	19,50%	\$ 67.444,59	58,49%
B	OVERHEAD				US\$ 6.340,00	\$ 3.804,00	3,30%	\$ -	0,00%	\$ 3.804,00	3,30%	\$ 2.536,00	2,20%	\$ 1.268,00	1,10%	\$ 3.804,00	3,30%
C	CONTIGENCY				US\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	GRAND TOTAL				US\$ 115.313,76	\$ 71.248,59	61,79%	\$ 204,18	0,18%	\$ 71.452,77	61,96%	\$ 47.496,34	41,19%	\$ 23.752,25	20,60%	\$ 71.248,59	61,79%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua
Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineru ba Projeto
Edifício Publiku, Agua e Saneamento, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT27)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA ESG-
PARALELO BOGORO

GRUPU KOMUNITARIU

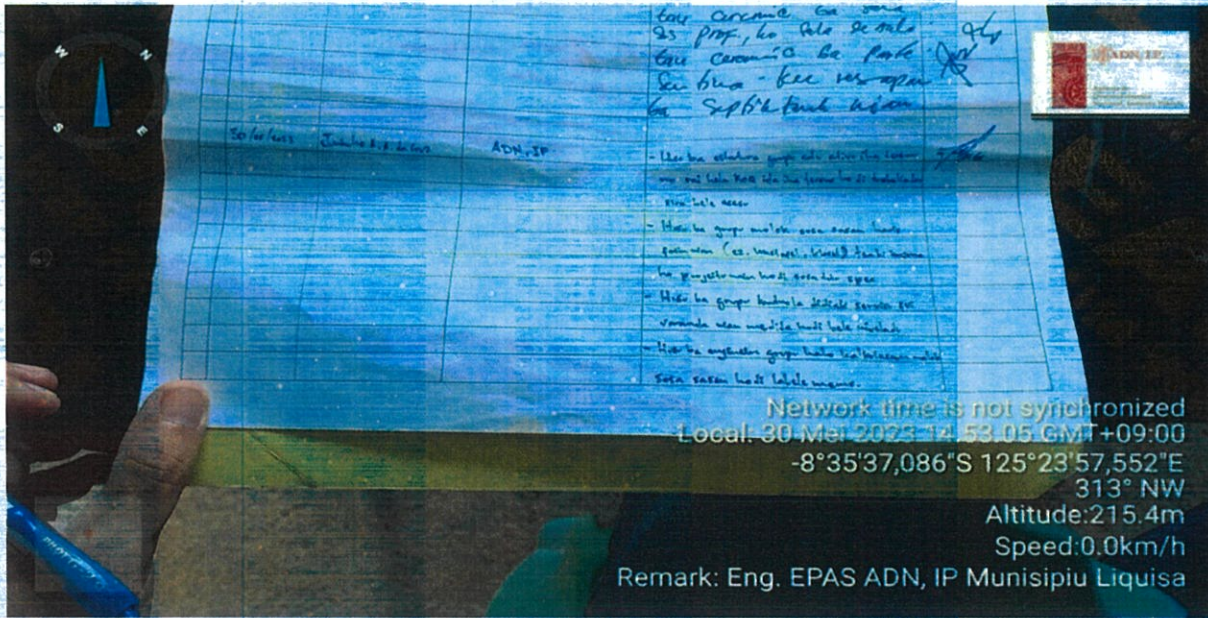No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	30/05/2023	Bogoro, Bazartete	Juninho António Abrantes da Cruz	Enjineiru ADN, IP Liquisa		 Network time is not synchronized Local: 30 Mai 2023 14:53:05 GMT+09:00 -8°35'37,086"S 125°23'57,552"E 313° NW Altitude:215.4m Speed:0.0km/h Remark: Eng. EPAS ADN, IP Munisipiu Liquisa	



ANEXO C1 (BZT34)

Back-up Data

Naran Projeto : Obras Konstrusaun ba Rekupersaun Estragus husi Cheias 04 de Abril 2021 " Moru Proteksaun Estrada Nasional Tibar - Gleno (Nasuta) Suco
Tibar, Posto Adm. Bazartete,
Contractor : Fikikay Unip.lda
No. kontratu : MPW-W-230009

Data Inspeksaun : 31 de Maio de 2023

Fatin Inspeksaun : Tibar - Gleno

Koordinat :
Start Point : Long : 125.4831958562
End Point : Long : 125.4835455492

Latetude : -8.6102620745
Latetude : -8.609282830


Naran Inspektor :
1
2 Eng. Domingos Soares Martins

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu : Gabion

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sta, 0+00 - 0+100





Step	W	h	L	Qty	Unit
1	2	1	100	200	m3
2	3	1	100	300	m3
3	3	1	100	300	m3
4	3	1	100	300	m3
5	3	1	100	300	m3
				1400	m3

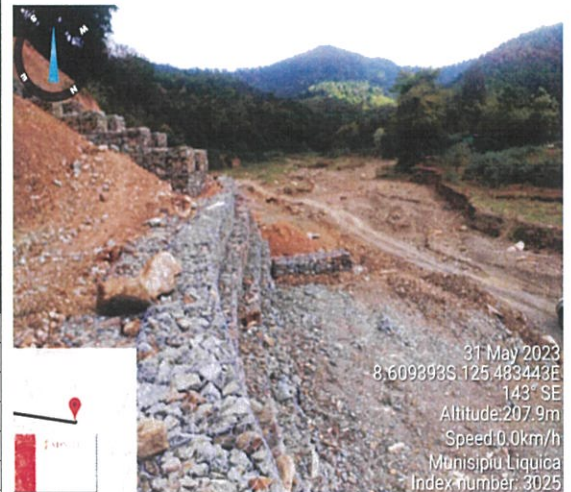

Sta, 0+000 - 0+90

Step	W	h	L	Qty	Unit
1	2	1	30	60	m3
2	3	1	40	120	m3
3	3	1	50	150	m3
4	3	1	60	180	m3
5	4	1	80	320	m3
6	4	1	90	360	m3
7	4	1	90	360	m3
				1550	m3

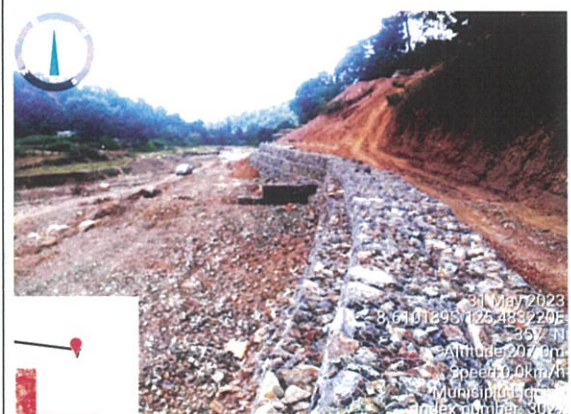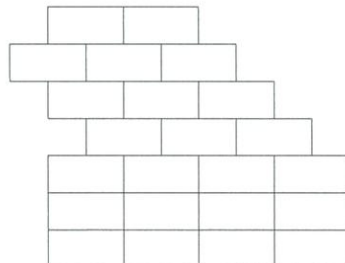

NB: Projeitu ne'e hahu konstrusaun iha fulan Fevereiro 2023 no foin regista iha iha Sistema ADN iha fulan Maio 2023 tamba ne'e progressu nee'e iha fulan Maio ne'e inklui ona ho progressu anterior nian.



ANEXO C2 (BZT34)


Contract Name : Obras Konstrusaun ba Rekuperasaun Estragus husi Cheias 04 de Abril 2021 " Moru Proteksaun Estrada Nasional Tibar - Gleno (Nasuta) Suco Tibar,Posto Adm. Bazartete, Município Liquica
No Contract : MPW-W-230009
Name of Contractor : Fikikay Unip.lda

SUMMARY													
NO	ITEM DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT	Halo ona rekomendasaun pagamentu		Seidauk halo rekomendasaun pagamentu						PAYMENT UP TO DATE		Remarks
		AMOUNT (\$)	Previous		Fulan Kotuk		Fulan:Maio 2023		This Billing		Amount (\$)	PERCENT %	
			Motante nebe'e selu ona	Percent (%)	Montante	PERCENT %	Motante fulan ne'e	PERCENT %	Motante Pagamento Agora	PERCENT %			
A	Construction Cost												
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 2,550.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 1,275.00	0.48%	\$ 1,275.00	0.48%	\$ 1,275.00	0.48%	
200	EARTHWORKS	\$ 16,986.75	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 12,954.95	4.86%	\$ 12,954.95	4.86%	\$ 12,954.95	4.86%	
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 4,013.29	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
600	DRAINAGE AND SLOP PROTECTION STRUCTURE	\$ 211,639.05	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 75,318.88	28.23%	\$ 75,318.88	28.23%	\$ 75,318.88	28.23%	
A	Total Construction Cost	\$ 235,189.08	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 89,548.83	33.57%	\$ 89,548.83	33.57%	\$ 89,548.83	33.57%	
C	OVER HEAD	\$ 2,850.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 577.39	0.22%	\$ 577.39	0.22%	\$ -	0.00%	
A	Total Construction	\$ 235,189.08	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 89,548.83	33.57%	\$ 89,548.83	33.57%	\$ 89,548.83	33.57%	
B	Provit + Overhead (10%)	\$ 23,518.91	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 8,954.88	3.36%	\$ 8,954.88	3.36%	\$ 8,954.88	3.36%	
C	Over Head	\$ 2,850.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 577.39	0.22%	\$ 577.39	0.22%	\$ -	0.00%	
D	Tax (2%)	\$ 5,231.16	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 1,981.62	0.74%	\$ 1,981.62	0.74%	\$ 1,970.07	0.74%	
E	Grand Total	\$ 266,789.15	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 101,062.73	37.88%	\$ 101,062.73	37.88%	\$ 100,473.79	37.66%	

Inspeksaun Husi :


Eng. Domingos Soares Martins
Engineiro ba Projecto Infraestrutura, Transporte e
irigaaun Município Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :


Eng. Remigio da C. Soares dos Santos
Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

ANEXO C1 (LV9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalakao Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality
Naran Kompanhia : 15 Realti Unip.Lda
No. kontratu : RT/034/MOP-2019

Data Inspeksaun : 16 de Maio de 2023

Fatin Inspeksaun : Suco Fatukesi

Koordinat :
Start Point : Long : 125°18'56.74
End Point : Long : 125°19'30.12

Latitude : - 8°37' 42.29
Latitude : - 8°39'12.96

Naran Inspektor :
1
2 Eng. Domingos Soares Martins


Sketch & Foto Desenho

Projetu ne'e fisikamente iha tereno 100% ona, no kondisaun geral ba obra ne'e diak hela, e no mos iha fase retensaun nia laran, maibe husi Ekipa tekniku ITI Municipiu Liquica sempre fo atensaun no aproxima ho empreza hodi bele tau matan nafatin ba obra ne'e hodi aseguara defeitus sira karik akontese iha tereno.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Projetu ne'e fisikamente iha tereno 100% ona, no kondisaun geral ba obra ne'e diak hela, e no mos iha fase retensaun nia laran, maibe husi Ekipa tekniku ITI Municipiu Liquica sempre fo atensaun no aproxima ho empreza hodi bele tau matan nafatin ba obra ne'e hodi aseguara defeitus sira karik akontese iha tereno.

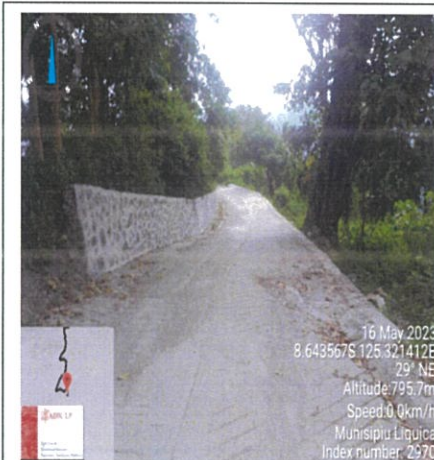

ANEXO C1 (LV13)
Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality
Naran Companhia : Prudencia Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD - NCB-R - 21036

Data Inspeksaun : 26 de Maio de 2023

Fatin Inspeksaun : Suco Taltabi - Kutulau

Koordinat :
Start Point : Long : 125.3714575
End Point : Long : 125.3801075

Latetude : - 8.64451919
Latetude : - 8.6527164

Naran Inspektor :
1
2 Eng. Domingos Soares Martins

Sketch & Foto Desenho

Projetu ne'e fisiku iha tereno sei mantein hela progressu anterior nian tamba iha fulan maio nia laran la iha aktividade konstrusaun fisiku iha tereno.
Empreja presija halo backup data tuir kondisaun tereno ba item servisu sira nebe'e nia kuantidade liu ona husi kuantidade original kontrato no hetan aprovasaun husi dono projetu. tamba ne'e progressu nebe'e iha seidak ajasta progressu nebe'e kategoria CCO nian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Projetu ne'e fisiku iha tereno sei mantein hela progressu anterior nian tamba iha fulan maio nia laran la iha aktividade konstrusaun fisiku iha tereno.
Empreja presija halo backup data tuir kondisaun tereno ba item servisu sira nebe'e nia kuantidade liu ona husi kuantidade original kontrato no hetan aprovasaun husi dono projetu. tamba ne'e progressu nebe'e iha seidak ajasta progressu nebe'e kategoria CCO nian.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV13)

Name of Roads :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality
Contract No : MOP - CD - NCB-R - 21036
Contractor : Prudencia Construction Unipessoal.Lda

Item	Description	BACK UP DATA															Remarks
		CONTRACT ORIGINAL	Variation Order		Revised Contract I	Halo ona rekomendasaun pagamentu		Seidauk halo rekomendasaun pagamentu						PAYMENT UP TO DATE			
			Increase	Decrease		Previous		Fulan Kotuk		Fulan: Maio 2023		This Billing		Amount (\$)	PERCENT %		
						Cost \$	Cost	Cost	Cost	Motante nebe'e selu ona	Percent (%)	Montante	PERCENT %			Motante fulan ne'e	
R-01	General works	\$ 1,550.00	\$ -	\$ -	\$ 1,550.00	\$ 800.00	0.65%	\$ 800.00	0.65%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 800.00	0.65%		
R-03	Earth work	\$ 6,216.90	\$ -	\$ -	\$ 6,216.90	\$ 4,983.71	4.03%	\$ 4,983.71	4.03%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 4,983.71	4.03%		
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 2,205.60	\$ -	\$ -	\$ 2,205.60	\$ 2,205.60	1.78%	\$ 2,205.60	1.78%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 2,205.60	1.78%		
R-08	Structures	\$ 69,266.99	\$ -	\$ -	\$ 69,266.99	\$ 36,070.74	29.18%	\$ 66,463.98	53.76%	\$ -	0.00%	\$ 30,393.24	24.58%	\$ 66,463.98	53.76%		
R-11	Routine maintenance	\$ 3,842.00	\$ -	\$ -	\$ 3,842.00	\$ 3,321.20	2.69%	\$ 3,391.20	2.74%	\$ -	0.00%	\$ 70.00	0.06%	\$ 3,391.20	2.74%		
R-15	Provisional sum	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%		
A	Total Construction cost	\$ 83,331.49	\$ -	\$ -	\$ 83,331.49	\$ 47,381.24	38.32%	\$ 77,844.48	62.96%	\$ -	0.00%	\$ 30,463.24	24.64%	\$ 77,844.48	62.96%		
	General items																
G-01	Security	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ 13.75	0.01%	\$ 13.75	0.01%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 13.75	0.01%		
G-02	Project team	\$ 21,600.00	\$ -	\$ -	\$ 21,600.00	\$ 20,200.00	16.34%	\$ 20,200.00	16.34%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 20,200.00	16.34%		
G-03	Safety and protection	\$ 2,816.00	\$ -	\$ -	\$ 2,816.00	\$ 2,576.00	2.08%	\$ 2,816.00	2.28%	\$ -	0.00%	\$ 240.00	0.19%	\$ 2,816.00	2.28%		
G-05	Meetings	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	0.08%	\$ 100.00	0.08%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 100.00	0.08%		
G-06	Ceremonial costs	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 75.00	0.06%	\$ 75.00	0.06%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 75.00	0.06%		
G-07	Mineral fees	\$ 4,861.93	\$ -	\$ -	\$ 4,861.93	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%		
C	Total General items	\$ 29,542.93	\$ -	\$ -	\$ 29,542.93	\$ 22,964.75	18.58%	\$ 23,204.75	18.77%	\$ -	0.00%	\$ 240.00	0.19%	\$ 23,204.75	18.77%		
A	Construction cost	\$ 83,331.49	\$ -	\$ -	\$ 83,331.49	\$ 47,381.24	38.32%	\$ 77,844.48	62.96%	\$ -	0.00%	\$ 30,463.24	24.64%	\$ 77,844.48	62.96%		
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 8,333.15	\$ -	\$ -	\$ 8,333.15	\$ 4,738.12	3.83%	\$ 7,784.45	6.30%	\$ -	0.00%	\$ 3,046.32	2.46%	\$ 7,784.45	6.30%		
C	General items	\$ 29,542.93	\$ -	\$ -	\$ 29,542.93	\$ 22,964.75	18.58%	\$ 23,204.75	18.77%	\$ -	0.00%	\$ 240.00	0.19%	\$ 23,204.75	18.77%		
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	\$ 2,424.15	\$ -	\$ -	\$ 2,424.15	\$ 1,501.68	1.21%	\$ 2,176.67	1.76%	\$ -	0.00%	\$ 674.99	0.55%	\$ 2,176.67	1.76%		
E	Total	\$ 123,631.72	\$ -	\$ -	\$ 123,631.72	\$ 76,585.80	61.95%	\$ 111,010.35	89.79%	\$ -	0.00%	\$ 34,424.55	27.84%	\$ 111,010.35	89.79%		

Inspeksaun Husi :

Eng. Domingos Soares Martins

Engenheiro ba Projecto Infraestrutura, Transporte e Irigasaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng. Remigio da C.S. dos Santos

Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

ANEXO C1 (LV14)
Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)
Naran Kompanhia : Metalika Unip.Lda
No kontratu : MPW-W-210151

Data Inspeksaun : 26 de Maio 2023

Fatin Inspeksaun : Suco Metagou - Aibeno


Koordinat :
Start Point : Long : 125.36544444
End Point : Long : 125.3416468

Latitude : - 8.66332014
Latitude : - 8.65444508

Naran Inspektor :
1
2 Eng. Domingos Soares Martins

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Plum Concrete




t	L	Distacia	Volume
0.12	2.00	35.00	8.40
Total			8.40

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch Item servisu : Stone Masonry



Keterangan :
w1 0.25
w2 0.40
w3 0.40
t1 1.50
t2 0.25
L 5.00

	Distacia	Volume
Wall	0.49	3.94
Foundation	0.10	0.5
Total		4.44 m3



Vertiver Grass

t	L	Distacia	Volume
	6.00	13.00	78.00
Total			78.00





ANEXO C2 (LV14)

Naran Projeto :R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)

Contractor : Metalika Unip.Lda

No. kontratu :MPW-W-210151

SUMMARY												
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	\$ 3,400.00					\$ 1,800.00	0.75%	\$ -	0.00%	\$ 1,800.00	0.75%
R-02	Drainage	\$ 244.30					\$ 244.30	0.10%	\$ -	0.00%	\$ 244.30	0.10%
R-03	Earth work	\$ 5,301.97					\$ 4,901.50	2.05%	\$ -	0.00%	\$ 4,901.50	2.05%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 3,356.64					\$ 3,356.64	1.41%	\$ -	0.00%	\$ 3,356.64	1.41%
R-08	Structures	\$ 159,824.15					\$ 135,295.06	56.67%	\$ 1,587.89	0.67%	\$ 136,882.95	57.34%
R-11	Routine maintenance	\$ 16,538.40					\$ 12,969.80	5.43%	\$ -	0.00%	\$ 12,969.80	5.43%
R-15	Provisional sum	\$ 250.00					\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
GENERAL ITEM												
G-01	Security	\$ 1,380.00					\$ 805.00	0.34%	\$ -	0.00%	\$ 805.00	0.34%
G-02	Project team	\$ 13,660.00					\$ 14,120.00	5.91%	\$ -	0.00%	\$ 14,120.00	5.91%
G-03	Safety and protection	\$ 3,062.00					\$ 2,750.00	1.15%	\$ -	0.00%	\$ 2,750.00	1.15%
G-05	Meetings	\$ 100.00					\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
G-06	Ceremonial costs	\$ 200.00					\$ 150.00	0.06%	\$ -	0.00%	\$ 150.00	0.06%
G-07	Mineral fees	\$ 7,849.54					\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction cost	\$ 188,915.45					\$ 158,567.30	66.42%	\$ 1,587.89	0.67%	\$ 160,155.19	67.08%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 18,891.55					\$ 15,856.73	6.64%	\$ 158.79	0.07%	\$ 16,015.52	6.71%
C	General items	\$ 26,251.54					\$ 17,825.00	7.47%	\$ -	0.00%	\$ 17,825.00	7.47%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	\$ 4,681.17					\$ 3,844.98	1.61%	\$ 34.93	0.01%	\$ 3,879.91	1.63%
E	Total	\$ 238,739.71					\$ 196,094.01	82.14%	\$ 1,781.62	0.75%	\$ 197,875.62	82.88%

Inspeksaun Husi :

Eng. Domingos Soares Martins
Engineiro ba Projecto Infraestrutura, Transporte e irigaaun
Município Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng. Remigio da C.S. dos Santos
Engenheiro Senior ba Projecto
Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN
I.P.



#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : **10 Maio 2023**

Fatin Inspesaun : Dato, Liquica Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.35'21.273"S, Latetude :

End Point : Long : 125.20'1.933"E, Latetude :

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2.

Sketch & Foto Desenho

Ekipa ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu husi MEJD nian ba Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica lokaliza iha suku Dato, postu Liquisa Vila, Munisipiu Liquisa, neebe implementa husi kompania Roman Furak Unip. Lda.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto
Kompania
No. kontratu

: **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
: **Roman Furak Unip. Lda.**
: **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho

Progresu servisu iha terenu kontinua lao fali ona
no ba iha konstrusaun klase C nian atinji servisu
instalasaun ba item *rangka plafon* no *keramik*.


Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Progresu servisu ba konstrusaun klase Cb ninian
lao hela iha parte *Toilet Building*, no ba klase
laran nian lao hela instalasaun *keramik 30x30*.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

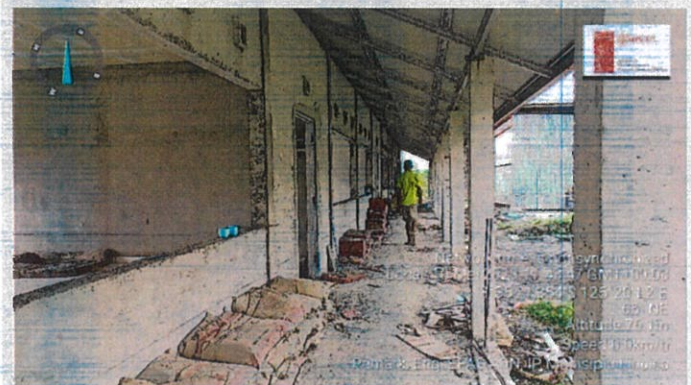



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO
FATIN PROJEITO
DONO DO PROJEITO

NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA SECUNDÁRIA GERAL LIQUIÇA
CAIMEO VILA, SUÇO DATO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

ANEKSU C2 - (LV20)			VERIFIED BY A D N , I P												
NO	WORK DESCRIPTION	AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU						PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL BILLED TO DATE		
			FULAN KOTUK	PERCENT %	FULAN NEE	PERCENT %	TOTAL PROGRESU	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	
I	PRELIMINARIES	\$ 2.870,00	\$ 1.385,00	0,83%	\$ -	0,00%	\$ 1.385,00	0,83%	\$ -	0,00%	\$ 1.385,00	0,83%	\$ 1.385,00	0,83%	
II	CLASSROOM BUILDING C	\$ 53.423,84	\$ 30.792,59	18,43%	\$ 243,80	0,15%	\$ 31.036,38	18,58%	\$ -	0,00%	\$ 25.478,95	15,25%	\$ 25.478,95	15,25%	
III	CLASSROOM BUILDING Cb	\$ 75.136,99	\$ 41.494,43	24,84%	\$ 203,50	0,12%	\$ 41.697,93	24,96%	\$ -	0,00%	\$ 35.660,32	21,34%	\$ 35.660,32	21,34%	
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 13.000,00	\$ 6.111,84	3,66%	\$ -	0,00%	\$ 6.111,84	3,66%	\$ -	0,00%	\$ 6.111,84	3,66%	\$ 6.111,84	3,66%	
A	CONSTRUCTION COST	\$ 144.430,83	\$ 79.783,86	47,75%	\$ 447,29	0,27%	\$ 80.231,15	48,02%	\$ -	0,00%	\$ 68.636,10	41,08%	\$ 68.636,10	41,08%	
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 14.443,08	\$ 7.978,39	4,78%	\$ 44,73	0,03%	\$ 8.023,12	4,80%	\$ -	0,00%	\$ 6.863,61	4,11%	\$ 6.863,61	4,11%	
C	OVERHEAD	\$ 4.930,00	\$ 1.972,00	1,18%	\$ -	0,00%	\$ 1.972,00	1,18%	\$ -	0,00%	\$ 1.972,00	1,18%	\$ 1.972,00	1,18%	
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 3.276,08	\$ 1.794,68	1,07%	\$ 9,84	0,01%	\$ 1.804,53	1,08%	\$ -	0,00%	\$ 1.549,43	0,93%	\$ 1.549,43	0,93%	
E	CONTIGENCY	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
F	TOTAL COST (A + B + C + D + E)	\$ 167.079,99	\$ 91.528,93	54,78%	\$ 501,86	0,30%	\$ 92.030,79	55,08%	\$ -	0,00%	\$ 79.021,15	47,30%	\$ 79.021,15	47,30%	

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento,
ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineru ba Projeitu
Edifício Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV20)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, IP.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran Projeitu: Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-
Liquica

Kompanha : ROMAN FURAK Unip. Lda.

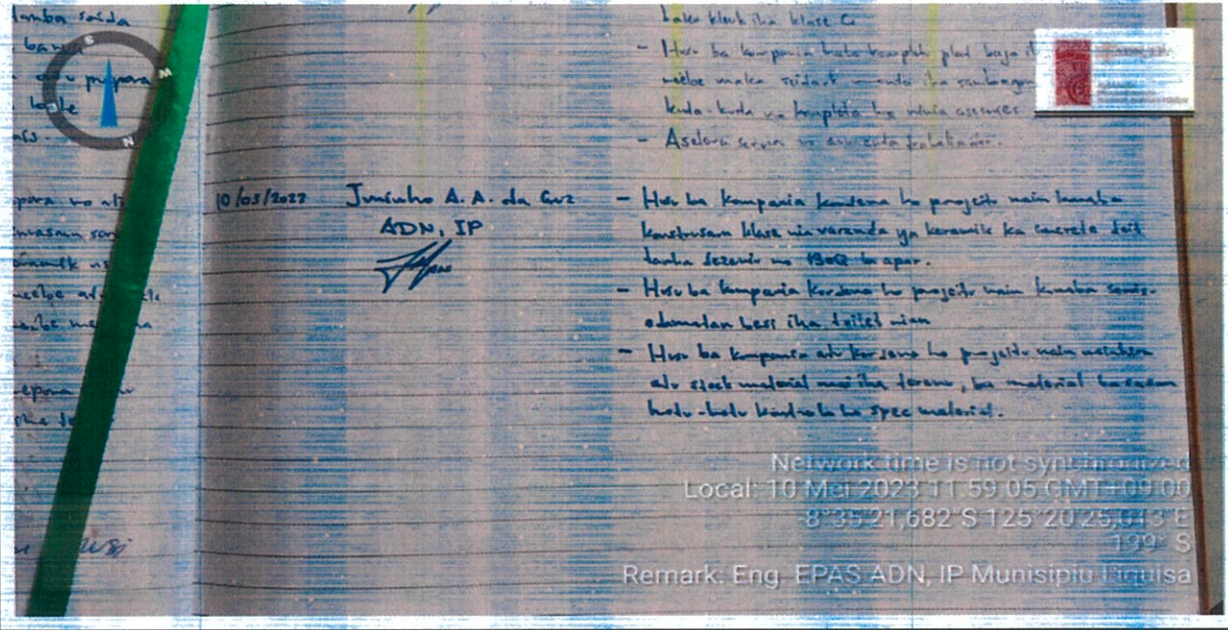No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	10/05/2023	Dato, Liquisa Vila	Juninho António Abrantes da Cruz	Enjineiru ADN, IP Liquisa			



#ANEXU C1 – (LV22)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1,2 Mauboque
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 09 Maio 2023

Fatin Inspesaun : Dato – Liquica Vila, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : S 8° 35' 49.086'', Latetude :

End Point : Long : E 125° 18' 51.269'', Latetude :

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2.

Sketch & Foto Desenho

Ekipa ADN, IP Munisipiu Liquisa halao
inspesaun ba projeitu husi MEJD PKRIE ba
Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1, 2
Mauboque lokaliza iha suku Dato, Liquisa Vila,
Munisipiu Liquisa neebe implementa husi servisu
Grupu Komunitariu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 – (LV22)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1,2 Mauboque
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Progresu servisu ba konstrusaun klase C nian
kontinua servisu instalasaun ba item *windows*
nian no mos *painting* faze dahuluk nian.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Progresu servisu ba konstrusaun klase Cdl nian
atinji servisu ba item *painting* ba klase liur
ninian.





TÍTULO DO PROJETO
FATIN PROJETO
DONO DO PROJETO

: KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN EBF MADBOQUE
: DATO, LIQUICA
: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

# ANEXU C2 - (LV 22)					VERIFIED BY A D N , I P											
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO		AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU						PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL BILLED	
					FULAN KOTUK	PERCENT %	FULAN NEE	PERCENT %	TOTAL PROGRESU	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$	\$ 3.075,00	\$ 1.487,50	1,32%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,32%	\$ 1.487,50	1,32%	\$ 0,00%	0,00%	\$ 1.487,50	1,32%
II	PROVISIONAL SUM FOR DEMOLITION	DM/3	US\$	\$ 590,80	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
III	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	US\$ \$ 48.285,30	\$ 35.280,90	31,35%	\$ 422,44	0,38%	\$ 35.703,34	31,73%	\$ 28.341,90	25,19%	\$ 6.939,00	6,17%	\$ 35.280,90	31,35%
IV	CLASSROOM BUILDING Cdl	C/36	(i)	US\$ \$ 43.049,04	\$ 31.489,60	27,98%	\$ 93,82	0,08%	\$ 31.583,42	28,07%	\$ 17.932,06	15,94%	\$ 13.557,54	12,05%	\$ 31.489,60	27,98%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/27	(i)	US\$ \$ 8.189,87	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST		US\$	\$ 103.190,01	\$ 68.258,00	60,66%	\$ 516,26	0,46%	\$ 68.774,26	61,12%	\$ 47.761,46	42,44%	\$ 20.496,53	18,21%	\$ 68.258,00	60,66%
B	OVERHEAD		US\$	\$ 6.340,00	\$ 3.804,00	3,38%	\$ -	0,00%	\$ 3.804,00	3,38%	\$ 2.536,00	2,25%	\$ 1.268,00	1,13%	\$ 3.804,00	3,38%
C	CONTIGENCY		US\$	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
D	GRAND TOTAL		US\$	\$ 112.530,01	\$ 72.062,00	64,04%	\$ 516,26	0,46%	\$ 72.578,26	64,50%	\$ 50.297,46	44,70%	\$ 21.764,53	19,34%	\$ 72.062,00	64,04%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua
Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeto
Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV22)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA EBF
MAUBOQUE

GRUPU KOMUNITARIU

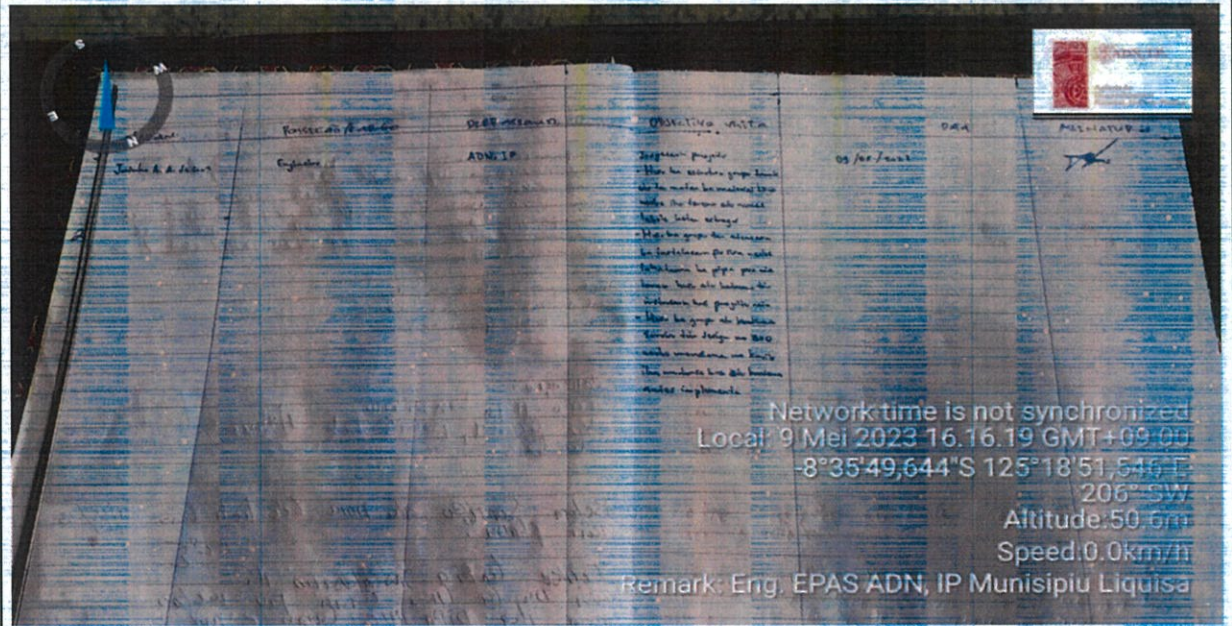No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	09/05/2023	Dato, Liquisa Vila	Juninho António Abrantes da Cruz	Enjineiru ADN, IP Liquisa		 Network time is not synchronized Local: 9 Mei 2023 16:16:19 GMT+09:00 8°35'49,644"S 125°18'51,546"E 206° SW Altitude: 50.6m Speed: 0.0km/h Remark: Eng. EPAS ADN, IP Munisipiu Liquisa	



#ANEXU C1 – (LV23)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBC 1,2,3 Liquica
Kompania : Grupu Komunitariu
No. kontratu :

Data Inspesaun : 09 Maio 2023

Fatin Inspesaun : Dato – Liquica Vila, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : S 8° 35' 32.592'', Latetude :

End Point : Long : E 125° 19' 53.005'', Latetude :

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa ADN, IP Munisipiu Liquisa halao
inspesaun ba projeitu MEJD PKRIE
Konstrusaun ka Reabilitasaun EBC 1, 2, 3
Liquica lokaliza iha suku Dato, postu Liquisa
Vila, munisipiu Liquisa, neebe implementa husi
servisu Grupu Komunitariu.





#ANEXU C1 – (LV23)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBC 1,2,3 Liquica
Kompania : Grupu Komunitariu
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Progresu servisu konstrusaun klase C ninian too
iha finalizasaun servisu item *painting* ba klase
laran no liur.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Progresu servisu konstrusaun Tb ninian atinji
servisu ba item *painting* no mos instalasaun
odamatan, *keramik* no mos *wastafel*.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJETO : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA EBC 1,2,3 LIQUICA
FATIN PROJETO : DATO, LIQUICA
DONO DO PROJETO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

# ANEXU C2 - (LV23)						VERIFIED BY A D N , I P											
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU						PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL BILLED	
						FULAN KOTUK	PERCENT %	FULAN NEE	PERCENT %	TOTAL PROGRESU	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3		US\$	\$ 3.075,00	\$ 1.487,50	1,50%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,50%	\$ 1.487,50	1,50%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,50%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	US\$	\$ 45.885,30	\$ 40.864,05	41,09%	\$ 77,28	0,08%	\$ 40.941,33	41,17%	\$ 29.108,51	29,27%	\$ 11.755,54	11,82%	\$ 40.864,05	41,09%
III	TOILET BUILDING Tb	C/39	(i)	US\$	\$ 23.742,51	\$ 16.028,33	16,12%	\$ 41,87	0,04%	\$ 16.070,19	16,16%	\$ 8.189,82	8,23%	\$ 7.838,50	7,88%	\$ 16.028,33	16,12%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/27	(i)	US\$	\$ 17.413,23	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST			US\$	\$ 90.116,04	\$ 58.379,88	58,70%	\$ 119,15	0,12%	\$ 58.499,03	58,82%	\$ 38.785,84	39,00%	\$ 19.594,04	19,70%	\$ 58.379,88	58,70%
B	OVERHEAD			US\$	\$ 6.340,00	\$ 3.804,00	3,82%	\$ -	0,00%	\$ 3.804,00	3,82%	\$ 2.536,00	2,55%	\$ 1.268,00	1,27%	\$ 3.804,00	3,82%
C	CONTIGENCY			US\$	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	GRAND TOTAL			US\$	\$ 99.456,04	\$ 62.183,88	62,52%	\$ 119,15	0,12%	\$ 62.303,03	62,64%	\$ 41.321,84	41,55%	\$ 20.862,04	20,98%	\$ 62.183,88	62,52%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento,
ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineru ba Projeto
Edificio Publiku Agua Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV23)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA EBC
1,2,3 LIQUICA

GRUPU KOMUNITARIU

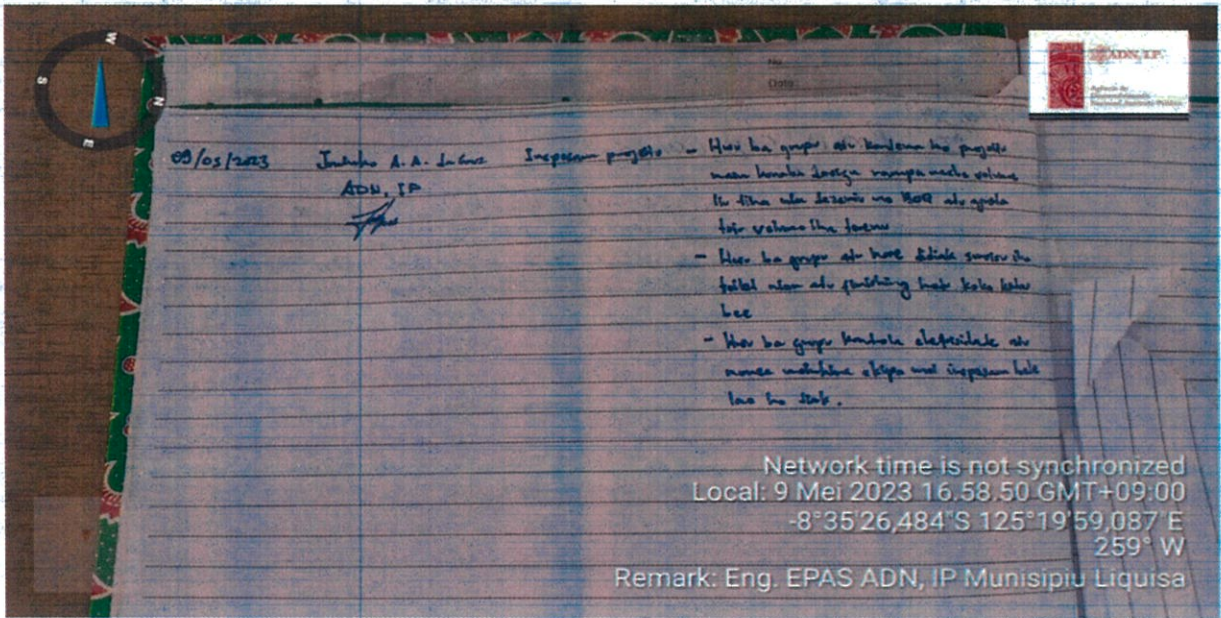No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	09/05/2023	Dato, Liquisa Vila	Juninho António Abrantes da Cruz	Enjineiru ADN, IP Liquisa			



ANEXO C1 (LV32)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality
Naran Kompanhia : 15 Realti Unip.Lda
No. kontratu : RT/003/MOP-2021

Data Inspeksaun : 16 de Maio de 2023

Fatin Inspeksaun : Suco Fatukesi

Koordinat :

Start Point : Long : 125°18'56.74
End Point : Long : 125°19'30.12

Latetude : - 8°37' 42.29


Latetude : - 8°39'12.96

Naran Inspektor : 1
2 Eng. Domingos Soares Martins

Sketch & Foto Desenho

Projetu nee la iha konstrusaun foun iha tereno no sei mantein hela progressu fisiku anterior nian tamba empreza sei hein hela aprovasaun CCO nomos hein pagamentu IPC-I nian nebe'e foin maka sei iha prosesu pagamentu nian

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

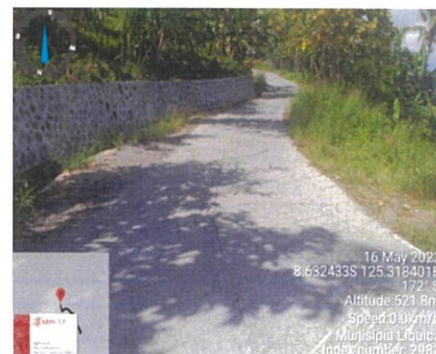

Projetu nee la iha konstrusaun foun iha tereno no sei mantein hela progressu fisiku anterior nian tamba empreza sei hein hela aprovasaun CCO nomos hein pagamentu IPC-I nian nebe'e foin maka sei iha prosesu pagamentu nian





#ANEXO C2 (LV32)

Roads Name : R4D Rural Road Rehabilitation of Bebadiri-Lebokalako Cha 0 + 000 - 5 + 000 Liquica Municipality
Contractor : 15 Raelti Unipessoal Lda
Contract No. : RT/003/MOP-2021

SUMMARY																
ITEM	DESCRIPTION	Original Contract	Variation Order		Revised Contract I	Halo ona rekomendasaun pagamentu		Seidauk halo rekomendasaun pagamentu						PAYMENT UP TO DATE		Remarks
		Cost (\$)	Increase	Descreease		Previous		Fulan Kotuk		Fulan: Maio 2023		This Billing		Amount (\$)	PERCENT %	
			Cost	Cost	Cost	Motante nebe'e selu ona	Percent (%)	Montante	PERCENT %	Motante fulan ne'e	PERCENT %	Motante Pagamento Agora	PERCENT %			
R-01	General	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00	\$ -	0.00%	\$ 2,150.00	\$ 0.01	\$ -	0.00%	\$ 2,150.00	0.69%	\$ 2,150.00	0.69%	
R-02	Drainage	\$ 747.60	\$ -	\$ -	\$ 747.60	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
R-03	Earth work	\$ 22,541.27	\$ -	\$ -	\$ 22,462.43	\$ -	0.00%	\$ 3,921.69	\$ 0.01	\$ -	0.00%	\$ 3,921.69	1.25%	\$ 3,921.69	1.25%	
R-05	Sub-base, Base and Pavament	\$ 3,122.57	\$ -	\$ -	\$ 3,122.57	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
R-08	Structures	\$ 203,520.63	\$ -	\$ -	\$ 203,520.63	\$ -	0.00%	\$ 142,038.26	\$ 0.45	\$ -	0.00%	\$ 142,038.26	45.39%	\$ 142,038.26	45.39%	
R-10	Dayworks	\$ 105.00	\$ -	\$ -	\$ 105.00	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
R-11	Routine maintenance	\$ 8,555.00	\$ -	\$ -	\$ 8,555.00	\$ -	0.00%	\$ 3,850.00	\$ 0.01	\$ -	0.00%	\$ 3,850.00	1.23%	\$ 3,850.00	1.23%	
R-15	Provisional sum	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
A	Total Construction Cost (R-01+R-02+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)	\$ 247,392.07	\$ -	\$ -	\$ 247,313.22	\$ -	0.00%	\$ 151,959.94	48.56%	\$ -	0.00%	\$ 151,959.94	48.56%	\$ 151,959.94	48.56%	
GENERAL ITEM																
G-01	Security	2,760.00	-	-	2,760.00	-	0.00%	1,150.00	\$ 0.00	-	0.00%	1,150.00	0.37%	1,150.00	0.37%	
G-02	Project team	15,100.00	-	-	15,100.00	-	0.00%	7,750.00	\$ 0.02	-	0.00%	7,750.00	2.48%	7,750.00	2.48%	
G-03	Safety and protection	3,244.00	-	-	3,244.00	-	0.00%	1,146.00	\$ 0.00	-	0.00%	1,146.00	0.37%	1,146.00	0.37%	
G-05	Meetings	120.00	-	-	120.00	-	0.00%	-	\$ -	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
G-06	Ceremonial costs	200.00	-	-	200.00	-	0.00%	-	\$ -	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
G-07	Mineral fees	13,330.21	-	-	13,330.21	-	0.00%	-	\$ -	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
C	Total General Items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	34,754.21	-	-	34,754.21	-	0.00%	10,046.00	3.21%	-	0.00%	10,046.00	3.21%	10,046.00	3.21%	
A	Construction Cost (R-01+R-02+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)	\$ 247,392.07	\$ -	\$ -	\$ 247,313.22	\$ -	0.00%	\$ 151,959.94	48.56%	\$ -	0.00%	\$ 151,959.94	48.56%	\$ 151,959.94	48.56%	
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 24,739.21	\$ -	\$ -	\$ 24,731.32	\$ -	0.00%	\$ 15,195.99	4.86%	\$ -	0.00%	\$ 15,195.99	4.86%	\$ 15,195.99	4.86%	
C	General Items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 34,754.21	\$ -	\$ -	\$ 34,754.21	\$ -	0.00%	\$ 10,046.00	3.21%	\$ -	0.00%	\$ 10,046.00	3.21%	\$ 10,046.00	3.21%	
D	Construction Tax (A+B+C) x 2%	\$ 6,137.71	\$ -	\$ -	\$ 6,135.98	\$ -	0.00%	\$ 3,544.04	1.13%	\$ -	0.00%	\$ 3,544.04	1.13%	\$ 3,544.04	1.13%	
	GRAND TOTAL	\$ 313,023.19	\$ -	\$ -	\$ 312,934.73	\$ -	0.00%	\$ 180,745.98	57.76%	\$ -	0.00%	\$ 180,745.98	57.76%	\$ 180,745.98	57.76%	

Inspeksaun Husi :

Eng. Domingos Soares Martins

Engenheiro ba Projecto Infraestrutura, Transporte e irigasaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng. Remigio da S. dos Santos

Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas

Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.



#ANEXO C2 (MBR10)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality
Contractor : Rito-Pu Unip.Lda
No. kontratu : MOP -CD-RFQ - 21013

Data Inspeksaun : 25 de Maio de 2023

Fatin Inspeksaun : Suco Nunuleta - Darulema

Koordinat :

Start Point : Long : 125.19399353

Latetude : - 8.66031911

End Point : Long : 125.19758718

Latetude : - 8.652363510

Naran Inspektor : 1
2 Domingos Soares Martins

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Projetu ne'e sei mantein hela progressu fisiku anterior nian tamba iha fulan maio nia laran la iha aktividade konstrusaun iha tereno husi empreza





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (MBR10)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality
Contractor : Rito-Pu Unip.Lda
No. kontratu : MOP -CD-RFQ - 21013

SUMMARY											
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	\$ 600.00				\$ 400.00	0.59%	\$ -	0.07%	\$ 400.00	0.59%
R-03	Earth work	\$ 7,829.12				\$ 1,026.29	1.52%	\$ -	0.51%	\$ 1,026.29	1.52%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 3,650.40				\$ 567.84	0.84%	\$ -	0.00%	\$ 567.84	0.84%
R-08	Structures	\$ 31,765.38				\$ 12,639.10	18.76%	\$ -	5.30%	\$ 12,639.10	18.76%
R-10	Dayworks	\$ 210.00				\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 4,077.80				\$ 3,447.80	5.12%	\$ -	0.00%	\$ 3,447.80	5.12%
R-15	Provisional sum	\$ 250.00				\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	General items										
G-01	Security	\$ 1,680.00				\$ 280.00	0.42%	\$ -	0.00%	\$ 280.00	0.42%
G-02	Project team	\$ 6,360.00				\$ 780.00	1.16%	\$ -	0.00%	\$ 780.00	1.16%
G-03	Safety and protection	\$ 1,664.00				\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
G-05	Meetings	\$ 100.00				\$ 100.00	0.15%	\$ -	0.00%	\$ 100.00	0.15%
G-06	Ceremonial costs	\$ 100.00				\$ 50.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ 50.00	0.07%
G-07	Mineral fees	\$ 2,936.03				\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction cost	\$ 48,382.70				\$ 18,081.02	26.83%	\$ -	5.89%	\$ 18,081.02	26.83%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 4,838.27				\$ 1,808.10	2.68%	\$ -	0.59%	\$ 1,808.10	2.68%
C	General items	\$ 12,840.03				\$ 1,210.00	1.80%	\$ -	0.00%	\$ 1,210.00	1.80%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	\$ 1,321.22				\$ 421.98	0.63%	\$ -	0.13%	\$ 421.98	0.63%
E	Total	\$ 67,382.22				\$ 21,521.11	31.94%	\$ -	6.61%	\$ 21,521.11	31.94%

Inspeksaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

Eng. Domingos Soares Martins
Engineiro ba Projecto Infraestrutura, Transporte e
irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Eng. Remigio da C.S. dos Santos
Enginheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, ADN I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da
Qualidade, ADN I.P.

ANEXO C1 (MBR14)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubalarisa, Chainage 8+400-12+500)
Contractor : Meta Loe Crae Bau Unip,Lda
No. kontratu : MPW-W-210160

Data Inspeksaun : 25 de Maio 2023

Fatin Inspeksaun : Suco Vaviquenia - Maubalarisa

Koordinat :

Start Point : Long : 125.21757267
End Point : Long : 125.19000270

Latitude : -8.649459943

Latitude : -8.663187790


Naran Inspektor :

1
2 Eng. Domingos Soares Martins

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Plum Concrete

STA, 8+500-8+600




T	W	Distacia	Volume
0.12	2	50.00	12.00
Total			12.00 m³

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch Item servisu : Stone Masonry Drain

STA, 8+700-8+800



Area	Distacia	Volume
0.35	-	-
Total		- m³





ANEXO C2 (MBR14)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)

Contractor : Meta Loe Crae Bau Unip,Lda

No. kontratu : MPW-W-210160

SUMMARY												
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
Item	Description											
R-01	General works	\$ 3,650.00					\$ 1,550.00	0.78%	\$ -	0.00%	\$ 1,550.00	0.78%
R-02	Drainage	\$ 13.30					\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-03	Earth work	\$ 34,566.24					\$ 31,048.71	15.63%	\$ -	0.00%	\$ 31,048.71	15.63%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 2,260.49					\$ 1,312.57	0.66%	\$ -	0.00%	\$ 1,312.57	0.66%
R-08	Structures	\$ 103,339.22					\$ 64,023.72	32.22%	\$ 1,280.52	0.64%	\$ 65,304.24	32.87%
R-10	Dayworks	\$ 210.00					\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 8,133.60					\$ 7,374.80	3.71%	\$ -	0.00%	\$ 7,374.80	3.71%
R-15	Provisional sum	\$ 500.00					\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
GENERAL ITEM												
G-01	Security	\$ 1,380.00					\$ 690.00	0.35%	\$ -	0.00%	\$ 690.00	0.35%
G-02	Project team	\$ 11,790.00					\$ 11,610.00	5.84%	\$ -	0.00%	\$ 11,610.00	5.84%
G-03	Safety and protection	\$ 6,206.50					\$ 6,181.50	3.11%	\$ -	0.00%	\$ 6,181.50	3.11%
G-05	Meetings	\$ 100.00					\$ 100.00	0.05%	\$ -	0.00%	\$ 100.00	0.05%
G-06	Ceremonial costs	\$ 350.00					\$ 275.00	0.14%	\$ -	0.00%	\$ 275.00	0.14%
G-07	Mineral fees	\$ 7,035.58					\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction cost	\$ 152,672.84					\$ 105,309.80	53.00%	\$ 1,280.52	0.64%	\$ 106,590.32	53.64%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 15,267.28					\$ 10,530.98	5.30%	\$ 128.05	0.06%	\$ 10,659.03	5.36%
C	General items	\$ 26,862.08					\$ 18,856.50	9.49%	\$ -	0.00%	\$ 18,856.50	9.49%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	\$ 3,896.04					\$ 2,693.95	1.36%	\$ 28.17	0.01%	\$ 2,722.12	1.37%
E	Total	\$ 198,698.25					\$ 137,391.23	69.15%	\$ 1,436.74	0.72%	\$ 138,827.97	69.87%

Inspeksaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

Eng. Domingos Soares Martins
Engenheiro ba Projecto Infraestrutura, Transporte e
irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Eng. Remigio da C.S.do Santos
Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, ADN I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da
Qualidade, ADN I.P.



ANEXO CI (MBR16)

Back-up Data

Naran Projeto: R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubalarisa Chainage 4+200-8+400)
Contractor: Luliana Unip,Lda
No. kontratu: MPW-W-210160

Data Inspeksa: 25 de Maio 2023

Fatin Inspeksa: Suco Vaviquenisa - Maubalarisa

Koordinat :

Start Point : Long : 125.22811811
End Point : Long : 125.21757267


Latitude : -8.6326617
Latitude : -8.649459943

Naran Inspekt: 1
2 Eng.Domingos Soares Martins

Sketch & Foto Desenho

Plum Concrete

STA, 3+300-3+420




T	W	Distacia	Volume
0.12	2	30.00	7.20
Total			7.20 m³

Observasaun lha terreno no Foto Aktual



Plum Concrete

STA, 2+300-2+420




T	W	Distacia	Volume
0.12	2		
Total			m³



Stone Masondry

STA, 3+600-3+700



Area	Distacia	Volume
0.35		
Total		m³





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (MBR16)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)

Contract No : MPW-W-210160

Contractor : Luliana,Unip Lda

SUMMARY												
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	\$ 3,458.00	-				\$ 1,050.00	0.49%	\$ -	0.00%	\$ 1,050.00	0.49%
R-02	Drainage	\$ 393.96					\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-03	Earth work	\$ 9,533.98					\$ 6,710.19	3.14%	\$ -	0.00%	\$ 6,710.19	3.14%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 2,334.15					\$ 1,462.50	0.68%	\$ -	0.00%	\$ 1,462.50	0.68%
R-08	Structures	\$ 139,095.11					\$ 105,527.78	49.33%	\$ 1,001.52	0.47%	\$ 106,529.30	49.80%
R-10	Dayworks	\$ 210.00					\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 6,112.00					\$ 6,112.00	2.86%	\$ -	0.00%	\$ 6,112.00	2.86%
R-15	Provisional sum	\$ 500.00					\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
GENERAL ITEM												
G-01	Security	\$ 3,600.00					\$ 3,600.00	1.68%	\$ -	0.00%	\$ 3,600.00	1.68%
G-02	Project team	\$ 11,580.00					\$ 11,580.00	5.41%	\$ -	0.00%	\$ 11,580.00	5.41%
G-03	Safety and protection	\$ 7,441.55					\$ 7,441.55	3.48%	\$ -	0.00%	\$ 7,441.55	3.48%
G-05	Meetings	\$ 100.00					\$ 100.00	0.05%	\$ -	0.00%	\$ 100.00	0.05%
G-06	Ceremonial costs	\$ 350.00					\$ 275.00	0.13%	\$ -	0.00%	\$ 275.00	0.13%
G-07	Mineral fees	\$ 8,863.06					\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction cost	\$ 161,637.20					\$ 120,862.47	56.50%	\$ 1,001.52	0.47%	\$ 121,863.99	56.96%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 16,163.72					\$ 12,086.25	5.65%	\$ 100.15	0.05%	\$ 12,186.40	5.70%
C	General items	\$ 31,934.61					\$ 22,996.55	10.75%	\$ -	0.00%	\$ 22,996.55	10.75%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	\$ 4,194.71					\$ 3,118.91	1.46%	\$ 22.03	0.01%	\$ 3,140.94	1.47%
E	TOTAL	\$ 213,930.25					\$ 159,064.17	74.35%	\$ 1,123.71	0.53%	\$ 160,187.88	74.88%

Inspeksaun Husi :

Eng. Domingos Soares Martins
Engenheiro ba Projecto Infraestrutura, Transporte e irigaaun
Município Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng. Remigio de C.S. dos Santos
Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN
I.P.



#ANEXU C1 – (MBR17)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1, 2 Gariana
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 03 Maio 2023

Fatin Inspesaun : Fatubou - Maubara, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : S 8° 35' 32.592'', Latetude :

End Point : Long : E 125° 19' 53.005'', Latetude :

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2.

Sketch & Foto Desenho

Ekpa enjineiru ADN, IP Munisipiu Liquisa halao
inspesaun ba projeitu Foun MEJD PKRIE ba
Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1, 2 Gariana
lokaliza iha suku Fatubou, Maubara munisipiu
Liquisa, neebe kaer husi servisu Grupu
Komunitariu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 – (MBR17)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1, 2 Gariana
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Progresu servisu refere iha terenu atinji ona servisu
ba item hirak hanesan, *blockwall*, *concretework*,
steel roof no roofing ba konstrusaun klase C
ninan..

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Trabaliador sira mos kontinua hela servisu ba item
finishes ba *plesteran* haleu konstrusaun klase C
ninan.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



TÍTULO DO PROJETO : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA EBF GARIANA
FATIN PROJETO : VATUVOU, MAUBARA
DONO DO PROJETO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

#ANEKSU C2 - (MBR17)					PROGRESU IHA TERENU							VERIFIED BY A D N , I P					
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO		AMOUNT USD	FULAN KOTUK	PERCENT %	FULAN NEE	PERCENT %	TOTAL	PERCENT %	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL BILLED		
											AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	
I	PRELIMINARIES	PP/3		US\$	\$ 3.075,00	\$ 1.487,50	1,26%	\$	0,00%	\$ 1.487,50	1,26%	\$ 1.487,50	1,26%	\$	0,00%	\$ 1.487,50	1,26%
III	CLASSROOM BUILDING CA	CA/39	(i)	US\$	\$ 62.765,81	\$ 20.111,88	17,06%	\$ 21.745,03	18,44%	\$ 41.856,90	35,50%	\$ 20.111,88	17,06%	\$ 21.745,03	18,44%	\$ 41.856,90	35,50%
IV	TOILET BUILDING Tb	TB/39	(i)	US\$	\$ 25.195,09	\$ 720,97	0,61%	\$ 4.131,13	3,50%	\$ 4.852,10	4,12%	\$ 720,97	0,61%	\$ 4.131,13	3,50%	\$ 4.852,10	4,12%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/28	(i)	US\$	\$ 17.526,14	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST			US\$	\$ 108.562,04	\$ 22.320,34	18,93%	\$ 25.876,16	21,95%	\$ 48.196,50	40,88%	\$ 22.320,34	18,93%	\$ 25.876,16	21,95%	\$ 48.196,50	40,88%
B	OVERHEAD			US\$	\$ 6.340,00	\$ 1.268,00	1,08%	\$ 1.268,00	1,08%	\$ 2.536,00	2,15%	\$ 1.268,00	1,08%	\$ 1.268,00	1,08%	\$ 2.536,00	2,15%
C	CONTIGENCY			US\$	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	GRAND TOTAL			US\$	\$ 117.902,04	\$ 23.588,34	20,01%	\$ 27.144,16	23,02%	\$ 50.732,50	43,03%	\$ 23.588,34	20,01%	\$ 27.144,16	23,02%	\$ 50.732,50	43,03%

Inspeksaun Husi:

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento,
ADN, I.P

Verifika Husi:

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineru ba Projeitu
Edifício Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi:

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (MBR17)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO COSTITUZIONALE



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

**Naran projeto : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA EBF
1, 2 GARIANA**

GRUPU KOMUNITARIU

[illegible]

ANEXO C1 (MBR22)
Back-up Data

Naran Projeto : Construcao de Recoperacao de Calamidade " Moru Estrutura Protecao Ponte Loes Pacote II Sta 0 + 000 - 0 + 080 & Sta 0 + 200 - 0 + 440, Postu administrativo Maubara, Municipiu Liquica
Contractor : Conjunto Mulheres Empresarial de Timor (CEMT),Lda
No. kontratu : MPW-W 220256

Data Inspeksaun : 24 de Maio 2023

Fatin Inspeksaun : Suco Loes

Koordinat :

Start Point : Long :
End Point : Long :

Latitude
Latitude


Naran Inspektor : 1
2 Eng. Domingos Soares Martins

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Husi Laboratorium MOP Nasional halo assistensia no fo autorizasaun ba empresa konaba prosesu halo kompozisaun material ba concrete cyclope baseia ba rejultadu teste nebe'e iha ona.

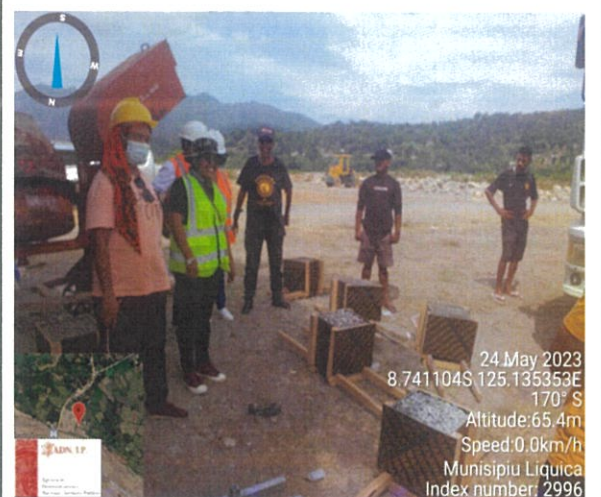

Halo excavausaun ho distancia 50 m, luan = 5m, klean = 2m





ANEXO C2 (MBR22)

Contract Name : Construção de Recuperação de Calamidade " Moru Estrutura Protecção Ponte Loes Pacote II Sta 0 + 000 - 0 + 080 & Sta 0 + 200 - 0 + 440, Postu administrativo Maubara, Municipiu Liqueica
No Contract : MPW-W 220256
Name of Contractor : Conjunto Mulheres Empresarial de Timor (CEMT),Lda

SUMMARY													
NO	ITEM DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT	Halo ona rekomendasaun pagamentu		Seidauk halo rekomendasaun pagamentu						PAYMENT UP TO DATE		Remarks
		AMOUNT (\$)	Previous		Fulan Kotuk		Fulan:Maio 2023		This Billing		Amount (\$)	PERCENT %	
			Motante nebe'e selu ona	Percent (%)	Montante	PERCENT %	Motante fulan ne'e	PERCENT %	Motante Pagamento Agora	PERCENT %			
A	Construction Cost												
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 1,438.00	\$ -	0.00%	\$ 719.00	0.12%	\$ -	0.00%	\$ 719.00	0.12%	\$ 719.00	0.12%	
200	EARTHWORKS	\$ 32,511.40	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 1,490.00	0.25%	\$ 1,490.00	0.25%	\$ 1,490.00	0.25%	
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 469,460.46	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
600	DRAINAGE AND SLOP PROTECTION STRUCTURE	\$ 2,246.90	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
700	MISCELLANEOUS STRUCTURE	\$ 10,612.77	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
A	Total Construction Cost	\$ 516,269.52	\$ -	0.00%	\$ 719.00	0.12%	\$ 1,490.00	0.25%	\$ 2,209.00	0.38%	\$ 2,209.00	0.38%	
C	OVER HEAD	\$ 5,750.00	\$ -	0.00%	\$ 2,175.00	0.37%	\$ -	0.00%	\$ 2,175.00	0.37%	\$ 2,175.00	0.37%	
A	Total Construction	\$ 516,269.52	\$ -	0.00%	\$ 719.00	0.12%	\$ 1,490.00	0.25%	\$ 2,209.00	0.38%	\$ 2,209.00	0.38%	
B	Provit + Overhead (10%)	\$ 51,626.95	\$ -	0.00%	\$ 71.90	0.01%	\$ 149.00	0.03%	\$ 220.90	0.04%	\$ 220.90	0.04%	
C	Over Head	\$ 5,750.00	\$ -	0.00%	\$ 2,175.00	0.37%	\$ -	0.00%	\$ 2,175.00	0.37%	\$ 2,175.00	0.37%	
D	Tax (2%)	\$ 11,472.93	\$ -	0.00%	\$ 59.32	0.01%	\$ 32.78	0.01%	\$ 92.10	0.02%	\$ 92.10	0.02%	
E	Grand Total	\$ 585,119.40	\$ -	0.00%	\$ 3,025.22	0.52%	\$ 1,671.78	0.29%	\$ 4,697.00	0.80%	\$ 4,697.00	0.80%	

Inspeksaun Husi :

Eng. Domingos Soares Martins
Engenheiro ba Projecto Infraestrutura, Transporte e irigaaun Municipiu Liqueica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng. Remigio da C. Soares dos Santos
Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

Note:

Plano Periode inspesaun iha tercinu

Relatorio avaliasuon mensal iha Dili

Inspesoun Pagamentu Annuall iha

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Prepara Husi :

Sertifikasi Huis :

Aprova Husi:

(Eng. Juninho Antônio Abrantes da Cruz)
Eng. do Edifício Público Água e Saneamento Municipal
Liquica ADN, L.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade
ADN, L.P.

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adiunto Director Ejecutivo ADN I.F.
