



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU AINARO

OUTUBRO 2022




SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO AINARO

OUTUBRO 2022


Prepara Husi :



(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Ainaro ADN, I.P




(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigação, Município Ainaro ADN, I.P



(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Ainaro ADN, I.P




(Eng. Jaulino H. Rodrigues)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigação, Município Ainaro ADN, I.P



(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Município Ainaro ADN, I.P

Verifica Husi :



(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P



(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e
Irigação, ADN, I.P



(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifica Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal	3
1.2 Perfil Municipio Ainaro	3
1.3. Lista Projectos	6
II. PROGRESU FISIKU	14
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	14
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	14
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	14
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	15
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu.....	15

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamentos	6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores.....	8
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio	11
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro	13

I. INTRODUSAUN


1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional, I.P ou ADN, I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Presidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN, I.P nian maka atu aseguza katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ADN, I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno caso presiza.

1.2 Perfil Municipio Ainaro

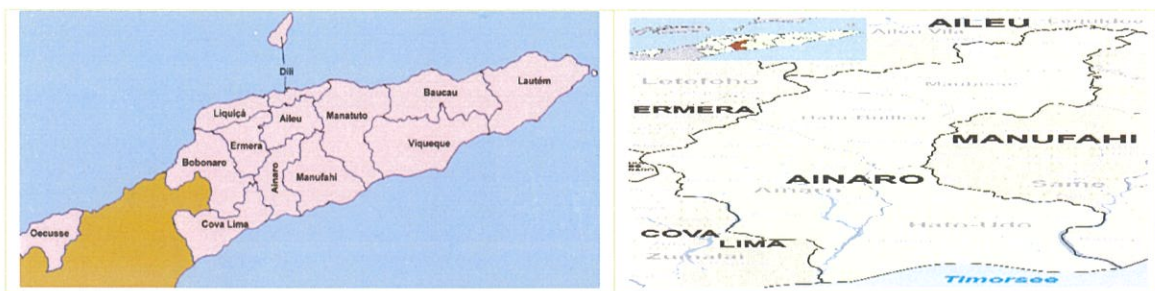

Administrasaun Munisipal Ainaro lokalizadu iha sudoeste país no mapa 2. hatudu pozisaun jeográfiku Munisipiu Ainaro ne'ebé ho luan 797 km² ho populasau nain 59,175 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Ainaro iha Postu Administraativo ha'at, Sukus 21 no Aldeias 131 hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1: Ponto Administrativo, Sukus no Total Aldeias/Sukus

Ainaro		Hatu Bulico		Hatu Udo		Maubisse	
Sukus	Aldeias	suku	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Ainaro	7	Mauchiga	7	Foho-Ailico (beikala)	6	Aituto	9
Cassa	5	Mulo	8	Leolima	10	Edi	6
Manutaci	4	Nuno Moge	6	-	-	Fatubessi	6
Mau-Nuno	3	-	-	-	-	Horai-Quic	4
Mau-Ulo	5	-	-	-	-	Liurai	4
Soro	4	-	-	-	2	Manelobas	4
Suro-Craic	4	-	-	-	4	Manetu	7
-	-	-	-	-	-	Maubisse	12
-	-	-	-	-	-	Maulau	10
Total	32	-	21	-	22	-	62

Data husi : Livro 3B OJE 2021, Pajina 22

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		4				4	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
Grand Total			5				5	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro

ASET ADN,IP MUNICIPIO AINARO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1				1	Moru hadia, monta tralis
2	Kareta		1				1	Kondisaun ladun diák
3	Desktop HP / Monitor		1				1	Diak
4	Laptop HP		1				1	Todan presija update
5	Printer Cannon		1				1	Diak
6	UPS		1				1	Aat
7	Armario File		2				2	Diak
8	Armario Tau hena		2				2	Aat 1
9	Meja escritorio		1				1	Diak
10	Meja han		1				1	Aat
11	Meja TV (kiik)		1				1	Diak
12	Kadeira escritorio		6				6	Diak
13	Kadeira han		4				4	Att 2
14	Sofa		1 Set				1	Diak
15	Springbed +sumasu 4		2 Set				2	Diak (sumasu laiha)
16	Jeleira		1				1	Diak
17	Water Dispenser		1				1	Aat
18	TV + Parabola		1 Set				1	Aat
19	Kipas Angin		5				5	Aat
20	Kompor		1				1	Diak
21	Kompor Gas		1				1	Aat
22	Rack sepatu		3				3	Aat
23	Rack Piring		1				1	Diak
24	Water Pump Sanyo		1				1	Aat

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dadus projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamiento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamiento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + PDIM + LM - BS + LM - TP + Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	27	\$ 26,239,266.40	66.57%
2	Hatubuilico	12	\$ 61,202,630.27	97.82%
3	Hatudo	13	\$ 3,029,791.15	14.82%
4	Maubisse	26	\$ 7,178,836.14	68.27%
Grand Total		78	\$ 97,650,523.96	84.67%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	11	\$ 23,879,713.14	69.88%
2	Hatubuilico	4	\$ 60,431,375.42	98.35%
3	Hatudo	5	\$ 1,770,459.15	7.13%
4	Maubisse	9	\$ 5,130,827.23	72.18%
Grand Total		29	\$ 91,212,374.94	87.65%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	\$ 1,376,091.81	21.18%
2	Hatubuilico	5	\$ 521,296.64	77.84%
3	Hatudo	3	\$ 718,688.00	9.76%
4	Maubisse	4	\$ 392,577.51	81.48%
Grand Total		17	\$ 3,008,653.96	36.14%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	\$ 473,161.58	50.73%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	3	\$ 458,435.28	92.53%
Grand Total		8	\$ 931,596.86	71.30%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo	2	\$ 263,719.00	87.35%
4	Maubisse	1	\$ 302,126.40	98.44%
Grand Total		3	\$ 565,845.40	93.27%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	4	\$ 408,232.25	42.49%
2	Hatubuilico	3	\$ 249,958.21	12.19%
3	Hatudo	3	\$ 276,925.00	8.01%
4	Maubisse	7	\$ 730,876.53	11.17%
Grand Total		17	\$ 1,665,991.99	18.47%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	2	\$ 102,067.62	73.81%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 140,000.00	53.14%
	Grand Total	3	\$ 242,067.62	61.85%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Emergency		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 23,993.19	0.00%
	Grand Total	1	\$ 23,993.19	0.00%

Dados detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Proyecto Municipio Ainara Por Sectores

NO	SECTOR PROYECTO	TOTAL MUNICIPIO AINARO		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	6	\$ 940,813.03	29.79%
2	Edukasaun	19	\$ 2,292,232.62	26.30%
3	Eléctricidade	10	\$ 7,999,431.74	72.04%
4	Estradas E Pontes	14	\$ 19,599,149.60	62.79%
5	Flood Control	2	\$ 108,153.47	68.24%
6	Imprestimo	3	\$ 59,201,316.40	98.91%
7	Irigasaun	1	\$ 32,319.72	100.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	17	\$ 3,237,083.74	62.72%
9	Pontes	2	\$ 3,869,397.22	73.34%
10	Saude	3	\$ 274,369.70	42.47%
11	Turismo	1	\$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	78	\$ 97,650,523.96	84.67%

NO	SECTOR PROYECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	4	\$ 639,367.96	10.60%
2	Edukasaun	4	\$ 520,065.09	41.98%
3	Eléctricidade	3	\$ 2,130,985.59	80.80%
4	Estradas E Pontes	7	\$ 17,893,140.72	67.36%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 815,683.40	44.91%
9	Pontes	2	\$ 3,869,397.22	73.34%
10	Saude	3	\$ 274,369.70	42.47%
11	Turismo	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		27	\$ 26,239,266.40	66.57%

NO	SECTOR PROYECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	3	\$ 249,958.21	12.19%
3	Eléctricidade	1	\$ 1,230,059.02	71.11%
4	Estradas E Pontes	1	\$ 76,554.69	58.37%
5	Flood Control			
6	Imprestimo	3	\$ 59,201,316.40	98.91%
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	4	\$ 444,741.95	81.20%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		12	\$ 61,202,630.27	97.82%

NO	SECTOR PROYECTO	Hatudo		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	4	\$ 578,502.86	10.37%
3	Eléctricidade	1	\$ 384,790.42	0.00%
4	Estradas E Pontes	4	\$ 1,482,565.12	5.85%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun	1	\$ 32,319.72	100.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 551,613.03	48.94%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		13	\$ 3,029,791.15	14.82%

NO	SECTOR PROYECTO	Maubisse		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	2	\$ 301,445.07	70.48%
2	Edukasaun	8	\$ 943,706.46	31.15%
3	Eléctricidade	5	\$ 4,253,596.71	74.44%
4	Estradas E Pontes	2	\$ 146,889.07	82.57%
5	Flood Control	2	\$ 108,153.47	68.24%
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	7	\$ 1,425,045.36	72.48%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		26	\$ 7,178,836.14	68.27%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat	3	\$ 260,605.35	81.30%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 32,319.72	100.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	45	\$ 93,416,272.06	86.97%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	20	\$ 2,316,678.62	26.97%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	5	\$ 484,439.64	51.96%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	0.00%
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
9	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		78	\$ 97,650,523.96	84.67%

NO	DONO DO PROJECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat	1	\$ 15,000.00	0.00%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	14	\$ 24,219,553.10	69.16%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	4	\$ 520,065.09	41.98%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	4	\$ 344,439.64	51.49%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	0.00%
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
9	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		27	\$ 26,239,266.40	66.57%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	9	\$ 60,952,672.06	98.17%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	3	\$ 249,958.21	12.19%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
Grand Total		12	\$ 61,202,630.27	97.82%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 32,319.72	100.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	7	\$ 2,394,522.57	13.98%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	\$ 602,948.86	13.60%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
Grand Total		13	\$ 3,029,791.15	14.82%

NO	DONO DO PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	2	\$ 245,605.35	86.27%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	15	\$ 5,849,524.33	73.86%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	8	\$ 943,706.46	31.15%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude	1	\$ 140,000.00	53.14%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
Grand Total		26	\$ 7,178,836.14	68.27%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Poduktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Ainaro	16,823	7170	6636	5567	5058
Hato-Udo	10,747	3130	2923	2415	2279
Hato-Builico	13,249	3457	3365	3241	3186
Maubisse	24,672	6378	6309	6222	5764

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu neébe hetan husi progresu fulan ida neé, ikus liu porsentagen actual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detallu bele hareé iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hareé #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Obstaclo neébe ami enjineiru hasoru iha terenu mak hanesan tuir mai ne'e :

1. Kompanhia nia tekniku laiha terenu
2. Kompanhia neébe ka'er obra iha Municipio Ainaro iha hotu Dili
3. Teknik husi Projetu nain ladun halo inspesaun ba iha terenu
4. Kondisaun kareta ne'ebe Suporta Ekipa ADN, I.P iha tereno ho kondisaun ne'ebe sei aat

➤ Obstaclo parte Eletricidade

1. Durante Eng ADN, I.P halo monitorin directur kompahnia nunka iha fatin projeto e delega ema balun mak sempre hein iha fatin projeto.
2. Kompahnia balun mak to agora sedauk hadia konstruk Linha MV & LV nebe mak avaria.
3. Iha kompahnia seluk hein hela karta termo de entrega 10% husi EDTL – EP municipio ate agora sedauk fo ba kompahnia.
4. Seksaun M & E - ADN, I.P sempre hasoru mak kona ba motorist.
5. Seksaun M & E – ADN, I.P labele kontrola masimu projeto electricidade ho edificio public tamba Eng M & E – ADN, I.P ida kontrola municipio ha'at (4).

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Buka solusaun ba projetu ne'ebe parado
2. Sistema Internet iha Municipio lalao ho diak ho difikulta enjineiru nia servisu
3. Kondisaun Rezidesia Oficial ADN, I.P Municipio Ainaro ne'ebe presija atu hadia:
 - Be'e
 - Moru
 - Tralis Jenela

➤ **Recomendação parte Eletricidade**

1. Seksaun M & E husu parte rekursu Humanu atu aumenta tan funsionario M & E.
2. Seksaun M & E – ADN, I.P husu ba ITC tenki kria folder sistem keta ida mai iha seksaun M & E – ADN, I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Ainaro

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engineiro	Manuel Bany da S. C. de Carvalho	115	Enjineiru ITI		
		Joaquim de C. Madeira	167	Enjineiru EPAS		
		Claudino Soares Dos Santos	243	Enjineiru EPAS		
		Jaulino H. Rdrigues	237	Enjineiru ITI		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		

2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Lucas Alberto Soares Pereira	195	Motorista		



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL OUTUBRO)

					Lokalizaun Projetu											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452.775,36	June 6, 2016	87,24%	78,52%	\$ 355.512,32	\$ 97.263,04	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381.043,91	Sept. 1, 2016	97,63%	87,87%	\$ 334.820,71	\$ 46.223,20	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Calloko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1.297.166,32	Sept. 1, 2016	88,36%	79,52%	\$ 1.031.531,81	\$ 265.634,51	ON-GOING	
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	\$ 4.223.004,05	July 1, 2013	100,00%	89,74%	\$ 3.789.830,06	\$ 433.173,99	FHO	Projetu ramata ona ho nia fisiku 100%.
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125.249,49	Nov. 7, 2016	100,00%	88,00%	\$ 110.219,55	\$ 15.029,94	PHO	Projetu 100% iha tinan 2016 maibe to agora companhia sedauk husu pagamento retensaun 10%
6	Emergency Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4.325.776,50	Sept. 15, 2017	91,02%	81,92%	\$ 3.543.740,61	\$ 782.035,89	ON-GOING	
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3.717.215,92	July 1, 2013	93,22%	71,00%	\$ 2.639.364,12	\$ 1.077.851,80	PHO	
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4.978.350,99	Aug. 28, 2017	41,51%	34,96%	\$ 1.740.596,03	\$ 3.237.754,96	ON-GOING	
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co.,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	\$ 3.596.249,07	July 1, 2013	100,00%	77,94%	\$ 2.802.979,89	\$ 793.269,18	FHO	
10	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182.864,69	Nov. 9, 2016	91,76%	80,75%	\$ 147.667,55	\$ 35.197,14	ON-GOING	
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardim dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489.653,83	April 10, 2019	52,62%	46,82%	\$ 229.243,50	\$ 260.410,33	ON-GOING	
12	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32.801,87	Aug. 16, 2019	93,39%	84,00%	\$ 27.553,61	\$ 5.248,26	ON-GOING	
13	Rehabilitasaun Edificio Administrasaun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	\$ 15.000,00	Sept. 19, 2016	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 15.000,00	FHO	Projetu refere remata ona iha 2021 husu atu hare fila fali dadus pagamento (Retensaun)
14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/II/2018	\$ 7.700,00	Feb. 12, 2018	100,00%	90,00%	\$ 6.930,00	\$ 770,00	PHO	Projetu refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedauk hatama pagamento
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208.089,56	July 29, 2019	97,82%	63,00%	\$ 131.088,50	\$ 0,70	ON-GOING	Projetu refere sei parado
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29.401,14	Sept. 23, 2019	86,20%	77,58%	\$ 22.808,96	\$ 6.592,18	ON-GOING	Projetu refere 100% ona tuir volume nebe iha tereno



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL OUTUBRO)

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL OUTUBRO)																
Lokalizasaun Projetu																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96.256,72	Dec. 19, 2016	100,00%	89,59%	\$ 86.232,55	\$ 10.024,17	PHO	Projeto ferere ramata ona, husu atu hare fila fali dadus pagamento nebe iha.
18	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33.889,94	June 18, 2021	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 33.889,94	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTG-W-015055	\$ 273.148,15	Aug. 1, 2015	64,84%	12,71%	\$ 34.707,48	\$ 238.440,67	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2016
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212.970,88	July 6, 2015	41,32%	37,19%	\$ 79.200,00	\$ 133.770,88	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2015
21	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600.016,84	July 25, 2016	66,84%	31,84%	\$ 191.070,62	\$ 408.946,22	PENDENTE	Projeto refere parado 2017
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98.554,74	Oct. 15, 2021	29,81%	28,92%	\$ 28.497,77	\$ 70.056,97	ON-GOING	
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103.107,04	Oct. 15, 2021	28,73%	28,73%	\$ 29.620,71	\$ 73.486,33	ON-GOING	
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110.313,75	Oct. 15, 2021	26,63%	26,37%	\$ 29.091,15	\$ 81.222,60	ON-GOING	
25	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	\$ 546.598,02	Oct. 25, 2021	20,04%	0,00%	\$ -	\$ 546.598,02	ON-GOING	
26	New Construction of Laboratory for Covid-19, at Sentru Internamentu Ainaro Villa, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Adjulcojam Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-21-098C	\$ 70.069,94	14-Mar-21	74,76%	86,82%	\$ 60.831,49	\$ 9.238,45	ON-GOING	
27	Rehabilitasaun CHC ba Izolamento Ainaro Villa relasiona covid19	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Marcalas Trading Solution, Unip Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-20-212	\$ 31.997,68	Nov. 1, 2021	100,00%	45,33%	\$ 14.505,18	\$ 17.492,50	ON-GOING	
28	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	Ia menciona no contrato	\$ 24.446,00	Aug. 26, 2013	100,00%	90,00%	\$ 22.001,40	\$ 2.444,60	PHO	Projeto refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedauk hatama pagamento
29	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	\$ 239.273,00	Sept. 25, 2019	100,00%	87,08%	\$ 208.360,75	\$ 30.912,25	FHO	
30	New Construction of Electrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELÉCTRICIDADE	Hatudo	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384.790,42	Jul,26,2021	12,33%	0,00%	\$ -	\$ 384.790,42	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
31	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287.894,03	May 18, 2017	15,00%	13,75%	\$ 39.581,06	\$ 248.312,97	PENDENTE	Projeto refere parado 2019
32	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere-Ainaro	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	Ainaro	Berdato Unip Lda		\$ 32.319,72	23.8, 2021	100,00%	100,00%	\$ 32.319,72	\$ -	FHO	
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97.872,80	Oct. 15, 2021	21,62%	0,00%	\$ -	\$ 97.872,80	ON-GOING	
34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68.356,81	Oct. 15, 2021	34,36%	32,44%	\$ 22.173,99	\$ 46.182,82	ON-GOING	
35	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110.695,39	Oct. 15, 2021	29,94%	0,00%	\$ -	\$ 110.695,39	ON-GOING	
36	Projeto Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	\$ 301.577,86	Oct. 15, 2021	19,30%	12,55%	\$ 37.839,97	\$ 263.737,89	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL OUTUBRO)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	Lokalizasaun Projetu		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVA SAUN
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU										
37	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	DELONG UNIPESOAAL LDA	RT/005/MOP-2021	\$ 411.500,10	08-Mar-22	12,70%	0,00%	\$ -	\$ 411.500,10	ON-GOING	
38	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	\$ 448.953,98	08-Mar-22	29,20%	0,00%	\$ -	\$ 448.953,98	ON-GOING	
39	Rural Road Rehabilitation of Foho Allico- Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	\$ 295.599,61	08-Mar-22	14,55%	6,67%	\$ 19.727,79	\$ 275.871,82	ON-GOING	
40	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	\$ 326.511,43	08-Mar-22	73,00%	20,51%	\$ 66.983,28	\$ 259.528,15	ON-GOING	
41	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161.554,19	Aug. 16, 2019	96,53%	86,20%	\$ 139.264,98	\$ 22.289,21	ON-GOING	
42	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27.701,07	Jan. 9, 2017	100,00%	79,19%	\$ 21.935,23	\$ 5.765,84	ON-GOING	Projetu refere ramata ona husu atu hare fila fali dadus pagamento
43	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195.150,70	Aug. 21, 2019	84,46%	76,02%	\$ 148.346,12	\$ 46.804,58	ON-GOING	
44	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60.335,99	Aug. 16, 2019	92,83%	85,47%	\$ 51.568,25	\$ 8.767,74	ON-GOING	
45	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76.554,69	June 18, 2021	37,11%	58,37%	\$ 44.682,98	\$ 31.871,71	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
46	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 28.138.737,00	Nov. 20, 2014	100,00%	99,22%	\$ 27.919.968,96	\$ 218.768,04	FHO	
47	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 26.875.070,79	Nov. 20, 2014	100,00%	99,62%	\$ 26.771.980,96	\$ 103.089,83	FHO	
48	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda, Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4.187.508,61	Dec. 12, 2014	92,29%	92,29%	\$ 3.864.572,08	\$ 322.936,53	ON-GOING	
49	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Hatubuilico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1.230.059,02	Sept. 1, 2016	79,02%	71,11%	\$ 874.731,27	\$ 355.327,75	ON-GOING	
50	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67.801,26	Oct. 15, 2021	28,66%	0,00%	\$ -	\$ 67.801,26	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL OUTUBRO)

Lokalizasaun Projeto																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
51	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubulico	Ainara	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100.649,51	Oct. 15, 2021	32,14%	30,27%	\$ 30.464,27	\$ 70.185,24	ON-GOING	
52	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubulico	Ainara	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81.507,44	Oct. 15, 2021	30,17%	0,00%	\$ -	\$ 81.507,44	ON-GOING	
53	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainara	Bermuana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236.224,90	Feb. 5, 2019	79,95%	60,75%	\$ 143.498,67	\$ 92.726,23	ON-GOING	
54	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainara	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203.298,50	Jan. 22, 2019	66,94%	49,43%	\$ 100.497,36	\$ 102.801,14	ON-GOING	
55	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimlete, Hahimu - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571.044,38	July 6, 2016	93,00%	83,32%	\$ 475.776,61	\$ 95.267,77	ON-GOING	Projeto nia lahele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laha ona no presija hadia fali nia konstrusaun
56	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Fleixa to Erelesu, and Libtutu - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657.097,80	Jan. 9, 2016	77,28%	69,81%	\$ 458.718,70	\$ 198.379,10	ON-GOING	
57	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996.017,31	July 6, 2016	100,00%	90,00%	\$ 896.415,58	\$ 99.601,73	PHO	Hein 10 % retensaun EDTL Munisipiu maka seidaok entrega
58	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1.032.412,07	July 6, 2016	48,72%	43,84%	\$ 452.656,17	\$ 579.755,90	ON-GOING	
59	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997.025,15	Sept. 1, 2016	98,38%	88,54%	\$ 882.792,12	\$ 114.233,03	ON-GOING	Projeto nia lahele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laha ona no sei hein kompanha atu submete dokumentus
60	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainara	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	\$ 195.378,22	Aug. 16, 2019	100,00%	98,25%	\$ 191.961,64	\$ 3.416,58	FHO	
61	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainara	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84.706,26	Aug. 12, 2016	100,00%	87,04%	\$ 73.728,12	\$ 10.978,14	ON-GOING	Projeto refere ramata ona iha 2019 husu atu hare fila fali dadus pagamento
62	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urlepha Star 0+000 - 3+000 Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainara	Delong Unip. Lda	MPW-190087	\$ 302.126,40	Aug. 16, 2019	100,00%	98,44%	\$ 297.407,48	\$ 4.718,92	FHO	
63	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainara	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 84.160,28	July 29, 2019	97,43%	87,69%	\$ 73.802,68	\$ 10.357,60	ON-GOING	Projeto refere kompanha sei hatama pagamento adicional
64	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainara (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 212.829,93	July 29, 2019	99,77%	99,77%	\$ 212.337,64	\$ 492,29	FHO	
65	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainara	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 161.445,07	Aug. 16, 2019	100,00%	85,52%	\$ 138.069,82	\$ 23.375,25	ON-GOING	
66	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainara	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	\$ 112.517,92	June 18, 2021	100,00%	90,00%	\$ 101.265,05	\$ 11.252,87	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL OUTUBRO)

					Lokalizasaun Projeto											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
67	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34.371,15	June 18, 2021	64,74%	58,27%	\$ 20.027,34	\$ 14.343,81	ON-GOING	
68	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353.000,86	Nov. 22, 2016	70,09%	62,10%	\$ 219.207,07	\$ 133.793,79	PHO	
69	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobulico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50.310,22	Jan. 9, 2017	40,00%	13,17%	\$ 6.624,47	\$ 43.685,75	ON-GOING	Projeto refere sei parado iha tinan 2019
70	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	\$ 140.000,00	29-Apr-21	94,29%	53,14%	\$ 74.391,78	\$ 65.608,22	ON-GOING	
71	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99.094,14	Oct. 15, 2021	28,49%	0,00%	\$ -	\$ 99.094,14	ON-GOING	
72	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92.706,60	Oct. 15, 2021	30,92%	29,72%	\$ 27.552,08	\$ 65.154,52	ON-GOING	
73	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86.471,50	Oct. 15, 2021	29,40%	29,40%	\$ 25.425,20	\$ 61.046,30	ON-GOING	
74	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97.841,29	Oct. 15, 2021	30,10%	29,32%	\$ 28.682,79	\$ 69.158,50	ON-GOING	
75	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149.916,20	Oct. 15, 2021	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 149.916,20	ON-GOING	
76	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94.951,66	Oct. 15, 2021	29,07%	0,00%	\$ -	\$ 94.951,66	ON-GOING	
77	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109.895,14	Oct. 15, 2021	26,47%	0,00%	\$ -	\$ 109.895,14	ON-GOING	
78	Emergency project Cyclone Seroja 04 de Abril 2021 "Construsaun moru protesau (Gabion) Aituto (Sta. 0+000-Sta. 0+028.71)", Munisipio Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	AILESU UNIPESOAL LDA	RFQ-CD-MOP-22006	\$ 23.993,19	28-Jun-22	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 23.993,19	ON-GOING	
TOTAL									\$ 97.650.523,96			84,67%	\$ 82.684.985,60	\$ 14.888.538,00		

(Eng. Joaquim de C. Madera)

Eng. ba Edificio Publiku no Bee Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino Soares Dos Santos)

Eng. ba Edificio Publiku no Bee Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Prepara Husi :

(Eng. Manuel Bery de S. C. de Carvalho)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Jaulino H. Rodrigues)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Silvino D. R. R. Soares)

Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

												Oct-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-1	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452.775,36	June 6, 2016	87,24%	0,00%	87,24%
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-2	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381.043,91	Sept. 1, 2016	97,63%	0,00%	97,63%
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobullico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-3	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1.297.166,32	Sept. 1, 2016	88,36%	0,00%	88,36%
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-4	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	\$ 4.223.004,05	July 1, 2013	100,00%	0,00%	100,00%
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-5	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125.249,49	Nov. 7, 2016	100,00%	0,00%	100,00%
6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-6	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4.325.776,50	Sept. 15, 2017	91,02%	0,00%	91,02%
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-7	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3.717.215,92	July 1, 2013	93,22%	0,00%	93,22%
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-8	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4.978.350,99	Aug. 28, 2017	41,51%	0,00%	41,51%
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	ANV-9	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	\$ 3.596.249,07	July 1, 2013	100,00%	0,00%	100,00%
10	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-10	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182.864,69	Nov. 9, 2016	91,76%	0,00%	91,76%
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-11	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489.653,83	April 10, 2019	52,62%	0,00%	52,62%
12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-12	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32.801,87	Aug. 16, 2019	93,39%	0,00%	93,39%
13	Rehabilitasaun Edificio Administrasaun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	ANV-13	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	\$ 15.000,00	Sept. 19, 2016	0,00%	0,00%	0,00%
14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	ANV-14	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/II/2018	\$ 7.700,00	Feb. 12, 2018	100,00%	0,00%	100,00%
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	ANV-15	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208.089,56	July 29, 2019	97,82%	0,00%	97,82%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Oct-22		
												Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainara-Vila	ANV-16	Ainara	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29.401,14	Sept. 23, 2019	86,20%	0,00%	86,20%
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainara	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainara-Vila	ANV-17	Ainara	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96.256,72	Dec. 19, 2016	100,00%	0,00%	100,00%
18	Rural Roads Routine Maintenance Ainara - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainara-Vila	ANV-18	Ainara	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33.889,94	June 18, 2021	0,00%	0,00%	0,00%
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainara vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainara-Vila	ANV-19	Ainara	Chik-tete Unip. Lda	RDITL-MPWTC-W-015055	\$ 273.148,15	Aug. 1, 2015	64,84%	0,00%	64,84%
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainara-Vila	ANV-20	Ainara	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212.970,88	July 6, 2015	41,32%	0,00%	41,32%
21	Rehabilitasaun Estrada Ainara-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainara-Vila	ANV-21	Ainara	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600.016,84	July 25, 2016	66,84%	0,00%	66,84%
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-22	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98.554,74	Oct. 15, 2021	29,81%	2,01%	31,82%
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-23	Ainara	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103.107,04	Oct. 15, 2021	28,73%	1,49%	30,21%
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-24	Ainara	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110.313,75	Oct. 15, 2021	26,63%	5,81%	32,44%
25	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainara District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	ANV-25	Ainara	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	\$ 546.598,02	Oct. 25, 2021	20,04%	0,00%	20,04%
26	New Construction of Laboratory for Covid-19, at Sentru Internamentu Ainara Villa, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	ANV-26	Ainara	Adjulcojam Unip. Lda	RDITL-MS-C19-DNA-RBK-21-098C	\$ 70.069,94	14-Mar-21	74,76%	0,00%	74,76%
27	Rehabilitasaun CHC ba Izolamento Ainara Villa relaciona covid19	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Ainara-Vila	ANV-27	Ainara	Marcalas Trading Solution, Unip Lda	RDITL-MS-C19-DNA-RBK-20-212	\$ 31.997,68	Nov. 1, 2021	100,00%	0,00%	100,00%
28	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-1	Ainara	Simbissa Unip.Lda	Ia mensiona no kontratu	\$ 24.446,00	Aug. 26, 2013	100,00%	0,00%	100,00%
29	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainara (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-2	Ainara	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	\$ 239.273,00	Sept. 25, 2019	100,00%	0,00%	100,00%
30	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	HA-3	Ainara	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384.790,42	Jul1,26,2021	12,33%	0,00%	12,33%
31	Road Maintenance Section - Ainara - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-4	Ainara	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287.894,03	May 18, 2017	15,00%	0,00%	15,00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Oct-22		
												Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
32	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere-Ainaro	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	HA-5	Ainaro	Berdato Unip Lda		\$ 32.319,72	23.8, 2021	100,00%	0,00%	100,00%
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-6	Ainaro	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97.872,80	Oct. 15, 2021	21,62%	8,49%	30,11%
34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-7	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68.356,81	Oct. 15, 2021	34,36%	18,20%	52,56%
35	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-8		MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110.695,39	Oct. 15, 2021	29,94%	2,34%	32,27%
36	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	HA-9	Ainaro	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	\$ 301.577,86	Oct. 15, 2021	19,30%	0,00%	19,30%
37	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-10	Ainaro	DELONG UNIPessoal LDA	RT/005/MOP-2021	\$ 411.500,10	08-Mar-22	12,70%	0,00%	12,70%
38	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-11	Ainaro	Bermuana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	\$ 448.953,98	08-Mar-22	29,20%	0,00%	29,20%
39	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-12	Ainaro	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	\$ 295.599,61	08-Mar-22	14,55%	0,00%	14,55%
40	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-13	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	\$ 326.511,43	08-Mar-22	73,00%	0,00%	73,00%
41	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-1	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161.554,19	Aug. 16, 2019	96,53%	0,00%	96,53%
42	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-2	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27.701,07	Jan. 9, 2017	100,00%	0,00%	100,00%
43	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-3	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195.150,70	Aug. 21, 2019	84,46%	8,20%	92,66%
44	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-4	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60.335,99	Aug. 16, 2019	92,83%	0,00%	92,83%
45	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	HTB-5	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76.554,69	June 18, 2021	37,11%	0,00%	37,11%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Oct-22		
												Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
46	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	HTB-6	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 28.138.737,00	Nov. 20, 2014	100,00%	0,00%	100,00%
47	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	HTB-7	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 26.875.070,79	Nov. 20, 2014	100,00%	0,00%	100,00%
48	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	HTB-8	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4.187.508,61	Dec. 12, 2014	92,29%	0,00%	92,29%
49	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	HTB-9	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1.230.059,02	Sept. 1, 2016	79,02%	0,00%	79,02%
50	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-10	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67.801,26	Oct. 15, 2021	28,66%	3,10%	31,77%
51	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-11	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100.649,51	Oct. 15, 2021	32,14%	14,16%	46,30%
52	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-12	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81.507,44	Oct. 15, 2021	30,17%	0,95%	31,12%
53	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-1	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236.224,90	Feb. 5, 2019	79,95%	0,00%	79,95%
54	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-2	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203.298,50	Jan. 22, 2019	66,94%	0,00%	66,94%
55	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-3	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571.044,38	July 6, 2016	93,00%	0,00%	93,00%
56	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-4	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657.097,80	Jan. 9, 2016	77,28%	0,00%	77,28%
57	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-5	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996.017,31	July 6, 2016	100,00%	0,00%	100,00%
58	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-6	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1.032.412,07	July 6, 2016	48,72%	0,00%	48,72%
59	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-7	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997.025,15	Sept. 1, 2016	98,38%	0,00%	98,38%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

												Oct-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
60	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-8	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	\$ 195.378,22	Aug. 16, 2019	100,00%	0,00%	100,00%
61	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-9	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84.706,26	Aug. 12, 2016	100,00%	0,00%	100,00%
62	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urlephha Star 0+000 - 3+000 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-10	Ainaro	Delong Unip. Lda	MPW-190087	\$ 302.126,40	Aug. 16, 2019	100,00%	0,00%	100,00%
63	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-11	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 98.821,63	July 29, 2019	97,43%	0,00%	97,43%
64	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-12	Ainaro	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 212.829,93	July 29, 2019	99,77%	0,00%	99,77%
65	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	MBS-13	Ainaro	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 161.445,07	Aug. 16, 2019	100,00%	0,00%	100,00%
66	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	MBS-14	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	\$ 112.517,92	June 18, 2021	100,00%	0,00%	100,00%
67	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	MBS-15	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34.371,15	June 18, 2021	64,74%	0,00%	64,74%
68	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-16	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353.000,86	Nov. 22, 2016	70,09%	0,00%	70,09%
69	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-17	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50.310,22	Jan. 9, 2017	40,00%	0,00%	40,00%
70	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	MBS-18	Ainaro	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	\$ 140.000,00	29-Apr-21	94,29%	0,00%	94,29%
71	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-19	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99.094,14	Oct. 15, 2021	28,49%	0,00%	28,49%
72	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-20	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92.706,60	Oct. 15, 2021	30,92%	3,38%	34,30%
73	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-21	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86.471,50	Oct. 15, 2021	29,40%	3,08%	32,48%
74	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-22	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97.841,29	Oct. 15, 2021	30,10%	9,54%	39,64%
75	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-23	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149.916,20	Oct. 15, 2021	0,00%	0,00%	0,00%
76	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-24	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94.951,66	Oct. 15, 2021	29,07%	0,00%	29,07%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Oct-22		
												Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
77	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-25	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109.895,14	Oct. 15, 2021	26,47%	0,73%	27,20%
78	Emergency project Cyclone Seroja 04 de Abril 2021 "Construsaun moru protesaun (Gabion) Aituto (Sta. 0+000-Sta. 0+028.71)", Munisipio Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-26	Ainara	AILESU UNIPESSOAL LDA	RFQ-CD-MOP-22006	\$ 23.993,19	28-Jun-22	0,00%	0,00%	0,00%

Prepara Husi:

(Eng. Joaquim de C. Madeira)

Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu, Município Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Claudino Soares Dos Santos)

Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu, Município Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Manuel Bary da S. C. de Carvalho)

Eng. ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun, Município Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Jacinto H. Rodrigues)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Município Ainara
ADN, I.P.

(Silvino D R R Soares)

Eng. M & E, Município Ainara ADN, I.P.

Verifika Husi:

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)

Eng. Senior ba Edifício Público no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)

Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P.

(Deolindo de F. Marques)

Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P.

Sertifika Husi:

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Data Inspesaun : **07-10-2022**

Fatin Inspesaun : **Ainaro**

Koordinadas :

Start Point : Long : **8.9941S**, Latetude: **125.5010E**

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : **1. Joaquim de C. Madeira**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeto refere nia fisiko final ona maibe nia osan resto seidauk selu hotu ho rajaun sira projeto nain atu altera fali ba halo Baleta no garagem para kareta ho motor. (Parado ate agora)	



ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data


Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidaok
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

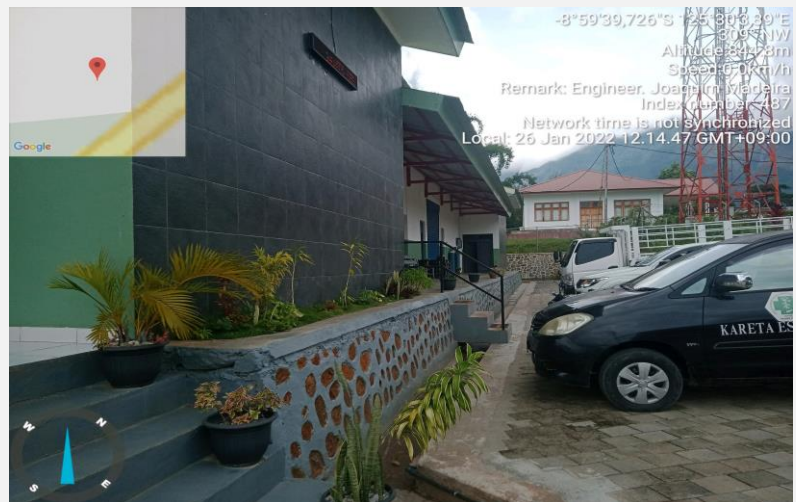



ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidauk
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.

Observasaun iha tereno no Foto





ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho
Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidauk
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
: **434/KDM-AINARO/IX/2019**



ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto
Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Data Inspesaun : 06-10-2022

Fatin Inspesaun : Hut-seo / Hato-udo - vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -9°9'7"902'S Latetude: 125°34'55,668 E

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Ekipa tekniku ADN. IP halo inspesaun
ba progresso fisiku iha tereno, Tekniku
husi ADN. IP mos observa fisiku iha
tereno, batako ba Sala de Aulas nian
kuase remata, no haris fatin nian sedauk
hotu tamba material sedauk sufisiente.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto
Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Sketch Item servisu

Ekipa tekniku ADN. IP halo inspesaun
ba progresso fisiku iha tereno, Tekniku
husi ADN. IP mos observa fisiku iha
tereno, batako ba Sala de Aulas nian
kuase remata, no haris fatin nian sedauk
hotu tamba material sedauk sufisiente.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto
Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Sketch Item servisu

Ekipa tekniku ADN. IP halo inspesaun
ba progresso fisiku iha tereno, Tekniku
husi ADN. IP mos observa fisiku iha
tereno, batako ba Sala de Aulas nian
kuase remata, no haris fatin nian sedauk
hotu tamba material sedauk sufisiente.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual






ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto
Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

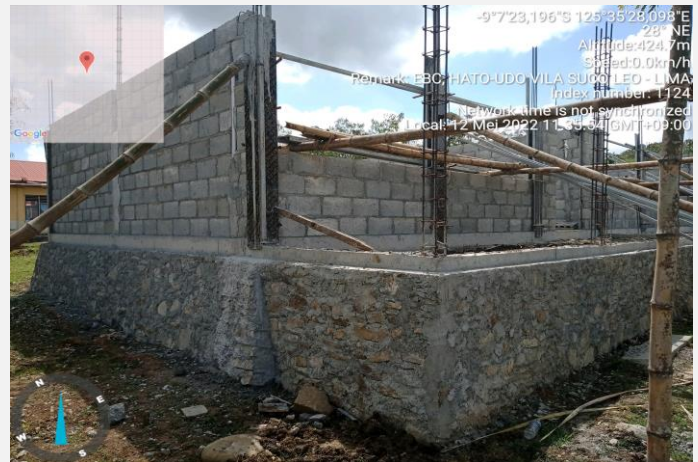



ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Data Inspesaun : 01/10/2022

Fatin Inspesaun : Ruslau/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere hotu ona, preparasaun ba monta bikesting ba slotf leten. E fui hotu kontinuasaun levantamento dadus ba pagamento 50% nian e pagamento 50% nia sai maka kontinua fali uma kakuluk.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere bloko hada
hotu ona, preparasaun ba
monta bikesting ba slotf
leten.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere bloko hada
hotu ona, preparasaun ba
monta bikesting ba slotf
leten.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



-8°50'28,54"S 125°38'4,794"E
Ainaro, Timor-Leste
Remark: Novo Konstrusaun: Actula servuso EBF RUSLAU AINARO
Network: 9-Agt 2022 14.30.57 GMT+09:00
Local: 9-Agt 2022 14.30.57 GMT+09:00



ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

**plamir para
preparasaun ba pinta
aiben.**

**Servisu Iha parte laran
mos kuaze plafon ho
keramik mos hotu ona.**
(Projeito ida nee parado)

Sketch & Foto Desenho
Sketch Item servisu

**Servisu bee nian mos hotu
ona nia istalasaun mos tuir
desenho nebe mak iha**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

terreno.

Servisu atero veranda mos
hotu ona hein deit fui
betaun. (Projeito ida nee
parado)

.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU





ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Data Inspesaun : 12-10-2022

Fatin Inspesaun :Betula/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long : 8'55'42606'S Latetude: 36'23'274 E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere fisicamente atinge on aba kuda-kuda, GK preparasaun atu tula kuda kuda.	 Remark: Novo Konstrusaun: Servuso actual Bekisting column varanda EBF Betulala AINARO Network: 12 Okt 2022 11:21:04 GMT+09:00 Local: 12 Okt 2022 11:21:03 GMT+09:00

ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere fisicamente
atinge on aba kuda-kuda, GK
preparasaun atu tula kuda
kuda.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere fisicamente atinge on aba kuda-kuda, GK preparasaun atu tula kuda kuda.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere bloku hada
hotu ona e agora preparasaun
ba fui sinta leten.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA





ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto

SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA
RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.

Data Inspesaun : 12-10-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°5930366 “S, Latetude: 125,3019,0666E

End Point : Long Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos santos

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere nia progresso atinje ona
100%, e kompanha submete ona pedidu
pagamento 100% ba iha dona de Projeto

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto

SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA
RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere nia progresso atinje ona
100%, e kompanha submete ona pedidu
pagamento 100% ba iha dona de Projeto

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto

SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA
RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere nia progresso atinje ona
100%, e kompanha submete ona pedidu
pagamento 100% ba iha dona de Projeto

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto

SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA
RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.







ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto

SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA
RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.

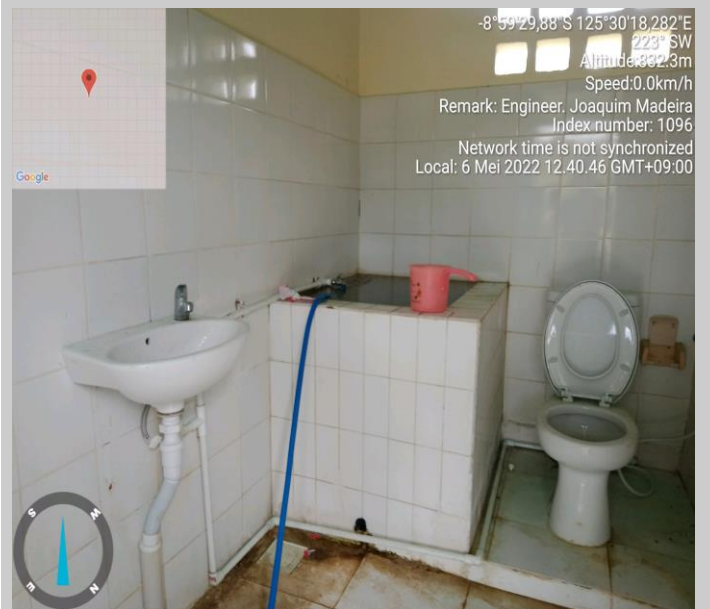



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto

SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA
RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.

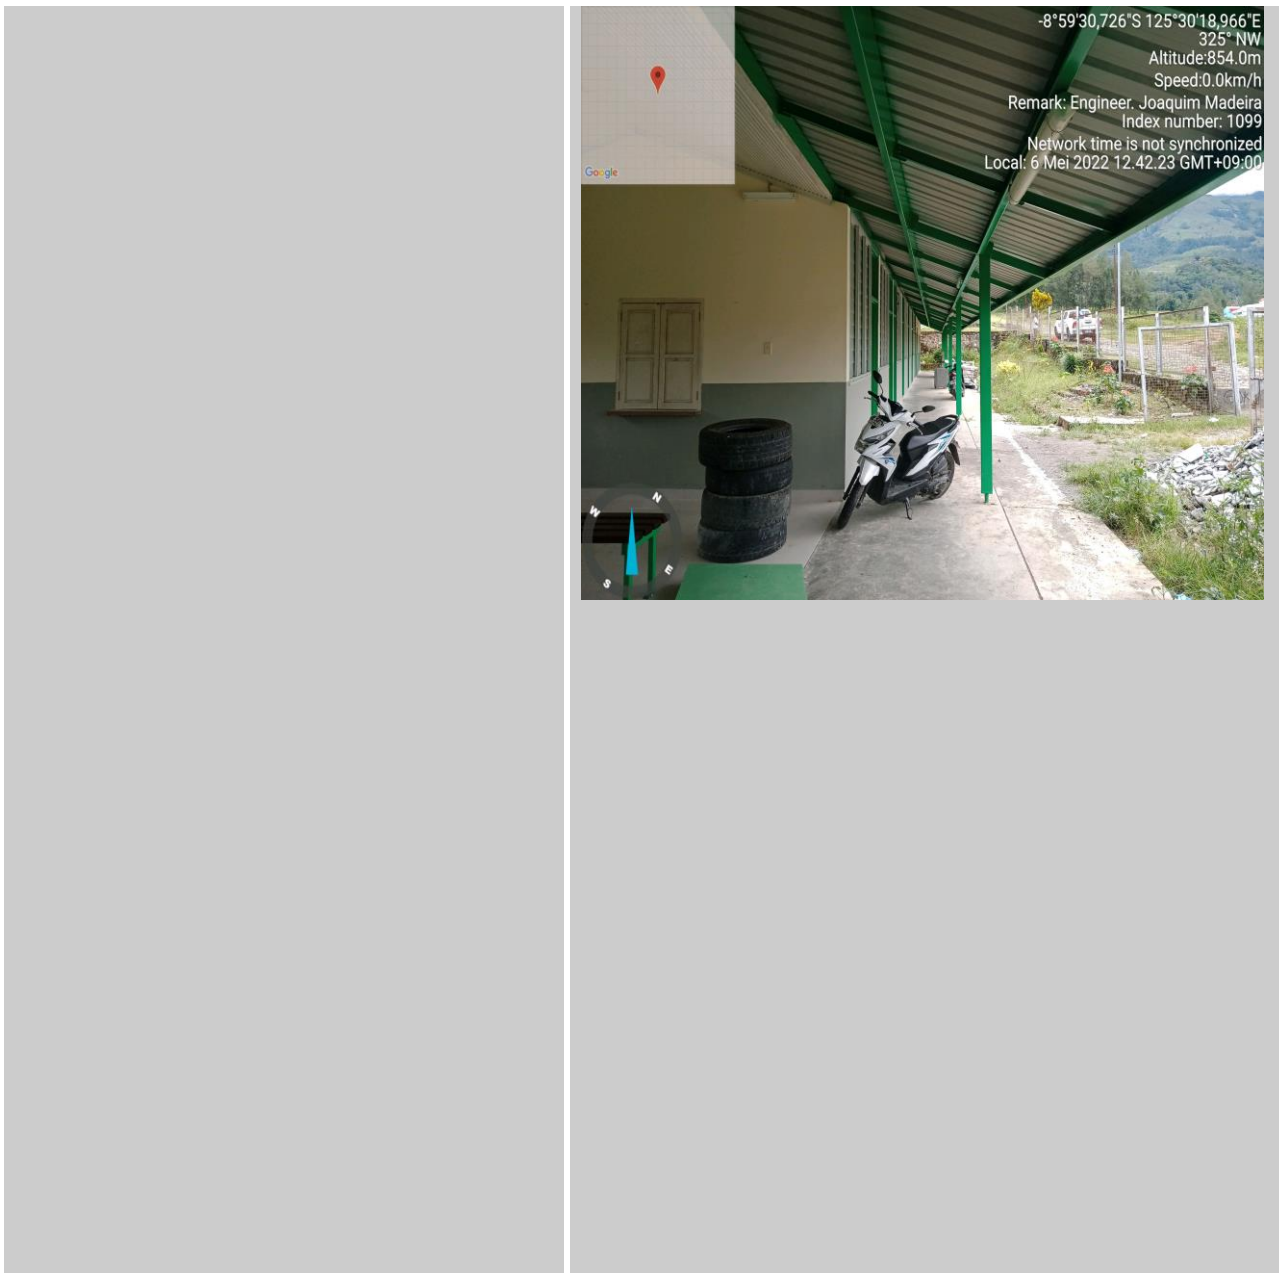




ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto

SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA
RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.






ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto

SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA
RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.





ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto

SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA
RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.

Sketch Item servisu “	Sketch & Foto Desenho
Parte oin sala izolamento ainaro vila	



ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto

SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA
RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.

Parte uma laran nebe pinta quase hotu
ona no parte kotuk nian maka seidauk




ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto

SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA
RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.





ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Data Inspesaun : 15-10-2022

Fatin Inspesaun : Tukaro, Hatu builiko

Koordinadas :

Start Point : Long : -856''37.974''S 125°31'18''702 ÉLatetude:

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa Tecnico ADN, IP municipio Ainaro halo Inspeksun ba projeto refere, projeto refere ba ha item block wall remata ona, no sloft leten cor remata ona, concrete work ba ringbalk sopi sopi, mos remata.	 -8°56'37.269"S 125°31'19.227"E Altitude: 1349.0m Remark: Novo Konstrusaun: Serviso actual EBF Tucaro AINARO Network time is not synchronized Local: 15 Okt 2022 10:51:05 GMT+09:00



ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Sketch & Foto Desenho

Ekipa Tecnico ADN, IP municipio Ainaro halo Inspeksun ba projeto refere, projeto refere ba ha item block wall remata ona, no sloft leten cor remata ona, concrete work ba ringbalk sopi sopi, mos remata.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Município de Ainaro (TUKARRO)

Ekipa Tecnico ADN, IP municipio Ainaro halo Inspeksun ba projeto refere, projeto refere ba ha item block wall remata ona, no sloft leten cor remata ona, concrete work ba ringbalk sopi sopi, mos remata.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Município de Ainaro (TUKARRO)





ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Data Inspesaun : 05-10-2022

Fatin Inspesaun :Tatiris Lases

Koordinadas :

Start Point : Long :-8°55'28,638''S Latetude: 125°34'4,392E

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projeito refere hada blocu no sinta leten hotu ona, e agora provisoriamente laiha servisu, tamba material hotu,e agora GK hatama ona pedido pagamento 50% ba iiha Dono de Projeito.	 Network: 5 Okt 2022 15:45:03 GMT+09:00 Local: 5 Okt 2022 15:45:04 GMT+09:00 8,9244S 125,5680E Jalan Tanpa Nama Timor-Leste Altitude:1227.0m Speed:2.6km/h Remark: EBF TATIRI, AINARO V > Index number: 187

ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere hada blocu no
sinta leten hotu ona, e agora
provisoriamente laiha
servisu, tamba material
hotu,e agora GK hatama ona
pedido pagamento 50% ba
iiha Dono de Projeito.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere hada blocu no sinta leten hotu ona, e agora provisoriamente laiha servisu, tamba material hotu,e agora GK hatama ona pedido pagamento 50% ba iiha Dono de Projeito.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto
Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inclui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inclui Sala Professor no Suco Mulo Posto
Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)





ANEXU-ANV-22

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Data Inspesaun : 06/10/2022

Fatin Inspesaun : LUAN CADOI / Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long :-9°9,176'S Latetude: 125, 32°9,042 E.

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere hada bloco 40 x 20 x10 ba sala de aulas 3 remata ona, ba iha item sopi sopi mos remata ona, GK mos iha hela preparasaun ba atu monta kuda kuda, no hahu mos atu plester moru liur no laran.	



ANEXU-ANV-22

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainara Posto Administrativo de
Ainara Municipio de Ainara (EBF. LUAN CADOI)

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere hada bloco 40 x 20 x10 ba
sala de aulas 3 remata ona, ba iha item
sopi sopi mos remata ona, GK mos iha
hela preparasaun ba atu monta kuda
kuda, no hahu mos atu plester moru liur
no laran.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU-ANV-22

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere hada bloco 40 x 20 x10 ba
sala de aulas 3 remata ona, ba iha item
sopi sopi mos remata ona, GK mos iha
hela preparasaun ba atu monta kuda
kuda, no hahu mos atu plester moru liur
no laran.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU-ANV-22

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU-ANV-22

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)





ANEXU- HA - 6

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Data Inspesaun : 06-10-2022

Fatin Inspesaun : Hato-udo Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :S, Latetude:E.

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira


: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere lao hela, maibe material konstrusaun mak hotu, maibe GK sira submete ona pagamento 50% nian. GK sei kontinua fila servisu wainhira hetan ona pagamento.	

ANEXU- HA - 6

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

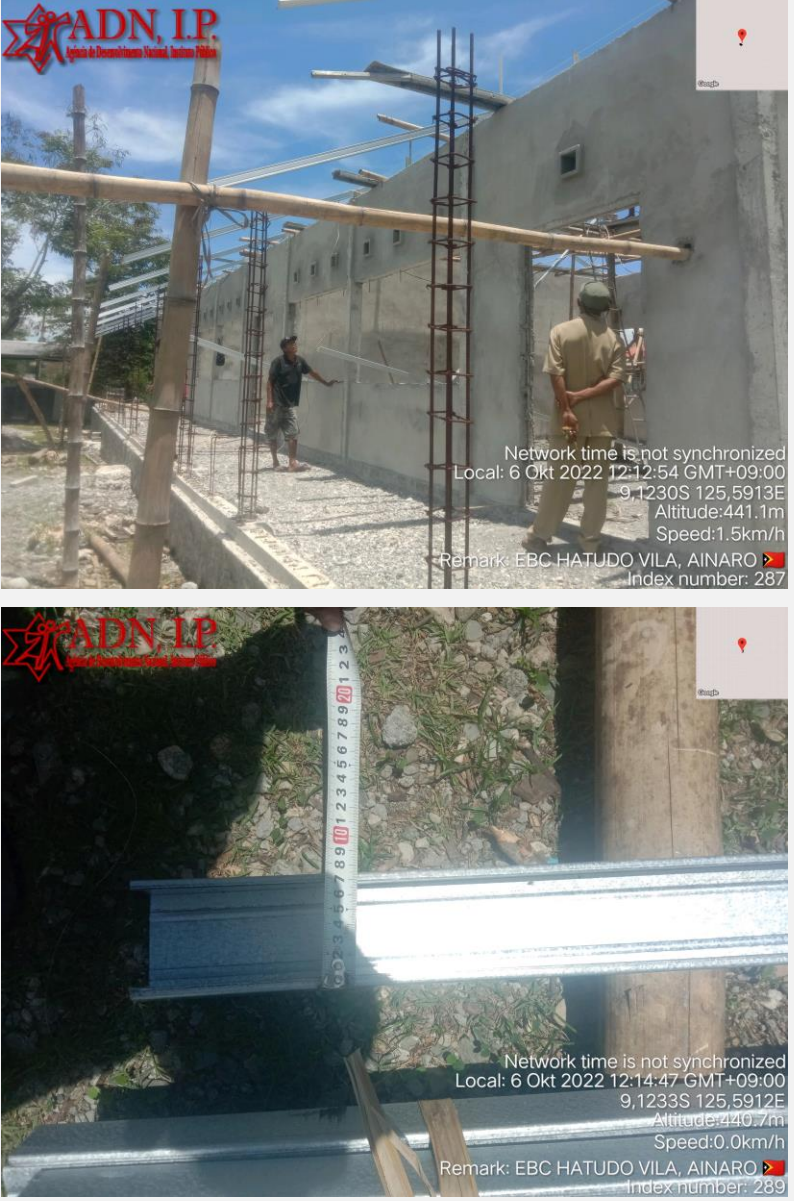Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu GK sei kontinua fila servisu wainhira hetan ona pagamento	 Network time is not synchronized Local: 6 Okt 2022 12:12:54 GMT+09:00 9,1230S 125,5913E Altitude:441.1m Speed:1.5km/h Remark: EBC HATUDO VILA, AINARO Index number: 287 Network time is not synchronized Local: 6 Okt 2022 12:14:47 GMT+09:00 9,1233S 125,5912E Altitude:440.7m Speed:0.0km/h Remark: EBC HATUDO VILA, AINARO Index number: 289



ANEXU- HA - 6

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Sketch & Foto Desenho

GK sei kontinua fila servisu
wainhira hetan ona
pagamento

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU- HA - 6

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de
Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU- HA - 6

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de
Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)





ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainara Posto Administrativo de
Ainara Municipio de Ainara (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Data Inspesaun : 27/10/2022

Fatin Inspesaun : Ainara Vila

Koordinadas :

Start Point : Long 8,9976S Latetude: 125,505,6E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekupa tekniko ADN. IP halo inspeksaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisiko iha tereno.	

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainara Posto Administrativo de
Ainara Municipio de Ainara (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Grupu Komunitade hahu ona
monta gording, no balun
plester moru husi parte liur
nian.



ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainara Posto Administrativo de
Ainara Municipio de Ainara (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Grupu Komunidade hahu ona
monta gording, no balun
plester moru husi parte liur
nian.



ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Sketch & Foto Desenho

Ekipa teknico ADN. IP halo
inspeksaun pagamento 50%
ba projeto Refere.





ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)





ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro

No. kontratu : SSS/295/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 12-10-2022

Fatin Inspesaun : Faulata Casa, Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long : -9227,834. S, Latetude: 125,3035868E

End Point : Long : -953588S Latetude: 125.3147646E

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Torneira publika agora dau-daun diak hela no comunidade uza hela. Projeito instalasaun bee refere atinge ona pagamento ba 100%, e agora dadauk iha hela fase Retensaun ba 10% nian. Fisikamente kondisaun tanki, no instalasaun kanu, torneira sira diak hela, comunidade sira mos uja hela ba nesesidades loron loron nian.	 Network time is not synchronized Local: 28 Jul 2022 16:36:58 GMT+09:00 +9°3'53.25"S 125°31'49.176"E Altitude: 276.9m Remark: Clean Water, Faulata, MNC AINARO Index number: 369



ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa,
Ainaro

No. kontratu : SSS/295/MOPTC-2016

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tanki no Torneira publika agora dau- daun diak hela no comunidade uza hela.	 Network time is not synchronized Local: 28 Jul 2022 17:05:07 GMT+09:00 Remark: Clean Water, Faulata, MNC AINARO Index number: 380  Network time is not synchronized Local: 28 Jul 2022 16:37:13 GMT+09:00 -9°3'53,352"S 125°31'49,152"E Altitude: 279.6m Remark: Clean Water, Faulata, MNC AINARO Index number: 372



ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa,
Ainaro

No. kontratu : SSS/295/MOPTC-2016

Torneira publico nebe comunidade sira
uza ba kuru bee mos no fase ropa agora
daudaun bee mai ho diak.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa,
Ainaro
No. kontratu : SSS/295/MOPTC-2016





ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
No. kontratu : **389/KDM-AINARO/VII/2019**

Data Inspesaun : 12-10-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8°59'47.2"S, Latetude: 125°30'26.8"E.

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : **1. Joaquim de C. Madeira**

: **2. Claudino Soares dos Santos**

Sketch & Foto Desenho

Projeito ida nee fisiko to ona
agora hein Pagamento 100%

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
: **389/KDM-AINARO/VII/2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Parte interior no veranda	



ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
: **389/KDM-AINARO/VII/2019**

Sketch & Foto Desenho

Kontinuasaun hadia item
siara nebee durante parado ne
at hela..

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
No. kontratu : **389/KDM-AINARO/VII/2019**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
: **389/KDM-AINARO/VII/2019**

Sketch & Foto Desenho



Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
: **389/KDM-AINARO/VII/2019**





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
: **389/KDM-AINARO/VII/2019**



ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Data Inspesaun : 12-10-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long : **8.9941S**, Latetude: **125.5010E**

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : **1. Joaquim de C. Madeira**

: **2. Claudino Soares dos Santos**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere nia fisiko final ona maibe nia osan resto seidauk selu hotu ho rajaun sira projeito nain atu altera fali ba halo Baleta no garagem para kareta ho motor.	

ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidaunk
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
: **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidausk
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.

Observasaun iha tereno no Foto



ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
: **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho
Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidauk
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
: **434/KDM-AINARO/IX/2019**



Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi**
No. kontratu : **02/GAB.AM.AIN/VII/2015**

Data Inspesaun : **12-10-2022**

Fatin Inspesaun : Manutasi/ AINARO

Koordinadas :

Start Point : Long : -85852344S Latetude: 125.312712E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : **1. Joaquim de C. Madeira**

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeto refere agora dadauk
kompanha mobiliza hela
material tuan sira nebe mak at
ona, no material konstrusaun
foun nebe mak foin mobliza mai
tereno.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi**
No. kontratu : **02/GAB.AM.AIN/VII/2015**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Konstrusaun sala de Doutor sira nian, posto saude Manutasi, agora dadauk kondisaun parede sira dodok hotu, hetan rekomendasaun husi ekipa Technico AND.IP atu hadia hafoin kontinua ba plaster foun.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi**
No. kontratu : **02/GAB.AM.AIN/VII/2015**

Sketch & Foto Desenho

Companha foin atu kontinua
servisu monta rangka plafon, no
item seluk nebee mak sedauk
halo.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi**
No. kontratu : **02/GAB.AM.AIN/VII/2015**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Konstrusaun sala de Doutor sira
nian, posto saude Manutasi,
agora dadauk kondisaun parede
sira dodok hotu, hetan
rekomendasaun husi ekipa
Technico AND.IP atu hadia
hafoin kontinua ba plaster foun.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi**
: **02/GAB.AM.AIN/VII/2015**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Parte laran nian uma dotor la halo aktividade servisu	 Remark: QUIM MADEIRA Network time is not synchronized Local: 24 Agt 2021 11:22:07 GMT+09:00



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi
: 02/GAB.AM.AIN/VII/2015

	 -8°58'53,346"S 125°31'2,13"E 96° E Altitude: 968.8m Speed: 3.1km/h Remark: Engineer. Joaquin Madeira Index number: 510 Network time is not synchronized Local: 26 Jan 2022 13:26:21 GMT+09:00
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu 	



Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi**
: **02/GAB.AM.AIN/VII/2015**

--	--

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu 	



Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi**
: **02/GAB.AM.AIN/VII/2015**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU- HA - 36

Back-up Data

Naran Projeto : Projeitu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021

Data Inspesaun : 06-10-2022

Fatin Inspesaun : Hato-udo Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :9,1246S, Latetude: 125,6119E.

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekupa ADN.IP halo inspesaun ba progresso fisiko ih tereno, hodi kontrola kualidade de implementasaun husi kompanha, no observa progresso fisiku iha tereno	 Network: 6 Okt 2022 11:00:30 GMT+09:00 Local: 6 Okt 2022 11:00:30 GMT+09:00 9,1248S 125,6117E Jalan Tanpa Nama Timor-Leste Altitude:351.6m Speed:0.0km/h Remark: ESCOLA TECNICA VOCACIONAL, ESTV HATUDO VILA Index number: 207



ANEXU- HA - 36

Back-up Data

Naran Projeto : Projektu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekupa ADN.IP halo inspesaun ba progresso fisiko iha tereno, hodi kontrola kualidade de implementasaun husi kompanha, no observa progresso fisiku iha tereno Classroom C1 & C2 (2 unit) .	 

ANEXU- HA - 36

Back-up Data

Naran Projeto : Projektu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho

Ekipa ADN.IP halo
inspesaun ba progresso fisico
ih tereno, hodi kontrola
kualidade de implementasaun
husi kompanha, no observa
progresso fisiku iha tereno

Laboratory room

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU- HA - 36

Back-up Data

Naran Projeto
Nu. Contract

: Projektu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
: NCB:02/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho

Ekipa ADN.IP halo
inspesaun ba progresso fisico
ih tereno, hodi kontrola
kualidade de implementasaun
husi kompanha, no observa
progresso fisiku iha tereno

Teacher room

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU- HA - 36

Back-up Data

Naran Projeto
Nu. Contract

: Projeitu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
: NCB:02/MEJD/DNA/2021





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU- HA - 36

Back-up Data

Naran Projeto
Nu. Contract

: Projeitu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
: NCB:02/MEJD/DNA/2021





ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Data Inspesaun : 27/10/2022

Fatin Inspesaun : Bermoli/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long -84834'638''S; Latetude: 125'39'26.238' E

End Point : Long : -84834'638''S, Latetude: 125'39'26.238' E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Ekpa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba progresso fisico iha tereno, hodi kontrola qualidade de implementasaun husi GK.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Sketch & Foto Desenho

Ekipa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba progresso fisico iha tereno, hodi kontrola qualidade de implementasaun husi GK.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Sketch & Foto Desenho

Ekupa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba progresso fisico iha tereno, hodi kontrola qualidade de implementasaun husi GK.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual






ANEXU# MBS-21#


Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI




Sketch & Foto Desenho



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidauk
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.

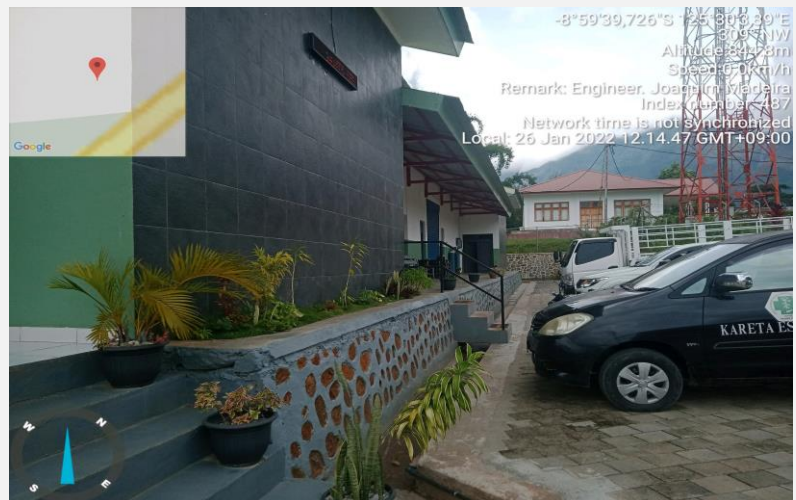



ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidauk
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.



Observasaun iha tereno no Foto





ANEXU# MBS-21#


Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Sketch & Foto Desenho
Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidauk
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.

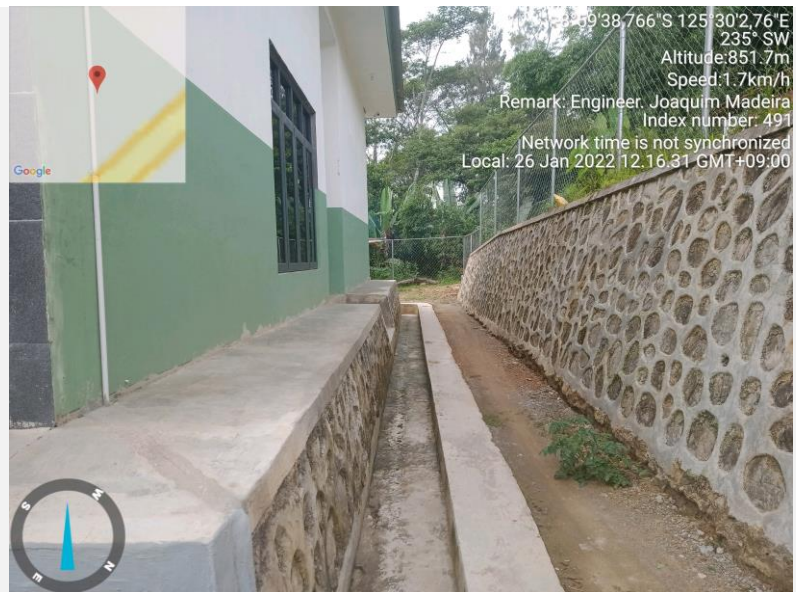



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

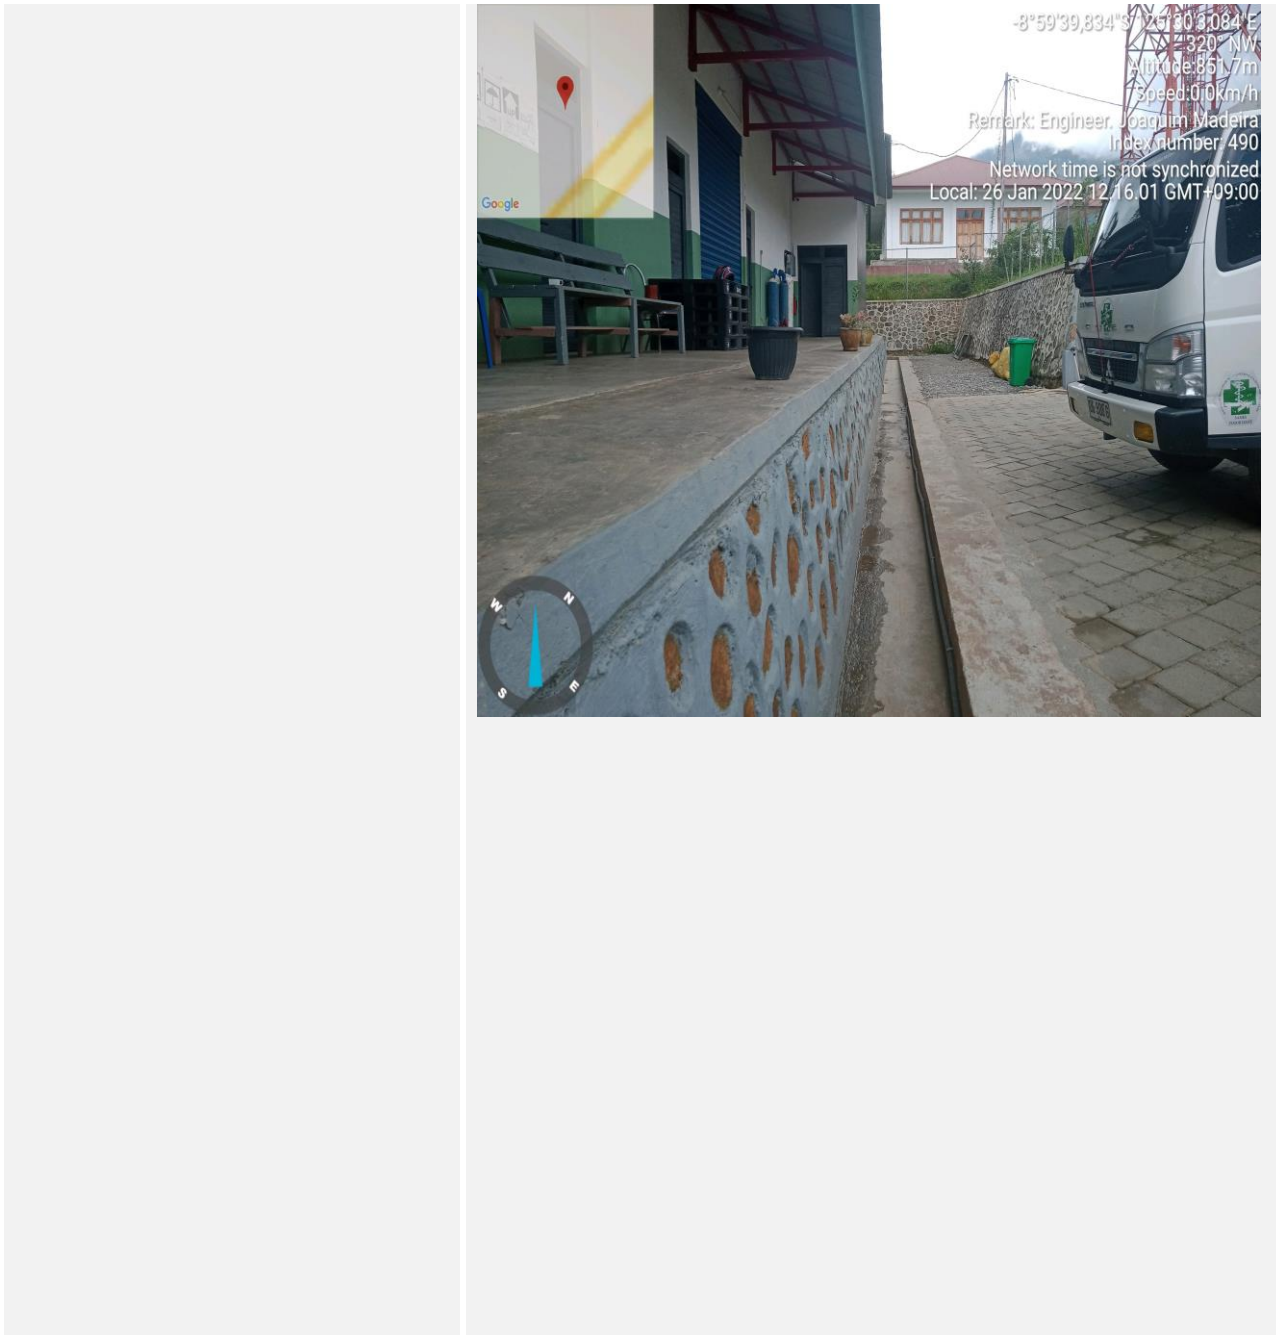



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI



ANEXU C1 (MBS-14)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Maubisse.**
No. kontratu : **391/KDM-AINARO/VII/2019**

Data Inspesaun : **23-10-2022**

Fatin Inspesaun : Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8.834443** Latetude: **125.598862**

End Point : Long : , Latetude:

Naran Inspector : **1. Joaquim de C.Madeira**

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere fisiko
final ona e selu tiha
98.97%, e hein deit
halo pagamento
kompleto ba 100%
nian. Maibe ate agora
kompanhia la Submete
dokumentus (Laiha
informasaun ate agora)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (MBS-14)

Back-up Data


Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Maubisse.**
: **391/KDM-AINARO/VII/2019**

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere fisiko
Final ona maibe ate
agora companhia
sedauk submete pedido
pagamento 100%)

Observasaun iha tereno no Foto Aktua

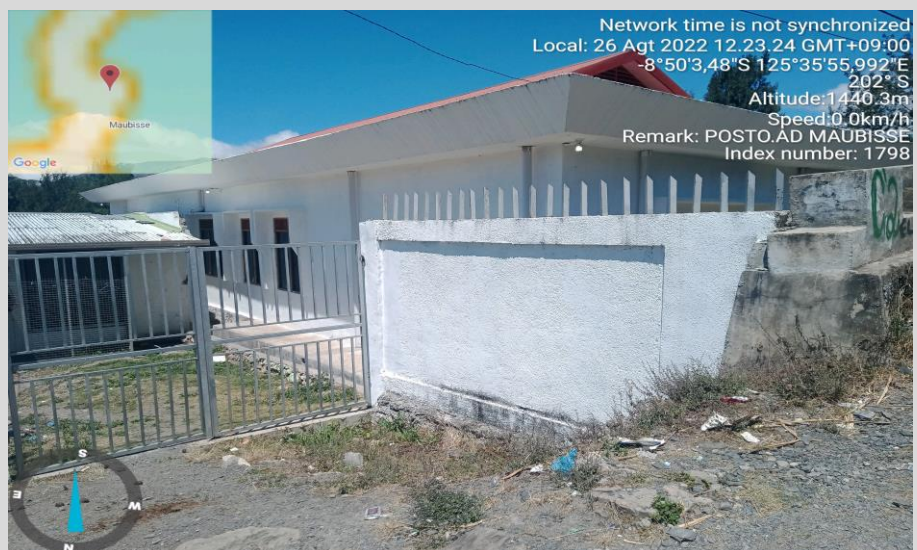



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Maubisse.**
: **391/KDM-AINARO/VII/2019**

Haris Fatin

**Kondisaun diak hotu
hela e bee mos mai
hela ho diak.**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse.**
: **391/KDM-AINARO/VII/2019**





ANEXU C1 (MBS-14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Maubisse.**
: **391/KDM-AINARO/VII/2019**




ANEXU C1 (MBS-14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse.**
: **391/KDM-AINARO/VII/2019**





#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.

No. kontratu : SSS/287/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 23-10-2022

Fatin Inspesaun : Manulobas

Koordinadas :

Start Point : Long :- 84961042S, Latetude: 125.3996632E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Bee matan nebe dada bee mos
ba comunidade sira iha suku
mane loba, kondisaun bee
matan iha neba bee boot no
diak. (pagamento 100%.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.

No. kontratu : SSS/287/MOPTC-2016

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu BEE MATAN.	 Network: 11 Okt 2021 14:36:40 GMT+09:00 Local: 11 Okt 2021 14:36:41 GMT+09:00 -8°49'51.414"S 125°39'55.572"E Altitude: 1257.5m Speed: 0.0km/h Remark: Quim Madeira -8°50'49.53"S 125°40'43.494"E 154° SE Altitude: 1257.5m Speed: 0.0km/h Remark: Engineer, Joaquim Madeira Index number: 840 Network time is not synchronized Local: 23 Mar 2022 13:54:17 GMT+09:00



#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.

No. kontratu : SSS/287/MOPTC-2016

Sketch & Foto Desenho

Instalasaun kanu 2" x 6 M
Kanu refere ho kondisaun diak
hela.

Lutu haleu tanki

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.

No. kontratu : SSS/287/MOPTC-2016

Sketch Item servisu

Rino tank ou tanki reserbatori

Kondisaun diak hela.







#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.

No. kontratu : SSS/287/MOPTC-2016





#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.

No. kontratu : SSS/287/MOPTC-2016

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Instalasaun kanu 2" x 6 M
Kanu refere ho kondisaun diak
hela.



Tanki resevatori nebe distribui
bee ba comunidade sira
kondisaun diak hela no uza
hela.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.**

No. kontratu : **SSS/287/MOPTC-2016**





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.**

No. kontratu : **SSS/287/MOPTC-2016**





ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ICU Room Maubesse.**
No. kontratu : **NCB/087/MOPTC-2016**

Data Inspesaun : **23/10/2022**

Fatin Inspesaun : Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : -8501296S, Latetude: 1253557546E,

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : **1. Joaquim de C. Madeira**

: **2. Claudino Soares dos Santos**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Parte oin

Projeito refere atinji ona
100%, Kompanhia agora
hatama ona relatotio ba iha
dono projeito.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ICU Room Maubesse.**
: **NCB/087/MOPTC-2016**

Sketch & Foto Desenho

Parte interior sala ICU.





ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ICU Room Maubesse.**
: **NCB/087/MOPTC-2016**

Parte soring kuana no karuk





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun ICU Room Maubesse.
: NCB/087/MOPTC-2016

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ICU Room Maubesse.**
: **NCB/087/MOPTC-2016**

	 Network time is not synchronized Local: 26 Agt 2022 12.37.10 GMT+09:00 -8°50'0,384"S 125°35'57,474"E 210° SW Altitude: 1443.8m Speed: 0.0km/h Remark: SALA ICU MAUBISSE Index number: 1806
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ICU Room Maubesse.**
: **NCB/087/MOPTC-2016**

--	--



ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ICU Room Maubesse.**
: **NCB/087/MOPTC-2016**

--	--



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ICU Room Maubesse.**
: **NCB/087/MOPTC-2016**



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun ICU Room Maubesse.
: NCB/087/MOPTC-2016

Sketch Item servisu

Servisu halo cor ou fui
kanofi mos hotu ona agora
preparasaun ba reboka liur
no laran.



Network time is not synchronized
Local: 28 Sep 2021 14:05:14 GMT+09:00
-8°50'0,354"S 125°35'57,486"E
238° SW
Altitude: 1456.3m
Speed: 0.0km/h
Remark: Quim Madeira



Network time is not synchronized
Local: 29 Sep 2021 16:43:29 GMT+09:00
-8°50'45,625"S 125°35'46,994"E
226° SW
Remark: Quim Madeira




ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ICU Room Maubesse.**
: **NCB/087/MOPTC-2016**





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ICU Room Maubesse.**
: **NCB/087/MOPTC-2016**





ANEXU

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL MANETU/ POSTO
MAUBESSI , MUNICIPIO AINARO

Data Inspesaun : 23-10-2022

Fatin Inspesaun : Manetu/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long :, Latetude:

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere iha fulan marsu nia laran la bizita tamba udan halo rai dodok no koes e Estrada aat.	Sketch & Foto Desenho 



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL MANETU/ POSTO
MAUBESSI , MUNICIPIO AINARO





ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Data Inspesaun : 13/10/2022

Fatin Inspesaun : Rileco / Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long :, 8,8341S Latetude: End 125,5842E

Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Inspesaun ba Pedido Pagamento 50% nian iha tereno. Hodi hein processo pagamento.	 Network: 13 Sep 2022 13:04:40 GMT+09:00 Local: 13 Sep 2022 13:04:38 GMT+09:00 8,8341S 125,5842E Altitude: 1597.0m Speed: 1.8km/h Remark: EBF RILECO MAUBISSE, AINARO Index number: 40



ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Sketch & Foto Desenho

Inspesaun ba Pedido Pagamento
50% nian iha tereno. Hodi hein
processo pagamento.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Inspesaun ba Pedido Pagamento
50% nian iha tereno. Hodi hein
processo pagamento.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Network: 13 Sep 2022 13:06:49 GMT+09:00
Local: 13 Sep 2022 13:06:47 GMT+09:00
8,8341S 125,5844E
Timor-Leste
Altitude: 1601.0m
Speed: 0.0km/h
Remark: EBF RILECO MAUBISSE, AINARO
Index number: 64



Network: 13 Sep 2022 13:05:27 GMT+09:00
Local: 13 Sep 2022 13:05:25 GMT+09:00
8,8341S 125,5844E
Altitude: 1599.4m
Speed: 1.6km/h
Remark: EBF RILECO MAUBISSE, AINARO
Index number: 49



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Sketch & Foto Desenho

Inspesaun ba Pedido Pagamento
50% nian iha tereno. Hodi hein
processo pagamento.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

GK hateten, wainhira hetan ona
pagamento 50% foin hahu fila
fali servisu, tamba ne
provisoriamente projeto refere la
lao.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO





ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Observasaun iha tereno no Foto



ANEXU C1 (ANV-27)

Back-up Data

Naran Projeto : NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19, AT
SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE

Data Inspesaun : 12-10-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8°59'47.2"S, Latetude: 125°30'26.8"E.

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Parte Oin Edifício Laboratorium Hospital Ainaro Projeto refere hotu, falta deit orsamento kontingency mak sedauk executa hotu. Maibe realmente fisiko iha terreno hotu ona, e kompanha mos submete ona pedidu pagamentu ba Dono de Projeto.	 -8°59'40,309"S 125°30'25,922"E Ainaro Remark: Eng. ADN.IP MUNICIPIO AINARO Index number: 36 Network: 14 Jul 2022 11:36:03 GMT+09:00 Local: 14 Jul 2022 11:36:07 GMT+09:00

ANEXU C1 (ANV-27)

Back-up Data

Naran Projeto : NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19,AT
SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Parte Interior Laboratory
Hospital Ainaro.





ANEXU C1 (ANV-27)

Back-up Data

Naran Projeto : NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19, AT
SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Parte Soin, no Kotuk Laboratory Hospital Ainaro.	



ANEXU C1 (ANV-27)

Back-up Data

Naran Projeto : NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19, AT
SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-27)

Back-up Data

Naran Projeto : NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19, AT
SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-27)

Back-up Data

Naran Projeto : NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19, AT
SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE





ANEXU-MBS-11#

Back-up Data

Naran Projeto

NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA FILIAL MAUBISSE SUCO
MANELOBAS, MUNICIPIO AINARO

Data Inspesaun : 16/10/2022

Fatin Inspesaun : Mane lobas/ Maubesi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeto refere bloko hada hotu ona, e agora dadauk foin cor sloft leten.	Sketch & Foto Desenho 



ANEXU-MBS-11#

Back-up Data

Naran Projeto

NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA FILIAL MAUBISSE SUCO
MANELOBAS, MUNICIPIO AINARO

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere bloko hada hotu ona, e
agora dadauk foin cor sloft leten.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU-MBS-11#

Back-up Data

Naran Projeto

NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA FILIAL MAUBISSE SUCO
MANELOBAS, MUNICIPIO AINARO

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere bloko hada hotu ona, e
agora dadauk foin cor sloft leten.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU-MBS-11#

Back-up Data

Naran Projeto

NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA FILIAL MAUBISSE SUCO
MANELOBAS, MUNICIPIO AINARO

Servisu Hada pondasi 1: 4 tuir desenho ho b
of q nebe iha



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU-MBS-11#

Back-up Data

Naran Projeto

NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA FILIAL MAUBISSE SUCO
MANELOBAS, MUNICIPIO AINARO





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU-MBS-11#

Back-up Data

Naran Projeto

NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA FILIAL MAUBISSE SUCO
MANELOBAS, MUNICIPIO AINARO





ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Data Inspesaun : 12-10-2022

Fatin Inspesaun : Ernaro

Koordinadas :

Start Point : Long : -8'55'45 S Latetude: 125'34''39,546 E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Equipa tecnico ADN.IP municipio Ainaro, halo inspeksaun ba ba progresso fisiku iha tereno, atinge on aba steel roof/kuda-kuda, bas ala de aulas no toilet.	

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Sketch & Foto Desenho

Equipa tecnico ADN.IP
municipio Ainaro, halo
inspeksaun ba ba progresso
fisiku iha tereno, atinge on aba
steel roof/kuda-kuda, bas ala de
aulas no toilet.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Sketch & Foto Desenho

Equipa tecnico ADN.IP
municipio Ainaro, halo
inspeksaun ba ba progresso
fisiku iha tereno, atinge on aba
steel roof/kuda-kuda, bas ala de
aulas no toilet.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto
Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto



ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto
Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Sketch & Foto Desenho Sketch Item servisu	Observasaun iha tereno no Foto
---	---------------------------------------



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto
Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)





#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Data Inspesaun : 03/10/2022

Fatin Inspesaun : Lumluli/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long -8°47'1,122 S; Latetude: 125°41'11'238"E

End Point : Long : -8°47'1,122 S, Latetude: 125°41'11'238"E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa tekniku ADN.IP halo inspesaun iha tereno, ADN. IP observa GK halao hela servisu ba fui sinta leten, no monta batako ba haris fatin.	 Remark: Novo Konstrusaun: Servisu actual EBF LUMLULI AINARO Network: 3 Okt 2022 11:14:39 GMT+09:00 Local: 3 Okt 2022 11:14:37 GMT+09:00

#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Sketch & Foto Desenho

Ekpa tekniku ADN.IP halo
inspesaun iha tereno, ADN. IP
observa GK halao hela servisu ba
fui sinta leten, no monta batako
ba haris fatin.

Observasaun uha tereno no foto aktual



#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Sketch & Foto Desenho

Ekpa tekniku ADN.IP halo
inspesaun iha tereno, ADN. IP
observa GK halao hela servisu ba
fui sinta leten, no monta batako
ba haris fatin.

Observasaun uha tereno no foto aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI



Observasaun uha tereno no foto aktual

Observasaun uha tereno no foto aktual



#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu refere monta caixa para
atu prepara ba fui betaun sinta
okos nian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Observasaun iha tereno no Foto





#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu kee rai kuak pusu nian
ou septik tanck.

Servisu refere monta kaixa para
atu prepara ba fui betaun sinta
okos nian.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu





ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Data Inspesaun : 6-10-2022-27-10-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :S, Latetude:E.

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Companha monta Bikesting ba landscaping remata ona, hein preparasaun ba cor slotf okos.	



ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Companha monta Biking
ba landscaping remata ona,
hein preparasaun ba cor slotf
okos.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Companha monta Biking
ba landscaping remata ona,
hein preparasaun ba cor slotf
okos.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Projeto MSSI, bloko hada
hotu ona, agora companha,
bessi beton ba slotf leten mos
monta hotu, kompanha
preparasaun hela monta
Kaixa ba sloft leten ho
medida 0.25 m x 0.30 m

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

	 Network time is not synchronized Local: 25 Agt 2022 13:08:16 GMT+09:00 -8°59'55,818"S 125°30'21,162"E 322° NW Altitude:807.4m Speed:0.0km/h Remark: MSS. AINARO Index number: 1773 Network time is not synchronized Local: 25 Agt 2022 13:26:56 GMT+09:00 -8°59'56,106"S 125°30'21,072"E 84° E Altitude:802.5m Speed:0.0km/h Remark: MSS. AINARO Index number: 1786
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch Item servisu



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Companha kontinua hada
batako, ba edifisiu MSS.



Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro





ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainara Posto Administrativo de
Ainara Municipio de Ainara (EBF LIAS)

Data Inspesaun : 06/10/2022

Fatin Inspesaun : Ainara Vila

Koordinadas :

Start Point : -9°6'42,882°S Latetude: 125 °32'2.67"E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

Ekpa teknico ADN. IP halo
inspesaun iha tereno, hodi
kontrola progresso fisico iha
tereno, fo orientasaun ba GK
atu mantein Qualidade.

Batako ba 3 sala de Aulas
nee remata ona, sopi sopi
mos remata ona.

.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Network: 6 Okt 2022 13:26:29 GMT+09:00
Local: 6 Okt 2022 13:26:30 GMT+09:00
9,1118S 125,5341E
Timor-Leste
Altitude: 179.2m
Speed: 4.2km/h
Remark: EBF LIAS AINARA VILA, AINARA
Index number: 307

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekiba tekniko ADN. IP halo
inspesaun iha tereno, hodi
kontrola progresso fisico iha
tereno, fo orientasaun ba GK
atu mantein Qualidade.
Batako ba 3 sala de Aulas
nee remata ona, sopi sopi
mos remata ona.



ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainara Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekiba tekniko ADN. IP halo
inspesaun iha tereno, hodi
kontrola progresso fisico iha
tereno, fo orientasaun ba GK
atu mantein Qualidade.
Batako ba 3 sala de Aulas
nee remata ona, sopi sopi
mos remata ona.





ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainara Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainara Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)





Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 -
6+000, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/007/MOP-2021

Data Inspesaun : 19/10/2022

Fatin Inspesaun : Foho Ailiko - Bobe

Koordinadas :


Start Point : Long : - 9°10'38.3 Latetude: 125°6'40.8

Naran Inspector : 1. Manuel Bany
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Inspeksaun Pagamento ba IPC II

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

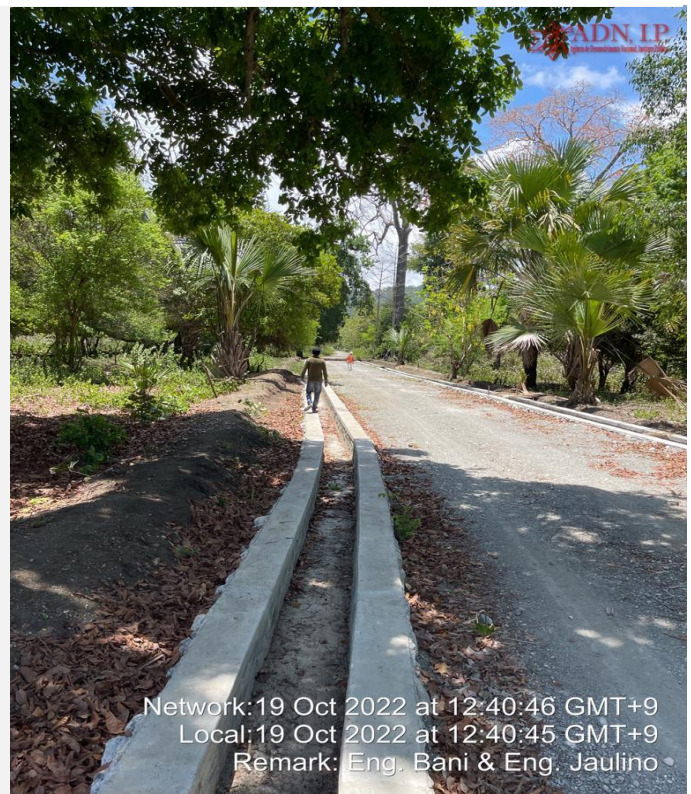


Network: 19 Oct 2022 at 12:40:46 GMT+9
Local: 19 Oct 2022 at 12:40:45 GMT+9
Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino



Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 -
6+000, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/007/MOP-2021

Inspeksaun Pagamento ba IPC II

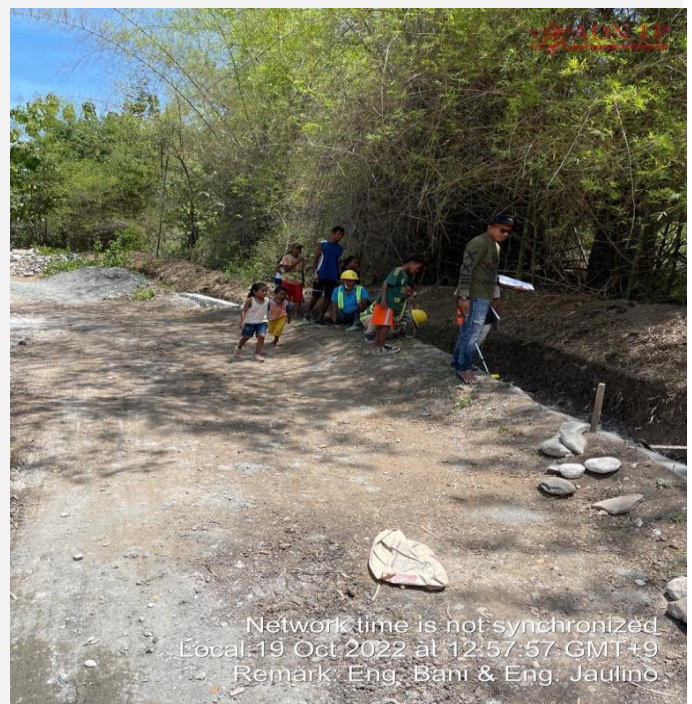



Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 -
6+000, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/007/MOP-2021

Sketch & Foto Desenho

Inspeksaun Pagamento ba IPC II

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (ANV-4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai**
Municipality Ainaro

No. kontratu : **RDTL**

Data Inspesaun : **19/10/2022**

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'15,612''S Latetude: 125°30'39,876''E

End Point : Long : - 9°3'51,231''S Latetude: 125°30'37,065''E


Naran Inspector : **1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho**

: **2. Jaulino H. Rodrigues**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico Marker Post

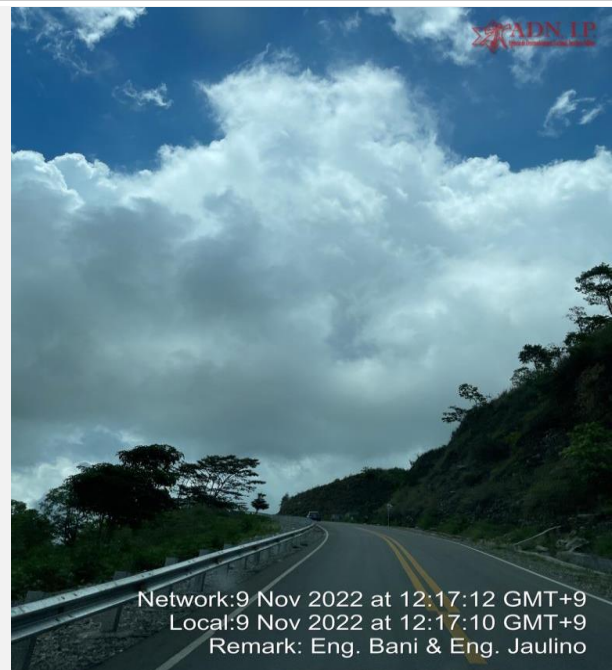



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai
Municipality Ainaro
No. kontratu : RDTL

Service Marker Post

Kondisaun Estrada Sarai – Ainaro Vila



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Service Marker Post





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai
Municipality Ainaro
No. kontratu : RDTL



ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.
No. kontratu : SSS/142/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 19/10/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'15,612''S Latetude: 125°30'39,876''E

End Point : Long : - 9°3'51,231''S Latetude: 125°30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Servico Refere parado hela

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.
: SSS/142/MOPTC-2017

Servico Refere parado hela



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico Refere parado hela





Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/008/MOP-2021

Data Inspesaun : 19/10/2022

Fatin Inspesaun : Foho Ailico - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°10'38.3 Latetude: 125°6'40.08

Naran Inspector : 1. Manuel Bany
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Halo Inspeksaun ba Pagamento

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Network: 19 Oct 2022 at 10:24:32 GMT+9
Local: 19 Oct 2022 at 10:24:23 GMT+9
Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/008/MOP-2021

Halo Inspeksaun ba Pagamento



Network: 19 Oct 2022 at 10:28:48 GMT+9
Local: 19 Oct 2022 at 10:28:45 GMT+9
Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino

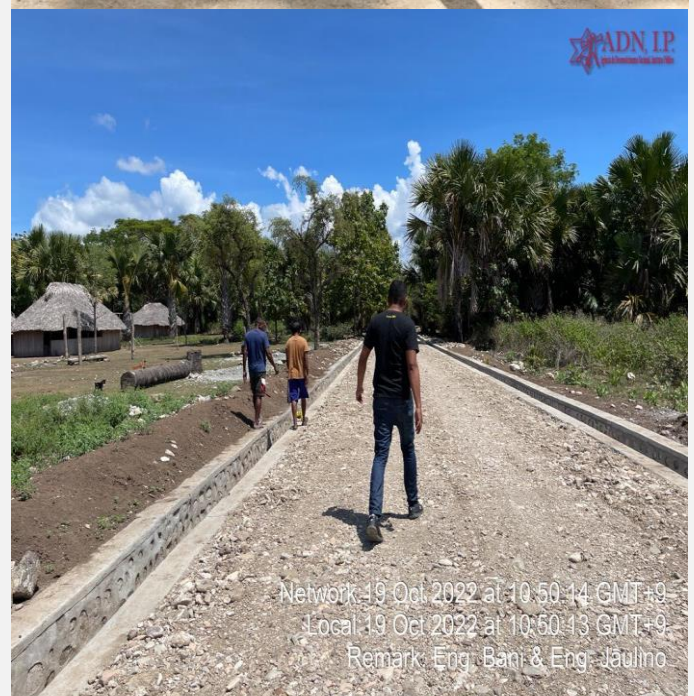

Network: 19 Oct 2022 at 10:50:14 GMT+9
Local: 19 Oct 2022 at 10:50:13 GMT+9
Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino



Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/008/MOP-2021

Sketch & Foto Desenho

Halo Inspeksaun ba Pagamento

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (ANV-19)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro-Maununu & Mau Ulu Lau
No. kontratu : MPW-190082

Data Inspesaun : 20/10/2022

Fatin Inspesaun : Mau Nunu – Mau Ulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -9°0'17,574''S Latetude: 125°29'48,294''E

End Point : Long : -9°0'48,138''S Latetude: 125°28'39,018''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S. C. de Carvalho
: Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Servico Laiha iha Tereno

Observasaun iha tereno





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro-Maununu & Mau Ulu Lau
: MPW-190082

Servico Laiha iha Tereno



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno

Servico Laiha iha Tereno





ANEXU C1 (MBS-2)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality.

No. kontratu : RT/021/MOP-2019

Data Inspesaun : 20/10/2022

Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'4,044''S, Latetude: 125°35'48,432''E

End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projeto refere parado hela	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-2)

Back-up Data


Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 -
6+400 Ainaro Municipality.
No. kontratu : RT/021/MOP-2019

Projeito refere parado hela



Sketch & Foto Desenho

Projeito refere parado hela

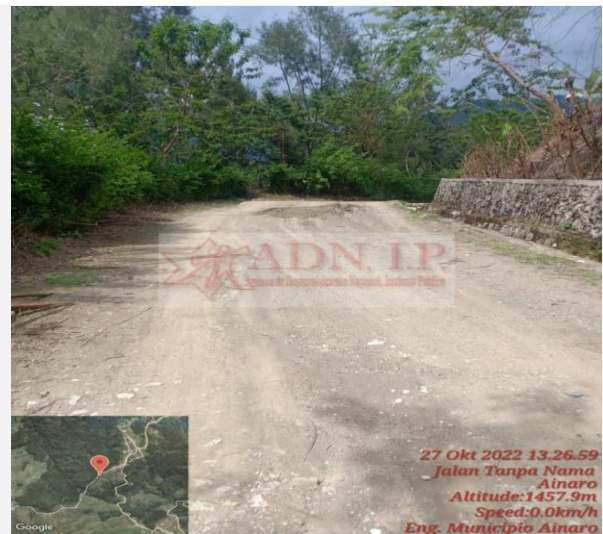



ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos
Herois Municipality Ainaro.

No. kontratu : 35/MACLNSEACLN/X/2019

Data Inspesaun : 20/10/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'59,904''S Latetude: 125°30'12,588''E

End Point : Long : - 9°1'59,496''S Latetude: 125°30'10,206''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho

:2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Kompanha Hahu atu servico fali iha Terenu	



ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos
Herois Municipality Ainaro.

No. kontratu : 35/MACLNSEACLN/X/2019

**Kompanha Hahu atu servico fali iha
Terenu**



Kondisaun iha Tereno

**Kompanha Hahu atu servico fali iha
Terenu**





ANEXU C1 (ANV-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 -
5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190082

Data Inspesaun : 20/10/2022

Fatin Inspesaun : Mau Nunu – Mau Ulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -9°0'17,574''S Latetude: 125°29'48,294''E


End Point : Long : -9°0'48,138''S Latetude: 125°28'39,018''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S. C. de Carvalho
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

**Manutensaun (Hamos Duut) husi Maulo –
Mau Nunu atizi ona 100% iha ful;an
agostus 2021**

Observasaun iha tereno

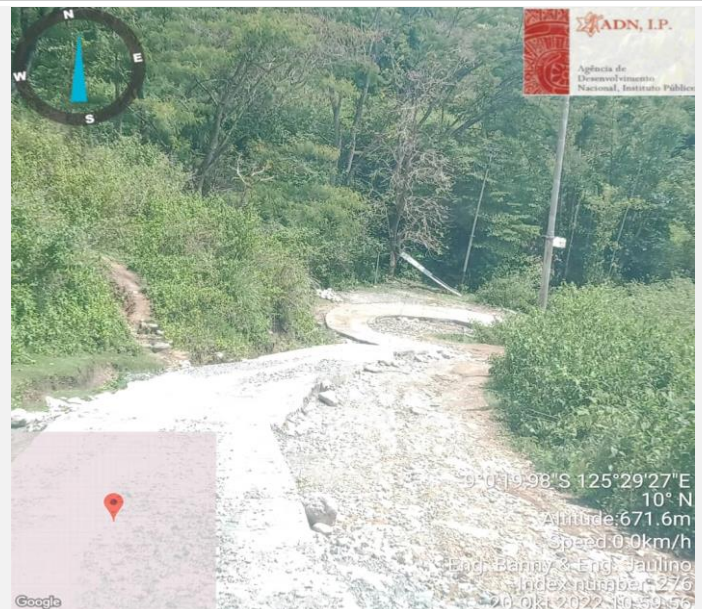

Kondisaun Manutensaun Obra nebe kaer husi



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 -
5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190082

**Manutensaun (Hamos Duut) husi Maulo –
Mau Nunu atizi ona 100%**

Sketch & Foto Desenho



Observasaun iha tereno



ANEXU C1 (ANV-22)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro.**

No. kontratu : **NCB/087/MOPTC-2016**

Data Inspesaun : **20/10/2022**

Fatin Inspesaun : Mau Lo – Mau Nunu

Koordinadas :

Start Point : Long : -9°2'45,223''S Latetude: 125°31'17,356 ''E

End Point : Long : -9°0'59,325''S, Latetude: 125°29'12,324''E

Naran Inspector : **1. Manuel Bany da S.C de Carvalho**

: **2. Jaulino H. Rodrigues**

Sketch & Foto Desenho

Compahia halo hela servisu Plum Concrete

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-22)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro.**
No. kontratu : **NCB/087/MOPTC-2016**

Compahia halo hela servisu Plum Concrete



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Compahia halo hela servisu Plum Concrete





Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Electrical Tower (No.55) Protection wall - Section
Betano Casa Ainaro.

No. kontratu : NCB/030/MOP-2020

Data Inspesaun : 20/10/2022

Fatin Inspesaun : Cassa

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°21.914 Latetude: 125°3234.949

Naran Inspector : 1. Manuel Bany

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

**Companhia sei halo Pemasangan
penulangan.**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section
Betano Casa Ainaro.
No. kontratu : NCB/030/MOP-2020

Pemasangan Penulangan ho Bekisting



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Pemasangan Penulangan ho Bekisting





ANEXU C1 (HA-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02), Casa - Hatu -
udo (A13).

No. kontratu : Marino Enterprises, Lda

Data Inspesaun : 20/10/2022

Fatin Inspesaun : Casa – Hatu Udo

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°8'13,374''S, Latetude: 125°32'36,181''E

End Point : Long : - 9°6'3,84''S, Latetude: 125°40'54,588''E

Naran Inspector : 1. Eng. Manuel Bany da S.C de Carvalho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
Companhia sedauk halo servisu iha tereno

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Kondisaun Estrada nebe Parado



ANEXU C1 (HA-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02), Casa - Hatu -
udo (A13).

No. kontratu : Marino Enterprises, Lda

Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
Companhia sedauk halo servisu iha tereno



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
Companhia sedauk halo servisu iha tereno





ANEXU C1 (MBS-1)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality.

No. kontratu : RT/021/MOP-2019

Data Inspesaun : 20/10/2022

Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'4,044''S, Latetude: 125°35'48,432''E

End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado



27 Okt 2022 13.31.16
Jalan Tanpa Nama
Ainaro
Altitude: 1503.0m
Speed: 0.0km/h
Eng. Municipio Ainaro



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-1)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 -
6+400 Ainaro Municipality.
No. kontratu : RT/021/MOP-2019

Projetu refere sei parado



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado





ANEXU C1 (MBS-16) Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality.
No. kontratu : MPW-W-210065

Data Inspesaun : 20/10/2022

Fatin Inspesaun : Lesuati Mausiga

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da Silva Cristovao de Carvalho
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico iha tereno sei parado hela





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-16) Back-up Data

Naran Projeto

: Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 -
5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality.

No. kontratu

: MPW-W-210065

Service iha tereno sei parado hela





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-16) Back-up Data

Naran Projeto

: Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 -
5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality.

No. kontratu

: MPW-W-210065

Service iha tereno sei parado hela





ANEXU C1 (HTB-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190091

Data Inspesaun : 21/10/2022

Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°49'55,188''S Latetude: 125°32'30,108''E

End Point : Long : -8°51'9,42''S Latetude: 125°32'14,91''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho
2. Jaulino H. Rodrigues

Service Gabion hotu ona






ANEXU C1 (HTB-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190091

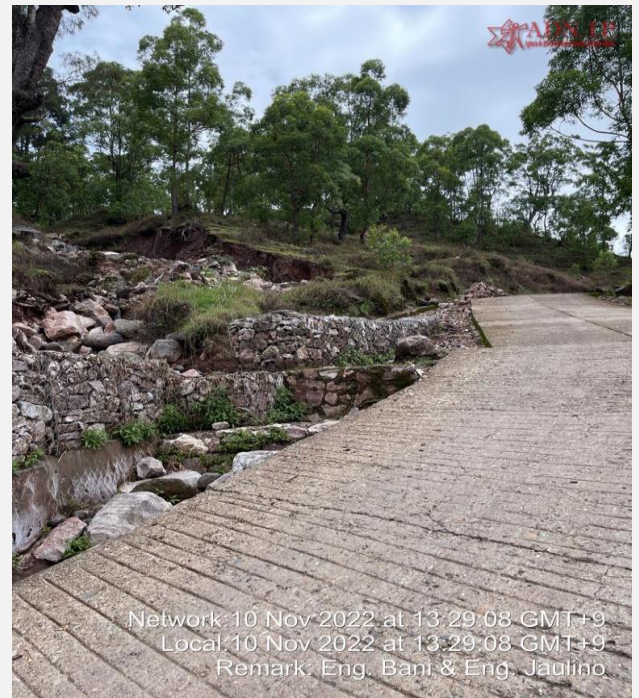

Service Gabion hotu ona





ANEXU C1 (HTB-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190104

Data Inspesaun : 21/10/2022

Fatin Inspesaun : Maubisse - Liurai

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'15,906''S Latetude: 125°35'56,839''E

End Point : Long : -8°51'9,714''S Latetude: 125°35'2,79''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico Sei Refere Parado hela





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190104

Servico Refere Sei Parado hela

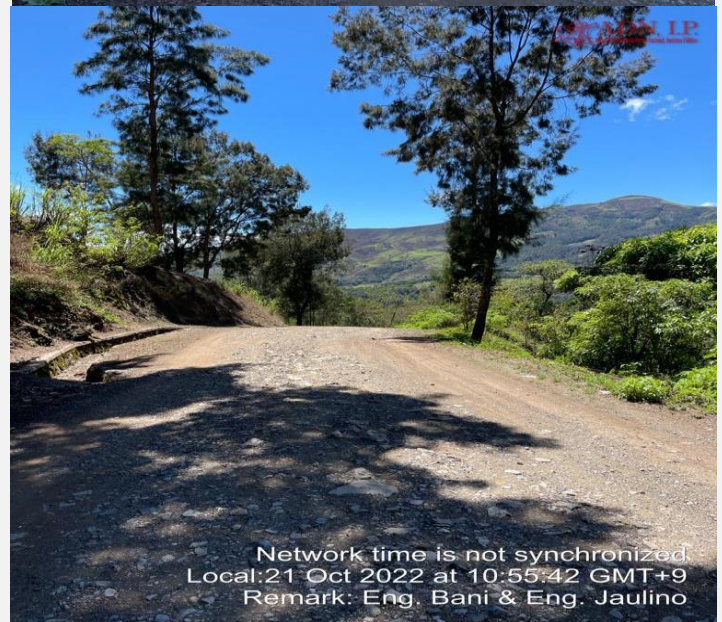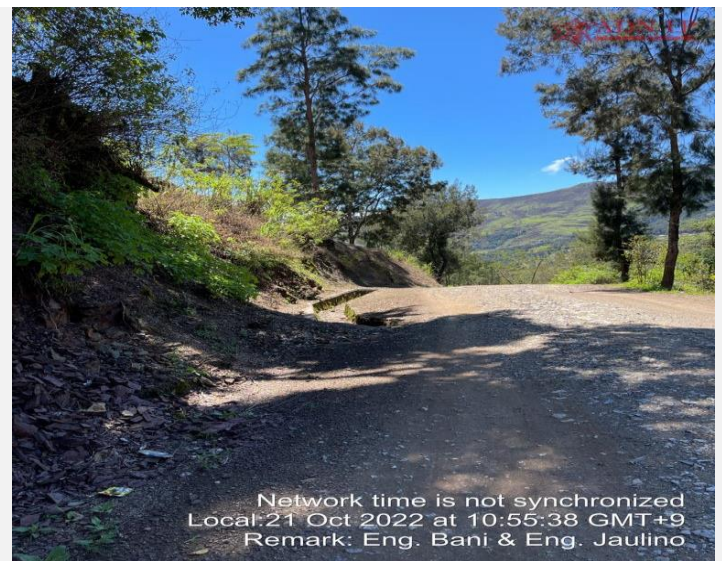



ANEXU C1 (ANV-8)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy**

No. kontratu : **SSS/098/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : **20/10/2022**

Fatin Inspesaun : Ainaro - Bobonaro

Koordinadas :

Start Point : Long : 8°59'3,108 S Latetude: 125°29'48,432 E

End Point : Long : 8°59'24,714 S Latetude: 125°27'42,42 E

Naran Inspector : **1. Manuel Bany da S. C de Carvalho**

: **2. Jaulino H. Rodrigues**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Compahia Halao hela servisu Gravel iha tereno



Kondisaun Estrada Ainaro Vila – Bobonaro



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


ANEXU C1 (ANV-8)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality**

No. kontratu : **SSS/098/MOPTC-2017**

Compahia Halao hela servisu Gravel iha tereno

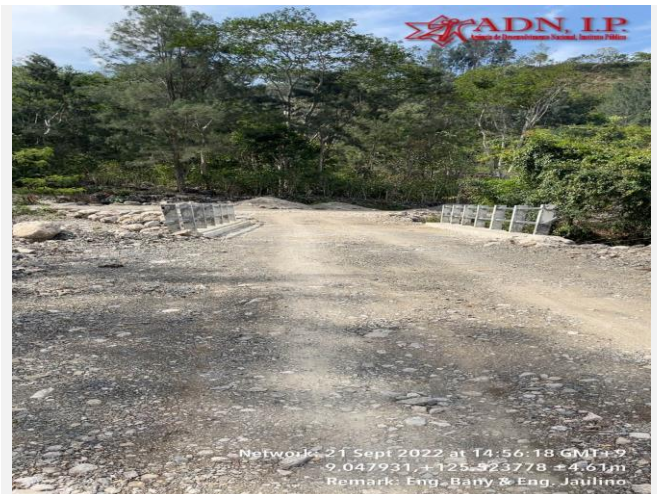

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

2022

[illegible]

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																	
Naran Eng.	Joaquim de C. Madeira						2022																																	
	Claudino Soares dos Santos																																							
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Oktober																															OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MAUBISSE (MBS)	3	Konstrusaun ICU Room Maubesse	El Constructio Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																	
	4	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet, Cuzina no Armagem no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (BERMOLI MAULAU)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
	5	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Lumluli)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
	6	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manelobas Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Maneloba)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
	7	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Russulau)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
	8	Construção de Salas de Aulas 6 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Manetu)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
	9	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Rileco Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
	10	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Aituto Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Betulala)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
TOTAL PROJETO ON-GOING																																								

Note:

	Planu Periode inspesaun iha terenu		Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu		Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili		Inspesaun Proceso Pagamentu
---	------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	---	-----------------------------

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira) & (Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. da Edifício Público no Boé Saneamentu, Município Ainaro
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.

Naran Eng.	Manuel Bany da S. C. de Carvalho							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	October																														OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
AINARO VILA (ANV)	4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

Prepara Husi :

Sertifika Husi :

Aprova Husi :

[illegible]

