



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público




RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU AILEU
JULHO 2022




SUMÁRIO
RELATÓRIO
IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO
AILEU
JULHO 2022

Prepara Husi :


(Eng. Merinho Cudo Lopes de Araújo)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Aileu ADN, I.P



(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Município Aileu ADN, I.P


(Eng. Celvio J. Alves)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Aileu ADN, I.P


(Eng. Rui Lopes)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Aileu ADN, I.P

Verifica Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigação, ADN, I.P


(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN,

Sertifica Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T, M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P 

INDICE

SUMÁRIO.....	1
INDICE	1
I. INTRODUSAUN.....	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	4
1.2 Perfil Municipio Aileu	4
1.3. Lista Projectos.....	6
II. PROGRESU FISIKU.....	14
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan.....	14
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	14
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	14
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	15
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	15

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.....	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Aileu.....	5
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Aileu	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Aileu Por Fundus Finansiamentos	6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Aileu Por Sectores.....	8
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Aileu Por Ministerio.....	11
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Aileu	13

I. INTRODUSAUN


1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN,I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN,I.P nian maka atu aseguza katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefisiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekretu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Público (IP), ADN,I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimentu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvimentu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio Aileu

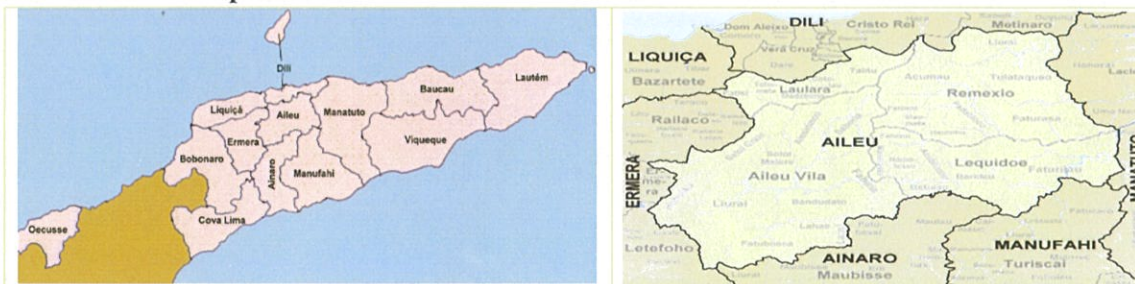

Administrasaun Munisipal Aileu lokalizadu iha parte sul Dili, kapital paíz no mapa 1 hatudu pozisaun jeográfika Munisipiu Aileu ne'ebé ho luan hamutuk 729 km² ho populasaun ema na'in 44,325 no densidade demografika ema 50.6 ba km², tuir Sensus 2015. Topografia Munisipiu Aileu ne'ebé foho dominante liu ho a'as entre 350 m to'o 1,500 m sukat husi tasi. Kapitál maka Aileu Vila iha foho Mota Mantane ho altitude 913 m. Administrasaun Munisipal Aileu iha Postos Administrativos 4, Sukus 31 no aldeias 139.

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos No Aldeias

Aileu villa		Laulara		Lequidoe		Remexio	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Aissirimou	5	Fatise	5	Aculitoho	3	Acumau	3
Bandudato	3	Cotolau	5	Bereleu	5	Fadabloco	7
Fahiria	6	Madabeno	5	Betulau	3	Fahisoi	3
Fatubossa	7	Talitu	4	Fahisoi	3	Faturas	4
Hoholau	5	Tohumeta	3	Faturilau	2	Hautoho	3
Lahane	5	-	-	Manucasa	2	Suco Liurai	3
Lausi	4	-	-	Namolesso	4	Maumeta	3
Suco Liurai	8	-	-	-	-	Tulataqueo	7
Seloi Malere	6	-	-	-	-	-	-
Saburia	3	-	-	-	-	-	-
Seloi Craik	10	-	-	-	-	-	-
Total	62	-	22	-	22	-	33

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 17

Tabela 1.1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Aileu

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Aileu								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		3				3	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
Total			4				4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Aileu

ASET ADN, I.P MUNICIPIO AILEU								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1				1	
2	Kareta		1				1	
3	Desktop HP / Monitor		1				1	
4	Laptop HP		1				1	Port ba USB fatin la diak , operasaun labtop Todan
5	Printer Cannon		1				1	
6	UPS		1				1	
7	Armario File		2				1	
8	Armario Tau hena		3				3	
9	Meja escritorio		1				1	
10	Meja han		1				1	
11	Meja TV (kiik)		1				1	
12	Kadeira escritorio		4				4	
13	Kadeira han		4				4	
14	Sofa		1 Set				1	
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3		3 Set				1	Springbed ida Nakles, Sumaso la Iha ba Kuarto Tolu
16	Jeleira		1				1	

17	TV + Parabola		1 Set				1	Reciver hosi Parabola la Utilija
18	Kipas Angin		5				5	Ida Kondisaun att
19	Kompor		1				1	
20	Kompor Gas		1				1	Kondisaun Att no labele uja
21	Rack sepatu		3				3	
22	Rack Piring		1				1	
23	Lampu		11				11	Rua mak att, nebe monta iha Veranda Uma oin no Veranda Kotuk ho Marka Philip
24	Water Pump Sanyo		1				1	

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumulá iha lista neé bazeia ba dados projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamiento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Aileu Por Fundus Finansiamiento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + LM - BS + LM - TP + Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	27	\$ 18,058,833.72	64.40%
2	Laulara	10	\$ 32,309,072.79	58.47%
3	Lequidoe	12	\$ 2,589,478.14	48.07%
4	Remexio	5	\$ 3,471,704.86	34.51%
Grand Total		54	\$ 56,429,089.51	58.42%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	5	\$ 13,467,157.82	75.14%
2	Laulara	7	\$ 32,002,953.24	58.41%
3	Lequidoe	1	\$ 240,048.46	84.76%
4	Remexio	1	\$ 2,567,345.51	34.72%
Grand Total		14	\$ 48,277,505.03	61.95%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	8	\$ 2,425,653.48	28.28%
2	Laulara	3	\$ 306,119.55	65.57%
3	Lequidoe	7	\$ 1,533,192.16	40.61%
4	Remexio	1	\$ 225,714.76	0.00%
Grand Total		19	\$ 4,490,679.95	33.61%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	2	\$ 522,720.63	38.39%
2	Laulara			
3	Lequidoe	1	\$ 550,800.00	70.00%
4	Remexio	1	\$ 494,544.48	62.04%
Grand Total		4	\$ 1,568,065.11	56.95%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	9	\$ 1,167,916.80	22.08%
2	Laulara			
3	Lequidoe	3	\$ 265,437.52	12.50%
4	Remexio	2	\$ 184,100.11	0.00%
Grand Total		14	\$ 1,617,454.43	17.99%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundu-Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	3	\$ 475,384.99	77.07%
2	Laulara			
3	Lequidoe			
4	Remexio			
Grand Total		3	\$ 475,384.99	77.07%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Aileu Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO AILEU		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Agua E Saneamento	1	\$ 827,410.00	9.00%
2	Edificios Publicos	4	\$ 1,079,346.48	43.82%
3	Edukasaun	13	\$ 1,313,542.97	5.64%
4	Eletrifikasaun Nasional	3	\$ 1,001,069.36	75.97%
5	Estradas	16	\$ 18,509,629.40	78.99%
6	Imprestimo	4	\$ 30,387,163.09	49.51%
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	5	\$ 1,320,533.03	56.62%
8	Preparasaun Desenhos No Supervisaun -Novos Projectos	2	\$ 1,025,800.00	53.89%
9	Saude	3	\$ 494,193.39	61.51%
10	Solidariedade E Social	2	\$ 166,490.33	57.18%
11	Turismo	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		54	\$ 56,429,089.51	58.42%

NO	SECTOR PROYECTO	Aileu-Vila		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Agua E Saneamento	1	\$ 827,410.00	9.00%
2	Edificios Publicos	4	\$ 1,079,346.48	43.82%
3	Edukasaun	8	\$ 864,005.34	4.73%
4	Eletrifikasaun Nasional			
5	Estradas	4	\$ 899,496.25	58.01%
6	Imprestimo	3	\$ 12,531,861.82	76.85%
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	1	\$ 717,064.23	41.26%
8	Preparasaun Desenhos No Supervisaun -Novos Projectos	1	\$ 475,000.00	35.21%
9	Saude	2	\$ 194,247.81	58.36%
10	Solidariedade E Social	2	\$ 166,490.33	57.18%
11	Turismo	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		27	\$ 18,058,833.72	64.40%

NO	SECTOR PROYECTO	Laulara		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Agua E Saneamento			
2	Edificios Publicos			
3	Edukasaun			
4	Eletrifikasaun Nasional	2	\$ 761,020.90	73.19%
5	Estradas	6	\$ 13,652,436.58	94.50%
6	Imprestimo	1	\$ 17,855,301.27	30.32%
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	1	\$ 40,314.04	49.04%
8	Preparasaun Desenhos No Supervisaun -Novos Projectos			
9	Saude			
10	Solidariedade E Social			
11	Turismo			
Grand Total		10	\$ 32,309,072.79	58.47%

NO	SECTOR PROYECTO	Lequidoe		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Agua E Saneamento			
2	Edificios Publicos			
3	Edukasaun	3	\$ 265,437.52	12.50%
4	Eletrifikasaun Nasional	1	\$ 240,048.46	84.76%
5	Estradas	3	\$ 670,091.82	0.00%
6	Imprestimo			
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 563,154.76	76.72%
8	Preparasaun Desenhos No Supervisaun -Novos Projectos	1	\$ 550,800.00	70.00%
9	Saude	1	\$ 299,945.58	63.56%
10	Solidariedade E Social			
11	Turismo			
Grand Total		12	\$ 2,589,478.14	48.07%

NO	SECTOR PROYECTO	Remexio		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Agua E Saneamento			
2	Edificios Publicos			
3	Edukasaun	2	\$ 184,100.11	0.00%
4	Eletrifikasaun Nasional			
5	Estradas	3	\$ 3,287,604.75	36.45%
6	Imprestimo			
7	Manutensaun No Rehabilitasaun			
8	Preparasaun Desenhos No Supervisaun -Novos Projectos			
9	Saude			
10	Solidariedade E Social			
11	Turismo			
Grand Total		5	\$ 3,471,704.86	34.51%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Aileu Por Ministerios

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ministerio Da Justica	1	\$ 200,000.00	89.19%
2	Ministerio Das Obras Publicas	30	\$ 52,596,604.88	60.15%
3	Ministerio Edukasaun	1	\$ 171,079.30	0.00%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	13	\$ 1,313,542.97	5.64%
5	Ministerio Ensino Superior Ciencia E Cultura	1	\$ 475,000.00	35.21%
6	Ministerio Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertacao Nacional	1	\$ 118,769.70	52.04%
7	Ministerio Saude	4	\$ 775,330.57	71.84%
8	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	2	\$ 474,850.63	15.79%
9	Sefope	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		54	\$ 56,429,089.51	58.42%

NO	DONO DO PROJECTO	Aileu-Vila		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ministerio Da Justica	1	\$ 200,000.00	89.19%
2	Ministerio Das Obras Publicas	9	\$ 14,975,832.30	70.27%
3	Ministerio Edukasaun	1	\$ 171,079.30	0.00%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	8	\$ 864,005.34	4.73%
5	Ministerio Ensino Superior Ciencia E Cultura	1	\$ 475,000.00	35.21%
6	Ministerio Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertacao Nacional	1	\$ 118,769.70	52.04%
7	Ministerio Saude	3	\$ 475,384.99	77.07%
8	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	2	\$ 474,850.63	15.79%
9	Sefope	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		27	\$ 18,058,833.72	64.40%

NO	DONO DO PROJECTO	Laulara		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ministerio Da Justica			
2	Ministerio Das Obras Publicas	10	\$ 32,309,072.79	58.47%
3	Ministerio Edukasaun			
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu			
5	Ministerio Ensino Superior Ciencia E Cultura			
6	Ministerio Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertacao Nacional			
7	Ministerio Saude			
8	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
9	Sefope			
Grand Total		10	\$ 32,309,072.79	58.47%

NO	DONO DO PROJECTO	Lequidoe		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ministerio Da Justica			
2	Ministerio Das Obras Publicas	8	\$ 2,024,095.04	50.44%
3	Ministerio Edukasaun			
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	3	\$ 265,437.52	12.50%
5	Ministerio Ensino Superior Ciencia E Cultura			
6	Ministerio Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertacao Nacional			
7	Ministerio Saude	1	\$ 299,945.58	63.56%
8	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
9	Sefope			
Grand Total		12	\$ 2,589,478.14	48.07%

NO	DONO DO PROJECTO	Remexio		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ministerio Da Justica			
2	Ministerio Das Obras Publicas	3	\$ 3,287,604.75	36.45%
3	Ministerio Edukasaun			
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	2	\$ 184,100.11	0.00%
5	Ministerio Ensino Superior Ciencia E Cultura			
6	Ministerio Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertacao Nacional			
7	Ministerio Saude			
8	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
9	Sefope			
Grand Total		5	\$ 3,471,704.86	34.51%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus populasaun Munisipiu Aileu

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Poduktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Aileu Vila	28,185	8546	7976	6113	5550
Laulara	8,342	2420	2344	1837	1742
Lequidoe	7,913	2407	2192	1698	1616
Remexio	12,868	3389	3448	3035	2996

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,
Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu porsentagen actual fulan ida ne'e hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare'e iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hare'e #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

1. Iha Municipio Aileu Kompania balun sira nia Enjineiru laiha Terenu, no Enjineiru husi Dono do Projeto mos la activu iha terenu.
2. Komposisi betaun ne'ebe fo husi Laboratorio Nacional maibe bainhira halo trail iha terenu husi kompanha kontaktu sira parte Laboratorio Nacional maibe laiha resposta ne'ebe fixu ba iha kompania sira. Maibe liu tiha loron balun husi parte Laboratorio Nacional kontaktu fali sira hodi foti rasik sample.
3. Iha Municipiu Aileu kompania/empreza sira infrenta problema ba rekursu finanseiru nune'e fo inpaktu ba servisu konstrusaun nian hodi difikulta progress servisu iha terenu.
4. Mudansa *Schedule* la tuir kontratu ho razaun pagamentu tarde, situasaun nebe'e ita hotu la espera ho covid-19 nebe'e invade Timor-Leste sai difikuldade mos ba kompania/empreza sira la halo servisu tuir planu refere.
5. Tekniku AND, I.P halo observasaun/monitorizasaun direktamente iha terenu hodi hare'e servisu kompania/empreza sira, maibe sira laiha Site Engineering.
6. Iha projectu balun ne'ebe maka kompania/empreza ladun koopera di'ak ho tekniku AND.IP no teknikus husi Dono projectu, tamba instrusaun nebe'e mak ita fo hanesan

prepara *time schedule* hadia *direksi keet* maibe kompania/empreza la halo tuir orientasaun.

7. Bazeia ba planu inspesaun neébe ami halo balun nia implementasaun la tuir planu nebe'e mak aprova husi DE. AND.IP, tamba iha difikuldade transporte, maibe ami nafatin tenta ka fahe tempo hodi halo monitorizasaun ba projetu hotu neébe iha Municpiu Aileu.
8. Ba projectu neébe mak abandona no parado ami halo monitorizasaun dala 2 tamba laiha progresu fiziku neébe mak halo iha terenu tuir planu ne'ebe tekniku AND.IP halo Monitorizasaun.

➤ **Obstaclo parte Eletricidade**

1. Durante halo monitorizasaun ba projeto neébe mak mensiona iha lista projetu Eng. M & E, ADN – I.P, la hasoru kontraktor sira tamba televomel fora da area hotu.
2. Eng. M & E, ADN – I.P, nunka hasoru tekniku husi kompania no parte kompania sempre delega tekniku neébe ba hein iha terenu, maibe tekniku neé rasik laiha konesimentu klean ho orbra refere.
3. Seksaun M & E, AND – I.P, la bele kontrola projetu ho maximu tamba Eng. M & E ida hodi
kontrola Projeto Linha Electricidade ho Edifisio Publik Iha Municipio Ha'at (4).
4. Projeto eletricidade barak maka espasu ba lina laiha ona, hodi kompanha sira mos la halo servisu kontinuasaun.
5. Motorista menus difikulta ami nia servisu.

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu


1. Husu Superior ADN.IP atu bele hatu'o ba projectu nain konaba projetu hirak ne'ebe maka abandona no parado husi kompania/empreza ne'ebe iha responsabilidade ba projectu ne'e rasik atu bele foti medidas ruma hanesan *Black list* ou Penalidade ba kompania.

2. Ami husi tekniku/engineiru Municipiu AND.IP husu ba Dono Projectu refere, ba oin kompania/empreza ne'ebe maka laiha responsabilidade no abandona projetu/obra ne'ebe sira halo, husu Governo labele fo tan oportunidade ba kompana hirak ne'e hodi kaer fali obra seluk.
3. Ami husi Engineiru Municipiu AND.IP sujere ba superior AND.IP atu bele prepara transporte hanesan motorizada hodi nune'e bele fasilita ami halo monitorizasaun ba projectu ne'ebe ho nia lokalizasaun besik.

➤ **Recomendação parte Eletricidade**

1. Husu ba parte ITC, ADN – I.P bele kria Folder Sistem ba Seksaun M & E, ADN – I.P.
2. Husu atu aumenta tan rekursu iha Seksaun M & E, ADN – I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Aileu

Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Aileu						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engineiro	Celvio J. Alves	108	Enjineiru ITI		
		Merinho Cuco L. de Araujo	189	Enjineiru EPAS		
		Rui Lopes	077	Enjineiru ITI		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		

2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	João Pedro Cortereal		Motorista		



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL JULHO)

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL JULHO)																
LOKALIZASAUN PROJETO																
NU.	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	Rehabilitation of Sloi Tocoluli roads Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Mendith Unip.Lda	SSS/061/MOPTK-2015	\$ 218,231.77	Nov. 14, 2014	0.00%	88.00%	\$ 192,043.96	\$ 26,187.81	PENDENTE	Projeto refere falta 10% rekomendasaun ikus iha tinan 2019
2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000 - 8+000 Munisiplu Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Aileu-Vila	Aileu	Caviq Unipessoal Lda in joint venture with Sunnines Unip. Lda	NCB/020/MOP-2019	\$ 717,064.23	Dec. 20, 2019	0.00%	41.26%	\$ 295,880.00	\$ 421,184.23	ON-GOING	
3	Consultant Design & Supervision Lot 3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Katahira and Engineers International	SSS/043/MPW-2014	\$ 4,069,793.04	Sept. 15, 2014	0.00%	80.11%	\$ 3,260,234.80	\$ 809,558.24	ON-GOING	
4	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Laulara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili - Ainaro Road (Lots 1 - 5)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Kunhwa Engineering & Consulting Co., Ltd JV with Dongsung Engineering Co.,Ltd	RFP/020/MOPTC/2017	\$ 2,626,077.78	April 27, 2018	0.00%	62.57%	\$ 1,643,162.72	\$ 982,915.06	ON-GOING	
5	Emergency Drainage and Slope Protection Along Aileu to Maubisse Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	My Friend Unip. Lda	MPW-W-014054	\$ 251,677.07	Oct. 5, 2014	0.00%	84.02%	\$ 211,462.39	\$ 40,214.68	ON-GOING	
6	Rehabilitation of MSS Office in Aileu	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-BS	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Borudo Matak	RDTL:47/MSS/DNPFAL-DAD/X/2016	\$ 47,720.63	Oct. 24, 2016	0.00%	69.97%	\$ 33,389.23	\$ 14,331.40	PENDENTE	
7	Programma Turismo Komunitario 2014 Selo / Malere	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Aileu-Vila	Aileu	Mirror Raefusa	RDTL/SEFOPE/DNA/DNE/2013-0003	\$ 303,911.46	May 5, 2014	0.00%	71.40%	\$ 217,004.28	\$ 86,907.18	PENDENTE	
8	Preparation of Master Plan For Municipal Capitals Water Supply and Sanitation (Aileu-Gleno-Liquica) /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	MPW-CS-200028	\$ 827,410.00	May 1, 2020	0.00%	9.00%	\$ 74,466.90	\$ 752,943.10	ON-GOING	
9	Realization of the Detailed Engineering Design (DED) includes Reparation of Feasibility Study of the University of Aileu (Bem Serviso)	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Aileu-Vila	Aileu	Bernabad Arquitectura SLP	MPW-S-200024	\$ 475,000.00	March 31, 2020	0.00%	35.21%	\$ 167,261.25	\$ 307,738.75	ON-GOING	Ongoing
10	New Construction of laboratory for covid 19 at CHC Aileu Vila	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	Jomy Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-257	\$ 62,128.32	Nov. 4, 2020	0.00%	95.51%	\$ 59,335.94	\$ 2,792.38	FHO	
11	Konstrusaun, Vedasaun no Jardim ba Edificio DTPSC	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kablaki Engineering Unip. Lda		\$ 200,000.00	1-Jul-12	0.00%	89.19%	\$ 178,371.29	\$ 21,628.71	PENDENTE	
12	Consultancy services for National Road No. 1 - Upgrading Project	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Philcoe International, Inc. In JV with Luis and Associates, Co	nn	\$ 5,835,991.00	Jan. 18, 2013	0.00%	81.01%	\$ 4,727,833.53	\$ 1,108,157.47	ON-GOING	
13	New Construction of Isolation Building	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-255	\$ 281,137.18	Nov. 04, 2020	0.00%	90.00%	\$ 253,023.47	\$ 28,113.71	PHO	
14	New Construction of Campas, Gate And Leveling	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Caramé Unip, Lda	No.: 37/MACLN/IX/2021	\$ 118,769.70	1-Sep-21	0.00%	52.04%	\$ 61,804.39	\$ 56,965.31	ON-GOING	
15	Konstrusaun salas de aulas 3 + Eskritorio + Laboratorio ESTV Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	NCB:01MEJD/DNA/2021	\$ 171,079.30	Dec 3.2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 171,079.30	ON-GOING	
16	New Cosntructio Office CSS Aileu District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kevina Unip.Lda	33/MSSI/DGAF/DNA/XI/2021	\$ 427,130.00	Nov. 22, 2021	0.00%	9.74%	\$ 41,595.56	\$ 385,534.44	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL JULHO)

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL JULHO)																
LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
17	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBC 3 Ciclo Seioi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBC 3 CICLO SEIOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 152,044.11	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 152,044.11	ON-GOING	
18	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EPE Mantane	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EPE MANTANE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 84,628.13	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 84,628.13	ON-GOING	
19	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBF Lacio	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF LACLO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,597.13	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 99,597.13	ON-GOING	
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Pre-Escolar Cotoabauro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE PRE-ESCOLAR COTOBAURO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 83,516.10	Oct. 15, 2021	0.00%	25.59%	\$ 21,372.99	\$ 62,143.11	ON-GOING	
21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Teblor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF TEBLOR	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 102,494.43	Oct. 15, 2021	0.00%	19.01%	\$ 19,483.20	\$ 83,011.23	ON-GOING	
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Darahe	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF DARAHE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,770.22	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 99,770.22	ON-GOING	
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESGAM Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE ESGAM AILEU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 140,545.78	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 140,545.78	ON-GOING	
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 101,409.44	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 101,409.44	ON-GOING	
25	R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli-Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Oin Unip. Lda	MOP-CD-RFQ-21011	\$ 89,757.77	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 89,757.77	ON-GOING	
26	R4D Rural Road Spot Improvement Kirelo - Lacio Chainage 0+000 - 11+300, Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Fikikay Unipessoal, Lda	MOP-W-NCB-21025	\$ 339,829.64	Oct. 1, 2021	0.00%	34.81%	\$ 118,294.10	\$ 221,535.54	ON-GOING	
27	New Construction of Fence at CSI Aileu-Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	BEHALE ENTERPRICE UNIPESSOAL, LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230	\$ 132,119.49	Jan. 14, 2022	0.00%	40.89%	\$ 54,020.94	\$ 78,098.55	ON-GOING	
28	New Install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Madabeno to Sarlala Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laulara	Aileu	Aldepo Murak Unip, Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000162	\$ 462,154.02	Aug. 22, 2013	0.00%	73.07%	\$ 337,695.10	\$ 124,458.92	PENDENTE	Progresu Fisiku nafatin deit tamba laiha ona espasu atu kontinua tan obra ne'e.



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL JULHO)

LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
29	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku to Besilau and Fatuk Hun - Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laulara	Aileu	osxavijoneli unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000179	\$ 298,866.88	Aug. 22, 2013	0.00%	73.38%	\$ 219,311.16	\$ 79,555.72	PENDENTE	Progresu Fisiku nafatin deit tamba laiha ona espasu atu kontinua tan obra ne'e.
30	Rehabilitation of Beducu Sarlala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Mejori, Lda	SSS/0103/MOPTC-2016	\$ 4,451,281.98	Sept. 5, 2016	0.00%	87.10%	\$ 3,876,857.25	\$ 574,424.73	ON-GOING	
31	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemós - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 0+000 - Sta. 2+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Aspalink Unip Lda	SSS/120/MOPTC-2015	\$ 4,128,651.62	Dec. 11, 2015	0.00%	99.35%	\$ 4,101,692.64	\$ 26,958.98	FHO	FHO iha Fulan Março 2022
32	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemós - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 2+800 - Sta. 6+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/121/MOPTC-2015	\$ 4,645,457.43	Dec. 11, 2015	0.00%	98.99%	\$ 4,598,764.07	\$ 46,693.36	FHO	FHO iha Fulan Março 2022
33	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laulara	Aileu	CINA WU YI CO.LTD	ICB/018/MOPTC-2017	\$ 17,855,301.27	May 31, 2019	0.00%	30.32%	\$ 5,413,917.86	\$ 12,441,383.41	ON-GOING	Responsavel Eng. ADN Impristimo
34	Rural Roads Maintenance Fahisohi - Fadabloco Sta 0+000-8+200, Hotoho - Liquica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Omai Sta 0+000 - 7+500 in Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laulara	Aileu	Remexio Furak Unip Lda	MPWTC-CD-170004	\$ 40,314.04	July 20, 2017	0.00%	49.04%	\$ 19,768.44	\$ 20,545.60	ON-GOING	Rekomendasun Ikus 2018
35	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Omai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Lisimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Fin Los unip.Lda	MPW-W190086	\$ 225,977.27	Aug. 16, 2019	0.00%	80.07%	\$ 180,944.94	\$ 45,032.33	ON-GOING	
36	Laulara Solerema Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Marino Enterprises, Lda	SSS/115/MOPTC-2017	\$ 161,240.04	Sept. 7, 2017	0.00%	88.85%	\$ 143,267.06	\$ 17,972.98	PHO	Projeito refere Atinji progreso 100% baseia ba Rekomendasun ikus 2017. no agora Projeito Impristimo mak halo fali konstrusaun foun
37	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Omai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Emmanuel Milenial	MOP-CD-RFQ-21013	\$ 39,828.24	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 39,828.24	ON-GOING	
38	Rural Road Periodic Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 -10+400 Dili & Aileu Municipality / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Nautetu I, II Unipessoal Lda	MPW.W-1900081	\$ 494,544.48	Aug. 16, 2019	0.00%	62.04%	\$ 306,821.03	\$ 187,723.45	ON-GOING	
39	Road Rehabilitation of Remexio to Lacio Sta 0+000-20+000 Package I Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Mendith UnipLda	SSS/139/MOPTC-2017	\$ 2,567,345.51	Sept. 12, 2017	0.00%	34.72%	\$ 891,434.87	\$ 1,675,910.64	ON-GOING	
40	Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Lonacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	\$ 225,714.76	18-Jun-21	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 225,714.76	ON-GOING	
41	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 77,252.65	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 77,252.65	ON-GOING	
42	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 106,847.46	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 106,847.46	ON-GOING	
43	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lequidoe	Aileu	Cadila Supplie Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000163	\$ 240,048.46	Aug. 22, 2013	0.00%	84.76%	\$ 203,456.68	\$ 36,591.78	PENDENTE	Progresu Fisiku nafatin deit tamba laiha ona espasu atu kontinua tan obra ne'e.



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL JULHO)

					LOKALIZASAUN PROJETU												
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN	
44	R4D MPW Rural Roads rehabilitation Project in Aileu Bereleu manucasa Package 2 Sta. 3+500-13+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Seiara Irapiti Unip. Lda	MPWTC-W-015016	\$ 248,750.72	Sept. 7, 2015	0.00%	87.70%	\$ 218,159.90	\$ 30,590.82	PHO	Projeto refere Atinji deit progreso 97.45% baseia ba Rekomendaçaun ikus 2017. no agora Projeto Impristimo mak halo fali konstrusaun foun	
45	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 8+200, Namalesu - Faturilau Chainage 0+000 - 12+500, Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hautoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+500 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Emmanuel Milenial	MPW-W-190103	\$ 171,685.42	Aug. 21, 2019	0.00%	58.18%	\$ 99,884.64	\$ 71,800.78	ON-GOING		
46	Rural Roads Periodic Maintenance Aituhaularan - Manufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300, Routine Maintenance Coula Udo Kirielo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-190174	\$ 142,718.62	Nov. 25, 2019	0.00%	79.86%	\$ 113,980.68	\$ 28,737.94	ON-GOING		
47	For Preparation of Detailed Engineering Design For Rehabilitation of "municipio Roads" Package 8 : (Be' Cluru) to Lequidoe Town (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Lequidoe	Aileu	Team Consulting Engineering & Management Co., Ltd JV ATT Consultants Co., Ltd & Triangle Architech Consultant., Lda	MPW-CS-2000021	\$ 550,800.00	March 26, 2020	0.00%	70.00%	\$ 385,560.00	\$ 165,240.00	ON-GOING		
48	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Faturilau, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	SAUDE	Lequidoe	Aileu	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	\$ 299,945.58	Sept. 6, 2021	0.00%	63.56%	\$ 190,644.75	\$ 109,300.83	ON-GOING		
49	R4D Rural Road Spot Improvement Namalesu-Faturilau Chainage 0+000-14+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-210149	\$ 411,620.44	Sept. 21, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 411,620.44	ON-GOING		
50	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 117,171.14	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 117,171.14	ON-GOING		
51	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Urdadan	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 73,988.60	Oct. 15, 2021	0.00%	23.68%	\$ 17,519.74	\$ 56,468.86	ON-GOING		
52	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 74,277.78	Oct. 15, 2021	0.00%	21.07%	\$ 15,653.87	\$ 58,623.91	ON-GOING		
53	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	Blackbird Unip. Lda JV Chaicallala Unip. Lda	MOP-CD-NCB-21026	\$ 186,084.05	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 186,084.05	ON-GOING		



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL JULHO)

LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
54	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi-Dairiouta Chainage 0+000 - 5+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	Raco Lda.	MOP-CD-RFQ-21012	\$ 72,387.33	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 72,387.33	ON-GOING	
TOTAL									\$ 56,429,089.51			58.42%	\$ 32,965,375.62	\$ 23,463,713.89		

Prepara Husi :

(Eng. Celvio J. Alves)

Engenheiro ba Projetu Instrastuctura, Transportes e Irigasaun
Municipio Aileu,
ADN, I.P.

(Eng. Rui Lopes)

Engenheiro ba Projetu Instrastuctura, Transportes e Irigasaun Municipio Aileu,
ADN, I.P.

(Eng. Merinho Cuco L. de Araujo)

Eng. ba Edificio Publiku no Be'e Saneamento
Municipio Aileu
ADN, I.P.

(Silvino D. R. R. Soares)

Eng. M & E, Munisipiu Aileu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											Julho 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
1	Rehabilitation of Sloi Tocoluli roads Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Mendith UnipLda	SSS/061/MOPTK-2015	\$ 218,231.77	Nov. 14, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000 - 8+000 Munisipiu Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Aileu-Vila	Aileu	Caviq Unipessoal Lda in joint venture with Sunnines Unip. Lda	NCB/020/MOP-2019	\$ 717,064.23	Dec. 20, 2019	47.95%	0.00%	47.95%
3	Consultant Design & Supervision Lot 3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Katahira and Engineers International	SSS/043/MPW-2014	\$ 4,069,793.04	Sept. 15, 2014	80.11%	0.00%	80.11%
4	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Laulara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili - Ainaro Road (Lots 1 - 5)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Kunhwa Engineering & Consulting Co., Ltd JV with Dongsung Engineering Co.,Ltd	RFP/020/MOPTC/2017	\$ 2,626,077.78	April 27, 2018	62.57%	0.00%	62.57%
5	Emergency Dili to Aileu Maubisse Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	My Friend Unip. Lda	MPW-W-014054	\$ 251,677.07	Oct. 5, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
6	Rehabilitation of MSS Office in Aileu	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-BS	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Borudo Matak	RDTL:47/MSS/DNPFA L-DAD/X/2016	\$ 47,720.63	Oct. 24, 2016	77.74%	0.00%	77.74%
7	Programma Turismo Komunitario 2014 Selo / Malere	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Aileu-Vila	Aileu	Miror Raefusa	RDTL/SEFOPE/DNA/D NE/2013-0003	\$ 227,981.87	May 5, 2014	91.20%	0.00%	91.20%
8	Preparation of Master Plan For Municipal Capitals Water Supply and Sanitation (Aileu-Gleno-Liquica) /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	MPW-CS-200028	\$ 827,410.00	May 1, 2020	10.00%	0.00%	10.00%
9	Realization of the Detailed Engineering Design (DED) includes Reparation of Feasibility Study of the University of Aileu (Bem Serviso)	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Aileu-Vila	Aileu	Bernabad Arquitectura SLP	MPW-S-200024	\$ 475,000.00	March 31, 2020	35.21%	0.00%	35.21%
10	New Construction of laboratory for covid 19 at CHC Aileu Vila	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	Jomy Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-257	\$ 62,128.32	Nov. 4, 2020	94.67%	0.00%	94.67%
11	Konstrusaun, Vedasaun no Jardim ba Edificio DTPSC	Ministerio da Justica	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kablaki Engineering Unip. Lda		\$ 200,000.00	1-Jul-12	89.19%	0.00%	89.19%
12	Consultancy services for National Road No. 1 - Upgrading Project	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Philcoei International, Inc. In JV with Luis and Associates, Co		\$ 5,835,991.00	Jan. 18, 2013	83.00%	0.00%	83.00%
13	New Construction of Isolation Building	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-255	\$ 281,137.18	Nov. 04, 2020	90.47%	0.00%	90.47%
14	New Construction of Campas, Gate And Leveling	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Caramé Unip, Lda	No.: 37/MACLN/IX/2021	\$ 118,769.70	1/09/2021	65.61%	0.31%	65.92%
15	Konstrusaun salas de aulas 3 + Eskritorio + Laboratorio ESTV Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	NCB:01MEJD/DNA/2021	\$ 171,079.30	Dec 3.2021	40.35%	5.68%	46.03%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											Julho 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
16	New construction office CSS of Aileu District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kevina Unip.Lda	33/MSSI/DGAF/DNA/XI/2021	\$ 427,130.00	Nov. 22, 2021	12.67%	3.19%	15.86%
17	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBC 3 Ciclo Selo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBC 3 CICLO SELOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 152,044.11	Oct. 15, 2021	25.81%	0.58%	26.39%
18	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EPE Mantane	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EPE MANTANE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 84,628.13	Oct. 15, 2021	22.04%	3.08%	25.12%
19	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBF Lacio	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF LACLO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,597.13	Oct. 15, 2021	21.66%	2.43%	24.10%
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Pre-Escolar Cotoabauro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE PRE-ESCOLAR COTOBAURO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 83,516.10	Oct. 15, 2021	29.39%	1.95%	31.34%
21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Teblor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF TEBLOR	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 102,494.43	Oct. 15, 2021	29.16%	2.39%	31.55%
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Darahe	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF DARAHE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,770.22	Oct. 15, 2021	20.89%	6.83%	27.73%
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESGAM Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE ESGAM AILEU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 140,545.78	Oct. 15, 2021	21.62%	5.20%	26.82%
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 101,409.44	Oct. 15, 2021	17.97%	6.47%	24.44%
25	R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli-Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Oin Unip. Lda	MOP-CD-RFQ-21011	\$ 89,757.77		33.32%	4.67%	37.99%
26	R4D Rural Road Spot Improvement Kirelo - Lacio Chainage 0+000 - 11+300, Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Fikikay Unipessoal, Lda	MOP-W-NCB-21025	\$ 339,829.64	Oct. 1, 2021	47.55%	13.61%	61.17%
27	New Construction of Fence at CSI Aileu-Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230	BEHALE ENTERPRICE UNIPESOAAL LDA	\$ 132,119.49	Jan. 14, 2022	72.76%	1.43%	74.20%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											Julho 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
28	New Install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Madabeno to Sarlala Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laulara	Aileu	Aldepo Murak Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000162	\$ 462,154.02	Aug. 22, 2013	81.19%	0.00%	81.19%
29	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku to Besilau and Fatuk Hun - Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laulara	Aileu	Oxavijoneli unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000179	\$ 298,866.88	Aug. 22, 2013	81.53%	0.00%	81.53%
30	Rehabilitation of Beducu Sarlala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Mejori, Lda	SSS/0103/MOPTC-2016	\$ 4,451,281.98	Sept. 5, 2016	98.97%	0.00%	98.97%
31	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemós - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 0+000 - Sta. 2+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Aspalink Unip Lda	SSS/120/MOPTC-2015	\$ 4,128,651.62	Dec. 11, 2015	100.00%	0.00%	100.00%
32	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemós - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 2+800 - Sta. 6+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/121/MOPTC-2015	\$ 4,645,457.43	Dec. 11, 2015	100.00%	0.00%	100.00%
33	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laulara	Aileu	CINA WU YI CO.LTD	ICB/018/MOPTC-2017	\$ 17,855,301.27	May 31, 2019	79.61%	0.00%	79.61%
34	Rural Roads Maintenance Fahisohi - Fadabloco Sta 0+000-8+200, Hotoho - Liquica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Ornai Sta 0+000 - 7+500 in Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laulara	Aileu	Remexio Furak Unip Lda	MPWTC-CD-170004	\$ 40,314.04	July 20, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
35	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Lisimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Fin Los unip.lda	MPW-W190086	\$ 225,977.27	Aug. 16, 2019	88.97%	0.00%	88.97%
36	Laulara Solerema Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Marino Enterprises, Lda	SSS/115/MOPTC-2017	\$ 161,240.04	Sept. 7, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
37	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Emmanuel Milenial	MOP-CD-RFQ-21013	\$ 39,828.24	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
38	Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 -10+400 Dili & Aileu Municipality / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Nautetu I, II Unipessoal Lda	MPW.W-1900081	\$ 494,544.48	Aug. 16, 2019	71.86%	0.22%	72.09%
39	Road Rehabilitation of Remexio to Lacio Sta 0+000-20+000 Package I Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Mendith UnipLda	SSS/139/MOPTC-2017	\$ 2,567,345.51	Sept. 12, 2017	43.26%	0.00%	43.26%
40	Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Lonacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	\$ 225,714.76	18-Jun-21	14.34%	3.90%	18.25%
41	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 77,252.65	Oct. 15, 2021	0.00%	15.58%	15.58%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											Julho 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
42	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 106,847.46	Oct. 15, 2021	14.30%	5.56%	19.86%
43	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lequidoe	Aileu	Cadila Supplie Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000163	\$ 240,048.46	Aug. 22, 2013	94.17%	0.00%	94.17%
44	R4D MPW Rural Roads rehabilitation Project in Aileu Bereleu manucasa Package 2 Sta. 3+500-13+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Seiara Irapiti Unip. Lda	MPWTC-W-015016	\$ 248,750.72	Sept. 7, 2015	97.45%	0.00%	97.45%
45	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 8+200, Nmalesu - Faturilau Chainage 0+000 - 12+500, Fahisoi - Dairilouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hautoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+500 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Emmanuel Milenial	MPW-W-190103	\$ 171,685.42	Aug. 21, 2019	64.64%	11.67%	76.31%
46	Rural Roads Periodic Maintenance Aituhauran - Manufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300, Routine Maintenance Coula Udo Kirelo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-190174	\$ 142,718.62	Nov. 25, 2019	98.30%	0.00%	98.30%
47	For Preparation of Detailed Engineering Design For Rehabilitation of "municipio Roads" Package 8 : (Be' Cluru) to Lequidoe Town (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Lequidoe	Aileu	Team Consulting Engineering & Management Co., Ltd JV ATT Consultants Co., Ltd & Triangle Architech Consultant., Lda	MPW-CS-2000021	\$ 550,800.00	March 26, 2020	70.00%	0.00%	70.00%
48	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Fatuberli, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	SAUDE	Lequidoe	Aileu	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	\$ 299,945.58	Sept. 6, 2021	53.54%	17.56%	71.10%
49	R4D Rural Road Spot Improvement Nmalesu-Faturilau Chainage 0+000-14+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-210149	\$ 411,620.44	Sept. 21, 2021	45.98%	0.00%	45.98%
50	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 117,171.14	Oct. 15, 2021	26.97%	4.26%	31.23%
51	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Urdadan	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 73,988.60	Oct. 15, 2021	35.65%	3.13%	38.78%
52	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 74,277.78	Oct. 15, 2021	31.54%	3.44%	34.98%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											Julho 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
53	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	Blackbird Unip. Lda JV Chaicailala Unip. Lda	MOP-CD-NCB-21026	\$ 186,084.05	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
54	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi-Dairlouta Chainage 0+000 - 5+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	Raco Lda.	MOP-CD-RFQ-21012	\$ 72,387.33	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	0.00%

Prepara Husi :

Verifika Husi :

(Eng. Celso J. Alves)
Engenheiro ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun Município Aileu, AD, I. P.

(Eng. Rui Lopes)
Engenheiro ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun Município Aileu, ADN, I. P.

(Eng. Merinho Cuco L. de Araujo)
Eng. ba Edifício Público no Be'e Saneamento Município Aile, ADN, I. P.

(Eng. Remigio Dos Santos)
Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, ADN, I. P.

(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Engenheiro Senior ba Edifício Público no Be'e Saneamento, ADN, I. P.

(Silvino D. R. R. Soares)
Eng. M & E, Município Aileu, ADN, I. P.

(Deolindo de F. Marques)
Chefe Sec. Projeto M.E & ITC, ADN, I. P.

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, I. P.



ANEXU C1 (ALV – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Roads Rehabilitation Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000
- 8+000, Aileu Municipality

No. kontratu : NCB / 020 / MOP - 2019

Data Inspesaun : 26 – 07 - 2022

;

Fatin Inspesaun : Selo

Koordinadas :

Start Point : Long : S. -8.70428, Latetude: E. 125.52651

End Point : Long : S. -8.71108, Latetude: E. 125.53455

Naran Inspector : 1. Eng. Celvio Justino Alves


2. Eng. Rui Lopes

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Atividade servico iha tereno laiha
(Site Camp nebe mamuk hela)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

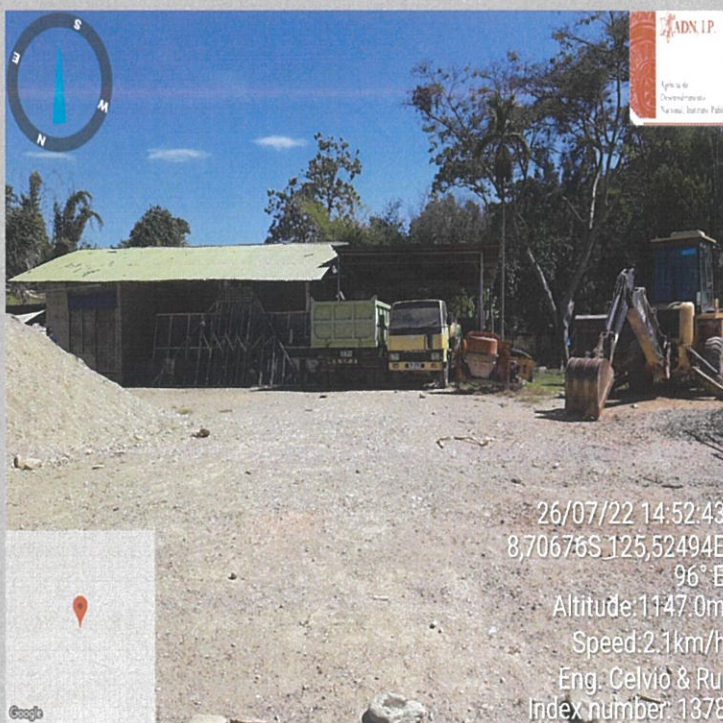

ANEXU C1 (AVL - 22)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli- Fatubosa Chainage
0+000 - 7+300 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-W-NCB-21025

Data Inspesaun : 13 / 07 / 2022

Fatin Inspesaun : Daisoli – Fatubosa, Aileu Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. -8.8378668), Latetude : (E. 125.5386965)

End Point : Long : (S. 8.83794), Latetude : (E. 125.53863)

Naran Inspector : 1. Eng. Rui Lopes
2. Eng. Celvio J. Alves

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Cement concrete pavement - plum concrete

Cement concrete pavement - plum concrete

Naruk = 10 m

Naruk = 10 m

Mahar = 0.15 m

Luan = 4 m

Total = 6 m³



ANEXU C1 (AVL - 22)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli- Fatubosa Chainage
0+000 - 7+300 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-W-NCB-21025

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :


Gabion

Gabion

= 1 x 1 x 17 = 17 m

= 1 x 1 x 18 = 18 m

Total = 35 m³

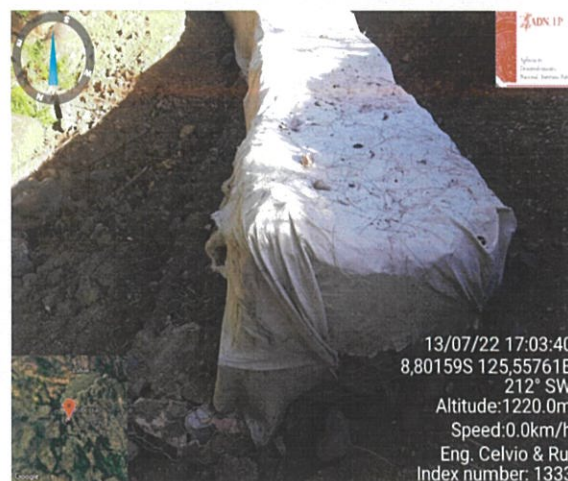

Geotextile

Geotextile



Page 1 of 1



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Normas e Padrões
Nacionais, Instituto Público

ADN, I.P.

ANEXU C2 (ALV - 22)

SUMMARY

Road name Daisoli - Fatubosa
Municipality Aileu
Postu Aileu Vila
Sukos Fatubosa

Chainage start 0 + 000
Chainage end 7+300
Length 7.3 KM
Contracor Aileu Ba Oim Unip. Lda

Item	Description	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS PREVIOUS MAY 2022		PROGRESS MONITORING JUNE 2022		PROGRESS MONITORING PROJECT	
		CONTRACT AMOUNT (\$)	%	AMOUNT (\$)	%	13/07/2022	%	Progres Phisic Up To Date	%
R-01	General	\$ 2.640.00	2.95%	\$ 640.00	0.71%	\$ -	0.00%	\$ 640.00	0.71%
R-03	Earth work	\$ 10.575.57	11.81%	\$ 1.111.02	1.24%	\$ -	0.00%	\$ 1.111.02	1.24%
R-05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 3.571.33	3.99%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structures	\$ 31.460.10	35.12%	\$ 16.909.73	18.88%	\$ 2.518.92	2.81%	\$ 19.428.65	21.69%
R-10	Dayworks	\$ 140.00	0.16%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 15.303.50	17.08%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 250.00	0.28%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction cost	\$ 65.940.49	71.38%	\$ 18.660.75	20.83%	\$ 2.518.92	2.81%	\$ 21.179.67	23.64%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 6.594.05	7.14%	\$ 1.866.07	2.08%	\$ 251.89	0.28%	\$ 2.117.97	2.36%
C	General items	\$ 17.484.84	19.52%	\$ 8.731.75	9.75%	\$ 1.330.00	1.48%	\$ 10.061.75	11.23%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	\$ 1.756.39	1.96%	\$ 585.17	0.65%	\$ 82.02	0.09%	\$ 667.19	0.74%
E	Total	\$ 89.575.77	100.00%	\$ 29.843.74	33.32%	\$ 4.182.83	4.67%	\$ 34.026.57	37.99%

Prepara Husi :

(Eng. Celso M. Alves)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P.

Prepara Husi :

(Eng. Rui Lopes)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Eng. Renigio da C. do Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Eneerjia da C. Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.

ANEXU C1 (AVL - 23)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Periodik Maintenance Kirlelo - Laclo Chainage Star
0+000 - 11+300 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-W-NCB-21025

Data Inspesaun : 13 / 07 / 2022

Fatin Inspesaun : Kirlelo Laclo – Aileu Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.81757), Latetude : (E.125.49602)

End Point : Long : (S. 8.81747), Latetude : (E. 125.49592)

Naran Inspector : 1. Eng. Rui Lopes
2. Eng. Celvio J. Alves


Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu :

Cement concrete pavement - plum concrete

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Cement concrete pavement - plum concrete

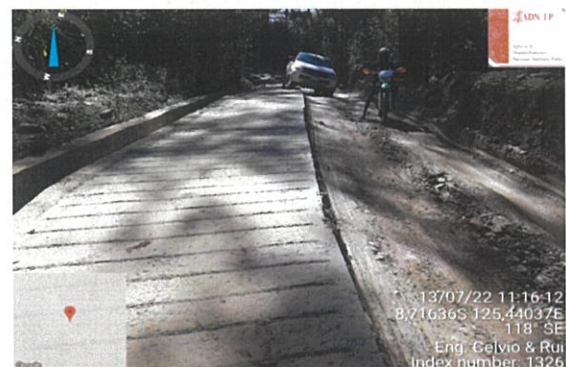

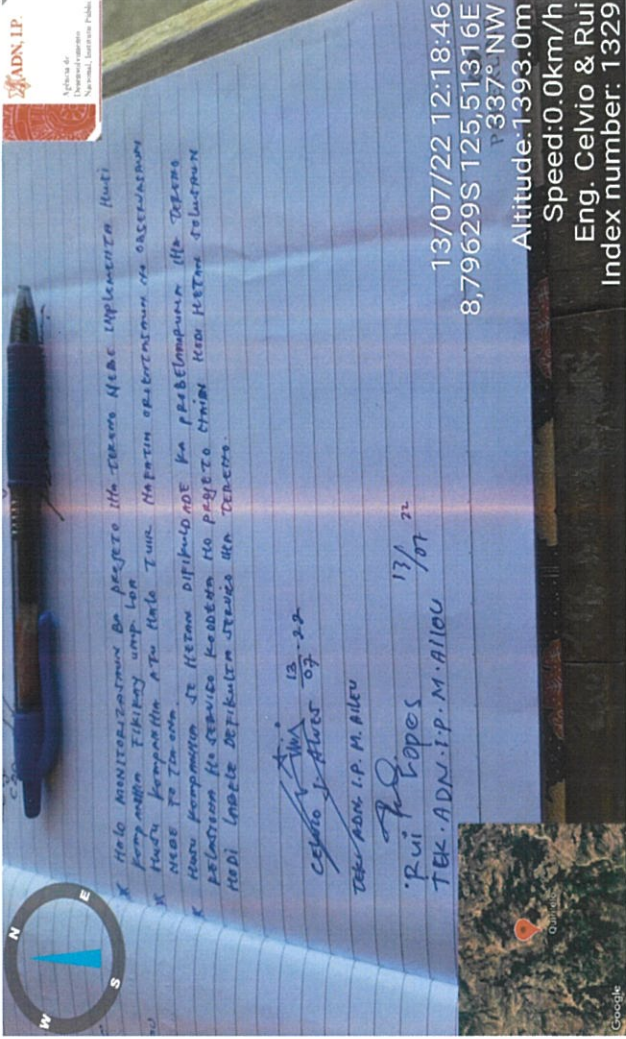INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Kirlelo - Lacro Chainage 0+000 - 11+300, Aileu Municipality				
Kompanha : Fikikay Unip. Lda				
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun
I	13/07/2022	Aileu / Aileu Villa	Rui Lopes & Celvio J. Alves	Eng. ITI ADN Aileu
				
			13/07/22 12:18:46 8,79629S 125,51316E 337° NW Altitude: 1393.0m Speed: 0.0km/h Eng. Celvio & Rui Index number: 1329	
			INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
			Asinatura	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (AVL - 23)

Summary

Roads Name : Kirielo - Lacio
Contractor : Fikway Unip. Lda
Contract No. : MPW - W - 210147
Contract Value : \$ 339,829.64

Pay item No.	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS PREVIOUS MAIO 2022		PROGRESS MONITORING JUNE 2022			PROGRESS MONITORING PROJECT	
		CONTRACT AMOUNT (\$)	RELATIVE WEIGHTAGE %	AMOUNT (\$)	%	21/06/2022		%	Progres Phisic Up To Date	
						AMOUNT (\$)	AMOUNT (\$)		AMOUNT (\$)	%
R-01	General	\$ 6,875.00	2.02%	\$ 2,400.00	0.71%	\$ 462.50	\$ 2,862.50	0.14%	\$ 2,862.50	0.84%
R-03	Earth work	\$ 73,511.02	21.63%	\$ 67,832.38	19.96%	\$ -	\$ 67,832.38	0.00%	\$ 67,832.38	19.96%
R-05	Sub-base, Base and Pavament	\$ 60,398.77	17.77%	\$ 19,907.29	5.86%	\$ -	\$ 19,907.29	0.00%	\$ 19,907.29	5.86%
R-08	Structures	\$ 120,900.85	35.58%	\$ 44,836.38	13.19%	\$ 38,562.13	\$ 83,398.52	11.35%	\$ 83,398.52	24.54%
R-10	Dayworks	\$ 140.00	0.04%	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 20,570.80	6.05%	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 250.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)	\$ 282,646.44	83.17%	\$ 134,976.05	39.72%	\$ 39,024.63	\$ 174,000.68	11.48%	\$ 174,000.68	51.20%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 28,264.64	8.32%	\$ 13,497.61	3.97%	\$ 3,902.46	\$ 17,400.07	1.15%	\$ 17,400.07	5.12%
C	General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 22,255.23	6.55%	\$ 9,951.00	2.93%	\$ 2,430.00	\$ 12,381.00	0.72%	\$ 12,381.00	3.64%
D	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 6,663.33	1.96%	\$ 3,168.49	0.93%	\$ 907.14	\$ 4,075.64	0.27%	\$ 4,075.64	1.20%
E	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 339,829.64	100.00%	\$ 161,593.15	47.55%	\$ 46,264.24	\$ 207,857.39	13.61%	\$ 207,857.39	61.17%

Prepara Husi :

Prepara Husi :

Verifica Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Celso J. Alves)

(Eng Rui Lopes)

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)

(Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas)

Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

ANEXU C1 (RE - 1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 - 10+400 Dili & Aileu Municipality / 162

No. kontratu : MPW.W-1900081

Data Inspesaun : 06 / 07 / 2022

Fatin Inspesaun : Hera - Liurai

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.53766), Latetude : (E.125.69851)

End Point : Long : (S. 8.58575), Latetude : (E. 125.69991)

Naran Inspector : Rui Lopes

Celvio J. Alves

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Stone masonry – finished


Stone masonry – finished

Naruk : 20.00

Naruk : 20.00 m

Luas Area : 0.350 m²

Vol. = 7.00 m³

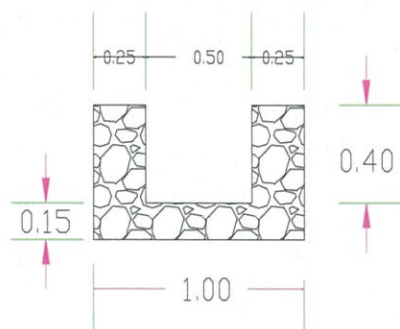

ANEXU C1 (RE - 1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 -
10+400 Dili & Aileu Municipality / 162

No. kontratu : MPW.W-1900081

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Fill and compact

Naruk = 200.00 m

Fill and compact

Naruk : 200.00 m

Luan : 0.50 m

Mahar : 0.12 m

Vol. = 12.00 m³



ANEXU D (RE - 1)

REPÚBLICA DE DILÍ MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Asinatura				
Naran projeto : Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 - 10+400 Dili & Aileu Municipality / 162 Kompanha : Nautetu I, II Unipessoal Lda									
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público OBJET-USAUN / REKOMENDASAUN MONITORIASAUN PASRETO INA TERPATO NABE IMPLEMENTA HUKU KOMPANIA NOUTETU II UNIP. LDA. HUKU ATU HUKU TATA NABATIN REKOMENDASAUN NABE ORIENTA TADAMA. HUKU KOMPANIA ATA PREPARA DOKUMENTAL HUKU HUKU PASAMENTU BA IPC DUA-MAI. HUKU KOMPANIA SE HUKU DITULONDE KA PROBLEMA PAMP UTA TERETO PETAUNAN HO SEWICO KORDENAS HO PROGETO ANAN HUKU HUKU ISULASUN HUKU LADOLE DITULITA SEWICO UTA TERETO LIU-LIU BA PASAMENTU 06/07/22 16:50:46 8,56242S 125,71526E 150° SE Altitude: 645.0m Speed: 0.0km/h Eng. Celvio & Rui Index number: 1313 Rui Lopes 06/07/2022 Celvio J. Alves 06/07/2022			



ANEXU C2 (Re - 1)

Name of the Road , Hera - Remexio Road
Contractor , Nautetu I, II, Unipessoal, Lda.
KM. 10.4

Backup Data

Pay item No.	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS PREVIOUS JUNE 2022		PROGRESS MONITORING JULY 2022		PROGRESS MONITORING PROJECT	
		AMOUNT (\$)	% Billed	AMOUNT (\$)	% Billed	AMOUNT (\$)	% Billed	Progres Phisic Up To Date	
								AMOUNT (\$)	% Billed
R-01	General items	\$ 20,295.81	4.10%	3,450.00	0.70%	\$ -	0.00%	\$ 3,450.00	0.70%
R-02	Drainage	\$ 3,617.12	0.73%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
R-03	Earth work	\$ 36,595.65	7.40%	9,373.88	1.90%	277.92	0.06%	\$ 9,651.80	1.95%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 21,431.67	4.33%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
R-08	Structure	\$ 297,087.36	60.07%	262,047.89	52.99%	628.95	0.13%	\$ 262,676.84	53.11%
R-10	Dayworks	\$ 110.00	0.02%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 15,336.99	3.10%	8,526.46	1.72%	-	0.00%	\$ 8,526.46	1.72%
R-13	General expenses	\$ 9,365.00	1.89%	6,941.25	1.40%	-	0.00%	\$ 6,941.25	1.40%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	0.04%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Total		\$ 404,039.61	81.70%	290,339.49	58.71%	906.87	0.18%	\$ 291,246.36	58.89%
R-14-01	Profit (net cost x %) ; 10%	\$ 40,403.96	8.17%	29,033.95	5.87%	90.69	0.02%	\$ 29,124.64	5.89%
R-17-01	Overheads (supervision and risk) net cost x % ; 10%	\$ 40,403.96	8.17%	29,033.95	5.87%	90.69	0.02%	\$ 29,124.64	5.89%
R-19-01	Tax ((net cost + profit + overhead) x 2 %)	\$ 9,696.95	1.96%	6,968.15	1.41%	21.76	0.00%	\$ 6,989.91	1.41%
Grand Total		\$ 494,544.48	100.00%	355,375.53	71.86%	1,110.01	0.22%	\$ 356,485.54	72.08%

Prepara Husi :

(Eng. Celvio J. Alves)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Prepara Husi :

(Eng. Rui Lopes)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Verifika Husi :

(Eng. Renigio da C. S. do Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

ANEXU C1 (ALV – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Rehabilitation of Remexio to Lacle Sta 0+000-20+000 Package
I Aileu Municipality

No. kontratu : SSS / 139 / MOPTC - 2017

Data Inspesaun : 18 – 07 - 2022

Fatin Inspesaun : Remexio

Koordinadas :

Start Point : Long : S. -8.61182, Latetude: E. 125.66034

End Point : Long : S. -8.61741, Latetude: E. 125.76524

Naran Inspector : 1. Eng. Rui Lopes

2. Eng. Celvio Justino Alves

Sketch & Foto Desenho



Sketch Item servisu :

Kompania stock hela material iha tereno
atu kontinua fali servico

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

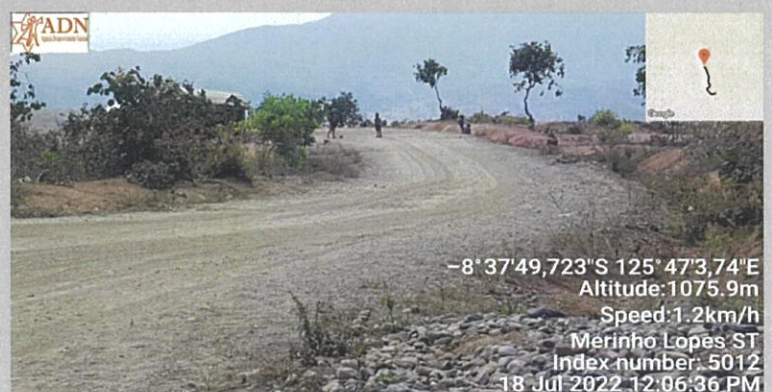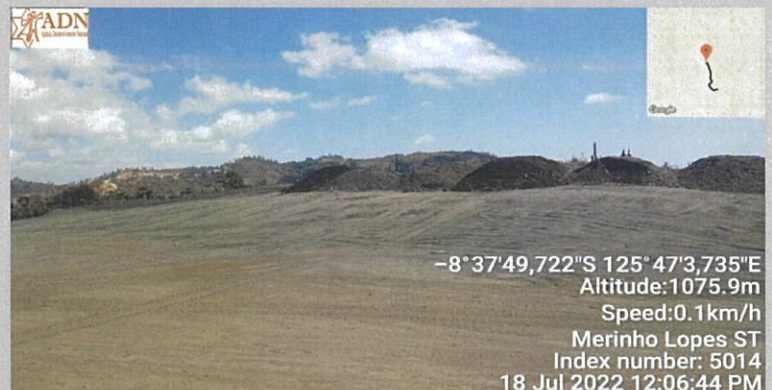

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Stone Masonry for RGP 1000mm Diameter



ANEXU C1 (RE - 3)

Back-up Data

Naran Projeto : **Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality**

No. kontratu : **MPW-W-210068**

Data Inspeção : **06 / 07 / 2022**

Fatin Inspeção : **Hera - Liurai**

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.557405), Latetude : (E.125.709941)

End Point : Long : (S. 8.562408), Latetude : (E. 125.715361)

Naran Inspector : **Rui Lopes**

: **Celvio J. Alves**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Cement concrete
pavement - plum concrete

Naruk : 80 m

Luan : 2.00 m


Mahar : 0.12 m

= 18.00 m³

Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Cement concrete pavement - plum concrete

Naruk : 80 m

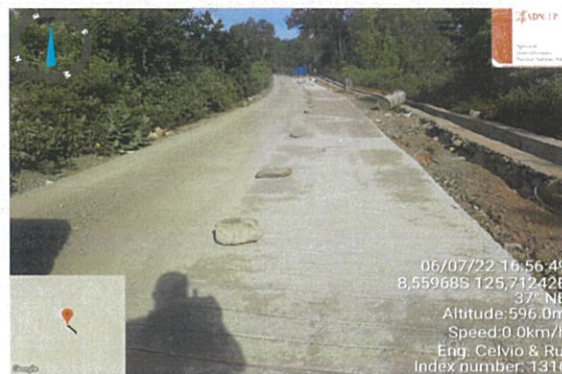

Naran projeto : Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality

Kompanha : Lonacca Unip.Lda

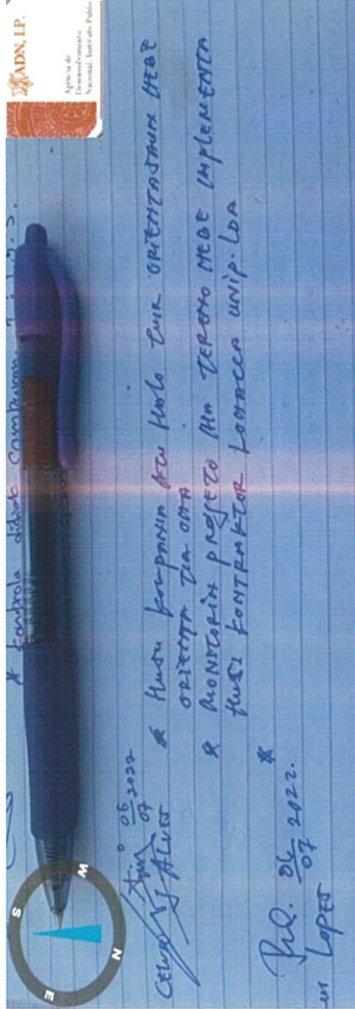No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	7/06/2022	Aileu / Remexio, Liurai	Rui Lopes & Celvio J. Alves	Eng. ITI ADN Aileu		 06/07/22 16:51:47 8,56245S 125,71528E 162° S Altitude: 631.0m Speed: 0.5km/h Eng. Celvio & Rui Index number: 1315	 

ANEXU C2 (Re - 3)

NAME OF PROJECT : SPOT IMPROVEMENT HERA - LIURAI STAR 4+00 - 10+400 DILI
LOCATION OF PROJECT AND AILEU MUNICIPALITY : HERA - LIURAI DILI - AILEU
NAME OF CONTRACTOR : LONACCA UNIPessoal LDA



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VILA VERDE, CONSELHO MUNICIPAL



Backup Data

ITEM NO.	ITEM DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS PREVIOUS JUNE 2022		PROGRESS MONITORING JULY 2022			PROGRESS MONITORING PROJECT			REMARKS
		Amount (USD)	% Billed	Cost (US)	% Billed	Jul-22		Progres Phisic Up To Date				
						Cost (US)	% Billed	Cost (US)	% Billed			
1	General	\$ 1,780.00	0.79%	\$ 450.00	0.20%	\$ -	0.00%	\$ 450.00	0.20%			
2	Drainage	\$ 44.00	0.02%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
3	Earth work	\$ 9,319.22	4.13%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
4	Sub-base, Base and Pavament	\$ 1,998.38	0.89%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
5	Structures	\$ 148,158.85	65.64%	\$ 27,284.84	12.09%	\$ 7,854.00	3.48%	\$ 35,138.84	15.57%			
6	Dayworks	\$ 182.00	0.08%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
7	Routine maintenance	\$ 7,458.00	3.30%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
8	Provisional sum	\$ 2,000.00	0.89%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
9	Security	\$ 1,440.00	0.64%	\$ 240.00	0.11%	\$ -	0.00%	\$ 240.00	0.11%			
10	Project team	\$ 14,820.00	6.57%	\$ 1,000.00	0.44%	\$ -	0.00%	\$ 1,000.00	0.44%			
11	Safety and protection	\$ 5,249.50	2.33%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
12	Meetings	\$ 120.00	0.05%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
13	Ceremonial costs	\$ 300.00	0.13%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
14	Mineral fees	\$ 11,324.99	5.02%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
A	Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)	\$ 170,940.45	75.73%	\$ 27,734.84	12.29%	\$ 7,854.00	3.48%	\$ 35,588.84	15.77%			
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 17,094.04	7.57%	\$ 2,773.48	1.23%	\$ 785.40	0.35%	\$ 3,558.88	1.58%			
C	General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 33,254.49	14.73%	\$ 1,240.00	0.55%	\$ -	0.00%	\$ 1,240.00	0.55%			
D	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 4,425.78	1.96%	\$ 634.97	0.28%	\$ 172.79	0.08%	\$ 807.75	0.36%			
E	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 225,714.76	100.00%	\$ 32,383.29	14.35%	\$ 8,812.19	3.90%	\$ 41,195.48	18.25%			

Prepara Husi :

Rui Lopes
(Eng. Rui Lopes)

Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Prepara Husi :

Carla J. Alves
(Eng. Carla J. Alves)

Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Verifica Husi :

Remigio da C. do Santos
(Eng. Remigio da C. do Santos)


Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Sertifika Husi :

Maia Freitas
(Eng. Emerenciana Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Naran projeto : R4D Rural Road Maintenance Fahisoï - Fadabloko Chainage 0+000 - 8+200, Namalesu - Faturilau Chainage 0+000 - 12+500, Fahisoï - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hautoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+500
Municipality Aileu / 162

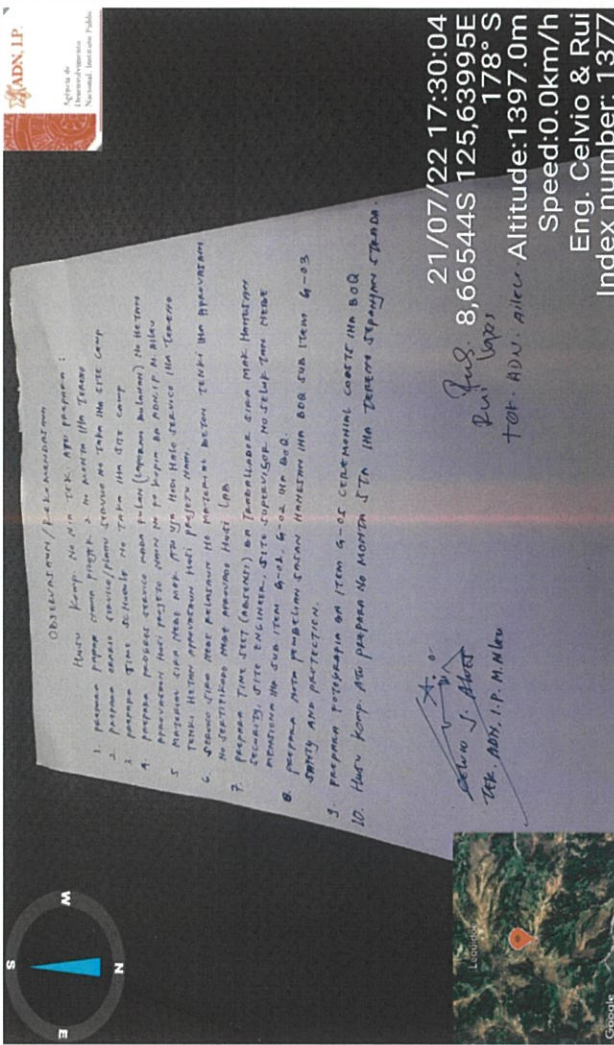No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	21/7/2022	Aileu / Lequidoe	Celvio J. Alves	Eng. ITI ADN Aileu			 



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (LE - 3)

Summary

Suko, Namalesu, Asbilitoh, Berleu, Faturilao, Fahisoi, Maumeta, Fahisoi.

Hautoho & Fadabloko

Roads Name : Namalesu-Faturilao, Fahisoi-Dairilouta, Fahisoi-Fadabloko & Hautoho-Liquica

Contractor : Emmanuel Milenial Lda

Contract No. : MPW - W - 190103

Posto Administrative: Liqueedoe and Remixio

Municipality: Aileu

Pay item No.	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS PREVIOUS JANUARY 2022		PROGRESS MONITORING JULY 2022		PROGRESS MONITORING PROJECT	
		CONTRACT AMOUNT (\$)	RELATIVE WEIGHTAGE	AMOUNT	%	AMOUNT	%	Progres Phisic Up To Date	
								AMOUNT	%
R-01	General	\$ 2,055.00	1.20%	\$ 1,355.00	0.79%	\$ 125.00	0.07%	\$ 1,480.00	0.86%
R-02	Drainage	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-03	Earth work	\$ 7,539.10	4.39%	\$ 5,177.73	3.02%	\$ 1,548.31	0.90%	\$ 6,726.04	3.92%
R-08	Structures	\$ 100,896.24	58.77%	\$ 60,117.04	35.02%	\$ 13,053.07	7.60%	\$ 73,170.12	42.62%
R-10	Dayworks	\$ 242.05	0.14%	\$ 242.05	0.14%	\$ -	0.00%	\$ 242.05	0.14%
R-11	Routine maintenance	\$ 25,257.98	14.71%	\$ 19,989.50	11.64%	\$ 1,425.00	0.83%	\$ 21,414.50	12.47%
R-13	General expenses	\$ 4,275.50	2.49%	\$ 3,791.00	2.21%	\$ 218.25	0.13%	\$ 4,009.25	2.34%
R-15	Provisional sum	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Total - net cost		\$ 140,265.87	81.70%	\$ 90,672.32	53%	\$ 16,369.64	10%	\$ 107,041.96	62.35%
R-14-01	Profit (net cost x %) ; 10%	\$ 14,026.59	8.17%	\$ 9,067.23	5.28%	\$ 1,636.96	0.95%	\$ 10,704.20	6.23%
R-17-01	Overheads (supervision and risk) net cost x %, 10%	\$ 14,026.59	8.17%	\$ 9,067.23	5.28%	\$ 1,636.96	0.95%	\$ 10,704.20	6.23%
R-19-01	Tax ((net cost + profit + overhead) x 2 %)	\$ 3,366.38	1.96%	\$ 2,176.14	1.27%	\$ 392.87	0.23%	\$ 2,569.01	1.50%
Total-gross cost		\$ 171,685.42	100.00%	\$ 110,982.92	64.64%	\$ 20,036.43	11.67%	\$ 131,019.36	76.31%

Prepara Husi :

(Eng. Celvino J. Alves)

Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Prepara Husi :

(Eng Rui Lopes)

Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)

Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le-7)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Namalesu - Faturilao Chainage
0+000 - 14+000

No. kontratu : MPW - W - 21027

Data Inspesaun : 21 / 07 / 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe, Namalesu, Asbilitoho, Berleu and Faturilao

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.709305), Latetude : (E.125.713868)

End Point : Long : (S. 8.712861), Latetude : (E. 125.682038)

Naran Inspector : 1. Celvio Justino Alves


2. Rui Lopes

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Kompania laiha atividade servico iha tereno

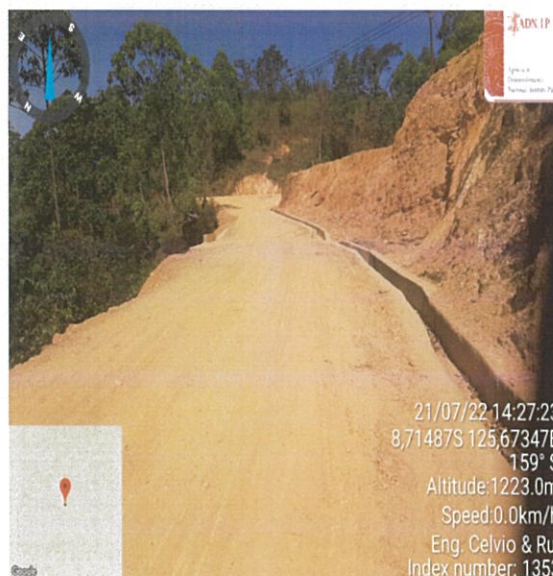

ANEXU C1 (LE - 9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi- Dairlouta Chainage
0+000 - 5+000 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-CD-RFQ-21012

Data Inspesaun : 21 / 07 / 2022

Fatin Inspesaun : Fahisoi – Fadabloko, Hautoho-Liquica, Lequidoe

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.69148), Latetude : (E.125.63555)

End Point : Long : (S. 8.68859), Latetude : (E. 125.69591)

Naran Inspector : 1. Celvio J. Alves


2. Rui Lopes

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Kompania stock hela material iha treno hodi
kontinua servico

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

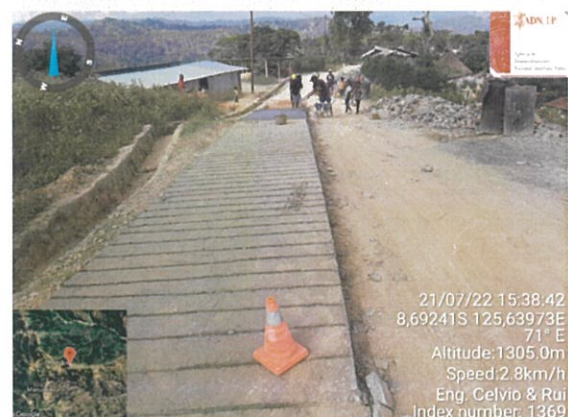

ANEXU C1 (LE - 8)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality**

No. kontratu : **MOP-CD-NCB-21026**

Data Inspesaun : 21 / 07 / 2022

Fatin Inspesaun : Fahisoi – Fadabloko, Hautoho-Liquica, Lequidoe

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.66548), Latetude : (E.125.63993)

End Point : Long : (S. 8.68859), Latetude : (E. 125.69591)

Start Point : Long : (S. 8.67332), Latetude : (E. 125.67745)

End Point : Long : (S. 8.66514), Latetude : (E. 125.69477)

Naran Inspector : **1. Celvio J. Alves**



2. Rui Lopes

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Kompania stock hela material iha treno hodi
kontinua servico

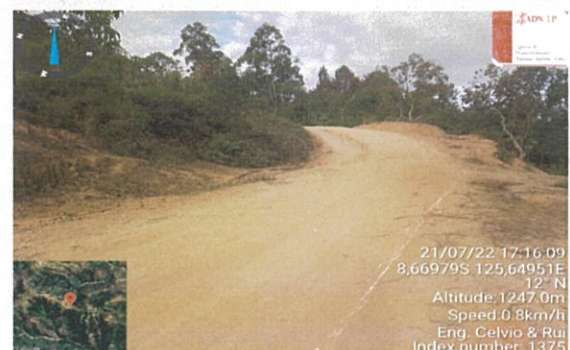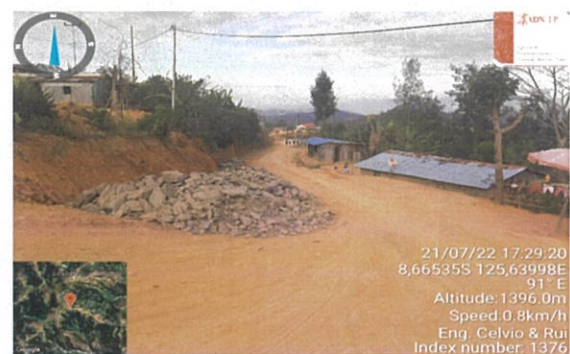

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO ECONOMICO E DESENVOLVIMENTO  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Investimentos Públicos							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Celvio Justino Alves						2022																																
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Julho																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
AILEU VILA (AVL)	1	Rehabilitation of Sloi Tocohuli roads Aileu	Mendith UnipLda	SSS/061/MOPTK-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Projeto refere PHO 2019 Falta Retensaun	
							Actual																																
	2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000 - 8+000 Municipiu Aileu	Caviq Unipessoal Lda in joint venture with Summines Unip. Lda	NCB/020/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	22	R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	Aileu ba On Unip. Lda	MOP-CD-RFQ-21011	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
AILEU VILA (AVL)	23	R4D Rural Road Spot Improvement Kirlalo - Lacio Chainage 0+000 - 11+300 Aileu Municipality	Fikikay Unipessoal, Lda	MOP-W-NCB-21024	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
LAULARA (LA)	3	Rehabilitation of Beducu Sarlala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.43	Mejori, Lda	SSS/0103/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	Rural Roads Maintenance Fahisoli - Fadabloco Sta 0+000-8+200. Hotoho - Liqica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Ormai Sta 0+000 - 7+300 in Aileu Municipality	Remexio Furak Unip. Lda	MPWTC-CD-170004	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	8	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madaleno - Lisimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumatu - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	Fin Los unip. Lda	MPW-W190086	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
LAULARA (LA)	10	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumatu - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	Emmanuel Milenial	MPW-W-210141	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
REMEXIO (RE)	1	Rural Road Periodic Maintenance Hero - Remexio Sta 0+000 - 10+400 Dili & Aileu Municipality / 162	Nautetu I. II Unipessoal Lda	MPW-W-1900081	LM-BS	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Road Rehabilitation of Remexio to Lacio Sta 0+000-20+000 Package I Aileu Municipality	Mendith UnipLda	SSS/139/MOPTC-2017	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	3	Spot Improvement Hera - Litrai Sta 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	Lonacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
LEQUIDOE (LE)	2	R4D MPW Rural Roads rehabilitation Project in Aileu Bereleu manucasa Package 2 Sta. 3+500-13+000	Seiara Irapihi Unip. Lda	MPWTC-W-013016	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	3	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadabloco Chainage 0+000 - 8+200. Namaleno - Faturilau Chainage 0+000 - 12+500. Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hutoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+300 Municipality Aileu / 162	Emmanuel Milenial	MPW-W-190103	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	Rural Roads Periodic Maintenance Aituhauhan - Manufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300. Routine Maintenance Coula Udo Kirlalo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu / 162	LNG Unip. Lda	MPW-W-190174	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Namaleno - Faturilau Chainage 0+000 - 14+000	LNG Unip. Lda	MPW-W-210149	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloco Chainage 0+000 - 9+000 and Hutoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+300 Aileu Municipality	Blackbird Unip. Lda JV Chaicailala Unip. Lda	MOP-CD-NCB-21026	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																

Note.

	Planu Periode inspesaun iha tereinu		Implementa Planu Periode Inspesaun iha Tereinu		Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili		Inspesaun Processu Pagamentu
---	-------------------------------------	--	--	---	--------------------------------------	---	------------------------------

Prepara Husi:

 (Eng. Celvio Justino Alves)
 Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun ADN, I.P.

Sertifika Husi:

 (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.

Aprova Husi:

 (Eng. Amario Aguiar)
 Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORÇAMENTO VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, LP Agência de Desenvolvimento Público, Serviços Públicos							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Naran Eng.	Celvio Justino Alves						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Julio																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AILEU VILA (AVL)	1	Rehabilitation of Sioi Tocohuli roads Aileu	Mendith UnipLda	SSS/061/MOPTK-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Note.

Planu Període Inspesun iha tereinu

Implementa Planu Període Inspesun iha Tereinu

Relatorio avaliasun mensal iha Dili

Inspesun Proceso Pagamentu

Prepara Husi
(Eng. Celvio Justino Alves)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun ADN, LP

Sertifica Husi
(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, LP

Aprov. Husi
(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN, LP

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Naran Eng.	Rui Lopes						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Jullo																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
AILEU VILA (AVL)	1	Rehabilitation of Sioi Tocolu roads Aileu	Mendith UnipLda	SSS/061/MOPTK-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Note:



Planu Periode inspesaun iha terenu



Implementa Planu Periode Inspesaun iha Terenu



Relatorio avaliasuan mensal iha Dili



Inspesaun Proceu Pagamentu

Prepara Husi:


(Eng. Rui Lopes)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun ADN, I.P.

Sertifika Husi:


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.

Aprova Husi:


(Eng. Januario Lima Guterres)

Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.

 MINISTÉRIO DO PLANO E COORDENAMENTO  ADN, LP Agência de Desenvolvimento Económico e Social							PLANU INSPESAUN																																	
Naran Eng.	Rui Lopes						2022																																	
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Jullo																															OBS	
AILEU VILA (AVL)	1	Rehabilitation of Sloi Tocohuli roads Aileu	Mendith UnipLda	SSS/061/MOPTK-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Projeto refere PHO 2019 Falta Retensaun	
	2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Talforleu - Kolihobo Chainage 0+000 - 8+000 Municipiu Aileu	Caviq Unipessoal Lda in joint venture with Sunnines Unip. Lda	NCB/020/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
	22	R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli- Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	Aileu ba Oin Unip. Lda	MOP-CD-RFQ-21011	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	23	R4D Rural Road Spot Improvement Kirlalo - Lacio Chainage 0+000 - 11+300, Aileu Municipality	Fikikay Unipessoal, Lda	MOP-W-NCB-21024	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
LAULARA (LA)	3	Rehabilitation of Bedacu Sariala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	Mejori, Lda	SSS/0103/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Rekomendasaun ikus 84.68% 2017 Falta Retensaun Baseia Progres Rekomendasaun (PHO)	
	7	Rural Roads Maintenance Fahisoi - Fadabloco Sta 0+000-8+200, Hotoho - Liqica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Ormai Sta 0+000 - 7+500 in Aileu Municipality	Remexio Furak Unip Lda	MPWTC-CD-170004	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
	8	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Lisimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	Fin Los unip.Lda	MPW-W190086	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	10	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	Emmanuel Milenial	MPW-W- 210141	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
REMEXIO (RE)	1	Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 - 10+400 Dili & Aileu Municipality / 162	Nautetu I, II Unipessoal Lda	MPW.W-1900081	LM-BS	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Projeto refere abandona husi Compania iha kedas fulan Dezembro 2021	
	2	Road Rehabilitation of Remexio to Lacio Sta 0+000-20+000 Package I Aileu Municipality	Mendith UnipLda	SSS/139/MOPTC-2017	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
	3	Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	Lonacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
LEQUIDOE (LE)	2	R4D MPW Rural Roads rehabilitation Project in Aileu Bereleu mamucasa Package 2 Sta. 3+500-13+000	Seiara Irapiiti Unip. Lda	MPWTC-W-015016	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Rekomendasaun ikus 97.45% iha 2017 (PHO)	
							Actual																																	
	3	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadabloco Chainage 0+000 - 8+200, Namaleu - Faturilau Chainage 0+000 - 12+500, Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hutoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+500 Municipality Aileu / 162	Emmanuel Milenial	MPW-W-190103	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Projeto Refere Parado Hela	
							Actual																																	
	4	Rural Roads Periodic Maintenance Aituhaularan - Mamufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300, Routine Maintenance Coula Udo Kirlalo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu / 162	LNG Unip. Lda	MPW-W-190174	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PHO iha Fulan Janeiro 2022 Falta Retensaun		
							Actual																																	
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Namaleu - Faturilao Chainage 0+000 - 14+000	LNG Unip. Lda	MPW - W - 210149	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
8	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloco Chainage 0+000 - 9+000 and Hutoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality	Blackbird Unip. Lda JV Chaicailala Unip. Lda	MOP-CD-NCB-21026	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																	
9	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi- Dairlouta Chainage 0+000 - 5+000 Aileu Municipality	Raco Lda.	MOP-CD-RFQ-21012	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																	
TOTAL PROJETO ON-GOING																																								

Note.

Planu Periode inspessun iha Terenu

Implementa Planu Periode Inspessun iha Terenu

Relatorio avaliasun mensal iha Dili

Inspessun Proceu Pagamentu

Prepara Husi



(Eng. Rui Lopes)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun ADN, LP

Sertifica Husi



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Avaliasun de Qualidade, ADN, LP

Aprova Husi



(Eng. Januario Maia Guterres)

Adjunto Director Executivo, ADN, LP



PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Silvino Domingos Rita Rebelo Soares							2022																																	
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Julho																															OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
AILEU VILA (AVL)	6	Rehabilitation of MSS Office in Aileu	Borudo Matak	RDTL:47/MSS/DNPFAL-DAD/X/2016	LM	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	Plan																																	
							Actual																																	
	7	Programma Turismo Komunitario 2014 Seloi / Malere	Miror Raefusa	RDTL/SEFOPE/DNA/DNE/2013-0003	LM-TP	SEFOPE	Plan																																	
							Actual																																	
	11	Konstrusaun, Vedasaun no Jardim ba Edificio DTPSC	Kablaki Engineering Unip. Lda		LM	MINISTERIO JUSTICA	Plan																																	
							Actual																																	
	12	New Construction of Isolation Building	Mortiles Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-257	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																	
	15	Konstrusaun salas de aulas 3 + Eskritorio + Laboratorio ESTV Aileu	Mortiles Unip.Lda	NCB:01/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUCASAUN	Plan																																	
							Actual																																	
	16	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBC 3 Ciclo Seloi	MEJD PKRIE EBC 3 CICLO SELOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	17	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EPE Mantane	MEJD PKRIE EPE MANTANE	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	18	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBF Lacro	MEJD PKRIE EBF LACLO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Pre-Escolar Cotobauro	MEJD PKRIE PRE-ESCOLAR COTABAURO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Teblor	MEJD PKRIE EBF TEBLOR	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Darahe	MEJD PKRIE EBF DARAHE	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESGAM Aileu	MEJD PKRIE ESGAM AILEU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
24	New Install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Madabeno to Sarlala Aileu District	Aldepo Murak Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000162	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
						Actual																																		
25	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku to Besilau and Fatuk Hun - Aileu District	Oxavijoneli unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000179	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
						Actual																																		
36	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
						Actual																																		
37	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
						Actual																																		
38	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	Cadila Supplie Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000163	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
						Actual																																		

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE R.D.T.V. MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares						2022																																
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Julho																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
LEQUIDOE (LE)	43	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Fatuberli, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	45	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	46	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Urdadan	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	47	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note: Planu Periode inspesaun iha tereinu Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili Inspesaun Proceso Pagamentu

Prepara Husi :

(Silvino D. R. Rebelo Soares)
Eng. Electrificacão, ADN - I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN - I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN - I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of of helath Post and doctor s House Building
No. kontratu : RDTL-MS-DNA-ICB-21-073

Data Inspesaun : 28 Julho 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe , Faturilau

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item cat tembok doctor house

Volume pinta nebe maka kompanhia halo iha
tereno ba uma doctor house rua ne volume
hamutuk 281,22 m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Altitude: 643m
Merinho Lopes 31
Index number: 5233
21 Jul 2022 12:11:58 PM



ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of of helath Post and doctor s House Building
No. kontratu : RDTL-MS-DNA-ICB-21-073

Sketch & Foto Desenho

Kompanhia mota odamatan ba iha toilet total
iha unit 2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Kalen

Volume pinta nebe maka kompanhia halo iha
tereno ba uma doctor house rua ne volume
hamutuk 281,22 m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

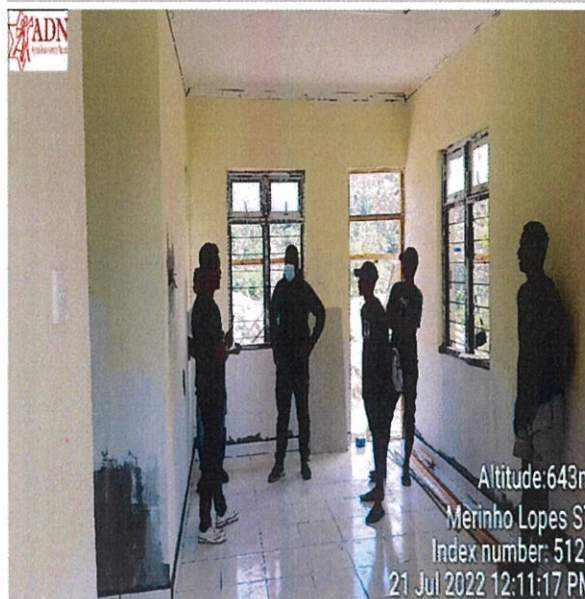



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO



ANEXU D (Avl - 2)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction of of helath Post and doctor s House Building

Kompanha : Kartini Unip,Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Posisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	21/07/2022	Leguidoe, Aileu.	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T'ADN	1	1 inspesaun ba pagamentu 3 + lusa ba kompanha atu amentu ben waramet ba lusa azeron * lusa kompanha lusa lusa us buill drawing ba us build Quantity ba item nebe maka lusa mudansa. + lusa ba kompanha atu lusa amentu azeron servisu + nafatua servisu lusa brentosoun nebe maka lusa. <i>M. A. A.</i> 21/07/2022	
II	21/07/2022	Leguidoe, Aileu.	Emanuel Bas Leian fernandes	T. M Saude	2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional

ANEXU C2 (Le - 2)

PROJECT NAME : NEW CONSTRUCTION OF HEALTH POST AND DOCTOR'S HOUSE BUILDING

LOCATION : AILEU - LEQDOE/FAURILAU MUNICIPALITY-TIMOR LESTE

PROJECT OWNER: MINISTRY OF HEALTH

SUMMARY

No	WORK DESCRIPTION	AMOUNT	WEIGHT	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		ADN ESTIMATED	
				AMOUNT	WEIGHT	AMOUNT	WEIGHT	AMOUNT	WEIGHT
A. BUILDING A HEALTH POST									
1	PREPARATION WORKS	\$ 4.803,37	1,60%	\$ 2.617,12	0,87%	\$ -	0,00%	\$ 2.617,12	0,87%
2	FOUNDATION WORKS	\$ 4.809,88	1,60%	\$ 4.809,88	1,60%	\$ -	0,00%	\$ 4.809,88	1,60%
3	CONCRETE WORKS	\$ 21.259,39	7,09%	\$ 17.164,50	5,72%	\$ 4.094,89	1,37%	\$ 21.259,39	7,09%
4	WALL INSTALLATION AND PLASTERING	\$ 20.287,86	6,76%	\$ 18.062,33	6,02%	\$ 2.225,53	0,74%	\$ 20.287,86	6,76%
5	CARPENTRY WORKS	\$ 9.792,00	3,26%	\$ 4.896,00	1,63%	\$ 4.896,00	1,63%	\$ 9.792,00	3,26%
6	ROOFING WORKS	\$ 21.405,58	7,14%	\$ 17.829,31	5,94%	\$ 3.576,27	0,78%	\$ 20.165,58	6,72%
7	CEILING WORKS	\$ 6.996,92	2,33%	\$ 4.082,96	1,36%	\$ 2.913,96	0,97%	\$ 6.996,92	2,33%
8	FLOOR TILE WORKS	\$ 7.193,85	2,40%	\$ 3.758,91	1,25%	\$ 3.434,94	0,95%	\$ 6.595,78	2,20%
9	ELECTRICAL WORKS	\$ 8.208,60	2,74%	\$ -	0,00%	\$ 1.488,83	0,50%	\$ 1.488,83	0,50%
10	SANITATION WORKS	\$ 7.251,56	2,42%	\$ 333,01	0,11%	\$ 6.918,55	0,88%	\$ 2.957,69	0,99%
11	PAINTING WORKS	\$ 3.103,63	1,03%	\$ 1.033,9	0,00%	\$ 2.069,74	0,78%	\$ 2.327,74	0,78%
12	Appliances and Detaching Work	\$ 2.117,74	0,71%	\$ -	0,00%	\$ 886,69	0,30%	\$ 886,69	0,30%
13	TOWER WORKS	\$ 5.919,74	1,97%	\$ -	0,00%	\$ 294,45	0,10%	\$ 294,45	0,10%
14	Provisional Sum for Furniture	\$ 6.500,00	2,17%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
15	FINAL CLEARING	\$ 100,00	0,03%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TOTAL BUILDING A		\$ 128.772,13	43,36%	\$ 73.554,03	24,42%	\$ 26.925,89	8,69%	\$ 100.479,92	33,50%
B. BUILDING B DOCTOR HOUSE									
1	PREPARATION WORKS	\$ 576,80	0,19%	\$ 576,80	0,19%	\$ -	0,00%	\$ 576,80	0,19%
2	FOUNDATION WORKS	\$ 2.251,48	0,75%	\$ 2.251,48	0,75%	\$ -	0,00%	\$ 2.251,48	0,75%
3	CONCRETE WORKS	\$ 11.196,77	3,73%	\$ 10.762,92	3,59%	\$ -	0,00%	\$ 10.762,92	3,59%
4	WALL INSTALLATION AND PLASTERING	\$ 6.979,69	2,33%	\$ 6.979,69	2,33%	\$ -	0,00%	\$ 6.979,69	2,33%
5	STAIRS WORKS	\$ 729,88	0,24%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
6	CARPENTRY WORKS	\$ 5.312,00	1,77%	\$ 1.221,00	0,41%	\$ 3.491,00	1,16%	\$ 4.712,00	1,57%
7	ROOFING WORKS	\$ 8.555,09	2,85%	\$ 7.452,04	2,48%	\$ 1.103,06	0,37%	\$ 8.555,09	2,85%
8	CEILING WORKS	\$ 3.027,04	1,01%	\$ 1.989,98	0,66%	\$ 1.037,06	0,35%	\$ 3.027,04	1,01%
9	FLOOR TILE WORKS	\$ 2.910,20	0,97%	\$ 1.079,96	0,36%	\$ 1.830,24	0,43%	\$ 2.368,49	0,79%
10	ELECTRICAL WORKS	\$ 3.620,00	1,21%	\$ -	0,00%	\$ 497,25	0,17%	\$ 497,25	0,17%
11	SANITATION WORKS	\$ 6.753,86	2,25%	\$ 1.000,51	0,33%	\$ 5.753,35	0,61%	\$ 2.820,32	0,94%
12	PAINTING WORKS	\$ 1.108,80	0,37%	\$ -	0,00%	\$ 776,16	0,26%	\$ 776,16	0,26%
13	FURNITURE	\$ 4.000,00	1,33%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TOTAL BUILDING B 1 UNIT		\$ 57.021,60	19,01%	\$ 33.314,37	11,11%	\$ 10.012,87	3,34%	\$ 43.327,23	14,45%
2 UNIT BUILDING DOCTOR HOUSE		\$ 114.043,20	38,02%	\$ 66.628,73	22,21%	\$ 20.025,74	6,68%	\$ 86.654,47	28,89%
C. Provisional Sum for External Works									
TOTAL CONSTRUCTION COST		\$ 15.800,00	5,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
CONTRACTOR FEE (10% x I)		\$ 25.879,53	8,63%	\$ 14.818,28	4,74%	\$ 4.691,63	1,57%	\$ 18.714,39	6,24%
Over head		\$ 4.315,00	1,44%	\$ 2.326,25	0,74%	\$ -	0,00%	\$ 3.725,25	1,08%
TAX (2% x (I+II+III))		\$ 5.779,80	1,93%	\$ 3.148,75	0,98%	\$ 1.033,94	0,34%	\$ 4.181,68	1,39%
CONTINGENCY 2%		\$ 5.175,91	1,73%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TOTAL PROJECT/CT CONSTRUCTION		\$ 299.945,58	100,00%	\$ 168.586,03	53,54%	\$ 52.429,71	17,50%	\$ 213.545,74	71,10%

Prepared by:

Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Município Aileu

Verified by:

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior na Projeto Edifício no Be e
Mos

Approved by:

Eng. Emerenciana da Costa Mala
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



ANEXU C1 (AVL - 6)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Campas, Gate, Levelling Area in Garden of Herois Aileu.

No. kontratu : 37/MACLN/IX/2021

Data Inspesaun : 28 Julho 2021

Fatin Inspesaun : Aileu Villa , Aisirimou

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.719208862 Latetude : 125.570387095

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Back Fill Ba Area Rate

Back fill nebe maka kompanhia halao iha tereno
hamutuk 157 m3


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

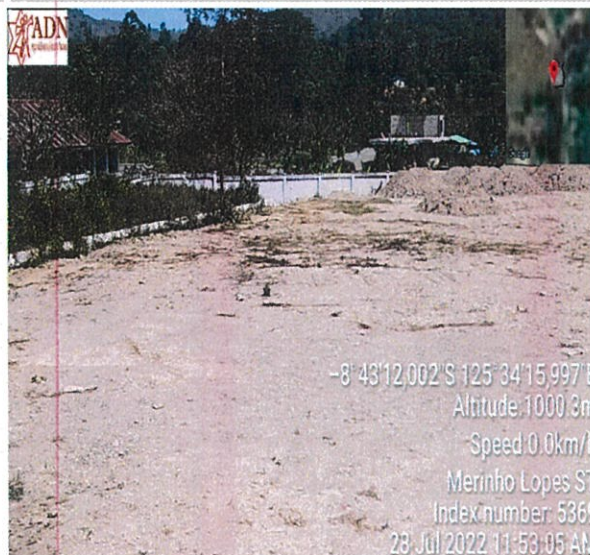

ANEXU C1 (AVL - 6)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Campas, Gate, Levelling Area in Garden of Herois
Aileu.
No. kontratu : 37/MACLN/IX/2021

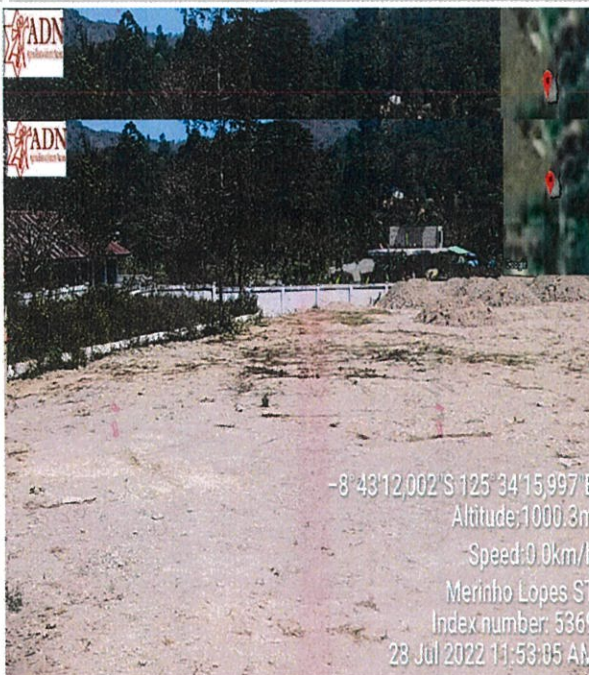Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Back Fill Ba Area Rate	
Sketch Item Back Fill Ba Area Rate	
Back fill nebe maka kompanhia halao iha tereno volume hamutuk 157 m3	
	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ANEXU C1 (AVL - 6)


Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Campas, Gate, Levelling Area in Garden of Herois Aileu.

No. kontratu : 37/MACLN/IX/2021

Sketch Item servisu cat gapura rate

Total volume nebe mak kompanhia
implemeta iha tereno volume hamtuk 189 m2

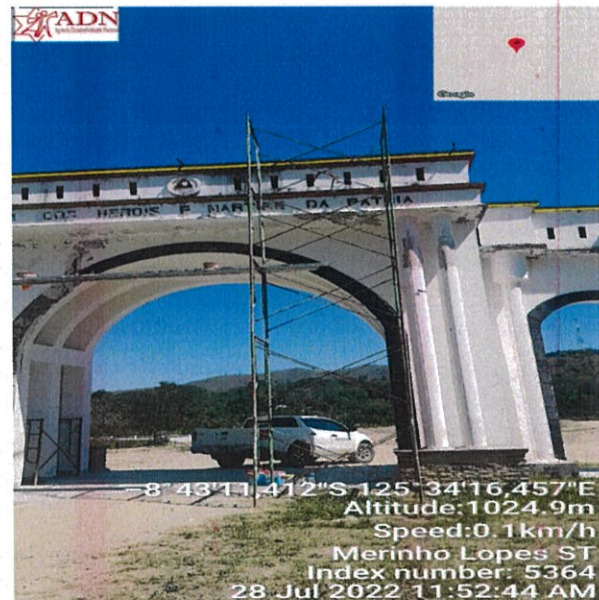

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu **Leveling Area Campas**

Naran projeto : New Construction of Campas, Gate And Leveling

Kompanha : Caramé Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	28/07/2022	Aileu Villa, Aileu.	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T'ADN	1 2 3 4 5
II	28/07/2022	Aileu Villa, Aileu.	Sergio Pineiro	T. Kompanhia	1 2 3 4 5
III					1 2 3 4 5
IV					1 2 3 4 5
V					1 2 3 4 5



MINISTÉRIO DO PLANO
F O R D E N A M E N T O
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projectu : New Construction of Campas Gate and Leveling Area in Garden of Herois
Nam ba Projectu : Ministério Para Os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional
Fatin Projectu : Aisirimou, Aileu - Timor Leste

ANEXU C2 (ALV - 6)

SUMMARY BILL OF QUANTITIES

ADN ESTIMATED									
NO	DESCRIPTION	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		UP TO DATE BILLING		AMOUNT	%
		AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%		
A	PERSIAPAN	\$ 5.695,00	4,79%	\$ 4.257,50	3,58%	\$ 50,00	0,04%	\$ 4.307,50	3,63%
B	KONSTRUKSI KUBURAN/RATE	\$ 30.655,44	25,81%	\$ 11.671,23	9,83%	\$ -80,43	-0,07%	\$ 11.590,80	9,76%
C	DRAINAGE	\$ 25.525,80	21,49%	\$ 25.525,80	21,49%	\$ -	0,00%	\$ 25.525,80	21,49%
D	STABILISASI TANAH & PERLENGKAPAN	\$ 32.044,63	26,98%	\$ 25.319,63	21,32%	\$ 362,50	0,31%	\$ 25.682,13	21,62%
I	TOTAL A + B + C + D	\$ 93.920,87	79,08%	\$ 66.774,17	56,22%	\$ 332,07	0,28%	\$ 67.106,23	56,50%
II	CONTRACTOR FEE (10% X A)	\$ 9.392,09	7,91%	\$ 6.677,42	5,62%	\$ 33,21	0,03%	\$ 6.710,62	5,65%
III	OVERHEAD	\$ 3.920,00	3,30%	\$ 2.940,00	2,48%	\$ -	0,00%	\$ 2.940,00	2,48%
IV	TAX 2% X (I+II+III)	\$ 2.144,66	1,81%	\$ 1.527,83	1,29%	\$ 7,31	0,01%	\$ 1.535,14	1,29%
V	CONTINGENCY (10% X I)	\$ 9.392,09	7,91%	\$ -	0,00%	\$ -	-	\$ -	0,00%
VI	GRAND TOTAL (I + II + III + IV + V)	\$ 118.769,70	100%	\$ 77.919,41	65,61%	\$ 372,58	0,31%	\$ 78.291,99	65,92%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior da Projeto Edificio no Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade

ANEXU C1 (AVL- 5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Cnstruction Office CSS of Aileu District
No. kontratu : No: RDTL : 33/MSSI/ DGAF/DNA/XI/2021

Data Inspesaun : 14, 28 Julho 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Aisirimou

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item Galian tanah ba pondas moru

Sketch :

Computation by AutoCAD

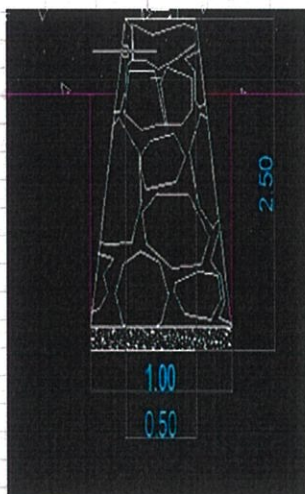

-8°43'18.821"S 125°33'58.019"E
Aileu
Altitude: 883m
Merinho Lopes ST
Index number: 4927
14 Jul 2022 11:40:48 AM

QTY						
	Cross Section				Length (m)	Volume (m.Sq)
	t	L	LA	Area		
	2,50	1,00	0,50	1,875	-	42,29
pasangan pondasi batu kali						

ANEXU C1 (AVL- 5)

Back-up Data


Naran Projeto
No. kontratu

: New Cnstruction Office CSS of Aileu District
: No: RDTL : 33/MSSI/ DGAF/DNA/XI/2021

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item pondasi ba post security


Sketch:
Computation by AutoCAD

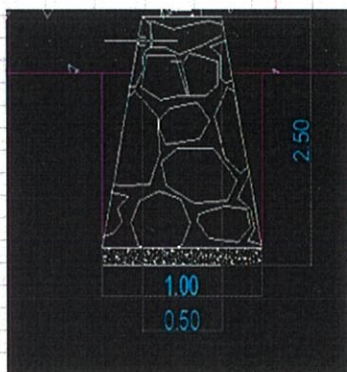

QTY							
Cross Section					Length (m)	Volume (m.cu)	Remarks
t	l	p	Area				
					-	13,74	pasangan Pondasi Batu kali

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

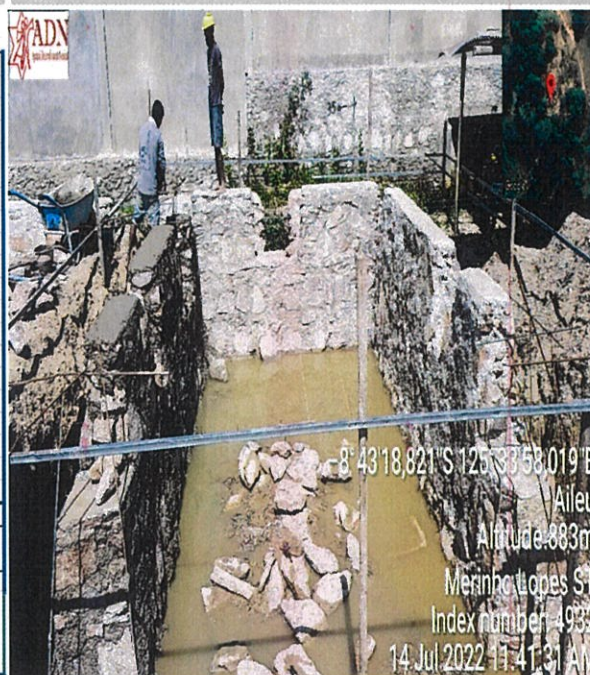

Observasaun iha tereno no Foto Aktual


ANEXU C1 (AVL- 5)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu


: New Cinstuction Office CSS of Aileu District
: No: RD TL : 33/MSSI/ DGAF/DNA/XI/2021

Sketch Item servisu pambesian ba Sloof

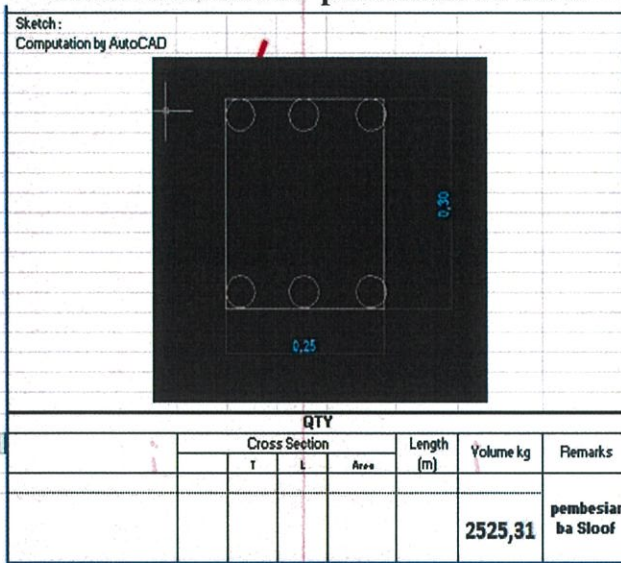


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu pambesian Sloof post sekurity

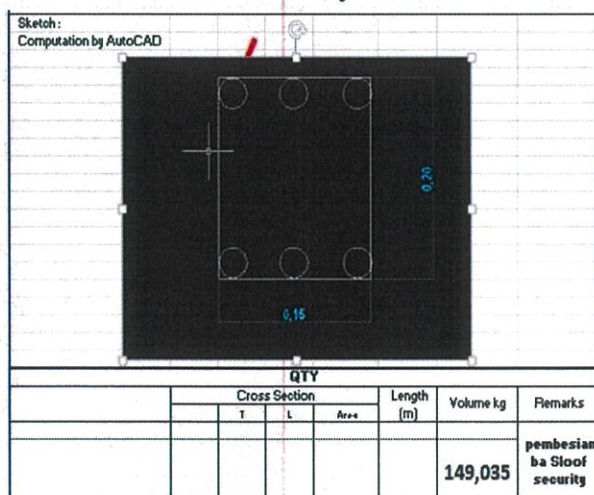

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

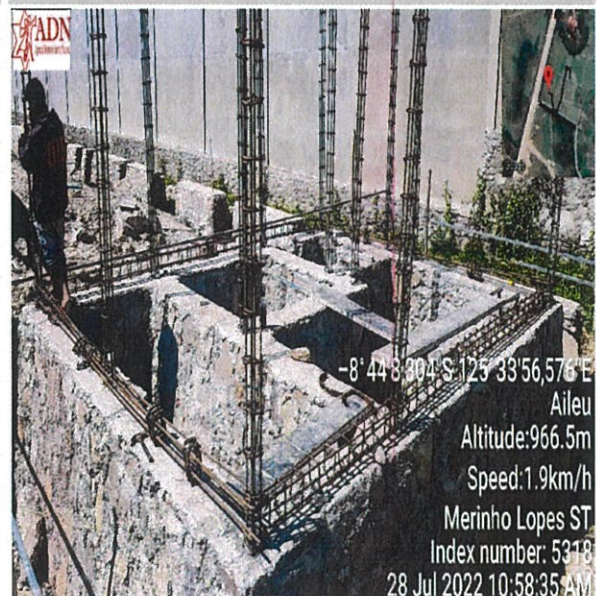



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.
Instituto Nacional de Estatística
Nacional Institute of Statistics

ANEXU D (Avl - 5)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction Office CSS Of Aileu District

Kompanha : Kevinia Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	28/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T'ADN	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
II					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
III					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
IV					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
V					1	
					2	
					3	
					4	
					5	


ANEXU D (Avl - 5)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction Office CSS Of Aileu District

Kompanha : Kevinia Unip.Lda

Asinatura

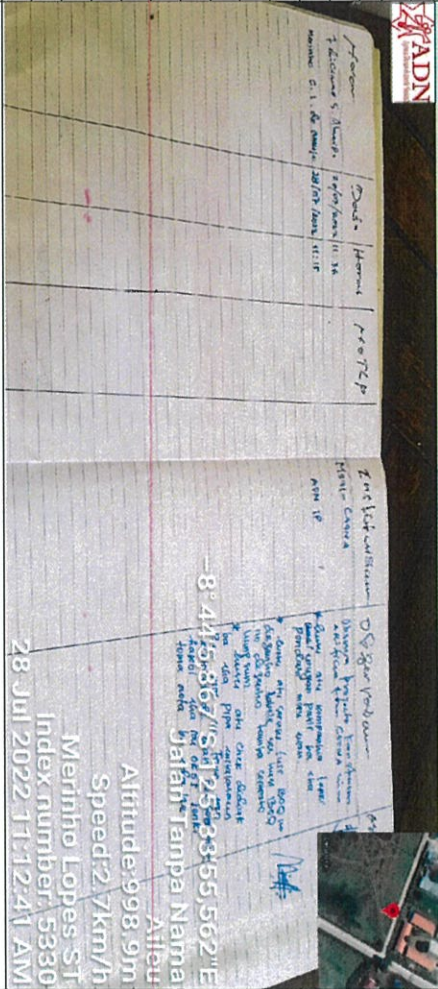No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					Asinatura
I	28/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T'ADN	1						
					2						
					3						
					4						
					5						
II					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
III					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
IV					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
V					1						
					2						
					3						
					4						
					5						



MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional

Anexu C2 (ALV - 5)

: New Construction Office CSSM – Aileu
: Ministry Solidarity Social
: Aileu Villa, Aileu Municipality – Timor Leste

Naran Projetu
Nain ba Projetu
Fatin

SUMMARY

NO	DESCRIPTION	AMOUNT	PREVIOUS BILLING AMOUNT	WEIGHT	THIS BILLING AMOUNT	WEIGHT	UP TO DATE AMOUNT	WEIGHT
A OFFICE								
I	PREPARATION WORKS	\$ 13.574,50	\$ 6.824,50	1,60%	\$ -	0,00%	\$ 6.824,50	1,60%
II	EARTH WORKS	\$ 12.268,34	\$ 10.264,60	2,40%	\$ -25,65	-0,01%	\$ 10.238,94	2,40%
III	MASONRY WORKS	\$ 53.876,80	\$ 19.036,63	4,46%	\$ -	0,00%	\$ 19.036,63	4,46%
IV	CONCRETE WORKS	\$ 81.271,20	\$ 4.829,94	1,13%	\$ 5.174,94	1,21%	\$ 10.004,87	2,34%
V	ROOFING WORKS	\$ 19.104,02	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
VI	CEILING WORKS	\$ 20.223,77	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
VII	CARPENTRY WORKS	\$ 11.855,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
VIII	ELECTRICAL WORKS	\$ 14.033,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
IX	SANITATION WORKS	\$ 13.209,93	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
X	PAINTING WORKS	\$ 3.850,57	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
B LANDSCAPE WORKS		\$ 94.245,62	\$ 40.955,66	9,59%	\$ 5.149,28	1,21%	\$ 46.104,95	10,79%
PARK AND OFFICE PLATFORM WORKS								
I	PRELIMINARY WORKS	\$ 38.009,23	\$ 1.019,52	0,24%	\$ -	0,00%	\$ 1.019,52	0,24%
II	PARK ELECTRICAL WORKS	\$ 3.179,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
III	FENCE WORKS	\$ 53.057,39	\$ 5.476,42	1,28%	\$ 5.237,87	1,23%	\$ 10.714,29	2,51%
C SECURITY POST TWO UNIT		\$ 32.085,31	\$ 6.495,94	1,52%	\$ 5.237,87	1,23%	\$ 11.733,81	2,75%
I	EARTH AND SAND WORKS	\$ 1.065,73	\$ -	0,00%	\$ 147,93	0,03%	\$ 147,93	0,03%
II	WALL MASONRY AND PLESTER WORKS	\$ 9.359,81	\$ -	0,00%	\$ 1.236,67	0,29%	\$ 1.236,67	0,29%
III	CONCRETE WORKS	\$ 5.396,67	\$ -	0,00%	\$ 369,64	0,09%	\$ 369,64	0,09%
IV	FLOOR WORKS	\$ 1.322,09	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
V	CARPENTRY WORKS	\$ 1.858,40	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
VI	ROOFING AND CEILING WORKS	\$ 3.757,99	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
VII	SANITATION WORKS	\$ 3.755,96	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
VIII	ELECTRICAL WORKS	\$ 5.184,30	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
IX	PAINTING WORKS	\$ 384,35	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
BUDGET AT COMPLETION, TOTAL(A+B+C)		\$ 369.598,07	\$ 47.451,60	11,11%	\$ 12.141,38	2,84%	\$ 59.592,98	13,95%
B	CONTRACTOR FEE (10%xA)	\$ 36.959,81	\$ 4.745,16	1,11%	\$ 1.214,14	0,28%	\$ 5.959,30	1,40%
C	OVERHEAD	\$ 4.950,01	\$ 851,00	0,20%	\$ -	0,00%	\$ 851,00	0,20%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 8.230,16	\$ 1.060,96	0,25%	\$ 267,11	0,06%	\$ 1.328,07	0,31%
E	CONTINGENCY (2% x A)	\$ 7.391,96	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
F	GRAND TOTAL	\$ 427.130,00	\$ 54.108,72	12,67%	\$ 13.622,63	3,19%	\$ 67.731,35	15,86%

prepared by :

Verify by :

Approved by :

Eng. Merinho Caco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior na Projeto Edificio no Re e Mos

Eng. Emerenciana Da Costa Mala
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao de
Qualidade



ANEXU C1 (AVL - 8)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Escritorio
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 26 Julho 2022

Fatin Inspesaun : Aileu - Villa Selo-Craik

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Servisu is tereno la lao ho razaun tamba
badaen sira sei ba koa hare ho nune
aktividade iha tereno la Lao no ekipa AND
update deit maka item nebe antes Grupo halo
ona

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (AVL - 8)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Escritorio
: Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu is tereno la lao ho razaun tamba
badaen sira sei ba koa hare ho nune
aktividade iha tereno la Lao no ekipa AND
update deit maka item nebe antes Grupo halo
ona

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (AVL - 8)

Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Escritorio
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Construção prototipo C laiha servisu iha
fatin refere hela sopi sopi seidauk servisu
tamba grupo sira fokus hela hada batako ba
escritorio

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

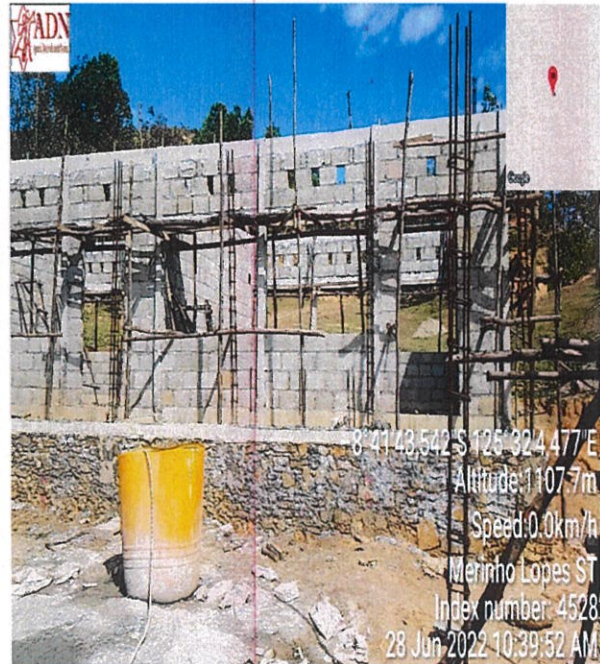

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (Avl - 8)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTOPI C)+ESCRITORIO
LOCATION : SELOI-CRAIK

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.900,00	1,25%	\$ -	0,00%	\$ 1.900,00	1,25%
2	Class Room Building C	\$ 50.575,14	\$ 14.203,69	9,34%	\$ 326,35	0,21%	\$ 14.530,03	9,56%
3	Teacher Office	\$ 67.964,02	\$ 21.048,74	13,84%	\$ 561,36	0,37%	\$ 21.610,10	14,21%
4	Provesional Sum for Site Works	\$ 21.089,95	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Total Construction Cost		\$ 142.704,11	\$ 37.152,43	24,44%	\$ 887,71	0,58%	\$ 38.040,13	25,02%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ 2.085,00	1,37%	\$ -	0,00%	\$ 2.085,00	1,37%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 152.044,11	\$ 39.237,43	25,81%	\$ 887,71	0,58%	\$ 40.125,13	26,39%

prepared by :

Verify by :

Aproved by :

Eng. Merinho Guco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio
no Be'e Mos

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Tb
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 21 Julho 2022

Fatin Inspesaun : Fahisoi - Lequedoe

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projetu refere parado hela ho razaun tamba grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere ho nunee hein pagamento sai maka foin bele halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

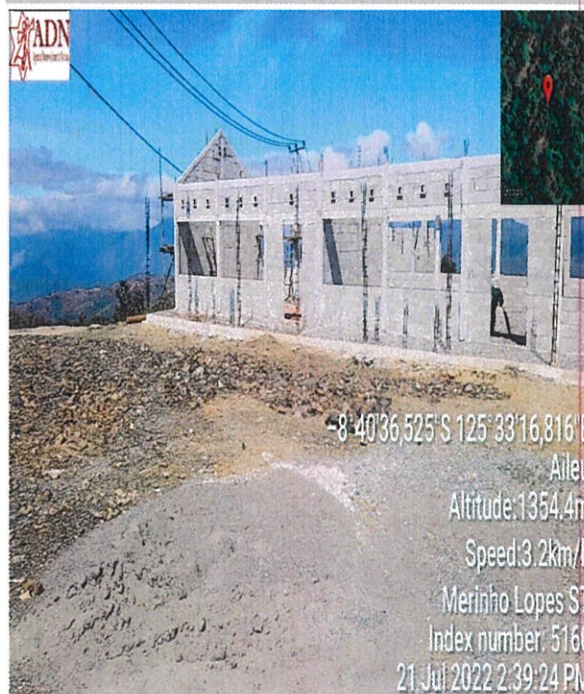



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Tb
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projetu refere parado hela ho razaun tamba grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere ho nunee hein pagamento sai maka foin bele halao fali servisu	 -8° 40'36,525" S 125° 33'16,816" E Aileu Altitude: 1354.4m Speed: 3.2km/h Merinho Lopes ST Index number: 5165 21 Jul 2022 2:39:26 PM
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu pasangan batako	 -8° 43'14,038" S 125° 39'17,425" E Altitude: 1354.4m Speed: 3.1km/h Merinho Lopes ST Index number: 5169 21 Jul 2022 2:39:57 PM

ANEXU D (LE - 2)



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C) + TB					
Kompanha : Grupo Komunitario					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	21/07/2022	Lequidoe, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T AND	1
					2
					3
					4
					5
II	21/07/2022	Lequidoe, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5

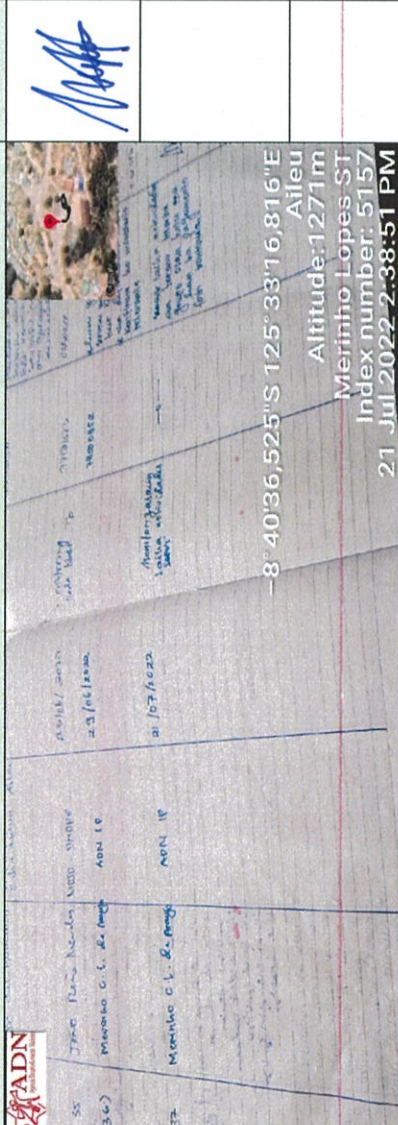

-8° 40'36,525"S 125° 33'16,816"E
 Aileu
 Altitude: 1271m
 Merinho Lopes ST
 Index number: 5157
 21 Jul 2022 2:38:51 PM



MINISTÉRIO DO PLANO
E O R D E N A M E N T O
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (LE - 2)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : FAHISOI - LEQUEDOE

SUMMARY									
NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING		
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.800,00	1,54%	\$ -	0,00%	\$ 1.800,00	1,54%	
2	Class Room Building C	\$ 56.180,86	\$ 19.809,88	16,91%	\$ 113,42	0,10%	\$ 19.923,31	17,00%	
3	Toilet Building Tb	\$ 29.383,00	\$ 9.995,20	8,53%	\$ 2.693,40	2,30%	\$ 12.688,60	10,83%	
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 19.192,29	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
	Total Construction Cost	\$ 107.831,14	\$ 31.605,08	26,97%	\$ 2.806,83	2,40%	\$ 34.411,90	29,37%	
	Overhead	\$ 6.340,00	\$ -	0,00%	\$ 2.185,00	1,86%	\$ 2.185,00	1,86%	
	Contingency	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
	Grand Total	\$ 117.171,14	\$ 31.605,08	26,97%	\$ 4.991,83	4,26%	\$ 36.596,90	31,23%	

prepared by :

Verify by :

Aproved by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Engenheiro Senior da Projeto Edificio no
Be'e Mos

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade



ANEXU C1 (ALV - 14)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Data Inspesaun : 22 Julho de 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Selo Malere

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.71344607 Latetude : 125.564061

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1. Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projetu refere parado hela ho razaun tamba grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere ho nune hein pagamento sai maka foin bele halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

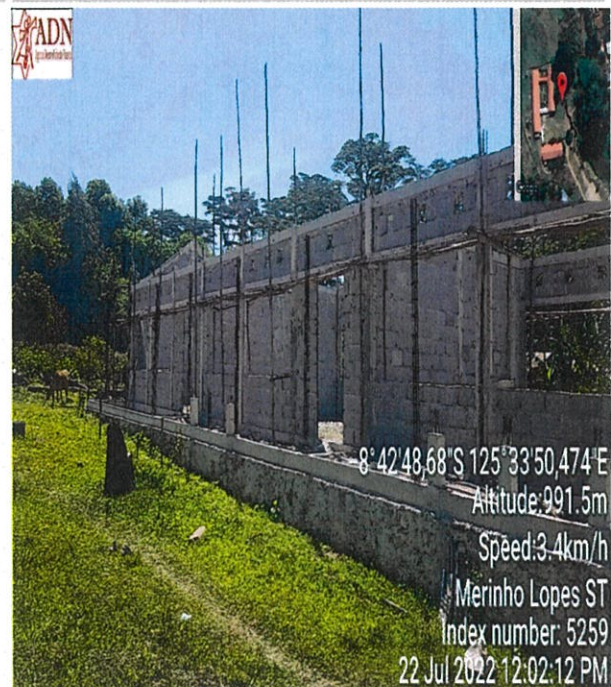



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 14)

Back-up Data


Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

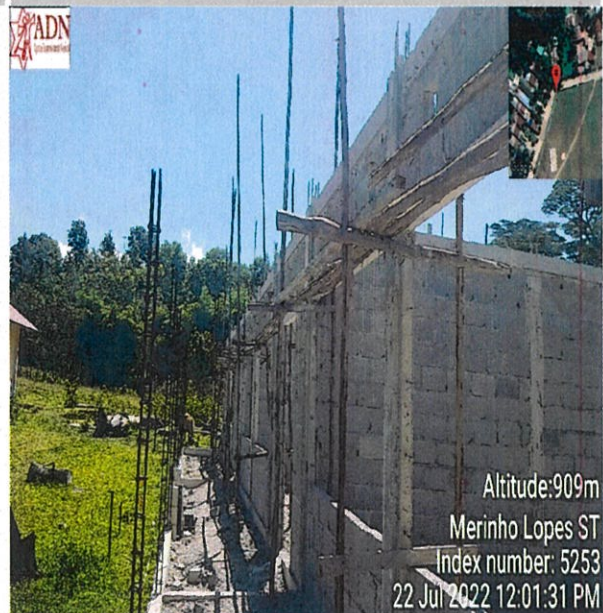


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

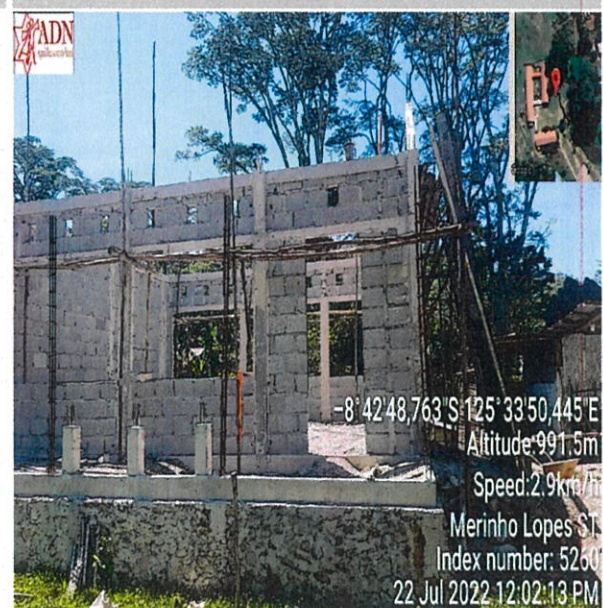



MINISTERIU ÎN PLIN
E ORDONAMENT
VIII GOVERNUL REPUBLICII MOLDOVA



ANEXU D (ALV - 14)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran proiecto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	22/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cucu Lopes de Araujo	T AND	1	grupo sira la halao servisu ba proiectu refere ho razauun katak osan hotu ona atu kontinua servisu ba proiectu refere no hein pagamento segundu maka foiu bele servisu fila faili	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	22/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Joao Dos Reis Mendes	T. MEJD	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 14)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE
LOCATION : SELOI - MALERE

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.743,75	1,24%	\$ -	0,00%	\$ 1.743,75	1,24%
2	Class Room Building C (2 Units)	\$ 113.990,70	\$ 28.642,33	20,38%	\$ 5.556,26	3,95%	\$ 34.198,59	24,33%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 14.140,08	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	Total Construction Cost	\$ 131.205,78	\$ 30.386,08	21,62%	\$ 5.556,26	3,95%	\$ 35.942,34	25,57%
	Overhead	\$ 6.340,00	\$ -	0,00%	\$ 1.755,00	1,25%	\$ 1.755,00	1,25%
	Contingency	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	Grand Total	\$ 140.545,78	\$ 30.386,08	21,62%	\$ 7.311,26	5,20%	\$ 37.697,34	26,82%

prepared by :

Eng. Merinho-Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior da Projeto Edificio no Be'e
Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



ANEXU C1 (AVL - 16)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu

No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230

Data Inspesaun : 14 20,28 Julho 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa , Aisirimou

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.719208862 Latetude : 125.570387095

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item **floor Concrete ba path way**

Floor concrete ne maka cor iha tereno 7,07 m3

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (AVL - 16)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu


No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **gording hollow 40x40**

ha Path wav

Sketch:
Computation by AutoCAD

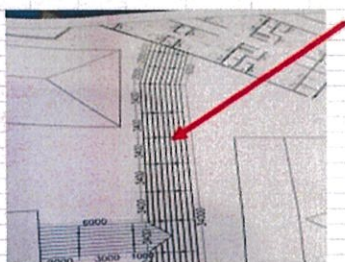

QTY						
Cross Section				Length (m)	Volume (kg)	Remarks
	T	L	Area			
	150 mm	200 mm	-	-	324,08	gording

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




Sketch & Foto Desenho

Plesteran moru

Plesteran nebe maka kompanhia halao iha
tereno total volume : 399,24 m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

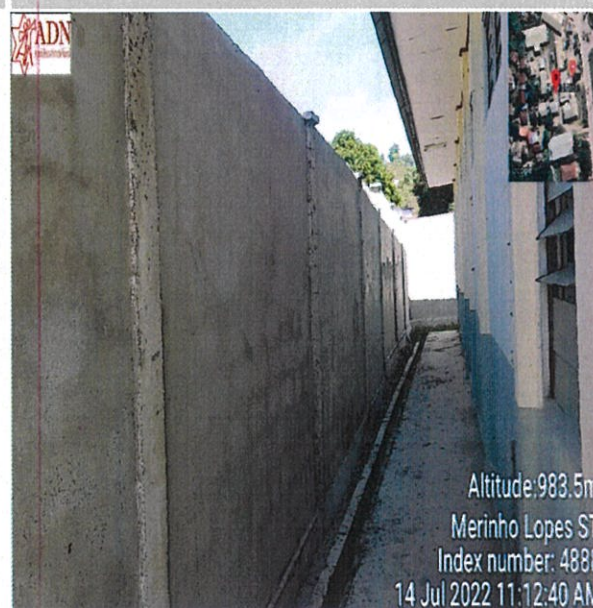

ANEXU C1 (AVL - 16)

Back-up Data


Naran Projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu

No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu zinalum path way

Sketch:
Computation by AutoCAD

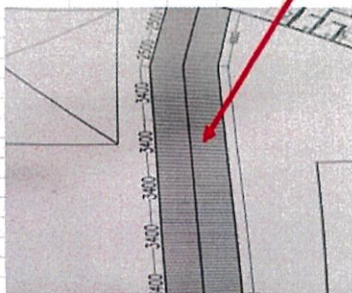

QTY						
1	Cross Section			Length (m)	Volume (m. sq.)	Remarks
	T	L	Area			
					202,98	zincalum 0.42

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

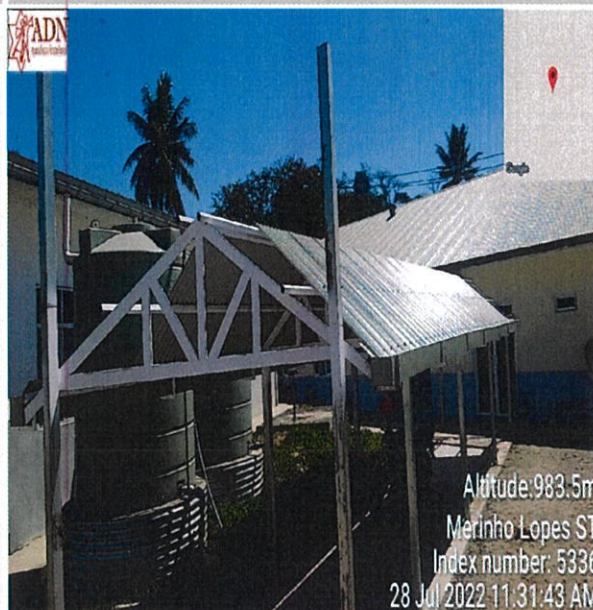


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu cat tembok ba moru

Cat tembok ho total volume nebe mak
implementa ona iha tereno hotal volume
hamutuk 1197,72 m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

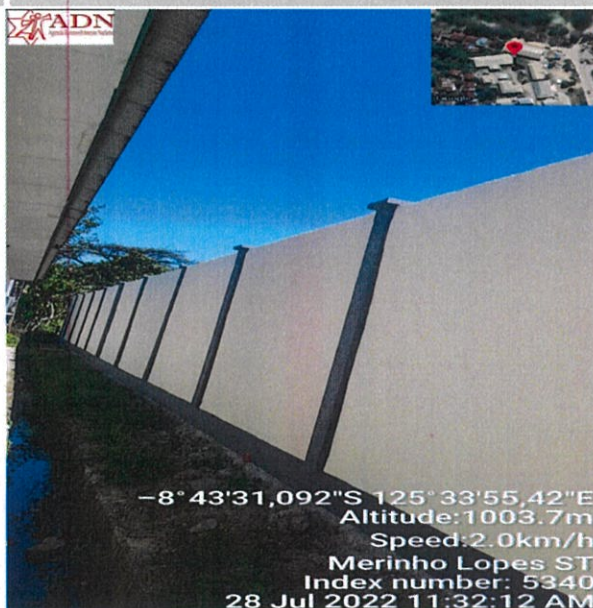

ANEXU C1 (AVL - 16)

Back-up Data


Naran Projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu

No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu cat tembok ho teralis

Sketch :
Computation by AutoCAD

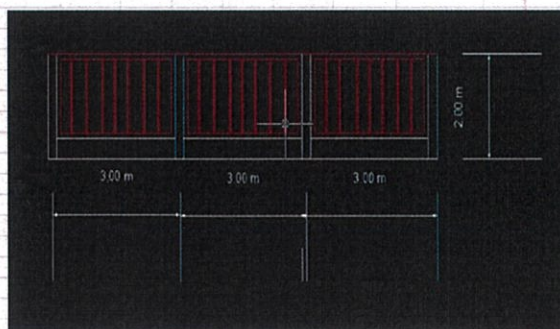

QTY					
t	Cross Section			Length (m)	Volume (m. sq)
	L	LA	Area		
2,60	0,15	0,15	0,0225		87,54
					cat steel hollow

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

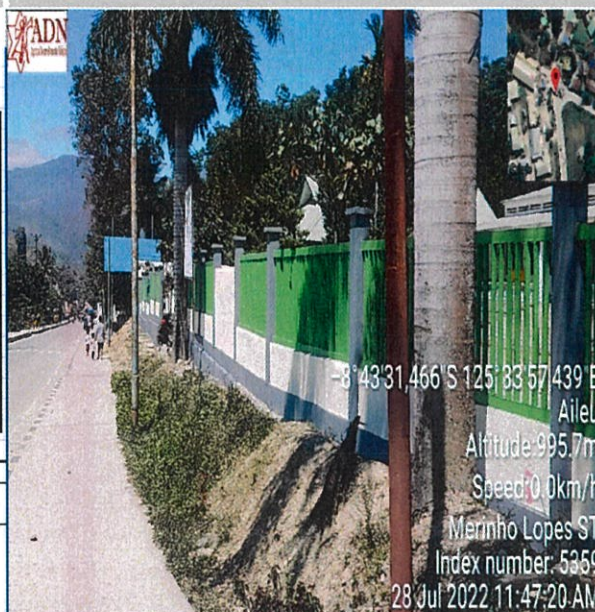

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ANEXU D (Avl - 16)



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu					
Kompanha : Behale Interprise Unip.Lda					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	14/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T 'ADN	1
					2
					3
					4
					5
II	14/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Emanuel B.F. Lelan	T. MDS	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5

[Handwritten signature]



8° 43' 19,064" S 125° 33' 57,446" E
Jalan Tappa Nampa Aileu
Altitude: 905m
Merinho Lopes
14 Jul 2022 11:09:43 AM

Naran projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu

Kompanha : Behale Interprise Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/06/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T'ADN	1	12 Merinho, C. I. de Araujo 20/07/2022	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	28/06/2022	Aileu, Aileu Villa	Emanuel B.F. Lelan	T. MDS	1		
					2		
					3		
III					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXU D (Avl - 2)



REPÚBLICA DE DILOR

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VII GONSO CONSTITUCIONAL

ADN, LP

Agência de Desenvolvimento Nacional, Territorial e Político

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN						Asinatura				
Naran projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu										
Kompanha : Behale Interprise Unip.Lda										
		INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN								
I	28/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T 'ADN	1					
					2					
					3					
					4					
					5					
II	28/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Emanuel B.F. Lelan	T. MDS	1					
					2					
					3					
					4					
					5					
III					1					
					2					
					3					
					4					
					5					
IV					1					
					2					
					3					
					4					
					5					
V					1					
					2					
					3					
					4					
					5					



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projectu : New Constructio of Fence CSI Aileu- Timor-Leste.
Fatin Projectu : CSI Aileu, Sub Distrito Aileu Vila, Distrito Aileu
Nain Projectu : Ministerio da Saude

ANEXU C2 (AVL- 16)

SUMMARY

No	WORK DESCRIPTION	AMOUNT	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
I	PREPARATION WORKS	\$ 1.834,26	\$ 1.584,26	1,20%	\$ -	0,00%	\$ 1.584,26	1,20%
II	Fundatin Works	\$ 10.041,47	\$ 10.041,47	7,58%	\$ -	0,00%	\$ 10.041,47	7,58%
III	CONCRETED WORKS	\$ 33.766,29	\$ 46.541,52	35,15%	\$ -16.092,96	-12,15%	\$ 30.448,56	22,99%
IV	Wall Installation And Plestering	\$ 35.402,78	\$ 14.599,80	11,03%	\$ 17.005,42	12,84%	\$ 31.605,21	23,87%
V	Others Works	\$ 3.102,75	\$ 439,36	0,33%	\$ -	0,00%	\$ 439,36	0,33%
VI	PATHWAY WORKS	\$ 20.080,17	\$ 4.647,53	3,51%	\$ 6.634,59	5,01%	\$ 11.282,12	8,52%
VII	Final Clearing	\$ 150,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	Construction Coast	\$ 104.377,72	\$ 77.853,94	58,79%	\$ 7.547,04	5,70%	\$ 85.400,99	64,49%
B	Contractor Fee (10%xA)	\$ 10.437,77	\$ 7.785,39	5,88%	\$ 754,70	0,57%	\$ 8.540,10	6,45%
C	Overhead	\$ 4.775,00	\$ 1.193,75	0,90%	\$ 1.193,75	0,90%	\$ 2.387,50	1,80%
D	Tax(2%(xA+B+C))	\$ 2.391,81	\$ 1.736,66	1,31%	\$ 189,91	0,14%	\$ 1.926,57	1,45%
E	Contingency (10%xA)	\$ 10.437,77	\$ 7.785,39	5,88%	\$ (7.785,39)	-5,88%	\$ -	0,00%
f	Grand Total (A+B+C+D+E)	\$ 132.420,07	\$ 96.355,14	72,76%	\$ 1.900,01	1,43%	\$ 98.255,16	74,20%

prepared by :

Eng. Merinho Curo Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior do Projeto Edificio no Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



ANEXU C1 (ALV - 11)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTO TIPO
EPE)
No. kontratu : GRUPU KOMUNITARIO

Data Inspesaun : 26 Julho2022

Fatin Inspesaun : Aileu, Selo Malere

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,69808407 Latetude : 125.53881841

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo


2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Sketch:


Computation by AutoCAD

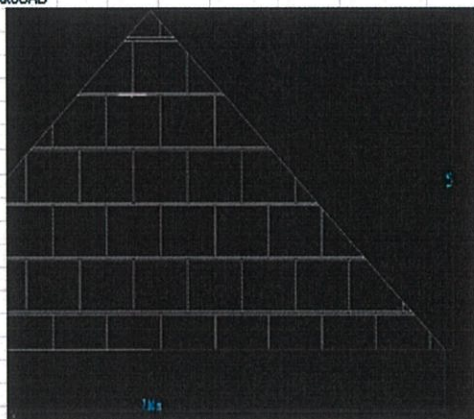

QTY

Cross Section			Length (m)	Volume (m sq.)	Remarks
T	L	Area			
				5,00	pasangan batako sopi sopi prototipo C

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

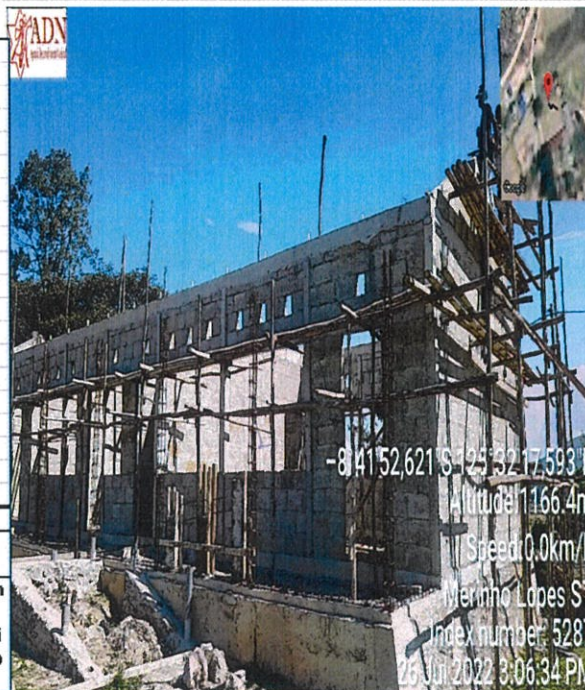

ANEXU C1 (ALV - 11)


Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTO TIPO
EPE)
No. kontratu : GRUPU KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item pasangan batako ba sopi sopi

Sketch:
Computation by AutoCAD

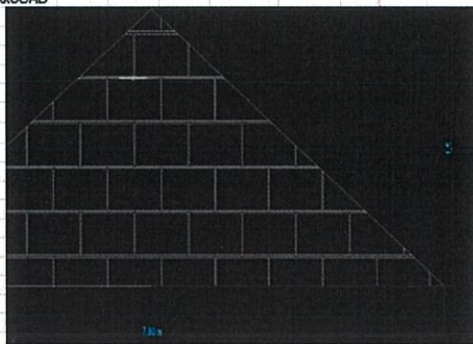

QTY						
	Cross Section			Length (m)	Volume (m sq.)	Remarks
	T	L	Area			
					5,00	pasangan batako sopi sopi prototipo C

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

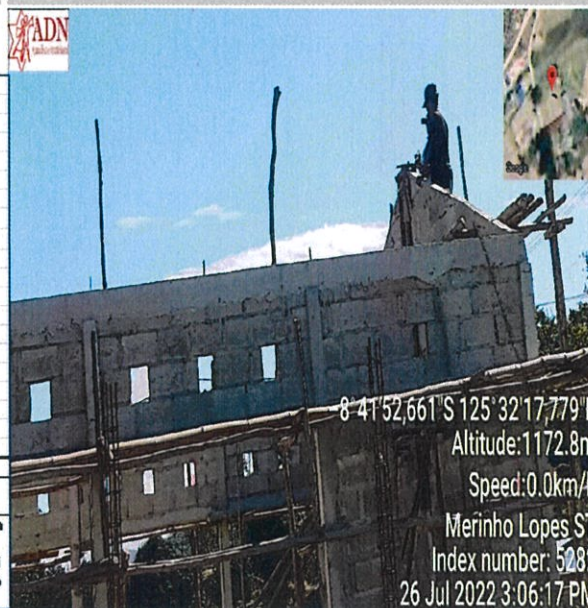

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTOTIPO EPE)				
Kompanha : Grupo Komunitario				
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun
I	26/07/2022	Aileu Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T ADN
II	26/07/2022	Aileu Villa, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD
III				
IV				
V				

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura
1	* Hium grupo atu sobu bataro nha top sopi-sopi hodi car usa besi no concrete labelo hada bataro mak full.	
2	* Hium grupo atu tenri servisu tuio orientasaun nebe mak cha.	
3	* Iha difikuldade ruma tenki konfirma ho projeto ma'in.	
4		
5		
1		
2		
3		
4		
5		
1		
2		
3		
4		
5		

Naming 26/07/2022



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 11)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTOTIPO EPE)
LOCATION : SELOI MALERE, AILEU VILA

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.800,00	2,16%	\$ -	0,00%	\$ 1.800,00	2,16%
2	Class Room Building C2	\$ 60.790,89	\$ 20.466,97	24,51%	\$ 1.626,48	1,95%	\$ 22.093,44	26,45%
3	Provisional Sum for Site Works	\$ 9.810,21	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
4	Provisional Sum for Demolition	\$ 500,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Total Construction Cost		\$ 74.176,10	\$ 22.266,97	26,66%	\$ 1.626,48	1,95%	\$ 23.893,44	28,61%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ 2.277,50	2,73%	\$ -	0,00%	\$ 2.277,50	2,73%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 83.516,10	\$ 24.544,47	29,39%	\$ 1.626,48	1,95%	\$ 26.170,94	31,34%

prepared by :

Verify by :

Aproved by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio no Be'e Mos

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade



ANEXU C1 (Le - 3)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 21 Julho 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe , Asubli Toho,Urbadan.

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projetu refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 3)

Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

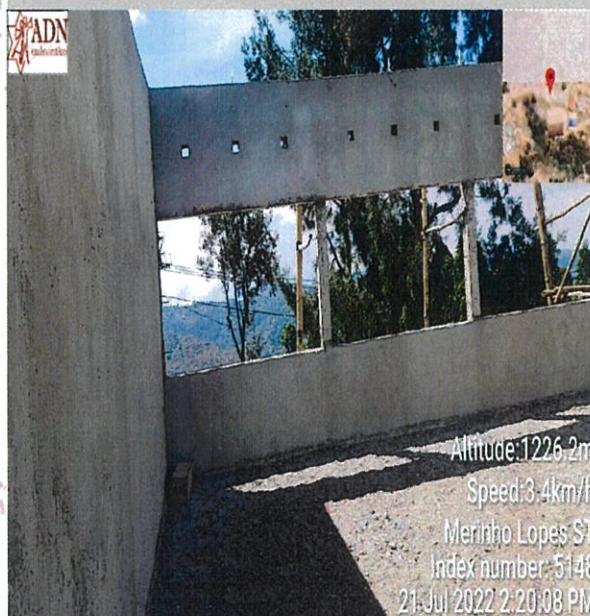


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

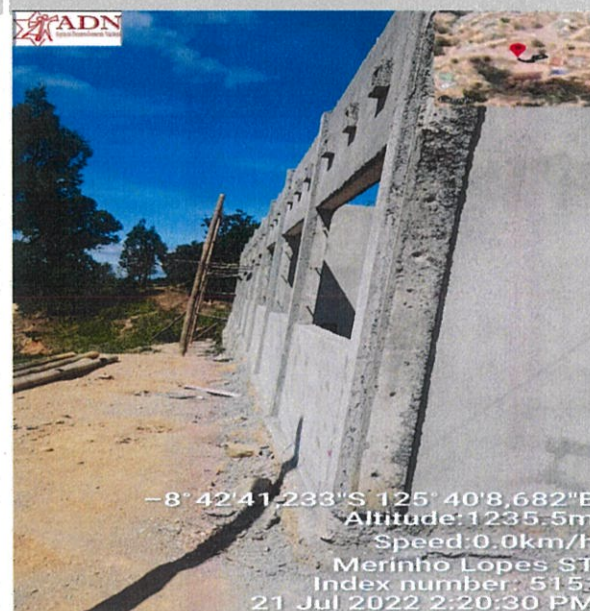

ANEXU D (LE - 3)



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	21/07/2022	Liquidoe, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T AND	1	Ba projetu refere mos laitha Aktividade servisu iha tereno, ho razaun katak grupo sira osan hotu ona no hein pagamento maka foin bele servisu fila fali	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	21/07/2022	Liquidoe, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (LE - 3)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)

LOCATION : URBADAN, SUCO ASUBLI TOHO-LEQUIDOE,AILEU

SUMMARY									
NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN		PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
				AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$	3.075,00	\$ 1.668,75	2,26%	\$ -	0,00%	\$ 1.668,75	2,26%
2	Class Room Building C	\$	55.945,00	\$ 22.524,57	30,44%	\$ 2.317,05	3,13%	\$ 24.841,62	33,57%
3	Provisional Sum for Site Works	\$	5.628,60	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	Total Construction Cost	\$	64.648,60	\$ 24.193,32	32,70%	\$ 2.317,05	3,13%	\$ 26.510,37	35,83%
	Overhead	\$	6.340,00	\$ 2.185,00	2,95%	\$ -	0,00%	\$ 2.185,00	2,95%
	Contingency	\$	3.000,00	\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	Grand Total	\$	73.988,60	\$ 26.378,32	35,65%	\$ 2.317,05	3,13%	\$ 28.695,37	38,78%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Enginheiro Senior ba Projeto Edificio no Be'e Mos

Approved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade



ANEXU C1 (AVL - 9)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Edifício Pré-Escolar (Prototipo Epe)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 14 Julho 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa Sarin, Mantane

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projeto refere parado hela ho razaun tamba grupo osan laiha ona atu eze kuta obra refere ho nunee hein pagamento sai maka foin bele halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

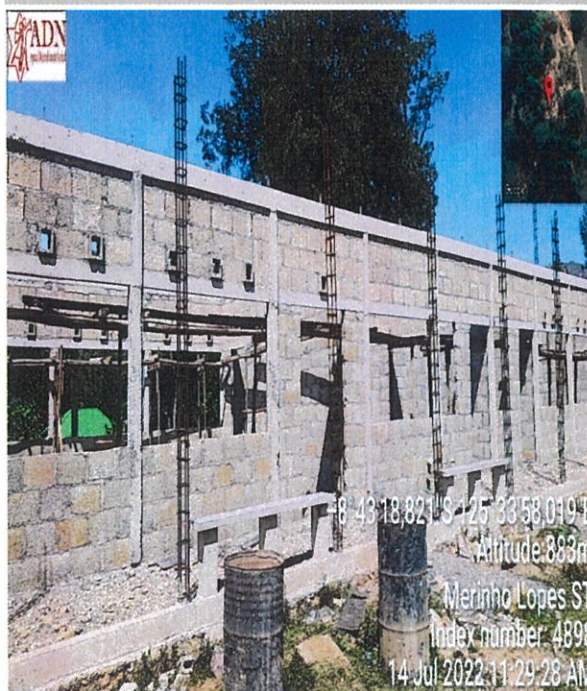



ANEXU C1 (AVL - 9)

Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção Edifício Pré-Escolar (Prototipo Epe)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

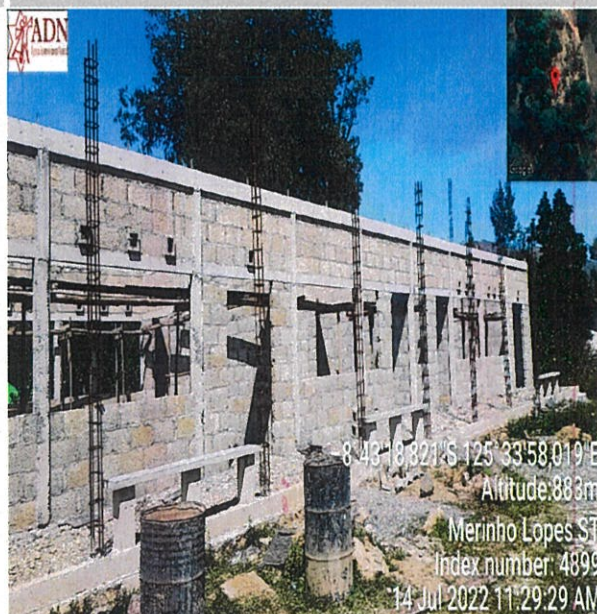


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

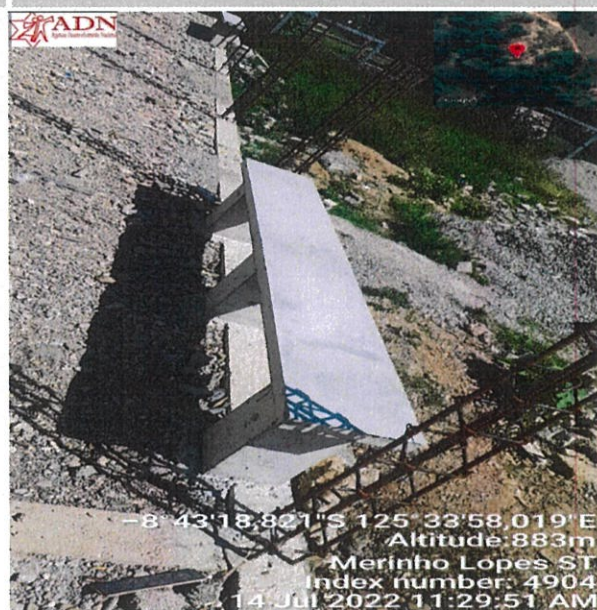



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Pessoal, Institucional e Empresarial

ANEXU D (Avl - 9)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTOTIPO EPE)

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	14/07/2022	Ailen Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T ADN	1	konstrusaun refere mos parado hela ho razaun grupo Komunitaria sira osan hotu ona no hein pagamento maka servisu foin bele lao fila fali.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	14/07/2022	Ailen Villa, Aileu	Joa dos Reis Mendes	T. MEJD	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (Avl - 9)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTOTIPO EPE)
LOCATION : FAHIRIA, AILEU VILA

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.800,00	2,13%	\$ -	0,00%	\$ 1.800,00	2,13%
2	Class Room Building C2	\$ 60.790,89	\$ 16.847,87	19,91%	\$ 2.609,65	3,08%	\$ 19.457,52	22,99%
3	Provisional Sum for Site Works	\$ 10.972,24	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
4	Provisional Sum for Demolition	\$ 450,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	Total Construction Cost	\$ 75.288,13	\$ 18.647,87	22,04%	\$ 2.609,65	3,08%	\$ 21.257,52	25,12%
	Overhead	\$ 6.340,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	Contingency	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	Grand Total	\$ 84.628,13	\$ 18.647,87	22,04%	\$ 2.609,65	3,08%	\$ 21.257,52	25,12%

prepared by :

Eng. Merinho Cluico Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Jeronimo
Engenheiro Senior na Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 21 Julho 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe, Aileu Suku Manukasa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.


4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item plesteran

Plesteran nebe maka grupo halao iha tereno
ho total volume hamutuk 222,95 m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

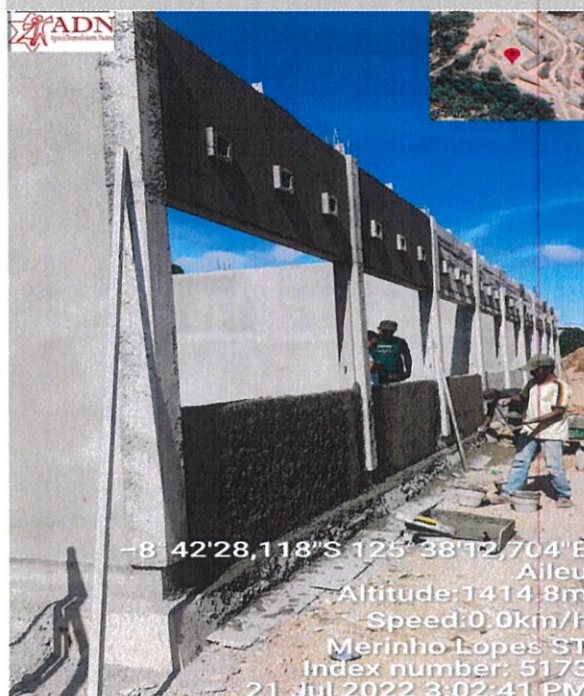

ANEXU C1 (Le - 4)

Back-up Data


Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Plesteran**

Plesteran nebe maka grupo halao iha tereno
ho total volume hamutuk 222,95 m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

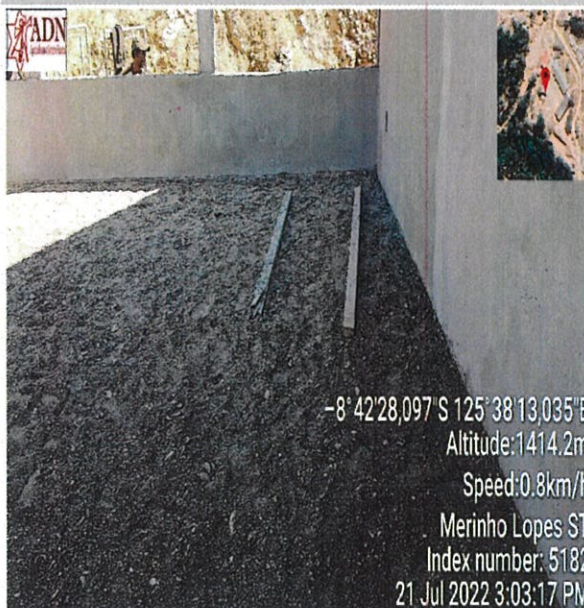


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Plesteran**

Plesteran nebe maka grupo halao iha tereno
ho total volume hamutuk 222,95 m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

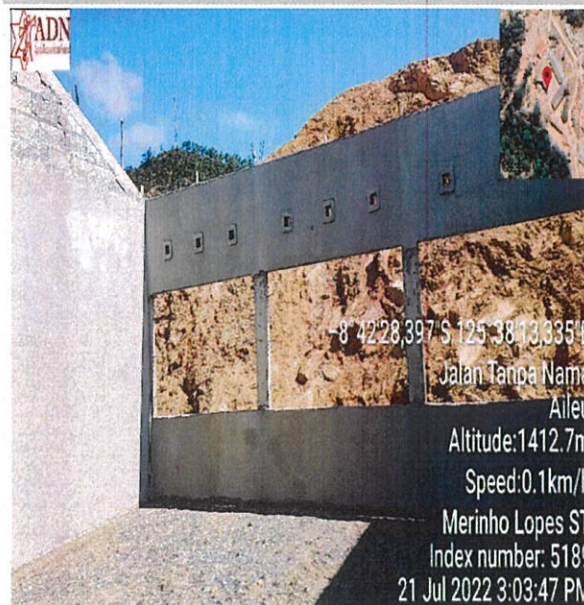



ANEXU D (LE - 4)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	21/07/2022	Lequidoe, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T AND	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
II	21/07/2022	Lequidoe, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
III					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
IV					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
V					1	
					2	
					3	
					4	
					5	

Livro Visita da Program. Instrusaun / Rekomendasaun	Assunto	Pozisaun	Assunto	Assunto	Assunto
08/07/22	Joao Reis Nade	MEJD	MEJD	MEJD	MEJD
11-07/22	Joao Reis Nade	MEJD	MEJD	MEJD	MEJD
21/07/22	Merinho C. I. de Araujo	ADN IP	ADN IP	ADN IP	ADN IP

-8° 40'36,525"S 125° 33'16,816"E
Aileu
Altitude: 1316m
Merinho Lopes ST
Index number: 5196
21 Jul 2022 3:09:40 PM



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (LE - 4)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTI
LOCATION : FATUK MARIU, SUCO MANUKASSA -LEQUIDOE,AILEU

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.743,75	2,35%	\$ -	0,00%	\$ 1.743,75	2,35%
2	Class Room Building C	\$ 54.915,20	\$ 20.027,90	26,96%	\$ 2.557,69	3,44%	\$ 22.585,60	30,41%
3	Provisional Sum for Site Works	\$ 6.447,58	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
4	Provisional Sum for Site Demolition	\$ 500,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Total Construction Cost		\$ 64.937,78	\$ 21.771,65	29,31%	\$ 2.557,69	3,44%	\$ 24.329,35	32,75%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ 1.660,00	2,23%	\$ -	0,00%	\$ 1.660,00	2,23%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 74.277,78	\$ 23.431,65	31,55%	\$ 2.557,69	3,44%	\$ 25.989,35	34,99%

prepared by :

Verify by :

Aproved by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Enginheiro Senior ba Projeto Edificio no
Be'e Mos

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



ANEXU C1 (ALV - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C) + TB
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Data Inspesaun : 13 Julho 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Suku Liurai (Laclo)

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.7404227

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projetu refere kondisaun parado hela ho
razaun comunidade osan ba ezejuta obra
refere hotu ona no hein pagamento maka foin
bele kontinua fila fali

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

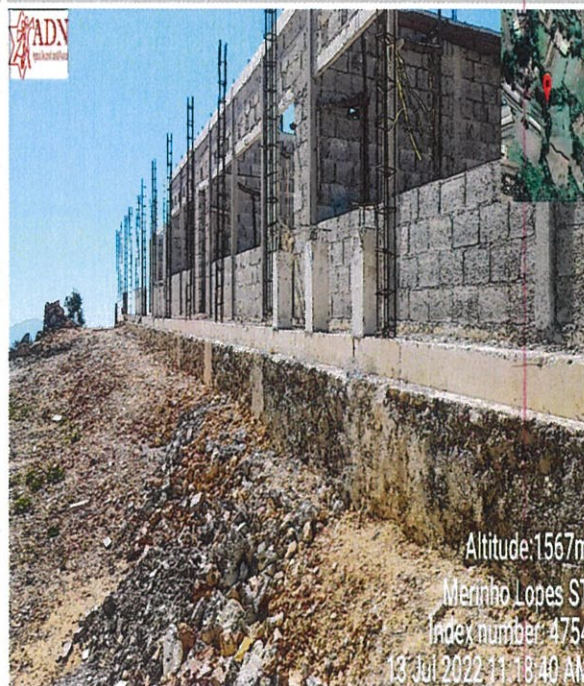

ANEXU C1 (ALV - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C) + TB
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Back Fill Pondasi Toilet**

Projetu refere kondisaun parado hela ho
razaun comunidade osan ba ezekuta obra
refere hotu ona no hein pagamento maka foin
bele kontinua fila fali

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere kondisaun parado hela ho
razaun comunidade osan ba ezekuta obra
refere hotu ona no hein pagamento maka foin
bele kontinua fila fali

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

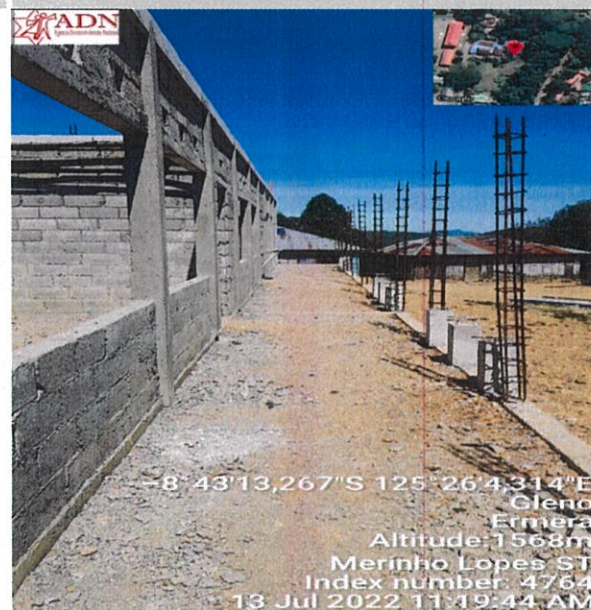

ANEXU D (Avl - 10)



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB					
Kompanha : Grupo Komunitario					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	21/06/2022	Aileu Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T 'ADN	1
					2
					3
					4
					5
II	21/06/2022	Aileu Villa, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (AVI - 10)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTOPI C)+TB
LOCATION : LACLO, SUICO LIURAI

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.725,00	1,73%	\$ -	0,00%	\$ 1.725,00	1,73%
2	Class Room Building C	\$ 50.833,58	\$ 16.069,34	16,13%	\$ -430,22	-0,43%	\$ 15.639,12	15,70%
3	Toilet Building Tb	\$ 25.271,72	\$ 3.780,38	3,80%	\$ 669,59	0,67%	\$ 4.449,97	4,47%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 10.876,83	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
5	Provisional Sum for Demolition	\$ 200,00	\$ -	0,00%	\$ 200,00	0,20%	\$ 200,00	0,20%
Total Construction Cost		\$ 90.257,13	\$ 21.574,72	21,66%	\$ 439,37	0,44%	\$ 22.014,09	22,10%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ -	0,00%	\$ 1.985,00	1,99%	\$ 1.985,00	1,99%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 99.597,13	\$ 21.574,72	21,66%	\$ 2.424,37	2,43%	\$ 23.999,09	24,10%

prepared by :

Verify by :

Aproved by :

Eng. Merinho Chico Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Enginheiro Senior ba Projeto
Edificio no Be'e Mos

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao
de Qualidade



ANEXU D (ALV - 15)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 13 Julho 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Suku Liurai, Fatubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item pasangan batako sopi sopi


Sketch:
Computation by AutoCAD

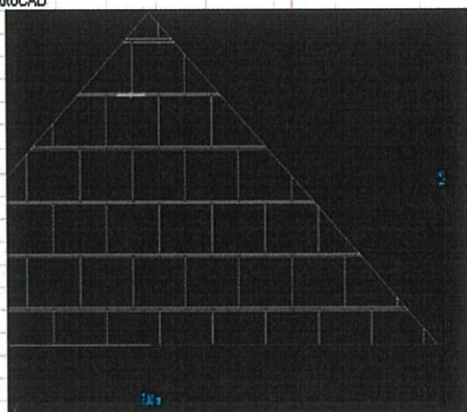

QTY

	Cross Section			Length (m)	Volume (m.sq)	Remarks
	T	L	Area			
					31,11	pasangan batako sopi sopi prototipo C

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

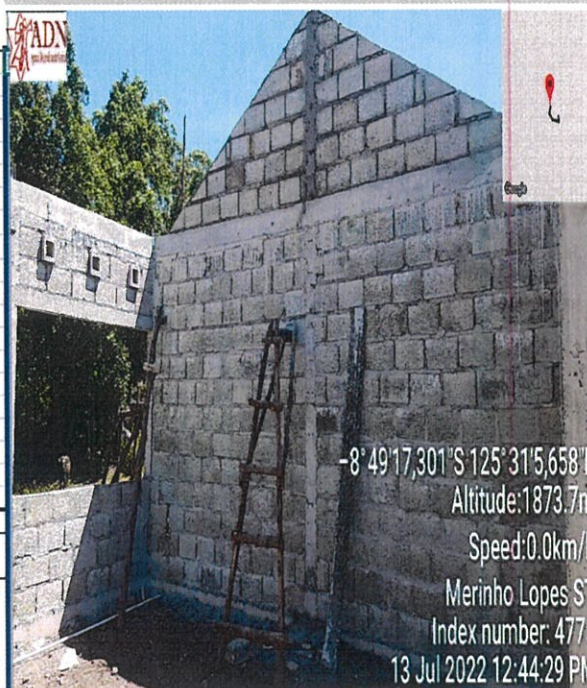


-8° 49' 17,301" S 125° 31' 5,658" E
Altitude: 1873.7m
Speed: 0.0km/h
Merinho Lopes ST
Index number: 4775
13 Jul 2022 12:44:29 PM

ANEXU D (ALV - 15)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

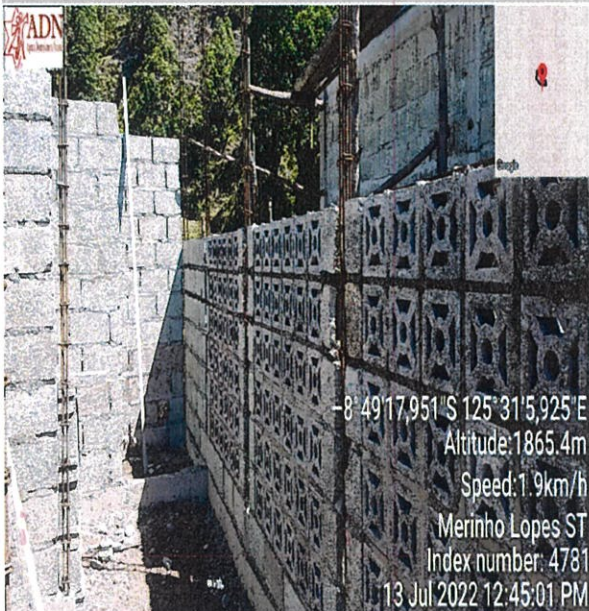Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu pemasangan Loster/ Grailha Total grailha nebe mak grupo komunitaria monta hamutuk 0,48 m2	 -8° 49'17.951" S 125° 31'5.925" E Altitude: 1865.4m Speed: 1.9km/h Merinho Lopes ST Index number: 4781 13 Jul 2022 12:45:01 PM
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Total grailha nebe mak grupo komunitaria monta hamutuk 0,48 m2	 -8° 49' 7.856" S 125° 31'5.939" E Altitude: 1865.9m Speed: 1.9km/h Merinho Lopes ST Index number: 4779 13 Jul 2022 12:44:56 PM

ANEXU D (ALV - 15)




INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	13/07/2022	Allen Villa, Allen	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T ADN	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
II	13/07/2022	Allen Villa, Allen	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
III					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
IV					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
V					1	
					2	
					3	
					4	
					5	

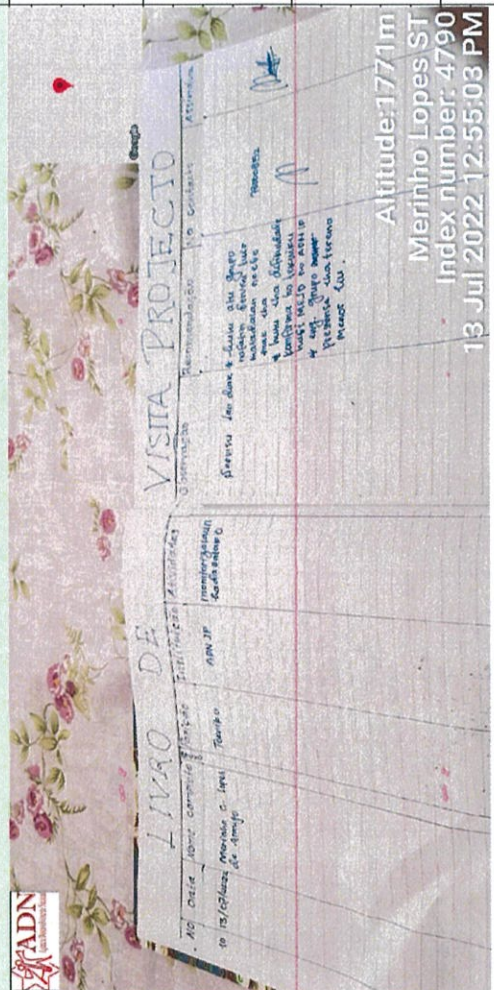

Altitude: 1771m
Merinho Lopes ST
Index number: 4790
13 Jul 2022 12:55:03 PM



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : FATUBESI, AILEU-VILA

ANEXU C2 (Avl - 15)

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.800,00	1,77%	\$ -	0,00%	\$ 1.800,00	1,77%
2	Class Room Building C	\$ 51.228,95	\$ 12.883,72	12,70%	\$ 2.279,63	2,25%	\$ 15.163,36	14,95%
3	Toilet Building Tb	\$ 25.530,78	\$ 3.540,00	3,49%	\$ 4.277,02	4,22%	\$ 7.817,02	7,71%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 12.234,70	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Total Construction Cost		\$ 92.069,44	\$ 18.223,72	17,97%	\$ 6.556,66	6,47%	\$ 24.780,38	24,44%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 101.409,44	\$ 18.223,72	17,97%	\$ 6.556,66	6,47%	\$ 24.780,38	24,44%

prepared by :

Eng. Merinho Cluco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Engenheiro Senior na Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao
de Qualidade



ANEXU C1 (RE - 1)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 18 Julho 2022

Fatin Inspesaun : Remexio , tulatageu, Fatubutik

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8.709141** Latetude : **125.74044227**

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo


2.

3.

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item pasangan batako

Sketch:
Computation by AutoCAD

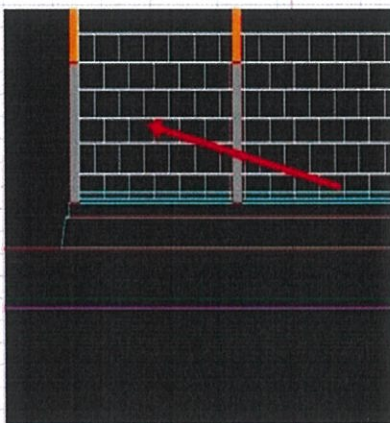

QTY							
	Cross Section				Length (m)	Volume (m sq.)	Remarks
		T	L	Area			
						48,60	pasangan batakoprototipo C

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

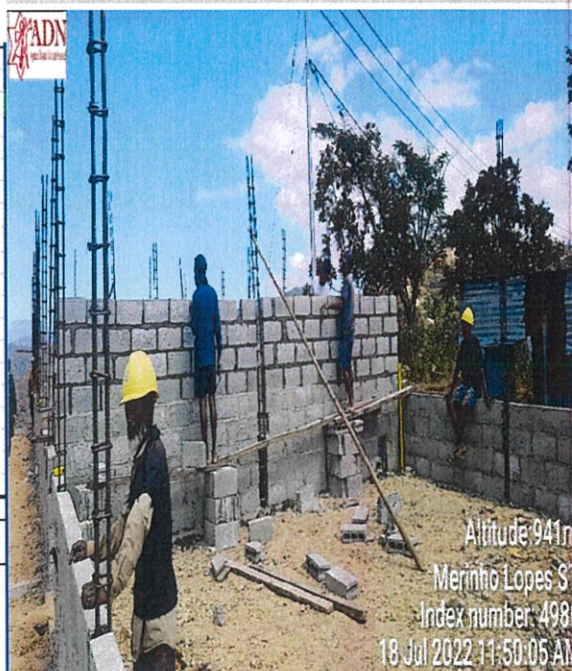



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (RE - 1)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu pasangan batako

Sketch:
Computation by AutoCAD

QTY

Cross Section					Length (m)	Volume (m sq.)	Remarks
T	L	Area					
						48,60	pasangan batako prototipo C

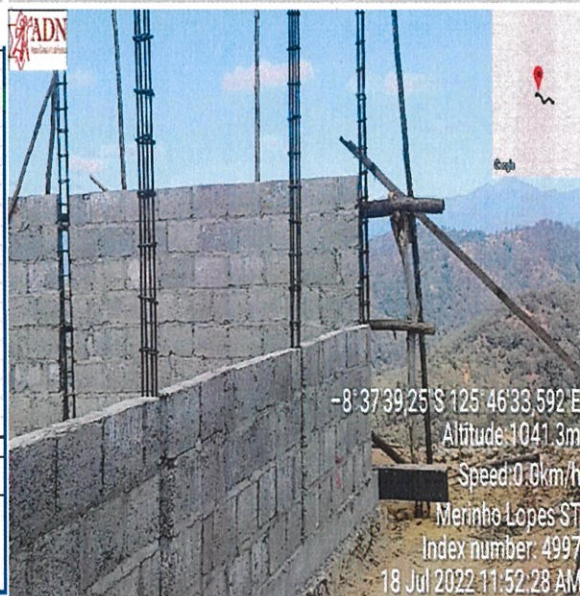

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (RE - 1)

Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Construção prototipo C laiha servisu iha
fatin refere hela sopi sopi seidauk servisu
tamba grupo sira fokus hela hada batako ba
escritorio

Observação iha terreno no Foto Aktual

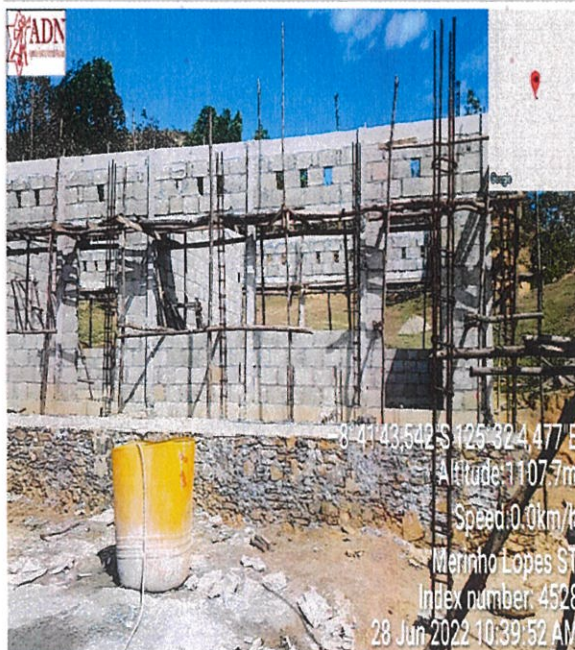

Sketch & Foto Desenho

Observação iha terreno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL





Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

T'ADN, I.P.

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Konstrusaun Salas de Aulas 3 + Eskritorio ESTV

Kompanha : Grupo Kominutario

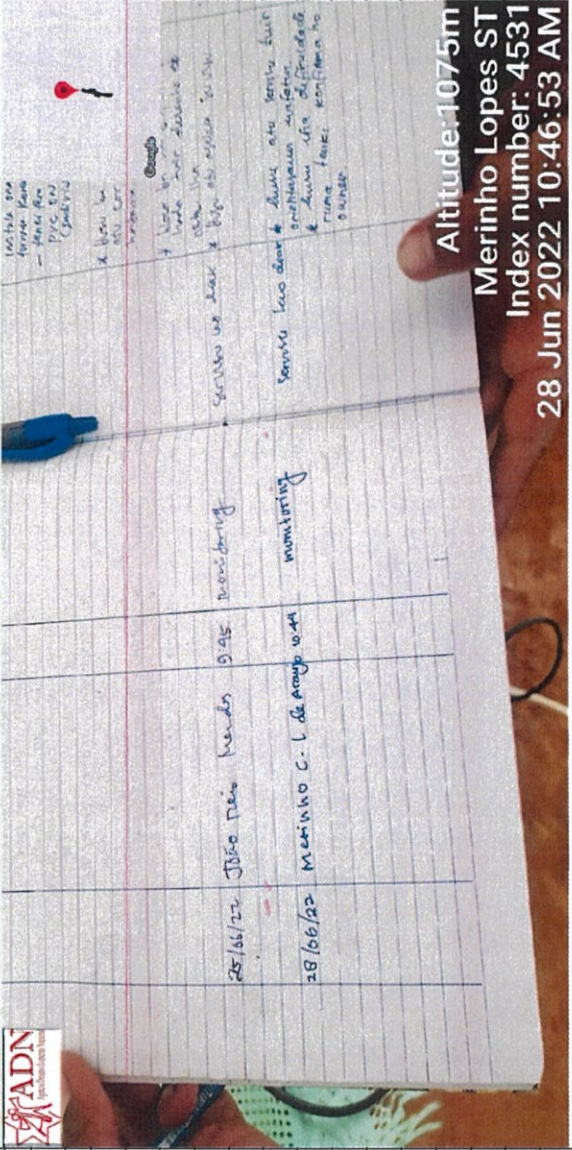No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T'ADN	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
II	28/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Joao dos Reis Mendes	MEJD - DNDP	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (RE - 1)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS

LOCATIO : FATUBUTIK, SUCO TULATAQUEU, REMIXIO-AILEU

SUMMARY

NO	ITEM SERVIU	VERIFIED BY ADN	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		UP TO DATE	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT
1	Preliminaries Works	\$ 3,075.00	\$ -	0.00%	\$ 1,350.00	1.75%	\$ 1,350.00	1.75%
2	Class Room Building C	\$ 56,904.27	\$ -	0.00%	\$ 10,684.96	13.83%	\$ 10,684.96	13.83%
3	Provisional Sum for Site Works	\$ 7,933.38	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	Total Construction Cost	\$ 67,912.65	\$ -	0.00%	\$ 12,034.96	15.58%	\$ 12,034.96	15.58%
	Overhead	\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	Contingency	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	Grand Total	\$ 77,252.65	\$ -	0.00%	\$ 12,034.96	15.58%	\$ 12,034.96	15.58%

prepared by :

Eng. Merinko Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio no Be e Mos

Approved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao de Qualidade



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU

No. kontratu : NCB: 01/MEJD/DNA/2021

Data Inspesaun : 14,28, Julho 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Aisirimou

Koordinadas :


Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

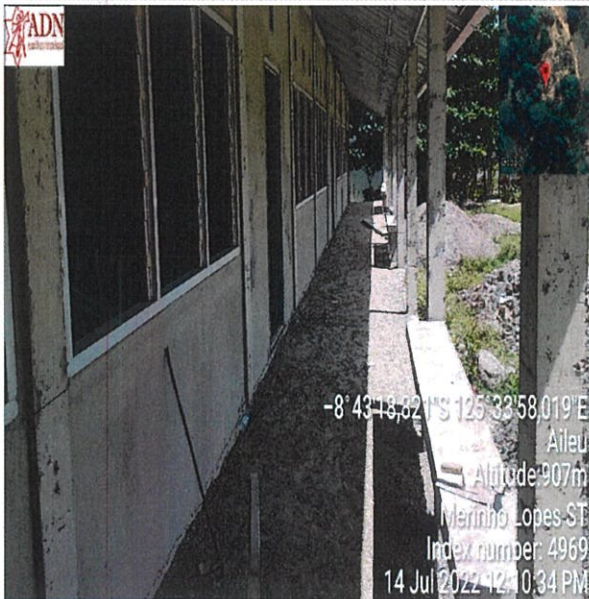Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu back fill under floor teras Escritorio ESTV Back fill nebe maka ateru volume hamutuk 35,40 m3	 -8°43'43.82"S 125°33'58.019"E Aileu Altitude: 907m Merinho Lopes ST Index number: 4969 14 Jul 2022 12:10:34 PM



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU
No. kontratu : NCB: 01/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **rangka Plafon**

Back fill nebe maka ateru volume hamutuk
35,40 m3

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU
No. kontratu : NCB: 01/MEJD/DNA/2021


Sketch Item servisu Kuda kuda eskritorio

Sketch:
Computation by AutoCAD

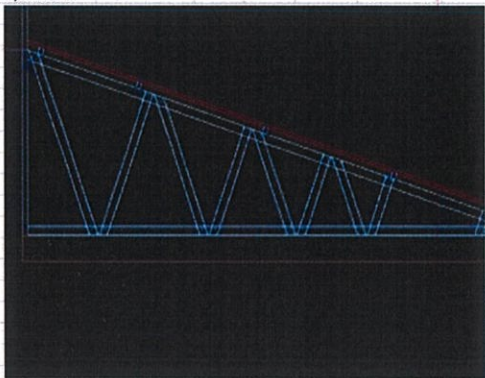

QTY					
	Cross Section			Length (m)	Volume (cu.m.)
	T	L	Area		
					50,22
					kuda kuda Canal C

Sketch & Foto Desenho

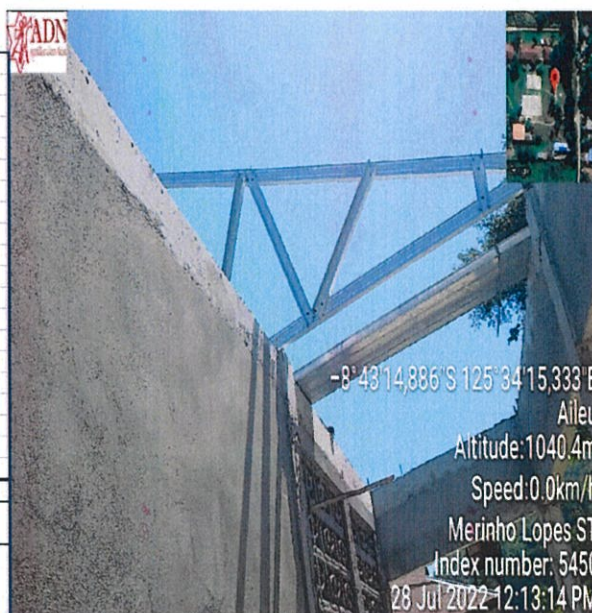


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu septitank eskritorio



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					Asinatura
Naran projeto : Konstrusaun Salas de Aulas 3 + Eskritorio ESTV					
Kompanha : Mortiles Unip.Lda					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	28/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T 'ADN	1
					2
					3
					4
					5
II	28/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Joao dos Reis Mendes	MEJD - DNDPE	1
					2
					3
					4
					5
III	28/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Rodolfo dos Reis Mendes	T. Kompanhia	1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5

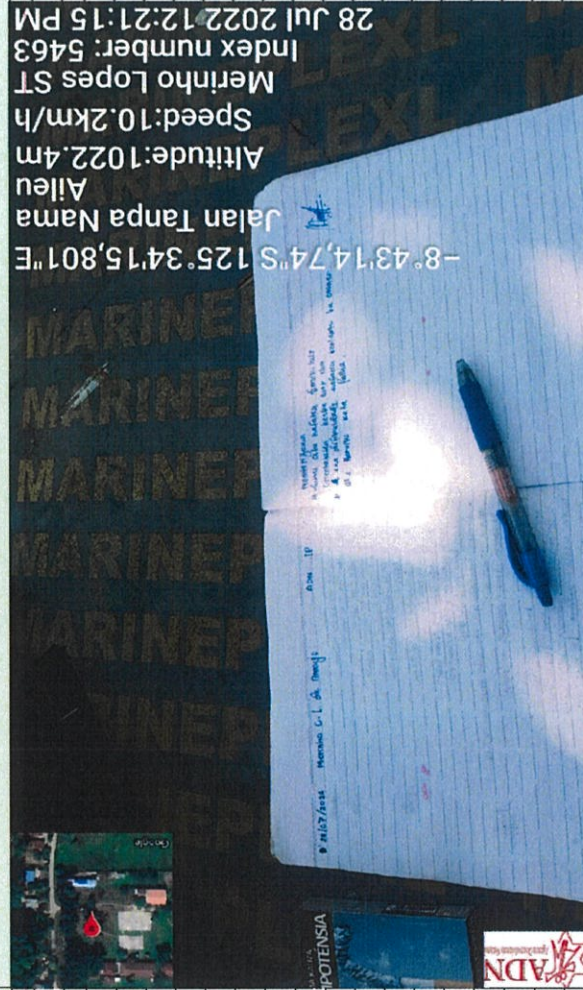

-8°43'14,74"S 125°34'15,801"E
Jalan Tanpa Nama
Aileu
Altitude:1022.4m
Speed:10.2km/h
Merinho Lopes ST
Index number: 5463
28 Jul 2022 12:21:15 PM

[Handwritten signature]



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Konstrusaun Salas de Aulas 3 + Eskritorio ESTV

Kompanha : Mortiles Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	14/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T 'ADN	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
II	14/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Joao dos Reis Mendes	MEJD - DNDPE	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III	14/07/2022	Aileu, Aileu Villa	Rodolfo dos Reis Mendes	T. Kompanha	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

-8° 43' 18,821"S 125° 33' 58,019"E
Aileu
Altitude: 916m
Merinho Lopes ST
Index number: 4979
14 Jul 2022 1:29:04 PM



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 7)

TÍTULO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO IA
TECNICA VOCACIONAL

FATIN PROJETO : AILEU

DONO DO PROJETO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

NO	WORK DESCRIPTION	AMOUNT USD	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		UP TO DATE	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT
I	Preliminaries Works	\$ 2.925,00	\$ 2.925,00	1,71%	\$ -	0,00%	\$ 2.925,00	1,71%
II	Class Room Building C	\$ 56.741,73	\$ 35.734,49	20,89%	\$ 1.641,49	0,96%	\$ 37.375,98	21,85%
III	Teacher Office	\$ 83.864,91	\$ 22.862,53	13,36%	\$ 7.021,17	4,10%	\$ 29.883,69	17,47%
V	Provisional Sum for Site Works	\$ 5.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 148.531,64	\$ 61.522,02	35,96%	\$ 8.662,66	5,06%	\$ 70.184,67	41,02%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 14.853,16	\$ 6.152,20	3,60%	\$ 866,27	0,51%	\$ 7.018,47	4,10%
C	OVERHEAD	\$ 4.340,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 3.354,50	\$ 1.353,48	0,79%	\$ 190,58	0,11%	\$ 1.544,06	0,90%
E	TOTAL COST (A+B+C+D)	\$ 171.079,30	\$ 69.027,70	40,35%	\$ 9.719,50	5,68%	\$ 78.747,20	46,03%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior do Projeto Edifício no Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 21 Julho 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta, Remixio-Aileu

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

4.

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item pengecoran concrete ba Sloof

Sketch:
Computation by AutoCAD

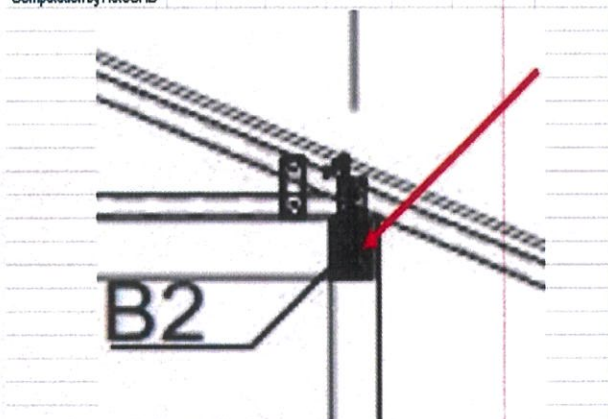

QTY					Length (m)	Volume (m ³)	Remarks
Cross Section				Area			
	T	L					
	150 mm	200 mm				4,89	bekisting ba ring balk B2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

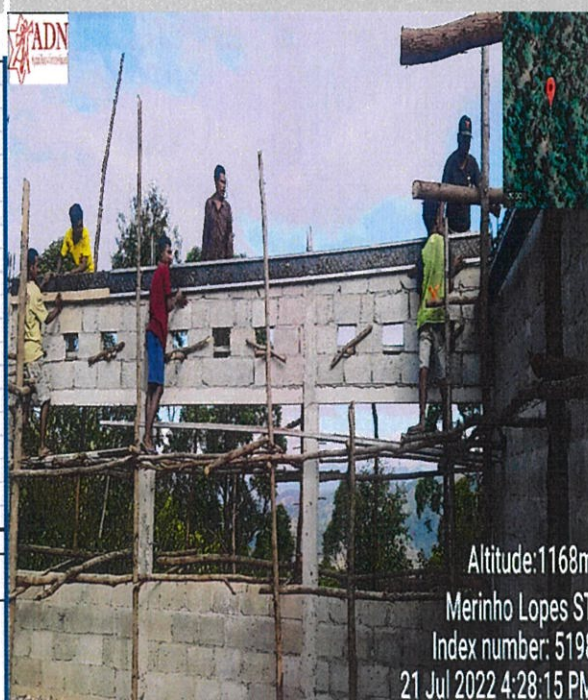


Altitude: 1168m
Merinho Lopes ST
Index number: 5198
21 Jul 2022 4:28:15 PM

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu pmbesian ring balk

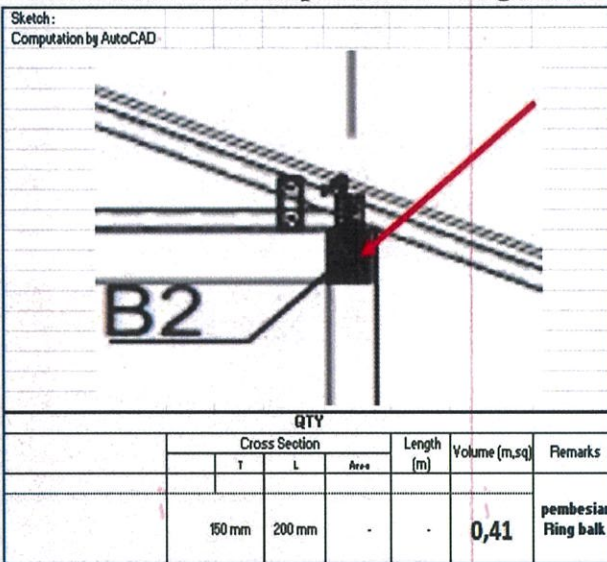


Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu

Pengecoran ba Sloof TB nebe maka remata
ona no nia volume ba SLoof total 1,4 m³

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

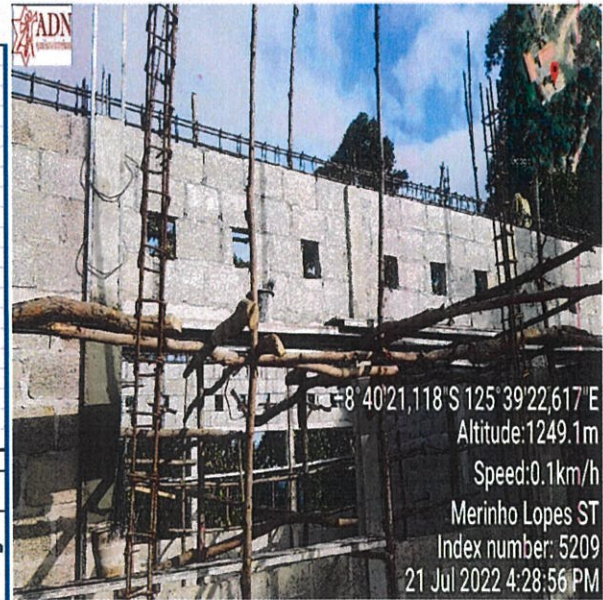




Observasaun iha tereno no Foto Aktual

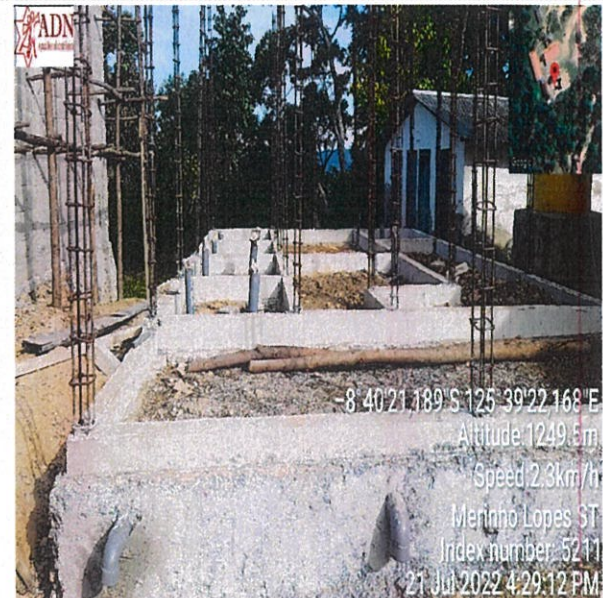

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	21/07/2022	Remexio, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T AND	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
II	21/07/2022	Remexio, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (RE - 2)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : MAUMETA, REMIXIO-AILEU

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.350,00	1,26%	\$ -	0,00%	\$ 1.350,00	1,26%
2	Class Room Building C	\$ 55.454,21	\$ 10.350,53	9,69%	\$ 3.941,23	3,69%	\$ 14.291,76	13,38%
3	Toilet Building Tb	\$ 26.626,00	\$ 3.152,38	2,95%	\$ 1.995,88	1,87%	\$ 1.995,88	4,82%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 11.927,26	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
5	Provisional Sum for Demolition	\$ 425,00	\$ 425,00	0,40%	\$ -	0,00%	\$ 425,00	0,40%
Total Construction Cost		\$ 97.507,46	\$ 15.277,90	14,30%	\$ 5.937,11	5,56%	\$ 18.062,63	19,86%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 106.847,46	\$ 15.277,90	14,30%	\$ 5.937,11	5,56%	\$ 18.062,63	19,86%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Ierpinimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio no
Be'e Mos

Approved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



ANEXU D (ALV - 13)

Naran Projeto
No. kontratu

Back-up Data
: NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
: Grupo Komunitario

Data Inspesaun

: 13 Julho 2022

Fatin Inspesaun

: Aileu Villa, Lausi

Koordinadas

:

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector

: 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item bekisting ba sopi sopi
protoripo C

Computation by AutoCAD

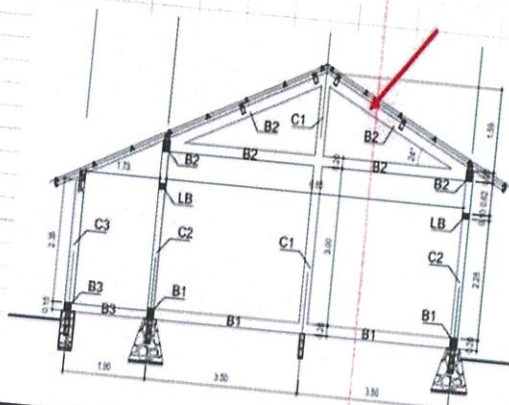

QTY						Remarks
Cross Section			Length (m)	Volume (cu. m)		
	T	L				Area
	-	-	-	-	6,80	bekisting ba Sopi Sopi

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU D (ALV - 13)

Back-up Data


Naran Projeto
No. kontratu

: NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
: Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu

Sketch:
Computation by AutoCAD

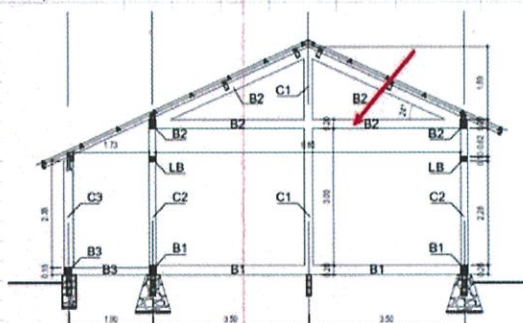

QTY						
	Cross Section			Length (m)	Volume (cu. m)	Remarks
	T	L	Area			
	-	-	-	-	0,20	ringball Toilet


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

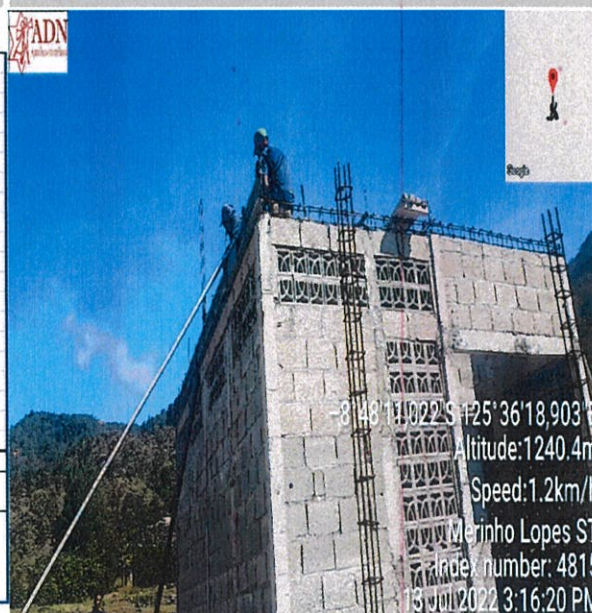

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu

Sketch:
Computation by AutoCAD

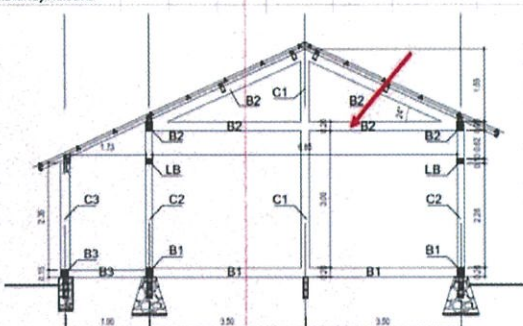

QTY						
	Cross Section			Length (m)	Volume (cu. m)	Remarks
	T	L	Area			
	-	-	-	-	0,20	ringbalk Toilet

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

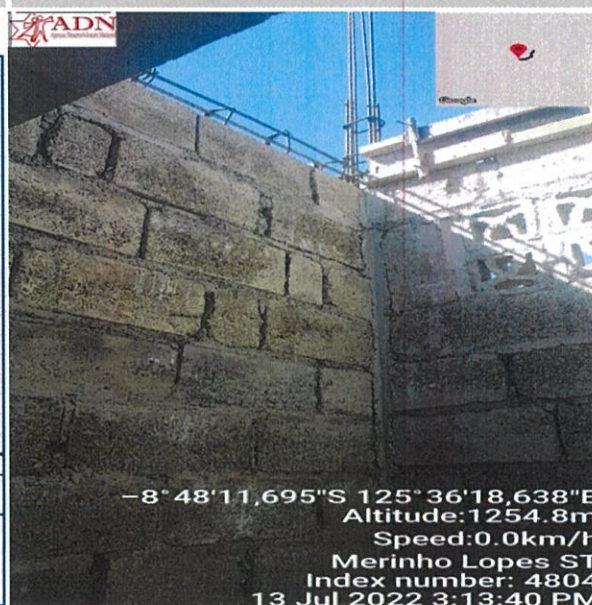

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	13/07/2022	Aileu Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T ADN	1 2 3 4 5		
II	13/07/2022	Aileu Villa, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		
IV					1 2 3 4 5		
V					1 2 3 4 5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 13)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTOPI C)+TB
LOCATION : LAUSI, DARAHAE, AILEU

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 2.293,75	2,30%	\$ -	0,00%	\$ 2.293,75	2,30%
2	Class Room Building C	\$ 50.833,58	\$ 16.344,04	16,38%	\$ 2.267,53	2,27%	\$ 18.611,57	18,65%
3	Toilet Building Tb	\$ 25.268,20	\$ 2.204,82	2,21%	\$ 2.991,63	3,00%	\$ 5.196,44	5,21%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 11.253,44	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Total Construction Cost		\$ 90.430,22	\$ 20.842,61	20,89%	\$ 5.259,16	5,27%	\$ 26.101,76	26,16%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ -	0,00%	\$ 1.560,00	1,56%	\$ 1.560,00	1,56%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 99.770,22	\$ 20.842,61	20,89%	\$ 6.819,16	6,83%	\$ 27.661,76	27,73%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de
Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Engenheiro Senior na Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

Naran Eng.	Merinho Cuco L. de Araujo
------------	----------------------------------

Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS
-----------	---------------------------

2022

[illegible]

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																			
Naran Eng.	Merinho Cuco L. de Araujo						2022																																			
Município	MUNICÍPIO AILEU NO POSTOS																																									
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Julho																															OBS			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	ON GOING		
							Actual																																			
	16	New Construction Of Fence At CSI Aileu	BEHALE INTERPRICE	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																			
							Actual																																			
REMEXIO (RE)	1	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																		ON GOING	
							Actual																																			
	2	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																		ON GOING	
							Actual																																			
LEQUIDOE (LO)	1	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Fatuberli, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																		ON GOING	
							Actual																																			
	2	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																		ON GOING	
							Actual																																			
	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Urdadan	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																		ON GOING	
							Actual																																			
	4	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																			ON GOING
							Actual																																			
TOTAL PROJETO ON-GOING																																										

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha T

Relatorio avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi:

(Merinho Cuco L. de Araujo)
Eng. Munisipiu Aileu

Sertifika Husi:

(Emerenciana da Costa Mella Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade

Aprova Husi:

(Eng. Januário Mota Guterres)
Adjunto Director Executivo
