



**REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE**  
**MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO**

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



**RELATÓRIU MENSÁL**  
**IMPLEMENTASAUN**  
**PROJETUS MUNISÍPIU COVALIMA**

**DEZEMBRO 2022**






## SUMÁRIO

### RELATÓRIO


#### IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO COVALIMA

DESEMBRO 2022


##### Prepara Husi :

  
(Eng. Madelino D J Magno)  
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,  
Município Covalima ADN, I.P

  
(Eng. Domingos Soares Martins)  
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e  
Irigação, Município Covalima ADN, I.P


  
(Eng. Prezenzo L C D Ximenes)  
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,  
Município Covalima ADN, I.P


  
(Eng. Bosco Dinis de Sousa)  
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e  
Irigação, Município Covalima ADN, I.P

  
(Silvino D R R Soares)  
Eng. M & E, Município Covalima ADN, I.P

##### Verifica Husi :

  
(Arc. Francisco X D D Jeronimo)  
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé  
Saneamento, ADN, I.P

  
(Eng. Remigio da C. Soares dos Santos)  
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,  
Transporte e Irigação, ADN, I.P

  
(Deolindo de F Marques)  
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P

##### Sertifica Husi :

  
(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)  
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,  
ADN, I.P

##### Aprova Husi :

  
(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)  
Director Executivo, ADN, I.P

## INDICE

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| SUMÁRIO .....                             | 1  |
| INDICE.....                               | 2  |
| I. INTRODUSAUN .....                      | 3  |
| 1.1 Enkuadramentu Legal.....              | 3  |
| 1.2 Perfil Municipio Covalima .....       | 3  |
| 1.3. Lista Projectos .....                | 6  |
| II. PROGRESU FISIKU .....                 | 21 |
| 2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan .....      | 21 |
| III. OBSTÁCLO IHA TERENU .....            | 21 |
| 3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu.....     | 21 |
| IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU .....        | 22 |
| 4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu..... | 22 |

## INDICE TABELA

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias .....                   | 4  |
| Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Covalima .....           | 5  |
| Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Covalima .....                  | 5  |
| Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Covalima Por Fundus Finansiamentos ..... | 7  |
| Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Covalima Por Sectores .....              | 11 |
| Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Covalima Por Ministerio .....            | 16 |
| Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Covalima.....                      | 20 |

## I. INTRODUSAUN


### 1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional, I.P. ou ADN, I.P. hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P. hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN, I.P. nian maka atu aseguira katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeńu, kustu no análise kustu-benefisiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P. hanesan insituto Público (IP), ADN, I.P. nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

### 1.2 Perfil Municipio Covalima

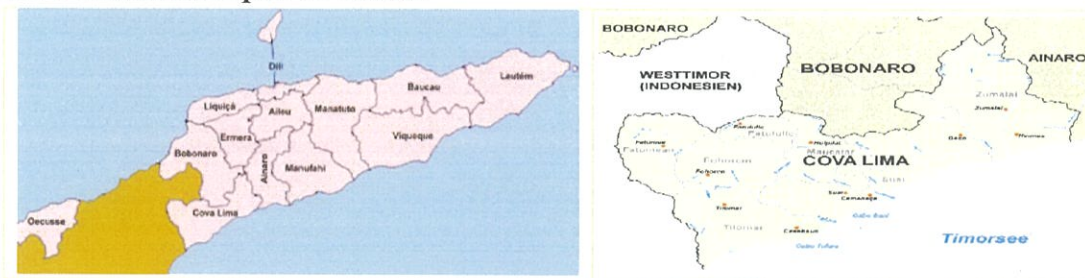

Hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Covalima iha area luan 1,226 km<sup>2</sup>, ho populasau ema nain – 59,455 tuir Sensus 2010. Munisipiu Covalima iha Posto



Administrativo 7, Sucus 30 no aldeias 148 ne'ebé hatudu iha Tabela 1. Posto Administrativo Zumalai iha Sucus barak liu kompara ho Sucus seluk iha Administrasaun Munisipal Cova-Lima.

**Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias**

| Fatululik    |           | Fohorem  |           | Zumalai       |           | Maucatar   |           |
|--------------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|
| Sucus        | Aldeia    | Sucus    | Aldeia    | Suku          | Aldeia    | Sucus      | Aldeia    |
| Fatululik    | 3         | Dato 2   | 3         | Tashilin      | 4         | Belecassac | 7         |
| Taroman      | 5         | Dato 3   | 3         | fatutetu      | 5         | Holpilat   | 6         |
|              |           | Fohorem  | 5         | lepo          | 5         | Matai      | 4         |
|              |           | Lactos   | 4         | Lour          | 7         | Ogues      | 5         |
|              |           |          |           | Mape          | 3         |            |           |
|              |           |          |           | Raimea        | 4         |            |           |
|              |           |          |           | Ucecai        | 2         |            |           |
|              |           |          |           | Zulo          | 4         |            |           |
| <b>Total</b> | <b>8</b>  |          | <b>15</b> |               | <b>34</b> |            | <b>22</b> |
| Suai         |           | Timolar  |           | Fatumean      |           |            |           |
| sucus        | Aldeia    | sucus    | Aldeia    | Suku          | Aldeia    |            |           |
| Beco         | 11        | Beiseuk  | 7         | Belulik leten | 4         |            |           |
| Debos        | 9         | lalawa   | 6         | fatumean      | 4         |            |           |
| Camnaça      | 4         | Maudemo  | 7         | Nunu          | 4         |            |           |
| Labarai      | 5         | Casabauk | 3         |               |           |            |           |
| Suai Loro    | 5         |          |           |               |           |            |           |
|              |           |          |           |               |           |            |           |
|              |           |          |           |               |           |            |           |
|              |           |          |           |               |           |            |           |
|              | <b>43</b> |          | <b>23</b> |               | <b>12</b> |            |           |

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 39

**Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Covalima**

| Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Covalima/Suai |                            |                          |      |      |      |      |       |     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-------|-----|
| No                                                | Deskrisaun                 | Total Membros Kada Tinan |      |      |      |      |       |     |
|                                                   |                            | 2021                     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | OBS |
| 1                                                 | Engineiro                  |                          | 4    |      |      |      | 4     |     |
| 2                                                 | Administrasaun no Financas |                          | 0    |      |      |      | 0     |     |
| 3                                                 | Motorista                  |                          | 1    |      |      |      | 1     |     |
| 4                                                 | Seguransa                  |                          | 0    |      |      |      | 0     |     |
| Total                                             |                            |                          | 5    |      |      |      | 5     |     |

**Tabela 1.2. : Lista Asset ADN,I.P Municipio Covalima**

| ASET ADN,IP MUNICIPIO COVALIMA |                               |                       |      |      |      |      |       |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| No                             | Deskrisaun                    | Total Aset Kada Tinan |      |      |      |      | Total | OBS                                                                     |
|                                |                               | 2021                  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |       |                                                                         |
| 1                              | Edificio                      |                       | 1    |      |      |      | 1     | Eletricidade, odamatan, janela, ho plumbing presija hadia no pinta foun |
| 2                              | Kareta                        |                       | 1    |      |      |      | 1     |                                                                         |
| 3                              | Desktop HP / Monitor          |                       | 1    |      |      |      | 1     | Diak                                                                    |
| 4                              | Laptop HP                     |                       | 1    |      |      |      | 1     | Presija Troka no aumenta 1                                              |
| 5                              | Printer HP (Kiik hitam&Mutin) |                       | 1    |      |      |      | 1     | Aat presija troka (A3 warna)                                            |
| 6                              | UPS                           |                       | 1    |      |      |      | 0     |                                                                         |
| 7                              | Armario File                  |                       | 2    |      |      |      | 2     | 1 Aat                                                                   |
| 8                              | Armario Tau hena              |                       | 3    |      |      |      | 3     | Diak                                                                    |
| 9                              | Meja escritorio               |                       | 1    |      |      |      | 1     | Diak                                                                    |
| 10                             | Meja han                      |                       | 1    |      |      |      | 1     | Diak                                                                    |



|    |                             |  |       |  |  |  |   |                              |
|----|-----------------------------|--|-------|--|--|--|---|------------------------------|
| 11 | Meja TV (kiik)              |  | 1     |  |  |  | 1 | Diak                         |
| 12 | Kadeira han                 |  | 6     |  |  |  | 6 | Diak                         |
| 13 | Kadeira Rotan + Massa       |  | 6     |  |  |  | 6 | Diak                         |
| 14 | Sofa                        |  | 1 Set |  |  |  | 1 | Aat presija troka            |
| 15 | Springbed +sumasu 4+sprei 3 |  | 3 Set |  |  |  | 3 | Sprei presija troka          |
| 16 | Jeleira                     |  | 1     |  |  |  | 1 | Diak                         |
| 17 | Water Dispenser             |  | 1     |  |  |  | 1 | Aat                          |
| 18 | TV + Parabola               |  | 1 Set |  |  |  | 1 | Aat                          |
| 19 | AC                          |  | 4     |  |  |  | 4 | 1 aat, 3 presija manutensaun |
| 20 | Kompor                      |  | 1     |  |  |  | 1 | Aat                          |
| 21 | Kompor Gas                  |  | 1     |  |  |  | 1 | Aat                          |
| 22 | Rack Piring                 |  | 1     |  |  |  | 1 | Diak                         |
| 23 | Water Pump Sanyo            |  | 1     |  |  |  | 1 | Diak                         |

### 1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumulá iha lista neé bazeia ba dadus projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

**Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Covalima Por Fundus Finansiamentos**

| NO          | POSTO ADMINISTRATIVO | TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + FUNDU COVID-19 |                        |                           |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|             |                      | TOTAL PROJECTO                                           | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Fatululik            | 2                                                        | \$ 2,745,409.37        | 81.02%                    |
| 2           | Fatumea              | 5                                                        | \$ 4,001,670.86        | 83.81%                    |
| 3           | Fohorem              | 8                                                        | \$ 8,327,418.54        | 86.43%                    |
| 4           | Maucatar             | 4                                                        | \$ 1,639,034.35        | 55.41%                    |
| 5           | Multy Posto          | 5                                                        | \$ 5,614,470.32        | 81.98%                    |
| 6           | Suai Villa           | 26                                                       | \$ 86,760,234.54       | 90.24%                    |
| 7           | Tilomar              | 10                                                       | \$ 2,270,632.86        | 55.44%                    |
| 8           | Zumalai              | 16                                                       | \$ 22,463,076.04       | 66.53%                    |
| Grand Total |                      | 76                                                       | \$ 133,821,946.88      | 84.28%                    |

| NO          | POSTO ADMINISTRATIVO | FI             |                        |                           |
|-------------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                      | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Fatululik            | 1              | \$ 2,445,005.95        | 86.59%                    |
| 2           | Fatumea              | 1              | \$ 3,407,674.66        | 86.43%                    |
| 3           | Fohorem              | 4              | \$ 7,282,268.51        | 95.44%                    |
| 4           | Maucatar             | 2              | \$ 1,326,918.81        | 56.19%                    |
| 5           | Multy Posto          | 3              | \$ 5,471,153.29        | 83.57%                    |
| 6           | Suai Villa           | 10             | \$ 84,429,538.98       | 90.70%                    |
| 7           | Tilomar              | 3              | \$ 1,143,572.50        | 64.06%                    |
| 8           | Zumalai              | 8              | \$ 19,799,020.63       | 66.83%                    |
| Grand Total |                      | 32             | \$ 125,305,153.33      | 86.09%                    |



| NO          | POSTO ADMINISTRATIVO | LM-CD          |                        |                           |
|-------------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                      | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Fatululik            |                |                        |                           |
| 2           | Fatumea              |                |                        |                           |
| 3           | Fohorem              | 2              | \$ 823,468.03          | 16.63%                    |
| 4           | Maucatar             |                |                        |                           |
| 5           | Multy Posto          | 2              | \$ 143,317.03          | 21.06%                    |
| 6           | Suai Villa           | 6              | \$ 1,211,412.57        | 78.63%                    |
| 7           | Tilomar              | 5              | \$ 907,125.99          | 35.69%                    |
| 8           | Zumalai              | 2              | \$ 807,886.00          | 46.76%                    |
| Grand Total |                      | 17             | \$ 3,893,209.62        | 46.78%                    |

| NO          | POSTO ADMINISTRATIVO | PDIM           |                        |                           |
|-------------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                      | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Fatululik            |                |                        |                           |
| 2           | Fatumea              | 1              | \$ 228,246.62          | 96.66%                    |
| 3           | Fohorem              |                |                        |                           |
| 4           | Maucatar             |                |                        |                           |
| 5           | Multy Posto          |                |                        |                           |
| 6           | Suai Villa           |                |                        |                           |
| 7           | Tilomar              | 1              | \$ 186,843.31          | 98.57%                    |
| 8           | Zumalai              | 1              | \$ 177,630.77          | 96.79%                    |
| Grand Total |                      | 3              | \$ 592,720.70          | 97.30%                    |

| NO          | POSTO ADMINISTRATIVO | LM-BS          |                        |                           |
|-------------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                      | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Fatululik            | 1              | \$ 300,403.42          | 35.69%                    |
| 2           | Fatumea              |                |                        |                           |
| 3           | Fohorem              |                |                        |                           |
| 4           | Maucatar             | 1              | \$ 242,501.42          | 51.26%                    |
| 5           | Multy Posto          |                |                        |                           |
| 6           | Suai Villa           |                |                        |                           |
| 7           | Tilomar              | 1              | \$ 33,091.06           | 55.09%                    |
| 8           | Zumalai              |                |                        |                           |
| Grand Total |                      | 3              | \$ 575,995.90          | 43.36%                    |

| NO          | POSTO ADMINISTRATIVO | LM-TP          |                        |                           |
|-------------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                      | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Fatululik            |                |                        |                           |
| 2           | Fatumea              | 3              | \$ 365,749.58          | 51.40%                    |
| 3           | Fohorem              | 2              | \$ 221,682.00          | 49.92%                    |
| 4           | Maucatar             | 1              | \$ 69,614.12           | 54.87%                    |
| 5           | Multy Posto          |                |                        |                           |
| 6           | Suai Villa           | 6              | \$ 585,794.35          | 50.67%                    |
| 7           | Tilomar              |                |                        |                           |
| 8           | Zumalai              | 5              | \$ 1,678,538.64        | 69.21%                    |
| Grand Total |                      | 17             | \$ 2,921,378.69        | 61.46%                    |



| NO          | POSTO ADMINISTRATIVO | FUNDU COVID-19 |                        |                           |
|-------------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                      | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Fatululik            |                |                        |                           |
| 2           | Fatumea              |                |                        |                           |
| 3           | Fohorem              |                |                        |                           |
| 4           | Maucatar             |                |                        |                           |
| 5           | Multy Posto          |                |                        |                           |
| 6           | Suai Villa           | 4              | \$ 533,488.64          | 87.54%                    |
| 7           | Tilomar              |                |                        |                           |
| 8           | Zumalai              |                |                        |                           |
| Grand Total |                      | 4              | \$ 533,488.64          | 87.54%                    |

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

**Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Covalima Por Sectores**

| NO                 | SECTOR PROJECTO                                | TOTAL MUNICIPIO COVALIMA |                          |                           |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                    |                                                | TOTAL PROJECTO           | MONTANTE KONTRATO (\$)   | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1                  | Aeroportos                                     | 2                        | \$ 72,430,992.54         | 92.84%                    |
| 2                  | Agua E Saneamento                              | 1                        | \$ 264,381.80            | 100.00%                   |
| 3                  | Edificios Publicos                             | 9                        | \$ 2,585,789.57          | 66.34%                    |
| 4                  | Edukasaun                                      | 18                       | \$ 2,722,556.08          | 40.81%                    |
| 5                  | Eletrifikasaun Nasional                        | 5                        | \$ 2,730,729.02          | 61.19%                    |
| 6                  | Estradas                                       | 24                       | \$ 40,767,708.41         | 73.03%                    |
| 7                  | Flood Control                                  | 3                        | \$ 1,338,610.18          | 74.63%                    |
| 8                  | Manutensaun No Rehabilitasaun                  | 7                        | \$ 1,507,681.83          | 65.57%                    |
| 9                  | Pontes                                         | 2                        | \$ 8,755,658.60          | 95.58%                    |
| 10                 | Saude                                          | 4                        | \$ 687,870.35            | 90.95%                    |
| 11                 | Sistema Financeiros e Suportas Infraestruturas | 1                        | \$ 29,968.50             | 60.83%                    |
| <b>Grand Total</b> |                                                | <b>76</b>                | <b>\$ 133,821,946.88</b> | <b>84.28%</b>             |

| NO                 | SECTOR PROJECTO                                | Fatululik      |                        |                           |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|                    |                                                | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1                  | Aeroportos                                     |                |                        |                           |
| 2                  | Agua E Saneamento                              |                |                        |                           |
| 3                  | Edificios Publicos                             |                |                        |                           |
| 4                  | Edukasaun                                      |                |                        |                           |
| 5                  | Eletrifikasaun Nasional                        |                |                        |                           |
| 6                  | Estradas                                       | 1              | \$ 300,403.42          | 35.69%                    |
| 7                  | Flood Control                                  |                |                        |                           |
| 8                  | Manutensaun No Rehabilitasaun                  |                |                        |                           |
| 9                  | Pontes                                         | 1              | \$ 2,445,005.95        | 86.59%                    |
| 10                 | Saude                                          |                |                        |                           |
| 11                 | Sistema Financeiros e Suportas Infraestruturas |                |                        |                           |
| <b>Grand Total</b> |                                                | <b>2</b>       | <b>\$ 2,745,409.37</b> | <b>81.02%</b>             |

| NO                 | SECTOR PROYECTO                                | Fatumea        |                        |                           |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|                    |                                                | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1                  | Aeroportos                                     |                |                        |                           |
| 2                  | Agua E Saneamento                              |                |                        |                           |
| 3                  | Edificios Publicos                             |                |                        |                           |
| 4                  | Edukasaun                                      | 3              | \$ 365,749.58          | 51.40%                    |
| 5                  | Eletrifikasaun Nasional                        |                |                        |                           |
| 6                  | Estradas                                       | 1              | \$ 3,407,674.66        | 86.43%                    |
| 7                  | Flood Control                                  |                |                        |                           |
| 8                  | Manutensaun No Rehabilitasaun                  |                |                        |                           |
| 9                  | Pontes                                         |                |                        |                           |
| 10                 | Saude                                          | 1              | \$ 228,246.62          | 96.66%                    |
| 11                 | Sistema Financeiros e Suportas Infraestruturas |                |                        |                           |
| <b>Grand Total</b> |                                                | <b>5</b>       | <b>\$ 4,001,670.86</b> | <b>83.81%</b>             |

| NO                 | SECTOR PROYECTO                                | Fohorem        |                        |                           |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|                    |                                                | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1                  | Aeroportos                                     |                |                        |                           |
| 2                  | Agua E Saneamento                              |                |                        |                           |
| 3                  | Edificios Publicos                             |                |                        |                           |
| 4                  | Edukasaun                                      | 2              | \$ 221,682.00          | 49.92%                    |
| 5                  | Eletrifikasaun Nasional                        |                |                        |                           |
| 6                  | Estradas                                       | 2              | \$ 823,468.03          | 16.63%                    |
| 7                  | Flood Control                                  |                |                        |                           |
| 8                  | Manutensaun No Rehabilitasaun                  | 3              | \$ 971,615.86          | 71.90%                    |
| 9                  | Pontes                                         | 1              | \$ 6,310,652.65        | 99.06%                    |
| 10                 | Saude                                          |                |                        |                           |
| 11                 | Sistema Financeiros e Suportas Infraestruturas |                |                        |                           |
| <b>Grand Total</b> |                                                | <b>8</b>       | <b>\$ 8,327,418.54</b> | <b>86.43%</b>             |



| NO          | SECTOR PROJECTO                                | Maucatar       |                        |                           |
|-------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                                | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Aeroportos                                     |                |                        |                           |
| 2           | Agua E Saneamento                              |                |                        |                           |
| 3           | Edificios Publicos                             |                |                        |                           |
| 4           | Edukasaun                                      | 1              | \$ 69,614.12           | 54.87%                    |
| 5           | Eletrifikasaun Nasional                        |                |                        |                           |
| 6           | Estradas                                       | 2              | \$ 1,326,918.81        | 56.19%                    |
| 7           | Flood Control                                  |                |                        |                           |
| 8           | Manutensaun No Rehabilitasaun                  | 1              | \$ 242,501.42          | 51.26%                    |
| 9           | Pontes                                         |                |                        |                           |
| 10          | Saude                                          |                |                        |                           |
| 11          | Sistema Financeiros e Suportas Infraestruturas |                |                        |                           |
| Grand Total |                                                | 4              | \$ 1,639,034.35        | 55.41%                    |

| NO          | SECTOR PROJECTO                                | Multy Posto    |                        |                           |
|-------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                                | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Aeroportos                                     |                |                        |                           |
| 2           | Agua E Saneamento                              |                |                        |                           |
| 3           | Edificios Publicos                             |                |                        |                           |
| 4           | Edukasaun                                      |                |                        |                           |
| 5           | Eletrifikasaun Nasional                        |                |                        |                           |
| 6           | Estradas                                       | 3              | \$ 5,430,116.11        | 82.93%                    |
| 7           | Flood Control                                  |                |                        |                           |
| 8           | Manutensaun No Rehabilitasaun                  | 2              | \$ 184,354.21          | 53.84%                    |
| 9           | Pontes                                         |                |                        |                           |
| 10          | Saude                                          |                |                        |                           |
| 11          | Sistema Financeiros e Suportas Infraestruturas |                |                        |                           |
| Grand Total |                                                | 5              | \$ 5,614,470.32        | 81.98%                    |

| NO          | SECTOR PROYECTO                                | Suai Villa     |                        |                           |
|-------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                                | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Aeroportos                                     | 2              | \$ 72,430,992.54       | 92.84%                    |
| 2           | Agua E Saneamento                              | 1              | \$ 264,381.80          | 100.00%                   |
| 3           | Edificios Publicos                             | 4              | \$ 593,329.82          | 72.46%                    |
| 4           | Edukasaun                                      | 7              | \$ 1,406,000.97        | 27.19%                    |
| 5           | Eletrifikasaun Nasional                        | 2              | \$ 1,218,543.47        | 34.52%                    |
| 6           | Estradas                                       | 6              | \$ 9,496,118.52        | 90.12%                    |
| 7           | Flood Control                                  | 2              | \$ 1,078,087.00        | 71.46%                    |
| 8           | Manutensaun No Rehabilitasaun                  |                |                        |                           |
| 9           | Pontes                                         |                |                        |                           |
| 10          | Saude                                          | 2              | \$ 272,780.42          | 80.97%                    |
| 11          | Sistema Financeiros e Suportas Infraestruturas |                |                        |                           |
| Grand Total |                                                | 26             | \$ 86,760,234.54       | 90.24%                    |

| NO          | SECTOR PROYECTO                                | Tilomar        |                        |                           |
|-------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                                | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Aeroportos                                     |                |                        |                           |
| 2           | Agua E Saneamento                              |                |                        |                           |
| 3           | Edificios Publicos                             | 4              | \$ 795,799.75          | 43.20%                    |
| 4           | Edukasaun                                      |                |                        |                           |
| 5           | Eletrifikasaun Nasional                        | 1              | \$ 323,539.34          | 87.54%                    |
| 6           | Estradas                                       | 2              | \$ 825,271.62          | 43.97%                    |
| 7           | Flood Control                                  |                |                        |                           |
| 8           | Manutensaun No Rehabilitasaun                  | 1              | \$ 109,210.34          | 60.83%                    |
| 9           | Pontes                                         |                |                        |                           |
| 10          | Saude                                          | 1              | \$ 186,843.31          | 98.57%                    |
| 11          | Sistema Financeiros e Suportas Infraestruturas | 1              | \$ 29,968.50           |                           |
| Grand Total |                                                | 10             | \$ 2,270,632.86        | 55.44%                    |

| NO                 | SECTOR PROYECTO                                | Zumalai        |                         |                           |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
|                    |                                                | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$)  | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1                  | Aeroportos                                     |                |                         |                           |
| 2                  | Agua E Saneamento                              |                |                         |                           |
| 3                  | Edificios Publicos                             | 1              | \$ 1,196,660.00         | 78.70%                    |
| 4                  | Edukasaun                                      | 5              | \$ 659,509.41           | 59.44%                    |
| 5                  | Eletrifikasaun Nasional                        | 2              | \$ 1,188,646.21         | 81.35%                    |
| 6                  | Estradas                                       | 7              | \$ 19,157,737.24        | 64.80%                    |
| 7                  | Flood Control                                  | 1              | \$ 260,523.18           | 87.78%                    |
| 8                  | Manutensaun No Rehabilitasaun                  |                |                         |                           |
| 9                  | Pontes                                         |                |                         |                           |
| 10                 | Saude                                          |                |                         |                           |
| 11                 | Sistema Financeiros e Suportas Infraestruturas |                |                         |                           |
| <b>Grand Total</b> |                                                | <b>16</b>      | <b>\$ 22,463,076.04</b> | <b>66.53%</b>             |

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A



**Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Covalima Por Ministerio**

| NO                 | DONO DO PROJECTO                          | GRAND TOTAL    |                          |                           |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
|                    |                                           | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$)   | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1                  | Gabinete Do Primeiro Ministro             | 1              | \$ 1,196,660.00          | 78.70%                    |
| 2                  | Ministerio Agrikultura e Pescas           | 1              | \$ 260,523.18            | 87.78%                    |
| 3                  | Ministerio Da Justica                     | 1              | \$ 149,292.80            | 84.70%                    |
| 4                  | Ministerio Das Financas                   | 1              | \$ 29,968.50             | 60.83%                    |
| 5                  | Ministerio Das Obras Publicas             | 40             | \$ 54,839,864.86         | 75.81%                    |
| 6                  | Ministerio Do Interior                    | 1              | \$ 337,328.10            | 25.64%                    |
| 7                  | Ministerio Edukasaun Juventude e Desportu | 19             | \$ 2,905,884.88          | 40.21%                    |
| 8                  | Ministerio Planu e Ordenamentu            | 1              | \$ 264,381.80            | 100.00%                   |
| 9                  | Ministerio Saude                          | 8              | \$ 1,373,959.16          | 80.85%                    |
| 10                 | Ministerio Tranportes e Komunikaun        | 2              | \$ 72,430,992.54         | 92.84%                    |
| 11                 | Ministerio Turismo Komercio e Industria   | 1              | \$ 33,091.06             | 55.09%                    |
| <b>Grand Total</b> |                                           | <b>76</b>      | <b>\$ 133,821,946.88</b> | <b>84.28%</b>             |

| NO                 | DONO DO PROJECTO                          | Fatululik      |                        |                           |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|                    |                                           | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1                  | Gabinete Do Primeiro Ministro             |                |                        |                           |
| 2                  | Ministerio Agrikultura e Pescas           |                |                        |                           |
| 3                  | Ministerio Da Justica                     |                |                        |                           |
| 4                  | Ministerio Das Financas                   |                |                        |                           |
| 5                  | Ministerio Das Obras Publicas             | 2              | \$ 2,745,409.37        | 81.02%                    |
| 6                  | Ministerio Do Interior                    |                |                        |                           |
| 7                  | Ministerio Edukasaun Juventude e Desportu |                |                        |                           |
| 8                  | Ministerio Planu e Ordenamentu            |                |                        |                           |
| 9                  | Ministerio Saude                          |                |                        |                           |
| 10                 | Ministerio Tranportes e Komunikaun        |                |                        |                           |
| 11                 | Ministerio Turismo Komercio e Industria   |                |                        |                           |
| <b>Grand Total</b> |                                           | <b>2</b>       | <b>\$ 2,745,409.37</b> | <b>81.02%</b>             |

| NO          | DONO DO PROJECTO                          | Fatumea        |                        |                           |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                           | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Gabinete Do Primeiro Ministro             |                |                        |                           |
| 2           | Ministerio Agrikultura e Pescas           |                |                        |                           |
| 3           | Ministerio Da Justica                     |                |                        |                           |
| 4           | Ministerio Das Financas                   |                |                        |                           |
| 5           | Ministerio Das Obras Publicas             | 1              | \$ 3,407,674.66        | 86.43%                    |
| 6           | Ministerio Do Interior                    |                |                        |                           |
| 7           | Ministerio Edukasaun Juventude e Desportu | 3              | \$ 365,749.58          | 51.40%                    |
| 8           | Ministerio Planu e Ordenamentu            |                |                        |                           |
| 9           | Ministerio Saude                          | 1              | \$ 228,246.62          | 96.66%                    |
| 10          | Ministerio Tranportes e Komunikaun        |                |                        |                           |
| 11          | Ministerio Turismo Komercio e Industria   |                |                        |                           |
| Grand Total |                                           | 5              | \$ 4,001,670.86        | 83.81%                    |

| NO          | DONO DO PROJECTO                          | Fohorem        |                        |                           |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                           | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Gabinete Do Primeiro Ministro             |                |                        |                           |
| 2           | Ministerio Agrikultura e Pescas           |                |                        |                           |
| 3           | Ministerio Da Justica                     |                |                        |                           |
| 4           | Ministerio Das Financas                   |                |                        |                           |
| 5           | Ministerio Das Obras Publicas             | 6              | \$ 8,105,736.54        | 87.43%                    |
| 6           | Ministerio Do Interior                    |                |                        |                           |
| 7           | Ministerio Edukasaun Juventude e Desportu | 2              | \$ 221,682.00          | 49.92%                    |
| 8           | Ministerio Planu e Ordenamentu            |                |                        |                           |
| 9           | Ministerio Saude                          |                |                        |                           |
| 10          | Ministerio Tranportes e Komunikaun        |                |                        |                           |
| 11          | Ministerio Turismo Komercio e Industria   |                |                        |                           |
| Grand Total |                                           | 8              | \$ 8,327,418.54        | 86.43%                    |

| NO          | DONO DO PROJECTO                          | Maucatar       |                        |                           |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                           | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Gabinete Do Primeiro Ministro             |                |                        |                           |
| 2           | Ministerio Agrikultura e Pescas           |                |                        |                           |
| 3           | Ministerio Da Justica                     |                |                        |                           |
| 4           | Ministerio Das Financas                   |                |                        |                           |
| 5           | Ministerio Das Obras Publicas             | 3              | \$ 1,569,420.23        | 55.43%                    |
| 6           | Ministerio Do Interior                    |                |                        |                           |
| 7           | Ministerio Edukasaun Juventude e Desportu | 1              | \$ 69,614.12           | 54.87%                    |
| 8           | Ministerio Planu e Ordenamentu            |                |                        |                           |
| 9           | Ministerio Saude                          |                |                        |                           |
| 10          | Ministerio Tranportes e Komunikasaun      |                |                        |                           |
| 11          | Ministerio Turismo Komercio e Industria   |                |                        |                           |
| Grand Total |                                           | 4              | \$ 1,639,034.35        | 55.41%                    |

| NO          | DONO DO PROJECTO                          | Multy Posto    |                        |                           |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                           | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Gabinete Do Primeiro Ministro             |                |                        |                           |
| 2           | Ministerio Agrikultura e Pescas           |                |                        |                           |
| 3           | Ministerio Da Justica                     |                |                        |                           |
| 4           | Ministerio Das Financas                   |                |                        |                           |
| 5           | Ministerio Das Obras Publicas             | 5              | \$ 5,614,470.32        | 81.98%                    |
| 6           | Ministerio Do Interior                    |                |                        |                           |
| 7           | Ministerio Edukasaun Juventude e Desportu |                |                        |                           |
| 8           | Ministerio Planu e Ordenamentu            |                |                        |                           |
| 9           | Ministerio Saude                          |                |                        |                           |
| 10          | Ministerio Tranportes e Komunikasaun      |                |                        |                           |
| 11          | Ministerio Turismo Komercio e Industria   |                |                        |                           |
| Grand Total |                                           | 5              | \$ 5,614,470.32        | 81.98%                    |



| NO          | DONO DO PROJECTO                          | Suai Villa     |                        |                           |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                           | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Gabinete Do Primeiro Ministro             |                |                        |                           |
| 2           | Ministerio Agrikultura e Pescas           |                |                        |                           |
| 3           | Ministerio Da Justica                     | 1              | \$ 149,292.80          | 84.70%                    |
| 4           | Ministerio Das Financas                   |                |                        |                           |
| 5           | Ministerio Das Obras Publicas             | 10             | \$ 11,792,748.99       | 82.67%                    |
| 6           | Ministerio Do Interior                    |                |                        |                           |
| 7           | Ministerio Edukasaun Juventude e Desportu | 8              | \$ 1,589,329.77        | 27.66%                    |
| 8           | Ministerio Planu e Ordenamentu            | 1              | \$ 264,381.80          | 100.00%                   |
| 9           | Ministerio Saude                          | 4              | \$ 533,488.64          | 87.54%                    |
| 10          | Ministerio Tranportes e Komunikasaun      | 2              | \$ 72,430,992.54       | 92.84%                    |
| 11          | Ministerio Turismo Komercio e Industria   |                |                        |                           |
| Grand Total |                                           | 26             | \$ 86,760,234.54       | 90.24%                    |

| NO          | DONO DO PROJECTO                          | Tilomar        |                        |                           |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                           | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Gabinete Do Primeiro Ministro             |                |                        |                           |
| 2           | Ministerio Agrikultura e Pescas           |                |                        |                           |
| 3           | Ministerio Da Justica                     |                |                        |                           |
| 4           | Ministerio Das Financas                   | 1              | \$ 29,968.50           |                           |
| 5           | Ministerio Das Obras Publicas             | 4              | \$ 1,258,021.30        | 56.64%                    |
| 6           | Ministerio Do Interior                    | 1              | \$ 337,328.10          | 25.64%                    |
| 7           | Ministerio Edukasaun Juventude e Desportu |                |                        |                           |
| 8           | Ministerio Planu e Ordenamentu            |                |                        |                           |
| 9           | Ministerio Saude                          | 3              | \$ 612,223.90          | 69.13%                    |
| 10          | Ministerio Tranportes e Komunikasaun      |                |                        |                           |
| 11          | Ministerio Turismo Komercio e Industria   | 1              | \$ 33,091.06           | 55.09%                    |
| Grand Total |                                           | 10             | \$ 2,270,632.86        | 55.44%                    |

| NO          | DONO DO PROJECTO                          | Zumalai        |                        |                           |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                           | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PERSENTAGEM EXECUSAUN (%) |
| 1           | Gabinete Do Primeiro Ministro             | 1              | \$ 1,196,660.00        | 78.70%                    |
| 2           | Ministerio Agrikultura e Pescas           | 1              | \$ 260,523.18          | 87.78%                    |
| 3           | Ministerio Da Justica                     |                |                        |                           |
| 4           | Ministerio Das Financas                   |                |                        |                           |
| 5           | Ministerio Das Obras Publicas             | 9              | \$ 20,346,383.45       | 65.77%                    |
| 6           | Ministerio Do Interior                    |                |                        |                           |
| 7           | Ministerio Edukasaun Juventude e Desportu | 5              | \$ 659,509.41          | 59.44%                    |
| 8           | Ministerio Planu e Ordenamentu            |                |                        |                           |
| 9           | Ministerio Saude                          |                |                        |                           |
| 10          | Ministerio Tranportes e Komunikasaun      |                |                        |                           |
| 11          | Ministerio Turismo Komercio e Industria   |                |                        |                           |
| Grand Total |                                           | 16             | \$ 22,463,076.04       | 66.53%                    |

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

**Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Covalima**

| Posto Administrativu, Suku no Sexu | 2022   |                               |        |                                              |        |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
|                                    | Total  | Idade Poduktivu (idade 15-64) |        | Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten) |        |
|                                    |        | Male                          | Female | Male                                         | Female |
| Fatululic                          | 2,173  | 1,840                         | 1,989  | 1,878                                        | 1,782  |
| Fatumean                           | 3,516  | 830                           | 903    | 921                                          | 862    |
| Fohorem                            | 4,442  | 1,216                         | 1,282  | 981                                          | 963    |
| Maucatar                           | 9,764  | 2,886                         | 2,893  | 2,056                                        | 1,930  |
| Suai                               | 28,195 | 8,707                         | 8,409  | 5,590                                        | 5,488  |
| Tilomar                            | 8,515  | 2,394                         | 2,281  | 1,967                                        | 1,873  |
| Zumalai                            | 14,266 | 3,923                         | 3,966  | 3,255                                        | 3,122  |

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

## II. PROGRESU FISIKU

### 2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu porsentagen actual fulan ida ne'e hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare'e iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hare'e #Anexu D.

## III. OBSTÁCLO IHA TERENU

### 3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

1. Durante Equipa ADN,I.P. Covalima halo monitorizasaun no Inspeksaun hasoru obstaklo sira iha Terreno mak hanesan:
  - Iha Covalima Projeto PKRIE balu iha fulan ida nee ami la konsege ba tamba asesu dalan ba fatin neba la diak iha tempo udan ho nu'ne progresu fisiko sei mantein ho Fulan kotuk nian nian.
  - Projeto balu atu hahu Kontrator no Projeto nain la informa ba Parte ADN,IP no servisu nonok deit to pagamento mak foin informa.
  - Dados ne'ebe ami prepara exemplo hanesan Lista Geral Anexo A no Lista progresu Fisiko Anexo B, tuir Back no Sumario nebe ami Prepara bazeia ba iha terreno. Maibe liu tiha loron balu lista Geral Anexo A nia resultado progresu fisiko la hanesan fali ho saida mak ami update ona. Ida nee bele fo inpakto ba superior sira halo apresentasaaun.
- ❖ Durante Equipa ADN,I.P. Covalima halo servisu iha Eskritorio ADN,I.P. Municipiu hasoru obstaklo sira mak hanesan:
  - Ami nafatin hasoru difikuldade ba Printer, tamba printer ne'ebe iha at no la funsiona ona.



- La Iha UPS ne'ebe atu suporta Komputador

- Obstacle parte Eletricidade


1. Iha Fulan Novembro nia laran iha projetu balun ne'ebe ami la bele ba halo inspesaun tamba espasu ba lina eletricidade mak laiha desde tinan kotuk no mos tempu latoo.

#### **IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU**

##### **4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu**

- Atu Informa ba superior sira atu informa superior sira husi Lina Ministerial wanhira atu hahu servisu tenke iha lina Kordenasaun ho Tekniko sira iha Municipio.
  - Sujere ba parte baze de Dados atu hare asunto ne tamba wanhira lista Geral ou Lista Anexo A, nia progresu fisiko la bazeia ba progresu iha terreno.
  - Husu ba Parte ITC atu Prepara Printer ida ba Municipio Covalima hodi nune bele Fasilita servisu iha Municipio.
  - Husu ba Parte IT atu prepara UPS hodi nune ahi mate derepente bele *save* lalais servisu ne'ebe seidauk *save* ba Komputador.
  - Rekomendasaun parte Eletricidade
1. Husu ba Parte superior atu bele hare ba kestaun hirak ne'e tamba karik projetu ne'ebe laiha ona lina eletricidade, husi parte ADN, I.P. sei continua ba halo inspesaun ou lae.

**Note: Asinatura husi Eng Municipio Covalima**

| Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Covalima/Suai |            |                                               |             |                   |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                | Deskrisaun | Identidade                                    |             |                   |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                   |            | Naran Kompletu                                | Nu. ID Card | Pozisaun          | Fotografia                                                                            | Asinatura                                                                             |
| 1                                                 | Enjineiru  | Madelino Deonizo<br>José Magno                | 170         | Enjineiru<br>EPAS |    |    |
|                                                   |            | Domingos Soares<br>Martins                    | 160         | Enjineiru<br>ITI  |   |   |
|                                                   |            | Prezenzio Legorio<br>do Carmo Dias<br>Ximenes | 212         | Enjineiru<br>EPAS |  |  |
|                                                   |            | Bosco Dinis de<br>Sousa                       | 215         | Enjineiru<br>ITI  |  |  |

|   |           |                           |     |                 |                                                                                      |                                                                                      |
|---|-----------|---------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           | Silvino D. R. R. Soares   | 177 | Enjineiru METIC |   |   |
| 2 | Enjineira | Tifania Clotaria G. Ornai | 201 | Enjineira VEBD  |   |                                                                                      |
| 3 | Motorista | Agustinho Amaral          | 068 | Motorista       |  |  |





# ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL DESEMBRO)

| LOKALIZASAUN PROJETU |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                   |                    |                      |           |                                              |                                                             |                        |                |                     |                        |                  |                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NU.                  | NARAN PROJETU                                                                                                                                                                                        | DONO PROJETU                              | KATEGORIA PROJETU | SECTOR             | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHIA                              | NUMERO KONTRATU                                             | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU  | PROGRESU FISIKU (%) | PROGRESU PAGAMENTU (%) | PAGAMENTU (\$)   | BALANSU (\$)    | STATUS PROJECTO | OBSERVASAUN                                                                                                                                                                                        |
| 1                    | The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality                                                                                                                                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ELÉCTRICIDADE      | Suai Villa           | Covalima  | Divita Unip. Lda                             | RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052                                 | \$ 230.560,12          | July 18, 2017  | 100,00%             | 90,00%                 | \$ 207.504,11    | \$ 23.056,01    | PHO             | Projeto ida ne iha Fase Retensaun                                                                                                                                                                  |
| 2                    | New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Haliun, MDGS, Matai, MDGS Haliun - Covalima Municipality | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ELÉCTRICIDADE      | Suai Villa           | Covalima  | Eron Power, Lda                              | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000435                        | \$ 987.983,35          | Sept. 1, 2016  | 24,00%              | 21,57%                 | \$ 213.139,22    | \$ 774.844,13   | PENDENTE        | Projeto ida ne Parado Hela                                                                                                                                                                         |
| 3                    | Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste                                                                                                                                                | MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN     | FI                | AEROPORTOS         | Suai Villa           | Covalima  | PT Waskita Karya (Persero) Tbk               | ICB/035/TGAP-2013                                           | \$ 67.687.412,46       | April 24, 2014 | 100,00%             | 92,65%                 | \$ 62.709.401,97 | \$ 4.978.010,49 | PHO             | La halo monitorizasaun tamba kompanhia la hadia defeitus iha tereno hahu husi 2020 to agora.                                                                                                       |
| 4                    | Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport                                                                                                                                  | MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN     | FI                | AEROPORTOS         | Suai Villa           | Covalima  | Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia) | ICB/035/TGAP-2013                                           | \$ 4.743.580,08        | May 30, 2014   | 100,00%             | 95,67%                 | \$ 4.538.294,94  | \$ 205.285,14   | PHO             | Projeto ida ne ate a data la iha informasaun                                                                                                                                                       |
| 5                    | New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)                                                                                                                                    | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES  | Suai Villa           | Covalima  | Consortio Naroman Covalima, Group Lda        | SSS/266/MOPTC-2016                                          | \$ 1.223.216,12        | July 10, 2016  | 75,91%              | 74,87%                 | \$ 915.873,80    | \$ 307.342,32   | Paradu/abandona | Projeto ne'e depois de halo pagamentu iha fulan abril 2022, ate agora seidauk kontinua servisu iha tereno, tamba kompanhia sei hein rejultadu VO nebe'e seidauk iha aprovasaun husi dono projecto. |
| 6                    | Normalization and Protection River of Gabion and New Concrete Bridge Section Busakukun, Municipality of Covalima                                                                                     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES  | Suai Villa           | Covalima  | Consortio Zemo Lda                           | SSS/346/MOPTC-2016                                          | \$ 970.974,30          | Dec. 12, 2016  | 74,13%              | 57,38%                 | \$ 557.101,01    | \$ 413.873,29   | ON-GOING        | Projeto ne'e hahu fali ona servisu iha tereno.                                                                                                                                                     |
| 7                    | Rehabilitation of Road From Haemano Bridge to Zumalai Jct. Phase II 5+020 - 10+140 Municipality Covalima                                                                                             | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES  | Suai Villa           | Covalima  | Nobre Labadai Unipessoal, Lda                | SSS/051/MOPTC-2017                                          | \$ 3.802.446,29        | Sept. 11, 2017 | 100,00%             | 98,83%                 | \$ 3.758.112,41  | \$ 44.333,88    | FHO             | Fisiku 100%, Intrega ona final ba dono projecto.                                                                                                                                                   |
| 8                    | New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste                                                                                                                                                | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | EDIFICIOS PUBLICOS | Suai Villa           | Covalima  | Giovanio                                     | RDTL-MS-DNA-NCB-20-150                                      | \$ 189.960,54          | Sept. 1, 2020  | 95,44%              | 95,44%                 | \$ 181.291,82    | \$ 8.668,72     | FHO             | Projeto ida ne FHO ona, no Osan Balansu \$ <del>8.668,72</del> fila ba Kofre Estado                                                                                                                |
| 9                    | New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste                                                                                                            | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | SAUDE              | Suai Villa           | Covalima  | Roman Junior Unipessoal, Lda                 | RDTL-MS-DNA-NCB-20-166                                      | \$ 262.452,00          | Sept. 23, 2020 | 93,51%              | 84,15%                 | \$ 220.866,46    | \$ 41.585,54    | PHO             | Projeto ida nee remata ona no iha fase retensaun nia laran                                                                                                                                         |
| 10                   | New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital, Ministry of Health Timor-Leste                                                                                                | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | EDIFICIOS PUBLICOS | Suai Villa           | Covalima  | Manu Bey Unip Lda                            | RDTL-MS-DNA-RBK-20-184                                      | \$ 70.747,68           | Jan. 11, 2021  | 91,69%              | 91,69%                 | \$ 64.870,21     | \$ 5.877,47     | PHO             | Projeto ida nee remata ona no iha fase retensaun nia laran                                                                                                                                         |
| 11                   | Rehabilitation of Road From Haemano Bridge - Zumalai Jct. Phase I 0+000 - 5+020 Municipality Covalima                                                                                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES  | Suai Villa           | Covalima  | WTJ Contraction Unipessoal Lda               | SSS/322/MOPTC-2016                                          | \$ 3.445.877,60        | Nov. 21, 2016  | 100,00%             | 96,54%                 | \$ 3.326.487,08  | \$ 119.390,52   | FHO             | Halo pagamentu retensaun 12% ( FHO )                                                                                                                                                               |
| 12                   | New Construction of Interior Fence for Prison in Suai Municipality                                                                                                                                   | MINISTERIO DA JUSTICA                     | LM-CD             | EDIFICIOS PUBLICOS | Suai Villa           | Covalima  | Fraternity Unipessoal Lda                    | MJ-062/OUTUBRO/2021                                         | \$ 149.292,80          | Sept. 19, 2021 | 94,30%              | 84,70%                 | \$ 126.446,74    | \$ 22.846,06    | ON-GOING        | Projeto ida nee agora remata ona no hein pagamento final no Break Down ba Contigencia                                                                                                              |
| 13                   | Prefurasaun No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala                                                                                                                                                  | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU            | LM-CD             | AGUA E SANEAMENTO  | Suai Villa           | Covalima  | Paya's Sisters                               | 002.LM/RDTL/MPIE/A.D.N /Da Rfq/VI/2019/EDIFICIO DEPARTAMENT | \$ 264.381,80          | July 3, 2019   | 100,00%             | 100,00%                | \$ 264.381,80    | \$ 1.398,61     | FHO             | Projeto ida nee halo ona pagamento retensaun balu, tuir CPV nebe parte financas ADN,I.P Prepara, no balansu \$ 1,398.61 sei halo tan pagamento iha tinan 2022                                      |
| 14                   | Projeto Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran                                                                                                                                                         | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-CD             | EDIFICIOS PUBLICOS | Suai Villa           | Covalima  | Roman Junior Unipessoal, Lda                 | NCB-04/MEJD/DNA/2021                                        | \$ 183.328,80          | 26-11-2021     | 48,28%              | 31,27%                 | \$ 57.331,46     | \$ 125.997,34   | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                      |
| 15                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Laen Tolu                                                                                                                                                | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN          | Suai Villa           | Covalima  | MEJD PKRIE EBF LAEN TOLU                     | Kontratu ho Grupo Comunitario                               | \$ 128.627,66          | Oct. 15, 2021  | 48,52%              | 48,23%                 | \$ 62.038,03     | \$ 66.589,63    | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                      |
| 16                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Holbolu                                                                                                                                                  | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN          | Suai Villa           | Covalima  | MEJD PKRIE EBF HOLBULO                       | Kontratu ho Grupo Comunitario                               | \$ 72.561,80           | Oct. 15, 2021  | 52,26%              | 52,26%                 | \$ 37.921,70     | \$ 34.640,10    | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                      |
| 17                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maucola                                                                                                                                                  | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN          | Suai Villa           | Covalima  | MEJD PKRIE EBF MAUCOLA                       | Kontratu ho Grupo Comunitario                               | \$ 65.448,21           | Oct. 15, 2021  | 56,58%              | 56,58%                 | \$ 37.030,50     | \$ 28.417,71    | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                      |





# ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL DESEMBRO)

| LOKALIZASAUN PROJETU |                                                                                                                                                |                                           |                   |                    |                      |           |                                              |                                      |                        |                |                     |                        |                |               |                 |                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NU.                  | NARAN PROJETU                                                                                                                                  | DONO PROJETU                              | KATEGORIA PROJETU | SECTOR             | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHA                               | NUMERO KONTRATU                      | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU  | PROGRESU FISIKU (%) | PROGRESU PAGAMENTU (%) | PAGAMENTU (\$) | BALANSU (\$)  | STATUS PROJECTO | OBSERVASAUN                                                                                       |
| 18                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Busacucun                                                                                          | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN          | Suai Villa           | Covalima  | MEJD PKRIE EPE BUSACUCUN                     | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 112.750,45          | Oct. 15, 2021  | 29,80%              | 49,30%                 | \$ 55.587,93   | \$ 112.750,45 | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                     |
| 19                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Akar Laran                                                                                         | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN          | Suai Villa           | Covalima  | MEJD PKRIE EPE AKAR LARAN                    | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 102.502,01          | Oct. 15, 2021  | 50,94%              | 50,94%                 | \$ 52.218,98   | \$ 50.283,03  | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                     |
| 20                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESGP Suai                                                                                              | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN          | Suai Villa           | Covalima  | MEJD PKRIE ESGP SUAI                         | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 103.904,22          | Oct. 15, 2021  | 50,05%              | 50,05%                 | \$ 52.003,81   | \$ 51.900,41  | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                     |
| 21                   | Project Construction of Check Dam in Zolai River Municipality Covalima                                                                         | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | FLOOD CONTROL      | Suai Villa           | Covalima  | Santana Diak Unipessoal Lda                  | MOP-W-220003                         | \$ 560.804,96          | Jan. 31, 2022  | 99,92%              | 89,93%                 | \$ 504.315,79  | \$ 560.804,96 | ON-GOING        | PHO                                                                                               |
| 22                   | New Construction of Path way Conection of ICU Building and Isolation Building at Hospital Referral Suai, Covalima, Timor-Leste                 | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | SAUDE              | Suai Villa           | Covalima  | Milcha Unip Lda                              | RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-234            | \$ 10.328,42           | Jan. 15, 2022  | 87,25%              | 0,00%                  | \$ -           | \$ 10.328,42  | PHO             | Projeto ida nee remata ona no iha fase retensaun nia laran                                        |
| 23                   | New Construction of ESCOLA CAFE building in Covalima Municipality                                                                              | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | FI                | EDUKASAUN          | Suai Villa           | Covalima  | JLC, LDA., IN JOINT VENTURE WITH AITULA, LDA | NCB/321/MEJD-2021                    | \$ 820.206,62          | 08-Jun-22      | 10,97%              | 10,42%                 | \$ 85.492,80   | \$ 734.713,82 | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                     |
| 24                   | Project Check Dam In Haimanu River, Municipality of Covalima                                                                                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | FLOOD CONTROL      | Suai Villa           | Covalima  | Romante Pty. Ltd                             | MOP-W-220005                         | \$ 517.282,04          | Jan. 24, 2022  | 65,39%              | 51,43%                 | \$ 266.040,36  | \$ 517.282,04 | ON-GOING        | Prjeto ida ne agora lao hela                                                                      |
| 25                   | Roads Maintenance Section : Urban Road Maintenance Suai (45 KM) Periodic Maintenance Suai Vila (Tribunal and DIO Office) Covalima Municipality | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS E PONTES  | Suai Villa           | Covalima  | Jufado                                       | RFQ/CD/MOP/22003A                    | \$ 24.132,86           | 09-May-22      | 18,14%              | 0,00%                  | \$ -           | \$ 24.132,86  | ON-GOING        |                                                                                                   |
| 26                   | Road Maintenance Section : Urban Road Suai Town 2021, Covalima Municipality                                                                    | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS E PONTES  | Suai Villa           | Covalima  | Joelamor, Unipessoal, Lda                    |                                      | \$ 29.471,35           | 01-Jun-22      | 0,00%               | 0,00%                  | \$ -           | \$ 29.471,35  | ON-GOING        |                                                                                                   |
| 27                   | New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality                 | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ELÉCTRICIDADE      | Tilomar              | Covalima  | Lalenok Fronteira, unip.lda                  | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366 | \$ 323.539,34          | July 6, 2016   | 100,00%             | 87,54%                 | \$ 283.223,74  | \$ 40.315,60  | ON-GOING        | Projeto ida ne remata ona no la iha tan item seluk atu kontinua                                   |
| 28                   | River normalization and protection in Fatuk Oan                                                                                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES  | Tilomar              | Covalima  | Consorcio Lorico Covalima                    | SSS/263/MOPTC-2016                   | \$ 482.705,06          | July 10, 2016  | 75,18%              | 75,18%                 | \$ 362.886,49  | \$ 119.818,57 | ABANDONA        | Projecto refere abandona kleur ona husi kompanhia ate agora la iha aktividade servisu iha tereno. |
| 29                   | Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Suai- Covalima                                                                        | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA   | LM-BS             | EDIFICIOS PUBLICOS | Tilomar              | Covalima  | Ota Gelor                                    | RDTL:73/GMTAC/X/2015                 | \$ 33.091,06           | Aug. 8, 2014   | 80,00%              | 55,09%                 | \$ 18.231,33   | \$ 14.859,73  | ON-GOING        | Projeto ida ne agora rehabilita fali ona ba fatin karantina                                       |
| 30                   | Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk                                                                     | MINISTERIO SAUDE                          | PDIM              | SAUDE              | Tilomar              | Covalima  | Joia Camenasa Unip. Lda                      | 06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019      | \$ 186.843,31          | Sept. 16, 2019 | 98,57%              | 98,57%                 | \$ 184.165,90  | \$ 2.677,41   | FHO             | Projeto ida ne FHO ona, no Osan Balansu \$ <u>2.677,41</u> fila ba Kofre Estado                   |





# ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL DESEMBRO)

LOKALIZASAUN PROJETU

| NU. | NARAN PROJETU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DONO PROJETU                              | KATEGORIA PROJETU | SECTOR                                         | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHA                       | NUMERO KONTRATU               | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU  | PROGRESU FISIKU (%) | PROGRESU PAGAMENTU (%) | PAGAMENTU (\$)  | BALANSU (\$)  | STATUS PROJECTO | OBSERVASAUN                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31  | R4D Rural Roads Routine Maintenance Dato Tolu Chainage 0+000 - 9+600, Lookeu Chainage 0+000 - 6+000, Casabau 008 Chainage 0+000 - 3+000, Casabau 012 Chainage 0+000 - 3+500, Casabau 018 Chainage 0+000 - 2+700, Lauwala Chainage 0+000 - 3+500, Boardikun - Mape Chainage 0+000 - 8+000, Naguidal - Lepo Chainage 0+000 - 4+000 Covalima Municipality | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN                  | Tilomar              | Covalima  | Futuro Mane Mesak Unip. Lda          | RDTL                          | \$ 109.210,34          | Aug. 13, 2019  | 72,42%              | 60,83%                 | \$ 66.429,82    | \$ 42.780,52  | PENDENTE        | Projecto nee paradu tamba husi kompanhia sei hein hela rekomendasaun pagamentu anterior nian nebe to agora seidak tama iha konta bankaria kompania nian.                                                                                          |
| 32  | Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste                                                                                                                                                                                                                                                             | MINISTERIO SAUDE                          | LM-CD             | EDIFICIOS PUBLICOS                             | Tilomar              | Covalima  | Figelato Unip. Lda                   | RDTL-MS-DNA-NCB-20-217        | \$ 129.595,17          | Abr. 21, 2021  | 99,78%              | 89,80%                 | \$ 116.381,60   | \$ 13.213,57  | PHO             | Projeto ida ne agora iha fase retensaun                                                                                                                                                                                                           |
| 33  | New Construction of Health Post and Doctor House Buiding in Beisuk, Tilomar, Covalima, Timor Leste (Niquir)                                                                                                                                                                                                                                            | MINISTERIO SAUDE                          | LM-CD             | EDIFICIOS PUBLICOS                             | Tilomar              | Covalima  | Caramé Unip Lda                      | RDTL-MS-DNA-ICB-21-071        | \$ 295.785,42          | Aug. 18, 2021  | 52,29%              | 41,48%                 | \$ 122.690,87   | \$ 173.094,55 | ON-GOING        | Projeto ida nee agora lao hela, maibe kontrator ezekurta servisu tarde no servisu la tuir espek nebe iha kontrato. Ho nune Parte A D N kordena ona ho parte Ministerio da Saude atu hare hamotuk assunto ida nee                                  |
| 34  | New Construction of U.P.F. Building in Covalima. LOT.1: New Construction of U.P.F. Building at Mota Masin                                                                                                                                                                                                                                              | MINISTERIO DO INTERIOR                    | FI                | EDIFICIOS PUBLICOS                             | Tilomar              | Covalima  | Joia Camenasa Unip. Lda              | NCB/087/MI-2021               | \$ 337.328,10          | Jan. 10, 2022  | 28,99%              | 25,64%                 | \$ 86.498,64    | \$ 250.829,46 | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                                                                     |
| 35  | R4D Rural Roads Rehabilitation Tilomar Border Chainage 0+000-3+000 Municipio Covalima                                                                                                                                                                                                                                                                  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS E PONTES                              | Tilomar              | Covalima  | Unidade Unip Lda                     | MOP/CD/NCB-R/ERD/22003        | \$ 342.566,56          | July 30, 2022  | 9,95%               | 0,00%                  | \$ -            | \$ 342.566,56 | ON-GOING        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36  | Mini Construction of Refectory Room in Integrated Border Post Salele                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MINISTERIO DAS FINANÇAS                   | LM-CD             | SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS | Tilomar              | Covalima  | Naroman Mosu Dadaun, Unipessoal, Lda | N,047/2021/PSC                | \$ 29.968,50           | Nov. 17, 2021  | 100,00%             | 60,83%                 | \$ 18.231,33    | \$ 11.737,17  | ON-GOING        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37  | R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 9+600 - 11+100 Covalima Municipality                                                                                                                                                                                                                                                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN                  | Fohorem              | Covalima  | Unidade Unip Lda                     | RT/027/MOP-2019               | \$ 284.245,59          | Dec. 20, 2019  | 100,00%             | 89,64%                 | \$ 254.811,22   | \$ 29.434,37  | FHO             | FHO, halo ona rekomendasaun pagamentu retensaun. Nomos projecto ne'e entrega ona ba dono projecto                                                                                                                                                 |
| 38  | R4D Rural Road Rehabilitation Dato- Tolu Chainage 11+100 - 12+600 Covalima Municipality                                                                                                                                                                                                                                                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN                  | Fohorem              | Covalima  | Verde Caisahe Lda                    | NCB/057/MOP-2019              | \$ 283.833,62          | March 1, 2020  | 45,05%              | 100,00%                | \$ 283.833,61   | \$ 0,01       | PHO             | Progresu Fisiku 100% PHO                                                                                                                                                                                                                          |
| 39  | Construction, Rehabilitation and Installation of Clean Water with System Gravitation in Suco Fohorem Villa                                                                                                                                                                                                                                             | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN                  | Fohorem              | Covalima  | Loro Metan Unipessoal, Lda           | SSS/293/MOPTC-2016            | \$ 403.536,65          | Nov. 22, 2016  | 100,00%             | 39,65%                 | \$ 159.993,44   | \$ 243.543,21 | FHO             | Projeto ida ne agora kontinua abandonan no abandona hahu kedas husi tinan 2018.                                                                                                                                                                   |
| 40  | Construction of Baer Bridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | PONTES                                         | Fohorem              | Covalima  | PT. Duta Graha                       | RDTL- 120002189               | \$ 6.310.652,65        | 23-May-10      | 50,00%              | 99,06%                 | \$ 6.251.415,94 | \$ 59.236,71  | PENDENTE        | Projeto refere atinge 100% iha tinan 7 liu ba kotuk, balansu nebe'e iha presija halo konfirmasaun ho dono projeto e nomos hare fila fali iha pagamentu anterior nian, hodi nune bele hatene lolos osamentu nebe'e sei iha balansu nia disposizaun |
| 41  | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF 1,2 Aitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                                      | Fohorem              | Covalima  | MEJD PKRIE EBF 1,2 AITOS             | Kontratu ho Grupo Comunitario | \$ 109.418,63          | Oct. 15, 2021  | 50,17%              | 50,00%                 | \$ 54.712,09    | \$ 54.706,54  | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                                                                     |
| 42  | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESTV Nutetu de Fohorem                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                                      | Fohorem              | Covalima  | MEJD PKRIE ESTV NUTETU DE FOHOREM    | Kontratu ho Grupo Comunitario | \$ 112.263,37          | Oct. 15, 2021  | 0,00%               | 49,84%                 | \$ 55.950,21    | \$ 56.313,16  | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                                                                     |
| 43  | Rehabilitasaun Estrada Rural, Taroman - Dato- Tolu Chainage, Covalima 0+000-2+000 (2.0 Km)                                                                                                                                                                                                                                                             | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS E PONTES                              | Fohorem              | Covalima  | Verde Caisahe Lda                    | RT/038/MOP-2021               | \$ 341.768,07          | 08-Mar-22      | 31,65%              | 0,00%                  | \$ -            | \$ 341.768,07 | ON-GOING        | Iha terreno Kontrator seidak hahu servisu                                                                                                                                                                                                         |
| 44  | Rehabilitasaun Estrada Rural, Natardik - Dato Tolu Roads Chainage 0+000-3+000, Municipio Covalima                                                                                                                                                                                                                                                      | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS E PONTES                              | Fohorem              | Covalima  | Delta Nova Junior unip Lda           | MOP/CD/NCB-R/ERD/22009        | \$ 481.699,96          | Sept. 30, 2022 | 99,63%              | 28,43%                 | \$ 136.949,33   | \$ 344.750,63 | ON-GOING        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45  | Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160                                                                                                                                                                                                                                            | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES                              | Fatumea              | Covalima  | Be'e horis, Unip. Lda                | SSS/103/MOPTC-2017            | \$ 3.407.674,66        | Sept. 15, 2017 | 96,66%              | 86,43%                 | \$ 2.945.189,07 | \$ 462.485,59 | ON-GOING        | Progressu Fisiku finaliza ona 100% iha tereno, no hein aprovasaun CCO No.2 husi Dono projecto hodi lori ba prosesu pagamentu nian iha periode tuir mai.                                                                                           |





# ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL DESEMBRO)

| LOKALIZASAUN PROJETU |                                                                                                                                    |                                           |                   |                               |                      |           |                              |                                      |                        |                |                     |                        |                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NU.                  | NARAN PROJETU                                                                                                                      | DONO PROJETU                              | KATEGORIA PROJETU | SECTOR                        | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHIA              | NUMERO KONTRATU                      | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU  | PROGRESU FISIKU (%) | PROGRESU PAGAMENTU (%) | PAGAMENTU (\$)  | BALANSU (\$)    | STATUS PROJECTO | OBSERVASAUN                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46                   | Konstrusaun Edificio Posto Saude No Konstrusaun Recidencia Mediku Nanu-Fatumea                                                     | MINISTERIO SAUDE                          | PDIM              | SAUDE                         | Fatumea              | Covalima  | Unidade Unip Lda             | 05/A.M.Covalima/KDM-AMP/VII/2019     | \$ 228.246,62          | Sept. 16, 2019 | 56,45%              | 96,66%                 | \$ 220.615,79   | \$ 7.630,83     | ON-GOING        | Projeto ida ne halo ona pagamento Retensaun bazeia ba Justifikasaun husi Projeto nain. Balansu osan <u>\$ 7.630,83</u> fila ba Kofre Estado                                                                                                     |
| 47                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macocon                                                                                | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Fatumea              | Covalima  | MEJD PKRIE EBF 1,2 MACOCON   | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 75.543,07           | Oct. 15, 2021  | 50,06%              | 56,45%                 | \$ 42.641,19    | \$ 32.901,88    | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                                                                   |
| 48                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Fatumea                                                                                | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Fatumea              | Covalima  | MEJD PKRIE EBC FATUMEA       | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 174.827,75          | Oct. 15, 2021  | 50,12%              | 50,06%                 | \$ 87.522,13    | \$ 87.305,62    | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                                                                   |
| 49                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Traducama                                                                              | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Fatumea              | Covalima  | MEJD PKRIE EBF TRADUCAMA     | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 115.378,76          | Oct. 15, 2021  | 39,66%              | 50,12%                 | \$ 57.827,58    | \$ 57.551,18    | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                                                                   |
| 50                   | Road Maintenance Section Taroman - Datorua - Fatumeta (A016) 13.15 Km Section Covalima Municipality (162)                          | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS             | ESTRADAS E PONTES             | Fatululik            | Covalima  | Jufado                       | NCB-MOP-190014                       | \$ 300.403,42          | Oct. 8, 2019   | 100,00%             | 35,69%                 | \$ 107.214,96   | \$ 193.188,46   | ABANDONA        | Kondisaun aktual agora iha tereno abandona hela tamba companhia la iha finaseiru nebe'e suficiente hodi apoiu aktividade servisu iha tereno                                                                                                     |
| 51                   | Construction of Taroman Bridge                                                                                                     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | PONTES                        | Fatululik            | Covalima  | Ensul Engenharia, S.A.       | RDTL- 11005004                       | \$ 2.445.005,95        | Nov. 10, 2011  | 97,84%              | 86,59%                 | \$ 2.117.121,82 | \$ 327.884,13   | PENDENTE        | Projeto refere atinge 100% iha tinan 7 liu ba kotuk, balansu nebe'e iha presija halo konfirmasaun ho dono projeto e nomos hare fila fali iha pagamentu anterior nian, hodi nune bele hatene los osamentu nebe'e sei iha balansu nia disposizaun |
| 52                   | Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore to Aldeia iha Roads Covalima Municipality                            | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES             | Maucatar             | Covalima  | Maun Alin Suai Unip Lda      | SSS/135/MOPTC-2016                   | \$ 955.722,62          | July 29, 2016  | 56,96%              | 78,02%                 | \$ 745.653,07   | \$ 210.069,55   | PHO             | Progressu fisiku finaliza ona 100% iha tereno, Maibe dezenho no Variation seidaik iha aprovasaun husi dono projecto                                                                                                                             |
| 53                   | Rebidding of Project Road Maintenance Sections ; Suai, Maucatar - Lelaus Municipality Covalima (162)                               | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS             | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Maucatar             | Covalima  | Verde Caisahe Lda            | NCB-MOP-190010                       | \$ 242.501,42          | Dec. 15, 2019  | 54,87%              | 51,26%                 | \$ 124.309,81   | \$ 118.191,61   | ABANDONA        | Kondisaun aktual agora iha tereno Abandona hela tamba companhia la iha finaseiru nebe'e suficiente hodi apoiu aktividade servisu iha tereno                                                                                                     |
| 54                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Has-Ain                                                                                | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Maucatar             | Covalima  | MEJD PKRIE EBF HAS -AIN      | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 69.614,12           | Oct. 15, 2021  | 12,72%              | 54,87%                 | \$ 38.194,23    | \$ 31.419,89    | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                                                                   |
| 55                   | Rural Road Rehabilitation of Lookeu Chainage 6+000-9+000 (3km), Covalima Municipality                                              | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES             | Maucatar             | Covalima  | Holpilat Unipessoal Lda      | RT/037/MOP-2021                      | \$ 371.196,19          | Jan. 3, 2022   | 82,01%              | 0,00%                  | \$ -            | \$ 371.196,19   | ON-GOING        | On Progress                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56                   | New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covalima Municipality                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ELÉCTRICIDADE                 | Zumalai              | Covalima  | Foho Rua Unip. Lda           | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000404 | \$ 466.841,13          | July 6, 2016   | 96,00%              | 73,80%                 | \$ 344.551,37   | \$ 122.289,76   | ON-GOING        | Projeto ida ne remata ona no la iha tan item seluk atu kontinua                                                                                                                                                                                 |
| 57                   | New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai - Covalima Municipality                      | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ELÉCTRICIDADE                 | Zumalai              | Covalima  | Mania Unip, Lda              | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000427 | \$ 721.805,08          | Sept. 1, 2016  | 70,39%              | 86,24%                 | \$ 622.455,90   | \$ 99.349,18    | ON-GOING        | Projeto ida ne remata ona no la iha tan item seluk atu kontinua                                                                                                                                                                                 |
| 58                   | Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES             | Zumalai              | Covalima  | Clardel Interprice Unip Lda  | SSS/227/MOPTC-2016                   | \$ 3.026.312,56        | Sept. 13, 2016 | 100,00%             | 60,64%                 | \$ 1.835.036,16 | \$ 1.191.276,40 | ABANDONA        | Obra ne'e sei iha balansu osamentu ba fisiku konstrusaun nian, maibe obra ne'e Abandona iha tinan 2019 to agora la iha informasaun ruma husi companhia konaba continuidade obra refere.                                                         |
| 59                   | Rehabilitation of Road From Haemanu Bridge Zumalai Junction ( 0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES             | Zumalai              | Covalima  | Star Suai, Lda               | SSS/050/MOPTC-2017                   | \$ 3.461.708,40        | Sept. 7, 2017  | 96,33%              | 99,46%                 | \$ 3.442.929,02 | \$ 18.779,38    | PHO             | Fisiku 100%, PHO.                                                                                                                                                                                                                               |
| 60                   | Rehabilitation of Roads and Slope Protection Road Section: Be'e Mean Zumalai National Road (250 M)                                 | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES             | Zumalai              | Covalima  | Roman Junior Unipessoal, Lda | SSS/049/MOPTC-2017                   | \$ 3.986.121,62        | Sept. 5, 2017  | 87,44%              | 86,56%                 | \$ 3.450.202,89 | \$ 535.918,73   | PHO             | Hein prosesu pagamentu 100%,no halo PHO ba dono projecto                                                                                                                                                                                        |
| 61                   | Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai                                                                                                | GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO             | LM-TP             | EDIFICIOS PUBLICOS            | Zumalai              | Covalima  | Aitula Construction, Lda     | 002/NC-ZC/VII/2015                   | \$ 1.196.660,00        | Aug. 1, 2015   | 96,79%              | 78,70%                 | \$ 941.722,09   | \$ 254.937,91   | ON-GOING        | Projeto ida remata ona no ate a data companhia seidaik submete pagamento final                                                                                                                                                                  |
| 62                   | Konstrusaun Eskola Tekniko Professional Zumalai                                                                                    | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | PDIM              | EDUKASAUN                     | Zumalai              | Covalima  | Sabudoj Unip. Lda            | 03/A.M.Covalima/KDM-AMP/VII/2019     | \$ 177.630,77          | July 15, 2019  | 89,63%              | 96,79%                 | \$ 171.935,57   | \$ 5.695,20     | FHO             | Projeto ida ne halo ona FHO. No Osan balansu <u>\$ 5.695,20</u> fila fali ba Kofre Estado                                                                                                                                                       |





# ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL DESEMBRO)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                               | LOKALIZASAUN PROJETU |           |                                        |                               |                        |                |                     |                        |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NU.   | NARAN PROJETU                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DONO PROJETU                              | KATEGORIA PROJETU | SECTOR                        | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHA                         | NUMERO KONTRATU               | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU  | PROGRESU FISIKU (%) | PROGRESU PAGAMENTU (%) | PAGAMENTU (\$)    | BALANSU (\$)     | STATUS PROJECTO | OBSERVASAUN                                                                                                                                                                                                                         |
| 63    | Rural Roads Periodik Maintenance Lepo - Lour Chainage 0+000-3+000                                                                                                                                                                                                                                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES             | Zumalai              | Covalima  | Futuro Mane Mesak Unip. Lda            | MPW-W-190260                  | \$ 73.033,49           | Dec. 19, 2019  | 52,06%              | 80,66%                 | \$ 58.910,72      | \$ 14.122,77     | PHO             | Obra ne'e remata ona 100%,iha fulan Junho 2021 hein submisaun pagamentu husi kompanhia ba dono projecto                                                                                                                             |
| 64    | Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai (50+900 km) Road Section : Jct A16 Uele'o - Jct A02 Zumalai (35+120) Road Section 8 : Zulo - Jct Zumalai ( 30+100 - 35+120 km ) Municipality Covalima                                                                                     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES             | Zumalai              | Covalima  | Octogono Constr. Unip. Lda             | SSS/067/MOPTC-2017            | \$ 3.748.915,76        | Sept. 7, 2017  | 48,95%              | 43,24%                 | \$ 1.621.097,23   | \$ 2.127.818,53  | ON-GOING        | Projecto ne'e lao hela                                                                                                                                                                                                              |
| 65    | Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai ( 50+900 km ), Road Section : Jct A16 Uele'o - Jct A02 Zumalai ( 35+120 ) Road Section 7 : Fatulito - Zulo ( 25+800 - 30+100 ) Municipality Bobonaro - Covalima                                                                           | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES             | Zumalai              | Covalima  | Marino Enterprises, Lda                | SSS/065/MOPTC-2017            | \$ 4.314.282,59        | Sept. 12, 2017 | 97,04%              | 43,04%                 | \$ 1.857.021,22   | \$ 2.457.261,37  | ON-GOING        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 66    | Manutensaun no Konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Oebaba - Covalima                                                                                                                                                                                                                                      | MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS           | LM-CD             | FLOOD CONTROL                 | Zumalai              | Covalima  | Lifran Unip. Lda                       | RDTL-2021-15595               | \$ 260.523,18          | Oct. 5, 2021   | 53,12%              | 87,78%                 | \$ 228.675,29     | \$ 31.847,89     | PHO             | Progressu iha tereno finaliza ona 100%,hein prosesu pagamentu                                                                                                                                                                       |
| 67    | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai                                                                                                                                                                                                                                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Zumalai              | Covalima  | MEJD PKRIE EBC ZUMALAI                 | Kontratu ho Grupo Comunitario | \$ 160.283,28          | Oct. 15, 2021  | 25,01%              | 53,12%                 | \$ 85.142,51      | \$ 75.140,77     | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                                                       |
| 68    | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Uce-Cai                                                                                                                                                                                                                                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Zumalai              | Covalima  | MEJD PKRIE EBF UCE-CAI                 | Kontratu ho Grupo Comunitario | \$ 109.981,83          | Oct. 15, 2021  | 50,32%              | 25,01%                 | \$ 27.506,75      | \$ 82.475,08     | ON-GOING        | Projeto ida ne asesu dalan ba terreno susar tebes, ho nune plano sei up date progressu fisico iha fulan Setembro wanhira Grupo hadia ona dalan hodi mobiliza material ba terreno                                                    |
| 69    | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa                                                                                                                                                                                                                                                      | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Zumalai              | Covalima  | MEJD PKRIE EBF SALASA                  | Kontratu ho Grupo Comunitario | \$ 110.004,78          | Oct. 15, 2021  | 51,24%              | 50,32%                 | \$ 55.359,58      | \$ 54.645,20     | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                                                       |
| 70    | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soiliga                                                                                                                                                                                                                                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Zumalai              | Covalima  | MEJD PKRIE EBF SOILIGA                 | Kontratu ho Grupo Comunitario | \$ 101.608,75          | Oct. 15, 2021  | 30,82%              | 51,24%                 | \$ 52.062,65      | \$ 49.546,10     | ON-GOING        | Projeto ida ne agora lao hela                                                                                                                                                                                                       |
| 71    | For Roads Maintenance Section : Mola - Mota Masin ( Multi - Year Program )/ RM Covalima Municipality                                                                                                                                                                                                    | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS E PONTES             | Zumalai              | Covalima  | Delta Dini                             | MPW - W - 220008              | \$ 547.362,82          | Jan. 3, 2022   | 100,00%             | 27,25%                 | \$ 149.129,02     | \$ 398.233,80    | ON-GOING        | Projeto ida nee agora lao hela                                                                                                                                                                                                      |
| 72    | Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro and Manufahi                                                                                                                                                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES             | Multy Posto          | Covalima  | Maun Alin Suai Unip Lda                | SSS/029/MOPTC-2017            | \$ 379.631,20          | July 7, 2017   | 100,00%             | 84,10%                 | \$ 319.270,12     | \$ 60.361,08     | ON-GOING        | Ate a data la iha informasaun konaba projeto ida nee                                                                                                                                                                                |
| 73    | Rehabilitation of Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 17+500-23+800                                                                                                                                                                                                                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES             | Multy Posto          | Covalima  | Expres Distribution Services Unip. Lda | SSS/318/MOPTC-2016            | \$ 4.941.274,57        | Dec. 9, 2016   | 51,08%              | 84,68%                 | \$ 4.184.042,48   | \$ 757.232,09    | PHO             | Obra ne'e remata ona 100%, iha tinan 2019 hein submisaun pagamentu husi kompanhia ba dono projecto, nomos iha problema adisional nebe'e seidauk iha aprovasaun husi dono do projeto.                                                |
| 74    | Manutensaun Estrada Lookeu. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200-Municipal of Covalima                                                                                                                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Multy Posto          | Covalima  | Manu Bey Unip Lda                      | RT/079/MOPTC-2016             | \$ 150.247,52          | Aug. 19, 2016  | 88,48%              | 45,97%                 | \$ 69.074,95      | \$ 81.172,57     | PENDENTE        | Projecto refere abandona / parado iha tinan 2019 ate agora tamba problema menus financeiro, Agora dadaun iha ona projeto foun halo manutensaun ba lokasaun refere husi ILO-R4D nebeé implementa hela husi kompania Futuru Manemesak |
| 75    | Rural Roads Routine Maintenance Lepo-Lour Sta 0+000-3+000, Naguidal - Lour Sta 0+000-5+000, Boardikun - Mape Sta 0+000-8+000 / 162                                                                                                                                                                      | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Multy Posto          | Covalima  | Futuro Mane Mesak Unip Lda             | MPWTC-CD-170015               | \$ 34.106,69           | Jan. 8, 2017   | 0,00%               | 88,48%                 | \$ 30.176,89      | \$ 3.929,80      | PENDENTE        | Agora dadaun iha ona projeto foun halo manutensaun ba lokasaun refere husi ILO-R4D nebeé implementa hela husi kompania Futuru Manemesak, ho kontratu foun                                                                           |
| 76    | Rural Roads Routine Maintenance Dato Tolu Cha 0+000 - 9+600, Lookeu Cha 0+000 - 6+000, Casabauc 008 Cha 0+000 - 3+000, Casabauc 012 Cha 0+000 - 3+500, Casabauc 018 Cha 0+000 - 2+700, Lalawa Cha 0+000 - 3+500, Boraikun Mape Cha 0+000 - 8+000, Naguidal Lepo Cha 0+000 - 4+000 Municipality Covalima | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS E PONTES             | Multy Posto          | Covalima  | Lufi Raica Unip Lda                    | MPW/WNCB/R/190048             | \$ 109.210,34          | Aug. 13, 2019  | 0,00%               | 0,00%                  | \$ -              | \$ 109.210,34    | PENDENTE        | Projeto ne'e seidauk implementa iha tereno,no iha ona projeto foun husi R4D implementa ona area fefere husi kompanhia Futuru-Manemesak.                                                                                             |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                               |                      |           |                                        |                               | \$ 133.821.946,88      |                |                     | 84,28%                 | \$ 112.782.750,54 | \$ 21.866.539,03 |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |





# ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL DESEMBRO)

LOKALIZASAUN PROJETU

| NU. | NARAN PROJETU | DONO PROJETU | KATEGORIA PROJETU | SECTOR | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHA | NUMERO KONTRATU | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU | PROGRESU FISIKU (%) | PROGRESU PAGAMENTU (%) | PAGAMENTU (\$) | BALANSU (\$) | STATUS PROJECTO | OBSERVASAUN |
|-----|---------------|--------------|-------------------|--------|----------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
|-----|---------------|--------------|-------------------|--------|----------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|

Prepara Husi :

(Eng. Madelino D. J. Magno)  
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Covalima ADN, I.P.

(Eng. Prezenzio L. C. D. Ximenes)  
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Covalima ADN, I.P.

(Eng. Domingos Soares Martins)  
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Covalima  
ADN, I.P.

(Eng. Bosco Dinis de Sousa)  
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio  
Covalima  
ADN, I.P.

(Silvino D. R. Soares)  
Eng. M & E, Municipio Covalima ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)  
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.





# ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA

| PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                   |                         |                      |           |                                              |                                                            |                        |                | Dezembro 2022           |                           |                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| NU.                                            | NARAN PROJETU                                                                                                                                                                                        | DONO PROJETU                              | KATEGORIA PROJETU | SECTOR                  | LOKALIZASAUN PROJETU |           | NARAN COMPANHA                               | NUMERO KONTRATU                                            | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU  | Dezembro 2022           |                           |                           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                   |                         | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU |                                              |                                                            |                        |                | Previous Progress ( % ) | This Month Progress ( % ) | Cumulative Progress ( % ) |
| 1                                              | The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality                                                                                                                                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ELETRIFIKASAUN NASIONAL | Suai Villa           | Covalima  | Divita Unip. Lda                             | RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052                                | \$ 230,560.12          | July 18, 2017  | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |
| 2                                              | New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Haliun, MDGS, Matai, MDGS Haliun - Covalima Municipality | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ELETRIFIKASAUN NASIONAL | Suai Villa           | Covalima  | Eron Power, Lda                              | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 0000435                        | \$ 987,983.35          | Sept. 1, 2016  | 24.00%                  | 0.00%                     | 24.00%                    |
| 3                                              | Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste                                                                                                                                                | MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN     | FI                | AEROPORTOS              | Suai Villa           | Covalima  | PT Waskita Karya (Persero) Tbk               | ICB/035/TGAP-2013                                          | \$ 67,687,412.46       | April 24, 2014 | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |
| 4                                              | Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport                                                                                                                                  | MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN     | FI                | AEROPORTOS              | Suai Villa           | Covalima  | Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia) | ICB/035/TGAP-2013                                          | \$ 4,743,580.08        | May 30, 2014   | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |
| 5                                              | New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)                                                                                                                                    | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                | Suai Villa           | Covalima  | Consortio Naroman Covalima, Group Lda        | SSS/266/MOPTC-2016                                         | \$ 1,223,216.12        | July 10, 2016  | 72.06%                  | 3.84%                     | 75.91%                    |
| 6                                              | Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun                                                                                                                         | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                | Suai Villa           | Covalima  | Consortio Zemo Lda                           | SSS/346/MOPTC-2016                                         | \$ 970,974.30          | Dec. 12, 2016  | 74.13%                  | 0.00%                     | 74.13%                    |
| 7                                              | Rehabilitation of Road From Haemano Bridge to Zumalai Jct. Phase II 5+020 - 10+140 Municipality Covalima                                                                                             | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                | Suai Villa           | Covalima  | Nobre Labadai Unipessoal, Lda                | SSS/051/MOPTC-2017                                         | \$ 3,802,446.29        | Sept. 11, 2017 | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |
| 8                                              | New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste                                                                                                                                                | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | EDIFICIOS PUBLICOS      | Suai Villa           | Covalima  | Giovanio                                     | RDTL-MS-DNA-NCB-20-150                                     | \$ 189,960.54          | Sept. 1, 2020  | 95.44%                  | 0.00%                     | 95.44%                    |
| 9                                              | New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste                                                                                                            | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | SAUDE                   | Suai Villa           | Covalima  | Roman Junior Unipessoal, Lda                 | RDTL-MS-DNA-NCB-20-166                                     | \$ 262,452.00          | Sept. 23, 2020 | 93.51%                  | 0.00%                     | 93.51%                    |
| 10                                             | New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital, Ministry of Health Timor-Leste                                                                                                | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | EDIFICIOS PUBLICOS      | Suai Villa           | Covalima  | Manu Bey Unip Lda                            | RDTL-MS-DNA-RBK-20-184                                     | \$ 70,747.68           | Jan. 11, 2021  | 91.69%                  | 0.00%                     | 91.69%                    |
| 11                                             | Rehabilitation of Road From Haemano Bridge - Zumalai Jct. Phase I 0+000 - 5+020 Municipality Covalima                                                                                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                | Suai Villa           | Covalima  | WTJ Contraction Unipessoal Lda               | SSS/322/MOPTC-2016                                         | \$ 3,445,877.60        | Nov. 21, 2016  | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |
| 12                                             | New Construsaun of Interior Fence for Prison in Suai Municipality                                                                                                                                    | MINISTERIO DA JUSTICA                     | LM-CD             | EDIFICIOS PUBLICOS      | Suai Villa           | Covalima  | Fraternity Unipessoal Lda                    | MJ-062/OUTUBRO/2021                                        | \$ 149,042.88          | Sept. 19, 2021 | 92.60%                  | 1.70%                     | 94.30%                    |
| 13                                             | Prefurasaun No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala                                                                                                                                                  | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU            | LM-CD             | AGUA E SANEAMENTO       | Suai Villa           | Covalima  | Paya's Sisters                               | 002.LM/RDTL/MPIE/A.D. N/Da Rfq/VI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT | \$ 264,381.80          | July 3, 2019   | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |
| 14                                             | Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai                                                                                                                                                           | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-CD             | EDUKASAUN               | Suai Villa           | Covalima  | Roman Junior Unipessoal, Lda                 | NCB/04/MEJD/DNA/2021                                       | \$ 183,328.80          | 26-11-2021     | 48.11%                  | 0.18%                     | 48.28%                    |
| 15                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Laen Tolu                                                                                                                                                | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN               | Suai Villa           | Covalima  | MEJD PKRIE EBF LAEN TOLU                     | Kontratu ho Grupo Comunitario                              | \$ 128,627.66          | Oct. 15, 2021  | 48.52%                  | 0.00%                     | 48.52%                    |
| 16                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Holbolu                                                                                                                                                  | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN               | Suai Villa           | Covalima  | MEJD PKRIE EBF HOLBOLU                       | Kontratu ho Grupo Comunitario                              | \$ 72,561.80           | Oct. 15, 2021  | 52.26%                  | 0.00%                     | 52.26%                    |
| 17                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maucola                                                                                                                                                  | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN               | Suai Villa           | Covalima  | MEJD PKRIE EBF MAUCOLA                       | Kontratu ho Grupo Comunitario                              | \$ 65,448.21           | Oct. 15, 2021  | 56.58%                  | 0.00%                     | 56.58%                    |
| 18                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Busacucun                                                                                                                                                | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN               | Suai Villa           | Covalima  | MEJD PKRIE EPE BUSACUCUN                     | Kontratu ho Grupo Comunitario                              | \$ 112,750.45          | Oct. 15, 2021  | 49.29%                  | 0.00%                     | 49.29%                    |
| 19                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Akar Laran                                                                                                                                               | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN               | Suai Villa           | Covalima  | MEJD PKRIE EPE AKAR LARAN                    | Kontratu ho Grupo Comunitario                              | \$ 102,502.01          | Oct. 15, 2021  | 50.94%                  | 0.00%                     | 50.94%                    |





# ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA

| PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                               |                      |           |                                      |                                             |                        |                | Dezembro 2022           |                           |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                               | LOKALIZASAUN PROJETU |           |                                      |                                             |                        |                |                         |                           |                           |
| NU.                                            | NARAN PROJETU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DONO PROJETU                              | KATEGORIA PROJETU | SECTOR                                        | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHA                       | NUMERO KONTRATU                             | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU  | Previous Progress ( % ) | This Month Progress ( % ) | Cumulative Progress ( % ) |
| 20                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Suai                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                                     | Suai Villa           | Covalima  | MEJD PKRIE ESGP SUAI                 | Kontratu ho Grupo Comunitario               | \$ 103,904.22          | Oct. 15, 2021  | 50.05%                  | 0.00%                     | 50.05%                    |
| 21                                             | Project Construction of Check Dam in Zolai River Municipality Covalima                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | FLOOD CONTROL                                 | Suai Villa           | Covalima  | MOP-W-220003                         | Santana Diak Unipessoal Lda                 | \$ 560,804.96          | Jan. 31, 2022  | 99.92%                  | 0.00%                     | 99.92%                    |
| 22                                             | New Construction of Path way Conection of ICU Building and Isolation Building at Hospital Referral Suai, Covalima, Timor-Leste                                                                                                                                                                                                                          | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | SAUDE                                         | Suai Villa           | Covalima  | RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-234            | Milcha Unip Lda                             | \$ 10,328.42           | Jan. 15, 2022  | 87.25%                  | 0.00%                     | 87.25%                    |
| 23                                             | New Construction of ESCOLA CAFE building in Covalima Municipality                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | FI                | EDUKASAUN                                     | Suai Villa           | Covalima  | NCB/321/MEJD-2021                    | JLC,LDA., IN JOINT VENTURE WITH AITULA, LDA | \$ 820,206.62          | 08-Jun-22      | 10.97%                  | 0.00%                     | 10.97%                    |
| 24                                             | Project Check Dam In Haimanu River, Municipality Covalima                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | FLOOD CONTROL                                 | Suai Villa           | Covalima  | MOP-W-220005                         | Romante Pty. Ltd                            | \$ 517,282.04          | Jan. 24, 2022  | 65.39%                  | 0.00%                     | 65.39%                    |
| 25                                             | Roads Maintenance Section : Urban Road Maintenance Suai (45 KM) Periodic Maintenance Suai Vila (Tribunal and DIO Office) Covalima Municipality                                                                                                                                                                                                          | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS E PONTES                             | Suai Villa           | Covalima  | RFQ/CD/MOP/22003A                    | Jufado                                      | \$ 24,132.86           | 09-May-22      | 18.14%                  | 0.00%                     | 18.14%                    |
| 26                                             | Road Maintenance Section : Urban Road Suai Town 2021, Covalima Municipality                                                                                                                                                                                                                                                                             | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS E PONTES                             | Suai Villa           | Covalima  | MPW-W-220067                         | Joelamor, Unipessoal, Lda                   | \$ 29,471.35           | 01-Jun-22      | 0.00%                   | 0.00%                     | 0.00%                     |
| 27                                             | New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality                                                                                                                                                                                                                          | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ELETRIFIKASAUN NASIONAL                       | Tilomar              | Covalima  | Lalenok Fronteira, unip.lda          | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366        | \$ 323,539.34          | July 6, 2016   | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |
| 28                                             | River normalization and protection in Fatuk Oan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                                      | Tilomar              | Covalima  | Consortio Lorico Covalima            | SSS/263/MOPTC-2016                          | \$ 482,705.06          | July 10, 2016  | 75.18%                  | 0.00%                     | 75.18%                    |
| 29                                             | Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Sua- Covalima                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA   | LM-BS             | EDIFICIOS PUBLICOS                            | Tilomar              | Covalima  | Ota Gelor                            | RDTL:73/GMTAC/XI/2015                       | \$ 33,091.06           | Aug. 8, 2014   | 80.00%                  | 0.00%                     | 80.00%                    |
| 30                                             | Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk                                                                                                                                                                                                                                                                              | MINISTERIO SAUDE                          | PDIM              | SAUDE                                         | Tilomar              | Covalima  | Joia Camenasa Unip. Lda              | 06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019             | \$ 186,843.31          | Sept. 16, 2019 | 98.57%                  | 0.00%                     | 98.57%                    |
| 31                                             | R4D Rural Roads Routine Maintenance Dato Tolu Chainage 0+000 - 9+600, Lookou Chainage 0+000 - 6+000, Casabau 008 Chainage 0+000 -3+000, Casabauc 012 Chainage 0+000 - 3+500, Casabauc 018 Chainage 0+000 - 2+700, Lauwala Chainage 0+000 - 3+500, Boardikun - Mape Chainage 0+000 - 8+000, Naguidal - Lepo Chainage 0+000 - 4+000 Covalima Municipality | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN                 | Tilomar              | Covalima  | Futuro Mane Mesak Unip. Lda          | RDTL                                        | \$ 109,210.34          | Aug. 13, 2019  | 72.42%                  | 0.00%                     | 72.42%                    |
| 32                                             | Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste                                                                                                                                                                                                                                                              | MINISTERIO SAUDE                          | LM-CD             | EDIFICIOS PUBLICOS                            | Tilomar              | Covalima  | Figelato Unip. Lda                   | RDTL-MS-DNA-NCB-20-217                      | \$ 129,595.17          | Abr. 21, 2021  | 99.78%                  | 0.00%                     | 99.78%                    |
| 33                                             | New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk, Tilomar, Covalima Timor Leste ( Niquer )                                                                                                                                                                                                                                           | MINISTERIO SAUDE                          | LM-CD             | SAUDE                                         | Tilomar              | Covalima  | Caramé Unip. Lda                     | RDTL-MS-DNA-NCB-21-071                      | \$ 295,785.42          | Aug. 18, 2021  | 52.29%                  | 0.00%                     | 52.29%                    |
| 34                                             | New Construction of U.P.F. Building in Covalima. LOT.1: New Construction of U.P.F. Building at Mota Masin                                                                                                                                                                                                                                               | MINISTERIO DO INTERIOR                    | FI                | EDIFICIOS PUBLICOS                            | Tilomar              | Covalima  | Joia Camenasa Unip. Lda              | NCB/087/MI-2021                             | \$ 337,328.10          | Jan. 10, 2022  | 28.99%                  | 0.00%                     | 28.99%                    |
| 35                                             | R4D Rural Roads Rehabilitation Tilomar Border Chainage 0+000-3+000 Municipio Covalima                                                                                                                                                                                                                                                                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS E PONTES                             | Tilomar              | Covalima  | Unidade Unip Lda                     | MOP/CD/NCB-R/ERD/22003                      | \$ 342,566.56          | July 30, 2022  | 0.92%                   | 9.02%                     | 9.95%                     |
| 36                                             | Mini Construction of Refectory Room in Integrated Border Post Salele                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MINISTERIO DAS FINANÇAS                   | LM-CD             | SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURA | Tilomar              | Covalima  | Naroman Mosu Dadaun, Unipessoal, Lda | N,047/2021/PSC                              | \$ 29,968.50           | Nov. 17, 2021  |                         | 67.59%                    | 67.59%                    |





# ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA

| PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA |                                                                                                             |                                           |                   |                               |                      |           |                                   |                                      |                        |                | Dezembro 2022           |                           |                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                |                                                                                                             |                                           |                   |                               | LOKALIZASAUN PROJETU |           |                                   |                                      |                        |                |                         |                           |                           |
| NU.                                            | NARAN PROJETU                                                                                               | DONO PROJETU                              | KATEGORIA PROJETU | SECTOR                        | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHA                    | NUMERO KONTRATU                      | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU  | Previous Progress ( % ) | This Month Progress ( % ) | Cumulative Progress ( % ) |
| 37                                             | R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 9+600 - 11+100 Covalima Municipality                     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Fohorem              | Covalima  | Unidade Unip Lda                  | RT/027/MOP-2019                      | \$ 284,245.59          | Dec. 20, 2019  | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |
| 38                                             | R4D Rural Road Rehabilitation Dato- Tolu Chainage 11+100 - 12+600 Covalima Municipality                     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Fohorem              | Covalima  | Verde Caisahe Lda                 | NCB/057/MOP-2019                     | \$ 283,833.62          | March 1, 2020  | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |
| 39                                             | Construction, Rehabilitation and Installation of Clean Water with System Gravitation in Suco Fohorem Villa  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Fohorem              | Covalima  | Loro Metan Unipesola. Lda         | SSS/293/MOPTC-2016                   | \$ 403,536.65          | Nov. 22, 2016  | 45.05%                  | 0.00%                     | 45.05%                    |
| 40                                             | Construction of Baer Bridge                                                                                 | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | PONTES                        | Fohorem              | Covalima  | PT. Duta Graha                    | RDTL- 120002189                      | \$ 6,310,652.65        | 23-May-10      | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |
| 41                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF 1,2 Aitos                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Fohorem              | Covalima  | MEJD PKRIE EBF 1,2 AITOS          | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 109,418.63          | Oct. 15, 2021  | 25.38%                  | 24.62%                    | 50.00%                    |
| 42                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESTV Nutetu de Fohorem                                              | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Fohorem              | Covalima  | MEJD PKRIE ESTV NUTETU DE FOHOREM | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 112,263.37          | Oct. 15, 2021  | 25.00%                  | 25.18%                    | 50.17%                    |
| 43                                             | Rehabilitasaun Estrada Rural, Taroman - Dato-Tolu Chainage, Covalima 0+000-2+000 (2.0 Km)                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS E PONTES             | Fohorem              | Covalima  | Verde Caisahe Lda                 | RT/038/MOP-2021                      | \$ 341,768.07          | 08-Mar-22      | 0.00%                   | 0.00%                     | 0.00%                     |
| 44                                             | Rehabilitasaun Estrada Rural, Natardik - Dato Tolu Roads Chainage 0+000-3+000, Municipio Covalima           | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS E PONTES             | Fohorem              | Covalima  | Delta Nova Junior unip Ida        | MOP/CD/NCB-R/ERD/22009               | \$ 481,699.96          | Sept. 30, 2022 | 0.00%                   | 31.65%                    | 31.65%                    |
| 45                                             | Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160 | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                      | Fatumea              | Covalima  | Be'e horis, Unip. Lda             | SSS/103/MOPTC-2017                   | \$ 3,407,674.66        | Sept. 15, 2017 | 90.63%                  | 9.03%                     | 99.63%                    |
| 46                                             | Konstrusaun Edificio Posto Saude No Konstrusaun Recidencia Mediku Nanu-Fatumea                              | MINISTERIO SAUDE                          | PDIM              | SAUDE                         | Fatumea              | Covalima  | Unidade Unip Lda                  | 05/A.M.Covalima/KDM-AMP/VII/2019     | \$ 228,246.62          | Sept. 16, 2019 | 96.66%                  | 0.00%                     | 96.66%                    |
| 47                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macocon                                                         | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Fatumea              | Covalima  | MEJD PKRIE EBF 1,2 MACOCON        | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 75,543.07           | Oct. 15, 2021  | 56.45%                  | 0.00%                     | 56.45%                    |
| 48                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Fatumea                                                         | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Fatumea              | Covalima  | MEJD PKRIE EBC FATUMEA            | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 174,827.75          | Oct. 15, 2021  | 50.06%                  | 0.00%                     | 50.06%                    |
| 49                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Traducama                                                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                      | Fatumea              | Covalima  | MEJD PKRIE EBF TRADUCAMA          | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 115,378.76          | Oct. 15, 2021  | 50.12%                  | 0.00%                     | 50.12%                    |
| 50                                             | Road Maintenance Section Taroman - Datorua - Fatumeta (A016) 13.15 Km Section Covalima Municipality (162)   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS             | ESTRADAS                      | Fatululik            | Covalima  | Jufado                            | NCB-MOP-190014                       | \$ 300,403.42          | Oct. 8, 2019   | 39.66%                  | 0.00%                     | 39.66%                    |
| 51                                             | Construction of Taroman Bridge                                                                              | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | PONTES                        | Fatululik            | Covalima  | Ensul Engenharia, S.A.            | RDTL- 11005004                       | \$ 2,445,005.95        | Nov. 10, 2011  | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |
| 52                                             | Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore to Aldeia iha Roads Covalima Municipality     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                      | Maucatar             | Covalima  | Maun Alin Suai Unip Lda           | SSS/135/MOPTC-2016                   | \$ 955,722.62          | July 29, 2016  | 97.84%                  | 0.00%                     | 97.84%                    |
| 53                                             | Rebidding of Project Road Maintenance Sections ; Suai, Maucatar - Lelaus Municipality Covalima (162)        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS             | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Maucatar             | Covalima  | Verde Caisahe Lda                 | NCB-MOP-190010                       | \$ 242,501.42          | Dec. 15, 2019  | 56.96%                  | 0.00%                     | 56.96%                    |
| 54                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Has-Ain                                                         | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Maucatar             | Covalima  | MEJD PKRIE EBF HAS -AIN           | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 69,614.12           | Oct. 15, 2021  | 54.87%                  | 0.00%                     | 54.87%                    |
| 55                                             | Rural Road Rehabilitation of Lookeu Chainage 6+000-9+000 (3km), Covalima Municipality                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                      | Maucatar             | Covalima  | Holpilat Unipesoal Lda            | RT/037/MOP-2021                      | \$ 371,196.19          | Jan. 3, 2022   | 12.72%                  | 0.00%                     | 12.72%                    |
| 56                                             | New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covalima Municipality                 | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ELETRIFIKASAUN NASIONAL       | Zumalai              | Covalima  | Foho Rua Unip. Lda                | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000404 | \$ 466,841.13          | July 6, 2016   | 82.01%                  | 0.00%                     | 82.01%                    |





# ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA

| PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA |                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                   |                         |                      |           |                                        |                                      |                        |                | Dezembro 2022           |                           |                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                   |                         | LOKALIZASAUN PROJETU |           |                                        |                                      |                        |                |                         |                           |                           |
| NU.                                            | NARAN PROJETU                                                                                                                                                                                                                  | DONO PROJETU                              | KATEGORIA PROJETU | SECTOR                  | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHA                         | NUMERO KONTRATU                      | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU  | Previous Progress ( % ) | This Month Progress ( % ) | Cumulative Progress ( % ) |
| 57                                             | New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai - Covalima Municipality                                                                                                                  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ELETRIFIKASAUN NASIONAL | Zumalai              | Covalima  | Mania Unip, Lda                        | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000427 | \$ 721,805.08          | Sept. 1, 2016  | 96.00%                  | 0.00%                     | 96.00%                    |
| 58                                             | Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima                                                                                                                    | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                | Zumalai              | Covalima  | Clardel Interprice Unip Lda            | SSS/227/MOPTC-2016                   | \$ 3,026,312.56        | Sept. 13, 2016 | 70.39%                  | 0.00%                     | 70.39%                    |
| 59                                             | Rehabilitation of Road From Haemanu Bridge Zumalai Junction ( 0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima                                                                                             | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                | Zumalai              | Covalima  | Star Suai, Lda                         | SSS/050/MOPTC-2017                   | \$ 3,461,708.40        | Sept. 7, 2017  | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |
| 60                                             | Rehabilitation of be'e mean roads                                                                                                                                                                                              | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                | Zumalai              | Covalima  | Roman Junior Unipessoal, Lda           | SSS/049/MOPTC-2017                   | \$ 3,645,870.73        | Sept. 5, 2017  | 96.33%                  | 0.00%                     | 96.33%                    |
| 61                                             | Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai                                                                                                                                                                                            | GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO             | LM-TP             | EDIFICIOS PUBLICOS      | Zumalai              | Covalima  | Aitula Construction, Lda               | 002/NC-ZC/VII/2015                   | \$ 1,196,660.00        | Aug. 1, 2015   | 87.44%                  | 0.00%                     | 87.44%                    |
| 62                                             | Konstrusaun Eskola Tekniko Professional Zumalai                                                                                                                                                                                | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | PDIM              | EDUKASAUN               | Zumalai              | Covalima  | Sabudoj Unip. Lda                      | 03/A.M.Coalima/KDM-AMP/VII/2019      | \$ 177,630.77          | July 15, 2019  | 96.79%                  | 0.00%                     | 96.79%                    |
| 63                                             | Rural Roads Periodik Maintenance Lepo - Lour Chainage 0+000-3+000                                                                                                                                                              | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                | Zumalai              | Covalima  | Futuro Mane Mesak Unip. Lda            | MPW-W-190260                         | \$ 73,033.49           | Dec. 19, 2019  | 89.63%                  | 0.00%                     | 89.63%                    |
| 64                                             | Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai Road Section 8 : Zulo - Jct Zumalai ( 30+100 - 35+120 km ) Municipality Covalima                                                                                 | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                | Zumalai              | Covalima  | Octogono Constr. Unip. Lda             | SSS/067/MOPTC-2017                   | \$ 3,748,915.76        | Sept. 7, 2017  | 52.05%                  | 0.00%                     | 52.06%                    |
| 65                                             | Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai ( 50+900 km ) , Road Section : Jct A16 Uele'o - Jct A02 Zumalai ( 35+120 ) Road Section 7 : Fatulito - Zulo ( 25+800 - 30+100 ) Municipality Bobonaro - Covalima | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                | Zumalai              | Covalima  | Marino Enterprises, Lda                | SSS/065/MOPTC-2017                   | \$ 4,314,282.59        | Sept. 12, 2017 | 48.95%                  | 0.00%                     | 48.95%                    |
| 66                                             | Manutensaun no konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Oebaba - Covalima                                                                                                                                                             | MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS           | LM-CD             | FLOOD CONTROL           | Zumalai              | Covalima  | Lifran Unip. Lda                       | RDTL - 2021 - 15595                  | \$ 260,523.18          | Oct. 5, 2021   | 97.04%                  | 0.00%                     | 97.04%                    |
| 67                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai                                                                                                                                                                            | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN               | Zumalai              | Covalima  | MEJD PKRIE EBC ZUMALAI                 | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 160,283.28          | Oct. 15, 2021  | 53.12%                  | 0.00%                     | 53.12%                    |
| 68                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Uce-Cai                                                                                                                                                                            | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN               | Zumalai              | Covalima  | MEJD PKRIE EBF UCE-CAI                 | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 109,981.83          | Oct. 15, 2021  | 25.01%                  | 0.00%                     | 25.01%                    |
| 69                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa                                                                                                                                                                             | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN               | Zumalai              | Covalima  | MEJD PKRIE EBF SALASA                  | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 110,004.78          | Oct. 15, 2021  | 50.32%                  | 0.00%                     | 50.32%                    |
| 70                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soiliga                                                                                                                                                                            | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN               | Zumalai              | Covalima  | MEJD PKRIE EBF SOILIGA                 | Kontratu ho Grupo Comunitario        | \$ 101,608.75          | Oct. 15, 2021  | 51.24%                  | 0.00%                     | 51.24%                    |
| 71                                             | Mola - Mota Masin/Roads Maintenance section Zumalai - Mota Masin Border (Multy Year program/RM)                                                                                                                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                | Zumalai              | Covalima  | Delta Dini                             | MPW - W - 220008                     | \$ 547,362.82          | Jan. 3, 2022   | 17.09%                  | 13.73%                    | 30.82%                    |
| 72                                             | Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro and Manufahi                                                                                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                | Multy Posto          | Covalima  | Maun Alin Suai Unip Lda                | SSS/029/MOPTC-2017                   | \$ 379,631.20          | July 7, 2017   | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |
| 73                                             | Rehabilitation of Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 17+500-23+800                                                                                                                                                               | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                | Multy Posto          | Covalima  | Expres Distribution Services Unip. Lda | SSS/318/MOPTC-2016                   | \$ 4,941,274.57        | Dec. 9, 2016   | 100.00%                 | 0.00%                     | 100.00%                   |





# ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA

| PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                   |                               |                      |           |                            |                   |                        |               | Dezembro 2022           |                           |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                   |                               | LOKALIZASAUN PROJETU |           |                            |                   |                        |               |                         |                           |                           |
| NU.                                            | NARAN PROJETU                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DONO PROJETU                  | KATEGORIA PROJETU | SECTOR                        | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHA             | NUMERO KONTRATU   | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU | Previous Progress ( % ) | This Month Progress ( % ) | Cumulative Progress ( % ) |
| 74                                             | Manutensaun Estrada Lookeu. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200-Municipal of Covalima                                                                                                                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | FI                | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Multy Posto          | Covalima  | Manu Bey Unip Lda          | RT/079/MOPTC-2016 | \$ 150,247.52          | Aug. 19, 2016 | 51.08%                  | 0.00%                     | 51.08%                    |
| 75                                             | Rural Roads Routine Maintenance Lepo-Lour Sta 0+000-3+000, Naguidal - Lour Sta 0+000-5+000, Boardikun - Mape Sta 0+000-8+000 / 162                                                                                                                                                                      | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | LM-CD             | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Multy Posto          | Covalima  | Futuro Mane Mesak Unip Lda | MPWTC-CD-170015   | \$ 34,106.69           | Jan. 8, 2017  | 88.48%                  | 0.00%                     | 88.48%                    |
| 76                                             | Rural Roads Routine Maintenance Dato Tolu Cha 0+000 - 9+600, Lookeu Cha 0+000 - 6+000, Casabauc 008 Cha 0+000 - 3+000, Casabauc 012 Cha 0+000 - 3+500, Casabauc 018 Cha 0+000 - 2+700, Lalawa Cha 0+000 - 3+500, Boraikun Mape Cha 0+000 - 8+000, Naguidal Lepo Cha 0+000 - 4+000 Municipality Covalima | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | LM-CD             | ESTRADAS                      | Multy Posto          | Covalima  | Lufi Raica Unip Lda        | MPW/WNCB/R/190048 | \$ 109,210.34          | Aug. 13, 2019 | 0.00%                   | 0.00%                     | 0.00%                     |

(Eng. Madelino D J Magno)  
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Covalima  
ADN, I.P.

Prepara Husi :

(Eng. Domingos Soares Martins)  
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun,  
Municipio Covalima  
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco D D Jeronimo)  
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,  
ADN, I.P.

(Eng. Prezenzio L C D Ximenes)  
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Covalima  
ADN, I.P.

(Eng. Bosco Dinis de Sousa)  
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio  
Covalima  
ADN, I.P.

(Eng. Remigio da C. Soares dos Santos)  
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun,  
ADN, I.P.

(Deolindo de F. Marques)  
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P.

(Silvino D. R. R. Soares)  
Eng. M & E, Municipio Covalima ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)  
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,  
ADN, I.P.





## # ANEXU C1 ( FO -05)

### Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Aitos**  
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Data Inspesaun : **08-12-2022**

Fatin Inspesaun : Aitos- Fohorem

Koordinadas :


Start Point : Long : -9.123031 Latetude: 125.444578

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

**2. Prezenzio L C D Ximenes**

#### Sketch & Foto Desenho

**Servisu – (seng gelombang "custom orb" colorbond**  
**0.35mm dipasang dengan sekrup pada baja**  
**gording.**

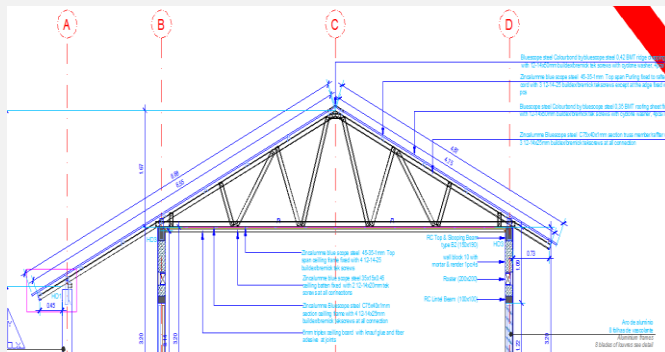

Area Send = **291** m2

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual





## # ANEXU C1 ( FO -05)

### Back-up Data

Naran Projeto

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Aitos**

No. kontratu

: **Kontratu ho Grupo Comunitario**

**Servisu – Fascia** (lisplank baja)

*Bent plate 230mm girth colorbond fascia (seng plat  
berwarna dengan lebar toal 230mm)*

Panjang = **50** meter







MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## # ANEXU C1 ( FO -05)

### Back-up Data

Naran Projeto  
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Aitos**  
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**





## # ANEXU C1 ( FO -06)

### Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESTV Nutetu de Fohorem**

No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Data Inspesaun : **08-12-2022**

Fatin Inspesaun : Nutetu - Fohorem

Koordinadas :


Start Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

**2. Prezenzio L C D Ximenes**

#### Sketch & Foto Desenho

**Servisu – (seng gelombang "custom orb" colorbond 0.35mm dipasang dengan sekrup pada baja gording.**

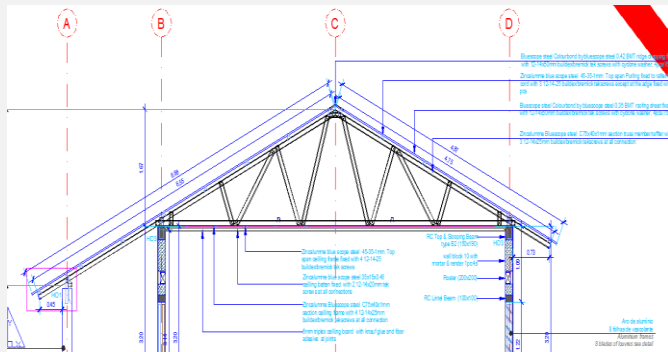

Area Send = **341** m2

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Remark: ADN I.P. Covalima ESTV Fohorem  
Index number: 3948  
Network: 8 Des 2022 10:14:10 GMT+09:00  
Local: 8 Des 2022 10:14:15 GMT+09:00



Remark: ADN I.P. Covalima ESTV Fohorem  
Index number: 3938  
Network: 8 Des 2022 10:12:02 GMT+09:00  
Local: 8 Des 2022 10:12:07 GMT+09:00





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## # ANEXU C1 ( FO -06)

### Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESTV Nutetu de Fohorem**

No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**





## #ANEXU C1 (SV-12)

# Back-up Data

Naran Projeto : New Construsaun of Interior Fence for Prison in Suai Municipality  
No. kontratu : MJ-062/OUTUBRO/2021

**Data Inspesaun : 08- 12-2022**

Fatin Inspesaun : Suai Villa- Covalima

Koordinadas :


**Start Point : Long :, -9.312043 Latetude: 125.265901**

Naran Inspector : 1. Madelino D J Magno

2. Prezenzio L C D Ximenes

### Sketch & Foto Desenho

#### *Servisu –soil backfill foundation*

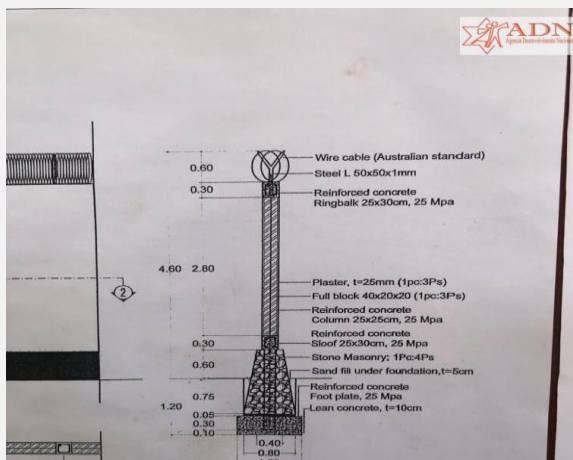

Volume = 30.11 m<sup>3</sup>

### Observasaun iha tereno no Foto Aktual







MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SV-12)

## Back-up Data

Naran Projeto  
No. kontratu

: New Construsaun of Interior Fence for Prison in Suai Municipality  
: MJ-062/OUTUBRO/2021

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



## #ANEXU C1 (SV-12)

### Back-up Data

Naran Projeto  
No. kontratu

: New Construsaun of Interior Fence for Prison in Suai Municipality  
: MJ-062/OUTUBRO/2021

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |









## #ANEXU C1 (SV-12)

### Back-up Data

Naran Projeto  
No. kontratu

: New Construsaun of Interior Fence for Prison in Suai Municipality  
: MJ-062/OUTUBRO/2021



## # ANEXU C1 (SV-14)

### Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai**  
No. kontratu : **NCB:04/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : **09-12-2022**

Fatin Inspesaun : Akar Laran Suai Villa

Koordinadas :


Start Point : Long : -9.350792 Latetude: 125.249381

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

**2. Prezenzio L C D Ximenes**

#### Sketch & Foto Desenho

##### *Servisu – Fence Works*



60x60x3mm SHS galvanised post  
approximately 3.00m long, one end cast into  
concrete

Berat Qty = 45 Kg

50x50x3mm steel angle as framing (besi siku  
50x50x3mm sebagai rangka)

Berat Qty = 21 Kg

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Remark: ADN I.P. Covallima  
Index number: 4052  
Network: 9 Des 2022 09:18:05 GMT+09:00  
Local: 9 Des 2022 09:18:12 GMT+09:00



Remark: ADN I.P. Covallima  
Index number: 4075  
Network: 9 Des 2022 09:37:00 GMT+09:00  
Local: 9 Des 2022 09:37:05 GMT+09:00





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## # ANEXU C1 (SV-14)

### Back-up Data

Naran Projeto  
No. kontratu

: **Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai**  
: **NCB:04/MEJD/DNA/2021**



MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## # ANEXU C1 (SV-14)

### Back-up Data

Naran Projeto  
No. kontratu

: **Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai**  
: **NCB:04/MEJD/DNA/2021**







## #ANEXU C1 ( TL-8 )

### Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of U.P.F. Building in Covalima. LOT.1: New  
Construction of U.P.F. Building at Mota Masin  
No. kontratu : NCB/087/MI-2021

Data Inspesaun : 09-12-2022

Fatin Inspesaun : Mota-Masin Tilomar, Covalima

Koordinadas :

Start Point : Long : 9,4488 S Latetude: 125,0969

Naran Inspector : 1.Madelino Deonizo Jose Magno

2. Prezenzio L C D Ximenes

#### Sketch & Foto Desenho

**Informsaun :** Tuir monitorizasaun Ekipa A D  
N nian iha dia 09-12-2022 projeto ida ne  
parado hela

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual






## #ANEXU C1 ( TL-8 )

### Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of U.P.F. Building in Covalima. LOT.1: New  
Construction of U.P.F. Building at Mota Masin  
No. kontratu : NCB/087/MI-2021







## # ANEXU C1 ( TL-9 )

### Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Rehabilitation Tilomar Border Chainage 0+000 – 3+000 Covalima Municipality**  
No. kontratu : **MPW-W-220122**

**Data Inspesaun** : 07/12/2022


Fatin Inspesaun : Tilomar, Biceuk

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.24053588, Latetude: 125.1353495

End Point : Long : -9.23874771, Latetude: 125.14521576



Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**  
**2. Eng. Bosco Dinis de Sousa**
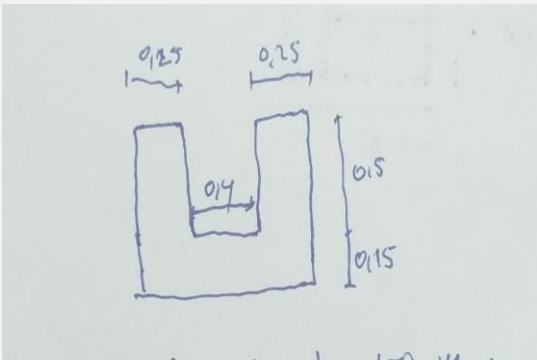
| Sketch & Foto Desenho                                                                                                                                                                          | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Item Servisu ; Stone Masonry drain</p> <p>Qty = A x L<br/>= 0.35m<sup>2</sup> x 484m<br/>= 169.4 M3</p>  |  <p>7 December 2022<br/>9.361272S 125.080114E<br/>223° SW<br/>Altitude: 422.1m<br/>Speed: 1.6km/h<br/>Munisipiu Covalima<br/>Index number: 2328</p> |

## # ANEXU C1 ( TL-9 )

### Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Rehabilitation Tilomar Border Chainage 0+000 – 3+000 Covalima Municipality**  
No. kontratu : **MPW-W-220122**
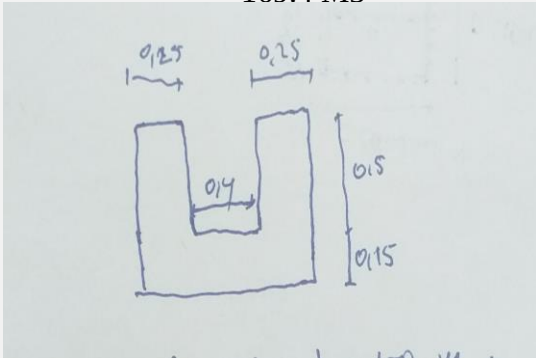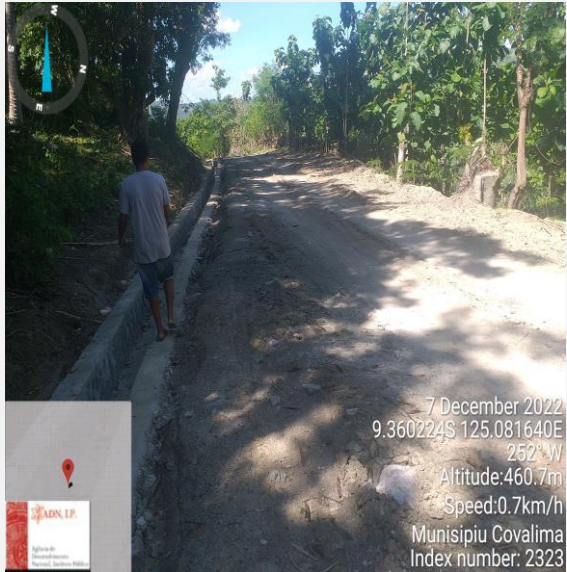
| Sketch & Foto Desenho                                                                                                                                                                                    | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Item Servisu ; Stone Masonry drain</p> <p>Qty = A x L<br/>= 0.35m<sup>2</sup> x 484m<br/>= 169.4 M<sup>3</sup></p>  |  <p>7 December 2022<br/>9.360224S 125.081640E<br/>252° W<br/>Altitude: 460.7m<br/>Speed: 0.7km/h<br/>Munisipiu Covalima<br/>Index number: 2323</p>   |
| Sketch & Foto Desenho                                                                                                                                                                                    | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Item Servisu ; Informasaun</p> <p>.</p> <p>Direksi keet projetu nian, inklui mos rai material konstrusaun .</p>                                                                                       |  <p>7 December 2022<br/>9.360253S 125.081882E<br/>222° SW<br/>Altitude: 451.2m<br/>Speed: 3.3km/h<br/>Munisipiu Covalima<br/>Index number: 2332</p> |





# ANEXU C1 ( ZU-16 )

## Back-up Data

Naran Projeto : **Mola - Mota Masin/Roads Maintenance section Zumalai - Mota Masin  
Border (Multy Year program/RM**  
No. kontratu : **MPW - W - 220008**

**Data Inspesaun** : **07 / 12 /2022**

Fatin Inspesaun : Zumalai – Mota Masin

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.170587, Latetude: 125.448221

End Point : Long : -9.45052, Latetude: 125.089063

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**  
**2. Eng. Bosco Dinis de Sousa**

| Informasaun                                                                                             | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase daruak nian husi empreza hahu fali servisu iha tereno, ba shoulder clearing, drainagen of Clering, |  <p>7 December 2022<br/>9.327689S 125.232892E<br/>65° NE<br/>Altitude: 73.2m<br/>Speed: 0.0km/h<br/>Munisipiu Covalima<br/>Index number: 2367</p> |



# ANEXU C1 ( ZU-16 )

## Back-up Data

Naran Projeto : **Mola - Mota Masin/Roads Maintenance section Zumalai - Mota Masin Border (Multy Year program/RM**  
No. kontratu : **MPW - W - 220008**

| Sketch & Foto Desenho                                                        | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Item Servisu ; Shoulder</p> <p>Shoulder Clearing no drainage Clearing</p> |   |
| Sketch & Foto Desenho                                                        | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                |
| <p>Item Servisu ; Informasaun</p> <p>Unsuitable and land slide Clearing</p>  |  |





# ANEXU C1 ( SV-5 )

**Back-up Data**

Naran Projeto : New construction of drainagen in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)  
No. kontratu : SSS/266/MOPTC-2016

**Data Inspesaun** : 07/12/2022

Fatin Inspesaun : Suai Villa- Suai Loro

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.32708999715697, Latetude: 125.261079110205

End Point : Long : -9.35355117970772, Latetude: 125.259350091218

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos Soares Martins

2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

| Informasaun                                                                                                                                                                                                                   | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tekniku ADN, I.P. Halo monitorisazaun ba projecto new construction of drainagen in suai loro hodi hare prosesu servisu ba item ateru embankment iha tereno no item refere seidauk mensiona iha kontratu ( Item Foun ).</p> |  |



## # ANEXU C1 ( SV-5 )

### Back-up Data

Naran Projeto  
No. kontratu

: New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)  
: SSS/266/MOPTC-2016

#### Informasaun

Tekniku ADN, I.P. Halo monitorisazaun ba  
projecto new construction of drainagen in  
suai loro hodi hare prosesu servisu ba


Item servisu stone masonry Retaining wall

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#### Informasaun

Item servisu stone masonry Retaining wall

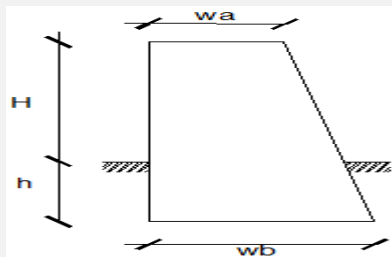

| No        | Wa  | Wb  | H   | Area (sq.m) | Average Area | L (m) | Qty | Unit |
|-----------|-----|-----|-----|-------------|--------------|-------|-----|------|
| 1         | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.36        |              |       |     |      |
| 2         | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.36        | 0.36         | 100   | 36  | Cu.m |
| 3         | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.36        | 0.36         | 100   | 36  | Cu.m |
| 4         | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.36        | 0.36         | 100   | 36  | Cu.m |
| 5         | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.36        | 0.36         | 100   | 36  | Cu.m |
| 6         | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.36        | 0.36         | 100   | 36  | Cu.m |
| Sub total |     |     |     |             |              |       | 180 | Cu.m |

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual







## # ANEXU C1 ( FO-2 )

### Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Rehabilitation Dato- Tolu Chainage 11+100 - 12+600**  
Covalima Municipality  
No. kontratu : **NCB/057/MOP-2019**

**Data Inspesaun : 08-12-2022**

Fatin Inspesaun : Covalima - Fohorem

Koordinadas :

Start Point : Long : 125.14521576, Latetude: -9.23874771

End Point : Long : 125.1528125, Latetude: -9.24547475

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**

: **2. Eng Bosco Dinis de Sousa**

Assunto : Informasaun ba projectu ne'e sei iha fase retensaun

1. Projectu fase retensaun 10% finaliza ona
2. Defeitas nebeé iha empreza halo ona reparasaun tuir kestaun tekniku nian
3. Halo ona rekomendasaun pagamentu 10% retensaun.



## # ANEXU C1 ( FO-2 )

### Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Dato- Tolu Chainage 11+100 - 12+600  
Covalima Municipality  
No. kontratu : NCB/057/MOP-2019

#### Informasaun

Stone Masonry wall kondisaun iha tereno diak

#### Informasaun

Estructura betaun ba ponte kiik kondisaun diak

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual







## # ANEXU C1 ( FO-2 )


### Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Dato- Tolu Chainage 11+100 - 12+600  
Covalima Municipality  
No. kontratu : NCB/057/MOP-2019

#### Informasaun

Gravel kondisaun diak iha tereno.

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual

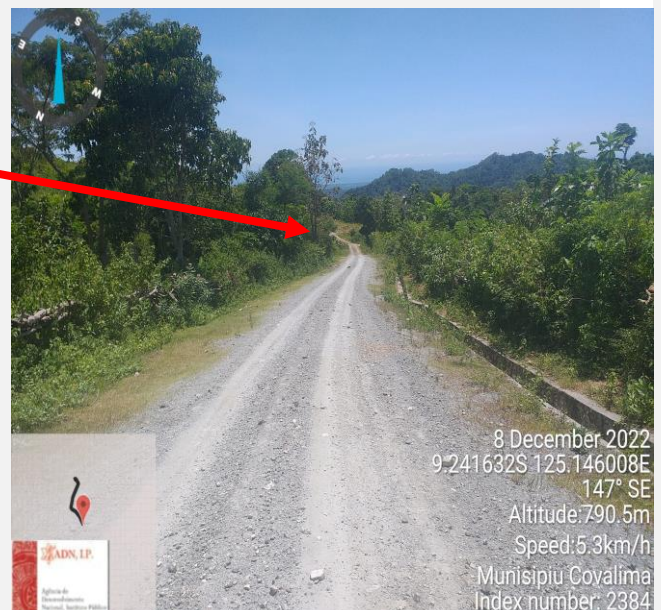



## # ANEXU C1 ( MA-4 )

### Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Lookeu Chainage 6+000-9+000 (3km),  
Covalima Municipality

No. kontratu : RT/037/MOP-2021

**Data Inspesaun** : 08/12/2022

Fatin Inspesaun : Maucatar

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.287679, Latetude: 125.195736

End Point : Long : -9.270658, Latetude: 125.186273

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos Soares Martins

2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

| Sketch & Foto Desenho                                                                                                                          | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Servisu additional stone Masonry finaliza ona 100% iha tereno maibe seidak iha aprovasaun kuantidade variation order husi dono projetu.</p> |  <p>8 December 2022<br/>9.250142S 125.175857E<br/>128° SE<br/>Munisipiu Covalima<br/>Index number: 2448</p> |





## # ANEXU C1 ( MA-4 )

### Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Lookeu Chainage 6+000-9+000 (3km),  
Covalima Municipality**  
No. kontratu : **RT/037/MOP-2021**

| Sketch & Foto Desenho                                                                                                                                                                         | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Item Servisu ; Informasaun</p> <p>Stone Masonry nebeé istala ona iha tereno tama ona iha fase Variation order, tamba kuantidade iha original contracto la tuir nesesidade tereno nian.</p> |  <p>12 Okt 2022 9:22:17 AM<br/>9.27402874S 125.19251004E<br/>Altitude:377.7m<br/>Speed:0.0km/h<br/>ADN, I.P. Covalima<br/>Index number: 821</p>    |
| Sketch & Foto Desenho                                                                                                                                                                         | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Item Servisu ; Informasaun</p> <p>Servisu ba item stone masonry line drain no retaining wall iha tereno atinge ona 100%</p>                                                                |  <p>8 December 2022<br/>9.271953S 125.191100E<br/>315° NW<br/>Altitude:352.8m<br/>Speed:5.7km/h<br/>Munisipiu Covalima<br/>Index number: 2447</p> |



# ANEXU C1 ( SV-24 )

## Back-up Data

Naran Projeto : **Construction Chek Dam In Haimanu River, Municipality of Covalima**  
No. kontratu : **MOP-W-220004**

**Data Inspesaun** : **08/12/2022**

Fatin Inspesaun : Suai Villa

Koordinadas :

Start Point : Latetude: -9.256322

Long :125.346614

End Point : Latetude: -9.258470

Long : 125.348598

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**  
**2. Eng. Bosco Dinis de Sousa**

| Sketch & Foto Desenho                                                                                                                                            | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sketch Item servisu, Masonry wall</p> <p>Halo inspeksaun pagamento ba Masonry wall nebee instala ona iha tereno dimensaun tuir dezenho nebee iha kontratu</p> |  <p>8 December 2022<br/>9.257131S 125.346917E<br/>293° NW<br/>Altitude: 86.3m<br/>Speed: 0.0km/h<br/>Munisipiu Covalima<br/>Index number: 2454</p> |





# ANEXU C1 ( SV-24 )


## Back-up Data

Naran Projeto  
No. kontratu

: **Construction Chek Dam In Haimanu River, Municipality of Covalima**  
: **MOP-W-220004**

### Sketch & Foto Desenho

#### Sketch Item servisu, Stone Main Dam

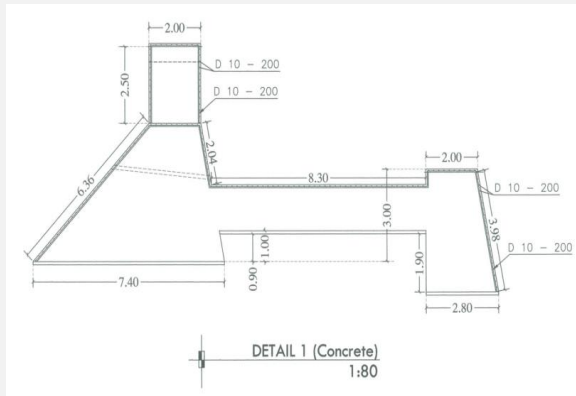


Halo Inspeksaun pagamento ba Stone  
Masonry Main Dam,sub dam no Apron

### Observasaun iha tereno no Foto Aktual



### Sketch & Foto Desenho

#### Sketch Item servisu, Embankment

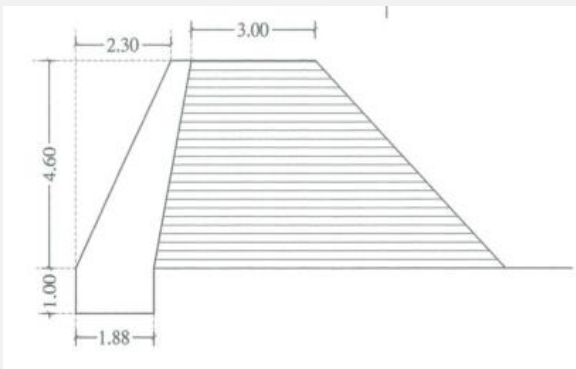

Halo inspeksaun pagamento ba Embankemnt

### Observasaun iha tereno no Foto Aktual





## # ANEXU C1 ( SV-6 )

### Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun**

No. kontratu : **SSS/346/MOPTC-2016**

**Data Inspesaun** : **07/12/2022**

Fatin Inspesaun : Suai Villa, Busakukun

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.326811, Latetude: 125.234821

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**

**2. Eng. Bosco Dinis de Sousa**

### Informasaun

1. Progreso fisiko atingi 74.13%, nebeé mak update iha Sistema presija reviu fila fali tamba la tuir progressu fisiku nebeé halo ona pagamentu iha anterior nian.
2. Pagamentu ikus nian iha tinan 2017 ho porsentu 44.27%
3. Husu atu hadia fila fali progressu pagamentu nebeé hatama ona iha Sistema.
4. Projecto refere kontinua fila fali ona servisu iha tereno no mobiliza material konstrusaun lokaliza ona iha fatin konstrusaun.





## # ANEXU C1 ( SV-6 )

### Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun**

No. kontratu : **SSS/346/MOPTC-2016**

| Sketch & Foto Desenho                                                                                                                                                            | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sketch item servisu ba Excavation no stone masonry R/S no L/S</p> <p>Halo inspeksaun pagamento ba item stone masonry ne,ebe instala iha tereno no dimensaun tuir kontrato</p> | <p>ekinamentus apoiu servisu avaria</p>  <p>7 December 2022<br/>9.325945S 125.234748E<br/>157° SE<br/>Altitude: 66.7m<br/>Speed: 0.0km/h<br/>Munisipiu Covalima<br/>Index number: 2316</p> |
| <p>Comon embakmen</p> <p>Halo inspeksaun pagamento ba item Comon embakmen ne,ebe instala iha tereno.</p>                                                                         |  <p>7 December 2022<br/>9.325938S 125.234745E<br/>3° N<br/>Altitude: 57.1m<br/>Speed: 0.0km/h<br/>Munisipiu Covalima<br/>Index number: 2315</p>                                           |



MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## # ANEXU C1 ( SV-6 )

### Back-up Data

Naran Projeto : Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in  
Busakukun  
No. kontratu : SSS/346/MOPTC-2016







## # ANEXU C1 ( SV-3 )

# Back-up Data

Naran Projeto : **Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste**  
No. kontratu : **ICB/035/TGAP-2013**

**Data Inspesaun** : **09 de Dezembro de 2022**

Fatin Inspesaun : Suai-Villa, Airoporto

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.300787278524622, Latetude: 125.28454106301069

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**  
**2. Eng. Bosco Dinis de Sousa**

Assunto : informasaun Geral ba projecto airoporto nebe'e tama ona iha final retensaun nian.

### I. REZULTADU REKOLHAMENTU DADUS

Iha lora 9 de Dezembro de 2022, husi ekipa Tekniku ADN,I.P. Munisipiu Covalima ho Ekipa Tekniku Nasional ADN,I.P. husi Electresidade no ITC halo inspeksaun iha tereno ba dokumentus nebe'e submete mai ADN,I.P. iha lora 06 de Dezembro 2022 ho Nu.Ref. 410/Gab DGTC / XII / 2022 husu pagamentu retensaun ba projectu Upgrading of Existing Suai Airport,Covalima Municipality nebe'e implementa husi Kompanhia WASKITA KARYA Tbk. Husi rejultadu inspeksaun maka hanesan tuir mai neé;

- ❖ ADN halo inspeksaun iha tereno katak empreza seidauk hadia defeitus nebeé notifica ona iha tinan 2020 ho Nu.Ref. 1885/ADN-MPO/XII/2020, nomos iha tinan 2021 ho Nu.Ref. 1559/ADN/MPO/XII/2021.
- ❖ Defeitos nebeé existe iha tereno ba item Electrical AC Central AHU , item servisu parte konstrusaun civil Mecanical no ITC notifica bervalmente ba tekniku supervisaun Eng. Joao husi konsultan Jurutera Perunding iha tinan 2018 inspeksaun pagamentu IPC-28
- ❖ Iha lora 17 de Dezembro de 2019 halo rekomendasaun pagamentu IPC-29 inklui mos ho pagamentu retensaun 50% husi valor 10% retensaun baseia ba General Condition of Contract Clause 14.9 Payment of retention Money.

## # ANEXU C1 ( SV-3 )

### Back-up Data

Naran Projeto : Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste  
No. kontratu : ICB/035/TGAP-2013

#### PARACER OU REKOMENDASAUN

- ❖ Sujere ba dono Projetu atu hare fila husi informasaun nebe'e notifika ona tamba ADN, I.P. mantein nafatin ho karta Nu.Ref. 1885/ADN-MPO/XII/2020, nomos iha tinan 2021 ho Nu.Ref. 1559/ADN/MPO/XII/2021.
- ❖ Husu dono Projetu atu koordena ho konsultan no kompanhia atu hadia defeitus hirak ne'e antes submete mai ADN, I.P.

Maka ne'e deit ba ita bo'ot sira nia kolaborasaun ami hatu'o obrigado wain.

#### 6.1. Notifikasaun Defeitus

##### 6.1.1. Defeitus Parte Konstrusaun Civil husi tinan 2018, tinan 2020 no tinan 2021

##### 6.1.1a. Area Taxi way B nian, tempo udan be'e nalihun iha area nebe'e iha asfalt ho nune afeita ba asfalt hodi separa ( abu batu ) husi asfalt

Anterior 2018,2020



Actual 2021



Area Taxi way B nian, tempo udan be'e nalihun iha area nebe'e iha asfalt ho nune afeita ba asfalt hodi separa ( abu batu ) husi asfalt

6.1.1b. Asfalt ba parte Estrada nian iha parte ninin soulder nian nakfera ho luan 5mm

Defeitus husi 2019, kontinua to 2020



Actual 2021



Asfalt ba parte Estrada nian iha parte ninin soulder nian nakfera ho luan 5mm





# ANEXU C1 ( ZU-4 )

## Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Road From Haemanu Bridge Zumalai Junction ( 0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima  
No. kontratu : SSS/050/MOPTC-2017

**Data Inspesaun : 12/12/2022**

Fatin Inspesaun : Zumalai - Covalima

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.2164781, Latetude: 125.39185429

End Point : Long : -9.19277947, Latetude: 125.42564747

**Naran Inspector : 1. Domingos Soares Martins**

**2. Bosco Dinis de Sousa**

**Assunto : Informasaun ba Projecto fase retensaun 10%**


1. Projecto refere tempo ba fase retensaun 10% finaliza ona.
2. Defeitas nebeé iha empreza halo ona reparasaun tuir kestaun tekniku nian
3. Halo ona rekomendasaun pagamentu 10% retensaun.



# ANEXU C1 ( ZU-4 )

## Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Road From Haemanu Bridge Zumalai Junction ( 0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima  
No. kontratu : SSS/050/MOPTC-2017
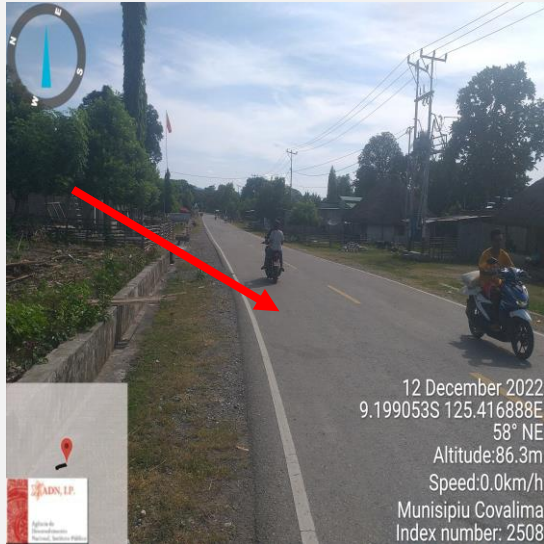
| Informasaun                                                                                                                           | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Estrada Liga Entre Zumalai – Suai Villa,<br/>Asphalt ho luan 6 m no mahar 0.05 m,<br/>projecto ne,e kondisaun actual diak hela</p> |   |
| Informasaun                                                                                                                           | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                |
| <p>Box Culvert diak hela tuir prosesu tekniku<br/>nian.</p>                                                                           |  |





# ANEXU C1 ( FTM-1 )

**Back-up Data**

Naran Projeto : **Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for  
Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160**  
No. kontratu : **SSS/103/MOPTC-2017**

**Data Inspesaun : 10 de Novembro de 2022**

Fatin Inspesaun : Fatumea-Covalima

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.2461232232 Latetude: 125.00242497772

End Point : Long : -9.19206164881 Latetude: 124.996615313

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**  
: **2. Eng. Bosco Dinis de Sousa**

**NB**



Projecto nee atinge 100% iha fulan janeiro 2022, tamba neé iha back data ida neé la halo kalkulasaun ba kuantidade maibe hatama deit kuantidade nebeé finaliza ona iha tinan kotuk nian bazeia ba aprovasaun variation no-2 nian.



## # ANEXU C1 ( FTM-1 )

### Back-up Data

Naran Projeto : **Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for  
Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160**  
No. kontratu : **SSS/103/MOPTC-2017**
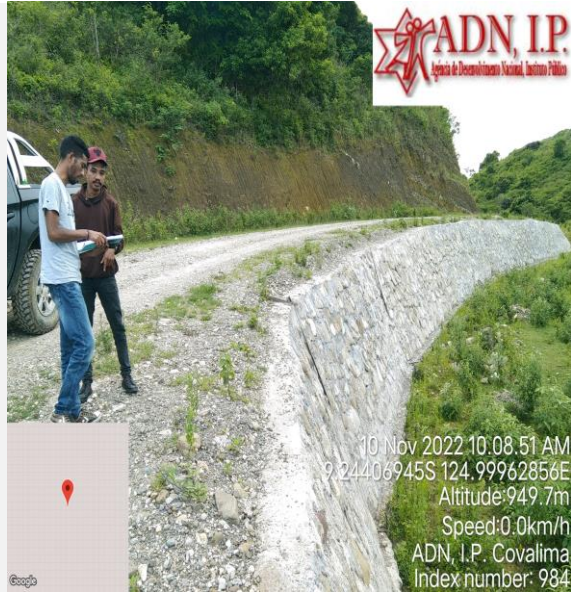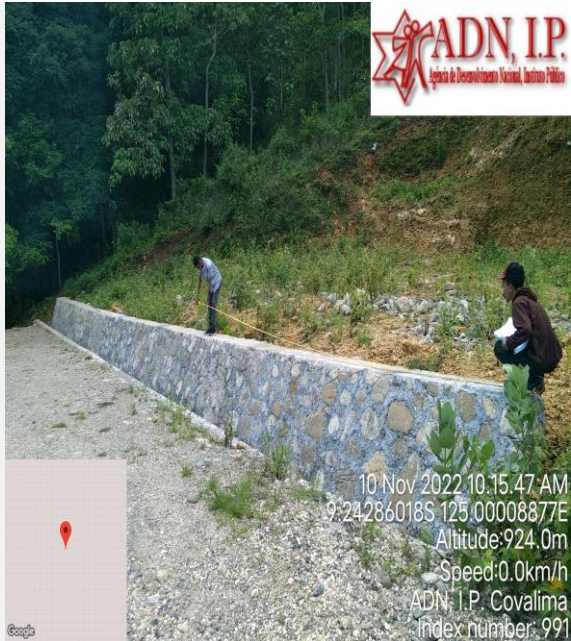
| Sketch & Foto Desenho                                                                                                                                                                                                          | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informasaun tereno</p> <p>Halo inspeksaun pagamento iha tereno<br/>Projecto refere kondisaun fisiku diak hela no<br/>fisikamete iha tereno atinge ona 100% iha<br/>fulan janeiro 2022,</p>                                  |   |
| Sketch & Foto Desenho                                                                                                                                                                                                          | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                |
| <p>Informasaun tereno</p> <p>Projecto refere kondisaun fisiku diak hela no<br/>fisikamete iha tereno atinge ona 100% iha<br/>fulan janeiro 2022, no re-check fila fali stone<br/>Masonry wall iha tereno ba Variation No-2</p> |  |







# ANEXU C1 ( FTM-1 )

**Back-up Data**

Naran Projeto : **Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for  
Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160**  
No. kontratu : **SSS/103/MOPTC-2017**
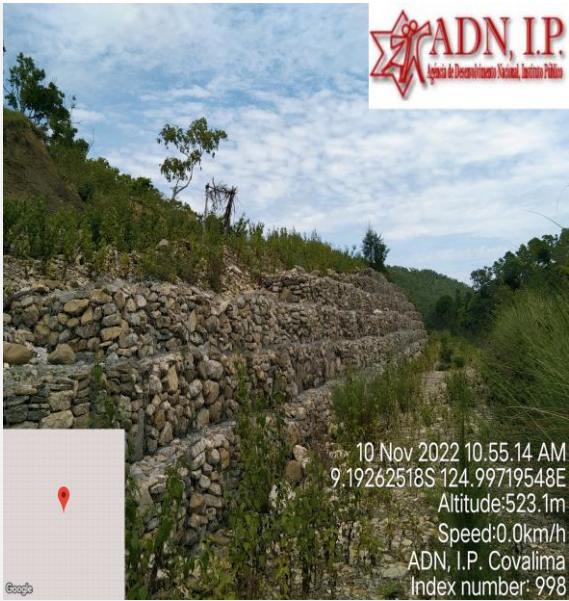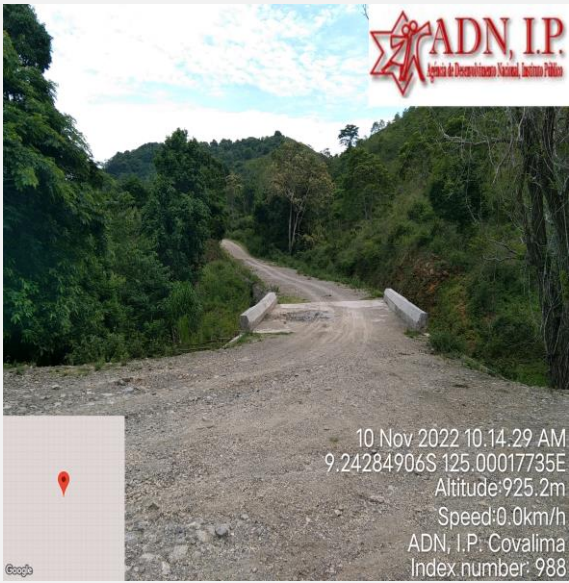
| Sketch & Foto Desenho                                                                                                                                                                        | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informasaun tereno</p> <p>Gabio box nebeé atinge ona 100% iha tereno diak hela no quantidade liu ona original contrato tama iha variation no-2</p>                                        |   |
| Sketch & Foto Desenho                                                                                                                                                                        | Observasaun iha tereno no Foto Aktual                                                |
| <p>Informasaun tereno</p> <p>Projecto refere kondisaun fisiku diak hela no fisikamete iha tereno atinge ona 100% iha fulan janeiro 2022, to agora kondisaun ba Estrada refere diak hela.</p> |  |







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>MINISTÉRIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO</div><div>VULGADO CONSTITUCIONAL</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>ADN, I.P.</div><div>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Social - Instituto Público</div></div></div></div> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | PLANU INSPEAUN |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
| Naran Eng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bosco Dinis de Sousa         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           |                | 2022          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
| Município / Posto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No                           | Naran Projeto                                                                                                                                                                                                                                               | Naran Companhia                   | No Contrato                           | Kategoria | Dono do Projeto                           | Action         | Dezembro 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  | OBS |
| TILOMAR (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                            | New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tildomar - Covalima Municipality                                                                                                                             | Lakenok Fronteira, unip.lda       | RD/LM/OPTC-VM/OPTC/CGI-PEN : 00000166 | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parte Electricidade mak sei halo Plano                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                            | River normalization and protection in Fatuk Oan                                                                                                                                                                                                             | Consorcio Lorico Covalima         | SSS/263/MOPTC-2016                    | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abandona,husi 2018 to agora, seidaux iha informasaun klaro ba projecto neé, tamba neé prestija koordena ho dono projecto atu nuneé bele hatene estatus ba projecto refere. |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            | Ia halo monitorizasaun tamba projectu neé Abandona,husi 2018 to agora, seidaux iha informasaun klaro ba projecto neé, tamba neé prestija koordena ho dono projecto atu nuneé bele hatene estatus ba projecto refere. |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                            | Rehabilitasaun Mercado Tradisional iha Fronteira Salec- Sua- Covalima                                                                                                                                                                                       | Ota Gekor                         | RD/LM/73/GMTAC/X/2015                 | LM        | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA   | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                            | Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beseuk                                                                                                                                                                                   | Joa Camenasa Unip. Lda            | 06/AM Covalima/KDM-AMP/IX/2019        | PDM       | MINISTERIO SAUDE                          | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                            | Looken Chamage 0+000 - 6+000, Casabau 008 Chamage 0+000 - 3+000, Casabau 012 Chamage 0+000 - 3+500, Casabau 018 Chamage 0+000 - 2+700, Nagudal - Lour Chamage 0+000 - 4+000, Boardkun - Mape Chamage 0+000 - 8+000, Data - Tolu Chamage 0+000 - 9+600 / 162 | Futuro Mane Mesak Unip. Lda       | RD/LM                                 | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            | fisik 100%                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | La halo monitorizasaun tamba projectu neé fisiku 100% ona iha tereno. |  |  |     |
| FOHOREM (FO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                            | Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Tumor Leste                                                                                                                                                                  | Figelato Unip. Lda                | RD/LM-MS-DNA-NCB-20-217               | LM        | MINISTERIO SAUDE                          | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                            | New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Buseuk, Tildomar, Covalima Tumor Leste ( Niquet )                                                                                                                                              | Carama Unip. Lda                  | RD/LM-MS-DNA-NCB-21-071               | LM        | MINISTERIO SAUDE                          | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                            | New Construction of U.P.F. Building in Covalima. LOT 1: New Construction of U.P.F. Building at Mota Masin                                                                                                                                                   | Joa Camenasa Unip. Lda            | NCB/057/MI-2021                       | FI        | MINISTERIO DO INTERIOR                    | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                            | R4D Rural Road Rehabilitation Tildomar Border Chamage 0+000 - 3+000 Covalima Municipality                                                                                                                                                                   | Unidade Unip Lda                  | MPW-W-220122                          | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | On Progress                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | On Progress                                                           |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                            | R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chamage 9+600 - 11+100 Covalima Municipality                                                                                                                                                                      | Unidade Unip Lda                  | RT/027/MOP-2019                       | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            | FHO, La halo plana monitorizasaun tamba projecto ne'e fisicamente finaliza ona 100% no entrega ona ba dono projecto.                                                                                                 |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
| FATUMEA (FTM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                            | R4D Rural Road Rehabilitation Data- Tolu Chamage 11+100 - 12+600 Covalima Municipality                                                                                                                                                                      | Verde Cassabe Lda                 | NCB/057/MOP-2019                      | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            | PHO, iha fase retensaun                                                                                                                                                                                              |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            | FHO, halo inspeksaun final retensaun no halo ona rekomendasaun pagamentu.                                                                                                                                            |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                            | Construction, Rehabilitation and Installation of Clean Water with System Gravitation in Suco Fohorem Valla                                                                                                                                                  | Loro Metan Unipicola Lda          | SSS/293/MOPTC-2016                    | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                            | Construction of Baer Bridge                                                                                                                                                                                                                                 | PT. Duta Graha                    | RD/LM-120002189                       | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projecto neé Prestija konfirma ho dono projecto ba balansu osan nebeé sei iha, tamba iha tereno projecto refere atinge ona 100% iha tinan 2016 ba kotuk.                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF 1.2 Aitos                                                                                                                                                                                                       | MEJD PKRIE EBF 1.2 AITOS          | Kontratu ho Grupo Comunitario         | LM-TP     | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESTV Nutetu de Fohorem                                                                                                                                                                                              | MEJD PKRIE ESTV NUTETU DE FOHOREM | Kontratu ho Grupo Comunitario         | LM-TP     | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                                         |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
| FATULILIK (FTL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                            | Rehabilitasaun Estrada Rural,Taroman - Dato-Tolu Chamage, Covalima 0+000-2+000 (2.0 Km)                                                                                                                                                                     | Verde Cassabe Lda                 | RT/038/MOP-2021                       | LM-CD     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ON GOING                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            | La halo monitorizasaun tamba ekpa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu.                                                                                                                                     |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                            | Rehabilitasaun Estrada Rural Natardik-Dato Tolu Roads Chamage 0+000 - 3+000, Municipi Covalima                                                                                                                                                              | Deha Nova Junior Lda              | MOP/CD/NCB-R/ERD/22009                | LM-CD     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | On Progress, Inspeksaun ba pagamentu                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                            | Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Crac for Patrolling the Border Sta 0+000 - Sta. 9+160                                                                                                                                                   | Be'e bors, Unip. Lda              | SSS/103/MOPTC-2017                    | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fisiku 100%, hein inspeksaun final                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            | Fisiku 100%, halo ona rekomendasaun pagamentu. Baseia ba resultadu inspeksaun iha fulan novembro 2022                                                                                                                |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                            | Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Nana                                                                                                                                                                                     | Unidade Unip Lda                  | 05/AM Covalima/KDM-AMP/VII/2019       | PDM       | MINISTERIO SAUDE                          | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macoon                                                                                                                                                                                                          | MEJD PKRIE EBF 1.2 MACOON         | Kontratu ho Grupo Comunitario         | LM-TP     | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
| MAUCATAR (MA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumea                                                                                                                                                                                                         | MEJD PKRIE EBF FATUMEA            | Kontratu ho Grupo Comunitario         | LM-TP     | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Traducama                                                                                                                                                                                                       | MEJD PKRIE EBF TRADUCAMA          | Kontratu ho Grupo Comunitario         | LM-TP     | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           | Actual         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                            | Road Maintenance Section Taroman - Datorua - Fatumeta (A016) 13.15 Km Section Covalima Municipality (162)                                                                                                                                                   | Julado                            | NCB-MOP-190014                        | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | projecto refere Abandona husi tinan 2020 to agora tamba kompanhia iha problema finansieiru                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                       |           |                                           |                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |  |  |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><span></span></div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div></div></div><div><div><span></span></div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div></div></div><div><div><span></span></div><div></div></div></div></div><div><div>MINISTÉRIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO</div><div>SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO</div></div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><span></span></div><div></div></div></div><div><div><span></span></div><div></div></div><div><div><span></span></div><div></div></div></div><div><div><span></span></div><div></div></div><div><div><span></span></div><div></div></div></div></div><div><div>ADN, I.P.</div><div>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Investimentos<br/>Públicos</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | PLANU INSPESAUN |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| Naran Eng. <b>Bosco Dinis de Sousa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | 2022            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| Município <b>MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | Dezembro 2022   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| Município / Posto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                       | Naran Projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naran Companhia                        | No Contrato                       | Kategoria                                 | Dono do Projeto                           | Action          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31                                                                                      | OBS                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| ZUMALAI (ZU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                        | New Installation Mv. Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hobopo, Zumalai - Covalima Municipality                                                                                                                                                                                      | Mania Unip. Lda                        | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGH-PEN-0000427 | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | Parte Electrical mk sei halo plano                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | Fisika 100%                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                        | Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekam Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima                                                                                                                                                                                         | Clardel Interprice Unip Lda            | SSS/227/MOPTC-2016                | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | La halo monitorizasaun tamba ekipa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | PHIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                        | Rehabilitation of Road From Haemaru Bridge Zumalai Junction (0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima                                                                                                                                                                  | Star Sui, Lda                          | SSS/050/MOPTC-2017                | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | FHO, Halo inspeksaun final retensaun ba pagamentu.                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | PHIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                        | Rehabilitation of be'e mean roads                                                                                                                                                                                                                                                                  | Roman Junior Unipessoal, Lda           | SSS/049/MOPTC-2017                | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | PHIO, La halo monitorizasaun tamba ekipa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu. |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                        | Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai                                                                                                                                                                                                                                                                | Astula Construction, Lda               | 002/NC-ZC/VI/2015                 | LM                                        | GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO             | Plan            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | Fisika 100%                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                        | Konstrusaun Escola Tekniko Profissional Zumalai                                                                                                                                                                                                                                                    | Sabudoj Unip. Lda                      | 03/A.M.Covalima/KDM-AMP-VII/2019  | PDIM                                      | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | PHIO, La halo monitorizasaun tamba ekipa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        | On Going                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                        | Rural Roads Periodic Maintenance Lepo - Lour Chainage 0+000-3+000                                                                                                                                                                                                                                  | Futuro Mane Mesak Unip. Lda            | MPW-W-190260                      | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | On Progress, La halo monitorizasaun tamba ekipa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        | On Going                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                                                                        | Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai Road Section 8 : Zulo - Jct Zumalai (30+100 - 35+120 km ) Municipality Covalima                                                                                                                                                      | Octogono Constru. Unip. Lda            | SSS/067/MOPTC-2017                | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | On Progress, La halo monitorizasaun tamba ekipa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        | On Progress, La halo monitorizasaun tamba ekipa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu. |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai (50+900 km ), Road Section Jct A16 Ueleto - Jct A02 Zumalai (35+120 ) Road Section 7 : Fatulito - Zulo (25+800 - 30+100 ) Municipality Bobonaro - Covalima | Marino Enterprises, Lda                                                                                                                                                                                                                                                                            | SSS/065/MOPTC-2017                     | FI                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan                                      |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Fisika 100%                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           | Actual                                    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | PHIO, La halo monitorizasaun tamba ekipa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu.                                                                                                                |                                                                                                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Manutensaun no konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Oebaba - Covalima                                                                                                                                                       | Lifan Unip Lda                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RDTL-2021-15595                        | LM-CD                             | MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS           | Plan                                      |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           | Actual                                    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EHC Zumalai                                                                                                                                                                      | MEJD PKRIE EBC ZUMALAI                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kontratu ho Grupo Comunitario          | LM-TP                             | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           | Actual                                    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Uce-Cai                                                                                                                                                                      | MEJD PKRIE EBF UCE-CAI                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kontratu ho Grupo Comunitario          | LM-TP                             | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           | Actual                                    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa                                                                                                                                                                       | MEJD PKRIE EBF SALASA                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kontratu ho Grupo Comunitario          | LM-TP                             | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           | Actual                                    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soliga                                                                                                                                                                       | MEJD PKRIE EBF SOLIGA                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kontratu ho Grupo Comunitario          | LM-TP                             | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           | Actual                                    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | On Going                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mola - Mota Masin/Roads Maintenance section Zumalai - Mota Masin Border (Multy Year program/RM                                                                                                                           | Delta Dmi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MPW - W - 220008                       | LM-CD                             | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan                                      |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | on progress                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           | Actual                                    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| MULTY POSTO ADMINT (MPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                        | Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Amaro and Manufahi                                                                                                                                                            | Maun Alan Sui Unip Lda                 | SSS/029/MOPTC-2017                | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | Tekniko nebe responsavel ba Konsultan mk sei halo plano                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | Fisika 100%                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                        | Rehabilitation of Mota Masin to Haemaru Roads Sta. 17+500-23+800                                                                                                                                                                                                                                   | Expres Distribution Services Unip. Lda | SSS/118/MOPTC-2016                | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | Projeto ne'e fisika atinge ona 100% iha tinan 2019, no PHIO tia ona ba dono projeto, maibe pagamentu 100% seidaik realiza tamba kompanhia sei hein aprovasaun Vo.1 husi dono projeto ba rejultadu nebee verifika tia ona husi ADN.I.P |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | Pendente, Presija konfirma ho dono projeto ba estatus projeto refere, tamba kondisaun actual agora husi kompanhia Futuru Manemesak maka iha aktividade manutensaun ho kontratu foun iha lokasi refere. |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                        | Manutensaun Estrada Lookou. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Nagudal-Lour. Sta. 0+000-4+200-Municipal of Covalima                                                                                                                            | Mama Bey Unip Lda                      | RT/079/MOPTC-2016                 | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         | Projeto ne'e Abandona iha tinan 2019 to agora, no lokasi refere iha ona projeto foun husi R4D iha tinan 2019 implementa husi kompanhia Futuru Manemesak                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | Presija konfirma ho dono projeto ba estatus projeto refere, tamba kondisaun actual agora husi kompanhia Futuru Manemesak maka iha aktividade manutensaun ho kontratu foun iha lokasi refere.           |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                        | Rural Roads Routine Maintenance Lepo-Lour Sta 0+000-3+000, Nagudal - Lour Sta 0+000-5+000, Boardoun - Mape Sta 0+000-8+000 / 162                                                                                                                                                                   | Futuro Mane Mesak Unip Lda             | MPWTC-CD-170015                   | LM                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                        | Rural Roads Routine Maintenance Dato Tolu Cha 0+000 - 9+600, Lookou Cha 0+000 - 6+000, Casabau 008 Cha 0+000 - 3+000, Casabau 012 Cha 0+000 - 3+500, Casabau 018 Cha 0+000 - 2+700, Lalawa Cha 0+000 - 3+500, Borakou Mape Cha 0+000 - 8+000, Nagudal Lepo Cha 0+000 - 4+000 Municipality Covalima | Lufi Raka Unip Lda                     | MPW/VNC/R/190048                  | LM                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| TOTAL PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                           |                                           |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |

Note:

Plann Periode inspesaun iha Terceiru

Implementa Plann Periode inspesaun iha Terceiru

Relatorin avaliasaun mensal iha Dili

Inspesaun Process Pagamentu

Prepara Husi:

(Eng. Bosco Dinis de Sousa)

Engenheiro de Projecto Infra-estrutura, Transportes e Irrigasaun Municipiu Covalima ADN, I.P.

Sertifica Husi:

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo, Valiasaun de Qualidade, ADN, I.P.

Aprova Husi:

(Eng. Januario Maia Guterres)

Adjunto Director Executivo ADN, I.P.



## 2022

Page 6 of 11



## 2022

Page 2 of 2



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO</div><div>REPUBLICA DE TIMOR-LESTE</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>ADN, I.P.</div><div>Agência de Desenvolvimento Nacional</div><div>National Development Agency</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        | PLANU INSPESAUN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| Naran Eng. Domingos Soares Martins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        | 2022            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| Município MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| Município / Posto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No                                                                                                                                                                                                                          | Naran Projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Naran Companhia                        | No Contrato                        | Kategoria                                 | Dono do Projeto                           | Action | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | OBS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| ZUMALAI (ZU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                           | New Installation Mv. Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hobopu, Zumalai - Covalima Municipality                                                                                                                                                                                         | Mania Unip. Lda                        | RD/LMOPIC-VMOPIC/CGI-PEN - 0000427 | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Parte Electrical mk sei halo plano                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        | Fisika 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                           | Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekam Road (Km 00-000-Km 04-000), Municipality of Covalima                                                                                                                                                                                            | Clardel Interprice Unip Lda            | SSS/227/MOPIC-2016                 | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | La halo monitorizasaun tamba ekipa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        | PHO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                           | Rehabilitation of Road From Haemann Bridge Zumalai Junction ( 0-000 - 20-316) Phase III Sta. 10-140 - 15-180 Municipality Covalima                                                                                                                                                                    | Star Suai. Lda                         | SSS/050/MOPIC-2017                 | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | PHO, Halo inspeksaun final retensaun ba pagamentu.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        | PHO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                           | Rehabilitation of bet mean roads                                                                                                                                                                                                                                                                      | Roman Junior Unipessoal Lda            | SSS/049/MOPIC-2017                 | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | PHO, La halo monitorizasaun tamba ekipa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                           | Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufela Construction Lda                | 002/MC-ZC/VII/2015                 | LM                                        | GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO             | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                           | Konstrusaun Escola Teknico Profissional Zumalai                                                                                                                                                                                                                                                       | Sabados Unip. Lda                      | 03/A/M Covalima/KDM-AMP/VII/2019   | PDIM                                      | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                           | Rural Roads Periodic Maintenance Lepo - Lour Chamane 0-000-3-000                                                                                                                                                                                                                                      | Futuro Mane Mesak Unip. Lda            | MPW-W-190260                       | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        | Fisika 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | PHO, La halo monitorizasaun tamba ekipa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                           | Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai Road Section 8 - Zulo - Jct Zumalai ( 30-100 - 35-120 km ) Municipality Covalima                                                                                                                                                        | Octogono Constr. Unip. Lda             | SSS/067/MOPIC-2017                 | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        | On Going                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | on Progress, La halo monitorizasaun tamba ekipa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu. |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai ( 50-900 km ). Road Section Jct A16 Ueleto - Jct A02 Zumalai ( 35-120 ) Road Section 7 - Fatulito - Zulo ( 25-800 - 30-100 ) Municipality Bobonaro - Covalima | Marino Enterprises Lda                                                                                                                                                                                                                                                                                | SSS/065/MOPIC-2017                     | FI                                 | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan                                      |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        | on Progress, La halo monitorizasaun tamba ekipa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu.                                                                                                                                      |                                                                                                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manutensaun no konstrusaun Kanaas Irrigasaun iha Oebaba - Covalima                                                                                                                                                          | Lifras Unip Lda                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RD/L-2021-15595                        | LM-CD                              | MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS           | Plan                                      |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Fisika 100%                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        | PHO, La halo monitorizasaun tamba ekipa ITI Covalima foka liu ba inspeksaun pagamentu.                                                                                                                                              |                                                                                                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai                                                                                                                                                                         | MEJD FKRIE EBC ZUMALAI                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kontratu ho Grupo Comunitario          | LM-TP                              | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Uce-Cai                                                                                                                                                                         | MEJD FKRIE EBF UCE-CAI                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kontratu ho Grupo Comunitario          | LM-TP                              | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa                                                                                                                                                                          | MEJD FKRIE EBF SALASA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kontratu ho Grupo Comunitario          | LM-TP                              | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soliga                                                                                                                                                                          | MEJD FKRIE EBF SOLIGA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kontratu ho Grupo Comunitario          | LM-TP                              | MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Parte EPAS mk sei halo plano                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mola - Mota Masin/Roads Maintenance section Zumalai - Mota Masin Border (Muly Year program RM)                                                                                                                              | Delta Dm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MPW - W - 220008                       | LM-CD                              | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan                                      |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        | on progress                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| MULTY POSTO ADMNT (MPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                           | Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Amaro and Manufahi                                                                                                                                                               | Maun Alin Suai Unip Lda                | SSS/029/MOPIC-2017                 | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        | Tekniko nebe responsavel ba Konsultan mk sei halo plano                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        | Fisika 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                           | Rehabilitation of Mota Masin to Haemann Roads Sta. 17-500-23-800                                                                                                                                                                                                                                      | Expres Distribution Services Unip. Lda | SSS/118/MOPIC-2016                 | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        | Projeto ne'e fisika atinge ona 100% iha tinan 2019, no PHO tia ona ba dono projeto, malbe pagamentu 100% seidaik realiza tamba kompanhia sei hein aprovasaun Vo.I husi dono projeto ba rejultadu nebe verifica tia ona husi ADN.I.P |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                           | Manutensaun Estrada Looken. Sta. 0-000-6-000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0-000-3-000, Manutensaun Estrada Nagadai-Lour. Sta. 0-000-4-200-Municipal of Covalima                                                                                                                               | Manu Bey Unip Lda                      | RT/079/MOPIC-2016                  | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Pendente, Presija konfirma ho dono projeto ba estatus projeto refere, tamba kondisaun actual agora husi kompanhia Futuru Manemesak maka iha aktividade manutensaun ho kontratu foun iha lokasi refere. |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                           | Rural Roads Routine Maintenance Lepo-Lour Sta 0-000-3-000, Nagadai - Lour Sta 0-000-5-000, Boardkun - Mape Sta 0-000-8-000 / 162                                                                                                                                                                      | Futuro Mane Mesak Unip Lda             | MPWTC-CD-170015                    | LM                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Projeto ne'e Abandona iha tinan 2019 to agora, no lokasi refere iha ona projecto foun husi R4D iha tinan 2019 implementa husi kompanhia Futuru Manemesak                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                           | Rural Roads Routine Maintenance Dato Tohi Cha 0-000 - 9-600, Looken Cha 0-000 - 6-000, Casabauc 008 Cha 0-000 - 3-000, Casabauc 012 Cha 0-000 - 3-500, Casabauc 018 Cha 0-000 - 2-700, Lalawa Cha 0-000 - 3-500, Borakun Mape Cha 0-000 - 8-000, Nagadai Lepo Cha 0-000 - 4-000 Municipality Covalima | Lufi Raka Unip Lda                     | MPW/VNC/B/R/190048                 | LM                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Presija konfirma ho dono projeto ba estatus projeto refere, tamba kondisaun actual agora husi kompanhia Futuru Manemesak maka iha aktividade manutensaun ho kontratu foun iha lokasi refere.           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        | Actual          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| TOTAL PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| Plann Periode inspesaun iha Terceiru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| Implementa Plann Periode inspesaun iha Terceiru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| Relatoriu avaliasaun mensai iha Dili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| Inspesaun Process Pagamentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                    |                                           |                                           |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |

Nota: Plano Periode inspeksaun iha Termino Implementa Plano Periode Inspeksaun iha Termino Relatorio avaliasaun mensal iha Dili Inspeksaun Procesa Pagamentu

Prepara Husi :  
  
 (Eng. Domingos Soares Martins)  
 Engenheiro ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irrigasaun Munisipiu Covalima ADN, I.P.

Sertifica Husi :  
  
 (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)  
 Coordenador da Unidade de Controlo e Valdasuon de Qualidade, ADN, I.P.

Aprova Husi :  
  
 (Eng. Januario Mota Guterres)  
 Adjunto Directo, Executivo ADN, I.P.





PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Madelino D J Magno

Município MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS

2022

| Município /<br>Posto | No | Naran Projeto                                                                             | Naran Companhia              | No Contrato            | Kategoria | Dono do Projeto  | Action | Dezembro |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | OBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|------------------|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |    |                                                                                           |                              |                        |           |                  |        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUAI VILLA (SV)      | 9  | New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste | Roman Junior Unipessoal, Lda | RDTL-MS-DNA-NCB-20-166 | LM        | MINISTERIO SAUDE | Plan   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|
| <div><div></div><div><div>MINISTERIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO<br/>VII GOVERNO CONSTITUCIONAL</div></div><div><div>ADN, I.P.<br/>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público</div></div></div> |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              |        | PLANU INSPESAUN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| Naran Eng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Madelino D J Magno           |                                                       |                              |                                  |           |                                              |        | 2022            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS |                                                       |                              |                                  |           |                                              |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| Município /<br>Posto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No                           | Naran Projeto                                         | Naran Companha               | No Contrato                      | Kategoria | Dono do Projeto                              | Action | Dezembro        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | OBS |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              |        | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |     |  |  |  |
| FATUMEA (FTM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macoon    | MEJD PKRIE EBF 1,2<br>MACOON | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Fatumea   | MEJD PKRIE EBC FATUMEA       | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Traducama | MEJD PKRIE EBF<br>TRADUCAMA  | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| MAUCATAR (MA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Has-Ain   | MEJD PKRIE EBF HAS -AIN      | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| ZUMALAI (ZU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                            | Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai                   | Aitula Construction, Lda     | 002/NC-ZC/VII/2015               | LM        | GABINETE DO PRIMEIRO<br>MINISTRO             | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                           | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai   | MEJD PKRIE EBC ZUMALAI       | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13                           | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Uce-Cai   | MEJD PKRIE EBF UCE-CAI       | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                           | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa    | MEJD PKRIE EBF SALASA        | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                           | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soiliga   | MEJD PKRIE EBF SOILIGA       | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL PROJETO                |                                                       |                              |                                  |           |                                              |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |

Note:  Planu Periode inspesaun iha tercinu  Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu   Inspesaun Processu Pagamentu

Prepara Husi :

( Eng. Madelino D J Magno )

Engenheiro ba Projecto Edificio Publico Agua e Saneamento ADN,I.P. Munisipiu Covalima

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres )

Adjunto Director Executivo ADN,I.P.



| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div>MINISTÉRIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO</div><div>VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL</div></div><div><div><div></div></div><div>ADN, L.P.</div><div>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Investimentos<br/>e Infraestrutura</div></div></div></div> |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | PLANU INSPEAUN |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|-----|
| Naran Eng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Silvino Domingos Rita Rebelo Soares                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | 2022           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
| Município /<br>Posto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No.                                                                                                         | Naran Projeto                                                                                                                                                                                          | Naran Companha                               | No Contrato                                                 | Kategoria                                 | Dono do Projeto                           | Action         | Dez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  | OBS |
| SUAI VILLA (SV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                           | The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality                                                                                                                                     | Divita Unip. Lda                             | RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052                                 | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | HELA RETENSAUN 10%                                            |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                           | New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Halihun, MDGS, Matai, MDGS Halihun - Covalima Municipality | Eron Power, Lda                              | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000435                        | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | PARADO                                                        |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                           | Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste                                                                                                                                                  | PT Waskita Karya (Persero) Tbk               | ICB/035/TGAP-2013                                           | FI                                        | MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN     | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | INSPEKSAUN PAGAMENTO MOTA MASIN SALELE ( MINISTERIO FINANCAS) |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                           | Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport                                                                                                                                    | Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia) | ICB/035/TGAP-2013                                           | FI                                        | MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN     | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                                           | New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste                                                                                                              | Roman Junior Unipessoal, Lda                 | RDTL-MS-DNA-NCB-20-166                                      | LM                                        | MINISTERIO SAUDE                          | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | HELA RETENSAUN 10%                                            |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                                                          | New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital, Ministry of Health Timor-Leste                                                                                                  | Manu Bey Unip Lda                            | RDTL-MS-DNA-RBK-20-184                                      | LM                                        | MINISTERIO SAUDE                          | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | HELA RETENSAUN 10%                                            |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13                                                                                                          | Prefurasan No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala                                                                                                                                                     | Paya's Sisters                               | 002.LM/RDTL/MP/ E/A.D.N/Da Rfq/VI/2019/EDIFI CIO DEPARTMENT | LM-CD                                     | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU            | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | INSPEKSAUN PAGAMENTO PROJETO MPO IHA AEROPROTO SUAI           |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                          | Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai                                                                                                                                                             | Roman Junior Unipessoal, Lda                 | NCB:04/MEJD/DN A/2021                                       | LM-CD                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                                                                                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Laen Tolu                                                                                                                                                  | MEJD PKRIE EBF LAEN TOLU                     | Kontratu ho Grupo Comunitario                               | LM-TP                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Holbolu                                                                                                                                                    | MEJD PKRIE EBF HOLBULO                       | Kontratu ho Grupo Comunitario                               | LM-TP                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maucola                                                         | MEJD PKRIE EBF MAUCOLA                                                                                                                                                                                 | Kontratu ho Grupo Comunitario                | LM-TP                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           | Actual                                    |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Busacucun                                                       | MEJD PKRIE EPE BUSACUCUN                                                                                                                                                                               | Kontratu ho Grupo Comunitario                | LM-TP                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           | Actual                                    |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Akar Laran                                                      | MEJD PKRIE EPE AKAR LARAN                                                                                                                                                                              | Kontratu ho Grupo Comunitario                | LM-TP                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           | Actual                                    |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Suai                                                            | MEJD PKRIE ESGP SUAI                                                                                                                                                                                   | Kontratu ho Grupo Comunitario                | LM-TP                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           | Actual                                    |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
| TILOMAR (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21                                                                                                          | New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality                                                                         | Lalenok Fronteira, unip.lda                  | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366                        | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PHO                |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24                                                                                                          | Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk                                                                                                                             | Joia Camenasa Unip. Lda                      | 06/A.M.Coalima/K DM-AMP/IX/2019                             | PDIM                                      | MINISTERIO SAUDE                          | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HELA RETENSAUN 10% |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26                                                                                                          | Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste                                                                                                             | Figelato Unip. Lda                           | RDTL-MS-DNA-NCB-20-217                                      | LM                                        | MINISTERIO SAUDE                          | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | HELA RETENSAUN 10%                                            |  |  |     |
| Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | New Construction of Health Post and Doctor House Buiding in Beisuk, Tilomar, Covalima, Timor Leste (Niquir) | Joia Camenasa Unip. Lda                                                                                                                                                                                | NCB/087/MI-2021                              | FI                                                          | MINISTERIO DO INTERIOR                    | Plan                                      |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HELA RETENSAUN 10% |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           | Actual                                    |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | New Construction of U.P.F. Building in Covalima. LOT.1: New Construction of U.P.F. Building at Mota Masin   | Carama Unip Lda                                                                                                                                                                                        | RDTL-MS-DNA-ICB-21-071                       | LM-CD                                                       | MINISTERIO SAUDE                          | Plan                                      |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           | Actual                                    |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
| FOHOREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33                                                                                                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF 1,2 Aitos                                                                                                                                                  | MEJD PKRIE EBF 1,2 AITOS                     | Kontratu ho Grupo Comunitario                               | LM-TP                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34                                                                                                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESTV Nutetu de Fohorem                                                                                                                                         | MEJD PKRIE ESTV NUTETU DE FOHOREM            | Kontratu ho Grupo Comunitario                               | LM-TP                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37                                                                                                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macocon                                                                                                                                                    | MEJD PKRIE EBF 1,2 MACOCON                   | Kontratu ho Grupo Comunitario                               | LM-TP                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             |                                           |                                           | Actual         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                                                               |  |  |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           |                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| <div><div><div>MINISTÉRIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO<br/>VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL</div></div><div><div>ADN, I.P.<br/>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Social, Investimentos<br/>Públicos</div></div></div> |                                     |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           | PLANU INSPESAUN |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
| Naran Eng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Silvino Domingos Rita Rebelo Soares |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           | 2022            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS        |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           |                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
| Município /<br>Posto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No.                                 | Naran Projeto                                                                                                 | Naran Companha           | No Contrato                          | Kategoria | Dono do Projeto                           | Action          | Dez |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     | OBS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           |                 | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30                                  | 31                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38                                  | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Fatumea                                                           | MEJD PKRIE EBC FATUMEA   | Kontratu ho Grupo Comunitario        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           | Actual          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39                                  | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Traducama                                                         | MEJD PKRIE EBF TRADUCAMA | Kontratu ho Grupo Comunitario        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           | Actual          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
| MAUCAT<br>AR (MA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44                                  | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Has-Ain                                                           | MEJD PKRIE EBF HAS -AIN  | Kontratu ho Grupo Comunitario        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           | Actual          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
| ZUMALAI (ZU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45                                  | New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covalima Municipality                   | Foho Rua Unip. Lda       | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000404 | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     | LAIHA ONA ESPASO HODI KONTINUA OBRA |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           | Actual          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46                                  | New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hobopu, Zumalai - Covalima Municipality | Mania Unip, Lda          | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000427 | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | LAIHA ONA ESPASO HODI KONTINUA OBRA |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           | Actual          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50                                  | Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai                                                                           | Aitula Construction, Lda | 002/NC-ZC/VII/2015                   | LM        | GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO             | Plan            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           | Actual          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56                                  | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai                                                           | MEJD PKRIE EBC ZUMALAI   | Kontratu ho Grupo Comunitario        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           | Actual          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57                                  | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Uce-Cai                                                           | MEJD PKRIE EBF UCE-CAI   | Kontratu ho Grupo Comunitario        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           | Actual          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58                                  | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa                                                            | MEJD PKRIE EBF SALASA    | Kontratu ho Grupo Comunitario        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           | Actual          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59                                  | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soiliga                                                           | MEJD PKRIE EBF SOILIGA   | Kontratu ho Grupo Comunitario        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                               |                          |                                      |           |                                           | Actual          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | TOTAL PROJETO                                                                                                 |                          |                                      |           |                                           |                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                     |                                     |     |

Notes: 
 Planu Periode inspesaun iha tercinu
Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu
Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili
Inspesaun Proceso Pagamentu

Prepara Husi :  
  
 (Silvino D. R. Rebelo Soares)  
 Eng. Electricidade, ADN - I.P

Sertifika Husi :  
  
 (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)  
 Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN - I.P

Aprova Husi :  
  
 (Eng. Januario Maia Guterres)  
 Adjunto Director Executivo, ADN - I.P



| <div><div><div><div><div><div></div><div>REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE</div><div>REPÚBLICA</div></div><div><div></div><div>MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO</div><div>VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL</div></div></div></div><div><div><div></div><div>ADN. LP.</div><div>Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público</div></div></div></div></div> |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | PLANU INSPESAUN |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|
| Naran Eng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prezenzio L C D X                                              |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             |                 | 2022     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS                                   |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             |                 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| Município / Posto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                                                             | Naran Projeto                                                                                                                  | Naran Companhia                                     | No Contrato                                                | Kategoria                                 | Dono do Projeto                             | Action          | Dezembro |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | OBS |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |     |  |
| SUAI VILLA (SV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                              | New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referal Hospital, Covalima, Timor Leste                                       | Roman Junior Unipessoal, Lda                        | RDTL-MS-DNA-NCB-20-166                                     | LM                                        | MINISTERIO SAUDE                            | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                             | New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referal Hospital, Ministry of Health Timor-Leste                           | Manu Bey Unip Lda                                   | RDTL-MS-DNA-RBK-20-184                                     | LM                                        | MINISTERIO SAUDE                            | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                             | New Construction of Interior Fence for Prison in Suai Municipality                                                             | Fraternity Unipessoal Lda                           | MJ-062/OUTOBRO/2021                                        | LM-CD                                     | MINISTERIO DA JUSTICA                       | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                                                             | Prefurasaun No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala                                                                            | Pay's Sisters                                       | 002.LM/RDTL/MP/IE/A.D.N/D a Rf/VI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT | LM-CD                                     | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU              | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                                             | Konstrusaun Foun ba ESTV Akar laran, Suai                                                                                      | Roman Junior Unipessoal, Lda                        | NCB/04/MEJD/DNA/2021                                       | LM-CD                                     | MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Laen Tolu                                                                          | MEJD PKRIE EBF LAEN TOLU                            | Kontratu ho Grupo Comunitario                              | LM-TP                                     | MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16                                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Holbolu                                                                            | MEJD PKRIE EBF HOLBULO                              | Kontratu ho Grupo Comunitario                              | LM-TP                                     | MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maucola                                                                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maucola | Kontratu ho Grupo Comunitario                              | LM-TP                                     | MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Busacucun                                                                          | MEJD PKRIE EPE BUSACUCUN                            | Kontratu ho Grupo Comunitario                              | LM-TP                                     | MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19                                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Akar Laran                                                                         | MEJD PKRIE EPE AKAR LARAN                           | Kontratu ho Grupo Comunitario                              | LM-TP                                     | MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                                                             | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Suai                                                                               | MEJD PKRIE ESGP SUAI                                | Kontratu ho Grupo Comunitario                              | LM-TP                                     | MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22                                                             | New Construction of Path way Conection of ICU Building and Isolation Building at Hospital Referral Suai, Covalima, Timor-Leste | Milcha Unip. Lda                                    | RDTL-MS-DNA-NCB-20-166                                     | LM-CD                                     | MINISTERIO DA SAUDE                         | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23                                                             | New Construction of ESCOLA CAFE building in Covalima Municipality                                                              | JLC,LDA., IN JOINT VENTURE WITH AITULA, LDA         | NCB/321/MEJD-2021                                          | FI                                        | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU   | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| TILOMAR (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                              | Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Sua- Covalima                                                         | Ota Gelor                                           | RDTL-73/GMTAC/X//2015                                      | LM                                        | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA     | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                              | Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk                                                     | Joia Camenasa Unip. Lda                             | 06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019                            | PDIM                                      | MINISTERIO SAUDE                            | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                              | Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste                                     | Figelato Unip. Lda                                  | RDTL-MS-DNA-NCB-20-217                                     | LM                                        | MINISTERIO SAUDE                            | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| FOHOREM (FO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                              | New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biscuk, Tilomar, Covalima Timor Leste ( Niquer )                  | Carama Unip. Lda                                    | RDTL-MS-DNA-NCB-21-071                                     | LM                                        | MINISTERIO SAUDE                            | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                              | New Construction of U.P.F. Building in Covalima. LOT.1: New Construction of U.P.F. Building at Mota Masin                      | Joia Camenasa Unip. Lda                             | NCB/087/MI-2021                                            | FI                                        | MINISTERIO DO INTERIOR                      | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                              | Construction, Rehabilitation and Installation of Clean Water with System Gravitation in Suco Fohorem Villa                     | Loro Metan Unipessoal. Lda                          | SSS/293/MOPTC-2016                                         | FI                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS               | Plan            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           | Actual                                      |                 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF 1,2 Aitos          | MEJD PKRIE EBF 1,2 AITOS                                                                                                       | Kontratu ho Grupo Comunitario                       | LM-TP                                                      | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                        |                 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESTV Nutetu de Fohorem | MEJD PKRIE ESTV NUTETU DE FOHOREM                                                                                              | Kontratu ho Grupo Comunitario                       | LM-TP                                                      | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                        |                 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                |                                                     |                                                            |                                           |                                             | Actual          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|
| <div><div><div>MINISTERIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO<br/>VII GOVERNO CONSTITUCIONAL</div></div><div><div>ADN, I.P.<br/>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público</div></div></div> |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              |        | PLANU INSPESAUN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| Naran Eng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prezenzio L C D X            |                                                       |                              |                                  |           |                                              |        | 2022            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS |                                                       |                              |                                  |           |                                              |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| Município /<br>Posto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                           | Naran Projeto                                         | Naran Companha               | No Contrato                      | Kategoria | Dono do Projeto                              | Action | Dezembro        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | OBS |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              |        | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |     |  |  |  |
| FATUMEA (FTM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macoon    | MEJD PKRIE EBF 1,2<br>MACOON | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Fatumea   | MEJD PKRIE EBC FATUMEA       | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Traducama | MEJD PKRIE EBF<br>TRADUCAMA  | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| MAUCATAR (MA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Has-Ain   | MEJD PKRIE EBF HAS -AIN      | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| ZUMALAI (ZU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                            | Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai                   | Aitula Construction, Lda     | 002/NC-ZC/VII/2015               | LM        | GABINETE DO PRIMEIRO<br>MINISTRO             | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                           | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai   | MEJD PKRIE EBC ZUMALAI       | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13                           | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Uce-Cai   | MEJD PKRIE EBF UCE-CAI       | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                           | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa    | MEJD PKRIE EBF SALASA        | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                           | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soiliga   | MEJD PKRIE EBF SOILIGA       | Kontratu ho Grupo<br>Comunitario | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              | Actual |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| TOTAL PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                       |                              |                                  |           |                                              |        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |

Note: ■ Planu Periode Inspesaun iha tereinu ■ Implementa Planu Periode Inspesaun iha Terenu ■ ■ Inspesaun Processu Pagamentu

Prepara Husi :

  
( Eng. Prezenzio L C D X )  
Engenheiro ba Projecto Edificio Publico Agua e Saneamento ADN,I.P. Munisipiu Covalima

Sertifika Husi :

  
(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)  
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P.

Aprova Husi :

  
(Eng. Januario Maia Guterres)  
Adjunto Director Executivo ADN,I.P.
