



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU AINARO

MARÇO 2022




SUMÁRIO

RELATÓRIO


IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO AINARO

MARÇO 2022

Prepara Husi :


(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Ainaro ADN, I.P


(Eng. Manuel Bary da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigação, Município Ainaro ADN, I.P


(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Município Ainaro ADN, I.P

Verifica Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P


(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e
Irigação, ADN, I.P


(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifica Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P



INDICE

SUMÁRIO.....	1
INDICE	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Ainaro	3
1.3. Lista Projectos	6
II. PROGRESU FISIKU	14
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	14
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	14
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	14
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	15
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu.....	15

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamientos	6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores.....	8
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio	11
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro	13

I. INTRODUSAUN


1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional, I.P ou ADN, I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN, I.P nian maka atu aseguza katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ADN, I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno caso presiza.

1.2 Perfil Municipio Ainaro

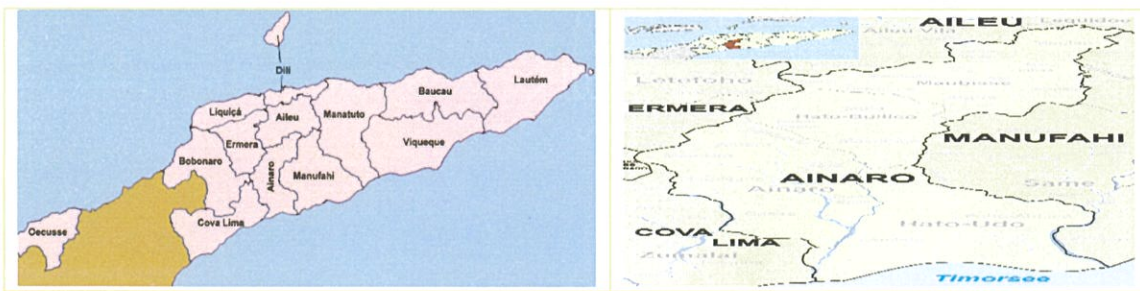

Administrasaun Munisipal Ainaro lokalizadu iha sudoeste paiz no mapa 2. hatudu pozisaun jeográfiku Munisipiu Ainaro ne'ebé ho luan 797 km² ho populasaun nain 59,175 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Ainaro iha Postu Administraativo ha'at, Sukus 21 no Aldeias 131 hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1: Ponto Administrativo, Suku no Total Aldeias/Suku

Ainaro		Hatu Builico		Hatu Udo		Maubisse	
Suku	Aldeias	suku	Aldeias	Suku	Aldeias	Suku	Aldeias
Ainaro	7	Mauchiga	7	Foho-Ailico (beikala)	6	Aituto	9
Cassa	5	Mulo	8	Leolima	10	Edi	6
Manutaci	4	Nuno Moge	6	-	-	Fatubessi	6
Mau-Nuno	3	-	-	-	-	Horai-Quic	4
Mau-Ulo	5	-	-	-	-	Liurai	4
Soro	4	-	-	-	2	Manelobas	4
Suro-Craic	4	-	-	-	4	Manetu	7
-	-	-	-	-	-	Maubisse	12
-	-	-	-	-	-	Maulau	10
Total	32	-	21	-	22	-	62

Data husi : Livro 3B OJE 2021, Pajina 22

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		2				2	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
	Grand Total		3				3	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro

ASET ADN,IP MUNICIPIO AINARO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1				1	Moru hadia, monta tralis
2	Kareta		1				1	Kondisaun ladun diák
3	Desktop HP / Monitor		1				1	Diak
4	Laptop HP		1				1	Todan presija update
5	Printer Cannon		1				1	Diak
6	UPS		1				1	Aat
7	Armario File		2				2	Diak
8	Armario Tau hena		2				2	Aat 1
9	Meja escritorio		1				1	Diak
10	Meja han		1				1	Aat
11	Meja TV (kiik)		1				1	Diak
12	Kadeira escritorio		6				6	Diak
13	Kadeira han		4				4	Att 2
14	Sofa		1 Set				1	Diak
15	Springbed +sumasu 4		2 Set				2	Diak (sumasu laiha)
16	Jeleira		1				1	Diak
17	Water Dispenser		1				1	Aat
18	TV + Parabola		1 Set				1	Aat
19	Kipas Angin		5				5	Aat
20	Kompor		1				1	Diak
21	Kompor Gas		1				1	Aat
22	Rack sepatu		3				3	Aat
23	Rack Piring		1				1	Diak
24	Water Pump Sanyo		1				1	Aat

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumulá iha lista neé bazeia ba dados projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + PDIM + LM - BS + LM - TP + Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	25	\$ 26,137,198.78	62.12%
2	Hatubuilico	12	\$ 61,202,630.27	97.44%
3	Hatudo	9	\$ 1,547,226.03	19.33%
4	Maubisse	25	\$ 7,169,504.30	64.11%
Grand Total		71	\$ 96,056,559.38	84.09%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	11	\$ 23,879,713.14	65.41%
2	Hatubuilico	4	\$ 60,431,375.42	98.09%
3	Hatudo	1	\$ 287,894.03	13.75%
4	Maubisse	9	\$ 5,130,827.23	69.94%
Grand Total		25	\$ 89,729,809.82	87.52%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	\$ 1,376,091.81	21.14%
2	Hatubuilico	5	\$ 521,296.64	69.05%
3	Hatudo	3	\$ 718,688.00	4.05%
4	Maubisse	4	\$ 392,577.51	61.22%
Grand Total		17	\$ 3,008,653.96	30.59%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	\$ 473,161.58	50.73%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	3	\$ 473,096.63	89.94%
Grand Total		8	\$ 946,258.21	70.33%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo	2	\$ 263,719.00	87.35%
4	Maubisse	1	\$ 302,126.40	88.59%
Grand Total		3	\$ 565,845.40	88.02%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	4	\$ 408,232.25	21.12%
2	Hatubuilico	3	\$ 249,958.21	0.00%
3	Hatudo	3	\$ 276,925.00	0.00%
4	Maubisse	7	\$ 730,876.53	0.00%
Grand Total		17	\$ 1,665,991.99	5.18%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 140,000.00	53.14%
	Grand Total	1	\$ 140,000.00	53.14%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO AINARO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	5	\$ 870,743.09	25.20%
2	Edukasaun	19	\$ 2,292,232.62	14.06%
3	Eletrifikasaun Nasional	10	\$ 7,999,431.74	68.39%
4	Estradas	10	\$ 18,116,584.48	62.15%
5	Flood Control	1	\$ 98,821.63	97.48%
6	Imprestimo	3	\$ 59,201,316.40	98.74%
7	Irigasaun	1	\$ 32,319.72	90.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	17	\$ 3,237,083.74	58.49%
9	Pontes	2	\$ 3,869,397.22	73.34%
10	Saude	2	\$ 242,372.02	42.09%
11	Turismo	1	\$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	71	\$ 96,056,559.38	84.09%

NO	SECTOR PROYECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	3	\$ 569,298.02	1.22%
2	Edukasaun	4	\$ 520,065.09	25.21%
3	Eletrifikasaun Nasional	3	\$ 2,130,985.59	72.44%
4	Estradas	7	\$ 17,893,140.72	62.57%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 815,683.40	40.90%
9	Pontes	2	\$ 3,869,397.22	73.34%
10	Saude	2	\$ 242,372.02	42.09%
11	Turismo	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		25	\$ 26,137,198.78	62.12%

NO	SECTOR PROYECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	3	\$ 249,958.21	0.00%
3	Eletrifikasaun Nasional	1	\$ 1,230,059.02	66.92%
4	Estradas	1	\$ 76,554.69	0.00%
5	Flood Control			
6	Imprestimo	3	\$ 59,201,316.40	98.74%
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	4	\$ 444,741.95	80.94%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		12	\$ 61,202,630.27	97.44%

NO	SECTOR PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	4	\$ 578,502.86	0.00%
3	Eletrifikasaun Nasional	1	\$ 384,790.42	0.00%
4	Estradas			
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun	1	\$ 32,319.72	90.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 551,613.03	48.94%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		9	\$ 1,547,226.03	19.33%

NO	SECTOR PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	2	\$ 301,445.07	70.48%
2	Edukasaun	8	\$ 943,706.46	20.25%
3	Eletrifikasaun Nasional	5	\$ 4,253,596.71	72.98%
4	Estradas	2	\$ 146,889.07	42.44%
5	Flood Control	1	\$ 98,821.63	97.48%
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	7	\$ 1,425,045.36	65.26%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		25	\$ 7,169,504.30	64.11%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	3	\$ 275,266.70	85.15%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 32,319.72	90.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	40	\$ 91,909,713.75	86.68%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	20	\$ 2,316,678.62	14.86%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	3	\$ 382,372.02	46.13%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	0.00%
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
9	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		71	\$ 96,056,559.38	84.09%

NO	DONO DO PROJECTO	Ainara-Vila		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	1	\$ 15,000.00	0.00%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	14	\$ 24,219,553.10	64.75%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	4	\$ 520,065.09	25.21%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	2	\$ 242,372.02	42.09%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	0.00%
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
9	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		25	\$ 26,137,198.78	62.12%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	9	\$ 60,952,672.06	97.84%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	3	\$ 249,958.21	0.00%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
Grand Total		12	\$ 61,202,630.27	97.44%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 32,319.72	90.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	3	\$ 911,957.45	27.19%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	\$ 602,948.86	3.65%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
Grand Total		9	\$ 1,547,226.03	19.33%

NO	DONO DO PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	2	\$ 260,266.70	90.06%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	14	\$ 5,825,531.14	70.32%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	8	\$ 943,706.46	20.25%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude	1	\$ 140,000.00	53.14%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
Grand Total		25	\$ 7,169,504.30	64.11%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Poduktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Ainaro	16,823	7170	6636	5567	5058
Hato-Udo	10,747	3130	2923	2415	2279
Hato-Builico	13,249	3457	3365	3241	3186
Maubisse	24,672	6378	6309	6222	5764

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu neébe hetan husi progresu fulan ida neé, ikus liu porsentagen actual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detallu bele hareé iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hareé #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Obstaclo neébe ami enjineiru hasoru iha terenu mak hanesan tuir mai ne'e :

1. Kompanhia nia tekniku laiha terenu
 2. Kompanhia neébe ka'er obra iha Municipio Ainaro iha hotu Dili
 3. Teknik husi Projetu nain ladun halo inspesaun ba iha terenu
 4. Kondisaun kareta ne'ebe Suporta Ekipa AND,I.P iha tereno ho kondisaun ne'ebe sei aat
- Obstaclo parte Eletricidade
1. Durante Eng ADN, I.P halo monitorin directur kompahnia nunca iha fatin projeto e delega ema balun mak sempre hein iha fatin projeto.
 2. Kompahnia balun mak to agora sedauk hadia konstruk Linha MV & LV nebe mak avaria.
 3. Iha kompahnia seluk hein hela karta termo de entrega 10% husi EDTL – EP municipio ate agora sedauk fo ba kompahnia.
 4. Seksaun M & E - ADN, I.P sempre hasoru mak kona ba motorist.
 5. Seksaun M & E – ADN, I.P labele kontrola masimu projeto electricidade ho edificio public tamba Eng M & E – ADN, I.P ida kontrola municipio ha'at (4).

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU


4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Buka solusaun ba projetu ne'ebe parado
2. Sistema Internet iha Municipio lalao ho diak ho difikulta enjineiru nia servisu
3. Kondisaun Rezidencia Oficial AND,I.P Municipio Ainaro ne'ebe presija atu hadia:
 - Be'e
 - Moru
 - Tralis Jenela

➤ Recomendação parte Eletricidade

1. Seksaun M & E husu parte rekursu Humanu atu aumenta tan funsionario M & E.
2. Seksaun M & E – ADN, I.P husu ba ITC tenki kria folder sistem keta ida mai iha seksaun M & E – ADN, I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Ainaro

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engineiro	Manuel Bany da S. C. de Carvalho	115	Enjineiru ITI		
		Joaquim de C. Madeira	167	Enjineiru EPAS		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		
2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Lucas Alberto Soares Pereira	195	Motorista		



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MARSU)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	78.52%	\$ 355,512.32	\$ 97,263.04	ON-GOING	Projeto nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	87.87%	\$ 334,820.71	\$ 46,223.20	ON-GOING	Projeto nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobulico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	73.10%	65.79%	\$ 853,430.72	\$ 443,735.60	ON-GOING	
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	\$ 4,223,004.05	July 1, 2013	100.00%	89.74%	\$ 3,789,830.06	\$ 433,173.99	PHO	Projeto ramata ona ho nia fisiku 100%.
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	88.00%	\$ 110,219.55	\$ 15,029.94	PHO	Projeto 100% iha tinan 2016 maibe to agora companhia sedauk husu pagamento retensaun 10%
6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	69.02%	62.12%	\$ 2,687,116.69	\$ 1,638,659.81	ON-GOING	
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3,717,215.92	July 1, 2013	86.60%	71.00%	\$ 2,639,364.12	\$ 1,077,851.80	PHO	
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	41.51%	34.96%	\$ 1,740,596.03	\$ 3,237,754.96	ON-GOING	
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co.,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	\$ 3,596,249.07	July 1, 2013	86.49%	77.94%	\$ 2,802,979.89	\$ 793,269.18	PHO	
10	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	87.28%	76.81%	\$ 140,453.21	\$ 42,411.48	ON-GOING	
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardim dos Heróis Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489,653.83	April 10, 2019	52.62%	46.82%	\$ 229,243.50	\$ 260,410.33	ON-GOING	
12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	82.18%	\$ 26,956.99	\$ 5,844.88	ON-GOING	
13	Rehabilitasaun Edificio Administraun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	\$ 15,000.00	Sept. 19, 2016	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 15,000.00	ON-GOING	Projeto refere remata ona iha 2021 husu atu hare fila fali dadus pagamento (Retensaun)
14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/II/2018	\$ 7,700.00	Feb. 12, 2018	100.00%	90.00%	\$ 6,930.00	\$ 770.00	PHO	Projeto refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedauk hatama pagamento
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208,089.56	July 29, 2019	70.00%	63.00%	\$ 131,088.50	\$ 0.70	ON-GOING	Projeto refere sei parado
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	86.20%	77.58%	\$ 22,808.96	\$ 6,592.18	ON-GOING	Projeto refere 100% ona tuir volume nebe iha tereno
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	89.59%	\$ 86,232.55	\$ 10,024.17	PHO	Projeto ferere ramata ona, husu atu hare fila fali dadus pagamento nebe iha.
18	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33,889.94	June 18, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 33,889.94	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWT-CW-015055	\$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	12.71%	\$ 34,707.48	\$ 238,440.67	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2016



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MARSU)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainara-Vila	Ainara	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/II/2015	\$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	37.19%	\$ 79,200.00	\$ 133,770.88	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2015
21	Rehabilitasaun Estrada Ainara-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainara-Vila	Ainara	EI Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600,016.84	July 25, 2016	30.78%	27.70%	\$ 166,229.49	\$ 433,787.35	PENDENTE	Projeto refere parado 2017
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	10.63%	0.00%	\$ -	\$ 98,554.74	ON-GOING	
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	Ainara	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	7.23%	0.00%	\$ -	\$ 103,107.04	ON-GOING	
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	Ainara	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	11.38%	0.00%	\$ -	\$ 110,313.75	ON-GOING	
25	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainara District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	Ainara	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	\$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	11.88%	0.00%	\$ -	\$ 546,598.02	ON-GOING	
26	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainara	Simbissa Unip.Lda	Ia mensiona no kontratu	\$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	90.00%	\$ 22,001.40	\$ 2,444.60	PHO	Projeto refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedauk hatama pagamento
27	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainara (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainara	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	\$ 239,273.00	Sept. 25, 2019	85.98%	87.08%	\$ 208,360.75	\$ 30,912.25	ON-GOING	
28	New Construction of Electrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKAUN NASIONAL	Hatudo	Ainara	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384,790.42	Jul1,26,2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 384,790.42	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
29	Road Maintenance Section - Ainara - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainara	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	13.75%	\$ 39,581.06	\$ 248,312.97	PENDENTE	Projeto refere parado 2019
30	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere-Ainara	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	Ainara	Berdato Unip Lda		\$ 32,319.72	23.8, 2021	100.00%	90.00%	\$ 29,087.75	\$ 3,231.97	PHO	
31	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 97,872.80	ON-GOING	
32	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	20.10%	0.00%	\$ -	\$ 68,356.81	ON-GOING	
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	15.54%	0.00%	\$ -	\$ 110,695.39	ON-GOING	
34	Projeto Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	Leolico Unip. Lda	NCB.02/MEJD/DNA/2021	\$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 301,577.86	ON-GOING	
35	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	99.16%	86.20%	\$ 139,264.98	\$ 22,289.21	ON-GOING	
36	Rural Roads Routine Maintenance Ainara - Maunono Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	79.19%	\$ 21,935.23	\$ 5,765.84	ON-GOING	Projeto refere ramata ona husu atu hare fila fali dadus pagamento
37	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	84.46%	76.02%	\$ 148,346.12	\$ 46,804.58	ON-GOING	
38	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	92.83%	83.55%	\$ 50,409.48	\$ 9,926.51	ON-GOING	
39	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	Ainara	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76,554.69	June 18, 2021	37.11%	0.00%	\$ -	\$ 76,554.69	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
40	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding and maintenance of Dili-Ainara Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainara	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 28,138,737.00	Nov. 20, 2014	99.12%	99.17%	\$ 27,905,994.96	\$ 232,742.04	PHO	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MARSU)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
41	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 26,875,070.79	Nov. 20, 2014	100.00%	99.29%	\$ 26,685,024.74	\$ 190,046.05	PHO	
42	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	92.29%	\$ 3,864,572.08	\$ 322,936.53	ON-GOING	
43	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	69.40%	66.92%	\$ 823,176.06	\$ 406,882.96	ON-GOING	
44	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	21.58%	0.00%	\$ -	\$ 67,801.26	ON-GOING	
45	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	19.62%	0.00%	\$ -	\$ 100,649.51	ON-GOING	
46	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	19.85%	0.00%	\$ -	\$ 81,507.44	ON-GOING	
47	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Bermavana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	79.95%	60.75%	\$ 143,498.67	\$ 92,726.23	ON-GOING	
48	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	66.94%	49.43%	\$ 100,497.36	\$ 102,801.14	ON-GOING	
49	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	83.32%	\$ 475,776.61	\$ 95,267.77	ON-GOING	Projetu nia laabe halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no presija hadia fali nia konstrusaun
50	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	67.52%	60.35%	\$ 396,577.37	\$ 260,520.43	ON-GOING	
51	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	90.00%	\$ 896,415.58	\$ 99,601.73	PHO	Hein 10 % retensaun EDTL Munisipiu maka seidaunk entrega
52	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	43.84%	\$ 452,656.17	\$ 579,755.90	ON-GOING	
53	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	88.54%	\$ 882,792.12	\$ 114,233.03	ON-GOING	Projetu nia laabe halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no sei hein kompanha atu submete dokumentus
54	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Leotyia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	\$ 195,378.22	Aug. 16, 2019	98.33%	87.71%	\$ 171,357.85	\$ 24,020.37	ON-GOING	
55	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	87.04%	\$ 73,728.12	\$ 10,978.14	ON-GOING	Projetu refere ramata ona iha 2019 husu atu hare fila fali dadus pagamento
56	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urlepha Star 0+000 - 3+000 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Delong Unip. Lda	MPW-190087	\$ 302,126.40	Aug. 16, 2019	100.00%	88.59%	\$ 267,666.73	\$ 34,459.67	ON-GOING	
57	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 98,821.63	July 29, 2019	100.00%	97.48%	\$ 96,332.33	\$ 2,489.30	ON-GOING	Projetu refere companhia sei hatama pagamento adicional



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MARSU)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
58	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 212,829.93	July 29, 2019	97.88%	89.79%	\$ 191,103.88	\$ 21,726.05	PHO	
59	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 161,445.07	Aug. 16, 2019	100.00%	85.52%	\$ 138,069.82	\$ 23,375.25	ON-GOING	
60	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	\$ 112,517.92	June 18, 2021	63.13%	55.41%	\$ 62,340.76	\$ 50,177.16	ON-GOING	
61	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34,371.15	June 18, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 34,371.15	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
62	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	53.62%	47.18%	\$ 166,561.25	\$ 186,439.61	PENDENTE	
63	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	13.17%	\$ 6,624.47	\$ 43,685.75	ON-GOING	Projetu refere sei parado iha tinan 2019
64	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	\$ 140,000.00	29-Apr-21	63.07%	53.14%	\$ 74,391.78	\$ 65,608.22	ON-GOING	
65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 99,094.14	ON-GOING	
66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 92,706.60	ON-GOING	
67	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	20.40%	0.00%	\$ -	\$ 86,471.50	ON-GOING	
68	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	17.89%	0.00%	\$ -	\$ 97,841.29	ON-GOING	
69	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 149,916.20	ON-GOING	
70	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	10.02%	0.00%	\$ -	\$ 94,951.66	ON-GOING	
71	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 109,895.14	ON-GOING	
TOTAL									\$ 96,056,559.38			84.09%	\$ 80,771,866.25	\$ 15,207,692.77		


(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Bee Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Prepara Husi :

(Eng. Manuel Bony da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.


(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Mar-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	0.00%	87.24%
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	0.00%	97.63%
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	73.10%	0.00%	73.10%
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	\$ 4,223,004.05	July 1, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	69.02%	0.00%	69.02%
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3,717,215.92	July 1, 2013	86.60%	0.00%	86.60%
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	41.51%	0.00%	41.51%
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co.,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	\$ 3,596,249.07	July 1, 2013	78.89%	7.60%	86.49%
10	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	78.75%	8.53%	87.28%
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489,653.83	April 10, 2019	52.62%	0.00%	52.62%
12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	0.00%	93.39%
13	Rehabilitasaun Edificio Administrasaun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	\$ 15,000.00	Sept. 19, 2016	0.00%	0.00%	0.00%
14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/II/2018	\$ 7,700.00	Feb. 12, 2018	100.00%	0.00%	100.00%
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208,089.56	July 29, 2019	50.29%	19.70%	70.00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Mar-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	34.37%	50.48%	86.20%
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
18	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33,889.94	June 18, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	\$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	0.00%	64.84%
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212,970.88	July 6, 2015	30.97%	14.53%	41.32%
21	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Ei Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600,016.84	July 25, 2016	30.78%	0.00%	30.78%
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	0.00%	10.63%	10.63%
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	0.00%	7.23%	7.23%
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	0.00%	11.38%	11.38%
25	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	\$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	0.00%	11.88%	11.88%
26	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	la menciona no contrato	\$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
27	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	\$ 239,273.00	Sept. 25, 2019	85.98%	0.00%	85.98%
28	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384,790.42	Jul,26,2021	0.00%	0.00%	0.00%
29	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	0.00%	15.00%
30	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere- Ainaro	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	Ainaro	Berdato Unip Lda		\$ 32,319.72	23.8, 2021	100.00%	0.00%	100.00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Mar-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
31	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
32	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	0.00%	20.10%	20.10%
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	0.00%	15.54%	15.54%
34	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	\$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
35	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	56.45%	41.94%	99.16%
36	Rural Roads Routine Maintenance Ainara - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
37	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	84.46%	0.00%	84.46%
38	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	49.32%	44.38%	92.83%
39	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	Ainara	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76,554.69	June 18, 2021	0.00%	37.11%	37.11%
40	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainara Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainara	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 28,138,737.00	Nov. 20, 2014	99.12%	0.00%	99.12%
41	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainara Road, Lot 5 Aituto-Ainara section (km 89+00 -km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainara	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 26,875,070.79	Nov. 20, 2014	100.00%	0.00%	100.00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Mar-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
42	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	0.00%	92.29%
43	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	69.40%	0.00%	69.40%
44	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	0.00%	21.58%	21.58%
45	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	0.00%	19.62%	19.62%
46	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	0.00%	19.85%	19.85%
47	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Bermuana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	18.65%	51.61%	79.95%
48	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	23.42%	43.52%	66.94%
49	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	0.00%	93.00%
50	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	67.52%	0.00%	67.52%
51	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlara - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
52	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	0.00%	48.72%
53	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	0.00%	98.38%
54	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	\$ 195,378.22	Aug. 16, 2019	98.33%	0.00%	98.33%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Mar-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
55	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
56	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urlephha Star 0+000 - 3+000 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Delong Unip. Lda	MPW-190087	\$ 302,126.40	Aug. 16, 2019	81.73%	18.27%	100.00%
57	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 98,821.63	July 29, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
58	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 212,829.93	July 29, 2019	97.88%	0.00%	97.88%
59	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 161,445.07	Aug. 16, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
60	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	\$ 112,517.92	June 18, 2021	0.00%	63.13%	63.13%
61	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34,371.15	June 18, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
62	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	53.62%	0.00%	53.62%
63	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	0.00%	40.00%
64	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	\$ 140,000.00	29-Apr-21	63.07%	0.00%	63.07%
65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
67	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	0.00%	20.40%	20.40%
68	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	0.00%	17.89%	17.89%
69	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	0.00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Mar-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
70	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	0.00%	10.02%	10.02%
71	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	0.00%

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)

Eng. ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Silvino D.R.R. Soares)

Eng. M & E, Municipio Ainara ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X.D.D. Jeronimo)

Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Joao Paulo Amaral)

Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P.

(Deolindo de F. Marques)

Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala
to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality.

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366

Data Inspesaun : 23/3/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro – Fatuk Maria

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,58.56.76, Latetude: 125,31.74.76

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Laiha Ona Espaso Hodi Kontinua Obra

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala
to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu


Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

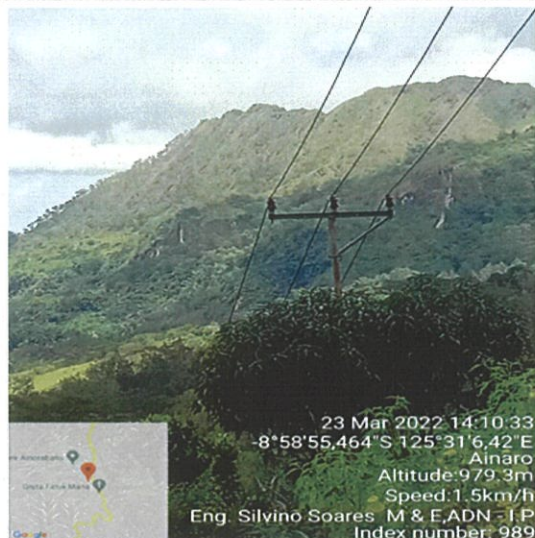



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



EADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro
Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417

Data Inspesaun : 23/3/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila – Mau Ulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,58.56.76, Latetude: 125,31.74.76

End Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Laiha Ona Espaso Hodi Kontinua Obra

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

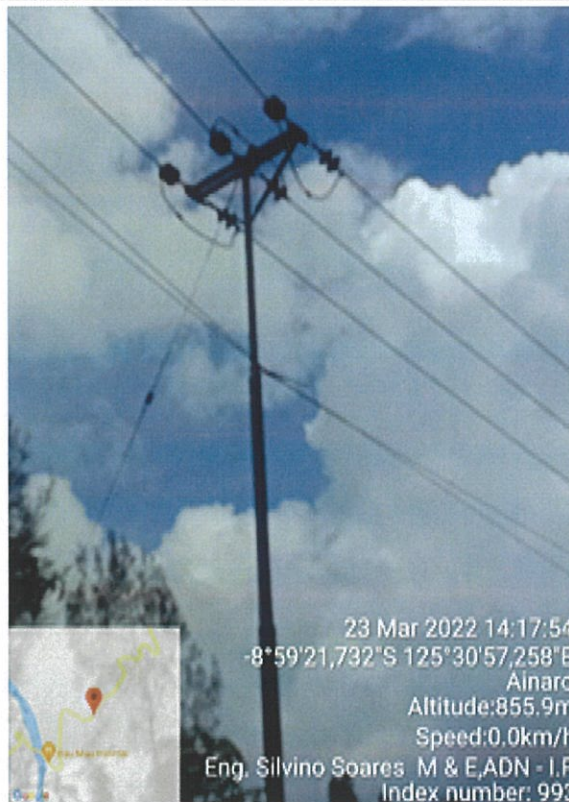



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-2)


Back-up Data

Naran Projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro
Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

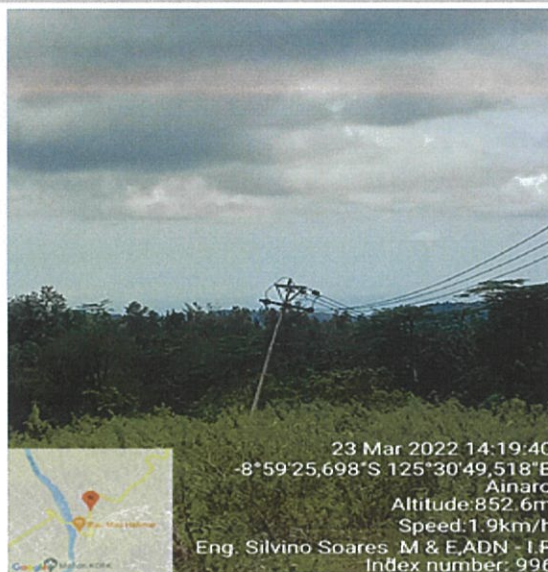

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-3)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to
Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415

Data Inspesaun : 23/3/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro - Hatobuilico

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,54.61.98, Latetude: 125,31.12.62

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Laiha Aktividade Iha Tereno



23 Mar 2022 13:58:39
8°57'35,046"S 125°31'30,018"E
Ainaro
Altitude: 854.5m
Speed: 0.7km/h
Eng. Silvino Soares M & E, ADN - I.P.
Index number: 982



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



EADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-3)


Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to
Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality
No. kontratu : RD TL/MO PTC-VMO PTC/CGI-PEN : 00000415

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

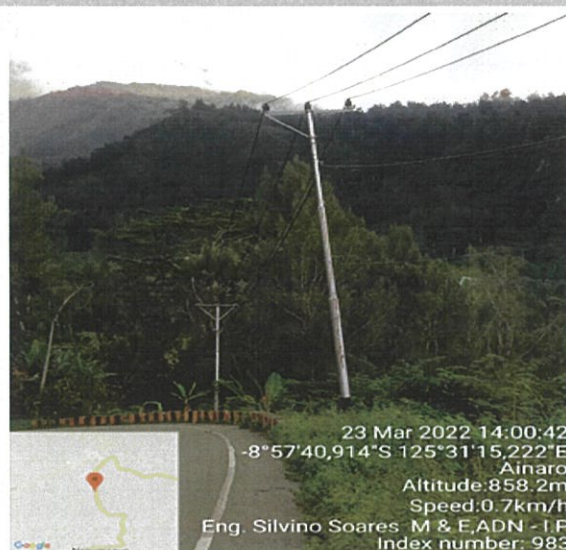

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.
No. kontratu : SSS/142/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 08/03/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'15,612''S Latetude: 125°30'39,876''E

End Point : Long : - 9°3'51,231''S Latetude: 125°30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado tamba hetan estragus
udan boot nebe akontese iha dia 22-02-2022
iha municipio Ainaro





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.
: SSS/142/MOPTC-2017

Projetu refere sei parado tamba hetan estragus
udan boot nebe akontese iha dia 22-02-2022
iha municipio Ainaro



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado tamba hetan estragus
udan boot nebe akontese iha dia 22-02-2022
iha municipio Ainaro





Project Name : Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Package 3 Ainaro Municipality
Onwner : M.O.P
Location : Ainaro
Contractor : Mejory Unip.Lda

BACK UP DATA

No	Item Description	Unit	Original Contract			ADN PROGRESS						Percentage
						Previous Billing		This Billing		To Date Billing		
			Quantity	Unit Price	Cost	Qty	Cost	Qty	Cost	Qty	Cost	
	SURFACE COURSE											
	Bituminous Prime Coat	Sq.m	58,857.50	\$ 3.78	\$ 222,481.35	\$ -	57,339.73	\$ 216,744.17	57,339.73	\$ 216,744.17	5.01%	
	Bituminous Prime Coat (RC,Cutback Asphalt)	Sq.m	55,251.38	\$ 1.04	\$ 57,491.36	\$ -	54,134.80	\$ 56,329.51	54,134.80	\$ 56,329.51	1.30%	
	Asphalt Concrete Binder Course (ACBC) 60mm thick	Sq.m	55,766.54	\$ 39.90	\$ 2,224,855.08	\$ -	40,000.00	\$ 1,595,835.12	40,000.00	\$ 1,595,835.12	36.89%	
	Asphalt Concrete Wearing Course (ACWC) 40mm thick	Sq.m	54,907.94	\$ 29.39	\$ 1,613,681.38	\$ -	38,000.00	\$ 1,116,776.42	38,000.00	\$ 1,116,776.42	25.82%	
	Sub Total 300				\$ 4,118,509.17	\$ -		\$ 2,985,685.22		\$ 2,985,685.22	69.02%	
600	DRAINAGE & SLOPE PROTECTION STRUCTURES											
204.2	Guardrail	Lm	457.50	\$ 109.93	\$ 50,294.60	\$ -		\$ -	-	\$ -	0.00%	
205	Road Sign	Ea	77.00	\$ 165.01	\$ 12,705.97	\$ -		\$ -	-	\$ -	0.00%	
606	Reflectorized Thermoplastic Pavement Markings	Sq.m	3,000.00	\$ 48.09	\$ 144,266.76	\$ -		\$ -	-	\$ -	0.00%	
	Sub Total 600				\$ 207,267.33	\$ -		\$ -		\$ -	0.00%	
	CONSTRUCTION COST				\$ 4,325,776.50	\$ -		\$ 2,985,685.22		\$ 2,985,685.22	69.02%	

Inspecsaun husi:

(Eng. Manuel Bany)

Eng. ba projeto Infraestrutura, Transporte e Irigasaun Municipio Ainaro
ADN I.P

Verifika Husi :

(Eng. Joao Paulo Amaral)

Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e Irigasaun, ADN I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador a Unidade de controlo e validadaun de Qualidade, ADN I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-9)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III,
Ainaro Municipality

No. kontratu : SSS/005/MOPTC-2013

Data Inspesaun : 08/03/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'15,612''S Latetude: 125°30'39,876''E


End Point : Long : - 9°3'51,231''S Latetude: 125°30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado tamba hetan
estragus iha dia 22-02-2022.

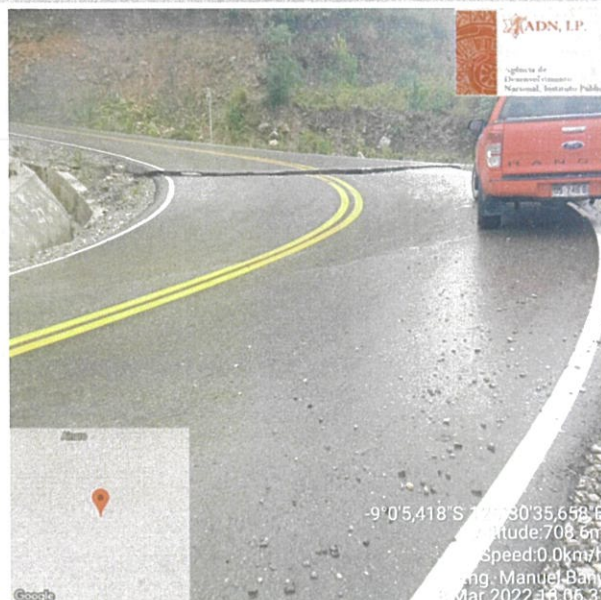



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


ANEXU C1 (ANV-9)

Back-up Data


Naran Projeto : Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III,
Ainaro Municipality

No. kontratu : SSS/005/MOPTC-2013

Projetu refere sei parado tamba hetan
estragus iha dia 22-02-2022.

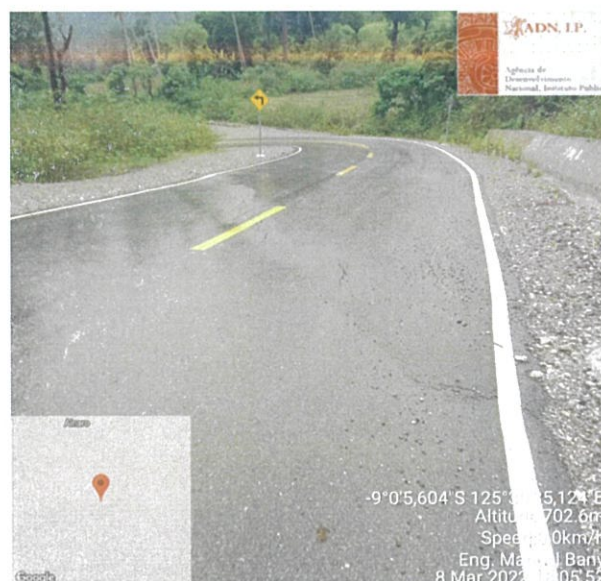

Projetu refere sei parado tamba hetan
estragus iha dia 22-02-2022.

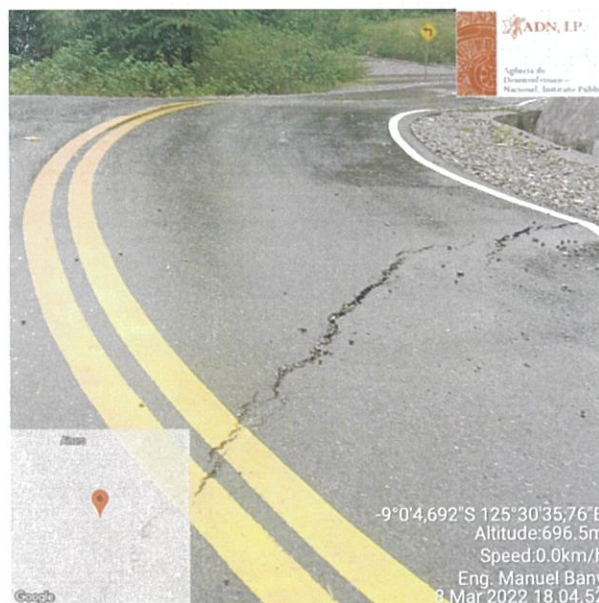



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Roads Name : Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Package 2 Ainaro Municipality

Lokasi : Ainaro Vila to Sarai

Contractor : Jonize Jv Ramelao Unip. Lda

Pay item No.	CONTRACT			SUMMARY					
	DESCRIPTION	Amount	Persent	PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE BILL	
				Amount	Persent	Amount	Persent	Amount	Persent
300	SUB BASE AND BASE COURSE	\$ 784,631.10	21.11%	\$ 576,464.11	15.51%		0.00%	\$ 576,464.11	15.51%
200	DRAINAGE & SLOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 2,932,584.82	78.89%	\$ 2,356,162.69	63.39%	\$ 282,435.98	7.60%	\$ 2,638,598.67	70.98%
GRAND TOTAL		\$ 3,717,215.92	100.00%	\$ 2,932,626.80	78.89%	\$ 282,435.98	7.60%	\$ 3,215,062.78	86.49%

Inspesaun Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projeitu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projeitu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro

No. kontratu : SSS/295/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 28-03-2022

Fatin Inspesaun : Faulata Casa, Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long : -9227,834S, Latetude: 125,3035868E

End Point : Long : -953588S Latetude: 125.3147646E

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Tanki nebe fo bee ba torneira publika
atu fahe bee ba comunidade sira iha
faulata. (Projeto abandona iha 2019
ate agora).

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch & Foto Desenho





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa,
Ainaro

No. kontratu : SSS/295/MOPTC-2016

Tangki fo bee ba torneira publika agora
dau daun diak hela maibe torneira balu
maka ladiak.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-10) Back-up Data

Naran Projeto : Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa,
Ainaro
No. kontratu : SSS/295/MOPTC-2016

Torneira public nebe comunidade sira
uza ba kuru bee mos no fase ropa agora
daudaun bee mai ho diak, kada bes la
mai tamba comunidade sira uza bee nee
ho nia horario kada loron, e kanu balu
mos kuak kada bes bee la mai.






#ANEXU C2 (ANV-10)

PROJECTO EXTENSAUN KANALIZASAUN BEMOS HUSI MAU-ULO II BA FAULATA
ALDEIA : QUESSA - MAU
SUCO : CASSA
POSTO ADMINISTRATIVO : AINARO

SUMMARY OF BOQ								
No	ITEM DESCRIPTION	TOTAL PRICE	PAYMENT IN PREVIOUS MONTH		PAYMENT IN THIS MONTH		DATE TO DATE	
			AMOUNT	PERCENT%	AMOUNT	PERCENT%	AMOUNT	PERCENT%
A	PROJECT PREPARATION AND ADMINISTRATION	\$ 3,220.00	\$ 2,255.00	1.23%	\$ 890.00	0.49%	\$ 3,145.00	1.72%
B	INSTALASAUN KANU GS	\$ 131,812.60	\$ 115,466.63	63.14%	\$ 4,583.71	2.51%	\$ 120,050.34	65.65%
C	KONSTRUI RESERVATORIO VOL= 10M3	\$ 4,016.31	\$ 2,516.31	1.38%	\$ 750.00	0.41%	\$ 3,266.31	1.79%
D	KONSTRUSAUN TORNEIRA PUBLICO	\$ 6,300.00	\$ 5,250.00	2.87%	\$ -	0.00%	\$ 5,250.00	2.87%
E	REHAB. TORNEIRA PUBLICO EXISTING	\$ 1,350.00	\$ 900.00	0.49%	\$ 150.00	0.08%	\$ 1,050.00	0.57%
F	BETAUN SUPORTA KANU	\$ 3,560.00	\$ 695.00	0.38%	\$ 1,580.00	0.86%	\$ 2,275.00	1.24%
G	SERVISU KE'E RAI HODI HAKOI KANU	\$ 11,586.93	\$ 1,271.46	0.70%	\$ 5,830.65	3.19%	\$ 7,102.11	3.88%
H	SASAN SERVISU	\$ 985.16	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
I	SERVISU FINISHING	\$ 150.00	\$ -	0.00%	\$ 112.50	0.06%	\$ 112.50	0.06%
I	CONSTRUCTION COST	\$ 162,981.00	\$ 128,354.40	70.19%	\$ 13,896.87	7.60%	\$ 142,251.26	77.79%
II	CONTRACTOR FEE (10% x I)	\$ 16,298.10	\$ 12,835.44	7.02%	\$ 1,389.69	0.76%	\$ 14,225.13	7.78%
III	TAXA (2% x (I + II))	\$ 3,585.58	\$ 2,823.80	1.54%	\$ 305.73	0.17%	\$ 3,129.53	1.71%
IV	GRAND TOTAL COST (I + II + III)	\$ 182,864.69	\$ 144,013.64	78.75%	\$ 15,592.28	8.53%	\$ 159,605.92	87.28%

Inspesaun Husi :


(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio
Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)
No. kontratu : 389/KDM-AINARO/VII/2019

Data Inspesaun : 28-03-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8°59'47.2"S, Latetude: 125°30'26.8"E.

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Projeto
ida nee fisiko to ona iha
servisu kakuluk nian.
(Projeto ida nee parado
iha 2020 ate agora 2021).
Laiha informasaun ate
agora.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



-8°59'46,638"S 125°30'27,768"E
248° W
Altitude: 803.5m
Speed: 3.2km/h
Remark: Engineer: Joaquim Madeira
Index number: 516
Network time is not synchronized
Local: 26 Jan 2022 13:37:46 GMT+09:00



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-15) Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)
No. kontratu : 389/KDM-AINARO/VII/2019

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

**Pinta didin lolon ho
plamir para
preparasaun ba pinta
aiben.**

**Servisu Iha parte laran
mos kuaze plafon ho
keramik mos hotu ona.**
(Projeito ida nee parado)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data


Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)
: 389/KDM-AINARO/VII/2019

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu bee nian mos hotu
ona nia instalasaun mos tuir
desenho nebe mak iha
terreno.

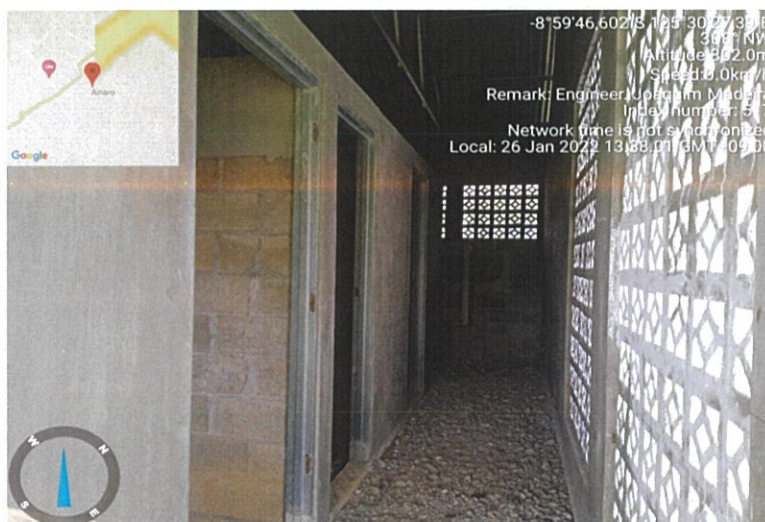

Servisu atero veranda mos
hotu ona hein deit fui
betaun. (Projeito ida nee
parado)





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-16) Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro
No. kontratu : 434/KDM-AINARO/IX/2019

Data Inspesaun : 28-03-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.9941S, Latetude: 125.5010E

End Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidaok
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor. (Parado ate agora)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

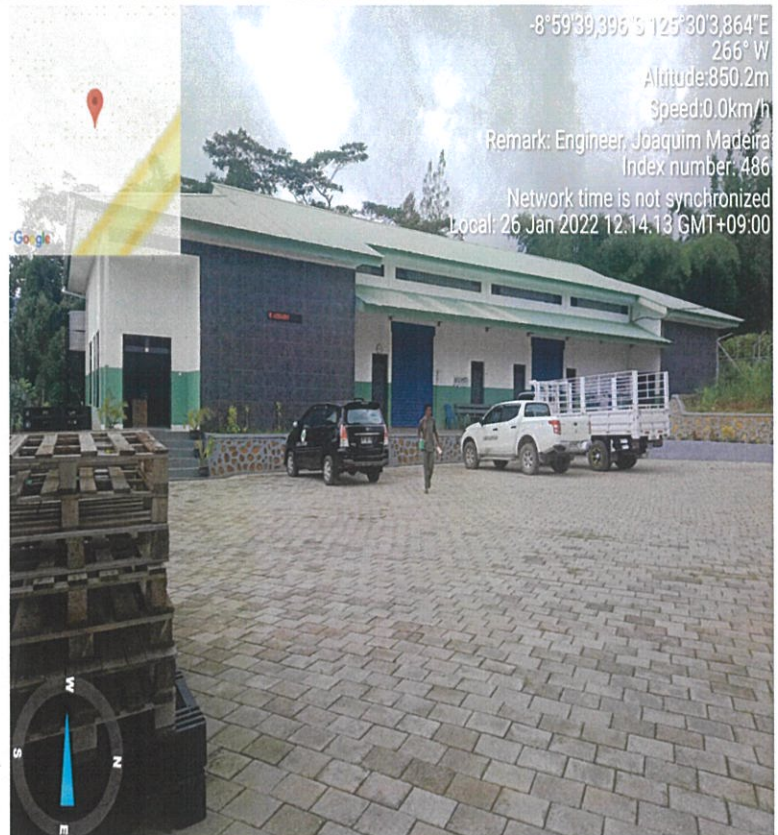



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro
No. kontratu : 434/KDM-AINARO/IX/2019

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeto refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidauk
selu hotu ho rajaun sira projeto
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro
: 434/KDM-AINARO/IX/2019

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeto refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidauk
selu hotu ho rajaun sira projeto
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.

Observasaun iha tereno no Foto





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-16) Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro
No. kontratu : 434/KDM-AINARO/IX/2019

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidak
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.





#ANEXU C2 (ANV-16)

Project Name : Site Works for Armazen SAMES Ainaro
Project Location : Ainaro Vila - Ainaro - Timor Leste

No	ORIGINAL CONTRACT			PRELIMINARIES		THIS BILLING		TO DATE	
	ITEM DESCRIPTION	Preço Total	PROGRESS(%)	Preço Total	PROGRESS(%)	Preço Total	PROGRESS(%)	Preço Total	PROGRESS(%)
I	Servisu Preparasaun	\$ 2,682.48	9.12%	\$ 1,011.24	3.44%	\$ 1,141.24	3.88%	\$ 2,152.48	7.32%
II	Pekerjaan Tembok penahan dan Saluran Keliling			\$ 7,996.41	27.20%			\$ 7,996.41	27.20%
a	Galian Tanah	\$ 3,545.08	12.06%	\$ -	0.00%	\$ 595.10	2.02%	\$ 595.10	2.02%
b	Urugan Pasir	\$ 87.60	0.30%	\$ -	0.00%	\$ 58.62	0.20%	\$ 58.62	0.20%
c	Pasangan Batu	\$ 13,564.08	46.13%	\$ -	0.00%	\$ 7,955.78	27.06%	\$ 7,955.78	27.06%
d	Back Fill (Urugan Tanah Kembali)	\$ 993.76	3.38%	\$ -	0.00%	\$ 30.88	0.11%	\$ 30.88	0.11%
e	Pekerjaan Beton	\$ 1,145.58	3.90%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
f	Pekerjaan Plesteran	\$ 2,483.15	8.45%	\$ -	0.00%	\$ 2,483.15	8.45%	\$ 2,483.15	8.45%
g	Pekerjaan Penutup Calsiboard	\$ 179.76	0.61%	\$ -	0.00%	\$ 202.94	0.69%	\$ 202.94	0.69%
A	Total	\$ 24,681.50		\$ 9,007.65		\$ 12,467.72		\$ 21,475.36	73.04%
B	Contractor Fee (10% x A)	\$ 2,468.15	8.39%	\$ 900.76	3.06%	\$ 1,246.77	4.24%	\$ 2,147.54	7.30%
C	Overhead	\$ 1,675.00	5.70%	\$ -	0.00%	\$ 837.50	2.85%	\$ 1,223.46	4.16%
D	Tax (2% x (A+B+C))	\$ 576.49	1.96%	\$ 198.17	0.67%	\$ 291.04	0.99%	\$ 496.93	1.69%
E	Grand Total	\$ 29,401.14	100.00%	\$ 10,106.58	34.37%	\$ 14,843.03	50.48%	\$ 25,343.29	86.20%

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-20)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi
No. kontratu : 02/GAB.AM.AIN/VII/2015

Data Inspesaun : 28-03-2022

Fatin Inspesaun : Manutasi/ AINARO

Koordinadas :

Start Point : Long : -85852344S Latetude: 125.312712E

End Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Projeito nee nia servisu to ona
iha kakuluk maibe ate agora
kompanhia la halo aktividade
servisu konstrusaun hanesan bai
bain.(ABANDONA ATE
AGORA LAIHA
INFORMASAUN IDA)

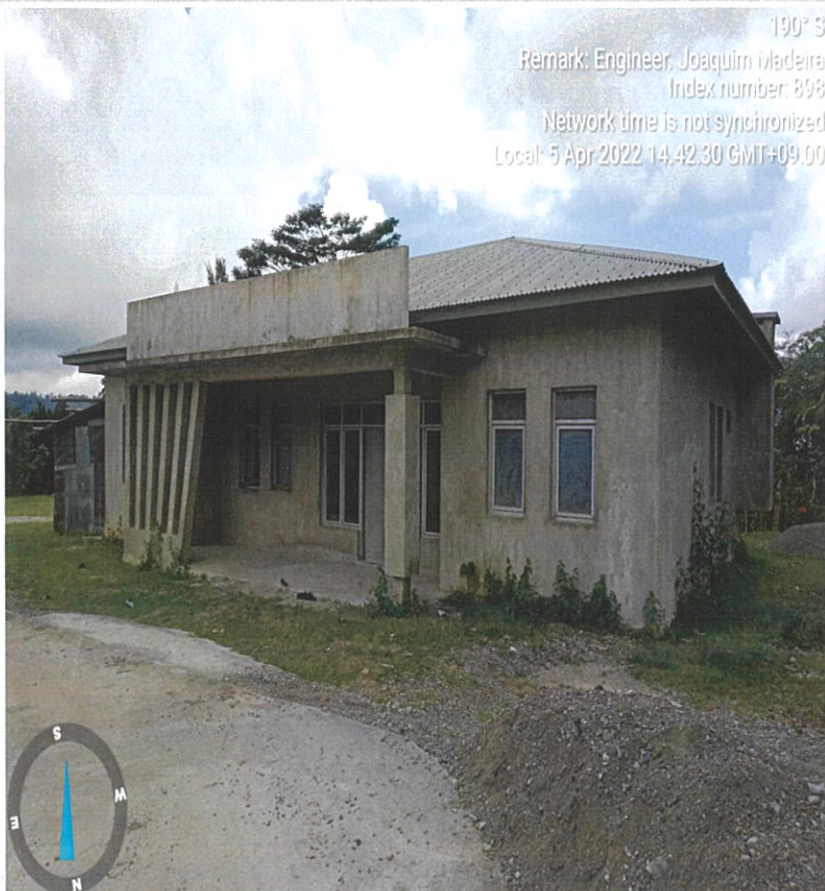



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-20)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi
: 02/GAB.AM.AIN/VII/2015

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu
Projeito nee nia servisu to ona
iha kakuluk maibe ate agora
kompanhia la halo aktividade
servisu konstrusaun hanesan bai
bain.(PARADO ATE AGORA)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-20)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi
: 02/GAB.AM.AIN/VII/2015

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Konstrusaun Uma dottor to ona
iha nia kuda kuda maibe ate
agora la halo aktividade.

Servisu laran nian reboka hotu
ona maibe la kontinuasaun.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-20)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi
: 02/GAB.AM.AIN/VII/2015

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu
Parte laran nian uma
dotor la halo aktividade
servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Remark: QUIM MADEIRA
Network time is not synchronized
Local: 24 Aug 2021 11:22:07 GMT+09:00



8°58'53,046"S 125°31'2,11"E
95°E
Altitude: 958.8m
Speed: 3.1km/h
Remark: Engineer: Joaquim Madeira
Index number: 510
Network time is not synchronized
Local: 26 Jan 2022 13:25:21 GMT+09:00



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ANV-20)

New Construction of Manutaci Health Post and Doctor House, Manutaci Sub Distrito Ainaro Villa, Distrito Ainaro,
Republic Democratic of Timor Leste

NO	DESCRIPTION OF WORK	AMOUNT	PREVIOUS MOUNTH		THIS MONTH		DATE TO DATE	
			AMOUNT	PROGRESS	AMOUNT	PROGRESS	AMOUNT	PROGRESS
I	Preliminares Page No. BQ/1	\$ 1,010.30	\$ 505.15	0.24%	\$ 252.58	0.12%	\$ 757.73	0.36%
II	Ground works Page No. BQ/5-6	\$ 2,216.49	\$ 2,450.08	1.15%	-\$ 467.18	0.00%	\$ 1,982.90	1.15%
III	Concrete works Page No. BQ/	\$ 1,890.59	\$ 9,521.01	4.47%	-\$ 7,630.42	0.38%	\$ 1,890.59	4.85%
IV	Masonry works Page No BQ/15-16-17	\$ 10,607.42	\$ 3,134.70	1.47%	\$ 999.13	0.47%	\$ 4,133.83	1.94%
V	steel structure Page No. BQ/19-20-21-22	\$ 10,578.70	\$ 8,336.35	3.91%	-\$ 1,511.46	-0.71%	\$ 6,824.88	3.20%
VI	Roofing works Page No. BQ/ 24-25	\$ 5,120.73			\$ 5,120.73	2.40%	\$ 5,120.73	2.40%
VII	Door and windows Page BQ/27-28-29	\$ 9,292.46	\$ 5,108.85	2.40%	\$ 1,910.10	0.90%	\$ 7,018.95	3.30%
VIII	Hardware Page No. BQ/31-32	\$ 1,496.40			\$ 97.50	0.05%	\$ 97.50	0.05%
IX	Painting works Page No. BQ/34-35-36	\$ 5,389.82					\$ -	0.00%
X	Tiling works Page No : BQ/38-39	\$ 5,188.73					\$ -	0.00%
XI	Ceiling works Page No. BQ/41-42	\$ 3,711.25					\$ -	0.00%
XII	Hydraulic Services Page No: BQ/44-45-46-47-48	\$ 8,100.61	\$ 2,693.98	1.26%	\$ 1,081.25	0.51%	\$ 3,775.23	1.77%
XIII	Electrical Service Page No: BQ/50-51-52-53-55	\$ 2,662.00	\$ -	0.00%	\$ 2,251.01	1.06%	\$ 2,251.01	1.06%
A	Construction cost	\$ 67,265.50	\$ 31,750.11	14.91%	\$ 2,103.23	5.17%	\$ 33,853.34	20.07%
B	Provide the Provisional Sum	\$ 2,500.00	\$ -	0.00%			\$ -	0.00%
C	Contractor Fee and Overhed (10% x (A+B))	\$ 6,976.55	\$ 3,175.01	1.49%	\$ 210.32	0.10%	\$ 3,385.33	1.59%
D	Taxa 2% (A+B+C)	\$ 1,534.84	\$ 698.50	0.33%	\$ 46.27	0.02%	\$ 744.77	0.35%
E	Project Cost (A+B+C+D)	\$ 78,276.89	\$ 35,623.63	16.73%	\$ 2,359.82	5.29%	\$ 37,983.45	22.01%
F	Contingency	Rp 6,246.21	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	GRAND TOTAL	\$ 84,523.10	\$ 35,623.63	16.73%	\$ 2,359.82	5.29%	\$ 37,983.45	22.01%
							\$ -	0.00%
I	Site Conrete Page No : BQ/8-9-10-11-12-13	\$ 8,608.17	\$ 7,400.48	3.47%	\$ 1,156.68	0.54%	\$ 8,557.17	4.02%
II	Massonry Page No : BQ/15-16-17	\$ 10,607.42	\$ 6,688.77	3.14%	\$ 3,808.56	1.79%	\$ 10,497.34	4.93%
III	Strucrural steel Page No : BQ/19-20-21-22	\$ 5,512.00	\$ 5,512.00	2.59%			\$ 5,512.00	2.59%
IV	Groud work Page No BQ/5-6	\$ 3,485.59	\$ 3,195.12	1.50%	\$ 383.84	0.18%	\$ 3,578.97	1.68%
V	Rofing works Page No. : BQ/24-25	\$ 7,756.03			\$ 7,232.14	3.40%	\$ 7,232.14	3.40%
VI	Electrical service Page No BQ/50-51	\$ 2,662.00			\$ 492.00	0.23%	\$ 492.00	0.23%
VII	Door and windows Page No. : BQ/27-28-29	\$ 2,830.14	\$ 1,188.09	0.56%	\$ 1,230.05	0.58%	\$ 2,418.14	1.14%
VIII	Hardware Page No, : BQ/31-32	\$ 2,390.57			\$ 50.00	0.02%	\$ 50.00	0.02%
IX	Painting warks Page No. : BQ/ 34-35-36	\$ 7,892.01					\$ -	0.00%
X	Tiling works Page No. : BQ/38-39	\$ 5,188.73			\$ 100.00	0.05%	\$ 100.00	0.05%
XI	Ceiling works Page No. BQ/41-42	\$ 6,223.31			\$ 958.40	0.45%	\$ 958.40	0.45%



ANEXU C2 (ANV-20)

New Construction of Manutaci Health Post and Doctor House, Manutaci Sub Distrito Ainaro Villa, Distrito Ainaro,
Republic Democratic of Timor Leste

NO	DESCRIPTION OF WORK	AMOUNT	PREVIOUS MOUNTH		THIS MONTH		DATE TO DATE	
XII	Hydraulic Service Page No. BQ/ 44-45-46-47-48	\$ 12,842.03	\$ 3,055.72	1.43%	\$ 2,126.15	1.00%	\$ 5,181.87	2.43%
XIII	Mechanical Service Page No. BQ/53	\$ -					\$ -	0.00%
A	Construction cost	\$ 75,997.99	\$ 27,040.19	12.70%	\$ 17,537.83	8.23%	\$ 44,578.02	20.93%
B	Provisional sum	\$ 5,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
C	Contractor fee and overhead (10% X (A+B))	\$ 8,390.40	\$ 2,704.02	1.27%	\$ 1,753.78	0.82%	\$ 4,457.80	2.09%
D	Taxa 2% X (A+B+C)	\$ 1,845.89	\$ 594.88	0.28%	\$ 385.83	0.18%	\$ 980.72	0.46%
E	Project cost (A+B+C+D)	\$ 91,234.28	\$ 30,339.10	14.25%	\$ 19,677.44	9.24%	\$ 50,016.54	23.49%
F	Contingency	\$ 5,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	GRAND TOTAL	\$ 99,140.26	\$ 30,339.10	14.25%	\$ 19,677.44	9.24%	\$ 50,016.54	23.49%
	New Const. of Manutaci Doctor House, Manutaci Sub District Ainaro Villa, District Ainaro, Republica Democratica of Timor Leste	\$ 84,523.10	\$ 35,623.63	16.73%	\$ 2,359.82	5.29%	\$ 37,983.45	22.01%
	New Const. of Manutaci Health Post, Manutaci Sub District Ainaro Villa, District Ainaro, Republica Democratica of Timor Leste	\$ 99,140.26	\$ 30,339.10	14.25%	\$ 19,677.44	9.24%	\$ 50,016.54	23.49%
	Total Construction Cost of Doctor House & Health Post	\$ 183,663.36						
	Contract Value (Total Amount (E + F))	Rp 212,970.88	\$ 65,962.72	30.97%	\$ 22,037.27	14.53%	\$ 87,999.99	41.32%

Inspesoun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-22)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainara Posto Administrativo
de Ainara Municipio de Ainara (EBF. LUAN CADOI)
Numero Contrato : Kontratu ho Grupo Comunitario

Data Inspesaun : 25/03/2022

Fatin Inspesaun :

Koordinadas :

Start Point : Long :, Latetude:

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere pondasi sala de aulas 3
kuase hada hotu ona e tuir desenho nebe
maka aprovado, no komesa kee fali
haris fatin nian mos hotu ona.

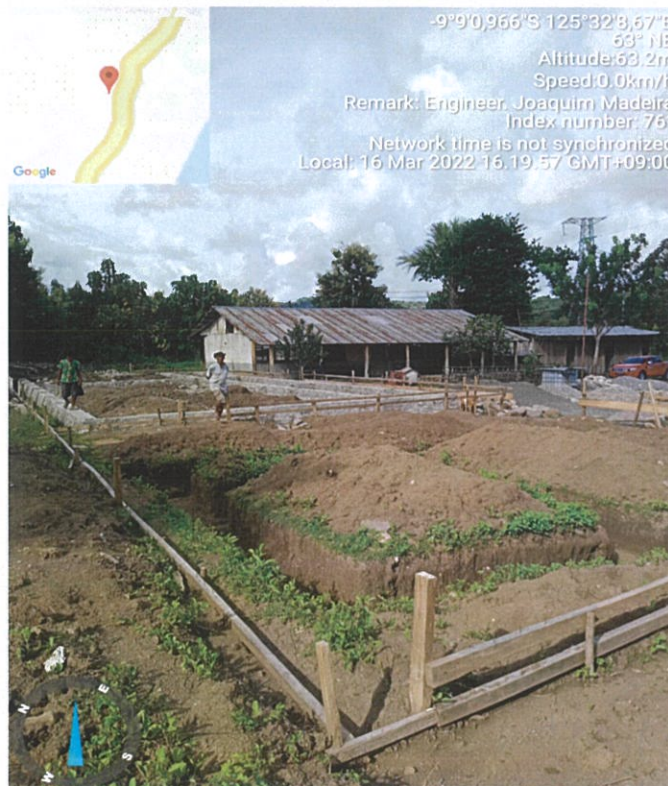



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-22)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainara Posto Administrativo
de Ainara Municipio de Ainara (EBF. LUAN CADOI)

Numero Contrato : Kontratu ho Grupo Comunitario

Projeito refere pondasi sala de aulas 3
kuase hada hotu ona e tuir desenho nebe
maka approved, no komesa kee fali
haris fatin nian mos hotu ona.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-22)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainara Posto Administrativo
de Ainara Municipio de Ainara (EBF. LUAN CADOI)
Numero Contrato : Kontratu ho Grupo Comunitario

Projeito refere pondasi sala de aulas 3
kuase hada hotu ona e tuir desenho nebe
maka approved, no komesa kee fali
haris fatin nian mos hotu ona.





#ANEXU C2 (ANV-22)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL LUAN CADOI
LOCATION : SUCO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO
AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No		Amount			THIS MOUNTH	
							AMOUNT	PERCENT
I	PRELIMINARIES	PP/3		US\$	3,575.00		\$ 1,975.00	2.00%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	US\$	49,729.55		\$ 7,193.54	7.30%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50		US\$	25,016.07			
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24	(i)	US\$	10,894.12			
CONSTRUCTION COST				US\$	89,214.74		\$ 9,168.54	9.30%
CONTIGENCY				US\$	3,000.00		\$ -	0.00%
OVERHEAD				US\$	6,340.00		\$ 1,310.00	1.33%
GRAND TOTAL				US\$	98,554.74		\$ 10,478.54	10.63%

Inspesau Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)


Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, —
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

#ANEXU D (ANV-22)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Município de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)							
Kompanha : Grupo Komunitari							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	3/8/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu ba grupu prepara material lais atu lori ba teste iha labortorium atu nune bele asselera servisu lais, nomos servisu tenki tuir desenho ho b of q.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	3/16/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III	3/25/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-23)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo
de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)
Numero Contrato : Kontratu ho Grupo Comunitario

Data Inspesaun : 25/03/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point :, Latetude:

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .
Projeito refere servisu hada
fondasi tuir planta e b of q
nebe aprovado.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-23)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainara Posto Administrativo
de Ainara Municipio de Ainara (EBF LIAS)

Numero Contrato : Kontratu ho Grupo Comunitario

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

. Projeto refere servisu hada
fondasi tuir planta e b of q
nebe aprovado.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-23)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainara Posto Administrativo
de Ainara Municipio de Ainara (EBF LIAS)

Numero Contrato : Kontratu ho Grupo Comunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere servisu hada
fondasi tuir planta e b of q
nebe aprovado.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (ANV-23)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL LIAS
LOCATION : SUCCO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No		Amount			AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3		US\$	3,575.00		\$ 2,050.00	1.99%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	US\$	50,185.26		\$ 4,097.44	3.97%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50		US\$	25,178.89			
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24	(i)	US\$	14,827.89			
CONSTRUCTION COST				US\$	93,767.04		\$ 6,147.44	5.96%
CONTIGENCY				US\$	3,000.00		\$ -	0.00%
OVERHEAD				US\$	6,340.00		\$ 1,310.00	1.27%
GRAND TOTAL				US\$	103,107.04		\$ 7,457.44	7.23%

Inspesauñ Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Ainaro
ADN, I.P


Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé Saneamento,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun
de Qualidade,
ADN, I.P

#ANEXU D (ANV-23)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)							
Kompanha : Grupo Komunitari							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	3/8/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu grupo servisu pondasi tengki hare desenho ho b of q e acelera lais tamba tempo udan, prepara material lais lori ba labortorium hodi teste.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	3/16/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III	3/25/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-24)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto
Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG. FERNANDO LA SAMA
DE ARAUJO AINARO)

Numero Contrato : Kontratu ho Grupo Comunitario

Data Inspesaun : 25-03-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :, Latetude:

End Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu hada pondasi e ateru
orentasaun tuir desenho no B
OF Q nebe iha

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

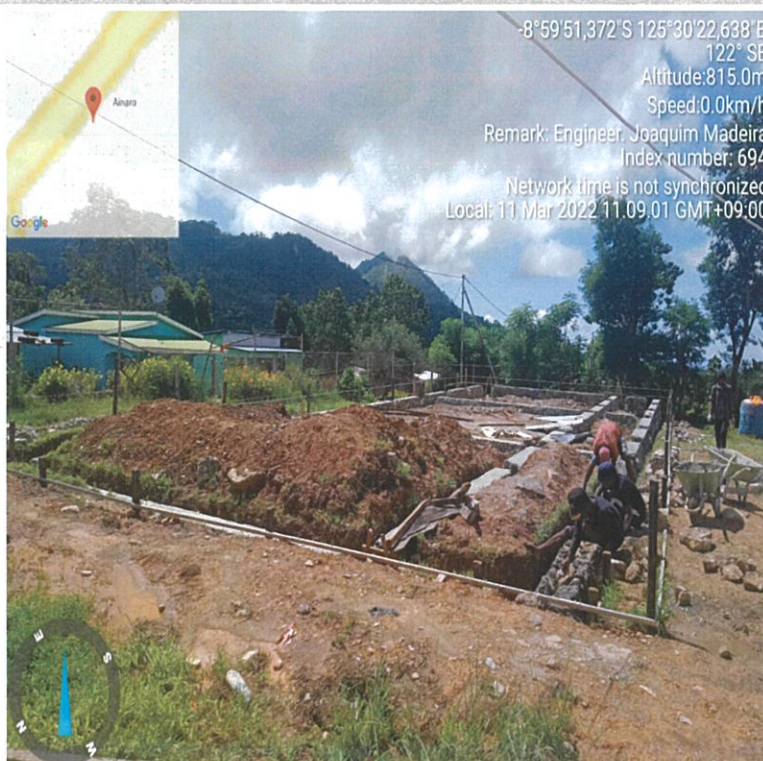



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-24)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto
Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG. FERNANDO LA SAMA
DE ARAUJO AINARO)


Numero Contrato : Kontratu ho Grupo Comunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu hada pondasi e ateru
orentasaun tuir desenho no B
OF Q nebe iha

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

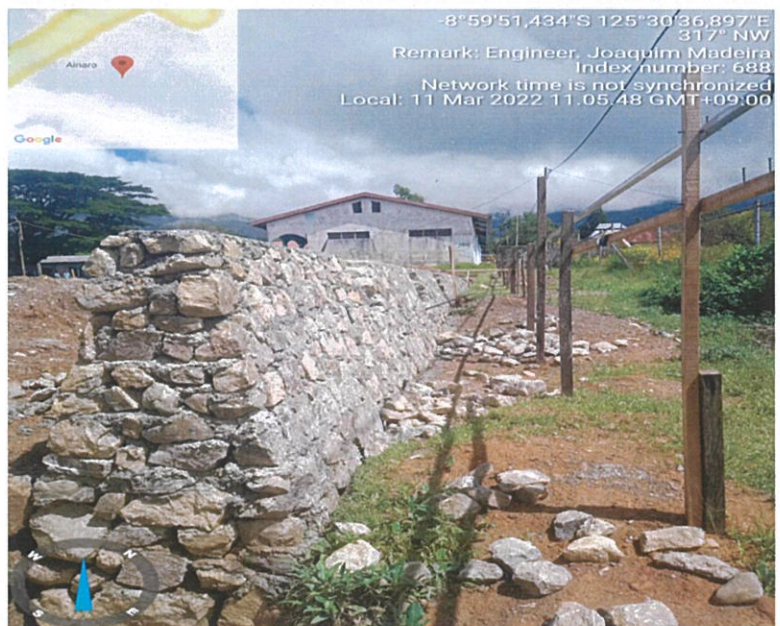



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-24)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainara Posto
Administrativo de Ainara Municipio de Ainara (ESG. FERNANDO LA SAMA
DE ARAUJO AINARO)

Numero Contrato : Kontratu ho Grupo Comunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu hada pondasi e ateru
orentasaun tuir desenho no B
OF Q nebe iha





#ANEXU C2 (ANV-24)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA SECUNDARIA GERAL
LOCATION : SUCO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY							THIS MONTH	
	MAIN SUMMARY	Page No		Amount			AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3		US\$ 3,075.00		\$ 1,800.00		1.68%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	US\$ 56,061.73		\$ 9,273.05		8.41%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50		US\$ 30,953.49				
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24	(i)	US\$ 10,883.53				
CONSTRUCTION COST				US\$ 100,973.75		\$ 11,073.05		10.08%
CONTIGENCY				US\$ 3,000.00		\$ -		0.00%
OVERHEAD				US\$ 6,340.00		\$ 1,310.00		1.30%
GRAND TOTAL				US\$ 110,313.75		12,383.05		11.38%

Inspesaun Husi :


(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P




Verifika Husi :


(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

#ANEXU D (ANV-24)

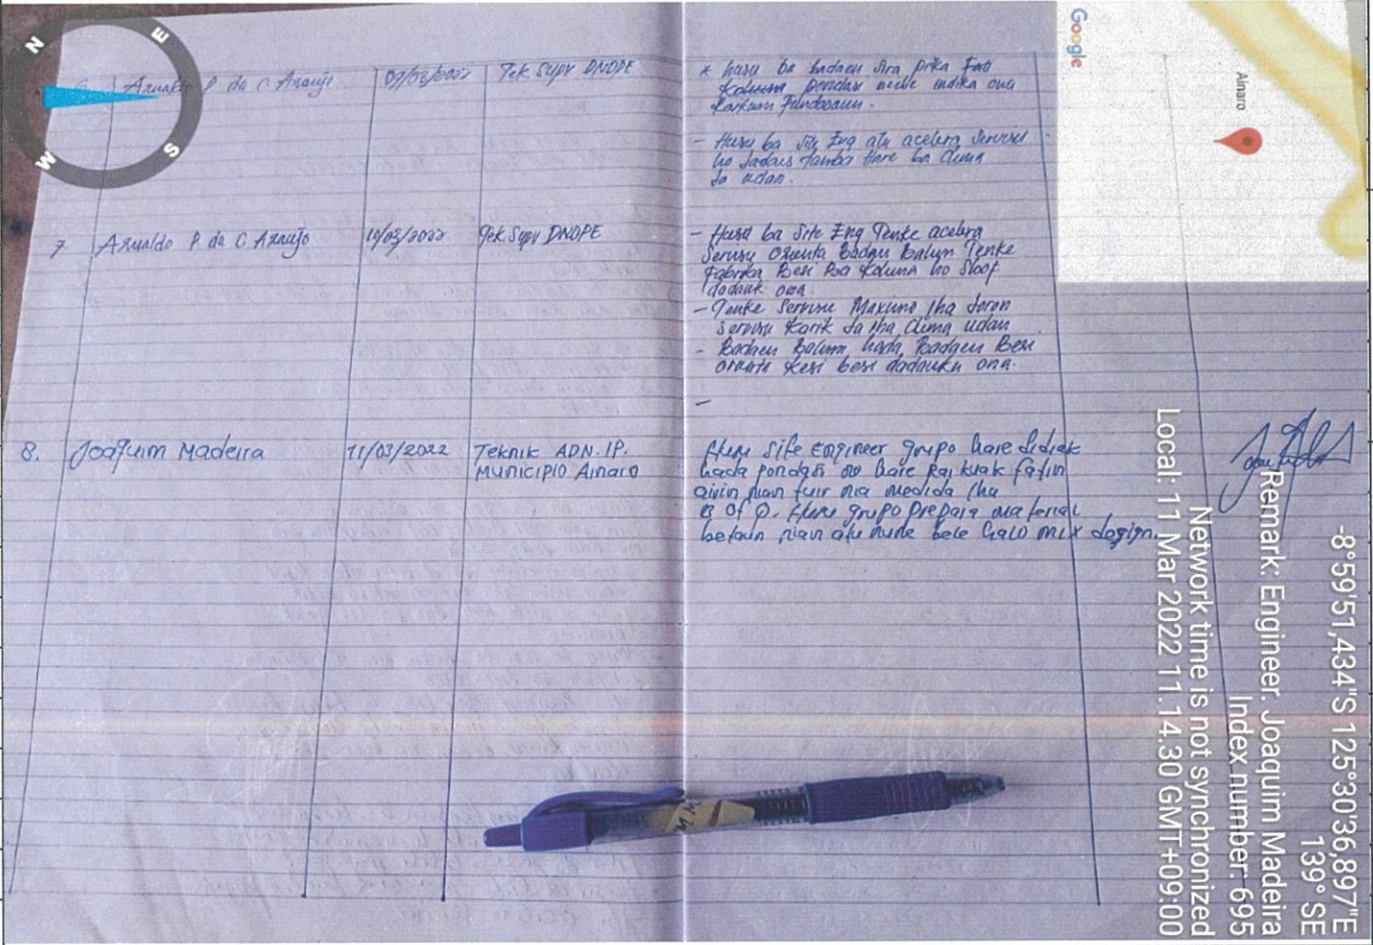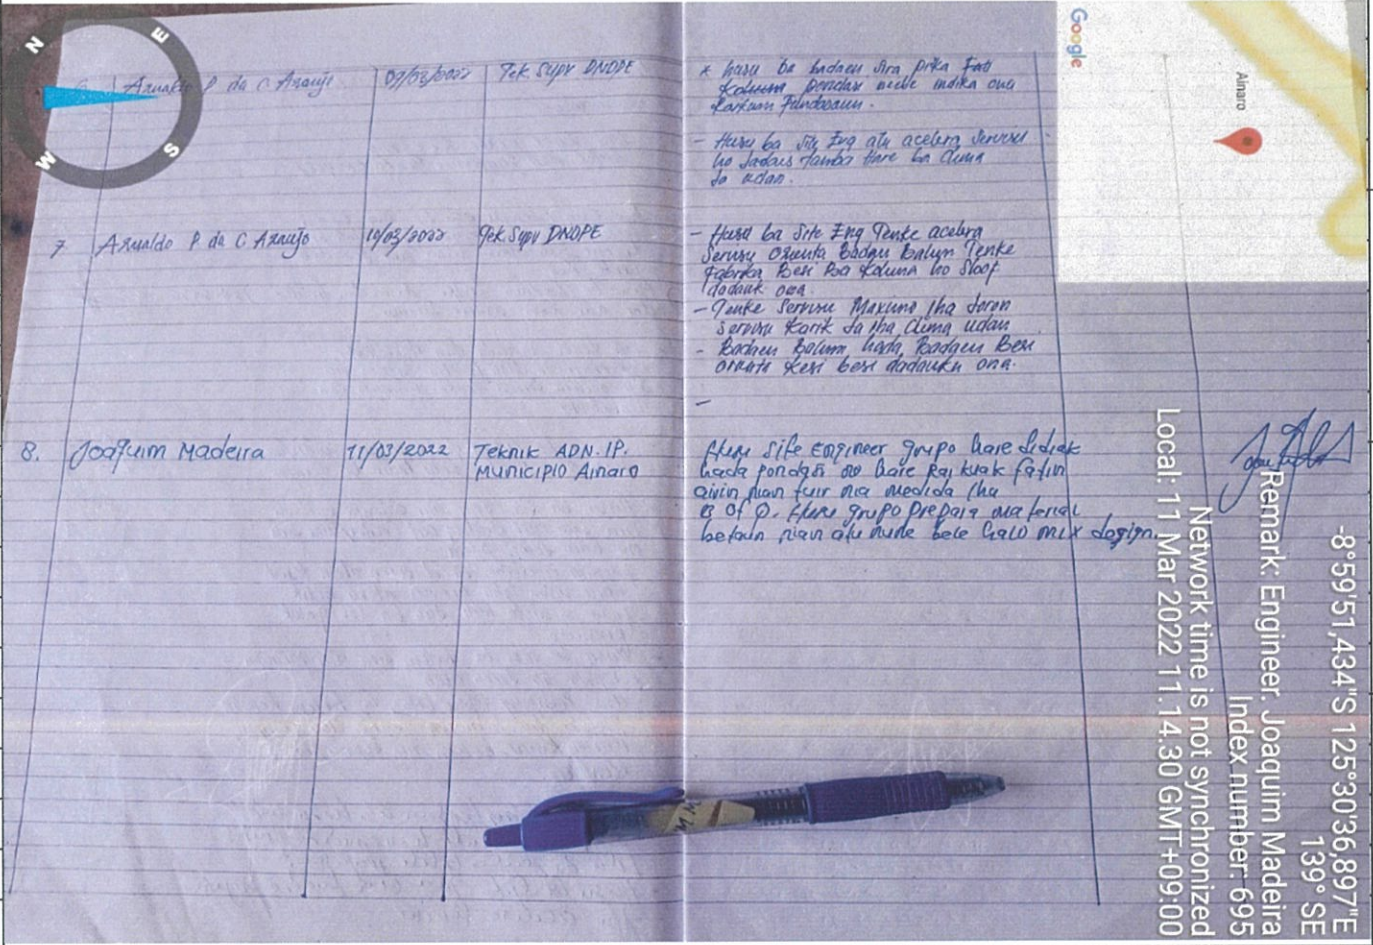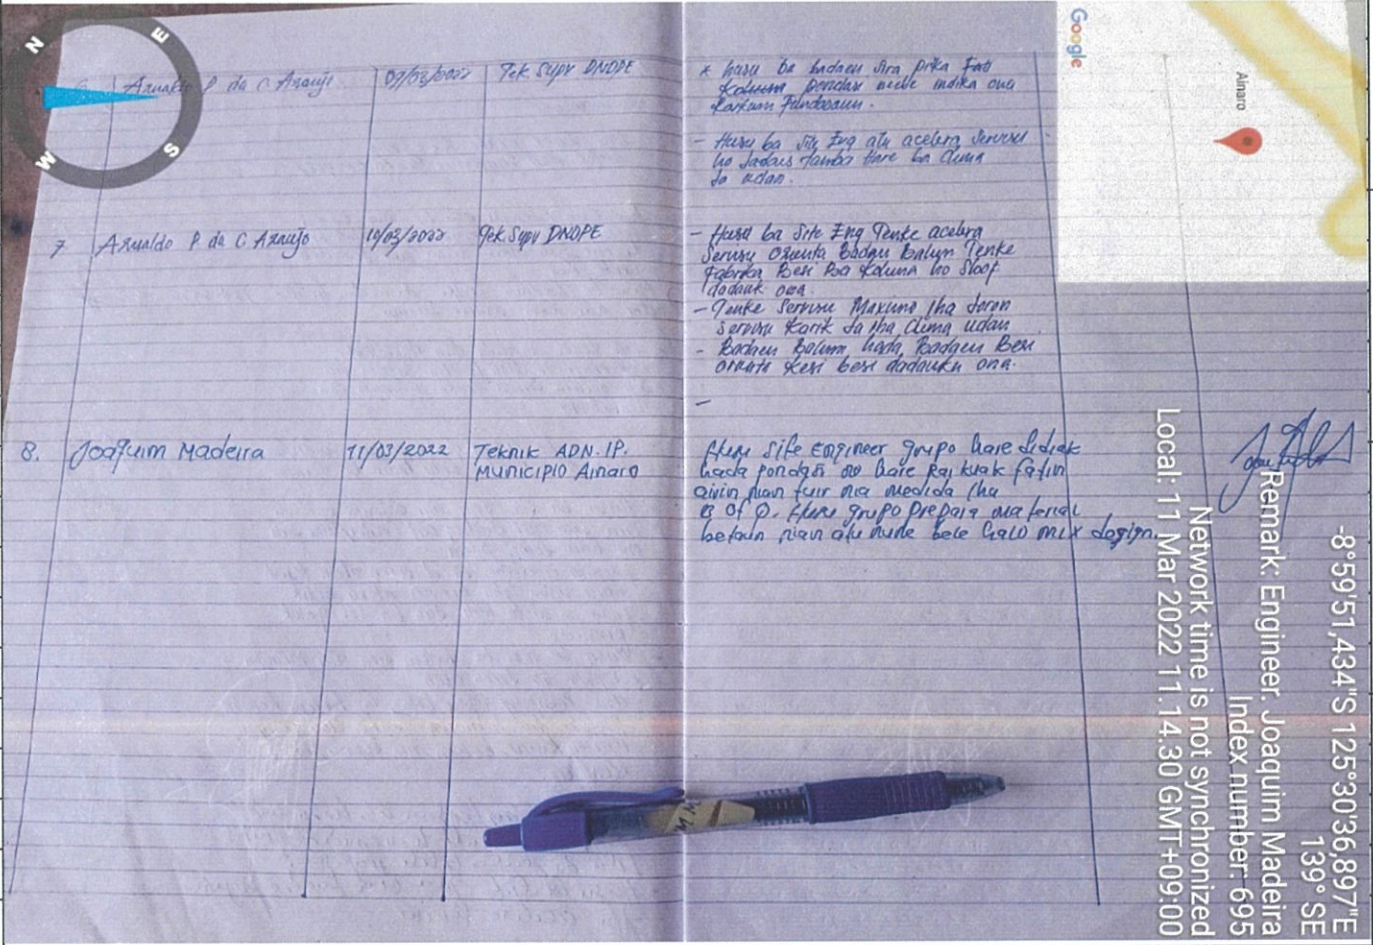 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Município de Ainaro (ESG. FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO AINARO)		
					Kompanha : Grupo Komunitari		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	3/11/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu site engineering grupo hare didiak hada pondasi hare rai kuak fatin airin nian tuir nia medida iha b of q, husu grupo prepara material atu une bele halo mix design.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	3/16/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III	3/25/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-25)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro
Numero Contrato : 29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021

Data Inspesaun : 28-03-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :S, Latetude: "E.

End Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Projeito refere hada fondasi
no fui mos airin. Foot Plate

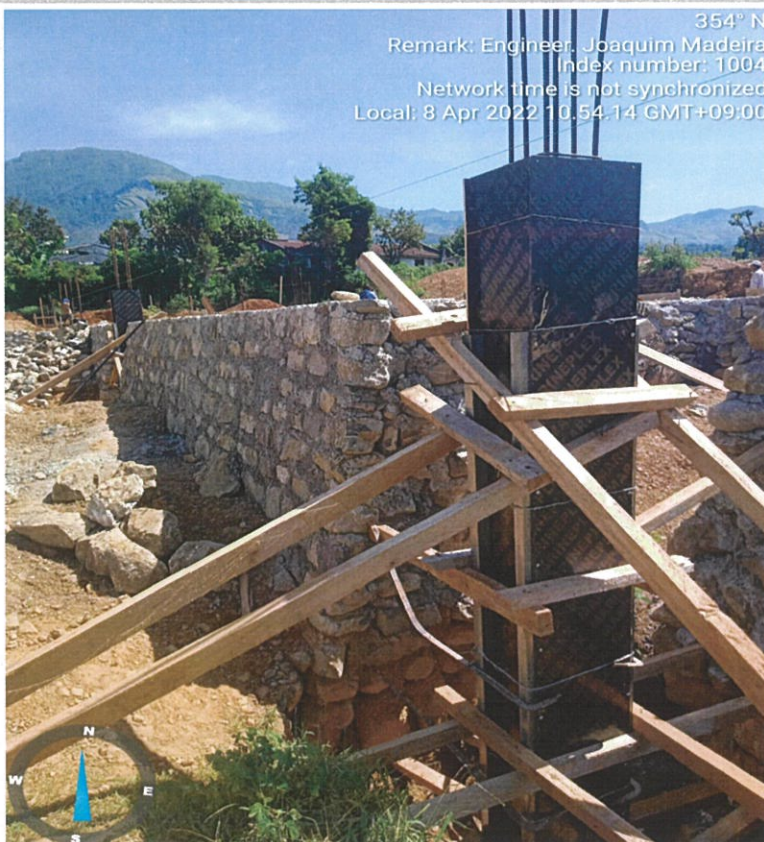



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-25)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro
Numero Contrato : 29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere hada fondasi
no fui mos airin. Foot Plate

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-25)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro
Numero Contrato : 29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere hada fondasi
no fui mos airin. Foot Plate






SUMMARY OF PROGRESS WORK

Project Name : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro
Contract No. : RDTL/29/MSSI/DGAF/X/2021
Location : Ainaro Vila, Ainaro Municipality, Timor-Leste
Date : 8 April 2022

NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	ACCOMPLISH TO DATE (%)
A	OFFICE BUILDING		
1	PREPARATION WORKS	\$ 14,915.67	1.97%
2	EARTH WORKS	\$ 13,584.96	0.53%
3	MASONRY WORKS	\$ 56,144.28	3.47%
4	CONCRETE WORKS	\$ 50,863.89	2.62%
5	ROOFING WORKS	\$ 32,805.38	0.00%
6	CEILING WORKS	\$ 21,285.46	0.00%
7	CARPENTRY WORKS	\$ 22,850.00	0.00%
8	ELECTRICAL WORKS	\$ 13,270.00	0.00%
9	SANITATION WORKS	\$ 12,382.50	0.00%
10	PAINTING WORKS	\$ 8,205.65	0.00%
B	WAREHOUSE		
1	EARTH WORKS	\$ 5,311.77	0.26%
2	MASONRY WORKS	\$ 14,333.87	1.04%
3	CONCRETE WORKS	\$ 34,136.60	2.00%
4	ROOFING WORKS	\$ 23,008.23	0.00%
5	CARPENTRY WORKS	\$ 6,008.18	0.00%
6	ELECTRICAL WORKS	\$ 2,635.00	0.00%
7	PAINTING WORKS	\$ 2,760.19	0.00%
C	LANDSCAPING WORKS		
1	PARK AND OFFICE PLATFORM WORKS	\$ 69,230.90	0.00%
2	PARK ELECTRICAL WORKS	\$ 4,070.00	0.00%
3	FENCE WORKS	\$ 52,405.65	0.00%
4	SECURITY POST	\$ 14,018.31	0.00%
I	COST CONSTRUCTION	\$ 474,226.49	11.88%
II	CONTRACTOR FEE & OVERHEAD 10% x I	\$ 47,422.65	
III	OVERHEAD	\$ 5,000.00	
IV	TAX 2% x (I+II+III)	\$ 10,532.98	
V	CONTINGENCY 2% x I	\$ 9,484.53	
A	CONTRACT PRICE	\$ 546,666.66	

Inspesau Husi :


(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.


Verifika Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.

#ANEXU D (ANV-25)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
Naran projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM- Ainaro											
Kompanha : Atramor Unipessoal Lda											
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			Asinatura		
I	3/8/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Tecnico	1	Husu site engineer kontrola masimu servisu e monta airin ho didiak no stell kaixa rapido atu nune fui betaun airin nian labelle kleuk.					
					2						
					3						
					4						
					5						
II	3/16/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Tecnico	1						
					2						
					3						
					4						
					5						
III	3/28/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Tecnico	1						
					2						
					3						
					4						
					5						
IV					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
V					1						
					2						
					3						
					4						
					5						



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU # HA-7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de
Hatu-Udo Município de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Data Inspesaun : 22-03-2022

Fatin Inspesaun :Hato-udo Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :S, Latetude:E.

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere pondasi hada
hotu ona, e gora preparasaun
material ba tes iha
labortoriun atu kontinuasaun
fui Sinta ho airin.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU # HA-7

Back-up Data


Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeto refere pondasi hada hotu ona, e gora preparasaun material ba tes iha labortoriun atu kontinuasaun fui Sinta ho airin.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

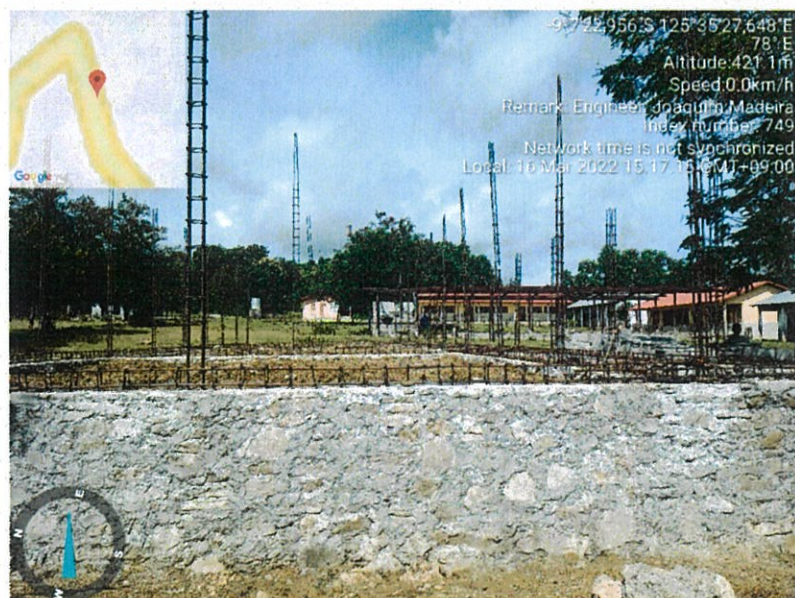

ANEXU # HA-7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere pondasi hada
hotu ona, e gora preparasaun
material ba tes iha
labortoriun atu kontinuasaun
fui Sinta ho airin.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO CENTRAL HATO UDO VILA
LOCATION : EBC HATU UDO VILLA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	THIS MONTH	
				AMOUNT	PERCEN%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,079.26	\$ 1,804.26	2.64%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 51,384.19	\$ 10,625.90	15.54%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 4,553.36	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 59,016.81	\$ 12,430.16	18.18%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,310.00	1.92%
GRAND TOTAL			US\$ 68,356.81	\$ 13,740.16	20.10%

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)

Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hato-Udo Município de Ainaro (EBC, HATO-UDO VILA)

Companha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	3/8/2022	Hato-udo / Ainaro	Joaquim Madeira	Tecnico	1	 Husu grupu prepara material atu nune bele acelera fui sinta no airin atu nune bele preparasaun ba hada bloku.
					2	
					3	
					4	
					5	
II					1	 Kesi besi airin no sinta tenki tuir nia dimensi no hare tuir desenho nebe maka iha.
					2	
					3	
					4	
					5	
III	3/16/2022	Hato-udo / Ainaro	Joaquim Madeira	Tecnico	1	 -9°7'23.79"S 125°35'28.03"E Altitude: 421.6m Speed: 0.0km/h Remark: Engineer Joaquim Madeira Index number: 735 Network time is not synchronized Local: 16 Mar 2022 15:26:19 GMT+509:00
					2	
					3	
					4	
					5	
IV					1	 -9°7'23.79"S 125°35'28.03"E Altitude: 421.6m Speed: 0.0km/h Remark: Engineer Joaquim Madeira Index number: 735 Network time is not synchronized Local: 16 Mar 2022 15:26:19 GMT+509:00
					2	
					3	
					4	
					5	
V	3/22/2022	Hato-udo / Ainaro	Joaquim Madeira	Tecnico	1	 -9°7'23.79"S 125°35'28.03"E Altitude: 421.6m Speed: 0.0km/h Remark: Engineer Joaquim Madeira Index number: 735 Network time is not synchronized Local: 16 Mar 2022 15:26:19 GMT+509:00
					2	
					3	
					4	
					5	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HA 8#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto
Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Data Inspesaun : 22-03-2022

Fatin Inspesaun :Hut-seo / Hato-udo - vila

Koordinadas :

Start Point : Long :, Latetude:

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere pondasi hotu ona e agora preparasaun material betaun nian atu nune hodi kontinuasaun fui sinta ho airin.	Sketch & Foto Desenho

ANEXU# HA 8#

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto
Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Sketch Item servisu

Projeito refere pondasi hotu ona e agora
preparasaun material betaun nian atu
nune hodi kontinuasaun fui sinta ho airin.

AIRIN.



ANEXU# HA 8#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto
Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Projeito refere pondasi hotu ona e agora
preparasaun material betaun nian atu
nune hodi kontinuasaun fui sinta ho airin.





PROJECT NAME
HUTSEO

: NOVA CONSTRUCAO PROTOTIPO CA + TB, EBF

MAIN SUMMARY

NO	ITEM DESCRIPTION	PAGE NO	AMOUNT	THIS MONTH	
				AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 2,982.93	\$ 1,632.93	1.48%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	CA/39	\$ 63,158.05	\$ 13,357.37	12.07%
III	BUILDING Tb	TB/39	\$ 25,465.79		
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORK		\$ 9,748.62		
A	Total Construction Cost		\$ 101,355.39	\$ 14,990.30	13.54%
B	Overhead		\$ 6,340.00	\$ 2,210.00	2.00%
C	Contingency		\$ 3,000.00	\$ -	0.00%
D	Grand Total		\$ 110,695.39	\$ 17,200.30	15.54%

Inspesaun Husi :

Verifika Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio
Ainaro
ADN, I.P.

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)

Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hato-Udo Municipio de Ainaro(EBR. HUT-SEO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	3/8/2022	Hut-seo/Hato-udo Vila	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu grupu prepara material atu nune bele tes sampil ou lori ba laboratorium hodi teste lais atu nune bele asselera servisu hada balaku nian.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III	3/16/2022	Hut-seo/Hato-udo Vila	Joaquim Madeira	Teknico	1	Pondasi hada tipe tuir nia dimensi e klaru liu hare tuir medida nebe lha desenh.	
					2	Raihenek finera molok cor airin ho sinta.	
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V	3/22/2022	Hut-seo/Hato-udo Vila	Joaquim Madeira	Teknico	1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190104

Data Inspesaun : 07/03/2022

Fatin Inspesaun : Maubisse - Liurai

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'15,906''S Latetude: 125°35'56,839''E


End Point : Long : -8°51'9,714''S Latetude: 125°35'2,79''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado tamba situasaun
iklima (udan) halo compahia parado hela
servisu iha tereno

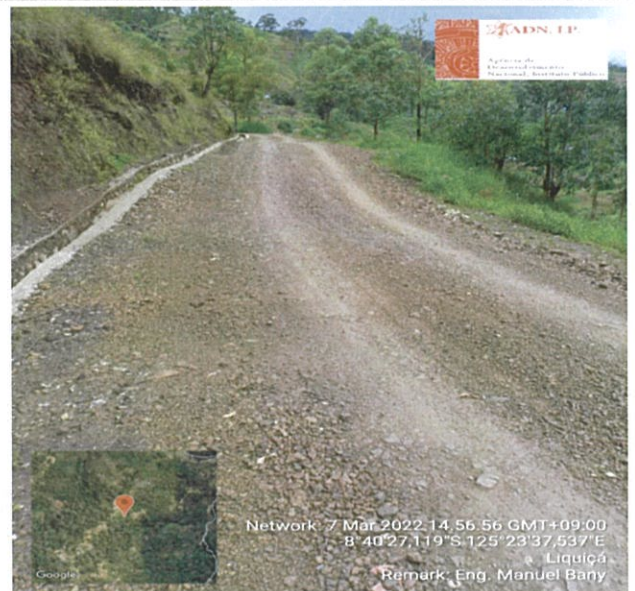



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190104

Projetu refere sei parado tamba situasaun
iklima (udan) halo compahia parado hela
servisu iha tereno



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado tamba situasaun
iklima (udan) halo compahia parado hela
servisu iha tereno





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (HTB-1)

Roads Name : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse-Liurai Sta 0+000-10+200
Lokasi : Liurai to Hatubolico
Contractor : GOS Unip. Lda

Pay item No.	CONTRACT ORIGINAL			SUMMARY					
	DESCRIPTION	Amount	Present	Previous		This Bill		Up To Date Bill	
				Amount	Present	Amount	Present	Amount	Present
R-01	General	\$ 975.00	0.60%	\$ 875.00	0.54%	\$ -	0.00%	\$ 875.00	0.54%
R-02	Drainage	\$ 1,388.20	0.86%	\$ 1,388.20	0.86%	\$ -	0.00%	\$ 1,388.20	0.86%
R-03	Earth work	\$ 15,077.16	9.33%	\$ 7,485.19	4.63%	\$ 7,591.97	4.70%	\$ 15,077.16	9.33%
R-05	Granular sub- base and base	\$ 10,077.22	6.24%	\$ -	0.00%	\$ 10,077.22	6.24%	\$ 10,077.22	6.24%
R-08	Structure	\$ 83,354.50	51.60%	\$ 54,224.74	33.56%	\$ 29,129.76	18.03%	\$ 83,354.50	51.60%
R-10	Dayworks	\$ 27.50	0.02%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 17,743.40	10.98%	\$ 8,171.00	5.06%	\$ 9,572.40	5.93%	\$ 17,743.40	10.98%
R-13	General Expenses	\$ 3,345.75	2.07%	\$ 2,358.00	1.46%	\$ -	0.00%	\$ 2,358.00	1.46%
R-15	Provisional sum	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Total - net cost in USD		\$ 131,988.73	81.70%	\$ 74,502.13	46.12%	\$ 56,371.35	42.71%	\$ 130,873.48	81.01%
B	Profit (Net costx %); 10%	\$ 13,198.87	8.17%	\$ 7,450.21	4.61%	\$ 5,637.14	42.71%	\$ 13,087.35	8.10%
C	Overheads (supervision and risk) net cost x % ; 10%	\$ 13,198.87	8.17%	\$ 7,450.21	4.61%	\$ 5,748.66	0.00%	\$ 13,087.35	8.10%
D	Tax ((net cost + profit+ Over head) x 2 %)	\$ 3,167.73	1.96%	\$ 1,788.05	1.11%	\$ 67,757.14	2138.98%	\$ 3,140.96	1.94%
Total-Gross Cost		\$ 161,554.19	100.00%	\$ 91,190.61	56.45%	\$ 67,757.14	41.94%	\$ 160,189.14	99.16%

Inspesaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)

Eng. ba Projeitu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Joao Paulo Amaral)

Eng. Senior ba Projeitu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Data Inspesaun : 07/03/2022

Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'9,42''S Latetude: 125°32'14,91''E

End Point : Long : -8°52'43,776''S Latetude: 125°31'56,1''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu sei parado tamba sei kordena ho owner
ba servisu iha tereno





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda


Laiha aktividades servisu iha tereno



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Laiha aktividades servisu iha tereno

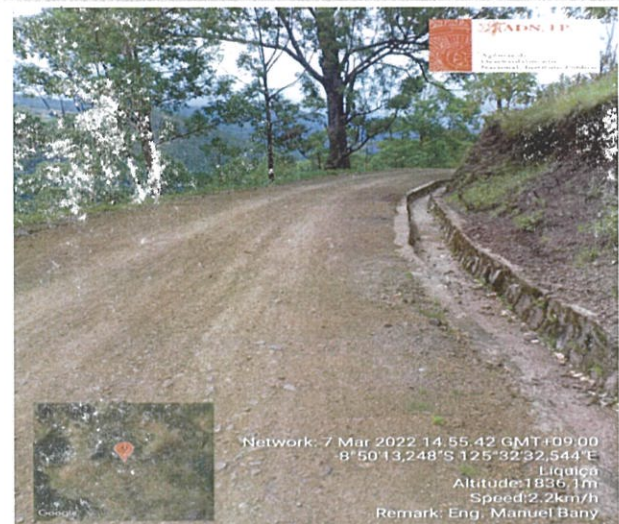



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (HTB-3)

Roads Name : Rural Roads Periodik Maintenance Dare-Mau Chiga Star 0+000-5+600
Lokasi : Liurai to Hatubolico
Contractor : BETUA CADA Unip. Lda

Pay item No.	ORIGINAL CONTRACT			SUMMARY					
	DESCRIPTION	Amount	Percent	PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE BILL	
				Amount	%	Amount	%	Amount	%
R-01	General	\$ 5,576.60	2.86%	\$ 545.00	0.28%	\$ -	0.00%	\$ 545.00	0.28%
R-02	Drainage	\$ 1,389.40	0.71%	\$ 1,389.40	0.71%	\$ -	0.00%	\$ 1,389.40	0.71%
R-03	Earth work	\$ 44,738.36	22.93%	\$ 29,310.63	15.02%	\$ -	0.00%	\$ 29,310.63	15.02%
P-05	Granular sub- base and base	\$ 3,922.87	2.01%	\$ 3,922.87	2.01%	\$ -	0.00%	\$ 3,922.87	2.01%
R-08	Structure	\$ 90,062.18	46.15%	\$ 88,221.21	45.21%	\$ -	0.00%	\$ 88,221.21	45.21%
P-10	Dayworks	\$ 55.00	0.03%	\$ 55.00	0.03%	\$ -	0.00%	\$ 55.00	0.03%
R-11	Routine maintenance	\$ 10,111.95	5.18%	\$ 1,138.00	0.58%	\$ -	0.00%	\$ 1,138.00	0.58%
R-13	General Expenses	\$ 3,397.50	1.74%	\$ 9,899.13	5.07%	\$ -	0.00%	\$ 9,899.13	5.07%
R-15	Provisional sum	\$ 182.99	0.09%	\$ 182.99	0.09%	\$ -	0.00%	\$ 182.99	0.09%
Total - net cost in USD		\$ 159,436.85	81.70%	\$ 134,664.23	69.01%	\$ -	0.00%	\$ 134,664.23	69.01%
A	Profit (Net costx %); 10%	\$ 15,943.68	8.17%	\$ 13,466.42	6.90%	\$ -	0.00%	\$ 13,466.42	6.90%
B	Overheads (supervision and risk) net cost x % ; 10%	\$ 15,943.68	8.17%	\$ 13,466.42	6.90%	\$ -	0.00%	\$ 13,466.42	6.90%
C	Tax ((net cost + profit+ Over head) x 2 %)	\$ 3,826.48	1.96%	\$ 3,231.94	1.66%	\$ -	0.00%	\$ 3,231.94	1.66%
Total-Gross Cost		\$ 195,150.70	100.00%	\$ 164,829.02	84.46%	\$ -	0.00%	\$ 164,829.02	84.46%

Inspesaun Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projeitu Infraestrutur e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projeitu Infraestrutur e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
ordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190091

Data Inspesaun : 07/03/2022

Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°49'55,188''S Latetude: 125°32'30,108''E

End Point : Long : -8°51'9,42''S Latetude: 125°32'14,91''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halao hela servisu ateru Gravel
iha tereno





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190091


Companhia halao hela servisu ateru Gravel
iha tereno



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halao hela servisu Plum
Concrete

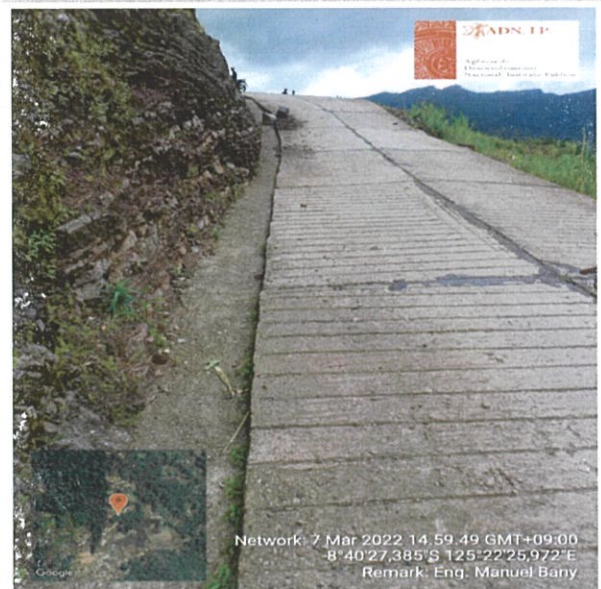



#ANEXU C2 (HTB-4)

Roads Name : Rural Roads Periodik Maintenance Dare-Mau Chiga Star 0+000-3+000
Lokasi : Liurai - Hatubolico
Contractor : AILESU Unip. Lda

Pay item No.	ORIGINAL CONTRACT			SUMMARY					
	DESCRIPTION	Amount	Persent	PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE BILL	
				Amount	Persent	Amount	Persent	Amount	Persent
R-01	General	\$ 6,928.60	11.48%	\$ 625.00	1.04%	\$ 300.00	0.50%	\$ 925.00	1.53%
R-03	Earth work	\$ 737.16	1.22%	\$ 571.34	0.95%	\$ (126.53)	-0.21%	\$ 444.80	0.74%
R-05	Granular sub- base and base	\$ 8,574.82	14.21%	\$ -	0.00%	\$ 16,982.77	28.15%	\$ 16,982.77	28.15%
R-08	Structure	\$ 21,214.04	35.16%	\$ 17,454.41	28.93%	\$ 1,793.76	2.97%	\$ 19,248.17	31.90%
R-10	Dayworks	\$ 27.50	0.05%	\$ -	0.00%	\$ 27.50	0.05%	\$ 27.50	0.05%
R-11	Routine maintenance	\$ 7,638.00	12.66%	\$ 3,488.75	5.78%	\$ 2,199.25	3.65%	\$ 5,688.00	9.43%
R-13	General Expenses	\$ 2,574.00	4.27%	\$ 2,174.00	3.60%	\$ 270.00	0.45%	\$ 2,444.00	4.05%
R-15	Provisional sum	\$ 1,600.00	2.65%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Total - net cost in USD	\$ 49,294.11	81.70%	\$ 24,313.50	40.30%	\$ 21,446.74	35.55%	\$ 45,760.24	75.84%
B	Profit (Net costx %); 10%	\$ 4,929.41	8.17%	\$ 2,431.35	4.03%	\$ 2,144.67	3.55%	\$ 4,576.02	7.58%
C	Overheads (supervision and risk) net cost x % ; 10%	\$ 4,929.41	8.17%	\$ 2,431.35	4.03%	\$ 2,144.67	3.55%	\$ 4,576.02	7.58%
D	Tax ((net cost + profit+ Over head) x 2 %)	\$ 1,183.06	1.96%	\$ 583.52	0.97%	\$ 514.72	1.73%	\$ 1,098.25	1.82%
Total-Gross Cost		\$ 60,335.99	100.00%	\$ 29,759.72	49.32%	\$ 26,250.81	44.38%	\$ 56,010.53	92.83%

Inspesaun Husi :

(Eng. Manuel Bani da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projeitu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projeitu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa
Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Data Inspesaun : 29/03/2022

Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'27,798''S Latetude: 125°31'54,408''E

End Point : Long : -8°54'43,776''S Latetude: 125°31'56,1''E


Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halao hela servisu plum

Concrete iha tereno

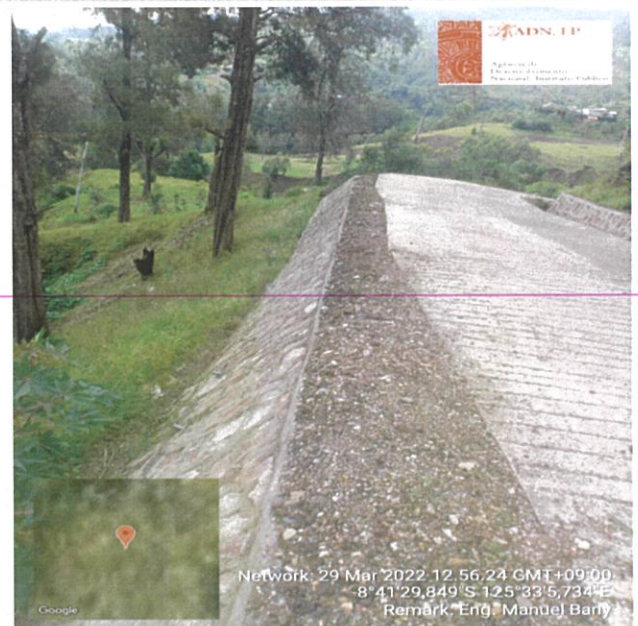

Kondisaun Estrada Suco Liurai - Fatubolico



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa
Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Companhia halao hela servisu iha
tereno



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halao hela servisu iha
tereno





#ANEXU C2 (HTB-5)

Roads Name : SPOT IMPROVEMENT LIURAI - HATUBULICO STAR 0+000 - 5+600 LIURAI - FATUBOSSA STAR 0+000 - 3+100
AINARO MUNICIPALITY

Lokasi : Suco Liurai
Contractor : Betua Calda Unip. Lda

Pay item No.	CONTRACT			SUMMARY					
	DESCRIPTION	AMOUNT	PRESENT (%)	PREVIOUS		THIS BILL		UP DATE TO BILL	
				Amount	Present	Amount	Present	Amount	Present
R-01	General	\$ 1,640.00	2.14%			\$ 1,145.00	1.50%	\$ 1,145.00	1.50%
R-02	Drainage	\$ 1,394.85	1.82%			\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-03	Earth work	\$ 4,203.95	5.49%			\$ 3,035.08	3.96%	\$ 3,035.08	3.96%
R-05	Granular sub- base and base	\$ 7,326.63	9.57%			\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structure	\$ 28,116.06	36.73%			\$ 20,914.95	27.32%	\$ 20,914.95	27.32%
R-10	Dayworks	\$ 105.00	0.14%			\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 13,117.10	17.13%			\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 225.00	0.29%			\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
G-02	Project Team	\$ 6,210.00	8.11%			\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
G-03	Safety and Protection	\$ 2,297.50	3.00%			\$ -	0.00%		0.00%
R-15	Ceremonial Costs	\$ 475.00	0.62%			\$ 250.00	0.33%	\$ 250.00	0.33%
R-15	Mineral fees	\$ 4,329.67	5.66%			\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)	\$ 56,128.59	73.32%			\$ 25,095.03	32.78%	\$ 25,095.03	32.78%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 5,612.86	7.33%			\$ 2,509.50	3.28%	\$ 2,509.50	3.28%
D	General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 13,312.17	17.39%			\$ 250.00	0.33%	\$ 250.00	0.33%
E	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 1,501.07	1.96%			\$ 557.09	0.73%	\$ 557.09	0.73%
F	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 76,554.69	100.00%			\$ 28,411.63	37.11%	\$ 28,411.63	37.11%

Inspesaun Husi :


(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :


(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



#ANEXU C1 (HTB-9)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423

Data Inspesaun : 23/3/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro – Mausiga

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,55.51.01, Latetude: 125.36.21.45

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Laiha Aktividade Iha Tereno





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (HTB-9)


Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

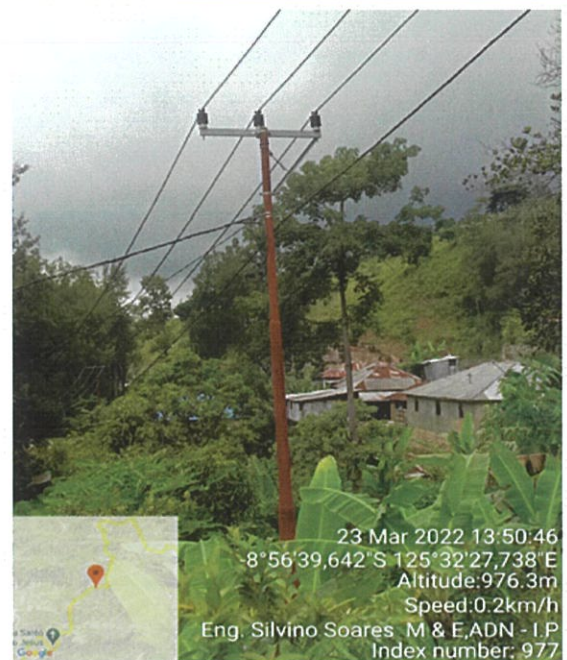



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



EADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (HTB-9)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Data Inspesaun : 11-03-2022

Fatin Inspesaun : Tukaro, Hatu builiko

Koordinadas :

Start Point : Long :, Latetude:

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere kee pondasi hotu ona e hein deit atu kontinuasaun hada fatuk fondasi nian, raikuak nebe kee tuir dimensi nebe mak iha desenho ho b of q.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch & Foto Desenho





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Município de Ainaro (TUKARRO)

Projeito refere kee pondasi hotu ona e
hein deit atu kontinuasaun hada fatuk
fondasi nian, raikuak nebe kee tuir
dimensi nebe mak iha desenho ho b of q.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Projeito refere kee pondasi hotu ona e
hein deit atu kontinuasaun hada fatuk
fondasi nian, raikuak nebe kee tuir
dimensi nebe mak iha desenho ho b of q.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA FILIAL TUCARO
LOCATION : HATUBUILICO, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	THIS MONTH	
				AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,329.26	\$ 1,479.26	2.18%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 50,948.05	\$ 12,039.93	17.76%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 4,183.95		
CONSTRUCTION COST			US\$ 58,461.26	\$ 13,519.19	19.94%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00		
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,110.00	1.64%
GRAND TOTAL			US\$ 67,801.26	\$ 14,629.19	21.58%

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D. D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Município de Ainaro (TUKARRO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	11/03/2022	Hato builico/A INARO	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu grupo asselera servisu hada pondasi atu nune bele hare fati servisu seluk, hadia diresket taka desenhio iha diresket no hari quadro projeto.
					2	
					3	
					4	
					5	
II	25/03/2022	to builico/A INARO	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu grupo asselera servisu hada pondasi atu nune bele hare fati servisu seluk, hadia diresket taka desenhio iha diresket no hari quadro projeto.
					2	
					3	
					4	
					5	
III					1	Husu grupo asselera servisu hada pondasi atu nune bele hare fati servisu seluk, hadia diresket taka desenhio iha diresket no hari quadro projeto.
					2	
					3	
					4	
					5	

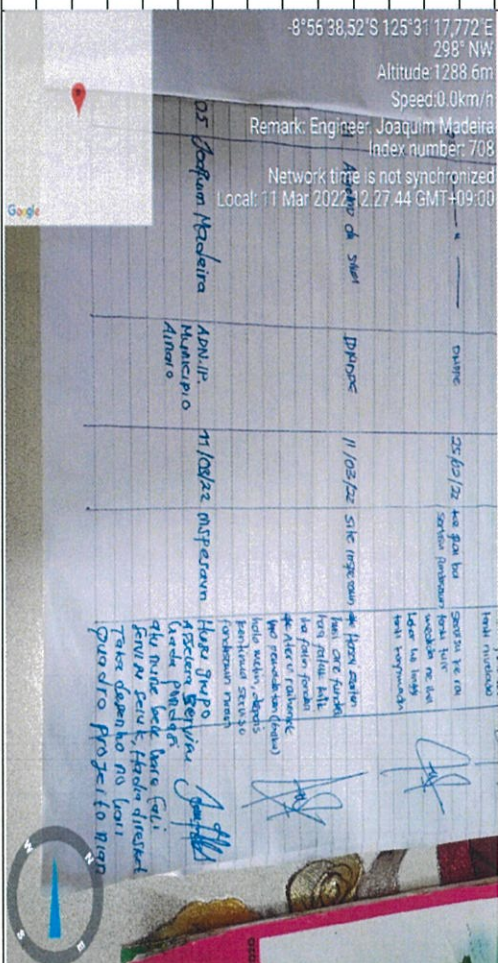



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto
Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Data Inspesaun : 10-03-2022

Fatin Inspesaun : Ernaro

Koordinadas :

Start Point : Long :, Latetude:

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere hada fondasi hotu
ona e hein deit preparasaun
material betaun nia ho
komposisaun para hodi fui airin
ho sinta.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto
Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Projeito refere hada fondasi hotu
ona e hein deit preparasaun
material betaun nia ho
komposisaun para hodi fui airin
ho sinta.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto
Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Instalasaun pvc haris fatin nian,
Nebe nivelado tuir dimensi no
medida iha b of q.





PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA ERNARO
LOCATION : SUCO NUN MOGE, POSTO ADMINISTRATIVO HATU BULICO, MUNICIPIO
AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	THIS MONTH	
				AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ -	\$ -	0
II	DEMOLITION	DM/3	US\$ 200.00	\$ 200.00	0.21%
III	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 50,798.26	\$ 11,476.86	12.20%
IV	TOILET BUILDING TB	CB/50	US\$ 25,500.85	\$ 5,466.63	5.81%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US\$ 11,235.41		
CONSTRUCTION COST			US\$ 87,734.51	17,143.49	18.22%
CONTIGENCY			US\$ -		
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,310.00	1.39%
GRAND TOTAL			US\$ 94,074.51	18,453.49	19.62%

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio
Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico
Município de Ainaro. (ERNARO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	10/03/2022	Hato builico/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu ba teknico grupo hare instala kanu ou pvc harris fatin nian nee ho nivelado.
					2	Hare lori material ba labororium atu nune bele teste lais atu kontinuasun fui sinta ho airn.
					3	
					4	
					5	
II	25/03/2022	Hato builico/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
III					1	
					2	
					3	
					4	
					5	

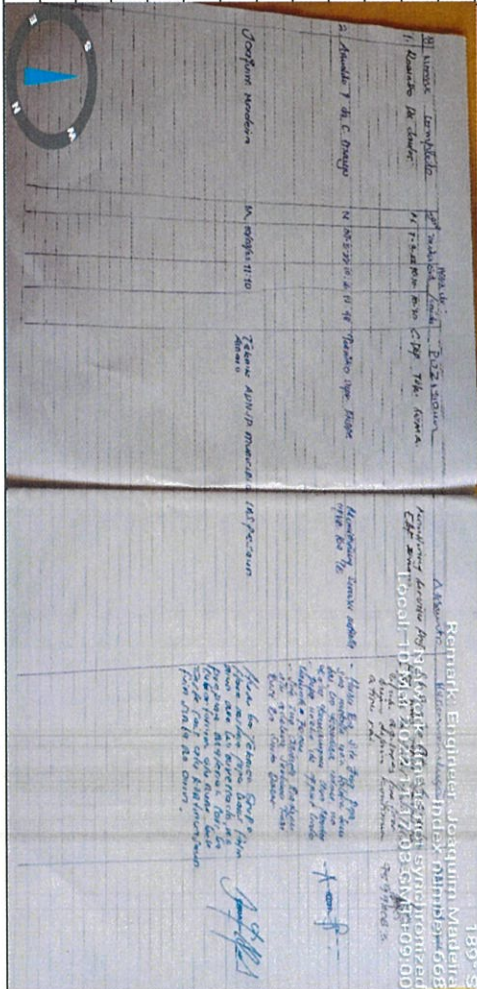



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Data Inspesaun : 11-03-2022

Fatin Inspesaun :Tatiris Lases

Koordinadas :

Start Point : Long :, Latetude:

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere fondasi hada hotu ona e agora hein deit preparasaun ba mix design para fui airin ho sinta.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto
Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Projeito refere fondasi hada
hotu ona e agora hein deit
preparasaun ba mix design
para fui airin ho sinta.



ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inclui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu
Projeito refere fondasi hada
hotu ona e agora hein deit
preparasaun ba mix design
para fui airin ho sinta.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual






PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO PROTOTIPO CA, EBF TATIRI
LASES
LOCATION : HATU BUILICO, MUNICIPIO AINARO

MAIN SUMMARY

NO	ITEM DESCRIPTION	PAGE NO	AMOUNT	THIS MONTH	
				AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 2,982.93	\$ 1,632.93	2.00%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	CA/39	\$ 62,623.84	\$ 13,237.60	16.24%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORK		\$ 6,560.68		
A	Total Construction Cost		\$ 72,167.44	\$ 14,870.53	18.24%
B	Overhead		\$ 6,340.00	\$ 1,310.00	1.61%
C	Contingency		\$ 3,000.00		
D	Grand Total		\$ 81,507.44	\$ 16,180.53	19.85%

Inspesaun Husi :



(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :



(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inclui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de
Hatuibuico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	11/03/2022	Hato builico/Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Hada fondasi tenki nivelado no hasai tiha rai dodok nebe monu baa laran e husu ba grupo prepara material atu nune bele halo mix design ba airin no sinta.
					2	Harce taka desenho iha didin lolon direksket nian.
					3	
					4	
					5	
II	25/03/2022	Hato builico/Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
III					1	
					2	
					3	
					4	
					5	

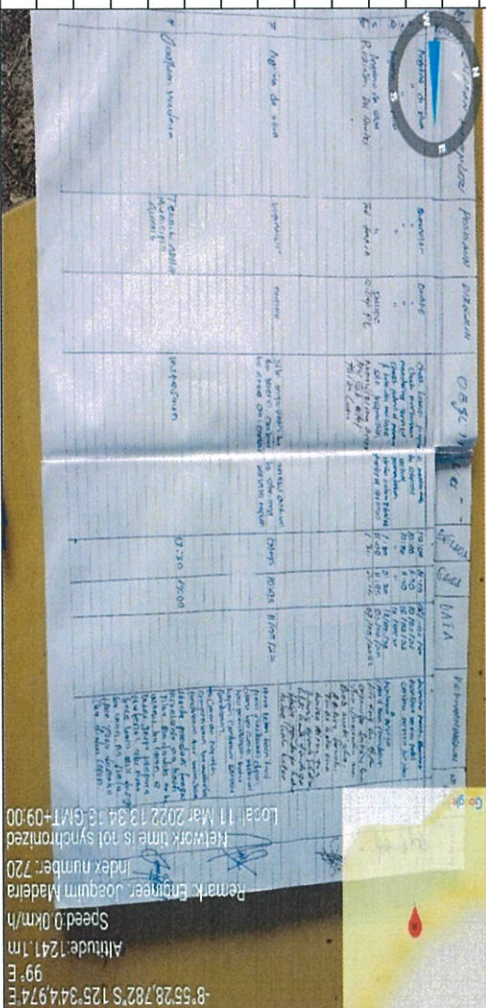

Altitude: 1241.1m
99° E
Speed: 0.0km/h
Index number: 720
Network time is not synchronized
Local: 11 Mar 2022 13:34:13 GMT+09:00
Remark: Engineer: Joaquim Madeira



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-1)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 -
6+400 Ainaro Municipality.
No. kontratu : RT/021/MOP-2019

Data Inspesaun : 14/03/2022

Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'4,044''S, Latetude: 125°35'48,432''E


End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado laiha actividades
servisu iha tereno

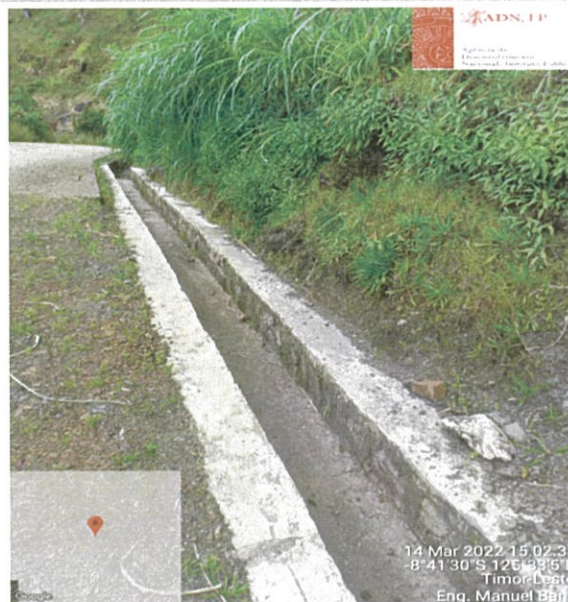



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-1)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 -
6+400 Ainaro Municipality.
No. kontratu : RT/021/MOP-2019

Projetu refere sei parado laiha aktividades
servisu iha tereno



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado laiha aktividades
servisu iha tereno





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MBS-1)

Roads Name : Rural Roads Periodik Maintenance Dare-Mau Chiga Star 0+000-5+000
Lokasi : Mausiga
Contractor : BEREMAUANAN Unip. Lda

Pay item No.	ORIGINAL CONTRACT			SUMMARY					
	DESCRIPTION	Amount	Persent	PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE BILL	
				Amount	Persent	Amount	Persent	Amount	Persent
R-01	General	\$ 4,975.00	2.11%	\$ 1,950.00	0.83%	\$ 4,825.00	2.04%	\$ 4,200.00	1.78%
R-03	Drainage	\$ 3,120.00	1.32%	\$ -	0.00%	\$ 1,560.00	0.66%	\$ -	0.00%
R-05	Earth work	\$ 35,162.65	14.89%	\$ 2,900.78	1.23%	\$ 14,837.14	6.28%	\$ 19,446.15	8.23%
R-08	Granular sub- base and base	\$ 11,790.52	4.99%	\$ -	0.00%	\$ 2,991.66	1.27%	\$ 5,798.82	2.45%
R-10	Structure	\$ 112,275.13	47.53%	\$ 26,736.35	11.32%	\$ 49,710.46	21.04%	\$ 119,348.49	50.52%
R-11	Dayworks	\$ 27.50	0.01%	\$ -	0.00%	\$ 27.50	0.01%	\$ -	0.00%
R-15	Routine maintenance	\$ 1,386.02	0.59%	\$ -	0.00%	\$ 1,386.02	0.59%	\$ -	0.00%
G-01	Provisional sum	\$ 2,000.00	0.85%	\$ -	0.00%	\$ 1,000.00	0.42%	\$ -	0.00%
G-03	Security	\$ 1,800.00	0.76%	\$ 600.00	0.25%	\$ 900.00	0.38%	\$ 1,800.00	0.76%
G-04	Project Team	\$ 24,240.00	10.26%	\$ 5,280.00	2.24%	\$ 7,935.00	3.36%	\$ 5,280.00	2.24%
G-05	Safety and protection	\$ 3,777.00	1.60%	\$ 2,458.00	1.04%	\$ 3,922.48	1.66%	\$ 3,667.00	1.55%
G-06	Ceremonial costs	\$ 200.00	0.08%	\$ 100.00	0.04%	\$ 199.00	0.08%	\$ 100.00	0.04%
G-07	Mineral fees	\$ 13,767.00	5.83%	\$ -	0.00%	\$ 4,990.83	2.11%	\$ -	0.00%
A	Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)	\$ 170,736.82	72.28%	\$ 31,587.13	13.37%	\$ 76,337.78	39.91%	\$ 148,793.46	67.58%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 17,073.68	7.23%	\$ 3,158.71	1.34%	\$ 7,633.78	3.23%	\$ 14,879.35	6.30%
C	General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 43,784.00	18.53%	\$ 8,438.00	3.57%	\$ 17,947.31	7.60%	\$ 10,847.00	4.59%
D	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 4,630.40	1.96%	\$ 863.68	0.37%	\$ 2,038.38	0.86%	\$ 3,490.40	1.48%
F	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 236,224.90	100.00%	\$ 44,047.53	18.65%	\$ 103,957.24	51.61%	\$ 178,010.20	79.95%

Inspesaun Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-2)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 -
6+400 Ainaro Municipality.
No. kontratu : RT/021/MOP-2019

Data Inspesaun : 07/03/2022

Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'4,044''S, Latetude: 125°35'48,432''E


End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado

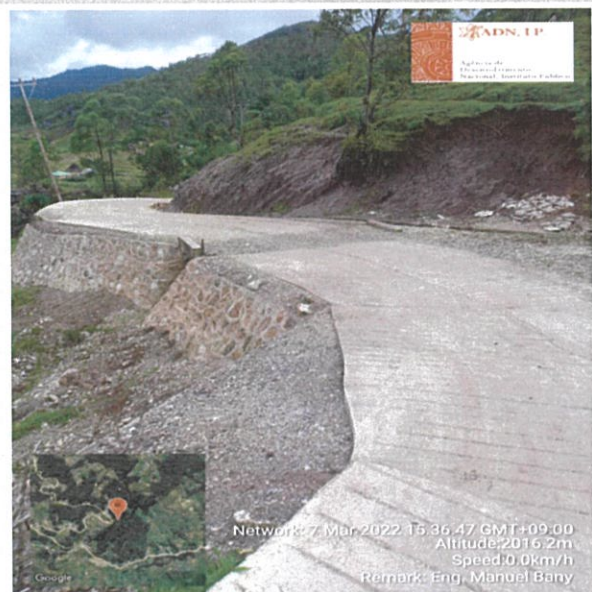



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-2)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 -
6+400 Ainaro Municipality.
No. kontratu : RT/021/MOP-2019

Projetu refere sei parado

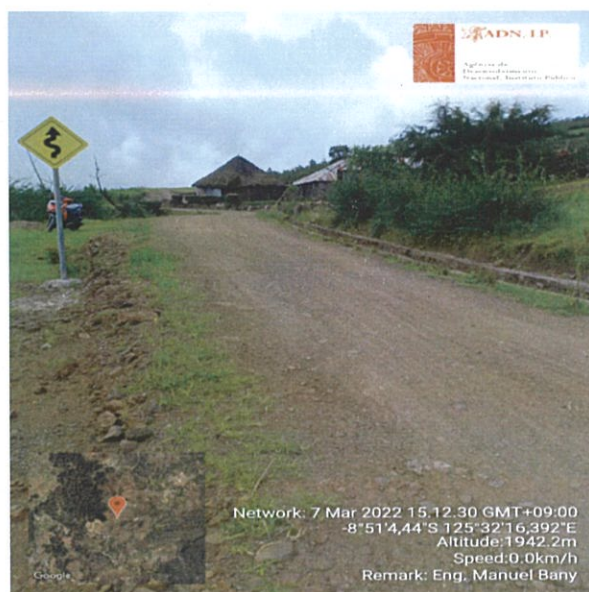

Sketch & Foto Desenho

Saluran Tipe 2

Projetu refere sei parado





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MBS-2)

Roads Name : Rural Roads Periodik Maintenance Dare-Mau Chiga Star 0+000-5+000
Lokasi : Mausiga
Contractor : HABURAS SARAI Unip. Lda

Pay item No.	CONTRACT			SUMMARY					
	DESCRIPTION			PREVIOUS		THIS BILL		UP DATE TO BILL	
				Amount	Present	Amount	Present	Amount	Present
R-01	General	\$ 3,275.00	1.61%	\$ 1,450.00	0.71%	\$ 818.75	0.40%	\$ 2,268.75	1.12%
R-03	Drainage	\$ 1,500.00	0.74%	\$ -	0.00%	\$ 666.67	0.33%	\$ 666.67	0.33%
R-05	Earth work	\$ 16,880.89	8.30%	\$ 8,671.37	4.27%	\$ 4,220.22	2.08%	\$ 12,891.59	6.34%
R-08	Granular sub- base and base	\$ 17,291.07	8.51%	\$ -	0.00%	\$ 4,322.77	2.13%	\$ 4,322.77	2.13%
R-10	Structure	\$ 103,931.51	51.12%	\$ 23,461.90	11.54%	\$ 59,255.14	29.15%	\$ 82,717.04	40.69%
R-11	Dayworks	\$ 45.00	0.02%	\$ -	0.00%	\$ 11.25	0.01%	\$ 11.25	0.01%
R-15	Routine maintenance	\$ 1,609.00	0.79%	\$ -	0.00%	\$ 402.25	0.20%	\$ 402.25	0.20%
G-01	Provisional sum	\$ 2,000.00	0.98%	\$ -	0.00%	\$ 500.00	0.25%	\$ 500.00	0.25%
G-03	Security	\$ 1,950.00	0.96%	\$ 650.00	0.32%	\$ 487.50	0.24%	\$ 1,137.50	0.56%
G-04	Project Team	\$ 19,500.00	9.59%	\$ 6,500.00	3.20%	\$ 4,875.00	2.40%	\$ 11,375.00	5.60%
G-05	Safety and protection	\$ 3,786.50	1.86%	\$ 2,481.50	1.22%	\$ 946.63	0.47%	\$ 3,428.13	1.69%
G-06	Ceremonial costs	\$ 200.00	0.10%	\$ 100.00	0.05%	\$ 50.00	0.02%	\$ 150.00	0.07%
G-07	Mineral fees	\$ 12,690.00	6.24%	\$ -	0.00%	\$ 3,172.50	1.56%	\$ 3,172.50	1.56%
A	Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)	\$ 146,532.50	72.08%	\$ 33,583.27	16.52%	\$ 70,197.04	34.53%	\$ 103,780.31	51.05%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 14,653.25	7.21%	\$ 3,358.33	1.65%	\$ 7,019.70	3.45%	\$ 10,378.03	5.10%
C	General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 38,126.50	18.75%	\$ 9,731.50	4.79%	\$ 9,531.63	4.69%	\$ 19,263.13	9.48%
D	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 3,986.25	1.96%	\$ 933.46	0.46%	\$ 1,734.97	0.85%	\$ 2,668.43	1.31%
F	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 203,298.50	100.00%	\$ 47,606.56	23.42%	\$ 88,483.34	43.52%	\$ 136,089.90	66.94%

Inspesaun Husi :


(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutur e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :


(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutur e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P



#ANEXU C1 (MBS-4)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto
Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323

Data Inspesaun : 23/3/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro - Maubisse

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,52.18.55, Latetude: 125,35.20.41

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Espaso Laiha Ona Hodi Kontinua Obra

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-4)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto
Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-4)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto
Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to
Lisuhati, Lihuntutu & Dauralala - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351

Data Inspesaun : 24/3/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro – Simpang Tiga Flexia

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,53.78, Latetude: 125,36.14.46

End Point : Long : -8,55.50.89, Latetude: 125,36.21.31

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Hela Retensaun 10% Maibe EDTL,I.P

Município Mak Sedauk Halo Karta Termo de
Entrega



24 Mar 2022 18:20:01
-8°55'50,952"S 125°36'21,6"E
Jalan Tanpa Nama
Ainaro
Altitude: 1460.5m
Speed: 0.2km/h
Eng. Silvino Soares M & E, ADN - I.P
Index number: 1031



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to
Lisuhati, Lihuntutu & Dauralala - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 (MBS-6)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi,
Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401

Data Inspesaun : 23/3/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro - Maubisse

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,49.48.14, Latetude: 125,37.59.44

End Point : Long : -8,50.53.88, Latetude: 125,39.66.84

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Aktividade Iha Tereno Laiha e Tenki Hadia
Konstruksaun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-6)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi,
Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



EADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-6)


Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi,
Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

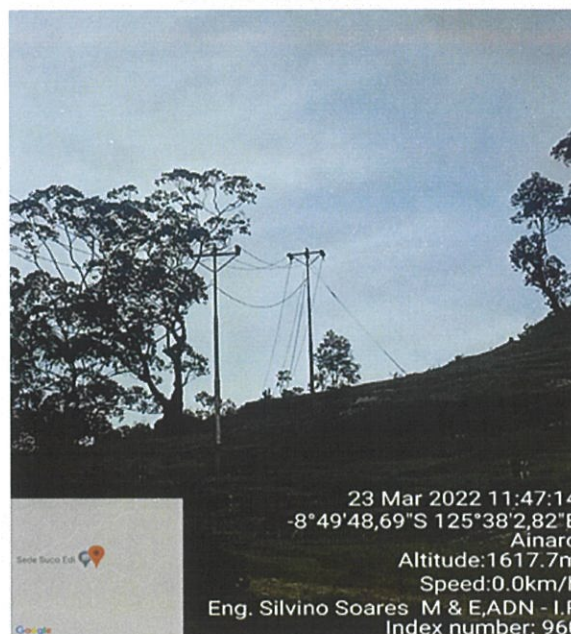



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



EADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-7)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality.

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318

Data Inspesaun : 23/3/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro - Feleixa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,53.30.19, Latetude: 125,35.46.92


End Point : Long : -8,55.56.04, Latetude: 125,33.35.92

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

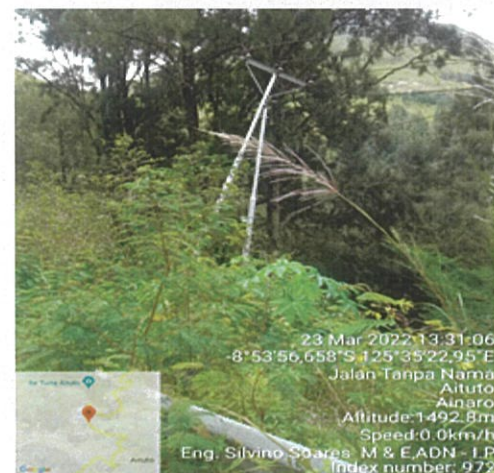



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-7)

Back-up Data


Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality.

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

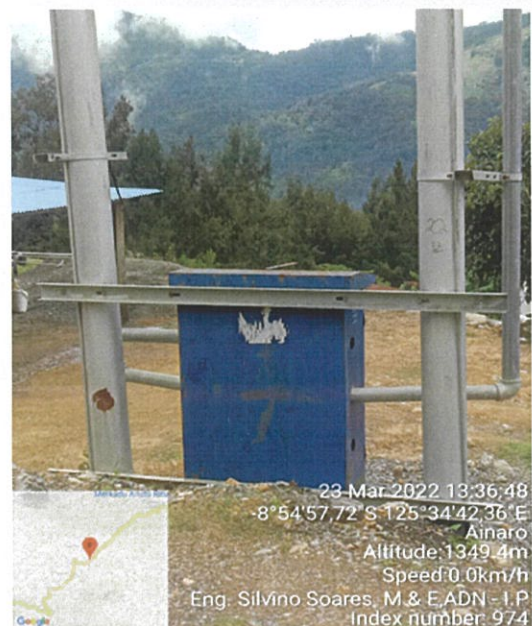



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



EADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-7)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to
Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RD TL/MO PTC-VMO PTC/CGI-PEN : 00000318

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-8)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000
Municipality Ainaro / 162.
No. kontratu : MPW-190076

Data Inspesaun : 07/03/2022

Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E


End Point : Long : - 8°56'34,906''S, Latetude: 125°32'46,032''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Projetu refere sei parado

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

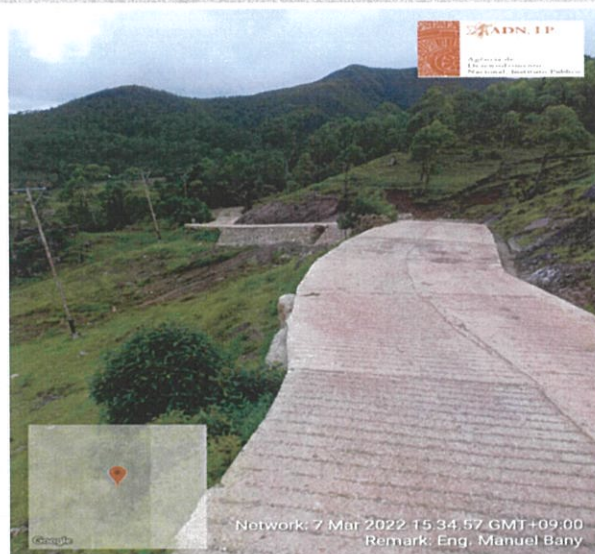



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-8)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000
Municipality Ainaro / 162.
No. kontratu : MPW-190076

Projetu refere sei parado

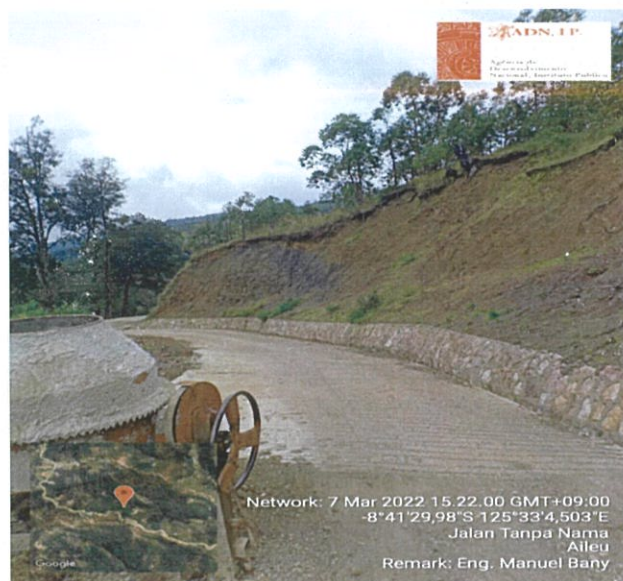

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 -
3+000 Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190087

Data Inspesaun : 09/03/2022

Fatin Inspesaun : Maubise - Urlepha

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°50'22,65''S, Latetude: 125°36'2,232''E

End Point : Long : - 8°50'13,632''S, Latetude: 125°36'43,416''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C.de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere hela retensaun 10%





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 -
3+000 Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190087

Projetu refere hela retensaun 10%

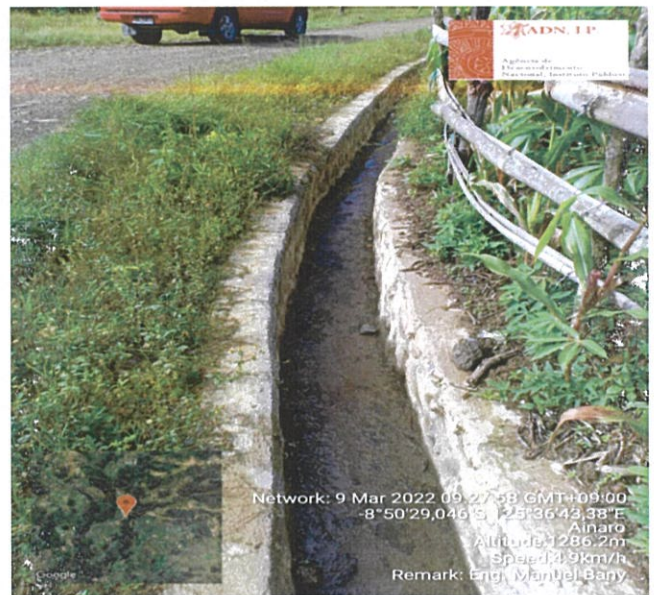

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere hela retensaun 10%





#ANEXU C2 (MBS-10)

Roads Name : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse-Urlepha Star 0+000-3+000
Lokasi : Maubisse Urlepha
Contractor : DELON Unip. Lda

Pay item No.	ORIGINAL CONTRACT			SUMMARY					
	DESCRIPTION	Amount	Persent	PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE BILL	
				Amount	Persent	Amount	Persent	Amount	Persent
R-01	General	\$ 2,500.00	0.83%	\$ 500.00	0.17%	\$ 2,000.00	0.66%	\$ 2,500.00	0.83%
R-02	Drainage	\$ 1,826.10	0.60%	\$ 1,414.34	0.47%	\$ 411.76	0.14%	\$ 1,826.10	0.60%
R-03	Earth work	\$ 21,377.99	7.08%	\$ 20,071.96	6.64%	\$ 1,306.03	0.43%	\$ 21,377.99	7.08%
R-05	Granular sub- base and base	\$ 48,139.04	15.93%	\$ 38,100.89	12.61%	\$ 10,038.15	3.32%	\$ 48,139.04	15.93%
R-8	Structure	\$ 164,176.46	54.34%	\$ 136,972.63	45.34%	\$ 27,203.83	9.00%	\$ 164,176.46	54.34%
R-10	Dayworks	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 4,541.72	1.50%	\$ 4,541.72	1.50%	\$ -	0.00%	\$ 4,541.72	1.50%
R-13	General Expenses	\$ 4,274.01	1.41%	\$ 140.00	0.05%	\$ 4,134.01	1.37%	\$ 4,274.01	1.41%
R-15	Provisional Sum	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction cost	\$ 246,835.31	81.70%	\$ 201,741.54	66.77%	\$ 45,093.78	14.93%	\$ 246,835.31	81.70%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 24,683.53	8.17%	\$ 20,174.15	6.68%	\$ 4,509.38	1.49%	\$ 24,683.53	8.17%
C	Over head (net cost x %);10%	\$ 24,683.53	8.17%	\$ 20,174.15	6.68%	\$ 4,509.38	1.49%	\$ 24,683.53	8.17%
D	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 5,924.05	1.96%	\$ 4,841.80	1.60%	\$ 1,082.25	0.36%	\$ 5,924.05	1.96%
F	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 302,126.40	100.00%	\$ 246,931.64	81.73%	\$ 55,194.78	18.27%	\$ 302,126.42	100.00%

Inspesaun Husi :


(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutur e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :


(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutur e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (MBS-12) Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB).

No. kontratu : 390/KDM-AINARO/VII/2019

Data Inspesaun : 22-03-2022

Fatin Inspesaun :

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.8109S, Latetude: 125.6587E

End Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito nee iha fase retensaun nia
laran.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

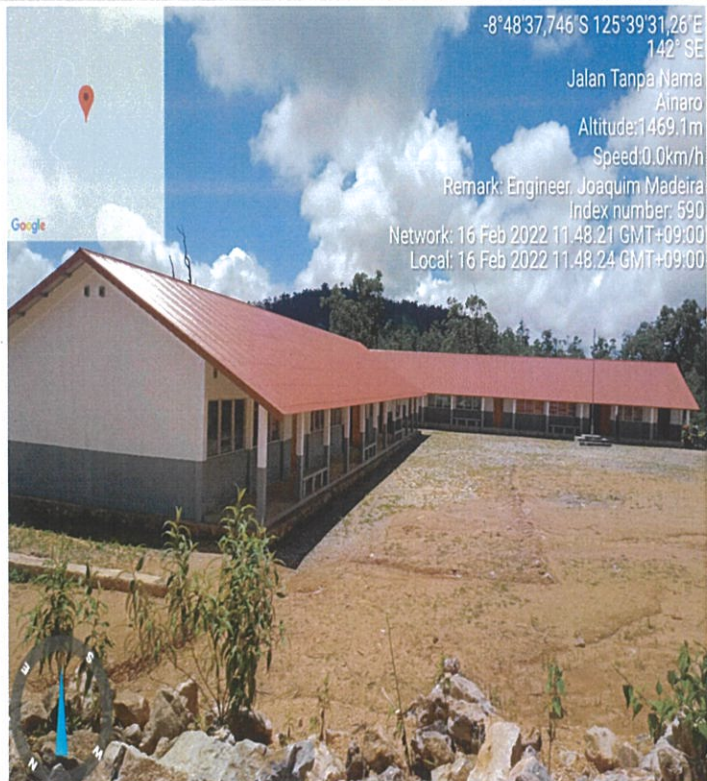



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (MBS-12) Back-up Data


Naran Projeto : Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA
+ CB).
No. kontratu : 390/KDM-AINARO/VII/2019

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Area oin nian

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

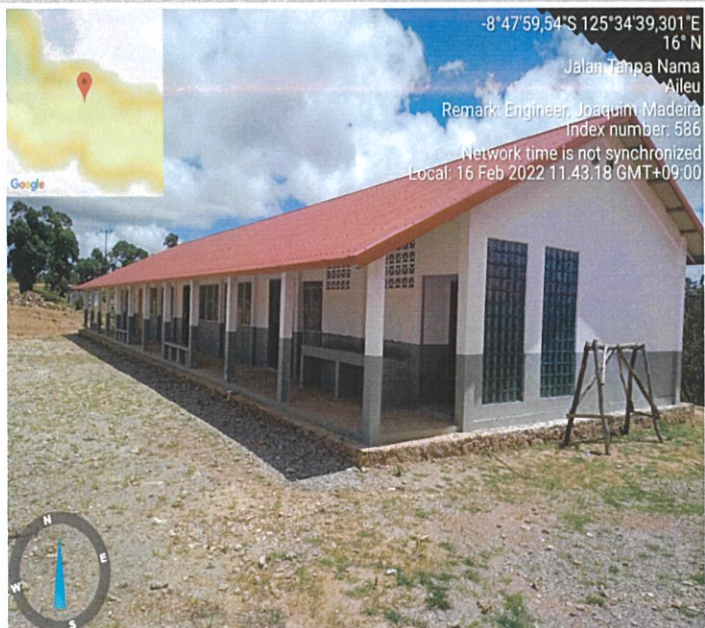



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (MBS-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB).

No. kontratu : 390/KDM-AINARO/VII/2019

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu

Monta toilet haris fatin nian nebe
tuur nia spek nebe determina iha b
of q.

Urinier ou Fatin mii nian

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

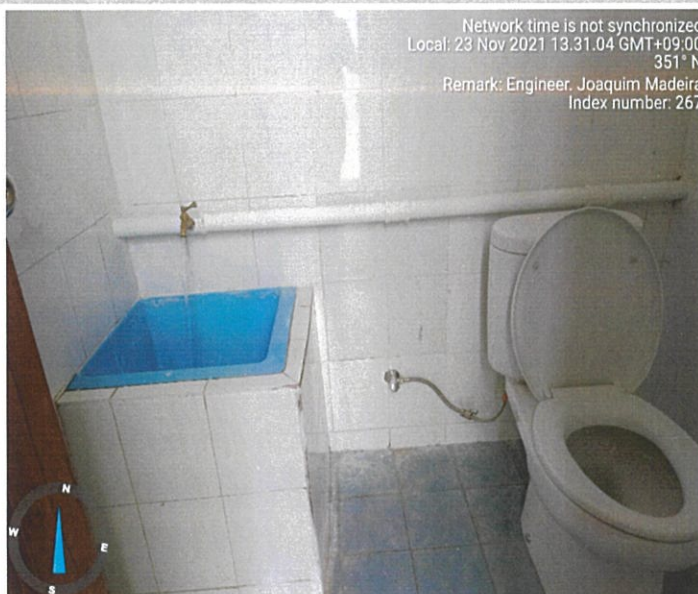



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


ANEXU C2 (MBS-12) Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA
+ CB).

No. kontratu : 390/KDM-AINARO/VII/2019

Obserbasaun iha terreno no fotu aktual

Tanki bee mos nian

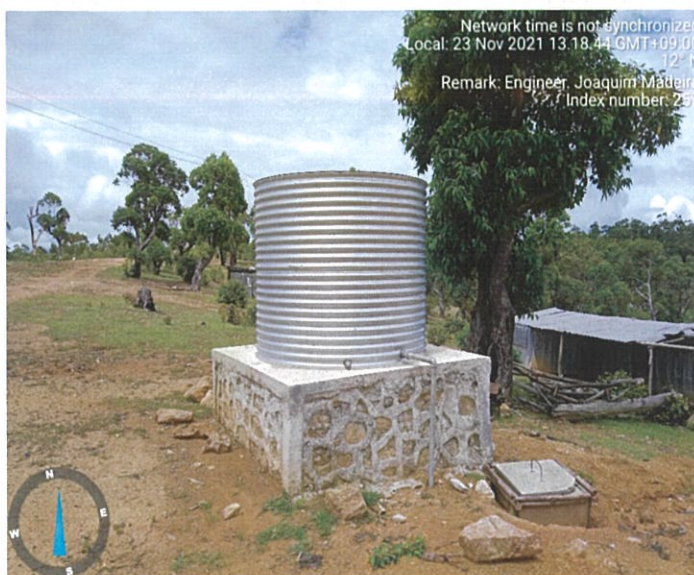

Seftiktank ba sintina nian ou Puso.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-13) Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse.
No. kontratu : 391/KDM-AINARO/VII/2019

Data Inspesaun : 23-03-2022

Fatin Inspesaun : Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.834443 Latetude: 125.598862

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C.Madeira

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere fisiko
final ona e selu tiha
98.97%, e hein deit
halo pagamento
kompleto ba 100%
nian. Maibe ate agora
kompanhia la hatama
dokumentus
ida.(Laiha
informasaun ate
agora)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-13)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Maubisse.
: 391/KDM-AINARO/VII/2019

(Projeito refere fisiko
final ona maibe ate
agora kompanhia
sedauk hatama pedido
pagamento 100%)





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


ANEXU C1 (MBS-13)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Maubisse.
: 391/KDM-AINARO/VII/2019

Parte interior ou uma
laran kondisaun diak
hotu hela.

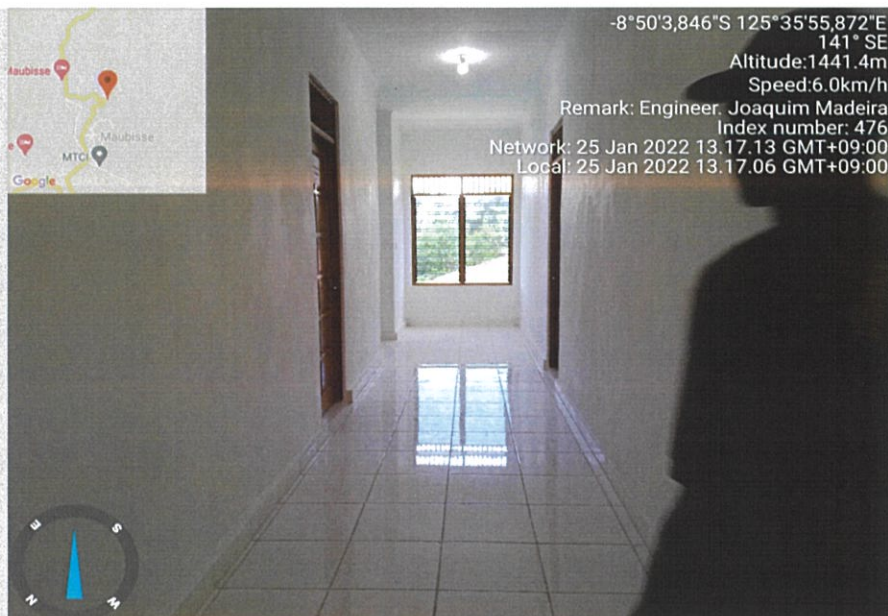

Haris Fatin
Kondisaun diak hotu
hela e bee mos mai
hela ho diak.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-15)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200
No. kontratu : MPW-W-210066

Data Inspesaun : 14/03/2022

Fatin Inspesaun : Maubisse - Liurai

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'15,906''S Latetude: 125°35'56,839''E


End Point : Long : -8°51'9,714''S Latetude: 125°35'2,79''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Kondisaun Estrada Maubisse – Hatubolico
companhia lahalo aktividade servisu iha
tereno (Parado)

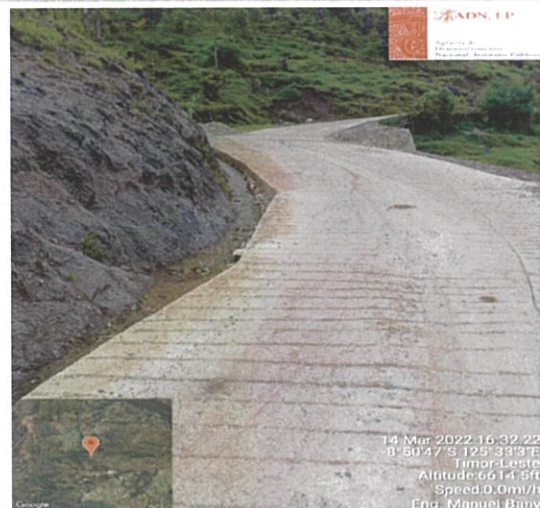



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-15)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200
No. kontratu : MPW-W-210066


**Kondisaun Estrada Maubisse – Hatubolico
companhia lahalo aktividade servisu iha
tereno**



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado

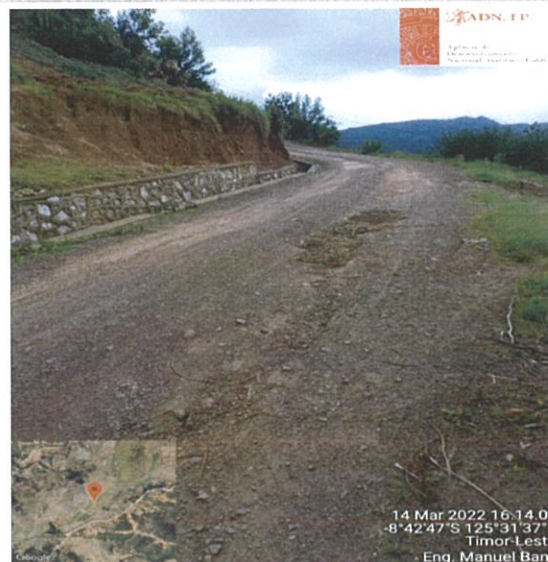



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MBS-15)

Roads Name : RURAL ROADS POT IMPROVMENT MAUBISSE - LIURAI (CH. 0+000 - 10+200)
Lokasi : Maubisse
Contractor : Leotylia Unip. Lda

Pay item No.	CONTRACT			SUMMARY					
	DESCRIPTION			PREVIOUS		THIS BILL		UP DATE TO BILL	
				Amount	Present	Amount	Present	Amount	Present
R-01	General	\$ 1,346.00	1.20%	\$ -	0.00%	\$ 832.00	0.74%	\$ 832.00	0.74%
R-02	Drainage	\$ 1,726.50	1.53%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-03	Earth work	\$ 10,748.90	9.55%	\$ -	0.00%	\$ 7,628.80	6.78%	\$ 7,628.80	6.78%
R-05	Sub-base, Base and Pavament	\$ 7,005.50	6.23%	\$ -	0.00%	\$ 42,778.33	38.02%	\$ 42,778.33	38.02%
R-08	Structures	\$ 46,855.54	41.64%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-10	Dayworks	\$ 70.00	0.06%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 15,375.80	13.67%	\$ -	0.00%	\$ 5,754.80	5.11%	\$ 5,754.80	5.11%
R-15	Provisional sum	\$ 25.00	0.02%	\$ -	0.00%	\$ 300.00	0.27%	\$ 300.00	0.27%
A	Construction cost	\$ 83,153.24	73.90%	\$ -	0.00%	\$ 56,993.93	50.92%	\$ 56,993.93	50.92%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 8,315.32	7.39%	\$ -	0.00%	\$ 5,699.39	5.07%	\$ 5,699.39	5.07%
C	General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 18,843.12	16.75%	\$ -	0.00%	\$ 6,655.00	5.91%	\$ 6,655.00	5.91%
D	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 2,206.23	1.96%	\$ -	0.00%	\$ 1,386.97	1.23%	\$ 1,386.97	1.23%
F	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 112,517.92	100.00%	\$ -	0.00%	\$ 70,735.29	63.13%	\$ 70,735.29	63.13%

Inspesaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Manuel Bary da S. C. de Carvalho)

Eng. ba Projeitu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Joao Paulo Amaral)

Eng. Senior ba Projeitu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.
No. kontratu : SSS/287/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 23-03-2022

Fatin Inspesaun : Manulobas

Koordinadas :

Start Point : Long :- 84961042S, Latetude: 125.3996632E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Bee matan nebe dada bee mos ba comunidade sira iha suku mane loba, kondisaun bee matan iha neba bee boot no diak. (PROJEITO NEE LA LAO, ABANDONA HELA ATE AGORA E LAIHA INFORMASAUN IDA HUSI KOMPANHIA)	 8°50'19,338"S 125°40'36,702"E 101°E Altitude: 1349.9m Speed: 0.0km/h Remark: Engineer: Joaquim Madeira Index number: 837 Network time is not synchronized Local: 23 Mar 2022 13:42:23 GMT+09:00



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.
No. kontratu : SSS/287/MOPTC-2016

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

BEE MATAN.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-16)

Back-up Data

Naran Projeto

: Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.

No. kontratu

: SSS/287/MOPTC-2016

Sketch & Foto Desenho

Instalasaun kanu 2" x 6 M

Kanu refere ho kondisaun diak
hela.

Lutu haleu tanki

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-16)

Back-up Data

Naran Projeto

: Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.


No. kontratu

: SSS/287/MOPTC-2016

Sketch Item servisu

Rino tank ou tanki reserbatori

Kondisaun diak hela.

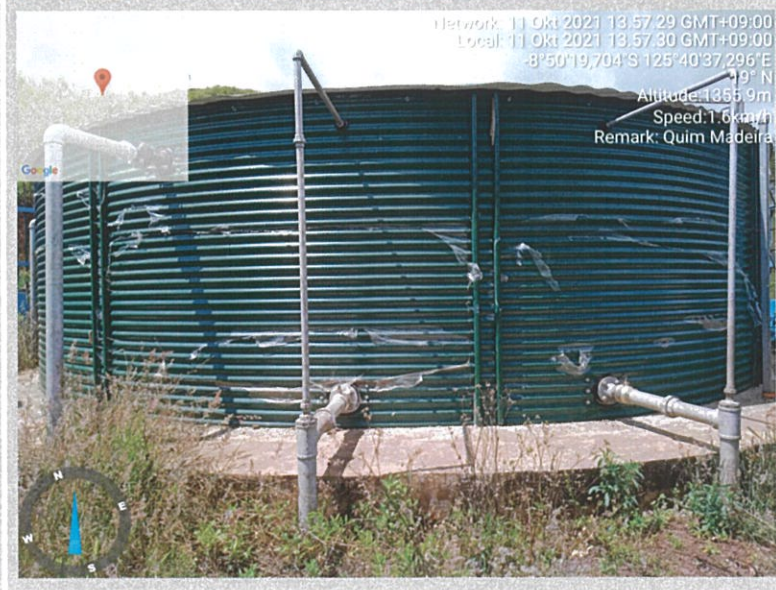



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-16)

Back-up Data

Naran Projeto

: Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.

No. kontratu

: SSS/287/MOPTC-2016

Instalasaun kanu 2" x 6 M

Kanu refere ho kondisaun diak
hela.



Tanki resevatori nebe distribui
bee ba comunidade sira
kondisaun diak hela no uza
hela.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-18)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ICU Room Maubesse.
No. kontratu : NCB/087/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 23/03/2022

Fatin Inspesaun : Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : -8501296S, Latetude: 1253557546E,

End Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere atinji ona
100%, Kompanhia agora
hatama ona relatotio ba iha
dono projeito.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

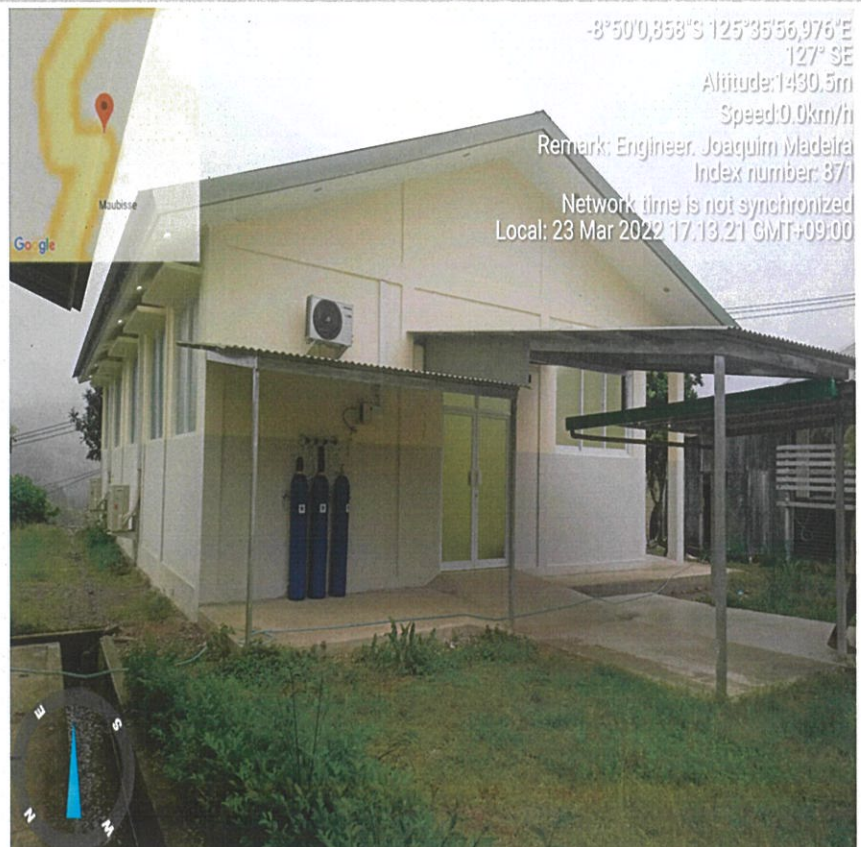



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-18)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun ICU Room Maubesse.
: NCB/087/MOPTC-2016

Oksigen



Parte sorin karuk





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-18)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun ICU Room Maubesse.
: NCB/087/MOPTC-2016

Parte soring Los



Parte Kotuk





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-18)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ICU Room Maubesse.

No. kontratu


: NCB/087/MOPTC-2016

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu halo cor ou fui
kanofi mos hotu ona agora
preparasaun ba reboka liur
no laran.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

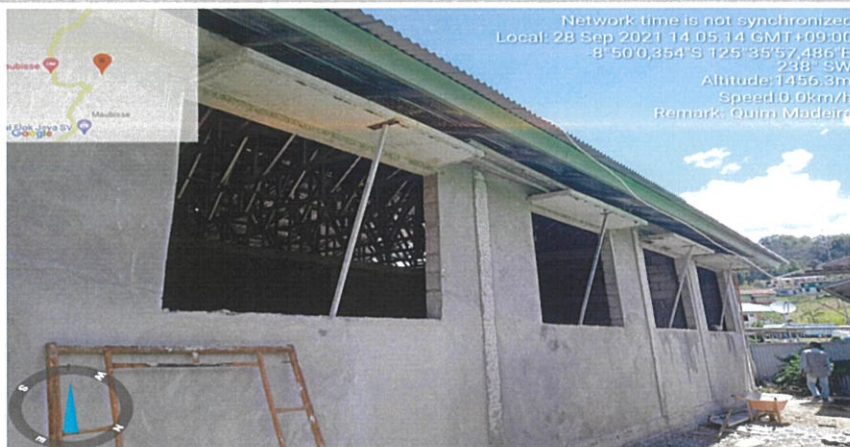



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO
BERMOLI

Data Inspesaun : 23-03-2022

Fatin Inspesaun : Bermoli/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long ;, Latetude:

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere hada fondasi hotu
E tuir orientasaun nebe iha
desenho ho b of q , agora
preparasaun ba fui sinta ho airin.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto

BERMOLI

Projeito refere hada fondasi hotu

E tuir orientasaun nebe iha

desenho ho b of q , agora

preparasaun ba fui sinta ho airin.

: NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO

BERMOLI

Projeto refere hada fondasi hotu

E tuir orientasaun nebe iha

desenho ho b of q , agora

preparasaun ba fui sinta ho airin.



Seftick Tank mos hada hotu ona
hein instala pvc.





PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO
BERMOLI
LOCATION : POSTU ADMINISTRATIVO MAUBISSE, SUCO MANLAU, MUNICIPIO
AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	THIS MONTH	
				AMOUNTH	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,079.26	\$ 1,354.26	1.57%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C/39 (i)	US\$ 61,149.43	\$ 15,103.03	17.47%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 12,902.81		
CONSTRUCTION COST			US\$ 77,131.50	16,457.29	19.03%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00		
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,210.00	1.40%
GRAND TOTAL			US\$ 86,471.50	17,667.29	20.4%

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X. D. D. Jeronimo)

Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




INADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO
BERMOLI

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	23/03/2022	Maubessi/Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu kesi besi ba sinta ho airin tenki didiak no tuir nia dimensi.
					2	Prega kaixa mos didiak tenki tuir nia dimensi.
					3	Monta paralon havis fatin nian mos tenki tuir nia dimensi.
					4	
					5	
II					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
III					1	
					2	
					3	
					4	
					5	

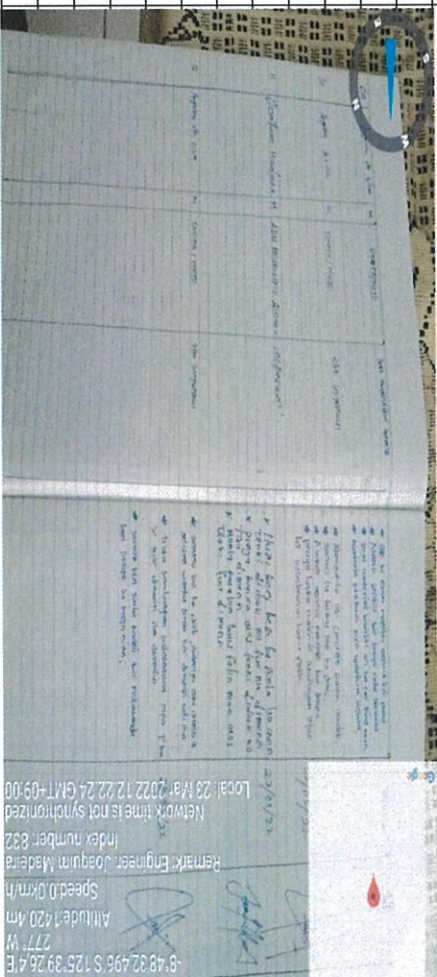

Altitude: 1420.4m
Speed: 0.0km/h
Index number: 832
Network time is not synchronized
Local: 23 Mar 2022 12:22:24 GMT+09:00
Remark: Engineer: Joaquim Madeira



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Data Inspesaun : 10-03-2022

Fatin Inspesaun : Betula/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere fondasi hada
hotu ona e agora preparasaun
ba hari airin ho sinta.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

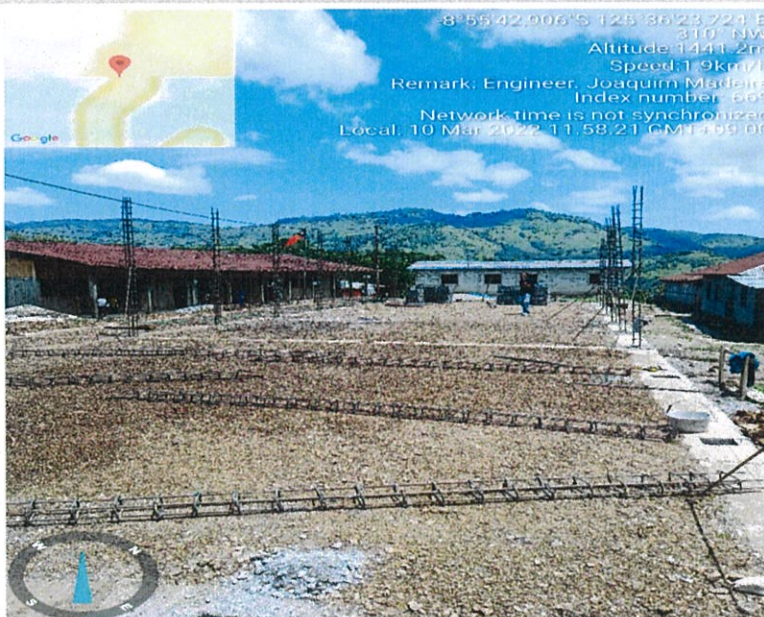



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu
Projeito refere fondasi hada
hotu ona e agora preparasaun
ba hari airin ho sinta.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere fondasi hada
hotu ona e agora preparasaun
ba hari airin ho sinta.





PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA
LOKASI : SUKO AITUTU, POSTO ADMINISTRATIVO MAUBISSE VILA
MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	THIS MONTH	
				AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,079.26	\$ 1,354.26	1.38%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 71,306.28	\$ 15,040.51	15.37%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 14,115.75		
CONSTRUCTION COST			US\$ 88,501.29	16,394.77	16.76%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00		
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,110.00	1.13%
GRAND TOTAL			US\$ 97,841.29	17,504.77	17.89%

Inspesau Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)

Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INTRUSAUUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto :NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	10/03/2022	Maubessi/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu tecnico ho badaen akompanha instala ou hari airin ho didiak hare labele kleuk,
					2	Hare prepara material para teste betauun nian.
					3	
					4	
					5	
II					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
III	22/03/2022	Maubessi/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu grupo sira monta lais kaixa sinta nian hodi nune hein nia komposisaun mai hodi bele fui dala ida deit. Kose oli ba kaixa lolon.
					2	
					3	
					4	
					5	
IV	28/03/2022	Maubessi/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
V					1	
					2	
					3	
					4	
					5	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Data Inspesaun : 23/03/2022

Fatin Inspesaun : Ruslau/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projeito refere fondasi kee hotu ona e preparasaun para hada fondasi ona.	 8°51'1,764"S 125°40'42,188"E Altitude: 340 m Altitude: 1239.6m Speed: 0.3km/h Remark: Engineer: Joaquim Madeira Index number: 847 Network time is not synchronized Local: 23 Mar 2022 14:07:48 GMT+09:00



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Projeito refere fondasi kee
hotu ona e preparasaun para
hada fondasi ona.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Projeito refere fondasi kee
hotu ona e preparasaun para
hada fondasi ona.





PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU
LOCATION : SUCO MANETU, POSTO ADMINISTRATIVO MAUBISSE , MUNICIPIO
AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	THIS MONTH	
				AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,079.26	\$ 1,354.26	1.43%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 71,553.70	\$ 6,751.35	7.11%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 10,978.70		
CONSTRUCTION COST			US\$ 85,611.66	8,105.61	8.54%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00		
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,410.00	1.48%
GRAND TOTAL			US\$ 94,951.66	9,515.61	10.02%

Inspesaun Husi :

Verifika Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Kompanha : Grupo Komunitari

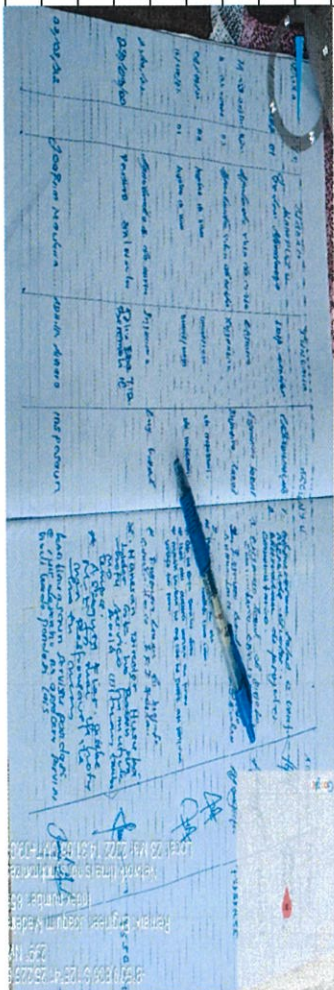No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	23/03/2022	Maubessi/Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
II	28/03/2022	Maubessi/Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	
					2	
					3	
					4	
					5	

Naran Eng.	Manuel Bany da S. C. de Carvalho						2022																																
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
AINARO VILA (ANV)	4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												FHO				
							Actual																																
	5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau arca 14	Consorcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Projetu Refere atizi ona 100% iha 2016 hela retensaun companhia sedauk husu pagamento ate agora					
							Actual																																
	6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											On Going					
							Actual																																
	7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												FHO				
							Actual																																
	8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Projetu refere sei parado tamba afeita husi kalamidade nebe iha dia 4/04/2021				
							Actual																																
	9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going				
							Actual																																
	11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardim dos Heroes Municipality Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	LM	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																												On Going				
							Actual																																
	12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												PHO				
							Actual																																
19	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maumono Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going					
						Actual																																	
20	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Projetu parado iha 2018					
						Actual																																	
22	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Projetu parado iha 2019					
						Actual																																	
HATUDO (HAI)	2	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	Nuha Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											FHO					
							Actual																																
	3	New Construction of Electrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Projetu refere sei parado tamba kondisaun iklima nebe sempre udan halo compahia labele halo servisu iha tereno					
							Actual																																
	4	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - ulo (A13)	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Projetu parado iha 2019				
							Actual																																
HATUBULICO (HTB)	1	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	Gos Unip.Lda	MPW-190104	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Projetu refere sei parado tamba compahia sei kordena ho owner hodi hare fila fali item/Volume nebe altera iha tereno					
							Actual																																
	2	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maumono Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Projetu parado iha 2018					
							Actual																																
	3	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubulico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Projetu refere sei parado tamba compahia sei kordena ho owner hodi hare fila fali osan restu nebe sei iha atu bele amenta tan servisu iha tereno					
							Actual																																
	4	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	Atlesu Unip.Lda	MPW-190091	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going				
							Actual																																
	5	Spot Improvement Liurai - Hatubulico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	Betua Calda Unip.Lda	MPW-W-210062	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going				
							Actual																																

Note:

 Planu Periode Inspesaun iha Terenu	 Implementa Planu Periode Inspesaun iha Terenu	 Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili	 Inspesaun Proceso Pagamentu
---	--	---	--

Plano, Período inspeção iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuon mensal iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)

ADN, I.P

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

(Eng. Januario Maia Guterres)

Adjunto Director Ejecutivo, ADN,I.P

Naran Eng.	Joaquim de C. Madeira
------------	-----------------------

Municipio	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS
-----------	----------------------------

2022

[illegible]

REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng.	Joaquim de C. Madeira							2022																															
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Maret																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MAUBISSE (MBS)	2	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																											PHO					
							Actual																																
	3	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																											Projeto refere final ona mas companhia sedauk hatama pagamento 100%					
							Actual																																
	4	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Abandona Laiha informasaun ate agora					
							Actual																																
	5	Konstrusaun ICU Room Maubesse	El Constructio Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																												Projeto refere final ona mas companhia sedauk hatama pagamento 100%				
							Actual																																
	6	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet, Cuzina no Armagem no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (BERMOLI MAULAU)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																												Lao hela				
							Actual																																
	7	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Lumluli)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																												Sedauk visita iha fulan ida nee tamba kondisaun dalan aat e udan boot halo kareta liu ladiak.				
							Actual																																
	8	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manelobas Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Manelobasa)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																												Sedauk visita iha fulan ida nee tamba kondisaun dalan aat e udan boot halo kareta liu ladiak.				
							Actual																																
	9	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Russulau)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																												Lao hela				
							Actual																																
	10	Construção de Salas de Aulas 6 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Manetu)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																												Sedauk visita iha fulan ida nee tamba kondisaun dalan aat e udan boot halo kareta liu ladiak.				
							Actual																																
	11	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Rileco Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																												Sedauk visita iha fulan ida nee tamba kondisaun dalan aat e udan boot halo kareta liu ladiak.				
							Actual																																
	12	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Aituto Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Betulala)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2023	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																												Lao hela				
							Actual																																
							Plan																																
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:



Planu Periode inspesaun iha tereinu




Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu



Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili



Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Sarjeamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Mariano R. Monteiro da Cruz, S.T.M., Eng)
Director Executivo, ADN, I.P.

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO REPUBLICA DE SAO TOME E PRINCIPES ADN, I.P. Agência de Normalização Nacional - Sociedade Pública							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares						2022																																
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Mar																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
AINARO VILA (ANV)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Santukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																LAIHA ONA ESPASO ATU KONTINUA OBRA
							Actual																																
	2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	Mantilo Unip. , Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																LAIHA ONA ESPASO ATU KONTINUA OBRA
							Actual																																
	3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Caioko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																LAIHA AKTIVIDADE IHA TERENO
							Actual																																
	10	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	Gos	71/GAM-AIN MAE/II/2018	PDIM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																
							Actual																																
	15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	Simbissa	389/KDM- AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
HATUBULI CO (HTB)	35	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mauniga, Hatakeru, Goulora, Loetelu 1 and Loetelu 2- Ainaro Municipality	Se-Maunin Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																LAIHA AKTIVIDADE IHA TERENO
							Actual																																
MAUBISSE (MBS)	38	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	39	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libutu - Ainaro Municipality	Lotas Unip. , Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																LAIHA AKTIVIDADE IHA TERENO
							Actual																																
	40	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurilala - Ainaro Municipality	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															HELA RETENSAUN 10%	
							Actual																																
	41	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															LAIHA AKTIVIDADE IHA TERENO	
							Actual																																
	42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															HELA RETENSAUN 10%	
							Actual																																
	47	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM- AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIU E INDUSTRIA	Plan																																
							Actual																																
	48	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	Mentil Unip. Lda	391/KDM- AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	63	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	Ei Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA- DC-21-012	Fundo Covid-19	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maneobas	MEJD PKRIE EBF MANEOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
						Actual																																	
67	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
						Actual																																	
68	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
						Actual																																	
69	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
						Actual																																	
70	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
						Actual																																	
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

Plano Periode Inspesaun iha terenu

Implementa Plano Periode Inspesaun iha Terenu

Relatorio avaliasaun mensal iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

 (Silvino D. A. Rebelo Soares)
 Eng. Electricidade - ADN - I.P.

Sertifika Husi :

 (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Coordenador da Unidade de Controlo e Valiasaun de Qualidade, ADN - I.P.

Aprova Husi :

 (Eng. Jaquario Maia Guterres)
 Adjunto Director Executivo, ADN - I.P.
