



**REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE**  
**MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO**

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



**RELATÓRIU MENSÁL**  
**IMPLEMENTASAUN PROJETUS**  
**MUNISÍPIU MANATUTO**

**MAIU 2023**



Elabora Hosi Eng. Munisípiu



## SUMÁRIO

### RELATÓRIO

#### IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO MANATUTO

MAIU 2023

Prepara Husi :



( Eng. Quico Adelino Junior )

Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no  
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P



( Eng. Jose R. Carlos Gusmão )

Eng. ba Projeto Insfrasturctura e  
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P



( Eng. Adonis Julio Fernandes )

Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P




( Eng. Domingos da Costa Silva )

Eng. ba Projeto Insfrasturctura e  
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

**Verifika Husi :**

  
( Arc. Fransisco X D D Jeronimo )  
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé  
Saneamentu, ADN, I.P

  
( Eng. Remigio da C. S. dos Santos )  
Eng. Senior ba Projektu Infraestrutura e  
Irigasaun, ADN, I.P

  
( Eng. Deolindo de F. Marques )  
Chefe Seksaun ba Projektu M.E & ITC, ADN, I.P

**Sertifika Husi :**

  
( Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,  
ADN, I.P

**Aprova Husi :**

  
( Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng )  
Director Executivo, ADN, I.P

## INDICE

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>SUMÁRIO</b> .....                       | 1  |
| <b>INDICE</b> .....                        | 3  |
| <b>I. INTRODUSAUN</b> .....                | 3  |
| 1.1 Enkuadramentu Legal.....               | 3  |
| 1.2 Perfil Municipio Manatuto.....         | 3  |
| 1.3. Lista Projectos.....                  | 7  |
| <b>II. PROGRESU FISIKU</b> .....           | 25 |
| 2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan.....        | 25 |
| <b>III. OBSTÁCLO IHA TERENU</b> .....      | 26 |
| 3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu .....     | 26 |
| <b>IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU</b> .....  | 27 |
| 4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu ..... | 27 |

## INDICE TABELA

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias .....                    | 4  |
| Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto.....             | 4  |
| Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto .....                   | 6  |
| Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamientos ..... | 7  |
| Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Manatuto Por Sectores.....                | 11 |
| Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Manatuto Por Ministerio.....              | 18 |
| Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto .....                      | 25 |



# I . INTRODUSAUN.


## 1.1.Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria

## 1.2. Perfil Municipio Manatuto

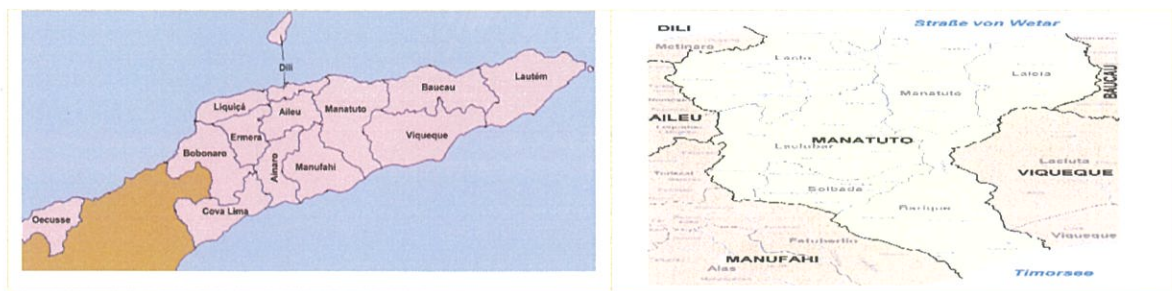

Mapa 2 hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Manatuto iha luan 1,706 km<sup>2</sup> ho populasaun nain 42,742 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Manatutoiha Postos Administrativos nen (6), Sukus 29 no aldeias 99 , mak hanesan hatudu iha Tabela 1.

**Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.**

| Natarbora    |           | Laclo         |           | Laklubar                 |           | Laleia        |           |
|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Sukus        | Aldeia    | Sukus         | Aldei     | Suku                     | Aldeia    | Sukus         | Aldeias   |
| Aubeon       | 2         | Hohorai       | 4         | Batara                   | 4         | Cairui        | 7         |
| Barique      | 2         | Locomesak     | 5         | Hatu<br>ma<br>quere<br>k | 3         | Hatulara<br>n | 3         |
| Fatuwaque    | 2         | Uma<br>kaduak | 3         | Funar                    | 4         | Lifau         | 3         |
| Manehat      | 3         | Uma<br>naruk  | 4         | Mane<br>lima             | 6         |               |           |
| Uma Boco     | 2         |               |           | -                        | 8         |               |           |
|              |           |               |           | Sanan<br>a<br>Na'i       | 4         |               |           |
| <b>Total</b> | <b>11</b> |               | <b>18</b> |                          | <b>30</b> |               | <b>13</b> |

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 69



| Manatuto |           | Soibada       |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| sukus    | Aldeia    | sukus         | aldeias   |
| Ailili   | 2         | Fatuma querek | 2         |
| Aitekas  | 4         | Leo-hat       | 2         |
| Cribas   | 5         | Manlala       | 2         |
| Iliheu   | 5         | Maun Fahe     | 2         |
| Ma'abat  | 2         | Somoro        | 2         |
| Sau      | 2         |               |           |
|          | <b>22</b> |               | <b>10</b> |

**Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto**

| Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Manututu |                                |                          |      |      |      |      |          |     |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|----------|-----|
| No                                           | Deskrisaun                     | Total Membros Kada Tinan |      |      |      |      |          |     |
|                                              |                                | 2021                     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total    | OBS |
| 1                                            | Engineiro                      | 3                        | 3    | 3    |      |      | 3        |     |
| 2                                            | Administrasau<br>n no Financas | 0                        | 0    | 0    |      |      | 0        |     |
| 3                                            | Motorista                      | 1                        | 1    | 1    |      |      | 1        |     |
| 4                                            | Seguransa                      | 0                        | 0    | 0    |      |      | 0        |     |
| <b>Total</b>                                 |                                | <b>4</b>                 |      |      |      |      | <b>4</b> |     |

**Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto.**

| ASET ADN,IP MUNICIPIO MANATUTO |                                |                       |       |       |      |      |       |              |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|------|------|-------|--------------|
| No                             | Deskrisaun                     | Total Aset Kada Tinan |       |       |      |      | Total | OBS          |
|                                |                                | 2021                  | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |       |              |
| 1                              | Edificio                       | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 2                              | Kareta                         | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 3                              | Desktop HP / Monitor           | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 4                              | Laptop HP                      | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 5                              | Printer Cannon                 | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 6                              | UPS                            | 1                     | 1     | 1     |      |      |       | Aát<br>ona   |
| 7                              | Armario File                   | 2                     | 2     | 2     |      |      |       |              |
| 8                              | Armario Tau hena               | 3                     | 3     | 3     |      |      |       |              |
| 9                              | Meja escritorio                | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 10                             | Meja han                       | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 11                             | Meja TV (kiik)                 | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 12                             | Kadeira escritorio             | 6                     | 6     | 6     |      |      |       |              |
| 13                             | Kadeira han                    | 4                     | 4     | 4     |      |      |       |              |
| 14                             | Sofa                           | 1 Set                 | 1 Set | 1 Set |      |      |       |              |
| 15                             | Springbed +sumasu<br>4+sprei 3 | 3 Set                 | 3 Set | 3 Set |      |      |       |              |
| 16                             | Jeleira                        | 1                     | 1     | 1     |      |      |       | Aát<br>ona   |
| 17                             | Water Dispenser                | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 18                             | TV + Parabola                  | 1 Set                 | 1 Set | 1 Set |      |      |       |              |
| 19                             | AC                             | 4                     | 4     | 4     |      |      |       | 1 aát<br>ona |
| 20                             | Kipas Angin                    | 4                     | 4     | 4     |      |      |       |              |
| 21                             | Kompur Listrik                 | 1                     | 1     | 1     |      |      |       | Aát<br>ona   |

|    |                  |    |    |    |  |  |  |            |
|----|------------------|----|----|----|--|--|--|------------|
| 22 | Kompór Gas       | 1  | 1  | 1  |  |  |  | Aát<br>ona |
| 23 | Rack sepatu      | 3  | 3  | 3  |  |  |  |            |
| 24 | Rack Piring      | 1  | 1  | 1  |  |  |  |            |
| 25 | Lampu            | 11 | 11 | 11 |  |  |  |            |
| 26 | Water Pump Sanyo | 1  | 1  | 1  |  |  |  |            |

### 1.3 : Lista Projectos

Projetu hotu ne'ebe akumula iha lista ne'e bazeia ba dadus projetu ne'ebe sei lao hela no mos projetu ne'ebe abandona ona tinan barak, projetu hirak ne'e fahe tuir lista 1.3.1 Projeto Por Fundus Finansiamientos, 1.3.2 Projeto Por Sectors no 1.3.3 Projeto Por Ministerios.

#### 1.3.1 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamientos

| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | TOTAL EMERGENCY+FI+Fundu Covid-19+LM-BS+LM-CD+LM-TP+PDIM |                        |                           |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROJECTO                                           | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              | 10                                                       | \$ 2,398,501.20        | 45.37%                    |
| 2  | Laclo                | 8                                                        | \$ 49,415,129.51       | 87.56%                    |
| 3  | Laclubar             | 9                                                        | \$ 36,702,834.12       | 86.67%                    |
| 4  | Laleia               | 3                                                        | \$ 392,472.03          | 17.27%                    |
| 5  | Manatuto Villa       | 19                                                       | \$ 42,391,971.04       | 78.72%                    |
| 6  | Soibada              | 6                                                        | \$ 4,286,667.82        | 85.89%                    |
|    | Grand Total          | 55                                                       | \$ 135,587,575.72      | 83.55%                    |



| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | EMERGENCY      |                        |                           |
|----|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 2  | Laclo                |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 3  | Laclubar             |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 4  | Laleia               |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 5  | Manatuto Villa       | 1              | \$ 127,786.80          | 20.56%                    |
| 6  | Soibada              |                | \$ -                   | 0.00%                     |
|    | Grand Total          | 1              | \$ 127,786.80          | 20.56%                    |

| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | FI             |                        |                           |
|----|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 2  | Laclo                | 3              | \$ 48,698,873.04       | 87.85%                    |
| 3  | Laclubar             | 2              | \$ 35,075,150.37       | 88.64%                    |
| 4  | Laleia               |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 5  | Manatuto Villa       | 6              | \$ 40,765,491.57       | 79.91%                    |
| 6  | Soibada              | 1              | \$ 3,553,954.20        | 93.93%                    |
|    | Grand Total          | 12             | \$ 128,093,469.18      | 85.71%                    |

| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | Fundo Covid-19 |                        |                           |
|----|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 2  | Laclo                |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 3  | Laclubar             |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 4  | Laleia               |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 5  | Manatuto Villa       | 3              | \$ 598,668.36          | 86.09%                    |
| 6  | Soibada              |                | \$ -                   | 0.00%                     |
|    | Grand Total          | 3              | \$ 598,668.36          | 86.09%                    |

| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | LM-BS          |                        |                           |
|----|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              | 2              | \$ 404,938.08          | 59.16%                    |
| 2  | Laclo                | 2              | \$ 240,323.02          | 77.07%                    |
| 3  | Laclubar             | 2              | \$ 675,432.39          | 40.19%                    |
| 4  | Laleia               |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 5  | Manatuto Villa       | 1              | \$ 29,275.84           | 15.92%                    |
| 6  | Soibada              |                | \$ -                   | 0.00%                     |
|    | Grand Total          | 7              | \$ 1,349,969.33        | 51.92%                    |

| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | LM-CD          |                        |                           |
|----|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              | 7              | \$ 1,876,648.24        | 41.23%                    |
| 2  | Laclo                | 1              | \$ 223,843.79          | 56.58%                    |
| 3  | Laclubar             | 2              | \$ 661,982.34          | 55.55%                    |
| 4  | Laleia               | 2              | \$ 305,588.74          | 9.25%                     |
| 5  | Manatuto Villa       | 1              | \$ 182,701.57          | 6.14%                     |
| 6  | Soibada              | 4              | \$ 630,201.31          | 47.08%                    |
|    | Grand Total          | 17             | \$ 3,880,965.99        | 41.34%                    |

| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | LM-TP          |                        |                           |
|----|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 2  | Laclo                | 1              | \$ 98,147.27           | 44.74%                    |
| 3  | Laclubar             | 2              | \$ 202,223.29          | 35.11%                    |
| 4  | Laleia               | 1              | \$ 86,883.29           | 45.49%                    |
| 5  | Manatuto Villa       | 5              | \$ 382,490.63          | 39.44%                    |
| 6  | Soibada              | 1              | \$ 102,512.31          | 45.66%                    |
|    | Grand Total          | 10             | \$ 872,256.79          | 40.37%                    |



| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | PDIM           |                        |                           |
|----|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              | 1              | \$ 116,914.88          | 63.99%                    |
| 2  | Laclo                | 1              | \$ 153,942.39          | 84.29%                    |
| 3  | Laclubar             | 1              | \$ 88,045.73           | 10.46%                    |
| 4  | Laleia               |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 5  | Manatuto Villa       | 2              | \$ 305,556.27          | 28.66%                    |
| 6  | Soibada              |                | \$ -                   | 0.00%                     |
|    | Grand Total          | 5              | \$ 664,459.27          | 45.35%                    |

### 1.3.2 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Sectors

| NO          | POR SECTOR                                                                | TOTAL MUNICIPIO MANATUTO |                        |                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                                                           | TOTAL PROJECTO           | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN (%) |
| 1           | AGRICULTURA                                                               | 1                        | \$ 370,511.25          | 15.83%                    |
| 2           | AGUA E SANEAMENTO                                                         | 1                        | \$ 162,377.94          | 41.85%                    |
| 3           | COMERCIO                                                                  | 1                        | \$ 153,942.39          | 84.29%                    |
| 4           | EDIFICIOS PUBLICOS                                                        | 7                        | \$ 1,168,395.22        | 58.91%                    |
| 5           | EDUKASAUN                                                                 | 11                       | \$ 1,054,958.36        | 34.44%                    |
| 6           | ELETRIFIKASAUN NASIONAL                                                   | 2                        | \$ 1,076,003.44        | 78.57%                    |
| 7           | ESTRADAS                                                                  | 15                       | \$ 8,687,169.39        | 60.14%                    |
| 8           | ESTRADAS E PONTES                                                         | 1                        | \$ 394,194.73          | 0.00%                     |
| 9           | FLOOD CONTROL                                                             | 2                        | \$ 432,138.16          | 78.21%                    |
| 10          | IMPRESTIMO                                                                | 4                        | \$ 115,112,106.35      | 86.80%                    |
| 11          | JUVENTUDE NO DESPORTU                                                     | 1                        | \$ 2,362,976.44        | 76.00%                    |
| 12          | MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES | 1                        | \$ 127,786.80          | 20.56%                    |
| 13          | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN                                             | 2                        | \$ 157,560.52          | 41.96%                    |
| 14          | PONTES                                                                    | 1                        | \$ 3,553,954.20        | 93.93%                    |
| 15          | SAUDE                                                                     | 3                        | \$ 467,944.26          | 72.58%                    |
| 16          | TURISMO                                                                   | 2                        | \$ 305,556.27          | 28.66%                    |
| Grand Total |                                                                           | 55                       | \$ 135,587,575.72      | 83.55%                    |

| NO | POR SECTOR                                                                               | Barique           |                           |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|    |                                                                                          | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EXECUSAUN (%) |
| 1  | AGRICULTURA                                                                              | 1                 | \$ 370,511.25             | 15.83%                       |
| 2  | AGUA E<br>SANEAMENTO                                                                     | 1                 | \$ 162,377.94             | 41.85%                       |
| 3  | COMERCIO                                                                                 |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 4  | EDIFICIOS<br>PUBLICOS                                                                    | 1                 | \$ 408,460.73             | 90.00%                       |
| 5  | EDUKASAUN                                                                                |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 6  | ELETRIFIKASAUN<br>NASIONAL                                                               |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 7  | ESTRADAS                                                                                 | 3                 | \$ 940,115.74             | 29.92%                       |
| 8  | ESTRADAS E<br>PONTES                                                                     |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 9  | FLOOD CONTROL                                                                            | 1                 | \$ 242,560.14             | 70.75%                       |
| 10 | IMPRESTIMO                                                                               |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 11 | JUVENTUDE NO<br>DESPORTU                                                                 |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 12 | MANUTENÇÃO,<br>REABILITAÇÃO E<br>RESPOSTA AS<br>ESTRUTURAS<br>DANIFICADAS<br>CALAMIDADES |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 13 | MANUTENSAUN<br>NO<br>REHABILITASAUN                                                      | 2                 | \$ 157,560.52             | 41.96%                       |
| 14 | PONTES                                                                                   |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 15 | SAUDE                                                                                    | 1                 | \$ 116,914.88             | 63.99%                       |
| 16 | TURISMO                                                                                  |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
|    | Grand Total                                                                              | 10                | \$ 2,398,501.20           | 45.37%                       |



| NO          | POR SECTOR                                                                               | Laclo             |                           |                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                          | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EXECUSAUN (%) |
| 1           | AGRICULTURA                                                                              |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 2           | AGUA E<br>SANEAMENTO                                                                     |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 3           | COMERCIO                                                                                 | 1                 | \$ 153,942.39             | 84.29%                       |
| 4           | EDIFICIOS<br>PUBLICOS                                                                    | 1                 | \$ 50,745.00              | 37.13%                       |
| 5           | EDUKASAUN                                                                                | 1                 | \$ 98,147.27              | 44.74%                       |
| 6           | ELETRIFIKASAUN<br>NASIONAL                                                               | 1                 | \$ 380,582.61             | 72.08%                       |
| 7           | ESTRADAS                                                                                 | 2                 | \$ 227,158.35             | 57.07%                       |
| 8           | ESTRADAS E<br>PONTES                                                                     |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 9           | FLOOD CONTROL                                                                            | 1                 | \$ 189,578.02             | 87.76%                       |
| 10          | IMPRESTIMO                                                                               | 1                 | \$ 48,314,975.87          | 87.98%                       |
| 11          | JUVENTUDE NO<br>DESPORTU                                                                 |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 12          | MANUTENÇÃO,<br>REABILITAÇÃO E<br>RESPOSTA AS<br>ESTRUTURAS<br>DANIFICADAS<br>CALAMIDADES |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 13          | MANUTENSAUN<br>NO<br>REHABILITASAUN                                                      |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 14          | PONTES                                                                                   |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 15          | SAUDE                                                                                    |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 16          | TURISMO                                                                                  |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| Grand Total |                                                                                          | 8                 | \$ 49,415,129.51          | 87.56%                       |

| NO | POR SECTOR                                                                               | Laclubar          |                           |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|    |                                                                                          | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EXECUSAUN (%) |
| 1  | AGRICULTURA                                                                              |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 2  | AGUA E<br>SANEAMENTO                                                                     |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 3  | COMERCIO                                                                                 |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 4  | EDIFICIOS<br>PUBLICOS                                                                    |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 5  | EDUKASAUN                                                                                | 2                 | \$ 202,223.29             | 35.11%                       |
| 6  | ELETRIFIKASAUN<br>NASIONAL                                                               | 1                 | \$ 695,420.83             | 82.11%                       |
| 7  | ESTRADAS                                                                                 | 4                 | \$ 1,337,414.73           | 47.79%                       |
| 8  | ESTRADAS E<br>PONTES                                                                     |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 9  | FLOOD CONTROL                                                                            |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 10 | IMPRESTIMO                                                                               | 1                 | \$ 34,379,729.54          | 88.78%                       |
| 11 | JUVENTUDE NO<br>DESPORTU                                                                 |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 12 | MANUTENÇÃO,<br>REABILITAÇÃO E<br>RESPOSTA AS<br>ESTRUTURAS<br>DANIFICADAS<br>CALAMIDADES |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 13 | MANUTENSAUN<br>NO<br>REHABILITASAUN                                                      |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 14 | PONTES                                                                                   |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 15 | SAUDE                                                                                    | 1                 | \$ 88,045.73              | 10.46%                       |
| 16 | TURISMO                                                                                  |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
|    | Grand Total                                                                              | 9                 | \$ 36,702,834.12          | 86.67%                       |

| NO          | POR SECTOR                                                                               | Laleia            |                           |                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                          | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EXECUSAUN (%) |
| 1           | AGRICULTURA                                                                              |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 2           | AGUA E<br>SANEAMENTO                                                                     |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 3           | COMERCIO                                                                                 |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 4           | EDIFICIOS<br>PUBLICOS                                                                    | 1                 | \$ 277,330.43             | 0.00%                        |
| 5           | EDUKASAUN                                                                                | 1                 | \$ 86,883.29              | 45.49%                       |
| 6           | ELETRIFIKASAUN<br>NASIONAL                                                               |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 7           | ESTRADAS                                                                                 | 1                 | \$ 28,258.31              | 100.00%                      |
| 8           | ESTRADAS E<br>PONTES                                                                     |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 9           | FLOOD CONTROL                                                                            |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 10          | IMPRESTIMO                                                                               |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 11          | JUVENTUDE NO<br>DESPORTU                                                                 |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 12          | MANUTENÇÃO,<br>REABILITAÇÃO E<br>RESPOSTA AS<br>ESTRUTURAS<br>DANIFICADAS<br>CALAMIDADES |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 13          | MANUTENSAUN<br>NO<br>REHABILITASAUN                                                      |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 14          | PONTES                                                                                   |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 15          | SAUDE                                                                                    |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 16          | TURISMO                                                                                  |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| Grand Total |                                                                                          | 3                 | \$ 392,472.03             | 17.27%                       |



| NO | POR SECTOR                                                                | Manatuto Villa |                        |                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                                                                           | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN (%) |
| 1  | AGRICULTURA                                                               |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 2  | AGUA E SANEAMENTO                                                         |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 3  | COMERCIO                                                                  |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 4  | EDIFICIOS PUBLICOS                                                        | 3              | \$ 364,960.55          | 72.47%                    |
| 5  | EDUKASAUN                                                                 | 6              | \$ 565,192.20          | 28.67%                    |
| 6  | ELETRIFIKASAUN NASIONAL                                                   |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 7  | ESTRADAS                                                                  | 2              | \$ 5,590,919.46        | 69.52%                    |
| 8  | ESTRADAS E PONTES                                                         | 1              | \$ 394,194.73          | 0.00%                     |
| 9  | FLOOD CONTROL                                                             |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 10 | IMPRESTIMO                                                                | 2              | \$ 32,417,400.94       | 82.96%                    |
| 11 | JUVENTUDE NO DESPORTU                                                     | 1              | \$ 2,362,976.44        | 76.00%                    |
| 12 | MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES | 1              | \$ 127,786.80          | 20.56%                    |
| 13 | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN                                             |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 14 | PONTES                                                                    |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 15 | SAUDE                                                                     | 1              | \$ 262,983.65          | 97.19%                    |
| 16 | TURISMO                                                                   | 2              | \$ 305,556.27          | 28.66%                    |
|    | Grand Total                                                               | 19             | \$ 42,391,971.04       | 78.72%                    |

| NO | POR SECTOR                                                                | Soibada        |                        |                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                                                                           | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN (%) |
| 1  | AGRICULTURA                                                               |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 2  | AGUA E SANEAMENTO                                                         |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 3  | COMERCIO                                                                  |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 4  | EDIFICIOS PUBLICOS                                                        | 1              | \$ 66,898.51           | 55.80%                    |
| 5  | EDUKASAUN                                                                 | 1              | \$ 102,512.31          | 45.66%                    |
| 6  | ELETRIFIKASAUN NASIONAL                                                   |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 7  | ESTRADAS                                                                  | 3              | \$ 563,302.80          | 46.05%                    |
| 8  | ESTRADAS E PONTES                                                         |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 9  | FLOOD CONTROL                                                             |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 10 | IMPRESTIMO                                                                |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 11 | JUVENTUDE NO DESPORTU                                                     |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 12 | MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 13 | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN                                             |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 14 | PONTES                                                                    | 1              | \$ 3,553,954.20        | 93.93%                    |
| 15 | SAUDE                                                                     |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 16 | TURISMO                                                                   |                | \$ -                   | 0.00%                     |
|    | Grand Total                                                               | 6              | \$ 4,286,667.82        | 85.89%                    |

### 1.3.3 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Ministerios

| NO          | POR MINISTERIO                                                   | GRAND TOTAL    |                        |                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                                                  | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN (%) |
| 1           | BE'E TIMOR LESTE, EMPRESA PUBLICA                                | 1              | \$ 127,786.80          | 20.56%                    |
| 2           | ESTATAL                                                          | 2              | \$ 305,556.27          | 28.66%                    |
| 3           | MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS                                  | 1              | \$ 370,511.25          | 15.83%                    |
| 4           | MINISTERIO DA DEFESA                                             | 1              | \$ 189,578.02          | 87.76%                    |
| 5           | MINISTERIO DA JUSTICA                                            | 1              | \$ 29,275.84           | 15.92%                    |
| 6           | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | 27             | \$ 129,385,926.71      | 84.73%                    |
| 7           | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU                        | 12             | \$ 1,121,856.87        | 35.71%                    |
| 8           | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU                                   | 1              | \$ 277,330.43          | 0.00%                     |
| 9           | MINISTERIO SAUDE                                                 | 5              | \$ 803,628.97          | 74.59%                    |
| 10          | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA                          | 2              | \$ 204,687.39          | 72.60%                    |
| 11          | MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL | 1              | \$ 408,460.73          | 90.00%                    |
| 12          | SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU                         | 1              | \$ 2,362,976.44        | 76.00%                    |
| Grand Total |                                                                  | 55             | \$ 135,587,575.72      | 83.55%                    |



| NO          | POR MINISTERIO                                                   | Barique        |                        |                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                                                  | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN (%) |
| 1           | BE'E TIMOR LESTE, EMPRESA PUBLICA                                |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 2           | ESTATAL                                                          |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 3           | MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS                                  | 1              | \$ 370,511.25          | 15.83%                    |
| 4           | MINISTERIO DA DEFESA                                             |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 5           | MINISTERIO DA JUSTICA                                            |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 6           | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | 7              | \$ 1,502,614.34        | 39.07%                    |
| 7           | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU                        |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 8           | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU                                   |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 9           | MINISTERIO SAUDE                                                 | 1              | \$ 116,914.88          | 63.99%                    |
| 10          | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA                          |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| 11          | MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL | 1              | \$ 408,460.73          | 90.00%                    |
| 12          | SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU                         |                | \$ -                   | 0.00%                     |
| Grand Total |                                                                  | 10             | \$ 2,398,501.20        | 45.37%                    |

| NO          | POR MINISTERIO                                                                  | Laclo             |                           |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                 | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EXECUSAUN (%) |
| 1           | BE'E TIMOR<br>LESTE, EMPRESA<br>PUBLICA                                         |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 2           | ESTATAL                                                                         |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 3           | MINISTERIO<br>AGRIKULTURA E<br>PESCAS                                           |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 4           | MINISTERIO DA<br>DEFESA                                                         | 1                 | \$ 189,578.02             | 87.76%                       |
| 5           | MINISTERIO DA<br>JUSTICA                                                        |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 6           | MINISTERIO DAS<br>OBRAS<br>PUBLICAS                                             | 4                 | \$ 48,922,716.83          | 87.71%                       |
| 7           | MINISTERIO<br>EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                              | 1                 | \$ 98,147.27              | 44.74%                       |
| 8           | MINISTERIO<br>PLANU E<br>ORDENAMENTU                                            |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 9           | MINISTERIO<br>SAUDE                                                             |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 10          | MINISTERIO<br>TURISMO<br>KOMERCIO E<br>INDUSTRIA                                | 2                 | \$ 204,687.39             | 72.60%                       |
| 11          | MINISTRO PARA<br>OS ASSUNTOS<br>DOS<br>COMBATENTES<br>DA LIBERTAÇÃO<br>NACIONAL |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 12          | SECRETARIADO<br>ESTADO<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                               |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| Grand Total |                                                                                 | 8                 | \$ 49,415,129.51          | 87.56%                       |

| NO          | POR MINISTERIO                                                                  | Laclubar          |                           |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                 | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EXECUSAUN (%) |
| 1           | BE'E TIMOR<br>LESTE, EMPRESA<br>PUBLICA                                         |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 2           | ESTATAL                                                                         |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 3           | MINISTERIO<br>AGRIKULTURA E<br>PESCAS                                           |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 4           | MINISTERIO DA<br>DEFESA                                                         |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 5           | MINISTERIO DA<br>JUSTICA                                                        |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 6           | MINISTERIO DAS<br>OBRAS<br>PUBLICAS                                             | 6                 | \$ 36,412,565.10          | 87.14%                       |
| 7           | MINISTERIO<br>EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                              | 2                 | \$ 202,223.29             | 35.11%                       |
| 8           | MINISTERIO<br>PLANU E<br>ORDENAMENTU                                            |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 9           | MINISTERIO<br>SAUDE                                                             | 1                 | \$ 88,045.73              | 10.46%                       |
| 10          | MINISTERIO<br>TURISMO<br>KOMERCIO E<br>INDUSTRIA                                |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 11          | MINISTRO PARA<br>OS ASSUNTOS<br>DOS<br>COMBATENTES<br>DA LIBERTAÇÃO<br>NACIONAL |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 12          | SECRETARIADO<br>ESTADO<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                               |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| Grand Total |                                                                                 | 9                 | \$ 36,702,834.12          | 86.67%                       |



| NO          | POR MINISTERIO                                                                  | Laleia            |                           |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                 | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EXECUSAUN (%) |
| 1           | BE'E TIMOR<br>LESTE, EMPRESA<br>PUBLICA                                         |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 2           | ESTATAL                                                                         |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 3           | MINISTERIO<br>AGRIKULTURA E<br>PESCAS                                           |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 4           | MINISTERIO DA<br>DEFESA                                                         |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 5           | MINISTERIO DA<br>JUSTICA                                                        |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 6           | MINISTERIO DAS<br>OBRAS<br>PUBLICAS                                             | 1                 | \$ 28,258.31              | 100.00%                      |
| 7           | MINISTERIO<br>EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                              | 1                 | \$ 86,883.29              | 45.49%                       |
| 8           | MINISTERIO<br>PLANU E<br>ORDENAMENTU                                            | 1                 | \$ 277,330.43             | 0.00%                        |
| 9           | MINISTERIO<br>SAUDE                                                             |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 10          | MINISTERIO<br>TURISMO<br>KOMERCIO E<br>INDUSTRIA                                |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 11          | MINISTRO PARA<br>OS ASSUNTOS<br>DOS<br>COMBATENTES<br>DA LIBERTAÇÃO<br>NACIONAL |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 12          | SECRETARIADO<br>ESTADO<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                               |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| Grand Total |                                                                                 | 3                 | \$ 392,472.03             | 17.27%                       |

| NO | POR MINISTERIO                                                                  | Manatuto Villa    |                           |                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|    |                                                                                 | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EXECUSAUN (%) |
| 1  | BE'E TIMOR<br>LESTE, EMPRESA<br>PUBLICA                                         | 1                 | \$ 127,786.80             | 20.56%                       |
| 2  | ESTATAL                                                                         | 2                 | \$ 305,556.27             | 28.66%                       |
| 3  | MINISTERIO<br>AGRIKULTURA E<br>PESCAS                                           |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 4  | MINISTERIO DA<br>DEFESA                                                         |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 5  | MINISTERIO DA<br>JUSTICA                                                        | 1                 | \$ 29,275.84              | 15.92%                       |
| 6  | MINISTERIO DAS<br>OBRAS<br>PUBLICAS                                             | 5                 | \$ 38,402,515.13          | 80.15%                       |
| 7  | MINISTERIO<br>EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                              | 6                 | \$ 565,192.20             | 28.67%                       |
| 8  | MINISTERIO<br>PLANU E<br>ORDENAMENTU                                            |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 9  | MINISTERIO<br>SAUDE                                                             | 3                 | \$ 598,668.36             | 86.09%                       |
| 10 | MINISTERIO<br>TURISMO<br>KOMERCIO E<br>INDUSTRIA                                |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 11 | MINISTRO PARA<br>OS ASSUNTOS<br>DOS<br>COMBATENTES<br>DA LIBERTAÇÃO<br>NACIONAL |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 12 | SECRETARIADO<br>ESTADO<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                               | 1                 | \$ 2,362,976.44           | 76.00%                       |
|    | Grand Total                                                                     | 19                | \$ 42,391,971.04          | 78.72%                       |

| NO | POR MINISTERIO                                                                  | Soibada           |                           |                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|    |                                                                                 | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EXECUSAUN (%) |
| 1  | BE'E TIMOR<br>LESTE, EMPRESA<br>PUBLICA                                         |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 2  | ESTATAL                                                                         |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 3  | MINISTERIO<br>AGRIKULTURA E<br>PESCAS                                           |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 4  | MINISTERIO DA<br>DEFESA                                                         |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 5  | MINISTERIO DA<br>JUSTICA                                                        |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 6  | MINISTERIO DAS<br>OBRAS<br>PUBLICAS                                             | 4                 | \$ 4,117,257.00           | 87.38%                       |
| 7  | MINISTERIO<br>EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                              | 2                 | \$ 169,410.82             | 49.67%                       |
| 8  | MINISTERIO<br>PLANU E<br>ORDENAMENTU                                            |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 9  | MINISTERIO<br>SAUDE                                                             |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 10 | MINISTERIO<br>TURISMO<br>KOMERCIO E<br>INDUSTRIA                                |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 11 | MINISTRO PARA<br>OS ASSUNTOS<br>DOS<br>COMBATENTES<br>DA LIBERTAÇÃO<br>NACIONAL |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
| 12 | SECRETARIADO<br>ESTADO<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                               |                   | \$ -                      | 0.00%                        |
|    | Grand Total                                                                     | 6                 | \$ 4,286,667.82           | 85.89%                       |



#### 1.4. Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto

| Posto Administrativo, Suco<br>no Sexu | 2022          |                                   |              |                                            |              |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
|                                       | Total         | Idade produktivu<br>(idade 15-64) |              | Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten) |              |
|                                       |               | Male                              | Female       | Male                                       | Female       |
| <b>Barique</b>                        | <b>5,833</b>  | <b>1,924</b>                      | <b>1,617</b> | <b>1,183</b>                               | <b>1,109</b> |
| <b>Laclo</b>                          | <b>8,193</b>  | <b>2,250</b>                      | <b>2,185</b> | <b>1,919</b>                               | <b>1,838</b> |
| <b>Laclubar</b>                       | <b>12,777</b> | <b>3,445</b>                      | <b>3,571</b> | <b>2,924</b>                               | <b>2,836</b> |
| <b>Laleia</b>                         | <b>3,930</b>  | <b>1,181</b>                      | <b>1,189</b> | <b>817</b>                                 | <b>743</b>   |
| <b>Manatuto</b>                       | <b>15,446</b> | <b>4,741</b>                      | <b>4,609</b> | <b>3,109</b>                               | <b>2,987</b> |
| <b>Soibada</b>                        | <b>3,511</b>  | <b>237</b>                        | <b>213</b>   | <b>239</b>                                 | <b>259</b>   |

Fontes : Projeksaun Populasaun bazea ba Census Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

## II. PROGRESU FISIKU

### 2.1. Progressu Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan nia laran, husi lista #anexu B hatudu progresu aktual fulan ida ne'e ho nia prensentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu prentangen aktual fulan ida ne'e hatudu progresu fisiku komulativu husi prosentu antrior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare iha #anexu B, detallu ba back-up #anexu C, no Instrusaun Servisu #Anexu D.

### **III. OBSTÁCLO IHA TERENU**

#### **3.1. Obtáculo Servisu iha Terenu**

Observasaun geral ba projeto hirak nebe mak implementa iha Munisipio Manatuto

1. Projeto Lao la tuir tempo nebee asina entre parte rua
2. Laiha tekniko supervisaun husi projeto nain atu halo kontrolo diaramente
3. Tekniko kompanha la iha tereno
4. Skill badaen neebe mak la dun professional

Obstalku teknik A.D.N hasoru

1. Distansia ne'ebe dook difikulta teknik atu servisu lalais
2. Kondisaun estrada neébe a'at
3. Kontraktor sira ne'ebe mak servisu iha terreno barak mak la tuir Spesifikasaun ne'ebe iha kontartu laran.
4. Planu Mapamentu Enginheiro Munisipiu la konsege realiza tuir planu tamba hare hosi nia distansia ne'ebe dook.
5. Sistema dropbox iha Munisipiu dala ruma iha problema lina internet

## **IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU**

### **4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu**

1. Presija tebes atu aumenta ema iha Munisipiu atu nune bele halo servisu ba administrasaun ne'ebe efektivu.
2. Sebele sistema dropbox tau mos iha dekstop Munisipiu para labele atraja ami nia servisu.



Note: Asinatura Husi Eng. Municipio Manatuto

| Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Manatuto |            |                           |             |                |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                           | Deskrisaun | Identidade                |             |                |                                                                                       | Asinatura                                                                             |
|                                              |            | Naran Kompletu            | Nu. ID Card | Pozisaun       | Fotografia                                                                            |                                                                                       |
| 1                                            | Enjineiru  | Quico Adelino Junior      | 240         | Enjineiru EPAS |    |    |
|                                              |            | José R. Carlos Gusmão     | 168         | Enjineiru ITI  |   |  |
|                                              |            | Domingos da Costa e Silva | 250         | Enjineiru ITI  |  |  |

|   |           |                            |     |                   |                                                                                       |                                                                                       |
|---|-----------|----------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           | Adonis Julio<br>Fernandes  | 152 | Enjineiru<br>ME   |    |    |
| 2 | Enjineira | Olivia Soares              | 112 | Enjineira<br>VEBD |    |    |
| 3 | Motorista | Timoteo da Silva<br>Morais | 120 | Motorista         |  |  |



#ANEXU A

MUNICIPIO MANATUTO ( LISTA GERAL )

Localizasaun Projeto

| NU. | PMIS CODE | NARAN PROJ.                                                                                                       | DONO PROJ.                                | KAT. PROJ.     | SECTOR                                                                    | Posto Administrativo | MUNI.    | NARAN COMP.                                                    | MONT. KONT. (\$) | DATA KONT.     | PROG. FISIKU (%) | PROG. PAGA. (%) | PAGA. (\$)       | BAL. (\$)       | Status Projecto | OBS                                                      |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | P0281     | Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila ( 3.72 km ) area in Manatuto Municipality Manatuto                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI             | ESTRADAS                                                                  | Manatuto Villa       | Manatuto | Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda                        | \$ 2,561,405.06  | Aug. 25, 2018  | 63.80%           | 57.33%          | \$ 1,468,479.04  | \$ 1,092,926.02 | ON-GOING        |                                                          |
| 2   | P0282     | Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte ( 4.68 km ) in Manatuto Municipio Manatuto | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI             | ESTRADAS                                                                  | Manatuto Villa       | Manatuto | Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda                           | \$ 3,029,514.40  | Aug. 25, 2017  | 89.20%           | 79.82%          | \$ 2,418,275.38  | \$ 611,239.02   | ON-GOING        |                                                          |
| 3   | P0326     | Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto                                                                 | SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU  | FI             | JUVENTUDE NO DESPORTU                                                     | Manatuto Villa       | Manatuto | Obrai Unipesoal, Lda                                           | \$ 2,362,976.44  | June 30, 2015  | 82.08%           | 76.00%          | \$ 1,795,843.89  | \$ 567,132.55   | ON-GOING        |                                                          |
| 4   | P0377     | Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction ( Sta. 65+235 - 100+355 )           | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI             | IMPRESTIMO                                                                | Manatuto Villa       | Manatuto | R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group | \$ 28,011,854.94 | Feb. 10, 2014  | 94.91%           | 85.62%          | \$ 23,983,565.18 | \$ 4,028,289.76 | ON-GOING        |                                                          |
| 5   | P0379     | Consultant Supervision (M-L & L-N)                                                                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI             | IMPRESTIMO                                                                | Manatuto Villa       | Manatuto | Sinotech Engineering Consultant                                | \$ 4,405,546.00  | Sept. 3, 2014  | 73.76%           | 66.02%          | \$ 2,908,484.28  | \$ 1,497,061.72 | ON-GOING        |                                                          |
| 6   | P0788     | Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto                                | ESTATAL                                   | PDIM           | TURISMO                                                                   | Manatuto Villa       | Manatuto | Carya Timor Leste Unip. Lda                                    | \$ 79,155.54     | Dec. 18, 2019  | 88.07%           | 79.26%          | \$ 62,737.67     | \$ 16,417.87    | ON-GOING        |                                                          |
| 7   | P0789     | Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto                                             | ESTATAL                                   | PDIM           | TURISMO                                                                   | Manatuto Villa       | Manatuto | Carya Timor Leste Lda                                          | \$ 226,400.73    | Dec. 18, 2019  | 43.70%           | 10.97%          | \$ 24,834.32     | \$ 201,566.41   | ON-GOING        |                                                          |
| 8   | P0872     | Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto                                                               | MINISTERIO DA JUSTICA                     | LM-BS          | EDIFICIOS PUBLICOS                                                        | Manatuto Villa       | Manatuto | Baboe Unip Lda                                                 | \$ 29,275.84     | March 1, 2020  | 15.92%           | 15.92%          | \$ 4,660.85      | \$ 24,614.99    | ON-GOING        |                                                          |
| 9   | P0954     | Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Municipiu Manatuto, Timor Leste                                                  | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19 | SAUDE                                                                     | Manatuto Villa       | Manatuto | Talamori Unip.Lda                                              | \$ 262,983.65    | 09-Dec-20      | 100.00%          | 97.19%          | \$ 255,587.87    | \$ 7,395.78     | FHO             | Projecto ne Finaliza ona                                 |
| 10  | P2538     | New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality                                  | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19 | EDIFICIOS PUBLICOS                                                        | Manatuto Villa       | Manatuto | K-6, UNIPESSOAL LDA                                            | \$ 257,748.51    | Jan. 12, 2022  | 88.89%           | 74.56%          | \$ 192,164.43    | \$ 65,584.08    | ON-GOING        |                                                          |
| 11  | P2539     | Supply and Installtion Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality           | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19 | EDIFICIOS PUBLICOS                                                        | Manatuto Villa       | Manatuto | Fraternity Unipessoal Lda                                      | \$ 77,936.20     | Jan. 12, 2022  | 96.46%           | 86.81%          | \$ 67,657.53     | \$ 10,278.67    | ON-GOING        |                                                          |
| 12  | P1806     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala                                                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP          | EDUKASAUN                                                                 | Manatuto Villa       | Manatuto | MEJD PKRIE ESG KAY RALA                                        | \$ 62,996.83     | Oct. 15, 2021  | 54.64%           | 48.32%          | \$ 30,440.24     | \$ 32,556.59    | ON-GOING        |                                                          |
| 13  | P1808     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau                                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP          | EDUKASAUN                                                                 | Manatuto Villa       | Manatuto | MEJD PKRIE EBF RENTAU                                          | \$ 64,383.50     | Oct. 15, 2021  | 74.71%           | 50.49%          | \$ 32,504.67     | \$ 31,878.83    | ON-GOING        |                                                          |
| 14  | P1809     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor                                                                        | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP          | EDUKASAUN                                                                 | Manatuto Villa       | Manatuto | MEJD PKRIE PE REMBOR                                           | \$ 88,918.34     | Oct. 15, 2021  | 58.03%           | 44.89%          | \$ 39,919.56     | \$ 48,998.78    | ON-GOING        | Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 6.00%  |
| 15  | P1811     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato                                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP          | EDUKASAUN                                                                 | Manatuto Villa       | Manatuto | MEJD PKRIE EBF OBRATO                                          | \$ 66,144.65     | Oct. 15, 2021  | 74.48%           | 50.49%          | \$ 33,395.94     | \$ 32,748.71    | ON-GOING        | Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 1.47%  |
| 16  | P2041     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik                                                                      | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP          | EDUKASAUN                                                                 | Manatuto Villa       | Manatuto | MEJD PKRIE EBF BAHADIK                                         | \$ 100,047.31    | Oct. 15, 2021  | 14.58%           | 14.58%          | \$ 14,590.20     | \$ 85,457.11    | ON-GOING        |                                                          |
| 17  | P1953     | Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto                                                                    | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-CD          | EDUKASAUN                                                                 | Manatuto Villa       | Manatuto | Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda                            | \$ 182,701.57    | Dec. 7, 2022   | 11.99%           | 6.14%           | \$ 11,214.18     | \$ 171,487.39   | ON-GOING        | Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 0.97%  |
| 18  | P1581     | Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km                                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI             | ESTRADAS E PONTES                                                         | Manatuto Villa       | Manatuto | Kartini Unipessoal Lda                                         | \$ 394,194.73    | April 28, 2022 | 11.35%           | 0.00%           | \$ -             | \$ 394,194.73   | ON-GOING        | Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 2.85%  |
| 19  | P1125     | Emergency Supply and Gabion Construction for Weten Transmission Pipeline,Manatuto Municipality                    | Be'e Timor Leste, Empresa Publica         | EMERGENCY      | MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES | Manatuto Villa       | Manatuto | Dyanyi Unipessoal, Lda                                         | \$ 127,786.80    | Sept. 05, 2022 | 21.64%           | 20.56%          | \$ 26,270.01     | \$ 101,516.79   | ON-GOING        | Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 21.64% |



#ANEXU A  
MUNICIPIO MANATUTO ( LISTA GERAL )

Localizasaun Projeto

| NU. | PMIS CODE | NARAN PROJ.                                                                                                                                    | DONO PROJ.                                | KAT. PROJ. | SECTOR                        | Posto Administrativo | MUNI.    | NARAN COMP.                                        | MONT. KONT. (\$) | DATA KONT.     | PROG. FISIKU (%) | PROG. PAGA. (%) | PAGA. (\$)       | BAL. (\$)       | Status Projecto | OBS                                                    |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 20  | P0627     | Rehabilitasaun Kampu Foteboli iha Postu Administrativu Laleia                                                                                  | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU            | LM-CD      | EDIFICIOS PUBLICOS            | Laleia               | Manatuto | DCO Unip.Lda                                       | \$ 277,330.43    | July 18, 2019  | 0.00%            | 0.00%           | \$ -             | \$ 277,330.43   | ON-GOING        |                                                        |
| 21  | P0986     | R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800                                                                     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | ESTRADAS                      | Laleia               | Manatuto | As Jazesia Unipessoal Lda                          | \$ 28,258.31     | June 10, 2021  | 100.00%          | 100.00%         | \$ 28,258.31     | \$ -            | FHO             | Projecto ne Finaliza ona                               |
| 22  | P1810     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui                                                                                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP      | EDUKASAUN                     | Laleia               | Manatuto | MEJD PKRIE EP CAIRUI                               | \$ 86,883.29     | Oct. 15, 2021  | 64.02%           | 45.49%          | \$ 39,524.89     | \$ 47,358.40    | ON-GOING        | Progreso Fisiko iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 5.84% |
| 23  | P0114     | New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality                             | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI         | ELETRIFIKASAUN NASIONAL       | Laclubar             | Manatuto | Tasibala III Unip. Lda                             | \$ 695,420.83    | June 7, 2016   | 91.52%           | 82.11%          | \$ 571,034.27    | \$ 124,386.56   | ON-GOING        |                                                        |
| 24  | P0378     | Road Network Upgrading Sector Project ( RNUSP )Upgrading and Maintenance of Laclubar Junction - Natarbora Road ( Sta. 100+360 - Sta. 144+995 ) | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI         | IMPRESTIMO                    | Laclubar             | Manatuto | China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD   | \$ 34,379,729.54 | Nov. 20, 2014  | 98.54%           | 88.78%          | \$ 30,520,639.32 | \$ 3,859,090.22 | ON-GOING        |                                                        |
| 25  | P0899     | Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)                                                      | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS      | ESTRADAS                      | Laclubar             | Manatuto | Hatuwari Unip. Lda                                 | \$ 481,029.67    | Aug. 25, 2020  | 54.37%           | 11.80%          | \$ 126,501.30    | \$ 354,528.37   | ON-GOING        |                                                        |
| 26  | P0917     | Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)                                                                  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS      | ESTRADAS                      | Laclubar             | Manatuto | Ryzena Unipessoal Lda                              | \$ 194,402.72    | Dec. 20, 2019  | 82.83%           | 74.55%          | \$ 144,924.09    | \$ 49,478.63    | ON-GOING        |                                                        |
| 27  | P0977     | R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000                                                                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | ESTRADAS                      | Laclubar             | Manatuto | Sun Rise Golden Construction 02 Lda                | \$ 448,209.39    | June 10, 2021  | 95.04%           | 82.05%          | \$ 367,756.59    | \$ 80,452.80    | ON-GOING        |                                                        |
| 28  | P0983     | R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000                                                                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | ESTRADAS                      | Laclubar             | Manatuto | Adahiak Orlao Unipessoal Lda                       | \$ 213,772.95    | June 10, 2021  | 7.12%            | 0.00%           | \$ -             | \$ 213,772.95   | ON-GOING        |                                                        |
| 29  | P2781     | Konstrasaun Postu Saude Laclubar Funar- Postu Administrativo Laclubar                                                                          | MINISTERIO SAUDE                          | PDIM       | SAUDE                         | Laclubar             | Manatuto | MERCY, Unipessoal Lda                              | \$ 88,045.73     | July 28, 2019  | 12.08%           | 10.46%          | \$ 9,212.19      | \$ 78,833.54    | ON-GOING        | Progreso Fisiko iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 0.45% |
| 30  | P1803     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara                                                                                                    | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP      | EDUKASAUN                     | Laclubar             | Manatuto | MEJD PKRIE EBF BATARA                              | \$ 102,060.99    | Oct. 15, 2021  | 77.87%           | 44.47%          | \$ 45,382.05     | \$ 56,678.94    | ON-GOING        |                                                        |
| 31  | P1804     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um                                                                                                  | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP      | EDUKASAUN                     | Laclubar             | Manatuto | MEJD PKRIE EBF AISIU-UM                            | \$ 100,162.30    | Oct. 15, 2021  | 42.21%           | 25.59%          | \$ 25,626.77     | \$ 74,535.53    | ON-GOING        |                                                        |
| 32  | P0316     | Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste                                              | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI         | PONTES                        | Soibada              | Manatuto | FIRDO UNIPESOAL LDA                                | \$ 3,553,954.20  | Feb. 27, 2017  | 100.00%          | 93.93%          | \$ 3,338,377.84  | \$ 215,576.36   | ON-GOING        |                                                        |
| 33  | P0932     | For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town                  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | ESTRADAS                      | Soibada              | Manatuto | Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan | \$ 164,154.00    | March 25, 2020 | 70.00%           | 70.00%          | \$ 114,907.80    | \$ 49,246.20    | ON-GOING        |                                                        |
| 34  | P0981     | R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000                                                         | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | ESTRADAS                      | Soibada              | Manatuto | Manufahi Kiik Unip. Lda                            | \$ 203,036.57    | June 10, 2021  | 57.75%           | 41.78%          | \$ 84,819.65     | \$ 118,216.92   | ON-GOING        | Progreso Fisiko iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 1.30% |
| 35  | P0984     | R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700                                                                    | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | ESTRADAS                      | Soibada              | Manatuto | Ryzena Unipessoal Lda                              | \$ 196,112.23    | June 10, 2021  | 63.34%           | 30.42%          | \$ 59,662.31     | \$ 136,449.92   | ON-GOING        |                                                        |
| 36  | P1814     | Projetu Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto                                                                  | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-CD      | EDIFICIOS PUBLICOS            | Soibada              | Manatuto | Manufahi Kiik Unip. Lda                            | \$ 66,898.51     | Nov. 26, 2021  | 67.91%           | 55.80%          | \$ 37,330.95     | \$ 29,567.56    | ON-GOING        | Progreso Fisiko iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 1.10% |
| 37  | P1807     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik                                                                                                 | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP      | EDUKASAUN                     | Soibada              | Manatuto | MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK                           | \$ 102,512.31    | Oct. 15, 2021  | 50.42%           | 45.66%          | \$ 46,807.88     | \$ 55,704.43    | ON-GOING        | Progreso Fisiko iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 2.50% |
| 38  | P0940     | Construction of Sahen Bridge Approach Protection ( A14 ) Manatuto ( MPW-W-190157 ) (162)                                                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS      | FLOOD CONTROL                 | Barique              | Manatuto | Yoku Unipessoal Lda                                | \$ 242,560.14    | Oct. 24, 2019  | 100.00%          | 70.75%          | \$ 171,617.69    | \$ 70,942.45    | FHO             | Projecto ne Finaliza ona                               |
| 39  | P0404     | New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora                                                                  | MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS           | LM-CD      | AGRICULTURA                   | Barique              | Manatuto | Tasibala II Const                                  | \$ 370,511.25    | Sept. 13, 2016 | 17.59%           | 15.83%          | \$ 58,645.87     | \$ 311,865.38   | Abandona        | Abandona                                               |
| 40  | P0540     | Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manatuto Municipality (Manutensaun)                                     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Barique              | Manatuto | Zenobia Diak Unip.Lda                              | \$ 15,875.56     | Jan. 7, 2017   | 100.00%          | 87.26%          | \$ 13,853.09     | \$ 2,022.47     | PHO             | Abandona                                               |



## #ANEXU A

### MUNICIPIO MANATUTO ( LISTA GERAL )

Localizasaun Projeto

| NU. | PMIS CODE | NARAN PROJ.                                                                                                                       | DONO PROJ.                                                       | KAT. PROJ. | SECTOR                        | Posto Administrativo | MUNI.    | NARAN COMP.                   | MONT. KONT. (\$)         | DATA KONT.     | PROG. FISIKU (%) | PROG. PAGA. (%) | PAGA. (\$)               | BAL. (\$)               | Status Projecto | OBS                                                      |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 41  | P0784     | Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique                                                                                      | MINISTERIO SAUDE                                                 | PDIM       | SAUDE                         | Barique              | Manatuto | Malack II Unip. Lda           | \$ 116,914.88            | Sept. 23, 2019 | 71.10%           | 63.99%          | \$ 74,817.23             | \$ 42,097.65            | ON-GOING        |                                                          |
| 42  | P0873     | Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162                                                                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-BS      | AGUA E SANEAMENTO             | Barique              | Manatuto | Malaca Unip Lda               | \$ 162,377.94            | Oct. 8, 2019   | 46.50%           | 41.85%          | \$ 67,961.57             | \$ 94,416.37            | ON-GOING        |                                                          |
| 43  | P0921     | R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162) | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD      | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Barique              | Manatuto | Manufahi Kiik Unip. Lda       | \$ 141,684.96            | Aug. 25, 2019  | 41.78%           | 36.88%          | \$ 52,260.01             | \$ 89,424.95            | ON-GOING        |                                                          |
| 44  | P0978     | R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200                                                  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD      | ESTRADAS                      | Barique              | Manatuto | We'coi Unipessoal Lda         | \$ 343,111.47            | June 10, 2021  | 99.04%           | 21.97%          | \$ 75,370.79             | \$ 267,740.68           | ON-GOING        | Progresso Fisiko Iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 16.54% |
| 45  | P0982     | R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000                                              | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD      | ESTRADAS                      | Barique              | Manatuto | Linoel                        | \$ 296,211.81            | June 10, 2021  | 20.73%           | 15.96%          | \$ 47,266.94             | \$ 248,944.87           | ON-GOING        | Progresso Fisiko Iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 1.59%  |
| 46  | P0985     | R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000                                                         | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD      | ESTRADAS                      | Barique              | Manatuto | Gimso Brothers Unip. Lda      | \$ 300,792.46            | July 10, 2021  | 98.52%           | 52.76%          | \$ 158,690.94            | \$ 142,101.52           | ON-GOING        |                                                          |
| 47  | P1056     | New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora                                            | MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL | LM-CD      | EDIFICIOS PUBLICOS            | Barique              | Manatuto | Senizu                        | \$ 408,460.73            | Oct. 18, 2021  | 100.00%          | 90.00%          | \$ 367,614.65            | \$ 40,846.08            | PHO             | Progresso Fisiko Iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 4.31%  |
| 48  | P0061     | New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality                                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | FI         | ELETRIFIKASAUN NASIONAL       | Lacio                | Manatuto | Anopa Electrical Unip. Lda    | \$ 380,582.61            | Sept. 1, 2016  | 95.99%           | 72.08%          | \$ 274,330.03            | \$ 106,252.58           | ON-GOING        |                                                          |
| 49  | P0221     | Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto                                                                 | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | FI         | ESTRADAS                      | Lacio                | Manatuto | Sahan I Unip.Lda              | \$ 3,314.56              | Sept. 27, 2016 | 100.00%          | 90.00%          | \$ 2,983.11              | \$ 331.45               | PHO             | Falta Retensaun                                          |
| 50  | P0926     | For Roads & Bridges Maintenance Section : Mantanen Lacio, Manatuto Municipality                                                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD      | ESTRADAS                      | Lacio                | Manatuto | Egana, Unip. Lda              | \$ 223,843.79            | Dec. 13, 2019  | 68.89%           | 56.58%          | \$ 126,647.74            | \$ 97,196.05            | ON-GOING        |                                                          |
| 51  | P0692     | Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food                                                                                     | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA                          | LM-BS      | EDIFICIOS PUBLICOS            | Lacio                | Manatuto | Esa-Un                        | \$ 50,745.00             | May 2, 2016    | 38.83%           | 37.13%          | \$ 18,841.29             | \$ 31,903.71            | PENDENTE        |                                                          |
| 52  | P0776     | Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilimano                                                                                     | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA                          | PDIM       | COMERCIO                      | Lacio                | Manatuto | Surprise Unip. Lda            | \$ 153,942.39            | Sept. 12, 2016 | 97.16%           | 84.29%          | \$ 129,753.97            | \$ 24,188.42            | ON-GOING        |                                                          |
| 53  | P0396     | National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)                                                             | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | FI         | IMPRESTIMO                    | Lacio                | Manatuto | Sinohydro Corporation Limited | \$ 48,314,975.87         | May.3, 2016    | 88.12%           | 87.98%          | \$ 42,506,027.78         | \$ 5,808,948.09         | ON-GOING        |                                                          |
| 54  | P1805     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun                                                                                    | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU                        | LM-TP      | EDUKASAUN                     | Lacio                | Manatuto | MEJD PKRIE EBC REMANARUN      | \$ 98,147.27             | Oct. 15, 2021  | 46.75%           | 44.74%          | \$ 43,908.27             | \$ 54,239.00            | ON-GOING        | Progresso Fisiko Iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 1.93%  |
| 55  | P2603     | Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp at Behau                                                                               | MINISTERIO DA DEFESA                                             | LM-BS      | FLOOD CONTROL                 | Lacio                | Manatuto | Baboe Unip Lda                | \$ 189,578.02            | May 23, 2022   | 100.00%          | 87.76%          | \$ 166,368.56            | \$ 23,209.46            | PHO             |                                                          |
|     |           | <b>TOTAL</b>                                                                                                                      |                                                                  |            |                               |                      |          |                               | <b>\$ 135,587,575.72</b> |                |                  |                 | <b>\$ 113,288,350.98</b> | <b>\$ 22,276,015.28</b> |                 |                                                          |

1. Eng. José R. Carlos. Gusmão  
Eng. ba Projeto Infrastrutura e  
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Prepara Husi:  
2. Eng. Domingos D.X. Silva  
Eng. ba Projeto Infrastrutura e  
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

3. Eng. Guico Adelino Junior  
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Edificiu Público, Be'e  
no Saneamento Municipiu Manatuto, ADN, I.P

4. Eng. Adonis Julio Fernandes  
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

Certifika Husi:  
Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas  
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De  
Qualidade ADN,I.P



LISTA #ANEXU B

| PROGRESSU FISIKU KADA FULAN |                                                                                                                                   |                                           |                   |                                                                           |                      |           |                                                                |                                                 |                        |                |                   |                     |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                             |                                                                                                                                   |                                           |                   |                                                                           | LOKALIZASAUN PROJETU |           |                                                                |                                                 |                        |                | May-23            |                     |                     |
| NU.                         | NARAN PROJETU                                                                                                                     | DONO PROJETU                              | KATEGORIA PROJETU | SECTOR                                                                    | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHA                                                 | NUMERO KONTRATU                                 | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU  | Previous Progress | This Month Progress | Komulativo Progress |
| 1                           | Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila ( 3.72 km ) area in Manatuto Municipality Manatuto                                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                                                                  | Manatuto Villa       | Manatuto  | Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda                        | SSS/062/MOPTC-2017                              | \$ 2,561,405.06        | Aug. 25, 2018  | 63.80%            |                     | 63.80%              |
| 2                           | Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte ( 4.68 km ) in Manatuto Municipio Manatuto                 | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                                                                  | Manatuto Villa       | Manatuto  | Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda                           | SSS/061/MOPTC-2017                              | \$ 3,029,514.40        | Aug. 25, 2017  | 89.20%            |                     | 89.20%              |
| 3                           | Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto                                                                                 | SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU  | FI                | JUVENTUDE NO DESPORTU                                                     | Manatuto Villa       | Manatuto  | Obrai Unipesoal, Lda                                           | ICB/0128/SEJD-2014                              | \$ 2,362,976.44        | June 30, 2015  | 82.08%            |                     | 82.08%              |
| 4                           | Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction ( Sta. 65+235 - 100+355 )                           | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | IMPRESTIMO                                                                | Manatuto Villa       | Manatuto  | R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group | ICB/023/MPW-2013                                | \$ 28,011,854.94       | Feb. 10, 2014  | 94.91%            |                     | 94.91%              |
| 5                           | Consultant Supervision (M-L & L-N)                                                                                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | IMPRESTIMO                                                                | Manatuto Villa       | Manatuto  | Sinotech Engineering Consultant                                | QCBS/019/MPW-2013                               | \$ 4,405,546.00        | Sept. 3, 2014  | 73.76%            |                     | 73.76%              |
| 6                           | Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto                                                | ESTATAL                                   | PDIM              | TURISMO                                                                   | Manatuto Villa       | Manatuto  | Carya Timor Leste Unip. Lda                                    | 08/PDIM-I/MNTT/XII/2019                         | \$ 79,155.54           | Dec. 18, 2019  | 88.07%            |                     | 88.07%              |
| 7                           | Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto                                                             | ESTATAL                                   | PDIM              | TURISMO                                                                   | Manatuto Villa       | Manatuto  | Carya Timor Leste Lda                                          | 01/PDIM-I/MNTT/XII/2019                         | \$ 226,400.73          | Dec. 18, 2019  | 43.70%            |                     | 43.70%              |
| 8                           | Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto                                                                               | MINISTERIO DA JUSTICA                     | LM-BS             | EDIFICIOS PUBLICOS                                                        | Manatuto Villa       | Manatuto  | Baboe Unip Lda                                                 | 019/Janeiro/2020                                | \$ 29,275.84           | March 1, 2020  | 15.92%            |                     | 15.92%              |
| 9                           | Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Municipio Manatuto, Timor Leste                                                                  | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | SAUDE                                                                     | Manatuto Villa       | Manatuto  | Talamori Unip.Lda                                              | RDTL-MS-DNA-DC-20-254                           | \$ 262,983.65          | 9-Dec-20       | 100.00%           |                     | 100.00%             |
| 10                          | New Construction of Fence at Isolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality                                                  | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | EDIFICIOS PUBLICOS                                                        | Manatuto Villa       | Manatuto  | K-6, UNIPESSOAL LDA                                            | RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227                       | \$ 257,748.51          | Jan. 12, 2022  | 88.89%            |                     | 88.89%              |
| 11                          | Supply and Installtion Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality                           | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | EDIFICIOS PUBLICOS                                                        | Manatuto Villa       | Manatuto  | Fraternity Unipessoal Lda                                      | RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227                       | \$ 77,936.20           | Jan. 12, 2022  | 92.28%            |                     | 92.28%              |
| 12                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala                                                                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                                                                 | Manatuto Villa       | Manatuto  | MEJD PKRIE ESG KAY RALA                                        | -                                               | \$ 62,996.83           | Oct. 15, 2021  | 54.64%            |                     | 54.64%              |
| 13                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau                                                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                                                                 | Manatuto Villa       | Manatuto  | MEJD PKRIE EBF RENTAU                                          | -                                               | \$ 64,383.50           | Oct. 15, 2021  | 74.71%            |                     | 74.71%              |
| 14                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor                                                                                        | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                                                                 | Manatuto Villa       | Manatuto  | MEJD PKRIE PE REMBOR                                           | -                                               | \$ 88,918.34           | Oct. 15, 2021  | 52.03%            | 6.00%               | 58.03%              |
| 15                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato                                                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                                                                 | Manatuto Villa       | Manatuto  | MEJD PKRIE EBF OBRATO                                          | -                                               | \$ 66,144.65           | Oct. 15, 2021  | 73.00%            | 1.47%               | 74.48%              |
| 16                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik                                                                                      | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                                                                 | Manatuto Villa       | Manatuto  | MEJD PKRIE EBF BAHADIK                                         | -                                               | \$ 100,047.31          | Oct. 15, 2021  | 14.58%            |                     | 14.58%              |
| 17                          | Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto                                                                                    | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-CD             | EDUKASAUN                                                                 | Manatuto Villa       | Manatuto  | Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda                            |                                                 | \$ 182,701.57          | Dec. 7, 2022   | 11.01%            | 0.97%               | 11.99%              |
| 18                          | Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km                                                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES                                                         | Manatuto Villa       | Manatuto  | Kartini Unipessoal Lda                                         |                                                 | \$ 394,194.73          | April 28, 2022 | 8.50%             | 2.85%               | 11.35%              |
| 19                          | Emergency Supply and Gabion Construction for Weten Transmission Pipeline,Manatuto Municipality                                    | Be'e Timor Leste, Empresa Publica         | EMERGENCY         | MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES | Manatuto Villa       | Manatuto  | Dyanyi Unipessoal, Lda                                         | NCB/055/BTL,E.P-2022                            | \$ 127,786.80          | Sept. 05, 2022 | 21.64%            |                     | 21.64%              |
| 20                          | Rehabilitasaun Kampu Foteboli iha Postu Administrativu Laleia                                                                     | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU            | LM-CD             | EDIFICIOS PUBLICOS                                                        | Laleia               | Manatuto  | DCO Unip.Lda                                                   | 011LM/AND/MPIE/II/DILI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT | \$ 277,330.43          | July 18, 2019  | 0.00%             |                     | 0.00%               |
| 21                          | R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800                                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                                                                  | Laleia               | Manatuto  | As Jazesia Unipessoal Lda                                      | MPW-W-210055                                    | \$ 28,258.31           | June 10, 2021  | 100.00%           |                     | 100.00%             |
| 22                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui                                                                                        | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                                                                 | Laleia               | Manatuto  | MEJD PKRIE EP CAIRUI                                           | -                                               | \$ 86,883.29           | Oct. 15, 2021  | 58.18%            | 5.84%               | 64.02%              |
| 23                          | New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ELETRIFIKASAUN NASIONAL                                                   | Laclubar             | Manatuto  | Tasibala III Unip. Lda                                         | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412            | \$ 695,420.83          | June 7, 2016   | 91.52%            |                     | 91.52%              |
| 24                          | Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)                                                         | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | IMPRESTIMO                                                                | Laclubar             | Manatuto  | China Nuclear Industry 22ND Construction Co.; LTD              | ICB/04/MPW-2014                                 | \$ 34,379,729.54       | Nov. 20, 2014  | 98.54%            |                     | 98.54%              |
| 25                          | Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)                                         | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS             | ESTRADAS                                                                  | Laclubar             | Manatuto  | Hatuwari Unip. Lda                                             | MPW-W-NCB-R-190035                              | \$ 481,029.67          | Aug. 25, 2020  | 54.37%            |                     | 54.37%              |
| 26                          | Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)                                                     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS             | ESTRADAS                                                                  | Laclubar             | Manatuto  | Ryzena Unipessoal Lda                                          | MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020                  | \$ 194,402.72          | Dec. 20, 2019  | 82.83%            |                     | 82.83%              |
| 27                          | R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000                                                      | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                                                                  | Laclubar             | Manatuto  | Sun Rise Golden Construction 02 Lda                            | MPW-W-210057                                    | \$ 448,209.39          | June 10, 2021  | 95.04%            |                     | 95.04%              |
| 28                          | R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000                                                          | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                                                                  | Laclubar             | Manatuto  | Adahiak Oriao Unipessoal Lda                                   | MPW-W-210056                                    | \$ 213,772.95          | June 10, 2021  | 7.12%             |                     | 7.12%               |
| 29                          | Konstrasaun Postu Saude Laclubar Funar- Postu Administrativo Laclubar                                                             | MINISTERIO SAUDE                          | PDIM              | SAUDE                                                                     | Laclubar             | Manatuto  | MERCY, Unipessoal Lda                                          | 04/PDIM-I/MNTT/VIII/2022                        | \$ 120,962.71          | July 28, 2019  | 11.63%            | 0.45%               | 12.08%              |
| 30                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara                                                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                                                                 | Laclubar             | Manatuto  | MEJD PKRIE EBF BATARA                                          | -                                               | \$ 102,060.99          | Oct. 15, 2021  | 77.87%            |                     | 77.87%              |
| 31                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um                                                                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                                                                 | Laclubar             | Manatuto  | MEJD PKRIE EBF AISIU-UM                                        | -                                               | \$ 100,162.30          | Oct. 15, 2021  | 42.21%            |                     | 42.21%              |
| 32                          | Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste                                 | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | PONTES                                                                    | Soibada              | Manatuto  | FIRDO UNIPESSOAL LDA                                           | SSS/013/MOPTC-2017                              | \$ 3,384,214.14        | Feb. 27, 2017  | 100.00%           |                     | 100.00%             |
| 33                          | For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                                                                  | Soibada              | Manatuto  | Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan             | MPW-CS-2000024                                  | \$ 164,154.00          | March 25, 2020 | 70.00%            |                     | 70.00%              |
| 34                          | R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000                                            | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                                                                  | Soibada              | Manatuto  | Manufahi Kiik Unip. Lda                                        | MPW-W-210059                                    | \$ 203,036.57          | June 10, 2021  | 56.45%            | 1.30%               | 57.75%              |
| 35                          | R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700                                                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                                                                  | Soibada              | Manatuto  | Ryzena Unipessoal Lda                                          | MPW-W-210060                                    | \$ 196,112.23          | June 10, 2021  | 63.34%            |                     | 63.34%              |
| 36                          | Projetu Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto                                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-CD             | EDIFICIOS PUBLICOS                                                        | Soibada              | Manatuto  | Manufahi Kiik Unip. Lda                                        | RFQ-R : 21/036 - Q                              | \$ 66,898.51           | Nov. 26, 2021  | 66.81%            | 1.10%               | 67.91%              |
| 37                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik                                                                                    | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                                                                 | Soibada              | Manatuto  | MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK                                       | -                                               | \$ 102,512.31          | Oct. 15, 2021  | 47.92%            | 2.50%               | 50.42%              |
| 38                          | Construction of Sahen Bridge Approach Protection ( A14 ) Manatuto ( MPW-W-190157 ) (162)                                          | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS             | FLOOD CONTROL                                                             | Barique              | Manatuto  | Yoku Unipessoal Lda                                            | MPW-W-190157                                    | \$ 242,560.14          | Oct. 24, 2019  | 70.75%            |                     | 70.75%              |
| 39                          | New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora                                                     | MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS           | LM-CD             | AGRICULTURA                                                               | Barique              | Manatuto  | Tasibala II Const                                              | RDTL/PO:2016-11272                              | \$ 370,511.25          | Sept. 13, 2016 | 17.59%            |                     | 17.59%              |
| 40                          | Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN                                             | Barique              | Manatuto  | Zenobia Diak Unip.Lda                                          | MPWTC - CD - 170003                             | \$ 15,875.56           | Jan. 7, 2017   | 100.00%           |                     | 100.00%             |
| 41                          | Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique                                                                                      | MINISTERIO SAUDE                          | PDIM              | SAUDE                                                                     | Barique              | Manatuto  | Malack II Unip. Lda                                            | 03/PDIM-I/MNTT/IX/2019                          | \$ 116,914.88          | Sept. 23, 2019 | 71.10%            |                     | 71.10%              |
| 42                          | Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162                                                                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS             | AGUA E SANEAMENTO                                                         | Barique              | Manatuto  | Malaca Unip Lda                                                | No. Kontratu : MOP-W-190233                     | \$ 162,377.94          | Oct. 8, 2019   | 46.50%            |                     | 46.50%              |
| 43                          | R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162) | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN                                             | Barique              | Manatuto  | Manufahi Kiik Unip. Lda                                        | MPW-W-W-190080                                  | \$ 141,684.96          | Aug. 25, 2019  | 41.78%            |                     | 41.78%              |



## LISTA #ANEXU B

### PROGRESSU FISIKU KADA FULAN

| LOKALIZASAUN PROJETU |                                                                                                 |                                                                  |                   |                         |                      |           |                               |                                      |                        |                | May-23            |                     |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| NU.                  | NARAN PROJETU                                                                                   | DONO PROJETU                                                     | KATEGORIA PROJETU | SECTOR                  | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHA                | NUMERO KONTRATU                      | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU  | Previous Progress | This Month Progress | Kumulativo Progress |
| 44                   | R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD             | ESTRADAS                | Barique              | Manatuto  | We'coi Unipessoal Lda         | MPW-W-210062                         | \$ 343,111.47          | June 10, 2021  | 82.50%            | 16.54%              | 99.04%              |
| 45                   | R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000            | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD             | ESTRADAS                | Barique              | Manatuto  | Linoel                        | MPW-W-210061                         | \$ 296,211.82          | June 10, 2021  | 19.14%            | 1.59%               | 20.73%              |
| 46                   | R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD             | ESTRADAS                | Barique              | Manatuto  | Gimso Brothers Unip. Lda      | MPW-W-210058                         | \$ 300,792.46          | July 10, 2021  | 98.52%            |                     | 98.52%              |
| 47                   | New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora          | MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACÃO NACIONAL | LM-CD             | EDIFICIOS PUBLICOS      | Barique              | Manatuto  | Senizu                        |                                      | \$ 408,460.73          |                | 95.69%            | 4.31%               | 100.00%             |
| 48                   | New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | FI                | ELETRIFIKASAUN NASIONAL | Lacio                | Manatuto  | Anopa Electrical Unip. Lda    | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421 | \$ 380,582.61          | Sept. 1, 2016  | 95.99%            |                     | 95.99%              |
| 49                   | Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto                               | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | FI                | ESTRADAS                | Lacio                | Manatuto  | Sahan I Unip.Lda              | SSS/304/MOPTC-2016                   | \$ 3,314.56            | Sept. 27, 2016 | 100.00%           |                     | 100.00%             |
| 50                   | Routine Roads Maintenance - Lacio, Manatuto Municipality                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD             | ESTRADAS                | Lacio                | Manatuto  | Egana, Unip. Lda              | MPW-W-190251                         | \$ 223,836.50          | Dec. 13, 2019  | 68.89%            |                     | 68.89%              |
| 51                   | Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food                                                   | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA                          | LM-BS             | EDIFICIOS PUBLICOS      | Lacio                | Manatuto  | Esa-Un                        | RDTL:74/GMTAC/X/2015                 | \$ 50,745.00           | May 2, 2016    | 38.83%            |                     | 38.83%              |
| 52                   | Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilmano                                                    | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA                          | PDIM              | COMERCIO                | Lacio                | Manatuto  | Surprise Unip. Lda            | 07/PDIM-II/MNTT/VIII/2016            | \$ 153,942.39          | Sept. 12, 2016 | 97.16%            |                     | 97.16%              |
| 53                   | National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)                           | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | FI                | IMPRESTIMO              | Lacio                | Manatuto  | Sinohydro Corporation Limited | ICB/07/MPW-2014                      | \$ 48,314,975.87       | May 3, 2016    | 88.12%            |                     | 88.12%              |
| 54                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun                                                  | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU                        | LM-TP             | EDUKASAUN               | Lacio                | Manatuto  | MEJD PKRIE EBC REMANARUN      | -                                    | \$ 98,147.27           | Oct. 15, 2021  | 44.82%            | 1.93%               | 46.75%              |
| 55                   | Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp at Behau                                             | MINISTERIO DA DEFESA                                             | LM-BS             | FLOOD CONTROL           | Lacio                | Manatuto  | Baboe Unip Lda                |                                      | \$ 189,578.02          | May 23, 2022   | 97.51%            |                     | 97.51%              |

Prepara Husi:

1. Eng. José R. Carlos. Gusmão  
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun  
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

3. Eng. Adonis Vitor Fernandes  
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

2. Eng. Domingos D.X.Silva  
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun  
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

4. Eng. Guico Adalino Junior  
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun  
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :

Eng. Remigio da c.s dos Santos  
Eng. Senior ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun, ADN, I.P

Eng. Aracil Francisco Xavier de D. Jeronimo  
Eng. Senior ba Projecto Edificio Publico Bêé no Saneamento, ADN, I.P

Eng. Deolindo de Paula Marques  
ChefeSeksau ME& ITC, ADN, I.P

Certifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas  
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De  
Qualidade ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C1 (MV-14)

### Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Rembor**  
No. kontratu :

**Data Inspesaun : 24 Maio 2023**

Fatin Inspesaun : Rembor, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5103S,

Latetude : 126,0157E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : **Quico Adelino Junior**

#### Sketch & Foto Desenho

##### Sketch Item servisu

Progressu Fiziku iha fulan ida  
ne'e: Iha fulan ida ne'e Ba  
Classroom ninian , grupu  
finaliza ona servisu monta  
keramik ninian no agora  
dadaun kontinua hela ho  
servisu monta keramik ba  
haris fatin nian.

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual







MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C1 (MV-14)


### Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Rembor

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu.

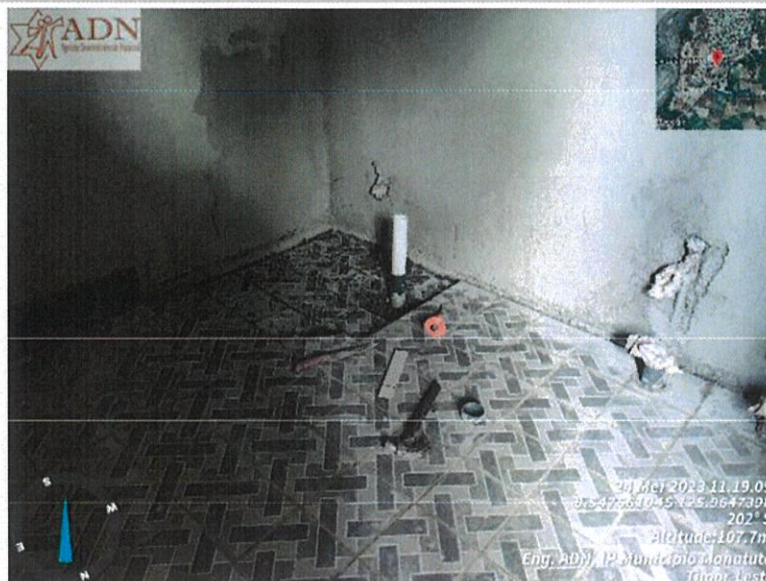

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .







MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO  
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.  
Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C2 ( MV-14) SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Rembor

Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto

Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

| NO  | MAIN SUMMARY                   | ORIGINAL CONTRACT |              | PROGRESS REPORT BY ADN IP |            |               |            |                  |            |
|-----|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|
|     |                                | Page No           | AMOUNT       | PREVIOUS PROGRESS         |            | PROGRESS MAY  |            | PROGRESS TO DATE |            |
|     |                                |                   |              | Amount (US\$)             | Weigth (%) | Amount (US\$) | Weigth (%) | Amount (US\$)    | Weigth (%) |
| I   | PRELIMINARIES                  | PP/3 (i)          | \$ 3.075,00  | \$ 1.850,00               | 2,08%      | \$ 125,00     | 0,14%      | \$ 1.975,00      | 2,22%      |
| II  | CLASSROOM BUILDING C2          | C2/47 (i)         | \$ 57.778,14 | \$ 41.106,01              | 46,23%     | \$ 5.212,78   | 5,86%      | \$ 46.318,79     | 52,09%     |
| III | PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS | SW/23 (i)         | \$ 9.959,28  | \$ -                      | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      | \$ -             | 0,00%      |
| A   | CONSTRUCTION COST              |                   | \$ 70.812,42 | \$ 42.956,01              | 48,31%     | \$ 5.337,78   | 6,00%      | \$ 48.293,79     | 54,31%     |
| B   | CONTIGENCIA                    |                   | \$ 3.000,00  | \$ -                      | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      | \$ -             | 0,00%      |
| C   | OVERHEAD                       |                   | \$ 6.340,00  | \$ 3.310,00               | 3,72%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 3.310,00      | 3,72%      |
| D   | GRAND TOTAL                    |                   | \$ 88.918,34 | \$ 46.266,01              | 52,03%     | \$ 5.337,78   | 6,00%      | \$ 51.603,79     | 58,04%     |

Prepara husi :

( Eng. Quico Adelino Junior )  
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no  
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P.

Verifika Husi :

( Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo )  
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua  
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

( Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e  
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C1 (MV-15)

### Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato  
No. kontratu :

**Data Inspesaun** : 16 Maio 2023

Fatin Inspesaun : Obrato, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5072S,

Latetude : 125,9953E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Progressu fiziku iha fulan ida ne'e :  
ba classroom building nian kuaze  
finalize ona servisu monta keramik  
ninian, no agora dadaun grupo sei  
kompleta mos servisu finishing ninian  
balun neebe mak sei falta, hodi hein  
adiantamentu tuir mai hodi finaliza  
konstrusaun refere.







MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C1 (MV-15)

### Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato


No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Sketch Item servisu.

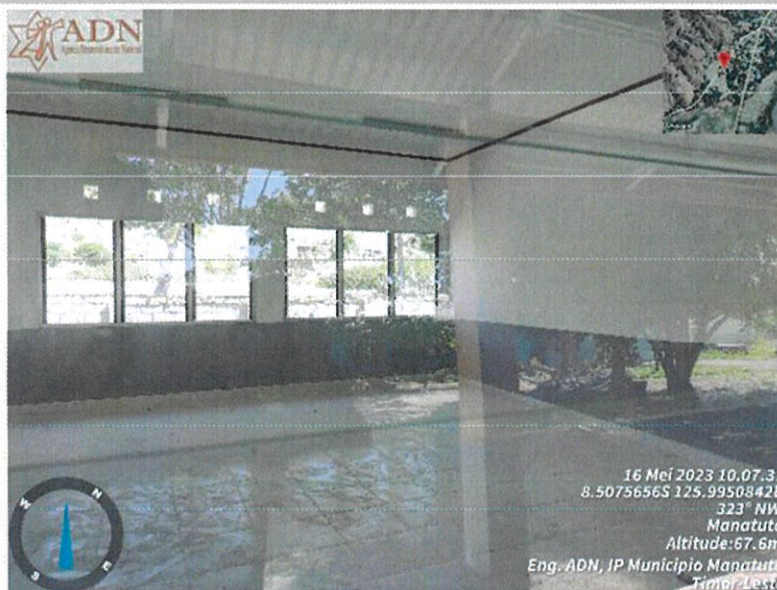

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

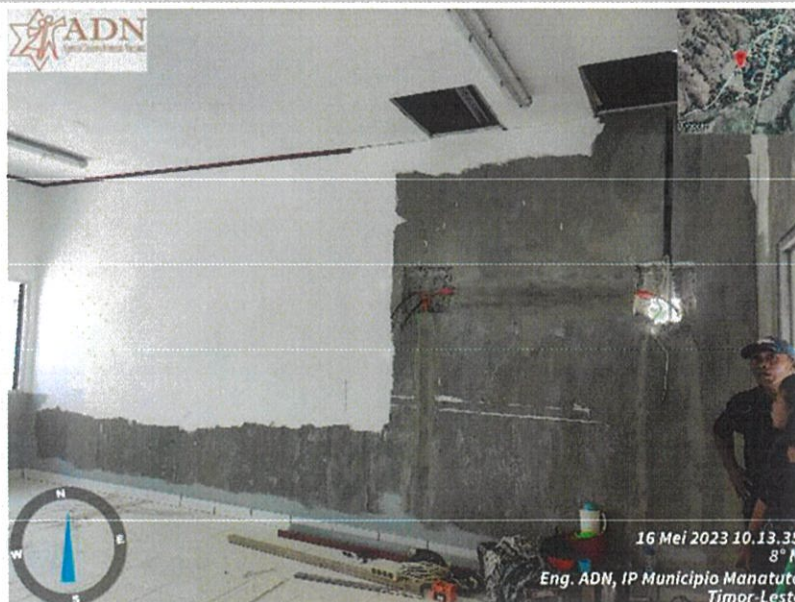





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO  
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



## #ANEXU C2 ( MV-15) SUMMARY BOQ

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato  
Lokalidade : Suco Sau, Posto Administrativo Manatuto  
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

| SUMMARY |                                | ORIGINAL CONTRACT |              | PROGRESS REPORT BY ADN IP |            |               |            |               |            |
|---------|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| No      | MAIN SUMMARY                   | Page No           | Amount       | Previous Progress         |            | Progress May  |            | Total To Date |            |
|         |                                |                   |              | Amount (US\$)             | Weigth (%) | Amount (US\$) | Weigth (%) | Amount (US\$) | Weigth (%) |
| I       | PRELIMINARIES                  | PP/3              | \$ 3.075,00  | \$ 1.975,00               | 2,99%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 1.975,00   | 2,99%      |
| II      | CLASSROOM BUILDING C           | C/39 (i)          | \$ 48.332,46 | \$ 44.939,90              | 67,94%     | \$ -          | 0,00%      | \$ 44.939,90  | 67,94%     |
| III     | PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS | SW/11 (i)         | \$ 5.397,19  | \$ -                      | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      |
| A       | CONSTRUCTION COST              |                   | \$ 56.804,65 | \$ 46.914,90              | 70,93%     | \$ -          | 0,00%      | \$ 46.914,90  | 70,93%     |
| B       | CONTIGENCY                     |                   | \$ 3.000,00  | \$ -                      | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      |
| C       | OVERHEAD                       |                   | \$ 6.340,00  | \$ 1.372,50               | 2,07%      | \$ 975,00     | 1,47%      | \$ 2.347,50   | 3,55%      |
| D       | GRAND TOTAL                    |                   | \$ 66.144,65 | \$ 48.287,40              | 73,00%     | \$ 975,00     | 1,47%      | \$ 49.262,40  | 74,48%     |

Prepara husi :


( Eng. Quico Adelino Junior )  
Eng. ba Projeto Edificio Publico Beé no  
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P.

Verifika Husi :

( Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo )  
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua  
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

( Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e  
Validação de Qualidade ADN,I.P

| <div>  <div> <div>MINISTÉRIO DO PLANO<br/>F O R D E N A M E N T O</div> <div>VII GOVERNO CONSTITUCIONAL</div> </div> <div>  <div>ADN, LP.</div> <div>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público</div> </div> </div> |                |                   |                      |               |    | <div>#ANEXU D ( MV-15)</div> <div>INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN</div>                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               |    | Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               |    | Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO OBRATO                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data inspesaun | Municipiu / Posto | Naran Eng.           | Pozisaun      | No | INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN                                                                           | Fotografia                                                                          | Asinatura                                                                           |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16/05/2023     | Manatuto Vila     | Quico Adelino Junior | Tek A D N, IP | 1  | Husu ba prezidenti do grupo atu kombina ho grupo hodi finaliza tia servisu monta lis plafond ninian. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | 2  | Husu ba grupo atu kria tan lubang kontrol iha plafond ninian ba kada sala de aula.                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | 3  | Follow up ba enjinheiru MEJD relasiona ba adiantamento no pozisaun odamatan sala de aula ninian.     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | 4  | Husu ba enjinheiru do grupo atu bele akompanha grupo iha terrenu hodi aselera servisu.               |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | 5  |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C1 (MV-17)

### Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto  
No. kontratu :

**Data Inspesaun** : 05 Maio 2023

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.5123S

Latetude : 126.0162E

End Point : Long :

Latetude :


Naran Inspector : Quico Adelino Junior

#### Sketch & Foto Desenho

##### Sketch Item servisu

Progresso iha fulan ida ne'e : ba  
Teacher Office ninian ,  
kompanhia komesa ona ho monta  
bekesting ba kolom no mos lintel  
beam ba konstrusaun teacher  
office ninian.

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual

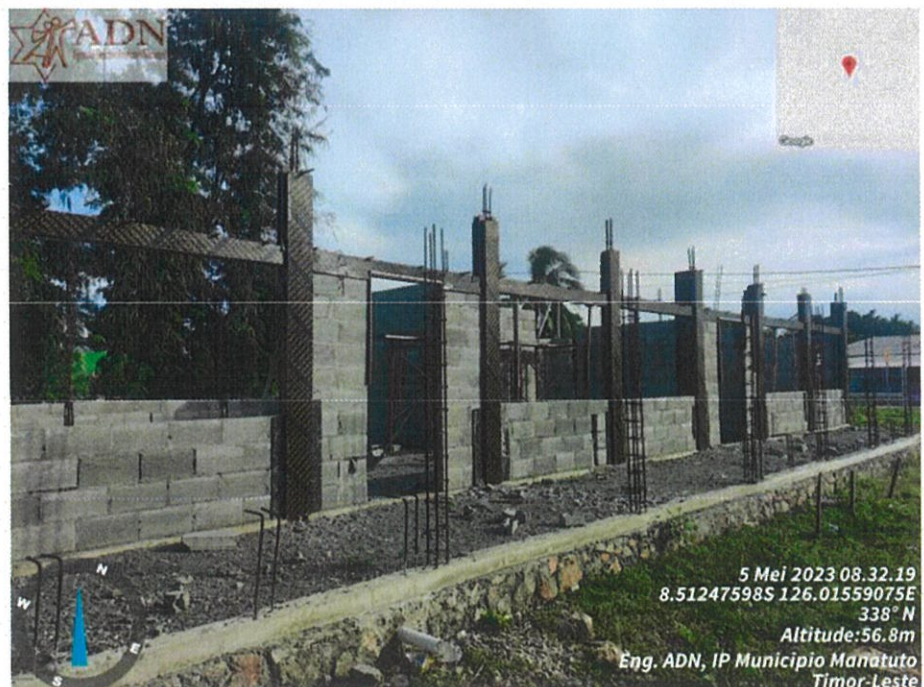





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C1 (MV-17)

### Back-up Data

Naran Projeto

No. kontratu

Sketch & Foto Desenho

: Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto

:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Iha parte Classroom building  
ninian komesa ona hada batako ba  
konstrusaun classroom building  
nian rasik.



Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu .

Progresso iha fulan ida ne'e : Ba  
konstrusaun Toilet building ninian  
seidauk iha mudansa fiziku.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





| <div>  <div> MINISTÉRIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO<br/>VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL </div> </div> <div>  <div> ADN, I.P.<br/>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público </div> </div> |                |                   |                      |               | <div>#ANEXU D ( MV-17)</div> <div>INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN</div> |                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | Naran projeto : Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama - Manatuto   |                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | Kompanha : Parapa Bemiziu Star Unipessoal Lda.                     |                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data inspesaun | Municipiu / Posto | Naran Eng.           | Pozisaun      | No                                                                 | INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN                                                                                                                                  | Fotografia                                                                          | Asinatura                                                                           |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05/05/2023     | Manatuto Vila     | Quico Adelino Junior | Tek A D N, IP | 1                                                                  | Husu ba kompanhia atu asclera progressu servisu iha terrenu.                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | 2                                                                  | Husu ba kompanhia atu tau atensaun ba medida bekesting ba kolom tenke tuir dimensi ne'ebe mak iha dezenhu nia laran.                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | 3                                                                  | Husu ba engenheiru kompanhia atu stand by iha terrenu atu bele fo assistensia tekniku ba badaen sira wainhira implementa servisu.                           |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | 4                                                                  | Wainhira tempu pengecoran , husu atu kompanhia envia carta akompanhamento ba laboratorio Nacional no cc mos carta ba laboratorio ADN IP atu bele akompanha. |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | 5                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |



## #ANEXU C2 ( MV-17) SUMMARY

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA CENTRAL VASCO DA GAMA  
FATIN PROJEITO : AITEAS, MANATUTO  
DONO DO PROJEITO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

| NO  | ITEM SERVISU                   | AMOUNT US\$   | PROGRESS REPORT BY A D N IP |        |               |       |               |        |
|-----|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|
|     |                                |               | Previous Progress           |        | Progress May  |       | Total to Date |        |
|     |                                |               | Amount (US\$)               | %      | Amount (US\$) | %     | Amount (US\$) | %      |
| i   | PRELIMINARIES WORKS            | \$ 6.300,00   | \$ 2.137,50                 | 1,17%  | \$ -          | 0,00% | \$ 2.137,50   | 1,17%  |
| ii  | CLASSROOM BUILDING C           | \$ 49.620,84  | \$ 6.120,65                 | 3,35%  | \$ 559,08     | 0,31% | \$ 6.679,72   | 3,66%  |
| iii | TEACHER OFFICE                 | \$ 67.466,67  | \$ 8.063,02                 | 4,41%  | \$ 1.027,73   | 0,56% | \$ 9.090,75   | 4,98%  |
| iv  | TOILET BUILDING Tb             | \$ 17.325,64  | \$ 910,39                   | 0,50%  | \$ -          | 0,00% | \$ 910,39     | 0,50%  |
| v   | SITWORKS                       | \$ 15.136,11  | \$ -                        | 0,00%  | \$ -          | 0,00% | \$ -          | 0,00%  |
| A   | CONSTRUCTION COST              | \$ 155.849,26 | \$ 17.231,56                | 9,43%  | \$ 1.586,81   | 0,87% | \$ 18.818,37  | 10,30% |
| B   | CONTRACTOR FEE (10% x A)       | \$ 15.584,93  | \$ 1.723,16                 | 0,94%  | \$ 158,68     | 0,09% | \$ 1.881,84   | 1,03%  |
| C   | OVERHEAD                       | \$ 3.100,00   | \$ 775,00                   | 0,42%  | \$ -          | 0,00% | \$ 775,00     | 0,42%  |
| D   | TAX (2% x (A+B+C))             | \$ 3.490,68   | \$ 394,59                   | 0,22%  | \$ 34,91      | 0,02% | \$ 429,50     | 0,24%  |
| E   | CONTIGENCY                     | \$ 4.679,68   | \$ -                        | 0,00%  | \$ -          | 0,00% | \$ -          | 0,00%  |
| F   | TOTAL COST (A + B + C + D + E) | \$ 182.701,57 | \$ 20.124,31                | 11,01% | \$ 1.780,40   | 0,97% | \$ 21.904,71  | 11,99% |

Prepara Husi :

( Eng. Quico Adelino Junior )  
Eng. ba Projecto Edificio Publico no Agua Saneamento  
Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)  
Engenheiro Senior ba Edificio Publico no Agua  
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia)  
Kordenadora da Unidade de Controlo e  
Validasaun de Kualidade ADN, I.P.





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 ( MV-18 )

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0+000-3+000 KM,  
Manatuto Municipality.

No. kontratu : RT/094/MOP-2021

Data Inspesaun : 24 / 05 / 2023

Fatin Inspesaun : Rembor-Manatuto Villa

Koordinadas : Start Point : Long : 125.973927°, Latetude : -8.541559°  
End Point : Long : 125.963384°, Latetude : -8.549488°

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos D. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Servisu

Compania kontinua servisu item stone Masonry  
-lined ditch, ho medida:



Drain Type - I

Total naruk ; 250 m

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 ( MV - 18 )


Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0 + 000 - 3 + 000 KM, Manatuto Municipality.  
No. kontratu : RT/094/MOP-2021  
Postu : Manatuto Villa  
Sukos : Iliheu  
Naran Kompania : Kartini Unip, Lda.

| SUMMARY     |                              |                               |                           |                             |                       |                       |                     |           |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| SECTION NO. | DESCRIPTION                  | TOTAL CONTRACT COST<br>(US\$) | PROGRESS PAYMENT BY A D N |                             |                       |                       |                     |           |
|             |                              |                               | PREVIOUS BILLING<br>(USD) | PERCENT PREVIOUS<br>BILLING | THIS BILLING<br>(USD) | PERCENT THIS<br>MONTH | TOTAL TO DATE (USD) | % TO DATE |
| R-01        | General                      | \$ 5,800.00                   | \$ 1,150.00               | 0.29%                       | \$ -                  | 0.00%                 | \$ 1,150.00         | 0.29%     |
| R-05        | Earth work                   | \$ 25,228.71                  | \$ 1,522.80               | 0.39%                       | \$ 352.50             | 0.09%                 | \$ 1,875.30         | 0.48%     |
| R-07        | Sub-base, Base and Pavement  | \$ 19,677.48                  | \$ -                      | 0.00%                       | \$ -                  | 0.00%                 | \$ -                | 0.00%     |
| R-08        | Bituminous pavement          | \$ 92,905.20                  | \$ -                      | 0.00%                       | \$ -                  | 0.00%                 | \$ -                | 0.00%     |
| R-10        | Structures                   | \$ 179,017.78                 | \$ 22,429.56              | 5.69%                       | \$ 7,364.28           | 1.87%                 | \$ 29,793.84        | 7.56%     |
| R-11        | Dayworks                     | \$ 175.00                     | \$ 175.00                 | 0.04%                       | \$ -                  | 0.00%                 | \$ 175.00           | 0.04%     |
| R-15        | Routine maintenance          | \$ 6,992.32                   | \$ -                      | 0.00%                       | \$ -                  | 0.00%                 | \$ -                | 0.00%     |
| R-15        | Provisional sum              | \$ 200.00                     | \$ -                      | 0.00%                       | \$ -                  | 0.00%                 | \$ -                | 0.00%     |
| A           | Construction Cost            | \$ 329,996.49                 | \$ 25,277.36              | 6.41%                       | \$ 7,716.78           | 1.96%                 | \$ 32,994.14        | 8.37%     |
| B           | Profit & Over Head (10% x A) | \$ 32,999.65                  | \$ 2,527.74               | 0.64%                       | \$ 771.68             | 0.20%                 | \$ 3,299.41         | 0.84%     |
| C           | Generals item                | \$ 23,472.23                  | \$ 5,046.00               | 1.28%                       | \$ 2,528.75           | 0.64%                 | \$ 7,574.75         | 1.92%     |
| D           | Tax 2 % x (A+B+C)            | \$ 7,729.37                   | \$ 657.02                 | 0.17%                       | \$ 220.34             | 0.06%                 | \$ 877.37           | 0.22%     |
| E           | GRAND/GROSS TOTAL            | \$ 394,197.73                 | \$ 33,508.12              | 8.50%                       | \$ 11,237.55          | 2.85%                 | \$ 44,745.67        | 11.35%    |

Inspeksaun Husi:

  
I. Domingos da C. X. Silva  
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e  
Irigação Munisipiu Matatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

  
Eng. Remigio da C. S. Dos Santos  
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e  
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

  
Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas  
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de  
Qualidade, ADN.I.P





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D ( MV-18 )

## INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

**Naran projeto :** R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0+000-3+000 Km, Manatuto municipality.

**Kompanha** : Kartini Unipessoal Lda.

| No | Data inspesaun | Municipiu / Posto          | Naran Eng.                                                                                        | Pozisaun                                        | No  | INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asinatura     |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
|----|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--|--|---------------------|---|--|--|-------------------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | 24/05/2022     | Manatuto/<br>Manatuto Vila | Domingos D.<br>X. Silva                                                                           | Eng. Ba<br>Projetu ITI<br>Munisipiu<br>Manatuto | 1   | <div><div><div>ADN I.P.</div><div>INSPECTION SHEET</div><table><tr><th>NO.</th><th>DATE</th><th>NAME</th><th>INSTRUCTION</th></tr><tr><td>1</td><td>24/05<br/>2023</td><td>Domingos da C. X. Silva</td><td>1. kontinua servisu ba hem fira nolas<br/>Sodauli kotu. <del>no</del></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>2. kontola campuran</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>3. uza <sup>medida</sup> fatur hir spesifikasun</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>4. Eng. Compania tanke Mantain<br/>iha tereno unan hira iha servisu</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>5. Hanika kadasun no trabalhador fira<br/>uza besan protesaun :<br/>luvas, kapasoto, Ramping, botas</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>6. Napatin uza pachiola kodi kalun<br/>masa .</td></tr></table><div>24/05/2023 11:58:52<br/>8.547153S 125.964543E ±3.10m<br/>Manatuto, Timor-Leste<br/>Altitude: 105.4m<br/>Speed: 3.1km/h<br/>Remarks: Rembor<br/>Municipio Manatuto<br/>Duquij<br/>Index number: 1164</div></div></div> | NO.           | DATE                    | NAME                                                                 | INSTRUCTION | 1 | 24/05<br>2023 | Domingos da C. X. Silva | 1. kontinua servisu ba hem fira nolas<br>Sodauli kotu. <del>no</del> | 2 |  |  | 2. kontola campuran | 3 |  |  | 3. uza <sup>medida</sup> fatur hir spesifikasun | 4 |  |  | 4. Eng. Compania tanke Mantain<br>iha tereno unan hira iha servisu |  |  |  | 5. Hanika kadasun no trabalhador fira<br>uza besan protesaun :<br>luvas, kapasoto, Ramping, botas |  |  |  | 6. Napatin uza pachiola kodi kalun<br>masa . |  |
|    |                |                            |                                                                                                   |                                                 | NO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATE          | NAME                    | INSTRUCTION                                                          |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
|    |                |                            |                                                                                                   |                                                 | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24/05<br>2023 | Domingos da C. X. Silva | 1. kontinua servisu ba hem fira nolas<br>Sodauli kotu. <del>no</del> |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
|    |                |                            |                                                                                                   |                                                 | 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         | 2. kontola campuran                                                  |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
| 3  |                |                            | 3. uza <sup>medida</sup> fatur hir spesifikasun                                                   |                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
| 4  |                |                            | 4. Eng. Compania tanke Mantain<br>iha tereno unan hira iha servisu                                |                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
|    |                |                            | 5. Hanika kadasun no trabalhador fira<br>uza besan protesaun :<br>luvas, kapasoto, Ramping, botas |                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
|    |                |                            | 6. Napatin uza pachiola kodi kalun<br>masa .                                                      |                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
| 2  |                |                            |                                                                                                   |                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
| 3  |                |                            |                                                                                                   |                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
| 4  |                |                            |                                                                                                   |                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
|    |                |                            |                                                                                                   |                                                 | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
|    |                |                            |                                                                                                   |                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
|    |                |                            |                                                                                                   |                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
|    |                |                            |                                                                                                   |                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
|    |                |                            |                                                                                                   |                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
|    |                |                            |                                                                                                   |                                                 | 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
|    |                |                            |                                                                                                   |                                                 | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |
|    |                |                            |                                                                                                   |                                                 | 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                      |             |   |               |                         |                                                                      |   |  |  |                     |   |  |  |                                                 |   |  |  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                   |  |  |  |                                              |                                                                                     |





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C1 (LAL-3)

### Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui  
No. kontratu :

**Data Inspesaun** : 24 Maio 2023

Fatin Inspesaun : Cairui, Laleia

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.6063S,

Latetude : 126,1422E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Progresso servisu iha fulan  
ida ne'e: ba Classroom  
ninian, grupo kuaze finaliza  
ona servisu monta keramik  
ninian, no iha parte haris fatin  
ninian hahu ona ho servisu  
plumbing nian hanesan monta  
closet no nia asesories sira.







MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C1 (LAL-3)

### Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Sketch Item servisu.




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

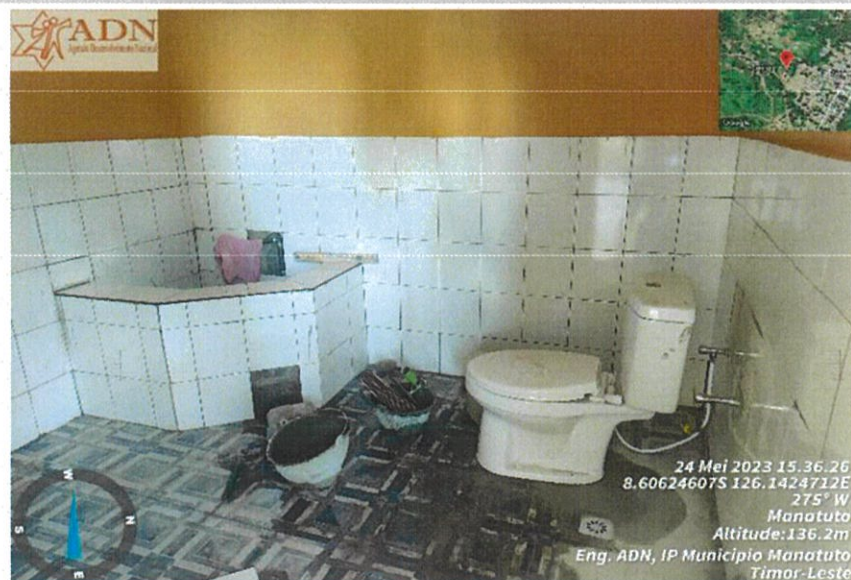
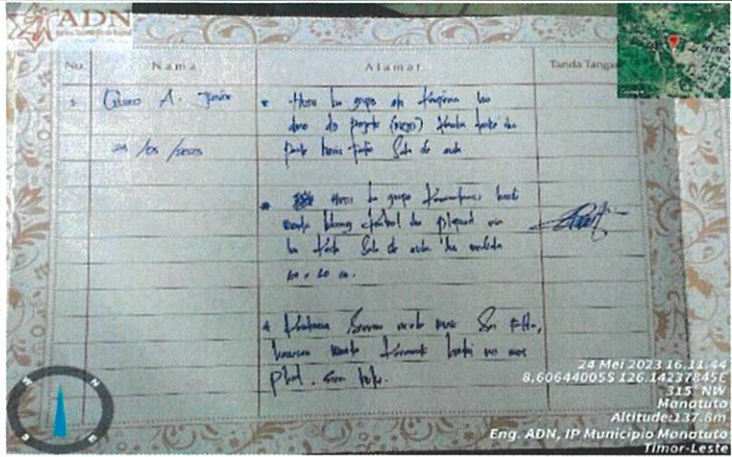
|  <div> <div>MINISTÉRIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO</div> <div>VII GOVERNO CONSTITUCIONAL</div> </div> <div>  <div>ADN, LP.</div> <div>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público</div> </div> |                |                   |                      |               | <div>#ANEXU D ( LAL-3)</div> <div>INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN</div> |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                      |               |                                                                    |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <div>Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO CAIRUI</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |                      |               |                                                                    |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data inspesaun | Municipiu / Posto | Naran Eng.           | Pozisaun      | No                                                                 | INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN                                                                            | Fotografia                                                                          | Asinatura                                                                           |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24/05/2023     | Laleia            | Quico Adelino Junior | Tek A D N, IP | 1                                                                  | Husu ba grupo atu komfirma ho dono do projetu (MEJD) konaba tanke iha parte haris fatin sala de aula. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |                      |               | 2                                                                  | Husu ba grupo komunitariu hodi monta lubang kontrol ba kada sala de aula ho medida 60 x 60 cm.        |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |                      |               | 3                                                                  | Kontinua servisu ne'ebe mak sei falta , hanesan monta keramik lantai no mos plint sira hotu.          |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |                      |               | 4                                                                  |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |                      |               | 5                                                                  |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO  
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C2 ( LAL-3) SUMMARY BOQ

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui

Lokalidade : Suco Cairui, Posto Administrativo Laleia

Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

| NO  | MAIN SUMMARY                   | ORIGINAL CONTRACT |              | PROGRESS REPORT BY ADN IP |            |               |            |               |            |
|-----|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|     |                                | Page No           | AMOUNT       | PREVIOUS PROGRESS         |            | PROGRESS MAY  |            | TOTAL TO DATE |            |
|     |                                |                   |              | Amount (US\$)             | Weigth (%) | Amount (US\$) | Weigth (%) | Amount (US\$) | Weigth (%) |
| I   | PRELIMINARIES                  | PP/3              | \$ 3.075,00  | \$ 1.725,00               | 1,99%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 1.725,00   | 1,99%      |
| II  | CLASSROOM BUILDING C2          | C2/47 (i)         | \$ 58.021,79 | \$ 44.482,50              | 51,20%     | \$ 5.074,57   | 5,84%      | \$ 49.557,07  | 57,04%     |
| III | PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS | SW/20 (i)         | \$ 7.901,93  | \$ -                      | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      |
| A   | CONSTRUCTION COST              |                   | \$ 68.998,72 | \$ 46.207,50              | 53,18%     | \$ 5.074,57   | 5,84%      | \$ 51.282,07  | 59,02%     |
| B   | CONTIGENCIA                    |                   | \$ 3.000,00  | \$ -                      | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      |
| C   | OVERHEAD                       |                   | \$ 6.340,00  | \$ 4.340,00               | 5,00%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 4.340,00   | 5,00%      |
| D   | GRAND TOTAL                    |                   | \$ 86.883,29 | \$ 50.547,50              | 58,18%     | \$ 5.074,57   | 5,84%      | \$ 55.622,07  | 64,02%     |

Prepara husi :

( Eng. Quico Adelino Junior )  
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no  
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

( Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo )  
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua  
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

( Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e  
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-7)

## Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Postu Saude Funar, Laclubar  
No. kontratu :

**Data Inspesaun** : 15 Maio 2023

Fatin Inspesaun : Funar, Laclubar

Koordinadas :

Start Point : Long :-8,75056S

Latetude : 125,870736 E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu Fiziku iha fulan ida ne'e:

Iha fulan ida ne'e Projetu refere  
finaliza ona cor dak beton teras ninian  
no hahu ona mos cor ba top beam  
ninian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

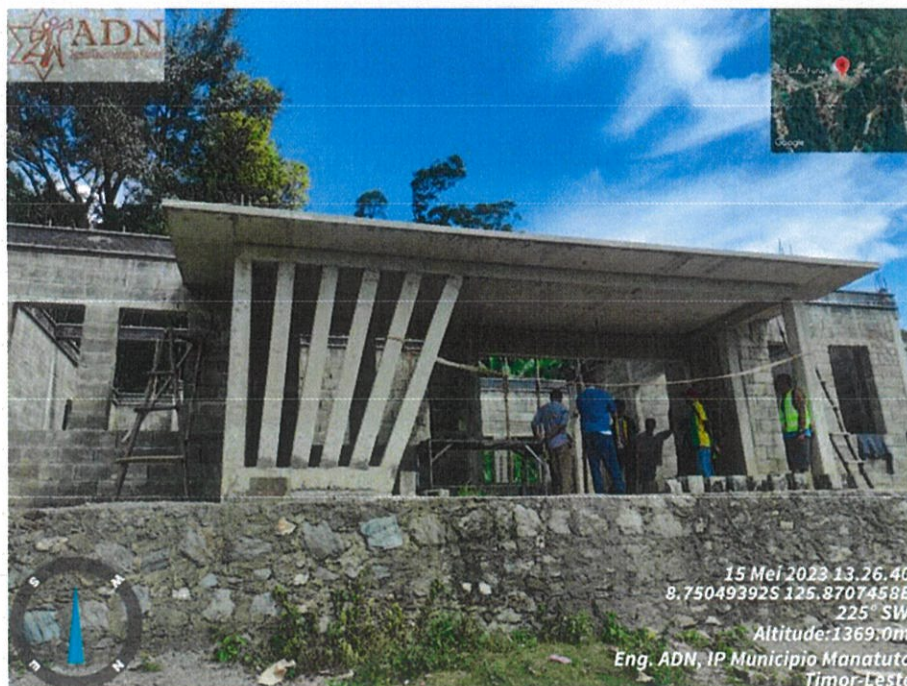





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-7)

## Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun Postu Saude Funar, Laclubar


No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Sketch Item servisu.

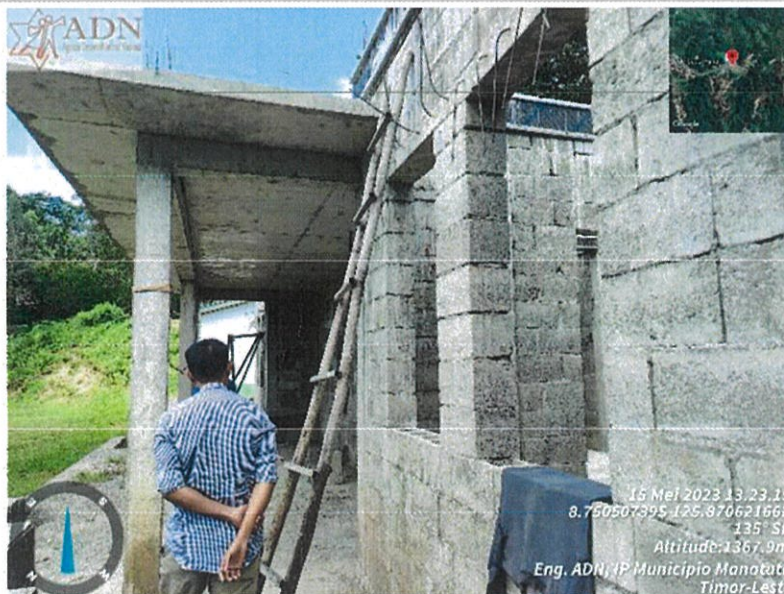


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

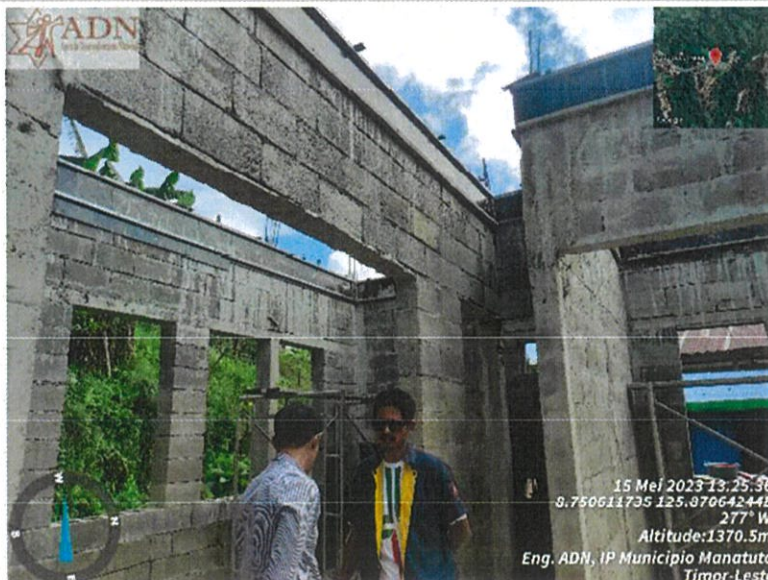
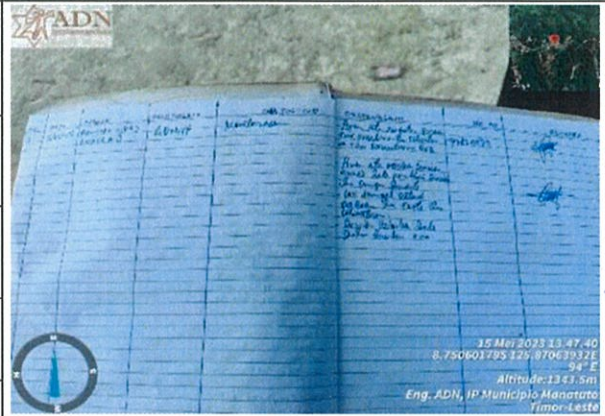
| <div>  <div> MINISTÉRIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO<br/>VII GOVERNO CONSTITUCIONAL </div> </div> <div>  <div> ADN, I.P.<br/>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público </div> </div> |                |                   |                      |                                      |    | #ANEXU D1 (LAC-7)<br>INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN                                |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |                                      |    | Projetu : Konstrusaun Postu Saude Funar, Laclubar                              |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |                                      |    | Kompanhia : MERCY UNIP. LDA                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data inspesaun | Municipiu / Posto | Naran Eng.           | Pozisaun                             | No | INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN                                                     | Fotografia                                                                          | Asinatura                                                                           |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/05/2023     | Funar, Laclubar   | Quico Adelino Junior | Engenheiru ADN IP Municipiu Manatuto | 1  | Husu atu nafatin servisu tuir prosedimentu tekniku no tuir dezenhu no mos BOQ. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |                                      | 2  | Husu atu asselera servisu nune'e bele konklui servisu iha tempu badak.         |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |                                      | 3  | Lori sampel betaun top beam ba teste iha laboratorio.                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |                                      | 4  | Servisu reboka bele hahu dadaun ona.                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |                                      | 5  |                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |





## #ANEXU C2 (LAC 7)

Project Name : Konstrusaun Posto saude Funar - Postu administrativo Laclubar

Location : Suco Funar Post.Admin Laclubar Municipio Manatuto

### SUMMARY

| No   | DESCRIPTION                        | AMOUNT (USD) | PROGRESS REPORT BY ADN IP |           |                       |       |                     |           |
|------|------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------|-------|---------------------|-----------|
|      |                                    |              | PREVIOUS<br>MONTH (USD)   | TOTAL (%) | PROGRESS<br>MAY (USD) | %     | UP TO DATE<br>(USD) | TOTAL (%) |
| I    | Preliminaries                      | \$ 450.00    | \$ 300.00                 | 0.34%     | \$ -                  | 0.00% | \$ 300.00           | 0.34%     |
| II   | GROUND WORKS                       | \$ -         | \$ -                      | 0.00%     | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| III  | CONCRETE WORKS                     | \$ 5,480.02  | \$ 5,479.88               | 6.22%     | \$ -                  | 0.00% | \$ 5,479.88         | 6.22%     |
| IV   | MASONRY WORKS                      | \$ 10,454.66 | \$ 3,342.91               | 3.80%     | \$ -                  | 0.00% | \$ 3,342.91         | 3.80%     |
| V    | STRUCTURAL STEEL WORKS             | \$ 6,761.89  | \$ -                      | 0%        | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| VI   | ROOFING AND CLADDING WORKS         | \$ 6,243.92  | \$ -                      | 0%        | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| VII  | DOORS AND WINDOWS WORKS            | \$ 8,060.00  | \$ -                      | 0%        | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| VIII | HARDWARE                           | \$ 1,040.00  | \$ -                      | 0%        | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| IX   | PAINTING WORKS                     | \$ 2,175.82  | \$ -                      | 0%        | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| X    | TILLING WORKS                      | \$ 4,895.74  | \$ -                      | 0%        | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| XI   | CEILING WORKS                      | \$ 5,027.25  | \$ -                      | 0%        | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| XII  | HIDROULIC WORKS                    | \$ 5,611.00  | \$ -                      | 0%        | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| XIII | ELECTRICAL SERVICES                | \$ 4,822.00  | \$ -                      | 0%        | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| XIV  | MECHANICAL SERVICES INSTALLATIONS  | \$ 313.00    | \$ -                      | 0%        | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| XV   | FURNITURE                          | \$ 7,200.00  | \$ -                      | 0%        | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| XVI  | PROVISIONAL SUM                    | \$ 500.00    | \$ -                      | 0%        | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| XVII | External Works as Additional Works | \$ 5,611.83  | \$ -                      | 0%        | \$ 350.90             | 0.40% | \$ 350.90           | 0.40%     |
| A    | Total Cost Helath Post             | \$ 74,647.13 | \$ 9,122.79               | 10.36%    | \$ 350.90             | 0.40% | \$ 9,473.69         | 10.76%    |
| B    | Contractor Fee (10% *A)            | \$ 7,464.71  | \$ 912.28                 | 1.04%     | \$ 35.09              | 0.04% | \$ 947.37           | 1.08%     |
| C    | Over Head                          | \$ 4,207.50  | \$ -                      | 0%        | \$ -                  | 0.00% | \$ -                | 0.00%     |
| D    | Tax (2%*(A+B+C))                   | \$ 1,726.39  | \$ 200.70                 | 0.23%     | \$ 7.72               | 0.01% | \$ 208.42           | 0.24%     |
| E    | Grand Total (A+B+C+D)              | \$ 88,045.73 | \$ 10,235.77              | 11.63%    | \$ 393.71             | 0.45% | \$ 10,629.48        | 12.08%    |

Inspesaun husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)  
Engenheiru ba Projetu Edificiu Be'e no  
Saneamentu Municipio Manatuto ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)  
Engenheiro Senior ba Edificio Publico no Agua  
Saneamento ADN, I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia)  
Kordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de  
Koalidade ADN, I.P





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C1 (LAC - 8)

### Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000

No. kontratu : MPW-W-210056

**Data Inspesaun** : 15/05/2023

Fatin Inspesaun : Laclubar

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.747020°, Latetude : 125.915538°

End Point : Long : -8.750884°, Latetude : 125.904335°

Naran Inspector : Domingos da C. X. Silva

#### Sketch & Foto Desenho



Sketch Item servisu :

Projetu Kontinua paradu



#### Drain Type - I

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual

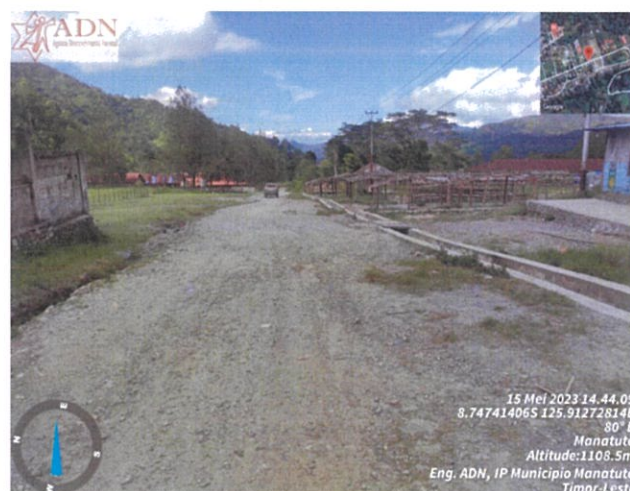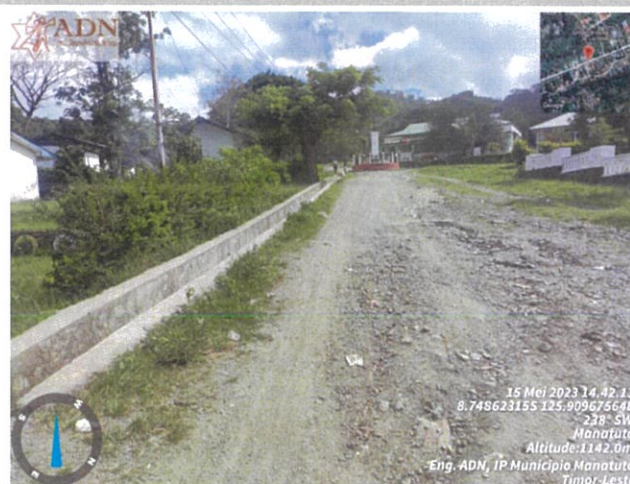





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C1 (SO -3)

### Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada  
Chainage 0+000-2+000

No. kontratu : MPW-W-210059

Data Inspesaun : 25/05/2023

Fatin Inspesaun : Soibada, Buah Rahun

Koordinadas :


Start Point : Long : 8,8399S Latetude: 125,9171E

End Point : Long : 8,82990S Latetude: 125,9223E

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos D. X. Silva

#### Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu stone masonry- lined  
ditch ho metru 50 m

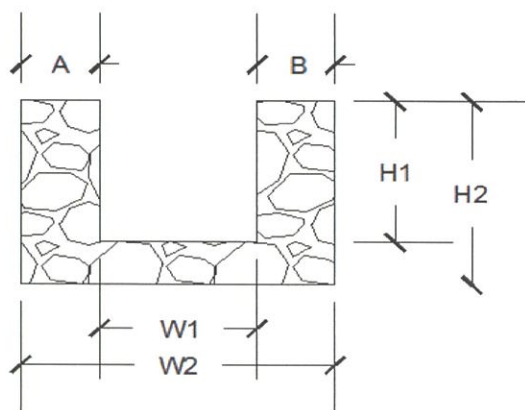

A: 0.25 M, B:0.25 M, W1:0.50, W2:1M,  
H1:0.50, H2:0.65 M

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual







#ANEXU C2 ( SO - 3 )

Road Name : Manlala(Manufahi Kiik) - Soibada Chainage start 0 + 000  
Municipality : Manatuto Chainage end 2+000  
Postu : Soibada Length 2.0 Km  
Sukos : Manufahi Kiik

SUMMARY

| SECTION NO. | DESCRIPTION                  | TOTAL<br>CONTRACT<br>COST<br><br>(US\$) | PROGRESS PAYMENT BY A D N |                                |                    |                       |                        |           |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
|             |                              |                                         | PREVIOUS<br>BILLING (USD) | PERCENT<br>PREVIOUS<br>BILLING | THIS BILLING (USD) | PERCENT THIS<br>MONTH | TOTAL TO<br>DATE (USD) | % TO DATE |
|             |                              |                                         |                           |                                |                    |                       |                        |           |
| R-01        | General                      | \$ 2,990.00                             | \$ 2,970.00               | 1.46%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 2,970.00            | 1.46%     |
| R-03        | Earth work                   | \$ 11,037.21                            | \$ 12,532.73              | 6.17%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 12,532.73           | 6.17%     |
| R-05        | Sub-base, Base and Pavament  | \$ 13,353.74                            | \$ 12,473.94              | 6.14%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 12,473.94           | 6.14%     |
| R-08        | Structures                   | \$ 121,257.00                           | \$ 50,849.36              | 25.04%                         | \$ 1,410.00        | 0.69%                 | \$ 52,259.36           | 25.74%    |
| R-10        | Dayworks                     | \$ 1,750.00                             | \$ 175.00                 | 0.09%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 175.00              | 0.09%     |
| R-11        | Routine maintenance          | \$ 4,205.00                             | \$ 4,205.00               | 2.07%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 4,205.00            | 2.07%     |
| R-15        | Provisional sum              | \$ 200.00                               | \$ 200.00                 | 0.10%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 200.00              | 0.10%     |
| A           | Construction Cost            | \$ 154,792.95                           | \$ 83,406.03              | 41.08%                         | \$ 1,410.00        | 0.7%                  | \$ 84,816.03           | 41.8%     |
| B           | Profit & Over Head (10% x A) | \$ 15,479.29                            | \$ 8,340.60               | 4.11%                          | \$ 141.00          | 0.07%                 | \$ 8,481.60            | 4.18%     |
| C           | General Item                 | \$ 28,783.23                            | \$ 20,611.00              | 10.15%                         | \$ 1,035.00        | 0.51%                 | \$ 21,646.00           | 10.66%    |
| D           | Tax 2 % x (A+B)              | \$ 3,981.11                             | \$ 2,247.15               | 1.11%                          | \$ 51.72           | 0.03%                 | \$ 2,298.87            | 1.13%     |
| E           | GRAND/GROSS TOTAL            | \$ 203,036.57                           | \$ 114,604.78             | 56.45%                         | \$ 2,637.72        | 1.30%                 | \$ 117,242.50          | 57.75%    |

Inspeksaun Husi:

1. ( Eng. Domingos D.X. Silva)  
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e  
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

( Eng. Remigio da C.S. dos Santos )  
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,  
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

( Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e  
Validação de Qualidade, ADN.I.P





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (SO - 3)

## INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) -  
Soibada Chainage 0+000-2+000

Kompanha : Manufahi Kiik Unip. Lda
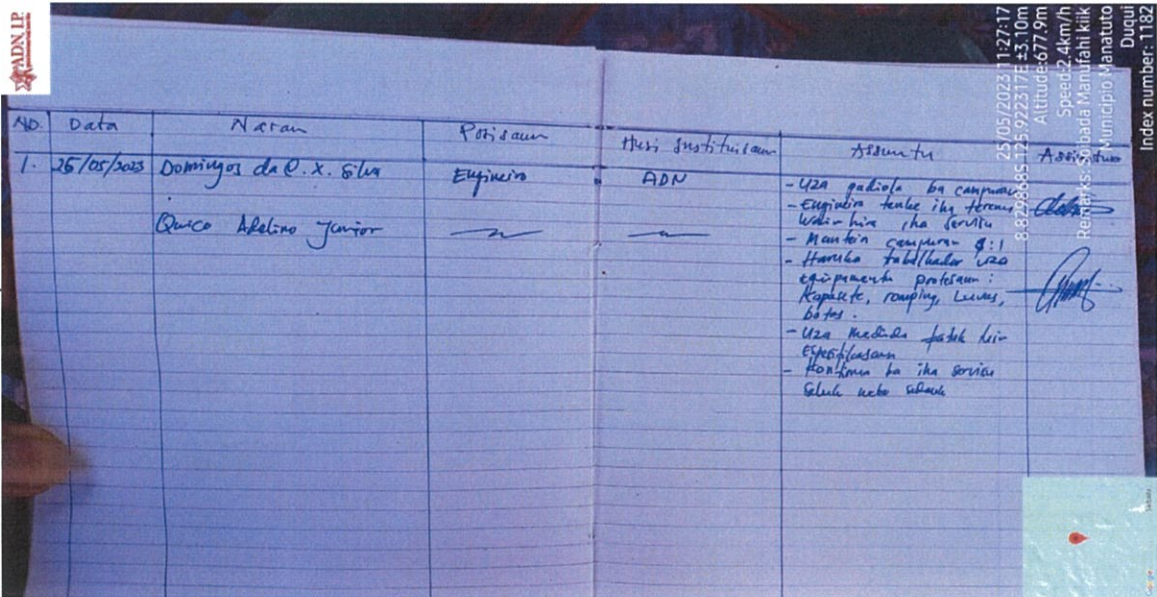
| No | Data inspesaun | Municipiu / Posto    | Naran Eng.             | Pozisaun                                             | No | INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN                                                           | Asinatura                                                                           |
|----|----------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | 25/05/2023     | Manatuto/<br>Soibada | Domingos D. X<br>Silva | Eng. Ba Projeto ITI<br>Munispiu Manatuto,<br>AND.I.P | 1  |  |  |
|    |                |                      |                        |                                                      |    |                                                                                      |                                                                                     |









MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C1 (SO-5)

### Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Ensину Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada,  
Manatuto

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .







MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO  
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.  
Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C2 ( SO-5) SUMMARY BOQ

NARAN PROJEITO : REHABILITAÇÃO ESCRITÓRIO ESCOLA SECUNDÁRIA TÉCNICA VOCACIONAL SOIBADA

FATIN PROJEITO : MANLALA, SOIBADA, MANATUTO

| NO   | DESCRIPTION                                                                      | AMOUNTH \$   | PROGRESS REPORT BY A D N |            |               |            |                  |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|
|      |                                                                                  |              | PREVIOUS PROGRESS        |            | PROGRESS MAY  |            | PROGRESS TO DATE |            |
|      |                                                                                  |              | AMOUNT (US\$)            | WEIGHT (%) | AMOUNT (US\$) | WEIGHT (%) | AMOUNT (US\$)    | WEIGHT (%) |
| I    | PRELIMINARIES (PEKERJAAN PERSIAPAN)                                              | \$ 1.778,89  | \$ 978,89                | 1,46%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 978,89        | 1,46%      |
| II   | DEMOLITION, CONCRETE & FINISHES (Pek. bongkaran ,beton & Pek.finishes)           | \$ 9.586,05  | \$ 9.311,05              | 13,92%     | \$ 125,00     | 0,19%      | \$ 9.436,05      | 14,11%     |
| III  | STEEL ROOF STRUCTURE & CEILING (Structur Atap Baja dan Plafond)                  | \$ 18.320,41 | \$ 8.789,95              | 13,14%     | \$ 128,23     | 0,19%      | \$ 8.918,18      | 13,33%     |
| IV   | ROOFING (Pek. Atap)                                                              | \$ 6.442,56  | \$ 6.442,56              | 9,63%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 6.442,56      | 9,63%      |
| V    | WINDOWS AND DOORS (Pekerjaan Jendela dan Pintu)                                  | \$ 8.047,00  | \$ 5.352,50              | 8,00%      | \$ 285,00     | 0,43%      | \$ 5.637,50      | 8,43%      |
| VI   | PAINTING (Pek. Pengecatan)                                                       | \$ 3.144,00  | \$ 2.814,30              | 4,21%      | \$ 115,68     | 0,17%      | \$ 2.929,98      | 4,38%      |
| VII  | PLUMBING AND DRAINAGE (Pek. perpipaam)                                           | \$ 2.558,76  | \$ 1.123,94              | 1,68%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 1.123,94      | 1,68%      |
| VIII | ELECTRICAL INSTALLATION (full installation)                                      | \$ 2.545,75  | \$ -                     | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      | \$ -             | 0,00%      |
| IX   | EXTERNAL ELECTRICAL SERVICES (full installation) (Instalasi listrik bagian luar) | \$ 1.238,64  | \$ -                     | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      | \$ -             | 0,00%      |
| X    | EXTERNAL WATER SERVICE PLUMBING (Perpipaan air bersih)                           | \$ 249,47    | \$ 249,47                | 0,37%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 249,47        | 0,37%      |
| XI   | EXTERNAL SEWER DRAINAGE (Perpipaan air kotor bagian luar)                        | \$ 2.803,73  | \$ 2.862,94              | 4,28%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 2.862,94      | 4,28%      |
| XII  | OVERHEAD                                                                         |              |                          |            |               |            |                  |            |
| A    | CONSTRUCTION COST                                                                | \$ 56.715,25 | \$ 37.925,59             | 56,69%     | \$ 653,90     | 0,98%      | \$ 38.579,50     | 57,67%     |
| B    | CONTRACTOR FEE (10% x A)                                                         | \$ 5.671,52  | \$ 3.792,56              | 5,67%      | \$ 65,39      | 0,10%      | \$ 3.857,95      | 5,77%      |
| C    | OVERHEAD                                                                         | \$ 3.200,00  | \$ 2.100,00              | 3,14%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 2.100,00      | 3,14%      |
| D    | TAX (2% x ( A+B+C)                                                               | \$ 1.311,74  | \$ 876,36                | 1,31%      | \$ 14,39      | 0,02%      | \$ 890,75        | 1,33%      |
| E    | CONTINGENCY (10% X A)                                                            | \$ -         | \$ -                     | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      | \$ -             | 0,00%      |
| F    | GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)                                                          | \$ 66.898,51 | \$ 44.694,52             | 66,81%     | \$ 733,68     | 1,10%      | \$ 45.428,20     | 67,91%     |

Prepara husi :

( Eng. Quico Adelino Junior )  
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no  
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

Verifika Husi :

( Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo )  
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua  
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

( Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e  
Validação de Qualidade ADN,I.P





#ANEXU C1 (SO-6)

## Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Weaihudik**  
No. kontratu :

**Data Inspesaun : 25 Maio 2023**

Fatin Inspesaun : Weaihudik

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.8515S,

Latetude : 125,9308E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : **Quico Adelino Junior**

### Sketch & Foto Desenho

#### Sketch Item

Progresso fiziku iha fulan ida ne'e: Iha parte classroom ninian agora dadaun grupo komesa ona monta triplex ba plafond iha sala de aula balun, no monta mos rangka plafond ba classroom seluk.

### Observasaun iha tereno no Foto Aktual







MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-6)

## Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Weaihudik

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Progresso fiziku iha fulan ida

ne'e: Ba parte konstrusaun

Toilet building ninian hahu ona

monta bekesting ba iha balok

sopi-sopi ninian.







## #ANEXU C2 (SO-6) SUMMARY BOQ

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik  
Lokalidade : Manufahi Ki'ik, Posto Administrativo Soibada  
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

| SUMMARY |                                |         |     | ORIGINAL<br>CONTRACT | PROGRESS REPORT BY ADN IP |            |               |            |               |            |
|---------|--------------------------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| No      | MAIN SUMMARY                   | Page No |     | Amount               | PREVIOUS PROGRESS         |            | PROGRESS MAY  |            | TOTAL TO DATE |            |
|         |                                |         |     |                      | Amount (US\$)             | Weigth (%) | Amount (US\$) | Weigth (%) | Amount (US\$) | Weigth (%) |
|         |                                |         |     |                      |                           |            |               |            |               |            |
| I       | PRELIMINARIES                  | PP/3    |     | \$ 3.075,00          | \$ 2.275,00               | 2,22%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 2.275,00   | 2,22%      |
| II      | CLASSROOM BUILDING C           | C/39    | (i) | \$ 51.164,59         | \$ 34.433,57              | 33,59%     | \$ 1.830,89   | 1,79%      | \$ 36.264,46  | 35,38%     |
| III     | TOILET BUILDING Tb             | TB/39   | (i) | \$ 25.091,96         | \$ 9.057,44               | 8,84%      | \$ 733,60     | 0,72%      | \$ 9.791,04   | 9,55%      |
| IV      | PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS | SW/24   | (i) | \$ 13.840,76         |                           |            |               |            |               |            |
| A       | CONSTRUCTION COST              |         |     | \$ 93.172,31         | \$ 45.766,01              | 44,64%     | \$ 2.564,49   | 2,50%      | \$ 48.330,51  | 47,15%     |
| B       | CONTIGENCIA                    |         |     | \$ 3.000,00          |                           |            |               |            |               |            |
| C       | OVERHEAD                       |         |     | \$ 6.340,00          | \$ 3.355,00               | 3,27%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 3.355,00   | 3,27%      |
| D       | GRAND TOTAL                    |         |     | \$ 102.512,31        | \$ 49.121,01              | 47,92%     | \$ 2.564,49   | 2,50%      | \$ 51.685,51  | 50,42%     |

Prepara husi :

( Eng. Quico Adelino Junior )  
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no  
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

( Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo )  
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua  
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

( Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e  
Validação de Qualidade ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C1 ( BA - 7)

### Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon  
Chainage 3+000-6+200

No. kontratu : MPW-W-210062

Data Inspesaun : 04/05/ 2023

Fatin Inspesaun : Barique

Koordinadas :


Start Point : Long : -8.996644°, Latetude : 126.084961°

End Point : Long : -8.977311°, Latetude : 126.102659°

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos D.X. Silva

#### Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Compania finaliza ona  
servisu aspal

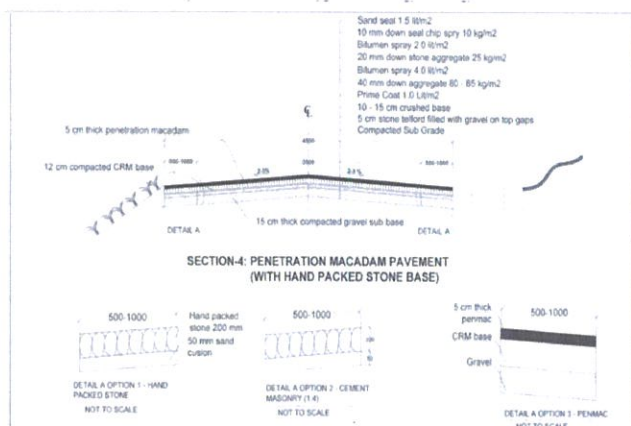

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual







#ANEXU C2 ( BA - 7 )

Naran Projeto : RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT AGRICULTURE CENTRE - AUBEON CHAINAGE ( STA 3 + 000 - 6 + 200)  
No. kontratu : MPW - W - 210062  
Postu : Natarbora  
Suku : Aubeon  
Naran Kompanhia : We' Coi Unip, Lda.

SUMMARY

| SECTION NO. | DESCRIPTION                  | TOTAL CONTRACT<br>COST<br>(US\$) | PROGRESS PAYMENT BY A D N |                                |                    |                       |                        |           |
|-------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
|             |                              |                                  | PREVIOUS<br>BILLING (USD) | PERCENT<br>PREVIOUS<br>BILLING | THIS BILLING (USD) | PERCENT THIS<br>MONTH | TOTAL TO DATE<br>(USD) | % TO DATE |
| R-01        | General                      | \$ 2,340.00                      | \$ 2,340.00               | 0.68%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 2,340.00            | 0.68%     |
| R-03        | Earth work                   | \$ 10,796.77                     | \$ 10,796.77              | 3.15%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 10,796.77           | 3.15%     |
| R - 05      | Sub-base, Base and Pavement  | \$ 57,631.73                     | \$ 57,631.73              | 16.80%                         | \$ -               | 0.00%                 | \$ 57,631.73           | 16.80%    |
| R - 07      | Bituminous pavement          | \$ 175,067.20                    | \$ 124,488.92             | 36.28%                         | \$ 50,578.28       | 14.74%                | \$ 175,067.20          | 51.02%    |
| R-08        | Structures                   | \$ 35,867.39                     | \$ 36,637.28              | 10.68%                         | \$ -               | 0.00%                 | \$ 36,637.28           | 10.68%    |
| R-10        | Dayworks                     | \$ 175.00                        | \$ 525.00                 | 0.15%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 525.00              | 0.15%     |
| R-11        | Routine Maintenance          | \$ 6,341.00                      | \$ 6,341.00               | 1.85%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 6,341.00            | 1.85%     |
| R-15        | Provisional Sum              | \$ 100.00                        | \$ 100.00                 | 0.03%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 100.00              | 0.03%     |
| A           | Construction Cost            | \$ 288,319.09                    | \$ 238,860.69             | 69.62%                         | \$ 50,578.28       | 14.7%                 | \$ 289,438.97          | 84.4%     |
| B           | Profit & Over Head (10% x A) | \$ 28,831.91                     | \$ 23,886.07              | 6.96%                          | \$ 5,057.83        | 1.47%                 | \$ 28,943.90           | 8.44%     |
| C           | General Item                 | \$ 19,232.79                     | \$ 14,755.50              | 4.30%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 14,755.50           | 4.30%     |
| D           | Tax 2 % x (A+B)              | \$ 6,727.68                      | \$ 5,550.05               | 1.62%                          | \$ 1,112.72        | 0.32%                 | \$ 6,662.77            | 1.94%     |
| E           | GRAND/GROSS TOTAL            | \$ 343,111.47                    | \$ 283,052.31             | 82.50%                         | \$ 56,748.83       | 16.54%                | \$ 339,801.14          | 99.04%    |

Inspeksaun Husi:

  
1. ( Eng. Domingos D. X. Silva)

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irigação  
Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

  
( Eng. Remigio da C. S. dos Santos)  
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,  
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Certifika husi :

  
( Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e  
Validação de Qualidade, ADN.I.P





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO  
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU D ( BA - 7 )

### INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200

Kompanha : We'coi Unipessoal Lda

| No | Data inspesaun | Municipiu / Posto    | Naran Eng.                  | Pozisaun                                        | No | INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Asinatura |
|----|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I  | 4/5/2023       | Manatuto/<br>Barique | Eng. Domingos D.X.<br>Silva | Eng. Ba<br>Projetu ITI<br>Munisipiu<br>Manatuto | 1  | <div><div>ADN I.P.</div><div><div>molok prime coat</div><div>2. Halo trial ba prime coat molok prime</div><div>3. Hmms base course molok prime</div><div>4. Uca Compressor lodi Hm Sai Rai rahun molok rega prime coat (Asphalt Ben)</div><div>5. Continua servisu</div><div>1. - Apparente construction</div><div>2. - Halo Request molok prime</div><div>Atu prime.</div><div>- Asalea fali servisu</div><div>Selen, excepto lodi pumae.</div><div>- Tante lodi Sai sai rai-rahun molok prime.</div><div>3. 21/05/2023 Domingos D.X. Silva</div><div>ADN IP - M. Manatuto</div><div>- Continua ba Hem servisu seluk/ asphalt request</div><div>- Halo rebermentu/ ba obra nain molok continua Asphalt</div><div>- Enginero Comp. fentle mantem ita fentle wain/ nain servisu lao</div></div></div> |           |
|    |                |                      |                             |                                                 | 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|    |                |                      |                             |                                                 | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|    |                |                      |                             |                                                 | 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



KADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## # ANEXU C1 ( BA-8 )

### Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center  
Chainage 0+000 - 3+000

No. kontratu : MPW-W-210061

**Data Inspesaun** : 04/ 05/ 2023

Fatin Inspesaun : Natarbora - Uma Boco- Aubeon

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.996666°, Latetude : 126.084966°

End Point : Long : -9.004681°, Latetude : 126.061377°

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos D.X. Silva

#### Sketch & Foto Desenho

Sketsa servisu;  
Compania continua halo servisu atiru rai  
ou embankment.

#### Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 ( BA -8 )


Naran Projeto : RD4 RURAL ROAD ROUTINE MAINTENANCE  
No. kontratu : MPW-W-210055  
Postu : Natarbora  
Suku : Aubeon  
Naran Kompanhia : Linoel Unip, Lda

| SUMMARY     |                              |                               |                           |                                |                    |                       |                     |           |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| SECTION NO. | DESCRIPTION                  | TOTAL CONTRACT COST<br>(US\$) | PROGRESS PAYMENT BY A D N |                                |                    |                       |                     |           |
|             |                              |                               | PREVIOUS<br>BILLING (USD) | PERCENT<br>PREVIOUS<br>BILLING | THIS BILLING (USD) | PERCENT THIS<br>MONTH | TOTAL TO DATE (USD) | % TO DATE |
| R-01        | General                      | \$ 2,440.90                   | \$ 950.00                 | 0.32%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 950.00           | 0.32%     |
| R-05        | Earth work                   | \$ 23,170.60                  | \$ 18,404.16              | 6.21%                          | \$ 1,920.00        | 0.65%                 | \$ 20,324.16        | 6.86%     |
| R-07        | Sub-base, Base and Pavement  | \$ 56,064.54                  | \$ -                      | 0.00%                          | \$ 1,260.60        | 0.43%                 | \$ 1,260.60         | 0.43%     |
| R-08        | Bituminous pavement          | \$ 134,733.55                 | \$ -                      | 0.00%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ -                | 0.00%     |
| R-10        | Structures                   | \$ 16,458.42                  | \$ 11,995.41              | 4.05%                          | \$ 1,013.92        | 0.34%                 | \$ 13,009.33        | 4.39%     |
| R-11        | Dayworks                     | \$ 182.00                     | \$ 182.00                 | 0.06%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 182.00           | 0.06%     |
| R-15        | Routine maintenance          | \$ 5,357.00                   | \$ 4,057.00               | 1.37%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 4,057.00         | 1.37%     |
| R-15        | Provisional sum              | \$ 200.00                     | \$ 200.00                 | 0.07%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 200.00           | 0.07%     |
| A           | Construction Cost            | \$ 238,607.02                 | \$ 35,788.57              | 12.08%                         | \$ 4,194.52        | 1.42%                 | \$ 39,983.08        | 13.50%    |
| B           | Profit & Over Head (10% x A) | \$ 23,860.70                  | \$ 3,578.86               | 1.21%                          | \$ 419.45          | 0.14%                 | \$ 3,998.31         | 1.35%     |
| C           | Generals item                | \$ 27,936.02                  | \$ 15,359.50              | 5.19%                          | \$ -               | 0.00%                 | \$ 15,359.50        | 5.19%     |
| D           | Tax 2 % x (A+B+C)            | \$ 5,808.07                   | \$ 1,094.54               | 0.37%                          | \$ 92.28           | 0.03%                 | \$ 1,186.82         | 0.40%     |
| E           | GRAND/GROSS TOTAL            | \$ 296,211.81                 | \$ 55,821.46              | 19.145%                        | \$ 4,706.25        | 1.59%                 | \$ 60,527.71        | 20.73%    |

Inspeksaun Husi:

  
2. Domingos D.X. Silva  
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e  
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P.

Verifika Husi :

  
Eng. Remigio da c.s dos Santos  
Eng. Senior ba Projecto Insfrasturctura e Irigasaun,  
ADN, I.P

Sertifika husi :

  
Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas  
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de  
Qualidade, ADN.I.P









MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA-10)

## Back-up Data

Naran Projeto : New Contruction of Gapura and Gabion Wall Protection no Jardim de  
Herois de Natarbora

No. kontratu : 215/MACLN/X/2021

**Data Inspesaun : 04 Maio 2023**

Fatin Inspesaun : Natarbora

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.9711S,

Latetude : 126,04947E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Progressu iha fulan ida ne'e:  
Konstrusaun refere atinji ona  
100 % ba nia pregressu fiziku  
no kompanhia mos submete  
ona dokumentus pedidu  
pagamentu ba 100% nian mai  
iha ADN IP.







MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA-10)

## Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction of Gapura and Gabion Wall Protection no Jardim de  
Heróis de Natarbora

No. kontratu

: 215/MACLN/X/2021

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .







## #ANEXU C2 ( BA-10) SUMMARY BOQ

PEMILIK PROYEK : MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL  
NAMA PROYEK : NEW CONSTRUCTION OF GAPURA AND GABION WALL PROTECTION NO JARDIM DE HEROIS DE NATARBORA  
LOKASI : NATARBORA - MANATUTO

### MAIN SUMMARY

| NO  | URAIAN PEKERJAAN         | ORIGINAL CONTRACT  | PROGRESS REPORT BY ADN IP |            |               |            |               |            |
|-----|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|     |                          |                    | PREVIOUS PROGRESS         |            | THIS PROGRESS |            | TOTAL TO DATE |            |
|     |                          | TOTAL BIAYA (US\$) | AMOUNT                    | WEIGHT (%) | AMOUNT        | WEIGHT (%) | AMOUNT        | WEIGHT (%) |
| I   | PERSIAPAN                | \$ 6.550,00        | \$ 5.450,00               | 1,33%      | \$ 1.100,00   | 0,27%      | \$ 6.550,00   | 1,60%      |
| II  | KONSTRUKSI GAPURA        | \$ 34.469,21       | \$ 25.357,47              | 6,21%      | \$ 9.111,74   | 2,23%      | \$ 34.469,21  | 8,44%      |
| III | PEMASANGAN BRONJONG      | \$ 318.618,69      | \$ 315.479,06             | 77,24%     | \$ 3.139,63   | 0,77%      | \$ 318.618,69 | 78,00%     |
| A   | TOTAL                    | \$ 359.637,90      | \$ 346.286,54             | 84,78%     | \$ 13.351,36  | 3,27%      | \$ 359.637,90 | 88,05%     |
| B   | CONTRACTOR FEE (10% x A) | \$ 35.963,79       | \$ 34.628,65              | 8,48%      | \$ 1.335,14   | 0,33%      | \$ 35.963,79  | 8,80%      |
| C   | OVERHEAD                 | \$ 4.850,00        | \$ 2.272,50               | 0,56%      | \$ 2.577,50   | 0,63%      | \$ 4.850,00   | 1,19%      |
| D   | TAX (2% x (A+B+C))       | \$ 8.009,03        | \$ 7.663,75               | 1,88%      | \$ 345,28     | 0,08%      | \$ 8.009,03   | 1,96%      |
| E   | GRAND TOTAL (A+B+C+D)    | \$ 408.460,73      | \$ 390.851,45             | 95,69%     | \$ 17.609,29  | 4,31%      | \$ 408.460,73 | 100,00%    |

Prepara husi :

( Eng. Quico Adelino Junior )  
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no  
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :

( Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo )  
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua  
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

( Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e  
Validação de Qualidade ADN, I.P





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-7)

## Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun**  
No. kontratu :

**Data Inspesaun : 17 Maio 2023**

Fatin Inspesaun : Remanarun-Laclo

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.62940038 S

Latetude : 125.78705982 E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : **Quico Adelino Junior**


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Progressu ba refere iha  
fulan ida ne'e:

Ba parte classroom grupo  
hahu ona monta arus  
janela no komesa ona ho  
servisu pengisian beton  
ba sisi pinggir Kusen  
ninian.

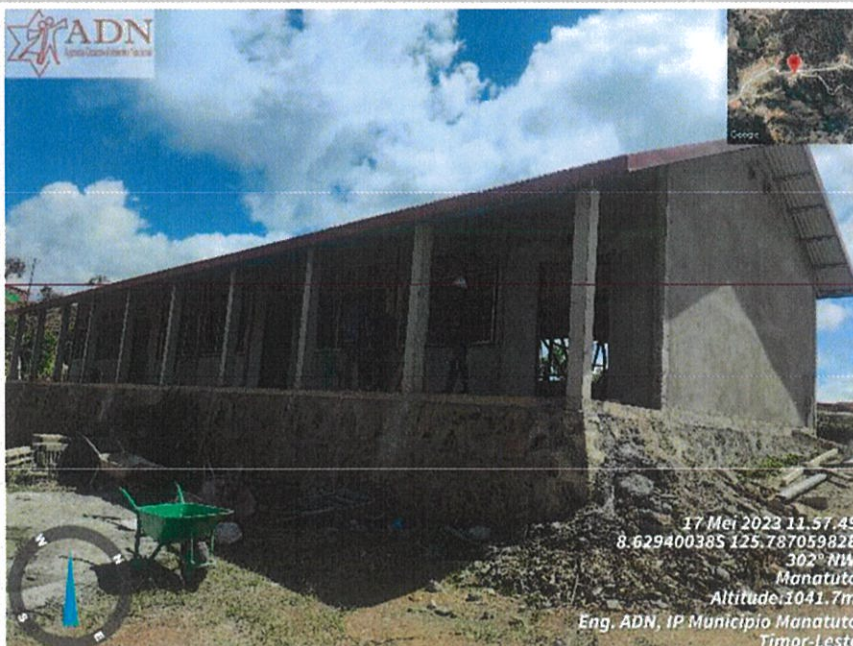



MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-7)


## Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun  
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

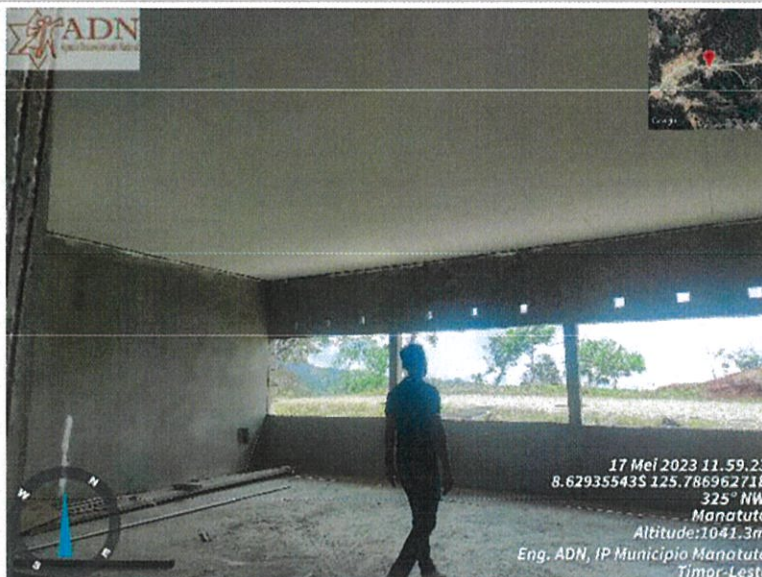

Sketch & Foto Desenho


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Grupo halo kompras ona  
ba material sira no agora  
dadaun material sira  
kuaze kompletu ona iha  
armajem eskola ninian.



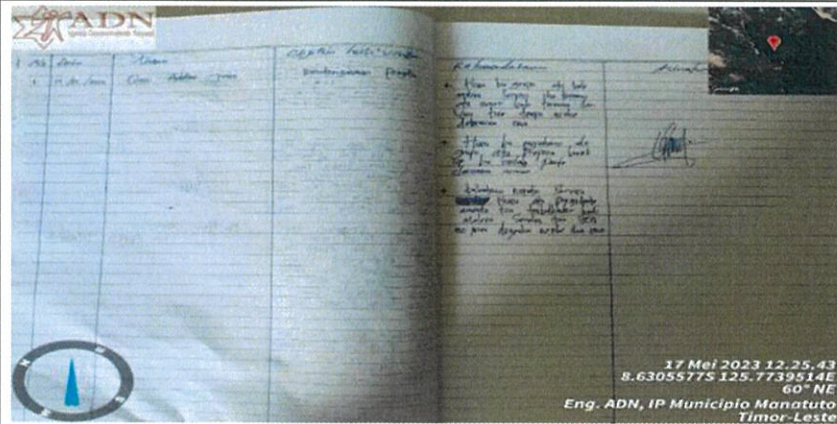

| <div><div><div>MINISTÉRIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO<br/>VII GOVERNO CONSTITUCIONAL</div></div><div><div>ADN, I.P.<br/>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público</div></div></div> |                |                   |                      |               | #ANEXU D (LA-7)<br>INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                      |               |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO EBC Remanarun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                      |               |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data inspesaun | Municipiu / Posto | Naran Eng.           | Pozisaun      | No                                            | INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN                                                                                                                       | Fotografia                                                                          | Asinatura                                                                           |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17/05/2023     | Manatuto/Laclo    | Quico Adelino Junior | Tek A D N, IP | 1                                             | Husu ba grupo atu bele aselera servisu iha terrenu atu nune'e bele termina servisu tuir tempu ne'ebe determina ona.                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | 2                                             | Husu ba enginheiru do grupo atu prepara back up ba railing parte classroom ninian.                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | 3                                             | Kontinua nafatin servisu , husu atu prezidente do grupo atu aumenta tan trabalhador hodi aselera servisu tuir BOQ no mos dezenhu ne'ebe iha ona. |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | 4                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |



## #ANEXU C2 ( LA-7)

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun

Lokalidade : Suco Hatuermera, Posto Administrativo Laclo

Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

| SUMMARY |                                |         |     |              | PROGRESS REPORT BY ADN IP |            |               |            |               |            |
|---------|--------------------------------|---------|-----|--------------|---------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| No      | MAIN SUMMARY                   | Page No |     | Amount       | PROGRESS PREVIOUS         |            | PROGRESS MAY  |            | TOTAL TO DATE |            |
|         |                                |         |     |              | Amount (US\$)             | Weigth (%) | Amount (US\$) | Weigth (%) | Amount (US\$) | Weigth (%) |
| I       | PRELIMINARIES                  | PP/3    |     | \$ 3.075,00  | \$ 1.860,00               | 1,90%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 1.860,00   | 1,90%      |
| II      | CLASSROOM BUILDING C           | C/39    | (i) | \$ 49.095,82 | \$ 31.721,79              | 32,36%     | \$ 1.887,03   | 1,93%      | \$ 33.608,82  | 34,29%     |
| III     | TOILET BULDING Tb              | TB/39   | (i) | \$ 24.265,03 | \$ 7.100,11               | 7,24%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 7.100,11   | 7,24%      |
| IV      | PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS | SW/24   | (i) | \$ 12.248,77 | \$ -                      | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      |
| A       | CONSTRUCTION COST              |         |     | \$ 88.684,62 | \$ 40.681,90              | 41,50%     | \$ 1.887,03   | 1,93%      | \$ 42.568,93  | 43,43%     |
| B       | CONTIGENCIA                    |         |     | \$ 3.000,00  | \$ -                      | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      | \$ -          | 0,00%      |
| C       | OVERHEAD                       |         |     | \$ 6.340,00  | \$ 3.255,00               | 3,32%      | \$ -          | 0,00%      | \$ 3.255,00   | 3,32%      |
| D       | GRAND TOTAL                    |         |     | \$ 98.024,62 | \$ 84.618,80              | 44,82%     | \$ 3.774,06   | 1,93%      | \$ 88.392,86  | 46,75%     |

Prepara husi :

( Eng. Quico Adelino Junior )

Eng. ba Projeto Edificio Publico Beé no  
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

( Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo )  
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua  
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

( Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e  
Validação de Qualidade ADN, I.P.





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO  
VIA GOVERNO E INSTITUCIONAL



ADN, I.P.  
Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## PLANU INSPESAUN

| Naran Eng.           |                                             | Quico Adelino Junior                                                                       |                             |                           |                                           |                                           |        |      | 2023 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|-----|
| Município            |                                             | MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS                                                               |                             |                           |                                           |                                           |        |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
| Município /<br>Posto | No.                                         | Naran Projeto                                                                              | Naran Companhia             | No Contrato               | Kategoria                                 | Dono do Projeto                           | Action | Maio |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    | OBS |
|                      |                                             |                                                                                            |                             |                           |                                           |                                           |        | 1    | 2    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29       | 30       | 31 |     |
| MANATUTO VILA ( MV ) | 3                                           | Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto                                          | Obrai Unipesoal, Lda        | ICB/0128/SEJD-2014        | FI                                        | SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU  | Plan   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |    |     |
|                      |                                             |                                                                                            |                             |                           |                                           |                                           | Actual |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 6                                           | Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto         | Carya Timor Leste Unip. Lda | 08/PDIM-IMNTT/XII/2019    | PDIM                                      | ESTATAL                                   | Plan   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |    |     |
|                      |                                             |                                                                                            |                             |                           |                                           |                                           | Actual |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 7                                           | Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto                      | Carya Timor Leste Lda       | 01/PDIM-IMNTT/XII/2019    | PDIM                                      | ESTATAL                                   | Plan   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |    |     |
|                      |                                             |                                                                                            |                             |                           |                                           |                                           | Actual |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 8                                           | Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto                                        | Baboe Unip Lda              | 019/Janeiro/2020          | LM                                        | MINISTERIO DA JUSTICA                     | Plan   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |                                             |                                                                                            |                             |                           |                                           |                                           | Actual |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 9                                           | Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Munisipiu Manatuto                                        | Talamori Unip,Lda           | RDTL-MS-DNA-DC-20-254     | Fundo Covid-19                            | MINISTERIO SAUDE                          | Plan   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |                                             |                                                                                            |                             |                           |                                           |                                           | Actual |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 11                                          | New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality           | MINISTERIO SAUDE            | RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227 | Fundo Covid-19                            | MINESTERIO SAUDE                          | Plan   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |                                             |                                                                                            |                             |                           |                                           |                                           | Actual |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 12                                          | Supplay and Installation Main Power For Isolation an Laboratorium Building Maabat Manatuto | MINISTERIO SAUDE            | RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-229 | Fundo Covid-19                            | MINESTERIO SAUDE                          | Plan   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |                                             |                                                                                            |                             |                           |                                           |                                           | Actual |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 13                                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala                                              | MEJD PKRIE ESG KAY RALA     | -                         | LM-TP                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |                                             |                                                                                            |                             |                           |                                           |                                           | Actual |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
| 14                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau | MEJD PKRIE EBF RENTAU                                                                      | -                           | LM-TP                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |        |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |    |     |
|                      |                                             |                                                                                            |                             |                           |                                           | Actual                                    |        |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
| 15                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor  | MEJD PKRIE PE REMBOR                                                                       | -                           | LM-TP                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |        |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |    |     |
|                      |                                             |                                                                                            |                             |                           |                                           | Actual                                    |        |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
| 16                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato | MEJD PKRIE EBF OBRATO                                                                      | -                           | LM-TP                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan                                      |        |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |    |     |
|                      |                                             |                                                                                            |                             |                           |                                           | Actual                                    |        |      |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |

*[Handwritten signature]*




| Naran Eng.        |                              | Quico Adelino Junior                                          |                                   |                                                   |           |                                           |        | 2023 |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |  |  |  |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|------|---|---|--------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----------|----------|--|--|--|
| Município         | MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           |        |      |   |   | Action |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |  |  |  |
| Município / Posto | No.                          | Naran Projeto                                                 | Naran Companhia                   | No Contrato                                       | Kategoria | Dono do Projeto                           |        | Maio |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | OBS      |          |  |  |  |
|                   |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | 1      | 2    | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |          |          |  |  |  |
|                   | 17                           | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik                  | MEJD PKRIE EBF BAHADIK            | -                                                 | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | On Going |          |  |  |  |
|                   |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |  |  |  |
|                   | 18                           | Konstrusaun EBC Vasco da Gama - Manatuto                      | Parapa Bemizu Stae Unipessoal Lda | -                                                 | LM-CD     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |          | On Going |  |  |  |
|                   |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |  |  |  |
| LALEA (LAL)       | 1                            | Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia | DCO Unip.Lda                      | 011LM/AND/MPIE/VII/DILI/2019/E DIFICIO DEPARTMENT | LM        | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU            | Plan   |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | On Going |          |  |  |  |
|                   |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |  |  |  |
|                   | 3                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui                    | MEJD PKRIE EP CAIRUI              | -                                                 | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | On Going |          |  |  |  |
|                   |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |  |  |  |
| LACLUBAR (LAC )   | 7                            | Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek          | Hatuwari Unip. Lda                | 02/PDD-II/MNTT/VII/2015                           | PDIM      | MINISTERIO SAUDE                          | Plan   |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | On Going |          |  |  |  |
|                   |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |  |  |  |
|                   | 8                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara                   | MEJD PKRIE EBF BATARA             |                                                   | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | On Going |          |  |  |  |
|                   |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |  |  |  |
|                   | 9                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um                 | MEJD PKRIE EBF AISIU-UM           |                                                   | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | On Going |          |  |  |  |
|                   |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |  |  |  |
|                   | 10                           | Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laktubar         | Mercy Unipessoal Lda.             |                                                   | PDIM      | MINISTERIO SAUDE                          | Plan   |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  | On Going |          |  |  |  |
|                   |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |      |   |   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |  |  |  |





| Naran Eng.             |                              | Quico Adelino Junior                                                                  |                          |                             |           |                                           |        | 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |     |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|-----|--|--|--|--|
| Município              | MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS |                                                                                       |                          |                             |           |                                           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |     |  |  |  |  |
| Município / Posto      | No.                          | Naran Projeto                                                                         | Naran Companhia          | No Contrato                 | Kategoria | Dono do Projeto                           | Action | Maio |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          | OBS |  |  |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           |        | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30       | 31       |     |  |  |  |  |
| SOIBADA (SO)           | 5                            | Projetu Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto         | Manufahi Kiik Unip. Lda  | -                           | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |     |  |  |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |     |  |  |  |  |
|                        | 6                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik                                        | MEJD PKRIE EBF WEAIHUDIK |                             | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |     |  |  |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |     |  |  |  |  |
| BARIQUE ( BA )         | 2                            | New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora         | Tasibala II Const        | RDTL/PO:2016-11272          | LM        | MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS           | Plan   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Abandona |          |     |  |  |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |     |  |  |  |  |
|                        | 4                            | Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique                                          | Malack II Unip. Lda      | 03/PDIM-I/MNTT/IX/2019      | PDIM      | MINISTERIO SAUDE                          | Plan   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |     |  |  |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |     |  |  |  |  |
|                        | 5                            | Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162                       | Malaca Unip Lda          | No. Kontratu : MOP-W-190233 | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |     |  |  |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |     |  |  |  |  |
|                        | 10                           | New Contruction of Gapura and Gabion Wall Protection no Jardim de Herois de Natarbora | Senizu Unip. Lda         | 215/MACLN/X/2021            | LM        | MACLN                                     | Plan   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |     |  |  |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |     |  |  |  |  |
| LACLO ( LA )           | 4                            | Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food                                         | Esa-Un                   | RDTL:74/GMTAC/XI/2015       | LM        | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA   | Plan   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Pendente |          |     |  |  |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |     |  |  |  |  |
|                        | 5                            | Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilimano                                         | Surprise Unip. Lda       | 07/PDIM-II/MNTT/VIII/2016   | PDIM      | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA   | Plan   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |     |  |  |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |     |  |  |  |  |
|                        | 7                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun                                        | MEJD PKRIE EBC REMANARUN |                             | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |     |  |  |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |     |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO ON-GOING |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |     |  |  |  |  |

Note:  Plano Periode inspesaun iha tereinu  Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu  Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili  Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :  
  
Eng. Quico Adelino Junior  
(Eng. Projeto Edificio Publico, Agua e Saneamento Municipiu Manatuto, ADN.I.P.)

Sertifika Husi :  
  
Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas  
(Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade. ADN.I.P.)

Aprova Husi :  
  
Eng. Januario Maia Guterres  
(Adjunto Director Executivo, ADN.I.P.)



## PLANU INSPESAUN

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Naran Eng. | Domingos D. X. Silva |
|------------|----------------------|

2023

|           |          |
|-----------|----------|
| Municipio | Manatuto |
|-----------|----------|

| Município /<br>Posto | No. | Naran Projeto                                                                                   | Naran Companhia                         | No Contrato        | Kategoria | Dono do Projeto               | Action | Maio |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | OBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |     |                                                                                                 |                                         |                    |           |                               |        | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANATUTO VILA ( MV ) | 1   | Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila ( 3.72 km ) area in Manatuto Municipality Manatuto | Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda | SSS/062/MOPTC-2017 | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan   | ■    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## PLANU INSPESAUN

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Naran Eng. | Domingos D. X. Silva |
|------------|----------------------|

| Municipio | Manatuto |
|-----------|----------|
|-----------|----------|

2023

| Município /<br>Posto   | No.                                                                          | Naran Projeto                                                                                                                            | Naran Companhia               | No Contrato         | Kategoria                        | Dono do Projeto                  | Action | Maio |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 |                  |    |    | OBS |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|-----|
|                        |                                                                              |                                                                                                                                          |                               |                     |                                  |                                  |        | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28                                                                                                                                              | 29               | 30 | 31 |     |
| BARIQUE ( BA )         | 1                                                                            | Construction of Sahen Bridge Approach Protection ( A14 )<br>Manatuto ( MPW-W-190157 ) (162)                                              | Yoku Unipessoal Lda           | MPW-W-190157        | LM                               | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan   |      | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Projeto refere paradu tinan ida resin ona desde selu<br>pagamentu segundo Tuir informasaun katak compania<br>sei la kontinua projektu nee rasik |                  |    |    |     |
|                        |                                                                              |                                                                                                                                          |                               |                     |                                  |                                  | Actual |      |   |   | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 |                  |    |    |     |
|                        | 3                                                                            | Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta.<br>0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)                            | Zenobia Diak Unip. Lda        | MPWTC - CD - 170003 | LM                               | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan   |      | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Projeto finaliza ona                                                                                                                            |                  |    |    |     |
|                        |                                                                              |                                                                                                                                          |                               |                     |                                  |                                  | Actual |      |   |   | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 |                  |    |    |     |
|                        | 6                                                                            | R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage<br>0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-<br>9+800 (162) | Manufahi Kiik Unip. Lda       | MPW-W-W-190080      | LM                               | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan   |      | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Projeto refere paradu tinan ida resin ona, tuir<br>informasaun husi Compania responsavel obra katak<br>sira sei la kontinua projektu nee.       |                  |    |    |     |
|                        |                                                                              |                                                                                                                                          |                               |                     |                                  |                                  | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 |                  |    |    |     |
|                        | 7                                                                            | R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon<br>Chainage 3+000-6+200                                                      | We"coi Unipessoal Lda         | MPW-W-210062        | LM                               | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan   |      | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 | Projeto Lao hela |    |    |     |
|                        |                                                                              |                                                                                                                                          |                               |                     |                                  |                                  | Actual |      |   |   | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 |                  |    |    |     |
|                        | 8                                                                            | R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture<br>Center Chainage 0+000 - 3+000                                                  | Linoel                        | MPW-W-210061        | LM                               | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan   |      | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 | Projeto Lao hela |    |    |     |
|                        |                                                                              |                                                                                                                                          |                               |                     |                                  |                                  | Actual |      |   |   | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 |                  |    |    |     |
| 9                      | R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique<br>Chainage 0+000-9+000 | Gimso Brothers Unip. Lda                                                                                                                 | MPW-W-210058                  | LM                  | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan                             |        | ■    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Projeto Lao hela                                                                                                                                |                  |    |    |     |
|                        |                                                                              |                                                                                                                                          |                               |                     |                                  | Actual                           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 |                  |    |    |     |
| LACLO ( LA )           | 2                                                                            | Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio<br>Manatuto                                                                     | Sahan I Unip. Lda             | SSS/304/MOPTC-2016  | FI                               | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan   |      |   |   |   | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Projeto finaliza ona                                                                                                                            |                  |    |    |     |
|                        |                                                                              |                                                                                                                                          |                               |                     |                                  |                                  | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 |                  |    |    |     |
|                        | 3                                                                            | Routine Roads Maintenance - Lacio, Manatuto Municipality                                                                                 | Egana, Unip. Lda              | MPW-W-190251        | LM                               | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan   |      |   |   |   | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Projeto paradu                                                                                                                                  |                  |    |    |     |
|                        |                                                                              |                                                                                                                                          |                               |                     |                                  |                                  | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 |                  |    |    |     |
|                        | 6                                                                            | National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package<br>A01-01)                                                                 | Sinohydro Corporation Limited | ICB/07/MPW-2014     | FI                               | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Observa husi engenheiro Nacional parte Imprestimo<br>Loan Project                                                                               |                  |    |    |     |
|                        |                                                                              |                                                                                                                                          |                               |                     |                                  |                                  | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 |                  |    |    |     |
|                        | 8                                                                            | Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp at Behau                                                                                      | Baboe Unip Lda                |                     | LM-BS                            | MINISTERIO DA DEFESA             | Plan   |      |   |   |   | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Projeto refere finaliza ona no halo ona pagamentu<br>100%                                                                                       |                  |    |    |     |
|                        |                                                                              |                                                                                                                                          |                               |                     |                                  |                                  | Actual |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 |                  |    |    |     |
| TOTAL PROJETO ON-GOING |                                                                              |                                                                                                                                          |                               |                     |                                  |                                  |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                 |                  |    |    |     |

**Note:**

### Plano Periode inspesaun iha tereinu

### Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

**Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili**

**Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu**

Prepara Husi :

(Edu Domingos D. X. Silva)

Eng. ba Projeto Infraestructura Transporte e Irigasaun Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)  
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN.I.P.

Aprova Husi :

( Eng. Januario Maia Guterres )  
Adjunto Director Ejecutivo, ADN.I.P
