



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN PROJETUS
MUNISÍPIU AINARO

ABRIL 2023




SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO AINARO

ABRIL 2023

Prepara Husi :




(Eng. Joaquim de C. Madeira)

Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Ainaro ADN, I.P




(Eng. Romulo J. Marques Henrique)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigação, Município Ainaro ADN, I.P




(Eng. Claudino Soares dos Santos)

Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Ainaro ADN, I.P



(Eng. Jaulino H. Rodrigues)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigação, Município Ainaro ADN, I.P



(Silvino D R R Soares)

Eng. M & E, Município Ainaro ADN, I.P

Verifica Husi :



(Arc. Francisco X D D Jeronimo)

Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P



(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)

Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e
Irigação, ADN, I.P



(Deolindo de F Marques)

Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifica Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)

Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Ainaro	3
1.3. Lista Projectos	6
II. PROGRESU FISIKU	14
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	14
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	14
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	14
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	15
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu.....	15

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.....	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamientos.....	6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores.....	8
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio	11
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro	13

I. INTRODUSAUN


1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional, I.P ou ADN, I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Presidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN, I.P nian maka atu aseguza katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ADN, I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno caso presiza.

1.2 Perfil Municipio Ainaro

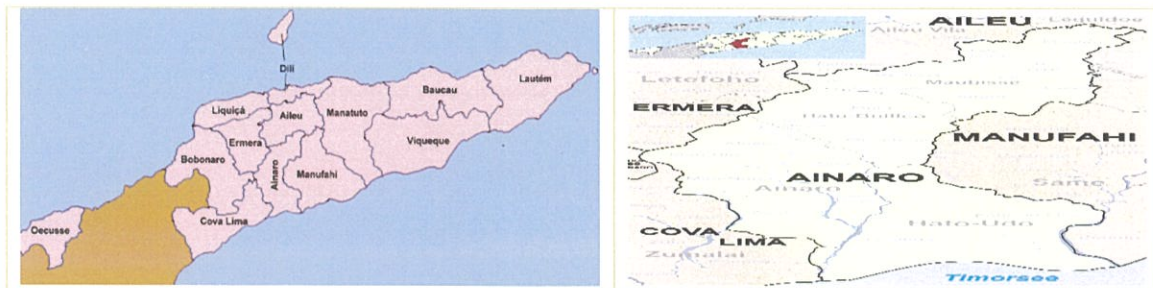

Administrasaun Munisipal Ainaro lokalizadu iha sudoeste paíz no mapa 2. hatudu pozisaun jeográfiku Munisipiu Ainaro ne'ebé ho luan 797 km² ho populasaun nain 59,175 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Ainaro iha Postu Administraativo ha'at, Sukus 21 no Aldeias 131 hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1: Ponto Administrativo, Sukus no Total Aldeias/Sukus

Ainaro		Hatu Bulico		Hatu Udo		Maubisse	
Sukus	Aldeias	suku	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Ainaro	7	Mauchiga	7	Foho-Ailico (beikala)	6	Aituto	9
Cassa	5	Mulo	8	Leolima	10	Edi	6
Manutaci	4	Nuno Moge	6	-	-	Fatubessi	6
Mau-Nuno	3	-	-	-	-	Horai-Quic	4
Mau-Ulo	5	-	-	-	-	Liurai	4
Soro	4	-	-	-	2	Manelobas	4
Suro-Craic	4	-	-	-	4	Manetu	7
-	-	-	-	-	-	Maubisse	12
-	-	-	-	-	-	Maulau	10
Total	32	-	21	-	22	-	62

Data husi : Livro 3B OJE 2021, Pajina 22

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro			4			4	
2	Administrasaun no Financas			0			0	
3	Motorista			1			1	
4	Seguransa			0			0	
	Grand Total			5			5	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro

ASET ADN,IP MUNICIPIO AINARO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio			1			1	Moru hadia, monta tralis
2	Kareta			1			1	Kondisaun ladun diák
3	Desktop HP / Monitor			1			1	Diak
4	Laptop HP			1			1	Todan presija update
5	Printer Cannon			1			1	Diak
6	UPS			1			1	Aat
7	Armario File			2			2	Diak
8	Armario Tau hena			2			2	Aat 1
9	Meja escritorio			1			1	Diak
10	Meja han			1			1	Aat
11	Meja TV (kiik)			1			1	Diak
12	Kadeira escritorio			6			6	Diak
13	Kadeira han			4			4	Att 2
14	Sofa			1 Set			1	Diak
15	Springbed +sumasu 4			2 Set			2	Diak (sumasu laiha)
16	Jeleira			1			1	Diak
17	Water Dispenser			1			1	Aat
18	TV + Parabola			1 Set			1	Aat
19	Kipas Angin			5			5	Aat
20	Kompor			1			1	Diak
21	Kompor Gas			1			1	Aat
22	Rack sepatu			3			3	Aat
23	Rack Piring			1			1	Diak
24	Water Pump Sanyo			1			1	Aat

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dadus projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamiento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamiento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + PDIM + LM - BS + LM - TP		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	21	\$ 18,295,245.66	62.76%
2	Hatubuilico	12	\$ 7,047,176.63	77.53%
3	Hatudo	11	\$ 2,758,198.43	19.53%
4	Maubisse	21	\$ 6,403,710.91	66.24%
Grand Total		65	\$ 34,504,331.63	62.96%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	9	\$ 16,060,460.02	65.48%
2	Hatubuilico	2	\$ 5,417,567.63	87.48%
3	Hatudo	5	\$ 1,770,459.15	13.94%
4	Maubisse	9	\$ 5,130,827.23	73.68%
Grand Total		25	\$ 28,379,314.03	67.95%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	\$ 1,376,091.81	31.34%
2	Hatubuilico	7	\$ 1,379,650.79	44.79%
3	Hatudo	2	\$ 686,368.28	20.86%
4	Maubisse	3	\$ 433,853.68	16.23%
Grand Total		17	\$ 3,875,964.56	32.58%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	3	\$ 450,461.58	63.74%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 84,160.28	87.69%
Grand Total		4	\$ 534,621.86	67.51%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo	1	\$ 24,446.00	90.00%
4	Maubisse			
Grand Total		1	\$ 24,446.00	90.00%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	4	\$ 408,232.25	60.41%
2	Hatubuilico	3	\$ 249,958.21	42.48%
3	Hatudo	3	\$ 276,925.00	45.80%
4	Maubisse	7	\$ 730,876.53	40.43%
Grand Total		17	\$ 1,665,991.99	46.52%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Emergency		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 23,993.19	90.00%
	Grand Total	1	\$ 23,993.19	90.00%

Dadus detallu kada projektu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO AINARO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	1	\$ 546,598.02	22.89%
2	Edukasaun	18	\$ 2,079,402.69	44.58%
3	Eléctricidade	10	\$ 7,999,431.74	73.14%
4	Estradas E Pontes	14	\$ 16,390,876.84	56.06%
5	Flood Control	2	\$ 108,153.47	88.20%
6	Imprestimo	1	\$ 4,187,508.61	92.29%
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	14	\$ 2,500,306.12	57.70%
8	Pontes	1	\$ 273,148.15	12.71%
9	Saude	2	\$ 242,372.02	43.02%
10	Turismo	2	\$ 176,533.97	51.95%
	Grand Total	65	\$ 34,504,331.63	62.96%

NO	SECTOR PROYECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	1	\$ 546,598.02	22.89%
2	Edukasaun	4	\$ 520,065.09	65.99%
3	Eléctricidade	3	\$ 2,130,985.59	80.80%
4	Estradas E Pontes	6	\$ 13,670,136.67	63.64%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 815,683.40	44.91%
8	Pontes	1	\$ 273,148.15	12.71%
9	Saude	2	\$ 242,372.02	43.02%
10	Turismo	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		21	\$ 18,295,245.66	62.76%

NO	SECTOR PROYECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	3	\$ 249,958.21	42.48%
3	Eléctricidade	1	\$ 1,230,059.02	71.11%
4	Estradas E Pontes	2	\$ 854,631.59	25.74%
5	Flood Control			
6	Imprestimo	1	\$ 4,187,508.61	92.29%
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	4	\$ 444,741.95	88.24%
8	Pontes			
9	Saude			
10	Turismo	1	\$ 80,277.25	6.83%
Grand Total		12	\$ 7,047,176.63	77.53%

NO	SECTOR PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	4	\$ 578,502.86	31.47%
3	Eléctricidade	1	\$ 384,790.42	22.85%
4	Estradas E Pontes	4	\$ 1,482,565.12	13.98%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	2	\$ 312,340.03	19.72%
8	Pontes			
9	Saude			
10	Turismo			
	Grand Total	11	\$ 2,758,198.43	19.53%

NO	SECTOR PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	7	\$ 730,876.53	40.43%
3	Eléctricidade	5	\$ 4,253,596.71	74.44%
4	Estradas E Pontes	2	\$ 383,543.46	16.18%
5	Flood Control	2	\$ 108,153.47	88.20%
6	Imprestimo			
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	5	\$ 927,540.74	67.09%
8	Pontes			
9	Saude			
10	Turismo			
	Grand Total	21	\$ 6,403,710.91	66.24%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	1	\$ 84,160.28	87.69%
2	Ministerio Das Obras Publicas	39	\$ 30,861,164.82	65.30%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	19	\$ 2,103,848.69	45.10%
4	Ministerio Saude	2	\$ 242,372.02	43.02%
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	22.89%
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria	1	\$ 80,277.25	6.83%
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
8	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		65	\$ 34,504,331.63	62.96%

NO	DONO DO PROJECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal			
2	Ministerio Das Obras Publicas	12	\$ 16,400,299.98	64.59%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	4	\$ 520,065.09	65.99%
4	Ministerio Saude	2	\$ 242,372.02	43.02%
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	22.89%
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
8	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		21	\$ 18,295,245.66	62.76%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat			
2	Ministerio Das Obras Publicas	8	\$ 6,716,941.17	79.67%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	3	\$ 249,958.21	42.48%
4	Ministerio Saude			
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria	1	\$ 80,277.25	6.83%
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope			
	Grand Total	12	\$ 7,047,176.63	77.53%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat			
2	Ministerio Das Obras Publicas	6	\$ 2,155,249.57	15.53%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	\$ 602,948.86	33.85%
4	Ministerio Saude			
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope			
	Grand Total	11	\$ 2,758,198.43	19.53%

NO	DONO DO PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	1	\$ 84,160.28	87.69%
2	Ministerio Das Obras Publicas	13	\$ 5,588,674.10	69.29%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	7	\$ 730,876.53	40.43%
4	Ministerio Saude			
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope			
Grand Total		21	\$ 6,403,710.91	66.24%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Produktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Ainaro	16,823	7170	6636	5567	5058
Hato-Udo	10,747	3130	2923	2415	2279
Hato-Builico	13,249	3457	3365	3241	3186
Maubisse	24,672	6378	6309	6222	5764

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu neébe hetan husi progresu fulan ida neé, ikus liu porsentagen actual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detallu bele hareé iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hareé #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Obstaclo neébe ami enjineiru hasoru iha terenu mak hanesan tuir mai ne'e :

1. Kompanhia nia tekniku laiha terenu
 2. Kompanhia neébe ka'er obra iha Municipio Ainaro iha hotu Dili
 3. Teknik husi Projetu nain ladun halo inspesaun ba iha terenu
 4. Kondisaun kareta ne'ebe Suporta Ekpa ADN, I.P iha tereno ho kondisaun ne'ebe sei aat
- Obstaclo parte Eletricidade
1. Durante Eng ADN, I.P halo monitorin directur kompahnia nunka iha fatin projeto e delega ema balun mak sempre hein iha fatin projeto.
 2. Kompahnia balun mak to agora sedauk hadia konstruk Linha MV & LV nebe mak avaria.
 3. Iha kompahnia seluk hein hela karta termo de entrega 10% husi EDTL – EP municipio ate agora sedauk fo ba kompahnia.
 4. Seksaun M & E - ADN, I.P sempre hasoru mak kona ba motorist.
 5. Seksaun M & E – ADN, I.P la bele kontrola masimu projeto electricidade ho edificio public tamba Eng M & E – ADN, I.P ida kontrola municipio ha'at (4).

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Buka solusaun ba projetu ne'ebe parado
2. Sistema Internet iha Municipio lalao ho diak ho difikulta enjineiru nia servisu
3. Kondisaun Rezidesia Oficial ADN, I.P Municipio Ainaro ne'ebe presija atu hadia:
 - Be'e
 - Moru
 - Tralis Jenela

➤ Recomendação parte Eletricidade

1. Seksaun M & E husu parte rekursu Humanu atu aumenta tan funsionario M & E.
2. Seksaun M & E – ADN, I.P husu ba ITC tenki kria folder sistem keta ida mai iha seksaun M & E – ADN, I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Ainaro

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engineiro	Romulo J. M. Henrique	174	Enjineiru ITI		
		Joaquim de C. Madeira	167	Enjineiru EPAS		
		Claudino Soares Dos Santos	243	Enjineiru EPAS		
		Jaulino H. Rdrigues	237	Enjineiru ITI		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		

2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Lucas Alberto Soares Pereira	195	Motorista		



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL ABRIL)

					Lokalizasaun Projeto												
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN	
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	78.52%	\$ 355,512.32	\$ 97,263.04	ON-GOING	Projeto nia labela halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona	
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	87.87%	\$ 334,820.71	\$ 46,223.20	ON-GOING	Projeto nia labela halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona	
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Caloko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	88.36%	79.52%	\$ 1,031,531.81	\$ 265,634.51	ON-GOING		
4	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Consorcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC- 2016	\$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	88.00%	\$ 110,219.55	\$ 15,029.94	PHO	Projeto 100% iha tinan 2016 maibe to agora companhia sedauk husu pagamento retensaun 10%	
5	Emergency Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	91.02%	81.92%	\$ 3,543,740.61	\$ 782,035.89	ON-GOING		
6	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3,717,215.92	July 1, 2013	93.22%	71.00%	\$ 2,639,364.12	\$ 1,077,851.80	PHO		
7	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	49.52%	43.43%	\$ 2,162,279.76	\$ 2,816,071.23	ON-GOING		
8	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	91.76%	80.75%	\$ 147,667.55	\$ 35,197.14	ON-GOING	Hela 10%	
9	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489,653.83	April 10, 2019	54.62%	46.82%	\$ 229,243.50	\$ 260,410.33	ON-GOING		
10	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Sta 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	84.00%	\$ 27,553.61	\$ 5,248.26	ON-GOING		
11	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208,089.56	July 29, 2019	97.82%	87.86%	\$ 182,832.44	\$ 0.70	PHO	100% falta retensaun 10%	
12	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	94.77%	85.29%	\$ 25,075.68	\$ 4,325.46	PHO	Projeto refere 100% ona tuir volume nebe iha tereno, falta retensaun 10%	
13	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	89.59%	\$ 86,232.55	\$ 10,024.17	PHO	Projeto ferere ramata ona, husu atu hare fila fali dadus pagamento nebe iha.	
14	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Lau Sta. 0+000 - 1+200 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33,889.94	June 18, 2021	48.12%	43.31%	\$ 14,678.12	\$ 19,211.82	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno	
15	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	\$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	12.71%	\$ 34,707.48	\$ 238,440.67	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2016	
16	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	37.19%	\$ 79,200.00	\$ 133,770.88	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2015	
17	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600,016.84	July 25, 2016	66.84%	31.84%	\$ 191,070.62	\$ 408,946.22	PENDENTE	Projeto refere parado 2017	
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	74.13%	58.21%	\$ 57,367.38	\$ 41,187.36	ON-GOING		
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	50.53%	43.66%	\$ 45,015.75	\$ 58,091.29	ON-GOING		



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL ABRIL)

					Lokalizasaun Projeto										STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
NU.	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)		
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	Ainara	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	71.41%	52.56%	\$ 57,981.37	\$ 52,332.38	ON-GOING	
21	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainara District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	Ainara	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	\$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	27.95%	22.89%	\$ 125,100.22	\$ 421,497.80	ON-GOING	
22	New Construction of ESCOLA CAFE building in Ainara Municipality	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	Ainara-Vila	Ainara	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB/133/MEJD-2021	\$ 907,735.20	June 1, 2022	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 907,735.20	ON-GOING	
23	New Construction of Entry Gate no Jardim de herois de Ainara	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	Ainara	BETUA CALDA UNIPESSOAL LDA	38/MACLN/X/2021	\$ 176,938.35	Jan. 1, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 176,938.35	ON-GOING	
24	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainara	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no contrato	\$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	90.00%	\$ 22,001.40	\$ 2,444.60	PHO	
25	New Construction of Eletical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELÉCTRICIDADE	Hatudo	Ainara	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384,790.42	Jul1,26,2021	32.23%	22.85%	\$ 87,913.49	\$ 296,876.93	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
26	Road Maintenance Section - Ainara - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainara	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	13.75%	\$ 39,581.06	\$ 248,312.97	PENDENTE	Projeto refere parado 2019
27	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	55.37%	55.37%	\$ 54,188.25	\$ 43,684.55	ON-GOING	
28	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	78.77%	58.78%	\$ 40,179.86	\$ 28,176.95	ON-GOING	
29	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	47.75%	29.32%	\$ 32,455.09	\$ 78,240.30	ON-GOING	
30	Projeto Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	Leolico Unip. Lda	NCB/02/MEJD/DNA/2021	\$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	31.78%	18.32%	\$ 55,243.87	\$ 246,333.99	ON-GOING	
31	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainara	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	\$ 411,500.10	08-Mar-22	12.70%	0.00%	\$ -	\$ 411,500.10	ON-GOING	
32	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainara	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	\$ 448,953.98	08-Mar-22	29.20%	0.00%	\$ -	\$ 448,953.98	ON-GOING	
33	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainara	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	\$ 295,599.61	08-Mar-22	25.83%	20.41%	\$ 60,344.67	\$ 235,254.94	ON-GOING	
34	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainara	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	\$ 326,511.43	08-Mar-22	92.16%	44.98%	\$ 146,860.44	\$ 179,650.99	ON-GOING	
35	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	97.43%	96.68%	\$ 156,198.58	\$ 5,355.61	ON-GOING	
36	Rural Roads Routine Maintenance Ainara - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	79.19%	\$ 21,935.23	\$ 5,765.84	ON-GOING	Projeto refere ramata ona husu atu hare fila faili dadus pagamento
37	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	92.66%	83.39%	\$ 162,743.65	\$ 32,407.05	ON-GOING	
38	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	94.96%	85.47%	\$ 51,568.25	\$ 8,767.74	PHO	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL ABRIL)

					Lokalizasaun Projeto										STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
NU.	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)		
39	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76,554.69	June 18, 2021	77.79%	70.01%	\$ 53,593.69	\$ 22,961.00	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
40	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	92.29%	\$ 3,864,572.08	\$ 322,936.53	ON-GOING	
41	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loetelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Hatubuilico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	79.02%	71.11%	\$ 874,731.27	\$ 355,327.75	ON-GOING	
42	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	40.95%	0.00%	\$ -	\$ 67,801.26	ON-GOING	
43	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	85.10%	81.08%	\$ 81,604.85	\$ 19,044.66	ON-GOING	
44	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	54.31%	30.17%	\$ 24,589.74	\$ 56,917.70	ON-GOING	
45	Rural Road Rehabilitation Hatubuilico - Santuario Nain Feto Ramelau Chainage 0+000 - 2+450 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	Ainaro	Leotilya, Unipessoal Lda	MOP/CD/NCB- R/ERD22001	\$ 778,076.90	July 15, 2022	24.92%	21.38%	\$ 166,356.71	\$ 611,720.19	ON-GOING	
46	Fornesimento Konstrusaun Uma Laku Ramelau	MINISTERIO TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA	LM-CD	TURISMO	Hatubuilico	Ainaro	DELONG UNIPESOAAL LDA	RFP	\$ 80,277.25	Aug. 1, 2022	7.59%	6.83%	\$ 5,481.12	\$ 74,796.13	ON-GOING	
47	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	100.00%	74.87%	\$ 176,861.91	\$ 59,362.99	ON-GOING	
48	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	80.64%	70.87%	\$ 144,085.67	\$ 59,212.83	ON-GOING	
49	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	83.32%	\$ 475,776.61	\$ 95,267.77	ON-GOING	Projeto nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no presija hadia fali nia konstrusaun
50	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	77.57%	69.81%	\$ 458,718.70	\$ 198,379.10	ON-GOING	
51	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Dauriala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	90.00%	\$ 896,415.58	\$ 99,601.73	PHO	Hein 10 % retensaun EDTL Munisipiu maka seidaunk entrega
52	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	43.84%	\$ 452,656.17	\$ 579,755.90	ON-GOING	
53	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunomoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	88.54%	\$ 882,792.12	\$ 114,233.03	ON-GOING	Projeto nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no sei hein kompanha atu submete dokumentus



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL ABRIL)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	Lokalizasaun Projetu		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU										
54	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainara	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	87.04%	\$ 73,728.12	\$ 10,978.14	ON-GOING	Projeto refere ramata ona iha 2019 husu atu hare fila fali dados pagamento
55	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainara	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 84,160.28	July 29, 2019	97.43%	87.69%	\$ 73,802.68	\$ 10,357.60	ON-GOING	Projeto refere companhia sei hatama pagamento adicional
56	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainara	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34,371.15	June 18, 2021	90.58%	81.52%	\$ 28,020.65	\$ 6,350.50	ON-GOING	
57	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainara	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	70.57%	62.10%	\$ 219,207.07	\$ 133,793.79	PHO	
58	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainara Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainara	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	16.64%	\$ 8,373.26	\$ 41,936.96	ON-GOING	Projeto refere sei parado iha tinan 2019
59	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	28.49%	28.16%	\$ 27,909.50	\$ 71,184.64	ON-GOING	
60	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	84.08%	84.08%	\$ 77,948.39	\$ 14,758.21	ON-GOING	
61	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	77.34%	48.05%	\$ 41,552.83	\$ 44,918.67	ON-GOING	
62	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	61.76%	55.71%	\$ 54,504.66	\$ 43,336.63	ON-GOING	
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	26.34%	26.34%	\$ 39,491.20	\$ 110,425.00	ON-GOING	
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	39.81%	26.27%	\$ 24,940.70	\$ 70,010.96	ON-GOING	
65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	34.21%	26.51%	\$ 29,133.62	\$ 80,761.52	ON-GOING	
66	Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainara	AILESU UNIPESSOAL LDA	RFQ-CD-MOP-22006	\$ 23,993.19	28-Jun-22	100.00%	90.00%	\$ 21,593.87	\$ 2,399.32	PHO	
67	Rural Road Maintenance and Rehabilitation of Maubise - Urlepha (Access to Edi Manelobas) Chainage 0+000 - 3+000 and Urlepha-Rita Chainage 0+000 - 2+150	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainara	Balada	RT/004/MOP-2021	\$ 349,172.31	May 30, 2022	22.32%	9.74%	\$ 34,024.37	\$ 315,147.94	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL ABRIL)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	Lokalizasaun Projetu		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU										
68	New Construction of Turismo comunitario Flexa-Maubisse Ainaro Municipality	Sekretaria Estadu Formasaun Profisional no Empregu	LM-TP	TURISMO	Maubisse	Ainaro	Formandus Centro CNEFP - Tibar	DNFP/DGFPE/SEFOP E/2002	\$ 315,000.01	Feb. 27, 2023	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 315,000.01	ON-GOING	
TOTAL									\$ 35,904,005.19			60.41%	\$ 21,690,851.76	\$ 13,523,724.69		

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Públiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino Soares I. M. Santos)
Eng. ba Edifício Públiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Prepara Husi :

(Eng. Romulo J. Marques Henrique)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Jaulino R. Rodrigues)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Silvino D. R. Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



												Apr-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-1	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	0.00%	87.24%
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-2	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	0.00%	97.63%
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-3	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	88.36%	0.00%	88.36%
4	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-4	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
5	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-5	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	91.02%	0.00%	91.02%
6	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-6	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3,717,215.92	July 1, 2013	93.22%	0.00%	93.22%
7	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-7	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	49.52%	0.00%	49.52%
8	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-8	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	91.76%	0.00%	91.76%
9	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-9	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489,653.83	April 10, 2019	54.62%	0.00%	54.62%
10	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-10	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	0.00%	93.39%
11	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	ANV-11	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208,089.56	July 29, 2019	97.82%	0.00%	97.82%
12	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	ANV-12	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	94.77%	0.00%	94.77%
13	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	ANV-13	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
14	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-14	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33,889.94	June 18, 2021	48.12%	0.00%	48.12%
15	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	ANV-15	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	\$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	0.00%	64.84%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



												Apr-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
16	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainara-Vila	ANV-16	Ainara	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	0.00%	41.32%
17	Rehabilitasaun Estrada Ainara-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainara-Vila	ANV-17	Ainara	EI Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600,016.84	July 25, 2016	66.84%	0.00%	66.84%
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-18	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	59.07%	15.06%	74.13%
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-19	Ainara	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	48.56%	1.97%	50.53%
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-20	Ainara	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	59.46%	11.95%	71.41%
21	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainara District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	ANV-21	Ainara	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	\$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	25.43%	2.52%	27.95%
22	New Construction of ESCOLA CAFE building in Ainara Municipality	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	Ainara-Vila	ANV-22	Ainara	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB/133/MEJD-2021	\$ 907,735.20	June 1, 2022		0.00%	0.00%
23	New Construction of Entry Gate no Jardim de herois de Ainara	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	ANV-23	Ainara	BETUA CALDA UNIPESSOAL LDA	38/MACLN/X/2021	\$ 176,938.35	Jan. 1, 2021		0.00%	0.00%
24	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-1	Ainara	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no kontratu	\$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
25	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	HA-2	Ainara	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384,790.42	Jull,26,2021	32.23%	0.00%	32.23%
26	Road Maintenance Section - Ainara - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-3	Ainara	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	0.00%	15.00%
27	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-4	Ainara	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	55.37%	0.00%	55.37%
28	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-5	Ainara	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	78.77%	0.00%	78.77%
29	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-6	Ainara	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	32.90%	14.85%	47.75%
30	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	HA-7	Ainara	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	\$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	28.18%	3.60%	31.78%
31	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-8	Ainara	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	\$ 411,500.10	08-Mar-22	12.70%	0.00%	12.70%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



												Apr-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
32	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-9	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	\$ 448,953.98	08-Mar-22	29.20%	0.00%	29.20%
33	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico- Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-10	Ainaro	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	\$ 295,599.61	08-Mar-22	25.83%	0.00%	25.83%
34	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-11	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	\$ 326,511.43	08-Mar-22	92.16%	0.00%	92.16%
35	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-1	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	97.43%	0.00%	97.43%
36	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-2	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
37	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-3	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	92.66%	0.00%	92.66%
38	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-4	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	94.96%	0.00%	94.96%
39	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	HTB-5	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76,554.69	June 18, 2021	77.79%	0.00%	77.79%
40	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	HTB-6	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	0.00%	92.29%
41	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	HTB-7	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	79.02%	0.00%	79.02%
42	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-8	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	32.26%	8.69%	40.95%
43	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-9	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	74.94%	10.16%	85.10%
44	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-10	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	31.12%	23.19%	54.31%
45	Rural Road Rehabilitation Hatubuilico - Santuario Nain Feto Ramelau Chainage 0+000 - 2+450 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	HTB-11	Ainaro	Leotilya, Unipessoal Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD22001	\$ 778,076.90	July 15, 2022	8.05%	16.87%	24.92%
46	Fornesimento Konstrusaun Uma Laku Ramelau	MINISTERIO TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA	LM-CD	TURISMO	Hatubuilico	HTB-12	Ainaro	DELONG UNIPESOAAL LDA	RFP	\$ 80,277.25	Aug. 1, 2022	7.59%	0.00%	7.59%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



												Apr-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
47	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-1	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
48	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-2	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	80.64%	0.00%	80.64%
49	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-3	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	0.00%	93.00%
50	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-4	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	77.57%	0.00%	77.57%
51	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurilala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-5	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
52	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-6	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	0.00%	48.72%
53	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-7	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	0.00%	98.38%
54	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-8	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
55	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-9	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 98,821.63	July 29, 2019	97.43%	0.00%	97.43%
56	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	MBS-10	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34,371.15	June 18, 2021	90.58%	0.00%	90.58%
57	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-11	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	70.57%	0.00%	70.57%
58	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-12	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	0.00%	40.00%
59	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-13	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	28.49%	0.00%	28.49%
60	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-14	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	56.21%	27.87%	84.08%
61	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-15	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	63.79%	13.55%	77.34%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

												Apr-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
62	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-16	Ainara	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	55.71%	6.05%	61.76%
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-17	Ainara	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	26.34%	0.00%	26.34%
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-18	Ainara	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	29.07%	10.74%	39.81%
65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-19	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	27.20%	7.01%	34.21%
66	Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-20	Ainara	AILESU UNIPESAOAL LDA	RFQ-CD-MOP-22006	\$ 23,993.19	28-Jun-22	100.00%	0.00%	100.00%
67	Rural Road Maintenance and Rehabilitation of Maubise - Urlepha (Access to Edi Manelobas) Chainage 0+000 - 3+000 and Urlepha-Rita Chainage 0+000 - 2+150	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	MBS-21	Ainara	Balada Unipessoal Lda	RT/004/MOP-2021	\$ 349,172.31	May 30, 2022	22.32%	0.00%	22.32%
68	New Construction of Turismo comunitario Flexa-Maubisse Ainara Municipality	Sekretaria Estadu Formasaun Profisional no Empregu	LM-TP	TURISMO	Maubisse	MBS-22	Ainara	Formandus Centro CNEFP - Tibar	DNFP/DGFPE/SEFOPE/2 002	\$ 315,000.01	Feb. 27, 2023		0.00%	0.00%

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Claudino Soares Dos Santos)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Romulo J. Marques Henrique)
Eng. ba Projektu Infraestrutur e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Jaulino H. Rodrigues)
Eng. ba Projektu Infraestrutur e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Silvino D.R.R. Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainara ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X.D.D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projektu Infraestrutur e Irigasaun,
ADN, I.P.

(Deolindo de F. Marques)
Chefe Sek. Projektu M.E & ITC, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



KADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Rehabilitation Hatubulico - Santuario Nain Feto Ramelau
Chainage 0+000 - 2+450 Ainaro Municipality
No. kontratu : MPW-W-220121

Data Inspesaun : 24/04/2022

Fatin Inspesaun : Hatubulico- Santuaio Nain Feto

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°53'47,31''S, Latetude: 125°31'11,198''E

End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E


Naran Inspector : 1. Romulo J. M. Henrique

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Inspeksaun Pagamento

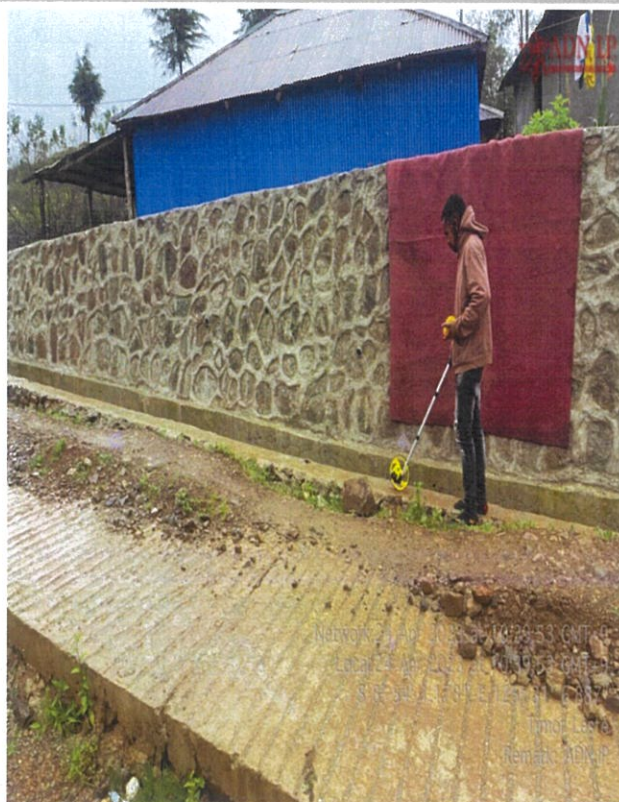



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Rehabilitation Hatubulico - Santuario Nain Feto Ramelau
Chainage 0+000 - 2+450 Ainaro Municipality
No. kontratu : MPW-W-220121

Inspeksaun Pagamento



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Inspeksaun Pagamento



ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos
Herois Municipality Ainaro.
No. kontratu : 35/MACLNSEACLN/X/2019

Data Inspesaun : 13/04/2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'59,904''S Latetude: 125°30'12,588''E

End Point : Long : - 9°1'59,496''S Latetude: 125°30'10,206''E

Naran Inspector : 1. Romulo J.M.Henrique

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

**Inspeksaun Pagamento (send cone test)
hamutuk Lab ADN, Director Kompanha
ho MACLN**





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos
Herois Municipality Ainaro.

No. kontratu

: 35/MACLNSEACLN/X/2019



Inspeksaun ba pagamento hamutuk ho Lab
ADN, Director Kompanha ho MACLN



**Kompanha : Leotyle Unip.Lda**[illegible]



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-22)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal
of Ainaro.
No. kontratu : NCB/087/MOPTC-2016

Projeto refere parado hela



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-19)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 -
5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro
No. kontratu : MPW-W-210064

Data Inspesaun : 12/04/2023

Fatin Inspesaun : Mau Nunu – Mau Ulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -9°0'17,574''S Latetude: 125°29'48,294''E

End Point : Long : -9°0'48,138''S Latetude: 125°28'39,018''E

Naran Inspector : 1. Romulo J.M Henrique
: Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Data Inspesaun : 24/04/2023

Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'9,42''S Latetude: 125°32'14,91''E


End Point : Long : -8°52'43,776''S Latetude: 125°31'56,1''E

Naran Inspector : 1. Romulo J.M Henrique
2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Projeito Refere Parado hela

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

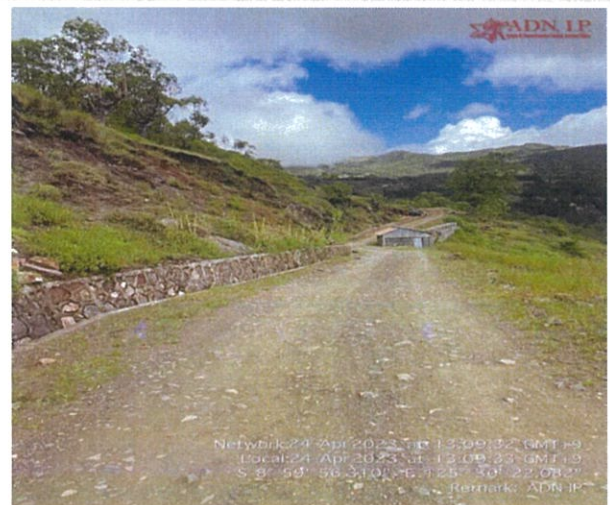



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-16) Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 -
5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality.
No. kontratu : MPW-W-210065

Data Inspesaun : 04/04/2023

Fatin Inspesaun : Lesuati Mausiga

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E


Naran Inspector : 1. Romulo J.M. Henrique

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico iha tereno sei parado hela

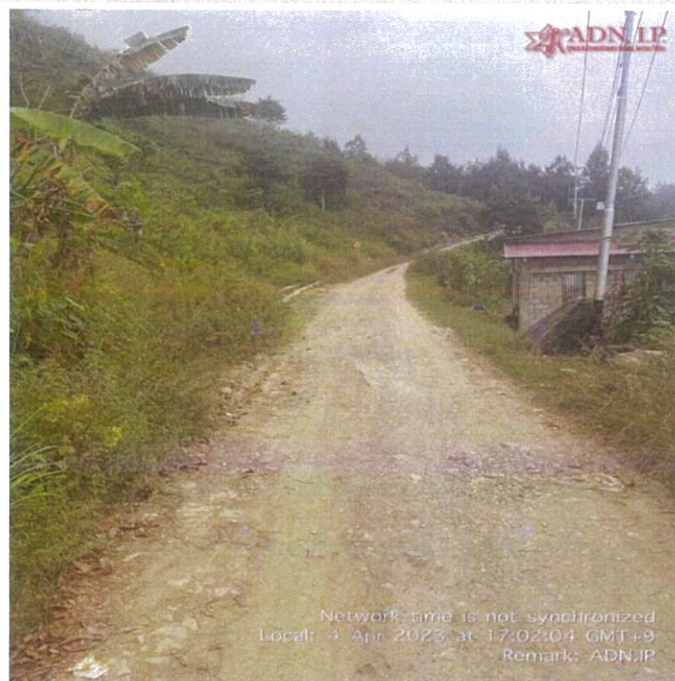



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-16) Back-up Data


Naran Projeto

: Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 -
5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality.

No. kontratu

: MPW-W-210065

Servico iha tereno sei parado hela

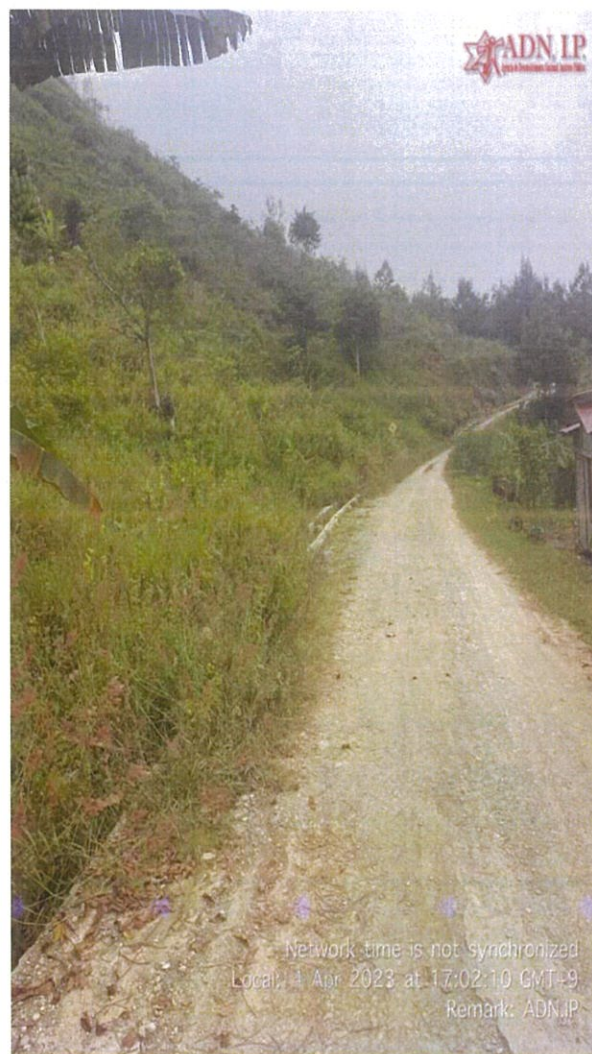

[illegible]



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Project Name : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro
Contract No. : RDTL/29/MSSI/DGAF/X/2021
Location : Ainaro Vila, Ainaro Municipality, Timor-Leste

NO	SUMMARY		PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		UP TO DATE	
	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	AMOUNT (USD)	PERCENTAGE (%)	AMOUNT (USD)	PERCENTAGE (%)	AMOUNT (USD)	PERCENTAGE (%)
A OFFICE BUILDING								
1	PREPARATION WORKS	\$ 14,915.67	\$ 8,491.61	1.55%	\$ 550.00	0.10%	\$ 9,041.61	1.65%
2	EARTH WORKS	\$ 13,584.96	\$ 2,611.35	0.48%	\$ 10,973.61	2.01%	\$ 13,584.96	2.49%
3	MASONRY WORKS	\$ 56,144.28	\$ 28,966.97	5.30%	\$ -	0.00%	\$ 28,966.97	5.30%
4	CONCRETE WORKS	\$ 50,863.89	\$ 35,911.05	6.57%	\$ -	0.00%	\$ 35,911.05	6.57%
5	ROOFING WORKS	\$ 32,805.38	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
6	CEILING WORKS	\$ 21,285.46	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
7	CARPENTRY WORKS	\$ 22,850.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
8	ELECTRICAL WORKS	\$ 13,270.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
9	SANITATION WORKS	\$ 12,382.50	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
10	PAINTING WORKS	\$ 8,205.65	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
SUB-TOTAL			\$ 75,980.98	13.90%	\$ 11,523.61	2.11%	\$ 87,504.59	16.01%
B WAREHOUSE								
1	EARTH WORKS	\$ 5,311.77	\$ 5,311.77	0.97%	\$ -	0.00%	\$ 5,311.77	0.97%
2	MASONRY WORKS	\$ 14,333.87	\$ 8,898.41	1.63%	\$ 736.77	0.13%	\$ 9,635.18	1.76%
3	CONCRETE WORKS	\$ 34,136.60	\$ 32,263.16	5.90%	\$ -	0.00%	\$ 32,263.16	5.90%
4	ROOFING WORKS	\$ 23,008.23	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
5	CARPENTRY WORKS	\$ 6,008.18	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
6	ELECTRICAL WORKS	\$ 2,635.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
7	PAINTING WORKS	\$ 2,760.19	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
SUB-TOTAL			\$ 46,473.34	8.50%	\$ 736.77	0.13%	\$ 47,210.11	8.64%
C LANDSCAPING WORKS								
1	PARK AND OFFICE PLATFORM WORKS	\$ 69,230.90	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
2	PARK ELECTRICAL WORKS	\$ 4,070.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
3	FENCE WORKS	\$ 52,405.65	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
4	SECURITY POST	\$ 14,018.31	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
SUB-TOTAL			\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
I	COST CONSTRUCTION	\$ 474,226.49	\$ 122,454.32	22.40%	\$ 12,260.38	2.24%	\$ 134,714.70	24.65%
II	CONTRACTOR FEE & OVERHEAD 10% x I	\$ 47,422.65	\$ 12,245.43	2.24%	\$ 1,226.04	0.22%	\$ 13,471.47	2.46%
III	OVERHEAD	\$ 5,000.00	\$ 1,575.00	0.29%	\$ -	0.00%	\$ 1,575.00	0.29%
IV	TAX 2% x (I+II+III)	\$ 10,532.98	\$ 2,725.50	0.50%	\$ 269.73	0.05%	\$ 2,995.22	0.55%
V	CONTINGENCY 2% x I	\$ 9,484.53	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONTRACT PRICE	\$ 546,666.66	\$ 139,000.25	25.43%	\$ 13,756.15	2.52%	\$ 152,756.40	27.95%

Inspesaun Husi :

Verfika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. da Edifício Público no Bee
Saneamento, Município Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Cláudio Soares dos Santos)
Eng. da Edifício Público no Bee
Saneamento, Município Ainaro
ADN, I.P.

(Arc. Francisco D.D. Jeronimo)
Eng. Senior da Edifício Público no Bee
Saneamento,
ADN, I.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU - ANV- 25 # Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Data Inspesaun : 26-04-2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :S, Latetude:E.

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu



Ekipa Teknico ADN, IP halo
inspesaun iha tereno, hodi
kontrola progresso fisico ba
projeito refere.

Kompanha agora servisu hela
ba item excavation ba
Landscaping nian no
kontinuasaun ba hada batako
ba Moru nian.



287° W
MSSI AINARO
Index number: 445
26 Apr 2023 10.04.05 AM

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa Teknico ADN, IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico ba projeto refere.

Kompanha agora servisu hela ba item excavation ba Landscaping nian no kontinuasaun ba hada batako ba Moru nian.



ANEXU - ANV- 25 # Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa Teknico ADN, IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico ba projeito refere.

Kompanha agora servisu hela ba item excavation ba Landscaping nian no kontinuasaun ba hada batako ba Moru nian.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Pessoal, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN						
Naran projeto : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA ESCOLA SECUNDARIA GERAL FERNANDO LASAMA DE ARAUJO AINARO						
Kompanha : Grupo Komunitario						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN
I	26/04/2023	Ainaro Villa	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	I	Ekipa AND. IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola kualidade de Implementasaun iha tereno, atinje ona ba monta keramik, no pinta ona parede sala de Aula nian.
						Asinatura



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA ESCOLA SECUNDARIA GERAL
FERNANDO LASAMA DE ARAUJO AINARO
LOCATION : SUCCO AINARO VILA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

MAIN SUMMARY		VERIFIED BY AND. IP		PREVIOUS SETEMBRO		THIS BILLING		UP TO DATE	
		Page No	Amount	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ 3,075.00	\$ 1,800.00	1.68%				
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 56,061.73	\$ 46,054.91	41.75%	\$ 1,405.00	1.27%	\$ 47,459.91	43.02%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US\$ 30,953.49	\$ 14,989.83	13.59%	\$ 11,780.12	10.68%	\$ 26,769.95	24.27%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US\$ 10,883.53						
CONSTRUCTION COST			US\$ 100,973.75	\$ 62,844.74	57.02%	\$ 13,185.12	11.95%	\$ 76,029.86	68.97%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%			\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 2,465.00	2.44%			\$ 2,465.00	2.44%
GRAND TOTAL			US\$ 110,313.75	\$ 65,309.74	59.46%	\$ 13,185.12	11.95%	\$ 78,494.86	71.41%

Inspesaun Husi :

Verifica husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.

(Arc. Francisco X.D.D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA ESCOLA BASICA FILIAL LIAS
LOCATION : SUKO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO ANARO VILA, MUNICIPIO ANARO

SUMMARY						
MAIN SUMMARY			Page No	Amount	PREVIOUS MONTH	
					AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES		PP/3	US\$ 3,575.00	\$ 2,275.00	2.21%
II	CLASSROOM BUILDING C		C/39 (i)	US\$ 50,185.26	\$ 32,791.62	31.80%
III	TOILET BUILDING TB		CB/50	US\$ 25,178.89	\$ 12,653.99	12.27%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK		SW/24 (i)	US\$ 14,827.89	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST				US\$ 93,767.04	\$ 47,720.61	46.28%
CONTINGENCY				US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%
OVERHEAD				US\$ 6,340.00	\$ 2,345.00	2.27%
GRAND TOTAL				US\$ 103,107.04	\$ 50,065.61	48.56%
					\$ 2,029.25	1.97%
					\$ 49,749.86	48.25%
					\$ -	0.00%
					\$ 2,345.00	2.27%
					\$ 52,094.86	50.53%

\$ 50,065.61 48.56%

Inspesasaun Husi :

Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu, Município Anaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Eng. Francisco X. D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé Saneamentu, Município Anaro
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emergencia da Cpsia Maia Freitas)
Eng. Emergencia da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Data Inspesaun : 04/04/2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : -9°6'42,882°S Latetude: 125 °32'2.67"E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

Ekipa tecnico ADN. IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico iha tereno, fo orientasaun ba GK atu mantein Qualidade.

.
.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU-ANV-23 # Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Ekipa tecnico ADN. IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico iha tereno, fo orientasaun ba GK atu mantein Qualidade.

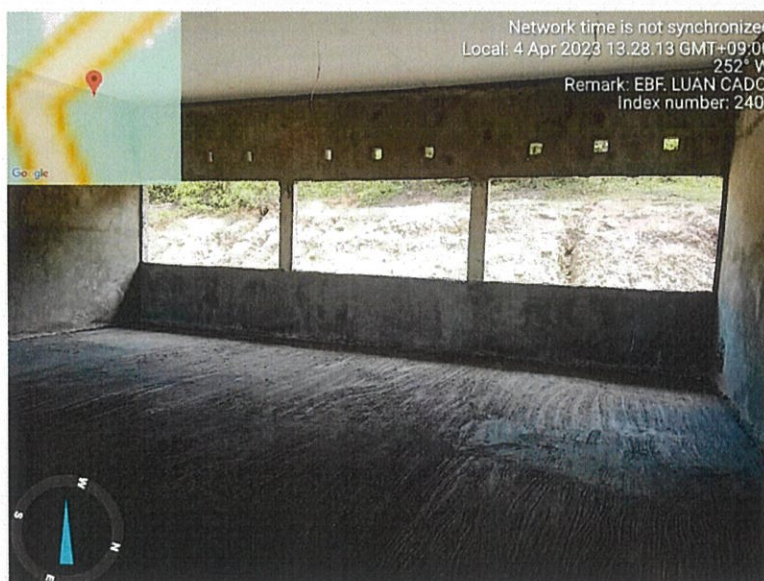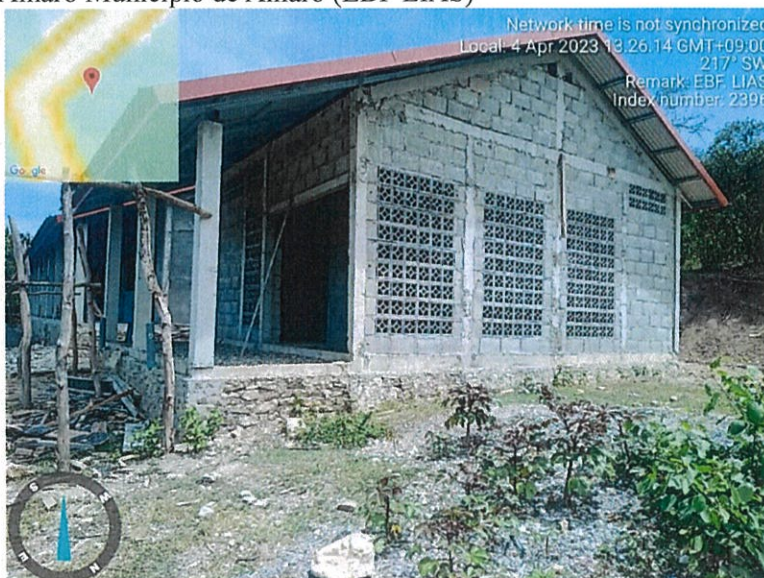



MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN						
Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Município de Ainaro (EBF LIAS)						
Kompanha : Grupo Komunitario						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN
I	04/04/2023	Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1	Ekipa AND. IP halo inspesaun lha tereno Grupo kestiona katak badae sei hein hela material konstrusaun, hafoin bele kontinua servisu.
						Asinatura



PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL LUAN CADOI
LOCATION : SUCCO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MOUNTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ 3,575.00	\$ 1,975.00	2.00%	\$ -	0.00%	\$ 1,975.00	2.00%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 49,729.55	\$ 39,693.29	40.28%	\$ 7,795.02	7.91%	\$ 47,488.31	48.18%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US\$ 25,016.07	\$ 15,237.48	15.46%	\$ 7,051.40	7.15%	\$ 22,288.88	22.62%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US\$ 10,894.12	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 89,214.74	\$ 56,905.77	57.74%	\$ 14,846.42	15.06%	\$ 71,752.19	72.80%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,310.00	1.33%	\$ -	0.00%	\$ 1,310.00	1.33%
GRAND TOTAL			US\$ 98,554.74	\$ 58,215.77	59.07%	\$ 14,846.42	15.06%	\$ 73,062.19	74.13%

Inspesau Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Arc. Francisco X.D.D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXU-ANV-22

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Data Inspesaun : 04/04/2023

Fatin Inspesaun : LUAN CADOI / Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long :-9°9,176'S Latetude: 125, 32°9,042 E.

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Ekipa TEkniku ADN, IP halo Inpesaun iah Tereno, hodi kontrola Progreso fisiku, no kualidade implemetnasaun hprojeito husi grupu komunitario, progresso fisiku atinje ona ha kakuluk. No Grupu sira continua hela servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU-ANV-22

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa TEkniku ADN, IP halo Inpesaun
iah Tereno, hodi kontrola Progreso
fisiku, no kualidade implemetnasaun
hprojeito husi grupu komunitario,
progresso fisiku atinje ona ha kakuluk.
Plester mos kuase atinge on aba 50 %.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Assessoria
Técnica
Nacional, Instituto Público

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE DI 2025 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura	
Naran projeto : Projektu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro											
Kompanha : Leolico Lda.											
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Husu ba kompanha aselera servisu no kontrola didiak BOQ, no Site Engineer Kompanha kontrola nafatin wainhira badaen sira halo servisu	Asinatura				
I	04/04/2023	Hato-udo / Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1						
					2	Tempo badaak husu ba kompanha atu hadia BOQ nebee nak sei balanco					
Resolusao Adm do Ainaro Engenheiro 1 2 1											

Resposta: ADN-IP Ainaro (inspector)
Husu Kompanha aselera servisu no kontrola didiak BOQ, no Site Engineer Kompanha kontrola nafatin wainhira badaen sira halo servisu
Fim, Hato, Ainaro
Claudino S. Santos
04/04/2023

Resposta: ADN-IP Ainaro (inspector)
Tempo badaak husu ba kompanha atu hadia BOQ nebee nak sei balanco
Fim, Hato, Ainaro
Claudino S. Santos
04/04/2023

ANEXU- HA - 36 # Back-up Data

Naran Projeto : Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021

Data Inspesaun : 26-04-2023

Fatin Inspesaun : Hato-udo Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :9,1246S, Latetude: 125,6119E.

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Ekipa ADN.IP halo
inspesaun ba progresso fisico
ih tereno, hodi kontrola
kualidade de implementasaun
husi kompanha, no observa
progresso fisiku iha tereno,
progresso lao hela ba item
Roffing and Finishes.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU- HA - 36

Back-up Data

Naran Projeto : Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa ADN.IP halo
inspesaun ba progresso fisico
ih tereno, hodi kontrola
kualidade de implementasaun
husi kompanha, no observa
progresso fisiku iha tereno,
progresso laos hela ba item
Roofing and Finishes.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN						
Naran projeto : Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro						
Kompanha : Leolico Lda.						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	26/4/2023	Hato-udo / Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1	
					2	

Husu ba companha aselera servisu no kontrola didiak BOQ, no Site Engineer Kompanha kontrola nafatin wainhira badaen sira halo servisu

Tempo badak husu ba companha atu hadia BOQ nebee nak sei balanco





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO : PROJETO KONSTRUSAUN FOUN BA ESTV HATU-UDO , AINARO
LOCATION : SUCO LEO LIMA,
POSTO ADMINISTRATIVO : HATO UDO VILA ,
MUNICIPIO : AINARO

SUMMARY

MAIN SUMMARY		Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ 1,752.92	\$ 1,040.42	0.34%	\$ -	0.00%	\$ 1,040.42	0.34%
II	CLASSROOM BUILDING C (2 UNITS)	C/39 (i)	US\$ 124,045.06	\$ 46,952.43	15.57%	\$ 2,756.15	0.91%	\$ 49,708.57	16.48%
III	TEACHER OFFICE	CB/50	US\$ 88,628.36	\$ 24,672.39	8.18%	\$ 8,110.88	2.14%	\$ 32,783.27	10.32%
IV	LABORATORY COMPUTER (IT)	LB	US\$ 40,059.64	\$ 5,995.32	1.99%	\$ -	0.00%	\$ 5,995.32	1.99%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US\$ 10,500.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 264,985.98	\$ 78,660.56	26.08%	\$ 10,867.03	3.05%	\$ 89,527.59	29.13%
CONTRACTOR FEE (10% X A)			US\$ 26,498.60	\$ 5,188.53	1.72%	\$ -	0.00%	\$ 5,188.53	1.72%
OVERHEAD			US\$ 4,180.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
TAX (2%X (A+B+C))			US\$ 5,913.29	\$ 1,141.48	0.38%	\$ -	0.00%	\$ 1,141.48	0.38%
CONTINGENCY			US\$ 9,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
GRAND TOTAL			US\$ 301,577.87	\$ 84,990.57	28.18%	\$ 10,867.03	3.60%	\$ 95,857.60	31.79%

Inspesau Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.

(Arc. Francisco D. D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :



ANEXU- HA - 6 # Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Data Inspesaun : 26-04-2023

Fatin Inspesaun : Hato-udo Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :S, Latetude: "E.

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Ekipa TEknik ADN, IP halo
INspesaun iha tereno, hodi
kontrola progresso fisiku
hotu ona, maibe ba item Site
work ho contingency mak
sedauk implementa.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU- HA - 6


Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekpa Teknik ADN, IP halo
INspesau iha tereno, hodi
kontrola progresso fisiku
hotu ona, maibe ba item Site
work ho contingency mak
sedauk implementa

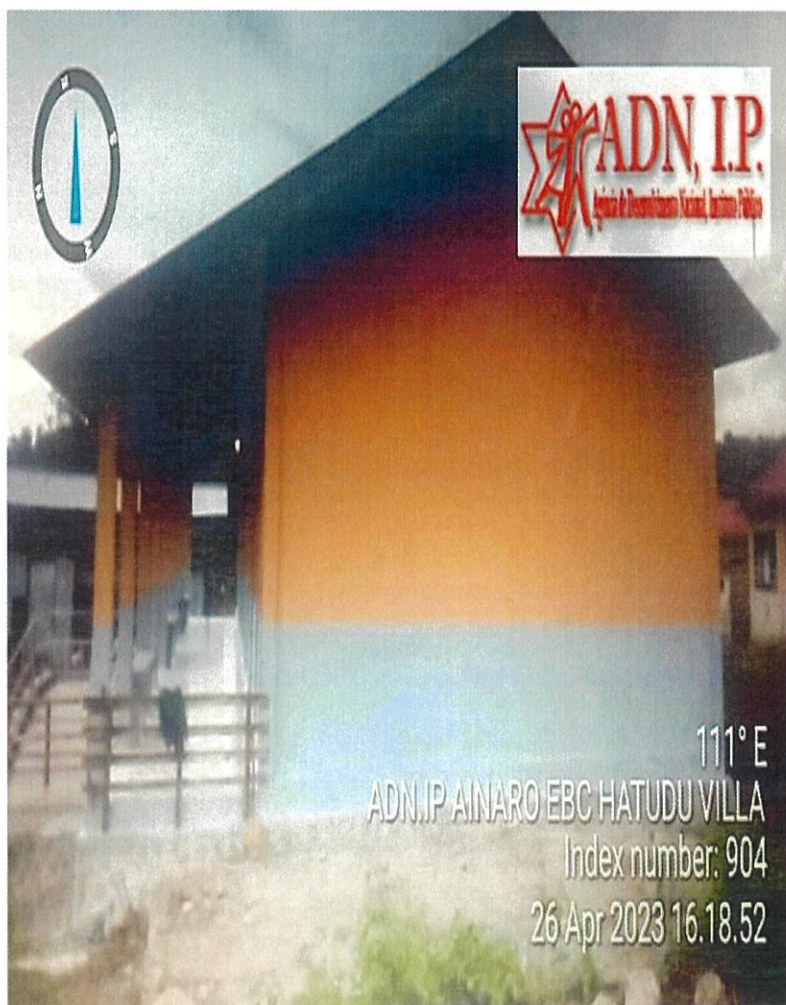



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE EDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público						INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Município de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)										
Kompanha : Grupo Komunitari										
		No	Pozisaun	No	Asinatura					
1	26/04/2023	Hato-udo / Ainaro	Joaquim Madeira &	1	Ekipa AND, IP fo orientasaun ba GK, atu mantein Kualidade servisu, tenke servisu baseia ba design no BOQ nebe mak iha					
			Claudino S. Santos							
2			Tech AND.IP	2	Akipa AND, IP husu ba GK atu aselera servisu					

[Signature]

[Signature]



ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto
Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Data Inspesaun : 26-04-2023

Fatin Inspesaun : Hut-seo / Hato-udo - vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -9°9'7"902'S Latetude: 125°34'55,668 E

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira


: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Ekipa tekniku ADN. IP halo inspesaun
ba progresso fisiku iha tereno, Tekniku
husi ADN. IP mos observa fisiku iha
tereno. Atinge on aba kakuluk.

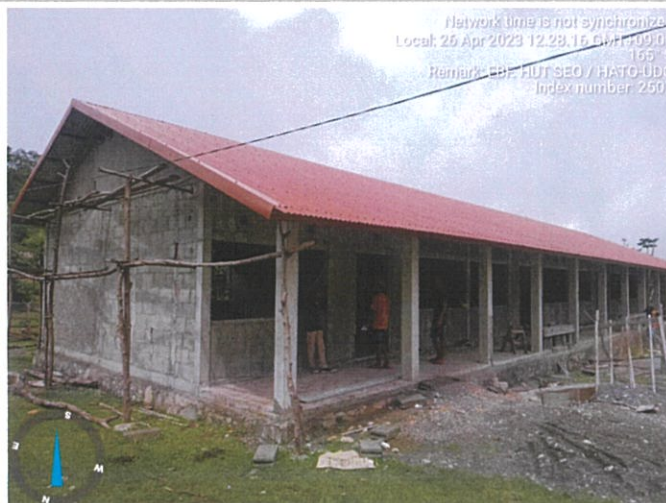



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto
Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa tekniku ADN. IP halo inspesaun
ba progresso fisiku iha tereno, Tekniku
husi ADN. IP mos observa fisiku iha
tereno. Atinge on aba kakuluk.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto
Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa tekniku ADN. IP halo inspesaun
ba progresso fisiku iha tereno, Tekniku
husi ADN. IP mos observa fisiku iha
tereno. Atinge on aba kakuluk.





MINISTÉRIO DO PLANO
E O R D E N A M E N T O
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hato-Udo Municipio de Ainaro(EBF, HUT-SEO)					
Kompanha : Grupo Komunitari					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
1	26/04/2023	Hut-seo/Hato-udo Vila	Joaquim Madeira & Claudino Soares dos Santos	Teknico AND. IP	1
					2
Asinatura					
Ekipa AND. IP halo inspesaun iha tereno, grupu komunitario ho Engiñeeiro do Grupo laiha					
Ekipa Observa progressu iha tereno, progressu mantein, tamba material konstrusaun hotu.					



PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO PROTOTIPO CA + TB, EBF HUTSEO
LOCATION : HATU UDO, MUNICIPIO AINARO

MAIN SUMMARY

ANEXU- HA - 7

NO	ITEM DESCRIPTION	PAGE NO	AMOUNT	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 2,982.93	\$ 1,632.93	1.48%	\$ -	0.00%	\$ 1,632.93	1.48%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	CA/39	\$ 63,158.05	\$ 23,016.53	20.79%	\$ 13,664.83	12.34%	\$ 36,681.36	33.14%
III	BUILDING Tb	TB/39	\$ 25,465.79	\$ 9,560.25	8.64%	\$ 2,768.27	2.50%	\$ 12,328.52	11.14%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORK		\$ 9,748.62						
A	Total Construction Cost		\$ 101,355.39	\$ 34,209.71	30.90%	\$ 16,433.09	14.85%	\$ 50,642.81	45.75%
B	Overhead		\$ 6,340.00	\$ 2,210.00	2.00%	\$ -	0.00%	\$ 2,210.00	2.00%
C	Contingency		\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	Grand Total		\$ 110,695.39	\$ 36,419.71	32.90%	\$ 16,433.09	14.85%	\$ 52,852.81	47.75%
				\$ 35,718.67	32.27%				

Inspesaun Husi :



(Eng. Joaquim de C. Madeira),
Eng. ba Edifício Publiku no Beé
Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :



(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu
Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA FILIAL TUCARO
LOCATION : HATUBUILICO, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,329.26	\$ 2,241.76	3.31%	\$ -	0.00%	\$ 2,241.76	3.31%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 50,948.05	\$ 17,177.06	25.33%	\$ 5,894.36	8.69%	\$ 23,071.42	34.03%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 4,183.95						
CONSTRUCTION COST			US\$ 58,461.26	\$ 19,418.82	28.64%	\$ 5,894.36	8.69%	\$ 25,313.18	37.33%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00						
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 2,452.50	3.62%	\$ -	0.00%	\$ 2,452.50	3.62%
GRAND TOTAL			US\$ 67,801.26	\$ 21,871.32	32.26%	\$ 5,894.36	8.69%	\$ 27,765.68	40.95%

Inspesaun Husi :


(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :


(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Sertifika Husi :


(Arc. Francisco X. D. D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P.


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Município de Ainaro (TUKARRO)

Data Inspesaun : 13-04-2023

Fatin Inspesaun : Tukaro, Hatu builiko

Koordinadas :

Start Point : Long : -856''37.974''S 125°31'18''702 ÉLatetude:

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa Tecnico ADN, IP municipio
Ainaro halo Inspeksun ba projeto refere,
projeto refere ba ha item Roofing





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Município de Ainaro (TUKARRO)

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekupa Tecnico ADN, IP municipio
Ainaro halo Inspeksun ba projeto refere,
projeto refere ba ha item Roofing





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Município de Ainaro (TUKARRO)				
Kompanha : Grupo Komunitari				
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun
I	13/04/2023	Hato builico/AINARO	Joaquim Madeira Claudino Soares dos Santos	Teknico
				No
				1
				2
				Asinatura



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Protótipo Ca, Ebf Tatiri Lases Hatu Bulico, Municipio
Ainaro

Data Inspesaun : 07-04-2023

Fatin Inspesaun : Ernaro

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°55'45 S Latetude: 125°34'39,546 E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Ekupa Tecnico ADN, IP
Municpio Ainaro halo inspesaun
iha tereno, hodi kontrola
progresso fisiku, e agora dadauk
atinje ona ba Item Painting,
Keramik Monta mor remata on
ba sala de Aula, maibe
provisoriarnnete parado tamba
hein hela pedidu oagamento
nebee mak submete.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Prototipo Ca, Ebf Tatiri Lases Hatu Builico, Municipio
Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa Tecnico ADN, IP
Municipio Ainaro halo inspesaun
iha tereno, hodi kontrola
progresso fisiku, e agora dadauk
atinje ona ba Item Painting,
Keramik Monta mor remata on
ba sala de Aula, maibe
provisoriamente parado tamba
hein hela pedidu oagamento
nebee mak submete.





MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inclui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubullico Município de Ainaro. (TATRIS LA SES)					
Kompanha : Grupo Komunitari					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	07/04/2023	Hato bullico/Ainaro	Joaquim Madeira Claudino S. dos Santos	Tecnico AND. IP	1
					2
					3
					Asinatura
					
					



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME
LOCATION

: NOVA CONSTRUCAO PROTOTIPO CA, EBF TATIRI LASES
: HATU BUILICO, MUNICIPIO ANARO

MAIN SUMMARY

NO	ITEM DESCRIPTION	PAGE NO	AMOUNT	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 2,982.93	\$ 1,782.93	2.19%	\$ -	0.00%	\$ 1,782.93	2.19%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	CA/39	\$ 62,623.84	\$ -	0.00%	\$ 18,899.02	23.19%	\$ -	0.00%
				\$ 21,646.81	26.56%	\$ 40,545.82	49.74%		
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORK				0.00%				
			\$ 6,560.68	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
					0.00%				
A	Total Construction Cost		\$ 72,167.44	\$ 23,429.74	28.75%	\$ 18,899.02	23.19%	\$ 42,328.75	51.93%
B	Overhead		\$ 6,340.00	\$ 1,937.50	2.38%	\$ -	0.00%	\$ 1,937.50	2.38%
C	Contingency		\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	Grand Total		\$ 81,507.44	\$ 25,367.24	31.12%	\$ 18,899.02	23.19%	\$ 44,266.25	54.31%

Inspesaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé
Saneamentu, Municipio Anaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
Municipio Anaro
ADN, I.P.

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E O R D E N A M E N T O
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN							
Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubulico Município de Ainaro. (ERNARO)							
Kompanha : Grupo Komunitari							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	03/04/2023	Hato bulico/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Ekipa tecnico AND. IP municipio Ainaro halo inspeksaun iha tereno, grupu Komunitario laiha, eng husi G. Komunitario laiha.	
					2	observasasaun nebe mak ekipa AND. IP observa ha tereno, fisicamnete prokeito refere liur ho laran husi sala de aula nian, plester hotu ona, harris fatin mak sedauk pleste.	
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA ERNARO
LOCATION : SUCO NUN MOGE, POSTO ADMINISTRATIVO HATU BUILICO,
MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ 3,575.00	\$ 2,275.00	2.26%	\$ 1,200.00	1.19%	\$ 3,475.00	3.45%
II	#REF!	#REF!	US\$ #REF!	200.00	0.20%	-	0.00%	200.00	0.20%
III	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 50,798.26	50,142.16	49.82%	-	0.00%	50,142.16	49.82%
IV	TOILET BUILDING TB	CB/50	US\$ 25,500.85	20,238.83	20.11%	5,262.02	5.23%	25,500.85	25.34%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US\$ #REF!	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ #REF!	72,855.99	72.39%	6,462.02	6.42%	79,318.01	78.81%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	2,576.00	2.56%	3,764.00	3.74%	6,340.00	6.30%
GRAND TOTAL			US\$ #REF!	75,431.99	74.95%	10,226.02	10.16%	85,658.01	85.11%

Inspesau Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasau
de Qualidade,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI					
Kompanha : Grupo Komunitari					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	12/04/2023	Maubise/Ainaro	Joaquim Madeira	Tecnico	1
			&		
			Claudino Soares Santos		
II					2

Asinatura	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN
	Husu grupu mantein nafatin servisu no kontrola servisu didiak atu nunce hein pagamento 50% nian hodi kontinua fila fali servisu
	husu ba grupu atu entrega desenho ba tecnico AND. IP iha tempo badak nia laran



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO
BERMOLI
LOCATION : POSTU ADMINISTRATIVO MAUBISSE, SUCO MANLAU, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY							
	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,079.26	\$ 2,723.22	3.15%	\$ 1,719.30	1.99%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C/39	US\$ 61,149.43	\$ 49,838.68	57.64%	\$ 4,960.12	5.74%
		SW/24 (i)	US\$ 12,902.81	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		US\$ 77,131.50	\$ 52,561.90	60.79%	6,679.42	7.72%
	CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ 2,600.00	3.01%	\$ 5,040.00	5.83%
	GRAND TOTAL		US\$ 86,471.50	55,161.90	63.79%	\$ 11,719.42	13.55%
			\$ 55,161.90	63.79%		\$ 66,881.32	77.34%

Inspesaun Husi :

Verfika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Bee Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edificio Publiku no Bee
Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Arc. Francisco D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Bee Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Escola Básica Filial Russulau Suco Manetu, Posto Administrativo Maubisse, Município Ainaro

Data Inspesaun : 14-28/04/2023

Fatin Inspesaun : Russulau/Maubisse

Koordinadas :

Start Point : Long, 8,8341SLatetude: End 125,5842E

Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa Tekniku ADN, IP. Halo inspesaun progresso fisiku ba projeto refere, GK servisu atinje ona ba item Stell roof.



ANEXU-MBS-12#


Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção Escola Básica Filial Russulau Suco Manetu, Posto Administrativo Maubisse, Município Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Observação in loco no Foto Atual

Ekpa Tekniku ADN, IP. Halo inspesaun progressu fisiku ba projeito refere, GK servisu atinje ona ba item Stell roof.

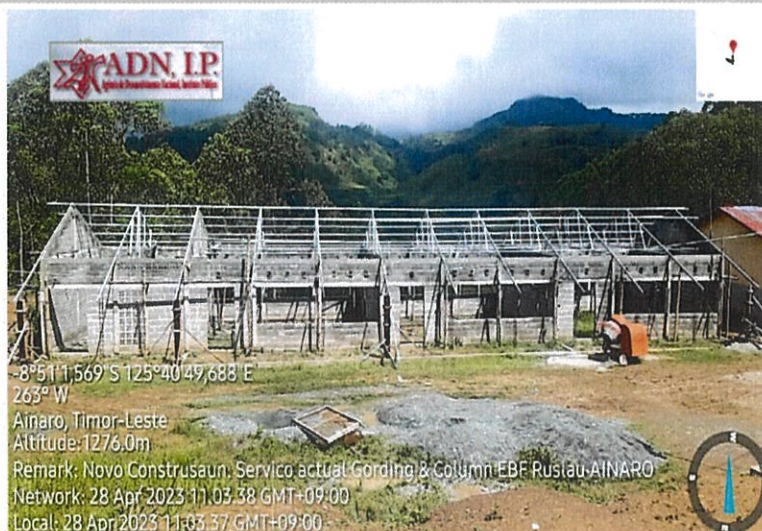

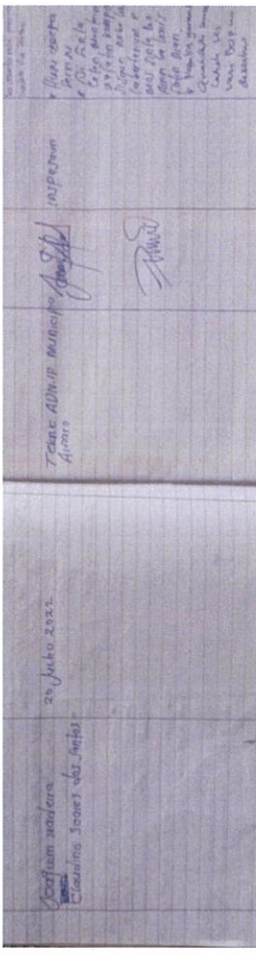 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público				INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL LUMULI Kompanha : Grupo Komunitari				Asinatura	
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura		
I	18/04/2023	Maubessi/ Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Teknico AND.IP	1	Husu ba GK wainhira atu fui sinta leten ba sala de Aula nian, husu atu mantein nafatin kompozisaun nebee maka laboratoriu fo sai.			
					2				



PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU
LOCATION : SUCO MANETU, POSTO ADMINISTRATIVO MAUBISSE , MUNICIPIO
AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,079.26	\$ 1,355.26	1.43%	\$ -	0.00%	\$ 1,355.26	1.43%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 71,553.70	\$ 24,833.27	26.15%	\$ 10,199.91	10.74%	\$ 35,033.18	36.90%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 10,978.70	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		US\$ 85,611.66	\$ 26,188.53	27.58%	\$ 10,199.91	10.74%	\$ 36,388.44	38.32%
	CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ 1,410.00	1.48%	\$ -	0.00%	\$ 1,410.00	1.48%
	GRAND TOTAL		US\$ 94,951.66	\$ 27,598.53	29.07%	\$ 10,199.91	10.74%	\$ 37,798.44	39.81%

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)A
Eng. ba Edificio Publiku no Bee Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edificio Publiku no Bee
Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Bee Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun
de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Data Inspesaun : 14/04/2023

Fatin Inspesaun : Lumluli/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long -8°47'1,122 S; Latetude: 125°41'11'238'E

End Point : Long : -8°47'1,122 S, Latetude: 125°41'11'238'E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Ekipa tekniku ADN.IP halo
inspesaun iha tereno, ADN. IP
observa GK halao hela servisu ba
item Stellroof, no GK moss
servisu hela ba plester sala de
aula iha posisaun laran nian.



#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Observasaun uha tereno no foto aktual

Sketch & Foto Desenho

Ekipa tekniku ADN.IP halo inspesaun iha tereno, ADN. IP observa GK halao hela servisu ba item Stellroof, no GK moss servisu hela ba plester sala de aula iha posisaun laran nian





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, LP.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA				
Kompanha : Grupo Komunitari				
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun
I	28/04/2023	Maubessi/ Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	No
				INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN
				Asinatura
				1 Husu ba Grupu atu mantein hodi hein pedido pagamento
2 wainhira hetan oa pagamento husu ba Grupu atu aselera servisu				
3 Mantein Qualidade, BOQ, No desenho				
4				



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMULULI
LOCATION : MAULAU, MAUBISSE, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ 3,575.00	\$ 1,600.00	1.46%	\$ -	0.00%	\$ 1,600.00	1.46%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 51,213.93	\$ 16,944.41	15.42%	\$ 7,701.97	7.01%	\$ 24,646.38	22.43%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US\$ 260,811.65	\$ 10,038.16	9.13%	\$ -	0.00%	\$ 10,038.16	9.13%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US\$ 20,088.04	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 335,688.62	\$ 28,582.58	26.01%	\$ 7,701.97	7.01%	\$ 36,284.54	33.02%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,310.00	1.19%	\$ -	0.00%	\$ 1,310.00	1.19%
GRAND TOTAL			US\$ 345,028.62	\$ 29,892.58	27.20%	\$ 7,701.97	7.01%	\$ 37,594.54	34.21%

Inspesaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)A
Eng. ba Edifício Públiku no Bee Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Públiku no Bee
Saneamentu, Município Ainaro
ADN, I.P.

(Arc. Francisco K D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Públiku no Bee Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Emerenciara da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA
LOKASI : SUCO AITUTU, POSTO ADMINISTRATIVO MAUBISSE VILA
MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,079.26	\$ 2,029.26	2.07%	\$ -	0.00%	\$ 2,029.26	2.07%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 71,306.28	\$ 49,439.90	50.53%	\$ 5,915.58	6.05%	\$ 55,355.47	56.58%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 14,115.75	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 88,501.29	51,469.16	52.60%	5,915.58	6.05%	\$ 57,384.73	58.65%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 3,040.00	3.11%	\$ -	0.00%	\$ 3,040.00	3.11%
GRAND TOTAL			US\$ 97,841.29	54,509.16	55.71%	5,915.58	6.05%	\$ 60,424.73	61.76%

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)A
Eng. ba Edifício Publiku no Bee Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.



(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba/Edifício Publiku no Bee
Saneamentu, Município Ainaro
ADN, I.P.

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Seniór ba Edifício Publiku no Bee Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun
de Qualidade,
ADN, I.P.

Verfika Husi :

Sertifika Husi :

 MINISTÉRIO DO PLANO COORDINAMENTO VICARIA INSTITUCIONAL  ADN LP Agência de Desenvolvimento Normativo e Institucional				INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO Kompanha : Grupo Komunitari			
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
1	25/04/2023	Maubisse/ Anaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Técnico AND.IP	1	Husu ba GK atu aselera servisu, no mantein kualidade no BOQ. 	
					2		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional Instituto Público


PROJECT NAME : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF RILECO
LOCATION : SUKO AINARO , POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 3,079.26	\$ 1,950.00	2.10%	\$ 1,129.26	1.22%	\$ 3,079.26	3.32%
II	CLASSROOM BUILDING Ch	CB/50	\$ 69,396.76	\$ 47,138.38	50.85%	\$ 21,390.75	23.07%	\$ 68,529.13	73.92%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	\$ 10,890.58	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			\$ 83,366.60	\$ 49,088.38	52.95%	\$ 22,520.01	24.29%	\$ 71,608.39	77.24%
CONTINGENCY			\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			\$ 6,340.00	\$ 3,020.00	3.26%	\$ 3,320.00	3.58%	\$ 6,340.00	6.84%
GRAND TOTAL			\$ 92,706.60	\$ 52,108.38	56.21%	\$ 25,840.01	27.87%	\$ 77,948.39	84.08%

Inspesaun Husi :


(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Púbiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.


(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Púbiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.


(Arc. Francisco X. D. D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Púbiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade
ADN, I.P.



ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Data Inspesaun : 03/04/2023

Fatin Inspesaun : Rileco / Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long, 8,8341SLatetude: End 125,5842E

Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa Tekniku ADN, IP. Halo inspesaun progresso fisiku ba projeito refere, projeito refere kuase remata ona, maibe ba item Professionalsam/Site work mak sedauk implementa.



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público



70° E
Ebf.rileco
Index number: 376
3 Apr 2023 17.18.25

ANEXU-MBS-12#

Back-up Data


Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch & Foto Desenho

Ekipa Tekniku ADN, IP. Halo inspesaun progresso fisiku ba projeito refere, projeito refere kuase remata ona, maibe ba item Professionalsam/Site work mak sedauk implementa.

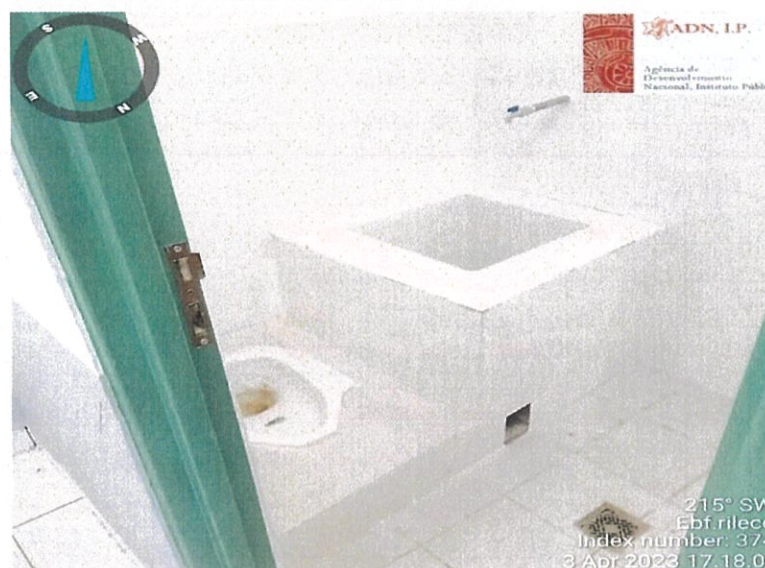

ANEXU-MBS-12#

Back-up Data


Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Sketch & Foto Desenho

Ekipa Tekniku ADN, IP. Halo inspesaun progressu fisiku ba projeto refere, projeto refere kuase remata ona, maibe ba item Professionalsam/Site work mak sedauk implementa.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



PLANU INSPESAUN

2023

[illegible]



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Joaquim de C. Madeira							2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Claudino Soares dos Santos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Apr-23																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MAUBISSE (MES)	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Note:

	Planu Periode inspesaun iha tercinu		Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu		Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili		Inspesaun Proesu Pagamentu
--	-------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	----------------------------

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Município Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Município Ainaro
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.



[illegible]

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Prepara Husi:

Sertifika Husi :

Aprova Nusi :
