



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU MANATUTO
FEVEREIRO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO


IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO MANATUTO

FEVEREIRO 2022


Prepara Husi :



(Eng. Aleixo da Costa Andrade)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P



(Eng. José R. Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura e
Irigação Municipio Manatuto, ADN, I.P



(Eng. Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projecto ME, ADN, I.P




(Eng. Augusta da Costa Ferreira)
Eng. ba Projecto Infraestrutura e
Irigação Municipio Manatuto, ADN, I.P

Verifica Husi :



(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Beé
Saneamento, ADN, I.P




(Eng. João Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projecto Infraestrutura e
Irigação, ADN, I.P



(Eng. Deolindo de F. Marques)
Chefe Secção ba Projecto M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifica Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN. I.P

Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P



INDICE

SUMÁRIO.....	1
INDICE	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Manatuto.....	3
1.3. Lista Projectos	7
II. PROGRESU FISIKU	25
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	25
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	26
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	26
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	27
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu.....	27

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto.....	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto	6
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamientos	7
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Manatuto Por Sectores	11
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Manatuto Por Ministerio.....	18
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto	25

I . INTRODUSAUN.


1.1.Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesessaria

1.2. Perfil Municipio Manatuto

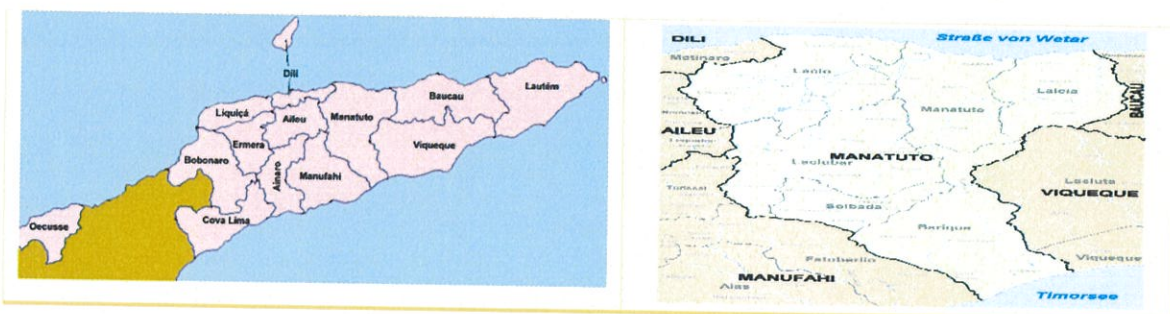

Mapa 2 hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Manatuto iha luan 1,706 km² ho populasaun nain 42,742 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Manatutoiha Postos Administrativos nen (6), Sukus 29 no aldeias 99 , mak hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.

Natarbora		Laclo		Laklubar		Laleia	
Sukus	Aldeia	Sukus	Aldei	Suku	Aldeia	Sukus	Aldeias
Aubeon	2	Hohorai	4	Batara	4	Cairui	7
Barique	2	Locomesak	5	Hatu ma quere k	3	Hatulara n	3
Fatuwaque	2	Uma kaduak	3	Funar	4	Lifau	3
Manehat	3	Uma naruk	4	Mane lima	6		
Uma Boco	2			-	8		
				Sanan a Na'i	4		
Total	11		18		30		13

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 69

Manatuto		Soibada	
sukus	Aldeia	sukus	aldeias
Ailili	2	Fatuma querek	2
Aitekas	4	Leo-hat	2
Cribas	5	Manlala	2
Iliheu	5	Maun Fahe	2
Ma'abat	2	Somoro	2
Sau	2		
	22		10

Tabela 1.1: Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Manututu								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	3	3				3	
2	Administrasaun no Financas	0	0				0	
3	Motorista	1	1				1	
4	Seguransa	0	0				0	
Total		4					4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto.

ASET ADN,IP MUNICIPIO MANATUTO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	1	1					
2	Kareta	1	1					
3	Desktop HP / Monitor	1	1					
4	Laptop HP	1	1					
5	Printer Cannon	1	1					
6	UPS	1	1					
7	Armario File	2	2					
8	Armario Tau hena	3	3					
9	Meja escritorio	1	1					
10	Meja han	1	1					
11	Meja TV (kiik)	1	1					
12	Kadeira escritorio	6	6					
13	Kadeira han	4	4					
14	Sofa	1 Set	1 Set					
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3	3 Set	3 Set					
16	Jeleira	1	1					
17	Water Dispenser	1	1					
18	TV + Parabola	1 Set	1 Set					
19	AC	4	4					
20	Kipas Angin	4	4					
21	Kompor	1	1					

22	Kompor Gas	1	1					
23	Rack sepatu	3	3					
24	Rack Piring	1	1					
25	Lampu	11	11					
26	Water Pump Sanyo	1	1					

1.3 : Lista Projectos

Projetu hotu ne'ebe akumula iha lista ne'e bazeia ba dados projetu ne'ebe sei la'o hela no mos projetu ne'ebe abandona ona tinan barak, projetu hirak ne'e fahe tuir lista 1.3.1 Projeto Por Fundus Financiamentos, 1.3.2 Projeto Por Sectors no 1.3.3 Projeto Por Ministerios.

1.3.1 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Fundus Financiamentos

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI+Fundu Covid-19+LM-BS+LM-DC+PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	Barique	11	\$ 2.449.084,64	20,04%
2	Laclo	8	\$ 49.669.824,29	73,92%
3	Laclubar	9	\$ 36.728.272,18	76,87%
4	Laleia	3	\$ 447.533,93	27,20%
5	Manatuto Villa	14	\$ 45.209.844,83	80,16%
6	Soibada	5	\$ 4.130.898,10	72,45%
	Grand Total	50	\$ 138.635.457,97	75,59%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0,00%
2	Laclo	3	\$ 48.698.873,04	74,18%
3	Laclubar	2	\$ 35.075.150,37	79,43%
4	Laleia		\$ -	0,00%
5	Manatuto Villa	7	\$ 44.188.670,20	81,00%
6	Soibada	1	\$ 3.384.214,14	80,78%
	Grand Total	13	\$ 131.346.907,75	78,05%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0,00%
2	Laclo		\$ -	0,00%
3	Laclubar		\$ -	0,00%
4	Laleia		\$ -	0,00%
5	Manatuto Villa	2	\$ 329.973,56	63,77%
6	Soibada		\$ -	0,00%
	Grand Total	2	\$ 329.973,56	63,77%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	Barique	2	\$ 404.938,08	54,93%
2	Laclo	1	\$ 50.745,00	34,95%
3	Laclubar	2	\$ 675.432,39	29,86%
4	Laleia		\$ -	0,00%
5	Manatuto Villa	1	\$ 29.275,84	15,92%
6	Soibada		\$ -	0,00%
	Grand Total	6	\$ 1.160.391,31	38,48%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	Barique	7	\$ 1.849.648,24	6,92%
2	Laclo	2	\$ 646.243,79	54,34%
3	Laclubar	2	\$ 661.982,34	0,00%
4	Laleia	2	\$ 305.588,74	0,00%
5	Manatuto Villa	1	\$ 175.266,63	0,00%
6	Soibada	3	\$ 563.302,80	20,40%
	Grand Total	17	\$ 4.202.032,54	14,14%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	Barique	2	\$ 194.498,32	72,19%
2	Laclo	2	\$ 273.962,46	80,30%
3	Laclubar	3	\$ 315.707,08	54,07%
4	Laleia	1	\$ 141.945,19	85,74%
5	Manatuto Villa	3	\$ 486.658,60	47,30%
6	Soibada	1	\$ 183.381,16	78,51%
	Grand Total	12	\$ 1.596.152,81	64,34%

1.3.2 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Sectors

NO	POR SECTOR	TOTAL MUNICIPIO MANATUTO		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370.511,25	15,83%
2	AGUA E SANEAMIENTO	1	\$ 162.377,94	41,85%
3	COMERCIO	1	\$ 153.942,39	72,74%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	6	\$ 1.027.777,26	24,85%
5	EDUKASAUN	2	\$ 364.483,49	78,62%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1.076.003,44	78,57%
7	ESTRADAS	19	\$ 13.075.209,38	60,21%
8	FLOOD CONTROL	1	\$ 242.560,14	63,68%
9	IMPRESTIMO	4	\$ 115.112.106,35	78,13%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2.362.976,44	76,00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157.560,52	41,96%
12	PONTES	1	\$ 3.384.214,14	80,78%
13	SAUDE	7	\$ 840.178,96	62,08%
14	TURISMO	2	\$ 305.556,27	28,66%
	Grand Total	50	\$ 138.635.457,97	75,59%

NO	POR SECTOR	Barique		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370.511,25	15,83%
2	AGUA E SANEAMIENTO	1	\$ 162.377,94	41,85%
3	COMERCIO		\$ -	0,00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 408.460,73	0,80%
5	EDUKASAUN		\$ -	0,00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0,00%
7	ESTRADAS	3	\$ 913.115,74	0,00%
8	FLOOD CONTROL	1	\$ 242.560,14	63,68%
9	IMPRESTIMO		\$ -	0,00%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0,00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157.560,52	41,96%
12	PONTES		\$ -	0,00%
13	SAUDE	2	\$ 194.498,32	72,19%
14	TURISMO		\$ -	0,00%
	Grand Total	11	\$ 2.449.084,64	20,04%

NO	POR SECTOR	Laclo		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0,00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0,00%
3	COMERCIO	1	\$ 153.942,39	72,74%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 170.765,07	73,64%
5	EDUKASAUN		\$ -	0,00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 380.582,61	72,08%
7	ESTRADAS	3	\$ 649.558,35	54,52%
8	FLOOD CONTROL		\$ -	0,00%
9	IMPRESTIMO	1	\$ 48.314.975,87	74,20%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0,00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
12	PONTES		\$ -	0,00%
13	SAUDE		\$ -	0,00%
14	TURISMO		\$ -	0,00%
	Grand Total	8	\$ 49.669.824,29	73,92%

NO	POR SECTOR	Laclubar		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0,00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0,00%
3	COMERCIO		\$ -	0,00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0,00%
5	EDUKASAUN		\$ -	0,00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 695.420,83	82,11%
7	ESTRADAS	4	\$ 1.337.414,73	15,08%
8	FLOOD CONTROL		\$ -	0,00%
9	IMPRESTIMO	1	\$ 34.379.729,54	79,37%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0,00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
12	PONTES		\$ -	0,00%
13	SAUDE	3	\$ 315.707,08	54,07%
14	TURISMO		\$ -	0,00%
	Grand Total	9	\$ 36.728.272,18	76,87%

NO	POR SECTOR	Laleia		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0,00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0,00%
3	COMERCIO		\$ -	0,00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 419.275,62	29,03%
5	EDUKASAUN		\$ -	0,00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0,00%
7	ESTRADAS	1	\$ 28.258,31	0,00%
8	FLOOD CONTROL		\$ -	0,00%
9	IMPRESTIMO		\$ -	0,00%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0,00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
12	PONTES		\$ -	0,00%
13	SAUDE		\$ -	0,00%
14	TURISMO		\$ -	0,00%
	Grand Total	3	\$ 447.533,93	27,20%

NO	POR SECTOR	Manatuto Villa		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0,00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0,00%
3	COMERCIO		\$ -	0,00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 29.275,84	15,92%
5	EDUKASAUN	1	\$ 181.102,33	78,74%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0,00%
7	ESTRADAS	5	\$ 9.583.559,45	75,15%
8	FLOOD CONTROL		\$ -	0,00%
9	IMPRESTIMO	2	\$ 32.417.400,94	82,66%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2.362.976,44	76,00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
12	PONTES		\$ -	0,00%
13	SAUDE	2	\$ 329.973,56	63,77%
14	TURISMO	2	\$ 305.556,27	28,66%
	Grand Total	14	\$ 45.209.844,83	80,16%

NO	POR SECTOR	Soibada		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0,00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0,00%
3	COMERCIO		\$ -	0,00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0,00%
5	EDUKASAUN	1	\$ 183.381,16	78,51%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0,00%
7	ESTRADAS	3	\$ 563.302,80	20,40%
8	FLOOD CONTROL		\$ -	0,00%
9	IMPRESTIMO		\$ -	0,00%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0,00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
12	PONTES	1	\$ 3.384.214,14	80,78%
13	SAUDE		\$ -	0,00%
14	TURISMO		\$ -	0,00%
	Grand Total	5	\$ 4.130.898,10	72,45%

1.3.3 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Ministerios

NO	POR MINISTERIO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	4	\$ 567.521,53	55,91%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 370.511,25	15,83%
3	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29.275,84	15,92%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	30	\$ 133.210.031,91	76,33%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 364.483,49	78,62%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277.330,43	0,00%
7	MINISTERIO SAUDE	7	\$ 840.178,96	62,08%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204.687,39	63,37%
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 408.460,73	0,80%
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2.362.976,44	76,00%
Grand Total		50	\$ 138.635.457,97	75,59%

NO	POR MINISTERIO	Barique		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0,00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 370.511,25	15,83%
3	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0,00%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	7	\$ 1.475.614,34	19,55%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
7	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 194.498,32	72,19%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0,00%
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 408.460,73	0,80%
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
	Grand Total	11	\$ 2.449.084,64	20,04%

NO	POR MINISTERIO	Laclo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 120.020,07	90,00%
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS		\$ -	0,00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0,00%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	\$ 49.345.116,83	73,93%
5	MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
7	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0,00%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204.687,39	63,37%
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0,00%
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
	Grand Total	8	\$ 49.669.824,29	73,92%

NO	POR MINISTERIO	Laclubar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0,00%
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS		\$ -	0,00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0,00%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	6	\$ 36.412.565,10	77,06%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
7	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 315.707,08	54,07%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0,00%
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0,00%
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
	Grand Total	9	\$ 36.728.272,18	76,87%

NO	POR MINISTERIO	Laleia		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 141.945,19	85,74%
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS		\$ -	0,00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0,00%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	1	\$ 28.258,31	0,00%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277.330,43	0,00%
7	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0,00%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0,00%
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0,00%
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
	Grand Total	3	\$ 447.533,93	27,20%

NO	POR MINISTERIO	Manatuto Villa		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 305.556,27	28,66%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0,00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29.275,84	15,92%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	7	\$ 42.000.960,39	80,95%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 181.102,33	78,74%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
7	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 329.973,56	63,77%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0,00%
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0,00%
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2.362.976,44	76,00%
	Grand Total	14	\$ 45.209.844,83	80,16%

NO	POR MINISTERIO	Soibada		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0,00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0,00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0,00%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	4	\$ 3.947.516,94	72,17%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 183.381,16	78,51%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
7	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0,00%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0,00%
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0,00%
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
	Grand Total	5	\$ 4.130.898,10	72,45%

1.4. Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Barique	5,833	1,924	1,617	1,183	1,109
Laclo	8,193	2,250	2,185	1,919	1,838
Laclubar	12,777	3,445	3,571	2,924	2,836
Laleia	3,930	1,181	1,189	817	743
Manatuto	15,446	4,741	4,609	3,109	2,987
Soibada	3,511	237	213	239	259

Fontes : Projeksaun Populasaun bazea ba Census Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1. Progressu Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan nia laran, husi lista #anexu B hatudu progresu aktual fulan ida ne'e ho nia prenentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu prentangen aktual fulan ida ne'e hatudu progresu fisiku komulativu husi prosentun antrior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare iha #anexu B, detallu ba back-up #anexu C, no Instrusaun Servisu #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1. Obtáculo Servisu iha Terenu

Observasaun geral ba projeto hirak nebe mak implementa iha Munisipio Manatuto

1. Projeto Lao la tuir tempo nebee asina entre parte rua
2. Laiha tekniko supervisaun husi projeto nain atu halo kontrolo diaramente
3. Tekniko kompanha la iha tereno
4. Skill badaen neebe mak la dun professional

Obstalku teknik A.D.N hasoru

1. Distansia ne'ebe dook difikulta teknik atu servisu lalais
2. Kondisaun estrada neébe a'at
3. Kontraktor sira ne'ebe mak servisu iha terreno barak mak la tuir Spesifikasaun ne'ebe iha kontartu laran.
4. Planu Mapamentu Engenheiro Munisipiu la konsege realiza tuir planu tamba hare hosi nia distansia ne'ebe dook.
5. Sistema dropbox iha Munisipiu dala ruma iha problema lina internet

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Presija tebes atu aumenta ema iha Munisipiu atu nune bele halo servisu ba administrasaun ne'ebe efetivo.
2. Sebele sistema dropbox tau mos iha dekstop Munisipiu para labele atraja ami nia servisu.

Note: Asinatura Husi Eng. Municipio Manatuto

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Manatuto						
No	Deskrisaun	Identidade				Asinatura
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	
1	Enjineiru	Aleixo da C. Andrade	081	Enjineiru EPAS		
		José R. Carlos Gusmão	168	Enjineiru ITI		
		Augusta da Costa Ferreira	214	Enjineiru ITI		

		Adonis Julio Fernandes	152	Enjineiru ME		
2	Enjineira	Olivia Soares	112	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Timoteo da Silva Morais	120	Motorista		

#ANEXU A

MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	\$ 2.561.405,06	63,80	57,33%	\$ 1.468.479,04	\$ 1.092.926,02	ON-GOING	
2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	\$ 3.029.514,40	89,20	79,82%	\$ 2.418.275,38	\$ 611.239,02	ON-GOING	
3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	\$ 2.362.976,44	82,08	76,00%	\$ 1.795.843,89	\$ 567.132,55	ON-GOING	
4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	\$ 28.011.854,94	93,35%	84,06%	\$ 23.546.774,85	\$ 4.465.080,09	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Fevereiro Aumenta 0,08%
5	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	\$ 4.405.546,00	73,76	73,76%	\$ 3.249.684,75	\$ 1.155.861,25	ON-GOING	
6	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Ralan Unip. Lda	\$ 181.102,33	91,59%	78,74%	\$ 142.605,32	\$ 38.497,01	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Fevereiro Aumenta 0.30%
7	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	\$ 79.155,54	88,07	79,26%	\$ 62.737,67	\$ 16.417,87	ON-GOING	
8	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	\$ 226.400,73	43,70	10,97%	\$ 24.834,32	\$ 201.566,41	ON-GOING	
9	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	\$ 29.275,84	15,92	15,92%	\$ 4.660,85	\$ 24.614,99	ON-GOING	
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda	\$ 66.989,91	94,75	85,28%	\$ 57.127,26	\$ 9.862,65	ON-GOING	
11	Sumase River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Forte, Unip. Lda	\$ 1.486.885,83	100,00	90,00%	\$ 1.338.197,25	\$ 148.688,58	ON-GOING	Falta Retensaun
12	Rehabilitation of Roads Monumento - Laclubar, Mercado Hua-Lu, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Ilatur, Lda	\$ 2.330.487,53	96,42	84,85%	\$ 1.977.323,53	\$ 353.164,00	ON-GOING	
13	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip.Lda	\$ 262.983,65	83,40%	58,29%	\$ 153.284,47	\$ 109.699,18	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Fevereiro Aumenta 9,59%
14	New Construction of Gabions Tower No. 4 Section Manatuto - Baucau Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Giovania Unip. Lda	\$ 175.266,63	94,92%	0,00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Fevereiro Aumenta 3,53%
15	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip.Lda	\$ 277.330,43	0,00	0,00%	\$ -	\$ 277.330,43	ON-GOING	
16	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	Hare Unip.Lda	\$ 141.945,19	98,92	85,74%	\$ 121.709,07	\$ 20.236,12	ON-GOING	
17	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	\$ 28.258,31	62,09%	0,00%	\$ -	\$ 28.258,31	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Fevereiro Aumenta 2,11%

18	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	\$ 695.420,83	91,24%	82,11%	\$ 571.034,27	\$ 124.386,56	ON-GOING	
19	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD	\$ 34.379.729,54	88,19%	79,37%	\$ 27.288.513,33	\$ 7.091.216,21	ON-GOING	
20	Konstrusaun Posto Saude Iha Iha Suku Funar - Laklubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Ladiama Unip. Lda	\$ 112.967,53	22,06	19,85%	\$ 22.429,62	\$ 90.537,91	ON-GOING	
21	Konstrusaun Rezidencia Pesol Iha Iha Suku Funar - Laklubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Tonijo Unip. Lda	\$ 81.776,84	100,00	86,50%	\$ 70.740,86	\$ 11.035,98	ON-GOING	
22	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 481.029,67	13,11	11,80%	\$ 56.774,87	\$ 424.254,80	ON-GOING	
23	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 194.402,72	82,83	74,55%	\$ 144.924,09	\$ 49.478,63	ON-GOING	
24	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	\$ 448.209,39	0	0,00%	\$ -	\$ 448.209,39	ON-GOING	
25	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	\$ 213.772,95	0	0,00%	\$ -	\$ 213.772,95	ON-GOING	
26	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 120.962,71	71,23	64,11%	\$ 77.547,51	\$ 43.415,20	ON-GOING	
27	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPESSOAL LDA	\$ 3.384.214,14	91,81%	80,78%	\$ 2.733.851,74	\$ 650.362,40	ON-GOING	
28	Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 183.381,16	98,52%	78,51%	\$ 143.967,27	\$ 39.413,89	ON-GOING	Progresso Fisiko Iha Tereno ba Fulan Fevereiro Aumenta 3,24%
29	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	\$ 164.154,00	70,00	70,00%	\$ 114.907,80	\$ 49.246,20	ON-GOING	
30	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 203.036,57	2,75%	0,00%	\$ -	\$ 203.036,57	ON-GOING	
31	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 196.112,23	0	0,00%	\$ -	\$ 196.112,23	ON-GOING	
32	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	\$ 242.560,14	70,75	63,68%	\$ 154.455,92	\$ 88.104,22	ON-GOING	
33	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	\$ 370.511,25	17,59	15,83%	\$ 58.645,87	\$ 311.865,38	Abandona	Abandona
34	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip.Lda	\$ 15.875,56	100,00	87,26%	\$ 13.853,09	\$ 2.022,47	ON-GOING	
35	Konstrusaun Posto Saude Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	\$ 116.914,88	67,11%	60,40%	\$ 70.617,35	\$ 46.297,53	ON-GOING	
36	Construction of Residence for Health Staff in Suku Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Macucuren Unip. Lda	\$ 77.583,44	99,96	89,97%	\$ 69.800,52	\$ 7.782,92	ON-GOING	
37	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip Lda	\$ 162.377,94	46,50	41,85%	\$ 67.961,57	\$ 94.416,37	ON-GOING	
38	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 141.684,96	40,98	36,88%	\$ 52.260,01	\$ 89.424,95	ON-GOING	
39	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We'coi Unipessoal Lda	\$ 343.111,47	10,15%	0,00%	\$ -	\$ 343.111,47	ON-GOING	
40	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	\$ 269.211,81	0,93%	0,00%	\$ -	\$ 269.211,81	ON-GOING	

41	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	\$ 300.792,46	0	0,00%	\$ -	\$ 300.792,46	ON-GOING	
42	New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Barique	Manatuto	Senizu	\$ 408.460,73	0,89%	0,80%	\$ 3.256,60	\$ 405.204,13	ON-GOING	
43	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacio	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	\$ 380.582,61	94,75%	72,08%	\$ 274.330,03	\$ 106.252,58	ON-GOING	
44	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Sahan I Unip.Lda	\$ 3.314,56	100,00	90,00%	\$ 2.983,11	\$ 331,45	ON-GOING	Sei falta retensaun no Projecto refere tama ona iha pakote ADB
45	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lacio	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Ailili Const. Unip. Lda	\$ 120.020,07	100,00	90,00%	\$ 108.017,87	\$ 12.002,20	PHO	Falta Retensaun
46	Routine Roads Maintenance - Lacio, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Egana, Unip. Lda	\$ 223.843,79	34,11%	24,79%	\$ 55.492,27	\$ 168.351,52	ON-GOING	
47	For Preparation of Detailled Engineering Design for Rehabilitation of "Municipio Roads" Package 9 : Lacio to Lacio Town Road	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	PT. Bikarma Jv Aureum Solis Consultant Unip Lda	\$ 422.400,00	70,00%	70,00%	\$ 295.680,00	\$ 126.720,00	ON-GOING	
48	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Esa-Un	\$ 50.745,00	38,83	34,95%	\$ 17.736,12	\$ 33.008,88	PENDENTE	
49	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilimano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacio	Manatuto	Surprise Unip. Lda	\$ 153.942,39	80,82	72,74%	\$ 111.978,83	\$ 41.963,56	PENDENTE	
50	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacio	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	\$ 48.314.975,87	82,44	74,20%	\$ 35.849.928,14	\$ 12.465.047,73	ON-GOING	
	TOTAL							\$ 138.635.457,97			\$ 104.793.226,31	\$ 33.666.965,03		


1. Eng. Aleixo da Costa Andrade
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P


2. Eng. José Roberto C. Gusmão
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Prepara Husi:


3. Eng. Augusta da Costa Ferreira
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P


4. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

Certifika Husi:


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De Qualidade ADN, I.P

LISTA #ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN

LOKALIZASAUN PROJETU										Feb-21		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress	This Month Progress	Komulativo Progress
1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	\$ 2.561.405,06	Aug. 25, 2018	63,80%		63,80%
2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	\$ 3.029.514,40	Aug. 25, 2017	89,20%		89,20%
3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	\$ 2.362.976,44	June 30, 2015	82,08%		82,08%
4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	\$ 28.011.854,94	Feb. 10, 2014	93,27%	0,08%	93,35%
5	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	\$ 4.405.546,00	Sept. 3, 2014	73,76%		73,76%
6	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Ralan Unip. Lda	\$ 181.102,33	Oct. 10, 2019	91,29%	0,30%	91,59%
7	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	\$ 79.155,54	Dec. 18, 2019	88,07%		88,07%
8	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	\$ 226.400,73	Dec. 18, 2019	43,70%		43,70%
9	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	\$ 29.275,84	March 1, 2020	15,92%		15,92%
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda	\$ 66.989,91	Jan. 7, 2021	95,34%		95,34%
11	Sumase River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Forte, Unip. Lda	\$ 1.486.885,83	Sept. 7, 2017	100,00%		100,00%
12	Rehabilitation of Roads Monumento - Laclubar, Mercado Hua-Lu, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Ilatur, Lda	\$ 2.330.487,53	July 25, 2016	96,42%		96,42%
13	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip.Lda	\$ 262.983,65	09-Dec-20	73,81%	9,59%	83,40%
14	New Construction of Gabions Tower No. 4 Section Manatuto - Baucau Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Giovanio Unip. Lda	\$ 175.266,63	02-Aug-21	91,39%	3,53%	94,92%

15	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip.Lda	\$ 277.330,43	July 18, 2019	0,00%		0,00%
16	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	Hare Unip.Lda	\$ 141.945,19	Oct. 8, 2019	98,92%		98,92%
17	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	\$ 28.258,31	June 10, 2021	59,98%	2,11%	62,09%
18	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	\$ 695.420,83	June 7, 2016	91,24%		91,24%
19	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD	\$ 34.379.729,54	Nov. 20, 2014	88,19%		88,19%
20	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Ladama Unip. Lda	\$ 112.967,53	Sept. 23, 2019	22,06%		22,06%
21	Konstrusaun Rezidencia Pesol Iha iha Suku Funar - Laklubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Tonijo Unip. Lda	\$ 81.776,84	Oct. 8, 2019	100,00%		100,00%
22	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 481.029,66	Aug. 25, 2020	13,11%		13,11%
23	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 194.402,72	Dec. 20, 2019	82,83%		82,83%
24	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	\$ 448.209,39	June 10, 2021	85,79%		85,79%
25	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	\$ 213.772,95	June 10, 2021	0,00%		0,00%
26	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 120.962,71	July 28, 2019	71,23%		71,23%
27	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada.	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPessoal LDA	\$ 3.384.214,14	Feb. 27, 2017	91,81%		91,81%
28	Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 183.381,16	Sept. 23, 2019	95,28%	3,24%	98,52%
29	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	\$ 164.154,00	March 25, 2020	70,00%		70,00%
30	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 203.036,57	June 10, 2021	14,0%		13,99%
31	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 196.112,23	June 10, 2021	18,73%		18,73%
32	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	\$ 242.560,14	Oct. 24, 2019	70,75%		70,75%
33	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	\$ 370.511,25	Sept. 13, 2016	17,59%		17,59%
34	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip.Lda	\$ 15.875,56	Jan. 7, 2017	100,00%		100,00%
35	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	\$ 116.914,88	Sept. 23, 2019	67,11%		67,11%
36	Construction of Residence for Health Staff in Suku Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Macucuren Unip. Lda	\$ 77.583,44	Oct. 8, 2019	99,96%		99,96%

37	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We'coi Jv Manulai Caboran Unip Lda	\$ 441.391,90	Nov. 5, 2020	100,00%		100,00%
38	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip Lda	\$ 162.377,94	Oct. 8, 2019	46,50%		46,50%
39	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 141.684,96	Aug. 25, 2019	41,78%		41,78%
40	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We'coi Unipessoal Lda	\$ 343.111,47	June 10, 2021	12,33%		12,33%
41	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	\$ 296.211,82	June 10, 2021	0,93%		0,93%
42	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	\$ 300.792,46	July 10, 2021	4,98%		4,98%
43	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacio	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	\$ 380.582,61	Sept. 1, 2016	94,75%		94,75%
44	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Sahan I Unip.Lda	\$ 3.314,56	Sept. 27, 2016	100,00%		100,00%
45	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lacio	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Ailili Const. Unip. Lda	\$ 120.020,07	Oct. 8, 2019	100,00%		100,00%
46	Routine Roads Maintenance - Lacio, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Egana, Unip. Lda	\$ 223.836,50	Dec. 13, 2019	50,93%		50,93%
47	For Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of "Municipio Roads" Package 9 : Lacio to Lacio Town Road	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	PT. Bikarma Jv Aureum Solis Consultant Unip Lda	\$ 422.400,00	April 25, 2020	40,00%		40,00%
48	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Esa-Un	\$ 50.745,00	May 2, 2016	38,83%		38,83%
49	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilimano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacio	Manatuto	Surprise Unip. Lda	\$ 153.942,39	Sept. 12, 2016	80,82%		80,82%
50	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacio	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	\$ 48.314.975,87	May.3, 2016	82,44%		82,44%


1. Eng. Aleixo da Costa Andrade
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P


4. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projecto ME, ADN, I.P


Inspeksaun Husi :


2. Eng. Jose Roberto C. Gusmao
Eng. ba Projecto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P


3. Eng. Augusta da Costa Ferreira
Eng. ba Projecto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :


Eng. João Paulo Amaral
Eng. Senior ba Projecto Insfrasturctura e Irigasaun, ADN, I.P


Eng/Arch. Francisco Xavier de D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projecto Edificio Publico Beé no Saneamento,ADN,I.P


Eng. Deolindo da Fatima Marques
ChefeSeksau ME& ITC, ADN, I.P

Certifika Husi :


Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in
Manatuto Municipality Manatuto
No. kontratu : SSS/062/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 24/ 02/ 2022

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 126,041,478, Latetude : -8,518,704

End Point : Long : 126,014,554, Latetude : -8,509,156

Naran Inspector : 1. Eng. Augusta da Costa Ferreira
2. Eng. Jose R.C. Gusmão

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba
Projetu refere remata ona nia fiziku iha
terenu no hein Rekomendasaun ikus husi
MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in
Manatuto Municipality Manatuto
No. kontratu : SSS/062/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba
Projetu refere remata ona nia fiziku iha
terenu no hein Rekomendasaun ikus husi
MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba
Projetu refere remata ona nia fiziku iha
terenu no hein Rekomendasaun ikus husi
MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in
Manatuto Municipality Manatuto
No. kontratu : SSS/062/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 24/ 02/ 2022

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 126,041,478, Latetude : -8,518,704

End Point : Long : 126,014,554, Latetude : -8,509,156

Naran Inspector : 1. Eng. Augusta da Costa Ferreira

2. Eng. Jose R.C. Gusmão

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba
Projetu refere remata ona nia fiziku iha
terenu no hein Rekomendasaun ikus husi
MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in
Manatuto Municipality Manatuto

No. kontratu : SSS/062/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba
Projetu refere remata ona nia fiziku iha
terenu no hein Rekomendasaun ikus husi
MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba
Projetu refere remata ona nia fiziku iha
terenu no hein Rekomendasaun ikus husi
MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-2)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau
Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto
No. kontratu : SSS/061/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 24/ 02/ 2022

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 126,019,530, Latetude: -8,514,341


End Point : Long : 126,007,849, Latetude: -8516389

Naran Inspector : 1. Jose R. Carlos Gusmão
2. Augusta da Costa Ferreira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba
Projetu refere remata ona nia fiziku iha
terenu no hein Rekomendasaun ikus husi
MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

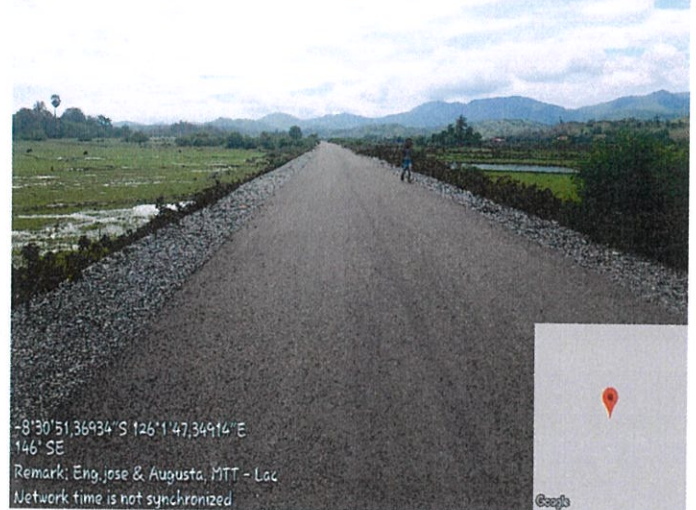

-8°30'51.36934"S 126°14'34.914"E
146° SE
Remark: Eng. Jose & Augusta, MTT - Loc
Network time is not synchronized



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-2)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau
Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto

No. kontratu : SSS/061/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba
Projetu refere remata ona nia fiziku iha
terenu no hein Rekomendasaun ikus husi
MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV- 4)

Back-up Data

Naran Projeto : RNUSP / Upgrading and Maintenance of Manatuto - Laclubar Junction Road
(sta.65+235 to Sta 100+355)

No. kontratu : ICB/023/MPW-2013

Data Inspesaun : 23-02-2022

Fatin Inspesaun : Manatuto-Laclubar

Koordinadas :

Start Point : Long : -84310383, Latetude : 125.5843077

End Point : Long : -8373105, Latetude : 125.5915918

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmão
2. Eng. Augusta da Costa Ferreira
3. Eng. Vidal Guterres

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Sketch laiha tanba
servisu Maintenance





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV- 4)

Back-up Data

Naran Projeto : RNUSP / Upgrading and Maintenance of Manatuto - Laclubar Junction Road
(sta.65+235 to Sta 100+355)

No. kontratu : ICB/023/MPW-2013

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Sketch laiha tanba
servisu Maintenance



Network: Feb 23, 2022 11:28:31 AM GMT+09:00
Local: Feb 23, 2022 11:28:32 AM GMT+09:00
Index number: 1262



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV- 4)

Back-up Data


Naran Projeto : RNUSP / Upgrading and Maintenance of Manatuto - Laclubar Junction Road
(sta.65+235 to Sta 100+355)

No. kontratu : ICB/023/MPW-2013

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Sketch laiha tanba
servisu Maintenance

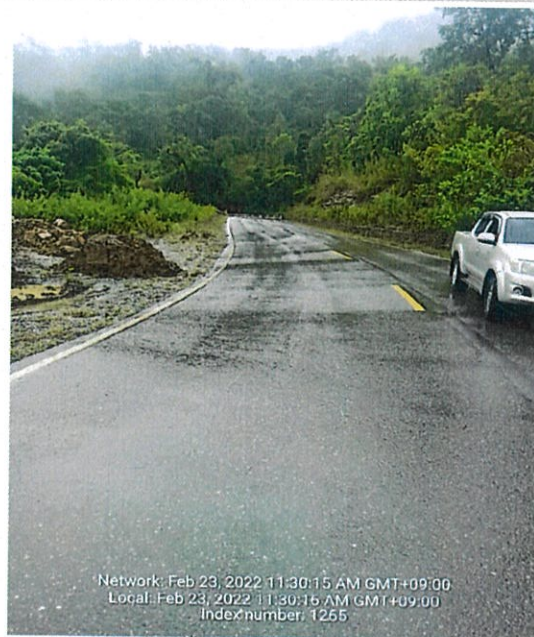



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV- 4)

Project Name : RNUSP / Upgrading and Maintenance of Manatuto - Laclubar Junction Road(sta.65+235 to Sta 100+355)

Contractor : R.D. Interior Junior Construction/Hebei Road and Bridges Group Co. Ltd. (JV)

IPC no. : IPC no. 34 PBM 14 For the period: Oct 16, 2021 - Nov 15, 2021

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	TOTAL VALUE OF WORK PREVIOUSLY	PERCENT PREVIOUS	TOTAL VALUE OF WORK THIS BILLING	PERCENT THIS MONTH	TOTAL VALUE OF WORK TO DATE	% TO DATE	BALANCE OF COST TO DATE
		(US Dollar)	(US Dollar)	%	(US Dollar)	%	(US Dollar)	%	(US Dollar)
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 1,832,315.90	\$ 1,769,896.73	6.32%	\$ -	0.00%	\$ 1,769,896.73	6.32%	\$ 62,419.18
200	EARHWORKS	\$ 4,582,442.48	\$ 4,051,855.40	14.46%	\$ -	0.00%	\$ 4,051,855.40	14.46%	\$ 530,587.08
300	SUBBASE AND BASE COURSES	\$ 3,815,952.12	\$ 3,766,624.61	13.45%	\$ -	0.00%	\$ 3,766,624.61	13.45%	\$ 49,327.51
400	SURFACE COURSE	\$ 6,906,466.41	\$ 6,806,708.10	24.30%	\$ -	0.00%	\$ 6,806,708.10	24.30%	\$ 99,758.31
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 1,532,360.99	\$ 1,532,185.97	5.47%	\$ -	0.00%	\$ 1,532,185.97	5.47%	\$ 175.03
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 6,212,247.57	\$ 5,663,263.57	20.22%	\$ -	0.00%	\$ 5,663,263.57	20.22%	\$ 548,983.99
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	\$ 1,958,295.38	\$ 1,941,390.20	6.93%	\$ -	0.00%	\$ 1,941,390.20	6.93%	\$ 16,905.18
800	BIO ENGINEERING	\$ 173,496.50	\$ 143,962.95	0.51%	\$ -	0.00%	\$ 143,962.95	0.51%	\$ 29,533.56
DW	DAYWORKS	\$ 54,389.06	\$ 54,389.06	0.19%	\$ -	0.00%	\$ 54,389.06	0.19%	\$ -
	PROVISIONAL SUM AND CONTINGENCY	\$ 343,891.70	\$ 61,499.72	0.22%	\$ -	0.00%	\$ 61,499.72	0.22%	\$ 282,391.98
	TOTAL =	\$ 27,411,858.12	\$ 25,791,776.32	92.07%	\$ -	0.00%	\$ 25,791,776.32	92.07%	\$ 1,620,081.81
	PERFORMANCE BASED MAINTENANCE WORKS	\$ 599,996.82	\$ 334,176.16	1.19%	\$ 23,402.01	0.08%	\$ 357,578.17	1.28%	\$ 242,418.65
	CONTRACT AMOUNT	\$ 28,011,854.94	\$ 26,125,952.48	93.27%	\$ 23,402.01	0.08%	\$ 357,578.17	93.35%	\$ 27,654,276.77
	GRAND TOTAL	\$ 28,011,854.94	\$ 51,917,728.80	93.27%	\$ 23,402.01	0.08%	\$ 26,149,354.49	93.35%	\$ 1,862,500.46

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. José R Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura
Transporte e Iririgação Munisipiu
Matatuto, ADN.I.P

2. (Eng. Augusta da Costa Ferreira)
Eng. ba Projecto Infraestrutura
Transporte e Iririgação Munisipiu
Matatuto, ADN.I.P

3. (Eng. Vidal Guterres)
Eng. PMU ba Projecto (Imprestimo),
ADN.I.P


Verifika Husi :

(Eng. João Paulo Amaral)
Eng. Senior ba projeto
Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN.I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (MV-4)		
					INSTRUSAUN/ REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : RNUSP Upgrading and Maintenance project Manatuto - Laclubar Junction Road (sta. 65+235 - to sta 100+335)		
					Kompanha : R.D. Interior Junior Construction/Hebei Road and Bridge Group Co.Ltd.(JV)		
No	Data inspesaun	Municípiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	23/02/2022	Manatuto/ Laclubar	Eng. Jose R. Carlos Gusmão	Eng. Ba Projetu ITI Munisípiu Manatuto, ADN.I.P	1	Husu ba Kompanhia atu kontrola nafatin estrada ne'ebe maka rai monu taka saluran atu nune'e labele difikulta movimento/ transporte iha tempo udan.	
II	23/02/2022	Manatuto/ Laclubar	Eng. Augusta da Costa Ferreira	Eng. Ba Projetu ITI Munisípiu Manatuto, ADN.I.P			
III	23/02/2022	Manatuto/ Laclubar	Eng. Vidal Guterres	Eng. PMU ba Projetu Imprestimo,ADN.I.P			

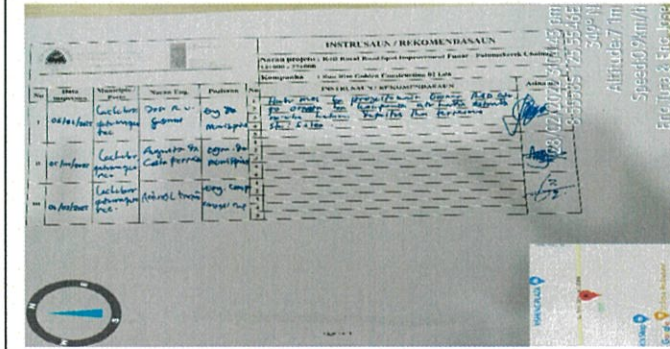



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto
No. kontratu : ICB/0128/SEJD-2014

Data Inspesaun : 21 fevereiro 2022

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5219S,

Latetude : 126.0534E,

End Point : Long :

Latetude :


Naran Inspector : Aleixo Da Costa Andrade

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Football Field

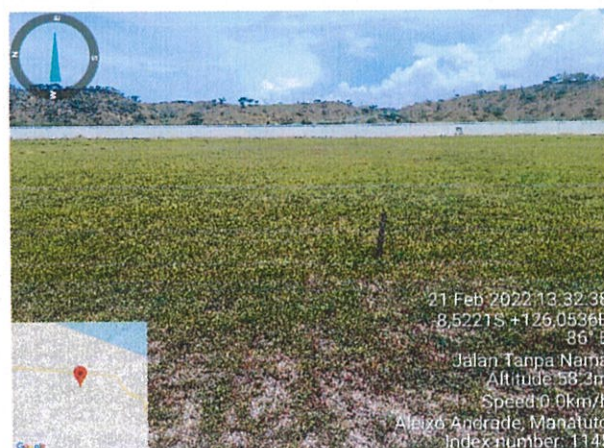



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto
No. kontratu : ICB/0128/SEJD-2014

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

Item serbisu subbase parking Area

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu.

Item serbisu Subbase ba estrada

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

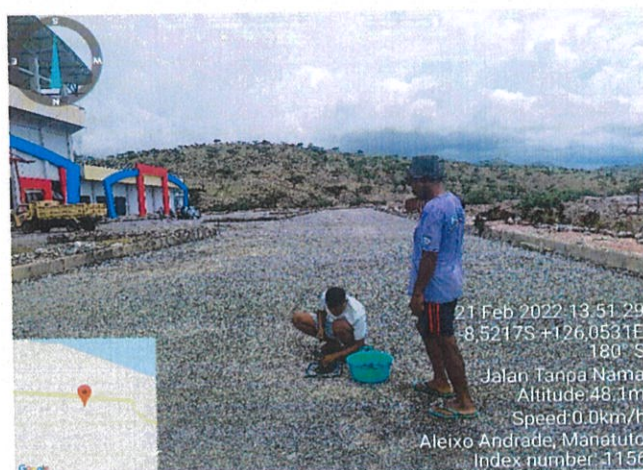



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto
No. kontratu : ICB/0128/SEJD-2014

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Main Tribune



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Front View Main Tribune





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto**
No. kontratu : **03/PDIM-II/MNTT/IX/2019**

Data Inspesaun : **18 Fevereiro 2022**

Fatin Inspesaun : Beadi, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.538497,

Latetude : 126.01472

End Point : Long :,.....

Latetude :

Naran Inspector : **Aleixo Da Costa Andrade**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Item servisu Water Tank





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-6)

Back-up Data


Naran Projeto : **Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto**
No. kontratu : **03/PDIM-II/MNTT/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item serbisu Sanitasaun

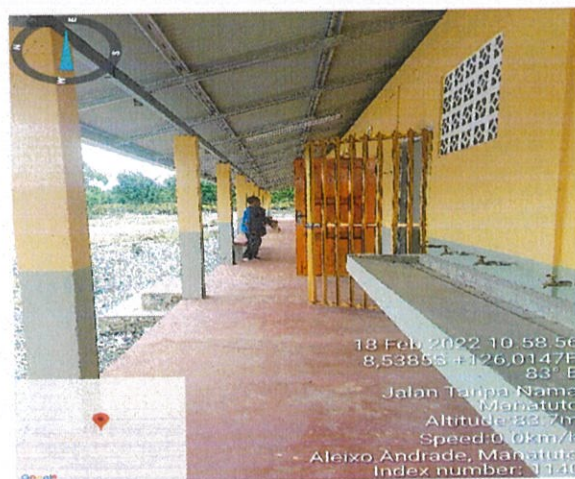

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Parte Oin





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto**

No. kontratu : **03/PDIM-II/MNTT/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Parte kotuk



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item.

Sala Escola





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-6)

SUMMARY BOQ

Projeito Nia Naran : Konstrusaun Escola Sekundario Teknik Vokasional Aiteas Manatuto Vila
Lokalizasaun Projeito : Beadi, Aiteas, Manatuto Vila

ORIGINAL CONTRACT			PROGRESS PAYMENT BY A D N					
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (US\$)	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL TO DATE	
			Amount US\$	%	Amount US\$	%	Amount US\$	%
I	PRELIMINARIES (Pekerjaan Persiapan)	\$ 980.00	\$ 980.00	0.54%	\$ -	0.00%	\$ 980.00	0.54%
II	GROUNDWORK (Pekerjaan Tanah)	\$ 1,926.81	\$ 1,926.81	1.06%	\$ -	0.00%	\$ 1,926.81	1.06%
III	CONCRETE (Pekerjaan Beton)	\$ 15,185.60	\$ 15,185.60	8.39%	\$ -	0.00%	\$ 15,185.60	8.39%
IV	STONE MASONRY AND MASONRY BLOCKWORK (Pek. Pasangan batu dan pasang batako)	\$ 2,259.32	\$ 2,445.32	1.35%	\$ -	0.00%	\$ 2,445.32	1.35%
V	Steel Roof Structure & Ceiling (Struktur Atap Baja dan Plafond)	\$ 79,907.42	\$ 79,907.42	44.12%	\$ -	0.00%	\$ 79,907.42	44.12%
VI	JOINERY FIXTURES	\$ 2,233.74	\$ 2,233.74	1.23%	\$ -	0.00%	\$ 2,233.74	1.23%
VII	ROOFING (Pek. Atap)	\$ 4,793.22	\$ 4,502.77	2.49%	\$ -	0.00%	\$ 4,502.77	2.49%
VIII	WINDOWS (Pekerjaan Jendela)	\$ 9,798.00	\$ 9,798.00	5.41%	\$ -	0.00%	\$ 9,798.00	5.41%
IX	DOORS AND HARDWARE (Pek. Pintu, Penggantung dan pengunci)	\$ 4,070.00	\$ 4,070.00	2.25%	\$ -	0.00%	\$ 4,070.00	2.25%
X	FINISHES (Pek Finishing atau plesteran)	\$ 5,797.15	\$ 5,797.15	3.20%	\$ -	0.00%	\$ 5,797.15	3.20%
XI	PAINTING (Pek. Pengecatan)	\$ 4,545.03	\$ 4,545.03	2.51%	\$ -	0.00%	\$ 4,545.03	2.51%
XII	PLUMBING	\$ 2,855.00	\$ 2,855.00	1.58%	\$ -	0.00%	\$ 2,855.00	1.58%
XIII	ELECTRICAL INSTALLATION (full installation)	\$ 4,394.88	\$ 4,394.88	2.43%	\$ -	0.00%	\$ 4,394.88	2.43%
XIV	SITE WORK	\$ 8,709.06	\$ 8,709.06	4.81%	\$ -	0.00%	\$ 8,709.06	4.81%
XV	GRAND TOTAL,CA,CB,SITE WORK	\$ 147,455.21	\$ 147,350.76	81.36%	\$ -	0.00%	\$ 147,350.76	81.36%
XVI	PROFIT 10% X A	\$ 14,745.52	\$ 14,735.08	8.14%	\$ -	0.00%	\$ 14,735.08	8.14%
XVII	OVERHEAD	\$ 549.25	\$ -	0.00%	\$ 549.25	0.30%	\$ 549.25	0.30%
XVIII	TAXA 2 % X (A + B + C)	\$ 18,254.54	\$ 3,241.72	1.79%	\$ -	0.00%	\$ 3,241.72	1.79%
XIX	GRAND TOTAL WITH CONTIGENCY	\$ 181,102.33	\$ 165,327.55	91.29%	\$ 549.25	0.30%	\$ 165,876.80	91.59%

Prepara husi :

(Eng. Aleixo Da Costa Andrade)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



#ANEXU D (MV-6)
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto

Kompanha : Ralan Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	18/02/2022	Manatuto Vila	Aleixo Da Costa Andrade	Eng. Municipiu Manatuto	1	Kontinua Husu ba kompanha atu kordena ho mestri sira hudi nunee bele instala ona Papan tulis	
					2	Husu ba kompanha atu anexo mos aprovasaun ba material hanesan water tank no justifika ba mudanca hirak neebe iha	
					3	Nafatin Husu ba kompanha atu halo serbisu limpeja ikus nian	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-13)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction For Isolation Room Manatuto Municipality
No. kontratu :

Data Inspesaun : 17 fevereiro 2022

Fatin Inspesaun : Aiteas, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5400S,

Latetude : 126.0157,

End Point : Long :.....,

Latetude :

Naran Inspector : Aleixo Da Costa Andrade

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu /Foto Dezenho

Sala item serbisu electricidade no pintura





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-13)

Back-up Data


Naran Projeto : New Construction For Isolation Room Manatuto Municipality
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu /Foto deznho

Item Serbisu instaalasaun AC 5PK

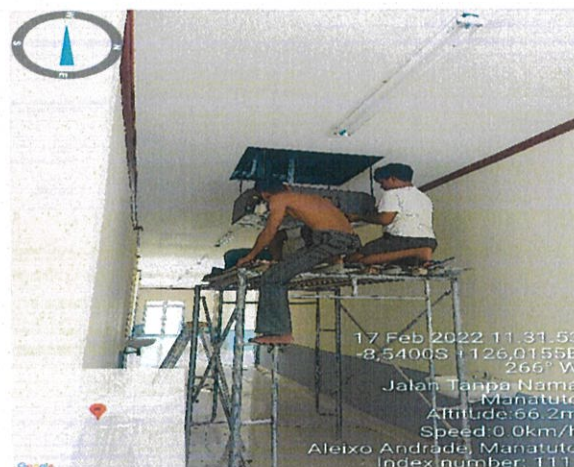


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu /Foto Dezenho

Item servisu Sanitasi

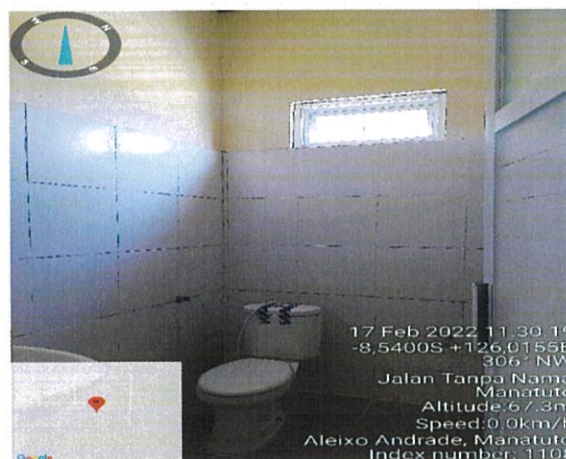



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-13)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction For Isolation Room Manatuto Municipality
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item Serbisu Plamir no pinta




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item Serbisu Ac 2 Pk

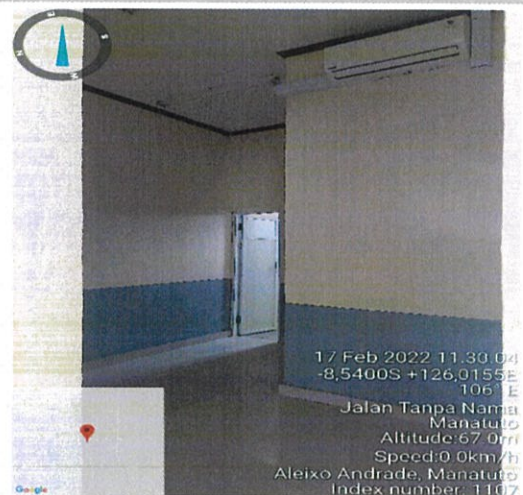



#ANEXU C2 (MV-13)

SUMMARY

PROJECT TITLE : NEW CONSTRUCTION FOR ISOLATION ROOM
LOCATION : MANATUTO VILA - MANATUTO MUNICIPALITY - TIMOR LESTE

			PROGRESS PAYMENT BY A D N				% TO DATE
No	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	PREVIOUS BILLING (USD)	%	THIS BILLING (USD)	%	
I	PREPARATION WORKS	\$ 9,172.89	\$ 8,391.76	3.19%	\$ -	0.00%	\$ 8,391.76 3.19%
II	FUNDATION WORKS	\$ 596.66	\$ 596.66	0.23%	\$ -	0.00%	\$ 596.66 0.23%
III	CONCRETE WORKS	\$ 42,907.24	\$ 42,907.24	16.32%	\$ -	0.00%	\$ 42,907.24 16.32%
IV	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$ 27,382.53	\$ 27,382.53	10.41%	\$ -	0.00%	\$ 27,382.53 10.41%
V	CARPENTER WORKS	\$ 24,244.00	\$ 24,244.00	9.22%	\$ -	0.00%	\$ 24,244.00 9.22%
VI	ROOFING WORKS	\$ 27,358.42	\$ 26,533.42	10.09%	\$ -	0.00%	\$ 26,533.42 10.09%
VII	CEILING WORKS	\$ 10,715.61	\$ 10,715.61	4.07%	\$ -	0.00%	\$ 10,715.61 4.07%
VIII	FLOOR TILE WORKS	\$ 12,860.75	\$ 12,860.75	4.89%	\$ -	0.00%	\$ 12,860.75 4.89%
IX	ELECTRICAL WORKS	\$ 22,285.66	\$ 215.60	0.08%	\$ 21,380.06	8.13%	\$ 21,595.66 8.21%
X	SANITASI WORKS	\$ 12,162.13	\$ 9,380.66	3.57%	\$ -	0.00%	\$ 9,380.66 3.57%
XI	PAINTING WORKS	\$ 6,469.39	\$ 6,469.39	2.46%	\$ -	0.00%	\$ 6,469.39 2.46%
XII	FURNITURE	\$ 14,694.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ - 0.00%
XIII	FINAL CLEARING	\$ 310.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ - 0.00%
A	CONTRUCTION COST	\$ 211,159.28	\$ 169,697.62	64.53%	\$ 21,380.06	8.13%	\$ 191,077.68 72.66%
B	FEE CONTRACTOR (10% x A)	\$ 21,115.93	\$ 16,969.76	6.45%	\$ 2,138.01	0.81%	\$ 19,107.77 7.27%
C	OVERHEAD	\$ 4,850.00	\$ 3,637.50	1.38%	\$ 1,212.50	0.46%	\$ 4,850.00 1.84%
D	TAX (2% x(A+B+C))	\$ 4,742.50	\$ 3,806.10	1.45%	\$ 494.61	0.19%	\$ 4,300.71 1.64%
E	CONTIGENCY (10% OF A)	\$ 21,115.93		0.00%		0.00%	
F	TOTAL PROJECT COST (A +B + C + D + E)	\$ 262,983.65	\$ 194,110.98	73.81%	\$ 25,225.18	9.59%	\$ 219,336.16 83.40%

Prepara husi :

(Eng. Aleixo Da Costa Andrade)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (MV-13)
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NEW CONSTRUCTION FOR ISOLATION ROOM

Kompanha : Talamori Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	17/02/2022	Manatuto Vila	Aleixo Da Costa A	Eng. Municpiu Manatuto	1	Husu ba Kompanha atu kontinua serbisu hodi nune bele finalisa lalais projeit refere	
					2	Husu ba kompanha atu kordena ho projeto nain konaba utulijasaun osan provisionalsum no kontengencia	
					3	Husu ba kompanha atu serbisu nafatin tuir speksifikasaun teknik neebe mensiona iha BoQ	
					4	Husu ba kompanha atu serbisu/hatama ona furniture	
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Roads Monumento - Laclubar, Mercado Hua-Lu,
Manatuto Municipality

No. kontratu : SSS/115/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 24/ 02 /2022

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 126,021,108, Latetude : -8,518,339

End Point : Long : 126,003,775, Latetude : -8,517,000

Naran Inspector : 1. Eng. Augusta da Costa Ferreira

2. Eng. Jose R.C. Gusmão

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba

Projetu refere remata ona nia fiziku iha

Terenu no hein Rekomendasaun ikus husi

MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Roads Monumento - Laclubar, Mercado Hua-Lu,
Manatuto Municipality
No. kontratu : SSS/115/MOPTC-2016

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu laiha tanba
Projetu refere remata ona nia fiziku iha
Terenu no hein Rekomendasaun ikus husi
MOP.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : New Const. of Gabion Tower No. 04 Section Manatuto - Baucau
Manatuto Municipality

No. kontratu : NCB/029/MOP-2020

Data Inspesaun : 22/ 02 /2022

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 126,041,478, Latetude : -8,518,704

End Point : Long : 126,014,554, Latetude : -8,509,156

Naran Inspector : 1. Augusta da Costa Ferreira

2. Jose R. Carlos Gusmão

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Excavation no
Normalization

$L = 250$

Excavation = $5 \times 0.5 \times 250 = 625 m^3$

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-14)


Back-up Data

Naran Projeto

: New Const. of Gabion Tower No. 04 Section Manatuto - Baucau
Manatuto Municipality


No. kontratu

: NCB/029/MOP-2020

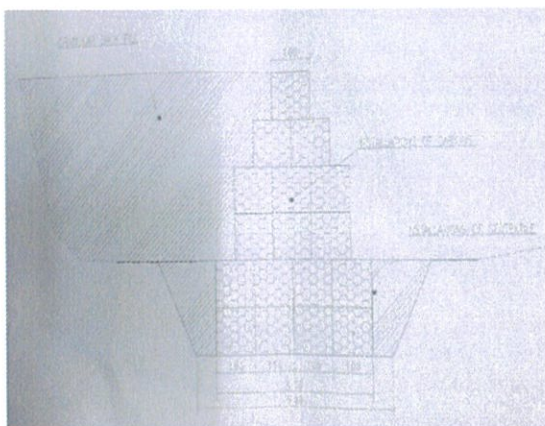

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Back fill no monta
Geotextil

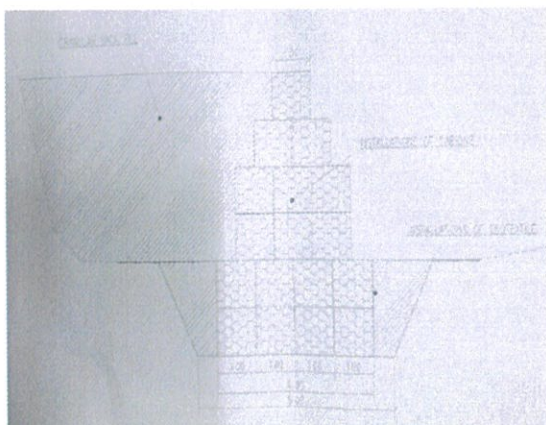

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : New Const. of Gabion Tower No. 04 Section Manatuto - Baucau
Manatuto Municipality


No. kontratu : NCB/029/MOP-2020

Back fill V = $((3.2+4/2) \times 4 \times 150$

$= 3,120.00 \text{ m}^3$

Geotextill V = $6 \times 1 \times 150$

$= 900 \text{ m}^2$

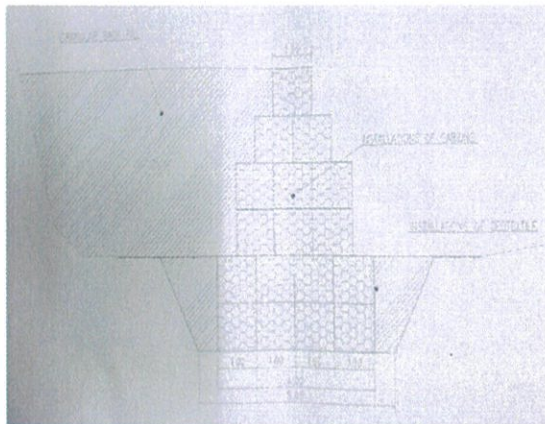



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV- 14)

Naran Projeto : New Const. of Gabion Tower No.4 Section Manatuto - Baucau
No. kontratu : NCB/029/MOP-2020
Contractor : Geovani Unipessoal,Lda.

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
I	PRELIMINARY AND GENERAL WORKS	\$ 5,081.02	\$ 3,290.51	1.88%	\$ -	0.00%	\$ 3,290.51	1.88%
II	INSTALATION OF GABIONS TOWER NO.4	\$ 140,762.19	\$ 137,432.26	78.41%	\$ -	0.00%	\$ 137,432.26	78.41%
III	RIVER NORMALIZATION	\$ 7,875.00	\$ 1,386.00	0.79%	\$ 5,512.50	3.15%	\$ 6,898.50	3.94%
	Construction Cost	\$ 153,718.21	\$ 142,108.77	81.08%	\$ 5,512.50	3.15%	\$ 147,621.27	84.23%
	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 15,371.82	\$ 14,210.88	8.11%	\$ 551.25	0.31%	\$ 14,762.13	8.42%
	Over Head	\$ 2,740.00	\$ 715.00	0.41%	\$ -	0.00%	\$ 715.00	0.41%
	Tax 2 % x (A+B)	\$ 3,436.60	\$ 3,140.69	1.79%	\$ 121.28	0.07%	\$ 3,261.97	1.86%
	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 175,266.63	\$ 160,175.34	91.39%	\$ 6,185.03	3.53%	\$ 166,360.36	94.92%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Jose R. Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

2. (Eng. Augusta da Costa Ferreira)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

Eng. João Paulo Amaral
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN.I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					#ANEXU D (MV-14) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
					Naran projeto : New Const. of Gabion Tower No.04 Section Manatuto - Baucau	
					Kompanha : Geovani, Unip. Lda	
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN
I	22/02/2022	Manatuto/ Manatuto Vila	Jose R Carlos Gusmao	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Eng. Munisipiu halo inspesaun maibe durante ne'e la priense Buku Tamu tanba Kompanhia sira la fo, motivo no razaun Eng. Munisipiu lahatene
II	22/02/2022	Manatuto/ Manatuto Vila	Augusta da Costa Ferreira	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto		
					Asinatura	
						
						



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAL- 4)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage
0+000-9+800
No. kontratu : MPW-W-210055

Data Inspesaun : 22/ 02/ 2022

Fatin Inspesaun : Laleia, Cairui

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.540587°, Latetude : 126.161209°

End Point : Long : -8.609667°, Latetude : 126.143949°

Naran Inspector : 1. Jose R. C Gusmão
2. Augusta da Costa Ferreira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba servisu
Manutensaun no nia distansia 3.80 KM mak
kompanhia hamos iha tereno

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAL- 4)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage
0+000-9+800

No. kontratu : MPW-W-210055

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba servisu
Manutensaun no nia distansia 3.80 KM mak
kompanhia hamos iha tereno

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba servisu
Manutensaun no nia distansia 3.80 KM mak
kompanhia hamos iha tereno

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (LAL- 4)

Road Name : RD4 RURAL ROAD ROUTINE MAINTENANCE HATULARAN - CAIRUI CAINAGE 0+000 - 9 + 800
No. kontratu : MPW-W-210055
Municipality : Manatuto
Postu : Laleia
Sukos : Haturalan and Cairui
Naran Kompanhia : AS Jazesia, Unip, Lda

Chainage start	0 + 000
Chainage end	9+ 800
Length	9.8 Km

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 1,350.00	\$ 150.00	0.53%	\$ -	0.00%	\$ 150.00	0.53%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 934.21	\$ 717.94	2.54%	\$ -	0.00%	\$ 717.94	2.54%
R-10	Dayworks	\$ 70.00	\$ 70.00	0.25%	\$ -	0.00%	\$ 70.00	0.25%
R-11	Routine Maintenance	\$ 15,646.00	\$ 10,020.50	35.46%	\$ 532.00	1.88%	\$ 10,552.50	37.34%
R-15	Provisional Sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 18,200.21	\$ 10,958.44	38.78%	\$ 532.00	1.88%	\$ 11,490.44	40.66%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 1,820.02	\$ 1,095.84	3.88%	\$ 53.20	0.19%	\$ 1,149.04	4.07%
C	General Item	\$ 7,684.00	\$ 4,563.25	16.15%	\$ -	0.00%	\$ 4,563.25	16.15%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 554.08	\$ 332.35	1.18%	\$ 11.70	0.04%	\$ 344.05	1.22%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 28,258.31	\$ 16,949.88	59.98%	\$ 596.90	2.11%	\$ 17,546.79	62.09%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Jose R Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte
e Iririgação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

2. (Eng. Augusta da Costa Ferreira)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte
e Iririgação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

(Eng. João Paulo Amaral)
Eng. Senior ba projeto
Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN.I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					# ANEXU D (LAL-4) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Naran projeto : R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800							
Kompanha : As Jazesia Unipessoal Lda							
No	Data inspesaun	Munisipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	22/02/2022	Manatuto/ Laleia	Eng. Jose R. C. Gusmão	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Eng. Munisipiu halo inspesaun ba Projetu refere no servisu fiziku iha Terenu lao maibe Tekniku Kompanhia la lori Buku Tamu tanba momento ne'eba udan.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	22/02/2022	Manatuto/ Laleia	Eng. Augusta da Costa Ferreira	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila
to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412

Data Inspesaun : 24 - 02 - 2022

Fatin Inspesaun : Laclubar, Fumar and Lihudenu

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.75102778S, Latetude : 125.90414729E

End Point : Long : 8.7503815S, Latetude : 125.87029475E

Naran Inspector : Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Hadia Druckschoor nia Assecures



24 Feb 2022 13:13:12
8.75099058S 125.90412122E
Altitude: 1200.5m
Eng. Adonis
Index number: 1412



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila
to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste 12 m kleuk/Halis



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Trechoor Mamar





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila
to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412

Pondasi nakfera/Rahun



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste 12 m kleuk halis





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto
Municipality (162)
No. kontratu : MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020

Data Inspesaun : 28/02/2022

Fatin Inspesaun : Laclubar, Manatuto

Koordinadas :

Start Point : Long 8.7554S, Latetude : 125.9598E

End Point : Long : 8.7529S Latetude : 125.9194E

Naran Inspector : 1. Jose R. Carlos Gusmão

2. Augusta da Costa Ferreira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item kompania sedauk hahu
servisu iha tereno





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto
Municipality (162)
No. kontratu : MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020

Sketch Item kompania sedauk hahu
servisu iha terreno



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item kompania sedauk hahu
servisu iha terreno

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-2)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river,
jct. Fatucamanau, Soibada, Timor Leste
No. kontratu : SSS/013/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 25/ 02/ 2022

Fatin Inspesaun : Soibada, Fatucamanau

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.864667917S Latetude : 125.95837902E

End Point : Long : -8.86475834S, Latetude : 125.95738057E

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmão
2. Eng. Augusta da Costa Fereirra

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tamba kompania
sedauk kontinua servisu iha terreno

Observasaun iha terreno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


#ANEXU C1 (SO-2)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river,
jct. Fatucamanau, Soibada, Timor Leste

No. kontratu : SSS/013/MOPTC-2017

Sketch Item servisu laiha tamba kompania
sedauk kontinua servisu iha terreno

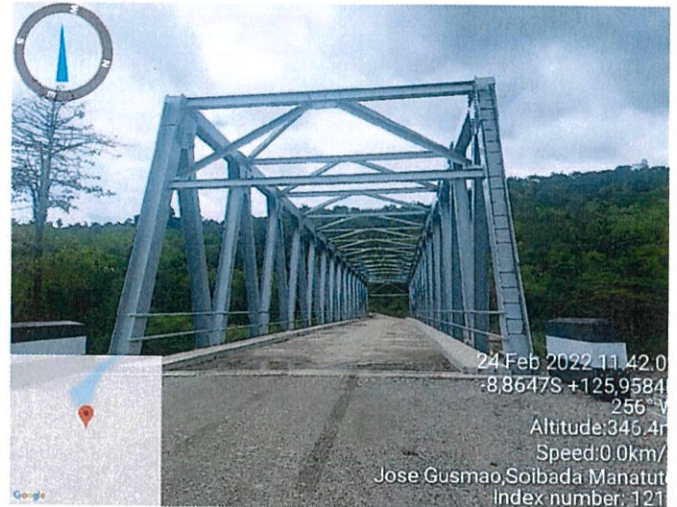



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Escola Sekundario Teknik Vokasional Soibada Suko
Manlala-Posto Adm Soibada-Municipiu Manatuto
No. kontratu : Kontratu 01/PDIM-II/MNTT/IX/2019

Data Inspesaun : 24 Fevereiro 2022

Fatin Inspesaun : Soibada

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.8601,

Latetude : 125.9394

End Point : Long :,

Latetude :

Naran Inspector : Aleixo Da Costa Andrade

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item servisu fondasi





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-3)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Escola Sekundario Teknik Vokasional Soibada Suko**
Manlala-Posto Adm Soibada-Municipiu Manatuto

No. kontratu : **Kontratu 01/PDIM-II/MNTT/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item Serbisu electricidade, Kuadro
hakerek



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Item servisu sanitasaun





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-3)

Back-up Data


Naran Projeto : Konstrusaun Escola Sekundario Teknik Vokasional Soibada Suko
Manlala-Posto Adm Soibada-Municipiu Manatuto
No. kontratu : Kontratu 01/PDIM-II/MNTT/IX/2019

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu.

Item serbisu Fondasi parte kotuk

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

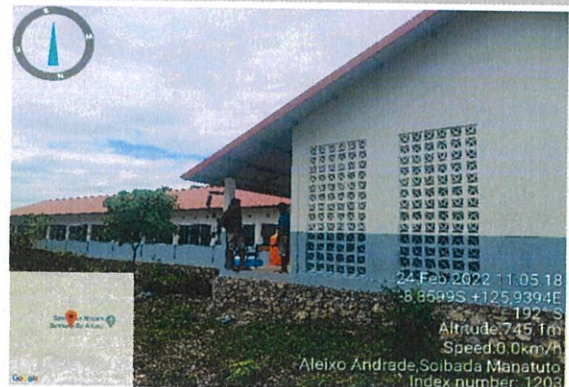

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

Item serbisu tralis ba teras

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (SO-3) SUMMARY BOQ

Projeito Nia Naran : Konstrusaun Escola Sekundario Teknik Vokasional Soibada Suko Manlala-Posto Adm Soibada-
Lokalizasaun Projeito : Manlala Soibada

ORIGINAL CONTRACT			PROGRESS PAYMENT BY A D N					
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (US\$)	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL TO DATE	
			Amount US\$	%	Amount US\$	%	Amount US\$	%
I	PRELIMINARIES (Pekerjaan Persiapan)	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	1.53%	\$ -	0.00%	\$ 2,800.00	1.53%
II	GROUNDWORK (Pekerjaan Tanah)	\$ 9,043.57	\$ 9,043.09	4.93%	\$ -	0.00%	\$ 9,043.09	4.93%
III	CONCRETE (Pekerjaan Beton)	\$ 27,583.58	\$ 26,204.48	14.29%	\$ 1,086.10	0.59%	\$ 27,290.58	14.88%
IV	STONE MASONRY AND MASONRY BLOCKWORK (Pek. Pasangan batu dan pasang batako)	\$ 16,295.38	\$ 16,295.38	8.89%	\$ -	0.00%	\$ 16,295.38	8.89%
V	Steel Roof Structure & Ceiling (Struktur Atap Baja dan Plafond)	\$ 28,601.71	\$ 28,521.76	15.55%	\$ -	0.00%	\$ 28,521.76	15.55%
VI	JOINERY FIXTURES	\$ 1,572.86	\$ 1,572.86	0.86%	\$ -	0.00%	\$ 1,572.86	0.86%
VII	ROOFING (Pek. Atap)	\$ 18,803.75	\$ 18,803.75	10.25%	\$ -	0.00%	\$ 18,803.75	10.25%
VIII	WINDOWS (Pekerjaan Jendela)	\$ 8,738.40	\$ 8,666.40	4.73%	\$ 72.00	0.04%	\$ 8,738.40	4.77%
IX	DOORS AND HARDWARE (Pek. Pintu, Penggantung dan pengunci)	\$ 4,135.00	\$ 4,132.00	2.25%	\$ -	0.00%	\$ 4,132.00	2.25%
X	FINISHES (Pek Finishing atau plesteran)	\$ 14,719.49	\$ 14,719.49	8.03%	\$ -	0.00%	\$ 14,719.49	8.03%
XI	PAINTING (Pek. Pengecatan)	\$ 4,377.79	\$ 4,377.79	2.39%	\$ -	0.00%	\$ 4,377.79	2.39%
XII	PLUMBING	\$ 8,669.41	\$ 8,658.41	4.72%	\$ -	0.00%	\$ 8,658.41	4.72%
XIII	ELECTRICAL INSTALLATION (full installation)	\$ 4,366.45	\$ 2,302.65	1.26%	\$ -	0.00%	\$ 2,302.65	1.26%
XIV	SITE WORK	\$ 10,874.75	\$ 7,791.54	4.25%	\$ 3,912.21	2.13%	\$ 11,703.75	6.38%
XV	GRAND TOTAL,CA,CB,SITE WORK	\$ 160,582.14	\$ 153,889.59	83.92%	\$ 5,070.31	2.76%	\$ 158,959.90	86.68%
XVI	PROFIT 10% X A	\$ 16,058.21	\$ 15,388.96	8.39%	\$ 507.03	0.28%	\$ 15,895.99	8.67%
XVII	OVERHEAD	\$ 2,900.00	\$ 2,030.00	1.11%	\$ -	0.00%	\$ 2,030.00	1.11%
XVIII	TAXA 2 % X (A + B + C)	\$ 3,590.81	\$ 3,426.17	1.87%	\$ 111.55	0.06%	\$ 3,537.72	1.93%
XIX	CONTIGENCY	\$ 250.00	\$ -	0.00%	\$ 250.00	0.14%	\$ 250.00	0.14%
XX	GRAND TOTAL WITH CONTIGENCY	\$ 183,381.16	\$ 174,734.72	95.28%	\$ 5,938.88	3.24%	\$ 180,673.60	98.52%

Prepara husi :

(Eng. Aleixo Da Costa Andrade)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D1 (SO-3)
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)

Kompanha : Manufahi Kiik Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	24/02/2022	Soibada	Aleixo Da Costa Andrade	Eng. Municipiu Manatuto	1	Husu ba kompanha atu halo justifikasaun ba item mudanca item hanesan	
					2	- Pagar pengaman	
					3	- no water tank	
					4	Husu atu hetan aprovasaun husi mudanca hirak neebe iha husi projeto nain	
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-1) Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Laclo to
Mantane - Manatuto Municipality043)
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421

Data Inspesaun : 18 – 02 - 2022

Fatin Inspesaun : Laclo - Mantane

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.55178942S, Latetude : 125.92819335E

End Point : Long : 8.55521546, Latetude : 125.90856654E

Naran Inspector : 1. Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste 12 m Pinta mos ona





#ANEXU C1 (LA-1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacro to Mantane - Manatuto Municipality043)


No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste 12 m halis/kleuk

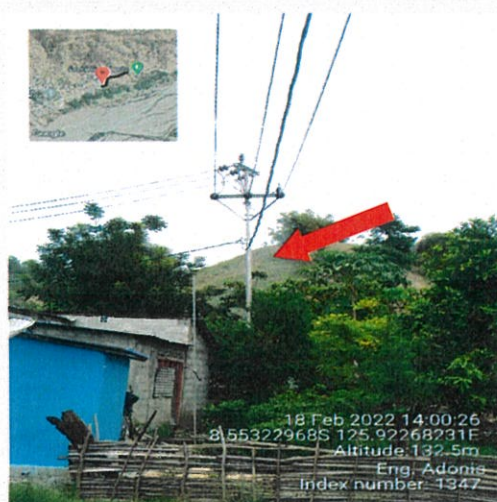

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Cross arm kleuk/halis





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacro to
Mantane - Manatuto Municipality043)

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste 12 m pinta mos ona



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Trafo Lacro Villa





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacro to
Mantane - Manatuto Municipality(043)

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Trafo 100 KVA Mantane



Sketch & Foto Desenho



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Aleixo de Andrade							2022																												
Município	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Fevereiro																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
MANATUTO VILA (MV)	3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipessoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																									On Going				
							Actual																													Projeito refere kompanha koninua lao
	6	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	Ralan Unip. Lda	03/PDIM-II/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																									On Going				
							Actual																													Inpeskasaun pagamentu 100%
	7	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																									Pendenti				
							Actual																													Kompanha sedauk kontinua serbisu
	8	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																										On Going			
							Actual																													Kompanha sedauk kontinua serbisu
	9	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	Baboe Unip Lda	019/Janeiro/2020	LM	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																										FHO			
							Actual																													Projeito refere remata ona
	10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-186	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																										PHO			
							Actual																													
	13	Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Munisipiu Manatuto	Talamori Unip,Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																										On Going			
							Actual																													Projeito refere kompanha kontinua serbisu
LALEA (LAL)	1	Rehabilitasaun Kampu Fotebolli iha Postu Administrativu Laleia	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/II/DILI/2019/E DIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																									Pendenti				
							Actual																													
	2	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	Hare Unip.Lda	02/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																									PHO				
							Actual																													Planu refere muda no halo inpeksaun ba projeito PKRIE
LACLUBAR (LAC)	3	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	Ladiama Unip. Lda	04/PDIM I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																									On Going				
							Actual																													Planu refere muda no halo inpeksaun ba projeito PKRIE
	4	Konstrusaun Rezidencia PesoaIha iha Suku Funar - Laklubar	Tonijo Unip. Lda	05/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																								On Going					
							Actual																													Planu refere muda no halo inpeksaun ba projeito PKRIE
	9	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	Hatuwari Unip. Lda	02/PDD-II/MNTT/II/2015	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																									On Going				
							Actual																													Labele inpeksaun tamba estrada asesu ba projeito refere kondisaun aat.
SOIBADA (SO)	2	Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)	Manufahi Kiik Unip. Lda	01/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																								On Going					
							Actual																													Inpeksaun ba pagamentu 100%

Naran Eng.	Aleixo de Andrade							2022																													
Município	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																				
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Fevereiro																												OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
BARIQUE (BA)	2	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	Tasibala II Const	RDTL/PO:2016-11272	LM	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																											Abandona			
							Actual																														
	4	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	Malack II Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																											On Going			
							Actual																														
	5	Construction of Residence for Health Staff in Suku Aimeta Laran-Barique	Macucuren Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																											PHO			
							Actual																														
	6	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	Malaca Unip Lda	No. Kontratu : MOP-W-190233	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Projeltu BTL.EP		
							Actual																														
	11	New Contruction of Gapura and Gablon Wall Protection no Jardim de Herois de Natarbora	Senizu Unip. Lda	215/MACLN/X/2021	LM	MACLN	Plan																												On Going		
							Actual																														
LACLO (LA)	3	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lacio	Ailili Const. Unip. Lda	02/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																											PHO			
							Actual																														
	6	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	Esa-Un	RDTL-74/GMTAC/XI/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																											Abandona			
							Actual																														
	7	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilmano	Surprise Unip. Lda	07/PDIM-II/MNTT/III/2016	PDIM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																											On Going			
							Actual																														
TOTAL PROJETO ON-GOING																																					
Note:																																					
		Plano Periode inspesaun iha tereinu		Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu		Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili		Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu																													
		Prepara Husi :  (Eng. Aleixo de Costa Andrade) Eng. Projeto Edificio Public, Agua e Saneamento Municipiu		Sertifika Husi :  (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas) Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade. ADN.I.P.		Aprova Husi :  (Eng. Japaneiro Maia Guterres) Adjunto Director Executivo, ADN.I.P.																															

---	--	--	--	--	--

2021

Municipio

[illegible]

Naran Eng.		Jose Roberto Carlos Gusmão							2022																												
Município																																					
Município / Posto		No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Fevereiro																												OBS
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
BARIQUE (BA)	1	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	Yoku Unipessoal Lda	MPW-W-190157	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																														
	3	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	Zenobia Diak Unip.Lda	MPWTC - CD - 170003	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													PHO	
							Actual																														
	7	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	Manufahi Kik Unip. Lda	MPW-W-W-190080	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going	
							Actual																														
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	We'coi Unipessoal Lda	MPW-W-210062	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going	
							Actual																														
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	Linoel	MPW-W-210061	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																														
10	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	Gimso Brothers Unip. Lda	MPW-W-210058	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going	
						Actual																															
LACLO (LA)	2	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	Sahan I Unip.Lda	SSS/304/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													PHO	
							Actual																														
	4	Routine Roads Maintenance - Laclo, Manatuto Municipality	Egana, Unip. Lda	MPW-W-190251	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going	
							Actual																														
	8	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	Sinohydro Corporation Limited	ICB/07/MPW-2014	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going	
							Actual																														
TOTAL PROJETO ON-GOING																																					
Note:																																					
Plano Periode inspesaun iha tereinu								Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu								Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili								Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu													

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público						PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng.	Augusta da Costa Ferreira						2022																														
Município	Manatuto																																				
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Fevereiro																												OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
MANATUTO VILA (MV)	1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Progresso Fisika 100%	
							Actual																														
	2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Iva Forek, Lda	SSS/061/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Progresso Fisika 100%	
							Actual																														Projeto refere Eng. Munisipiu halo Monitorizasaun la tuir planu ne'ebe iha razau tanba iha Data 08-09/02/2022 Eng hui parte Leste hotu desloka ba Bucau hodi tuir Treinamento Lms, depois de ida Eng. Munisipiu fla fai mai Dili no iha Data 10-15 /02/2022 Eng. Munisipiu kontinua halo Rekomendasaun Pagamento tolu (3) ne'ebe iha. no hakarak relata mos katak Durante Prosesu Rekomendasaun Pagamento nia laran han tempu tanba Pagamento barak nune'e xefi seksaun prezisa check ida-ida nomos difikuldade ida mak Pagamento tolu (3) ne'ebe submete Back Up rekomendasaun hui Owner laiha nomos Nota Original hui Companhia la aneksu. iha semana ikus Eng. Munisipiu desloka ba Munisipiu maibe Monitorizasaun la realiza ho diak razau tanba kondisaun klima la permite (Udan no anin boot).
	4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	ICB/023/MPW-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going	
							Actual																														
	6	Manatuto to Laclubar (Orhua Bridge)	Manu Aman Unip.Lda	nn	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														PHO
							Actual																														
	12	Sumase River	Forte, Unip. Lda	SSS/113/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														PHO
							Actual																														
	13	Rehabilitation of Roads Monumento - Laclubar, Mercado Hua-Lu, Manatuto Municipality	Ilaitun, Lda	SSS/115/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Progresso Fisika 100%
							Actual																														
	14	New Const. of Gabion Tower No.04 Section Manatuto - Bucau	Geovanio Unip. Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																														
3	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalen - Cairui Chainage 0+000-9+800	As Jazesia Unipessoal Lda	MPW-W-210055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going	
						Actual																															Projeto refere Eng. Munisipiu halo Monitorizasaun la tuir planu ne'ebe iha razau tanba iha Data 08-09/02/2022 Eng hui parte Leste hotu desloka ba Bucau hodi tuir Treinamento Lms, depois de ida Eng. Munisipiu fla fai mai Dili no iha Data 10-15 /02/2022 Eng. Munisipiu kontinua halo Rekomendasaun Pagamento tolu (3) ne'ebe iha. no hakarak relata mos katak Durante Prosesu Rekomendasaun Pagamento nia laran han tempu tanba Pagamento barak nune'e xefi seksaun prezisa check ida-ida nomos difikuldade ida mak Pagamento tolu (3) ne'ebe submete Back Up rekomendasaun hui Owner laiha nomos Nota Original hui Companhia la aneksu. iha semana ikus Eng. Munisipiu desloka ba Munisipiu maibe Monitorizasaun la realiza ho diak razau tanba kondisaun klima la permite (Udan no anin boot).
LACLUBAR (LAC)	2	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD	ICB/04/MPW-2014	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going	
							Actual																														
	5	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	Hatuwari Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190035	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going		
							Actual																														
	6	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	Ryzena Unipessoal Lda	MOP/DGOP/DNEPCC/0671-VIII/2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going		
							Actual																														
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	MPW-W-210057	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going	
							Actual																														
8	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	Adahiak Oriso Unipessoal Lda	MPW-W-210056	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going	
						Actual																															Eng. Munisipiu laabe halo monitorizasaun no razau tanba dalan asesu kotu kauza hui Calamidade 04 Abril 2021. ADN coordena ho MOP kona ba assunto refere no sira dehan sei hein aprovasaun hui Nasional atu halo fali Re-Alinhamento foun



Note:	Plano Periode inspesaun iha tereinu	Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu	Relatoriu avaliasun mensal iha Dili	Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu
-------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------

Aprova Husi :

(Eng. Juanario Mota Gutierrez)
Adjunto Director Ejecutivo, ADNLP

Aprova Husi :

[Handwritten signature]

Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T.M., Eng.
Diretor Executivo, AONAP

[Handwritten signature]

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPEAUN																													
Naran Eng.	Adonis Julio Fernandes							2022																												
Município	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Febreiru																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
MANATUTO VILA (MV)	1	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													
							Actual																													
	2	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	Ralan Unip. Lda	03/PDIM-II/MNTT/X/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													
							Actual																													
	3	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																													
							Actual																													
	4	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																													
							Actual																													
	5	Costrusaun Fatin Izolamento Iha Municipio Manatuto	Talamori Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	LM	SAUDE	Plan																													
							Actual																													
6	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-186	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																														
						Actual																														
LALEIA (LAL)	1	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/VI/DILI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																													
							Actual																													
	2	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	Hare Unip.Lda	02/PDIM-I/MNTT/X/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																													
							Actual																													
LACLUBAR (LAC)	1	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	Tasibala III Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	2	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	Ladiama Unip. Lda	04/PDIM I/MNTT/X/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													
							Actual																													
	3	Konstrusaun Rezidencia Pesoa Iha iha Suku Funar - Laklubar	Tonijo Unip. Lda	05/PDIM-I/MNTT/X/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													
							Actual																													
SOIBADA (SO)	4	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	Hatuwari Unip. Lda	02/PDD-II/MNTT/VII/2015	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													
							Actual																													
	5	Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)	Manufahi Kiik Unip. Lda	01/PDIM-I/MNTT/X/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													
							Actual																													
BARIQUE (BA)	1	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	Tasibala II Const	RDTL/PO:2016-11272	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																													
							Actual																													
	2	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	Malack II Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/X/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													
							Actual																													
	3	Construction of Residense for Health Staff in Suku Aimeta Laran-Barique	Macucuren Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/X/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													
							Actual																													

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Febreiru																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
LACLO (LA)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	Anopa Electrical Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000421	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	2	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lacio	Ailili Const. Unip. Lda	02/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																													
							Actual																													
	3	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	Esa-Un	RDTL:74/GMTAC/XI/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																													
							Actual																													
	4	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilirano	Surprise Unip. Lda	07/PDIM-II/MNTT/VIII/2016	PDIM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																													
							Actual																													
TOTAL PROJETO ON-GOING																																				

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :



(Adonis Julio Fernandes)
Eng. Electricidade, ADN, I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P



Aprova Husi :



(Eng. Jantario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN,I.P



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.		Adonis Julio Fernandes						2022																												
Município		MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																		
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Febreiru																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
MANATUTO VILA (MV)	1	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													
							Actual																													
	2	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	Ralan Unip. Lda	03/PDIM-II/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													
							Actual																													
	3	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																													
							Actual																													
	4	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																													
							Actual																													
	5	Costrusaun Fatin Izolamento Iha Municipio Manatuto	Talamori Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	LM	SAUDE	Plan																													
							Actual																													
	6	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-186	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													
							Actual																													
LALEIA (LAL)	1	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/II/DILI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																													
							Actual																													
	2	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	Hare Unip.Lda	02/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																													
							Actual																													
LACLUBAR (LAC)	1	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	Tasibala III Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	2	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	Ladiama Unip. Lda	04/PDIM I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													
							Actual																													
	3	Konstrusaun Rezidencia Pesoa Iha iha Suku Funar - Laklubar	Tonijo Unip. Lda	05/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													
							Actual																													
SOIBADA (SO)	4	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	Hatuwari Unip. Lda	02/PDD-II/MNTT/VII/2015	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													
							Actual																													
	5	Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)	Manufahi Kiik Unip. Lda	01/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													
							Actual																													
BARIQUE (BA)	1	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	Tasibala II Const	RDTL/PO:2016-11272	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																													
							Actual																													
	2	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	Malack II Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													
							Actual																													
	3	Construction of Residense for Health Staff in Suku Aimeta Laran-Barique	Macucuren Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													
							Actual																													

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Febreiru																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
LACLO (LA)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacro to Mantane - Manatuto Municipality	Anopa Electrical Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000421	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	2	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lacro	Ailili Const. Unip. Lda	02/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																													
							Actual																													
	3	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	Esa-Un	RDTL:74/GMTAC/XI/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																													
							Actual																													
	4	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilimano	Surprise Unip. Lda	07/PDIM-II/MNTT/VIII/2016	PDIM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																													
							Actual																													
TOTAL PROJETO ON-GOING																																				

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi

(Adonis Julio Fernandes)
Eng. Electricidade, ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN,I.P


Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T.M.,Eng)
Director Executivo, ADN,I.P




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PLANU INSPEAUN

Naran Eng.		Tito Edgar F.N de Jesus						2022																												OBSERVASAUN			
Município		MUNICIPIO DILI NO POSTOS																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		FEVEREIRO																															
								Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Mo		Tu	We	Th
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
IMPRESTIMO	1	National road no. 1 Upgrading project Manatuto - Baucau (package A01-02)Package A01-02/sta 56+400-114+102(56.82km)	Shanghai Construction Group Co.Ltd Jv PT. Brantas Abipraya(Persero)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	2	National road no. 1 Upgrading project Dili - Manatuto (package A01-01) (km 12+966.66-km 61+706.66)	Sinohydro Corporation Limited		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	3	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	4	RNUSP/ Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Baucau - Lautem Section : Sta. 123 + 105 to Sta. 182 + 040 (with Exceptions)	CBMI Const.Co.,Ltd. / Chongqing Road Engineering (Group)Co.,Ltd.(Joint venture)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	5	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Const.Co.,Ltd. / Chongqing Road Engineering (Group)Co.,Ltd.(Joint venture)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	6	Road Network Upgrading Project (RNUP) Upgrading and Maintanace of Dili (Air Port Junction - Tibar)Road - Section 2 (Tasitolu - Tibar Road Link A03-01/ Sta 8 + 740 - Sta 13 + 290)	China Wu Yi Co.,Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	7	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding project and maintanace of Dili- Ainaro Road Lot 3(Solerema - Bandudatu Section (Km 34 +620 - Km 64 + 000)(29km)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	8	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000) (ICB/034/MPW-2013)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	9	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	10	Road Network Upgrading Sector Project Consulting Services : Preparation of Designs for 169 Km of National Roads (Baucau to Lospalos, Lautem to Com and Baucau to Viqueque) (ADB LOAN no . 3020 - TIM and 3021 - TIM)	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.,Ltd.		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	11	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.,Ltd.		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	12	Upgrading and Maintenance of Laclubar Jct Natarbora Roads Sta. 100+360 - 144+995 Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction CO.,Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	13	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Laulara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili - Ainaro Road (Lots 1 - 5)	Kunhwa Eng. & Consulting Co.,Ltd in Joint Venture with Dongsung Eng. Co.,Ltd., and in Association with Desing Science, INC., and Kai Watu Kmanek Consultants, Unip ,Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	14	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620 km) Municipality Aileu	China Wu Yi Co.,Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	15	Consulting Services for Project Implementation and Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120), Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste.	Intercontinental Consultant and Technocrats Pvt.,Ltd. (India) in Association With Infra Consultants in the Philis. (Icp) Inc. (Philippines) (As Sub - Consultant) and Dezemvolve Timor Leste (Detile) Consultant, ,Ltd (Timor Leste (As sub - Consultant)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	16	Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120)	China Railway JV COVEC		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	17	Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste.	China Railway JV COVEC		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																

X



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Vidal Guterres								2022																												OBSERVASAUN			
Município		MUNICIPIO DILI NO POSTOS																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		FEVEREIRO																															
								Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
IMPRESTIMO	1	National road no. 1 Upgrading project Manatuto - Baucau (package A01-02)Package A01-02/sta 56+400-114+102(56.82km)	Shanghai Construction Group Co.Ltd Jv PT. Brantas Abipraya(Persero)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	2	National road no. 1 Upgrading project Dili - Manatuto (package A01-01) (km 12+966.66-km 61+706.66)	Sinohydro Corporation Limited		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	3	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	4	RNUSP/ Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Baucau - Lautem Section : Sta. 123 + 105 to Sta. 182 + 040 (with Exceptions)	CBMI Const.Co.,Ltd / Chongqing Road Engineering (Group)Co.,Ltd.(Joint venture)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	5	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Const.Co.,Ltd / Chongqing Road Engineering (Group)Co.,Ltd.(Joint venture)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	6	Road Network Upgrading Project (RNUP) Upgrading and Maintanace of Dili (Air Port Junction - Tibar)Road - Section 2 (Tasitolu - Tibar Road Link A03-01/ Sta 8 + 740 - Sta 13 + 290)	China Wu Yi Co.,Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	7	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding project and maintanace of Dili- Ainaro Road Lot 3(Solerema - Bandudatu Section (Km 34 +620 - Km 64 + 000)(29km)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	8	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000) (ICB/034/MPW-2013)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	9	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	10	Road Network Upgrading Sector Project Consulting Services : Preparation of Designs for 169 Km of National Roads (Baucau to Lospalos, Lautem to Com and Baucau to Viqueque) (ADB LOAN no . 3020 - TIM and 3021 - TIM)	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunlwa Engineering and Consulting Co.,Ltd.		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	11	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunlwa Engineering and Consulting Co.,Ltd.		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	12	Upgrading and Maintenance of Laclubar Jet Natarbora Roads Sta. 100+360 - 144+995 Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction CO.Lda		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	13	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Laulara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili - Ainaro Road (Lots 1 - 5)	Kunlwa Eng. & Consulting Co.,Ltd in Joint Venture with Dongsung Eng. Co.,Ltd., and in Association with Desing Science, INC., and Kai Watu Kmanek Consultants, Unip Lda		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	14	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620 km) Municipality Aileu	China Wu Yi Co.,Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	15	Consulting Services for Project Implementation and Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120), Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste.	Intercontinental Consultanst and Technocrats Pvt.Ltd. (India) in Association With Infra Consultants in the Philis. (Icp) Inc. (Philippines) (As Sub-Consultant) and Dezemvolve Timor Leste (Detile) Consultant, Lda (Timor Leste (As sub - Consultant)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	16	Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120)	China Railway JV COVEC		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																
	17	Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste.	China Railway JV COVEC		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
							Actual																																

Handwritten signature or mark.



2022

OBSERVASAUN

FEVEREIRO

Inspeksaun PBM 15

PHO

Inspeksaun PBM

Inspeksaun PBM

PHO

Insp. No fo fila	
------------------	--

Inspeksaun IPC 10

Inspeksaun Ipc 8

Inspeksaun Ipc 8

IMPRESTIMO

Naran Eng.	Eng. Tito Edgar F. N. De Jesus
------------	--------------------------------

2022

Municipio

MUNICIPIO DILI NO POSTOS

FEVEREIRO

OBSERVASAUN

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	Município	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto																																	OBSERVAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
IMPRESTIMO	1	National road no. 1 Upgrading project Manatuto - Baucau (package A01-02)(Package A01-02/sta 56+400-114+102(56.82km)	Shanghai Construction Group Co.Ltd Jv PT. Brantas Abiprayati(Persero)	Manatuto		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

2022

22

[illegible]

Naran Eng. Eng. Teresa Gomes

2022

Municipio

MUNICIPIO DILI NO POSTOS

Municipio /
Posto

No.

Naran Projeto

Naran Companhia

Municipio

No Contrato

ria

[illegible]

FEVEREIRO

OBSERVASAUN

IMPRESTIMO

2HC

ERIC

