



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN PROJETUS
MUNISÍPIU MANATUTO

JUÑU 2023




SUMÁRIO
RELATÓRIO
IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO
MANATUTO
JUNHO 2023

Prepara Husi :



(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P



(Eng. Jose R. Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P



(Eng. Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projecto ME, ADN, I.P



(Eng. Domingos da Costa e Silva)
Eng. ba Projecto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu, ADN, I.P


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e
Irigasaun, ADN, I.P


(Eng. Deolindo de F. Marques)
Chefe Seksaun ba Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO.....	1
INDICE	3
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Manatuto.....	3
1.3. Lista Projectos.....	7
II. PROGRESU FISIKU.....	25
2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan.....	25
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	26
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	26
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	27
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	27

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto.....	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto	6
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamentos	7
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Manatuto Por Sectores.....	11
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Manatuto Por Ministerio.....	18
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto	25

I. INTRODUSAUN.


1.1. Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria

1.2. Perfil Municipio Manatuto

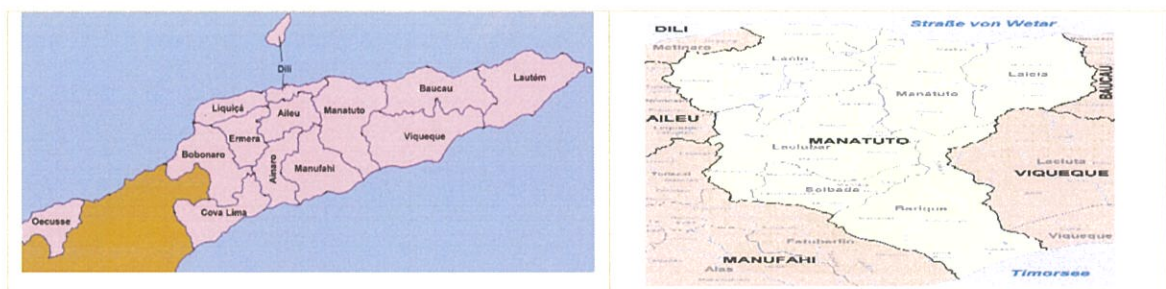

Mapa 2 hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Manatuto iha luan 1,706 km² ho populasau nain 42,742 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Manatutoiha Postos Administrativos nen (6), Sukus 29 no aldeias 99 , mak hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.

Natarbora		Laclo		Laklubar		Laleia	
Sukus	Aldeia	Sukus	Aldei	Suku	Aldeia	Sukus	Aldeias
Aubeon	2	Hohorai	4	Batara	4	Cairui	7
Barique	2	Locomesak	5	Hatu ma quere k	3	Hatulara n	3
Fatuwaque	2	Uma kaduak	3	Funar	4	Lifau	3
Manehat	3	Uma naruk	4	Mane lima	6		
Uma Boco	2			-	8		
				Sanan a Na'i	4		
Total	11		18		30		13

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 69

Manatuto		Soibada	
sukus	Aldeia	sukus	aldeias
Ailili	2	Fatuma querek	2
Aitekas	4	Leo-hat	2
Cribas	5	Manlala	2
Iliheu	5	Maun Fahe	2
Ma'abat	2	Somoro	2
Sau	2		
	22		10

Tabela 1.1: Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Manututu								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	3	3	3			3	
2	Administrasau n no Financas	0	0	0			0	
3	Motorista	1	1	1			1	
4	Seguransa	0	0	0			0	
Total		4					4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto.

ASET ADN,IP MUNICIPIO MANATUTO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	1	1	1				
2	Kareta	1	1	1				
3	Desktop HP / Monitor	1	1	1				
4	Laptop HP	1	1	1				
5	Printer Cannon	1	1	1				
6	UPS	1	1	1				Aát ona
7	Armario File	2	2	2				
8	Armario Tau hena	3	3	3				
9	Meja escritorio	1	1	1				
10	Meja han	1	1	1				
11	Meja TV (kiik)	1	1	1				
12	Kadeira escritorio	6	6	6				
13	Kadeira han	4	4	4				
14	Sofa	1 Set	1 Set	1 Set				
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3	3 Set	3 Set	3 Set				
16	Jeleira	1	1	1				Aát ona
17	Water Dispenser	1	1	1				
18	TV + Parabola	1 Set	1 Set	1 Set				
19	AC	4	4	4				1 aát ona
20	Kipas Angin	4	4	4				
21	Kompur Listrik	1	1	1				Aát ona

22	Kompor Gas	1	1	1				Aát ona
23	Rack sepatu	3	3	3				
24	Rack Piring	1	1	1				
25	Lampu	11	11	11				
26	Water Pump Sanyo	1	1	1				

1.3 : Lista Projectos

Projetu hotu ne'ebe akumulá iha lista ne'e bazeia ba dados projetu ne'ebe sei la'o hela no mos projetu ne'ebe abandona ona tinan barak, projetu hirak ne'e fahe tuir lista 1.3.1 Projeto Por Fundus Finansiamientos, 1.3.2 Projeto Por Sektors no 1.3.3 Projeto Por Ministerios.

1.3.1 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamientos

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	TOTAL EMERGENCY+FI+Fundu Covid-19+LM-BS+LM-CD+LM-TP+PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	12	\$ 3,014,185.05	36.90%
2	Laclo	8	\$ 49,415,129.51	87.56%
3	Laclubar	9	\$ 36,702,834.12	86.81%
4	Laleia	3	\$ 392,472.03	17.27%
5	Manatuto Villa	20	\$ 47,697,606.74	70.03%
6	Soibada	6	\$ 4,286,667.82	75.99%
	Grand Total	58	\$ 141,508,895.27	79.83%

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	EMERGENCY		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0.00%
2	Laclo		\$ -	0.00%
3	Laclubar		\$ -	0.00%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	1	\$ 127,786.80	20.56%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	1	\$ 127,786.80	20.56%

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	FI		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	1	\$ 373,283.85	0.00%
2	Laclo	3	\$ 48,698,873.04	87.85%
3	Laclubar	2	\$ 35,075,150.37	88.64%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	7	\$ 46,071,127.27	70.71%
6	Soibada	1	\$ 3,553,954.20	80.60%
	Grand Total	14	\$ 133,772,388.73	81.72%

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0.00%
2	Laclo		\$ -	0.00%
3	Laclubar		\$ -	0.00%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	3	\$ 598,668.36	86.09%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	3	\$ 598,668.36	86.09%

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	2	\$ 404,938.08	59.16%
2	Laclo	2	\$ 240,323.02	77.07%
3	Laclubar	2	\$ 675,432.39	43.85%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	1	\$ 29,275.84	15.92%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	7	\$ 1,349,969.33	53.75%

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	8	\$ 2,119,048.24	37.66%
2	Laclo	1	\$ 223,843.79	56.58%
3	Laclubar	2	\$ 661,982.34	55.55%
4	Laleia	2	\$ 305,588.74	9.25%
5	Manatuto Villa	1	\$ 182,701.57	6.14%
6	Soibada	4	\$ 630,201.31	54.90%
	Grand Total	18	\$ 4,123,365.99	40.69%

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0.00%
2	Laclo	1	\$ 98,147.27	44.74%
3	Laclubar	2	\$ 202,223.29	47.26%
4	Laleia	1	\$ 86,883.29	45.49%
5	Manatuto Villa	5	\$ 382,490.63	47.96%
6	Soibada	1	\$ 102,512.31	45.66%
	Grand Total	10	\$ 872,256.79	46.92%

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	1	\$ 116,914.88	63.99%
2	Laclo	1	\$ 153,942.39	84.29%
3	Laclubar	1	\$ 88,045.73	10.46%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	2	\$ 305,556.27	28.66%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	5	\$ 664,459.27	45.35%

1.3.2 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Sectors

NO	POR SECTOR	TOTAL MUNICIPIO MANATUTO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370,511.25	15.83%
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 162,377.94	41.85%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL	1	\$ 5,305,635.70	0.00%
4	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	84.29%
5	EDIFICIOS PUBLICOS	7	\$ 1,168,395.22	58.91%
6	EDUKASAUN	11	\$ 1,054,958.36	39.86%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1,076,003.44	78.57%
8	ESTRADAS	17	\$ 9,302,853.24	57.22%
9	ESTRADAS E PONTES	1	\$ 394,194.73	0.00%
10	FLOOD CONTROL	2	\$ 432,138.16	78.21%
11	IMPRESTIMO	4	\$ 115,112,106.35	86.80%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES	1	\$ 127,786.80	20.56%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157,560.52	41.96%
15	PONTES	1	\$ 3,553,954.20	80.60%
16	SAUDE	3	\$ 467,944.26	72.58%
17	TURISMO	2	\$ 305,556.27	28.66%
Grand Total		58	\$ 141,508,895.27	79.83%

NO	POR SECTOR	Barique		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370,511.25	15.83%
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 162,377.94	41.85%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL		\$ -	0.00%
4	COMERCIO		\$ -	0.00%
5	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 408,460.73	90.00%
6	EDUKASAUN		\$ -	0.00%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
8	ESTRADAS	5	\$ 1,555,799.59	19.64%
9	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
10	FLOOD CONTROL	1	\$ 242,560.14	70.75%
11	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES		\$ -	0.00%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157,560.52	41.96%
15	PONTES		\$ -	0.00%
16	SAUDE	1	\$ 116,914.88	63.99%
17	TURISMO		\$ -	0.00%
Grand Total		12	\$ 3,014,185.05	36.90%

NO	POR SECTOR	Laclo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL		\$ -	0.00%
4	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	84.29%
5	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 50,745.00	37.13%
6	EDUKASAUN	1	\$ 98,147.27	44.74%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 380,582.61	72.08%
8	ESTRADAS	2	\$ 227,158.35	57.07%
9	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
10	FLOOD CONTROL	1	\$ 189,578.02	87.76%
11	IMPRESTIMO	1	\$ 48,314,975.87	87.98%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES		\$ -	0.00%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
15	PONTES		\$ -	0.00%
16	SAUDE		\$ -	0.00%
17	TURISMO		\$ -	0.00%
Grand Total		8	\$ 49,415,129.51	87.56%

NO	POR SECTOR	Laclubar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL		\$ -	0.00%
4	COMERCIO		\$ -	0.00%
5	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0.00%
6	EDUKASAUN	2	\$ 202,223.29	47.26%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 695,420.83	82.11%
8	ESTRADAS	4	\$ 1,337,414.73	49.64%
9	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
10	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
11	IMPRESTIMO	1	\$ 34,379,729.54	88.78%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES		\$ -	0.00%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
15	PONTES		\$ -	0.00%
16	SAUDE	1	\$ 88,045.73	10.46%
17	TURISMO		\$ -	0.00%
Grand Total		9	\$ 36,702,834.12	86.81%

NO	POR SECTOR	Laleia		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL		\$ -	0.00%
4	COMERCIO		\$ -	0.00%
5	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 277,330.43	0.00%
6	EDUKASAUN	1	\$ 86,883.29	45.49%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
8	ESTRADAS	1	\$ 28,258.31	100.00%
9	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
10	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
11	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES		\$ -	0.00%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
15	PONTES		\$ -	0.00%
16	SAUDE		\$ -	0.00%
17	TURISMO		\$ -	0.00%
Grand Total		3	\$ 392,472.03	17.27%

NO	POR SECTOR	Manatuto Villa		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL	1	\$ 5,305,635.70	0.00%
4	COMERCIO		\$ -	0.00%
5	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 364,960.55	72.47%
6	EDUKASAUN	6	\$ 565,192.20	34.44%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
8	ESTRADAS	2	\$ 5,590,919.46	69.52%
9	ESTRADAS E PONTES	1	\$ 394,194.73	0.00%
10	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
11	IMPRESTIMO	2	\$ 32,417,400.94	82.96%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES	1	\$ 127,786.80	20.56%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
15	PONTES		\$ -	0.00%
16	SAUDE	1	\$ 262,983.65	97.19%
17	TURISMO	2	\$ 305,556.27	28.66%
	Grand Total	20	\$ 47,697,606.74	70.03%

NO	POR SECTOR	Soibada		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL		\$ -	0.00%
4	COMERCIO		\$ -	0.00%
5	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 66,898.51	55.80%
6	EDUKASAUN	1	\$ 102,512.31	45.66%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
8	ESTRADAS	3	\$ 563,302.80	54.79%
9	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
10	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
11	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES		\$ -	0.00%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
15	PONTES	1	\$ 3,553,954.20	80.60%
16	SAUDE		\$ -	0.00%
17	TURISMO		\$ -	0.00%
Grand Total		6	\$ 4,286,667.82	75.99%

1.3.3 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Ministerios

NO	POR MINISTERIO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica	1	\$ 127,786.80	20.56%
2	ESTATAL	2	\$ 305,556.27	28.66%
3	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 370,511.25	15.83%
4	Ministério da Administração Estatal	1	\$ 5,305,635.70	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 189,578.02	87.76%
6	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29,275.84	15.92%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	29	\$ 130,001,610.56	84.04%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	12	\$ 1,121,856.87	40.81%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277,330.43	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE	5	\$ 803,628.97	74.59%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204,687.39	72.60%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 408,460.73	90.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
Grand Total		58	\$ 141,508,895.27	79.83%

NO	POR MINISTERIO	Barique		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica		\$ -	0.00%
2	ESTATAL		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 370,511.25	15.83%
4	Ministério da Administração Estatal		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	9	\$ 2,118,298.19	28.86%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 116,914.88	63.99%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 408,460.73	90.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
Grand Total		12	\$ 3,014,185.05	36.90%

NO	POR MINISTERIO	Laclo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica		\$ -	0.00%
2	ESTATAL		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
4	Ministério da Administração Estatal		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 189,578.02	87.76%
6	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	4	\$ 48,922,716.83	87.71%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 98,147.27	44.74%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204,687.39	72.60%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
Grand Total		8	\$ 49,415,129.51	87.56%

NO	POR MINISTERIO	Laclubar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica		\$ -	0.00%
2	ESTATAL		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
4	Ministério da Administração Estatal		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	6	\$ 36,412,565.10	87.21%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 202,223.29	47.26%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 88,045.73	10.46%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
Grand Total		9	\$ 36,702,834.12	86.81%

NO	POR MINISTERIO	Laleia		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica		\$ -	0.00%
2	ESTATAL		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
4	Ministério da Administração Estatal		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	1	\$ 28,258.31	100.00%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 86,883.29	45.49%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277,330.43	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
	Grand Total	3	\$ 392,472.03	17.27%

NO	POR MINISTERIO	Manatuto Villa		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica	1	\$ 127,786.80	20.56%
2	ESTATAL	2	\$ 305,556.27	28.66%
3	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
4	Ministério da Administração Estatal	1	\$ 5,305,635.70	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29,275.84	15.92%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	\$ 38,402,515.13	80.15%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	6	\$ 565,192.20	34.44%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 598,668.36	86.09%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
Grand Total		20	\$ 47,697,606.74	70.03%

NO	POR MINISTERIO	Soibada		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica		\$ -	0.00%
2	ESTATAL		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
4	Ministério da Administração Estatal		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	4	\$ 4,117,257.00	77.07%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 169,410.82	49.67%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
Grand Total		6	\$ 4,286,667.82	75.99%

1.4. Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Barique	5,833	1,924	1,617	1,183	1,109
Laclo	8,193	2,250	2,185	1,919	1,838
Lacubar	12,777	3,445	3,571	2,924	2,836
Laleia	3,930	1,181	1,189	817	743
Manatuto	15,446	4,741	4,609	3,109	2,987
Soibada	3,511	237	213	239	259

Fontes : Projeksaun Populasaun bazea ba Census Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1. Progressu Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan nia laran, husi lista #anexu B hatudu progresu aktual fulan ida ne'e ho nia prensentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu prentangen aktual fulan ida ne'e hatudu progresu fisiku komulativu husi prosentu antrior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare iha #anexu B, detallu ba back-up #anexu C, no Instrusaun Servisu #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1. Obtáclo Servisu iha Terenu

Observasaun geral ba projeto hirak nebe mak implementa iha Munisipio Manatuto

1. Projeto Lao la tuir tempo nebee asina entre parte rua
2. Laiha tekniko supervisaun husi projeto nain atu halo kontrolo diaramente
3. Tekniko kompanha la iha tereno
4. Skill badaen neebe mak la dun professional

Obstalku teknik A.D.N hasoru

1. Distansia ne'ebe dook difikulta teknik atu servisu lalais
2. Kondisaun estrada neébe a'at
3. Kontraktor sira ne'ebe mak servisu iha terreno barak mak la tuir Spesifikasaun ne'ebe iha kontartu laran.
4. Planu Mapamentu Enginheiro Munisipiu la konsege realiza tuir planu tamba hare hosi nia distansia ne'ebe dook.
5. Sistema dropbox iha Munisipiu dala ruma iha problema lina internet

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Presija tebes atu aumenta ema iha Munisipiu atu nune bele halo servisu ba administrasaun ne'ebe efektivu.
2. Sebele sistema dropbox tau mos iha dektop Munisipiu para labele atraja ami nia servisu.

Note: Asinatura Husi Eng. Municipio Manatuto

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Manatuto						
No	Deskrisaun	Identidade				Asinatura
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	
1	Enjineiru	Quico Adelino Junior	240	Enjineiru EPAS		
		José R. Carlos Gusmão	168	Enjineiru ITI		
		Domingos da Costa e Silva	250	Enjineiru ITI		

		Adonis Julio Fernandes	152	Enjineiru ME		
2	Enjineira	Olivia Soares	112	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Timoteo da Silva Morais	120	Motorista		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Roads Maintenance - Lacle, Manatuto Municipality
No. kontratu : MPW-W-190251

Data Inspesaun : 14/ 06/ 2023

Fatin Inspesaun : Manatuto / Lacle

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°9'15.24541, Latetude : -8.55757187



End Point : Long : 125°9'13.84094, Latetude : -8.55721745

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos da C. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Laiha sketch servisu. Projetu kontinua paradu tamba Compania iha problema ho dokumentus, nune mos parte Dono do projetu mos halo ona inspesaun atu prosesu ba oin.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

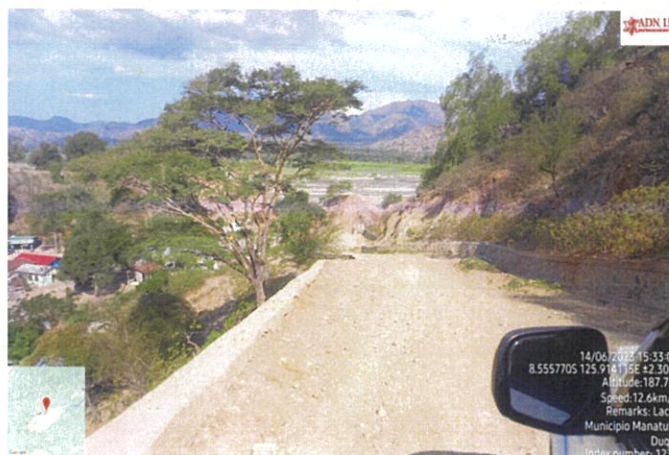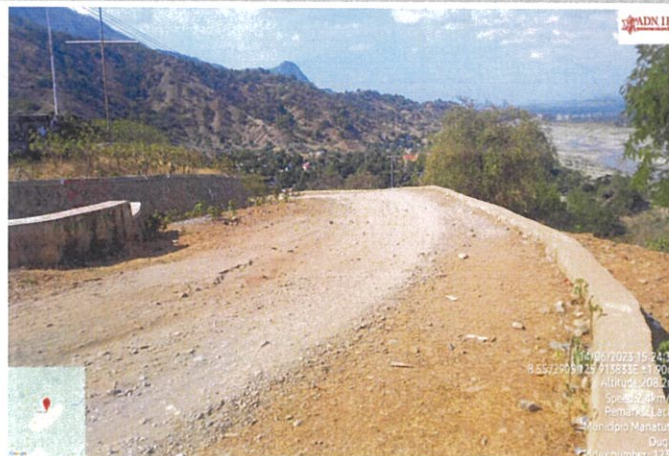



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun
No. kontratu :

Data Inspeasaun : 22 Junho 2023

Fatin Inspeasaun : Remanarun-Laclo

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.62940038 S

Latitude : 125.78705982 E

End Point : Long :

Latitude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Progressu ba refere iha
fulan ida ne'e:
Ba parte classroom grupo
hahu ona monta keramik
iha parte varanda ninian,
no halo mos ho servisu
plafond ninian iha parte
classroom nia laran.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



-8° 37' 46,29" S 125° 47' 13,368" E
Altitude: 1047.0m
ADN AILEU
Index number: 9642
22 Jun 2023 12:53:56



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-7)

Back-up Data


Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

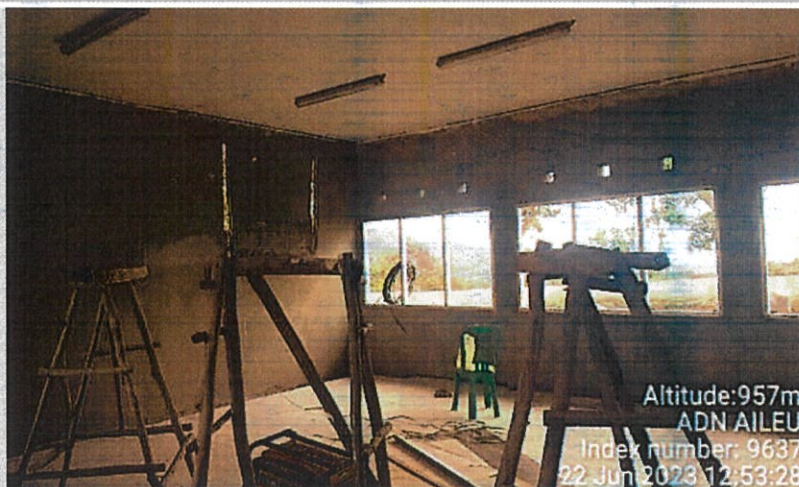

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Iha parte Toilet Building
ninian, grupo hahu ona
monta arus odamatan
nian balun.



#ANEXU A
MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	PMIS CODE	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
1	P0281	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	\$ 2,561,405.06	Aug. 25, 2018	63.80%	57.33%	\$ 1,468,479.04	\$ 1,092,926.02	ON-GOING	
2	P0282	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	\$ 3,029,514.40	Aug. 25, 2017	89.20%	79.82%	\$ 2,418,275.38	\$ 611,239.02	ON-GOING	
3	P0326	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obrai Unipessoal, Lda	\$ 2,362,976.44	June 30, 2015	82.08%	76.00%	\$ 1,795,843.89	\$ 567,132.55	ON-GOING	
4	P0377	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	\$ 28,011,854.94	Feb. 10, 2014	94.91%	85.62%	\$ 23,983,565.18	\$ 4,028,289.76	ON-GOING	
5	P0379	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	\$ 4,405,546.00	Sept. 3, 2014	73.76%	66.02%	\$ 2,908,484.28	\$ 1,497,061.72	ON-GOING	
6	P0788	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	\$ 79,155.54	Dec. 18, 2019	88.07%	79.26%	\$ 62,737.67	\$ 16,417.87	ON-GOING	
7	P0789	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	\$ 226,400.73	Dec. 18, 2019	43.70%	10.97%	\$ 24,834.32	\$ 201,566.41	ON-GOING	
8	P0872	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	\$ 29,275.84	March 1, 2020	15.92%	15.92%	\$ 4,660.85	\$ 24,614.99	ON-GOING	
9	P0954	Konstrusaun Fatim Isolamentu iha Municipiu Manatuto, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip Lda	\$ 262,983.65	09-Dec-20	100.00%	97.19%	\$ 255,587.87	\$ 7,395.78	FHO	Projecto ne Finaliza ona
10	P2538	New Construction of Fence at Isolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	K-6, UNIPESOAL LDA	\$ 257,748.51	Jan. 12, 2022	88.89%	74.56%	\$ 192,164.43	\$ 65,584.08	ON-GOING	
11	P2539	Supply and Installtion Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Fraternity Unipessoal Lda	\$ 77,936.20	Jan. 12, 2022	92.28%	86.81%	\$ 67,657.53	\$ 10,278.67	ON-GOING	
12	P1806	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	\$ 62,996.83	Oct. 15, 2021	71.10%	71.10%	\$ 44,793.33	\$ 18,203.50	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 16.46%
13	P1808	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF RENTAU	\$ 64,383.50	Oct. 15, 2021	74.71%	50.49%	\$ 32,504.67	\$ 31,878.83	ON-GOING	
14	P1809	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE PE REMBOR	\$ 88,918.34	Oct. 15, 2021	59.53%	44.89%	\$ 39,919.56	\$ 48,998.78	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 1.50%
15	P1811	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF OBRATO	\$ 66,144.65	Oct. 15, 2021	76.13%	50.49%	\$ 33,395.94	\$ 32,748.71	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 1.66%
16	P2041	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	\$ 100,047.31	Oct. 15, 2021	32.81%	32.81%	\$ 32,820.63	\$ 67,226.68	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 18.22%
17	P1953	Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Parapa Bemizuu Star Unipessoal Lda	\$ 182,701.57	Dec. 7, 2022	12.42%	6.14%	\$ 11,214.18	\$ 171,487.39	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 0.43%
18	P1581	Rehabilitasaun Estrada Rural Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda	\$ 394,197.73	April 28, 2022	18.68%	0.00%	\$ -	\$ 394,197.73	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 7.33%
19	P1125	Emergency Supply and Gabion Construction for Weten Transmission Pipeline, Manatuto Municipality	Be'e Timor Leste, Empresa Publica	EMERGENCY	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES	Manatuto Villa	Manatuto	Dyanyi Unipessoal, Lda	\$ 127,786.80	Sept. 05, 2022	21.64%	20.56%	\$ 26,270.01	\$ 101,516.79	ON-GOING	
20	P2868	New Construction Of Office Building Of Ministry Of State Administration In Manatuto Municipality	Ministério da Administração Estatal	FI	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL	Manatuto Villa	Manatuto	JLC LDA (TIMOR - LESTE)	\$ 5,305,635.70	Jan. 30, 2023	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 5,305,635.70	ON-GOING	
21	P0627	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip Lda	\$ 277,330.43	July 18, 2019	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 277,330.43	ON-GOING	

#ANEXU A
MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	PMIS CODE	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
22	P0986	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	\$ 28,258.31	June 10, 2021	100.00%	100.00%	\$ 28,258.31	\$ -	FHO	Projecto ne Finaliza ona
23	P1810	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laleia	Manatuto	MEJD PKRIE EP CAIRUI	\$ 86,883.29	Oct. 15, 2021	66.71%	45.49%	\$ 39,524.89	\$ 47,358.40	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 2.69%
24	P0114	New Installation Mv. Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	\$ 695,420.83	June 7, 2016	91.52%	82.11%	\$ 571,034.27	\$ 124,386.56	ON-GOING	
25	P0378	Road Network Upgrading Sector Project (RNUSP)Upgrading and Maintenance of Laclubar Junction - Natarbora Road (Sta. 100+360 - Sta. 144+995)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD	\$ 34,379,729.54	Nov. 20, 2014	98.54%	88.78%	\$ 30,520,639.32	\$ 3,859,090.22	ON-GOING	
26	P0899	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 481,029.67	Aug. 25, 2020	54.37%	11.80%	\$ 126,501.30	\$ 354,528.37	ON-GOING	
27	P0917	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 194,402.72	Dec. 20, 2019	96.99%	74.55%	\$ 169,695.40	\$ 24,707.32	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 14.16%
28	P0977	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	\$ 448,209.39	June 10, 2021	95.04%	82.05%	\$ 367,756.59	\$ 80,452.80	ON-GOING	
29	P0983	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	\$ 213,772.95	June 10, 2021	7.12%	0.00%	\$ -	\$ 213,772.95	ON-GOING	
30	P2781	Konstrasaun Postu Saude Laclubar Funar- Postu Administrativo Laclubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	MERCY, Unipessoal Lda	\$ 88,045.73	July 28, 2019	13.92%	10.46%	\$ 9,212.19	\$ 78,833.54	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 1.84%
31	P1803	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BATARA	\$ 102,060.99	Oct. 15, 2021	77.87%	44.47%	\$ 45,382.05	\$ 56,678.94	ON-GOING	
32	P1804	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	\$ 100,162.30	Oct. 15, 2021	50.16%	50.11%	\$ 50,193.41	\$ 49,968.89	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 7.95%
33	P0316	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPESSOAL LDA	\$ 3,553,954.20	Feb. 27, 2017	100.00%	80.60%	\$ 2,864,587.85	\$ 689,366.35	PHO	
34	P0932	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Starplan Utama Konsultan	\$ 164,154.00	March 25, 2020	100.00%	100.00%	\$ 164,154.00	\$ -	FHO	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 30%
35	P0981	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 203,036.57	June 10, 2021	63.56%	41.78%	\$ 84,819.65	\$ 118,216.92	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 5.81%
36	P0984	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 196,112.23	June 10, 2021	63.34%	30.42%	\$ 59,662.31	\$ 136,449.92	ON-GOING	
37	P1814	Projeto Rehabilitasaun Ensinnu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 66,898.51	Nov. 26, 2021	67.91%	55.80%	\$ 37,330.95	\$ 29,567.56	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 1.10%
38	P1807	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	\$ 102,512.31	Oct. 15, 2021	50.85%	45.66%	\$ 46,807.88	\$ 55,704.43	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Maio Aumenta 2.50%
39	P0940	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	\$ 242,560.14	Oct. 24, 2019	70.75%	70.75%	\$ 171,617.69	\$ 70,942.45	FHO	Projecto ne Finaliza ona
40	P0404	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	\$ 370,511.25	Sept. 13, 2016	17.59%	15.83%	\$ 58,645.87	\$ 311,865.38	Abandona	Abandona

#ANEXU A
MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	PMIS CODE	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
41	P0540	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip Lda	\$ 15,875.56	Jan. 7, 2017	100.00%	87.26%	\$ 13,853.09	\$ 2,022.47	PHO	Abandona
42	P0784	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	\$ 116,914.88	Sept. 23, 2019	71.10%	63.99%	\$ 74,817.23	\$ 42,097.65	ON-GOING	
43	P0873	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip Lda	\$ 162,377.94	Oct. 8, 2019	46.50%	41.85%	\$ 67,961.57	\$ 94,416.37	ON-GOING	
44	P0921	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 141,684.96	Aug. 25, 2019	41.78%	36.88%	\$ 52,260.01	\$ 89,424.95	ON-GOING	
45	P0978	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We'coi Unipessoal Lda	\$ 343,111.47	June 10, 2021	99.89%	21.97%	\$ 75,370.79	\$ 267,740.68	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 0.85%
46	P0982	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	\$ 296,211.81	June 10, 2021	24.25%	15.96%	\$ 47,266.94	\$ 248,944.87	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 3.53%
47	P0985	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	\$ 300,792.46	July 10, 2021	99.09%	52.76%	\$ 158,690.94	\$ 142,101.52	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 0.56%
48	P1056	New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Barique	Manatuto	Senizu	\$ 408,460.73	Oct. 18, 2021	100.00%	90.00%	\$ 367,614.65	\$ 40,846.08	PHO	
49	P1582	Rehabilitation of The Rural Road Natarbora - Pualaka (Mina Rai) Chainage 0+000 - 2+000 (2 km), Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Ilatun Lda	\$ 373,283.85	June 05, 2023	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 373,283.85	ON-GOING	
50	P2642	Provision of Consultancy Service for Preparation of Detailed Engineering Design (DED) and Bidding Document for Lamara Bridge on National Road (A09-04) Under Road Network Upgrading Sector Project (RNSUP), Access Bridge to Link Manehat to Natarbora, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	PT. Dhiratama Cipta Persada	\$ 242,400.00	Dec. 23, 2022	10.00%	10.00%	\$ 24,240.00	\$ 218,160.00	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 10.0%
51	P0061	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacio	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	\$ 380,582.61	Sept. 1, 2016	95.99%	72.08%	\$ 274,330.03	\$ 106,252.58	ON-GOING	
52	P0221	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Sahan I Unip Lda	\$ 3,314.56	Sept. 27, 2016	100.00%	90.00%	\$ 2,983.11	\$ 331.45	PHO	Falta Retensaun
53	P0926	For Roads & Bridges Maintenance Section : Mantanen Lacio, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Egana, Unip. Lda	\$ 223,843.79	Dec. 13, 2019	68.89%	56.58%	\$ 126,647.74	\$ 97,196.05	ON-GOING	
54	P0692	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Esa-Un	\$ 50,745.00	May 2, 2016	38.83%	37.13%	\$ 18,841.29	\$ 31,903.71	PENDENTE	
55	P0776	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilmano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacio	Manatuto	Surprise Unip. Lda	\$ 153,942.39	Sept. 12, 2016	97.16%	84.29%	\$ 129,753.97	\$ 24,188.42	ON-GOING	
56	P0396	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacio	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	\$ 48,314,975.87	May 3, 2016	88.12%	87.98%	\$ 42,506,027.78	\$ 5,808,948.09	ON-GOING	
57	P1805	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lacio	Manatuto	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	\$ 98,147.27	Oct. 15, 2021	52.14%	44.74%	\$ 43,908.27	\$ 54,239.00	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Junho Aumenta 5.39%
58	P2603	Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp at Behau	MINISTERIO DA DEFESA	LM-BS	FLOOD CONTROL	Lacio	Manatuto	Baboe Unip Lda	\$ 189,578.02	May 23, 2022	97.51%	87.76%	\$ 166,368.56	\$ 23,209.46	PHO	
TOTAL									\$ 141,508,898.27				\$ 112,969,968.66	\$ 28,515,720.15		

1. Eng. José R. Carlos Gusmão
Eng. ba Projeto Infrastrutura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Prepara Husi:
2. Eng. Domingus D.X. Silva
Eng. ba Projeto Infrastrutura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

3. Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Edificiu Público, Be'e
no Saneamento Municipiu Manatuto, ADN, I.P

4. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

Certifika Husi:
Eng. Emerenciana d. Costa Maia Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De
Qualidade ADN,I.P

LISTA #ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN


										Jun-23		
					LOKALIZASAUN PROJETU							
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress	This Month Progress	Komulativo Progress
1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	\$ 2,561,405.06	63.80%		63.80%
2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	SSS/061/MOPTC-2017	\$ 3,029,514.40	89.20%		89.20%
3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obrai Unipessoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	\$ 2,362,976.44	82.08%		82.08%
4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	ICB/023/MPW-2013	\$ 28,011,854.94	94.91%		94.91%
5	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	QCBS/019/MPW-2013	\$ 4,405,546.00	73.76%		73.76%
6	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	\$ 79,155.54	88.07%		88.07%
7	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	\$ 226,400.73	43.70%		43.70%
8	Servisu Manutensaun Edifisui CRC Munisipiu Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	019/Janeiro/2020	\$ 29,275.84	15.92%		15.92%
9	Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Municiui Manatuto, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	\$ 262,983.65	100.00%		100.00%
10	New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	K-6, UNIPESOAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227	\$ 257,748.51	88.89%		88.89%
11	Supply and Installtion Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Fraternity Unipessoal Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227	\$ 77,936.20	92.28%		92.28%
12	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	-	\$ 62,996.83	54.64%	16.46%	71.10%
13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF RENTAU	-	\$ 64,383.50	74.71%		74.71%
14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE PE REMBOR	-	\$ 88,918.34	58.04%	1.50%	59.53%
15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF OBRATO	-	\$ 66,144.65	74.48%	1.66%	76.13%
16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	-	\$ 100,047.31	14.58%	18.22%	32.81%
17	Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Parapa Bemizui Star Unipessoal Lda		\$ 182,701.57	11.99%	0.43%	12.42%
18	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda		\$ 394,197.73	11.35%	7.33%	18.68%
19	Emergency Supply and Gabion Construction for Weten Transmission Pipeline,Manatuto Municipality	Be'e Timor Leste, Empresa Publica	EMERGENCY	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL	Manatuto Villa	Manatuto	Dyanyi Unipessoal, Lda	NCB/055/BTL,E.P-2022	\$ 394,197.73	21.64%		21.64%
20	New Construction Of Office Building Of Ministry Of State Administration In Manatuto Municipality	Ministério da Administração Estatal	FI		Manatuto Villa	Manatuto	JLC LDA (TIMOR - LESTE)	ICB/032/MAE - 2022	\$ 5,305,635.70	0.00%		0.00%
21	Rehabilitasaun Kampu Fotebol iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/VII/DILI/2019/EDIFICIO DEPARTAMENT	\$ 277,330.43	0.00%		0.00%
22	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	MPW-W-210055	\$ 28,258.31	100.00%		100.00%
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laleia	Manatuto	MEJD PKRIE EP CAIRUI	-	\$ 86,883.29	64.02%	2.69%	66.71%
24	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412	\$ 695,420.83	91.52%		91.52%
25	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co., LTD	ICB/04/MPW-2014	\$ 34,379,729.54	98.54%		98.54%
26	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190035	\$ 481,029.67	54.37%		54.37%
27	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020	\$ 194,402.72	82.83%	14.16%	96.99%
28	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	MPW-W-210057	\$ 448,209.39	95.04%		95.04%
29	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	MPW-W-210056	\$ 213,772.95	7.12%		7.12%
30	Konstrasaun Postu Saude Laclubar Funar- Postu Administrativo Laclubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	MERCY, Unipessoal Lda	04/PDIM-I/MNTT/VIII/2022	\$ 88,045.73	12.08%	1.84%	13.92%
31	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BATARA	-	\$ 102,060.99	77.87%		77.87%
32	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	-	\$ 100,162.30	42.21%	7.95%	50.16%
33	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPESOAL LDA	SSS/013/MOPTC-2017	\$ 3,384,214.14	100.00%		100.00%
34	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000024	\$ 164,154.00	70.00%	30.00%	100.00%
35	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	MPW-W-210059	\$ 203,036.57	57.75%	5.81%	63.56%
36	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	MPW-W-210060	\$ 196,112.23	63.34%		63.34%
37	Projetu Rehabilitasaun Ensinnu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	RFQ-R : 21/036 - Q	\$ 66,898.51	67.91%		67.91%
38	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	-	\$ 102,512.31	50.42%	0.43%	50.85%
39	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	MPW-W-190157	\$ 242,560.14	70.75%		70.75%
40	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	RDTL/PO:2016-11272	\$ 370,511.25	17.59%		17.59%
41	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip.Lda	MPWTC - CD - 170003	\$ 15,875.56	100.00%		100.00%
42	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/IX/2019	\$ 116,914.88	71.10%		71.10%
43	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip Lda	No. Kontratu : MOP-W-190233	\$ 162,377.94	46.50%		46.50%
44	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	MPW-W-W-190080	\$ 141,684.96	41.78%		41.78%


LISTA #ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN


					LOKALIZASAUN PROJETU					Jun-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress	This Month Progress	Kumulativo Progress
45	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We"coi Unipessoal Lda	MPW-W-210062	\$ 343,111.47	99.04%	0.85%	99.89%
46	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	MPW-W-210061	\$ 296,211.81	20.73%	3.53%	24.25%
47	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	MPW-W-210058	\$ 300,792.46	98.52%	0.56%	99.09%
48	New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Barique	Manatuto	Senizu		\$ 408,460.73	100.00%		100.00%
49	Rehabilitation of The Rural Road Natarbora - Pualaka (Mina Rai) Chainage 0+000 - 2+000 (2 km), Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Ilatur Lda	RT/103/MOP-2022	\$ 373,283.85	0.00%		0.00%
50	Provision of Consultancy Service for Preparation of Detailed Engineering Design (DED) and Bidding Document for Lamara Bridge on National Road (A09-04) Under Road Network	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	PT. Dhiratama Cipta Persada	MPW-CS-220290	\$ 242,400.00	0.00%	10.00%	10.00%
51	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacio	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421	\$ 380,582.61	95.99%		95.99%
52	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Sahan I Unip.Lda	SSS/304/MOPTC-2016	\$ 3,314.56	100.00%		100.00%
53	Routine Roads Maintenance - Lacio, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Egana, Unip. Lda	MPW-W-190251	\$ 223,836.50	68.89%		68.89%
54	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Esa-Un	RDTL:74/GMTAC/X/2015	\$ 50,745.00	38.83%		38.83%
55	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilmano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacio	Manatuto	Surprise Unip. Lda	07/PDIM-II/MNTT/VIII/2016	\$ 153,942.39	97.16%		97.16%
56	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacio	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	ICB/07/MPW-2014	\$ 48,314,975.87	88.12%		88.12%
57	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lacio	Manatuto	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	-	\$ 98,147.27	46.75%	5.39%	52.14%
58	Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp at Behau	MINISTERIO DA DEFESA	LM-BS	FLOOD CONTROL	Lacio	Manatuto	Baboe Unip Lda		\$ 189,578.02	97.51%		97.51%

Prepara Husi:

1. 
Eng. ba Projeito Infrastrutura e Irigasaun
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

3. 
Eng. ba Projeito ME, ADN, I.P

2. 
Eng. ba Projeito Infrastrutura e Irigasaun
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

4. 
Eng. ba Projeito Infrastrutura e Irigasaun
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :


Eng. Remigio da c.s dos Santos
Eng. Senior ba Projeito Infrastrutura e Irigasaun, ADN, I.P


Eng. Arca-Francisco Xavier de D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeito Edificio Publico Beé no Saneamento, ADN, I.P


Eng. Deolindo de Falma Marques
ChefeSaksaun ME& ITC, ADN, I.P

Certifika Husi :


Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e
Validação De Qualidade ADN, I.P



#ANEXU C2 (LA-7)

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun

Lokalidade : Suco Hatuermera, Posto Administrativo Lacro

Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY					PROGRESS REPORT BY ADN IP					
No	MAIN SUMMARY	Page No		Amount	PROGRESS PREVIOUS		PROGRESS JUNE		TOTAL TO DATE	
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3.075,00	\$ 1.860,00	1,90%	\$ -	0,00%	\$ 1.860,00	1,90%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	\$ 49.095,82	\$ 33.608,82	34,24%	\$ 4.692,10	4,78%	\$ 38.300,92	39,02%
III	TOILET BULDING Tb	TB/39	(i)	\$ 24.387,69	\$ 7.160,11	7,30%	\$ 602,32	0,61%	\$ 7.762,43	7,91%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/24	(i)	\$ 12.248,77	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST			\$ 88.807,27	\$ 42.628,93	43,43%	\$ 5.294,42	5,39%	\$ 47.923,35	48,83%
B	CONTIGENCIA			\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD			\$ 6.340,00	\$ 3.255,00	3,32%	\$ -	0,00%	\$ 3.255,00	3,32%
D	GRAND TOTAL			\$ 98.147,27	\$ 45.883,93	46,75%	\$ 5.294,42	5,39%	\$ 51.178,35	52,14%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projeto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)

No. kontratu : MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020

Data Inspesaun : 20/06/2023

Fatin Inspesaun : Laclubar, Manatuto

Koordinadas :

Start Point : Long 8.7554S, Latetude : 125.9598E

End Point : Long : 8.7529S Latetude : 125.9194E


Naran Inspector : 1. Eng. José R. Carlos Gusmão

2. Eng. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Compania finaliza ona
projetu no halo ona pagamentu 100%-
FHO

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

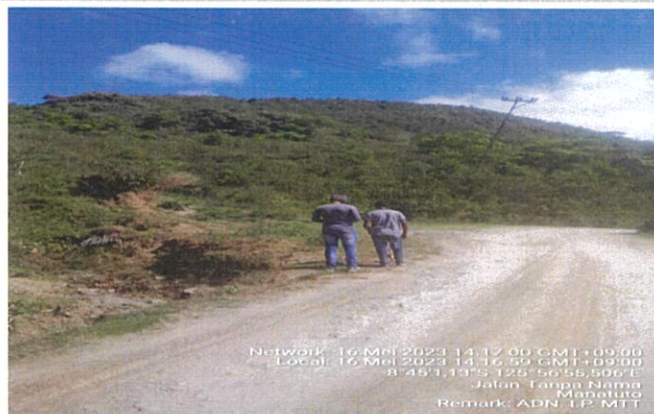



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


#ANEXU C1 (LAC - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)
No. kontratu : MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

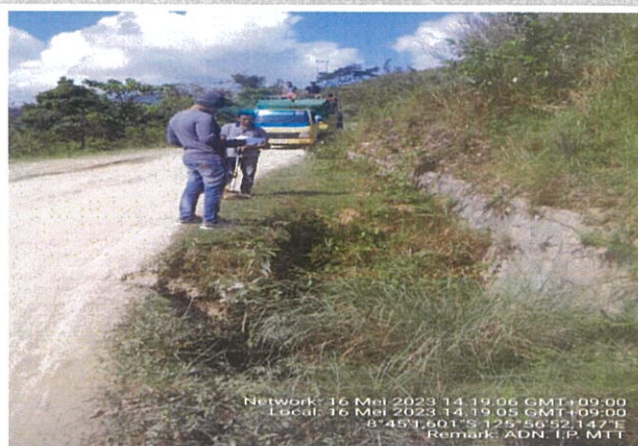



#ANEXU C2 (LAC-4)

Titulo Projeto : Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality
No. kontratu : MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020
Fatin Projeto : Posto Administrativo Laclubar, Municipio Manatuto
Contraktor : Ryzena Unip.Lda

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
100	GENERAL REQUIRMENTS	\$ 632.04	\$ 5,100.00	2.62%	\$ 4,850.00	2.49%	\$ 9,950.00	5.12%
200	EARHTWORK	\$ 22,980.03	\$ 7,312.43	3.76%	\$ 5,267.67	2.71%	\$ 12,580.10	6.47%
300	SUB BASE AND BASE COURSE	\$ 71,655.84	\$ 41,845.19	21.53%	\$ 2,104.69	1.08%	\$ 43,949.88	22.61%
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 99,134.81	\$ 87,010.00	44.76%	\$ 11,422.20	5.88%	\$ 98,432.20	50.63%
A	Construction Cost	\$ 194,402.72	\$ 141,267.62	72.67%	\$ 23,644.55	12.16%	\$ 164,912.17	84.83%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ -	\$ 14,126.76	7.27%	\$ 2,364.46	1.22%	\$ 16,491.22	8.48%
C	Overhead		\$ 2,475.00	1.27%	\$ 975.00	0.50%	\$ 3,450.00	1.77%
D	Tax 2 % x (A+B+C)	\$ -	\$ 3,157.39	1.62%	\$ 539.68	0.28%	\$ 3,697.07	1.90%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 194,402.72	\$ 161,026.77	82.83%	\$ 27,523.69	14.16%	\$ 188,550.46	96.99%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. José R. Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irigação
Munisipiu Matatuto, ADN.I.P

2. (Eng. Domingos D.X. Silva)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irigação
Munisipiu Matatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

Eng. Remigo da Costa do Santos.
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (LAC- 4)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)

Kompanha : Ryzena Unipessoal Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	20/06/2022	Manatuto/ Laclubar	Jose Roberto Carlos Gusmão	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Compania finaliza ona projetu		
					2	Compania halo ona pagamentu 100%		
					3			
					4	Final handover		
			Domingos DX. Silva		5			
					1			
					2			
					3			
					4			
					5			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC - 6)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000

No. kontratu : MPW-W-210056

Data Inspesaun : 20/06/2023

Fatin Inspesaun : Laclubar

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.747020°, Latetude : 125.915538°

End Point : Long : -8.750884°, Latetude : 125.904335°

Naran Inspector : Domingos da C. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Projetu Kontinua paradu



Drain Type - I

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público						#ANEXU D (LAC-6)	
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN							
Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000							
Kompanha : Adahiak Orlao Unipessoal Lda							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	20/06/2023	Manatuto/ Laclubar	Domingos D.X. Silva	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Eng. Munisipiu la prese buku tamu ho rajaun kompania sedauk prepara iha tereinu. Projetu paradu hahu husi Novembro 2022 too agora	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Postu Saude Funar, Laclubar
No. kontratu :

Data Inspesaun : 20 Junho 2023

Fatin Inspesaun : Funar, Laclubar

Koordinadas :

Start Point : Long :-8,75056S

Latetude : 125,870736 E

End Point : Long :

Latetude :


Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu Fiziku iha fulan ida ne'e:
Iha fulan ida ne'e Projetu refere agora
dadaun kompanhia hahu ona ho
plesteran ba parte laran nian. Alem de
ida ne kompanhia mos mobiliza ona
sasan ba kuda-kuda nian iha terrenu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

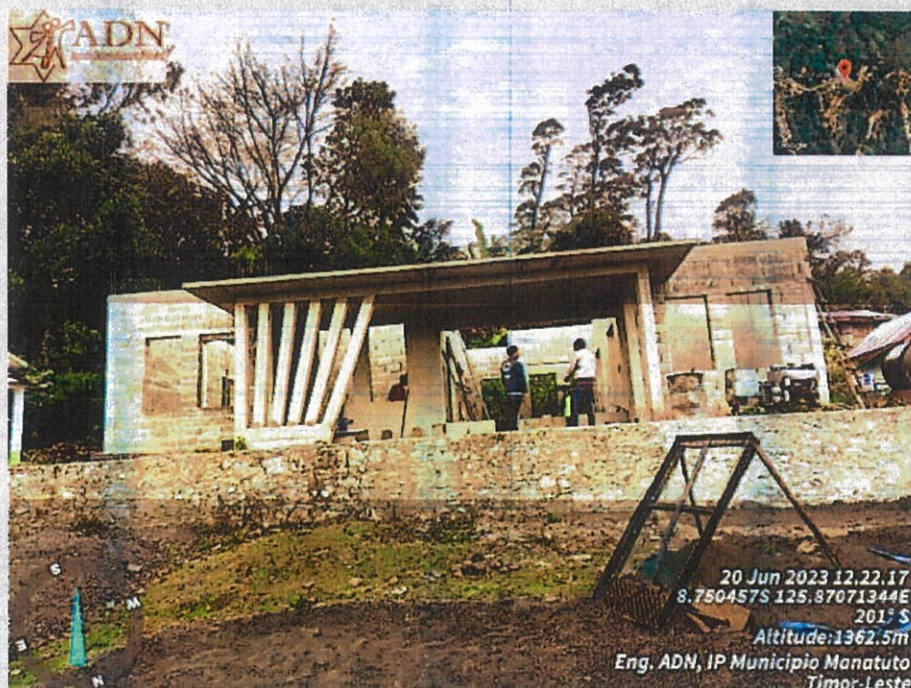



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-7)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun Postu Saude Funar, Laclubar

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .



 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D1 (LAC-7) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
					Projetu : Konstrusaun Postu Saude Funar, Laclubar			
					Kompanhia : MERCY UNIP. LDA			
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
1	20/06/2023	Funar, Laclubar	Quico Adelino Junior	Engenheiru ADN IP Municipiu Manatuto	1	Husu ba engenheiru kompanhia atu fo instrusaun ba badaen sira konaba campuran plesteran tenke tuir BOQ 1:3 no ketebalan plesteran 12 mm.		
					2	Bele kontinua ona ho servisu steel roofing nian no centering kuda-kuda sira tuir dezenhu.		
					3	Kontinua aselera servisu tuir dezenhu no mos BOQ.		
					4			
					5			



#ANEXU C2 (LAC 7)

Project Name : Konstrusaun Posto saude Funar - Postu administrativo Laclubar
Location : Suco Funar Post.Admin Laclubar Municipio Manatuto

SUMMARY

No	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	PROGRESS REPORT BY ADN IP					
			PREVIOUS MONTH (USD)	TOTAL (%)	PROGRESS JUNE (USD)	%	UP TO DATE (USD)	TOTAL (%)
I	Preliminaries	\$ 450,00	\$ 300,00	0,34%	\$ -	0,00%	\$ 300,00	0,34%
II	GROUND WORKS	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
III	CONCRETE WORKS	\$ 5.480,02	\$ 5.479,88	6,22%	\$ -	0,00%	\$ 5.479,88	6,22%
IV	MASONRY WORKS	\$ 10.454,66	\$ 3.342,91	3,80%	\$ 1.035,29	1,18%	\$ 4.378,20	4,97%
V	STRUCTURAL STEEL WORKS	\$ 6.761,89	\$ -	0,00%	\$ 410,12	0,47%	\$ 410,12	0,47%
VI	ROOFING AND CLADDING WORKS	\$ 6.243,92	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
VII	DOORS AND WINDOWS WORKS	\$ 8.060,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
VIII	HARDWARE	\$ 1.040,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
IX	PAINTING WORKS	\$ 2.175,82	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
X	TILLING WORKS	\$ 4.895,74	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
XI	CEILING WORKS	\$ 5.027,25	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
XII	HIDROULIC WORKS	\$ 5.611,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
XIII	ELECTRICAL SERVICES	\$ 4.822,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
XIV	MECHANICAL SERVICES INSTALLATIONS	\$ 313,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
XV	FURNITURE	\$ 7.200,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
XVI	PROVISIONAL SUM	\$ 500,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
XVII	External Works as Additional Works	\$ 5.611,83	\$ 350,90	0,40%	\$ -	0,00%	\$ 350,90	0,40%
A	Total Cost Helath Post	\$ 74.647,13	\$ 9.473,69	10,76%	\$ 1.445,41	1,64%	\$ 10.919,10	12,40%
B	Contractor Fee (10% *A)	\$ 7.464,71	\$ 947,37	1,08%	\$ 144,54	0,16%	\$ 1.091,91	1,24%
C	Over Head	\$ 4.207,50	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	Tax (2%*(A+B+C))	\$ 1.726,39	\$ 208,42	0,24%	\$ 31,80	0,04%	\$ 240,22	0,27%
E	Grand Total (A+B+C+D)	\$ 88.045,73	\$ 10.629,48	12,08%	\$ 1.621,75	1,84%	\$ 12.251,23	13,92%

Inspesau husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Engenheiru ba Projetu Edificiu Be'e no
Saneamentu Municipio Manatuto ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Engenheiro Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia)
Kordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de
Koalidade ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-9)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um
No. kontratu :

Data Inspesaun : 20 Junho 2023

Fatin Inspesaun : Aisiu-um Laclubar

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.7762S,

Latetude : 125,9238E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu fiziku iha fulan ida ne'e: Ba Classroom ninian finaliza ona servisu roofing ninian no agora dadaun grupo kontinua ho servisu plesteran ba parte laran no mos liur.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-9)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.





Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Ba Toilet Building ninian kuaze finaliza on
aba servisu roofing ninian no sei kontinua ba
servisu finshing ninian hanesan plesteran ba
parte laran.

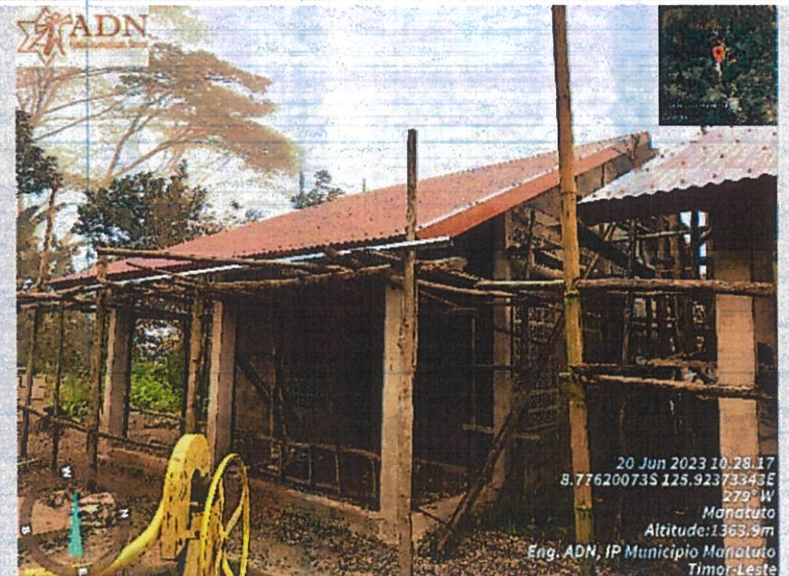

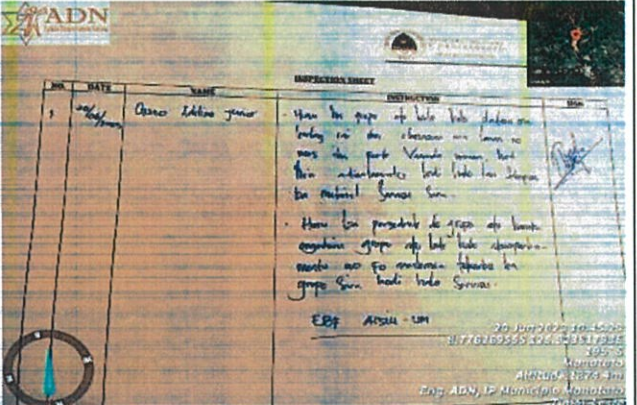 MINISTÉRIO DO PLANO E ORÇAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, IP Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D1 (LAC-9) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um												
Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO AISIU-UM												
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Fotografia	Asinatura			
I	20/06/2023	Laclubar	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Husu ba grupo atu bele halo dadaun ona leveling rai iha classroom nia laran no mos iha parte varanda ninnian, hodi hein adiantamentu hodi halo tan kompras ba material servisu sira.						
					2	Husu ba presidente do grupo atu haruka enginheiru grupo atu bele halo akompanhamentu no fo assistensia tekniku ba grupo sira hodi halo servisu.						
					3							
					4							
					5							



#ANEXU C2 (LAC-9)
SUMMARY BOQ

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um
Lokalidade : Suco Bora, Posto Administrativo Laclubar
Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

No	MAIN SUMMARY	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY A D N					
		Page No	Amount	PROGRESS PREVIOUS		PROGRESS JUNE		TOTAL TO DATE	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 3.075,00	\$ 1.725,00	1,72%	\$ 350,00	0,35%	\$ 2.075,00	2,07%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	\$ 51.145,96	\$ 31.705,01	31,65%	\$ 818,41	0,82%	\$ 32.523,42	32,47%
III	TOILET BULDING Tb	TB/39 (i)	\$ 25.155,89	\$ 7.626,07	7,61%	\$ 5.934,47	5,92%	\$ 13.560,54	13,54%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/24 (i)	\$ 11.445,45						
A	CONSTRUCTION COST		\$ 90.822,30	\$ 41.056,08	40,99%	\$ 7.102,88	7,09%	\$ 48.158,96	48,08%
B	CONTIGENCIA		\$ 3.000,00						
C	OVERHEAD		\$ 6.340,00	\$ 1.220,00	1,22%	\$ 860,00	0,86%	\$ 2.080,00	2,08%
D	GRAND TOTAL		\$ 100.162,30	\$ 42.276,08	42,21%	\$ 7.962,88	7,95%	\$ 50.238,96	50,16%

Verifika Husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projeto Edificio Publico no Agua
Saneamento Municipio Manatuto ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of the Rural Road Natarbora – Pualaka(Mina Rai),
Chainage 0+000-2+000 (2 Km) Manatuto Municipality

No. kontratu : RT / 103 / MOP - 2022

Data Inspesaun : 20/06/2023

Fatin Inspesaun : Laclubar

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.861680° S Latetude : 125.953162° E

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : Domingos da C. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Compania hahu mobiliza equipamentu
pesadu iha terenu, tempu badak sei hahu
servisu clearing and grubing

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAL-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui
No. kontratu :

Data Inspesaun : 21 Junho 2023

Fatin Inspesaun : Cairui, Laleia

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.6063S,

Latetude : 126,1422E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Progresso servisu iha fulan
ida ne'e: ba Classroom
ninian, grupo finaliza ona
servisu monta keramik
ninian, no sei falta tan servisu
ituan iha parte plumbing no
sei falta odamatan tahan
balun ne'ebe seidauk monta





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAL-3)

Back-up Data

Naran Projeto

No. kontratu


: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

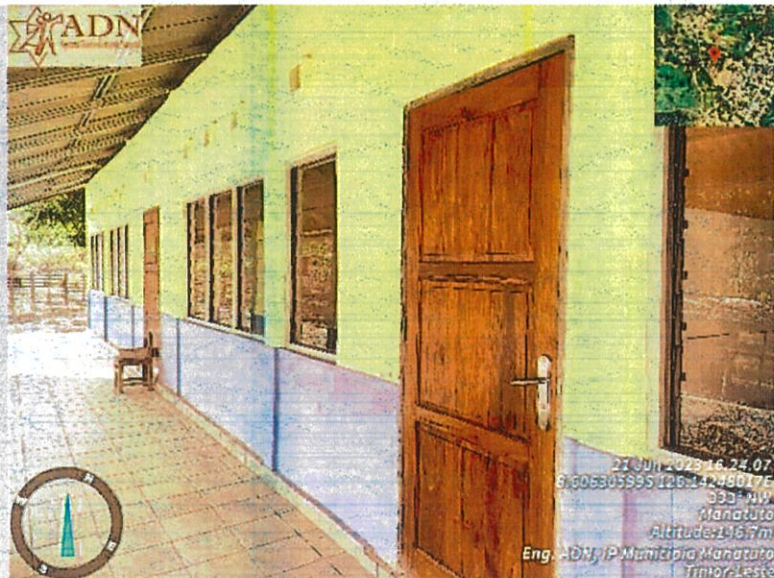

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (LAL-3) SUMMARY BOQ

Naran Projektu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui

Lokalidade : Suco Cairui, Posto Administrativo Laleia

Projektu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

NO	MAIN SUMMARY	Page No	AMOUNT	PROGRESS REPORT BY ADN IP					
				PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS JUNE		TOTAL TO DATE	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 3.075,00	\$ 1.725,00	1,99%	\$ -	0,00%	\$ 1.725,00	1,99%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47 (i)	\$ 58.021,79	\$ 49.557,07	57,04%	\$ 2.336,14	2,69%	\$ 51.893,21	59,73%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/20 (i)	\$ 7.901,93	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST		\$ 68.998,72	\$ 51.282,07	59,02%	\$ 2.336,14	2,69%	\$ 53.618,21	61,71%
B	CONTIGENCIA		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD		\$ 6.340,00	\$ 4.340,00	5,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.340,00	5,00%
D	GRAND TOTAL		\$ 86.883,29	\$ 55.622,07	64,02%	\$ 2.336,14	2,69%	\$ 57.958,21	66,71%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG Kay Rala
No. kontratu :

Data Inspesaun : 07 Junho 2023

Fatin Inspesaun : Kampung baru, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5349S,

Latetude : 126,0101E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu servisu iha fulan ida
ne'e:

Ba konstrusaun Escritorio ninian
finaliza ona servisu monta keramik
ba iha parte sala laran, no varanda
ninian. No agora dadaun grupo sei
kontinua hada keramik ba parte
koridor liur ninian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

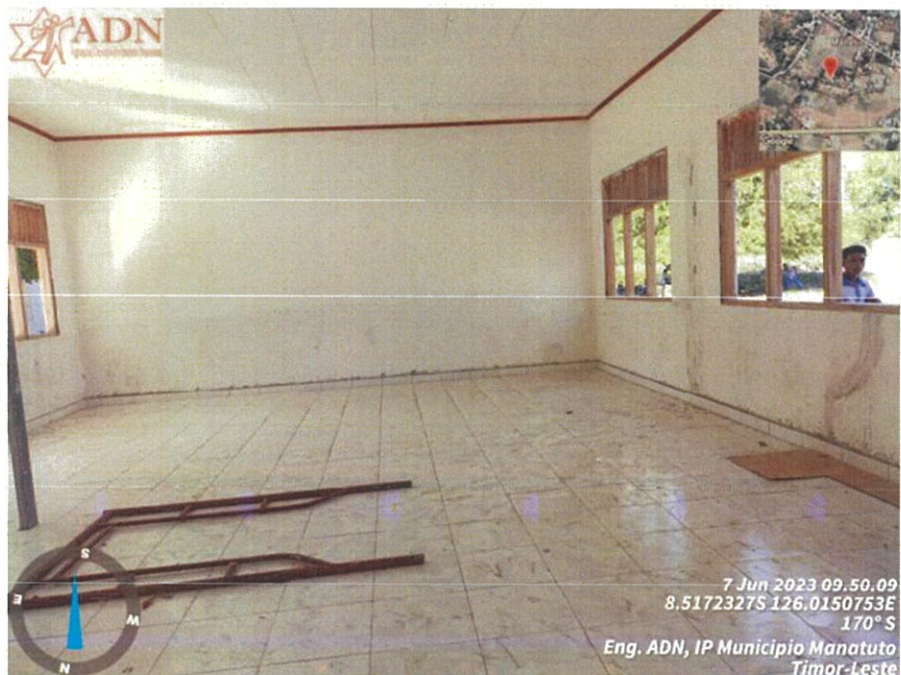



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-12)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG Kay Rala

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Sketch Item servisu.




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

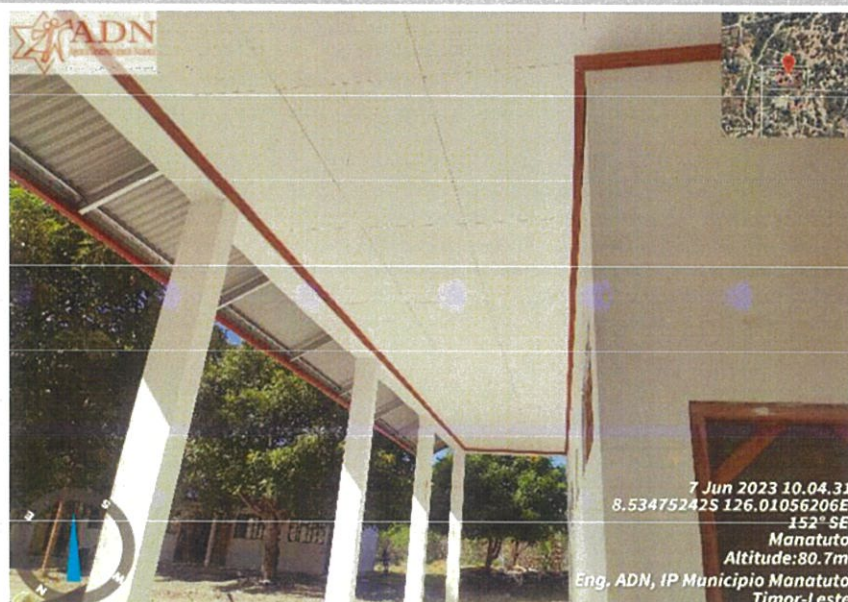

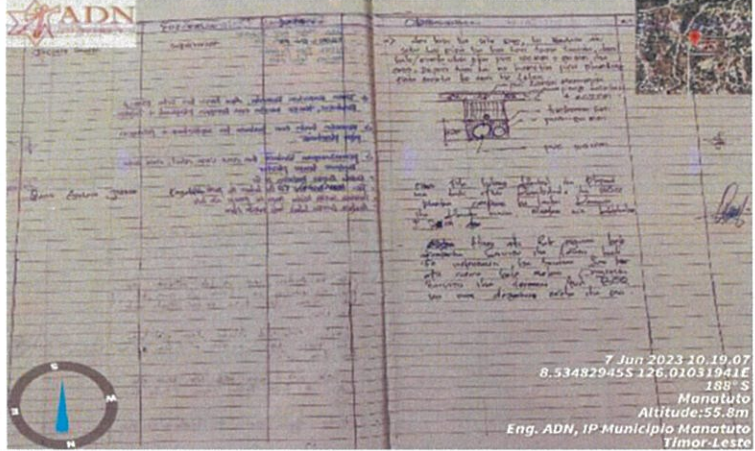 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VI GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público						#ANEXU D1 (MV-12) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
						Naran projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG Kay Rala		
						Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO ESG KAY RALA		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	07/06/2023	Manatuto Vila	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Check fila fali lubang kontrol iha plafond nian tenke tuir kuantidade iha BOQ.		
					2	Mantem campuran ba pasangan lantai keramik iha korridor ninian, mantem nia ketebalan Mais ou minus 7 cm		
					3	Husu atu site engineer bele akompanha servisu iha terrenu hodi fo instrusaun ba badaen sira atu nune'e bele aselera progressu servisu iha terrenu tuir BOQ no mos dezenhu ne'ebe iha ona.		
					4			



#ANEXU C2 (MV-12) SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala
Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

NO.	MAIN SUMMARY	Page No	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY ADN IP					
				Amount	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS JUNE		TOTAL TO DATE	
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3.075,00	\$ 2.125,00	3,37%	\$ 418,75	0,66%	\$ 2.543,75	4,04%
II	REFURBISHED TEACHER OFFICE BUILDING Rf	RF/51	(i)	\$ 50.581,84	\$ 29.476,11	46,79%	\$ 8.150,96	12,94%	\$ 37.627,08	59,73%
A	CONSTRUCTION COST			\$ 53.656,84	\$ 31.601,11	50,16%	\$ 8.569,71	13,60%	\$ 40.170,83	63,77%
B	CONTIGENCIA			\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD			\$ 6.340,00	\$ 2.820,00	4,48%	\$ 1.802,50	2,86%	\$ 4.622,50	7,34%
D	GRAND TOTAL			\$ 62.996,83	\$ 34.421,11	54,64%	\$ 10.372,21	16,46%	\$ 44.793,33	71,10%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Rembor
No. kontratu :

Data Inspesaun : 21 Junho 2023

Fatin Inspesaun : Rembor, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5103S,

Latetude : 126,0157E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu Fiziku iha fulan ida
ne'e: Iha fulan ida ne'e Ba
Classroom ninian , grupu
hahu ona ho pinta classroom
laran no mos monta keramik
ba iha haris fatin ninian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-14)


Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Rembor

No. kontratu :


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu.

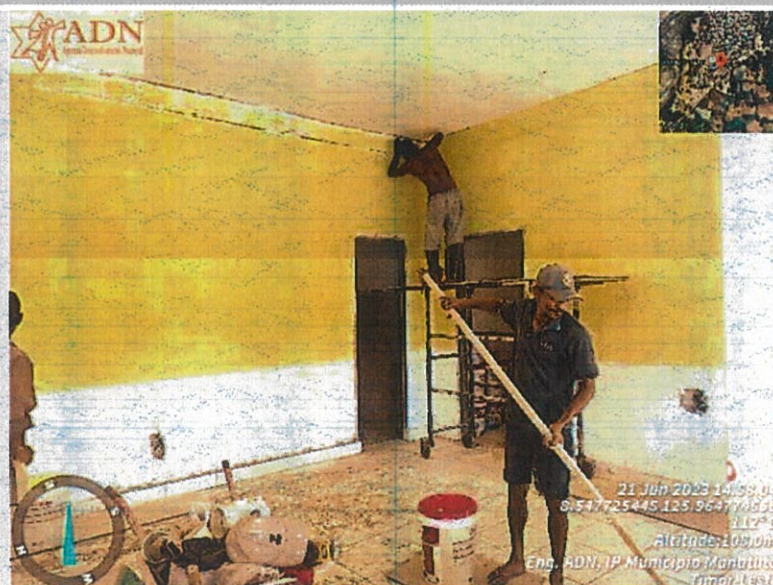

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

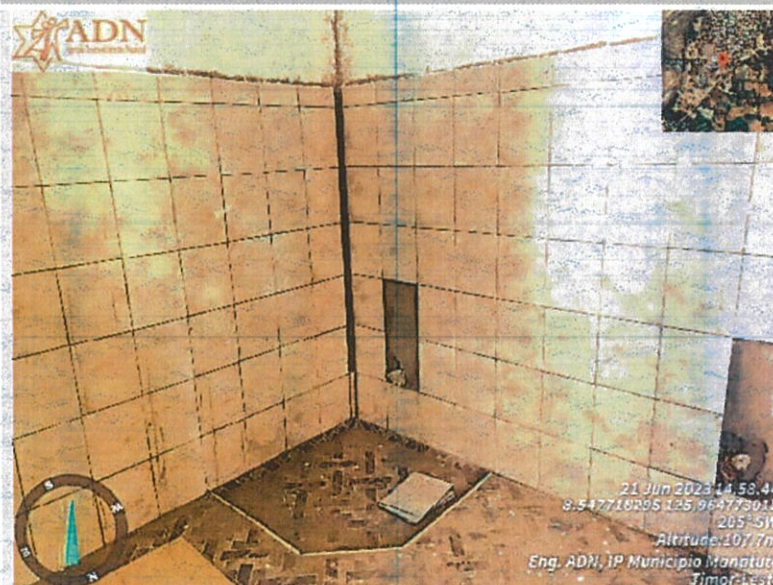



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-14) SUMMARY BOQ

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Rembor

Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto

Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

NO	MAIN SUMMARY	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY ADN IP					
		Page No	AMOUNT	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS JUNE		PROGRESS TO DATE	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3 (i)	\$ 3.075,00	\$ 1.975,00	2,22%	\$ -	0,00%	\$ 1.975,00	2,22%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47 (i)	\$ 57.778,14	\$ 46.318,79	52,09%	\$ 1.330,50	1,50%	\$ 47.649,29	53,59%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/23 (i)	\$ 9.959,28	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST		\$ 70.812,42	\$ 48.293,79	54,31%	\$ 1.330,50	1,50%	\$ 49.624,29	55,81%
B	CONTIGENCIA		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD		\$ 6.340,00	\$ 3.310,00	3,72%	\$ -	0,00%	\$ 3.310,00	3,72%
D	GRAND TOTAL		\$ 88.918,34	\$ 51.603,79	58,04%	\$ 1.330,50	1,50%	\$ 52.934,29	59,53%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-15)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato
No. kontratu :

Data Inspesaun : 14 Junho 2023

Fatin Inspesaun : Obrato, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5072S,

Latetude : 125,9953E

End Point : Long :

Latetude :


Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu fiziku iha fulan ida ne'e : ba
classroom building nian finalize ona
monta keramik ba classroom ninian no
hahu ona supply kadeira alunos sira nian
balun ba iha sala de aula nia laran.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

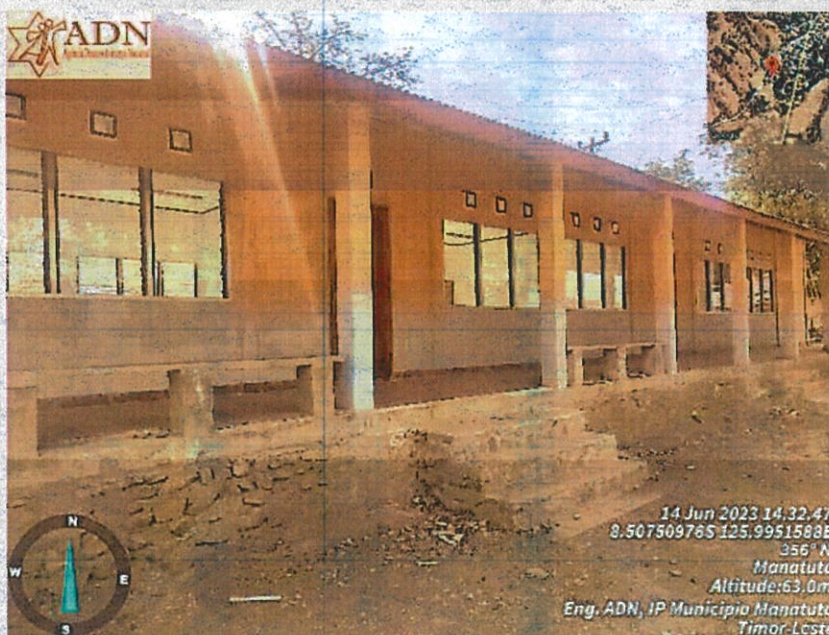

14 Jun 2023 14:32:47
8.50750976S 125.9951588E
356° N
Manatuto
Altitude: 63.0m
Eng. ADN, IP Municipio Manatuto
Timor-Leste



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-15)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato

No. kontratu

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-15) SUMMARY BOQ

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato
Lokalidade : Suco Sau, Posto Administrativo Manatuto
Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY		ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY ADN IP					
No	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous Progress		Progress June		Total To Date	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 3.075,00	\$ 1.975,00	2,99%	\$ -	0,00%	\$ 1.975,00	2,99%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	\$ 48.332,46	\$ 44.939,90	67,94%	\$ 341,38	0,52%	\$ 45.281,28	68,46%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/11 (i)	\$ 5.397,19	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST		\$ 56.804,65	\$ 46.914,90	70,93%	\$ 341,38	0,52%	\$ 47.256,28	71,44%
B	CONTIGENCY		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD		\$ 6.340,00	\$ 2.347,50	3,55%	\$ 755,00	1,14%	\$ 3.102,50	4,69%
D	GRAND TOTAL		\$ 66.144,65	\$ 49.262,40	74,48%	\$ 1.096,38	1,66%	\$ 50.358,78	76,13%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projeto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik
No. kontratu :

Data Inspesaun : 22 Junho 2023

Fatin Inspesaun : Iliheu, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.592203S,

Latetude : 125,9040E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu servisu iha fulan ida ne'e:
Ba classroom building ninian, grupo
komesa ona ho monta kuda-kuda no
centering antes atu chave hodi monta
gording

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-16)

Back-up Data

Naran Projeto

No. kontratu

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Progressu servisu iha fulan ida ne'e:

Ba Toilet building ninian, grupo
komesa ona halo bekesting ba balok
sopi sopi ninian.

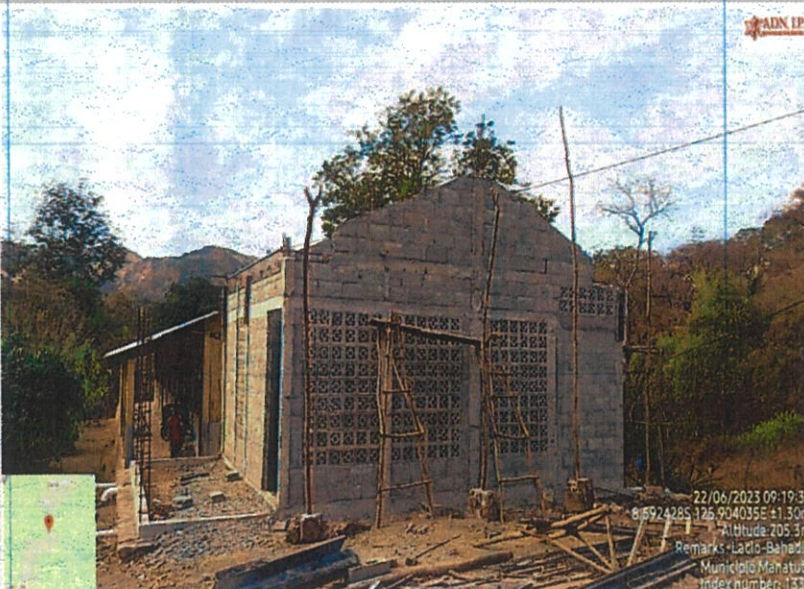



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-16)

SUMMARY BOQ

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik

Lokalidade : Suco Iliheu, Posto Administrativo Manatuto

Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY				PROGRESS REPORT BY ADN IP					
No	MAIN SUMMARY		Amount	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS JUNE		TOTAL TO DATE	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES		\$ 3.075,00	\$ 1.725,00	1,72%	\$ 250,00	0,25%	\$ 1.975,00	1,97%
H	CLASSROOM BUILDING C		\$ 48.765,49	\$ 10.251,74	10,25%	\$ 8.832,63	8,83%	\$ 19.084,37	19,08%
III	TOILET BULDING Tb		\$ 24.358,65	\$ 1.383,46	1,38%	\$ 7.930,31	7,93%	\$ 9.313,77	9,31%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS		\$ 14.508,17						
A	CONSTRUCTION COST		\$ 90.707,31	\$ 13.360,20	13,35%	\$ 17.012,93	17,00%	\$ 30.373,13	30,36%
B	CONTIGENCIA		\$ 3.000,00						
C	OVERHEAD		\$ 6.340,00	\$ 1.230,00	1,23%	\$ 1.217,50	1,22%	\$ 2.447,50	2,45%
D	GRAND TOTAL		\$ 100.047,31	\$ 14.590,20	14,58%	\$ 18.230,43	18,22%	\$ 32.820,63	32,81%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)

Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto
No. kontratu :

Data Inspesaun : 07 Junho 2023

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.5123S

Latetude : 126.0162E

End Point : Long :

Latetude :


Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progresso iha fulan ida ne'e : ba
Teacher Office ninian , sei nafatin
hanesan ho fulan kotuk tamba
kompanhia sei konsentra badae hodi
konstrui uluk classroom building
nininan.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

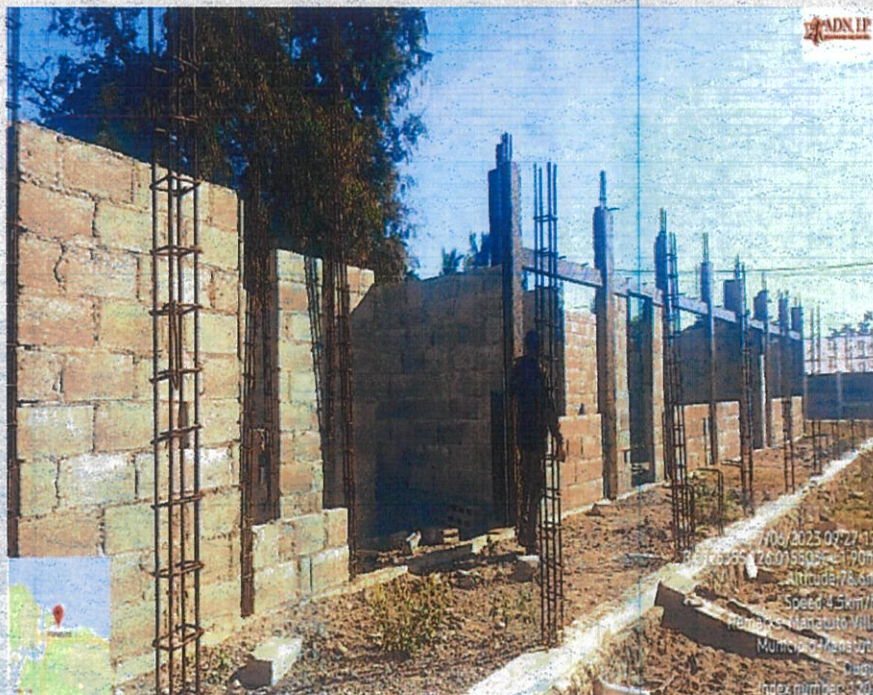



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-17)

Back-up Data

Naran Projeto

No. kontratu

: Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu.

Iha parte Classroom building ninian
komesa ona monta bekesting no cor
kolom parte sorin ninian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



7 Jun 2023 09:28:20
8.5127815S 126.01623596E
71° E
Altitude: 65.9m
Eng. ADN, I.P. Municipio Manatuto
Timor-Leste

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

Progresso iha fulan ida ne'e : Ba
konstrusaun Toilet building ninian
seidauk iha mudansa fiziku.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



7 Jun 2023 09:30:07
8.5128511S 126.01638775E
68° NE
Altitude: 68.5m
Eng. ADN, I.P. Municipio Manatuto
Timor-Leste



#ANEXU C2 (MV-17) SUMMARY

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BÁSICA CENTRAL VASCO DA GAMA
FATIN PROJEITO : AITEAS, MANATUTO
DONO DO PROJEITO : MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

NO	ITEM SERVIU	AMOUNT US\$	PROGRESS REPORT BY A D N IP					
			Previous Progress		Progress June		Total to Date	
			Amount (US\$)	%	Amount (US\$)	%	Amount (US\$)	%
i	PRELIMINARIES WORKS	\$ 6.300,00	\$ 2.137,50	1,17%	\$ -	0,00%	\$ 2.137,50	1,17%
ii	CLASSROOM BUILDING C	\$ 49.620,84	\$ 6.679,72	3,66%	\$ 694,94	0,38%	\$ 7.374,66	4,04%
iii	TEACHER OFFICE	\$ 67.466,67	\$ 9.090,75	4,98%	\$ -	0,00%	\$ 9.090,75	4,98%
iv	TOILET BUILDING Tb	\$ 17.325,64	\$ 910,39	0,50%	\$ -	0,00%	\$ 910,39	0,50%
v	SITWORKS	\$ 15.136,11	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 155.849,26	\$ 18.818,37	10,30%	\$ 694,94	0,38%	\$ 19.513,31	10,68%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 15.584,93	\$ 1.881,84	1,03%	\$ 69,49	0,04%	\$ 1.951,33	1,07%
C	OVERHEAD	\$ 3.100,00	\$ 775,00	0,42%	\$ -	0,00%	\$ 775,00	0,42%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 3.490,68	\$ 429,50	0,24%	\$ 15,29	0,01%	\$ 444,79	0,24%
E	CONTIGENCY	\$ 4.679,68	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
F	TOTAL COST (A + B + C + D + E)	\$ 182.701,57	\$ 21.904,71	11,99%	\$ 779,72	0,43%	\$ 22.684,43	12,42%

Prepara Husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)

Eng. ba Projecto Edificio Publico no Agua Saneamento
Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Engenheiro Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia)
Kordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun
de Kualidade ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-18)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0+000-3+000 KM,
Manatuto Municipality.

No. kontratu : RT/094/MOP-2021

Data Inspesaun : 21 / 06 /2023

Fatin Inspesaun : Rembor-Manatuto Villa

Koordinadas : Start Point : Long : 125.973927°, Latetude : -8.541559°


End Point : Long : 125.963384°, Latetude : -8.549488°

Naran Inspector : Eng. Domingos da C. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Servisu

Compania kontinua servisu item stone Masonry
no lined ditch, ho medida: 150 m

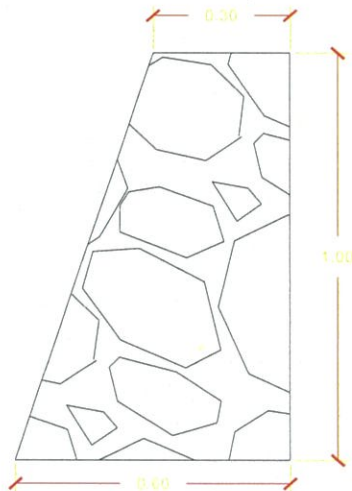

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-18)

Back-up Data


Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0+000-3+000 KM,
Manatuto Municipality.

No. kontratu : RT/094/MOP-2021

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item Servisu;

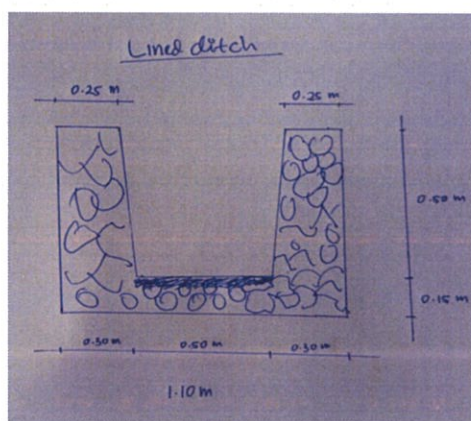

Lined ditch; 250 m





#ANEXU C2 (MV - 18)

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0 + 000 - 3 + 000 KM, Manatuto Municipality.
No. kontratu : RT/094/MOP-2021
Postu : Manatuto Villa
Sukos : Iliheu
Naran Kompania : Kartini Unip, Lda.

SUMMARY								
SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERECENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 5,800.00	\$ 1,150.00	0.29%	\$ -	0.00%	\$ 1,150.00	0.29%
R-05	Earth work	\$ 25,228.71	\$ 1,875.30	0.48%	\$ 872.50	0.22%	\$ 2,747.80	0.70%
R-07	Sub-base, Base and Pavement	\$ 19,677.48	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Bituminous pavement	\$ 92,905.20	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-10	Structures	\$ 179,017.78	\$ 28,416.63	7.21%	\$ 23,536.05	5.97%	\$ 51,952.67	13.18%
R-11	Dayworks	\$ 175.00	\$ 175.00	0.04%	\$ -	0.00%	\$ 175.00	0.04%
R-15	Routine maintenance	\$ 6,992.32	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 329,996.49	\$ 31,616.93	8.02%	\$ 24,408.55	6.19%	\$ 56,025.47	14.21%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 32,999.65	\$ 3,161.69	0.80%	\$ 2,440.85	0.62%	\$ 5,602.55	1.42%
C	Generals item	\$ 23,472.23	\$ 9,066.75	2.30%	\$ 1,492.00	0.38%	\$ 10,558.75	2.68%
D	Tax 2 % x (A+B+C)	\$ 7,729.37	\$ 876.91	0.22%	\$ 566.83	0.14%	\$ 1,443.74	0.37%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 394,197.73	\$ 44,722.28	11.35%	\$ 28,908.23	7.33%	\$ 73,630.51	18.68%

Inspeksaun Husi:

I. Domingos da C. X. Silva
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Matatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

Eng. Remigio da C. S. Dos Santos
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN.I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (MV-18)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0+000-3+000 Km, Manatuto municipality.

Kompanha : Kartini Unipessoal, Lda.

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	21/06/2023	Manatuto/ Manatuto Vila	Domingos D. X. Silva	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1		
					2		
					3		
					4		
					1		
					2		
					3		
					4		



Project Name : PREPARATION OF DED FOR REHABILITATION OF MUNICIPIO ROADS PACKAGE 10: SOIBADA TO SOIBADA TOWN

Consultant : Hilobadi JV PT.Citra Ngada Plan

Invoice Number : Final Report no. 04

Invoice Summary

No	DESCRIPTION	CONSULTAN/OWNER INVOICE				ADN RECOMMENDATION				Progress (%)
		Contract Amount Original	Previous Invoice Amount	This Invoice Amount	Total-to-Date Amount	Previous Billing Amount	This Billing Amount	Progress (%)	Total-to-Date Amount	
1	1st payment : Inception Report The first payment equivalent to (10%) of the contract price will be paid to the consultant for Inception Report after the inception Report was discussed and approved by the Owner (within 15 days)	\$ 16,415.40	\$ 16,415.40	\$ -	\$ 16,415.40	\$ 16,415.40	\$ -	0.00%	\$ 16,415.40	10%
2	2nd payment : Interim Report The Second payment equivalent to (30%) of the contract price will be paid to the consultant after the Interim Report was discussed and approved by the Owner (within 30 days)	\$ 49,246.20	\$ 49,246.20	\$ -	\$ 49,246.20	\$ 49,246.20	\$ -	0.00%	\$ 49,246.20	30%
3	3rd payment : Draft Final Report The third payment to (30%) of the contract price will be paid to the consultant after the Draft Final Report was discussed and approved by the Owner (within 45 days)	\$ 49,246.20	\$ 49,246.20	\$ -	\$ 49,246.20	\$ 49,246.20	\$ -	0.00%	\$ 49,246.20	30%
4	4th payment : Final Detailed Engineering Design (DED) the final payment equivalent to (30%) of the contract price will be paid to the consultant after Final Detailed Engineering Design (DED) was reviewed, approved and Submitted to the Owner (within 15 days)	\$ 49,246.20	\$ -	\$ 49,246.20	\$ 49,246.20	\$ -	\$ 49,246.20	30.00%	\$ 49,246.20	30%
TOTAL CONTRACT PRICE		\$ 164,154.00	\$ 114,907.80	\$ 49,246.20	\$ 164,154.00	\$ 114,907.80	\$ 49,246.20	30.00%	\$ 164,154.00	100.00%

Checked by

1. Engra. Teresa Gomes

Engenheiro Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun

Verified by

Eng. Remigio C.S. Dos Santos

Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun

Certified by

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas

Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO -3)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada
Chainage 0+000-2+000

No. kontratu : MPW-W-210059

Data Inspeção : 15/06/2023

Fatin Inspeção : Soibada, Buah Rahun

Koordinadas :

Start Point : Long : 8,83990S Latetude: 125,9171E

End Point : Long : 8,82990S Latetude: 125,9223E

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos da C. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Compania continua servisu item stone masonry-lined ditch ho total naruk 30 m



Drain Type - I

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (SO - 3)

Road Name : Manlala(Manufahi Kiik) - Soibada Chainage start 0 + 000
Municipality : Manatuto Chainage end 2+000
Postu : Soibada Length 2.0 Km
Sukos : Manufahi Kiik

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 2,990.00	\$ 2,970.00	1.46%	\$ -	0.00%	\$ 2,970.00	1.46%
R-03	Earth work	\$ 11,037.21	\$ 12,532.73	6.17%	\$ -	0.00%	\$ 12,532.73	6.17%
R-05	Sub-base, Base and Pavament	\$ 13,353.74	\$ 12,473.94	6.14%	\$ -	0.00%	\$ 12,473.94	6.14%
R-08	Structures	\$ 121,257.00	\$ 52,259.36	25.74%	\$ 9,725.59	4.79%	\$ 61,984.95	30.53%
R-10	Dayworks	\$ 1,750.00	\$ 175.00	0.09%	\$ -	0.00%	\$ 175.00	0.09%
R-11	Routine maintenance	\$ 4,205.00	\$ 4,205.00	2.07%	\$ -	0.00%	\$ 4,205.00	2.07%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ 200.00	0.10%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.10%
A	Construction Cost	\$ 154,792.95	\$ 84,816.03	41.77%	\$ 9,725.59	4.8%	\$ 94,541.62	46.6%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 15,479.29	\$ 8,481.60	4.18%	\$ 972.56	0.48%	\$ 9,454.16	4.66%
C	General Item	\$ 28,783.23	\$ 21,646.00	10.66%	\$ 875.00	0.43%	\$ 22,521.00	11.09%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 3,981.11	\$ 2,298.87	1.13%	\$ 231.46	0.11%	\$ 2,530.34	1.25%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 203,036.57	\$ 117,242.50	57.75%	\$ 11,804.61	5.81%	\$ 129,047.12	63.56%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Domingos D.X. Silva)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C.S. dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (SO - 3)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

**Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) -
Soibada Chainage 0+000-2+000**

Kompanha : Manufahi Kiik Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/06/2023	Manatuto/ Soibada	Domingos D.X Silva	Eng. Ba Projetu ITI Munispiu Manatuto, AND.I.P	1	Tekniko Compania la iha terene, nune'e equipa la priense Livro Bainaka	
						Edifisiu/Office Compania taka nune'e equipa la hasoru Compania nain	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada,
Manatuto

No. kontratu :

Data Inspesaun : 15 Junho 2023

Fatin Inspesaun : Manlala, Soibada

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.8602S,

Latetude : 125,9393E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu iha fulan ida ne'e:

Ba mudansa fiziku iha terrenu ba
konstrusaun ida ne sei nafatin hanesan
ho fulan kotuk tamba kompanhia sei ba
halao compras material iha Dili ba
material finishing ninian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

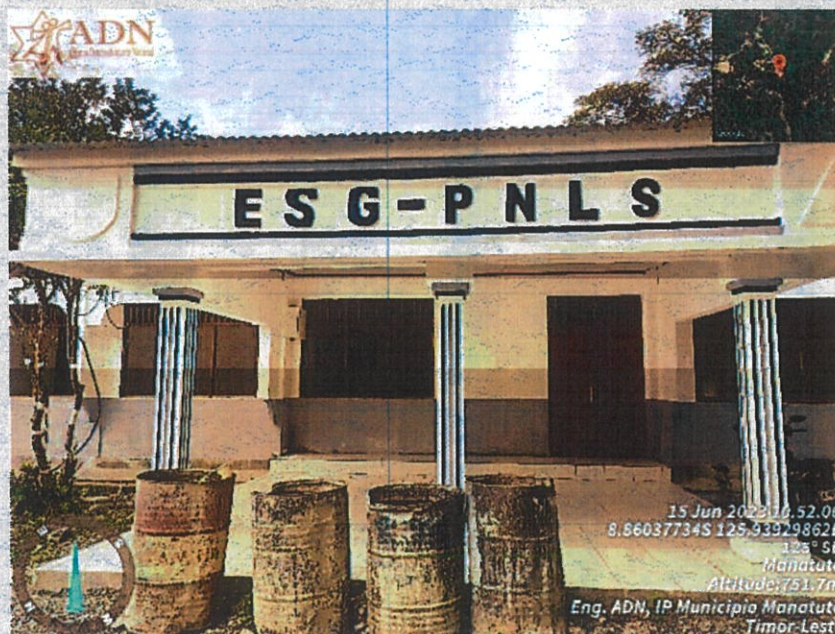



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-5)

Back-up Data

Naran Projeto


: Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada,
Manatuto

No. kontratu

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

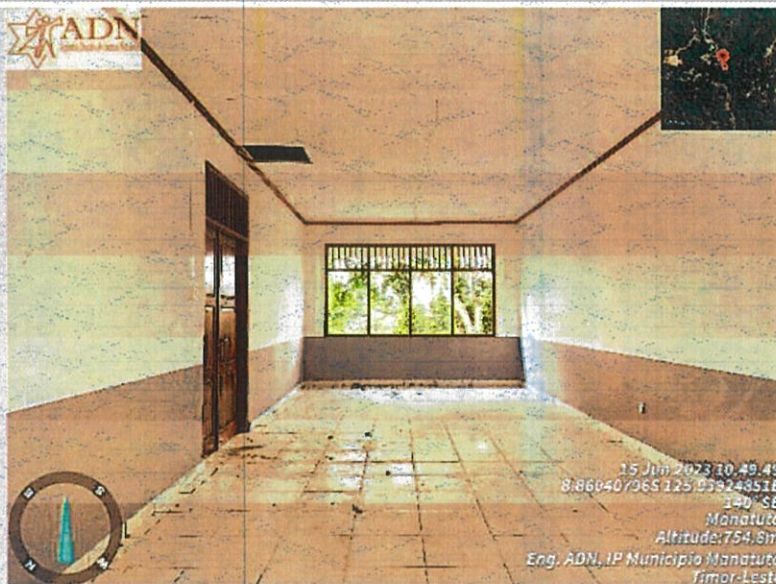

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Weaihudik
No. kontratu :

Data Inspesaun : 15 Junho 2023

Fatin Inspesaun : Weaihudik

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.8515S,

Latetude : 125,9308E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Progresso fiziku iha fulan ida
ne'e: Iha parte classroom ninian
agora dadaun grupo komesa ona
monta keramik ituan iha sala de
aula laran.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



15 Jun 2023 11:09:08
8,85162356S 125.93088765E
244° SW
Altitude: 852.7m
Eng: ADN, IP Município Manatuto
Timor-Leste



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-6)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Weaihudik

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Progresso fiziku iha fulan ida
ne'e: Ba parte konstrusaun
Toilet building ninian hahu ona
ho monta no centering kuda-
kuda.

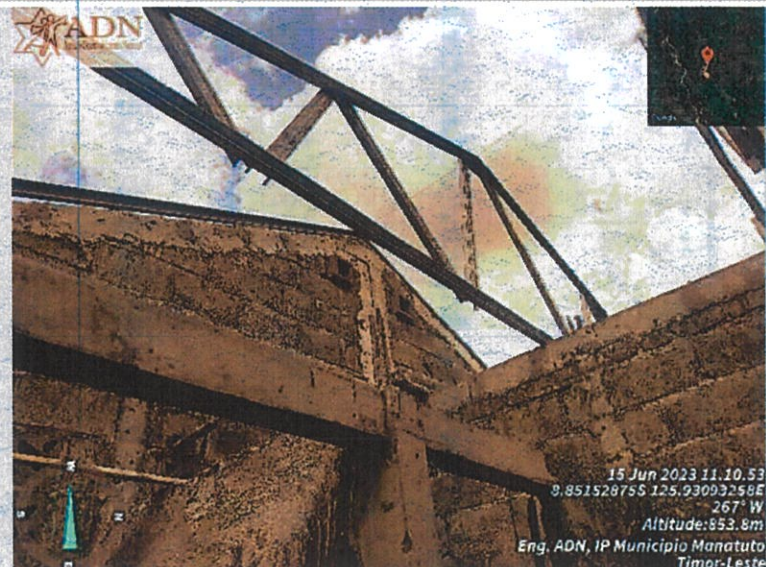



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (SO-6) SUMMARY BOQ

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik
Lokalidade : Manufahi Ki'ik, Posto Administrativo Soibada
Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY				ORIGINAL CONTRACT	PROGRESS REPORT BY ADN IP					
No	MAIN SUMMARY	Page No		Amount	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS JUNE		TOTAL TO DATE	
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3.075,00	\$ 2.275,00	2,22%	\$ -	0,00%	\$ 2.275,00	2,22%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	\$ 51.164,59	\$ 36.264,46	35,38%	\$ 188,60	0,18%	\$ 36.453,06	35,56%
III	TOILET BULDING Tb	TB/39	(i)	\$ 25.091,96	\$ 9.791,04	9,55%	\$ 255,14	0,25%	\$ 10.046,18	9,80%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/24	(i)	\$ 13.840,76						
A	CONSTRUCTION COST			\$ 93.172,31	\$ 48.330,51	47,15%	\$ 443,74	0,43%	\$ 48.774,24	47,58%
B	CONTIGENCIA			\$ 3.000,00						
C	OVERHEAD			\$ 6.340,00	\$ 3.355,00	3,27%	\$ -	0,00%	\$ 3.355,00	3,27%
D	GRAND TOTAL			\$ 102.512,31	\$ 51.685,51	50,42%	\$ 443,74	0,43%	\$ 52.129,24	50,85%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon
Chainage 3+000-6+200

No. kontratu : MPW-W-210062

Data Inspesaun : 06/06/ 2023

Fatin Inspesaun : Barique

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.996644°, Latetude : 126.084961°

End Point : Long : -8.977311°, Latetude : 126.102659°

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu ;

Compania hahu monta beckisting ba item stone
masonry nebe sei falta.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (BA - 7)

Naran Projeto : RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT AGRICULTURE CENTRE - AUBEON CHAINAGE (STA 3 + 000 - 6 + 200)
No. kontratu : MPW - W - 210062
Postu : Natarbora
Suku : Aubeon
Naran Kompanhia : We' Coi Unip, Lda.

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 2,340.00	\$ 2,340.00	0.68%	\$ -	0.00%	\$ 2,340.00	0.68%
R-03	Earth work	\$ 10,796.77	\$ 10,796.77	3.15%	\$ -	0.00%	\$ 10,796.77	3.15%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 57,631.73	\$ 57,631.73	16.80%	\$ -	0.00%	\$ 57,631.73	16.80%
R - 07	Bituminous pavement	\$ 175,067.20	\$ 175,067.20	51.02%	\$ -	0.00%	\$ 175,067.20	51.02%
R-08	Structures	\$ 35,867.39	\$ 36,637.28	10.68%	\$ 2,609.69	0.76%	\$ 39,246.97	11.44%
R-10	Dayworks	\$ 175.00	\$ 525.00	0.15%	\$ -	0.00%	\$ 525.00	0.15%
R-11	Routine Maintenance	\$ 6,341.00	\$ 6,341.00	1.85%	\$ -	0.00%	\$ 6,341.00	1.85%
R-15	Provisional Sum	\$ 100.00	\$ 100.00	0.03%	\$ -	0.00%	\$ 100.00	0.03%
A	Construction Cost	\$ 288,319.09	\$ 289,438.97	84.36%	\$ 2,609.69	0.8%	\$ 292,048.66	85.1%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 28,831.91	\$ 28,943.90	8.44%	\$ 260.97	0.08%	\$ 29,204.87	8.51%
C	General Item	\$ 19,232.79	\$ 14,755.50	4.30%	\$ -	0.00%	\$ 14,755.50	4.30%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 6,727.68	\$ 6,662.77	1.94%	\$ 57.41	0.02%	\$ 6,720.18	1.96%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 343,111.47	\$ 339,801.14	99.04%	\$ 2,928.07	0.85%	\$ 342,729.21	99.89%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Domingos D. X.Silva)

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irigação
Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Certifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Kompanha : We'coi Unipessoal Lda

10/6/2023

- Agak ada servis Stone Mampang
rebu di jalan (drainage)
- Ura paku-paku hasil rekam
di lapangan
- Material campuran 3:1
- Engineer komp. tanah dan
terbaca rekam-rekam dan servis
- Medida tanah Ura dan
pembangunan
- Ura perlengkapan pekerjaan
(Kawat, Lembar, Kamping, Gasing)
- Koordinasi ke proyek lain
dan rekam-rekam dan pembangunan

ADN. ID

Ery. Dominguez de la X. Silva

Ery. Olivero Jovior

Ery. Olivero Jovior

6/06/2023 11:27:51
8.9810235 126.094315E ±13.10m
Altitude: 17.5m
Speed: 0.0km/h
Remarks: Natarbora
Municipio Manatuto
Duqu...

1193



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



KADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (BA-8)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center
Chainage 0+000 - 3+000

No. kontratu : MPW-W-210061

Data Inspesaun : 06/ 06/ 2023

Fatin Inspesaun : Natarbora - Uma Boco- Aubeon

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.996666°, Latetude : 126.084966°

End Point : Long : -9.004681°, Latetude : 126.061377°

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketsa item servisu;
Compania kontinua halo servisu atiru rai
ou embankment. Nunee mos kontinua
item subbase course.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (BA -8)

Naran Projeto : RD4 RURAL ROAD ROUTINE MAINTENANCE
No. kontratu : MPW-W-210055
Postu : Natarbora
Suku : Aubeon
Naran Kompanhia : Linoel Unip, Lda

SUMMARY								
SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
		(US\$)	PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 2,440.90	\$ 950.00	0.32%	\$ -	0.00%	\$ 950.00	0.32%
R-05	Earth work	\$ 23,170.60	\$ 20,324.16	6.86%	\$ 2,100.00	0.71%	\$ 22,424.16	7.57%
R-07	Sub-base, Base and Pavement	\$ 56,064.54	\$ 1,260.60	0.43%	\$ 6,303.00	2.13%	\$ 7,563.60	2.55%
R-08	Bituminous pavement	\$ 134,733.55	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-10	Structures	\$ 16,458.42	\$ 13,009.33	4.39%	\$ -	0.00%	\$ 13,009.33	4.39%
R-11	Dayworks	\$ 182.00	\$ 182.00	0.06%	\$ -	0.00%	\$ 182.00	0.06%
R-15	Routine maintenance	\$ 5,357.00	\$ 4,057.00	1.37%	\$ -	0.00%	\$ 4,057.00	1.37%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ 200.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.07%
A	Construction Cost	\$ 238,607.02	\$ 39,983.08	13.50%	\$ 8,403.00	2.84%	\$ 48,386.08	16.33%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 23,860.70	\$ 3,998.31	1.35%	\$ 840.30	0.28%	\$ 4,838.61	1.63%
C	Generals item	\$ 27,936.02	\$ 15,359.50	5.19%	\$ 995.00	0.34%	\$ 16,354.50	5.52%
D	Tax 2 % x (A+B+C)	\$ 5,808.07	\$ 1,186.82	0.40%	\$ 204.77	0.07%	\$ 1,391.58	0.47%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 296,211.81	\$ 60,527.71	20.73%	\$ 10,443.07	3.53%	\$ 70,970.78	24.26%

Inspeksaun Husi:

2. Domingos D.X. Silva
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P.

Verifika Husi :

Eng. Remigio da c.s dos Santos
Eng. Senior ba Projecto Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P.

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN.I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (BA-8)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000

Kompanha : Linoel Unipessoal Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura															
I	6/06/2023	Manatuto/ Barique	1. Domingos D.X. Silva	Eng. Ba Projeitu ITI Munisipiu Manatuto, ADN.I.P	1	INSPECTION SHEET <table><thead><tr><th>NO.</th><th>DATE</th><th>NAME</th><th>INSTRUCTION</th><th>SIGN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>06/06/2023</td><td>Domingos da C.X. Silva</td><td>- Uza equipamentos profetaun wainhira servisu (Botas, kapate, Luvas, Pomping)</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>—</td><td>Quico A. Junior</td><td>- Hasai fatuk ho mudida ko'ot (Uza kiti spesifikasun nebe iha. - Uza cilindro hodi halo kompaktasun - Halo kompaktasun tenke bobro haki area estada, Labela iha parte Hagan deit. - Acelera servisu hodi kontinua ba raba soluk - Hato ko'ordenasun ho domo do projeto karik iha mudansas ou falanço servisu numa kana ba BOQ no spesifikasun. - Enginero kompania tenke mantin feroc wainhira iha servisu ruma</td><td></td></tr></tbody></table> Aubon Manatuto Mangrove Lagoon 6/06/2023 12:03:51 9.005838S 126.076267E ±125.70m Altitude:309.8m Speed:1.3km/h Remarks: Natarbora Município Manatuto Duqui Index number: 1194	NO.	DATE	NAME	INSTRUCTION	SIGN	1.	06/06/2023	Domingos da C.X. Silva	- Uza equipamentos profetaun wainhira servisu (Botas, kapate, Luvas, Pomping)		2.	—	Quico A. Junior	- Hasai fatuk ho mudida ko'ot (Uza kiti spesifikasun nebe iha. - Uza cilindro hodi halo kompaktasun - Halo kompaktasun tenke bobro haki area estada, Labela iha parte Hagan deit. - Acelera servisu hodi kontinua ba raba soluk - Hato ko'ordenasun ho domo do projeto karik iha mudansas ou falanço servisu numa kana ba BOQ no spesifikasun. - Enginero kompania tenke mantin feroc wainhira iha servisu ruma		
NO.	DATE	NAME	INSTRUCTION	SIGN																		
1.	06/06/2023	Domingos da C.X. Silva	- Uza equipamentos profetaun wainhira servisu (Botas, kapate, Luvas, Pomping)																			
2.	—	Quico A. Junior	- Hasai fatuk ho mudida ko'ot (Uza kiti spesifikasun nebe iha. - Uza cilindro hodi halo kompaktasun - Halo kompaktasun tenke bobro haki area estada, Labela iha parte Hagan deit. - Acelera servisu hodi kontinua ba raba soluk - Hato ko'ordenasun ho domo do projeto karik iha mudansas ou falanço servisu numa kana ba BOQ no spesifikasun. - Enginero kompania tenke mantin feroc wainhira iha servisu ruma																			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



KADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


#ANEXU C1 (BA - 9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage
0+000-9+000
No. kontratu : MPW-W-210058
Data Inspesaun : 06/06/2023
Fatin Inspesaun : Barique, Kaen laran
Koordinadas : Start Point : Long : -8.839898°, Latetude : 126.004266°
End Point : Long : -8.853010°, Latetude : 126.061603°
Naran Inspector : 1. Domingos da C. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Compania hahu ona item plan concrete.

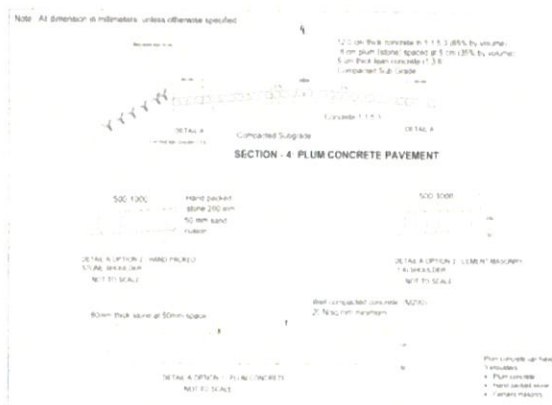

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (BA - 9)

Naran Projeto : R4D RUAL ROAD SPOT IMROVEMENT, KEAN LARAN - BARIQUE CHAINAGE 0+000 - 9 + 000
No. kontratu : MPW - W - 210058
Postu : Barique
Suku : Barique
Naran Kompanhia : Gimso ,Unip. Lda

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERECENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 2,980.11	\$ 2,980.11	0.99%	\$ -	0.00%	\$ 2,980.11	0.99%
R-03	Earth work	\$ 11,414.65	\$ 11,414.65	3.79%	\$ -	0.00%	\$ 11,414.65	3.79%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 32,040.00	\$ 32,040.00	10.65%	\$ -	0.00%	\$ 32,040.00	10.65%
R-08	Structures	\$ 181,126.91	\$ 195,539.01	65.01%	\$ 885.00	0.29%	\$ 196,424.01	65.30%
R-10	Dayworks	\$ 175.00	\$ 112.00	0.04%	\$ -	0.00%	\$ 112.00	0.04%
R-11	Routine Maintenance	\$ 14,384.50	\$ 10,580.50	3.52%	\$ -	0.00%	\$ 10,580.50	3.52%
R-15	Provisional Sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 242,321.16	\$ 252,666.26	84.00%	\$ 885.00	0.29%	\$ 253,551.26	84.29%
B	Profit (10% x A)	\$ 24,232.12	\$ 25,266.63	8.40%	\$ 88.50	0.03%	\$ 25,355.13	8.43%
C	General Item	\$ 28,341.30	\$ 12,600.00	4.19%	\$ 690.00	0.23%	\$ 13,290.00	4.42%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 5,897.89	\$ 5,810.66	1.93%	\$ 33.27	0.01%	\$ 5,843.93	1.94%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 300,792.46	\$ 873.55	98.52%	\$ 1,696.77	0.56%	\$ 298,040.32	99.09%

Verifika Husi :

Sertifika husi :

Inspeksaun Husi:


1. (Eng.Domingos DX. Silva)

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

(Eng. Remigio da c.s dos Santos)

Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P

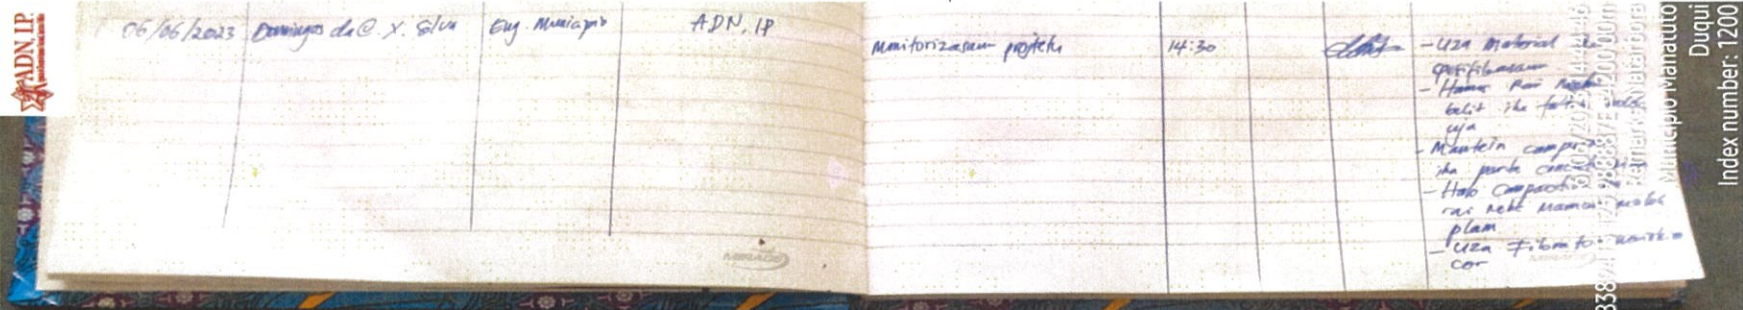 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público						#ANEXU D (BA-9)						
						INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN						
						Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000						
						Kompanha : Gimso Brothers Unip. Lda						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No							Asinatura
I	6/06/2023	Manatuto/ Barique	Domingos D.X. Silva	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto		 						Municipiu Manatuto Duqui Index number: 1200



MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIA GOVERNOS DA DCA



ADN, I.P.
Agência de
Normas e Qualidade
Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.		Quico Adelino Junior							2023																																	
Município	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																									
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto			Action	Junhu																														OBS		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
MANATUTO VILA (MV)	3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															On Going				
							Actual																																			
	6	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																															On Going				
							Actual																																			
	7	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																															On Going				
							Actual																																			
	8	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	Baboe Unip Lda	019/Janeiro/2020	LM	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																																On Going			
							Actual																																			
	9	Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Munisipiu Manatuto	Talamori Unip,Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	Fundo Covid-19	MINISTERIO SAUDE	Plan																																On Going			
							Actual																																			
	11	New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227	Fundo Covid-19	MINESTERIO SAUDE	Plan																																On Going			
							Actual																																			
	12	Supplay and Installation Main Power For Isolation an Laboratorium Building Maabat Manatuto	MINISTERIO SAUDE	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-229	Fundo Covid-19	MINESTERIO SAUDE	Plan																																On Going			
							Actual																																			
	13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																On Going			
							Actual																																			
	14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MEJD PKRIE EBF RENTAU	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																On Going			
							Actual																																			
	15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MEJD PKRIE PE REMBOR	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															On Going				
							Actual																																			
	16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MEJD PKRIE EBF OBRATO	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															On Going				
							Actual																																			

X

Naran Eng. Quico Adelino Junior								2023																														
Município	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Junhu																														OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	17	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													On Going		
							Actual																															
	18	Konstrusaun EBC Vasco da Gama - Manatuto	Parapa Bemizu Stae Unipessoal Lda	-	LM-CD	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													On Going		
							Actual																															
LALÉA (LAL)	1	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/VII/DILI/2019/ED IFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																												On Going			
							Actual																															
	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MEJD PKRIE EP CAIRUI	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																												On Going			
							Actual																															
LACLUBAR (LAC)	7	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	Hatuwari Unip. Lda	02/PDD-II/MNTT/VII/2015	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																												On Going			
							Actual																															
	8	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MEJD PKRIE EBF BATARA		LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																												On Going			
							Actual																															
	9	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM		LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																												On Going			
							Actual																															
	10	Konstrusaun Posto Saude Iha Iha Suku Funar - Laklubar	Mercy Unipessoal Lda.		PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																												On Going			
							Actual																															





PLANU INSPESAUN

Naran Eng.		Domingos da C. X. Silva						2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Município		Manatuto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Junho																																OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MANATUTO VILA (MV)	1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	█																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

X

[illegible]

Note:

Plano Període inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng. Domingos da C. X. Silva)
Eng. do Projeto Infraestrutura Transporte e Irrigação Municipium Manatuto, ADNIP

Sertifika Busi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN.I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo, ADN.I.F.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA -1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacro to
Mantane - Manatuto Municipality 0000421)

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421

Data Inspesaun : 14 - 06 - 2023

Fatin Inspesaun : Lacro - Mantane

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.55175757S, Latetude : 125.92822726E


End Point : Long : 8.55541886, Latetude : 125.90941978E

Naran Inspector : Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

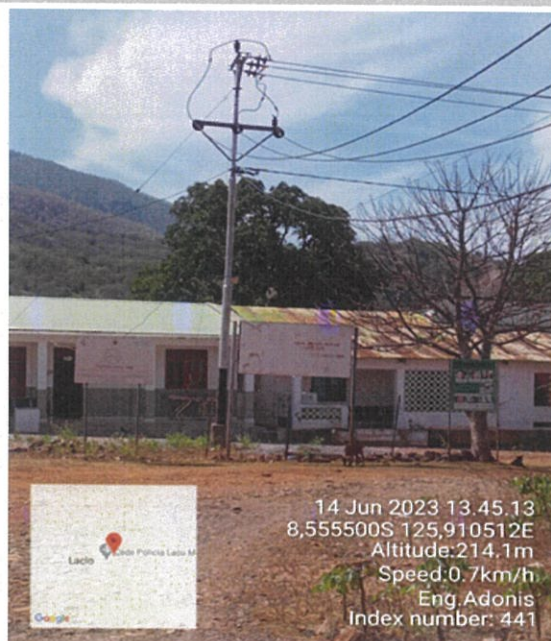



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA -1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacro to
Mantane - Manatuto Municipality 0000421)

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Sketch Item servisu



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

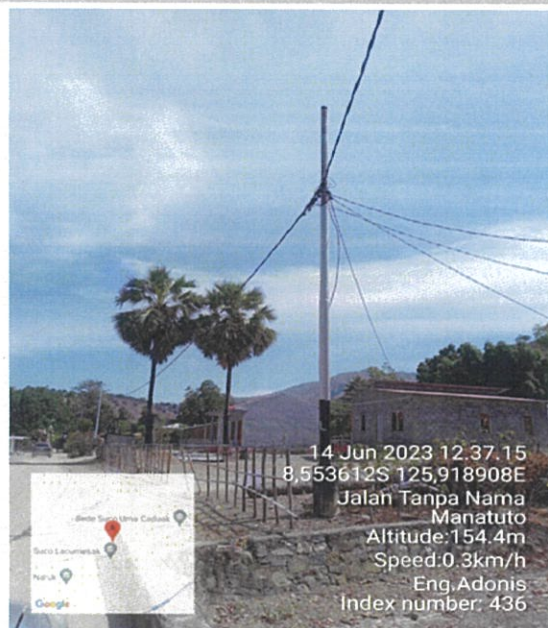



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA -1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacro to Mantane - Manatuto Municipality 0000421)

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu


Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

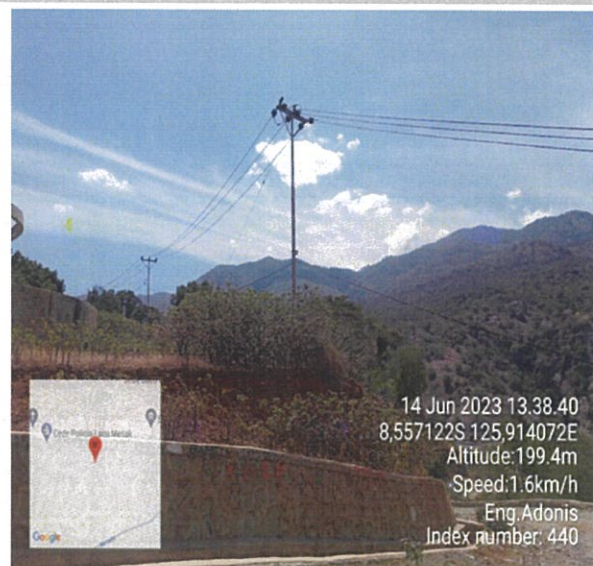



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-15)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato
No. kontratu :

Data Inspesaun : 14 Junho 2023

Fatin Inspesaun : Obrato, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5072S,

Latetude : 125,9953E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servisu instala fiu no Pipa eletricidade





#ANEXU C1 (MV-15)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato
:

Sketch & Foto Desenho

Servisu instala lampu Varanda eskola nian

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Servisu instala Lampu Sala Laran

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VILA GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng.	Adonis Julio Fernandes						2023																															
Municipio	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																					
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JUNHU																														OBS
MANATUTO VILA (MV)	1	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MEJD PKRIE EBF BATARA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	2	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															Lahalo Monitoring tamba okupadu ho servisu seluk
	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															Lahalo Monitoring tamba okupadu ho servisu seluk
	4	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															Lahalo Monitoring tamba okupadu ho servisu seluk
	5	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MEJD PKRIE EBF RENTAU	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															Lahalo Monitoring tamba okupadu ho servisu seluk
	6	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															Lahalo Monitoring tamba okupadu ho servisu seluk
	7	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MEJD PKRIE EBF OBRATO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	8	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obral Unipesoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															Lahalo Monitoring tamba okupadu ho servisu seluk
	9	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	Baboe Unip Lda	019/Janeiro/2020	LM-BS	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																															
							Actual																															Lahalo Monitoring tamba okupadu ho servisu seluk
	10	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																															
							Actual																															Projeitu Abandona
	11	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																															
							Actual																															Projeitu Abandona
	12	Costrusaun Fatin Izolamento Iha Municipio Manatuto	Talamori Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	LM	SAUDE	Plan																															
							Actual																															Servisu Eletricidade laiha
13	Supplay and installation Main Power for Isolation and Laboratorium Building Maabat Manatuto	Fraternity Unip.Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-229	LM	MINISTERIO DA SAUDE	Plan																																
						Actual																															Projeitu Refre FHO ona	
14	Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto	Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda	-	LM-CD	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
						Actual																															Lahalo Monitoring tamba okupadu ho servisu seluk	
1	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MEJD PKRIE EP CAIRUI	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
						Actual																															Lahalo Monitoring tamba okupadu ho servisu seluk	
2	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/VII/DILI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																
						Actual																															Projeitu Kontratu seidaok iha	
1	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	Tasibala III Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																															Lahalo Monitoring tamba okupadu ho servisu seluk	
2	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	MERCY. Unipessoal Lda	04/PDIM	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
						Actual																																

-A

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JUNHU																														OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
LACLUB				I/MNTT/IX/2019			Actual																													Lahalo Monitoring tamba okupadu ho servisu seluk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	Hatuwari Unip. Lda	02/PDD-II/MNTT/II/2015	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													Lahalo Monitoring tamba okupadu ho servisu seluk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							Actual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Note:



Plano Periode inspesaun iha tereinu



Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu



Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili



Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

 (Adonis Julio Fernandes)
 Eng. Electricidade, ADN, I.P

Sertifika Husi :

 (Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :

 (Eng. Januario Maia Guterres)
 Adjunto Director Executivo, ADN, I.P
