



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU VIQUEQUE

NOVEMBRO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTASAUN PROJETU INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO VIQUEQUE

NOVEMBRO 2022

Prepara Husi :




(Eng. Roberto M. Martins)

Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, Municipio Viqueque ADN, I.P




(Eng. Salvador Martins)

Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, Municipio Viqueque ADN, I.P



(Eng. Bebiano C. de Jesus Lopes)

Eng. ba Projetu Edificio Publiku no Beé
Saneamentu, Municipio Viqueque ADN, I.P



(Eng. Camilo Maia)

Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, Municipio Viqueque ADN, I.P



(Eng. Adonis Julio Fernandes)

Eng. ba Projetu Mekanikal Elektrikal,
Municipio Viqueque ADN, I.P

Verifika Husi :



(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)

Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu, ADN, I.P



(Eng. Remigio da C.S dos Santos)

Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura
Transportes e Irigasaun, ADN, I.P



(Deolindo de F Marques)

Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, ST. M.Eng)

Director Ezeutivo , ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	0
INDICE.....	1
I. INTRODUSAUN	2
1.1 Enkuadramentu Legal	2
1.2 Perfil Municipio Viqueque.....	2
1.3 Lista Projecto	5
II. PROGRESU FISIKU.....	13
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	13
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	13
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	13
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	15
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu.....	15

INDICE TABELA

Tabela 1	: Postos Administrativos, Sucos no Aldeia.....	3
Tabela 1.1	: Forca Trabalho ADN, I.P Municipio Viqueque.....	4
Tabela 1.2	: Lista Asset ADN, I.P Municipio Viqueque.....	4
Tabela 1.3.1	: Tabela Municipio Viqueque Por Fundus Finansiamiento.....	5
Tabela 1.3.2	: Tabela Municipio Viqueque Por Sectores.....	7
Tabela 1.3.3	: Tabela Municipio Viqueque Por Ministerio.....	9
Tabela 1.4	: Dadus populasau Munisipiu Viqueque.....	13

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos no Aldeia

Lacluta		Ossu		Viqueque	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Ahic	5	Builale	5	Bahalarauain	6
Dilor	5	Liaruca	5	bibileo	8
Laline	5	Loi-Huno	5	Caraubalu	7
Uma tolu	5	Naha Reka	5	Fatudere	3
-	-	Ossu Rua	12	luca	4
-	-	Ossu Decima	8	Maluru	3
-	-	Uabubo	6	Uai Mori	6
-	-	Uaguaia	6	Uma Quic	8
-	-	Uaibobo	7	Uma Uain Craic	9
-	-	-	-	Uma Uain Leten	8
Total	20	-	59	-	62

Uato-Carbau		Watulari	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Afaloicai	4	Babulo	8
Bahatata	4	Macadique	21
Irabin de Baixo	7	Matohoi	12
Irabin de Cima	5	Uaitame	5
Loi Ulo	5	Vesoru	7
Uani Uma	5	Afaloicai	4
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	30	-	57

Data husi livro 3B, OJE 2021, Pajina 86

Tabela 1.1 : Forca Trabalho ADN, I.P Municipio Viqueque

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Viqueque								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	3					3	
2	Administrasaun no Financas	0					0	
3	Motorista	1					1	
4	Seguransa	0					0	
Total		4					4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN, I.P Municipio Viqueque

ASET ADN,IP MUNICIPIO VIQUEQUE								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	1					1	
2	Kareta	1					1	
3	Desktop HP / Monitor	1					1	
4	Laptop HP	1					1	
5	Printer Cannon (Color)	1					1	Aát
6	UPS	1					1	
7	Armario File	2					2	
8	Armario Tau hena	3					3	
9	Meja escritorio	1					1	
10	Meja han	1					1	
11	Meja TV (kiik)	1					1	
12	Kadeira escritorio	6					6	
13	Kadeira han	4					4	
14	Sofa	1 Set					1 Set	
15	Springbed	3 Set					3 Set	
16	Jeleira	1					1	
17	Water Dispenser	1					1	Aát
18	TV + Parabola	1 Set					1 Set	Parabola Aát
19	AC	4					4	
20	Kompor	1						La iha
21	Kompor Gas	1					1	Aát
22	Rack sepatu	3						La iha
23	Rack Piring	1						La iha
24	Water Pump Sanyo	1						La iha

1.3 Lista Projecto

Projetu hotu neébe akumulá iha lista neé bazeia ba dadus projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamto, tabela 1.3.2 Projetu por Sectores no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Tabela Municipio Viqueque Por Fundus Finansiamto

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI+LM-BS+LM-CD+PDIM		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta	4	\$ 9,860,561.24	76.74%
2	Regional	1	\$ 23,853,175.70	23.45%
3	Ossu	22	\$ 15,598,983.00	45.36%
4	Uatocarbau	9	\$ 10,734,033.30	53.58%
5	Uatolari	18	\$ 13,765,690.56	30.69%
6	Viqueque	18	\$ 20,696,505.21	49.72%
	Grand Total	72	\$ 94,508,949.01	42.86%

NO POSTO ADMINISTRATIVO		FI		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta	2	\$ 9,781,560.84	77.36%
2	Regional	1	\$ 23,853,175.70	23.45%
3	Ossu	4	\$ 9,461,469.53	68.26%
4	Uatocarbau	5	\$ 10,124,353.34	54.44%
5	Uatolari	5	\$ 11,155,838.98	29.24%
6	Viqueque	8	\$ 18,890,123.05	51.85%
	Grand Total	25	\$ 83,266,521.44	45.86%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta			
2	Regional			

3	Ossu			
4	Uatocarbau			
5	Uatolari	1	\$ 145,269.48	0.00%
6	Viqueque	2	\$ 155,719.93	50.07%
	Grand Total	3	\$ 300,989.41	25.90%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM + CD		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta			
2	Regional			
3	Ossu	14	\$ 5,708,319.54	8.43%
4	Uatocarbau	1	\$ 236,638.85	0.00%
5	Uatolari	4	\$ 1,555,529.21	46.38%
6	Viqueque	2	\$ 974,770.41	27.48%
	Grand Total	21	\$ 8,475,258.01	17.35%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta			
2	Regional			
3	Ossu			
4	Uatocarbau	1	\$ 197,429.13	85.57%
5	Uatolari	1	\$ 158,411.79	97.23%
6	Viqueque			
	Grand Total	2	\$ 355,840.92	90.76%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TP		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta	1	\$ 34,780.68	0.00%
2	Regional			
3	Ossu	4	\$ 403,762.43	31.85%
4	Uatocarbau	2	\$ 175,611.98	40.17%
5	Uatolari	7	\$ 750,641.10	11.50%
6	Viqueque	6	\$ 675,891.82	22.27%
	Grand Total	20	\$ 2,040,688.01	21.49%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Emergency		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta	1	\$ 44,219.72	0.00%
2	Regional			
3	Ossu			
4	Uatocarbau			
5	Uatolari			
6	Viqueque			
	Grand Total	1	\$ 44,219.72	0.00%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Tabela Municipio Viqueque Por Sectores

NO	SECTOR PROJETO	TOTAL PROJECTO		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	3	\$ 5,472,502.45	77.34%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	28	\$ 4,217,179.61	25.68%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	4	\$ 2,296,509.09	65.49%
4	ESTRADAS E PONTES	34	\$ 58,060,561.11	48.02%
5	IMPRESTIMO	1	\$ 23,853,175.70	23.45%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	33.83%
	Grand Total	72	\$ 94,508,949.01	42.86%

NO	SECTOR PROJETO	LACLUTA		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 34,780.68	0.00%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
4	ESTRADAS E PONTES	3	\$ 9,825,780.56	77.01%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
	Grand Total	4	\$ 9,860,561.24	76.74%

NO	SECTOR PROJETO	OSSU		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	EDIFICIOS PUBLICOS	5	\$ 730,995.09	39.73%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
4	ESTRADAS E PONTES	15	\$ 14,233,535.36	46.15%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	33.83%
	Grand Total	22	\$ 15,573,551.50	45.36%

NO	SECTOR PROJETO	REGIONAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	EDIFICIOS PUBLICOS			
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
4	ESTRADAS E PONTES			
5	IMPRESTIMO	1	\$ 23,853,175.70	23.45%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
	Grand Total	1	\$ 23,853,175.70	23.45%

NO	SECTOR PROJETO	UATUCARBAU		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	2	\$ 5,025,018.02	76.54%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	4	\$ 609,679.96	39.28%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1,147,191.84	81.19%
4	ESTRADAS E PONTES	1	\$ 3,952,143.48	18.58%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
	Grand Total	9	\$ 10,734,033.30	53.58%

NO	SECTOR PROJETO	UATULARI		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 447,484.43	86.28%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	10	\$ 1,329,326.87	18.30%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1,149,317.25	49.82%

4	ESTRADAS E PONTES	5	\$ 10,839,562.01	27.88%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
	Grand Total	18	\$ 13,765,690.56	30.69%

NO	SECTOR PROJETO	VIQUEQUE		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	EDIFICIOS PUBLICOS	8	\$ 1,486,965.51	20.16%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
4	ESTRADAS E PONTES	10	\$ 19,209,539.70	52.01%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
	Grand Total	18	\$ 20,696,505.21	49.72%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Tabela Municipio Viqueque Por Ministerio

NO	DONO DO PROJETO	TOTAL PROJETO		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 322,956.45	90.76%
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ -	0.00%
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN	20	\$ 444,104.97	21.49%
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN	1	\$ 149,313.64	18.54%
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	3	\$ 4,232,344.51	77.34%
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	41	\$ 35,186,414.73	41.48%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO	1	\$ -	0.00%
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL	1	\$ 2,911.53	1.06%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ -	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 163,850.75	50.07%
	Grand Total	72	\$ 40,501,896.57	42.86%

NO	DONO DO PROJETO	LACLUTA		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN	1	\$ 34,780.68	0.00%
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 9,825,780.56	77.01%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO			
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
10	MINISTERIO SAUDE			
Grand Total		4	\$ 9,860,561.24	76.74%

NO	DONO DO PROJETO	OSSU		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN	4	\$ 429,193.93	31.85%
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	17	\$ 14,842,556.41	45.65%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO			
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
10	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 327,232.66	50.07%
Grand Total		22	\$ 15,598,983.00	45.36%

NO	DONO DO PROJETO	REGIONAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN			
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	1	\$ 23,853,175.70	23.45%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO			
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
10	MINISTERIO SAUDE			
Grand Total		1	\$ 23,853,175.70	23.45%

NO	DONO DO PROJETO	UATUCARBAU		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 197,429.13	85.57%
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN	2	\$ 175,611.98	40.17%
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	2	\$ 5,025,018.02	76.54%
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 5,099,335.32	32.67%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO			
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 236,638.85	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE			
Grand Total		9	\$ 10,734,033.30	53.58%

NO	DONO DO PROJETO	UATULARI		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 158,411.79	97.23%
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	0.00%
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN	7	\$ 750,641.10	11.50%
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 447,484.43	86.28%
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	7	\$ 11,988,879.26	29.98%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO			
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL	1	\$ 275,004.50	1.06%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
10	MINISTERIO SAUDE			
Grand Total		18	\$ 13,765,690.56	30.69%

NO	DONO DO PROJETO	VIQUEQUE		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN	6	\$ 675,891.82	22.27%
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN	1	\$ 805,366.41	18.54%
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	10	\$ 19,209,539.70	52.01%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO	1	\$ 5,707.28	0.00%
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
10	MINISTERIO SAUDE			
Grand Total		18	\$ 20,696,505.21	49.72%

Tabela 1.4 : Dadus populasau Munisipiu Viqueque

Administrative Post, Suco and Sex	2021				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Lacluta	7,098	2,152	1,917	1,528	1,501
Ossu	17,972	4621	4946	4241	4164
Uato-Lari	19,580	4,927	5,199	4,879	4,575
Uatucarbau	7,669	1,842	2,060	1,896	1,871
Viqueque	26,822	7,370	7,549	6,184	5,720

Fontes : Projeksaun Populasau bazea ba Census Populasau no Uma Kain 2015
Direcção Geral de Estatística, MOF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia persentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu persentagen actual fulan ida ne'e hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare'e iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hare'e #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

- ❖ Durante Equipa ADN, I.P. Viqueque halo monitorizasaun no Inspeksaun hasoru obstaklo sira iha Terreno mak hanesan tuir mai ne'e :
 - Ekipa ADN, I.P. Viqueque, halo monitorizasaun no inspeksaun indentifika kompanhia balun la kumpri rekomendasaun ne'ebe equipa hatu'o, hanesan :

- a) Atu taka dokumentos *Time Schedule* no Dezenho service iha Site office maibe sira nafatin la taka ate a data.
- b) Kompanhia servisu parado no Equipa ADN, I.P. viqueque orienta atu kontinua fali maibe ate a data seidak kontinua.
- c) Iha kompanhia balu nebe'e laiha *site office* iha terreno.
- Ba projetu abandona sira ne'ebe abandona durante ne'e (husi tinan 2014 ate a data) no lokaliza iha fatin ne'ebe do'ok tuir orientasaun tenki halo planu ba observa dala rua maibe iha tempu udan defisil atu asesu ba, no maioria gastus tempu barak liu ba projetu ne'ebe abandona
- Iha projeto sira site supervisor husi ministerio relevante la iha terreno, no kontrator sira dalaruma servisu la tuir espesifikasaun iha kontrato, maibe parte tekniko ADN, I.P. tempo la to'o atu diariamente kontrola iha terreno, hodi nune'e servisu sira ne'ebe iha rai laran ona susar atu indentifika.
- Ekipa ADN, I.P. Viqueque, la konsege lao tuir plano inspesaun nebe'e planeia ona tamba factor distancia (projecto ida ba projetco seluk), ho nune'e ekipa ADN, I.P. Viqueque halo monitorizasaun ba projeto hirak ne'e mais ou menus loron ida hare projetu ida ou rua deit.

❖ Durante Equipa ADN, I.P. Viqueque halo servisu iha Eskritorio ADN, I.P. Municipio hasoru obstaklo sira mak hanesan :

- Printer la diak, no lebele uza, krik atu print asuntu inportante ruma presiza ba print fali iha fatin seluk, ida nee mos bele fo impakto ba dokumentos konfidensial sira.
- Internet iha Municipio lao ladun diak hodi nune susar tebes atu asesu manda dokumentos ruma *via email* liu liu *Dropbox*.
- Sistema *Drop Box* Equipa hatama ona dados Inspeksaun no Monitorizasaun, maibe ami nia dados sira labele asesu iha nacional tamba *Memory Drop Box Full*.
- Ami nia Edificio / Residencia refere presiza manutensaun tamba iha parte electrical no odatamatan balu la seguro, no ami araska asesu be'e mos.
- Fasilidade la sufisiente apoiu servisu diariamente hanesan laptop, tamba ami tekniku munisipiu Viqueque iha deit laptop ida e nee mos la sufisiente atu halo *back up data* no update ba *folder system*.

❖ **Obstaclo Parte Eletricidade :**

Obtaklu nebe durante Prosesu monitorizasaun Eng. Mekanikal, Elecktrikal & ITC hasoru iha base mak hanesan tuir mai nee:

1. Laptop Laiha atu halo relatorio wainhira iha municipio.
2. Transporte (Kareta/ Motor) la suficiente atu koresponde ba plano nebe Aprovado.
3. Combustivel/Mina (Municipio Baucau, Viqueque, Lautem Pertamina Eto Laiha).
4. Kontractor laiha site ou kontaktu/telepon la tama no contractor la ba iha site/terenu
5. Menus Engenheiro ME.
6. Natureza hanesan Udan boot, Estrada kotu dalan la asesu ba kareta.

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Rekomenda ba superior ADN, I.P. atu kordena ho ministerio relevantes sira hodi nune'e bele fo penalidade ba komphia sira nebe servisu parado no abandona hela sira nia servico sem informasaun.
2. Rekomenda ba parte Lina Ministerial sira atu foti desizaun ba projeto sira ne'ebe parado no abandona iha terreno.
3. Ministerio relevante sira atu implementa projeto sira tenke iha mos *Site Supervisor*, hodi nune bele kontrola servisu Diariamente iha terreno.
4. Ami Rekomenda ba superior sira atu prepara printer nebe bele print *kertas A3* no *A4* hodi nune'e bele fasilita ami nia servisu iha Municipio.
5. Rekomenda ba Seksaun ITC hare konaba velocidade internet nebe'e mak iha munisipiu ho velocidade nebe'e ki'ik susar atu envia dokumentus ba *dropbox*.
6. Sujere mos ba seksaun ITC atu hare mos konaba kapasidade *dropbox* nian nebe'e distribui ba Munisipiu sira ho kapasidade nebe'e bo'ot hodi nune'e bele akumula dados hotu iha laran.
7. Husu ba parte Logistica atu tun Direita hodi hare ami nia residencia refere iha municipio, hodi nune'e bele halo manutensaun, tamba ami hatu'o ona proposta ba parte Logistik

8. Rekomenda mos ba seksaun ITC atu aumenta facilidade Laptop ba iha Munisipiu tamba tekniku nain tolu assesu *dropbox* iha laptop ida deit, hodi nune'e susar atu fahe servisu.

❖ **Recomendação Parte Electricidade :**

1. Rekomenda ba Parte Logistik atu prepara Laptop kada engenheiro (Ba Engenheiro nebe seidauk Hetan)
2. Rekomenda ba Logistik atu Aumenta transporte kareta ba Engenheiro Electricidade
3. Rekomenda ba parte Logistik atu hare problema kombustivel/mina iha parte leste mak hanesan Municipio Baucau, Municipio Lautem no Municipio Viqueque problema iha neba Pertamina Eto Laiha nemak dificulta Ami nia plano monitorizasaun karik mina hotu ami tenki fila mai atesta iha municipio Manatuto
4. Rekomenda ba Superior sira atu koordena ho Dono do Projeto (EDTL, EP) oinsa atu kria linha koordenasaun nebe diak
5. Rekomenda ba HR atu Aumenta eng. Electricidade (Recruta tan engenheiro ME)
6. Rekomenda ba Parte Logistik atu prepara ou facilita simcard office nian ba engenheiro.

Note: Assinatura husi Eng Municipio Viqueque

Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Viqueque						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engenheiro	Bebiano C. de Jesus Lopes	156	Engenheiro EPAS		
2	Engenheiro	Roberto M. Martins	175	Engenheiro ITI		
3	Engenheiro	Salvador Martins	133	Engenheiro ITI		
4	Engenheiro	Camilo Maia	257	Engenheiro ITI		

5	Engenheiro	Adonis Julio Fernandes	152	Engenheiro METIC		
6	Engenheiro	Joao Paulo Amaral	077	Engenheiro VEBD		
7.	Motorista	Bendito M. Bento	027	Motorista		



ANEXU A


Município Viqueque (Lista Geral)

Localizações Projeto

NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	Suco	Posto Administrativo	MUNI.	Latitude (Start Point)	Longitude (Start Point)	Latitude (End Point)	Longitude (End Point)	NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA (%)	PAGA (\$)	REAL (\$)	STATUS PROJECT	OBS
1	Package II Dilor	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Dilor	Lacuta	Viqueque					Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOPTC-2017	\$ 4,886,127.61	Aug. 25, 2017	82.28%	64.25%	\$ 3,139,406.69	\$ 1,746,720.92	ON-GOING	ON-GOING
2	Nova Construção de Moro Protecção da Ribeira de Dilor (Pakote1-Sta. 0+000 To 0+800)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Dilor	Lacuta	Viqueque					Atramor Sucesso Unip. Lda	SSS/093/MOPTC-2016	\$ 4,895,433.23	May 17, 2016	97.10%	90.44%	\$ 4,427,564.97	\$ 467,868.26	Parado	Parado
3	NOVA CONSTRUCAO ESC. TECNICO VOCAZIONAL(ESTV), RAVINA LACUTA, DILOR VIQUEQUE	MINISTERIO DA EDUCASAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Lacuta	Viqueque					Grupo Komunitario	NCB 021 - R/MEJD-DNA/2022	\$ 347,806.68	02/09/2022	25.33%	0.00%	\$ -	\$ 347,806.68	ON-GOING	Progres Fialko fulan Novembro aumenta 7.01%
4	Emergency Project, Cyclone Seroja 04 April 2021, River Training Wello, Viqueque, Regularization Temporary (STA 0+220 to STA 0+340)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	ESTRADAS E PONTES		Lacuta	Viqueque					Fin Los unip.lda	RFQ-CD-MOP-22007	\$ 44,219.72	June 27, 2022	100.00%	0.00%	\$ -	\$ 44,219.72	ON-GOING	Progres Fialko fulan Novembro aumenta 100%
5	Road Rehabilitation of Assafatula - Ossu Sta. 5+155 - 14+000 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque					Uhacae, Lda	SSS/064/MOPTC-2017	\$ 4,849,333.48	Aug. 25, 2017	69.41%	58.14%	\$ 2,819,358.97	\$ 2,029,974.51	ON-GOING	
6	Periodic Maintenance Lohono-Osorua Chainage 0+000-6+750 Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Loh-Huno/Osorua	Ossu	Viqueque					Boru- Buty Unip.Lda	RT/072/MOPTC-2016	\$ 183,928.35	Sept. 22, 2016	99.81%	88.46%	\$ 162,704.20	\$ 21,224.15	ON-GOING	ON-GOING
7	R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liawoli Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ossu de Cima/Loi-Huno	Ossu	Viqueque					Kay Seng Unip. Lda	NCB/056/MOPTC-2019	\$ 425,092.70	Aug. 25, 2020	15.08%	10.19%	\$ 43,304.61	\$ 381,788.07	ON-GOING	Progres Fialko fulan Novembro aumenta 6.35%
8	Rural Roads Periodic Maintenance Lohono - Osorua Chainage 0+000 - 6+800 Routine Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400 Municipality Viqueque (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Loh-Huno	Ossu	Viqueque					Kay Seng Unip. Lda	MPW-W-190084	\$ 298,505.70	Aug. 16, 2019	53.01%	55.69%	\$ 166,238.32	\$ 132,267.38	ON-GOING	ON-GOING
9	R4D Rural Road Spot Improvement Ossu-Nahareka Chainage 0+000-3+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Nahareka	Ossu	Viqueque					Costa Key Unip Lda	MPW-W-210053	\$ 74,854.80	June 10, 2021	47.83%	21.13%	\$ 15,817.10	\$ 59,037.70	ON-GOING	ON-GOING
10	R4D Rural Road Spot Improvement Lohuno-Uagla Chainage 0+000 - 6+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Loh-Huno	Ossu	Viqueque					Manoko Unip. Lda	MPW-W-210050	\$ 474,365.56	June 10, 2021	28.97%	10.97%	\$ 52,037.90	\$ 422,327.66	ON-GOING	ON-GOING
11	Emergency Road Rehabilitation Package II from Ossu - Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque					Modena Tecnica Unipessoal Lda	MOPW-F1-W-166514	\$ 4,003,115.00	June 25, 2013	95.28%	85.75%	\$ 3,432,678.18	\$ 570,436.82	ABANDONA	Parado
12	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Ossu-Nahareka Chainage 4+350-6+350	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque					Fin-Los Unip.Lda JV Costa Key Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190037	\$ 491,752.56	Aug 16, 2019	34.44%	16.91%	\$ 83,143.62	\$ 408,608.94	Parado	Progres Fialko fulan Novembro aumenta 12.87%
13	New Construction of Health post and Doctor's House Building in Bulale, Ossu, Viqueque Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Viqueque					Borala Lda	RDTL-MS-DNA-ICB21-075	\$ 327,232.66	Aug-25, 2021	70.84%	50.07%	\$ 163,850.75	\$ 163,381.91	ON-GOING	ON-GOING
14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF 1.2 Ulubobo	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 116,970.18		24.04%	0.00%	\$ -	\$ 116,970.18	ON-GOING	Progres Fialko fulan Novembro aumenta 24.04%
15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Ualibua/Ossu	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 86,739.52		55.11%	54.83%	\$ 47,555.72	\$ 39,183.80	ON-GOING	Progres Fialko fulan Novembro aumenta 25.11%
16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Okokassa Ossu	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 112,885.23		53.79%	53.08%	\$ 59,925.07	\$ 52,960.16	ON-GOING	Progres Fialko fulan Novembro aumenta 24.95%
17	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Lianuca	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 112,599.00		26.70%	25.94%	\$ 29,205.88	\$ 83,393.12	ON-GOING	ON-GOING
18	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 2 + 000 - 4 + 000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque					Costa Key Unip Lda	RT/028/MOP-2021	\$ 445,193.69		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 445,193.69	ON-GOING	ON-GOING
19	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 4 + 000 - 6 + 000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque					JV1983 Larigutu. Lda	RT/029/MOP-2021	\$ 310,049.27		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 310,049.27	ON-GOING	ON-GOING
20	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 6 + 000 - 8 + 000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque						RT/030/MOP-2021	\$ -		0.00%	#DIV/0!	\$ -	\$ -	ON-GOING	ON-GOING
21	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 5 + 400 - 7 + 400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque					Walay Unipessoal Lda	RT/031/MOP-2021	\$ 507,050.73		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 507,050.73	ON-GOING	ON-GOING
22	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 7 + 400 - 9 + 400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque					Fin-Los Unip.Lda	RT/032/MOP-2021	\$ 491,785.11		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 491,785.11	ON-GOING	ON-GOING
23	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 9 + 400 - 11 + 400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque					Lemadae Unipessoal Lda	RT/033/MOP-2021	\$ 471,641.93		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 471,641.93	ON-GOING	ON-GOING
24	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 11 + 400 - 13 + 400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque					Marques Const. Unip. Lda	RT/034/MOP-2021	\$ 495,519.07		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 495,519.07	ON-GOING	ON-GOING
25	Rehabilitation of the Rural road Uagla - Nahareka - Chainage 13 + 400 - 15 + 400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque					Uassau Unipessoal Lda	RT/035/MOP-2021	\$ 650,059.97	March 17, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 650,059.97	ON-GOING	ON-GOING
26	Rehabilitation of the Rural road Uagla - Nahareka - Chainage 15 + 400 - 18 + 700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque					Cuba Unip. Lda	RT/036/MOP-2021	\$ 670,308.49		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 670,308.49	ON-GOING	ON-GOING
27	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	FI	AGRICULTURA		Uatocarbau	Viqueque					Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	\$ 4,009,902.86	Jan. 18, 2019	92.67%	75.04%	\$ 3,009,169.24	\$ 1,000,733.62	ON-GOING	ON-GOING
28	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	FI	AGRICULTURA		Uatocarbau	Viqueque					PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	\$ 1,015,115.16	Dec. 6, 2019	82.46%	82.46%	\$ 837,100.99	\$ 178,014.17	ON-GOING	ON-GOING
29	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Iraboe to Maunua, Floresta Dirimu, Uatocarbau - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		Uatocarbau	Viqueque					Divita Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441	\$ 591,750.15	Sept. 1, 2016	95.79%	85.91%	\$ 508,351.69	\$ 83,398.46	ON-GOING	ON-GOING
30	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lofara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgi Baru - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		Uatocarbau	Viqueque					Jonel Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346	\$ 555,441.69	July 6, 2016	98.65%	76.17%	\$ 423,062.89	\$ 132,378.80	ON-GOING	Progres Fialko 100%
31	Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Uato-Carbau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatocarbau	Viqueque					Luminar Unip. Lda	675/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	\$ 197,429.13	Aug. 5, 2019	98.56%	85.57%	\$ 168,940.11	\$ 28,489.02	ON-GOING	ON-GOING


Localizaasaun Projeto																					
NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	Suco	Posto Administrativo	MUNL	Latitude (Start Point)	Longitude (Start Point)	Latitude (End Point)	Longitude (End Point)	NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	STATUS PROJECT	OBS
32	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidale - Tardai/Post Polisi)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Loi-Huno	Uatocarbau	Viqueque					Sabrara. Unip. Lda	SSS/155/MOPTC-2017	\$ 3,952,143.48	Sept. 15, 2017	48.39%	18.58%	\$ 734,308.26	\$ 3,217,835.22	ON-GOING	
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC 2,3 Uatocarbau Nuan Uata	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatocarbau	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 83,016.63		53.24%	53.26%	\$ 45,277.01	\$ 39,739.62	ON-GOING	Progres Fisiko fulan Novembro aumenta 27.26%
34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Uatocarbau	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatocarbau	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 90,595.35		55.58%	27.89%	\$ 25,269.11	\$ 65,326.24	ON-GOING	Progres Fisiko fulan Novembro aumenta 17.59%
35	Supply, installation, configuration, testing, commissioning of equipments, Drones, GNSS and permanent establishment of GNSS Station at eight Municipalities in Tenu Leste Under ministry of planning & territory	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatocarbau	Viqueque					TeroMovigo - Earth Innovation, Lda	ICB/011/MPO-2022	\$ 236,638.85	May 24, 2022	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 236,638.85	ON-GOING	
36	New installation of mv/lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uma Uain Leten	Uatolari	Viqueque					Laway	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN-0000459	\$ 97,892.93	March 25, 2015	63.38%	46.30%	\$ 45,324.43	\$ 52,568.50	ON-GOING	Parado
37	New Installation MV, LV Line and House Connection from Dirbu to Liasidi, Nunumalau, Irakere and Ullusu, Uatolari - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		Uatolari	Viqueque					Habere Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN - 00000433	\$ 1,051,424.32	Sept. 1, 2016	72.06%	50.15%	\$ 527,283.76	\$ 524,140.56	ON-GOING	ON-GOING
38	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Uatolari	Viqueque					Holamula Unipessoal, Lda	SSS/096/MOPTC-2017	\$ 4,045,100.44	Aug. 28, 2017	63.29%	25.65%	\$ 1,037,517.23	\$ 3,007,583.21	ON-GOING	ON-GOING
39	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Uatolari	Viqueque					Greu Unipessoal, Lda	SSS/093/MOPTC-2017	\$ 4,322,335.54	Aug. 25, 2017	67.28%	22.80%	\$ 985,435.28	\$ 3,336,900.26	ON-GOING	ABANDONA
40	New construction of Gapura Stairs and wall protection no jardim de herois de Viqueque	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque					Natureza Furak Unip/ Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	\$ 275,004.50	Jan. 01, 2021	46.36%	1.06%	\$ 2,911.53	\$ 272,092.97	ON-GOING	
41	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uatolari	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque					Lemadae Unipessoal Lda	665/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	\$ 158,411.79	Aug. 5, 2019	100.00%	97.23%	\$ 154,016.34	\$ 4,395.45	ON-GOING	ON-GOING
42	Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 2 Uatolari - Laisorlai (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Uatolari	Viqueque					Bragotoul Unip. Lda JV PT Decont Mitra Consolindo	MPW-CS-2000025	\$ 475,000.00	March 25, 2020	70.00%	70.00%	\$ 332,500.00	\$ 142,500.00	ABANDONA	ABANDONA
43	Rehabilitation of Matubul Edmumo, Sapatala Road /reabilitacao de estradas distritais de Uatolari Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Uatolari	Viqueque					Karakuta Unip Lda	MPW-2013/JUNE	\$ 1,639,085.75	June 25, 2014	41.68%	40.68%	\$ 666,780.08	\$ 972,305.67	ON-GOING	ON-GOING
44	New Construction of Capela Botesda Naedala - Afalocai-Uatolari	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque					Be'e Horis Unip. Lda		\$ 145,269.48		49.85%	0.00%	\$ -	\$ 145,269.48	ON-GOING	Progres Fisiko fulan Novembro aumenta 6.16%
45	Konstrusaun Kanais Irrigasaun Iha Bihui Municipio Viqueque	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA		Uatolari	Viqueque					I.M. Caicara Motin Unip Lda	RDTI-MAPO2021-15965	\$ 447,484.43	Oct. 08, 2021	100.00%	86.28%	\$ 386,074.28	\$ 61,410.15	ON-GOING	ON-GOING
46	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Nahae	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 114,134.85		15.04%	0.00%	\$ -	\$ 114,134.85	ON-GOING	ON-GOING
47	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESF Uabira	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 103,117.97		24.18%	0.00%	\$ -	\$ 103,117.97	ON-GOING	Progres Fisiko fulan Novembro aumenta 24.18%
48	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC 07 Uatolari	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 70,191.21		53.38%	0.00%	\$ -	\$ 70,191.21	ON-GOING	Progres Fisiko fulan Novembro aumenta 31.43%
49	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Edmumo	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 98,958.49		12.25%	0.00%	\$ -	\$ 98,958.49	ON-GOING	
50	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Uabique	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 106,475.42		51.29%	23.32%	\$ 24,829.66	\$ 81,645.76	ON-GOING	Progres Fisiko fulan Novembro aumenta 36.35%
51	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESTV Kalo-Heda Uatolari	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 159,590.65		22.67%	22.25%	\$ 35,510.57	\$ 124,080.08		
52	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Debuisi	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 98,172.51		54.82%	26.50%	\$ 26,014.37	\$ 72,158.14	ON-GOING	Progres Fisiko fulan Novembro aumenta 35.51%
53	Roads Maintenance Section : Viqueque-Makadika (A08-1)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Uatolari	Viqueque					Samadare Unip. Lda	MPW-W-220023	\$ 358,040.28	March 21, 2022	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 358,040.28	ON-GOING	
54	Emergency work package caused by climate change on June 2013 (Gabion protection works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Carabuko	Viqueque	Viqueque					Consortio Unidos Genero, Lda	SSS/100/MOPTC-2015	\$ 75,260.55	Dec. 1, 2015	0.00%	88.00%	\$ 66,229.28	\$ 9,031.27	ON-GOING	Progres Fisiko 100%
55	Rehabilitation of Urban Road Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Viqueque	Viqueque					Urukai II, Unip. Lda	SSS/072/MOPTC-2017	\$ 4,246,801.85	Aug. 25, 2017	100.00%	89.07%	\$ 3,782,637.26	\$ 464,164.59	ON-GOING	Parado
56	Rehabilitation of Roads From Junction Bermindo Bahalara - Uain We Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000 - 5+500 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Bahalara-Uain	Viqueque	Viqueque					Arpy Unipessoal, Lda	SSS/163/MOPTC-2017	\$ 3,666,919.24	Sept. 15, 2017	99.14%	85.17%	\$ 3,123,271.96	\$ 543,647.28	ON-GOING	Progres Fisiko 100%
57	Rehabilitation of Suspension Bridge, Municipality of Viqueque.	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Viqueque	Viqueque					Arquis	SSS/105/MOPTC-2017	\$ 758,090.38	Sept. 7, 2017	94.64%	72.01%	\$ 545,900.59	\$ 212,189.79	ON-GOING	Progres Fisiko fulan Novembro aumenta 26.35%
58	Routine Road Maintenance Lot 1 - Viqueque - Dilor A07 Lot 2 - Jct Luca - Lachuta C5 Municipality Viqueque (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	Luca	Viqueque	Viqueque					Dira Nova Unip. Lda	MPW - W - 190114	\$ 150,012.65	March 9, 2019	100.00%	51.97%	\$ 77,967.95	\$ 72,044.70	ON-GOING	ABANDONA
59	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package: 12 Luca - Lachuta	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Luca	Viqueque	Viqueque					Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000022	\$ 169,404.00	March 25, 2020	75.00%	70.00%	\$ 118,582.80	\$ 50,821.20	ABANDONA	ON-GOING
60	Rehabilitation of Venilale - Hatulia, Uaimori Road Package 2 (STA. 10+300 - STA. 15+475) in Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Uai-Mori	Viqueque	Viqueque					Uma Liurai unip, lda	SSS/138/MOPTC-2016	\$ 3,664,122.77	Aug. 1, 2016	70.00%	24.12%	\$ 883,922.53	\$ 2,780,200.24	ABANDONA	
61	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Uai-mori	Viqueque	Viqueque					Bihaltur Unip. lda	SSS/141/MOPTC-2016	\$ 2,073,894.13	Aug. 1, 2016	49.30%	9.09%	\$ 188,464.84	\$ 1,885,429.29	ON-GOING	ON-GOING
62	Rehabilitation of Venilale - Hatuluri - Uaimori Road (30.880km) Roads Section : Venilale - Hatulia Roads Package 5 Sta. 20+625 - 25+755 Municipality Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Uai-mori	Viqueque	Viqueque					Loke Matan unip, lda	SSS/307/MOPTC-2016	\$ 2,455,115.74	May 12, 2016	10.33%	24.85%	\$ 610,078.01	\$ 1,845,037.73	ON-GOING	
63	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Uai-mori	Viqueque	Viqueque					Caburela unip, lda	SSS/306/MOPTC-2016	\$ 1,949,918.39	Nov. 22, 2016	34.21%	30.42%	\$ 593,217.81	\$ 1,356,700.58	ON-GOING	ON-GOING
64	Konstrusaun Foun Escola Secundaria Geral 4 de Setembro Viqueque	MINISTERIO DA EDUCASAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque					Grupo Komunitario	NCB 020-R/ME/DNA/2021	\$ 250,170.65	02/09/2022	48.92%	0.00%	\$ -	\$ 250,170.65	ON-GOING	ON-GOING
65	Upgrading and Maintenance of Baucau - Viqueque Highway Project Lot 2: Venilale - Viqueque : Sta. 27 + 120 to Sta. 62 + 010	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO		Multi Posto Administrativo	Regional					China Railway Int. Group co. jr with China overseas	ICB/048/MOPTC-2017	\$ 23,853,175.70	March 21, 2019	24.20%	23.45%	\$ 5,593,323.50	\$ 18,259,852.20	ON-GOING	ON-GOING
66	Servisu Manutensaun Edificio ADN LP Municipio Viqueque	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque					Luminar Unip. Lda	22/RDTL.MPO/AND.LP/XI/2021	\$ 5,707.28		100.00%	0.00%	\$ -	\$ 5,707.28	ON-GOING	Progres Fisiko 100%
67	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Calxa Viqueque	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 113,359.66		23.08%	0.00%	\$ -	\$ 113,359.66	ON-GOING	
68	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Ular Rihik Kraras	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque					Grupo Komunitario		\$ 70,633.26		25.06%	0.00%	\$ -	\$ 70,633.26	ON-GOING	

Localizaçaun Projeto											NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA (%)	PAGA (\$)	BAL (\$)	STATUS PROJECT	OBS
NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	Suco	Posto Administrativo	MUNL	Latitude (Start Point)	Longitude (Start Point)	Latitude (End Point)										
69	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Maria Lobato	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque				Grupo Komunitario		\$ 99,496.02		50.11%	50.06%	\$ 49,804.11	\$ 49,691.91	ON-GOING	Progres Fisiko fulan Novembro aumenta 10.42%
70	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE, Cabra-Oan	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque				Grupo Komunitario		\$ 52,836.14		94.32%	94.32%	\$ 49,896.12	\$ 3,000.02	ON-GOING	Progres Fisiko fulan Novembro aumenta 8.06%
71	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Sebastiao Gomes	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque				Grupo Komunitario		\$ 89,396.09		57.08%	56.91%	\$ 50,877.35	\$ 38,518.74	ON-GOING	Progres Fisiko fulan Novembro aumenta 28.33%
72	New Construction Office, Were House And Landscaping Of Viqueque Distric	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIALE INCLUZAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque				L.M. Caicasa Metin Unip,Lda	01/MSSI DGAE/DNA/U/2022	\$ 805,366.41		36.90%	18.54%	\$ 149,313.64	\$ 656,052.77	ON-GOING	Progres Fisiko fulan Novembro aumenta10.74%
73	Konstrusaun Foun Escola Secundaria Geral 4 de Seicmbro Viqueque	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque				Grupo Komunitario	NCB 020-R/MEJD DNA/2021	\$ 250,170.65	02/09/2022	27.69%	0.00%	\$ -	\$ 250,170.65	ON-GOING	Progres Fisiko fulan Novembro aumenta 17.10%
													\$ 95,072,145.66			42.60%	\$ 40,501,896.57	\$ 54,570,249.09		


Inspetoraun Husi,

(Eng. Roberto A. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P


(Eng. Salvador Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P


(Eng. Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projeto Mecanical
Electrical, ADN, I.P

Inspetoraun Husi,

(Eng. Bsbiano C. de Jesus Lopes)
Eng. ba Projeto Edificio Publico no
Beé Saneamento ADN, I.P


(Eng. Camilo Maia)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Verifica Husi,

(Eng. Renigio da C.S dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun ADN, I.P


(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico no Beé Saneamento ADN, I.P


(Eng. Decoindo de Fatima Marques)
Chefe Seksaun Mecanical Electrical, Informasaun Tecnologia no Komunikasaun ADN, I.P

Cedifica Husi

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controla e Validasaun
de Qualidade, ADN, I.P.

ANEXOB

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU VIQUEQUE

NU	NARAN PROIEITU	DONO PROIEITU	KATEGORIA PROIEITU	SECTOR	Localizasaun Projeto						Novembro 2022		
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Progress Previous	Progress This Month	Progress Kumulative
1	Package II Dilor	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacluta	Viqueque	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOPTC-2017	\$ 4,886,127.61	Aug. 25, 2017	82.28%		82.28%
2	Nova Construção de Moro Protecção da Ribeira de Dilor (Pakotel-Sta. 0+000 To 0+800)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacluta	Viqueque	Atramor Sucesso Unip. Lda	SSS/093/MOPTC-2016	\$ 4,895,433.23	May. 17, 2016	97.10%		97.10%
3	NOVA CONSTRUCAO ESC. TECNICO VOCASIONAL(ESTV), RAVINA LACLUTA, DILOR VIQUEQUE	MEJD	LM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacluta	Viqueque	MEJD		\$ 347,806.68		18.32%	7.01%	25.33%
4	Emergency Project, Cyclone Seroja 04 April 2021, River Training Welolo, Viqueque Regularizasaun Temporaria (STA 0+220 to STA 0+340)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	ESTRADAS	Lacluta	Viqueque	Fin-Los Unip. Lda	MPW-W-220084	\$ 44,219.72		0.00%	100.00%	100.00%
5	Road Rehabilitation of Assalaitula - Oosu Sta. 5+155 - 14+000 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Uhacae, Lda	SSS/064/MOPTC-2017	\$ 4,849,333.48	Aug. 25, 2017	69.41%		69.41%
6	Periodic Maintenance Lohono-Osorua Chainage 0+000-6+750 Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ossu	Viqueque	Boru- Buty Unip.Lda	RT/072/MOPTC-2016	\$ 183,928.35	Sept. 22, 2016	99.81%		99.81%
7	R4D Rural Road Rehabilitation Oosu de Cima - Liawaioli Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ossu	Viqueque	Kay Seng Unip. Lda	NCB/056/MOPTC-2019	\$ 425,092.70	Aug. 25, 2020	8.72%	6.35%	15.08%
8	Rural Roads Periodic Maintenance Lihono - Osorua Chainage 0+000 - 6+800 Routine Maintenance Oosu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400 Municipality Viqueque (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Kay Seng Unip. Lda	MPW-W-190084	\$ 298,505.70	Aug. 16, 2019	53.01%		53.01%
9	R4D Rural Road Spot Improvement Oosu-Nahareka Chainage 0+000-3+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Costa Key Unip Lda	MPW-W-210053	\$ 74,854.80	June 10, 2021	47.83%		47.83%
10	R4D Rural Road Spot Improvement Lohunu-Uagia Chainage 0+000 - 6+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Manoko Unip. Lda	MPW-W-210050	\$ 474,365.56	June 10, 2021	28.97%		28.97%
11	Emergency Road Rehabilitation Package II from Oosu - Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Modena Tecnica Unipessoal Lda	MOPW-FI-W-166514	\$ 4,003,115.00	June 25, 2013	95.28%		95.28%
12	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Oosu-Nahareka Chainage 4+350-6+350	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Fin-Los Unip.Lda JV Costa Key Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190037	\$ 491,752.56	Aug 16, 2019	21.57%	12.87%	34.44%
13	New Construction of Health post and Doctor's House Building in Builale, Oosu, Viqueque Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Borala Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-ICB21-075	\$ 327,232.66	Aug-25,2021	70.84%		70.84%
14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Uibobo	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 116,970.18		0.00%	24.04%	24.04%
15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Uaibua/Ossu	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 86,739.52		30.00%	25.11%	55.11%
16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Olokassa Ossu	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 87,453.73		28.84%	24.95%	53.79%
17	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Liaruka	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 112,599.00		26.70%		26.70%
18	Rehabilitation of the Rural road Oosu de Cima - Liaruka, Chainage 2+000 - 4+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Costa Key Unip Lda	RT/028/MOP-2021	\$ 445,193.69		0.00%		0.00%
19	Rehabilitation of the Rural road Oosu de Cima - Liaruka Chainage 4+000 - 6+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	R4D	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	JV1983 Larigutu. Lda	RT/029/MOP-2021	\$ 310,049.27		0.00%		0.00%
20	Rehabilitation of the Rural road Oosu de Cima - Liaruka Chainage 6+000 - 8+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	R4D	ESTRADAS	Ossu	Viqueque		RT/030/MOP-2021	\$ -		0.00%		0.00%
21	Rehabilitation of the Rural road Oosu de Cima - Liaruka Chainage 5+400 - 7+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	R4D	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Walay Unipessoal. Lda	RT/031/MOP-2021	\$ 507,050.73		0.00%		0.00%
22	Rural Road Rehabilitation of Uagia -Nahareka, Chainage 7+400 - 9+400 (2 Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	R4D	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Fin-Los Unip.Lda	RT/032/MOP-2021	\$ 491,785.11		0.00%		0.00%
23	Rehabilitation of the Rural road Oosu de Cima - Liaruka Chainage 9+400 - 11+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	R4D	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Lemadae Unipessoal Lda	RT/033/MOP-2021	\$ 471,641.93		0.00%		0.00%
24	Rehabilitation of the Rural road Oosu de Cima - Liaruka Chainage 11+400 - 13+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	R4D	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Marquesn Const. Unip. Lda	RT/034/MOP-2021	\$ 495,519.07		0.00%		0.00%
25	Rehabilitation of the Rural road Uagua - Nahareka - Chainage 13+400 - 15+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI/R4D	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Uaitau Unipessoal Lda	RT/035/MOP-2021	\$ 650,059.97		0.00%		0.00%
26	Rehabilitation of the Rural road Uagua - Nahareka - Chainage 15+400 - 18+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	R4D	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Cuba Unip. Lda	RT/036/MOP-2021	\$ 670,308.49		0.00%		0.00%
27	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAPS	FI	AGRICULTURA	Uatocarbau	Viqueque	Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	\$ 3,912,226.56	Jan. 18, 2019	92.67%		92.67%
28	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAPS	FI	AGRICULTURA	Uatocarbau	Viqueque	PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	\$ 1,015,115.16	Dec. 6, 2019	82.46%		82.46%
29	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarbau - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uatocarbau	Viqueque	Divita Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/ CGI-PEN : 00000441	\$ 591,750.15	Sept. 1, 2016	95.79%		95.79%
30	New Installation MV, LV Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uatocarbau	Viqueque	Jonel Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/ CGI-PEN : 00000346	\$ 555,441.69	July 6, 2016	98.65%		98.65%
31	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uato-Carbau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatocarbau	Viqueque	Luminar Unip. Lda	675/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	\$ 197,429.13	Aug. 5, 2019	98.56%		98.56%
32	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai Post Polisi)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uatocarbau	Viqueque	Sabirara, Unip. Lda	SSS/155/MOPTC-2017	\$ 3,952,143.48	Sept. 15, 2017	48.39%		48.39%
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC 2,3 Uatocarbau Nunu Uata	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatocarbau	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 85,016.63		25.98%	27.26%	53.24%

34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Uatocarbau	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatocarbau	Viqueque	Grupo Komunitario		\$	90,595.35		37.98%	17.59%	55.58%
35	Supply, Installation, Configuration, Testing, Commissioning of GNSS Station at eight Municipality in Timor Leste Under Ministry of Planning & Territory.	MPO	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatucarbau	Viqueque	Tero Movigo- Earth Innovation Lda	ICB/011/MPO-2022	\$	236,638.85		0.00%		
36	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uatolari	Viqueque	Laway	RDTL/MO PTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459	\$	97,892.93	March 25, 2015	63.38%		63.38%
37	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Liasidi, Nunumalau, Iralere and Uлуу, Uatolari - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uatolari	Viqueque	Habere Unip.lda	RDTL/MO PTC-VMO PTC/CGI-PEN : 00000433	\$	1,051,424.32	Sept. 1, 2016	72.06%		72.06%
38	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+ 500 - 31+ 800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uatolari	Viqueque	Helamula Unipessoal, Lda	SSS/096/MO PTC-2017	\$	4,045,100.44	Aug. 28, 2017	63.29%		63.29%
39	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+ 800 - 37+ 100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uatolari	Viqueque	Greu Unipessoal, Lda	SSS/093/MO PTC-2017	\$	4,322,335.54	Aug. 25, 2017	67.28%		67.28%
40	New construction of Gapura Stairs and wall protection no jardim de herois de Viqueque	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIOANL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Natureza Furak Unip/ Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	\$	275,004.50	Aug. 31, 2016	46.36%		46.36%
41	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uatolari	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Lemadae Unipessoal Lda	665/004/PDIM/ KDM-VQ Q/VIII/2019	\$	158,411.79	Aug. 5, 2019	100.00%		100.00%
42	Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 2 Uatolari - Laisorlai (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Uatolari	Viqueque	Bragtojal Unip. Lda JV PT Decont Mitra Consolindo	MPW-CS-2000025	\$	475,000.00	March 25, 2020	70.00%		70.00%
43	Rehabilitation of Miabuti Edmumo, Sapatula Road /reabilitacao de estradas distrais de Uatolari Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uatolari	Viqueque	Karakuta Unip Lda	MPW-2013/JUNE	\$	1,639,085.75	June 25, 2014	41.68%		41.68%
44	New Construction of Capela Betesda Naedala - Afoloicai-Uatolari	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	LM	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Be'e Horis Unip. Lda		\$	145,269.48		43.70%	6.16%	49.85%
45	Konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Bebui Municipio Viqueque	MINISTERIO DA AGRICULTURA	LM-CD	IRIGASAUN	Uatolari	Viqueque	L.M. Caicasa Metin Unip.Lda	RDTL-MAPPO2021:15965	\$	447,484.43	Oct. 08, 2021	100.00%		100.00%
46	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Nahae	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$	114,134.85		15.04%		15.04%
47	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESF Uaibira	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$	103,117.97		0.00%	24.18%	24.18%
48	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC 07 Uatolari	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$	70,191.21		21.96%	31.43%	53.38%
49	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Edemumo	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$	98,958.49		12.25%		12.25%
50	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Ualaque	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$	106,475.42		14.94%	36.35%	51.29%
51	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESTV Kalo-Heda Uatolari	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$	159,590.65		22.67%		22.67%
52	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Debuisi	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$	98,172.51		21.31%	33.51%	54.82%
53	Road Maintenance Section : Viqueque Makadiki (A08-3)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Samadare.Unip.Lda	MPW-W-220023	\$	358,040.28		0.00%		
54	Konstrusaun foun ESG Daraloi-Iraler, uatolari-Viqueque	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Henkopsta, Unipessoal Lda		\$	215,190.29		0.00%		
55	Emergency work package caused by climate change on June 2013 (Gabion protection works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Consorcio Unidos Genero, Lda	SSS/100/MO PTC-2015	\$	75,260.55	Dec. 1, 2015	100.00%		100.00%
56	Rehabilitation of Urban Road Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Urukai II, Unip. Lda	SSS/072/MO PTC-2017	\$	4,246,801.85	Aug. 25, 2017	99.14%		99.14%
57	Rehabilitation of Roads From Junction Bemvindo Bahalara - Uain We Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+ 000 - 5+ 500 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Arpy Unipessoal, Lda	SSS/163/MO PTC-2017	\$	3,666,919.24	Sept. 15, 2017	68.29%	26.35%	94.64%
58	Rehabilitation of Suspension Bridge, Municipality of Viqueque.	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Viqueque	Viqueque	Arquiris Unip. Lda	SSS/105/MO PTC-2017	\$	758,090.38	Sept. 7, 2017	100.00%		100.00%
59	Routine Road Maintenance Lot 1 - Viqueque - Dilor A07, Lot 2 - Jet Luca - Lacluta C5 Municipality Viqueque (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Dira Nova Unip. Lda	MPW - W - 190114	\$	150,012.65	March 9, 2019	75.00%		75.00%
60	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package: 12 Luca - Lacluta	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000022	\$	169,404.00	March 25, 2020	70.00%		70.00%
61	Rehabilitation of Venilale - Hatulia, Uamori Road Package 2 (STA. 10+ 300 - STA. 15+ 475) in Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Uma Liurai unip. lda	SSS/138/MO PTC-2016	\$	3,664,122.77	Aug. 1, 2016	49.30%		49.30%
62	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+ 476-20+ 625	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Bihalutur Unip, kla	SSS/141/MO PTC-2016	\$	2,073,894.13	Aug. 1, 2016	10.33%		10.33%

63	Rehabilitation of Vanilale - Hatulali - Uaimori Road (30.880km) Roads Section : Venilale - Hatulia Roads Package 5 Sta. 20+ 625 - 25+ 755 Municipality Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Loke Matan unip, lda	SSS/307/MOPTC-2016	\$ 2,455,115.74	May 12, 2016	34.21%		34.21%
64	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25- 775-30+ 880	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Caburela unip,lda	SSS/306/MOPTC-2016	\$ 1,949,918.39	Nov. 22, 2016	48.92%		48.92%
65	Upgrading and Maintenance of Baucau - Viqueque Highway Project Lot 2: Venilale - Viqueque : Sta. 27 + 120 to Sta. 62 + 010	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Multi Posto Administrativo	Regional	China Railway Int. Group co, jv with China overseas	ICB/046/MOPTC-2017	\$ 23,853,175.70	March 21, 2019	24.20%		24.20%
66	Servisu Manturensaun Edificio ADN I.P Municipio Viqueque	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO	LM	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Luminar Unip. Lda	22/RDTL/MPO/AND.I.P/XI/2021	\$ 5,707.28		100.00%		100.00%
67	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Calixa Viqueque	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 113,359.66		23.08%		23.08%
68	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Ular Rihik Kraras	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 70,633.26		25.06%		25.06%
69	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Maria Lobato	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 99,496.02		39.69%	10.42%	50.11%
70	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Cabira-Oan	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 52,836.14		86.26%	8.06%	94.32%
71	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Sebastiao Gomes	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 89,396.09		28.75%	28.33%	57.08%
72	New Construction Office, Were House And Landscaping Of Viqueque Distric	MINISTERIO SOLIDARIDADE SOCIAL E INCLUZAUN	LM	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	L.M. Caicasa Metin Unip,Lda	01/MSSU/DGAF/DNA/I/2022	\$ 805,366.41		26.16%	10.74%	36.90%
73	Konstrusaun Foun Escola Secundaria Geral 4 de Setembro Viqueque	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TT	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario	NCB/020-R/MEJD/DNA/2021	\$ 250,170.65		10.59%	17.10%	27.69%

Inspesaun Iusi :

(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

(Eng. Salvador Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

(Eng. Camilo Maia)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes
e Irigasaun ADN, I.P

(Eng. Bebian C. de Jesus Lopes)
Eng. ba Projeto Edificio Publico no
Beé Saneamento ADN, I.P

(Eng. Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projeto Mecanical
Electrical, ADN, I.P

Verifika Iusi :

(Eng. Remigio da C.S dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun ADN, I.P

(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico No Beé
Saneamento ADN, I.P

(Eng. Decilindo de Lima Marques)
Chefe Seksaun Mecanical Electrical, Informasaun Tecnologia no Komunikasaun

Certifika Iusi

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coodenadora da Unidade de Controla e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.



ANEXU C1 (LacL-3)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Foun Escola Secundario Tecnica Vocasional Revina,Lacluta**
No. kontratu :

Data Inspesaun : 24-11-2022

Fatin Inspesaun : Revina,Lacluta

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.505961” 126.121089

End Point : Long :

Naran Inspector : **1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes**

2.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Serbisu hada batako ba teacher office remata,continua pembesian no bekisting ringbalk	



ANEXU C1 (LacL-3)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Foun Escola Secundario Tecnica Vocasional Revina,Lacluta
:

Serbisu hada
batako ba
Classroom
Building
remata,continua
pembesian no
bekisting ringbalk
no pengecoran





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



NARAN PROJECTO : NOVA CONSTRUCAO ESC. TECNICO VOCASIONAL(ESTV), RAVINA LACLUTA, DILOR VIQUEQUE
MINISTERIO : MEJD

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	Previous		This Billing		Up to Date	
			Amount	%	Amount	%	Amount	%
1	Preliminaries Works	\$ 3,025.00	\$ 1,472.50	0.42%	\$ -	0.00%	\$ 1,472.50	0.42%
2	Class Room Building C (2 Units)	\$ 126,858.29	\$ 31,714.57	9.12%	\$ 12,685.83	3.65%	\$ 44,400.40	12.77%
3	Teacher Office	\$ 90,459.80	\$ 18,091.96	5.20%	\$ 9,045.98	2.60%	\$ 27,137.94	7.80%
4	Toilet Building	\$ 31,352.51	\$ 5,692.73	1.64%	\$ -	0.00%	\$ 5,692.73	1.64%
5	Professional Sum for Water Borred	\$ 11,750.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
6	Professional Sum for SW (18% x (2+3+4))	\$ 44,760.71	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 308,206.31	\$ 56,971.76	16.38%	\$ 21,731.81	6.25%	\$ 78,703.57	22.63%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 30,820.63	\$ 5,106.09	1.47%	\$ 2,173.18	0.62%	\$ 7,279.27	2.09%
C	OVERHEAD	\$ 1,960.00	\$ 515.00	0.15%	\$ -	0.00%	\$ 515.00	0.15%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 6,819.74	\$ 1,133.64	0.33%	\$ 478.10	0.14%	\$ 1,611.74	0.46%
E	TOTAL COST (A + B + C + D + E)	\$ 347,806.68	\$ 63,726.49	18.32%	\$ 24,383.09	7.01%	\$ 88,109.58	25.33%

Prepared By


Cheked By

Aproved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeitu Edificio Publiku No Bee
Saneamento ADN, I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN, I.P.

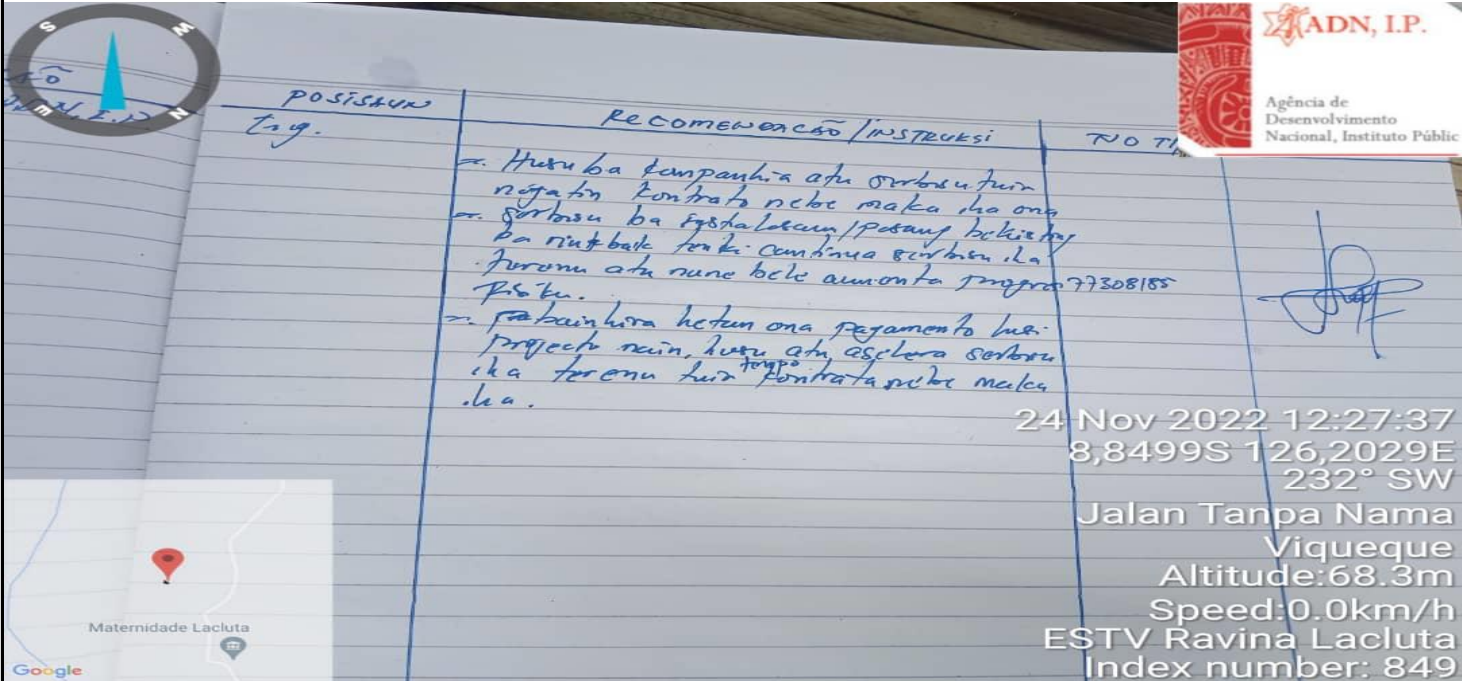 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN NOVA CONSTRUCAO ESC. TECNICO VOCASIONAL(ESTV), RAVINA LACLUTA, DILOR VIQUEQUE Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	24/11/2022	Lacluta	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Husu ba kompanhia atu serbisu tuir nafatin dezenho,boq no spesifikasaun nebe maka iha ona kontrato laran	
					2	Husu ba site eng. Atu ativo iha tereno atu bele fasilita ou orienta badaen sira halo serbisu	
					3		
					4		



ANEXU C1 (Ossu-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Uaibobo**
No. kontratu :

Data Inspesaun : 25-11-2022

Fatin Inspesaun : Uaibobo

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.525418” 126.2155866

End Point : Long :

Naran Inspector : **1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes**
2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu pas.batako remata continua ba servisu
pembesian ringbalk

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Ossu-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Uaibobo
No. kontratu :



Sketch & Foto Desenho



Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Ossu-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Uaibobo**

No. kontratu :

Sketch Item servisu :

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Naran Projeitu : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Uaibobo
Lokalidade : Wainisi uiaibobo ossu viqueque
Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount \$	%	Amount \$	%	Amount \$	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,832.93	\$ -	0.00%	\$ 1,445.43	1.24%	\$ 1,445.43	1.24%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	C/39 (i)	US\$ 67,092.51	\$ -	0.00%	\$ 17,534.74	14.99%	\$ 17,534.74	14.99%
III	TOILET BUILDING		US\$ 27,475.49	\$ -	0.00%	\$ 8,295.86	7.09%	\$ 8,295.86	7.09%
IV	PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 9,235.25	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 107,636.18	\$ -	0.00%	\$ 27,276.03	23.32%	\$ 27,276.03	23.32%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 847.50	0.72%	\$ 847.50	0.72%
GRAND TOTAL			US\$ 116,976.18	\$ -	0.00%	\$ 28,123.53	24.04%	\$ 28,123.53	24.04%

Prepared By

Checked By

Aproved By

Eng. Bebiano Crecêncio De Jesus Lopes
Eng. Município Viqueque ADN, I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeitu Edifício Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN, I.P.



ANEXU C1 (Ossu-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre Escolar Uaibua
No. kontratu :

Data Inspesaun : 11-11-2022

Fatin Inspesaun : Ossu Decima, Ossu

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.449576" 126.228748

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Serbisu atap seng remata continua serbisu plesteran dinding	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Ossu-11)

Back-up Data

Naran Projeto

: Nova Construção da Escola Pre Escolar Uaibua

No. kontratu

:





ANEXU C1 (Ossu-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre Escolar Uaibua

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	



ANEXU C1 (Ossu-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre Escolar Uaibua

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
-----------------------	---------------------------------------



ANEXU C1 (Ossu-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre Escolar Uaibua

No. kontratu :

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Ossu-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre Escolar Uaibua

No. kontratu :

Sketch Item servisu

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projeitu : Nova Construção da Escola Pre Escolar Uaibua no code emis 1694
Lokalidade : Lugabuti, Ossu de Cima, Ossu, Viqueque
Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY									
				Previous		This Billing		Up to Date	
	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,579.26	1,789.63	2.06%	\$ 357.93	0.41%	2,147.56	2.48%
II	CLASSROOM BUILDING	C/39 (i)	US\$ 62,959.35	20,217.74	23.31%	\$ 18,887.81	21.78%	39,105.54	45.08%
III	PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 10,860.91	2,437.72	2.81%	\$ -	0.00%	2,437.72	2.81%
CONSTRUCTION COST			US\$ 77,399.52	24,445.09	28.18%	\$ 19,245.73	22.19%	43,690.82	50.37%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00	-	0.00%	\$ -	0.00%	-	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	1,572.50	1.81%	\$ 2,536.00	2.92%	4,108.50	4.74%
GRAND TOTAL			US\$ 86,739.52	26,017.59	30.00%	\$ 21,781.73	25.11%	47,799.32	55.11%

Prepared By

Cheked By

Aproved By

Eng. Bebiano Crecêncio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeitu Edificio Publiku No
Bee Saneamento

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade



ANEXU C1 (Ossu-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola secundaria geral olocassa
No. kontratu :

Data Inspesaun : 11-11-2022

Fatin Inspesaun : Ossu Decima, Ossu

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.525418” 126.2155866

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu atap seng ba classroom
Building remata continua serbisu
plesteran dinding

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Ossu-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola secundaria geral olocassa

No. kontratu :

Serbisu atap seng ba Toilet Building
remata continua serbisu plesteran
dinding





ANEXU C1 (Ossu-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola secundaria geral olocassa
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	



ANEXU C1 (Ossu-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola secundaria geral olocassa

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
-----------------------	---------------------------------------



ANEXU C1 (Ossu-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola secundaria geral olocassa

No. kontratu :

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Ossu-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola secundaria geral olocassa

No. kontratu :

Sketch Item servisu

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu



Naran Projeitu : Nova Construção da Escola secundaria geral olocassa no code emis 1151.
Lokalidade : baca isi ossu de cima viqueque villa
Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This billing		Up to Date	
				Amount \$	%	Amount \$	%	Amount \$	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,075.00	\$ -	0.00%	\$ 922.50	1.05%	\$ 922.50	1.05%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 59,579.97	\$ 14,416.18	23.05%	\$ 17,873.99	20.44%	\$ 32,290.17	43.48%
III	TOILET BUILDING		US\$ 7,549.35	\$ 4,514.22	5.79%	\$ 3,019.74	3.45%	\$ 7,533.95	9.25%
IV	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 7,909.41	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 78,113.73	\$ 18,930.40	28.84%	\$ 21,816.23	24.95%	\$ 40,746.63	53.79%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
GRAND TOTAL			US\$ 87,453.73	\$ 18,930.40	28.84%	\$ 21,816.23	24.95%	\$ 40,746.63	53.79%

Prepared By

Cheked By

Aproved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeitu Edificio Publiku No
Bee Saneamento

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



ANEXU C1 (Uatocarbau-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica central uatocarbao
No. kontratu :

Data Inspesaun : 09-11-2022

Fatin Inspesaun : Irabin Literia,Uatocarbau

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.452418” 126.4144874

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu instalasaun kakuluk (atap
seng) remata continua serbisu
plesteran

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Uatocarbau-7)

Back-up Data

Naran Projeto

: Nova Construção da Escola basica central uatocarbau

No. kontratu

:





ANEXU C1 (Uatocarbau-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica central uatocarbao
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	



ANEXU C1 (Uatocarbau-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica central uatocarbao

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Uatocarbau-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica central uatocarbao

No. kontratu :

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Uatocarbau-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica central uatocarbao

No. kontratu :

Sketch Item servisu

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



Naran Projetu : Nova Construção da Escola basica central uatocarbau no code emis 5319
Lokalidade : Matadalan,, Irabin de Bixo,UatoCarbau, viqueque.
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,879.26	\$ 1,289.26	1.52%	\$ 775.85	0.91%	\$ 2,065.11	2.43%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	C/39 (i)	US\$ 66,202.64	\$ 17,404.16	20.47%	\$ 19,860.79	23.36%	\$ 37,264.96	43.83%
IV	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 5,594.73	\$ 2,857.02	3.36%	\$ -	0.00%	\$ 2,857.02	3.36%
CONSTRUCTION COST			US\$ 75,676.63	\$ 21,550.44	25.35%	\$ 20,636.64	24.27%	\$ 42,187.08	49.62%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 540.00	0.64%	\$ 2,536.00	2.98%	\$ 3,076.00	3.62%
GRAND TOTAL			US\$ 85,016.63	\$ 22,090.44	25.98%	\$ 23,172.64	27.26%	\$ 45,263.08	53.24%

Prepared By

Choked By

Aproved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN,I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engineiro Senior ba Projetoit Edificio Publiku No
Bee Saneamento ADN,I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P.



ANEXU C1 (Uatocarbau-8)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Ensino Secundario Geral Uatocarbau
No. kontratu :

Data Inspesaun : 23-11-2022

Fatin Inspesaun : Irabin de Bixo, Posto Administrativo Uato Carbau

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.4458932” 126.421584

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Serbisu instalasaun atap seng ba classroom remata continua servisu plesteran dinding	 23 Nov 2022 11:21:12 8,7497S 126,7002E 112° E Altitude: 1.6m Speed: 0.0km/h ESG Uatocarbau Index number: 801



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Uatocarbau-8)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Nova Construção da Escola Ensino Secundario Geral Uatocarbau
:

	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Naran Projeitu : Nova Construção da Escola ESG Uatucarbau
Lokalidade : Irabin de Bixo, Posto Administrativo Uato Carbau, Municipio Viqueque
Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount	%	Amount	%	Amount	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 4,279.26	\$ 3,120.02	3.44%	\$ -	0.00%	\$ 3,120.02	3.44%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	C/39 (i)	US\$ 73,342.16	\$ 29,481.99	32.54%	\$ 14,668.43	16.19%	\$ 44,150.42	48.73%
III	PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 3,633.93	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 81,255.35	\$ 32,602.01	35.99%	\$ 14,668.43	16.19%	\$ 47,270.44	52.18%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,808.00	2.00%	\$ 1,268.00	1.40%	\$ 3,076.00	3.40%
GRAND TOTAL			US\$ 90,595.35	\$ 34,410.01	37.98%	\$ 15,936.43	17.59%	\$ 50,346.44	55.57%

Prepared By

Checked By

Aproved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeitu Edificio Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



ANEXU C1 (Uatolari-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction Of Chapel Betesda Naedala Affaloicai-Uatolari**
No. kontratu :

Data Inspesaun : 23-11-2022

Fatin Inspesaun : Afaloicai

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.5119278, 126.2148024

End Point : Long :

Naran Inspector : **1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes**
2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu pengecoran kuda2 remata
continua serbisu pas.gording

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Uatolari-10)

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Of Chapel Betesda Naedala Affaloicai-Uatolari

No. kontratu

:





ANEXU C1 (Uatolari-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction Of Chapel Betesda Naedala Affaloicai-Uatolari**
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	



ANEXU C1 (Uatolari-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction Of Chapel Betesda Naedala Affaloicai-Uatolari**

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
-----------------------	---------------------------------------



ANEXU C1 (Uatolari-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction Of Chapel Betesda Naedala Affaloicai-Uatolari**

No. kontratu :

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Uatolari-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction Of Chapel Betesda Naedala Affaloicai-Uatolari**

No. kontratu :

Sketch Item servisu

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu



PROJECT OWNER : IGREJA PROTESTANTE IHA TIMOR LESTE-TEGIAO LESTE
PROJECT TITLE : NEW CONSTRUCTION OF CAPELA
PROJECT LOCATION : BETESDA NAEDALA,SUCO AFALOICAI,UATOLARI VIQUEQUE
TOTAL FLOOR AREA : 162 M2

SUMMARY

ITEM NO.	DESCRIPTION	ORIGINAL	PREVIOUS		THIS MONTH		UP TO DATE	
			AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%
	MAIN BUILDING WORKS							
I	GENERAL WORKS	\$ 10,401.01	\$ 3,953.78	2.36%	\$ -	0.00%	\$ 3,953.78	2.36%
II	EARTH AND SAND WORKS	\$ 3,147.42	\$ 3,162.72	1.88%	\$ -	0.00%	\$ 3,162.72	1.88%
III	WALL MASONRY AND PLASTER WORKS	\$ 4,917.75	\$ 4,917.75	2.93%	\$ -	0.00%	\$ 4,917.75	2.93%
IV	CONCRETE WORKS	\$ 35,597.61	\$ 35,597.61	21.22%	\$ -	0.00%	\$ 35,597.61	21.22%
V	ROOFING WORKS	\$ 15,555.58	\$ 4,297.97	2.56%	\$ 6,222.23	3.71%	\$ 10,520.20	6.27%
VI	CEILING WORKS	\$ 8,757.87	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
VII	CARPENTRY WORKS	\$ 11,606.00	\$ 2,628.00	1.57%	\$ -	0.00%	\$ 2,628.00	1.57%
VIII	ELECTRICAL WORKS	\$ 3,474.86	\$ 2,136.00	1.27%	\$ -	0.00%	\$ 2,136.00	1.27%
IX	HIDRAULIC WORKS	\$ 5,621.93	\$ 602.01	0.36%	\$ -	0.00%	\$ 602.01	0.36%
X	FLOOR WORKS	\$ 12,784.71	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
XI	PAINTING WORKS	\$ 3,564.81	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
XII	NEW CONSTRUCTION OF FENCE	\$ 29,839.95	\$ 8,050.66	4.80%	\$ 2,983.99	1.78%	\$ 11,034.66	6.58%
A	TOTAL (I +II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	\$ 145,269.48	\$ 65,346.51	38.95%	\$ 9,206.23	5.49%	\$ 74,552.73	44.43%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 14,526.95	\$ 6,534.65	3.89%	\$ 920.62	0.55%	\$ 7,455.27	4.44%
C	OVERHEAD	\$ 4,700.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 3,289.93	\$ 1,437.62	0.86%	\$ 202.54	0.12%	\$ 1,640.16	0.98%
E	GRAN TOTAL	\$ 167,786.36	\$ 73,318.78	43.69%	\$ 10,329.39	6.16%	\$ 83,648.17	49.85%

Prepared By

Cheked By

Aproved By

Eng. Bebiano Crecêncio de Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



ANEXU C1 (UatL-13)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Ensino Básica Filial Uaibira
No. kontratu :

Data Inspesaun : 23-11-2022

Fatin Inspesaun : Uaibira Vessoru

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.525418” 126.2155866

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu pas.batako remata continua ba servisu
pembesian ringbalk

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (UatL-13)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Ensino Básica Filial Uaibira
No. kontratu :



Sketch & Foto Desenho



Observação in loco terreno no Foto Atual



ANEXU C1 (UatL-13)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Ensino Básica Filial Uaibira

No. kontratu :

Sketch Item servisu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projeitu : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Uaibira
Lokalidade : Bahao vesoru uatolari viqueque
Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount \$	%	Amount \$	%	Amount \$	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 4,075.00	\$ -	0.00%	\$ 1,500.00	1.45%	\$ 1,500.00	1.45%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 53,479.51	\$ -	0.00%	\$ 13,584.04	13.17%	\$ 13,584.04	13.17%
III	TOILET BUILDING		US\$ 26,888.26	\$ -	0.00%	\$ 8,997.48	8.73%	\$ 8,997.48	8.73%
IV	PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 9,335.21	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 93,777.97	\$ -	0.00%	\$ 24,081.52	23.35%	\$ 24,081.52	23.35%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 847.50	0.82%	\$ 847.50	0.82%
GRAND TOTAL			US\$ 103,117.97	\$ -	0.00%	\$ 24,929.02	24.18%	\$ 24,929.02	24.18%

Prepared By

Checked By

Aproved By

Eng. Bebiano Crecêncio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeitu Edificio Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN, I.P.



ANEXU C1 (Uatolari-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica Central
No. kontratu :

Data Inspesaun : 23-11-2022

Fatin Inspesaun : Matahoi, Uatolari

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.525418” 126.2155866

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Serbisu pas.atap seng	




ANEXU C1 (Uatolari-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica Central
No. kontratu :

Serbisu plesteran dinding bagian
dalam

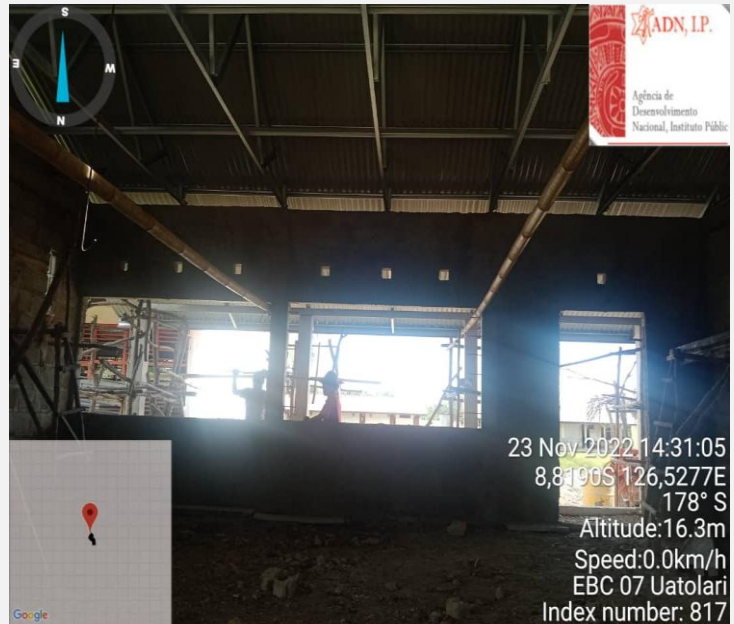



ANEXU C1 (Uatolari-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica Central
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	



ANEXU C1 (Uatolari-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica Central

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
-----------------------	---------------------------------------



ANEXU C1 (Uatolari-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica Central

No. kontratu :

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Uatolari-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica Central

No. kontratu :

Sketch Item servisu

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Naran Projetu : Nova Construção da Escola basica Central no code emis 5321
Lokalidade : Matahoi, Uatolari, Viqueque.
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous	This Billing		Up to Date	
				%	Amount	%	Amount	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,875.00	2.22%	\$ 775.00	1.10%	\$ 2,332.50	3.32%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 53,213.90	18.53%	\$ 21,285.56	30.33%	\$ 34,291.54	48.85%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 3,762.31	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 60,851.21	20.75%	\$ 22,060.56	31.43%	\$ 36,624.04	52.18%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	1.21%	\$ -	0.00%	\$ 847.50	1.21%
GRAND TOTAL			US\$ 70,191.21	21.96%	\$ 22,060.56	31.43%	\$ 37,471.54	53.38%

Prepared By

Choked By

Aproved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engineiro Senior ba Projeitu Edificio Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



ANEXU C1 (Uatolari-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica filial ualaka
No. kontratu :

Data Inspesaun : 09-12-2022

Fatin Inspesaun : Macadiki

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.4514286” 126.3157234

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Serbisu instalasaun kuda2 no gording remata continua servisu atap seng..	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Uatolari-16)


Back-up Data

Naran Projeto

: Nova Construção da Escola basica filial ualaka

No. kontratu

:

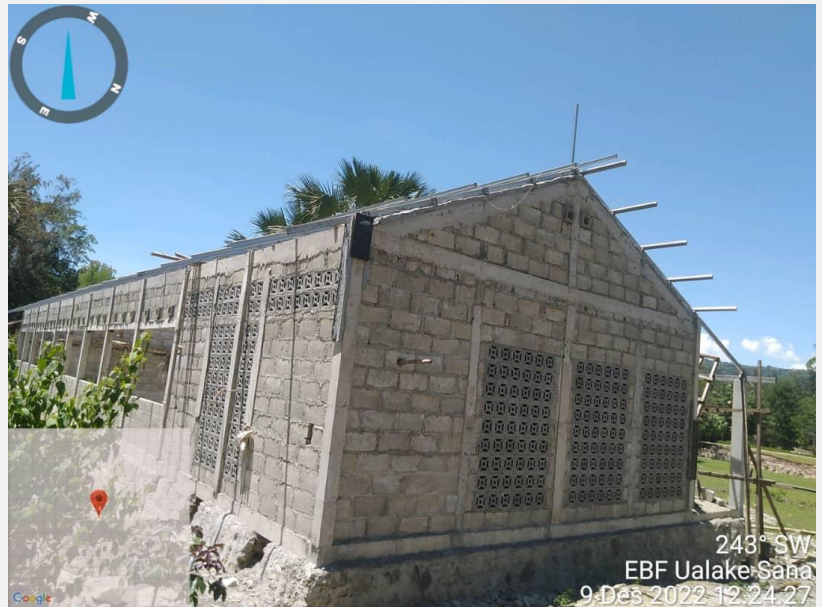



ANEXU C1 (Uatolari-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica filial ualaka

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	



ANEXU C1 (Uatolari-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica filial ualaka
No. kontratu :

--	--

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Uatolari-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica filial ualaka

No. kontratu :

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Uatolari-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica filial ualaka

No. kontratu :

Sketch Item servisu



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projetu : Nova Construção da Escola basica filial ualaka no code emis 791
Lokalidade : Sana uaitame Uatolari viqueque
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount \$	%	Amount \$	%	Amount \$	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,879.26	\$ 1,979.26	1.86%	\$ 387.93	0.36%	\$ 2,367.19	2.22%
II	CLASSROOM BUILDING Cb	C/39 (i)	US\$ 78,149.38	\$ 13,922.85	13.08%	\$ 36,730.21	34.50%	\$ 50,653.06	47.57%
IV	PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 15,106.78	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 97,135.42	\$ 15,902.11	14.94%	\$ 37,118.13	34.86%	\$ 53,020.25	49.80%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 1,585.00	1.49%	\$ 1,585.00	1.49%
GRAND TOTAL			US\$ 106,475.42	\$ 15,902.11	14.94%	\$ 38,703.13	36.35%	\$ 54,605.25	51.29%

Prepared By

Choked By

Aproved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeitu Edificio Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN,I.P.



ANEXU C1 (Uatolari-18)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Escola basica Felial debuisi
No. kontratu :

Data Inspesaun : 24-11-2022

Fatin Inspesaun : Macadiki, Uatolari

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.4441568” 126.3242492

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu instalasaun kakuluk (atap seng) ba
classroom building remata no plesteran mos
remata

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (Uatolari-18)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Escola basica Felial debuisi
No. kontratu :

Serbisu instalasaun kakuluk (atap seng) ba
Toilet building remata no plesteran mos
remata



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Uatolari-18)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Escola basica Felial debuisi

No. kontratu :

Sketch Item servisu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :



Naran Projetu : Nova Construção Escola basica Filial Debuisi
Lokalidade : Macadiki, Uatolari, Viqueque.
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount	%	Amount	%	Amount	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 2,800.00	\$ 1,400.00	1.43%	\$ 560.00	0.57%	\$ 1,960.00	2.00%
II	CLASSROOM BUILDING CDL	C/39 (i)	US\$ 46,972.86	\$ 11,743.22	7.18%	\$ 18,789.14	19.14%	\$ 30,532.36	26.32%
III	TOILET BUILDING	C/40	US\$ 25,936.05	\$ 7,780.82	7.93%	\$ 10,374.42	10.57%	\$ 18,155.24	18.49%
IV	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 13,123.60	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 88,832.51	\$ 20,924.03	21.31%	\$ 29,723.56	30.28%	\$ 50,647.59	51.59%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 3,170.00	3.23%	\$ 3,170.00	3.23%
GRAND TOTAL			US\$ 98,172.51	\$ 20,924.03	21.31%	\$ 32,893.56	33.51%	\$ 53,817.59	54.82%

Prepared By

Cheked By


Aproved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeltu Edifício Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.

ANEXUD(Uatolari-17)

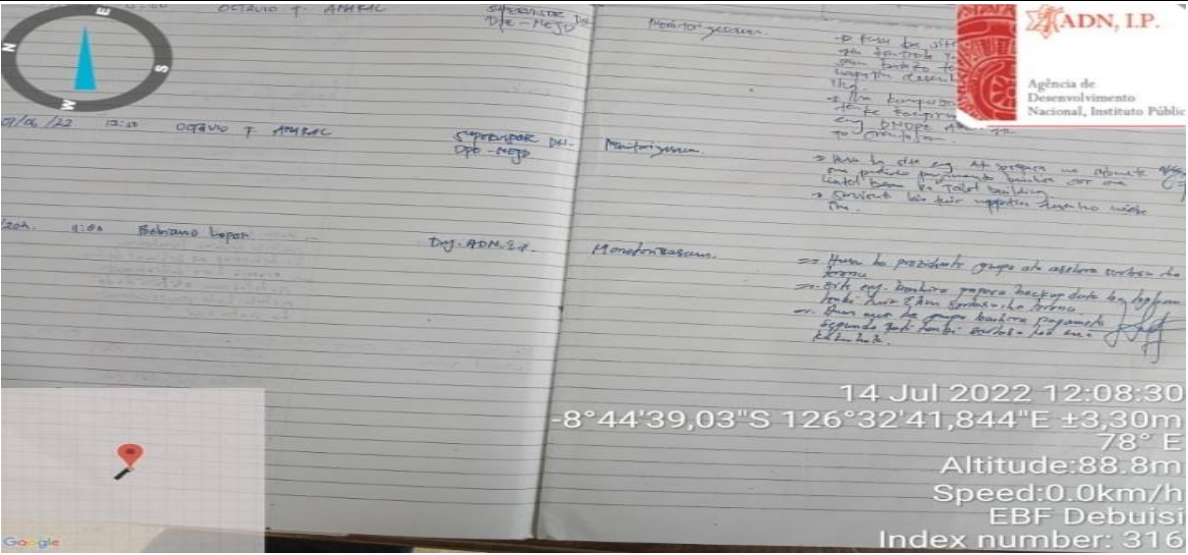 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Nova Construção Escola basica Felial debuisi							
Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	14/07/2022	Uatolari	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Husu ba grupu atu aselera serbisu iha terenu	
					2	Husu ba site eng. Bainhra atu prepara backup data pagamento tenki condis ho item serbisu iha terenu	
					3		
					4		



ANEXU C1 (Viqueque-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre-Escolar Maria Lobato
No. kontratu :

Data Inspesaun : 09-11-2022

Fatin Inspesaun : Bosa bein uma wain craic,viqueque villa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.553792” 126.242214

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Serbisu instalasaun kakuluk(atap seng) remata continua serbisu plesteran	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Viqueque-14)


Back-up Data

Naran Projeto

: Nova Construção da Escola Pre-Escolar Maria Lobato

No. kontratu

:

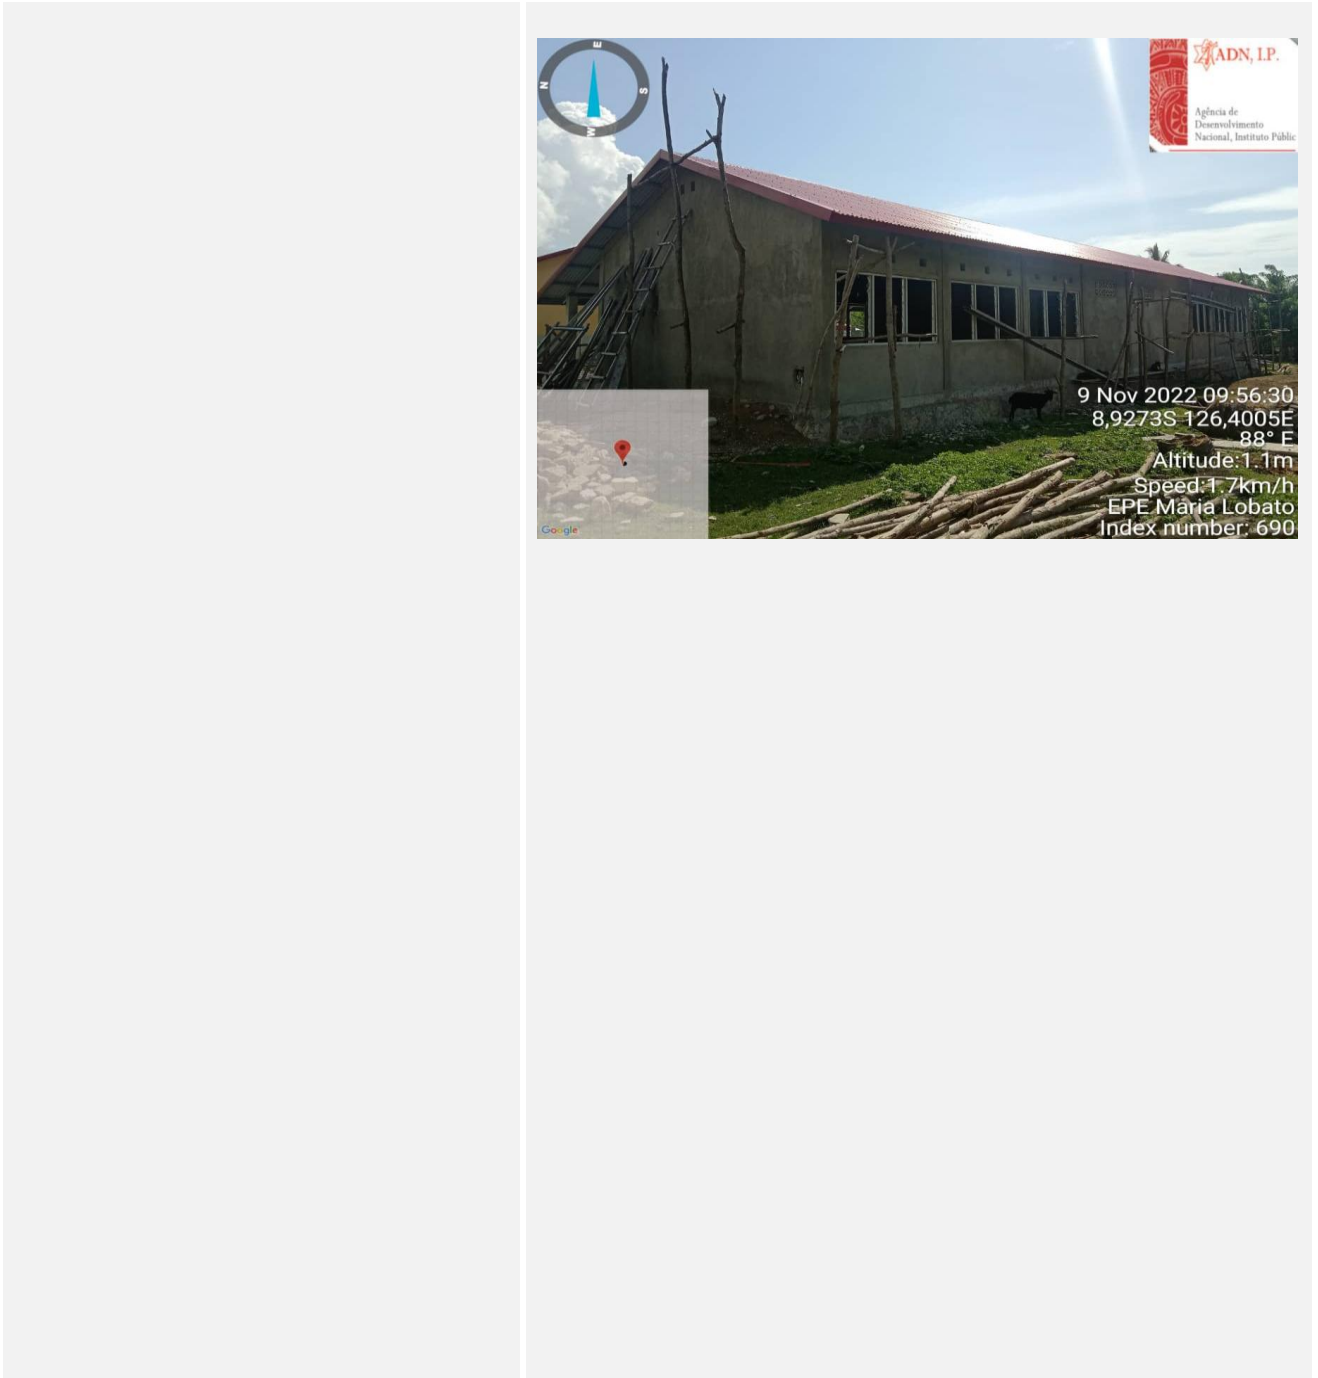



ANEXU C1 (Viqueque-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre-Escolar Maria Lobato

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	



ANEXU C1 (Viqueque-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre-Escolar Maria Lobato
No. kontratu :

--	--

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Viqueque-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre-Escolar Maria Lobato

No. kontratu :

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Viqueque-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre-Escolar Maria Lobato

No. kontratu :

Sketch Item servisu



Naran Projetu : Nova Construção da Escola maria lobato no code emis 1638
Lokalidade : Bosa bein uma wain craic viqueque villa
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up To Date	
				Amount \$	%	Amount \$	%	Amount \$	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,279.26	\$ 2,840.96	2.95%	\$ -	0.00%	\$ 2,840.96	2.95%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C/39 (i)	US\$ 56,119.79	\$ 32,463.92	33.46%	\$ 8,417.97	9.06%	\$ 40,881.89	42.52%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 24,199.84	\$ 920.71	0.93%	\$ -	0.00%	\$ 920.71	0.93%
CONSTRUCTION COST			US\$ 83,598.89	\$ 36,225.59	37.34%	\$ 8,417.97	9.06%	\$ 44,643.56	46.39%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 2,337.50	2.35%	\$ 1,268.00	1.36%	\$ 3,605.50	3.71%
GRAND TOTAL			US\$ 92,938.89	\$ 38,563.09	39.69%	\$ 9,685.97	10.42%	\$ 48,249.06	50.11%

Prepared By

Checked By


Aproved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN,I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio Publiku No
Bee Saneamento ADN,I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P.

ANEXU D (Viqueuqe-14)

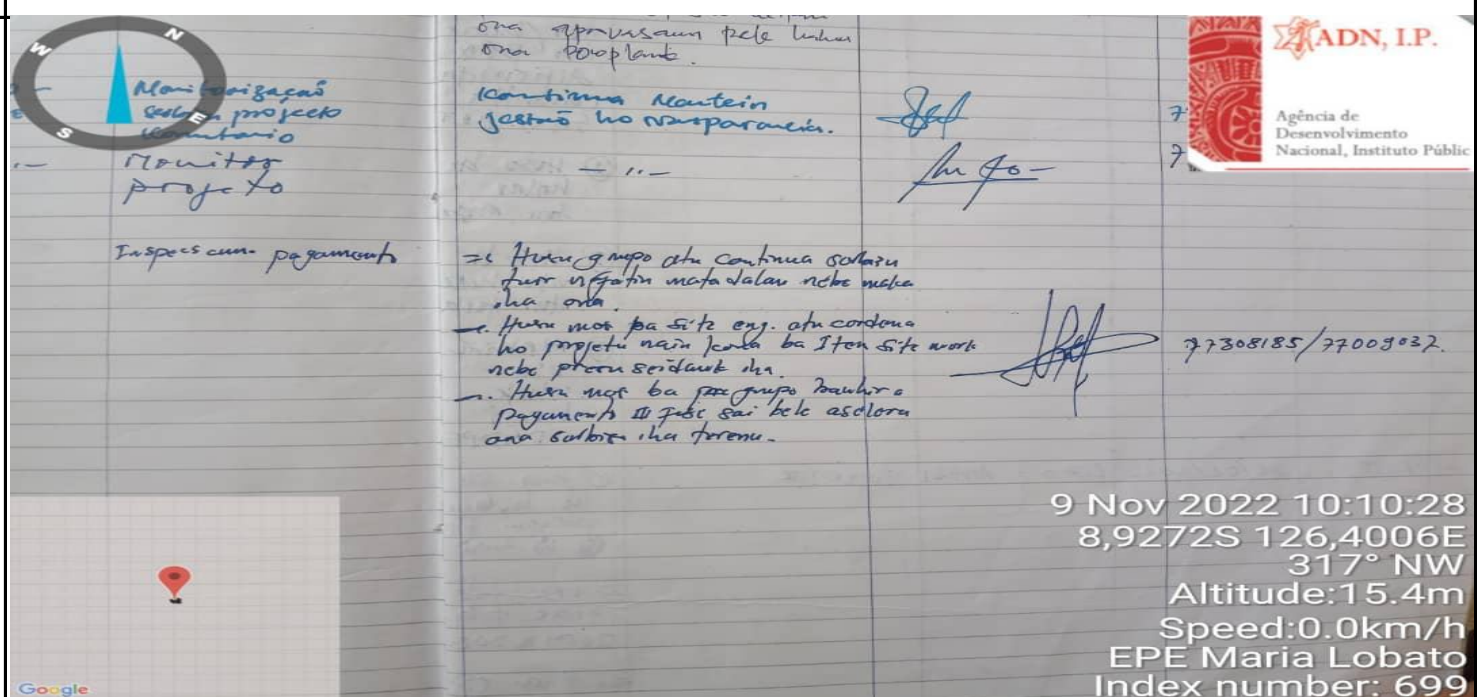 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público			INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
Nova Construção da Escola Pre-Escolar Maria Lobato									
Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO									
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura		
I	9/11/2022	Viqueuqe Vila	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Husu ba site eng. Atu update nafatin progress fisiku iha terenu			
					2	husu mos ba site eng.atu halo estimasaun ba item site preparation iha sub item pasangan pondasi			
					3	site eng.atu controla didiak badaen sira bainhra atu monta bekisting no besi ba ringbalk molok halo pengecoran			
					4				
 Handwritten report and map showing project progress, including a compass rose, a map of the site, and a list of tasks. 9 Nov 2022 10:10:28 8,9272S 126,4006E 317° NW Altitude:15.4m Speed:0.0km/h EPE Maria Lobato Index number: 699									



ANEXU C1 (Viqueque-15)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção rehabilitação Ensino Básica Central Caibira oan
No. kontratu :

Data Inspeção : 10-11-2022

Fatin Inspeção : Cabira Oan, Viqueque Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.525418" 126.2155866

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho	Observação iha terreno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Serbisu fisiku iha terenu remata ona 100% falta deit osan ba item contigencia	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Viqueque-15)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção rehabilitação Ensino Básica Central Caibira oan
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observação in loco terreno no Foto Atual



ANEXU C1 (Viqueque-15)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção rehabilitação Ensino Básica Central Caibira oan

No. kontratu :

Sketch Item servisu :

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observação iha terreno no Foto Atual

Sketch Item servisu :

--	--



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projeitu : Nova Construção rehabilitaun EBC Caibira oan
Lokalidade : Caibira oan viqueque villa
Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

		Original Contract		Previous		This Billing		Up to Date	
	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ 2,579.26	\$ 2,579.26	4.88%	\$ -	0.00%	\$ 2,579.26	4.88%
II	REFURBISHED CLASSROOM BUILDING Rf	C/39	US\$ 40,916.88	\$ 36,825.19	69.70%	\$ 4,091.69	7.74%	\$ 40,916.88	77.44%
CONSTRUCTION COST			US\$ 43,496.14	\$ 39,404.45	74.58%	\$ 4,091.69	7.74%	\$ 43,496.14	82.32%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 6,171.99	11.68%	\$ 168.01	0.32%	\$ 6,340.00	12.00%
GRAND TOTAL			US\$ 52,836.14	\$ 45,576.44	86.26%	\$ 4,259.70	8.06%	\$ 49,836.14	94.32%

Prepared By

Checked By

Approved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Município Viqueque ADN, I.P

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeitu Edifício Público No
Bee Saneamento ADN, I.P

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P



ANEXU C1 (Viqueque-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre-Escolar Sebastiao Gomes Uaimoritula
No. kontratu :

Data Inspesaun : 11-11-2022

Fatin Inspesaun : Uamori Tula,viqueque villa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.413588” 126.132604

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu atap seng remata continua
plesteran dinding

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (Viqueque-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre-Escolar Sebastiao Gomes Uaimoritula
No. kontratu :

Serbisu septitank





ANEXU C1 (Viqueque-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre-Escolar Sebastiao Gomes Uaimoritula

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	



ANEXU C1 (Viqueque-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre-Escolar Sebastiao Gomes Uaimoritula
No. kontratu :

--	--

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Viqueque-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre-Escolar Sebastiao Gomes Uaimoritula

No. kontratu :

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

--	--

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Viqueque-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre-Escolar Sebastiao Gomes Uaimoritula

No. kontratu :

Sketch Item servisu



Naran Projetu : Nova Construção da escola pre-escolar sebastiao gomes uaimoritula no code emis 1694
Lokalidade : uma liurai, uamoritula, viqueque villa.
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS		THIS BILLING		UP TODATE	
				AMOUNT \$	%	AMOUNT \$	%	AMOUNT \$	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 4,079.26	\$ 1,504.26	1.68%	\$ 1,631.70	1.83%	\$ 3,135.96	3.51%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C/39 (i)	US\$ 66,049.28	\$ 22,780.95	25.48%	\$ 21,796.26	24.38%	\$ 44,577.21	49.86%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 9,927.55	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 80,056.09	\$ 24,285.21	27.17%	\$ 23,427.97	26.21%	\$ 47,713.18	53.37%
CONTIGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,412.50	1.58%	\$ 1,902.00	2.13%	\$ 3,314.50	3.71%
GRAND TOTAL			US\$ 89,396.09	\$ 25,697.71	28.75%	\$ 25,329.97	28.33%	\$ 51,027.68	57.08%

Prepared By

Choked By

Aproved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN,I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio Publiku No Bee
Saneamento ADN,I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade ADN,I.P.



ANEXU C1 (Viqueque_17)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Were House And Landscaping Of Viqueque Distric
No. kontratu :

Data Inspesaun : 12-10-2022

Fatin Inspesaun : Rai Tahu, Viqueque Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.5441892, 126.2339576

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho

Serbisu pasangan batako ba Werehouse

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (Viqueque_17)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Were House And Landscaping Of Viqueque Distric

No. kontratu :

Sketch Item servisu :

Serbisu pas. Batako ba toilet building

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (Viqueque_17)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Were House And Landscaping Of Viqueque Distric
No. kontratu :

Serbisu sinta rai ba moru haleu
remata,continua ba serbisu hada batako



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Viqueque_17)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Were House And Landscaping Of Viqueque Distric

No. kontratu :

Sketch Item servisu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projectu : New Construction Office , Warehouse and Landscaping CSSM - Viqueque
Nain ba Projectu : Ministry Solidarity Social
Fatin Projectu : Suco Ratau, Viqueque Vila, Viqueque Municipality - Timor Leste

NO	DESCRIPTIONS OF WORKS	ORIGINAL CONTRAC	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
A.	OFFICE BUILDING	AMOUNTH \$	AMOUNTH \$	%	AMOUNTH \$	%	AMOUNTH \$	%
1	PREPARATION WORKS	\$ 14,760.92	\$ 903.93	0.11%	\$ 2,952.18	0.37%	\$ 3,856.11	0.48%
2	EARTH WORKS	\$ 22,432.19	\$ 22,466.83	2.79%	\$ -	0.00%	\$ 22,466.83	2.79%
3	MASONRY WORKS	\$ 82,579.83	\$ 82,579.83	10.25%	\$ -	0.00%	\$ 82,579.83	10.25%
4	CONCRETE WORKS	\$ 52,025.12	\$ 12,944.80	1.61%	\$ 39,080.33	4.85%	\$ 52,025.12	6.46%
5	ROOFING WORKS	\$ 46,919.22	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
6	CEILING WORKS	\$ 21,320.84	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
7	CARPENTRY WORKS	\$ 19,700.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
8	ELECTRICAL WORKS	\$ 11,318.39	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
9	SANITATION WORKS	\$ 9,903.36	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
10	PAINTING WORKS	\$ 7,588.47	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	TOTAL	\$ 288,548.35	\$ 118,895.38	14.76%	\$ 42,032.51	5.22%	\$ 160,927.89	19.98%
B.	WAREHOUSE							
1	EARTH WORKS	\$ 4,425.76	\$ 756.06	0.09%	\$ 3,669.69	0.46%	\$ 4,425.76	0.55%
2	MASONRY WORKS	\$ 14,378.42	\$ 14,378.42	1.79%	\$ -	0.00%	\$ 14,378.42	1.79%
3	CONCRETE WORKS	\$ 34,502.01	\$ 12,066.59	1.50%	\$ 22,435.42	2.79%	\$ 34,502.01	4.28%
4	ROOFING WORKS	\$ 28,120.33	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
5	CARPENTRY WORKS	\$ 6,269.62	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
6	ELECTRICAL WORKS	\$ 2,497.99	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
7	PAINTING WORKS	\$ 2,745.37	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	TOTAL	\$ 92,939.50	\$ 27,201.07	3.38%	\$ 26,105.11	3.24%	\$ 53,306.19	6.62%
C.	LANDSCAPING WORKS							
1	PARK AND OFFICE PLATFORM WORKS	\$ 192,445.89	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
2	PARK ELECTRICAL WORKS	\$ 4,922.36	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
3	FENCE WOKS	\$ 89,396.67	\$ 34,354.93	4.27%	\$ 8,939.67	1.11%	\$ 43,294.60	5.38%
4	SECURITY POST	\$ 32,014.67	\$ 7,441.41	0.92%	\$ -	0.00%	\$ 7,441.41	0.92%
	TOTAL	\$ 318,779.58	\$ 41,796.34	5.19%	\$ 8,939.67	1.11%	\$ 50,736.00	6.30%
I	TOTAL (A+B+C)	\$ 700,267.43	\$ 187,892.79	23.33%	\$ 77,077.29	9.57%	\$ 264,970.08	32.90%
II	CONTRACTOR FEE & OVERHEAD 10% x I	\$ 70,026.74	\$ 18,789.28	2.33%	\$ 7,707.73	0.96%	\$ 26,497.01	3.29%
III	OVERHEAD	\$ 5,550.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
IV	TAX 2% x (I+II+III)	\$ 15,516.88	\$ 4,133.64	0.51%	\$ 1,695.70	0.21%	\$ 5,829.34	0.72%
V	CONTINGENCY 2% x I	\$ 14,005.35	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
VI	GRAND TOTAL (I+II+III+IV+V)	\$ 805,366.41	\$ 210,815.71	26.16%	\$ 86,480.72	10.74%	\$ 297,296.43	36.90%

Prepared By

Choked By

Aproved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque, ADN, I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeitu Edificio Publiku No Bee
Saneamento, ADN,I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade, ADN,I.P.



ANEXU C1 (Oss-8)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Riral Roads Periodic Maintenance ossu - Nahareka Chainage 4+350 - 6+350**

No. kontratu : **MPW-W-NCB-R-190037**

Data Inspesaun : 22/11/2022

Fatin Inspesaun : Ossu - Nahareka

Koordinadas :


Start Point : Long : (8.75602 S), Latetude : (126.41340 E)

End Point : Long : (8.74723 S), Latetude : (126.42692 E)

Naran Inspector : **Eng. Roberto M. Martins**

: **Eng. Salvador Martins**

: **Eng. Camilo Maia**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Structures W=2.5 m H = 0.12 m Distance = 804 m Volume = 241.20 Cu.m 	Plam Concrete:




ANEXU C1 (Oss-8)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Riral Roads Periodic Maintenance ossu - Nahareka Chainage
4+350 - 6+350**

No. kontratu : **MPW-W-NCB-R-190037**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Servisu: Structures Volume of Stone masonry = 27.54 Cu.m 	Stone masonry – finished: Sta.4+612 – 4+929 (Rs/Ls)



#ANEXU C2 (Oss-8)

Project : R4D Riral Roads Periodic Maintenance ossu - Nahareka Chainage 4+350 - 6+350

Location : Viqueque, Ossu

Contractor : Fin-Los Unip. Lda JV Costa Key Unip. Lda

Progress : November 2022

Backup Data

PAY ITEM NO.	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS A D N, I.P					
		COST \$	% BILLED	PREVIOUS PROGRES		THIS PERIOD		TO DATE	
				AMOUNT (USD)	% BILLED	22-Nov-22			
						AMOUNT (USD)	% BILLED	AMOUNT (USD)	% BILLED
		(b)							
R-01	General	\$ 22,453.81	4.57%	\$ 2,400.00	0.49%	\$ -	0.00%	\$ 2,400.00	0.49%
R-03	Earth Work	\$ 26,390.22	5.37%	\$ 14,933.41	3.04%	\$ 37.48	0.01%	\$ 14,970.89	3.04%
R-05	Sub Base, base and pavement	\$ 3,862.26	0.79%	\$ -	0.00%	\$ 3,862.26	0.79%	\$ 3,862.26	0.79%
R-07	Bitumenous pavement	\$ 686.25	0.14%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structures	\$ 338,482.09	68.83%	\$ 63,730.93	12.96%	\$ 46,290.47	9.41%	\$ 110,021.40	22.37%
R-10	Dayworks	\$ 1,000.00	0.20%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 1,642.00	0.33%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-13	General expenses	\$ 6,692.16	1.36%	\$ 5,576.16	1.13%	\$ 1,504.25	0.31%	\$ 7,080.41	1.44%
R-15	Provisional sum	\$ 550.00	0.11%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Total - net		\$ 401,758.78	81.70%	\$ 86,640.50	17.62%	\$ 51,694.46	10.51%	\$ 138,334.96	28.13%
R-14-01	Profit (net cost x %) ; 10%	\$ 40,175.88	8.17%	\$ 8,664.05	1.76%	\$ 5,169.45	1.05%	\$ 13,833.50	2.81%
R-17-01	Overheads (supervision and risk) net cost x % ; 10%	\$ 40,175.88	8.17%	\$ 8,664.05	1.76%	\$ 5,169.45	1.05%	\$ 13,833.50	2.81%
R-19-01	Tax ((net cost + profit + overhead) x 2 %)	\$ 9,642.21	1.96%	\$ 2,079.37	0.42%	\$ 1,240.67	0.25%	\$ 3,320.04	0.68%
Total - Gross		\$ 491,752.56	100.00%	\$ 106,047.97	21.57%	\$ 63,274.02	12.87%	\$ 169,322.00	34.44%

Prepara Husi :

1. Eng. Roberto M. Martins

2. Eng. Salvador Martins

3. Eng. Camilo Maia

Eng. ba projeto infraestrutura, transporte e irigasaun
Município Viqueque ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng. Remigio da C. S. dos Santos

Engenheiro Senior ba projeto infraestrutura,
transporte e irigasaun ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas

Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

**Naran projeto :R4D Riral Roads Periodic Maintenance ossu - Nahareka
Chainage 4+350 - 6+350**

Kompanha : Fin-Los Unip. Lda JV Costa Key Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	22/11/2022	Ossu	Roberto M.Martins	Eng.ITI,ADN,I P. Municipio Viqueque	1	Inspesaun ba pagamentu	
II	22/11/2022	Ossu	Salvador Martins	Eng.ITI,ADN,I P. Municipio Viqueque			
III	22/11/2022	Ossu	Camilo Maia	Eng.ITI,ADN,I P. Municipio Viqueque			



ANEXU C1 (Vqq-3)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Roads From Junction Bemvindo Bahalara - Uain We Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000 - 5+500 Municipality Viqueque**

No. kontratu : **SSS/163/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : **10/11/2022**

Fatin Inspesaun : **Viqueque Villa, Bahalara Wain**

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. -8.545175), Latetude : (E. 126.171758)

End Point : Long : (S. -8.572704), Latetude : (E. 126.192915)

Naran Inspector : **Eng. Roberto M. Martins**

: **Eng. Camilo Maia**


: **Eng. Salvador Martins**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Aggregate Sub-base

Total Volume of Aggregate Sub-base Course

= 17,689.28 Cu.m



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Aggregate Sub-base:



ANEXU C1 (Vqq-3)

Back-up Data

Naran Projeto

: **Rehabilitation of Roads From Junction Bemvindo Bahalara - Uain We Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000 - 5+500 Municipality Viqueque**

No. kontratu

: **SSS/163/MOPTC-2017**


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu: DRAINAGE AND
SLOOPE PROTECTION STRUCTURES

Reinforcing Concrete Pipe Culvert
(RCPC):

Total Qty of RCPC 1000mm dia. = 141 L.m.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT : REHABILITATION OF ROADS FROM JUNCTION BEMVINDO BAHALARA - UAIN WE BUBUR-NATAR TALI BELANDA ROAD STA. 0+000 - 5+500
LOCATION : VIQUEQUE VILLA (Bahala-Uain We Bubur-Natar Tali Belanda)
CONTRACTOR : ARPY UNIPessoal LDA

SUMMARY

Bill No.	ITEM DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL		REVISE CONTRACT		PREVIOUS PROGRESS		Progres Phisic on November 2022		Progres Phisic Up To Date022		Remarks
		Total Amount US\$	Weight %	Total Amount US\$	Weight %	Total Cost (\$)	Weight %	Total Cost (\$)	Weight %	Total Cost (\$)	Weight %	
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 17,362.86	0.47%	\$ 17,362.86	0.47%	8681.428571	0.24%	\$ 8,681.43	0.24%	17362.86	0.47%	
200	EARTH WORK	\$ 569,423.92	15.53%	\$ 639,129.52	17.43%	\$ 538,134.82	14.68%	\$ 170,757.05	4.66%	\$ 708,891.86	19.33%	
400	SURFACE COURSE	\$ 431,757.11	11.77%	\$ 791,298.79	21.58%	\$ 227,161.97	6.19%	\$ 544,120.73	14.84%	\$ 771,282.70	21.03%	
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 114,425.04	3.12%	\$ 261,871.66	7.14%	\$ 3,759.15	0.10%	\$ 100,353.02	2.74%	\$ 104,112.17	2.84%	
600	DRAINAGE AND SLOOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 2,135,230.04	58.23%	\$ 1,558,536.14	42.50%	\$ 1,453,999.94	39.65%	\$ 37,311.42	1.02%	\$ 1,491,311.36	40.67%	
A	CONSTRUCTION COST	\$ 3,268,198.97	89.13%	\$ 3,268,198.97	89.13%	\$ 2,231,737.30	60.86%	\$ 861,223.64	23.49%	\$ 3,092,960.94	84.35%	
B	PROFIT & OVERHEAD (10%)*a	\$ 326,819.90	8.91%	\$ 326,819.90	8.91%	\$ 223,173.73	6.09%	\$ 86,122.36	2.35%	\$ 309,296.09	8.43%	
C	TAX 2%*(a+b)	\$ 71,900.38	1.96%	\$ 71,900.38	1.96%	\$ 49,098.22	1.34%	\$ 18,946.92	0.52%	\$ 68,045.14	1.86%	
D	TOTAL (a+b+c)	\$ 3,666,919.24	100%	\$ 3,666,919.24	100%	\$ 2,504,009.25	68.29%	\$ 966,292.93	26.35%	\$ 3,470,302.17	94.64%	

Prepara Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

1. Eng. Roberto M. Martins

2. Eng. Salvador Martins

3. Eng. Camilo Maia

Eng. ba projeto infraestrutura, transporte e irigasaun
Município Viqueque ADN I.P.

Eng. Remigio da C. S. dos Santos

Engenheiro Senior ba projeto infraestrutura, transporte e irigasaun ADN
I.P.

Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitation of Roads From Junction Bemvindo Bahalara - Uain We Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000 - 5+500 Municipality Viqueque Kompanha : Arpy Unipessoal, Lda		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	10/11/2022	Viqueque Villa	Roberto M. Martins	Eng.ITI,AND,I .P. Municipio Viqueque	1	Halo inspesaun ba pagamentu iha terreno	
II	10/11/2022	Viqueque Villa	Camilo Maia	Eng.ITI,AND,I .P. Municipio Viqueque			
III	10/11/2022	Viqueque Villa	Salvador Martins	Eng.ITI,AND,I .P. Municipio Viqueque			



ANEXU C1 (Oss-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Rehabilitation Ossu de Cima -Liawaioli Sta. 0+000 - 2+000
Municipality Viqueque
No. kontratu : SSS/064/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 20/10/2022

Fatin Inspesaun : Ossu de Cima

Koordinadas :

Start Point : Long : S -8.44713374 Latetude : E 126.221520561

End Point : Long : S -8.44337669 Latetude : E 126.213197652


Naran Inspector : Eng. Roberto M. Martins

Eng. Salvador Martins

Eng. Camilo Maia



Sketch & Foto Desenho

Total Volume of Stone masonry – finished
= 228.08 Cu.m

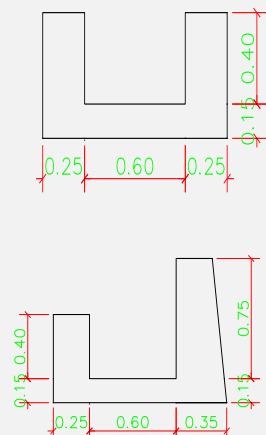

Observasaun iha tereno no Foto Aktual :

Stone masonry - finished

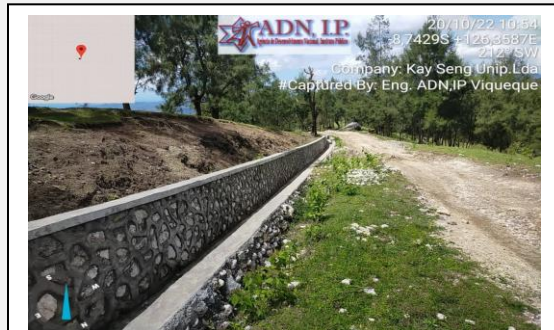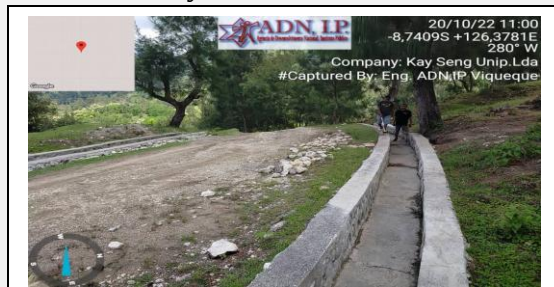




ANEXU C1 (Oss-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Rehabilitation Ossu de Cima -Liawaioli Sta. 0+000 - 2+000
Municipality Viqueque
No. kontratu : SSS/064/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Total Volumen of Granular pavement - gravel
surface = 160 Cu.m



Observasaun iha Terreno no Foto Aktual

Granular pavement - gravel surface





ANEXU2 (Os - 3)

Project Name : Rural Roads Rehabilitation Ossu de Cima-Liawaioli Chainage 0+000 - 2+000
Contract Number : NCB/056/MOP-2019
Contractor Name : Kay Seng Unip. Lda
Progress : November 2022

SUMMARY

Pay Item No.	ITEM DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		PROGRES PREVIOUS		PROGRES NOVEMBRO 2022		PROGRESS MONITORING UP TO NOVEMBERO 2022		
		AMOUNT (USD)	% BILLED	AMOUNT (USD)	% BILLED	AMOUNT (USD)	% BILLED	AMOUNT (USD)	% BILLED	REMARKS
R-01	General - works	\$ 4,200.00	1.41%		0.00%	\$ (100.00)	-0.03%	\$ 900.00	0.30%	
R-03	Earth works	\$ 29,277.97	9.81%		0.00%	\$ (269.07)	-0.09%	\$ 14,227.88	4.77%	
R-05	Sub-base and Pavement	\$ 31,217.05	10.46%		0.00%	\$ 10,576.58	3.54%	\$ 50,007.28	16.75%	
R-07	Bituminous pavement	\$ 49,565.25	16.60%		0.00%	\$ -	0.00%	\$ 19,721.54	6.61%	
R - 08	Structures	\$ 249,204.14	83.48%	\$ 18,926.00	6.34%	\$ -	0.00%	\$ 154,750.58	51.84%	
R - 10	Dayworks	\$ 750.00	0.25%		0.00%	\$ -	0.00%	\$ 600.00	0.20%	
R- 11	Routine Maintenance	\$ 2,647.00	0.89%		0.00%	\$ 5,815.30	1.95%	\$ 13,431.49	4.50%	
R-12	Cleaning	\$ 100.00	0.03%		0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	0.07%		0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
				\$ 18,926.00	6.34%	\$ 16,022.81	5.37%	\$ 253,638.77	84.97%	
GENERAL ITEM										
G-01	Security	\$ 1,440.00	0.48%	\$ -	0.00%	\$ 209.50	0.07%	\$ 240.00	0.08%	
G-02	Project team	\$ 31,080.00	10.41%	\$ 2,940.00	0.98%	\$ -	0.00%	\$ 8,420.00	2.82%	
G-03	Safety and protection	\$ 5,864.00	1.96%	\$ 1,171.00	0.39%	\$ 500.00	0.17%	\$ 3,784.00	1.27%	
G-05	Meetings	\$ 400.00	0.13%	\$ 400.00	0.13%	\$ 258.00	0.09%	\$ 400.00	0.13%	
G-06	Ceremonial costs	\$ 500.00	0.17%	\$ 200.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.07%	
G-07	Mineral fees	\$ 18,647.29	6.25%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
				\$ 4,711.00	1.58%	\$ 967.50	0.32%	\$ 13,044.00	4.37%	
A	Construction Cost	\$ 367,161.41	123.00%	\$ 18,926.00	6.34%	\$ 16,022.81	5.37%	\$ 34,948.81	11.71%	
B	Contrator Fee (Ax10%)			\$ 1,892.60	0.63%	\$ 1,602.28	0.54%	\$ 3,494.88	1.17%	
C	General Items	\$ 57,931.29	19.41%	\$ 4,711.00	1.58%	\$ 967.50	0.32%	\$ 5,678.50	1.90%	
D	Construction Tax (A+B+C x 2%)			\$ 510.59	0.17%	\$ 371.85	0.12%	\$ 882.44	0.30%	
Grand Total (US\$)		\$ 298,505.70	142.41%	\$ 26,040.19	8.72%	\$ 18,964.44	6.35%	\$ 45,004.63	15.08%	

Prepara Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

1. Eng. Roberto M. Martins

2. Eng. Salvador Martins

3. Eng. Camilo Maia

Eng. ba projeto infraestrutura, transporte e irigasaun
Município Viqueque ADN I.P.

Eng. Remigio da C. S. dos Santos

Engenheiro Senior ba projeto infraestrutura,
transporte e irigasaun ADN I.P.

Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas

Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P
Transportes e Irigasaun ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liawaioli Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality

Kompanha : Kay Seng Unip. Lda

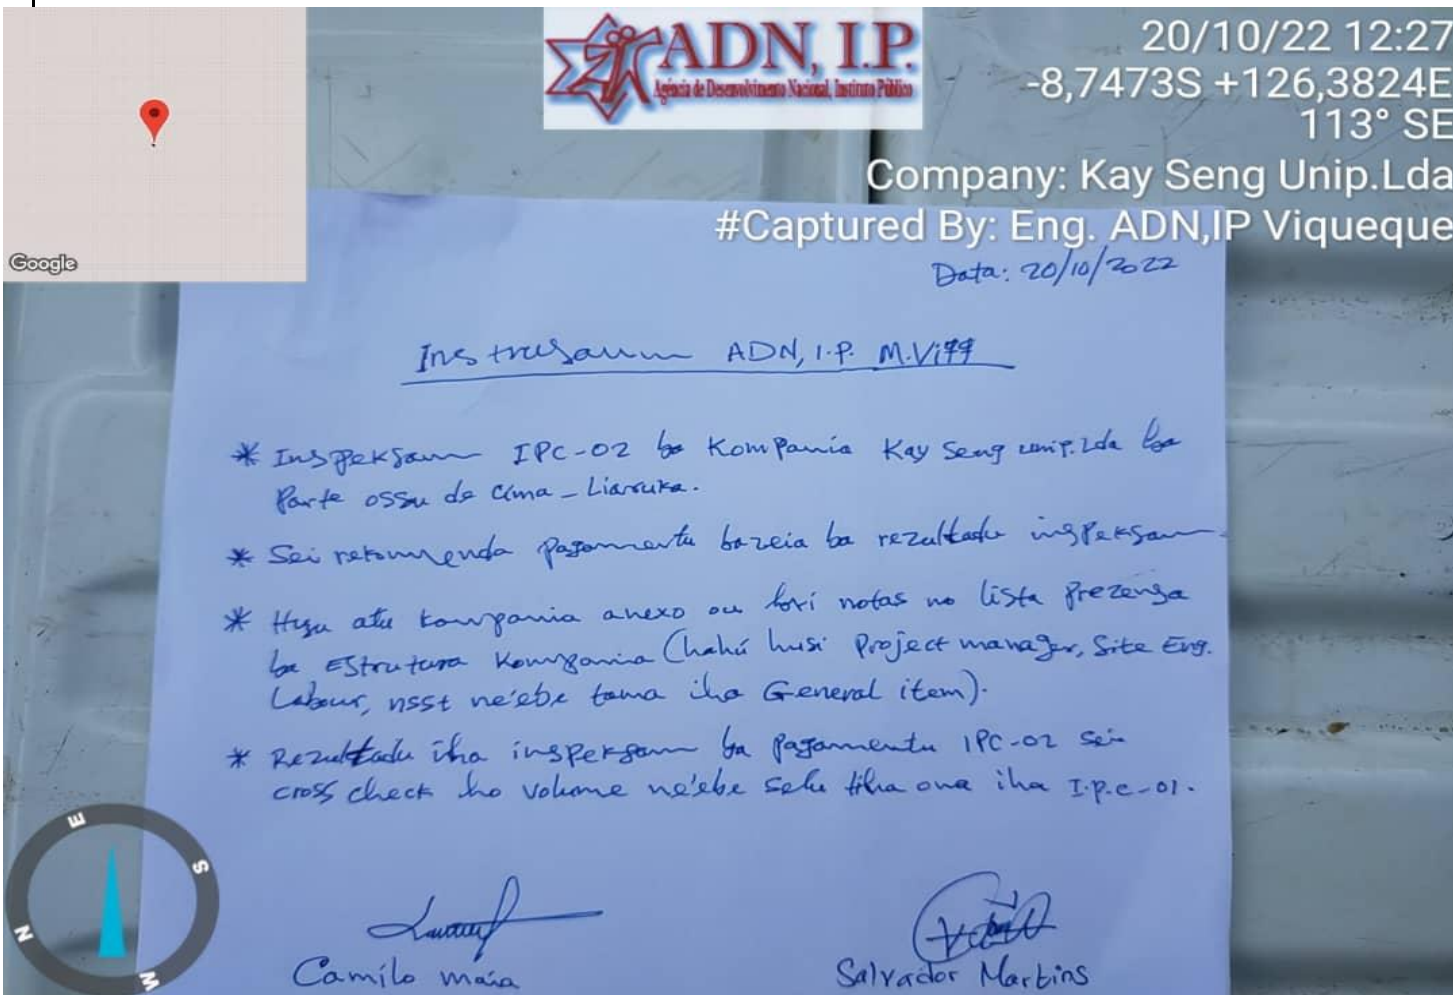No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	20/10/2022	Ossu.	Eng. Roberto M.M	Eng.ITI,ADN ,I.P, Municipio Viqueque	1	Halo inspesaun pagamentu iha terreno ba IPC 02	
II	20/10/2022	Ossu.	Eng. Salvador Martins	Eng.ITI,ADN ,I.P, Municipio Viqueque			
III	20/10/2022	Ossu.	Eng. Camilo Maia	Eng.ITI,ADN ,I.P, Municipio Viqueque			



ANEXU C1 (Lac.-4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency Project, Cyclone Seroja 04 April 2021, River Training Welolo, Viqueque Regularizasaun Temporaria (STA 0+220 to STA 0+340)**
No. kontratu : **MPW-W-220084**

Data Inspesaun : **13/10/2022**

Fatin Inspesaun : **Mota Welolo, Municipio Viqueque, Timor Leste.**

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.5611568 S Latetude : 126.12873 E

End Point : Long : 8.5616308 S Latetude : 126.1210392 E

Naran Inspector : **Eng. Roberto M. Martins**


Eng. Salvador Martins

Eng. Camilo Maia

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual :

Total Volume of Excavation
= 12,332.70 Cu.m



Excavation:





ANEXUC2 (Lac. - 4)

Project Name : Emergency Project, Cyclone Seroja 04 April 2021, River Training Welolo, Viqueque Regularizasaun Temporaria (STA 0+220 to STA 0+340)
Contract Number : MPW-W-220084
Contractor Name : Fin-Los Unipessoal Lda
Progress : November 2022

SUMMARY

Pay Item No.	ITEM DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS NOVEMBER 2022		PROGRESS MONITORING UP TO NOVEMBER 2022		
		AMOUNT (USD)	% BILLED	AMOUNT (USD)	% BILLED	AMOUNT (USD)	% BILLED	AMOUNT (USD)	% BILLED	REMARKS
I	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 8,300.00	18.77%	\$ -	0.00%	\$ 8,300.00	18.77%	\$ 8,300.00	18.77%	
II	EARTH WORKS	\$ 29,475.15	66.66%	\$ -	0.00%	\$ 29,475.15	66.66%	\$ 29,475.15	66.66%	
III	OVERHEAD WORKS	\$ 1,800.00	4.07%	\$ -	0.00%	\$ 1,800.00	4.07%	\$ 1,800.00	4.07%	
A	Construction Cost	\$ 37,775.15	85.43%	\$ -	0.00%	\$ 37,775.15	85.43%	\$ 37,775.15	85.43%	
B	Contrator Fee (Ax10%)	\$ 3,777.52	8.54%	\$ -	0.00%	\$ 3,777.52	8.54%	\$ 3,777.52	8.54%	
C	Over Head	\$ 1,800.00	4.07%	\$ -	0.00%	\$ 1,800.00	4.07%	\$ 1,800.00	4.07%	
D	Construction Tax (A+B+C x 2%)	\$ 867.05	1.96%	\$ -	0.00%	\$ 867.05	1.96%	\$ 867.05	1.96%	
Grand Total (US\$)		\$ 44,219.72	100.00%	\$ -	0.00%	\$ 44,219.72	100.00%	\$ 44,219.72	100.00%	

Prepara Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

1. Eng. Roberto M. Martins

2. Eng. Salvador Martins

3. Eng. Camilo Maia

Eng. ba projeto infraestrutura, transporte e irigasaun
Municipio Viqueque ADN I.P.

Eng. Remigio da C. S. dos Santos

Engineiro Senior ba projeto infraestrutura, transporte e irigasaun ADN I.P.

Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas

Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P
Transportes e Irigasaun ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Emergency Project, Cyclone Seroja 04 April 2021, River Training Welolo, Viqueque
Regularizasaun Temporaria (STA 0+220 to STA 0+340)

Kompanha : Fin-Los Unipessoal Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	13/10/2022	Ossu.	Eng. Roberto M.M	Eng.ITI,ADN ,I.P, Municipio Viqueque	1	Halo inspesaun pagamentu iha terreno ba IPC 01 ba projetu normalizasaun mota Welolo	
II	13/10/2022	Ossu.	Eng. Salvador Martins	Eng.ITI,ADN ,I.P, Municipio Viqueque			
III	13/10/2022	Ossu.	Eng. Camilo Maia	Eng.ITI,ADN ,I.P, Municipio Viqueque			

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Naran Eng. Camilo Maia							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Município MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	NOVEMBRO																														OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Lactuta	1	Package II Dilor	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

2022



 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng.	Camilo Maia						2022																															
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	NOVEMBRO																														OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	17	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uagua - Nahareka - Chainage 5 + 400 - 7 + 400	Walay Unip. Lda	RT/031/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Lao Hela
							Actual																															
	18	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uagua - Nahareka - Chainage 7 + 400 - 9 + 400	Fin-Los Unip. Lda	RT/032/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Lao Hela
							Actual																															
	19	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uagua - Nahareka - Chainage 9 + 400 - 11 + 400	Lamadae Unip. Lda	RT/033/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Lao Hela
							Actual																															
	20	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uagua - Nahareka - Chainage 11 + 400 - 13 + 400	Marques Const. Unip. Lda	RT/034/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Lao Hela
							Actual																															
	21	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uagua - Nahareka - Chainage 13 + 400 - 15 + 400	Uaitau Unipessoal,Lda	RT/035/MOP-2021	FI/R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Lao Hela
							Actual																															
	22	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uagua - Nahareka - Chainage 15 + 400 - 17 + 700	Cuba Unip. Lda	RT/036/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Lista Foun/Foin atu Lao
							Actual																															
UATOCARBAU	1	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																															
							Actual																															
	2	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																														Lao Hela	
							Actual																															
	3	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarbau - Viqueque Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	4	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	Jonel Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	5	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uato-Carbau	Luminar Unip. Lda	675/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																															
							Actual																															
	6	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)	Sabirara, Unip. Lda	SSS/155/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Lao Hela	
							Actual																															
7	EBC 2.3 Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
						Actual																																
8	ESG Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
						Actual																																
9	Supply, Installation, Configuration, Testing, Commisioning of it establishment of GNSS Station at eight Municipalities in Timor Leste under Ministry of Planing & Territory.	TeroMovigo - Earth Innovation, Lda	ICB/011/MPO-2022	LM-CD	MINISTERIO PLANO E ORDENAMENTO	Plan																														Lao Hela		
						Actual																																
	1	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	Laway	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Liasidi, Nunumalau, Iralere and Ulusu, Uatolari - Viqueque Municipality	Habere Unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	3	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	Helamula Unipessoal, Lda	SSS/096/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Lao Hela	
							Actual																															
	4	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	Greu Unipessoal, Lda	SSS/093/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Lao Hela	
							Actual																															
	5	New Construction Of Gapura,Stairs and Wall Protection in Garden Of Heroes	Natureza Furak,Unip Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	LM	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO	Plan																															
							Actual																															

[illegible]

Note:

Plano Periode inspesaun iha terenu

Implementa Planu Periode Inspesaun

Assunto Servisu iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Camilo Maia)
Eng. Munisipiu Viqueque ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Mala Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo ADN, I.P.



PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Roberto M. Martins

Município MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS

2022

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Categoria	Dono do Projeto	Action	NOVEMBRO																														OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Lacluta	1	Package II Dilor	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



PLANU INSPEAUN

Naran Eng.		Roberto M. Martins					2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Município		MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Município / Posto		No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
UATOCARBAU	17	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 5 + 400 - 7 + 400	Walay Unip. Lda	RT/031/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

PLANU INSPESAUN

2022

[illegible]



MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.		Roberto M. Martins						2022																																			
Município		MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																									
Município / Posto		No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	NOVEMBRO																														OBS				
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
VIQUEQUE	6	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package: 12 Luca - Lacluta	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000022	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Lao Hela Toma Konta Eng. Konsultant ADN,IP		
	Actual																																										
	7	Rehabilatation of Venilale - Hatulia, Uamori Road Package 2 (STA. 10+300 - STA. 15+475) in Baucau Municipality	Uma Liurai Unip. Lda	SSS/138/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Lao Hela		
	Actual																																										
	8	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625	Bihalutur Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Lao Hela		
	Actual																																										
	9	Rehabilitation of Vanilale - Hatulari - Uaimori Road (30.880km) Roads Section : Venilale - Hatulia Roads Package 5 Sta. 20+625 - 25+755 Municipality Baucau	Loke Matan Unip. Lda	SSS/307/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Lao Hela		
	Actual																																										
	10	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880	Caburela Unip. Lda	SSS/306/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			Lao Hela	
	Actual																																										
	11	Servisu Manutensaun Edificio Agencia de Desemvolvimentu Nasional, I.P, Municipio Viqueque	Luminar, Unip,Lda	22/RDTL/MPO/AND,I.P/XI/2021	LM	MOP/ADN,I.P	Plan																																				
	Actual																																										
	12	ESG Calixa	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																				
	Actual																																										
	13	EBF Ular Rihik	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																				
	Actual																																										
	14	Pre Escolar Maria Lobato Raithu	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																				
	Actual																																										
	15	EBC Caibiraoan	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																				
	Actual																																										
	16	Pre Escolar Sebastiao Gomes Uai Mori Tula	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																				
	Actual																																										
	17	New Construction Office, Were House and Landscaping Of Viqueque Distric	L.M. Caicasa Metin Unip,Lda	01/MSSI/DGAF/DNA/I/2022	LM	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN	Plan																																				
	Actual																																</										

Note:

Plano Periode inspesaun iha terenu

Implementa Planu Periode Inspesaun

Assunto Servisu iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN, I.P.

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.		Salvador Martins						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Município		MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	NOVEMBRO																														OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Lacluta	1	Package II Dilor	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																	
Naran Eng.	Salvador Martins						2022																																	
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	NOVEMBRO																														OBS		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	17	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 5 + 400 - 7 + 400	Walay Unip. Lda	RT/031/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Lao Hela	
							Actual																																	
	18	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 7 + 400 - 9 + 400	Fin-Los Unip. Lda	RT/032/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Lao Hela	
							Actual																																	
	19	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 9 + 400 - 11 + 400	Lamadae Unip. Lda	RT/033/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Lao Hela	
							Actual																																	
	20	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 11 + 400 - 13 + 400	Marques Const. Unip. Lda	RT/034/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Lao Hela	
							Actual																																	
	21	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 13 + 400 - 15 + 400	Uaitau Unipessoal.Lda	RT/035/MOP-2021	FI/R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Lao Hela	
							Actual																																	
	22	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 15 + 400 - 17 + 700	Cuba Unip. Lda	RT/036/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Lista Foun/Foin atu Lao	
							Actual																																	
UATOCARBAU	1	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																																	
							Actual																																	
	2	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																																Lao Hela	
							Actual																																	
	3	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarabau - Viqueque Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	4	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	Jonel Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	5	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uato-Carbau	Luminar Unip. Lda	675/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																	
							Actual																																	
	6	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)	Sabirara, Unip. Lda	SSS/155/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Lao Hela		
							Actual																																	
	7	EBC 2.3 Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MINISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																	
							Actual																																	
	8	ESG Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MINISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																	
							Actual																																	
	9	Supply, Installation, Configuration, Testing, Commisioning of it establishment of GNSS Station at eight Municipalities in Timor Leste under Ministry of Planing & Territory.	TeroMovigo - Earth Innovation, Lda	ICB/011/MPO-2022	LM-CD	MINISTERIO PLANO E ORDENAMENTO	Plan																															Lao Hela		
							Actual																																	
	1	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	Laway	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Liasidi, Nunumalau, Iralere and Uлуу, Uatolari - Viqueque Municipality	Habere Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	3	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	Helamula Unipessoal, Lda	SSS/096/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Lao Hela		
							Actual																																	
	4	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	Greu Unipessoal, Lda	SSS/093/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Lao Hela		
							Actual																																	
	5	New Construction Of Gapura,Stairs and Wall Protection in Garden Of Heroes	Natureza Furak,Unip Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	LM	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. **Salvador Martins**

Município

MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS

2022

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Categoria	Dono do Projeto	Action	NOVEMBRO																														OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
UATOLARI	6	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uatolari	Lemadae Unipessoal Lda	665/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																															
							Actual																															
	7	Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 2 Uatolari - Laisorulai (162)	Bragtojul Unip. Lda JV PT Decont Mitra Consolindo	MPW-CS-2000025	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	8	Rehabilitation of Miabuti Edmumo, Sapatula Road /reabilitacao de estradas distritais de Uatolari Viqueque District	Karakuta Unip Lda	MPW-2013/JUNE	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	10	New Construction Of Chapel Betesda Naedala Affaloicai-Uatolari	Be'e Horis unip,lda		LM	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	Plan																															
							Actual																															
	11	Konstrusaun Kanais Irrigasaun Iha Bebui - Viqueque	L.M. Caicasa Metin Unip,Lda	RDTL-MAP-PO2021:15965	LM	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																															
							Actual																															
	12	EBF Nahae	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																															
							Actual																															
	13	EBF Uaibira	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																															
							Actual																															
	14	EBC Uatolari	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																															
							Actual																															
	15	EBF Edemumu	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																															
							Actual																															
16	EBF Ualake	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
						Actual																																
17	ESTV Kaluheda	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
						Actual																																
18	EBF Debuisi	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
						Actual																																
1	Emergency work package caused by climate change on June 2013 (Gabion protection works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	Consortio Unidos Genero, Lda	SSS/100/MOPTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
2	Rehabilitation of Urban Road Municipality Viqueque	Urukai II, Unip. Lda	SSS/072/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
3	Rehabilitation of Roads From Junction Bemvindo Bahalara - Uain We Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000 - 5+500 Municipality Viqueque	Arpy Unipessoal, Lda	SSS/163/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
4	Rehabilitation of Suspension Bridge, Municipality of Viqueque.	Arquiris	SSS/105/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
5	Routine Road Maintenance Lot 1 - Viqueque - Dilor A07, Lot 2 - Jct Luca - Lacluta C5 Municipality Viqueque (162)	Dira Nova Unip. Lda	MPW - W - 190114	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																

PLANU INSPESAUN

2022

[illegible]

Note:

Plano Periode inspesaun iha terenu

Implementa Planu Periode Inspesaun

Assunto Servisu iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :
(Eng. Salvador Martins)
Eng. Municipal Viqueque ADN, I.P.

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade ADN, I.P.


Aprova Fusi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo ADN, I.P.

[illegible]

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	NOVEMBRO																														OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
VIQUEQUE	2	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Cabira-Oan	MEJD PKRIE EBC CABIRA-OAN	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Note: Plano Periode inspesaun iha terenu Implementa Planu Periode Inspesaun Relatorio avallasuan mensal iha Dili Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projeto ME, ADN,I.P

Sertifica Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN,I.P
