



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU VIQUEQUE

MARÇO 2022



SUMÁRIO
RELATÓRIO
IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO
VIQUEQUE
MARÇO 2022

Prepara Husi :

(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, Município Viqueque ADN, I.P

(Eng. Bebião C. de Jesus Lopes)
Eng. ba Projeto Edifício Públiku no Bêe
Saneamentu, Município Viqueque ADN, I.P

(Eng. Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projeto Mekanikal Elektrikal,
Município Viqueque ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Públiku no Bêe
Saneamentu, ADN, I.P

(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projektu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz ST.M.Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal	3
1.2 Perfil Municipio Viqueque	3
1.3 Lista Projecto	6
II. PROGRESU FISIKU	15
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	15
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	16
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	16
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	17
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	17

INDICE TABELA

Tabela 1	: Postos Administrativos, Sucos no Aldeia	4
Tabela 1.1	: Forca Trabalho ADN, I.P Municipio Viqueque	5
Tabela 1.2	: Lista Asset ADN, I.P Municipio Viqueque	5
Tabela 1.3.1	: Tabela Municipio Viqueque Por Fundus Finansiamento	6
Tabela 1.3.2	: Tabela Municipio Viqueque Por Sectores	8
Tabela 1.3.3	: Tabela Municipio Viqueque Por Ministerio	11
Tabela 1.4	: Dadus populaun Munisipiu Viqueque	15


I. INTRODUSAUN

1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável. Depois de Dekretu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio Viqueque

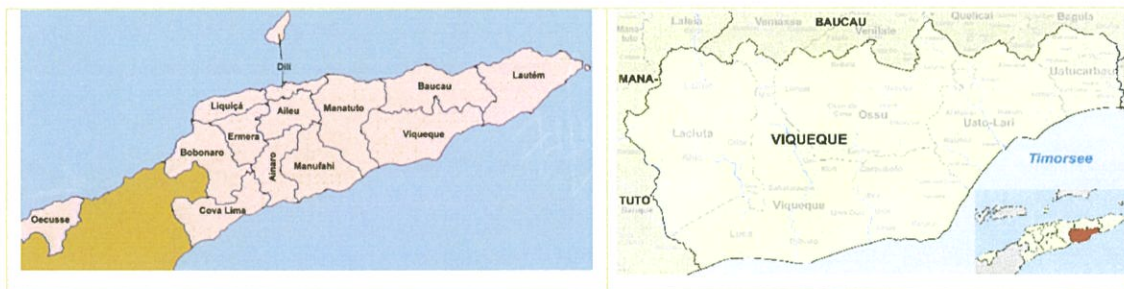

Mapa 2 hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Viqueque iha luan 1,781 km² ho populasaun 70,036 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Viqueque iha Postos Administrativos lima (5), Sukus 35 no Aldeias 228, mak hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos no Aldeia

Lacluta		Ossu		Viqueque	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Ahic	5	Builale	5	Bahalarauain	6
Dilor	5	Liaruca	5	bibileo	8
Laline	5	Loi-Huno	5	Caraubalu	7
Uma tolu	5	Naha Reka	5	Fatudere	3
-	-	Ossu Rua	12	luca	4
-	-	Ossu Decima	8	Maluru	3
-	-	Uabubo	6	Uai Mori	6
-	-	Uaguaia	6	Uma Quic	8
-	-	Uaibobo	7	Uma Uain Craic	9
-	-	-	-	Uma Uain Leten	8
Total	20	-	59	-	62

Uato-Carbau		Watulari	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Afaloicai	4	Babulo	8
Bahatata	4	Macadique	21
Irabin de Baixo	7	Matohoi	12
Irabin de Cima	5	Uaitame	5
Loi Ulo	5	Vesoru	7
Uani Uma	5	Afaloicai	4
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	30	-	57

Data husi livro 3B, OJE 2021, Pajina 86

Tabela 1.1 : Forca Trabalho ADN, I.P Municipio Viqueque

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Viqueque								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	3					3	
2	Administrasaun no Financas	0					0	
3	Motorista	1					1	
4	Seguransa	0					0	
Total		4					4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN, I.P Municipio Viqueque

ASET ADN,IP MUNICIPIO VIQUEQUE								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	1					1	
2	Kareta	1					1	
3	Desktop HP / Monitor	1					1	
4	Laptop HP	1					1	
5	Printer Cannon (Color)	1					1	Aát
6	UPS	1					1	
7	Armario File	2					2	
8	Armario Tau hena	3					3	
9	Meja escritorio	1					1	
10	Meja han	1					1	
11	Meja TV (kiik)	1					1	
12	Kadeira escritorio	6					6	
13	Kadeira han	4					4	
14	Sofa	1 Set					1 Set	
15	Springbed	3 Set					3 Set	
16	Jeleira	1					1	
17	Water Dispenser	1					1	Aát
18	TV + Parabola	1 Set					1 Set	Parabola Aát
19	AC	4					4	
20	Kompor	1						La iha
21	Kompor Gas	1					1	Aát
22	Rack sepatu	3						La iha
23	Rack Piring	1						La iha
24	Water Pump Sanyo	1						La iha

1.3 Lista Projecto

Projetu hotu neébe akumulá iha lista neé bazeia ba dados projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela

1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamento, tabela 1.3.2 Projetu por Sectores no tabela 1.3.3

Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Tabela Municipio Viqueque Por Fundus Finansiamento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI+LM-BS+LM-CD+PDIM		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta	2	\$ 9,781,560.84	74.86%
2	Ossu	13	\$ 11,557,374.74	74.86%
3	Regional	1	\$ 23,853,175.70	19.29%
4	Uatucarbau	8	\$ 10,399,718.15	19.29%
5	Uatulari	17	\$ 13,407,650.28	74.86%
6	Viqueque	17	\$ 20,446,334.56	19.29%
Grand Total		58	\$ 89,445,814.27	74.86%

NO POSTO ADMNISTRATIVO		FI		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta	2	\$ 9,781,560.84	74.86%
2	Ossu	4	\$ 9,461,469.53	59.36%
3	Regional	1	\$ 23,853,175.70	19.26%
4	Uatucarbau	5	\$ 10,026,677.04	45.05%
5	Uatulari	5	\$ 11,158,838.98	29.24%
6	Viqueque	8	\$ 18,890,123.05	46.64%
Grand Total		25	\$ 83,168,845.14	41.04%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta			
2	Ossu			
3	Regional			
4	Uatucarbau			
5	Uatulari	1	\$ 145,269.48	0.00%
6	Viqueque	1	\$ 155,719.92	50.07%
	Grand Total	3	\$ 300,989.41	25.90%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM + CD		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta			
2	Ossu	5	\$ 1,666,711.28	20.39%
3	Regional			
4	Uatucarbau			
5	Uatulari	3	\$ 1,197,488.93	29.16%
6	Viqueque	2	\$ 974,770.41	12.17%
	Grand Total	10	\$ 3,838,970.62	21.03%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta			
2	Ossu			
3	Regional			
4	Uatucarbau	1	\$ 197,429.13	80.39%
5	Uatulari	1	\$ 158,411.79	64.02%
6	Viqueque			
	Grand Total	2	\$ 335,840.92	73.10%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Tabela Municipio Viqueque Por Sectores

NO	SECTOR PROJETO	TOTAL PROJECTO		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	3	\$ 5374826.15	55.96%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	25	\$ 3695589.43	9.12%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	4	\$ 2296509.09	65.49%
4	ESTRADAS	22	\$ 52858602.47	47.53%
5	IMPRESTIMO	1	\$ 23853175.7	19.29%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609021.05	25.35%
7	PONTES	1	\$ 758090.38	72.01%
Grand Total		58	\$ 89,445,814.27	39.44%

NO	SECTOR PROJETO	LACLUTA		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	EDIFICIOS PUBLICOS			
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
4	ESTRADAS	2	\$ 9,781,560.84	74.86%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
7	PONTES			
Grand Total		2	\$ 9,781,560.84	74.86%

NO	SECTOR PROJETO	OSSU		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	EDIFICIOS PUBLICOS	5	\$ 756,426.59	9.77%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
4	ESTRADAS	6	\$ 10,191,927.10	56.20%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	25.35%
7	PONTES			
Grand Total		13	\$ 11,557,374.74	51.53%

NO	SECTOR PROJETO	REGIONAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	EDIFICIOS PUBLICOS			
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
4	ESTRADAS			
5	IMPRESTIMO	1	\$ 23,853,175.70	19.29%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
7	PONTES			
Grand Total		1	\$ 23,853,175.70	19.29%

NO	SECTOR PROJETO	UATUCARBAU		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	2	\$ 4,927,341.72	57.87%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 373,041.11	42.55%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1,147,191.84	81.19%
4	ESTRADAS	1	\$ 3,952,143.48	18.58%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
7	PONTES			
Grand Total		8	\$ 10,399,718.15	44.96%

NO	SECTOR PROJETO	UATULARI		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 447,484.43	57.87%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	10	\$ 1,329,326.87	42.55%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1,149,317.25	81.19%
4	ESTRADAS	4	\$ 10,481,521.73	18.58%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
7	PONTES			
Grand Total		17	\$ 13,407,650.28	27.69%

NO	SECTOR PROJETO	VIQUEQUE		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	EDIFICIOS PUBLICOS	7	\$ 1,236,794.86	0.00%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
4	ESTRADAS	9	\$ 18,451,449.32	45.86%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
7	PONTES	1	\$ 758,090.38	72.01%
Grand Total		17	\$ 20,446,334.56	44.05%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Tabela Municipio Viqueque Por Ministerio

NO	DONO DO PROJETO	TOTAL PROJECTO		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 355,840.92	73.10%
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	0.00%
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN	18	\$ 1,781,168.18	0.00%
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOCIAL E INCLUZAUN	1	\$ 805,366.41	0.00%
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	3	\$ 5,374,826.15	55.96%
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	30	\$ 80,375,398.69	39.73%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO	1	\$ 5,707.28	0.00%
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBARENTES DA LIBERTACAO NACIOANL	1	\$ 275,004.50	1.06%
9	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 327,232.66	22.58%
Grand Total		58	\$ 89,445,814.27	74.86%

NO	DONO DO PROJETO	LACLUTA		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN			
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	2	\$ 9,781,560.84	74.86%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO			
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBARENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			
9	MINISTERIO SAUDE			
Grand Total		2	\$ 9,781,560.84	74.86%

NO	DONO DO PROJETO	OSSU		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN	4	\$ 429,193.93	0.00%
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	8	\$ 10,800,948.15	74.86%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO			
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBARENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			
9	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 327,232.66	22.58%

	Grand Total	13	\$ 11,557,374.74	51.53%
--	--------------------	-----------	----------------------------	---------------

NO	DONO DO PROJETO	REGIONAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN			
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	1	\$ 23,853,175.70	19.29%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO			
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			
9	MINISTERIO SAUDE			
	Grand Total	1	\$ 23,853,175.70	19.29%

NO	DONO DO PROJETO	UATUCARBAU		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 197,429.13	80.39%
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN	2	\$ 175,611.98	0.00%
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	2	\$ 4,927,341.72	57.87%
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 5,099,335.32	32.66%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO			
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			
9	MINISTERIO SAUDE			

	Grand Total	8	\$ 10,399,718.15	44.96%
--	--------------------	----------	-----------------------------	---------------

NO	DONO DO PROJETO	UATULARI		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 158,411.79	64.02%
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	0.00%
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN	7	\$ 750,641.10	0.00%
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 447,484.43	34.91%
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	6	\$ 11,630,838.98	29.68%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO			
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL	1	\$ 275,004.50	1.06%
9	MINISTERIO SAUDE			
	Grand Total	17	\$ 13,407,650.28	27.69%

NO	DONO DO PROJETO	VIQUEQUE		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
3	MENISTERIO DA EDUCASAUN	5	\$ 425,721.17	0.00%
4	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN	1	\$ 805,366.41	0.00%
5	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
6	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	10	\$ 19,209,539.70	46.89%
7	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO	1	\$ 5,707.28	0.00%
8	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			

9	MINISTERIO SAUDE			
	Grand Total	17	\$ 20,446,334.56	44.05%

Dados detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dados populaçaun Munisipiu Viqueque

Administrative Post, Suco and Sex	2021				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Lacluta	7,098	2,152	1,917	1,528	1,501
Ossu	17,972	4621	4946	4241	4164
Uato-Lari	19,580	4,927	5,199	4,879	4,575
Uatucarbau	7,669	1,842	2,060	1,896	1,871
Viqueque	26,822	7,370	7,549	6,184	5,720

Fontes : Projeksaun Populaçaun bazea ba Census Populaçaun no Uma Kain 2015
Direcção Geral de Estatística, MOF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia persentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu neébe hetan husi progresu fulan ida neé, ikus liu persentagen actual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detallu bele hareé iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hareé #Anexu D.

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

- ❖ Durante Equipa ADN, I.P. Viqueque halo monitorizasaun no Inspeksaun hasoru obstaklo sira iha Terreno mak hanesan tuir mai ne'e :
 - Ekipa ADN, I.P. Viqueque, halo monitorizasaun no inspeksaun indentifika kompanhia balun la kumpri rekomendasaun ne'ebe equipa hatu'o, hanesan :
 - a) Atu taka dokumentos *Time Schedule* no Dezenho service iha Site office maibe sira nafatin la taka ate a data.
 - b) Kompanhia servisu parado no Equipa ADN, I.P. viqueque orienta atu kontinua fali maibe ate a data seidak kontinua.
 - c) Iha kompanhia balu nebe'e laiha *site office* iha terreno.
 - Ba projetu abandona sira ne'ebe abandona durante ne'e (husi tinan 2014 ate a data) no lokaliza iha fatin ne'ebe do'ok tuir orientasaun tenki halo planu ba observa dala rua maibe iha tempu udan defisil atu asesu ba, no maioria gastus tempu barak liu ba projetu ne'ebe abandona
 - Iha projeto sira site supervisor husi ministerio relevante la iha terreno, no kontrator sira dalaruma servisu la tuir espesifikasaun iha kontrato, maibe parte tekniko ADN, I.P. tempo la to'o atu diariamente kontrola iha terreno, hodi nune'e servisu sira ne'ebe iha rai laran ona susar atu indentifika.
 - Ekipa ADN, I.P. Viqueque, la konsege lao tuir plano inspesaun nebe'e planeia ona tamba factor distancia (projecto ida ba projetco seluk), ho nune'e ekipa ADN, I.P. Viqueque halo monitorizasaun ba projeto hirak ne'e mais ou menus loron ida hare projetu ida ou rua deit.
- ❖ Durante Equipa ADN, I.P. Viqueque halo servisu iha Eskritorio ADN, I.P. Municipio hasoru obstaklo sira mak hanesan :
 - Printer la diak, no lebele uza, krik atu print asuntu inportante ruma presiza ba print fali iha fatin seluk, ida nee mos bele fo impakto ba dokumentos konfidensial sira.
 - Internet iha Municipio lao ladun diak hodi nune susar tebes atu asesu manda dokumentos ruma *via email* liu liu *Dropbox*.

ami nia dados sira labele asesu iha nacional tamba *Memory Drop Box Full*.

- Ami nia Edificio / Residencia refere presiza manutensaun tamba iha parte electrical no odatamatan balu la seguro, no ami araska asesu be'e mos.
- Fasilidade la sufisiente apoiu servisu diariamente hanesan laptop, tamba ami tekniku munisipiu Viqueque iha deit laptop ida e nee mos la sufisiente atu halo *back up data* no update ba *folder system*.

❖ **Obstaclo Parte Eletricidade :**

Obtaklu nebe durante Prosesu monitorizasaun Eng. Mekanikal, Elecktrikal & ITC hasoru iha base mak hanesan tuir mai nee:

1. Laptop Laiha atu halo relatorio wainhira iha municipio.
2. Transporte (Kareta/ Motor) la suficiente atu koresponde ba plano nebe Aprovado.
3. Combustivel/Mina (Municipio Baucau, Viqueque, Lautem Pertamina Eto Laiha).
4. Kontractor laiha site ou kontaktu/telepon la tama no contractor la ba iha site/terenu
5. Menus Engenheiro ME.
6. Natureza hanesan Udan boot, Estrada kotu dalan la asesu ba kareta.

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Rekomenda ba superior ADN, I.P. atu kordena ho ministerio relevantes sira hodi nune'e bele fo penalidade ba komphia sira nebe servisu parado no abandona hela sira nia servico sem informasaun.
2. Rekomenda ba parte Lina Ministerial sira atu foti desizaun ba projeto sira ne'ebe parado no abandona iha terreno.
3. Ministerio relevante sira atu implementa projeto sira tenke iha mos *Site Supervisor*, hodi nune bele kontrola servisu Diariamente iha terreno.
4. Ami Rekomenda ba superior sira atu prepara printer nebe bele print *kertas* A3 no A4 hodi nune'e bele fasilita ami nia servisu iha Municipio.
5. Rekomenda ba Seksaun ITC hare konaba velocidade internet nebe'e mak iha munisipiu ho velocidade nebe'e ki'ik susar atu envia dokumentus ba *dropbox*.


distribui ba Munisipiu sira ho kapasidade nebe'e bo'ot hodi nune'e bele akumula dados hotu iha laran.

7. Husu ba parte Logistica atu tun Direita hodi hare ami nia residencia refere iha municipio, hodi nune'e bele halo manutensaun, tamba ami hatu'o ona proposta ba parte Logistika.
8. Rekomenda mos ba seksaun ITC atu aumenta facilidade Laptop ba iha Munisipiu tamba tekniku nain tolu assesu *dropbox* iha laptop ida deit, hodi nune'e susar atu fahe servisu.

❖ **Recomendação Parte Electricidade :**

1. Rekomenda ba Parte Logistik atu prepara Laptop kada engenheiro (Ba Engenheiro nebe seidauk Hetan)
2. Rekomenda ba Logistik atu Aumenta transporte kareta ba Engenheiro Electricidade
3. Rekomenda ba parte Logistik atu hare problema kombustivel/mina iha parte leste mak hanesan Municipio Baucau, Municipio Lautem no Municipio Viqueque problema iha neba Pertamina Eto Laiha nemak dificulta Ami nia plano monitorizasaun karik mina hotu ami tenki fila mai atesta iha municipio Manatuto
4. Rekomenda ba Superior sira atu koordena ho Dono do Projeto (EDTL, EP) oinsa atu kria linha koordenasaun nebe diak
5. Rekomenda ba HR atu Aumenta eng. Electricidade (Recruta tan engenheiro ME)
6. Rekomenda ba Parte Logistik atu prepara ou facilita simcard office nian ba engenheiro.

Note: Assinatura husi Eng Municipio Viqueque

Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Viqueque						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1		Bebiano C. de Jesus Lopes	156	Engenheiro EPAS		
2		Roberto M. Martins	175	Engenheiro ITI		
3		Adonis Julio Fernandes	152	Engenheiro METIC		
4	Engenheiro	Remigio Santos	008	Engenheiro VEBD		
5	Motorista	Bendito M. Bento	027	Motorista		



ANEXU A

Município Viqueque (Lista Geral)

Localizasaun Projeto																
NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	STATUS PROJECT	OBS
1	Package II Dilor	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacluta	Viqueque	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOPTC-2017	\$ 4,886,127.61	Aug. 25, 2017	78.20%	64.23%	\$ 3,139,406.69	\$ 1,746,720.92	ON-GOING	ON-GOING
2	Nova Construção de Moro Protecção da Ribeira de Dilor (Pakote1-Sta. 0+000 To 0+800)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacluta	Viqueque	Atramor Sucesso Unip. Lda	SSS/093/MOPTC-2016	\$ 4,895,433.23	May 17, 2016	97.10%	83.43%	\$ 4,183,098.19	\$ 712,335.04	ABANDONA	Parado
3	Road Rehabilitation of Assalaítula - Ossu Sta. 5+155 - 14+000 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Uhacae, Lda	SSS/064/MOPTC-2017	\$ 4,849,333.48	Aug. 25, 2017	55.41%	41.84%	\$ 2,028,833.63	\$ 2,820,477.85	ON-GOING	ON-GOING
4	Manutensaun Estrada Luihono-Osorua Sta. 0+000-6+750- Municipal of Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ossu	Viqueque	Boru- Buty Unip.Lda	RT/072/MOPTC-2016	\$ 183,928.35	Sept. 22, 2016	97.63%	73.61%	\$ 135,393.13	\$ 48,535.22	ON-GOING	ON-GOING
5	R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liawaioli Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ossu	Viqueque	Kay Seng Unip. Lda	NCB/056/MOPTC-2019	\$ 425,092.70	Aug. 25, 2020	8.72%	4.47%	\$ 18,999.26	\$ 406,093.44	ABANDONA	ON-GOING
6	Rural Roads Periodic Maintenance Luihono - Osorua Chainage 0+000 - 6+800 Routine Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400 Municipality Viqueque (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Kay Seng Unip. Lda	MPW-W-190084	\$ 298,505.70	Aug. 16, 2019	47.34%	38.48%	\$ 114,868.38	\$ 183,637.12	ON-GOING	ON-GOING
7	R4D Rural Road Spot Improvement Ossu-Nahareka Chainage 0+000-3+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Costa Key Unip Lda	MPW-W-210053	\$ 74,854.80	June 10, 2021	23.92%	21.13%	\$ 15,817.10	\$ 59,037.70	ON-GOING	ON-GOING
8	R4D Rural Road Spot Improvement Loihunu-Uagla Chainage 0+000 - 6+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Manoko Unip. Lda	MPW-W-210050	\$ 474,365.56	June 10, 2021	26.87%	10.97%	\$ 52,041.92	\$ 422,323.64	ON-GOING	ON-GOING
9	Emergency Road Rehabilitation Package II from Ossu - Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Modena Tecnico Unipessoal Lda	MOPW-F1-W-166514	\$ 4,003,115.00	June 25, 2013	93.28%	83.75%	\$ 3,432,678.18	\$ 570,436.82	ABANDONA	Parado
10	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Ossu-Nahareka Chainage 4+350-6+350	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Fin-Los Unip Lda JV Costa Key Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190037	\$ 491,752.56	Aug 16,2019	21.57%	16.91%	\$ 83,143.62	\$ 408,608.94	Parado	Parado
11	New Construction of Health Post and Doctor's House Building in Builele,Ossu, Viqueque, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Borala Lda	RDTL-MS-DNA-ICB21-075	\$ 327,232.66	Aug-25,2021	54.83%	22.58%	\$ 73,903.69	\$ 253,328.97	ON-GOING	ON-GOING
12	EBF Uaibobo	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 116,970.18		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 116,970.18	ON-GOING	ON-GOING
13	Pre Escolar Uaibua	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 86,739.52		9.83%	0.00%	\$ -	\$ 86,739.52	ON-GOING	ON-GOING
14	ESG Oloaasa	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 112,885.23		12.68%	0.00%	\$ -	\$ 112,885.23	ON-GOING	ON-GOING
15	Nova Construcao da Escola Basica Filial Liaruca	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 112,599.00		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 112,599.00	ON-GOING	ON-GOING
16	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	FI	AGRICULTURA	Uatocarbau	Viqueque	Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	\$ 3,912,226.56	Jan. 18, 2019	80.29%	52.18%	\$ 2,092,294.66	\$ 1,819,931.90	ON-GOING	ON-GOING
17	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	FI	AGRICULTURA	Uatocarbau	Viqueque	PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	\$ 1,015,115.16	Dec. 6, 2019	80.33%	74.77%	\$ 738,979.83	\$ 256,135.31	ON-GOING	ON-GOING
18	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarabau - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uatocarbau	Viqueque	Divita Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441	\$ 591,750.15	Sept. 1, 2016	95.79%	83.91%	\$ 308,331.69	\$ 83,398.46	ON-GOING	ON-GOING
19	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uatocarbau	Viqueque	Jonel Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346	\$ 555,441.69	July 6, 2016	98.65%	76.17%	\$ 423,062.89	\$ 132,378.80	ON-GOING	Progres Fisiko 100%
20	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uato-Carbau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatocarbau	Viqueque	Luminar Unip. Lda	675/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	\$ 197,429.13	Aug. 5, 2019	98.56%	83.37%	\$ 138,717.28	\$ 38,711.85	ON-GOING	ON-GOING
21	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidiale - Tardai/Post Polisi)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uatocarbau	Viqueque	Sabirara, Unip. Lda	SSS/155/MOPTC-2017	\$ 3,952,143.48	Sept. 15, 2017	24.35%	18.58	\$ 734,206.23	\$ 3,217,937.23	ON-GOING	ON-GOING
22	ERC 2.3 Uatocarbau	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatocarbau	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 25,016.63		10.20%	0.00%	\$ -	\$ 3,217,937.23	ON-GOING	ON-GOING
23	ESG Uatocarbau	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatocarbau	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 90,393.33		5.78%	0.00%	\$ -	\$ 3,217,937.23	ON-GOING	ON-GOING
24	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uatolari	Viqueque	Laway	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459	\$ 97,892.93	March 25, 2015	63.38%	46.30%	\$ 43,322.74	\$ 52,570.19	ON-GOING	Parado
25	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Liasidi, Nunumalau, Iralere and Uлуу, Uatolari - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uatolari	Viqueque	Habere Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433	\$ 1,051,424.32	Sept. 1, 2016	72.06%	50.13%	\$ 327,283.76	\$ 524,140.56	ON-GOING	ON-GOING

26	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uatolari	Viqueque	Helamula Unipessoal, Lda	SSS/096/MOPTC-2017	\$ 4,045,100.44	Aug. 28, 2017	63.29%	25.63%	\$ 1,037,517.23	\$ 3,007,583.21	ON-GOING	ON-GOING
27	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uatolari	Viqueque	Greu Unipessoal, Lda	SSS/093/MOPTC-2017	\$ 4,322,335.54	Aug. 25, 2017	58.62%	22.80%	\$ 985,435.28	\$ 3,336,900.26	ON-GOING	ABANDONA
28	New Construction of Gapura, Stairs and Wall Protection in Garden of Heroes	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIOANL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Natureza Furak Unip/ Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	\$ 275,004.50	Jan. 01, 2021	23.25%	1.06%	\$ 2,911.53	\$ 272,092.97	ON-GOING	ON-GOING
29	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uatolari	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Lemadae Unipessoal Lda	665/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	\$ 158,411.79	Aug. 5, 2019	100.00%	78.30%	\$ 101,411.72	\$ 57,000.07	ON-GOING	ON-GOING
30	Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 2 Uatolari - Laisorulai (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Uatolari	Viqueque	Bragtojul Unip. Lda JV PT Decont Mitra Consolindo	MPW-CS-2000025	\$ 475,000.00	March 25, 2020	70.00%	70.00%	\$ 190,000.00	\$ 285,000.00	ABANDONA	ABANDONA
31	Rehabilitation of Miabuti Edmumo, Sapatula Road /reabilitacao de estradas distintas de Uatolari Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uatolari	Viqueque	Karakuta Unip Lda	MPW-2013/JUNE	\$ 1,639,085.75	June 25, 2014	41.68%	40.68%	\$ 666,780.08	\$ 972,305.67	ON-GOING	ON-GOING
32	New Construction of Chapel Betesda Naedala Afolica- Uatolari	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Be'e Horis Unip. Lda		\$ 145,269.48		22.06%	0.00%	\$ -	\$ 145,269.48	ON-GOING	ON-GOING
33	Konstrusaun Kanais Irigasaun iha Bebu	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Uatolari	Viqueque	L.K. Caicasa Metin Unip Lda	RDTL-MAFFO2021.13965	\$ 447,484.43	Oct. 08, 2021	68.30%	34.91%	\$ 156,226.47	\$ 291,257.96	ON-GOING	ON-GOING
34	EBF Nahae	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 114,134.85		0.00%	0.00%		\$ 114,134.85	ON-GOING	ON-GOING
35	EBF Uaibira	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 103,117.97		0.00%	0.00%		\$ 103,117.97	ON-GOING	ON-GOING
36	EBF Uatolari	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 70,191.21		13.84%	0.00%		\$ 70,191.21	ON-GOING	ON-GOING
37	EBF Edemumu	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 98,958.49		0.00%	0.00%		\$ 98,958.49	ON-GOING	ON-GOING
38	EBF Ualake	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 106,475.42		7.60%	0.00%		\$ 106,475.42	ON-GOING	ON-GOING
39	ESTV Kahuheda	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 159,590.65		0.00%	0.00%		\$ 159,590.65		
40	EBF Debusi	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 98,172.51		6.21%	0.00%	\$ -	\$ 98,172.51	ON-GOING	ON-GOING
41	Emergency work package caused by climate change on June 2013 (Gabion protection works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Consortio Unidos Genero, Lda	SSS/100/MOPTC-2015	\$ 75,260.55	Dec. 1, 2015	100.00%	88.00%	\$ 66,229.28	\$ 9,031.27	ON-GOING	Progres Fisiko 100%
42	Rehabilitation of Urban Road Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Urukai II, Unip. Lda	SSS/072/MOPTC-2017	\$ 4,246,801.85	Aug. 25, 2017	99.14%	88.03%	\$ 3,738,450.12	\$ 508,351.73	ON-GOING	Parado
43	Rehabilitation of Roads From Junction Bemvindo Bahalara - Uain We Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000 - 5+500 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Arpy Unipessoal, Lda	SSS/163/MOPTC-2017	\$ 3,666,919.24	Sept. 15, 2017	68.29%	61.46%	\$ 2,253,608.32	\$ 1,413,310.92	ON-GOING	Progres Fisiko 100%
44	Rehabilitation of Suspension Bridge, Municipality of Viqueque.	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Viqueque	Viqueque	Arquiris	SSS/105/MOPTC-2017	\$ 758,090.38	Sept. 7, 2017	100.00%	72.01%	\$ 545,900.59	\$ 212,189.79	ON-GOING	Parado
45	Routine Road Maintenance Lot 1 - Viqueque - Dilor A07, Lot 2 - Jct Luca - Lacluta C5 Municipality Viqueque (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Dira Nova Unip. Lda	MPW - W - 190114	\$ 150,012.65	March 9, 2019	75.00%	51.97%	\$ 77,967.95	\$ 72,044.70	ON-GOING	ABANDONA
46	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package: 12 Luca - Lacluta	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000022	\$ 169,404.00	March 25, 2020	70%	70.00%	\$ 118,582.80	\$ 50,821.20	ABANDONA	ON-GOING
47	Rehabilitation of Venilale - Hatulia, Uamori Road Package 2 (STA. 10+300 - STA. 15+475) in Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Uma Liurai unip, Ida	SSS/138/MOPTC-2016	\$ 3,664,122.77	Aug. 1, 2016	27.42%	24.12%	\$ 883,922.53	\$ 2,780,200.24	ABANDONA	Parado
48	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Bihalutur Unip, Ida	SSS/141/MOPTC-2016	\$ 2,073,894.13	Aug. 1, 2016	10.33%	9.09%	\$ 185,464.84	\$ 1,885,429.29	ON-GOING	ON-GOING
49	Rehabilitation of Vanilale - Hatulali - Uaimori Road (30.880km) Roads Section : Venilale - Hatulia Roads Package 5 Sta. 20+625 - 25+755 Municipality Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Loke Matan unip, Ida	SSS/307/MOPTC-2016	\$ 2,455,115.74	May 12, 2016	30.76%	22.03%	\$ 540,920.78	\$ 1,914,194.96	ON-GOING	ON-GOING
50	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Caburela unip, Ida	SSS/306/MOPTC-2016	\$ 1,949,918.39	Nov. 22, 2016	48.92%	30.42%	\$ 593,217.81	\$ 1,356,700.58	ON-GOING	ON-GOING
51	Upgrading and Maintenance of Baucau - Viqueque Highway Project Lot 2: Venilale - Viqueque : Sta. 27 + 120 to Sta. 62 + 010	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Multi Posto Administrativo	Regional	China Railway Int. Group co, jv with China overseas	ICB/046/MOPTC-2017	\$ 23,853,175.70	March 21, 2019	21.57%	19.29%	\$ 4,601,922.36	\$ 19,251,253.34	ON-GOING	ON-GOING
52	Servisu Manutensaun Edificio Agencia de Desenvolvimento Nacional. 1P Municipio Viqueque	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Luminar Unip. Lda	22/RDTL/MFO/AND 1P/XI/2021	\$ 5,707.28		100.00%	0.00%	\$ -	\$ 5,707.28	ON-GOING	Progres Fisiko 100%
53	ESG Calixa	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 113,359.66		3.22%	0.00%	\$ -	\$ 113,359.66	ON-GOING	ON-GOING
54	EBF Ular Rihak	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 70,633.26		9.29%	0.00%	\$ -	\$ 70,633.26	ON-GOING	ON-GOING

55	Pre Escolar Maria Lobato Raithu	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 99,496.02		10.88%	0.00%	\$ -	\$ 99,496.02	ON-GOING	ON-GOING
56	EBC Caibiraon	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 52,836.14		53.87%	0.00%	\$ -	\$ 52,836.14	ON-GOING	ON-GOING
57	Pre Escolar Sebastiao Gomes Uai Mori Tula	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 89,396.09		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 89,396.09	ON-GOING	ON-GOING
58	New Construction Office, Were House And Landscaping Of Viqueque Distric	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN	LM	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	L.M. Caicasa Metin Unip.Lda	01/MSSI/DGAF/DNA/I/2022	\$ 805,366.41		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 805,366.41	ON-GOING	ON-GOING
									\$ 89,445,814.27			39.44%	\$ 35,275,894.80	\$ 60,430,181.95		

Inspeksaun Husi,

 (Eng. Roberto M. Martins)
 Eng. ba Projeto Infraestrutura,
 Transportes e Irigasaun ADN, I.P


 (Eng. Bebiano C. de Jesus Lopes)
 Eng. ba Projeto Edificio Publico no
 Beé Saneamento ADN, I.P


 (Eng. Adams Julio Fernandes)
 Eng. ba Projeto Mecanical
 Electrical, ADN, I.P

Verifika Husi,

 (Eng. João Paulo Amaral)
 Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
 Irigasaun ADN, I.P


 (Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
 Eng. Senior ba Projeto Edificio Publiku No Beé
 Saneamento ADN, I.P


 (Eng. Deolindo de Fatima Marques)
 Chefe Seksaun Mecanical Electrical, Informasaun Tecnologia no
 Komunikaun ADN, I.P

Cedtika Husi

 (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Coordenadora da Unidade de Controla e Validasaun
 de Qualidade, ADN, I.P.



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU VIQUEQUE

NU.	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	Localizasaun Projeto		NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Mar-22		
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU					Previous Progress	Progress This Month	Progress Komulative
1	Package II Dilor	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lachita	Viqueque	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOFTC-2017	\$ 4.886.127.61	Aug. 25, 2017	78.20%		78.20%
2	Nova Construção de Moro Protecção da Ribeira de Dilor (Pakote 1-Sta 0+000 To 0+800)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lachita	Viqueque	Atramor Sucesso Unip. Lda	SSS/093/MOFTC-2016	\$ 4.895.433.23	May 17, 2016	97.10%		97.10%
3	Road Rehabilitation of Assalahtula - Ossu Sta. 5+155 - 14+000 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Uhacae, Lda	SSS/064/MOFTC-2017	\$ 4.849.333.48	Aug. 25, 2017	48.74%	6.67%	55.41%
4	Manutensaun Estrada Luihono-Osortua Sta. 0+000-6+750- Municipal of Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ossu	Viqueque	Boru- Buty Unip Lda	RT/072/MOFTC-2016	\$ 183.928.35	Sept. 22, 2016	97.63%		97.63%
5	R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liawaioli Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ossu	Viqueque	Kay Seng Unip. Lda	NCB/056/MOFTC-2019	\$ 425.092.70	Aug. 25, 2020	8.72%		8.72%
6	Rural Roads Periodic Maintenance Luihono - Osortua Chainage 0+000 - 6+800 Routine Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400 Municipality Viqueque (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Kay Seng Unip. Lda	MPW-W-190084	\$ 298.505.70	Aug. 16, 2019	43.70%	3.63%	47.34%
7	R4D Rural Road Spot Improvement Ossu-Nahareka Chainage 0+000-3+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Costa Key Unip Lda	MPW-W-210053	\$ 74.854.80	June 10, 2021	23.92%		23.92%
8	R4D Rural Road Spot Improvement Loihumu-Uagia Chainage 0+000 - 6+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Manoko Unip. Lda	MPW-W-210050	\$ 474.365.56	June 10, 2021	26.52%	0.35%	26.87%
9	Emergency Road Rehabilitation Package II from Ossu - Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Modena Tecnica Unipessoal Lda	MOPW-FI-W-166514	\$ 4.003.115.00	June 25, 2013	95.28%		95.28%
10	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Ossu-Nahareka Chainage 4+350-6+350	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ossu	Viqueque	Fin-Los Unip Lda JV Costa Key Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190037	\$ 491.752.56	Aug. 16, 2019	18.79%	2.78%	21.57%
11	New Construction of Health post and Doctor's House Building in Builale, Ossu, Viqueque Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Borala Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-ICB21-075	\$ 327.232.66	Aug-25, 2021	42.07%	12.78%	54.85%
12	EBF Uaibobo	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 116.970.18		0.00%		0.00%
13	Pre Escolar Uaibua	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 86.739.52		0.00%	9.85%	9.85%
14	ESG Oloaasa	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 87.453.73		0.00%	12.68%	12.68%
15	Nova Construção da Escola Basica Filial Liaruca	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 112.599.00		0.00%		0.00%
16	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	FI	AGRICULTURA	Uatocarbau	Viqueque	Pembinaan Pulau Sebang SDN BHD	ICB/041/MAP-2017	\$ 3.912.226.56	Jan. 18, 2019	80.29%		80.29%
17	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	FI	AGRICULTURA	Uatocarbau	Viqueque	PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	\$ 1.015.115.16	Dec. 6, 2019	80.55%		80.55%
18	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarbau - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uatocarbau	Viqueque	Divita Unip. Lda	RDTL/MOFTC-VMOFTC/CGI-PEN. 00000441	\$ 591.750.15	Sept. 1, 2016	95.79%		95.79%
19	New Installation MV, LV Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uatocarbau	Viqueque	Jonel Unip. Lda	RDTL/MOFTC-VMOFTC/CGI-PEN. 00000346	\$ 555.441.69	July 6, 2016	98.65%		98.65%
20	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uato-Carbau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatocarbau	Viqueque	Luminar Unip. Lda	675/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	\$ 197.429.13	Aug. 5, 2019	98.56%		98.56%
21	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uatocarbau	Viqueque	Sabirara, Unip. Lda	SSS/155/MOFTC-2017	\$ 3.952.143.48	Sept. 15, 2017	24.35%		24.35%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU VIQUEQUE

NU.	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	Localizasaun Projeto		NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Mar-22		
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU					Previous Progress	Progress This Month	Progress Komulative
22	EBC 2 3 Uatocarbau	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatocarbau	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 85,016.63		0.00%	10.20%	10.20%
23	ESG Uatocarbau	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatocarbau	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 90,595.35		0.00%	5.78%	5.78%
24	New installation of mv.lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uatolari	Viqueque	Laway	RDTL/MOFTC-VOMPTC/CGI-PEN 0000459	\$ 97,892.93	March 25, 2015	63.38%		63.38%
25	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Liasidi, Numumalai, Iralere and Uluu, Uatolari - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uatolari	Viqueque	Habere Unip Lda	RDTL/MOFTC-VMOFTC/CGI-PEN 00000433	\$ 1,051,424.32	Sept 1, 2016	72.06%		72.06%
26	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uatolari	Viqueque	Helamula Unipessoal Lda	SSS/096/MOFTC-2017	\$ 4,045,100.44	Aug 28, 2017	60.39%	2.90%	63.29%
27	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uatolari	Viqueque	Greu Unipessoal Lda	SSS/093/MOFTC-2017	\$ 4,322,335.54	Aug 25, 2017	56.43%	2.19%	58.62%
28	New construction of Gapura Stairs and wall protection no jardim de herois de Viqueque	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Natureza Furak Unip/ Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	\$ 275,004.50	Aug 31, 2016	4.13%	21.11%	25.25%
29	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uatolari	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Lemadae Unipessoal Lda	665/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	\$ 158,411.79	Aug 5, 2019	100.00%		100.00%
30	Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 2 Uatolari - Laisorulai (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Uatolari	Viqueque	Bragtojul Unip Lda JV PT Decont Mitra Consolindo	MPW-CS-2000025	\$ 475,000.00	March 25, 2020	70.00%		70.00%
31	Rehabilitation of Miabuti Edmumo, Sapatula Road /reabilitacao de estradas distritais de Uatolari Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uatolari	Viqueque	Karakuta Unip Lda	MPW-2013/JUNE	\$ 1,639,085.75	June 25, 2014	41.68%		41.68%
32	New Construction of Capela	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	LM	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Be'e Horis Unip. Lda		\$ 145,269.48		22.06%		22.06%
33	Konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Bebuí Município Viqueque	MINISTERIO DA AGRICULTURA	LM-CD	IRIGASAUN	Uatolari	Viqueque	L.K. Caicasa Metin Unip Lda	RDTL-MAPPO2021.15965	\$ 447,484.43	Oct 08, 2021	39.26%	29.04%	68.30%
34	EBF Nahae	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 114,134.85		0.00%		0.00%
35	EBF Uaibira	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 103,117.97		0.00%		0.00%
36	EBC Uatolari	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 70,191.21		0.00%	13.84%	13.84%
37	EBF Edemumu	MENISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 98,958.49		0.00%		0.00%



ANEXO B

PLAN MUNICIPAL PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPTU VIQUEQUE

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	Localizasaun Projeto		NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Mar-22		
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPTU					Previous Progress	Progress This Month	Progress Komulative
38	EBF Ualake	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 106,475.42		0.00%	7.60%	7.60%
39	ESTV Kalluheda	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 159,590.65		0.00%		0.00%
40	EBF Debuisi	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 98,172.51		0.00%	6.21%	6.21%
41	Emergency work package caused by climate change on June 2013 (Gabion protection works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Consortio Unidos Genero, Lda	SSS/100/MOPTC-2015	\$ 75,260.55	Dec 1, 2015	100.00%		100.00%
42	Rehabilitation of Urban Road Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Urulai II, Unip. Lda	SSS/072/MOPTC-2017	\$ 4,246,801.85	Aug 25, 2017	99.14%		99.14%
43	Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000 - 5+500 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Arpy Unipessoal, Lda	SSS/163/MOPTC-2017	\$ 3,666,919.24	Sept 15, 2017	68.29%		68.29%
44	Rehabilitation of Suspension Bridge, Municipality of Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Viqueque	Viqueque	Arquiris Unip. Lda	SSS/105/MOPTC-2017	\$ 758,090.38	Sept 7, 2017	100.00%		100.00%
45	Routine Road Maintenance Lot 1 - Viqueque - Dilor A07, Lot 2 - Jct Luca - Lachuta C5 Municipality Viqueque (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Dira Nova Unip. Lda	MPW - W - 190114	\$ 150,012.65	March 9, 2019	75.00%		75.00%
46	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 12 Luca - Lachuta	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Hilobadi Unip. Lda JV PT Sarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000022	\$ 169,404.00	March 25, 2020	70.00%		70.00%
47	Rehabilitation of Venilale - Hatulia, Uaimori Road Package 2 (STA 10+300 - STA 15+475) in Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Uma Liurai unip. Lda	SSS/138/MOPTC-2016	\$ 3,664,122.77	Aug 1, 2016	27.42%		27.42%
48	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Bihaltur Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2016	\$ 2,073,894.13	Aug 1, 2016	10.33%		10.33%
49	Rehabilitation of Vanilale - Hatulali - Uaimori Road (30.880km) Roads Section - Venilale - Hatulia Roads Package 5 Sta. 20+625 - 25+755 Municipality Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Loke Ma'an unip. Lda	SSS/307/MOPTC-2016	\$ 2,455,115.74	May 12, 2016	30.76%		30.76%
50	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Viqueque	Viqueque	Caburela unip. Lda	SSS/306/MOPTC-2016	\$ 1,949,918.39	Nov 22, 2016	48.92%		48.92%
51	Upgrading and Maintenance of Baucau - Viqueque Highway Project Lot 2 - Venilale - Viqueque - Sta. 27 + 120 to Sta. 62 + 010	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Multi Posto Administrativo	Regional	China Railway Int. Group co. jy with China overseas	ICB/046/MOPTC-2017	\$ 23,853,175.70	March 21, 2019	21.62%		21.62%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU VIQUEQUE


NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	Localizasaun Projeto		NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Mar-22		
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU					Previous Progress	Progress This Month	Progress Komulative
52	Servisu Mantensaun Edifício Agência de Desenvolvimento Nacional, I.P. Município Viqueque	MINISTERIO DO PLANO e ORDENAMENTO	LM	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Luminar Unip Lda	22/RDTL/MPO/AND.IP/XI/2021	\$ 5.707.28		100.00%		100.00%
53	ESG Calixa	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 113.359.66		0.00%	3.22%	3.22%
54	EBF Ular Rihik	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 70.633.26		0.00%	9.29%	9.29%
55	Pre Escolar Maria Lobato Raihu	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 99.496.02		0.00%	10.88%	10.88%
56	EBC Caibiraon	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 52.836.14		0.00%	53.87%	53.87%
57	Pre Escolar Sebastiao Gomes Uai Mori Tula	MINISTERIO DA EDUCASAUN	TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 89.396.09		0.00%		0.00%
58	New Construction Office, Were House And Landscaping Of Viqueque Distric	MINISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN	LM	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	LM Caicasa Metin Unip Lda	01/MSSI/DGAF/DNA/I/2022	\$ 805.366.41		0.00%		0.00%

Inspesaun Husi ,


(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P.


(Eng. Bobiano C. de Jesus Lopes)
Eng. ba Projeto Edifício Público no
Beé Saneamento ADN, I.P.

Verifika Husi ,


(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun ADN, I.P.

Sertifika Husi ,


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Cooordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.


(Eng. Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projeto Mecanical
Electrical, ADN, I.P.


(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Eng. Senior ba Projeto Edifício Público No Beé
Saneamento ADN, I.P.


(Eng. Deolindo de Fatima Marques)
Chefe Seksaun Mecanical Electrical, Informasaun Tecnologia no
Komunikasaun ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Viqueque-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Escola Secundário Geral Calixa
No. kontratu :

Data Inspesau : 11-03-2022

Fatin Inspesau : Caraubalu, viqueque vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.5243842° 126.2234492

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Serbisu Galian tanah keliling bangunan





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projetu : Nova Construção da Escola secundaria geral calixa no code emis 5121
Lokalidade : Macdean uma quie Viqueque villa
Projctu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

					PREVIOUS		THIS BILLING		UP TODATE	
	MAIN SUMMARY	Page No	Amount		AMOUNT \$	%	AMOUNT \$	%	AMOUNT \$	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3		US\$ 3,075.00	\$ -	0.00%	\$ 1,300.00	1.15%	\$ 1,300.00	1.15%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)		US\$ 58,664.20	\$ -	0.00%	\$ 2,354.01	2.08%	\$ 2,354.01	2.08%
III	TOILET BUILDING			US\$ 32,529.17	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
IV	PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)		US\$ 9,751.28	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST				US\$ 104,019.66	\$ -	0.00%	\$ 3,654.01	3.22%	\$ 3,654.01	3.22%
CONTINGENCY				US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD				US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
GRAND TOTAL				US\$ 113,359.66	\$ -	0.00%	\$ 3,654.01	3.22%	\$ 3,654.01	3.22%

Prepared By

Checked By

Approved By

Eng. Bebiano Creencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projctu Edifício Publiku No
Bee Saheamento

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Viqueque-15)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção rehabilitaun Ensino Basica Central Caibira oan
No. kontratu :

Data Inspesaun : 23-03-2022

Fatin Inspesaun : Cabira Oan, Viqueque Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.525418" 126.2155866

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes


2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu Monta Arus Janela no Odomatan

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

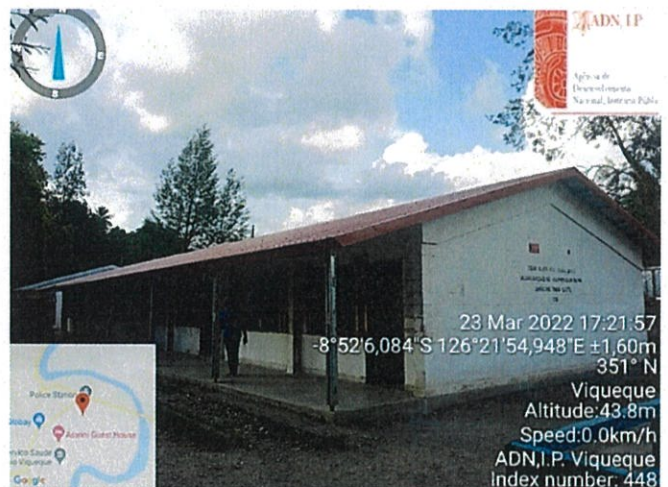



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projetu : Nova Construção rehabilitação EBC Caibira oan
Lokalidade : Caibira oan viqueque villa
Projeto nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

No	MAIN SUMMARY	Original Contract		Previous		This Billing		Up to Date	
		Page No	Amount	Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ 2,579.26	\$ -	0.00%	\$ 1,350.00	2.56%	\$ 1,350.00	2.56%
II	REFURBISHED CLASSROOM BUILDING Rf	C/39	US\$ 40,916.88	\$ -	0.00%	\$ 25,669.44	48.58%	\$ 25,669.44	48.58%
	CONSTRUCTION COST		US\$ 43,496.14	\$ -	0.00%	\$ 27,019.44	51.14%	\$ 27,019.44	51.14%
	CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 1,442.50	2.73%	\$ 1,442.50	2.73%
	GRAND TOTAL		US\$ 52,836.14	\$ -	0.00%	28,461.94	53.87%	\$ 28,461.94	53.87%

Prepared By


Eng. Bebiano Crescêncio De Jesus Lopes
Eng. Município Viqueque

Checked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engineiro Senior ba Projeto Edifício Público No
Bee Saneamento

Aproved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público		INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
Nova Construcão rehabilitasaun Ensino Basica Central Caibira oan								
Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	23/03/2022	Viqueuque Vila	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Serbisu Tuir nafatin matadalan neebe maka iha ona		
					2	Husu ba prezidente grupo atu confirma ho parte edukasaun kona ba pagamento segundo fase nian too iha neebe ona.		
					3			
					4			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Uatolari-5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Gapura, Stairs and Wall Protection in Garden Of Heroes
No. kontratu :

Data Inspesaun : 23-03-2022

Fatin Inspesaun : Lugasa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.5235022, 126.3012066

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes

2.

Sketch & Foto Desenho

Serbisu fila fali galian 100 m3

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Uatolari-5)

Back-up Data



Naran Projeto : New Construction Of Gapura, Stairs and Wall Protection in Garden Of Heroes

No. kontratu :

Sketch Item servisu :

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Serbisu Hada pondasi sepanjang 60 m3

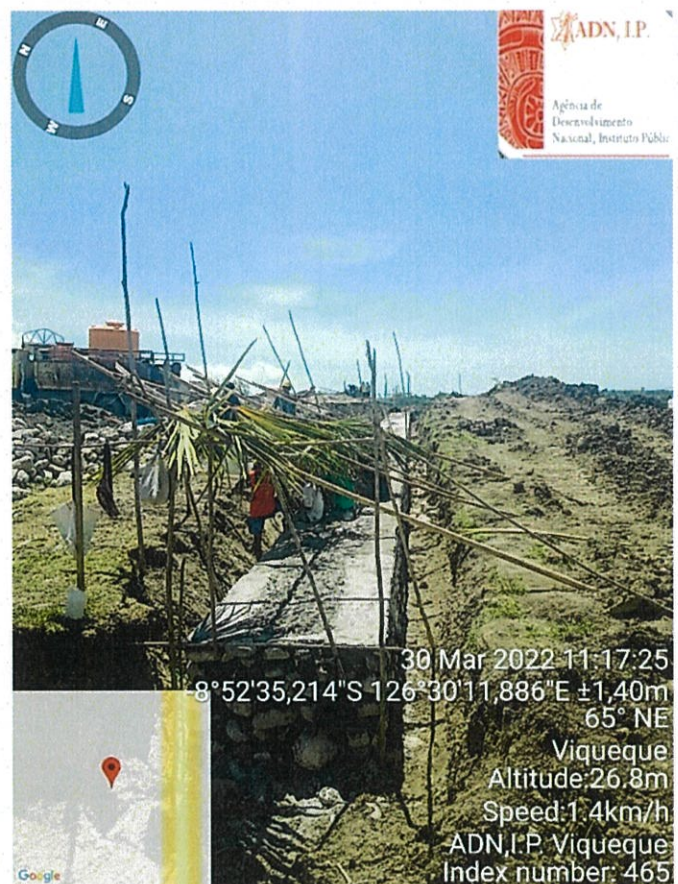



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NAIN BA PROJECTO : MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL
NARAN PROJECTO : NEW CONSTRUCTION OF GAPURA, STAIRS AND WALL PROTECTION IN GARDEN OF HEROES

SUMMARY ORIGINAL CONTRACT				IN PREVIOUS MONTH		IN THIS MONTH		PERCENT UP TO DATE	
NO	URAIAI PEKERJAAN	TOTAL BIAYA (US\$)	PERCENT (%)	AMOUNT \$	PERCENT (%)	AMOUNT \$	PERCENT (%)	AMOUNT \$	PERCENT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	\$ 13,163.50	4.79%	\$ 3,350.00	1.22%	\$ 2,934.62	1.07%	\$ 6,284.62	2.29%
II	KONSTRUKSI GAPURA	\$ 36,560.20	13.29%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
III	KONSTRUKSI PENAHANAN	\$ 171,352.00	62.31%	\$ 6,094.51	2.22%	\$ 48,813.37	17.75%	\$ 54,907.88	19.97%
A	TOTAL	\$ 221,075.69	80.39%	\$ 9,444.51	3.43%	\$ 51,748.00	18.82%	\$ 61,192.51	22.25%
B	FEE CONTRACTOR 10% x (A)	\$ 22,107.57	8.04%	\$ 944.45	0.34%	\$ 5,174.80	1.88%	\$ 6,119.25	2.23%
C	OVERHEAD	\$ 4,850.00	1.76%	\$ 770.00	0.28%	\$ -	0.00%	\$ 770.00	0.28%
D	TAX 2% x (A+B+C)	\$ 4,863.67	1.77%	\$ 207.78	0.08%	\$ 1,138.46	0.41%	\$ 1,346.24	0.49%
E	KONTINGENCY (10% x A)	\$ 22,107.57	8.04%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
F	GRAND TOTAL (D + E + F + G)	\$ 275,004.50	100.00%	\$ 11,366.74	4.13%	\$ 58,061.25	21.11%	\$ 69,427.99	25.25%

Prepared By

Cheked By


Aproved By

Eng. Beblano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque, ADN, I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio Publiku No Bee
Saneamento, ADN, I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validção
de Qualidade, ADN, I.P.

ANEXU D (Uatolari-5)

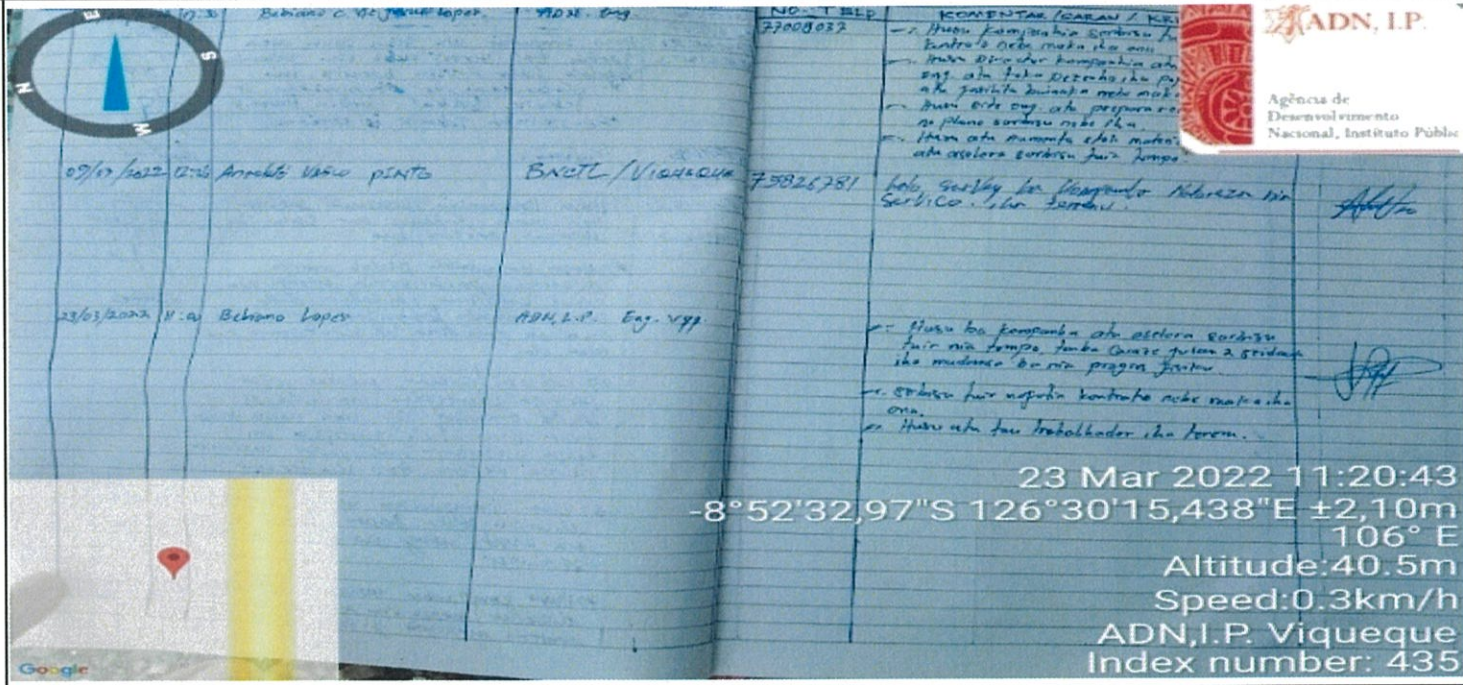 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público		INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN New Construction Of Gapura, Stairs and Wall Protection in Garden Of Heroes	
Kompanha : Natureza Furak Unip. Lda								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	23/03/2022	Uatolari, Lugasa	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Husu kompanhia serbisu tuir nafatin kontrato neebe maka iha ona		
					2	Husu kompanhia atu aselera serbisu tuir nia tempo tanba quaze fulan 2 ona la iha mudansa ba nia progress fisiku iha terenu		
					3	Presija aumenta tan trabalhadores iha terenu.		
					4			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Viqueque-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre-Escolar Maria Lobato
No. kontratu :

Data Inspesaun : 10-03-2022

Fatin Inspesaun : Bosa bein uma wain craic, viqueque villa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.553792" 126.242214

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes



2.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Serbisu Hada Pondasi Fatuk. 59.3 M3

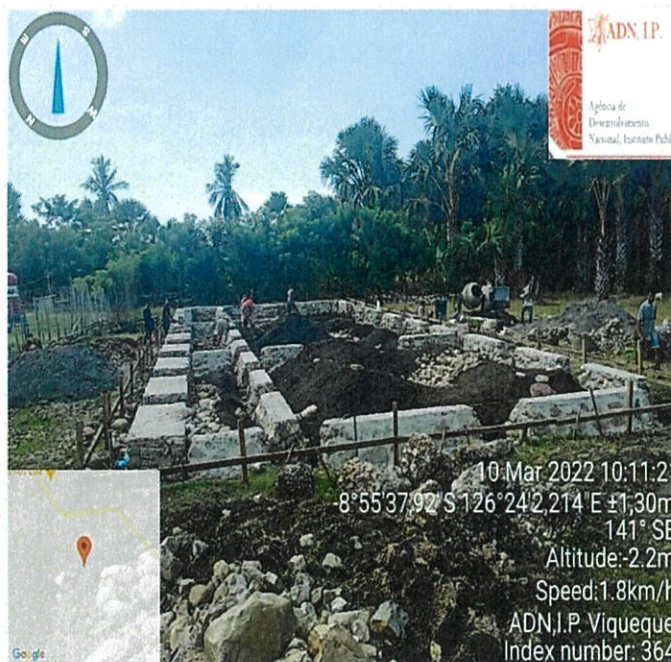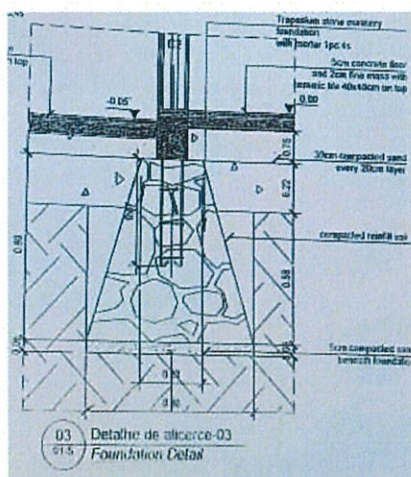



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Viqueque-14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Nova Construção da Escola Pre-Escolar Maria Lobato
:

Serbisu Monta besi sinta rai (Sloof
,) besi Kolom no monta bekisting.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
DO GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ADN, I.P.

Naran Projectu : Nova Construção da Escola maria lobato no code emis 1638
Lokalidade : Bosa bein uma wain craic viqueque villa
Projectu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up To Date	
			Amount \$	%	Amount \$	%	Amount \$	%
I PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,279.26	\$ -	0.00%	1309.63	1.41%	\$ 1,309.63	1.41%
II CLASSROOM BUILDING C2	C/39 (i)	US\$ 56,119.79	\$ -	0.00%	\$ 8,266.67	8.89%	\$ 8,266.67	8.89%
III PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 24,199.84	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST		US\$ 83,598.89	\$ -	0.00%	9,576.30	10.30%	\$ 9,576.30	10.30%
CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 540.00	0.58%	\$ 540.00	0.58%
GRAND TOTAL		US\$ 92,938.89	\$ -	0.00%	10,116.30	10.88%	\$ 10,116.30	10.88%

Prepared By



Eng. Bebiano Crencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque

Checked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio Publiku No
Bee Saneamento

Approved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

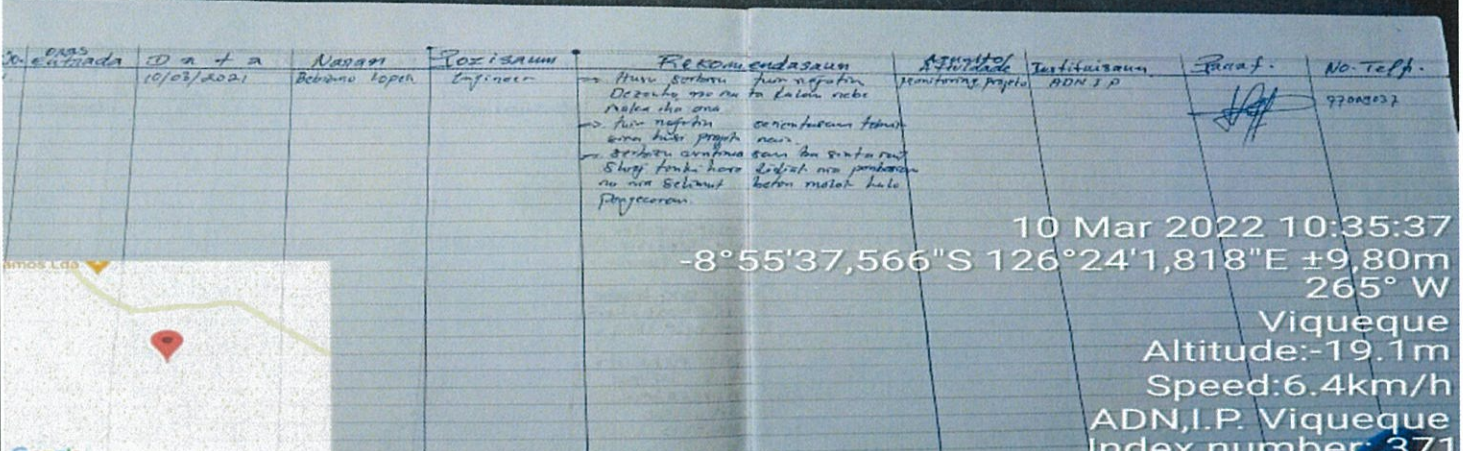 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público		INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
Nova Construção da Escola Pre-Escolar Maria Lobato								
Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	10/03/2022	Viqueuque Vila	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Serbisu Tuir nafatin matadalan neebe maka iha ona		
					2	Tuir nafatin orientasaun husi projecto nain		
					3	serbisu continuasaun ba sinta rai ou sloof tenki hare didiak nia pambesian no selimut beton molok ba pengecoran.		
					4			
					   10 Mar 2022 10:35:37 -8°55'37,566"S 126°24'1,818"E ±9,80m 265° W Viqueuque Altitude:-19.1m Speed:6.4km/h ADN,I.P. Viqueuque Index number: 371			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Uatocarbau-8)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Ensino Secundario Geral Uatucarbau
No. kontratu :

Data Inspesaun : 30-03-2022

Fatin Inspesaun : Irabin de Bixo, Posto Administrativo Uato Carbau

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.4458932" 126.421584


End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu Ke,e rai Pondasi 59 m3



Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projeto : Nova Construção da Escola ESG Uatucarbau
Localidade : Irabin de Bixo, Posto Administrativo Uato Carbau, Município Viqueque
Projeto nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount		Previous		This Billing		Up to Date	
					Amount	%	Amount	%	Amount	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$	4,279.26	\$	-	0.00%	\$	1,729.26	1.91%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	C/39 (i)	US\$	73,342.16	\$	-	0.00%	\$	2,967.31	3.28%
			US\$	3,633.93	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
III	PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$							
CONSTRUCTION COST			US\$	81,255.35	\$	-	0.00%	\$	4,696.57	5.18%
CONTINGENCY			US\$	3,000.00	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
OVERHEAD			US\$	6,340.00	\$	-	0.00%	\$	540.00	0.60%
GRAND TOTAL			US\$	90,595.35	\$	-	0.00%	\$	5,236.57	5.78%

Prepared By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes

Eng. Municipio Viqueque

Checked By


Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo

Engenheiro Senior ba Projeto Edificio Publiku No
Bee Saneamento

Approved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade

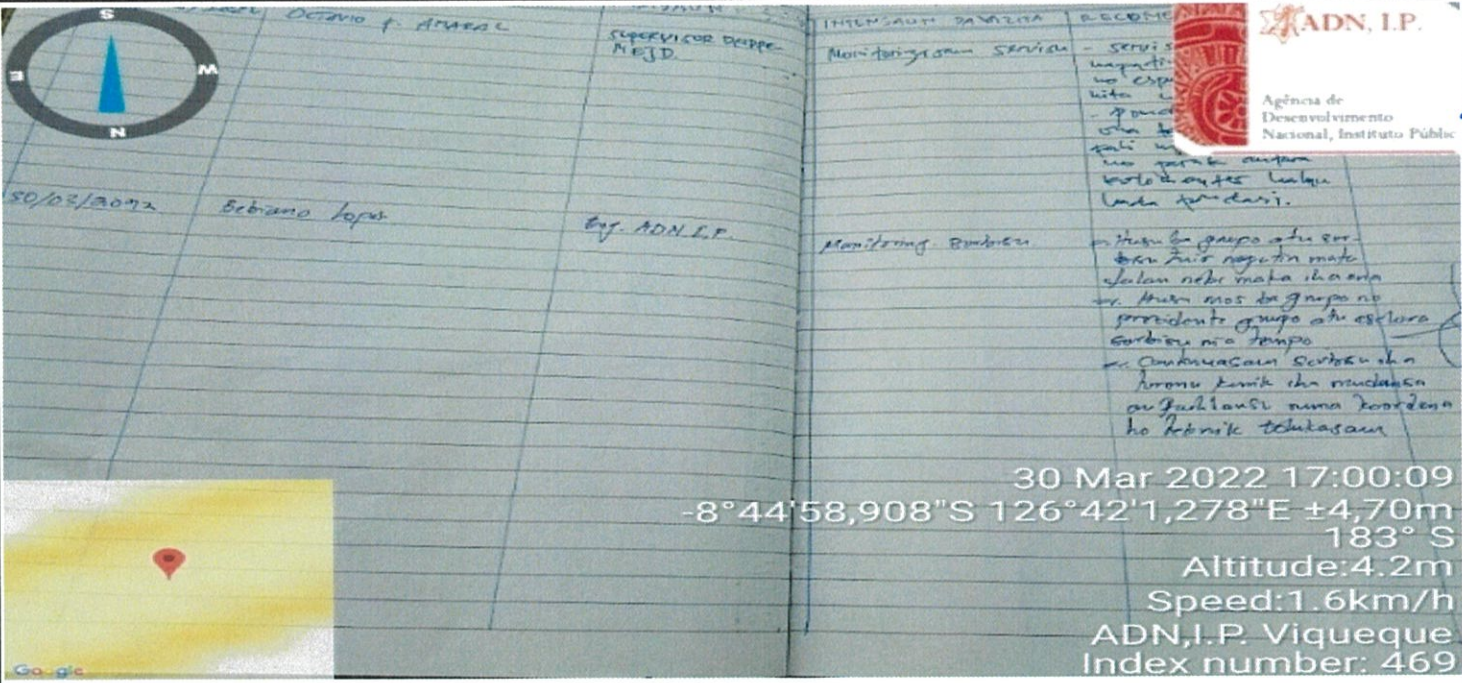 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Nova Construção da Escola Ensino Secundario Geral Uatocarbau							
Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	30/3/2022	Uatocarbau	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Serbisu Tuir nafatin matadalan neebe maka iha ona	
					2	Husu ba prezidente grupo atu aselera serbisu tuir nia tempo	
					3	Continua serbisu karik iha duvidas iha terenu kordena ho teknik sira husi edukasaun	
					4		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Ossu-8)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Health Post and Doctor's House building in Builale
No. kontratu : RDTL-MS-DNA-ICB-21-075

Data Inspesaun : 15-03-2022

Fatin Inspesaun : Builale

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.415532, 126.1953112

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes

2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Pas.Kuda” no Gording Kakuluk ba Doctor
House

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Ossu-8)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: New Construction of Health Post and Doctor's House building in Builale
: RDTL-MS-DNA-ICB-21-075

Pas. Kuda” no Gording ba Kakuluk Health
Post





Project Name : New Construction Of Health Post & Doctor House Building
Location : Builale - Ossu - Viqueque Municipality - Timor Leste
Project Owner : Ministry Of Health

SUMMARY

NO	WORK DESCRIPTION	AMOUNT	REVIEW BOBOT	THIS BILLING		PREVIOUS		THIS BILLING		UP TO DATE	
				TOTAL	BOBOT	TOTAL	BOBOT	TOTAL	BOBOT	TOTAL	BOBOT
A	CONSTRUCTION OF HEALTH POST										
1	PREPARATION WORKS	\$ 3,843.74	0.62%	\$ 1,119.99	0.34%	\$ 3,148.74	0.96%	\$ -	0.00%	\$ 3,148.74	0.96%
2	FUNDATION WORKS	\$ 5,595.02	1.71%	\$ -	0.00%	\$ 5,595.02	1.71%	\$ -	0.00%	\$ 5,595.02	1.71%
3	CONCRETE WORKS	\$ 19,676.14	5.60%	\$ 1,349.05	0.41%	\$ 19,676.14	6.01%	\$ -	0.00%	\$ 19,676.14	6.01%
4	WALL-INSTALATION & PLASTERING	\$ 26,475.29	0.00%	\$ 14,416.52	4.41%	\$ 14,416.52	4.41%	\$ 5,365.88	1.64%	\$ 19,782.40	6.05%
5	CARPENTERS WORKS	\$ 8,040.00	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 4,020.00	1.23%	\$ 4,020.00	1.23%
6	ROOFING WORKS	\$ 19,626.55	0.00%	\$ 9,813.28	3.00%	\$ 9,813.28	3.00%	\$ 5,679.13	1.74%	\$ 15,492.40	4.73%
7	CEILING WORKS	\$ 8,480.49	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
8	FLOOR TILE WORKS	\$ 11,508.17	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
9	ELECTRICAL WORKS	\$ 8,719.34	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 4,359.67	1.33%	\$ 4,359.67	1.33%
10	SANITATION WORKS	\$ 8,651.64	1.19%	\$ 1,100.45	0.34%	\$ 4,983.22	1.52%	\$ -	0.00%	\$ 4,983.22	1.52%
11	PAINTING WORKS	\$ 3,519.72	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
12	APROND & DRAINAGE WORKS	\$ 2,447.84	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
13	TOWER WORKS	\$ 8,983.14	0.00%	\$ 2,637.20	0.81%	\$ 2,637.20	0.81%	\$ -	0.00%	\$ 2,637.20	0.81%
14	PROVISIONAL SUM FOR FURNITURE	\$ 6,500.00	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
15	FINAL CLEARING	\$ 1,000.00	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	TOTAL A	\$ 143,067.08	9.12%	\$ 30,436.48	9.30%	\$ 60,270.11	18.42%	\$ 19,424.68	5.94%	\$ 79,694.79	24.35%
B	DOCTOR HOUSE (RESIDENCIA PROFESIONAL DE SAUDE) 2 UNIT										
1	PREPARATION WORKS	\$ 1,319.62	0.40%	\$ -	0.00%	\$ 1,319.62	0.40%	\$ -	0.00%	\$ 1,319.62	0.40%
2	FUNDATION WORKS	\$ 2,425.57	0.74%	\$ -	0.00%	\$ 2,425.57	0.74%	\$ -	0.00%	\$ 2,425.57	0.74%
3	CONCRETE WORKS	\$ 8,396.82	2.18%	\$ -	0.00%	\$ 7,139.69	2.18%	\$ 1,257.14	0.38%	\$ 8,396.82	2.57%
4	WALL INSTALATION & PLASTERING	\$ 9,421.62	0.00%	\$ 6,553.27	2.00%	\$ 6,553.27	2.00%	\$ -	0.00%	\$ 6,553.27	2.00%
5	STAIRS WORKS	\$ 257.28	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
6	CARPENTERS WORKS	\$ 4,638.00	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 2,319.00	0.71%	\$ 2,319.00	0.71%
7	ROOFING WORKS	\$ 8,879.69	0.00%	\$ 287.70	0.09%	\$ 287.70	0.09%	\$ 4,439.84	1.36%	\$ 4,727.54	1.44%
8	CEILING WORKS	\$ 3,273.44	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
9	TILE WORKS	\$ 4,290.81	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
10	ELECTRICAL WORKS	\$ 4,000.66	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 579.24	0.18%	\$ 579.24	0.18%
11	SANITATION WORKS	\$ 5,786.30	0.95%	\$ 2,693.64	0.82%	\$ 5,786.31	1.77%	\$ -	0.00%	\$ 5,786.31	1.77%
12	PAINTING WORKS	\$ 1,301.89	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
13	PROVISIONAL SUM FOR FURNITURE	\$ 4,000.00	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
14	FINAL CLEARING	\$ 1,000.00	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	TOTAL BUILDING B	\$ 58,991.71	4.27%	\$ 9,534.60	2.91%	\$ 23,512.16	7.19%	\$ 8,595.23	2.63%	\$ 32,107.38	9.81%
	TOTAL BUILDING B (2 UNIT DOCTOR HOUSE)	\$ 117,983.41	8.54%	\$ 19,069.21	5.83%	\$ 47,024.31	14.37%	\$ 17,190.45	5.25%	\$ 64,214.76	19.62%
C	LAND SCAPE WORKS	\$ 20,000.00	4.28%	\$ -	0.00%	\$ 14,000.00	4.28%	\$ -	0.00%	\$ 14,000.00	4.28%
I	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 281,050.49	21.94%	\$ 49,505.69	15.13%	\$ 121,294.42	37.07%	\$ 36,615.13	11.19%	\$ 157,909.55	48.26%
II	CONTACTOR FEE (10% x I)	\$ 28,105.05	2.19%	\$ 4,950.57	1.51%	\$ 12,129.44	3.71%	\$ 3,661.51	1.12%	\$ 15,790.96	4.83%
III	OVER HEAD	\$ 6,150.00	0.47%	\$ -	0.00%	\$ 1,537.50	0.47%	\$ -	0.00%	\$ 1,537.50	0.47%
IV	TAX (2% x (I+II+III))	\$ 6,306.11	0.49%	\$ 1,089.13	0.33%	\$ 2,699.23	0.82%	\$ 805.53	0.25%	\$ 3,504.76	1.07%
V	CONTINGENCIA (2% x I)	\$ 5,621.01	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 732.30	0.22%	\$ 732.30	0.22%
VI		\$ 327,232.66	25.09%	\$ 55,545.38	16.97%	\$ 137,660.59	42.07%	\$ 41,814.48	12.78%	\$ 179,475.07	54.85%

Prepared By

Eng. Bebiano Crecêncio de Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.


Checked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edifício Publiku No Bee
Saneamento ADN, I.P.

Aproved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.

ANEXU D (Ossu-8)

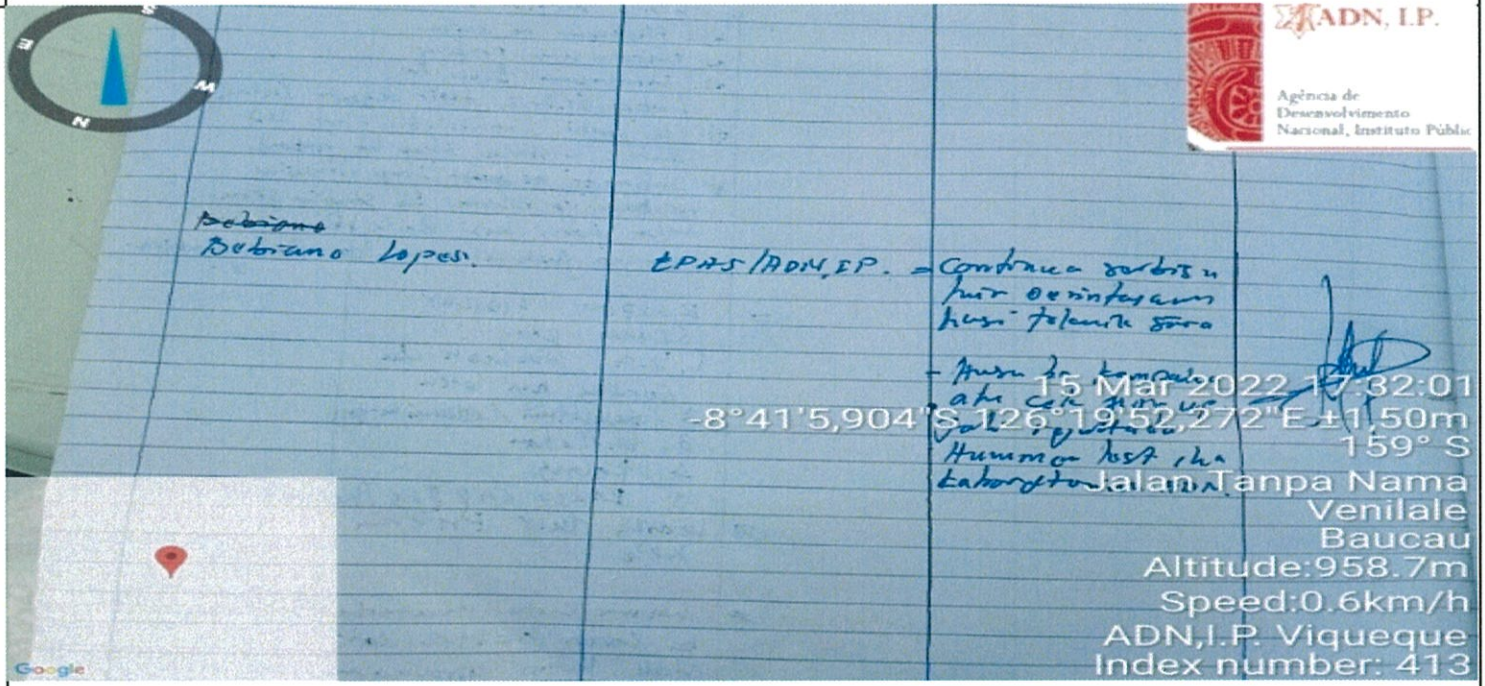 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					New Construction of Health Post and Doctor's House building in Builale		
					Kompanha : Borala unip,lda		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/03/2022	Ossu, Builale	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Continua serbisu tuir nafatin orientasaun husi teknik sira	
					2	Husu ba kompanhia atu fallow up fali rejultado hummer test husi laboratorium A.D.N	
					3		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (UatC- 5)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uato-Carbau
No. kontratu : 675/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019

Data Inspesaun : 10-03-2022

Fatin Inspesaun : Suco Irabin Decima, Uatocarbau, Viqueque

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.45097156 , Latetude : 126.415350248

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1. Eng. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes

2.

3.


4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

- Projeto refere nia fisiku atinji ona 100% maibe pagamento seidak bele atinji 100% tanba iha mudansa item iha terenu no presija halo justifikasaun ho as build drawing molok ba pagamento 100%

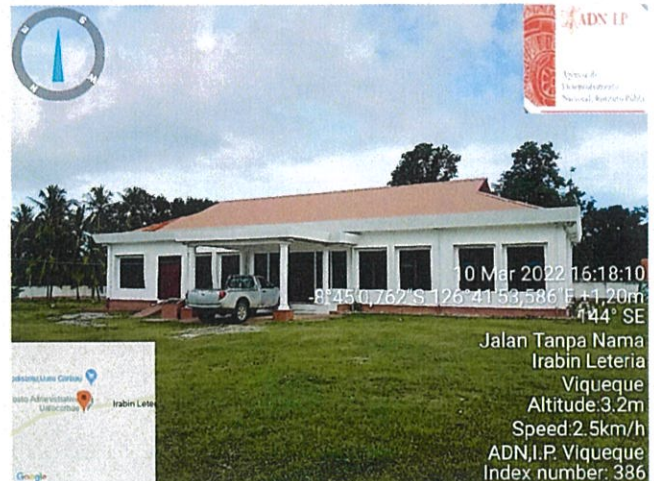



ANEXU C1 (UatL- 6)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Uatolari
No. kontratu : 665/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019

Data Inspesaun : 10-03-2022

Fatin Inspesaun : Suco Matahoi, Uatolari, Viqueque

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.491503 , Latetude : 126.3155386

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1. Eng. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes

2.

3.


4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeto refere nia fisiku atinji ona 100% maibe pagamento seidaunk bele atinji 100% tanba iha mudansa item iha terenu no presija halo justifikasaun ho as build drawing molok ba pagamento 100%

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

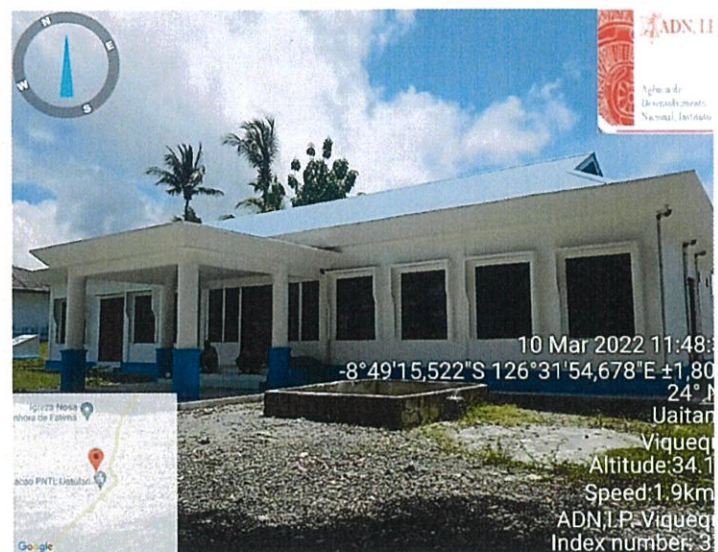



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Uatolari-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica filial ualaka
No. kontratu :

Data Inspesaun : 23-03-2022

Fatin Inspesaun : Macadiki

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.4514286" 126.3157234

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu Galian krliling bangunan

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Naran Projetu : Nova Construção da Escola basica filial ualaka no code emis 791
Lokalidade : Sana uaiame Uatolari viqueque
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

MAIN SUMMARY			Previous		This Billing		Up to Date	
	Page No	Amount	Amount \$	%	Amount \$	%	Amount \$	%
I PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,879.26	\$ -	0.00%	1979.26	1.86%	\$ 1,979.26	1.86%
II CLASSROOM BUILDING Cb	C/39 (i)	US\$ 78,149.38	\$ -	0.00%	\$ 6,107.91	5.74%	\$ 6,107.91	5.74%
IV PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 15,106.78	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST		US\$ 97,135.42	\$ -	0.00%	\$ 8,087.17	0.08	\$ 8,087.17	7.60%
CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
GRAND TOTAL		US\$ 106,475.42	\$ -	0.00%	\$ 8,087.17	\$ 0.08	\$ 8,087.17	7.60%

Prepared By

Checked By

Approved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projetu Edifício Publiku No
Bee Saneamento

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Uatolari-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica Central
No. kontratu :

Data Inspesaun : 14-03-2022

Fatin Inspesaun : Matahoi, Uatolari

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.525418° 126.2155866

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu Ke'e pondasi keliling bangunan

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projettu : Nova Construção da Escola basica Central no code emis 5321
Lokalidade : Matahoi, Uatolari, Viqueque.
Projettu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
			Amount	%	Amount	%	Amount	%
I PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,875.00	\$ -	0.00%	1557.5	2.22%	\$ 1,557.50	2.22%
II CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 53,213.90	\$ -	0.00%	\$ 8,156.24	11.62%	\$ 8,156.24	11.62%
III PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 3,762.31	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST		US\$ 60,851.21	\$ -	0.00%	\$ 9,713.74	13.84%	\$ 9,713.74	13.84%
CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
GRAND TOTAL		US\$ 70,191.21	\$ -	0.00%	\$ 9,713.74	13.84%	\$ 9,713.74	13.84%

Prepared By


Checked By

Approved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projettu Edifício Publiku No
Bee Sancamento

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Nova Construção da Escola basica Central Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	14/03/2022	Uatolari	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Serbisu Tuir nafatin matadalan neebe maka iha ona	
					2	Husu ba site eng. Atu prepara relatorio mensal	
					3		
					4		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Uatocarbau-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola basica central uatocarbau
No. kontratu :

Data Inspesaun : 10-03-2022

Fatin Inspesaun : Irabin Literia, Uatocarbau

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.452418" 126.4144874

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes

2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu Pembesian ba sinra rai/sloff

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Naran Projeto : Nova Construção da Escola básica central uatocarbao no code emis 5319
Lokalidade : Matadalan,, Irabin de Bixo,Uatocarbau, viqueque.
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
			Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %
I PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,879.26	\$ -	0.00%	1289.26	1.52%	\$ 1,289.26	1.52%
II CLASSROOM BUILDING Ca	C/39 (i)	US\$ 66,202.64	\$ -	0.00%	\$ 6,846.22	8.05%	\$ 6,846.22	8.05%
IV PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 5,594.73	\$ -	0.00%	\$ -		\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST		US\$ 75,676.63	\$ -	0.00%	\$ 8,135.48	9.57%	\$ 8,135.48	9.57%
CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 540.00	0.64%	\$ 540.00	0.64%
GRAND TOTAL		US\$ 85,016.63	\$ -	0.00%	\$ 8,675.48	10.20%	\$ 8,675.48	10.20%

Prepared By

Eng. Bebiano Creencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque


Checked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projettu Edificio Publiku No
Bee Saneamento

Approved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

ANEXU D (Uatocarbau-7)

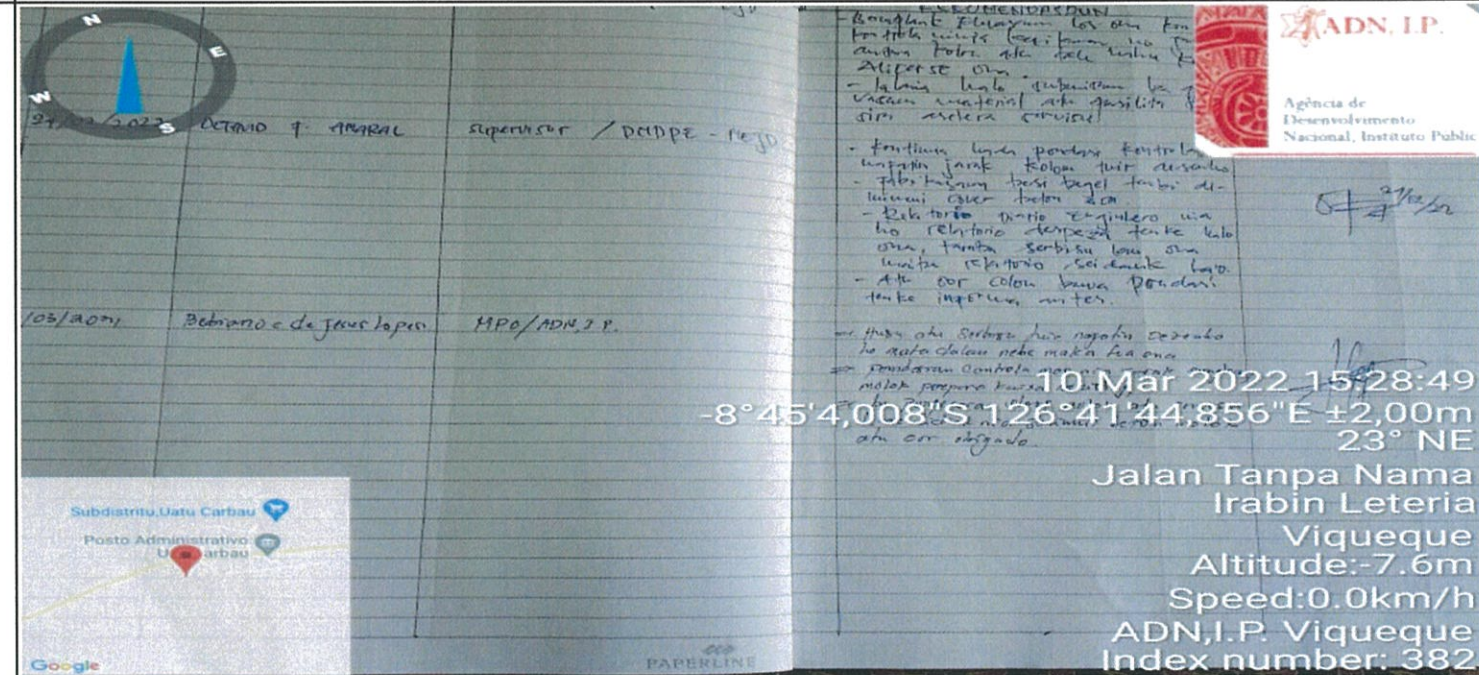 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
					Nova Construção da Escola basica central uatocarbau						
					Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				Asinatura	
I	3/10/2022	Uatocarbau	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Serbisu Tuir nafatin matadalan neebe maka iha ona					
					2	Husu ba site eng. Atu controla jarak sengkang no selimut beton molok ba pengecoran sloof					
					3						
					4						
											



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Viqueque-13)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Bazika filial ularihic kraras
No. kontratu :

Data Inspesaun : 24-03-2022

Fatin Inspesaun : Kraras, Viqueque Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.5123748" 126.1824822

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Serbisu Hada pondasi haleu bangunan





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projectu : Nova Construção da Escola filial ularihic kraras no code emis 5125
Lokalidade : bibileo,craras,viqueque villa.
Projectu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
			Amount	%	Amount	%	Amount	%
I PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,075.00	\$ -	0.00%	\$ 945.00	1.34%	\$ 945.00	1.34%
II CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 51,986.89	\$ -	0.00%	\$ 5,076.36	7.19%	\$ 5,076.36	7.19%
III PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 6,231.37	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST		US\$ 61,293.26	\$ -	0.00%	\$ 6,021.36	8.52%	\$ 6,021.36	8.52%
CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 540.00	0.76%	\$ 540.00	0.76%
GRAND TOTAL		US\$ 70,633.26	\$ -	0.00%	\$ 6,561.36	9.29%	\$ 6,561.36	9.29%

Prepared By

Checked By


Approved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projectu Edificio Publiku No
Bee Saneamento

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

ANEXU D (Viqueuqe-13)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					Nova Construção da Escola Bazika filial ularihic kraras		
					Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	24/03/2022	Viqueuque Vila	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Serbisu Tuir nafatin matadalan neebe maka iha ona	 24 Mar 2022 11:20:24 -8°51'25,506"S 126°18'25,662"E ±4,70m 250° W Altitude:71.9m Speed:0.5km/h ADN,I.P. Viqueuque Index number: 455
					2	Husu ba site eng. Atu hare didiak nia pambesian ho bekisting ba selimut beton molok ba pengecoran	
					3		
					4		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Ossu-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola secundaria geral olocassa
No. kontratu :

Data Inspesaun : 9-03-2022

Fatin Inspesaun : Ossu Decima, Ossu

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.525418" 126.2155866

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Serbisu Monta bekisting ba sinta rai/sloof





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Ossu-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola secundaria geral olocassa
No. kontratu :

Preparasaun ba pengecoran sloof



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
DO GOVERNO CONSTITUCIONAL



Naran Projectu : Nova Construção da Escola secundaria geral olocassa no code emis 1151.
Lokalidade : baca isi ossu de cima viqueque villa
Projectu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This billing		Up to Date	
			Amount \$	%	Amount \$	%	Amount \$	%
I PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,075.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
II CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 59,579.97	\$ -	0.00%	\$ 5,858.39	11.09%	\$ 5,858.39	11.09%
III TOILET BUILDING		US\$ 7,549.35	\$ -	0.00%	\$ 843.13	1.60%	\$ 843.13	1.60%
IV PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 7,909.41	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST		US\$ 78,113.73	\$ -	0.00%	6,701.52	12.68%	\$ 6,701.52	12.68%
CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
GRAND TOTAL		US\$ 87,453.73	\$ -	0.00%	6,701.52	12.68%	\$ 6,701.52	12.68%

Prepared By

Checked By


Approved By

Eng. Bebianno Creencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projetu Edificio Publiku No
Bee Saneamento

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

ANEXU D (Ossu-12)

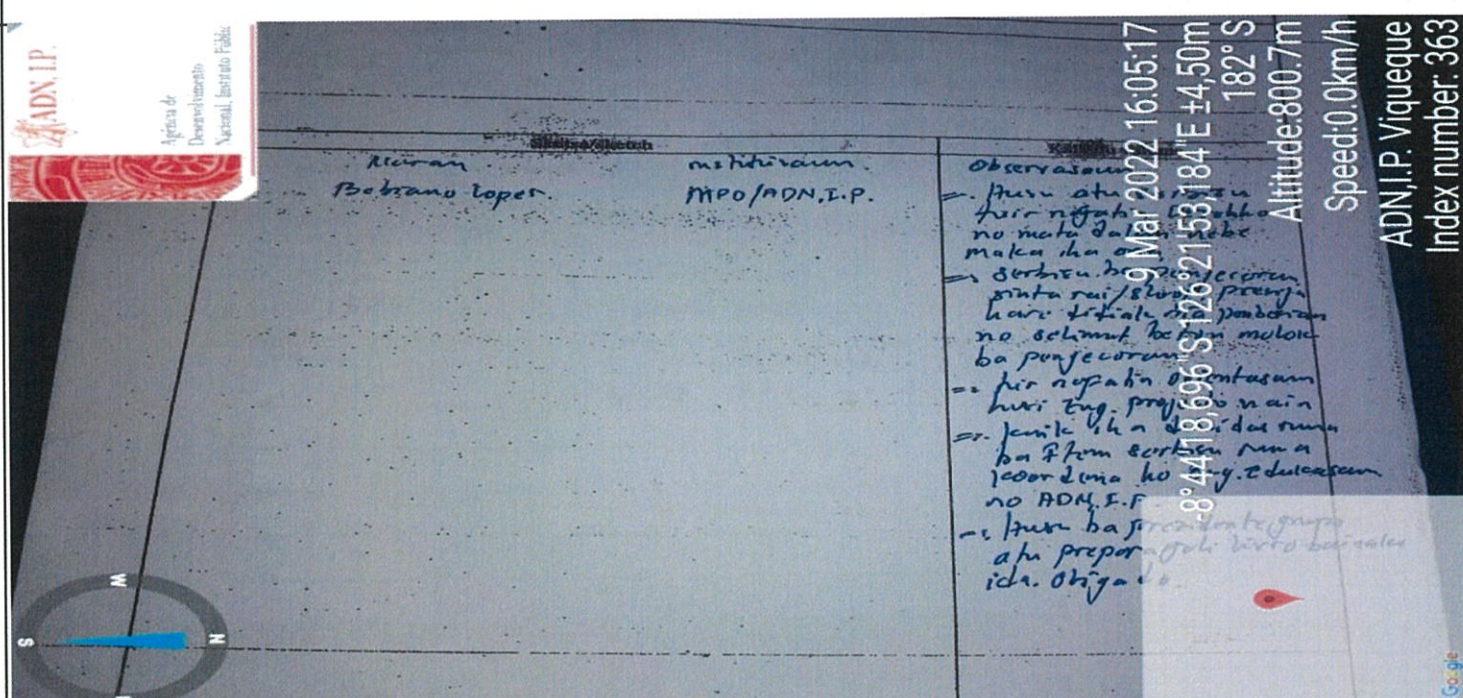 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Nova Construção da Escola secundaria geral olocassa							
Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	3/09/2022	Ossu	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Serbisu Tuir nafatin matadalan neebe maka iha ona	
					2	Serbisu ba pengecoran sinta rai/sloof site eng.presija hare didiak pambesian ba selimut beton.	
					3	Husu ba prezidente grupo atu prepara livro bainaka.	
					4		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Ossu-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre Escolar Uaibua
No. kontratu :

Data Inspesaun : 9-03-2022

Fatin Inspesaun : Ossu Decima, Ossu

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.449576" 126.228748

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes
2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu Pasangan batu keliling bangunan

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Ossu-11)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Nova Construção da Escola Pre Escolar Uaibua
:

Serbisu Pembesian sloof no Monta Bekisting



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Naran Projetu : Nova Construção da Escola Pre Escolar Uaibua no code emis 1694
Lokalidade : Lugabuti, Ossu de Cima, Ossu, Viqueque
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

			Previous		This Billing		Up to Date	
	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Percent %	Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,579.26	0.00%	1,789.63	2.06%	1,789.63	2.06%
II	CLASSROOM BUILDING	C/39 (i)	US\$ 62,959.35	0.00%	6,752.46	7.78%	6,752.46	7.78%
III	PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 10,860.91	0.00%	\$ -	0.00%	-	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 77,399.52	0.00%	8,542.09	9.85%	8,542.09	9.85%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	0.00%	\$ -	0.00%	-	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	0.00%	\$ -	0.00%	-	0.00%
GRAND TOTAL			US\$ 86,739.52	0.00%	8,542.09	9.85%	8,542.09	9.85%

Prepared By

Eng. Bebiano Crecêncio De Jesus Lopes
Eng. Município Viqueque


Checked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeltu Edifício Publiku No Bee Saneamento

Aproved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade

ANEXU D (Ossu-11)

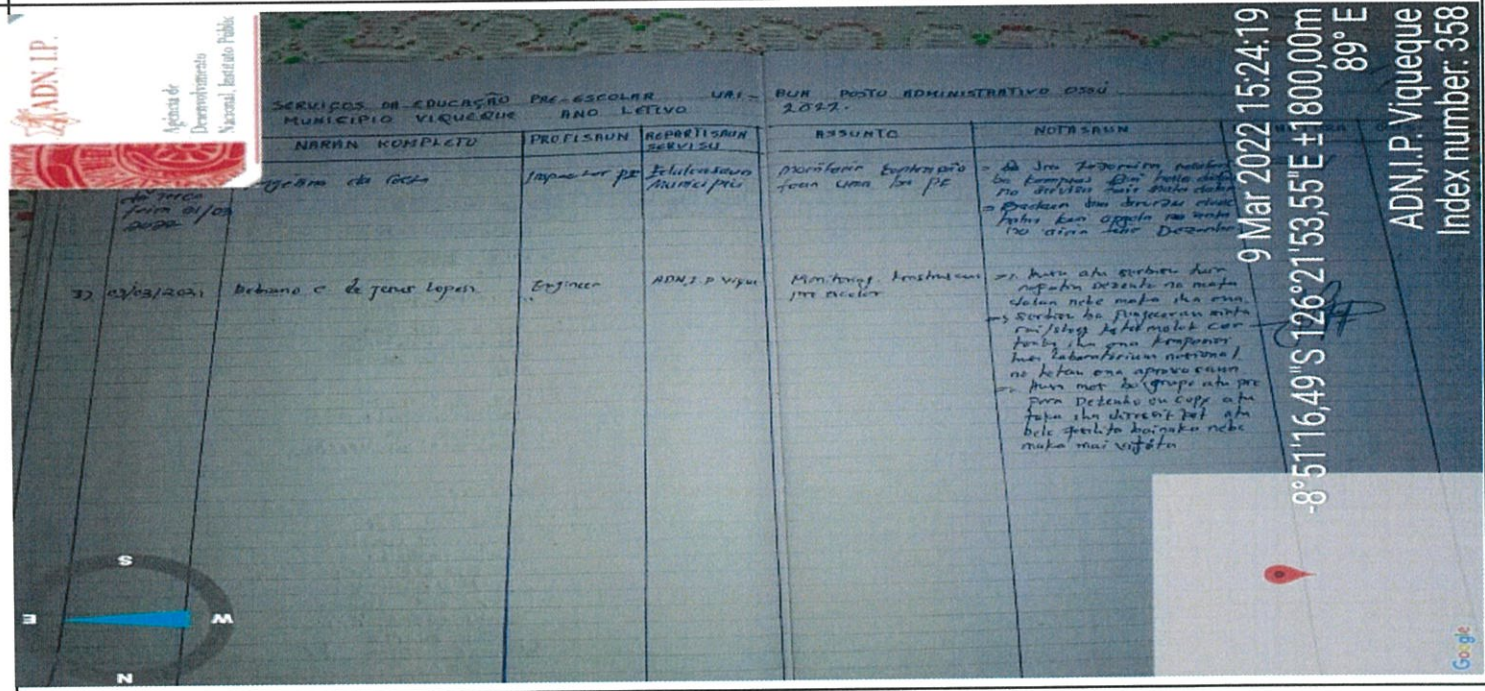 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Nova Construção da Escola Pre Escolar Uaibua												
Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO												
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			Asinatura			
I	9/03/2022	Ossu	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Serbisu Tuir nafatin matadalan neebe maka iha ona						
					2	Serbisu ba pengecoran sloof molok pengecoran tenki iha ona komposisi husi laboratorium nasinal						
					3	Husu ba presidente grupo atu copy dezenho,boq no spesifikasaunatu taka iha direcsi ket hodi fasilita bainaka nebee maka mai vijita						
					4							
												



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Uatolari-18)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Escola basica Felial debuisi
No. kontratu :

Data Inspesaun : 23-03-2022

Fatin Inspesaun : Macadiki, Uatolari

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.4441568" 126.3242492

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes

2.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Serbisu pasangan pondasi keliling bangunan





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projetu : Nova Construção Escola basica Filial Debuisi
Lokalidade : Macadiki, Uatolari, Viqueque.
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
			Amount	%	Amount	%	Amount	%
I PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 2,800.00	\$ -	0.00%	1,400.00	1.43%	\$ 1,400.00	1.43%
II CLASSROOM BUILDING CDL	C/39 (i)	US\$ 46,972.86	\$ -	0.00%	4,697.29	4.78%	\$ 4,697.29	4.78%
III TOILET BUILDING	C/40	US\$ 25,936.05	\$ -	0.00%	-	0.00%		
IV PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 13,123.60	\$ -	0.00%	-	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST		US\$ 88,832.51	\$ -	0.00%	6,097.29	6.21%	\$ 6,097.29	6.21%
CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	-	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	-	0.00%	\$ -	0.00%
GRAND TOTAL		US\$ 98,172.51	\$ -	0.00%	6,097.29	6.21%	\$ 6,097.29	6.21%

Prepared By

Checked By


Approved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projetu Edificio Publiku No
Bee Saneamento

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade

ANEXU D (Uatolari-18)

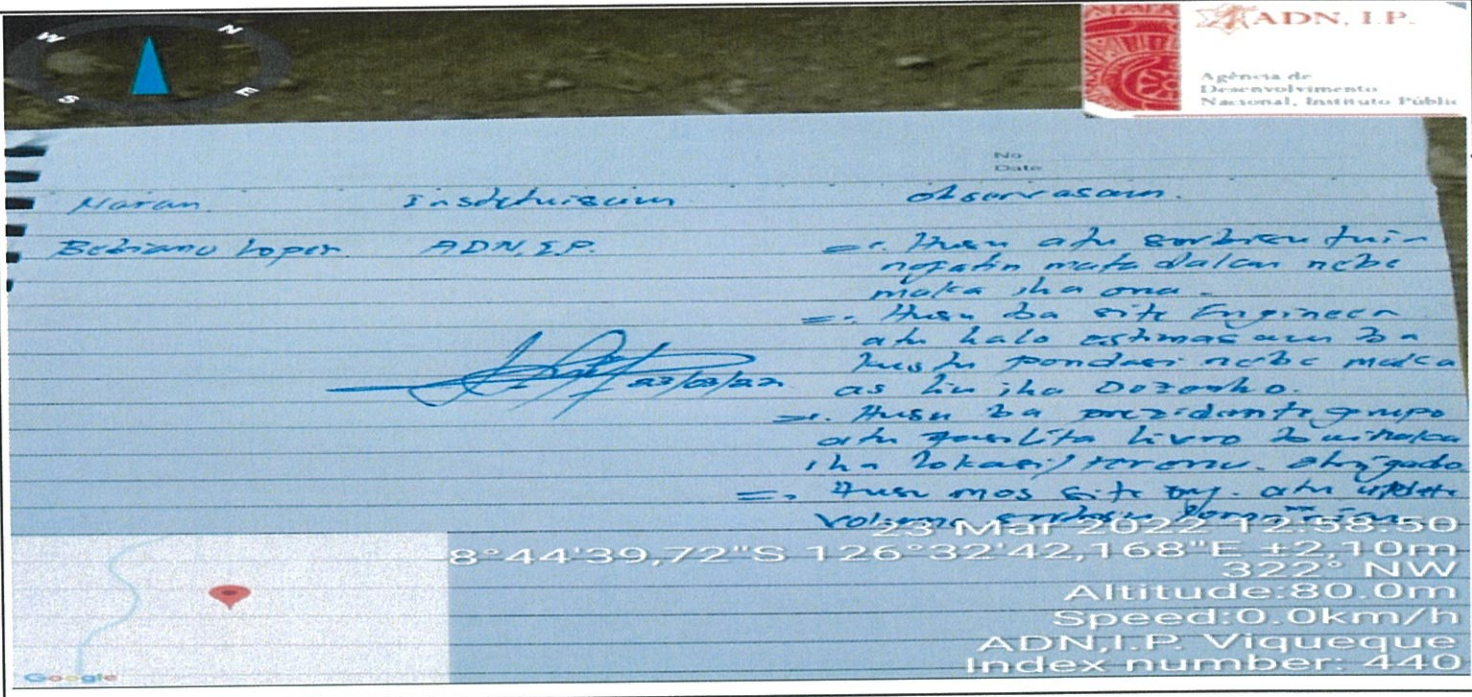 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público		INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
Nova Construção Escola basica Felial debuisi								
Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	23/03/2022	Uatolari	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Serbisu Tuir nafatin matadalan neebe maka iha ona		
					2	Husu ba site eng. Atu halo estimasaun ba kustu pondasi nebe maka aas liu iha dezenho		
					3	Husu ba prezidente grupo atu fasilita livro bainaka iha terenu		
					4			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Oss-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Rehabilitation of Assalaitula - Ossu Sta. 5+155 - 14+000
Municipality Viqueque
No. kontratu : SSS/064/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 16/03/2022 & 25/03/2022

Fatin Inspesaun : Ossu

Koordinadas :

Start Point : Long : (-8 38'38.21" S) Latetude : (126'22'33.38" E)

End Point : Long : (-8 50'55.35" S) Latetude : (126'21'59.71" E)

Naran Inspector : Eng. Roberto M. Martins

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu : Reinforced Still Bar For Box
Drain (Ls)

Sta : 11+275 - 11+291.20

Sta : 11+298.90 - 11+380

Sta : 11+394.5 - 11+489

Total Volume = 5,615.66 Kg

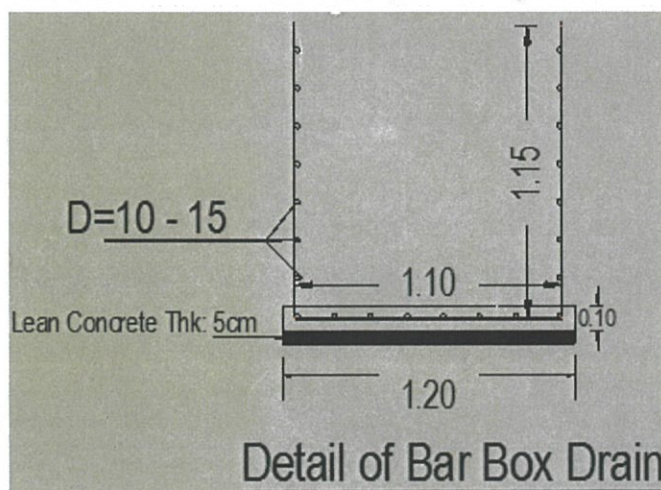

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Reinforced Still Bar For Box Drain (Ls)





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


ANEXU C1 (Oss-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Rehabilitation of Assalaitula - Ossu Sta. 5+155 - 14+000
Municipality Viqueque
No. kontratu : SSS/064/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Structural Concrete Class A, 25
Mpa, Sta 11 + 298 To 11 + 344.12
W = 1.2 m, H = 0.1 m
Distance = 46.12 m
Volume = 5.54 Cu.m

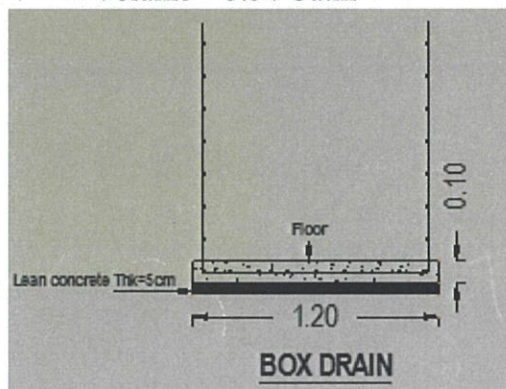


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Structural Concrete Class A, 25 Mpa For
Box Drain (Ls)



Sketch & Foto Desenho

Stone Masonry
Volume = 1020.69 Cu.m

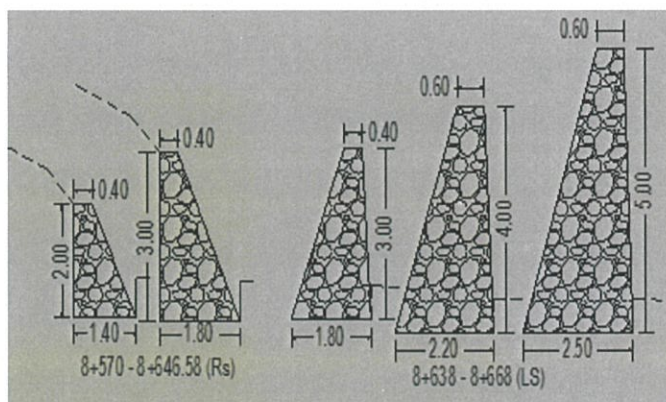

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Stone Masonry





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


ANEXU C2 (Ossu-1)

Project Name : Road Rehabilitation of Assalaitula – Ossu Sta. 5+155 – 14+000, Viqueque Municipality
Contract Number : SSS/064/MOPTC-2017
Contractor Name : Uhacae Unip. Lda
Progres Monitoring : Marcu 2022

BACKUP DATA

Pay Item No.	ITEM DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		REVISED CONTRAC		PROGRESS PREVIOUS 2021		PROGRESS MARCH 2022		PROGRESS UP TO DATE 2022	
		AMOUNT (USD)	Percent (%)	AMOUNT (USD)	Percent (%)	AMOUNT (USD)	Percent (%)	AMOUNT (USD)	Percent (%)	AMOUNT (USD)	Percent (%)
100	General Requirements	\$ 26,680.00	0.55%	\$ 26,680.00	0.55%	\$ 17,990.00	0.37%	\$ -	0.00%	\$ 17,990.00	0.37%
200	Earth works	\$ 422,037.15	8.70%	\$ 901,750.42	18.60%	\$ 379,626.30	7.83%	\$ -	0.00%	\$ 379,626.30	7.83%
300	Sub-Base and Course and Base Course	\$ 486,707.83	10.04%	\$ 702,501.43	14.49%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
500	Bridge Construction	\$ 518,067.91	10.68%	\$ 519,752.76	10.72%	\$ 66,197.16	1.37%	\$ 150,985.39	3.11%	\$ 217,182.56	4.48%
600	Drainage and Slope Protection Structures	\$ 2,868,551.21	59.15%	\$ 2,171,359.48	44.78%	\$ 1,642,874.23	33.88%	\$ 137,261.67	2.83%	\$ 1,780,135.90	36.71%
A	Grant Total :	\$ 4,322,044.10	89.13%	\$ 4,322,044.09	89.13%	\$ 2,106,687.69	43.44%	\$ 288,247.06	5.94%	\$ 2,394,934.75	49.39%
B	Fee Contractor 10 % x (A)	\$ 432,204.41	8.91%	\$ 432,204.41	8.91%	\$ 210,668.77	4.34%	\$ 28,824.71	0.59%	\$ 239,493.48	4.94%
C	Tax 2 % x (A+B)	\$ 95,084.97	1.96%	\$ 95,084.97	1.96%	\$ 46,347.13	0.96%	\$ 6,341.44	0.13%	\$ 52,688.56	1.09%
	Total (USD)	\$ 4,849,333.48	100.00%	\$ 4,849,333.48	100.00%	\$ 2,363,703.59	48.74%	\$ 323,413.21	6.67%	\$ 2,687,116.79	55.41%


Prepara Husi :



(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Verifika Husi :


(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

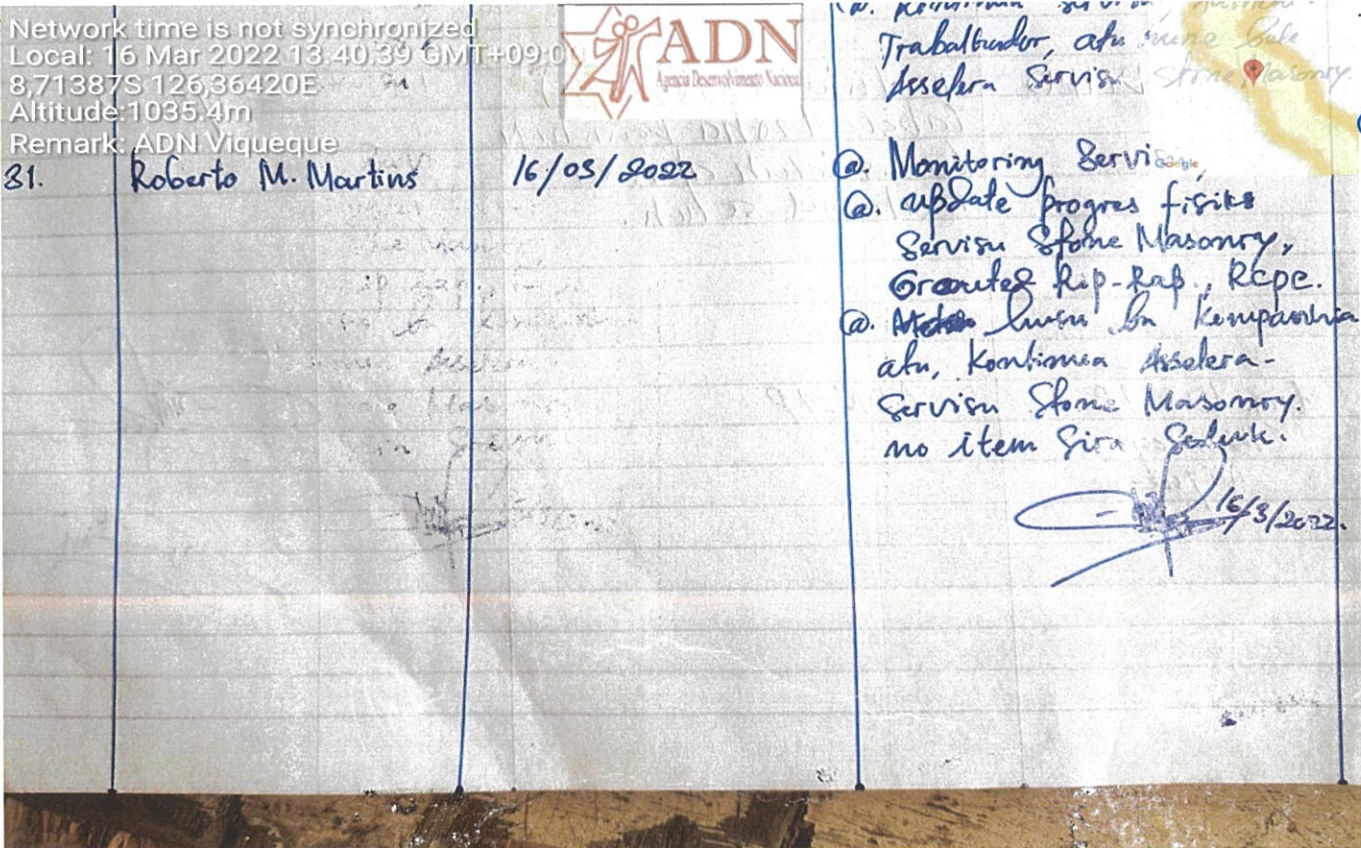 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
Naran projeto : Road Rehabilitation of Assalaitula - Ossu Sta. 5+155 - 14+000 Municipality Viqueque											
Kompanha : Uhacae, Lda											
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			Asinatura		
					1	Monitoring Servisu					
					2	Update Progres fisik servisu Stone Masonry, Grauted Rip-Rap, RCPC					
					3	Husu ba kompanhia atu kontinua Asselera Servisu Stone Masonry no Item Sira Seluk					
					4						
	16/03/2022 & 25 /03/2022	Viqueque / Osso	Roberto M.Martins	Eng.ITI,ADN,IP. Municipio Viqueque							



ANEXU C1 (Oss-2)

Back-up Data

Naran Projeto : Manutensaun Estrada Luihono-Osorua Sta. 0+000-6+750- Municipal of Viqueque

No. kontratu : RT/072/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 9 / 03 / 2022 & 25/03/2022

Fatin Inspesaun : Ossu, Luihono Osorua

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. -8.452196), Latetude : (E.126.244785)

End Point : Long : (S. -8.452219), Latetude : (E. 126.244734)

Naran Inspector : Eng. Roberto M. Martins


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Iha data 09/03/2022 no 25/03/2022 Bainhira

Eng.ADN,IP. Munisipio Viqueque halo monitorijasaun iha terreno observa katak ba projetu refere la iha actividade servisu iha terreno.

Observasaun iha terreno no Foto Aktual

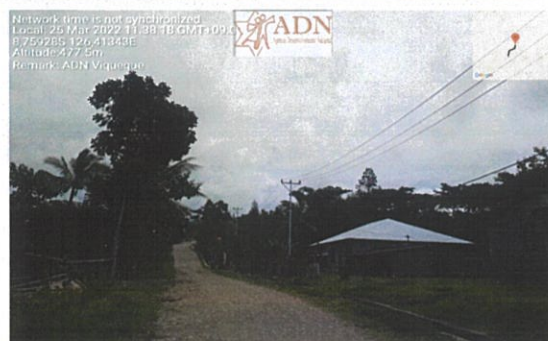



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Manutensaun Estrada Luihono-Osorua Sta. 0+000-6+750-
Municipal of Viqueque

Kompanha : Boru- Buty Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	09/03/2022 & 25/03/2022	Ossu	Roberto M.M	Eng. ITI,ADN,I.P. Municipio Viqueque	1	Eng. kompanhia laiha terreno	
					2	Direksiket Companhia Mamuk	
					3	Laiha Actividade Servisu iha terreno	
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Oss-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Rehabilitation Ossu de Cima -Liawaioli Sta. 0+000 - 2+000
Municipality Viqueque

No. kontratu : SSS/064/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 25/03/2022

Fatin Inspesaun : Ossu de Cima

Koordinadas :

Start Point : Long : S -8.44713374 Latetude : E 126.221520561

End Point : Long : S -8.44337669 Latetude : E 126.213197652

Naran Inspector : Eng. Roberto M. Martins

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu:

Laiha Actividade servisu bainhira Eng.Adn
ba halo monitorijasaun.

No direksiket kompanhia nian mamuk hela

Observasaun iha tereno no Foto Aktual :

Laiha Actividade Iha Terreno

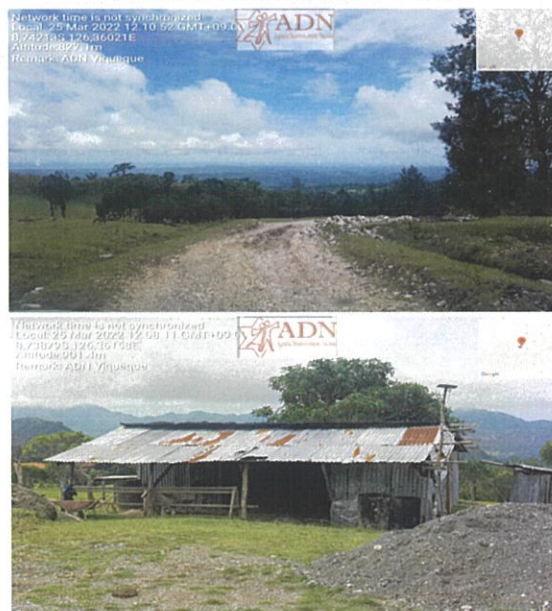



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liawaioli
Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality

Kompanha : Kay Seng Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	25/03/2022	Ossu.	Eng. Roberto M.M	Eng.ITI,ADN ,I.P, Municipio Viqueque	1	Eng. Kompania laiha tereno	
					2	Direksiket kompania taka hela	
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



ANEXU C1 (Oss-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodic Maintenance Luihono - Osorua Chainage 0+000 - 6+800 Routine Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400 Municipality Viqueque (162)

No. kontratu : MPW-W-190084

Data Inspesaun : 09/03/2022 & 25/03/2022

Fatin Inspesaun : Ossu Luihonu

Koordinadas :

Start Point : Long : (S -8.464097932), Latetude : (E 126.231849766)

End Point : Long : (S -8.464108523), Latetude : (E 126.232043187)

Naran Inspector : Eng.Roberto M. Martins

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu ... Structures

W=2.00 m

H = 0.12 m


Distance = 215 m

Volume = 51.6 Cu.m



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Plam Concrete (RS)

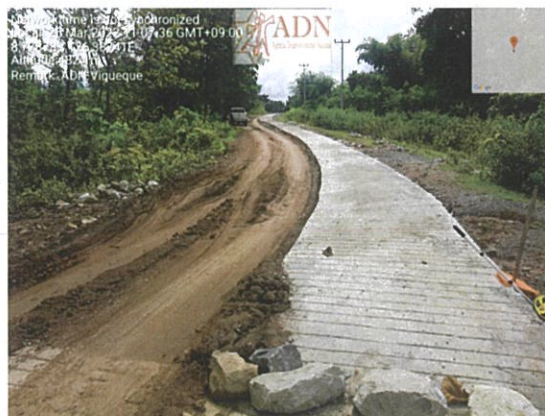

ANEXU C1 (Oss-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodic Maintenance Luihono - Osorua Chainage 0+000 - 6+800 Routine Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400 Municipality Viqueque (162)

No. kontratu : MPW-W-190084

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu ... Structures

$W = 2.00 \text{ m}$

$H = 0.05 \text{ m}$


Distance = 215 m

Volume = 21.5 Cu.m



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Lean Concrete Under Plam Concrete (Ls)

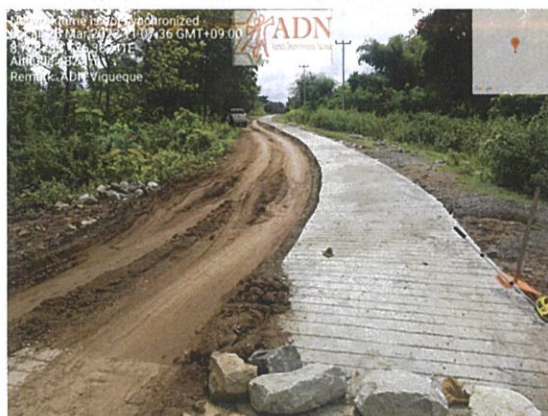

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu ... Structures


$W_a = 0.3 \text{ m}$, $W_b = 0.5$

$H = 0.45 \text{ m}$

Distance = 38 m

Area = 0.33 Sq.m

Volume = 6.84 Cu.m



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Stone masonry - finished





ANEXU C2 (Oss-4)

Project Name		: From Luihono - Osorua Chainage Sta 0+000 - 6+800										
Contract Number		: MPW - W - 190084										
Contractor Name		: Kay Seng Unip. Lda										
SUMMARY												
Pay Item No.	ITEM DESCRIPTION	CONTRACT VALUE (USD)		REVISED CONTRACT		PREVIOS PROGRES		PROGRES MARCH 2022		PROGRES MONITORING PROJECT		
		Total Amount US	Weight %	Total Amount US	Weight %	Total Amount US	Weight %	Total Amount US	Weight %	Progress on Site		REMARKS
										Total Amount US	Weight %	
R-01	General - Works	\$18,956.53	6.35%	\$18,956.53	6.35%	\$ 700.00	0.23%	\$ -	0.00%	\$ 700.00	0.23%	
R-03	Earth Works	\$9,200.39	3.08%	\$9,200.39	3.08%	\$ 7,149.52	2.40%	\$ -	0.00%	\$ 7,149.52	2.40%	
R-05	Sub-Base and Pavement	\$6,580.38	18.95%	\$56,580.38	18.95%	\$ 18,514.95	6.20%	\$ -	0.00%	\$ 18,514.95	6.20%	
R - 08	Structures	\$118,458.12	39.68%	\$118,458.12	39.68%	\$ 45,834.99	15.35%	\$ 8,863.88	2.97%	\$ 54,698.87	18.32%	
R - 10	Dayworks	\$250.00	0.08%	\$250.00	0.08%	\$ 200.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.07%	
R - 11	Routine Maintenance	\$9,672.50	3.24%	\$9,672.50	3.24%	\$ 5,815.30	1.95%	\$ -	0.00%	\$ 5,815.30	1.95%	
R-13	General expenses	\$5,498.00	1.84%	\$5,498.00	1.84%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
R - 15	Provisional sum	\$ 400.00	0.13%	\$400.00	0.13%	\$ 3,086.00	1.03%	\$ -	0.00%	\$ 3,086.00	1.03%	
	Grant Total :	\$ 219,015.91	73.37%	\$ 219,015.91	73.37%	\$ 81,300.76	27.24%	\$ 8,863.88	2.97%	\$ 90,164.64	30.21%	
R-14-01	Profit (net cost X 10%)	\$ 21,901.59	7.34%	\$ 21,901.59	7.34%	\$ 8,130.08	2.72%	\$ 886.39	0.30%	\$ 9,016.46	3.02%	
R-17-01	Overheads (supervisor and risk) net cost x10%	\$ 21,901.59	7.34%	\$ 21,901.59	7.34%	\$ 8,130.08	2.72%	\$ 886.39	0.30%	\$ 9,016.46	3.02%	
R-19-01	Tax ((net cost + profit+Overheads) x 2%)	\$ 5,256.38	1.76%	\$ 5,256.38	1.76%	\$ 1,951.22	0.65%	\$ 212.73	0.07%	\$ 2,163.95	0.72%	
	Sub - Total Contract From Luihono - Osorua Chainage Sta 0+000 - 6+800	\$ 268,075.48	89.81%	\$ 268,075.48	89.81%	\$ 99,512.13	33.34%	\$ 10,849.39	3.63%	\$ 110,361.52	36.97%	

Project Name		: From Ossu - Nahareka Chainage Sta 0+000 - 3+400									
Contract Number		: MPW - W - 190084									
Contractor Name		: Kay Seng Unip. Lda									
Pay Item No.	ITEM DESCRIPTION	CONTRACT VALUE (USD)		REVISED CONTRACT		PREVIOS PROGRES		PROGRES MARCH 2022		PROGRESS TO DATE (ADN)	
		Total Amount US	Weight %	Total Amount US	Weight %	Total Amount US	Weight %	Total Amount US	Weight %	Progress on Site	REMARKS
R-01	General - works	\$2,207.66	0.74%	400.00	0.13%	200.00	0.07%	-	0.00%	\$ 200.00	0.07%
R-03	Earth works	\$ 1,125.19	0.38%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	\$ -	0.00%
R-05	Sub-base and Pavement	\$ 72.74	0.02%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	\$ -	0.00%
R-07	Pitumenus Pavement	\$ -	0.00%	20,288.25	6.80%	19,721.54	6.61%	-	0.00%	\$ 19,721.54	6.61%
R-08	Structures	\$ 14,715.35	4.93%	1,925.04	0.64%	1,960.41	0.66%	-	0.00%	\$ 1,960.41	0.66%
R-10	Dayworks	\$ 250.00	0.08%	200.00	0.07%	250.00	0.08%	-	0.00%	\$ 250.00	0.08%
R-11	Routine Maintenance	\$ 4,720.35	1.58%	996.00	0.33%	990.00	0.33%	-	0.00%	\$ 990.00	0.33%
R-13	General expenses	\$ 1,570.00	0.53%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	0.07%	1,052.00	0.35%	842.50	0.28%	-	0.00%	\$ 842.50	0.28%
Grant Total :		\$ 24,861.29	8.33%	24,861.29	8.33%	23,964.45	8.03%	-	0.00%	23,964.45	8.03%
R-14-01	Profit (net cost X 10%)	\$ 2,486.13	0.83%	\$ 2,486.13	0.83%	\$ 2,396.45	0.80%	\$ -	0.00%	\$ 2,396.45	0.80%
R-17-01	Overheads (supervisor and risk) net cost x10%	\$ 2,486.13	0.83%	\$ 2,486.13	0.83%	\$ 2,396.45	0.80%	\$ -	0.00%	\$ 2,396.45	0.80%
R-19-01	Tax ((net cost + profit+Overheads) x 2%)	\$ 596.67	0.20%	\$ 596.67	0.20%	\$ 575.15	0.19%	\$ -	0.00%	\$ 575.15	0.19%
Sub - Total Contract From Ossu - Nahareka Chainage Sta 0+000 - 3+400		\$ 30,430.22	10.19%	\$ 30,430.22	10.19%	\$ 29,332.49	9.83%	\$ -	0.00%	\$ 29,332.49	9.83%
GRAND TOTAL : Luihono - Osorua Chainage Sta 0+000 - 6+800 ADN Ossu - Nahareka Chainage Sta 0+000 - 3+400		\$298,505.70	100.00%	\$298,505.70	100.00%	\$128,844.62	43.70%	\$10,849.39	3.63%	\$139,694.01	46.80%

Inspesaun Husi :


(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Verifika Husi :


(Eng. Joao P. Amaral)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Emerenciana da C. Mana Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun
de Qualidade, ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

**Naran projeto : Rural Roads Periodic Maintenance Luihono - Osorua Chainage
0+000 - 6+800 Routine Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400
Municipality Viqueque (162)**

Kompanha : Kay Seng Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	25/03/2022	Ossu Luihono. Viqueque	Roberto M. Martins	Eng. ITI.ADN,IP. Município Viqueque	1	Monitoring Servisu, Update Progres fisik Plam & Cement Masonry	
					2	Bainhira servisu plam tenki halo kompaksan uluk ba embankmen	
					3	servisu plam tenki tur spesifikasun	
					4	fatuk nebe uja ba servisu plam tenki susun halo rapi	
					5	kordena nafatin ho supervisor MOP ba servisu hirak nebe iha terreno	
						Network time is not synchronized Local: 25 Mar 2022 11:20:25 GMT+09:00 8,77819S 126,38946E Altitude: 477.1m Remark: ADN Viqueque ADN, I.P. M. Uqg. @ Monitoring Servisu, Update progres fisik Plam & Cement Masonry. Eng. Roberto M. M. @ Bainhira servisu plam tenki halo kompaksan uluk ba embankmen. fasa bade @ Servisu plam tenki tur spesifikasun nebe iha. @ fatuk tenki susun halo rapi. @ kontinua servisu do Arde lera servisu. @ kordena nafatin ho supervisor MOP ba servisu hirak nebe iha terreno.  25/03/2022	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Oss-5)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Ossu-Nahareca Chainage 0+000-3+400

No. kontratu : MPW-W-210053

Data Inspesaun : 9 / 3 / 2022

Fatin Inspesaun : Ossu

Koordinadas :

Start Point : Long : S. (-8. 7452) Latetude : E. (126.3851)

End Point : Long : S. (-8. 7505) Latetude : E. (126.4091)

Naran Inspector : Eng. Roberto M. Martins


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Laiha Actividade iha terreno, servisu paradu hahu husi fulan dezembro 2021 ate Agora. Imformasaun husi director compania katak Kompania sei hein documentus Varition Order foin atu kontinua servisu.

Observasaun iha terreno no Foto Aktual

Laiha Actividade iha terreno

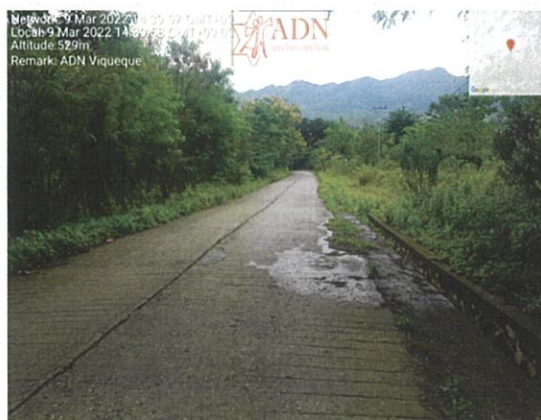

#ANNEXU D (Oss-5)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Ossu-Nahareca Chainage 0+000-3+400

Kompanha : Costa Key Unip Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	3/09/2022	Viqueque / Osso	Roberto M.M	Eng. ITI, ADN, I.P, Municipio Viqueque	1	Monitoring Servisu Iha terreno, Kompanhia Laiha Actividade Servisu Iha Terreno	
					2	Kompanhia paradu hahu husi fulan Dezembro 2021 Ate Agora	
					3	Karikiha mudansa Oo Varition Order sujere ba kompanhia atu koordena ho projetunain hodi asselera prosesu	
					4	Tenki tinaliza servisu tuir termo kontratu nebe'e iha.	
						Network: 9 Mar 2022 14.35.27 GMT+09:00 Local: 9 Mar 2022 14.35.28 GMT+09:00 8,75089S 126,41128E Altitude: 473.1m Remark: ADN Viqueque  Kompanhia Costa Key Unip. Lda. 9/03/2022. 1. Monitoring Servisu Iha terreno Kompanhia Costa Key Unip. Lda. 2. Kadan Observasaun iha terreno laiha Actividade Servisu. 3. Kompanhia paradu hela. hahu husi Dezembro 2021 Ate Agora. 4. Karik iha problem Ruma Iha terreno husi ba Kompanhia atu koordena ho projetu nain hodi resolve. 5. Iha Mudansa Oo Varition Order sujere ba kompanhia - atu koordena ho projetu nain hodi asselera prosesu. 6. Tenki finaliza tuir termo de kontratu nebe'e iha.  9/3/2022. Eng. Roberto M. Martins. Eng. ITI, ADN, I.P. M. Vgq.	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Oss-6)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Loihunu-Uagia Chainage 0+000 - 6+800

No. kontratu : MPW-W-210050

Data Inspesaun : 9 / 03 / 2022

Fatin Inspesaun : Ossu

Koordinadas :

Start Point : Long : S. (-8. 7452) Latetude : E. (126.3851)

End Point : Long : S. (-8. 7505) Latetude : E. (126.4091)

Naran Inspector : Eng. Roberto M. Martins

Sketch & Foto Desenho

'R-08. Structures


Reinforced Steel for structural concrete M20

Total Volume for 16 point

D10 = 13.81 x 16 = 220.96 Kg

D12 = 17.04 x 16 = 272.64 Kg

Total volume = 493.6 Kg

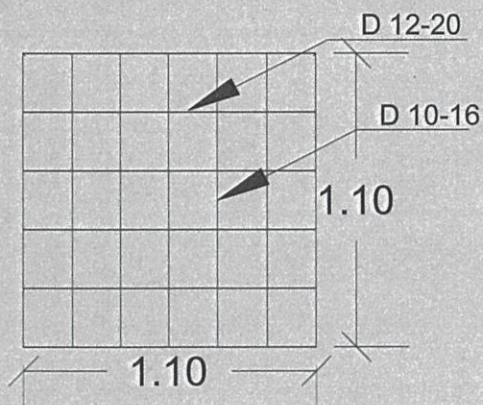

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Item : Reinforcing steel





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Oss-6)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Loihunu-Uagia Chainage 0+000 - 6+800
No. kontratu : MPW-W-210050

Sketch & Foto Desenho

'R-08. Structures

W= 1.00 m


H = 0.10 m

L = 3.00 m

Volume = 0.3 Cu.m

Total iha 16 titik

= 16 x 0.3 = 4.8 Cu.m

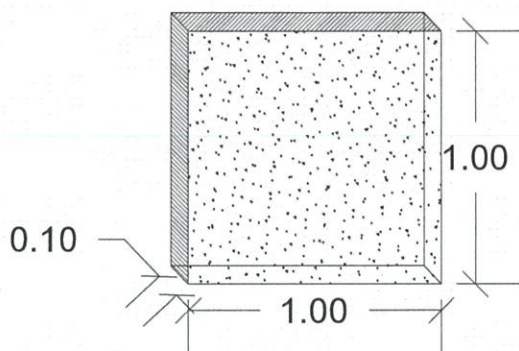

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Cement concrete - structural concrete M20
for Acess to community house



Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C2 (Oss-6)

Road name	Luihono to Uagua
Municipality	Viqueque
Postu	Ossu
Sukos	Luihono and Uaugia

Chainage start	: 0+000
Chainage end	: 6+800
Length	: 6.8 km
Manoko Unip. Lda	

SUMMARY

Item	Description	Amount US\$		PROGRESS PREVIOUS		PROGRESS MONITORING MARCH 2022		PROGRESS PHYSICAL UP TO DATE	
		Amount US\$	% BILLED	Amount US\$	% BILLED	Amount US\$	% BILLED	Amount US\$	% BILLED
R-01	General works	\$ 3,800.00	0.80%	\$ 2,000.00	0.42%	\$ -	0.00%	\$ 2,000.00	0.42%
R-03	Earth work	\$ 33,624.42	7.09%	\$ 27,880.61	5.88%	\$ -	0.00%	\$ 27,880.61	5.88%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 23,081.30	4.87%	\$ 20,483.30	4.32%	\$ -	0.00%	\$ 20,483.30	4.32%
R-08	Structures	\$ 314,690.34	66.34%	\$ 52,403.39	11.05%	\$ 1,468.94	0.31%	\$ 53,872.33	11.36%
R-10	Dayworks	\$ 350.00	0.07%	\$ 28.00	0.01%	\$ -	0.00%	\$ 28.00	0.01%
R-11	Routine maintenance	\$ 11,288.00	2.38%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-12	Cleaning	\$ 200.00	0.04%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	0.04%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction cost	\$ 837,234.06	81.63%	\$ 102,795.29	21.67%	\$ 1,468.94	0.31%	\$ 104,264.23	21.98%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 38,723.41	8.16%	\$ 10,279.53	2.17%	\$ 146.89	0.03%	\$ 10,426.42	2.20%
C	Over Head	\$ 89,106.81	8.24%	\$ 9,978.50	2.17%	\$ -	0.00%	\$ 104,264.23	2.17%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	\$ 9,301.29	1.96%	\$ 2,461.07	0.52%	\$ 32.32	0.01%	\$ 4,379.10	0.53%
E	Total	\$ 474,365.56	100.00%	\$ 125,514.39	26.52%	\$ 1,648.15	0.35%	\$ 223,333.98	26.87%

Verifika Husi :

Prepara Husi :


(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestructura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P


(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projeto Infraestructura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade, ADN, I.P

#ANNEXU D (Oss-6)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Loihunu-Uagia Chainage 0+000 - 6+800

Kompanha : Manoko Unip. Lda

 				
---	--	--	--	--



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Oss-9)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Riral Roads Periodic Maintenance ossu - Nahareka Chainage
4+350 - 6+350**

No. kontratu : **MPW-W-NCB-R-190037**

Data Inspesaun : 09/03/2022

Fatin Inspesaun : Ossu - Nahareka

Koordinadas :

Start Point : Long : (8.75602 S), Latetude : (126.41340 E)

End Point : Long : (8.74723 S), Latetude : (126.42692 E)

Naran Inspector : **Eng. Roberto M. Martins**

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu : Structures

$W=2.5$ m

$H = 0.12$ m

Distance = 30 m


Volume = 9.00 Cu.m



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Plam Concrete

Sta 3 + 612 to 3 + 642 W (Ls)

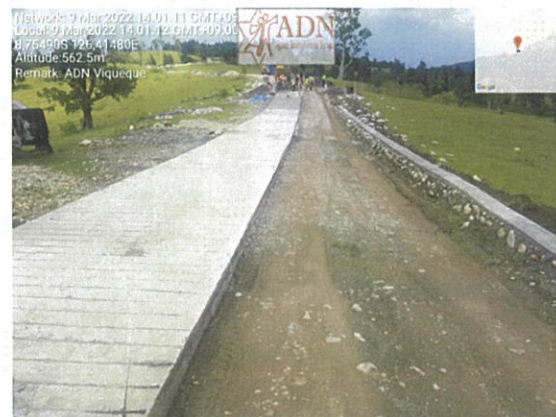



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Oss-9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Riral Roads Periodic Maintenance ossu - Nahareka Chainage
4+350 - 6+350

No. kontratu : MPW-W-NCB-R-190037

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu ... Structures

Lean Concrete Under Plam Concrete



$W=2.5$ m

Sta 3 + 612 to 3 + 642 W (Ls)

$H = 0.05$ m

Distance = 30 m

Volume = 7.5 Cu.m

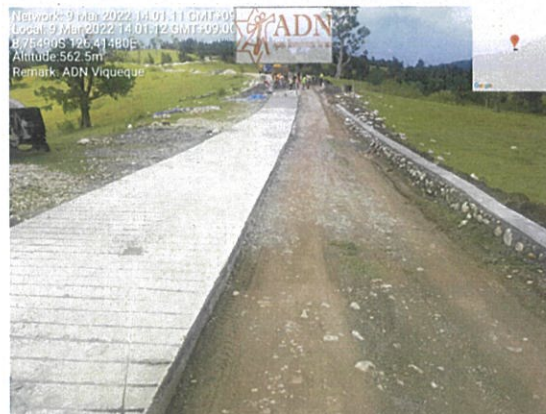

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu ... Structures

Stone masonry - finished

$W_a=0.3$ m, $W_b = 0.5$


Sta 3 + 612 to 3 + 646 W (Rs)

$H = 0.81$ m

Distance = 34 m

Area = 0.33 Sq.m

Volume = 11.05 Cu.m





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Oss-9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Riral Roads Periodic Maintenance ossu - Nahareka Chainage
4+350 - 6+350

No. kontratu : MPW-W-NCB-R-190037

Data Inspesaun : 25/03/2022

Fatin Inspesaun : Ossu - Nahareka

Koordinadas :

Start Point : Long : (8.75602 S), Latetude : (126.41340 E)

End Point : Long : (8.74723 S), Latetude : (126.42692 E)

Naran Inspector : Eng. Roberto M. Martins

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu : Structures

W=2.5 m

H = 0.12 m

Distance = 150 m


Volume = 45 Cu.m



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Plam Concrete

Sta 3 + 642 to 3 + 792 W (Ls)

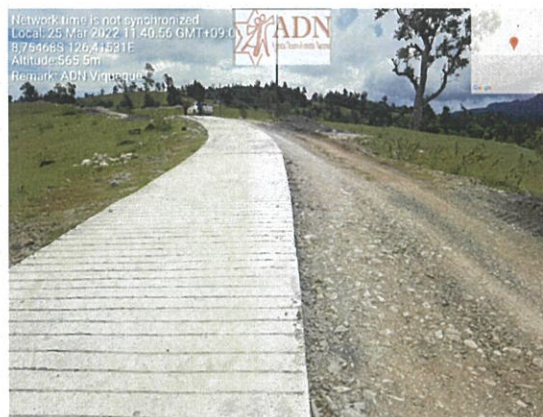



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Oss-9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Riral Roads Períodic Maintenance ossu - Nahareka Chainage
4+350 - 6+350

No. kontratu : MPW-W-NCB-R-190037

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu ... Structures

Lean Concrete Under Plam Concrete



$W=2.5$ m

Sta 3 + 642 to 3 + 792 W (Ls)

$H = 0.05$ m

Distance = 150 m

Volume = 18.75 Cu.m

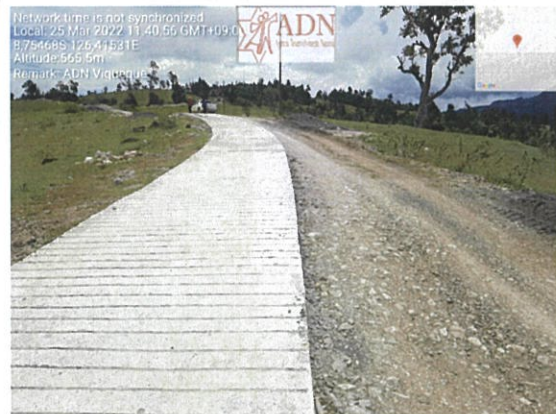

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu ... Structures

Stone masonry - finished

$Wa=0.3$ m, $Wb = 0.5$


Sta 3 + 646 to 3 + 666 W (Rs)

$H = 0.81$ m

Distance = 20 m

Area = 0.33 Sq.m

Volume = 6.6 Cu.m





#ANEXU C2 (Oss-9)

Project : R4D Riral Roads Periodic Maintenance ossu - Nahareka Chainage 4+350 - 6+350

Location : Viqueque, Ossu

Contractor : Fin-Los Unip. Lda JV Costa Key Unip. Lda

Backup Data

PAY ITEM NO.	DESCRIPTION								
		COST \$	% BILLED	PREVIOUS PROGRES		THIS PERIOD		AMOUNT (USD)	% BILLED
				AMOUNT (USD)	% BILLED	3/9/2022 & 25/03/2022			
		(b)		AMOUNT (USD)	% BILLED	AMOUNT (USD)	% BILLED	AMOUNT (USD)	% BILLED
R-01	General	\$ 22,453.81	4.57%	\$ 2,400.00	0.49%	\$ -	0.00%	\$ 2,400.00	0.49%
R-03	Earth Work	\$ 26,390.22	5.37%	\$ 14,933.41	3.04%	\$ -	0.00%	\$ 14,933.41	3.04%
R-05	Sub Base, base and pavement	\$ 3,862.26	0.79%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-07	Bitumenous pavement	\$ 686.25	0.14%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structures	\$ 338,482.09	68.83%	\$ 53,743.33	10.93%	\$ 11,168.98	2.27%	\$ 64,912.31	13.20%
R-10	Dayworks	\$ 1,000.00	0.20%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 1,642.00	0.33%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-13	General expenses	\$ 6,692.16	1.36%	\$ 4,398.58	0.89%	\$ -	0.00%	\$ 4,398.58	0.89%
R-15	Provisional sum	\$ 550.00	0.11%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Total – net		\$ 401,758.78	81.70%	\$ 75,475.33	15.35%	\$ 11,168.98	2.27%	\$ 86,644.30	17.62%
R-14-01	Profit (net cost x %) ; 10%	\$ 40,175.88	8.17%	\$ 7,547.53	1.53%	\$ 1,116.90	0.23%	\$ 8,664.43	1.76%
R-17-01	Overheads (supervision and risk) net cost x % ; 10%	\$ 40,175.88	8.17%	\$ 7,547.53	1.53%	\$ 1,116.90	0.23%	\$ 8,664.43	1.76%
R-19-01	Tax ((net cost + profit + overhead) x 2 %)	\$ 9,642.21	1.96%	\$ 1,811.41	0.37%	\$ 268.06	0.05%	\$ 2,079.46	0.42%
Total – Gross		\$ 491,752.56	100.00%	\$ 92,381.80	18.79%	\$ 13,670.83	2.78%	\$ 106,052.63	21.57%

Prepara Husi .

Inspeksaun Husi .

Verifika Husi .

Eng. Roberto M. Martins

Eng. ba projeto infraestrutura, transporte e
irigasaun Municipio Viqueque, ADN, I.P.

Eng. Joao Paulo Amaral

Eng. Senior ba projeto infraestrutura, transporte e
irigasaun Municipio Viqueque, ADN, I.P.

Eng. Emerenciana da Costa M.F.





Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P.



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto :R4D Riral Roads Periodic Maintenance ossu - Nahareka Chainage 4+350 - 6+350

Kompanha : Fin-Los Unip. Lda JV Costa Key Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	3/09/2022	Ossu	Roberto M.Martins	Eng.ITI,ADN,I P. Municipio Viqueque	1	Monitoring Servisu,Update Progres Fisik	
					2	Aumenta Trabalhador,hodi bele asselera servisu atunune bele finalija tuir termo Contrato	
					3	Husu Ba Eng,Kompanhia atu halo supervisaun diaria iha terreno	
					4	kordena ho supervisor MOP no Eng.R4D hodi bele fo instrusaun de servisu	
					5		
II					1	Network: 9 Mar 2022 14:23:09 GMT+09 Local: 9-Mar-2022 14:23:10 GMT+09:00 8,75099S 126,41125E Altitude:529.7m Remark: ADN Viqueque	
					2		
					3		
					4	03/3/2022 Roberto M. Martins Eng. ITI, ADN, I.P. M.Vgg.	
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (UatL-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800
(Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque
No. kontratu : SSS/096/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 9/03/2022 & 14 / 03 / 2022

Fatin Inspesaun : Uatulari

Koordinadas :


Start Point : Long : (S -8.52.26,4825) Latetude : (E 126.30.26,5777)

End Point : Long : (S -8.50.11,2716) Latetude : (E 126.31.8,1614)

Naran Inspector : Eng. Roberto M. Martin


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Crushed aggregate base
course (150mm)
Sta 5+ 200 to 5+ 300
W = 6 m
H = 0.15
Distance = 100 m
Volume = 90.00 Cu.m



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Crushed aggregate base course (150mm)
Sta 5+ 200 to 5+ 300

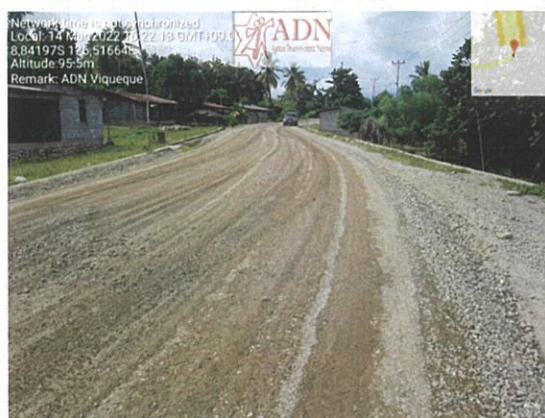



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (UatL-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800
(Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque
No. kontratu : SSS/096/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

: Crushed aggregate base course (150mm)


Sta 3+ 325to 4+ 900

W = 6 m

H = 0.15

Distance = 1575 m


Volume = 1,417.50 Cu.m



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Crushed aggregate base course (150mm)



Sta 3+ 325to 4+ 900

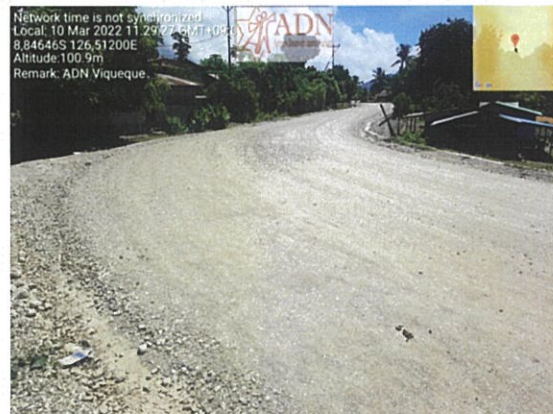

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C2 (UatL - 3)

PROJECT : REHABILITATION OF VIQUEQUE - UATOCARBAU ROAD STA. 26+500 - 31+800 (PACKAGE) IN UATOLARI MUNICIPALITY OF VIQUEQUE
LOCATION : VIQUEQUE - UATOCARBAU ROAD
CONTRACTOR : HELAMULA UNIPESSOAL LDA

SUMMARY

ITEM NO	ITEM DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		VARIATION ORDER NO : #1 REVISE CONTRACT		Progress Previous		Progress Monitoring 14 March 2021		Progres Phisic Up To Date		Remarks
		Total Amount US\$	Weight %	Total Amount US\$	Weight %	AMOUNT (US\$)	Weight %	AMOUNT (US\$)	Weight %	AMOUNT (US\$)	Weight %	
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 32,128.47	0.79%	\$ 32,128.47	0.81%	\$ 22,663.84	0.56%	\$ -	0.00%	22663.84	0.56%	
200	EARTH WORK	\$ 250,198.27	6.19%	\$ 310,336.56	7.82%	\$ 308,733.81	7.63%	\$ -	0.00%	308,733.81	7.63%	
300	SUBBASE AND BASE COURSE	\$ 1,373,341.33	33.95%	\$ 1,057,812.18	26.65%	\$ 623,782.64	15.42%	\$ 117,482.30	2.90%	741,264.94	18.33%	
400	SURFACE COURSE	\$ 1,597,728.00	39.50%	\$ 1,587,742.20	40.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	-	0.00%	
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ -	0.00%	\$ 132,682.48	3.34%	\$ 132,682.48	3.28%	\$ -	0.00%	132,682.48	3.28%	
600	DRAINAGE AND SLOOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 731,058.43	18.07%	\$ 785,890.32	19.80%	\$ 634,825.94	15.69%	\$ -	0.00%	634,825.94	15.69%	
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	\$ 60,645.94	1.50%	\$ 62,446.26	1.57%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	-	0.00%	
GRAND TOTAL		\$ 4,045,100.44	100.00%	\$ 3,969,038.48	100.00%	\$ 2,442,836.15	60.39%	\$ 117,482.30	2.90%	2,560,318.46	63.29%	

Inspesaun Husi :


(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P




Verifika Husi :


(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU D (UatL-3)

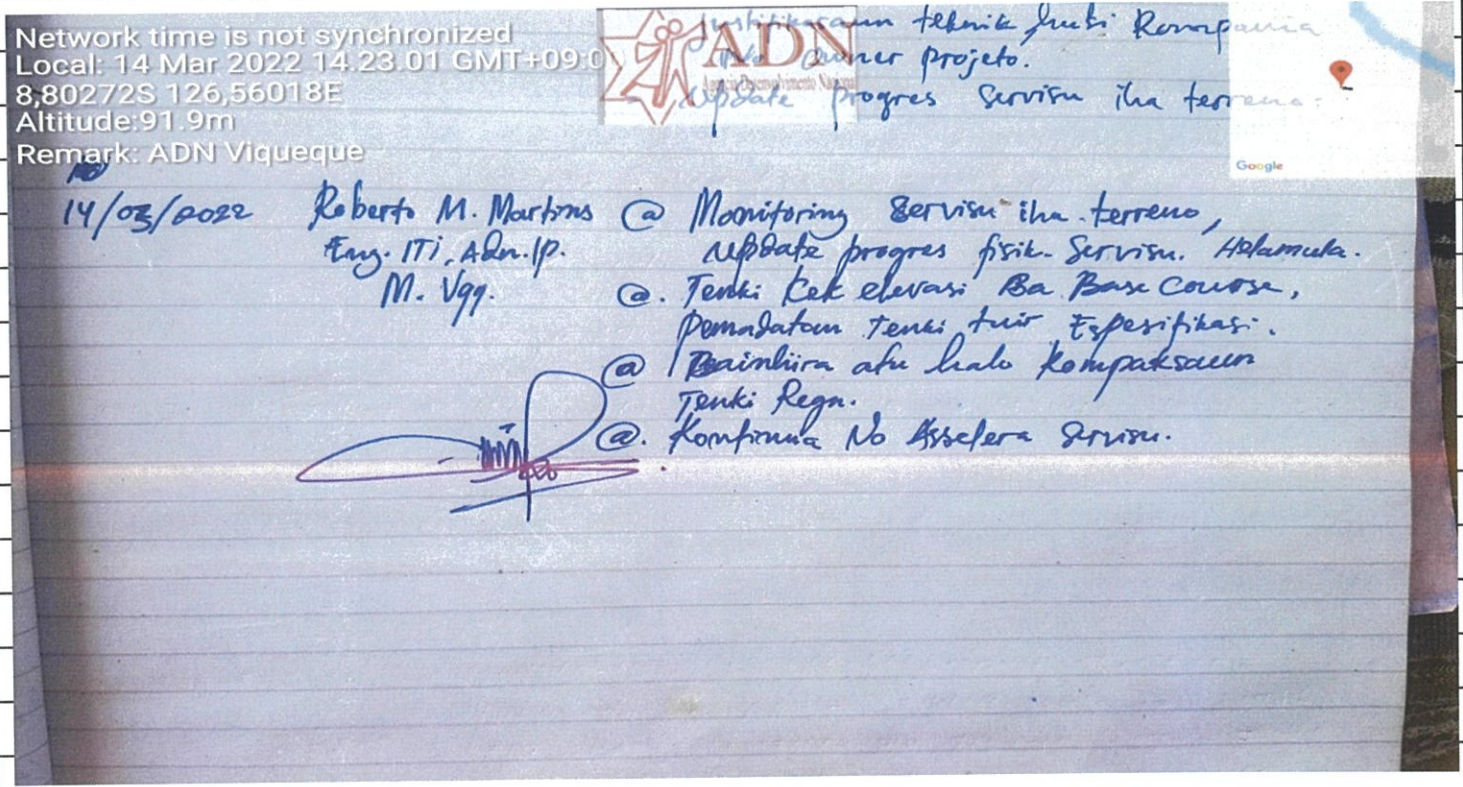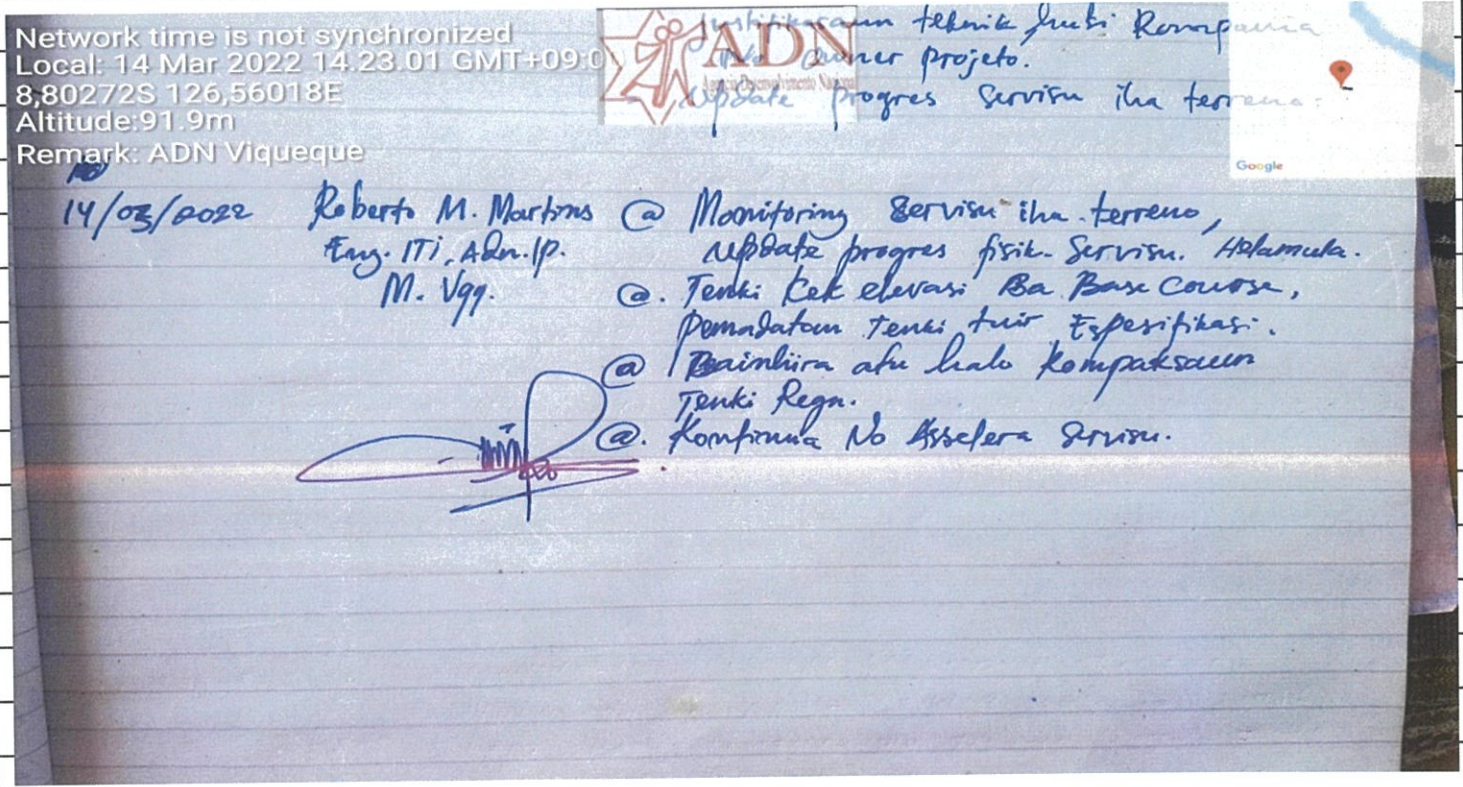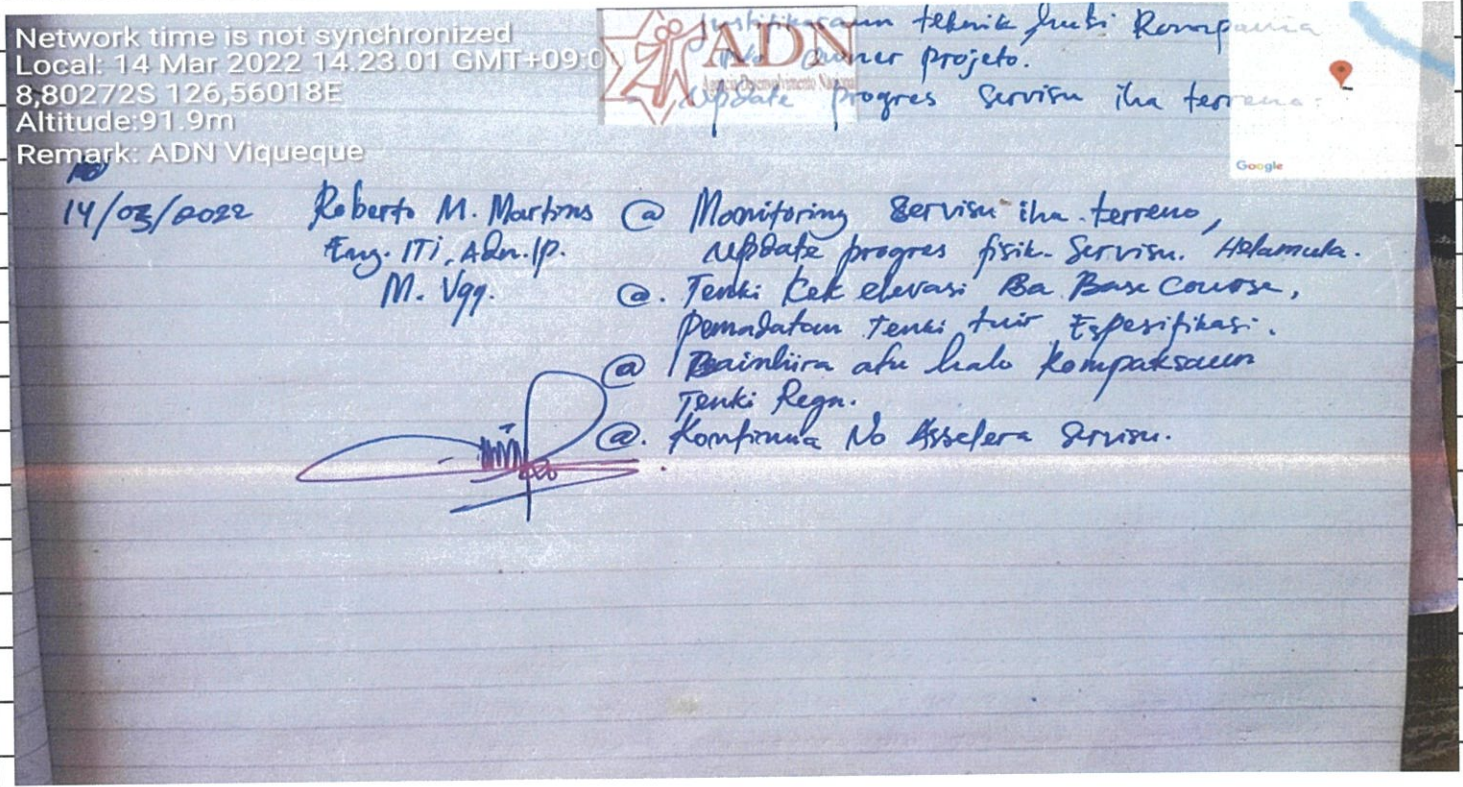 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público		INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
Naran projeto : Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque								
Kompanha : Helamula Unipessoal, Lda								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	14/03/2022	Viqueque / Uatulari	Roberto M. Martins	Eng. ITI, ADN, I P. M. Viqueque	1	monitoring Servisu iha terreno, Update Progres fisiku servisu		
					2	tenki cek elevasi ba srvisu base course, pematatan tenki tuir espesifikasaun.		
					3	bainhira atu halo kompasaun tenki rega		
					4	Kontinua no Asselera Servisu		
III					1			
					2			
					3			
					4			
					5			
IV					1			
					2			
					3			
					4			
					5			
V					1			
					2			
					3			
					4			
					5			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (UatL-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100
(Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque
No. kontratu : SSS/093/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 14 / 03 / 2022 & 23 / 03 / 2022

Fatin Inspesaun : Uatolari

Koordinadas :

Start Point : Long : (S -8.80428), Latetude : (E 126.54701)

End Point : Long : (S -8.83728), Latetude : (E 126.51851)

Naran Inspector : Eng. Roberto M. Martins.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Crushed aggregate base
course (150mm)

Sta 1+ 000 To 1 + 100


Sta 1+ 600 To 2+ 800

W = 6 m

H = 0.15

Distance = 1200 m

Volume = 1080 Cu.m



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Crushed aggregate base course (150mm)





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (UatL-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100
(Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque
No. kontratu : SSS/093/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : DRAINAGE AND
SLOOPE PROTECTION STRUCTURES


Stone Masonry Wall

Sta 4+ 100 To 4 + 250

Distance = 150 M

Area = 0.675

Volume = 101.25 Cu.m



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Line Drain Stone Masonry Type 1



Sketch & Foto Desenho

Observasaun.

Bainhira Eng. ADN.IP municipio Viqueque

halo monitorijasaun Observa kaatak :

Laiha Actividade iha Terreno, Direksiket

Kompanhia nian taka, Laiha Eng. Kompanhia


iha terreno, imformasaun Fereiadu Ba

Eleisaun Presidencial nian nebe'e trabalhadoe

No Eng. sedauk Fila fali ba Lokasi projektu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Data 23/03/2022

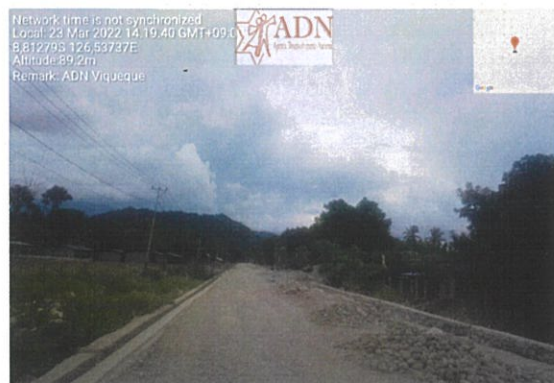



ANEXU C2 (UatL - 4)

PROJECT : REHABILITATION OF VIQUEQUE - UATOCARBAU ROAD STA. 31+800 - 37+100 (PACKAGE VII) IN UATOLARI MUNICIPALITY OF VIQUEQUE
LOCATION : VIQUEQUE - UATOCARBAU ROAD
CONTRACTOR : GREU UNIPessoal LDA

SUMMARY

Bill No.	ITEM DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		VARIATION ORDER NO : #1 REVISE CONTRACT		Progress Fisiku iha Fulan Kotuk		Progress Monitoring Marcu 2022		Progress Ate Agora		Remarks
		Total Amount US	Weight %	Total Amount US	Weight %	Total Amount US	Weight %	Total Amount US	Weight %	Total Amount US	Weight %	
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 32,128.58	0.74%	\$ 32,128.58	0.74%	\$ 22,268.61	0.52%	\$ -	0.00%	\$ 22,268.61	0.52%	
200	EARTH WORK	\$ 492,347.18	11.39%	\$ 269,000.80	6.22%	\$ 269,000.80	6.22%	\$ -	0.00%	\$ 269,000.80	6.22%	
300	SUBBASE AND BASE COURSE	\$ 1,373,341.33	31.77%	\$ 1,042,900.71	24.13%	\$ 793,768.09	18.36%	\$ 84,166.43	1.95%	\$ 877,934.52	20.31%	
400	SURFACE COURSE	\$ 1,597,728.00	36.96%	\$ 1,587,742.20	36.73%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 387,136.42	8.96%	\$ 89,102.65	2.06%	\$ 88,732.38	2.05%	\$ -	0.00%	\$ 88,732.38	2.05%	
600	DRAINAGE AND SLOOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 401,433.22	9.29%	\$ 1,082,550.09	25.05%	\$ 820,538.46	18.98%	\$ 10,579.27	0.24%	\$ 831,117.73	19.23%	
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	\$ 38,220.81	0.88%	\$ 40,185.61	0.93%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
GRAND TOTAL		\$ 4,322,335.54	100.00%	\$ 4,143,610.65	95.87%	\$ 2,439,093.95	56.43%	\$ 94,745.70	2.19%	\$ 2,533,839.65	58.62%	

Inspesaun Husi :


(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P




Verifika Husi :


(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P
~~Transportes e Irigasaun ADN, I.P~~

ANEXU D (UatL-4)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
					Naran projeto : Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque						
					Kompanha : Greu Unipessoal, Lda						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			Asinatura		
I	14/02/2022 & 23/03/2022	Viqueque / Uatolari	Eng.Roberto M. Martins	Eng.ITI,ADN,I P municipio Vqq	1	Monitoring Servisu, Update Progres fisik iha Terreno,					
					2	Kontinua Servisu Kordena Nafatin Ho Projektu Nain.					
					3	Iha data 23/03/2022 la bele fo instrusaun tamba kompania laiha Actividade iha terreno, Eng.kompanhia laiha terreno no direksiket kompania nian Taka hela.					
					4						
					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
					1						
					2						
					3						
					4						
					5						



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Kanais Irrigasaun Iha Bebui - Viqueque
No. kontratu : RDTL-MAP-PO2021:15965

Data Inspesaun : 14/03/2022 And 23/03/2022

Fatin Inspesaun : Uatulari

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8.80299 S Latetude : 126.56135 E

End Point : Long : - 8.80583 S Latetude : 126.56372 E


Naran Inspector : Eng. Roberto M. Martins

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu ... River Normalization

Ba fulan marcu kompanhia halo
normalizasaun mota 20% terhadap volume

Kontrac



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

River Normalization




Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Kanais Irrigasaun Iha Bebui - Viqueque
No. kontratu : RDTL-MAP-PO2021:15965

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu ... Retaining Wall
Layer II Wall Sta 0 + 000 to 0 + 401
H = 1.5 m
Wa = 1.6 m
Wb = 2 m
Distance = 401 m
Volume = 1082.7Cu.m




Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Fondation For Retaining Wall Sta 0 + 000
to 0 + 401



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu ... Retaining Wall
Layer II Wall Sta 0 + 000 to 0 + 200
H = 1.5 m
Wa = 1.2 m
Wb = 1.6 m
Distance = 200 m
Volume = 420.00 Cu.m



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Retaining Wall Layer II Wall
Sta 0 + 000 to 0 + 200





Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Kanais Irrigasaun Iha Bebui - Viqueque
: RDTL-MAP-PO2021:15965

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu ... Embankment with
compaction

Sta Sta 0 + 00 to 0 + 401


Wa = 5 m, Wb = 6 m

H = 1.5 m

Distance 401 m


Area = 8.25 Sq.m

Volume = 3877.5 Cu.m

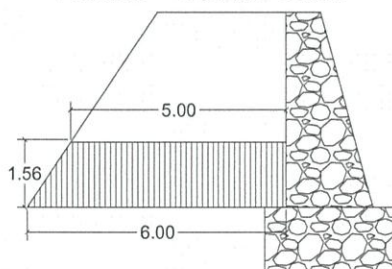

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Embankment with compaction
Sta Sta 0 + 00 to 0 + 401

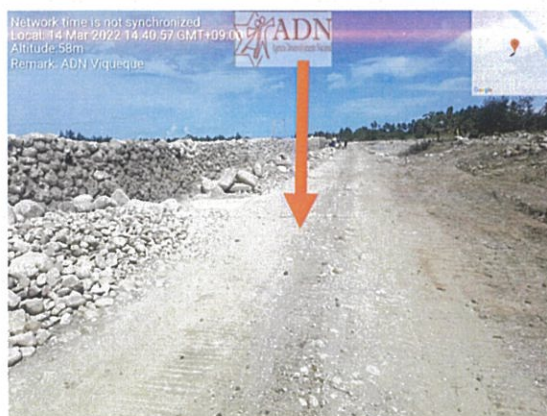

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu ...

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E
INVESTIMENTO ESTRATÉGICO



ADN
Agência de
Desenvolvimento
Nacional

ANEXU C-2 (UatL-11)

Project Owner : Ministry of Agriculture and Fisheries
Location : Bebui, Uatulari Sub District, Viqueque Municipality
Name of Project : Rehabilitation of Bebui Wall Protection

BACK UP DATA

BILL OF QUANTITY				PROGRESS MONITORING PROJEC 2022						
No	ITEM OF WORKS	TOTAL COST	WEIGHT	PROGRESS PREVIOUS		PROGRES 14 March 2022 & 23 March 2022		PROGRESS TO DATE		REMARKS
		(USD)	%	QUANTITY	COST (\$)	QUANTITY	COST (\$)	QUANTITY	COST (\$)	
I.	Preparation Works	\$ 16,650.12	3.72%	\$ 11,110.06	2.48%	\$ -	0.00%	\$ 11,110.06	2.48%	
II.	Eart Work	\$ 9,345.00	2.09%	\$ 6,315.75	1.41%	\$ -	0.00%	\$ 6,315.75	1.41%	
III.	Stone Masonry, Plastering & weephole works	\$ 293,297.36	65.54%	\$ 110,074.50	24.60%	\$ 91,664.70	20.48%	\$ 201,739.20	45.08%	
IV.	Embankment with compation work	\$ 26,460.00	5.91%	\$ 2,646.00	0.59%	\$ 13,571.25	3.03%	\$ 16,217.25	3.62%	
V.	River Normalization Work	\$ 52,875.00	11.82%	\$ 26,437.50	5.91%	\$ 10,575.00	2.36%	\$ 37,012.50	8.27%	
VI.	Finishing work	\$ 200.00	0.04%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
A	TAL CONSTRUCTION COST (I+II+III +IV+V+	\$ 398,827.48	89.13%	\$ 156,583.81	34.99%	\$ 115,810.95	25.88%	\$ 272,394.76	60.87%	
B	ITEM OF WORKS (A X 10%)	\$ 39,882.75	8.91%	\$ 15,658.38	3.50%	\$ 11,581.10	2.59%	\$ 27,239.48	6.09%	
C	TAX (A+B)*2%	\$ 8,774.20	1.96%	\$ 3,444.84	0.77%	\$ 2,547.84	0.57%	\$ 5,992.68	1.34%	
D	GRAND TOTAL COST (A+B+C)	\$ 447,484.43	100.00%	\$ 175,687.03	39.26%	\$ 129,939.89	29.04%	\$ 305,626.92	68.30%	


Prepara Husi :


(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Verifika Husi :


(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P



Naran projeto :Konstrusaun Kanais Irrigasaun Iha Bebui - Viqueque

Kompanha : L.M. Caicasa Metin Unip,Lda

[illegible]



ANEXU C1 (Vqq-1)

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency work package caused by climate change on June 2013
(Gabion protection works in Lamak Laran) Municipio Viqueque.**
No. kontratu : **SSS/100/MOPTC-2015**

Data Inspesaun : **11/3/2022**

Fatin Inspesaun : **Viqueque Villa**

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. -8.515636), Latetude : (E. 126.221002)

End Point : Long : (S. -8.515807), Latetude : (E. 126.221043)

Naran Inspector : **Eng. Roberto M. Martins**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Projeto refere PHO ona





ANEXU C1 (Vqq-2)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Urban Road Municipality Viqueque
No. kontratu : SSS/072/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 11 / 03 /2022

Fatin Inspesaun : Viqueque Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : (S – 8.53.0.37,372), Latetude : (E 126.22.36.8726)

End Point : Long : (S – 8.52.9.87,901), Latetude : (E 126.21.53,37622)


Naran Inspector : Roberto M. Martins

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Projeto refere fisikamente finalija ona, hein
deit dokumentus Submete Husi MOP hodi
proses aba pagamnetu 100%

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

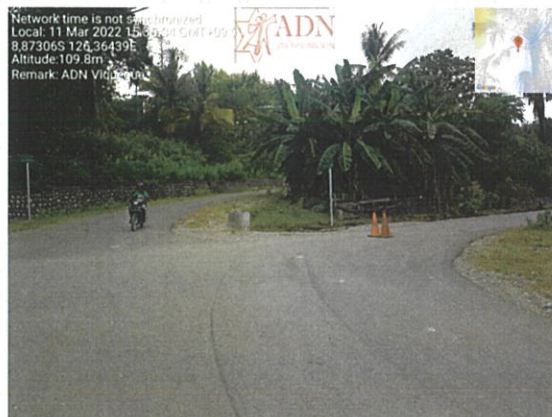



ANEXU C1 (Vqq-3)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Roads From Junction Bemvindo Bahalara - Uain We Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000 - 5+500 Municipality Viqueque**

No. kontratu : **SSS/163/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : **11/03/2022**

Fatin Inspesaun : **Viqueque Villa, Bahalara Wain**

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. -8.545175), Latetude : (E. 126.171758)

End Point : Long : (S. -8.572704), Latetude : (E. 126.192915)


Naran Inspector : **Eng. Roberto M. Martins**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Projeto refere Fisiku Projetu ramata ona falta dokumentus administrasaun hanesan :
Varition Order, As-Build Drawing, As-Build Quantity. hodi bele halo pagamentu 100%

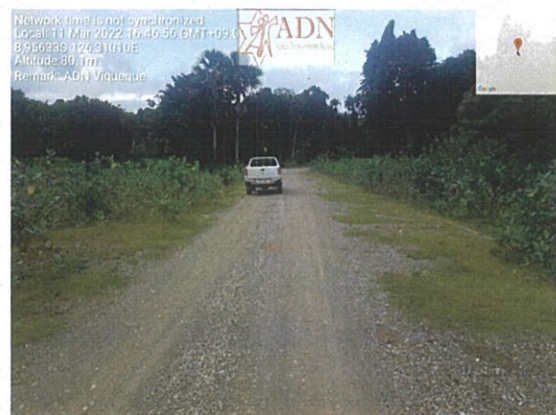



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Vqq-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Suspension Bridge, Municipality of Viqueque

No. kontratu : SSS/105/MOPTC-2017

Data Inspesaun :25/01/2022

Fatin Inspesaun : viqueque Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. -8.513570), Latetude : (E. 126.215317)

End Point : Long : (S. -8.513701), Latetude : (E. 126.215753)


Naran Inspector : Eng. Roberto M. Martins

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Projetu refere Fisikamente 100% ona falta
kompleta documentus administrasaun hodi
proses aba pagamentu 100%

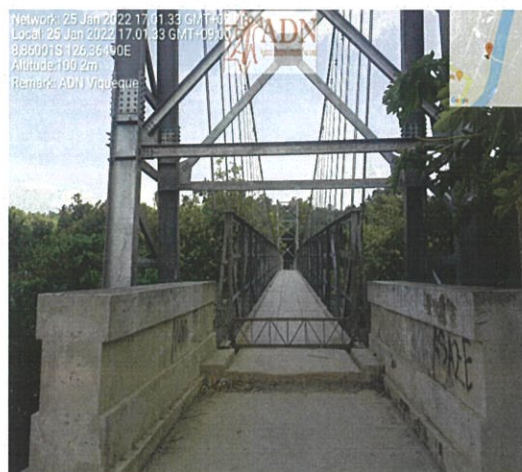

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Vqq-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Road Maintenance Lot 1 - Viqueque - Dilor A07, Lot 2 – Jct Luca - Lacluta C5 Municipality Viqueque (162)

No. kontratu : MPW - W - 190114

Data Inspesaun : 11/03/2022

Fatin Inspesaun : Uma Tolu

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. -8.553646), Latetude : (E. 126.132360)

End Point : Long : (S. -8.9357), Latetude : (E. 126.1703)

Naran Inspector : Eng. Roberto M. Martins

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Donu do Projeitu Submete Documentus

Pagamentu 100% iha fulan Dezembro 2021

maibe bainhira Eng. ADN,I.P.Municipio

viqueque halo inspesaun iha terreno observa

Projeito refere sei ho kondisaun A'at hela ho


nune Eng. ADN,I.P.Municipio viqueque

labele rekomenda no Devolve filafali

Dodumentus pagamentu. Ate agora fisiku

projeitu sei ho kondisaun A'at hela.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

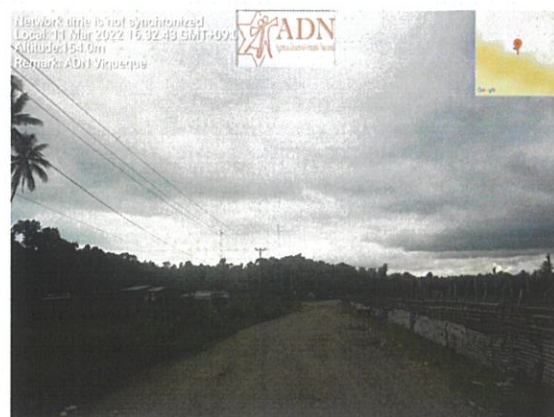

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Roberto M. Martins
------------	---------------------------

2022

Municipio	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS
------------------	-------------------------------------

[illegible]



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.		Roberto M. Martins						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Município		MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
UATOCARBAU	1	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Roberto M. Martins							2022																															
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
VIQUEQUE	12	EBF Nahae	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	13	EBF Uaibira	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	14	EBC Uatolari	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	15	EBF Edemumu	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	16	EBF Ualake	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	17	ESTV Kaluheda	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	18	EBF Debuisi	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	1	Emergency work package caused by climate change on June 2013 (Gabion protection works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	Consortio Unidos Genero, Lda	SSS/100/MOPTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Falta retensaun
							Actual																																
	2	Rehabilitation of Urban Road Municipality Viqueque	Urukai II, Unip. Lda	SSS/072/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Fisikamente Finaliza ona falta Dadus Administrasaun hodi prosesa pagamentu 100%
							Actual																																
3	Rehabilitation of Roads From Junction Bemvindo Bahalara - Uain We Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000 - 5+500 Municipality Viqueque	Arpy Unipessoal, Lda	SSS/163/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Fisikamente Finaliza ona falta Dadus Administrasaun hodi prosesa pagamentu 100%		
						Actual																																	
4	Rehabilitation of Suspension Bridge, Municipality of Viqueque.	Arquiris	SSS/105/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Fisikamente Finaliza ona falta Dadus Administrasaun hodi prosesa pagamentu 100%		
						Actual																																	
5	Routine Road Maintenance Lot 1 - Viqueque - Dilor A07, Lot 2 - Jct Luca - Lacluta C5 Municipality Viqueque (162)	Dira Nova Unip. Lda	MPW - W - 190114	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Fisikamente Finaliza ona falta Dadus Administrasaun hodi prosesa pagamentu 100% maibe kondisaun iha tereno sei a'at hela		
						Actual																																	
6	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package: 12 Luca - Lacluta	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000022	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																			</														

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Roberto M. Martins						2022																																
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MULTI POSTO ADMINIS TRATIVO	8	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625	Bihalutur Unip, Ida	SSS/141/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Paradu Total (Sei iha Problema ho Fisiku Konstrusaun) laiha informasaun Husi kompania	
							Actual																																
	9	Rehabilitation of Vanilale - Hatulari - Uaimori Road (30.880km) Roads Section : Venilale - Hatulia Roads Package 5 Sta. 20+625 - 25+755 Municipality Baucau	Loke Matan unip, Ida	SSS/307/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Lao Hela	
							Actual																																
	10	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880	Caburela unip,Ida	SSS/306/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Lao Hela	
							Actual																																
	11	Servisu Manutensaun Edificio Agencia de Desemvolvimentu Nasional, I.P, Municipio Viqueque	Luminar, Unip,Lda	22/RDTL/MPO/AND,I.P/XI/2021	LM	MOP/ADN,I.P	Plan																															Lao Hela	
							Actual																																
	12	ESG Calixa	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	13	EBF Ular Rihik	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	14	Pre Escolar Maria Lobato Raithu	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	15	EBC Caibiraon	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	16	Pre Escolar Sebastiao Gomes Uai Mori Tula	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	17	New Construction Office, Were House And Landscaping Of Viqueque Distric	L.M. Caicasa Metin Unip,Lda	01/MSSI/DGAF/DNA/I/2022	LM	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN	Plan																																
							Actual																																
	1	Upgrading and Maintenance of Baucau - Viqueque Highway Project Lot 2: Venilale - Viqueque : Sta. 27 + 120 to Sta. 62 + 010	China Railway Int. Group co, jv with China oversees	ICB/046/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Lao Hela		
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

Plano Periode inspesaun iha terenu

Implementa Planu Periode Inspesaun

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. ITI, ADN, I.P. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres .)
Adjunto Director Executivo ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (UatC – 3)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota
Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarabau - Viqueque
Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441

Data Inspesaun : 31 – 03 - 2022

Fatin Inspesaun : Maumua - Dirinuu

Koordinadas :

Start Point : Long : 8. 72327782S, Latetude : 126.73435711E

End Point : Long : 8.74276514S, Latetude : 126.75989149E

Naran Inspector : Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste 12 m Pinta mos ona





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (UatC – 3)

Back-up Data

Naran Projeto

: New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota
Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarabau - Viqueque
Municipality

No. kontratu

: RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441

Poste 9 m Pinta mos ona




Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Hadia Assecres Panel & Climber Protection
seidauk monta/Installa

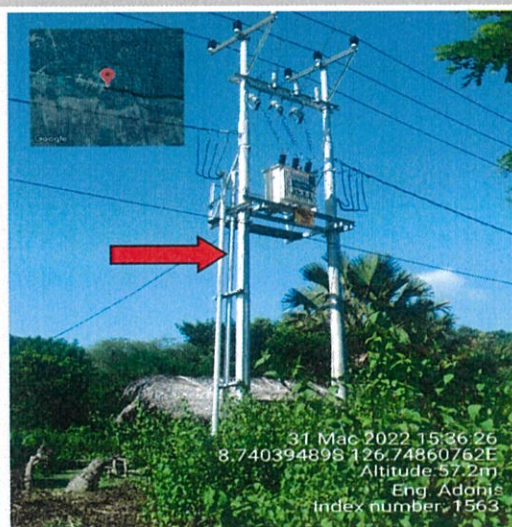



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (UatC – 3)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota
Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarabau - Viqueque
Municipality


No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste 12 m Pinta mos ona & cabo baixadas
monu / table

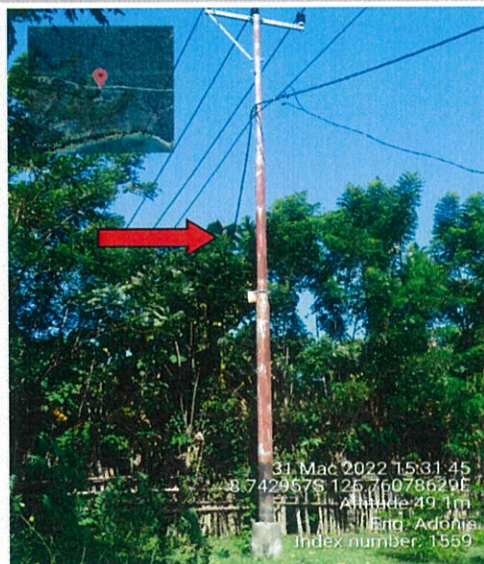

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Assecures druckschoor seidauk monta





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (UatC – 4)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae
Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346

Data Inspesaun : 31 - 03 - 2022

Fatin Inspesaun : Hae Oli, Uani Uma & Ringgit

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.75815027S, Latetude : 126.67350657E

End Point : Long : 8.74863203S, Latetude : 126.70498036E

Naran Inspector : Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Cross Arm hali / kleuk





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (UatC – 4)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae
Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Treckschoor Mamar

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Poste 12 m halis / kleuk

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (UatC – 4)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae
Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Pin post halis/ kleuk



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Pondasi rahun/nakfera





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (UatC – 4)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae
Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (UatL – 1)

Back-up Data

Naran Projeto : New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai
Viqueque District
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459

Data Inspesaun : 31 – 03 - 2022

Fatin Inspesaun : Lawai - Uatolari

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.93164339S, Latetude : 126.49095769S

End Point : Long : 8.91427577S, Latetude : 126.50009669E

Naran Inspector : Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Arde ba ending baixadas seidak montaj/
installa





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (UatL – 1)

Back-up Data

Naran Projeto : New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai
Viqueque District
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Fiu outgoing nia koneksaun ladik/ lametin



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste 9 m pinta mos ona, trecschoor mamar
& Poste Kleuk/halis





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (UatL – 1)

Back-up Data

Naran Projeto : New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai
Viqueque District
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Fiu Baixadas monu / table



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Suspension linha baixadas nian ladauk instala





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (UatL – 1)

Back-up Data

Naran Projeto : New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai
Viqueque District
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste 9 m Pinta mos ona & kleuk/halis



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (UatL – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Liasidi, Nunumalau, Iralere and Ulusu, Uatolari - Viqueque Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433

Data Inspesaun : 31 – 03 - 2022

Fatin Inspesaun : Diribuu, Liasidi & Nunumalau

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.75178994S, Latetude : 126.58012437E

End Point : Long : 8.70641417S Latetude : 126.57638368E

Naran Inspector : Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Treckschoor Mamar





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (UatL – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to
Liasidi, Nunumalau, Iralere and Ulusu, Uatolari - Viqueque
Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste 12 m halis/kleuk), Treckschoor
mamar& fiu baixadas table



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Treckschoor Mamar & Poste Halis/ kleuk





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (UatL – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to
Liasidi, Nunumalau, Iralere and Ulusu, Uatolari - Viqueque
Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Pondasi trafo nakfera & climber protection
seidauk installa



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Cabo baixadas kois (suspension kotu)



PLANU INSPESAUN

2022

[illegible]

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
VIQUEQUE	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Calixa Viqueque	MEJD PKRIE ESG CALIXA VIQUEQUE	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	4	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Maria Lobato	MEJD PKRIE EPE MARIA LOBATO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	5	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Sebastiao Gomes	MEJD PKRIE EPE SEBASTIAO GOMES	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	6	Servisu Manutensaun Edificio Agencia de Desenvolvementu Nasional, I.P, Municipio Viqueque	Luminar, Unip,Lda	22/RDTL/MPO/AND,I.P/XI/2021	22/RDTL/MPO/AND,I.P/XI/2021	MOP/ADN,I.P	Plan																																
							Actual																																
	TOTAL PROJETO ON-GOING																																						

Note: Plano Periode inspesaun iha terenu Implementa Planu Periode Inspeaun Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili Inspeaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projéitu ME, ADN,I.P

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validaçaun de Qualidade, ADN,I.P

Aprova Husi :

(Eng. Vanuario Maria Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN,I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																			
Naran Eng.	Bebiano C. de Jesus Lopes						2022																																			
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS																																									
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Laeluta	1	Package II Dilor	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	2	Nova Construção de Moro Protecção da Ribeira de Dilor (Pakote I-Sta. 0+000 To 0+800)	Atramor Sucesso Unip. Lda	SSS/093/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
OSSU	1	Road Rehabilitation of Assalaitula - Ossu Sta. 5+155 - 14+000 Municipality Viqueque	Uhacae, Lda	SSS/064/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	2	Manutensaun Estrada Luihono-Osorua Sta. 0+000-6+750-Municipal of Viqueque	Boru- Buty Unip.Lda	RT/072/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	3	R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liawaioli Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality	Kay Seng Unip. Lda	NCB/056/MOPTC-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	4	Rural Roads Periodic Maintenance Luihono - Osorua Chainage 0+000 - 6+800 Routine Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400 Municipality Viqueque (162)	Kay Seng Unip. Lda	MPW-W-190084	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Ossu-Nahareca Chainage 0+000-3+400	Costa Key Unip Lda	MPW-W-210053	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Loihunu-Uagia Chainage 0+000 - 6+800	Manoko Unip. Lda	MPW-W-210050	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	7	Emergency Road Rehabilitation Package II from Ossu - Viqueque District	Modena Tecnic Unipessoal Lda	MOPW-F1-W-166514	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	8	New Construction of Health Post and Doctor's House building in Builale	Borala Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-075	LM	MINISTERIO DA SAUDE	Plan																																			
							Actual																																			
	9	R4D Riral Roads Periodic Maintenance ossu - Nahareka Chainage 4+350 - 6+350	Fin-Los Unip. Lda JV Costa Key Unip. Lda	MPW - W - 190085	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	10	EBF Uaibobo	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																			
							Actual																																			
11	Pre Escolar Uaibua	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																				
						Actual																																				
12	ESG Oloacasa	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																				
						Actual																																				
13	EBF Liaruca	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																				
						Actual																																				
U	1	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																																			
							Actual																																			
	2	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																																			
							Actual																																			
	3	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarabau - Viqueque Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Bebiano C. de Jesus Lopes						2022																																
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
UATOCARB.	4	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	Jonel Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uato-Carbau	Luminar Unip. Lda	675/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	6	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)	Sabirara, Unip. Lda	SSS/155/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	EBC 2.3 Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
8	ESG Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																	
						Actual																																	
UATOLARI	1	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	Laway	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Liasidi, Nunumalau, Iralere and Ulusu, Uatolari - Viqueque Municipality	Habere Unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	3	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	Helamula Unipessoal, Lda	SSS/096/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	Greu Unipessoal, Lda	SSS/093/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	New Construction Of Gapura,Stairs and Wall Protection in Garden Of Heroes	Natureza Furak,Unip Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	LM	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																																
							Actual																																
	6	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uatolari	Lemadae Unipessoal Lda	665/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	7	Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 2 Uatolari - Laisorulai (162)	Bragtojul Unip. Lda JV PT Decont Mitra Consolindo	MPW-CS-2000025	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	8	Rehabilitation of Miabuti Edmumo, Sapatula Road /reabilitacao de estradas distritais de Uatolari Viqueque District	Karakuta Unip Lda	MPW-2013/JUNE	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	10	New Construction Of Chapel Betesda Naedala Affaloicai-Uatolari	Be'e Horis unip,lda		LM	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	Plan																																
							Actual																																
	11	Konstrusaun Kanais Irrigasaun Iha Bebui - Viqueque	L.M. Caicasa Metin Unip,Lda	RDTL-MAP-PO2021:15965	LM	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																																
							Actual																																
	12	EBF Nahae	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	13	EBF Uaibira	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	14	EBC Uatolari	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	15	EBF Edemumu	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	16	EBF Ualake	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Bebiano C. de Jesus Lopes
------------	----------------------------------

2022

Município	MUNICIPIO VIOQUEQUE NO POSTOS
-----------	-------------------------------

[illegible]

VIQUEQUE

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Bebiano C. de Jesus Lopes
------------	---------------------------

2022

Município	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS
-----------	------------------------------

[illegible]

Note:

Plano Periode inspesaun iha terenu

Implementa Planu Periode Inpesaun

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Betuliano C. de Jesus Lopes)
Eng. Munisipiu Viqueque ADN, I.P.

Sertifikasi Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres.)
Adjunto Director Ejecutivo ADN,I.P.

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Naran Eng.	Roberto M. Martins						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Lacuta	1	Package II Dilor	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Roberto M. Martins
------------	---------------------------

2022

Município	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS
-----------	------------------------------

[illegible]

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Roberto M. Martins
------------	---------------------------

2022

Município	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS
-----------	------------------------------

[illegible]

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Naran Eng.	Roberto M. Martins						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MULTI POSTO ADMINIS TRATIVO	7	J Roads Section : venilale - Hatulia Roads Package 3 Sta. 20+625 - 25+755 Municipality Baucau	Loke Matan unip, lda	SSS/307/MOPTC-2016	FI	PUBLICAS	Actual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Note:

Plano Periode inspesaun iha terenu

Implementa Planu Periode Inspesaun

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. ITI, ADN,I.P. Municipiu Viqueque ADN,I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres.)
Adjunto Director Executivo ADN,I.P.

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, L.P. Agência de Desenvolvimento Regional, Investimentos Públicos							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Naran Eng.	Adonis Julio Fernandes						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OSSU	1	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Liaruca	MEJD PKRIE EBF LIARUCA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VIQUEQUE	2	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Cabira-Oan	MEJD PKRIE EBC CABIRA-OAN	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Note:  Plano Periode inspesau iha terenu  Implementa Planu Periode Inspesau  Relatoriu avaliasuon mensal iha Dili  Inspesau Protesu Pagamentu

Prepara Husi
(Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projeto ME, ADN,I.P

Sertifika Husi :
(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P

Aprova Husi
(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN,I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Bebiano C. de Jesus Lopes						2022																																
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Lacluta	1	Package II Dilor	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Nova Construção de Moro Protecção da Ribeira de Dilor (Pakote1-Sta. 0+000 To 0+800)	Atramor Sucesso Unip. Lda	SSS/093/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
OSSU	1	Road Rehabilitation of Assalaitula - Ossu Sta. 5+155 - 14+000 Municipality Viqueque	Uhacae, Lda	SSS/064/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Manutensaun Estrada Luihono-Osorua Sta. 0+000-6+750- Municipal of Viqueque	Boru- Buty Unip.Lda	RT/072/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	3	R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liawaioli Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality	Kay Seng Unip. Lda	NCB/056/MOPTC-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	Rural Roads Periodic Maintenance Luihono - Osorua Chainage 0+000 - 6+800 Routine Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400 Municipality Viqueque (162)	Kay Seng Unip. Lda	MPW-W-190084	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Ossu-Nahareka Chainage 0+000-3+400	Costa Key Unip Lda	MPW-W-210053	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Loihunu-Uagia Chainage 0+000 - 6+800	Manoko Unip. Lda	MPW-W-210050	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	Emergency Road Rehabilitation Package II from Ossu - Viqueque District	Modena Tecnic Unipessoal Lda	MOPW-F1-W-166514	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	8	New Construction of Health Post and Doctor's House building in Builale	Borala Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-075	LM	MINISTERIO DA SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	9	R4D Riral Roads Periodic Maintenance ossu - Nahareka Chainage 4+350 - 6+350	Fin-Los Unip. Lda JV Costa Key Unip. Lda	MPW - W - 190085	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	10	EBF Uaibobo	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	11	Pre Escolar Uaibua	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	12	ESG Oloaasa	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	13	EBF Liaruca	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
U	1	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																
							Actual																																
	3	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarabau - Viqueque Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.		Bebiano C. de Jesus Lopes						2022																															
Município		MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
UATOCARB.	4	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	Jonel Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uato-Carbau	Luminar Unip. Lda	675/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	6	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)	Sabirara, Unip. Lda	SSS/155/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	EBC 2.3 Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
8	ESG Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																	
						Actual																																	
UATOLARI	1	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	Laway	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Liasidi, Nunumalau, Iralere and Ulusu, Uatolari - Viqueque Municipality	Habere Unip.Ida	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	3	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	Helamula Unipessoal, Lda	SSS/096/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	Greu Unipessoal, Lda	SSS/093/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	New Construction Of Gapura,Stairs and Wall Protection in Garden Of Heroes	Natureza Furak,Unip Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	LM	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																																
							Actual																																
	6	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Uatolari	Lemadae Unipessoal Lda	665/004/PDIM/KDM-VQQ/VIII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	7	Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 2 Uatolari - Laisorulai (162)	Bragtojul Unip. Lda JV PT Decont Mitra Consolindo	MPW-CS-2000025	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	8	Rehabilitation of Miabuti Edmumo, Sapatula Road /reabilitacao de estradas distritais de Uatolari Viqueque District	Karakuta Unip Lda	MPW-2013/JUNE	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	10	New Construction Of Chapel Betsda Naedala Affaloicai-Uatolari	Be'e Horis unip,lda		LM	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	Plan																																
							Actual																																
	11	Konstrusaun Kanais Irrigasaun Iha Bebui - Viqueque	L.M. Caicasa Metin Unip,Lda	RDTL-MAP-PO2021:15965	LM	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																																
							Actual																																
	12	EBF Nahae	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	13	EBF Uaibira	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	14	EBC Uatolari	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	15	EBF Edemumu	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																
							Actual																																
	16	EBF Ualaka	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA	Plan																																



2022

Municipio	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS
-----------	------------------------------

VIQUEQUE

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Naran Eng.	Bebiano C. de Jesus Lopes						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MULTI POSTO ADMINIST RATIVO	12	ESG Calixa	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

Note:

Plano Periode inspesaun iha terenu

Implementa Planu Periode Inspesaun

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi:

(Eng. Bebian C. de Jesus Lopes)
Eng. Municipiu Viqueque ADN, I.P.

Sertifika Husi:

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN, I.P.

Aprova Husi:

(Eng. Januario Maia Guterres.)
Adjunto Director Executivo ADN, I.P.
