



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL **IMPLEMENTASAUN PROJETUS** **MUNISÍPIU MANATUTO**

JULLU 2023



Elabora Hosi Eng. Munisípiu

SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO MANATUTO

JULHO 2023

Prepara Hui :



(Eng. Quico Adelino Junior)

Eng. do Projecto Edifício Público Beé no
Saneamento Município Manatuto, ADN, I.P



(Eng. José R. Carlos Gusmão)

Eng. do Projecto Infraestrutura e
Irrigação Município Manatuto, ADN, I.P



(Eng. Adonis Julio Fernandes)

Eng. do Projecto ME, ADN, I.P




(Eng. Domingos da Costa e Silva)

Eng. do Projecto Infraestrutura e
Irrigação Município Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :


(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu, ADN, I.P


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e
Irigasaun, ADN, I.P


(Eng. Deolindo de F. Marques)
Chefe Seksaun ba Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	3
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Manatuto.....	3
1.3. Lista Projectos.....	7
II. PROGRESU FISIKU	25
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan.....	25
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	26
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	26
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	27
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	27

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto.....	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto	6
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamientos	7
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Manatuto Por Sectores.....	11
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Manatuto Por Ministerio.....	18
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto	25

I . INTRODUSAUN.


1.1.Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimentu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvimentu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria

1.2. Perfil Municipio Manatuto

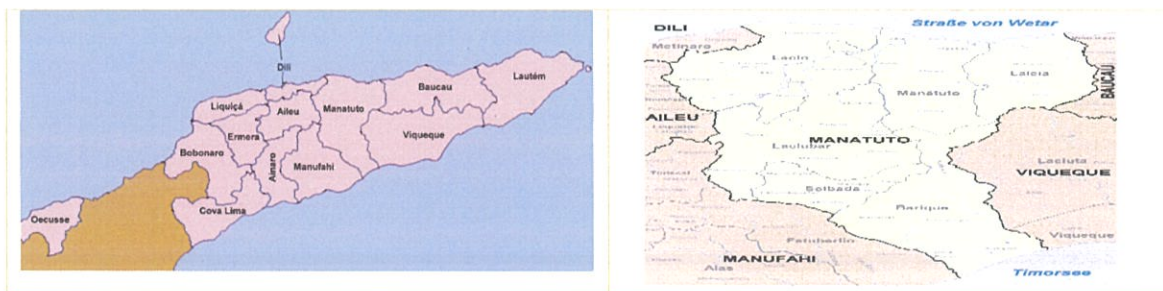

Mapa 2 hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Manatuto iha luan 1,706 km² ho populusaun nain 42,742 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Manatutoiha Postos Administrativos nen (6), Sukus 29 no aldeias 99 , mak hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.

Natarbora		Laclo		Laklubar		Laleia	
Sukus	Aldeia	Sukus	Aldei	Suku	Aldeia	Sukus	Aldeias
Aubeon	2	Hohorai	4	Batara	4	Cairui	7
Barique	2	Locomesak	5	Hatu ma quere k	3	Hatulara n	3
Fatuwaque	2	Uma kaduak	3	Funar	4	Lifau	3
Manehat	3	Uma naruk	4	Mane lima	6		
Uma Boco	2			-	8		
				Sanan a Na'i	4		
Total	11		18		30		13

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 69

Manatuto		Soibada	
sukus	Aldeia	sukus	aldeias
Ailili	2	Fatuma querek	2
Aitekas	4	Leo-hat	2
Cribas	5	Manlala	2
Iliheu	5	Maun Fahe	2
Ma'abat	2	Somoro	2
Sau	2		
	22		10

Tabela 1.1: Força de Trabalho ADN, I.P Município Manatuto

Força de Trabalho ADN,I.P Município Manututu								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	3	3	3			3	
2	Administrasau n no Financas	0	0	0			0	
3	Motorista	1	1	1			1	
4	Seguransa	0	0	0			0	
Total		4					4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto.

ASET ADN,IP MUNICIPIO MANATUTO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	1	1	1				
2	Kareta	1	1	1				
3	Desktop HP / Monitor	1	1	1				
4	Laptop HP	1	1	1				
5	Printer Cannon	1	1	1				
6	UPS	1	1	1				Aát ona
7	Armario File	2	2	2				
8	Armario Tau hena	3	3	3				
9	Meja escritorio	1	1	1				
10	Meja han	1	1	1				
11	Meja TV (kiik)	1	1	1				
12	Kadeira escritorio	6	6	6				
13	Kadeira han	4	4	4				
14	Sofa	1 Set	1 Set	1 Set				
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3	3 Set	3 Set	3 Set				
16	Jeleira	1	1	1				Aát ona
17	Water Dispenser	1	1	1				
18	TV + Parabola	1 Set	1 Set	1 Set				
19	AC	4	4	4				1 aát ona
20	Kipas Angin	4	4	4				
21	Kompur Listrik	1	1	1				Aát ona

22	Kompor Gas	1	1	1				Aát ona
23	Rack sepatu	3	3	3				
24	Rack Piring	1	1	1				
25	Lampu	11	11	11				
26	Water Pump Sanyo	1	1	1				

1.3 : Lista Projectos

Projetu hotu ne'ebe akumula iha lista ne'e bazeia ba dados projetu ne'ebe sei la'o hela no mos projetu ne'ebe abandona ona tinan barak, projetu hirak ne'e fahe tuir lista 1.3.1 Projeto Por Fundus Finansiamientos, 1.3.2 Projeto Por Sectors no 1.3.3 Projeto Por Ministerios.

1.3.1 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamientos

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL EMERGENCY+FI+Fundu Covid-19+LM-BS+LM-CD+LM-TP+PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	12	\$ 3,014,185.05	36.90%
2	Laclo	8	\$ 49,415,129.51	87.56%
3	Laclubar	9	\$ 36,702,834.12	86.93%
4	Laleia	3	\$ 392,472.03	17.27%
5	Manatuto Villa	20	\$ 47,697,609.74	70.14%
6	Soibada	6	\$ 4,286,667.82	75.99%
Grand Total		58	\$ 141,508,898.27	79.90%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	EMERGENCY		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0.00%
2	Laclo		\$ -	0.00%
3	Laclubar		\$ -	0.00%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	1	\$ 127,786.80	20.56%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	1	\$ 127,786.80	20.56%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	1	\$ 373,283.85	0.00%
2	Laclo	3	\$ 48,698,873.04	87.85%
3	Laclubar	2	\$ 35,075,150.37	88.64%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	7	\$ 46,071,130.27	70.71%
6	Soibada	1	\$ 3,553,954.20	80.60%
	Grand Total	14	\$ 133,772,391.73	81.72%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0.00%
2	Laclo		\$ -	0.00%
3	Laclubar		\$ -	0.00%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	3	\$ 598,668.36	91.68%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	3	\$ 598,668.36	91.68%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	2	\$ 404,938.08	59.16%
2	Laclo	2	\$ 240,323.02	77.07%
3	Laclubar	2	\$ 675,432.39	43.85%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	1	\$ 29,275.84	15.92%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	7	\$ 1,349,969.33	53.75%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	8	\$ 2,119,048.24	37.66%
2	Laclo	1	\$ 223,843.79	56.58%
3	Laclubar	2	\$ 661,982.34	55.55%
4	Laleia	2	\$ 305,588.74	9.25%
5	Manatuto Villa	1	\$ 182,701.57	6.14%
6	Soibada	4	\$ 630,201.31	54.90%
	Grand Total	18	\$ 4,123,365.99	40.69%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0.00%
2	Laclo	1	\$ 98,147.27	44.74%
3	Laclubar	2	\$ 202,223.29	70.49%
4	Laleia	1	\$ 86,883.29	45.49%
5	Manatuto Villa	5	\$ 382,490.63	52.71%
6	Soibada	1	\$ 102,512.31	45.66%
	Grand Total	10	\$ 872,256.79	54.39%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	1	\$ 116,914.88	63.99%
2	Laclo	1	\$ 153,942.39	84.29%
3	Laclubar	1	\$ 88,045.73	10.46%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	2	\$ 305,556.27	28.66%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	5	\$ 664,459.27	45.35%

1.3.2 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Sectors

NO	POR SECTOR	TOTAL MUNICIPIO MANATUTO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370,511.25	15.83%
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 162,377.94	41.85%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL	1	\$ 5,305,635.70	0.00%
4	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	84.29%
5	EDIFICIOS PUBLICOS	7	\$ 1,168,395.22	61.77%
6	EDUKASAUN	11	\$ 1,054,958.36	46.03%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1,076,003.44	78.57%
8	ESTRADAS	17	\$ 9,302,853.24	57.22%
9	ESTRADAS E PONTES	1	\$ 394,197.73	0.00%
10	FLOOD CONTROL	2	\$ 432,138.16	78.21%
11	IMPRESTIMO	4	\$ 115,112,106.35	86.80%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES	1	\$ 127,786.80	20.56%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157,560.52	41.96%
15	PONTES	1	\$ 3,553,954.20	80.60%
16	SAUDE	3	\$ 467,944.26	72.58%
17	TURISMO	2	\$ 305,556.27	28.66%
Grand Total		58	\$ 141,508,898.27	79.90%

NO	POR SECTOR	Barique		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370,511.25	15.83%
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 162,377.94	41.85%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL		\$ -	0.00%
4	COMERCIO		\$ -	0.00%
5	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 408,460.73	90.00%
6	EDUKASAUN		\$ -	0.00%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
8	ESTRADAS	5	\$ 1,555,799.59	19.64%
9	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
10	FLOOD CONTROL	1	\$ 242,560.14	70.75%
11	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES		\$ -	0.00%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157,560.52	41.96%
15	PONTES		\$ -	0.00%
16	SAUDE	1	\$ 116,914.88	63.99%
17	TURISMO		\$ -	0.00%
Grand Total		12	\$ 3,014,185.05	36.90%

NO	POR SECTOR	Laclo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL		\$ -	0.00%
4	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	84.29%
5	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 50,745.00	37.13%
6	EDUKASAUN	1	\$ 98,147.27	44.74%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 380,582.61	72.08%
8	ESTRADAS	2	\$ 227,158.35	57.07%
9	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
10	FLOOD CONTROL	1	\$ 189,578.02	87.76%
11	IMPRESTIMO	1	\$ 48,314,975.87	87.98%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES		\$ -	0.00%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
15	PONTES		\$ -	0.00%
16	SAUDE		\$ -	0.00%
17	TURISMO		\$ -	0.00%
Grand Total		8	\$ 49,415,129.51	87.56%

NO	POR SECTOR	Laclubar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL		\$ -	0.00%
4	COMERCIO		\$ -	0.00%
5	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0.00%
6	EDUKASAUN	2	\$ 202,223.29	70.49%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 695,420.83	82.11%
8	ESTRADAS	4	\$ 1,337,414.73	49.64%
9	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
10	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
11	IMPRESTIMO	1	\$ 34,379,729.54	88.78%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES		\$ -	0.00%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
15	PONTES		\$ -	0.00%
16	SAUDE	1	\$ 88,045.73	10.46%
17	TURISMO		\$ -	0.00%
	Grand Total	9	\$ 36,702,834.12	86.93%

NO	POR SECTOR	Laleia		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL		\$ -	0.00%
4	COMERCIO		\$ -	0.00%
5	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 277,330.43	0.00%
6	EDUKASAUN	1	\$ 86,883.29	45.49%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
8	ESTRADAS	1	\$ 28,258.31	100.00%
9	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
10	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
11	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES		\$ -	0.00%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
15	PONTES		\$ -	0.00%
16	SAUDE		\$ -	0.00%
17	TURISMO		\$ -	0.00%
Grand Total		3	\$ 392,472.03	17.27%

NO	POR SECTOR	Manatuto Villa		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL	1	\$ 5,305,635.70	0.00%
4	COMERCIO		\$ -	0.00%
5	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 364,960.55	81.64%
6	EDUKASAUN	6	\$ 565,192.20	37.65%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
8	ESTRADAS	2	\$ 5,590,919.46	69.52%
9	ESTRADAS E PONTES	1	\$ 394,197.73	0.00%
10	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
11	IMPRESTIMO	2	\$ 32,417,400.94	82.96%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES	1	\$ 127,786.80	20.56%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
15	PONTES		\$ -	0.00%
16	SAUDE	1	\$ 262,983.65	97.19%
17	TURISMO	2	\$ 305,556.27	28.66%
	Grand Total	20	\$ 47,697,609.74	70.14%

NO	POR SECTOR	Soibada		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL		\$ -	0.00%
4	COMERCIO		\$ -	0.00%
5	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 66,898.51	55.80%
6	EDUKASAUN	1	\$ 102,512.31	45.66%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
8	ESTRADAS	3	\$ 563,302.80	54.79%
9	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
10	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
11	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
12	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
13	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES		\$ -	0.00%
14	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
15	PONTES	1	\$ 3,553,954.20	80.60%
16	SAUDE		\$ -	0.00%
17	TURISMO		\$ -	0.00%
	Grand Total	6	\$ 4,286,667.82	75.99%

1.3.3 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Ministerios

NO	POR MINISTERIO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica	1	\$ 127,786.80	20.56%
2	ESTATAL	2	\$ 305,556.27	28.66%
3	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 370,511.25	15.83%
4	Ministério da Administração Estatal	1	\$ 5,305,635.70	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 189,578.02	87.76%
6	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29,275.84	15.92%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	29	\$ 130,001,613.56	84.04%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	12	\$ 1,121,856.87	46.61%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277,330.43	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE	5	\$ 803,628.97	78.76%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204,687.39	72.60%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 408,460.73	90.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
Grand Total		58	\$ 141,508,898.27	79.90%

NO	POR MINISTERIO	Barique		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica		\$ -	0.00%
2	ESTATAL		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 370,511.25	15.83%
4	Ministério da Administração Estatal		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	9	\$ 2,118,298.19	28.86%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 116,914.88	63.99%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 408,460.73	90.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
Grand Total		12	\$ 3,014,185.05	36.90%

NO	POR MINISTERIO	Laclo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica		\$ -	0.00%
2	ESTATAL		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
4	Ministério da Administração Estatal		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 189,578.02	87.76%
6	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	4	\$ 48,922,716.83	87.71%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 98,147.27	44.74%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204,687.39	72.60%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
Grand Total		8	\$ 49,415,129.51	87.56%

NO	POR MINISTERIO	Laclubar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica		\$ -	0.00%
2	ESTATAL		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
4	Ministério da Administração Estatal		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	6	\$ 36,412,565.10	87.21%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 202,223.29	70.49%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 88,045.73	10.46%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
Grand Total		9	\$ 36,702,834.12	86.93%

NO	POR MINISTERIO	Laleia		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica		\$ -	0.00%
2	ESTATAL		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
4	Ministério da Administração Estatal		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	1	\$ 28,258.31	100.00%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 86,883.29	45.49%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277,330.43	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
Grand Total		3	\$ 392,472.03	17.27%

NO	POR MINISTERIO	Manatuto Villa		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica	1	\$ 127,786.80	20.56%
2	ESTATAL	2	\$ 305,556.27	28.66%
3	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
4	Ministério da Administração Estatal	1	\$ 5,305,635.70	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29,275.84	15.92%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	\$ 38,402,518.13	80.15%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	6	\$ 565,192.20	37.65%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 598,668.36	91.68%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
	Grand Total	20	\$ 47,697,609.74	70.14%

NO	POR MINISTERIO	Soibada		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Be'e Timor Leste, Empresa Publica		\$ -	0.00%
2	ESTATAL		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
4	Ministério da Administração Estatal		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	4	\$ 4,117,257.00	77.07%
8	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 169,410.82	49.67%
9	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
10	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
11	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
12	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
13	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
Grand Total		6	\$ 4,286,667.82	75.99%

1.4. Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Idade la produktivu (idade 0- 14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Barique	5,833	1,924	1,617	1,183	1,109
Laclo	8,193	2,250	2,185	1,919	1,838
Lacubar	12,777	3,445	3,571	2,924	2,836
Laleia	3,930	1,181	1,189	817	743
Manatuto	15,446	4,741	4,609	3,109	2,987
Soibada	3,511	237	213	239	259

Fontes : Projeksaun Populasaun bazea ba Census Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1. Progressu Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan nia laran, husi lista #anexu B hatudu progresu aktual fulan ida ne'e ho nia prenentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu prentangen aktual fulan ida ne'e hatudu progresu fisiku komulativu husi prosentu antrior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare iha #anexu B, detallu ba back-up #anexu C, no Instrusaun Servisu #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1. Obtáclo Servisu iha Terenu

Observasaun geral ba projeto hirak nebe mak implementa iha Munisipio Manatuto

1. Projeto Lao la tuir tempo nebee asina entre parte rua
2. Laiha tekniko supervisaun husi projeto nain atu halo kontrolo diaramente
3. Tekniko kompanha la iha tereno
4. Skill badaen neebe mak la dun professional

Obstalku teknik A.D.N hasoru

1. Distansia ne'ebe dook difikulta teknik atu servisu lalais
2. Kondisaun estrada ne'ebe a'at
3. Kontraktor sira ne'ebe mak servisu iha terreno barak mak la tuir Spesifikasaun ne'ebe iha kontartu laran.
4. Planu Mapamentu Enginheiro Munisipiu la konsege realiza tuir planu tamba hare hosi nia distansia ne'ebe dook.
5. Sistema dropbox iha Munisipiu dala ruma iha problema lina internet

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Presija tebes atu aumenta ema iha Munisipiu atu nune bele halo servisu ba administrasaun ne'ebe efektivu.
2. Sebele sistema dropbox tau mos iha dekstop Munisipiu para la bele atraja ami nia servisu.

Note: Asinatura Husi Eng. Municipio Manatuto

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Manatuto						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Enjineiru	Quico Adelino Junior	240	Enjineiru EPAS		
		José R. Carlos Gusmão	168	Enjineiru ITI		
		Domingos da Costa e Silva	250	Enjineiru ITI		

		Adonis Julio Fernandes	152	Enjineiru ME		
2	Enjineira	Olivia Soares	112	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Timoteo da Silva Morais	120	Motorista		

#ANEXU A

MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	PMIS CODE	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
1	P0281	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	\$ 2,561,405.06	Aug. 25, 2018	99.31%	57.33%	\$ 1,468,479.04	\$ 1,092,926.02	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 35.51%
2	P0282	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	\$ 3,029,514.40	Aug. 25, 2017	99.47%	79.82%	\$ 2,418,275.38	\$ 611,239.02	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 10.28%
3	P0326	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obrai Unipessoal, Lda	\$ 2,362,976.44	June 30, 2015	82.08%	76.00%	\$ 1,795,843.89	\$ 567,132.55	ON-GOING	
4	P0377	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R.D Interior Junior Construction / Hebel Road and Bridge Group	\$ 28,011,854.94	Feb. 10, 2014	94.91%	85.62%	\$ 23,983,565.18	\$ 4,028,289.76	ON-GOING	
5	P0379	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	\$ 4,405,546.00	Sept. 3, 2014	73.76%	66.02%	\$ 2,908,484.28	\$ 1,497,061.72	ON-GOING	
6	P0788	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	\$ 79,155.54	Dec. 18, 2019	88.07%	79.26%	\$ 62,737.67	\$ 16,417.87	ON-GOING	
7	P0789	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	\$ 226,400.73	Dec. 18, 2019	43.70%	10.97%	\$ 24,834.32	\$ 201,566.41	ON-GOING	
8	P0872	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisiplu Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	\$ 29,275.84	March 1, 2020	15.92%	15.92%	\$ 4,660.85	\$ 24,614.99	ON-GOING	
9	P0954	Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Municiplu Manatuto, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip Lda	\$ 262,983.65	09-Dec-20	100.00%	97.19%	\$ 255,587.87	\$ 7,395.78	FHO	Projecto ne Finaliza ona
10	P2538	New Construction of Fence at Isolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	K-6, UNIPESSOAL LDA	\$ 257,748.51	Jan. 12, 2022	94.03%	84.63%	\$ 218,126.13	\$ 39,622.38	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 5.14%
11	P2539	Supply and Installtion Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Fraternity Unipessoal Lda	\$ 77,936.20	Jan. 12, 2022	96.46%	96.46%	\$ 75,175.03	\$ 2,761.17	FHO	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 4.18%
12	P1806	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	\$ 62,996.83	Oct. 15, 2021	75.55%	71.10%	\$ 44,793.33	\$ 18,203.50	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 4.45%
13	P1808	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF RENTAU	\$ 64,383.50	Oct. 15, 2021	80.58%	78.71%	\$ 50,677.05	\$ 13,706.45	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 5.87%
14	P1809	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE PE REMBOR	\$ 88,918.34	Oct. 15, 2021	61.21%	44.89%	\$ 39,919.56	\$ 48,998.78	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 1.67%
15	P1811	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF OBRATO	\$ 66,144.65	Oct. 15, 2021	76.13%	50.49%	\$ 33,395.94	\$ 32,748.71	ON-GOING	
16	P2041	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	\$ 100,047.31	Oct. 15, 2021	32.81%	32.81%	\$ 32,820.63	\$ 67,226.68	ON-GOING	
17	P1953	Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Parapa Bemizuu Star Unipessoal Lda	\$ 182,701.57	Dec. 7, 2022	13.26%	6.14%	\$ 11,214.18	\$ 171,487.39	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 0.84%
18	P1581	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda	\$ 394,197.73	April 28, 2022	20.08%	0.00%	\$ -	\$ 394,197.73	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 1.40%
19	P1125	Emergency Supply and Gabion Construction for Weten Transmission Pipeline,Manatuto Municipality	Be'e Timor Leste, Empresa Publica	EMERGENCY	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES	Manatuto Villa	Manatuto	Dyanyl Unipessoal, Lda	\$ 127,786.80	Sept. 05, 2022	21.64%	20.56%	\$ 26,270.01	\$ 101,516.79	ON-GOING	
20	P2868	New Construction Of Office Building Of Ministry Of State Administration In Manatuto Municipality	Ministério da Administração Estatal	FI	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL	Manatuto Villa	Manatuto	JLC LDA (TIMOR - LESTE)	\$ 5,305,635.70	Jan. 30, 2023	1.80%	0.00%	\$ -	\$ 5,305,635.70	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 1.80%
21	P0627	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip Lda	\$ 277,330.43	July 18, 2019	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 277,330.43	ON-GOING	

#ANEXU A
MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto


NU.	PMIS CODE	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
22	P0986	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	\$ 28,258.31	June 10, 2021	100.00%	100.00%	\$ 28,258.31	\$ -	FHO	Projecto ne Finaliza ona
23	P1810	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laleia	Manatuto	MEJD PKRIE EP CAIRUI	\$ 86,883.29	Oct. 15, 2021	66.71%	45.49%	\$ 39,524.89	\$ 47,358.40	ON-GOING	
24	P0114	New Installation Mv. Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	\$ 695,420.83	June 7, 2016	91.52%	82.11%	\$ 571,034.27	\$ 124,386.56	ON-GOING	
25	P0378	Road Network Upgrading Sector Project (RNUSP)Upgrading and Maintenance of Laclubar Junction - Natarbora Road (Sta. 100+360 - Sta. 144+995)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co, LTD	\$ 34,379,729.54	Nov. 20, 2014	98.54%	88.78%	\$ 30,520,639.32	\$ 3,859,090.22	ON-GOING	
26	P0899	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 481,029.67	Aug. 25, 2020	54.37%	26.30%	\$ 126,501.30	\$ 354,528.37	ON-GOING	
27	P0917	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 194,402.72	Dec. 20, 2019	96.99%	87.29%	\$ 169,695.40	\$ 24,707.32	ON-GOING	
28	P0977	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	\$ 448,209.39	June 10, 2021	95.04%	82.05%	\$ 367,756.59	\$ 80,452.80	ON-GOING	
29	P0983	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	\$ 213,772.95	June 10, 2021	7.12%	0.00%	\$ -	\$ 213,772.95	ON-GOING	
30	P2781	Konstrasaun Postu Saude Laclubar Funar- Postu Administrativo Laclubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	MERCY, Unipessoal Lda	\$ 88,045.73	July 28, 2019	13.92%	10.46%	\$ 9,212.19	\$ 78,833.54	ON-GOING	
31	P1803	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BATARA	\$ 102,060.99	Oct. 15, 2021	92.00%	90.49%	\$ 92,353.10	\$ 9,707.89	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 14.13%
32	P1804	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	\$ 100,162.30	Oct. 15, 2021	50.16%	50.11%	\$ 50,193.41	\$ 49,968.89	ON-GOING	
33	P1582	Rehabilitation of The Rural Road Natarbora - Pualaka (Mina Rai) Chainage 0+000 - 2+000 (2 km), Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Ilatun Lda	\$ 373,283.85	June 05, 2023	23.71%	0.00%	\$ -	\$ 373,283.85	ON-GOING	
34	P0316	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPESSOAL LDA	\$ 3,553,954.20	Feb. 27, 2017	100.00%	80.60%	\$ 2,864,587.85	\$ 689,366.35	PHO	
35	P0932	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	\$ 164,154.00	March 25, 2020	100.00%	100.00%	\$ 164,154.00	\$ -	FHO	
36	P0981	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 203,036.57	June 10, 2021	64.38%	41.78%	\$ 84,819.65	\$ 118,216.92	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 0.82%
37	P0984	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 196,112.23	June 10, 2021	63.34%	30.42%	\$ 59,662.31	\$ 136,449.92	ON-GOING	
38	P1814	Projeto Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 66,898.51	Nov. 26, 2021	67.91%	55.80%	\$ 37,330.95	\$ 29,567.56	ON-GOING	
39	P1807	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	\$ 102,512.31	Oct. 15, 2021	59.36%	45.66%	\$ 46,807.88	\$ 55,704.43	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 8.51%
40	P0940	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	\$ 242,560.14	Oct. 24, 2019	70.75%	70.75%	\$ 171,617.69	\$ 70,942.45	FHO	Projecto ne Finaliza ona
41	P0404	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	\$ 370,511.25	Sept. 13, 2016	17.59%	15.83%	\$ 58,645.87	\$ 311,865.38	Abandona	Abandona

#ANEXU A
MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	PMIS CODE	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
42	P0540	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip.Lda	\$ 15,875.56	Jan. 7, 2017	100.00%	87.26%	\$ 13,853.09	\$ 2,022.47	PHO	Abandona
43	P0784	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	\$ 116,914.88	Sept. 23, 2019	71.10%	63.99%	\$ 74,817.23	\$ 42,097.65	ON-GOING	
44	P0873	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip.Lda	\$ 162,377.94	Oct. 8, 2019	46.50%	41.85%	\$ 67,961.57	\$ 94,416.37	ON-GOING	
45	P0921	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 141,684.96	Aug. 25, 2019	41.78%	36.88%	\$ 52,260.01	\$ 89,424.95	ON-GOING	
46	P0978	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We'coi Unipessoal Lda	\$ 343,111.47	June 10, 2021	99.89%	21.97%	\$ 75,370.79	\$ 267,740.68	ON-GOING	
47	P0982	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	\$ 296,211.81	June 10, 2021	26.37%	15.96%	\$ 47,266.94	\$ 248,944.87	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 2.11%
48	P0985	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	\$ 300,792.46	July 10, 2021	99.09%	52.76%	\$ 158,690.94	\$ 142,101.52	ON-GOING	
49	P1056	New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de heróis de Natarbora	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Barique	Manatuto	Senizu	\$ 408,460.73	Oct. 18, 2021	100.00%	90.00%	\$ 367,614.65	\$ 40,846.08	PHO	
50	P2642	Provision of Consultancy Service for Preparation of Detailed Engineering Design (DED) and Bidding Document for Lamara Bridge on National Road (A09-04) Under Road Network Upgrading Sector Project (RNSUP), Access Bridge to Link Manehat to Natarbora, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	PT. Dhiratama Cipta Persada	\$ 242,400.00	Dec. 23, 2022	10.00%	10.00%	\$ 24,240.00	\$ 218,160.00	ON-GOING	
51	P0061	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ÊLETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacio	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	\$ 380,582.61	Sept. 1, 2016	95.99%	72.08%	\$ 274,330.03	\$ 106,252.58	ON-GOING	
52	P0221	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Sahan I Unip.Lda	\$ 3,314.56	Sept. 27, 2016	100.00%	90.00%	\$ 2,983.11	\$ 331.45	PHO	Falta Retensaun
53	P0926	For Roads & Bridges Maintenance Section : Mantanen Lacio, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Egana, Unip. Lda	\$ 223,843.79	Dec. 13, 2019	68.89%	56.58%	\$ 126,647.74	\$ 97,196.05	ON-GOING	
54	P0692	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Esa-Un	\$ 50,745.00	May 2, 2016	38.83%	37.13%	\$ 18,841.29	\$ 31,903.71	PENDENTE	
55	P0776	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilmano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacio	Manatuto	Surprise Unip. Lda	\$ 153,942.39	Sept. 12, 2016	97.16%	84.29%	\$ 129,753.97	\$ 24,188.42	ON-GOING	
56	P0396	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacio	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	\$ 48,314,975.87	May 3, 2016	88.12%	87.98%	\$ 42,506,027.78	\$ 5,808,948.09	ON-GOING	
57	P1805	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lacio	Manatuto	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	\$ 98,147.27	Oct. 15, 2021	59.64%	44.74%	\$ 43,908.27	\$ 54,239.00	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 7.50%
58	P2603	Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp at Behau	MINISTERIO DA DEFESA	LM-BS	FLOOD CONTROL	Lacio	Manatuto	Baboe Unip.Lda	\$ 189,578.02	May 23, 2022	97.51%	87.76%	\$ 166,368.56	\$ 23,209.46	PHO	
		TOTAL							\$ 141,508,898.27				\$ 113,068,591.29	\$ 28,417,097.52		


1. Eng. José R. Carlos, Gusmão
Eng. ba Projeto Infrastrutura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Prepara Husi:

2. Eng. Domingus D.X. Silva
Eng. ba Projeto Infrastrutura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P


3. Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Edificio Público, Be'e
no Saneamento Municipiu Manatuto, ADN, I.P


4. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

Certifica Husi:

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De
Qualidade ADN,I.P

LISTA #ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN													
					LOKALIZASAUN PROJETU						Jul-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress	This Month Progress	Kumulativo Progress
1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3,72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	\$ 2.561.405,06	Aug. 25, 2018	63,80%	35,51%	99,31%
2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct, Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4,68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	SSS/061/MOPTC-2017	\$ 3.029.514,40	Aug. 25, 2017	89,20%	10,28%	99,47%
3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obral Unipessoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	\$ 2.362.976,44	June 30, 2015	82,08%		82,08%
4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	ICB/023/MPW-2013	\$ 28.011.854,94	Feb. 10, 2014	94,91%		94,91%
5	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	QCBS/019/MPW-2013	\$ 4.405.546,00	Sept. 3, 2014	73,76%		73,76%
6	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-VMNTT/XII/2019	\$ 79.155,54	Dec. 18, 2019	88,07%		88,07%
7	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-VMNTT/XII/2019	\$ 226.400,73	Dec. 18, 2019	43,70%		43,70%
8	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	019/Janeiro/2020	\$ 29.275,84	March 1, 2020	15,92%		15,92%
9	Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Municipio Manatuto, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	\$ 262.983,65	09-Dec-20	100,00%		100,00%
10	New Construction of Fence at Isolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	K-6, UNIPESOOAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227	\$ 257.748,51	Jan. 12, 2022	88,89%	5,14%	94,03%
11	Supply and Instalition Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Fraternity Unipessoal Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227	\$ 77.936,20	Jan. 12, 2022	92,28%	4,18%	96,46%
12	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	-	\$ 62.996,83	Oct. 15, 2021	71,10%	4,45%	75,55%
13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF RENTAU	-	\$ 64.383,50	Oct. 15, 2021	74,71%	5,87%	80,58%
14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE PE REMBOR	-	\$ 88.918,34	Oct. 15, 2021	59,54%	1,67%	61,21%
15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF OBRATO	-	\$ 66.144,65	Oct. 15, 2021	76,13%		76,13%
16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	-	\$ 100.047,31	Oct. 15, 2021	32,81%		32,81%
17	Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda		\$ 182.701,57	Dec. 7, 2022	12,42%	0,84%	13,26%
18	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3,0 Km	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda		\$ 394.197,73	April 28, 2022	18,68%	1,40%	20,08%
19	Emergency Supply and Gabion Construction for Weten Transmission Pipeline,Manatuto Municipality	Be'e Timor Leste, Empresa Publica	EMERGENCY	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES	Manatuto Villa	Manatuto	Dyanyl Unipessoal, Lda	NCB/055/BTL,E.P-2022	\$ 394.197,73	Sept. 05, 2022	21,64%		21,64%
20	New Construction Of Office Building Of Ministry Of State Administration In Manatuto Municipality	Ministério da Administração Estatal	FI	BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL	Manatuto Villa	Manatuto	JLC LDA (TIMOR - LESTE)	ICB/032/MAE - 2022	\$ 5.305.635,70	Jan. 30, 2023	0,00%	1,80%	1,80%
21	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/VII/DIL/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	\$ 277.330,43	July 18, 2019	0,00%		0,00%
22	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	MPW-W-210055	\$ 28.258,31	June 10, 2021	100,00%		100,00%
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laleia	Manatuto	MEJD PKRIE EP CAIRUI	-	\$ 86.883,29	Oct. 15, 2021	66,71%		66,71%
24	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412	\$ 695.420,83	June 7, 2016	91,52%		91,52%
25	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD	ICB/04/MPW-2014	\$ 34.379.729,54	Nov. 20, 2014	98,54%		98,54%
26	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190035	\$ 481.029,67	Aug. 25, 2020	54,37%		54,37%
27	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020	\$ 194.402,72	Dec. 20, 2019	96,99%		96,99%
28	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	MPW-W-210057	\$ 448.209,39	June 10, 2021	95,04%		95,04%
29	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	MPW-W-210056	\$ 213.772,95	June 10, 2021	7,12%		7,12%
30	Konstrasaun Postu Saude Laclubar Funar- Postu Administrativo Laclubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	MERCY, Unipessoal Lda	04/PDIM-VMNTT/VIII/2022	\$ 88.045,73	July 28, 2019	13,92%		13,92%
31	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BATARA	-	\$ 102.060,99	Oct. 15, 2021	77,87%	14,13%	92,00%
32	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	-	\$ 100.162,30	Oct. 15, 2021	50,16%		50,16%
33	Rehabilitation of The Rural Road Natarbora - Pualaka (Mina Rai) Chainage 0+000 - 2+000 (2 km), Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ilatun Lda	RT/103/MOP-2022	\$ 373.283,85	June 05, 2023	0,00%	23,71%	23,71%
34	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPESOOAL LDA	SSS/013/MOPTC-2017	\$ 3.384.214,14	Feb. 27, 2017	100,00%		100,00%
35	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000024	\$ 164.154,00	March 25, 2020	100,00%		100,00%
36	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	MPW-W-210059	\$ 203.036,57	June 10, 2021	63,56%	0,82%	64,38%
37	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	MPW-W-210060	\$ 196.112,23	June 10, 2021	63,34%		63,34%
38	Projeto Rehabilitasaun Ensnu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	RFQ-R : 21/036 - Q	\$ 66.898,51	Nov. 26, 2021	67,91%		67,91%
39	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	-	\$ 102.512,31	Oct. 15, 2021	50,85%	8,51%	59,36%
40	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	MPW-W-190157	\$ 242.560,14	Oct. 24, 2019	70,75%		70,75%
41	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	RDTL/PO:2016-11272	\$ 370.511,25	Sept. 13, 2016	17,59%		17,59%
42	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip.Lda	MPWTC - CD - 170003	\$ 15.875,56	Jan. 7, 2017	100,00%		100,00%
43	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	03/PDIM-VMNTT/IX/2019	\$ 116.914,88	Sept. 23, 2019	71,10%		71,10%
44	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip Lda	No. Kontratu : MOP-W-190233	\$ 162.377,94	Oct. 8, 2019	46,50%		46,50%
45	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	MPW-W-W-190080	\$ 141.684,96	Aug. 25, 2019	41,78%		41,78%

LISTA #ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN											Jul-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	LOKALIZASAUN PROJETU		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress	This Month Progress	Komulativo Progress
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU							
46	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-5+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We"coi Unipessoal Lda	MPW-W-210062	\$ 343,111.47	June 10, 2021	99.89%		99.89%
47	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	MPW-W-210061	\$ 296,211.81	June 10, 2021	24.25%	2.11%	26.37%
48	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	MPW-W-210058	\$ 300,792.46	July 10, 2021	99.09%		99.09%
49	New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Barique	Manatuto	Senizu		\$ 408,460.73		100.00%		100.00%
50	Provision of Consultancy Service for Preparation of Detailed Engineering Design (DED) and Bidding Document for Lamara Bridge on National Road (A09-04) Under Road Network	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	PT. Dhiratama Cipta Persada	MPW-CS-220290	\$ 242,400.00	Dec. 23, 2022	10.00%		10.00%
51	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacio	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421	\$ 380,582.61	Sept. 1, 2016	95.99%		95.99%
52	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Sahan I Unip.Lda	SSS/304/MOPTC-2016	\$ 3,314.56	Sept. 27, 2016	100.00%		100.00%
53	Routine Roads Maintenance - Lacio, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Egana, Unip. Lda	MPW-W-190251	\$ 223,836.50	Dec. 13, 2019	68.89%		68.89%
54	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Esa-Un	RDTL:74/GMTAC/XI/2015	\$ 50,745.00	May 2, 2016	38.83%		38.83%
55	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilmano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacio	Manatuto	Surprise Unip. Lda	07/PDIM-II/MNTT/VIII/2016	\$ 153,942.39	Sept. 12, 2016	97.16%		97.16%
56	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacio	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	ICB/07/MPW-2014	\$ 48,314,975.87	May 3, 2016	88.12%		88.12%
57	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lacio	Manatuto	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	-	\$ 98,147.27	Oct. 15, 2021	52.14%	7.50%	59.64%
58	Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp at Behau	MINISTERIO DA DEFESA	LM-BS	FLOOD CONTROL	Lacio	Manatuto	Baboe Unip Lda		\$ 189,578.02	May 23, 2022	97.51%		97.51%

Prepara Husi:

1. Eng. José R. Carlos, Gusmão
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

3. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

2. Eng. Domingos D.X.Silva
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

4. Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi:

Eng. Remigio da c.s dos Santos
Eng. Senior ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun, ADN, I.P

Eng/Arch.Francisco Xavier de D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projecto Edificio Publico e Saneamento,ADN,I.P

Eng. Deolindo de Fatima Marques
ChefeSeksau ME& ITC, ADN, I.P

Certifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo
e Validacao De Qualidade ADN,I.P



#ANEXU C1 (MV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in
Manatuto Municipality Manatuto
No. kontratu : SSS/062/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 12/ 07/20223

Fatin Inspesaun : Manatuto Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : 126,041,478, Latetude : -8,518,704

End Point : Long : 126,014,554, Latetude : -8,509,156

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos D.X. Silva
2. Eng. José R. Carlos Gusmão

Sketch & Foto Desenho

Sketch servisu laiha ona horajaun tamba
servisu iha tereinu finaliza ona ho ida nee
husi parte kompania hein
Rekomendasaun pagamento ikus husi
MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (MV- 01)

Projeto : Fundus de Infraestruturas (F I)
Título Projeto : Reabilitação Estrada Urbanas Manatuto Villa (3.72 KM)
Fatin Projeto : Posto Administrativo Manatuto Villa, Municipio Manatuto
Contraktor : Maran-Dai JV Adam Motor Unip. Lda

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)						
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 22,900.00	\$ 17,175.00	0.67%	\$ 5,725.00	0.22%	\$ 22,900.00	0.89%
200	EARTHWORKS	\$ 189,909.37	\$ 106,200.47	4.15%	\$ 68,014.80	2.66%	\$ 174,215.26	7.41%
300	SUB BASE AND BASE COURSE	\$ 814,746.26	\$ 355,587.96	13.88%	\$ 459,158.31	17.93%	\$ 814,746.26	31.81%
400	SURFACE COURSE	\$ 771,872.50	\$ 519,773.90	20.29%	\$ 252,098.60	9.84%	\$ 771,872.50	30.13%
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 44,267.92	\$ 38,617.99	1.51%	\$ 5,649.93	0.22%	\$ 44,267.92	1.73%
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 436,931.96	\$ 419,107.21	16.36%	\$ 17,824.74	0.70%	\$ 436,931.95	17.06%
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	\$ 2,264.20	\$ -	0.00%	\$ 2,264.20	0.09%	\$ 2,264.20	0.09%
A	Construction Cost	\$ 2,282,892.21	\$ 1,456,462.52	56.86%	\$ 810,735.57	31.65%	\$ 2,267,198.09	88.51%
B	Profit (10% x A)	\$ 228,289.22	\$ 145,646.25	5.69%	\$ 81,073.56	3.17%	\$ 226,719.81	8.85%
C	Tax 2 % x (A+B)	\$ 50,223.63	\$ 32,042.18	1.25%	\$ 17,836.18	0.70%	\$ 49,878.36	1.95%
D	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 2,561,405.06	\$ 1,634,150.95	63.80%	\$ 909,645.31	35.51%	\$ 2,543,796.26	99.31%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng.Domingos D.X. Silva)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

2. (Eng.José Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto. ADN.I.P

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da c.s dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



#ANEXU C1 (MV - 2)

Back-up Data


Naran Projeto : Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau
Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto

No. kontratu : SSS/061/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Sketch servisu laiha ona horajaun tamba
servisu iha tereinu finaliza ona ho ida nee
parte kompania hein Rekomendasaun ikus
husi MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

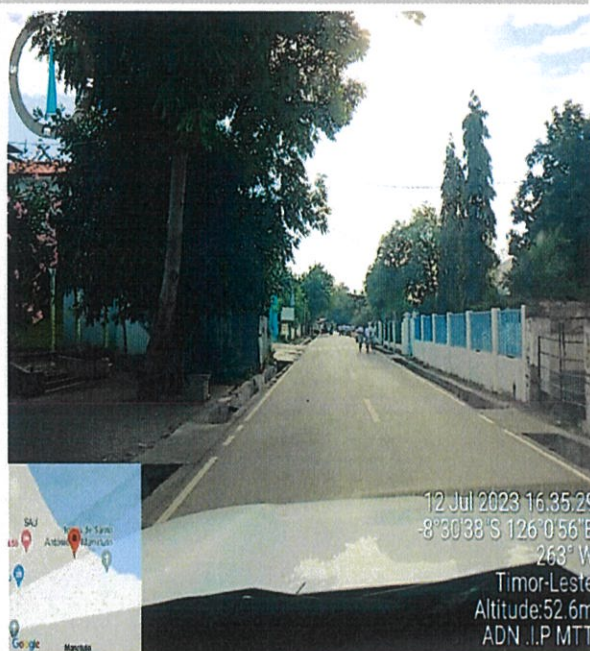

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 (MV - 2)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau
Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto
No. kontratu : SSS/061/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 16/07/2023

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 126,019,530, Latetude : -8,514,341

End Point : Long : 126,007,849, Latetude : -8516389

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos D.X. Silva
2. Eng. José R. Carlos Gusmão

Sketch & Foto Desenho

Sketch servisu laiha ona horajaun tamba
servisu iha tereinu finaliza ona ho ida nee
husi parte kompania hein Rekomendasaun
pagamento ikus husi MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (MV- 02)

Projeitu : Fundus de Infraestruturas (F I)
Titulo Projeitu : Reabilitação Estrada Urbanas Manatuto Villa (4.00 KM)
Fatim Projeitu : Posto Administrstivo Manatuto Villa, Municipio Manatuto
Contraktor : Nananio Unip, Lda JV Inanfoek Unip. Lda

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERECENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)						
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 22,900.00	\$ 12,500.00	0.41%	\$ 10,400.00	0.34%	\$ 22,900.00	0.76%
200	EARTHWORKS	\$ 265,091.37	\$ 144,398.49	4.77%	\$ 107,239.38	3.54%	\$ 251,637.87	8.31%
300	SUB BASE AND BASE COURSE	\$ 595,855.21	\$ 478,068.49	15.78%	\$ 117,786.73	3.89%	\$ 595,855.21	19.67%
400	SURFACE COURSE	\$ 1,115,028.72	\$ 1,108,090.80	36.58%	\$ 6,149.52	0.20%	\$ 1,114,240.32	36.78%
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 41,104.36	\$ 38,175.12	1.26%	\$ 2,929.24	0.10%	\$ 41,104.37	1.36%
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 658,140.04	\$ 625,150.18	20.63%	\$ 32,990.18	1.09%	\$ 658,140.35	21.72%
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	\$ 2,037.78	\$ 2,037.78	0.07%	\$ -	0.00%	\$ 2,037.78	0.07%
A	Construction Cost	\$ 2,700,157.48	\$ 2,408,420.86	79.50%	\$ 277,495.04	9.16%	\$ 2,685,915.90	88.66%
B	Profit (10% x A)	\$ 270,015.75	\$ 240,842.09	7.95%	\$ 27,749.50	0.92%	\$ 268,591.59	8.87%
C	Tax 2 % x (A+B)	\$ 59,403.46	\$ 52,985.26	1.75%	\$ 6,104.89	0.20%	\$ 59,090.15	1.95%
D	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 3,029,576.69	\$ 2,702,248.20	89.20%	\$ 311,349.43	10.28%	\$ 3,013,597.64	99.47%

Verifika Husi :

Inspeksaun Husi:

1. (Eng.Domingos D.X. Silva)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

2. (Eng.José R. Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

(Eng. Remigio da c.s dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality

No. kontratu :

Data Inspesaun : 05 Jullu 2023 ; 14 Jullu 2023

Fatin Inspesaun : Beadi Aiteas, Manatuto

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5390S,

Latetude : 126,017E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Progressu fiziku iha fulan ida ne'e:
Iha fulan ida ne'e ba konstrusaun moru ninian kompanhia komesa hadia ona buat balu ne'ebe eng. ADN IP fo instrusaun atu hadia no kompanhia mos uza osan contingency hodi konstrui tan fatin Post security iha parte oin, no Ekipa ADN IP halo ona inspeksaun ba pagamentu final ba projetu refere.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-10)

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality


No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

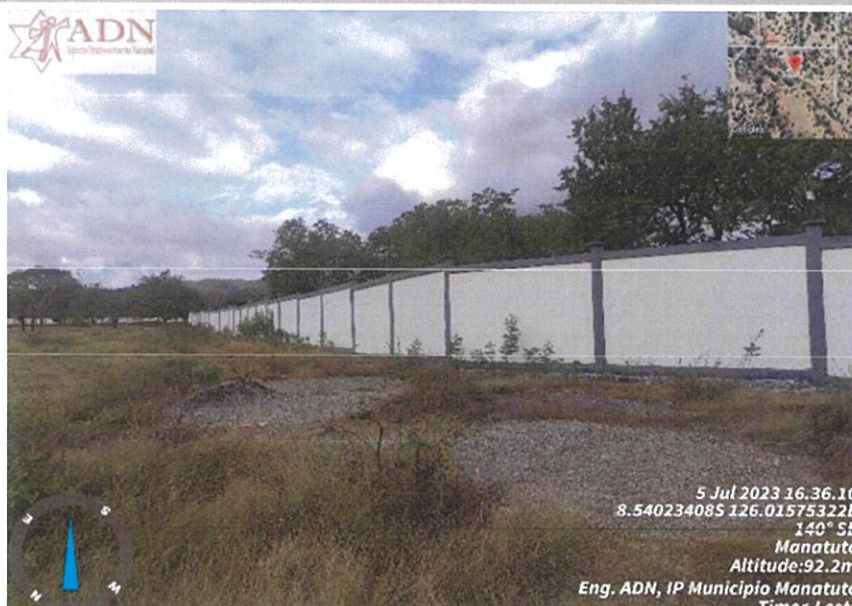

5 Jul 2023 16.36.10
8.54023408S 126.01575322E
140° SE
Manatuto
Altitude: 92.2m
Eng. ADN, IP Municipio Manatuto
Timor-Leste

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .



5 Jul 2023 16.21.07
8.53909508S 126.01531627E
53° NE
Manatuto
Altitude: 93.8m
Eng. ADN, IP Municipio Manatuto
Timor-Leste



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-10)

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.



5 Jul 2023 16.26.12
8.53904507S 126.01536364E
135° SE
Manatuto
Altitude: 84.0m
Eng. ADN, IP Municipio Manatuto
Timor-Leste

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .



14 Jul 2023 11.45.02
8.53903682S 126.01536304E
156° S
Manatuto
Altitude: 92.8m
Eng. ADN, IP Municipio Manatuto
Timor-Leste



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-10)
SUMMARY BOQ

Project Name : NEW CONSTRUCTION OF FENCE AT IZOLATION COVID-19 IN MA'ABAT MANATUTO MUNICIPALITY
Location : MA'ABAT MANATUTU MUNICIPALITY - TIMOR LESTE
Project Owner : MINISTRY OF HEALTH

NO	DESCRIPTION	AMOUNTH \$	PROGRESS BY A D N IP					
			PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS JULY		PROGRESS TO DATE	
			AMOUNT (US\$)	WEIGHT (%)	AMOUNT (US\$)	WEIGHT (%)	AMOUNT (US\$)	WEIGHT (%)
I	PREPARATION WORKS	\$ 3.104,30	\$ 2.800,00	1,09%	\$ 304,30	0,12%	\$ 3.104,30	1,20%
II	FUNDATION WORKS	\$ 12.548,99	\$ 12.548,99	4,87%	\$ -	0,00%	\$ 12.548,99	4,87%
III	CONCRETE WORKS	\$ 101.240,97	\$ 101.240,97	39,28%	\$ -	0,00%	\$ 101.240,97	39,28%
IV	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$ 86.559,00	\$ 84.530,00	32,80%	\$ 2.029,00	0,79%	\$ 86.559,00	33,58%
V	OTHERS WORKS	\$ 3.727,08	\$ 3.084,55	1,20%	\$ 202,54	0,08%	\$ 3.287,08	1,28%
VI	FINAL CLEARING	\$ 175,00	\$ -	0,00%	\$ 175,00	0,07%	\$ 175,00	0,07%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 207.355,34	\$ 204.204,51	79,23%	\$ 2.710,83	1,05%	\$ 206.915,34	80,28%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 20.735,53	\$ 20.420,45	7,92%	\$ 271,08	0,11%	\$ 20.691,53	8,03%
C	OVERHEAD	\$ 4.775,00	\$ -	0,00%	\$ 4.775,00	1,85%	\$ 4.775,00	1,85%
D	TAX (2% x A)	\$ 4.147,11	\$ 4.492,50	1,74%	\$ (345,39)	-0,13%	\$ 4.147,11	1,61%
E	CONTINGENCY (10% X A)	\$ 20.735,53	\$ -	0,00%	\$ 5.842,20	2,27%	\$ 5.842,20	2,27%
F	GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)	\$ 257.748,51	\$ 229.117,46	88,89%	\$ 13.253,72	5,14%	\$ 242.371,18	94,03%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projetu Edificio Publico Beé no Saneamento
Municipio Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN. IP.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply & Installation Main Power for Isolation & Laboratorium Building

No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-229

Data Inspesaun : 05 July 2023

Fatin Inspesaun : Beadi Aiteas, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5403S,

Latetude : 126,0153

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progreso iha fulan ida ne'e: Projetu refere finaliza ona nia tempu retensaun no submete ona nia pedidu retensaun mai iha ADN IP no ekipa tekniku husi ADN IP ba halo ona inspeksaun ba retensaun ninian, no fo intrusaun ba kompanhia atu hadia defeitus kik balun ne'ebe mak iha.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



8 523312S 126.0092943E
Jalan Tanpa Nama
Manatuto
Eng. Adonis
5 Jul 2023 16:58:56



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN. IP.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-11)

Back-up Data

Naran Projeto

: Supply & Installation Main Power for Isolation & Laboratorium
Building

No. kontratu

: RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-229

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.



8.523312S 126.0092943E
Jalan Tanpa Nama
Manatuto
Eng. Adonis
5 Jul 2023 17:00:53

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .



8.523312S 126.0092943E
Jalan Tanpa Nama
Manatuto
Eng. Adonis
5 Jul 2023 16:58:34



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-11) SUMMARY BOQ

Project Title : Supply & Installation Main Power for Isolation & Laboratorium Building
Location : MA'ABAT MANATUTU MUNICIPALITY - TIMOR LESTE
Project Owner : MINISTRY OF HEALTH

ORIGINAL CONTRACT			PROGRESS BY A D N					
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (US\$)	PROGRESS PREVIOUS		PROGRESS JULY		PROGRESS TO DATE	
			Amount US\$	%	Amount US\$	%	Amount US\$	%
I	PREPARATION WORKS	\$ 1.129,26	\$ 1.129,26	1,45%	\$ -	0,00%	\$ 1.129,26	1,45%
II	NEW INSTALATION LOW VOLTAGE (LV) LINE	\$ 16.429,56	\$ 16.429,56	21,08%	-\$ 122,40	-0,16%	\$ 16.307,16	20,92%
III	MAIN CONECTION TO ISOLAMENTO INCLUDE PROVIDE GENSET	\$ 30.150,63	\$ 30.150,63	38,69%	-\$ 1.223,61	-1,57%	\$ 28.927,02	37,12%
IV	CONSTRUCTION HOUSE FOR GENSET	\$ 14.172,92	\$ 14.172,92	18,19%	\$ -	0,00%	\$ 14.172,92	18,19%
V	FINAL CLEARING	\$ 135,00	\$ 135,00	0,17%	\$ -	0,00%	\$ 135,00	0,17%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 62.017,37	\$ 62.017,37	79,57%	-\$ 1.346,01	-1,73%	\$ 60.671,36	77,85%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 6.201,74	\$ 6.201,74	7,96%	-\$ 134,60	-0,17%	\$ 6.067,14	7,78%
C	OVERHEAD	\$ 2.275,00	\$ 2.275,00	2,92%	\$ -	0,00%	\$ 2.275,00	2,92%
D	TAX (2% x (A+B+C)	\$ 1.240,35	\$ 1.421,65	1,82%	-\$ 208,22	-0,27%	\$ 1.213,43	1,56%
E	CONTINGENCY (10% X A)	\$ 6.201,74	\$ -	0,00%	\$ 4.948,10	6,35%	\$ 4.948,10	6,35%
F	GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)	\$ 77.936,20	\$ 71.915,76	92,28%	\$ 3.259,26	4,18%	\$ 75.175,03	96,46%

Prepara husi :


(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

Verifika Husi :


(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :


(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG Kay Rala
No. kontratu :

Data Inspesaun : 13 Jullu 2023

Fatin Inspesaun : Kampung baru, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5349S,

Latetude : 126,0101E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu servisu iha fulan ida
ne'e:

Ba konstrusaun Escritorio ninian
hahu ona monta assessoris haris
fatin , no iha parte liur ninian ,
grupo mos hahu ona cor rampa
haleu escritorio ho nia mahar 10
cm.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-12)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG Kay Rala

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Sketch Item servisu.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

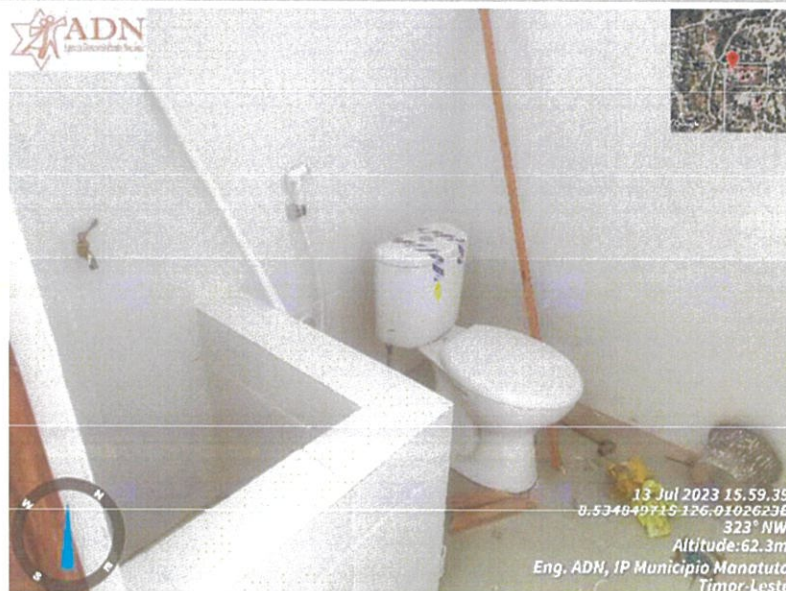



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-12) SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala
Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

NO.	MAIN SUMMARY	Page No	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY ADN IP					
				Amount	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS JULY		TOTAL TO DATE	
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3.075,00	\$ 2.543,75	4,04%	\$ -	0,00%	\$ 2.543,75	4,04%
II	REFURBISHED TEACHER OFFICE BUILDING RF	RF/51	(i)	\$ 50.581,84	\$ 37.627,08	59,73%	\$ 2.802,05	4,45%	\$ 40.429,13	64,18%
A	CONSTRUCTION COST			\$ 53.656,84	\$ 40.170,83	63,77%	\$ 2.802,05	4,45%	\$ 42.972,88	68,21%
B	CONTIGENCIA			\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD			\$ 6.340,00	\$ 4.622,50	7,34%	\$ -	0,00%	\$ 4.622,50	7,34%
D	GRAND TOTAL			\$ 62.996,83	\$ 44.793,33	71,10%	\$ 2.802,05	4,45%	\$ 47.595,38	75,55%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-13) Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau
No. kontratu :

Data Inspesaun : 05 Julho 2023

Fatin Inspesaun : Aiteas Manatuto

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5103S,

Latetude : 126,0157E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu Fiziku iha fulan ida ne'e:
Iha fulan ida ne iha parte classroom
ninian finaliza ona monta plafond
maibe sei falta instalasaun
eletricidade nian ba parte classroom
ninian rasik.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-13)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

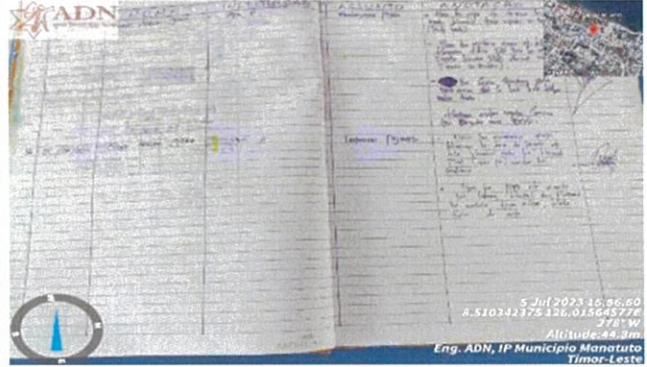

 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO IX GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN IP Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (MV-13) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
					Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau			
					Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO RENTAU			
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	05/07/2023	Manatuto Vila	Quico Adelino Junior	Enginheiru ADN IP Municipiu Manatuto	1	Husu ba engenheiru grupo atu komfirma ho dono do projetu atu halo variation order ba keramik plint (roda pe) ne'ebe iha mudansa.		
					2	Husu ba grupo atu aumenta tan lubang kontrol iha plafond ho medida 60cm x 60cm, kada sala de aula.		
					3			
					4			



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-13) SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau

Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto

Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY		ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY ADN IP					
No	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Progress Previous		Progress July		Total To Date	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 3.075,00	\$ 2.200,00	3,42%	\$ 300,00	0,47%	\$ 2.500,00	3,88%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	\$ 48.345,34	\$ 44.104,14	68,50%	\$ 1.525,85	2,37%	\$ 45.629,99	70,87%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/10 (i)	\$ 3.623,16	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST		\$ 55.043,50	\$ 46.304,14	71,92%	\$ 1.825,85	2,84%	\$ 48.129,99	74,76%
B	CONTIGENCY		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD		\$ 6.340,00	\$ 1.795,00	2,79%	\$ 1.952,50	3,03%	\$ 3.747,50	5,82%
D	GRAND TOTAL		\$ 64.383,50	\$ 48.099,14	74,71%	\$ 3.778,35	5,87%	\$ 51.877,49	80,58%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projetu Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Rembor
No. kontratu :

Data Inspesaun : 10 Jullu 2023

Fatin Inspesaun : Rembor, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5103S,

Latetude : 126,0157E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu Fiziku iha fulan ida
ne'e: Iha fulan ida ne'e Ba
Classroom ninian , grupu
hahu ona ho pinta classroom
parte liur ninian no mos hahu
ona monta odamatan tuir
kada sala de aula.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Rembor

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu.



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-14)
SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Rembor
Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

NO	MAIN SUMMARY	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY ADN IP					
		Page No	AMOUNT	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS JULY		PROGRESS TO DATE	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3 (i)	\$ 3.075,00	\$ 1.975,00	2,22%	\$ -	0,00%	\$ 1.975,00	2,22%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47 (i)	\$ 57.778,14	\$ 47.649,29	53,59%	\$ 1.481,29	1,67%	\$ 49.130,58	55,25%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/23 (i)	\$ 9.959,28	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST		\$ 70.812,42	\$ 49.624,29	55,81%	\$ 1.481,29	1,67%	\$ 51.105,58	57,47%
B	CONTIGENCIA		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD		\$ 6.340,00	\$ 3.317,00	3,73%	\$ -	0,00%	\$ 3.317,00	3,73%
D	GRAND TOTAL		\$ 88.918,34	\$ 52.941,29	59,54%	\$ 1.481,29	1,67%	\$ 54.422,58	61,21%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto
No. kontratu :

Data Inspesaun : 20 Julho 2023

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.5123S

Latetude : 126.0162E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Progresso iha fulan ida ne'e : ba
Teacher Office ninian ,hahu ona
monta bekesting ba kolom.





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-17)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu


: Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Iha parte Classroom building
ninian finalize ona pengecoran
ba parte kolom ninian no agora
dadaun kontinua monta/kesi besi
ba top beam no mos monta ona
bekesting balun.

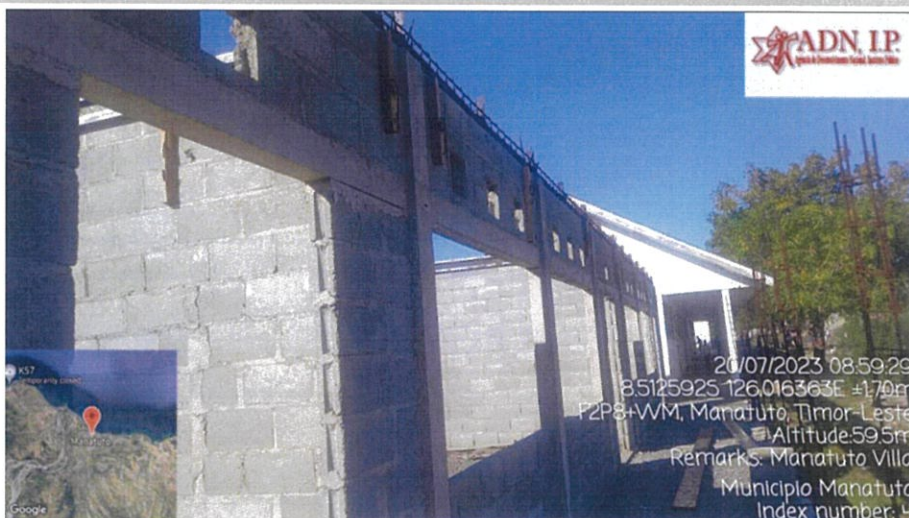

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-17)
SUMMARY

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA CENTRAL VASCO DA GAMA
FATIN PROJEITO : AITEAS, MANATUTO
DONO DO PROJEITO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

NO	ITEM SERVISU	AMOUNT US\$	PROGRESS REPORT BY A D N IP					
			Previous Progress		Progress July		Total to Date	
			Amount (US\$)	%	Amount (US\$)	%	Amount (US\$)	%
i	PRELIMINARIES WORKS	\$ 6.300,00	\$ 2.137,50	1,17%	\$ -	0,00%	\$ 2.137,50	1,17%
ii	CLASSROOM BUILDING C	\$ 49.620,84	\$ 7.374,66	4,04%	\$ 1.370,03	0,75%	\$ 8.744,69	4,79%
iii	TEACHER OFFICE	\$ 67.466,67	\$ 9.090,75	4,98%	\$ -	0,00%	\$ 9.090,75	4,98%
iv	TOILET BUILDING Tb	\$ 17.325,64	\$ 910,39	0,50%	\$ -	0,00%	\$ 910,39	0,50%
v	SITEWORKS	\$ 15.136,11	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 155.849,26	\$ 19.513,31	10,68%	\$ 1.370,03	0,75%	\$ 20.883,33	11,43%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 15.584,93	\$ 1.951,33	1,07%	\$ 137,00	0,07%	\$ 2.088,33	1,14%
C	OVERHEAD	\$ 3.100,00	\$ 775,00	0,42%	\$ -	0,00%	\$ 775,00	0,42%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 3.490,68	\$ 444,79	0,24%	\$ 30,14	0,02%	\$ 474,93	0,26%
E	CONTIGENCY	\$ 4.679,68	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
F	TOTAL COST (A + B + C + D + E)	\$ 182.701,57	\$ 22.684,43	12,42%	\$ 1.537,17	0,84%	\$ 24.221,60	13,26%

Prepara Husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)

Eng. ba Projecto Edificio Publico no Agua Saneamento
Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Engenheiro Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia)
Kordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Kualidade ADN, I.P

#ANEXU C1 (MV-18)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0+000-3+000 KM,
Manatuto Municipality.

No. kontratu : RT/094/MOP-2021

Data Inspesaun : 10 / 07 /2023

Fatin Inspesaun : Rembor-Manatuto Villa


Koordinadas : Start Point : Long : 125.973927°, Latetude : -8.541559°
End Point : Long : 125.963384°, Latetude : -8.549488°

Naran Inspector : 1. Eng. Jose Roberto C. Gusmao
2. Eng. Domingos da C. X. Silva

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
-----------------------	---------------------------------------


Sketch Item Servisu

Compania continua servisu item stone Masonry
Retaining wall, ho medida: 250 m

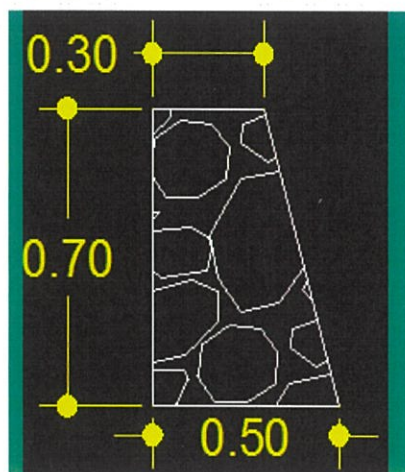

Area: 0.28 m²

Volume: 0.28×250
70 m³

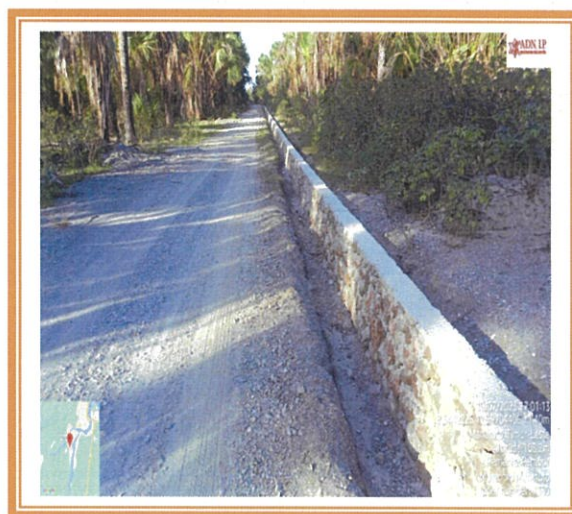



#ANEXU C2 (MV - 18)

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0 + 000 - 3 + 000 KM, Manatuto Municipality.
No. kontratu : RT/094/MOP-2021
Postu : Manatuto Villa
Sukos : Iliheu
Naran Kompania : Kartini Unip, Lda.

SUMMARY								
SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERECENT PREVIOUS	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)		BILLING		MONTH		
R-01	General	\$ 5,800.00	\$ 1,150.00	0.29%	\$ -	0.00%	\$ 1,150.00	0.29%
R-05	Earth work	\$ 25,228.71	\$ 3,430.30	0.87%	\$ -	0.00%	\$ 3,430.30	0.87%
R-07	Sub-base, Base and Pavement	\$ 19,677.48	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Bituminous pavement	\$ 92,905.20	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-10	Structures	\$ 179,017.78	\$ 51,952.67	13.18%	\$ 4,463.20	1.13%	\$ 56,415.87	14.31%
R-11	Dayworks	\$ 175.00	\$ 175.00	0.04%	\$ -	0.00%	\$ 175.00	0.04%
R-15	Routine maintenance	\$ 6,992.32	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 329,996.49	\$ 56,707.97	14.39%	\$ 4,463.20	1.13%	\$ 61,171.17	15.52%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 32,999.65	\$ 5,670.80	1.44%	\$ 446.32	0.11%	\$ 6,117.12	1.55%
C	Generals item	\$ 23,472.23	\$ 9,816.75	2.49%	\$ 487.50	0.12%	\$ 10,304.25	2.61%
D	Tax 2 % x (A+B+C)	\$ 7,729.37	\$ 1,443.91	0.37%	\$ 107.94	0.03%	\$ 1,551.85	0.39%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 394,197.73	\$ 73,639.43	18.68%	\$ 5,504.96	1.40%	\$ 79,144.39	20.08%

Inspeksaun Husi:

1. Jose R. Carlos Gusmao
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irrigação
Munisipiu Matatuto, ADN.I.P.

2. Domingos da C. X. Silva
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irrigação
Munisipiu Matatuto, ADN.I.P.

Verifika Husi :

Eng. Remigio da C. S. Dos Santos
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P.

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN.I.P.



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-20)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Office Building Of Ministry Of State
Administration In Manatuto Municipality
No. kontratu : ICB/032/MAE - 2022

Data Inspesaun : 13 Jullu 2023

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.50940167S,

Latetude : 126,01381922E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Progressu servisu iha fulan ida
ne'e:

Kompanhia finaliza ona servisu
servisu escavasaun no mos halo
pemadatan (compaction) ba iha
fatin atu monta fondasi ninian, no
ekipa laboratorio mos halo ona
teste sand cone iha fatin refere.





#ANEXU C1 (MV-20)

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Of Office Building Of Ministry Of State
Administration In Manatuto Municipality

No. kontratu

: ICB/032/MAE - 2022

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Progressu servisu iha fulan ida
ne'e:

Kompanhia mos mobiliza ona
equipamentus pezadus sira no mos
equipamentu batching plant ba iha
terrenu.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Progressu servisu iha fulan ida
ne'e:

Alem de equipamentus pezadus ,
kompanhia mos hahu ona
mobiliza scaffolding balun ba iha
site/terrenu.





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-20)

MAIN SUMMARY

TÍTULO DO PROJETO : New Construction Of Office Building Of Ministry Of State Administration In Manatuto Municipality
FATIN PROJETO : Manatuto Villa
DONO DO PROJETO : Ministério da Administração Estatal

NO	DESIGNATION	AMOUNT US\$	%	PROGRESS REPORT BY ADN IP					
				Previous Progress		Progress JuLy		Total to Date	
				Amount (US\$)	%	Amount (US\$)	%	Amount (US\$)	%
I	ARCHITECTURE	\$ 2.587.998,17	48,78%	\$ -	0,00%	\$ 95.436,95	1,80%	\$ 95.436,95	1,80%
II	STRUCTURAL WORKS	\$ 1.252.420,86	23,61%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
III	HIDRAULIC INSTALLATION	\$ 151.850,87	2,86%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
IV	GAS INSTALLATION	\$ 5.293,45	0,10%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
V	ELECTRICAL INSTALLATION	\$ 354.569,04	6,68%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
VI	ELEVADORES	\$ 83.702,88	1,58%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
VII	ELECTROMECHANICAL INSTALLATIONS	\$ 766.550,43	14,45%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 5.202.385,70	98,05%	\$ -	0,00%	\$ 95.436,95	1,80%	\$ 95.436,95	1,80%
VIII	OVERHEAD	\$ 103.250,00	1,95%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
B	GRAND TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	\$ 5.305.632,72	100,00%	\$ -	0,00%	\$ 95.436,95	1,80%	\$ 95.436,95	1,80%

Prepara Husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)

Eng. ba Projecto Edificio Publico no Agua Saneamento
Município Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Engenheiro Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia)
Kordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de
Kualidade ADN, I.P



#ANEXU C1 (LAC - 6)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000

No. kontratu : MPW-W-210056

Data Inspesaun : 07/07/2023

Fatin Inspesaun : Laclubar

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.747020°, Latetude : 125.915538°

End Point : Long : -8.750884°, Latetude : 125.904335°

Naran Inspector : 1. Jose R. Carlos Gusmao

2. Domingos da C. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Projetu Kontinua paradu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-8)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara
No. kontratu :

Data Inspesaun : 05 Julho 2023

Fatin Inspesaun : Batara, Laclubar

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.7762S,

Latetude : 125,9238E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Progressu servisu iha fulan ida
ne'e: Ba Classroom Building
agora dadauk fizikamente husi
konstrusaun finalize ona , maibe
sei iha defeitus balun ne'ebe
detekta no sei halo reparasaun iha
tempo badak.





#ANEXU C1 (LAC-8)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Progressu servisu iha fulan ida
ne'e: Ba Toilet Building nian
agora dadaun fizikamente
kompleta ona , maibe hanesan
mos classroom nian, sei iha
defeitus balun ne'ebe presija
hadia.



 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO IX GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN IP Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (LAC-8) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara												
Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO BATARA												
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura				
I	05/07/2023	Laclubar	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Husu ba enginheiru grupo atu komfirma fila fali konaba variasaun relasiona ho keramik parte varanda ninian ne'ebe troka ona.						
					2	Iha parte finishing (tinta) atu bele tinta tan parte ne'ebe sei malahuk (ladun mo'os).						



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (LAC-8)

TÍTULO DO PROJECTO : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA EBF BATARA

FATIN PROJEITO : BATARA, MANATUTO

DONO DO PROJEITO : MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY		ORIGINAL CONTRACT		REPORT PROGRESS BY ADN IP					
NO.	WORK DESCRIPTION	AMOUNT US\$	WEIGHT (%)	Previous Progress		Progress July		Up to Date	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	\$ 3.575,00	3,50%	\$ 2.195,00	2,15%	\$ 1.380,00	1,35%	\$ 3.575,00	3,50%
II	DEMOLITION	\$ 300,00	0,29%	\$ 300,00	0,29%	\$ -	0,00%	\$ 300,00	0,29%
III	CLASSROOM BUILDING	\$ 50.717,94	49,69%	\$ 48.612,63	47,63%	\$ 1.686,48	1,65%	\$ 50.299,11	49,28%
IV	TOILET BUILDING	\$ 25.427,93	24,91%	\$ 22.032,11	21,59%	\$ 3.341,72	3,27%	\$ 25.373,83	24,86%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	\$ 12.700,12	12,44%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 92.720,99	90,85%	\$ 73.139,74	71,66%	\$ 6.408,20	6,28%	\$ 79.547,94	77,94%
B	CONTIGENCY	\$ 3.000,00	2,94%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD	\$ 6.340,00	6,21%	\$ 6.340,00	6,21%	\$ 8.012,31	7,85%	\$ 14.352,31	14,06%
D	GRAND TOTAL	\$ 102.060,99	100,00%	\$ 79.479,74	77,87%	\$ 14.420,51	14,13%	\$ 93.900,26	92,00%

Prepara Husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico no Agua
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



#ANEXU C1 (LAC - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of the Rural Road Natarbora – Pualaka(Mina Rai),
Chainage 0+000-2+000 (2 Km) Manatuto Municipality**
No. kontratu : **RT / 103 / MOP - 2022**

Data Inspesaun : **3/08/2023**

Fatin Inspesaun : Laclubar

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.861680°S

Latetude : 125.953162°E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : **Domingos da C. X. Silva**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Compania hahu servisu loke estrada foun
finaliza ona ho distansia 0+000 – 2 + 000, no
kompania sei kontinua servisu fila fali ba
item stone masonry, item line draine, item
gravel iha tempo tuir.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 (LAC - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of the Rural Road Natarbora – Pualaka(Mina Rai),
Chainage 0+000-2+000 (2 Km) Manatuto Municipality**

No. kontratu : **RT / 103 / MOP - 2022**

Compania hahu servisu loke estrada foun
finaliza ona ho distansia 0+000 – 2 + 000, no
kompania sei kontinua servisu seluk ba item
stone masonry, item line draine, item gravel
iha tempo tuir.



Compania hahu servisu loke estrada foun
finaliza ona ho distansia 0+000 – 2 + 000, no
kompania sei kontinua servisu seluk ba item
stone masonry, item line draine, item gravel
iha tempo tuir.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 (LAC - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of the Rural Road Natarbora – Pualaka(Mina Rai),
Chainage 0+000-2+000 (2 Km) Manatuto Municipality**

No. kontratu : **RT / 103 / MOP - 2022**

Sketch Item servisu

Compania hahu servisu loke estrada foun
finaliza ona ho distansia 0+000 – 2 + 000, no
kompania sei kontinua servisu seluk ba item
stone masonry, item line draine, item gravel
iha tempo tuir.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C2 (BA - 11)

Road name : Natarbora-Pualaka (Mina Rai)
Municipality : Manatuto
Postu : Laclubar
Sukos : Orlalan

Package no : 1
Chainage start 0 + 000
Chainage end 2 + 000
Length 2 . 0 km

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 4,040.00	\$ -	0.00%	\$ 2,225.00	0.51%	\$ 2,225.00	0.51%
R-03	Earth work	\$ 102,454.75	\$ -	0.00%	\$ 83,353.40	19.06%	\$ 83,353.40	19.06%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 26,297.94	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structures	\$ 225,380.33	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-10	Dayworks	\$ 350.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine Maintenance	\$ 2,377.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional Sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 361,100.02	\$ -	0.00%	\$ 85,578.40	19.57%	\$ 85,578.40	19.57%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 36,110.00	\$ -	0.00%	\$ 8,557.84	1.96%	\$ 8,557.84	1.96%
C	General Item	\$ 31,568.20	\$ -	0.00%	\$ 7,540.00	1.72%	\$ 7,540.00	1.72%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 8,575.56	\$ -	0.00%	\$ 2,033.52	0.46%	\$ 2,033.52	0.46%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 437,353.79	\$ -	0.00%	\$ 103,709.76	23.71%	\$ 103,709.76	23.71%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Domingos DX. Silva)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

2. (Eng. José R Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da c.s dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



#ANEXU C1 (SO -3)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada
Chainage 0+000-2+000

No. kontratu : MPW-W-210059

Data Inspesaun : 11/07/2023

Fatin Inspesaun : Soibada, Buah Rahun

Koordinadas :

Start Point : Long : 8,83990S Latetude: 125,9171E

End Point : Long : 8,82990S Latetude: 125,9223E

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmao


2. Eng. Domingos da C. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Compania continua servisu item stone
masonry retainingwall ho total naruk 40 m

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

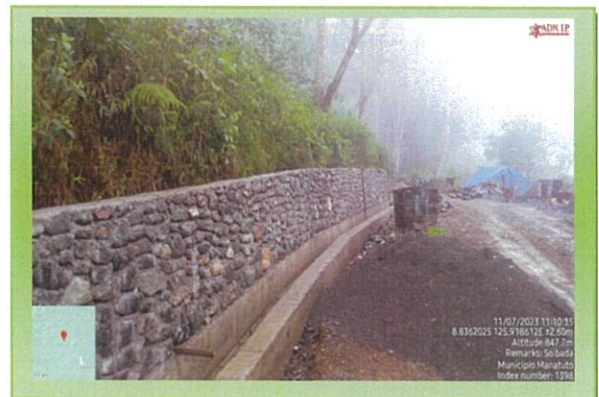



#ANEXU C2 (SO - 3)

Road Name : Manlala(Manufahi Kiik) - Soibada Chainage start 0 + 000
Municipality : Manatuto Chainage end 2+000
Postu : Soibada Length 2.0 Km
Sukos : Manufahi Kiik

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 2,990.00	\$ 2,970.00	1.46%	\$ -	0.00%	\$ 2,970.00	1.46%
R-03	Earth work	\$ 11,037.21	\$ 12,532.73	6.17%	\$ -	0.00%	\$ 12,532.73	6.17%
R-05	Sub-base, Base and Pavament	\$ 13,353.74	\$ 12,473.94	6.14%	\$ -	0.00%	\$ 12,473.94	6.14%
R-08	Structures	\$ 121,257.00	\$ 61,984.95	30.53%	\$ 1,400.55	0.69%	\$ 63,385.50	31.22%
R-10	Dayworks	\$ 1,750.00	\$ 175.00	0.09%	\$ -	0.00%	\$ 175.00	0.09%
R-11	Routine maintenance	\$ 4,205.00	\$ 4,205.00	2.07%	\$ -	0.00%	\$ 4,205.00	2.07%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ 200.00	0.10%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.10%
A	Construction Cost	\$ 154,792.95	\$ 94,541.62	46.56%	\$ 1,400.55	0.7%	\$ 95,942.17	47.3%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 15,479.29	\$ 9,454.16	4.66%	\$ 140.06	0.07%	\$ 9,594.22	4.73%
C	General Item	\$ 28,783.23	\$ 22,521.00	11.09%	\$ 90.00	0.04%	\$ 22,611.00	11.14%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 3,981.11	\$ 2,530.34	1.25%	\$ 32.61	0.02%	\$ 2,562.95	1.26%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 203,036.57	\$ 129,047.12	63.56%	\$ 1,663.22	0.82%	\$ 130,710.33	64.38%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Jose R. Carlos Gusmao)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P


2. (Eng. Domingos da C. X. Silva)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C.S. dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P

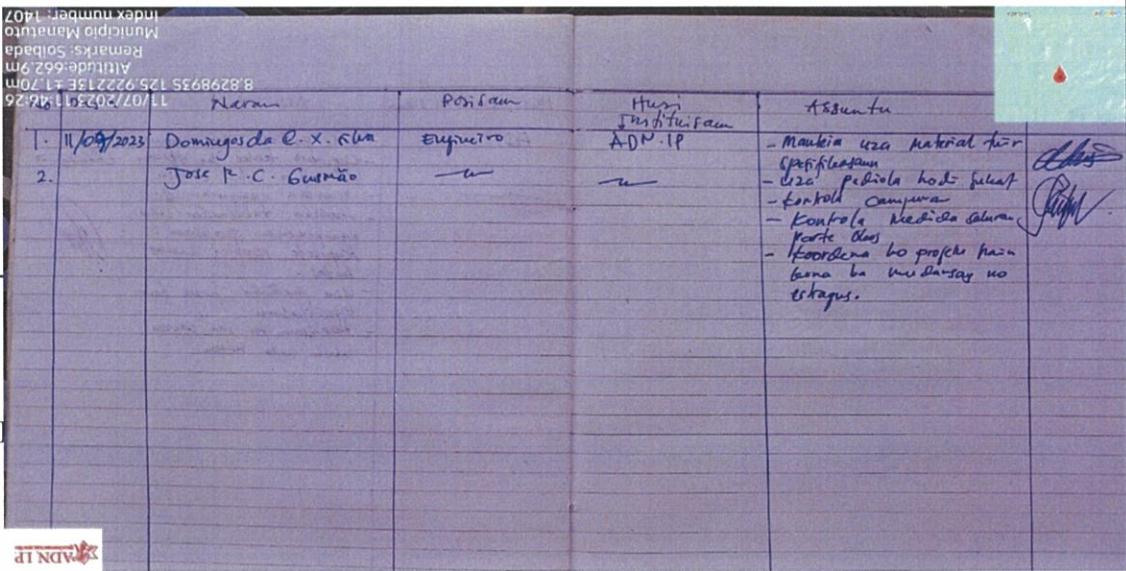 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO IX GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN IP Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público						#ANEXU D (SO - 3)	
						INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
						Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000 Kompanha : Manufahi Kiik Unip. Lda	
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	7/11/2023	Manatuto/ Soibada	Jose R. Carlos Gusmao	Eng. Ba Projetu ITI Munispiu Manatuto, AND.I.P	1		 
II	7/11/2023	Manatuto/ Soibada	Domingos D.X Silva	Eng. Ba Projetu ITI Munispiu Manatuto, AND.I.P	2		



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Ensinnu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada,
Manatuto

No. kontratu :

Data Inspesaun : 11 Jullu 2023

Fatin Inspesaun : Manlala, Soibada

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.8602S,

Latetude : 125,9393E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu iha fulan ida ne'e:
Ba mudansa fiziku iha terrenu ba
konstrusaun ida ne sei nafatin
hanesan ho fulan kotuk tamba
kompanhia sei ba halao compras
material iha Dili ba material
finishing ninian, maibe hetan
difikuldade atu lori mai iha fatin
projetu tamba tempu udan.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-5)
Back-up Data

Naran Projeto

: Rehabilitasaun Ensину Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada,
Manatuto

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Weaihudik
No. kontratu :

Data Inspesaun : 11 Jullu 2023

Fatin Inspesaun : Weaihudik

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.8515S,

Latetude : 125,9308E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Progresso fiziku iha fulan ida
ne'e: Iha parte classroom ninian
grupo finaliza ona servisu
plesteran no agora dadaun
kontinua hela ho nahe keramik
ba classroom laran no mos cor
beton iha parte varanda ninian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-6)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Weaihudik

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item



11/07/2023 12:22:43
8.851645S 125.930883E +2.50m
Altitude: 848.1m
Remarks: Solbada
Município Manatuto
Index number: 1410

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Progresso fiziku iha fulan ida
ne'e: Ba parte konstrusaun
Toilet building ninian finalize
ona serbisu monta kakuluk
ninian, no agora dadaun komesa
ona ho plesteran ba parte laran
no mos liur.



11/07/2023 12:29:16
8.851465S 125.930990E +1.70m
Altitude: 831.8m
Remarks: Solbada
Município Manatuto
Index number: 1419

 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO EX GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN IP Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (SO-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik								
Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO WEAIHUDIK								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	11/07/2023	Manatuto/Soibada	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Aselera servisu sira ne'ebe sei falta		
					2	Parte haris fatin , liu-liu monta parte sintina nian, husu atu enginheiru bele akompanha.		
					3	Husu enginheiru atu stand by iha terrenu wainhira servisu lao.		
					4	koordena ho enginheiru MEJD karik atu hola sasan / ka iha mudansa ruma.		
					5	hodi hein sasan ne'ebe sei ba kompras , bele ona kontinua servisu item sira seluk.		



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (SO-6) SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik
Lokalidade : Manufahi Ki'ik, Posto Administrativo Soibada
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY				ORIGINAL CONTRACT	PROGRESS REPORT BY ADN IP					
No	MAIN SUMMARY	Page No		Amount	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS JULY		TOTAL TO DATE	
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3.075,00	\$ 2.275,00	2,22%	\$ -	0,00%	\$ 2.275,00	2,22%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	\$ 51.164,59	\$ 36.453,06	35,56%	\$ 4.408,04	4,30%	\$ 40.861,10	39,86%
III	TOILET BULDING Tb	TB/39	(i)	\$ 25.091,96	\$ 10.046,18	9,80%	\$ 4.312,62	4,21%	\$ 14.358,81	14,01%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/24	(i)	\$ 13.840,76						
A	CONSTRUCTION COST			\$ 93.172,31	\$ 48.774,24	47,58%	\$ 8.720,66	8,51%	\$ 57.494,90	56,09%
B	CONTIGENCIA			\$ 3.000,00						
C	OVERHEAD			\$ 6.340,00	\$ 3.355,00	3,27%	\$ -	0,00%	\$ 3.355,00	3,27%
D	GRAND TOTAL			\$ 102.512,31	\$ 52.129,24	50,85%	\$ 8.720,66	8,51%	\$ 60.849,90	59,36%

Prepara husi :


(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :


(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :


(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



**MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO**
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon
Chainage 3+000-6+200

No. kontratu : MPW-W-210062

Data Inspesaun : 19/07/ 2023

Fatin Inspesaun : Barique

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.996644°, Latetude : 126.084961°

End Point : Long : -8.977311°, Latetude : 126.102659°

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmao

2. Eng. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu ;

Servisu fisiku iha terene remata ona 100%

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (BA-8)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center
Chainage 0+000 - 3+000

No. kontratu : MPW-W-210061

Data Inspesaun : 19/ 07/ 2023

Fatin Inspesaun : Natarbora - Uma Boco- Aubeon

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.996666°, Latetude : 126.084966°


End Point : Long : -9.004681°, Latetude : 126.061377°

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmao

2. Eng. Domingos da C. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketsa item servisu;
Compania continua servisu parte item
Subbase course.

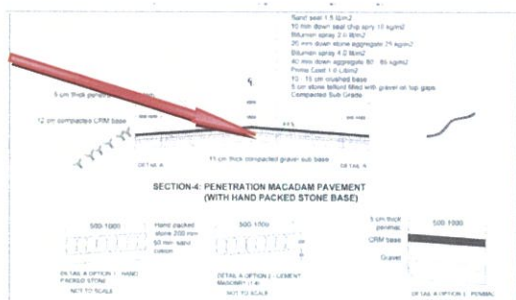

Volume : 240 m3

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (BA -8)

Naran Projeto : RD4 RURAL ROAD ROUTINE MAINTENANCE
No. kontratu : MPW-W-210055
Postu : Natarbora
Suku : Aubeon
Naran Kompanhia : Linoel Unip, Lda

SUMMARY								
SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
		(US\$)	PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 2,440.90	\$ 950.00	0.32%	\$ -	0.00%	\$ 950.00	0.32%
R-05	Earth work	\$ 23,170.60	\$ 22,424.16	7.57%	\$ -	0.00%	\$ 22,424.16	7.57%
R-07	Sub-base, Base and Pavement	\$ 56,064.54	\$ 7,563.60	2.55%	\$ 5,042.40	1.70%	\$ 12,606.00	4.26%
R-08	Bituminous pavement	\$ 134,733.55	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-10	Structures	\$ 16,458.42	\$ 13,009.33	4.39%	\$ -	0.00%	\$ 13,009.33	4.39%
R-11	Dayworks	\$ 182.00	\$ 182.00	0.06%	\$ -	0.00%	\$ 182.00	0.06%
R-15	Routine maintenance	\$ 5,357.00	\$ 4,057.00	1.37%	\$ -	0.00%	\$ 4,057.00	1.37%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ 200.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.07%
A	Construction Cost	\$ 238,607.02	\$ 48,386.08	16.33%	\$ 5,042.40	1.70%	\$ 53,428.48	18.04%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 23,860.70	\$ 4,838.61	1.63%	\$ 504.24	0.17%	\$ 5,342.85	1.80%
C	Generals item	\$ 27,936.02	\$ 16,354.50	5.52%	\$ 595.00	0.20%	\$ 16,949.50	5.72%
D	Tax 2 % x (A+B+C)	\$ 5,808.07	\$ 1,391.58	0.47%	\$ 122.83	0.04%	\$ 1,514.42	0.51%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 296,211.81	\$ 70,970.78	24.26%	\$ 6,264.47	2.11%	\$ 77,235.25	26.37%

Inspektor Husi:

1. Jose R. Carlos Gusmao
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

2. Domingos D.X. Silva

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi:

Eng. Remigio da c.s dos Santos
Eng. Senior ba Projecto Insfrasturctura e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika husi:

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN.I.P



#ANEXU C1 (BA - 9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage
0+000-9+000
No. kontratu : MPW-W-210058
Data Inspesaun : 11/07/2023
Fatin Inspeksaun : Barique, Kaen laran
Koordinadas : Start Point : Long : -8.839898°, Latetude : 126.004266°
End Point : Long : -8.853010°, Latetude : 126.061603°
Naran Inspector : 1. Jose R. Carlos Gusmao
2. Domingos da C. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item :

Compania remata ona servisu fisiku iha
terenu 100%

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 (LA - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Roads Maintenance - Lacle, Manatuto Municipality
No. kontratu : MPW-W-190251

Data Inspesaun : 20/ 07/ 2023

Fatin Inspesaun : Manatuto / Lacle

Koordinadas :

Start Point : Long : 125'91524541, Latetude : -8.55757187

End Point : Long : 125'91384094, Latetude : -8.55721745



Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmao

2. Eng. Domingos da C. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Laiha sketch servisu. Projetu kontinua paradu tamba Compania iha problema ho dokumentus, nune mos parte Dono do projetu mos halo ona inspecaun atu prosesu ba oin.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

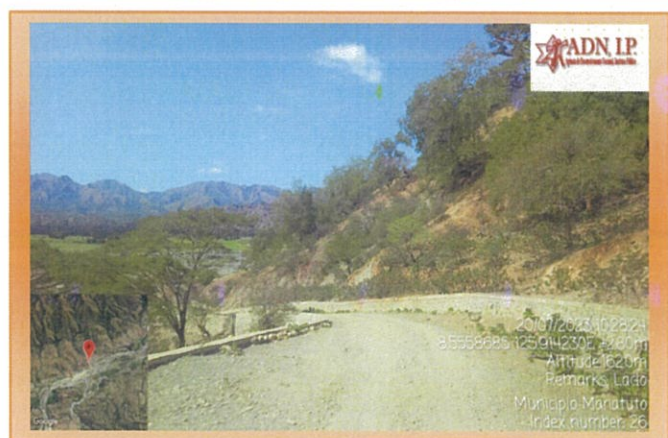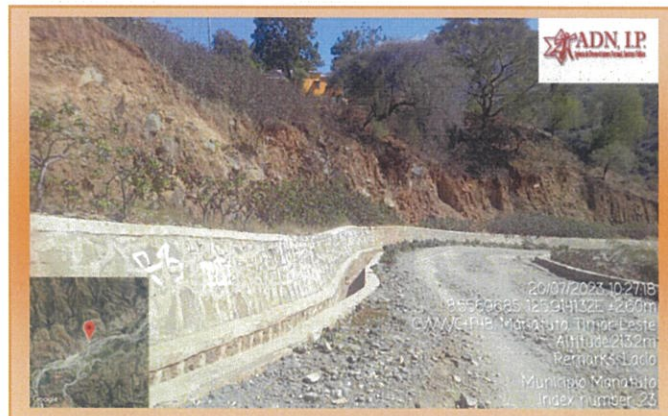



#ANEXU C1 (LA - 5)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Rehabilitation of "Municipal Roads", Lacleo to Lacleo Town Sta.
0+000 to 18+500, Lot 1; Section 1 (Manatuto-Lacleo 13.672 km)

No. kontratu : ICB/086/MOP/-2022

Data Inspesaun : 20/ 07/ 2023

Fatin Inspesaun : Manatuto / Lacleo

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°9'1524541, Latetude : -8.55757187

End Point : Long : 125°9'1384094, Latetude : -8.55721745

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmao


2. Eng. Domingos da C. X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item :

Compania hahu ona servisu Clearing and
Grubbing iha terenu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

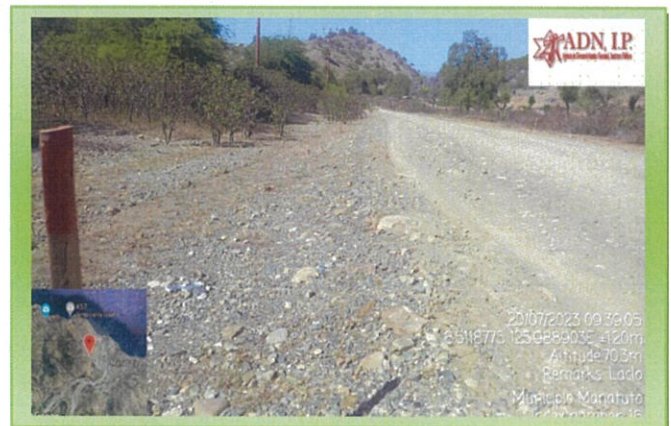



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun
No. kontratu :

Data Inspesaun : 27 Julho 2023

Fatin Inspesaun : Remanarun-Laclo

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.62940038 S

Latetude : 125.78705982 E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Quico Adelino Junior

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Progressu ba refere iha
fulan ida ne'e:

Ba parte classroom
ninian , kuaze finaliza
servisu finishing nian no
mos servisu electrical
ninian.





MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN IP

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Iha parte Toilet Building
ninian, grupo mobiliza
ona sasan lubuk ida mai
iha terrenu ,ne'ebe mak
sei uja ba iha
konstrusaun toilet
building nian

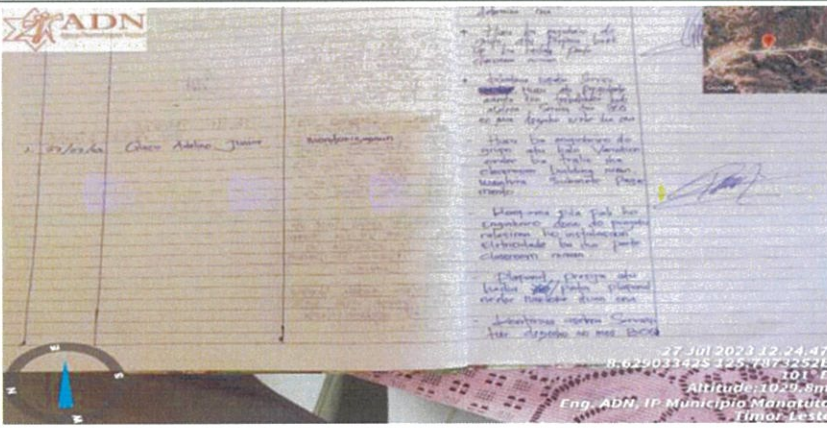

 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO EX GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN IP Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (LA-7) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
					Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun			
					Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO EBC Remanarun			
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	27/07/2023	Manatuto/Laclo	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Husu ba engenheiro do grupo atu halo variation order ba tralis/ railing iha classroom building nian , wainhira submete pagamento.		
					2	Komfirma fila fali ho engenheiro dono do projeto relaciona ho instalasaun eletricidade baa iha parte classroom ninian.		
					3	Plafond presija atu hadia / pinta plafond ne'ebe nakloke ituan ona.		
					4	Kontinua aselera servisu tuir dezenho no mos BOQ.		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



#ANEXU C2 (LA-7)

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun
Lokalidade : Suco Hatuermera, Posto Administrativo Lacle
Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY					PROGRESS REPORT BY ADN IP					
No	MAIN SUMMARY	Page No		Amount	PROGRESS PREVIOUS		PROGRESS JULY		TOTAL TO DATE	
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3.075,00	\$ 1.860,00	1,90%	\$ -	0,00%	\$ 1.860,00	1,90%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	\$ 49.095,82	\$ 38.300,92	39,02%	\$ 7.357,75	7,50%	\$ 45.658,66	46,52%
III	TOILET BULDING Tb	TB/39	(i)	\$ 24.387,69	\$ 7.762,43	7,91%	\$ -	0,00%	\$ 7.762,43	7,91%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/24	(i)	\$ 12.248,77	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST			\$ 88.807,27	\$ 47.923,35	48,83%	\$ 7.357,75	7,50%	\$ 55.281,09	56,32%
B	CONTIGENCIA			\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD			\$ 6.340,00	\$ 3.255,00	3,32%	\$ -	0,00%	\$ 3.255,00	3,32%
D	GRAND TOTAL			\$ 98.147,27	\$ 51.178,35	52,14%	\$ 7.357,75	7,50%	\$ 58.536,09	59,64%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projeto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Quico Adelino Junior							2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		Action	Julho																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	3		Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</



Naran Eng.		Quico Adelino Junior						2023																															
Município		MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Julho																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															On Going	
							Actual																																
	17	Konstrusaun EBC Vasco da Gama - Manatuto	Parapa Bemizu Stae Unipessoal Lda	-	LM-CD	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															On Going	
							Actual																																
	20	New Construction Of Office Building Of Ministry Of State Administration In Manatuto Municipality	JLC LDA (TIMOR - LESTE)	ICB/032/MAE - 2022	FI	Ministério da Administração Estatal	Plan																															On Going	
							Actual																																
LAL	1	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/II/DILI/2019/E DIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																														On Going		
							Actual																																
	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MEJD PKRIE EP CAIRUI	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														On Going		
							Actual																																
LACLUBAR (LAC)	7	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	Hatuwari Unip. Lda	02/PDD-II/MNTT/II/2015	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																														On Going		
							Actual																																
	8	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MEJD PKRIE EBF BATARA		LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														On Going		
							Actual																																
	9	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM		LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														On Going		
							Actual																																
	10	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	Mercy Unipessoal Lda.		PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																														On Going		
							Actual																																



Naran Eng.		Quico Adelino Junior						2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Município	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Julho																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SOIBADA (SO)	5	Projetu Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

Eng. Quico Adelino Junior
(Eng. Projeto Edificio Publico, Agua e Saneamento Municipiu Manatuto, ADN.I.P.)

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
(Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN.I.P.)

Aprova Husi :

Eng. Januario Maia Guterres
(Adjunto Director Executivo, ADN.I.P.)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPEAUN																																	
Naran Eng.	Adonis Julio Fernandes							2023																																	
Município	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																								
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JULHO																															OBS		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
MANATUTO VILA (MV)	1	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MEJD PKRIE EBF BATARA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																		
	2	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																		
	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																		
	4	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																		
	5	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MEJD PKRIE EBF RENTAU	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																		
	6	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																		
	7	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MEJD PKRIE EBF OBRATO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																		
	8	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipessoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																		
	9	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	Baboe Unip Lda	019/Janeiro/2020	LM-BS	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																																		
							Actual																																		
	10	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM- I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																		
							Actual																																		
	11	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM- I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																		
							Actual																																		
	12	Costrusaun Fatin Isolamento Iha Municipio Manatuto	Talamori Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	LM	SAUDE	Plan																																		
							Actual																																		
	13	Supplay and installation Main Power for Isolation and Laboratorium Building Maabat Manatuto	Fraternity Unip.Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-229	LM	MINISTERIO DA SAUDE	Plan																																		
							Actual																																		
	14	Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto	Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda	-	LM-CD	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																		
1	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MEJD PKRIE EP CAIRUI	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
						Actual																																			
2	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/ VII/DILI/2019/EDIFI CIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																			
						Actual																																			
1	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	Tasibala III Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000412	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
						Actual																																			
2	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laclubar	MERCY, Unipessoal Lda	04/PDIM I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																			
						Actual																																			
3	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	Hatuwari Unip. Lda	02/PDD- II/MNTT/VII/2015	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																			
						Actual																																			



[illegible]

Note:

11/11/2019



11

Prepara Husi :

(Adonis Julio Fernandes)
Eng. Electricidade, ADN, I.P

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi:

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo, ADN, I.P

[illegible]

Naran Eng.	Jose R. C. Gusmao
------------	-------------------

Municipio

Manatuto

2023

[illegible]

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Proyeto Infrastuktura Transporte e Ingrassaun Mananisu Manatulo, ADN I.P.



(Eng. Jooz R. C. Gusmao)

Eng. ba Projeto Infraestrutura Transporte e Ingrassaun Mananisu Manatulo, ADN I.P.

Sertificação HUSI : 

(Eng. Emerenciana de Sousa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controle e Validação de Qualidade, ADN-IP



Aprova Hus

(Eng. Januario Maia Guimaraes)
Adjunto Director Ejecutivo, AONLP



Note:	Plano Periode inspesaun iha tereinu	Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu	Relatoriu avaliasun mensal iha Dili	Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu
-------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------

Aprova Hum

(Eng. Januario Maia Capoteves)
Adjunto Director Ejecutivo ADNLP
