



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL **IMPLEMENTASAUN PROJETUS** **MUNISÍPIU MANATUTO**

MARSU 2023



SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO MANATUTO


MARSU 2023

Prepara Husi :



(Eng. Quico Adelino Junior)

Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P



(Eng. Jose R. Carlos Gusmão)

Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P



(Eng. Adonis Julio Fernandes)

Eng. ba Projeito ME, ADN, I.P



(Eng. Domingos da Costa e Silva)

Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :



(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)

**Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu, ADN, I.P**



(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)

**Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e
Irigasaun, ADN, I.P**



(Eng. Deolindo de F. Marques)

Chefe Seksaun ba Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)


**Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P**

Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)

Director Executivo, ADN, I.P



INDICE

SUMÁRIO.....	1
INDICE	3
I. INTRODUSAUN.....	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Manatuto.....	3
1.3. Lista Projectos.....	7
II. PROGRESU FISIKU.....	25
2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan.....	25
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	26
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	26
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	27
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	27

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto.....	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto	6
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamentos	7
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Manatuto Por Sectores.....	11
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Manatuto Por Ministerio.....	18
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto	25

I . INTRODUSAUN.

1.1.Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefisiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria

1.2. Perfil Municipio Manatuto



Mapa 2 hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Manatuto iha luan 1,706 km² ho populasaun nain 42,742 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Manatutoiha Postos Administrativos nen (6), Sukus 29 no aldeias 99 , mak hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.

Natarbora		Laclo		Laklubar		Laleia	
Sukus	Aldeia	Sukus	Aldei	Suku	Aldeia	Sukus	Aldeias
Aubeon	2	Hohorai	4	Batara	4	Cairui	7
Barique	2	Locomesak	5	Hatu ma quere k	3	Hatulara n	3
Fatuwaque	2	Uma kaduak	3	Funar	4	Lifau	3
Manehat	3	Uma naruk	4	Mane lima	6		
Uma Boco	2			-	8		
				Sanan a Na'i	4		
Total	11		18		30		13

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 69

Manatuto		Soibada	
sukus	Aldeia	sukus	aldeias
Ailili	2	Fatuma querek	2
Aitekas	4	Leo-hat	2
Cribas	5	Manlala	2
Iliheu	5	Maun Fahe	2
Ma'abat	2	Somoro	2
Sau	2		
	22		10

Tabela 1.1: Força de Trabalho ADN, I.P Município Manatuto

Força de Trabalho ADN,I.P Município Manututu								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	3	3	3			3	
2	Administrasau n no Financas	0	0	0			0	
3	Motorista	1	1	1			1	
4	Seguransa	0	0	0			0	
Total		4					4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto.

ASET ADN,IP MUNICIPIO MANATUTO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	1	1	1				
2	Kareta	1	1	1				
3	Desktop HP / Monitor	1	1	1				
4	Laptop HP	1	1	1				
5	Printer Cannon	1	1	1				
6	UPS	1	1	1				Aát ona
7	Armario File	2	2	2				
8	Armario Tau hena	3	3	3				
9	Meja escritorio	1	1	1				
10	Meja han	1	1	1				
11	Meja TV (kiik)	1	1	1				
12	Kadeira escritorio	6	6	6				
13	Kadeira han	4	4	4				
14	Sofa	1 Set	1 Set	1 Set				
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3	3 Set	3 Set	3 Set				
16	Jeleira	1	1	1				Aát ona
17	Water Dispenser	1	1	1				
18	TV + Parabola	1 Set	1 Set	1 Set				
19	AC	4	4	4				1 aát ona
20	Kipas Angin	4	4	4				
21	Kompur Listrik	1	1	1				Aát ona

22	Kompor Gas	1	1	1				Aát ona
23	Rack sepatu	3	3	3				
24	Rack Piring	1	1	1				
25	Lampu	11	11	11				
26	Water Pump Sanyo	1	1	1				

1.3 : Lista Projectos

Projetu hotu ne'ebe akumulá iha lista ne'e bazeia ba dadus projetu ne'ebe sei lao hela no mos projeto ne'ebe abandona ona tinan barak, projeto hirak ne'e fahe tuir lista 1.3.1 Projeto Por Fundus Finansiamientos, 1.3.2 Projeto Por Sectors no 1.3.3 Projeto Por Ministerios.

1.3.1 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamientos

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	TOTAL FI+Fundu Covid-19+LM-BS+LM-CD+LM-TP+PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	Barique	10	\$ 2.398.501,20	42,62%
2	Laclo	9	\$ 49.837.529,51	87,47%
3	Laclubar	10	\$ 36.823.796,83	86,10%
4	Laleia	2	\$ 392.472,03	12,03%
5	Manatuto Villa	18	\$ 42.264.184,24	79,49%
6	Soibada	5	\$ 4.286.667,82	85,46%
	Grand Total	54	\$ 136.003.151,63	83,55%

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	FI		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0,00%
2	Laclo	3	\$ 48.698.873,04	87,85%
3	Laclubar	2	\$ 35.075.150,37	88,18%
4	Laleia		\$ -	0,00%
5	Manatuto Villa	6	\$ 40.765.491,57	80,74%
6	Soibada	1	\$ 3.553.954,20	93,93%
	Grand Total	12	\$ 128.093.469,18	85,85%

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0,00%
2	Laclo		\$ -	0,00%
3	Laclubar		\$ -	0,00%
4	Laleia		\$ -	0,00%
5	Manatuto Villa	2	\$ 598.668,36	86,09%
6	Soibada		\$ -	0,00%
	Grand Total	2	\$ 598.668,36	86,09%

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	Barique	2	\$ 404.938,08	54,93%
2	Laclo	2	\$ 240.323,02	44,35%
3	Laclubar	2	\$ 675.432,39	40,19%
4	Laleia		\$ -	0,00%
5	Manatuto Villa	1	\$ 29.275,84	15,92%
6	Soibada		\$ -	0,00%
	Grand Total	7	\$ 1.349.969,33	44,82%

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	Barique	7	\$ 1.876.648,24	38,63%
2	Laclo	2	\$ 646.243,79	84,96%
3	Laclubar	2	\$ 661.982,34	55,55%
4	Laleia	2	\$ 305.588,74	8,32%
5	Manatuto Villa	1	\$ 182.701,57	6,14%
6	Soibada	3	\$ 630.201,31	47,08%
	Grand Total	17	\$ 4.303.365,99	45,90%

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0,00%
2	Laclo	1	\$ 98.147,27	23,56%
3	Laclubar	2	\$ 202.223,29	25,59%
4	Laleia	1	\$ 86.883,29	25,06%
5	Manatuto Villa	5	\$ 382.490,63	15,84%
6	Soibada	1	\$ 102.512,31	27,56%
	Grand Total	10	\$ 872.256,79	21,27%

NO	POSTO ADMINISTRATIVU	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	Barique	1	\$ 116.914,88	63,99%
2	Laclo	1	\$ 153.942,39	84,29%
3	Laclubar	2	\$ 209.008,44	41,51%
4	Laleia		\$ -	0,00%
5	Manatuto Villa	2	\$ 305.556,27	28,66%
6	Soibada		\$ -	0,00%
	Grand Total	6	\$ 785.421,98	48,24%

1.3.2 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Sectors

NO	POR SECTOR	TOTAL MUNICIPIO MANATUTO		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN(%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370.511,25	15,83%
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 162.377,94	41,85%
3	COMERCIO	1	\$ 153.942,39	84,29%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	7	\$ 1.168.395,22	54,65%
5	EDUKASAUN	10	\$ 1.054.958,36	18,65%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1.076.003,44	78,57%
7	ESTRADAS	15	\$ 9.109.569,39	61,96%
8	ESTRADAS E PONTES	1	\$ 394.194,73	0,00%
9	FLOOD CONTROL	2	\$ 432.138,16	56,30%
10	IMPRESTIMO	4	\$ 115.112.106,35	86,96%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2.362.976,44	76,00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157.560,52	41,96%
13	PONTES	1	\$ 3.553.954,20	93,93%
14	SAUDE	4	\$ 588.906,97	70,84%
15	TURISMO	2	\$ 305.556,27	28,66%
	Grand Total	54	\$ 136.003.151,63	83,55%

NO	POR SECTOR	Barique		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN(%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370.511,25	15,83%
2	AGUA E SANEAMIENTO	1	\$ 162.377,94	41,85%
3	COMERCIO		\$ -	0,00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 408.460,73	78,09%
5	EDUKASAUN		\$ -	0,00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0,00%
7	ESTRADAS	3	\$ 940.115,74	29,92%
8	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0,00%
9	FLOOD CONTROL	1	\$ 242.560,14	63,68%
10	IMPRESTIMO		\$ -	0,00%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0,00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157.560,52	41,96%
13	PONTES		\$ -	0,00%
14	SAUDE	1	\$ 116.914,88	63,99%
15	TURISMO		\$ -	0,00%
	Grand Total	10	\$ 2.398.501,20	42,62%

NO	POR SECTOR	Laclo		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN(%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0,00%
2	AGUA E SANEAMIENTO		\$ -	0,00%
3	COMERCIO	1	\$ 153.942,39	84,29%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 50.745,00	34,95%
5	EDUKASAUN	1	\$ 98.147,27	23,56%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 380.582,61	72,08%
7	ESTRADAS	3	\$ 649.558,35	84,99%
8	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0,00%
9	FLOOD CONTROL	1	\$ 189.578,02	46,86%
10	IMPRESTIMO	1	\$ 48.314.975,87	87,98%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0,00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
13	PONTES		\$ -	0,00%
14	SAUDE		\$ -	0,00%
15	TURISMO		\$ -	0,00%
	Grand Total	9	\$ 49.837.529,51	87,47%

NO	POR SECTOR	Laclubar		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN(%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0,00%
2	AGUA E SANEAMIENTO		\$ -	0,00%
3	COMERCIO		\$ -	0,00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0,00%
5	EDUKASAUN	2	\$ 202.223,29	25,59%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 695.420,83	82,11%
7	ESTRADAS	3	\$ 1.337.414,73	47,79%
8	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0,00%
9	FLOOD CONTROL		\$ -	0,00%
10	IMPRESTIMO	1	\$ 34.379.729,54	88,30%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0,00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
13	PONTES		\$ -	0,00%
14	SAUDE	2	\$ 209.008,44	41,51%
15	TURISMO		\$ -	0,00%
Grand Total		9	\$ 36.823.796,83	86,10%

NO	POR SECTOR	Laleia		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN(%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0,00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0,00%
3	COMERCIO		\$ -	0,00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 277.330,43	0,00%
5	EDUKASAUN	1	\$ 86.883,29	25,06%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0,00%
7	ESTRADAS	1	\$ 28.258,31	90,00%
8	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0,00%
9	FLOOD CONTROL		\$ -	0,00%
10	IMPRESTIMO		\$ -	0,00%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0,00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
13	PONTES		\$ -	0,00%
14	SAUDE		\$ -	0,00%
15	TURISMO		\$ -	0,00%
	Grand Total	3	\$ 392.472,03	12,03%

NO	POR SECTOR	Manatuto Villa		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN(%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0,00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0,00%
3	COMERCIO		\$ -	0,00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 364.960,55	72,47%
5	EDUKASAUN	5	\$ 565.192,20	12,70%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0,00%
7	ESTRADAS	2	\$ 5.590.919,46	69,52%
8	ESTRADAS E PONTES	1	\$ 394.194,73	0,00%
9	FLOOD CONTROL		\$ -	0,00%
10	IMPRESTIMO	2	\$ 32.417.400,94	84,01%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2.362.976,44	76,00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
13	PONTES		\$ -	0,00%
14	SAUDE	1	\$ 262.983,65	97,19%
15	TURISMO	2	\$ 305.556,27	28,66%
	Grand Total	17	\$ 42.264.184,24	79,49%

NO	POR SECTOR	Soibada		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN(%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0,00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0,00%
3	COMERCIO		\$ -	0,00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 66.898,51	55,80%
5	EDUKASAUN	1	\$ 102.512,31	27,56%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0,00%
7	ESTRADAS	3	\$ 563.302,80	46,05%
8	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0,00%
9	FLOOD CONTROL		\$ -	0,00%
10	IMPRESTIMO		\$ -	0,00%
11	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0,00%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
13	PONTES	1	\$ 3.553.954,20	93,93%
14	SAUDE		\$ -	0,00%
15	TURISMO		\$ -	0,00%
	Grand Total	6	\$ 4.286.667,82	85,46%

1.3.3 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Ministerios

NO	POR MINISTERIO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 305.556,27	28,66%
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	1	\$ 370.511,25	15,83%
3	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 189.578,02	46,86%
4	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29.275,84	15,92%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	27	\$ 129.808.326,71	84,90%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	12	\$ 1.121.856,87	20,86%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277.330,43	0,00%
8	MINISTERIO SAUDE	5	\$ 924.591,68	73,22%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204.687,39	72,06%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 408.460,73	78,09%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2.362.976,44	76,00%
	Grand Total	54	\$ 136.003.151,63	83,55%

NO	POR MINISTERIO	Barique		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0,00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 370.511,25	15,83%
3	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0,00%
4	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0,00%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	7	\$ 1.502.614,34	37,92%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
8	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 116.914,88	63,99%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0,00%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 408.460,73	78,09%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
Grand Total		10	\$ 2.398.501,20	42,62%

NO	POR MINISTERIO	Laclo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0,00%
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS		\$ -	0,00%
3	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 189.578,02	46,86%
4	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0,00%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	\$ 49.345.116,83	87,81%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 98.147,27	23,56%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
8	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0,00%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204.687,39	72,06%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0,00%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
Grand Total		9	\$ 49.837.529,51	87,47%

NO	POR MINISTERIO	Laclubar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0,00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0,00%
3	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0,00%
4	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0,00%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	\$ 36.412.565,10	86,69%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 202.223,29	25,59%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
8	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 209.008,44	41,51%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0,00%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0,00%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
Grand Total		9	\$ 36.823.796,83	86,10%

NO	POR MINISTERIO	Laleia		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0,00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0,00%
3	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0,00%
4	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0,00%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	1	\$ 28.258,31	90,00%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 86.883,29	25,06%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277.330,43	0,00%
8	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0,00%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0,00%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0,00%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
Grand Total		3	\$ 392.472,03	12,03%

NO	POR MINISTERIO	Manatuto Villa		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 305.556,27	28,66%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0,00%
3	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0,00%
4	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29.275,84	15,92%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	4	\$ 38.402.515,13	81,04%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	6	\$ 565.192,20	12,70%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
8	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 598.668,36	86,09%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0,00%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0,00%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2.362.976,44	76,00%
	Grand Total	17	\$ 42.264.184,24	79,49%

NO	POR MINISTERIO	Soibada		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EZECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0,00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0,00%
3	MINISTERIO DA DEFESA		\$ -	0,00%
4	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0,00%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	4	\$ 4.117.257,00	87,38%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 169.410,82	38,71%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
8	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0,00%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0,00%
10	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0,00%
11	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0,00%
Grand Total		6	\$ 4.286.667,82	85,46%

1.4. Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Idade la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Barique	5,833	1,924	1,617	1,183	1,109
Laclo	8,193	2,250	2,185	1,919	1,838
Laclubar	12,777	3,445	3,571	2,924	2,836
Laleia	3,930	1,181	1,189	817	743
Manatuto	15,446	4,741	4,609	3,109	2,987
Soibada	3,511	237	213	239	259

Fontes : Projeksaun Populasaun bazea ba Census Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1. Progressu Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan nia laran, husi lista #anexu B hatudu progresu aktual fulan ida ne'e ho nia prensentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu prentangen aktual fulan ida ne'e hatudu progresu fisiku komulativu husi prosentu antrior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare iha #anexu B, detallu ba back-up #anexu C, no Instrusaun Servisu #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1. Obtáclo Servisu iha Terenu

Observasaun geral ba projeto hirak nebe mak implementa iha Munisipio Manatuto

1. Projeto Lao la tuir tempo nebee asina entre parte rua
2. Laiha tekniko supervisaun husi projeto nain atu halo kontrolo diaramente
3. Tekniko kompanha la iha tereno
4. Skill badaen neebe mak la dun professional

Obstalku teknik A.D.N hasoru

1. Distansia ne'ebe dook difikulta teknik atu servisu lalais
2. Kondisaun estrada neébe a'at
3. Kontraktor sira ne'ebe mak servisu iha terreno barak mak la tuir Spesifikasaun ne'ebe iha kontartu laran.
4. Planu Mapamentu Engenheiro Munisipiu la konsege realiza tuir planu tamba hare hosi nia distansia ne'ebe dook.
5. Sistema dropbox iha Munisipiu dala ruma iha problema lina internet

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Presija tebes atu aumenta ema iha Munisipiu atu nune bele halo servisu ba administrasaun ne'ebe efetivo.
2. Sebele sistema dropbox tau mos iha dekstop Munisipiu para labele atraja ami nia servisu.

Note: Asinatura Husi Eng. Municipio Manatuto

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Manatuto						
No	Deskrisaun	Identidade				Asinatura
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	
1	Enjineiru	Quico Adelino Junior	240	Enjineiru EPAS		
		José R. Carlos Gusmão	168	Enjineiru ITI		
		Domingos da Costa e Silva	250	Enjineiru ITI		

		Adonis Julio Fernandes	152	Enjineiru ME		
2	Enjineira	Olivia Soares	112	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Timoteo da Silva Morais	120	Motorista		

#ANEXU A

MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	PMIS CODE	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
1	P0281	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	\$ 2,561,405.06	Aug. 25, 2018	63.80%	57.33%	\$ 1,468,479.04	\$ 1,092,926.02	ON-GOING	
2	P0282	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	\$ 3,029,514.40	Aug. 25, 2017	89.20%	79.82%	\$ 2,418,275.38	\$ 611,239.02	ON-GOING	
3	P0326	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	\$ 2,362,976.44	June 30, 2015	82.08%	76.00%	\$ 1,795,843.89	\$ 567,132.55	ON-GOING	
4	P0377	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	\$ 28,011,854.94	Feb. 10, 2014	94.91%	85.62%	\$ 23,983,565.18	\$ 4,028,289.76	ON-GOING	
5	P0379	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	\$ 4,405,546.00	Sept. 3, 2014	73.76%	73.76%	\$ 3,249,684.75	\$ 1,155,861.25	ON-GOING	
6	P0788	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	\$ 79,155.54	Dec. 18, 2019	88.07%	79.26%	\$ 62,737.67	\$ 16,417.87	ON-GOING	
7	P0789	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	\$ 226,400.73	Dec. 18, 2019	43.70%	10.97%	\$ 24,834.32	\$ 201,566.41	ON-GOING	
8	P0872	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	\$ 29,275.84	March 1, 2020	15.92%	15.92%	\$ 4,660.85	\$ 24,614.99	ON-GOING	
9	P0954	Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Municipiu Manatuto, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip.Lda	\$ 262,983.65	09-Dec-20	100.00%	97.19%	\$ 255,587.87	\$ 7,395.78	ON-GOING	
10	P2538	New Construction of Fence at Isolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	K-6, UNIPESOAL LDA	\$ 257,748.51	Jan. 12, 2022	88.89%	74.56%	\$ 192,164.43	\$ 65,584.08	ON-GOING	
11	P2539	Supply and Installtion Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Fraternity Unipessoal Lda	\$ 77,936.20	Jan. 12, 2022	92.28%	86.81%	\$ 67,657.50	\$ 10,278.70	ON-GOING	
12	P1806	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	\$ 62,996.83	Oct. 15, 2021	51.03%	24.62%	\$ 15,507.66	\$ 47,489.17	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan marco Aumenta 2.71%
13	P1808	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF RENTAU	\$ 64,383.50	Oct. 15, 2021	69.15%	50.49%	\$ 32,504.67	\$ 31,878.83	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan marco Aumenta 11.66%
14	P1809	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE PE REMBOR	\$ 88,918.34	Oct. 15, 2021	46.21%	0.00%	\$ -	\$ 88,918.34	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan marco Aumenta 0.88%
15	P1811	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF OBRATO	\$ 66,144.65	Oct. 15, 2021	62.47%	22.03%	\$ 14,570.40	\$ 51,574.25	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan marco Aumenta 8.28%
16	P2041	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	\$ 100,047.31	Oct. 15, 2021	14.58%	14.58%	\$ 14,590.20	\$ 85,457.11	ON-GOING	
17	P1953	Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda	\$ 182,701.57	Dec. 7, 2022	11.01%	6.14%	\$ 11,214.18	\$ 171,487.39	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan marco Aumenta 1.35%
18	P1581	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda	\$ 394,194.73	April 28, 2022	1.77%	0.00%	\$ -	\$ 394,194.73	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan marco Aumenta 1.77%
19	P0627	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip.Lda	\$ 277,330.43	July 18, 2019	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 277,330.43	ON-GOING	

#ANEXU A

MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	PMIS CODE	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FSIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
20	P0986	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	\$ 28,258.31	June 10, 2021	100.00%	90.00%	\$ 25,432.48	\$ 2,825.83	ON-GOING	
21	P1810	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laleia	Manatuto	MEJD PKRIE EP CAIRUI	\$ 86,883.29	Oct. 15, 2021	48.70%	25.06%	\$ 21,771.04	\$ 65,112.25	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan marco Aumenta 0.74%
22	P0114	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	\$ 695,420.83	June 7, 2016	91.52%	82.11%	\$ 571,034.27	\$ 124,386.56	ON-GOING	
23	P0378	Road Network Upgrading Sector Project (RNUSP)Upgrading and Maintenance of Laclubar Junction - Natarbora Road (Sta. 100+360 - Sta. 144+995)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD	\$ 34,379,729.54	Nov. 20, 2014	92.04%	88.30%	\$ 30,356,507.52	\$ 4,023,222.02	ON-GOING	
24	P0899	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 481,029.67	Aug. 25, 2020	54.37%	11.80%	\$ 126,501.30	\$ 354,528.37	ON-GOING	
25	P0917	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 194,402.72	Dec. 20, 2019	82.83%	74.55%	\$ 144,924.09	\$ 49,478.63	ON-GOING	
26	P0977	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	\$ 448,209.39	June 10, 2021	95.04%	82.05%	\$ 367,756.59	\$ 80,452.80	ON-GOING	
27	P0983	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	\$ 213,772.95	June 10, 2021	7.12%	0.00%	\$ -	\$ 213,772.95	ON-GOING	
28	P2781	Konstrasaun Postu Saude Laclubar Funar- Postu Administrativo Laclubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	MERCY, Unipessoal Lda	\$ 88,045.73	July 28, 2019	11.63%	10.46%	\$ 9,212.19	\$ 78,833.54	ON-GOING	
29	P1803	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BATARA	\$ 102,060.99	Oct. 15, 2021	64.09%	25.60%	\$ 26,125.75	\$ 75,935.24	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan marco Aumenta 11.44%
30	P1804	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	\$ 100,162.30	Oct. 15, 2021	31.58%	25.59%	\$ 25,626.77	\$ 74,535.53	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan marco Aumenta 5.99%
31	P0316	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPESSOAL LDA	\$ 3,553,954.20	Feb. 27, 2017	100.00%	93.93%	\$ 3,338,377.84	\$ 215,576.36	ON-GOING	
32	P0932	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	\$ 164,154.00	March 25, 2020	70.00%	70.00%	\$ 114,907.80	\$ 49,246.20	ON-GOING	
33	P0981	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 203,036.57	June 10, 2021	52.40%	41.78%	\$ 84,819.65	\$ 118,216.92	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan marco Aumenta 1.67%
34	P0984	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 196,112.23	June 10, 2021	61.58%	30.42%	\$ 59,662.31	\$ 136,449.92	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan marco Aumenta 6.17%
35	P1814	Projetu Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 66,898.51	Nov. 26, 2021	59.01%	55.80%	\$ 37,330.95	\$ 29,567.56	ON-GOING	
36	P1807	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	\$ 102,512.31	Oct. 15, 2021	32.15%	27.56%	\$ 28,253.89	\$ 74,258.42	ON-GOING	
37	P0940	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	\$ 242,560.14	Oct. 24, 2019	70.75%	63.68%	\$ 154,455.92	\$ 88,104.22	Abandona	
38	P0404	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	\$ 370,511.25	Sept. 13, 2016	17.59%	15.83%	\$ 58,645.87	\$ 311,865.38	Abandona	Abandona
39	P0540	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip.Lda	\$ 15,875.56	Jan. 7, 2017	100.00%	87.26%	\$ 13,853.09	\$ 2,022.47	PHO	Abandona
40	P0784	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	\$ 116,914.88	Sept. 23, 2019	71.10%	63.99%	\$ 74,817.23	\$ 42,097.65	ON-GOING	

#ANEXU A

MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	PMIS CODE	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
41	P0873	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Ametalaran /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip Lda	\$ 162,377.94	Oct. 8, 2019	46.50%	41.85%	\$ 67,961.57	\$ 94,416.37	ON-GOING	
42	P0921	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 141,684.96	Aug. 25, 2019	41.78%	36.88%	\$ 52,260.01	\$ 89,424.95	ON-GOING	
43	P0978	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We"coi Unipessoal Lda	\$ 343,111.47	June 10, 2021	66.14%	21.97%	\$ 75,370.79	\$ 267,740.68	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan marco Aumenta 2.89%
44	P0982	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	\$ 296,211.81	June 10, 2021	18.83%	15.96%	\$ 47,266.94	\$ 248,944.87	ON-GOING	
45	P0985	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	\$ 300,792.46	July 10, 2021	98.30%	52.76%	\$ 158,690.94	\$ 142,101.52	ON-GOING	
46	P1056	New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de heroes de Natarbora	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Barique	Manatuto	Senizu	\$ 408,460.73	Oct. 18, 2021	95.69%	78.09%	\$ 318,953.66	\$ 89,507.07	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan marco Aumenta 1.86%
47	P0061	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacio	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	\$ 380,582.61	Sept. 1, 2016	95.99%	72.08%	\$ 274,330.03	\$ 106,252.58	ON-GOING	
48	P0221	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Sahan I Unip Lda	\$ 3,314.56	Sept. 27, 2016	100.00%	90.00%	\$ 2,983.11	\$ 331.45	PHO	Falta Retensaun
49	P0926	For Roads & Bridges Maintenance Section : Mantanen Lacio, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Egana, Unip. Lda	\$ 223,843.79	Dec. 13, 2019	68.89%	56.58%	\$ 126,647.74	\$ 97,196.05	ON-GOING	
50	P0692	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Esa-Un	\$ 50,745.00	May 2, 2016	38.83%	34.95%	\$ 17,736.12	\$ 33,008.88	PENDENTE	
51	P0776	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilimano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacio	Manatuto	Surprise Unip. Lda	\$ 153,942.39	Sept. 12, 2016	97.16%	84.29%	\$ 129,753.97	\$ 24,188.42	ON-GOING	
52	P0396	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacio	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	\$ 48,314,975.87	May.3, 2016	88.12%	87.98%	\$ 42,506,027.78	\$ 5,808,948.09	ON-GOING	
53	P1805	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lacio	Manatuto	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	\$ 98,147.27	Oct. 15, 2021	44.82%	23.56%	\$ 23,122.26	\$ 75,025.01	ON-GOING	
54	P2603	Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp at Behau	MINISTERIO DA DEFESA	LM-BS	FLOOD CONTROL	Lacio	Manatuto	Baboe Unip Lda	\$ 189,578.02	May 23, 2022	92.53%	46.86%	\$ 88,843.95	\$ 100,734.07	ON-GOING	
		TOTAL							\$ 135,459,788.92				\$ 113,141,843.41	\$ 22,217,211.44		


1. Eng. José R. Carlos, Gusmão
Eng. ba Projeto Infrastrutura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Prepara Husi:

2. Eng. Domingos D.X. Silva
Eng. ba Projeto Infrastrutura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P


3. Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Edificiu Público, Be'e
no Saneamento Municipiu Manatuto, ADN, I.P


4. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

Certifika Husi:

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De
Qualidade ADN,I.P

LISTA #ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN													
					LOKALIZASAUN PROJETU						Mar-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress	This Month Progress	Komulativo Progress
1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	\$ 2,561,405.06	Aug. 25, 2018	63.80%		63.80%
2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	SSS/061/MOPTC-2017	\$ 3,029,514.40	Aug. 25, 2017	89.20%		89.20%
3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	\$ 2,362,976.44	June 30, 2015	82.08%		82.08%
4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	ICB/023/MPW-2013	\$ 28,011,854.94	Feb. 10, 2014	94.91%		94.91%
5	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	QCBS/019/MPW-2013	\$ 4,405,546.00	Sept. 3, 2014	73.76%		73.76%
6	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	\$ 79,155.54	Dec. 18, 2019	88.07%		88.07%
7	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	\$ 226,400.73	Dec. 18, 2019	43.70%		43.70%
8	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisiapiu Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	019/Janeiro/2020	\$ 29,275.84	March 1, 2020	15.92%		15.92%
9	Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Municiapiu Manatuto, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	\$ 262,983.65	09-Dec-20	100.00%		100.00%
10	New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	K-6, UNIPESOAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227	\$ 257,748.51	Jan. 12, 2022	88.89%		88.89%
11	Supply and Installtion Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Fraternity Unipessoal Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227	\$ 77,936.20	Jan. 12, 2022	92.28%		92.28%
12	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	-	\$ 62,996.83	Oct. 15, 2021	48.32%	2.71%	51.03%
13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF RENTAU	-	\$ 64,383.50	Oct. 15, 2021	57.49%	11.66%	69.15%
14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE PE REMBOR	-	\$ 88,918.34	Oct. 15, 2021	45.33%	0.88%	46.21%
15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF OBRATO	-	\$ 66,144.65	Oct. 15, 2021	54.19%	8.28%	62.47%
16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	-	\$ 100,047.31	Oct. 15, 2021	14.58%		14.58%
17	Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda		\$ 182,701.57	Dec. 7, 2022	9.67%	1.35%	11.01%
18	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda		\$ 394,194.73	April 28, 2022	0.00%	1.77%	1.77%
19	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip.Lda	011LM/WAND/MPIE/VII/DILI/2019/EDIFI CIO DEPARTMENT	\$ 277,330.43	July 18, 2019	0.00%		0.00%
20	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	MPW-W-210055	\$ 28,258.31	June 10, 2021	100.00%		100.00%
21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laleia	Manatuto	MEJD PKRIE EP CAIRUI	-	\$ 86,883.29	Oct. 15, 2021	47.97%	0.74%	48.70%
22	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412	\$ 695,420.83	June 7, 2016	91.52%		91.52%
23	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD	ICB/04/MPW-2014	\$ 34,379,729.54	Nov. 20, 2014	92.04%		92.04%
24	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190035	\$ 481,029.67	Aug. 25, 2020	54.37%		54.37%
25	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020	\$ 194,402.72	Dec. 20, 2019	82.83%		82.83%
26	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	MPW-W-210057	\$ 448,209.39	June 10, 2021	95.04%		95.04%
27	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	MPW-W-210056	\$ 213,772.95	June 10, 2021	7.12%		7.12%
28	Konstrasaun Postu Saude Laclubar Funar- Postu Administrativo Laclubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	MERCY, Unipessoal Lda	04/PDIM-I/MNTT/VIII/2022	\$ 120,962.71	July 28, 2019	11.63%		11.63%
29	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BATARA	-	\$ 102,060.99	Oct. 15, 2021	52.65%	11.44%	64.09%
30	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	-	\$ 100,162.30	Oct. 15, 2021	25.59%	5.99%	31.58%
31	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPESOAL LDA	SSS/013/MOPTC-2017	\$ 3,384,214.14	Feb. 27, 2017	100.00%		100.00%
32	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000024	\$ 164,154.00	March 25, 2020	70.00%		70.00%
33	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	MPW-W-210059	\$ 203,036.57	June 10, 2021	50.73%	1.67%	52.40%
34	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000- 10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	MPW-W-210060	\$ 196,112.23	June 10, 2021	55.40%	6.17%	61.58%
35	Projetu Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	RFQ-R : 21/036 - Q	\$ 66,898.51	Nov. 26, 2021	59.01%		59.01%
36	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	-	\$ 102,512.31	Oct. 15, 2021	32.15%		32.15%
37	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W- 190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	MPW-W-190157	\$ 242,560.14	Oct. 24, 2019	70.75%		70.75%
38	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	RDTL/PO:2016-11272	\$ 370,511.25	Sept. 13, 2016	17.59%		17.59%
39	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip.Lda	MPWTC - CD - 170003	\$ 15,875.56	Jan. 7, 2017	100.00%		100.00%
40	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/IX/2019	\$ 116,914.88	Sept. 23, 2019	71.10%		71.10%
41	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip Lda	No. Kontratu : MOP-W-190233	\$ 162,377.94	Oct. 8, 2019	46.50%		46.50%
42	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	MPW-W-W-190080	\$ 141,684.96	Aug. 25, 2019	41.78%		41.78%
43	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000- 6+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We'coi Unipessoal Lda	MPW-W-210062	\$ 343,111.47	June 10, 2021	63.25%	2.89%	66.14%

LISTA #ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN													
					LOKALIZASAUN PROJETU						Mar-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress	This Month Progress	Komulative Progress
44	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	MPW-W-210061	\$ 296,211.82	June 10, 2021	18.83%		18.83%
45	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	MPW-W-210058	\$ 300,792.46	July 10, 2021	98.30%		98.30%
46	New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Barique	Manatuto	Senizu		\$ 408,460.73		93.83%	1.86%	95.69%
47	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacio	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421	\$ 380,582.61	Sept. 1, 2016	95.99%		95.99%
48	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Sahan I Unip.Lda	SSS/304/MOPTC-2016	\$ 3,314.56	Sept. 27, 2016	100.00%		100.00%
49	Routine Roads Maintenance - Lacio, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Egana, Unip. Lda	MPW-W-190251	\$ 223,836.50	Dec. 13, 2019	68.89%		68.89%
50	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Esa-Un	RDTL:74/GMTAC/X//2015	\$ 50,745.00	May 2, 2016	38.83%		38.83%
51	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Iliriano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacio	Manatuto	Surprise Unip. Lda	07/PDIM-II/MNTT/VIII/2016	\$ 153,942.39	Sept. 12, 2016	97.16%		97.16%
52	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacio	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	ICB/07/MPW-2014	\$ 48,314,975.87	May.3, 2016	88.12%		88.12%
53	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lacio	Manatuto	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	-	\$ 98,147.27	Oct. 15, 2021	30.64%	14.18%	44.82%
54	Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp at Behau	MINISTERIO DA DEFESA	LM-BS	FLOOD CONTROL	Lacio	Manatuto	Baboe Unip Lda		\$ 189,578.02	May 23, 2022	92.53%		92.53%

Prepara Husi:

Verifika Husi:

1. Eng. José R.Carlos, Gusmão
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

2. Eng. Domingos D.X.Silva
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Eng. Remigio da c.s dos Santos
Eng. Senior ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun, ADN, I.P

Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e
Validação De Qualidade ADN,I.P

3. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

4. Eng. Quico Agelino Junior
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Eng/Arch.Francisco Xavier de D. Jeronimo
Eng. Senior ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento,ADN,I.P

Eng. Deolinda de Fatima Marques
ChefeSaksaun ME& ITC, ADN, I.P



#ANEXU C2 (SO - 3)

Road Name : Manlala(Manufahi Kiik) - Soibada Chainage start 0 + 000
Municipality : Manatuto Chainage end 2+000
Postu : Soibada Length 2.0 Km
Sukos : Manufahi Kiik

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)						
R-01	General	\$ 2,990.00	\$ 2,970.00	1.46%	\$ -	0.00%	\$ 2,970.00	1.46%
R-03	Earth work	\$ 11,037.21	\$ 12,532.73	6.17%	\$ -	0.00%	\$ 12,532.73	6.17%
R-05	Sub-base, Base and Pavament	\$ 13,353.74	\$ 12,473.94	6.14%	\$ -	0.00%	\$ 12,473.94	6.14%
R-08	Structures	\$ 121,257.00	\$ 42,411.55	20.89%	\$ 3,026.64	1.49%	\$ 45,438.19	22.38%
R-10	Dayworks	\$ 1,750.00	\$ 175.00	0.09%	\$ -	0.00%	\$ 175.00	0.09%
R-11	Routine maintenance	\$ 4,205.00	\$ 4,205.00	2.07%	\$ -	0.00%	\$ 4,205.00	2.07%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ 200.00	0.10%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.10%
A	Construction Cost	\$ 154,792.95	\$ 74,968.22	36.92%	\$ 3,026.64	1.5%	\$ 77,994.86	38.4%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 15,479.29	\$ 7,496.82	3.69%	\$ 302.66	0.15%	\$ 7,799.49	3.84%
C	General Item	\$ 28,783.23	\$ 20,611.00	10.15%	\$ -	0.00%	\$ 20,611.00	10.15%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 3,981.11	\$ 2,061.52	1.02%	\$ 66.59	0.03%	\$ 2,128.11	1.05%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 203,036.57	\$ 105,137.57	51.73%	\$ 3,395.89	1.67%	\$ 108,533.46	53.41%

Inspeksaun Husi:


1. (Eng. Domingos D.X. Silva)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P


2. (Eng. José R. Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :


(Eng. Remigio da C.S. dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



#ANEXU C2 (SO - 4)

PROJECT NAME : R4D RURAL ROAD SPOT IMROVEMET, SOIBADA - FATUMAKEREC CHAINAGE 8+000 - 10+700
CONT.NUMBER : MPW - W - 210060
SUCO SASAHI - FATUMAQUEREC

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERECENT PREVIOUS	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
				BILLING		MONTH		
R-01	General	\$ 3,040.00	\$ 3,040.00	1.55%	\$ -	0.00%	\$ 3,040.00	1.55%
R-03	Earth Work	\$ 9,242.27	\$ 30,032.70	15.31%	\$ -	0.00%	\$ 30,032.70	15.31%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 12,677.94	\$ 5,890.59	3.00%	\$ -	0.00%	\$ 5,890.59	3.00%
R - 08	Structure	\$ 119,043.38	\$ 34,918.09	17.81%	\$ 10,790.07	5.50%	\$ 45,708.17	23.31%
R-10	Dayworks	\$ 1,750.00	\$ 595.00	0.30%	\$ -	0.00%	\$ 595.00	0.30%
R-11	Routine Maintenance	\$ 5,800.25	\$ 5,769.20	2.94%	\$ -	0.00%	\$ 5,769.20	2.94%
R-15	Provisional Sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 151,753.84	\$ 80,245.58	40.92%	\$ 10,790.07	5.50%	\$ 91,035.66	46.4%
B	Profit (10% x A)	\$ 15,175.38	\$ 8,024.56	4.09%	\$ 1,079.01	0.55%	\$ 9,103.57	4.64%
C	General Item	\$ 25,337.67	\$ 18,252.70	9.31%	\$ -	0.00%	\$ 18,252.70	9.31%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 3,845.34	\$ 1,765.40	1.09%	\$ 237.38	0.12%	\$ 2,367.84	1.21%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 196,112.23	\$ 108,288.25	54.40%	\$ 12,106.46	6.17%	\$ 120,759.76	61.58%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. José R. C. Gusmão)

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

2. (Eng. Domingo D.X.Silva)

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

Eng. Aniceto da Costa

Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irrigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D2 (SO-5) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
					Naran projeto : Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto			
					Kompanha : Manufahi Kiik Unipesoal, Lda			
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	15/03/2023	Soibada	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Husu ba enginheiru atu atensaun ba monta plafond parte liur no mos tenki kabir / labele bubu.		
					2	Ba keramik Haris fatin ninian tenki tuir dezenhu no mos BOQ.		
					3	Kontinua aselera Servisu tuir dezenhu no mos BOQ.		
					4			



#ANEXU C2 (SO-5)
SUMMARY BOQ

NARAN PROJEITO : REHABILITAÇÃO ESCRITÓRIO ESCOLA SECUNDÁRIA TÉCNICA VOCACIONAL SOIBADA

FATIN PROJEITO : MANLALA, SOIBADA, MANATUTO

NO	DESCRIPTION	AMOUNT \$	PROGRESS REPORT BY A D N					
			PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS MARCH		PROGRESS TO DATE	
			AMOUNT (US\$)	WEIGHT (%)	AMOUNT (US\$)	WEIGHT (%)	AMOUNT (US\$)	WEIGHT (%)
I	PRELIMINARIES (PEKERJAAN PERSIAPAN)	\$ 1.778,89	\$ 978,89	1,46%	\$ -	0,00%	\$ 978,89	1,46%
II	DEMOLITION, CONCRETE & FINISHES (Pek. bongkaran ,beton & Pek.finishes)	\$ 9.586,05	\$ 7.368,83	11,01%	\$ -	0,00%	\$ 7.368,83	11,01%
III	STEEL ROOF STRUCTURE & CEILING (Structur Atap Baja dan Plafond)	\$ 18.320,41	\$ 8.454,72	12,64%	\$ 231,73	0,35%	\$ 8.686,45	12,98%
IV	ROOFING (Pek. Atap)	\$ 6.442,56	\$ 6.442,56	9,63%	\$ -	0,00%	\$ 6.442,56	9,63%
V	WINDOWS AND DOORS (Pekerjaan Jendela dan Pintu)	\$ 8.047,00	\$ 4.297,50	6,42%	\$ 1.055,00	1,58%	\$ 5.352,50	8,00%
VI	PAINTING (Pek. Pengecatan)	\$ 3.144,00	\$ 1.951,33	2,92%	\$ 593,76	0,89%	\$ 2.545,09	3,80%
VII	PLUMBING AND DRAINAGE (Pek. perpipaan)	\$ 2.558,76	\$ 1.123,94	1,68%	\$ -	0,00%	\$ 1.123,94	1,68%
VIII	ELECTRICAL INSTALLATION (full installation)	\$ 2.545,75	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
IX	EXTERNAL ELECTRICAL SERVICES (full installation) (Instalasi listrik bagian luar)	\$ 1.238,64	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
X	EXTERNAL WATER SERVICE PLUMBING (Perpipaan air bersih)	\$ 249,47	\$ 249,47	0,37%	\$ -	0,00%	\$ 249,47	0,37%
XI	EXTERNAL SEWER DRAINAGE (Perpipaan air kotor bagian luar)	\$ 2.803,73	\$ 2.862,94	4,28%	\$ -	0,00%	\$ 2.862,94	4,28%
XII	OVERHEAD							
A	CONSTRUCTION COST	\$ 56.715,25	\$ 33.730,18	50,42%	\$ 1.880,49	2,81%	\$ 35.610,67	53,23%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 5.671,52	\$ 3.373,02	5,04%	\$ 188,05	0,28%	\$ 3.561,07	5,32%
C	OVERHEAD	\$ 3.200,00	\$ 1.600,00	2,39%	\$ 500,00	0,75%	\$ 2.100,00	3,14%
D	TAX (2% x (A+B+C)	\$ 1.311,74	\$ 774,06	1,16%	\$ 51,37	0,08%	\$ 825,43	1,23%
E	CONTINGENCY (10% X A)	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
F	GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)	\$ 66.898,51	\$ 39.477,26	59,01%	\$ 2.619,91	3,92%	\$ 42.097,17	62,93%

Prepara husi :

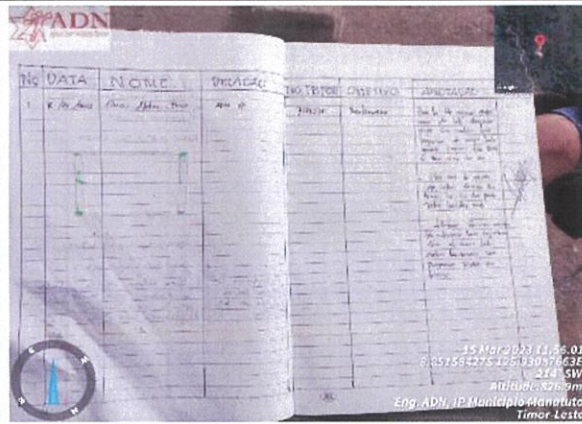
(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade ADN,I.P

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (SO-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
					Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik			
					Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO WEAIHUDIK			
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	15/03/2023	Manatuto/Soibada	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Husu ba site engineer grupo ninian atu bele akompanha grupo sira wainhira halo pengecoran atu nune'e bele garante campuran tuir BOQ no Mix design ne'ebe iha ona.		
					2	Husu mos ba grupo atu aselera servisu iha terrenu , liu-liu iha parte toilet building nian.		
					3	Kontinua servisu nafatin tuir instrusaun husi enjinheiru sira atu nune'e bele aselera konstrusaun nia progressu fiziku iha terrenu.		
					4			
					5			



#ANEXU C2 (SO-6) SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik
Lokalidade : Manufahi Ki'ik, Posto Administrativo Soibada
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY				ORIGINAL	PROGRESS REPORT BY ADN IP					
				CONTRACT						
No	MAIN SUMMARY	Page No		Amount	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS MARCH		TOTAL TO DATE	
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3.075,00	\$ 2.275,00	2,22%	\$ 300,00	0,29%	\$ 2.575,00	2,51%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	\$ 51.164,59	\$ 21.038,03	20,52%	\$ 13.395,55	13,07%	\$ 34.433,57	33,59%
III	TOILET BULDING Tb	TB/39	(i)	\$ 25.091,96	\$ 8.984,44	8,76%	\$ 128,79	0,13%	\$ 9.113,24	8,89%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/24	(i)	\$ 13.840,76						
A	CONSTRUCTION COST			\$ 93.172,31	\$ 32.297,47	31,51%	\$ 13.824,34	13,49%	\$ 46.121,81	44,99%
B	CONTIGENCIA			\$ 3.000,00						
C	OVERHEAD			\$ 6.340,00	\$ 1.210,00	1,18%	\$ 2.145,00	2,09%	\$ 3.355,00	3,27%
D	GRAND TOTAL			\$ 102.512,31	\$ 33.507,47	32,69%	\$ 15.969,34	15,58%	\$ 49.476,81	48,26%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN, I.P.



#ANEXU C2 (BA - 7)

Naran Projeto : RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT AGRICULTURE CENTRE - AUBEON CHAINAGE (STA 3 + 000 - 6 + 200)
No. kontratu : MPW - W - 210062
Postu : Natarbora
Suku : Aubeon
Naran Kompanhia : We' Coi Unip, Lda.

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)						
R-01	General	\$ 2,340.00	\$ 2,340.00	0.68%	\$ -	0.00%	\$ 2,340.00	0.68%
R-03	Earth work	\$ 10,796.77	\$ 10,796.77	3.15%	\$ 0.00	0.00%	\$ 10,796.77	3.15%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 57,631.73	\$ 57,631.73	16.80%	\$ -	0.00%	\$ 57,631.73	16.80%
R - 07	Bituminous pavement	\$ 175,067.20	\$ 64,848.00	18.90%	\$ 8,850.63	2.58%	\$ 73,698.63	21.48%
R-08	Structures	\$ 35,867.39	\$ 36,637.28	10.68%	\$ -	0.00%	\$ 36,637.28	10.68%
R-10	Dayworks	\$ 175.00	\$ 525.00	0.15%	\$ -	0.00%	\$ 525.00	0.15%
R-11	Routine Maintenance	\$ 6,341.00	\$ 6,341.00	1.85%	\$ -	0.00%	\$ 6,341.00	1.85%
R-15	Provisional Sum	\$ 100.00	\$ 100.00	0.03%	\$ -	0.00%	\$ 100.00	0.03%
A	Construction Cost	\$ 288,319.09	\$ 179,219.77	52.23%	\$ 8,850.63	2.6%	\$ 188,070.40	54.8%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 28,831.91	\$ 17,921.98	5.22%	\$ 885.06	0.26%	\$ 18,807.04	5.48%
C	General Item	\$ 19,232.79	\$ 14,755.50	4.30%	\$ -	0.00%	\$ 14,755.50	4.30%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 6,727.68	\$ 4,237.95	1.24%	\$ 194.71	0.06%	\$ 4,432.66	1.29%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 343,111.47	\$ 216,135.20	63.25%	\$ 9,930.40	2.89%	\$ 226,065.60	66.14%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Domingos D.X.Silva)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irigação
Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

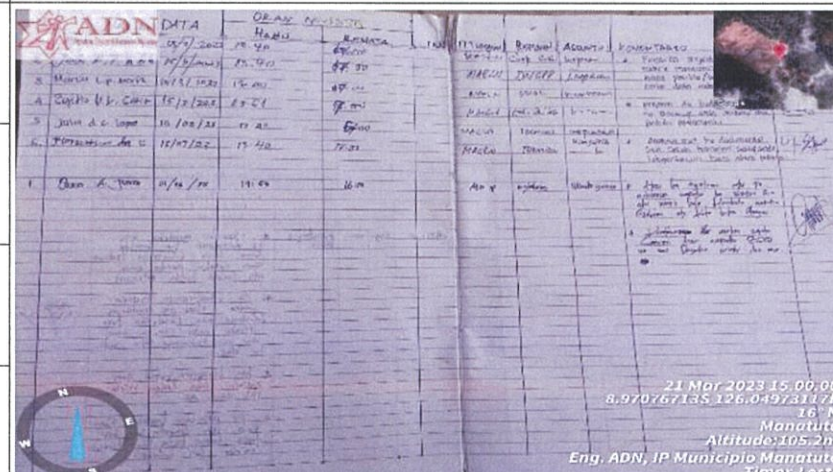
2. (José R. Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irigação
Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C.S. dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P

 REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (BA-10) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
Naran projeto : New Contruction of Gapura and Gabion Wall Protection no Jardim de Herois de Natarbora								
Kompanha : Senizu Unipesoal, Lda								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	21/03/2023	Manatuto/Barique	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Husu ba enginheiru atu fo instrusaun nafatin ba worker sira atu nune'e bele kontrola nafatin gabion atu keta hetan stragus.		
					2	Kontinua aselera nafatin servisu tuir nafatin BOQ no mos dezenhu ne'ebe iha ona.		
					3			
					4			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



#ANEXU C2 (BA-10) SUMMARY BOQ

PEMILIK PROYEK : MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA
LIBERTAÇÃO NACIONAL
NAMA PROYEK : NEW CONSTRUCTION OF GAPURA AND GABION WALL
PROTECTION IN GARDEN OF HEROES
LOKASI : NATARBORA - MANATUTO

SUMMARY

NO	URAIAN PEKERJAAN	ORIGINAL CONTRACT TOTAL BIAYA (US\$)	PROGRESS BY A D N					
			PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS MARCH		PROGRESS TO DATE	
			AMOUNT	(%)	AMOUNT	(%)	AMOUNT	(%)
I	PERSIAPAN	\$ 6.550,00	\$ 4.600,00	1,13%	\$ 850,00	0,21%	\$ 5.450,00	1,33%
II	KONSTRUKSI GAPURA	\$ 34.469,21	\$ 19.427,99	4,76%	\$ 5.929,48	1,45%	\$ 25.357,47	6,21%
III	PEMASANGAN BRONJONG	\$ 318.618,69	\$ 315.479,06	77,24%	\$ -	0,00%	\$ 315.479,06	77,24%
A	TOTAL	\$ 359.637,90	\$ 339.507,05	83,12%	\$ 6.779,48	1,66%	\$ 346.286,54	84,78%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 35.963,79	\$ 33.950,71	8,31%	\$ 677,95	0,17%	\$ 34.628,65	8,48%
C	OVERHEAD	\$ 4.850,00	\$ 2.272,50	0,56%	\$ -	0,00%	\$ 2.272,50	0,56%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 8.009,03	\$ 7.514,61	1,84%	\$ 149,15	0,04%	\$ 7.663,75	1,88%
E	GRAND TOTAL (A+B+C+D)	\$ 408.460,73	\$ 383.244,86	93,83%	\$ 7.606,58	1,86%	\$ 390.851,45	95,69%

Prepara husi :

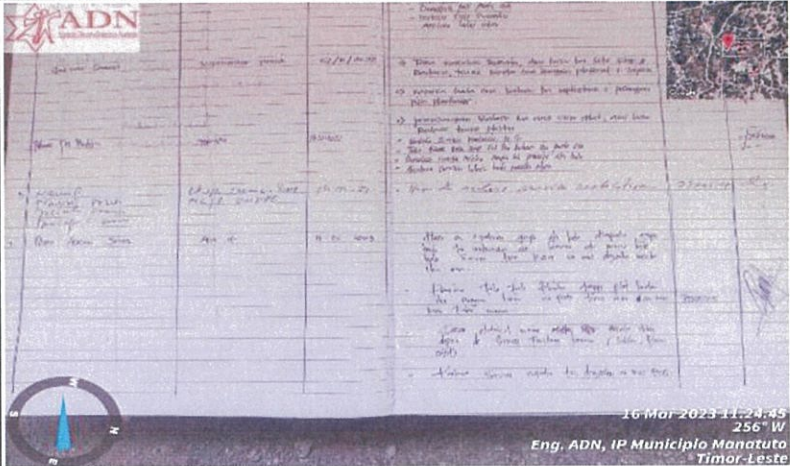
(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua Saneamento
ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VI GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D1 (MV-12) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
					Naran projeto : Reabilitação do Escritorio, ID Emis - 1096			
					Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO ESG KAY RALA			
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	16/03/2023	Manatuto Vila	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Husu ba engenheiro grupo atu bele akompanha grupo hodi fo instrusaun do servisu atu nune'e bele halo servisu tuir BOQ no mos deze nhu ne'ebe iha ona.		
					2	Komfirma fila fali konaba tinggi plat lantai iha ruangan laran no mos parte teras nian no mos haris fatin ninian.		
					3	Sasan Electrical ninian monta ikus depois de servisu finishing termina (saklar, Power outlet).		
					4	Kontinua servisu nafatin tuir dezenhu no mos BOQ.		



#ANEXU C2 (MV-12) SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Reabilitação do Escritorio, ID Emis - 1096

Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto

Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

NO.	MAIN SUMMARY	Page No	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY ADN IP					
				Amount	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS MARCH		TOTAL TO DATE	
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3.075,00	\$ 2.125,00	3,37%	\$ -	0,00%	\$ 2.125,00	3,37%
II	REFURBISHED TEACHER OFFICE BUILDING Rf	RF/51	(i)	\$ 50.581,84	\$ 25.495,24	40,47%	\$ 1.708,65	2,71%	\$ 27.203,88	43,18%
A	CONSTRUCTION COST			\$ 53.656,84	\$ 27.620,24	43,84%	\$ 1.708,65	2,71%	\$ 29.328,88	46,56%
B	CONTIGENCIA			\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD			\$ 6.340,00	\$ 2.820,00	4,48%	\$ -	0,00%	\$ 2.820,00	4,48%
D	GRAND TOTAL			\$ 62.996,84	\$ 30.440,24	48,32%	\$ 1.708,65	2,71%	\$ 32.148,88	51,03%

Prepara husi :

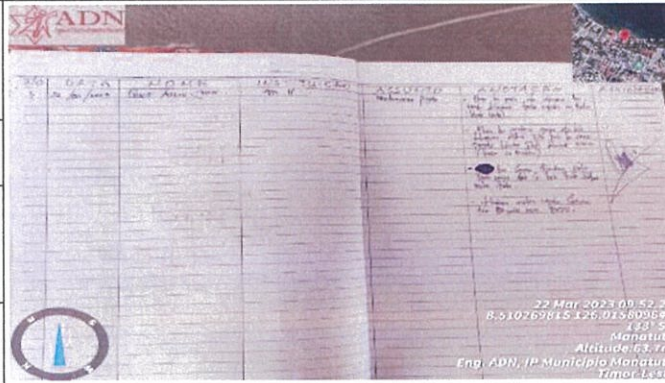
(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (MV-13) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau								
Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO RENTAU								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	22/03/2023	Manatuto Vila	Quico Adelino Junior	Engenheiru ADN IP Municipiu Manatuto	1	Husu ba grupu atu atensaun ba monta keramik tenke rapidu no metin (labele tarutu)		
					2	Husu ba engenheiru grupu atu bele komfirma didiak fila fali ho owner projetu konaba plint keramik ninian (troka ou manteim).		
					3	B servisu finishing pinta moru ninian se bele halo kabir molok atu tinta.		
					4	Kontinua aselera nafatin servisu tuir dezenhu no mos BOQ.		



#ANEXU C2 (MV-13) SUMMARY BOQ

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau

Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto

Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY			ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY A D N					
No	MAIN SUMMARY	Page No		Amount	Progress Previous		Progress March		Total To Date	
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3.075,00	\$ 1.950,00	3,03%	\$ -	0,00%	\$ 1.950,00	3,03%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	\$ 48.345,34	\$ 33.270,80	51,68%	\$ 7.505,64	11,66%	\$ 40.776,44	63,33%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/10	(i)	\$ 3.623,16	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST			\$ 55.043,50	\$ 35.220,80	54,70%	\$ 7.505,64	11,66%	\$ 42.726,44	66,36%
B	CONTIGENCY			\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD			\$ 6.340,00	\$ 1.795,00	2,79%	\$ -	0,00%	\$ 1.795,00	2,79%
D	GRAND TOTAL			\$ 64.383,50	\$ 37.015,80	57,49%	\$ 7.505,64	11,66%	\$ 44.521,44	69,15%

Prepara husi :

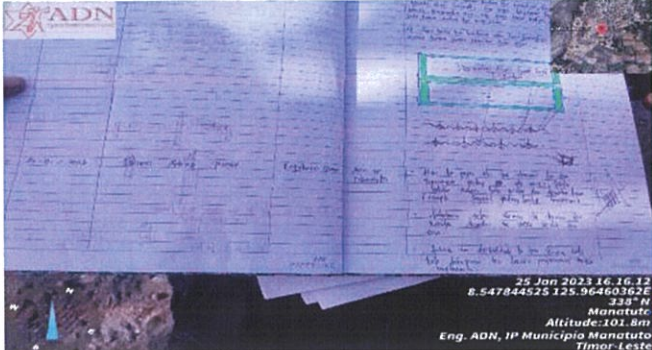
(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projeitu Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D2 (MV-14) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
					Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor			
					Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO REMBOR			
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	25/01/2023	Manatuto Vila	Quico Adelino Junior	Engenheiru AND IP Municipiu Manatuto	1	Husu ba grupu atu tau atensaun ba iha pasangan gording atu nune'e keta haluha assessoris balu iha dezenhu laran (Ezemplu pengikat gording bentuk trapezium)		
					2	Kontinua aselera servisu iha terrenu tuir nafatin dezenhu no mos BOQ ne'ebe iha ona.		
					3	Karik iha difikuldade ba item servisu balun bele komfirma ho tekniku responsavel molok implementa.		
					4			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-14) SUMMARY BOQ

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor

Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto

Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

NO	MAIN SUMMARY	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY ADN IP					
		Page No	AMOUNT	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS MARCH		PROGRESS TO DATE	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3 (i)	\$ 3.075,00	\$ 1.850,00	2,08%	\$ -	0,00%	\$ 1.850,00	2,08%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47 (i)	\$ 57.778,14	\$ 35.143,59	39,52%	\$ 779,62	0,88%	\$ 35.923,21	40,40%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/23 (i)	\$ 9.959,28	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST		\$ 70.812,42	\$ 36.993,59	41,60%	\$ 779,62	0,88%	\$ 37.773,21	42,48%
B	CONTIGENCIA		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD		\$ 6.340,00	\$ 3.310,00	3,72%	\$ -	0,00%	\$ 3.310,00	3,72%
D	GRAND TOTAL		\$ 88.918,34	\$ 40.303,59	45,33%	\$ 779,62	0,88%	\$ 41.083,21	46,20%

Prepara husi :

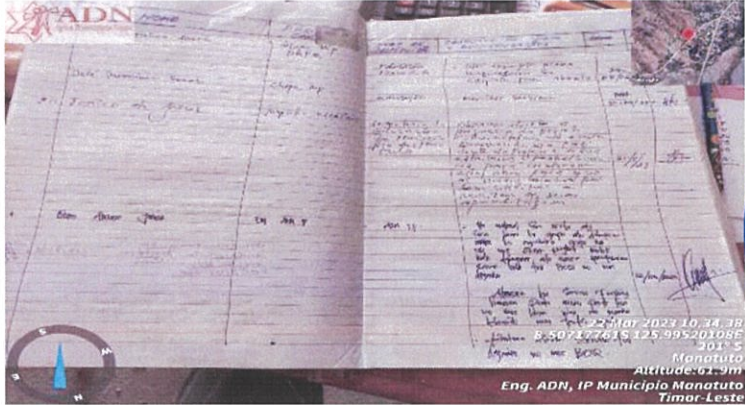
(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (MV-15) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
					Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato			
					Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO OBRATO			
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	22/03/2023	Manatuto Vila	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Ba material sira ne'ebe atu sosa husu ba grupo atu komfirma ho engenheiru grupo no mos owner project molok halo kompras atu nune'e spesifikasaun sasan bele tuir BOQ no mos dezenhu.		
					2	Atensaun ba servisu finishing hanesan pinta moru parte liur no mos laran nian no monta keramik tenke rapidu.		
					3	Kontinua selera servisu tuir Dezenhu no mos BOQ.		
					4			
					5			



#ANEXU C2 (MV-15) SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato
Lokalidade : Suco Sau, Posto Administrativo Manatuto
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY		ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY ADN IP					
No	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous Progress		Progress March		Total To Date	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 3.075,00	\$ 1.975,00	2,99%	\$ -	0,00%	\$ 1.975,00	2,99%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	\$ 48.332,46	\$ 32.498,49	49,13%	\$ 5.475,96	8,28%	\$ 37.974,45	57,41%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/11 (i)	\$ 5.397,19	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST		\$ 56.804,65	\$ 34.473,49	52,12%	\$ 5.475,96	8,28%	\$ 39.949,45	60,40%
B	CONTIGENCY		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD		\$ 6.340,00	\$ 1.372,50	2,07%	\$ -	0,00%	\$ 1.372,50	2,07%
D	GRAND TOTAL		\$ 66.144,65	\$ 35.845,99	54,19%	\$ 5.475,96	8,28%	\$ 41.321,95	62,47%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projeto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



#ANEXU C2 (MV-17)

SUMMARY

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA CENTRAL VASCO DA GAMA
FATIN PROJEITO : AITEAS, MANATUTO
DONO DO PROJEITO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

NO	ITEM SERVISU	AMOUNT US\$	PROGRESS REPORT BY A D N IP					
			Previous Progress		Progress March		Total to Date	
			Amount (US\$)	%	Amount (US\$)	%	Amount (US\$)	%
i	PRELIMINARIES WORKS	\$ 6.300,00	\$ 2.137,50	1,17%	\$ -	0,00%	\$ 2.137,50	1,17%
ii	CLASSROOM BUILDING C	\$ 49.620,84	\$ 3.924,82	2,15%	\$ 2.195,82	1,20%	\$ 6.120,65	3,35%
iii	TEACHER OFFICE	\$ 67.466,67	\$ 8.063,02	4,41%	\$ -	0,00%	\$ 8.063,02	4,41%
iv	TOILET BUILDING Tb	\$ 17.325,64	\$ 910,39	0,50%	\$ -	0,00%	\$ 910,39	0,50%
v	SITEWORKS	\$ 15.136,11	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 155.849,26	\$ 15.035,74	8,23%	\$ 2.195,82	1,20%	\$ 17.231,56	9,43%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 15.584,93	\$ 1.503,57	0,82%	\$ 219,58	0,12%	\$ 1.723,16	0,94%
C	OVERHEAD	\$ 3.100,00	\$ 775,00	0,42%	\$ -	0,00%	\$ 775,00	0,42%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 3.490,68	\$ 346,29	0,19%	\$ 48,31	0,03%	\$ 394,59	0,22%
E	CONTIGENCY	\$ 4.679,68	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
F	TOTAL COST (A + B + C + D + E)	\$ 182.701,57	\$ 17.660,60	9,67%	\$ 2.463,72	1,35%	\$ 20.124,31	11,01%

Prepara Husi :


(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico no Agua Saneamento
Município Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :


(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Engenheiro Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :


(Eng. Emerenciana Da Costa Maia)
Kordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de
Kualidade ADN, I.P.



Manatuto Municipality
Município de Manatuto

Manatuto Municipality
Município de Manatuto

#ANEXU C2 (MV - 18)

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation of Rembor Chainage 0 + 000 - 3 + 000 KM, Manatuto Municipality.
No. kontratu : RT/094/MOP-2021
Postu : Manatuto Villa
Sukos : Iliheu
Naran Kompania : Kartini Unip, Lda.

SUMMARY								
SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERECENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)						
R-01	General	\$ 5,800.00	\$ -	0.00%	\$ 1,150.00	0.29%	\$ 1,150.00	0.29%
R-05	Earth work	\$ 25,228.71	\$ -	0.00%	\$ 1,522.80	0.39%	\$ 1,522.80	0.39%
R-07	Sub-base, Base and Pavement	\$ 19,677.48	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Bituminous pavement	\$ 92,905.20	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-10	Structures	\$ 179,017.78	\$ -	0.00%	\$ -	0.27%	\$ -	0.27%
R-11	Dayworks	\$ 175.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.04%	\$ -	0.04%
R-15	Routine maintenance	\$ 6,992.32	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 329,996.49	\$ -	0.00%	\$ 2,672.80	0.99%	\$ 2,672.80	0.99%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 32,999.65	\$ -	0.00%	\$ 267.28	0.10%	\$ 267.28	0.10%
C	Generals item	\$ 23,472.23	\$ -	0.00%	\$ 2,517.25	0.64%	\$ 2,517.25	0.64%
D	Tax 2 % x (A+B+C)	\$ 7,729.37	\$ -	0.00%	\$ 109.15	0.03%	\$ 109.15	0.03%
E	GRAND/GROSS TOTAL		\$ -	0.00%	\$ 5,566.48	1.77%	\$ 5,566.48	1.76%

Inspeksaun Husi:

1. (José R. Carlos Gusmão)

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Matatuto, ADN.I.P

2. (Domingos D.X. Silva)

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irigação Munisipiu Matatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

Eng. Remigio Dos Santos

Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN.I.P



Project Name : Provision of Consultancy Service For Preparation of Detailed Engineering Design (DED) and Bidding Dokument for Lamara Bridge on National Road (A09-040 Under Road Network Upgrading Sector Project (RNSUP), Acces Bridge to Link Manehat to Natarbora, Manatuto Municipality

Consultant : PT Dhiramata Cipta Persada

Invoice Number : Interim Billing no. 01

Invoice Summary

Contract : \$ 242,400.00

No	DESCRIPTION	CONSULTAN/OWNER INVOICE				ADN RECOMMENDATION			Progress (%)
		Contract Amount	Previous Invoice	This Invoice	Total-to-Date	Previous Billing	This Billing	Total-to-Date	
		Original	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	
1	1st payment : Inception Report Ten percent (10%) of the contract price will be paid to the consultant for Inception Report after the inception Report was discussed and approved by the Owner	\$ 24,240.00	\$	\$ 24,240.00	\$ 24,240.00		\$ 24,240.00	\$ 24,240.00	10%
2	2nd payment : Interim Report Thirty percent (30%) of the contract price will be paid to the consultant after the Interim Report was discussed and approved by the Owner	\$ 72,720.00	\$ -	\$	\$ 0.00	\$ -		\$ -	0%
3	3rd payment : Draft Final Report Thirty percent (30%) of the contract price will be paid to the consultant after the Draft Final Report was discussed and approved by the Owner	\$ 72,720.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%
4	4th payment : Final Detailed Engineering Design (DED) Thirty percent (30%) of the contract price will be paid to the consultant after Final Detailed Engineering Design (DED) was reviewed, approved and Submitted to the Owner	\$ 72,720.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL CONTRACT PRICE		\$ 242,400.00	\$ -	\$ 24,240.00	\$ 24,240.00	-	24,240.00	24,240.00	10%

Verified by

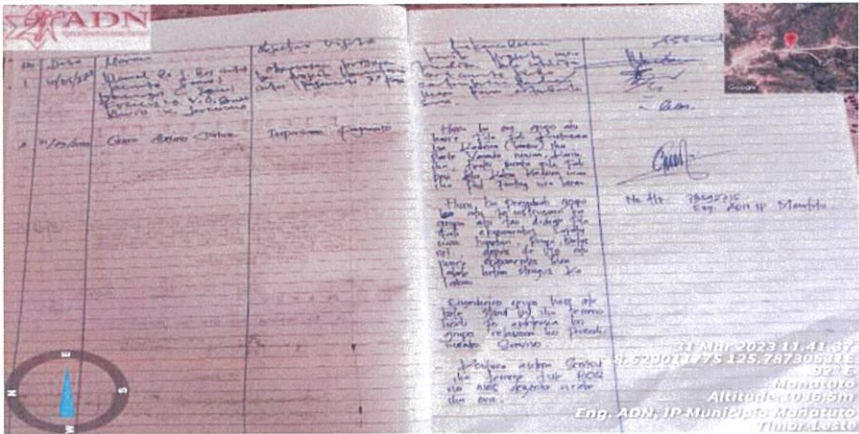
Certified by

Checked by


1. Tito Edgar F. N de Jesus
Eng. Projecto Imprestimo e consultant


Remigio dos Santos
Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (LA-7) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun								
Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO EBC Remanarun								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	31/03/2023	Manatuto/Laclo	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Husuba engenheiru grupu atu hare'e fila fali konstrusaun ba kadeira (banku) iha parte varanda ninian , karik iha, tenki monta fila fali besi ba kolom kadeira nian iha pad footing nia laran.		
					2	Husu ba presidente do grupo atu fo instrusaun ba grupo atu tau didiak fila fali ekipamentus safety ninian hanesan helm , rompi , botas nst. Depois de uja atu nune'e ekipamentos sira labele hetan stragus ka lakon.		
					3	Engenheiru grupo husu atu bele stand by iha terrenu hodi fo asistencia ba grupo relasiona ho procedimentu servisu.		
					4	Kontinua aselera servisu iha terrenu tuir BOQ no mos Dezenhu ne'ebe iha ona.		



#ANEXU C2 (LA-7)

Naran Projeitu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun
Lokalidade : Suco Hatuermera, Posto Administrativo Laclo
Projeitu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY					PROGRESS BY A D N					
No	MAIN SUMMARY	Page No		Amount	PROGRESS PREVIOUS		PROGRESS MARCH		TOTAL TO DATE	
					Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3.075,00	\$ 1.860,00	1,90%	\$ -	0,00%	\$ 1.860,00	1,90%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	\$ 49.095,82	\$ 19.815,07	20,21%	\$ 11.906,72	12,15%	\$ 31.721,79	32,36%
III	TOILET BULDING Tb	TB/39	(i)	\$ 24.265,03	\$ 6.650,80	6,78%	\$ 449,32	0,46%	\$ 7.100,11	7,24%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/24	(i)	\$ 12.248,77	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST			\$ 88.684,62	\$ 28.325,86	28,90%	\$ 12.356,04	12,61%	\$ 40.681,90	41,50%
B	CONTIGENCIA			\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD			\$ 6.340,00	\$ 1.712,50	1,75%	\$ 1.542,50	1,57%	\$ 3.255,00	3,32%
D	GRAND TOTAL			\$ 98.024,62	\$ 58.364,23	30,64%	\$ 26.254,58	14,18%	\$ 84.618,80	44,82%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)

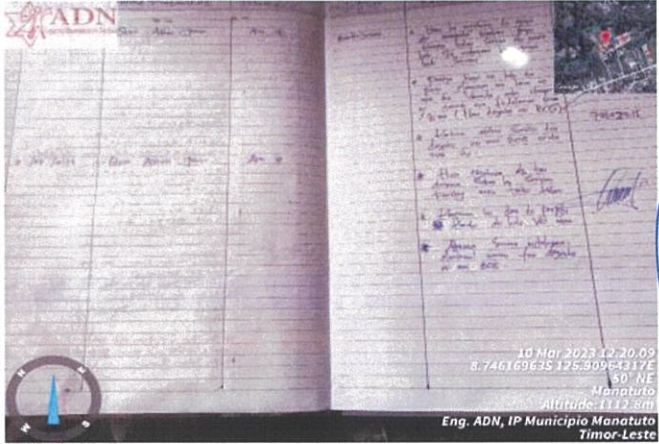
Eng. ba Projeto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VEL GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (LAC-8) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara								
Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO BATARA								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura
I	10/03/2023	Laclubar	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Husu enginheiru atu tau atensaun makas ba servisu finishing nian tenki kabers.		
					2	Komfirma ho dono do projetu konaba atu halo VO nian.		
					3	Atensaun servisu instalasaun Electrical ninian tuir dezenho no mos BOQ.		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (LAC-8)

TÍTULO DO PROJECTO : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA EBF BATARA
FATIN PROJEITO : BATARA, MANATUTO
DONO DO PROJEITO : MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

	MAIN SUMMARY	ORIGINAL CONTRACT		REPORT PROGRESS BY ADN IP					
NO.	WORK DESCRIPTION	AMOUNT US\$	WEIGHT (%)	Previous Progress		Progress March		Up to Date	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	\$ 3.575,00	3,50%	\$ 2.195,00	2,15%	\$ -	0,00%	\$ 2.195,00	2,15%
II	DEMOLITION	\$ 300,00	0,29%	\$ 300,00	0,29%	\$ -	0,00%	\$ 300,00	0,29%
III	CLASSROOM BUILDING	\$ 50.717,94	49,69%	\$ 33.887,89	33,20%	\$ 7.241,82	7,10%	\$ 41.129,70	40,30%
IV	TOILET BUILDING	\$ 25.427,93	24,91%	\$ 15.141,57	14,84%	\$ 1.594,84	1,56%	\$ 16.736,40	16,40%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	\$ 12.700,12	12,44%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 92.720,99	90,85%	\$ 51.524,46	50,48%	\$ 8.836,65	8,66%	\$ 60.361,11	59,14%
B	CONTIGENCY	\$ 3.000,00	2,94%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD	\$ 6.340,00	6,21%	\$ 2.204,50	2,16%	\$ 2.836,00	2,78%	\$ 5.040,50	4,94%
D	GRAND TOTAL	\$ 102.060,99	100,00%	\$ 53.728,96	52,64%	\$ 11.672,65	11,44%	\$ 65.401,61	64,08%

Prepara Husi :

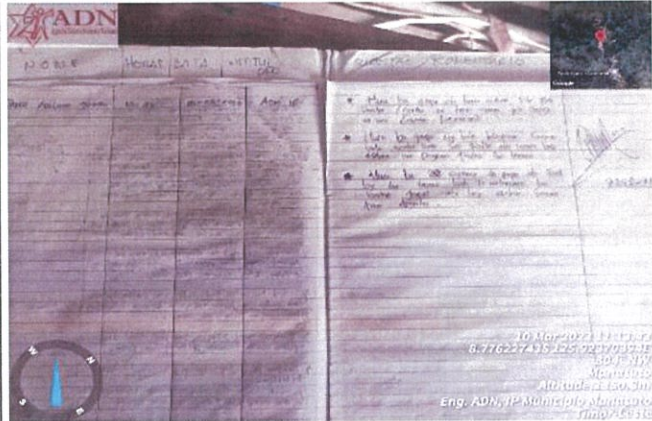
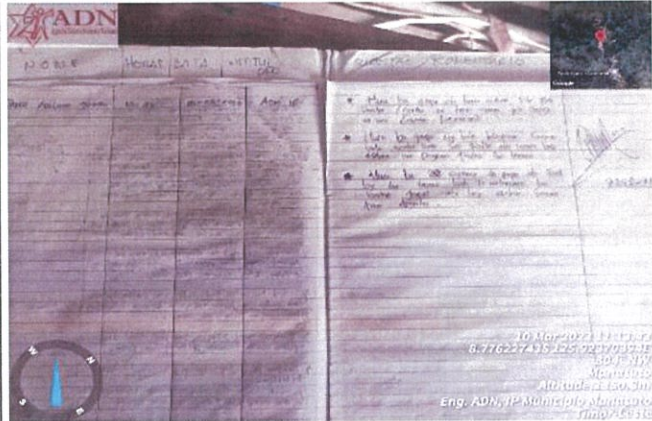
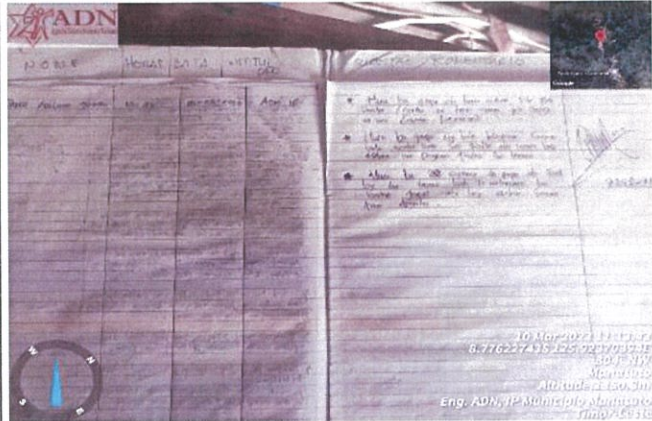
(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico no Agua
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público <tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">#ANEXU D1 (LAC-9) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN</td></tr> <tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um</td></tr> <tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO AISIU-UM</td></tr> <tr><th>No</th><th>Data inspesaun</th><th>Municipiu / Posto</th><th>Naran Eng.</th><th>Pozisaun</th><th>No</th><th>INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN</th><th>Fotografia</th><th>Asinatura</th></tr> <tr><td rowspan="5">I</td><td rowspan="5">10/03/2023</td><td rowspan="5">Laclubar</td><td rowspan="5">Quico Adelino Junior</td><td rowspan="5">Tek A D N, IP</td><td>1</td><td>Husu ba grupu atu haree didiak fila fali roster/grella ne tenki tuir ukuran iha BOQ no mos dezenhu (20 x 20cm).</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td></tr> <tr><td>2</td><td>Husu ba grupu atu bele kontinua servisu balu ne'ebe mak sei falta atu nune'e bele aselera nia progressu fiziku iha terrenu.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Husu ba engenheiru do grupu atu stand by iha terrenu hodi fo instrusaun ba badae grupu atu bele aselera servisu tuir dezenhu.</td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr>										#ANEXU D1 (LAC-9) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN								Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um								Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO AISIU-UM			No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura	I	10/03/2023	Laclubar	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Husu ba grupu atu haree didiak fila fali roster/grella ne tenki tuir ukuran iha BOQ no mos dezenhu (20 x 20cm).			2	Husu ba grupu atu bele kontinua servisu balu ne'ebe mak sei falta atu nune'e bele aselera nia progressu fiziku iha terrenu.	3	Husu ba engenheiru do grupu atu stand by iha terrenu hodi fo instrusaun ba badae grupu atu bele aselera servisu tuir dezenhu.	4		5	
					#ANEXU D1 (LAC-9) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN																																																	
					Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um																																																	
					Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO AISIU-UM																																																	
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Fotografia	Asinatura																																														
I	10/03/2023	Laclubar	Quico Adelino Junior	Tek A D N, IP	1	Husu ba grupu atu haree didiak fila fali roster/grella ne tenki tuir ukuran iha BOQ no mos dezenhu (20 x 20cm).																																																
					2	Husu ba grupu atu bele kontinua servisu balu ne'ebe mak sei falta atu nune'e bele aselera nia progressu fiziku iha terrenu.																																																
					3	Husu ba engenheiru do grupu atu stand by iha terrenu hodi fo instrusaun ba badae grupu atu bele aselera servisu tuir dezenhu.																																																
					4																																																	
					5																																																	



#ANEXU C2 (LAC-9)

SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um
Lokalidade : Suco Bora, Posto Administrativo Laclubar
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

		ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY A D N					
No	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PROGRESS PREVIOUS		PROGRESS MARCH		TOTAL TO DATE	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 3.075,00	\$ 1.725,00	1,72%	\$ -	0,00%	\$ 1.725,00	1,72%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i) \$ 51.145,96	\$ 16.047,63	16,02%	\$ 6.002,27	5,99%	\$ 22.049,90	22,01%
III	TOILET BULDING Tb	TB/39	(i) \$ 25.155,89	\$ 6.634,14	6,62%	\$ -	0,00%	\$ 6.634,14	6,62%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/24	(i) \$ 11.445,45						
A	CONSTRUCTION COST		\$ 90.822,30	\$ 24.406,77	24,37%	\$ 6.002,27	5,99%	\$ 30.409,04	30,36%
B	CONTIGENCIA		\$ 3.000,00						
C	OVERHEAD		\$ 6.340,00	\$ 1.220,00	1,22%	\$ -	0,00%	\$ 1.220,00	1,22%
D	GRAND TOTAL		\$ 100.162,30	\$ 25.626,77	25,59%	\$ -	5,99%	\$ 31.629,04	31,58%

Verifika Husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projeto Edificio Publico no Agua
Saneamento Municipio Manatuto ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P



#ANEXU C2 (LAL-3) SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui

Lokalidade : Suco Cairui, Posto Administrativo Laleia

Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

NO	MAIN SUMMARY	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS REPORT BY ADN IP					
		Page No	AMOUNT	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS MARCH		TOTAL TO DATE	
				Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)	Amount (US\$)	Weigth (%)
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 3.075,00	\$ 1.725,00	1,99%	\$ -	0,00%	\$ 1.725,00	1,99%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47 (i)	\$ 58.021,79	\$ 35.609,45	40,99%	\$ 641,66	0,74%	\$ 36.251,11	41,72%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/20 (i)	\$ 7.901,93	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST		\$ 68.998,72	\$ 37.334,45	42,97%	\$ 641,66	0,74%	\$ 37.976,11	43,71%
B	CONTIGENCIA		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
C	OVERHEAD		\$ 6.340,00	\$ 4.340,00	5,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.340,00	5,00%
D	GRAND TOTAL		\$ 86.883,29	\$ 41.674,45	47,97%	\$ 641,66	0,74%	\$ 42.316,11	48,70%

Prepara husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Supplay & Installation Main Power for Issolation & Lab Building
Ma'abat - Manatuto Municipality
No. kontratu : RDTL - MS - C19 - DNA - DC - 21 - 229

Data Inspesaun : 21 - 03 - 2023

Fatin Inspesaun : Manatuto Villa, Ma'abat

Koordinadas :

Start Point : Long : 8 8.538725S, Latetude : 126.009992E

End Point : Long : 8.5221277S, Latetude : 126.0069137E

Naran Inspector : Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Poste 12 m no Cabu Baixa Tensaun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Supplay & Installation Main Power for Issolation & Lab Building
Ma'abat - Manatuto Municipality
No. kontratu : RDTL - MS - C19 - DNA - DC - 21 - 229

Sketch Item servisu



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



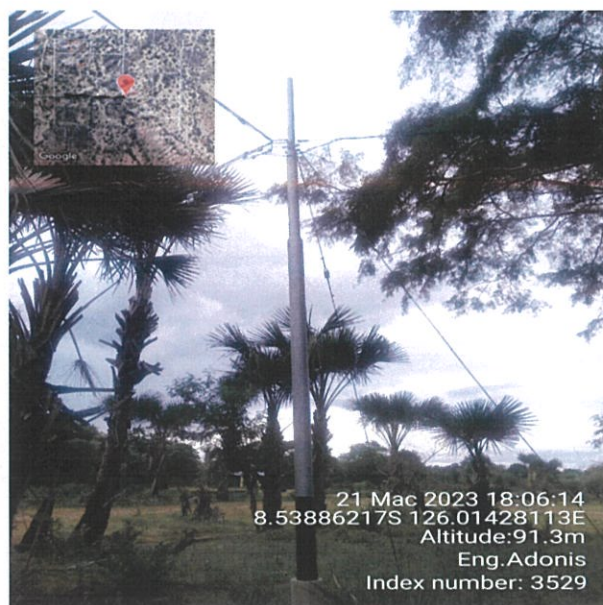
ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Supplay & Installation Main Power for Issolation & Lab Building
Ma'abat - Manatuto Municipality
No. kontratu : RDTL - MS - C19 - DNA - DC - 21 - 229



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Fiu Baixa tensaun tabele hela

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (MV-16)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Supplay and installation Main Power for Isolation and Laboratorium Building
Ma'abat - Manatuto Municipality

Kompanhia : Fraternity Unip. Lda

No	Data Inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	21/03/2023	Manatuto/ Manatuto Vila	Adonis Julio Fernandes	Tekniku, ME	1	Hadia ou halos poste 12 m nebe kleuk/ halis	
					2	Istika cabu baixa tensaun nebe table	
					3	Cross Check instalasaun Grounding ho installasaun Penankal Petir	
					4	Istika treckschoor nebe mak mamar	
					5		
					6		
					7		
					8		
					9		



MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO DA DILSA



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Quico Adelino Junior								2023																															
Município	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marcu																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MANATUTO VILA (MV)	3	Construção de novo Estádio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													On Going			
							Actual																																
	6	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																													On Going			
							Actual																																
	7	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																													On Going			
							Actual																																
	8	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	Baboe Unip Lda	019/Janeiro/2020	LM	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																													On Going			
							Actual																																
	9	Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Munisipiu Manatuto	Talamori Unip,Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	Fundo Covid-19	MINISTERIO SAUDE	Plan																													On Going			
							Actual																																
	10	New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227	Fundo Covid-19	MINESTERIO SAUDE	Plan																													On Going			
							Actual																																
	11	Supplay and Installation Main Power For Isolation an Laboratorium Building Maabat Manatuto	MINISTERIO SAUDE	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-229	Fundo Covid-19	MINESTERIO SAUDE	Plan																													On Going			
							Actual																																
	12	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													On Going			
							Actual																																
	13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MEJD PKRIE EBF RENTAU	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													On Going			
							Actual																																
	14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MEJD PKRIE PE REMBOR	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													On Going			
							Actual																																
	15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MEJD PKRIE EBF OBRATO	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													On Going			
							Actual																																

✱

Naran Eng.	Quico Adelino Junior							2023																																
Município	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marcu																															OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
SOIBADA (SO)	5	Projetu Rehabilitasaun EnsINU Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	6	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MEJD PKRIE EBF WEAIHUDIK		LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
BARIQUE (BA)	2	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	Tasibala II Const	RDTL/PO:2016-11272	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																														Abandona			
							Actual																																	
	4	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	Malack II Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	5	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	Malaca Unip Lda	No. Kontratu : MOP-W-190233	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	9	New Contruction of Gapura and Gabion Wall Protection no Jardim de Herois de Natarbora	Senizu Unip. Lda	215/MACLN/X/2021	LM	MACLN	Plan																															On Going		
							Actual																																	
LACLO (LA)	5	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	Esa-Un	RDTL:74/GMTAC/XI/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																														Pendente			
							Actual																																	
	6	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilimano	Surprise Unip. Lda	07/PDIM-II/MNTT/VIII/2016	PDIM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	8	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	.	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														On Going			
							Actual																																	
TOTAL PROJETO ON-GOING																																								

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili


Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

Eng. Quico Adelino Junior
(Eng. Projeto Edificio Publico, Agua e Saneamento Municipiu Manatuto, ADN.I.P.)

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
(Coordenador da Unidade de Controlo e Vandalasaun de Qualidade. ADN.I.P.)

Aprova Husi :

Eng. Januario Maia Guterres
(Adjunto Director Executivo, ADN.I.P.)

PLANU INSPESAUN

[illegible]

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		Marsu																														
								We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	18	Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of Municipio Roads Package 7 : Selo - Aileu to Gleno - Ermera (162)	Raya Konsultan LDA	MPW- Cs 2000020	LM	MOP	Plan																															
							Actual																															
	19	Preparation of Detail Engineering & Bidding Dokument Preparation for New Bridges in 2019 suco Liurai maubara 1 Bera Railako, Sanfuk, tutu luru same fahi nehan	Lelo eng. Unip Lda Jv, Pt.Muti Karidi - Guna Jasa & PT. Cipta Design Indonesia	MPW-Cs -2000032	LM	MOP	Plan																															
							Actual																															
	20	Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of Municipio Roads Package 2 : Uatulari - laisorulai	Bragtojul Unip Lda	MPW-CS -2000025	LM	MOP	Plan																															
							Actual																															
	21	For Preparation of detailed engineering for Rehabilitation of Municipios Roads Package 12 : Luca to Lacluta	Hilobadi Jv Pt. Siarplan Utama	MPW - CS- 2000022	LM	MOP	Plan																															
							Actual																															
	22	Preparation of Detailed Engineering For Rehabilitation of Municipio Roads Package : 1 JCT A - 16 (bobonaro) to lolotoe Town	Hilobadi Jv Pt. Siarplan Utama	MPW - CS- 2000030	LM	MOP	Plan																															
							Actual																															
	23	preparation of DED for Rehabilitation of Municipio Roads Package 10 : Soibada to Soibada town	Hilobadi Jv Pt. Siarplan Utama	MPW- CS 2000024	LM	MOP	Plan																															
							Actual																															
	24	Preparation of detailed Design for Rahabilitation municipio Roads Package 4 : turiscail to Alas	Wan Husin & Associates SDN. BHD Jv Consultant & eng. Intercontinental Unip Lda	MPW- CS 2000028	LM		Plan																															
							Actual																															
	25	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Detile Consultant	MPW- CS 2000029	LM	MOP	Plan																															
							Actual																															
	26	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Detile Consultant	MPW- CS 2000027	LM	MOP	Plan																															
							Actual																															
	27	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Nieces Unip Lda	MPW- CS 2000026	LM	MOP	Plan																															
							Actual																															
	28	Preparation of Detailed Engineering & bid Preparation for new Bridge in 2019 package 1 : Samalari, sana uatulari- lai sorulai, sumaco (lacluta uma tolu) molas matadoro - RTK, Comoro mota ulun	Vox Da Vinci Consultant Engineering Lda	MPW- CS 2000031	LM	MOP	Plan																															
							Actual																															
	29	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Team Consultant Jv. ATT & ATT & Triangle	MPW- CS 2000021	LM	MOP	Plan																															
							Actual																															
	30	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Aureum Solis Consultant, Unip Lda Jv PT Bikarna	MPW- CS 2000033	LM	MOP	Plan																															
							Actual																															
	31	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	PT. Bikarna JV Aureum Solis Consultant, Unip Lda	MPW- CS 2000023	LM	MOP	Plan																															
							Actual																															
32	Intersection in the Existing dili liquisa road to conec akses road from tibar Bay Port	TPF Timor Unipessoal Lda	REP/009/MOP/2019	FI	MOP	Plan																																
						Actual																																
33	Preparation Deitaled Design for Enginnering Desing Dili Urban Roads	Kiat Konsultan				Plan																																
						Actual																																
34	Konsultan Suprevisi for Konstruction Suprevison of daradau irigation Schema	PT.Suanda karya Jv KWK	REP/042/MAP/2017	FI	MOP	Plan																																
						Actual																																
35	Suprevison Consultant for Construction of Intersection in the Existing Dili-Liquisa Road to Connect Access Road from Tibar Bay port (National Road)	Lelo Unipessoal Lda.			LM	MOP	Plan																															
						Actual																																
36	Preparation of Detailed Engineering Design (DED) For New Cable Stayed Bridge Over the Becusse River, in Dili Total Length +	TPT Timor Unip Lda			LM	MOP	Plan																															
						Actual																																
37	Rehabilitation OF Municipality Roads Package 4 Section Laga Baguia Sta 0+ 000 - sta 38 + 030	Norinco Internacional Corporation Lda	ICB/ 053/MOP/ 2022	FI	MOP	Plan																																
						Actual																																
38	Rehabilitasaun of Estrada Municipais Pakote 3 Uacala - Quelical Para Ossu Sta 0+000 - Sta 22 + 700 Municipio de Baucau - Viqueque		ICB/ 054/MOP/ 2022	FI	MOP	Plan																																
						Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																						

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :



(Eng. Aniceto da Costa.)

Eng. PMU ba Projeto (Impréstimo), ADN, I.P.

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.

Aprova Husi :



(Eng. Januario Maia Guterres)

Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.

PLANU INSPESAUN

[illegible]



2023

[illegible]

PLANU INSPESAUN

[illegible]

PLANU INSPESAUN

[illegible]

**SERVISU BA
KONSULTAN DESIGN
SEI AJUSTA TUIR
PLANO HUSI
PROJECTO NAIN .OU
BAZEIA BA
DOKUMENTOS
KONSULTAN NIAN
NEBE SUBMETE MAI
HUSI PROJECTO
NAIN.**



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	José R.Carlos Gusmão						2023																																
Município	Manatuto																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MANATUTO VILA (MV)	1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	SSS/061/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	ICB/023/MPW-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	5	Consultant Supervision (M-L & L-N)	Sinotech Engineering Consultant		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																On Going
							Actual																																
18	Rehabilitasaun Estrada Rural Rembor, Chainage 0+000-3+000 Km	Kartini Unipessoal Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
						Actual																																	
LALEIA (LAL)	3	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	As Jazesia Unipessoal Lda	MPW-W-210055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																On Going
							Actual																																
LACUBAR (LAC)	2	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	China Nuclear Industry 22ND Construction Co, LTD	ICB/04/MPW-2014	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																On Going
							Actual																																
	5	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	Hatuwari Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190035	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	6	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	Ryzena Unipessoal Lda	MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	MPW-W-210057	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
8	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	MPW-W-210056	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going		
						Actual																																	
SOIBADA (SO)	1	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	FIRDO UNIPessoal LDA	SSS/013/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	4	R4D Rural Road Spot Improvement Maniala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	Manufahi Kiik Unip. Lda	MPW-W-210059	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	Ryzena Unipessoal Lda	MPW-W-210060	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

2023

TOTAL PROJETO ON-GOING

Notes:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi

(Eng. José R.Carlos Gusmão

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e Irrigação Municipal, Manatuto, ADN I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas

Coordenadora da Unidade de Controle e Validação de Qualidade, ADN I E

Approva Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo, ADN I.P.

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO  ADN, LP							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Domingos D. X. Silva						2023																																
Município	Manatuto																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Marco																															OBS
MANATUTO VILA (MV)	1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	On Going
							Actual																																
	2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	SSS/061/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	On Going
							Actual																																
	4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	R D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	ICB/023/MPW-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	5	Consultant Supervision (M-L & L-N)	Sinotech Engineering Consultant		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																On Going
							Actual																																
	18	Rehabilitasaun Estrada Rural Rembor, Chainage 0+000-3+000 Km	Kartini Unipessoal Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	On Going
							Actual																																
LALEIA (LAL)	3	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	As Jazesia Unipessoal Lda	MPW-W-210055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	On Going
							Actual																																
LACLUBAR (LAC)	2	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	China Nuclear Industry 22ND Construction Co, LTD	ICB/04/MPW-2014	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	5	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	Hatuwari Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190035	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going		
							Actual																																
	6	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	Ryzena Unipessoal Lda	MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going		
							Actual																																
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	MPW-W-210057	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	Adahiak Orfao Unipessoal Lda	MPW-W-210056	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
SOIBADA (SO)	1	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	FIRDO UNIPESOAAL LDA	SSS/013/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going		
							Actual																																
	4	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	Manufahi Kiik Unip. Lda	MPW-W-210059	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going		
							Actual																																
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	Ryzena Unipessoal Lda	MPW-W-210060	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going		
							Actual																																

Handwritten signature or mark.

[illegible]

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng. Domingos D. X. Silva)
Eng. ba Projeto Infraestrutura Transporte e Irrigação Municipal
Manatuto, ADN LP

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN LP

Aprova Husi :

(Eng. Januario Mata Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo, ADN LP

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																			
Naran Eng.	Adonis Julio Fernandes						2023																																			
Município	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																									
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	MARCU																															OBS			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MANATUTO VILA (MV)	1	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MEJD PKRIE EBF BATARA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			
	2	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			
	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			
	4	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			
	5	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MEJD PKRIE EBF RENTAU	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			
	6	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			
	7	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MEJD PKRIE EBF OBRATO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			
	8	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			
	9	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	Baboe Unip Lda	019/Janeiro/2020	LM-BS	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																																			
							Actual																																			
	10	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																			
							Actual																																			
	11	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																			
							Actual																																			
	12	Costrusaun Fatin Izolamento Iha Municipio Manatuto	Talamori Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	LM	SAUDE	Plan																																			
							Actual																																			
13	Supplay and installation Main Power for Isolation and Laboratory Building Maabat Manatuto	Fraternity Unip.Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-229	LM	MINISTERIO DA SAUDE	Plan																																				
						Actual																																				
14	Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto	Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda	-	LM-CD	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																				
						Actual																																				
1	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MEJD PKRIE EP CAIRUI	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																				
						Actual																																				
2	Rehabilitasaun Kampu Foteboli iha Postu Administrativu Laleia	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/VII/DILI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																				
						Actual																																				
1	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	Tasibala III Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				
						Actual																																				
