



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN PROJETUS
MUNISÍPIU AINARO

MARSU 2023




SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTASAUN PROJETU INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO AINARO

MARSU 2023


Prepara Husi :


(Eng. Joaquim de C. Madeira)


Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro ADN, I.P


(Eng. Romulo J. Marques Henrique)


Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, Município Ainaro ADN, I.P


(Eng. Claudino Soares dos Santos)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro ADN, I.P


(Eng. Jaulino H. Rodrigues)

Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, Município Ainaro ADN, I.P



(Silvino D R R Soares)

Eng. M & E, Município Ainaro ADN, I.P

Verifika Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)

Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu, ADN, I.P


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)

Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e
Irigasaun, ADN, I.P


(Deolindo de F Marques)


Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)

Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal	3
1.2 Perfil Municipio Ainaro	3
1.3. Lista Projectos	6
II. PROGRESU FISIKU	14
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	14
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	14
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	14
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	15
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	15

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamientos	6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores	8
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio	11
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro	13

I. INTRODUSAUN

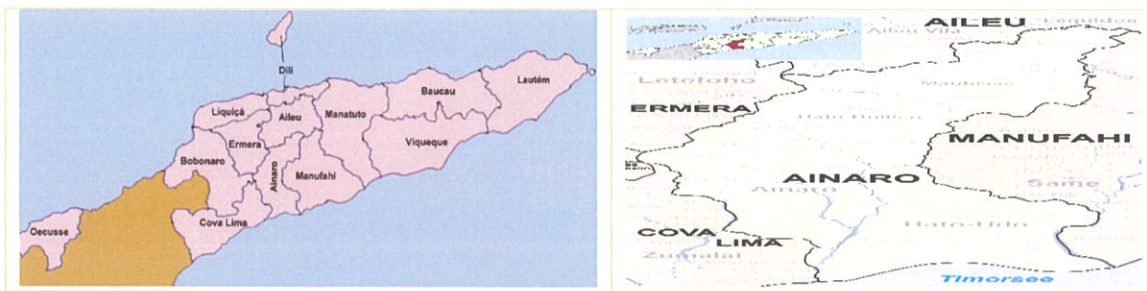
1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional, I.P ou ADN, I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN, I.P nian maka atu aseguira katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ADN, I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimento nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvimento nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno caso presiza.

1.2 Perfil Municipio Ainaro



Administrasaun Munisipal Ainaro lokalizadu iha sudoeste paíz no mapa 2. hatudu pozisaun jeográfiku Munisipiu Ainaro ne'ebé ho luan 797 km² ho populasau nain 59,175 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Ainaro iha Postu Administraativo ha'at, Sukus 21 no Aldeias 131 hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1: Ponto Administrativo, Sukus no Total Aldeias/Sukus

Ainaro		Hatu Bulico		Hatu Udo		Maubisse	
Sukus	Aldeias	suku	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Ainaro	7	Mauchiga	7	Foho-Ailico (beikala)	6	Aituto	9
Cassa	5	Mulo	8	Leolima	10	Edi	6
Manutaci	4	Nuno Moge	6	-	-	Fatubessi	6
Mau-Nuno	3	-	-	-	-	Horai-Quic	4
Mau-Ulo	5	-	-	-	-	Liurai	4
Soro	4	-	-	-	2	Manelobas	4
Suro-Craic	4	-	-	-	4	Manetu	7
-	-	-	-	-	-	Maubisse	12
-	-	-	-	-	-	Maulau	10
Total	32	-	21	-	22	-	62

Data husi : Livro 3B OJE 2021, Pajina 22

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro			4			4	
2	Administrasaun no Financas			0			0	
3	Motorista			1			1	
4	Seguransa			0			0	
	Grand Total			5			5	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro

ASET ADN,IP MUNICIPIO AINARO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio			1			1	Moru hadia, monta tralis
2	Kareta			1			1	Kondisaun ladun diák
3	Desktop HP / Monitor			1			1	Diak
4	Laptop HP			1			1	Todan presija update
5	Printer Cannon			1			1	Diak
6	UPS			1			1	Aat
7	Armario File			2			2	Diak
8	Armario Tau hena			2			2	Aat 1
9	Meja escritorio			1			1	Diak
10	Meja han			1			1	Aat
11	Meja TV (kiik)			1			1	Diak
12	Kadeira escritorio			6			6	Diak
13	Kadeira han			4			4	Att 2
14	Sofa			1 Set			1	Diak
15	Springbed +sumasu 4			2 Set			2	Diak (sumasu laiha)
16	Jeleira			1			1	Diak
17	Water Dispenser			1			1	Aat
18	TV + Parabola			1 Set			1	Aat
19	Kipas Angin			5			5	Aat
20	Kompor			1			1	Diak
21	Kompor Gas			1			1	Aat
22	Rack sepatu			3			3	Aat
23	Rack Piring			1			1	Diak
24	Water Pump Sanyo			1			1	Aat

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dados projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + PDIM + LM - BS + LM - TP		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	21	\$ 18,295,245.66	62.76%
2	Hatubuilico	12	\$ 7,047,176.63	75.59%
3	Hatudo	11	\$ 2,758,198.43	19.53%
4	Maubisse	21	\$ 6,403,710.91	65.84%
Grand Total		65	\$ 34,504,331.63	62.49%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	9	\$ 16,060,460.02	65.48%
2	Hatubuilico	2	\$ 5,417,567.63	87.48%
3	Hatudo	5	\$ 1,770,459.15	13.94%
4	Maubisse	9	\$ 5,130,827.23	73.69%
Grand Total		25	\$ 28,379,314.03	67.95%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	\$ 1,376,091.81	31.34%
2	Hatubuilico	7	\$ 1,379,650.79	36.81%
3	Hatudo	2	\$ 686,368.28	20.86%
4	Maubisse	3	\$ 433,853.68	16.23%
	Grand Total	17	\$ 3,875,964.56	29.74%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	3	\$ 450,461.58	63.74%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 84,160.28	87.69%
	Grand Total	4	\$ 534,621.86	67.51%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo	1	\$ 24,446.00	90.00%
4	Maubisse			
	Grand Total	1	\$ 24,446.00	90.00%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	4	\$ 408,232.25	60.41%
2	Hatubuilico	3	\$ 249,958.21	31.83%
3	Hatudo	3	\$ 276,925.00	45.80%
4	Maubisse	7	\$ 730,876.53	36.89%
	Grand Total	17	\$ 1,665,991.99	43.38%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Emergency		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 23,993.19	90.00%
	Grand Total	1	\$ 23,993.19	90.00%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO AINARO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	1	\$ 546,598.02	22.89%
2	Edukasaun	18	\$ 2,079,402.69	42.05%
3	Eléctricidade	10	\$ 7,999,431.74	73.14%
4	Estradas E Pontes	14	\$ 16,390,876.84	55.39%
5	Flood Control	2	\$ 108,153.47	88.20%
6	Imprestimo	1	\$ 4,187,508.61	92.29%
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	14	\$ 2,500,306.12	57.72%
8	Pontes	1	\$ 273,148.15	12.71%
9	Saude	2	\$ 242,372.02	43.02%
10	Turismo	2	\$ 176,533.97	51.95%
	Grand Total	65	\$ 34,504,331.63	62.49%

NO	SECTOR PROYECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	1	\$ 546,598.02	22.89%
2	Edukasaun	4	\$ 520,065.09	65.99%
3	Eléctricidade	3	\$ 2,130,985.59	80.80%
4	Estradas E Pontes	6	\$ 13,670,136.67	63.64%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 815,683.40	44.91%
8	Pontes	1	\$ 273,148.15	12.71%
9	Saude	2	\$ 242,372.02	43.02%
10	Turismo	1	\$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	21	\$ 18,295,245.66	62.76%

NO	SECTOR PROYECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	3	\$ 249,958.21	31.83%
3	Eléctricidade	1	\$ 1,230,059.02	71.11%
4	Estradas E Pontes	2	\$ 854,631.59	12.87%
5	Flood Control			
6	Imprestimo	1	\$ 4,187,508.61	92.29%
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	4	\$ 444,741.95	88.24%
8	Pontes			
9	Saude			
10	Turismo	1	\$ 80,277.25	6.83%
	Grand Total	12	\$ 7,047,176.63	75.59%

NO	SECTOR PROYECTO	Hatudo		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	4	\$ 578,502.86	31.47%
3	Eléctricidade	1	\$ 384,790.42	22.85%
4	Estradas E Pontes	4	\$ 1,482,565.12	13.98%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	2	\$ 312,340.03	19.72%
8	Pontes			
9	Saude			
10	Turismo			
	Grand Total	11	\$ 2,758,198.43	19.53%

NO	SECTOR PROYECTO	Maubisse		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	7	\$ 730,876.53	36.89%
3	Eléctricidade	5	\$ 4,253,596.71	74.44%
4	Estradas E Pontes	2	\$ 383,543.46	16.18%
5	Flood Control	2	\$ 108,153.47	88.20%
6	Imprestimo			
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	5	\$ 927,540.74	67.15%
8	Pontes			
9	Saude			
10	Turismo			
	Grand Total	21	\$ 6,403,710.91	65.84%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	1	\$ 84,160.28	87.69%
2	Ministerio Das Obras Publicas	39	\$ 30,861,164.82	64.94%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	19	\$ 2,103,848.69	42.61%
4	Ministerio Saude	2	\$ 242,372.02	43.02%
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	22.89%
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria	1	\$ 80,277.25	6.83%
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
8	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		65	\$ 34,504,331.63	62.49%

NO	DONO DO PROJECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal			
2	Ministerio Das Obras Publicas	12	\$ 16,400,299.98	64.59%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	4	\$ 520,065.09	65.99%
4	Ministerio Saude	2	\$ 242,372.02	43.02%
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	22.89%
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
8	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		21	\$ 18,295,245.66	62.76%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat			
2	Ministerio Das Obras Publicas	8	\$ 6,716,941.17	78.04%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	3	\$ 249,958.21	31.83%
4	Ministerio Saude			
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria	1	\$ 80,277.25	6.83%
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope			
	Grand Total	12	\$ 7,047,176.63	75.59%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat			
2	Ministerio Das Obras Publicas	6	\$ 2,155,249.57	15.53%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	\$ 602,948.86	33.85%
4	Ministerio Saude			
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope			
	Grand Total	11	\$ 2,758,198.43	19.53%

NO	DONO DO PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat	1	\$ 84,160.28	87.69%
2	Ministerio Das Obras Publicas	13	\$ 5,588,674.10	69.30%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	7	\$ 730,876.53	36.89%
4	Ministerio Saude			
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope			
Grand Total		21	\$ 6,403,710.91	65.84%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Produktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Ainaro	16,823	7170	6636	5567	5058
Hato-Udo	10,747	3130	2923	2415	2279
Hato-Builico	13,249	3457	3365	3241	3186
Maubisse	24,672	6378	6309	6222	5764

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu neébe hetan husi progresu fulan ida neé, ikus liu porsentagen actual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detallu bele hareé iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hareé #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Obstaclo neébe ami enjineiru hasoru iha terenu mak hanesan tuir mai ne'e :

1. Kompanhia nia tekniku laiha terenu
 2. Kompanhia neébe ka'er obra iha Municipio Ainaro iha hotu Dili
 3. Teknik husi Projetu nain ladun halo inspesaun ba iha terenu
 4. Kondisaun kareta ne'ebe Suporta Ekipa ADN, I.P iha tereno ho kondisaun ne'ebe sei aat
- Obstaclo parte Eletricidade
1. Durante Eng ADN, I.P halo monitorin directur kompahnia nunka iha fatin projeto e delega ema balun mak sempre hein iha fatin projeto.
 2. Kompahnia balun mak to agora sedauk hadia konstruk Linha MV & LV nebe mak avaria.
 3. Iha kompahnia seluk hein hela karta termo de entrega 10% husi EDTL – EP municipio ate agora sedauk fo ba kompahnia.
 4. Seksaun M & E - ADN, I.P sempre hasoru mak kona ba motorist.
 5. Seksaun M & E – ADN, I.P labele kontrola masimu projeto electricidade ho edificio public tamba Eng M & E – ADN, I.P ida kontrola municipio ha'at (4).

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Buka solusaun ba projetu ne'ebe parado
2. Sistema Internet iha Municipio lalao ho diak ho difikulta enjineiru nia servisu
3. Kondisaun Rezidesia Oficial ADN, I.P Municipio Ainaro ne'ebe presija atu hadia:
 - Be'e
 - Moru
 - Tralis Jenela

➤ **Recomendação parte Eletricidade**

1. Seksaun M & E husu parte rekursu Humanu atu aumenta tan funsionario M & E.
2. Seksaun M & E – ADN, I.P husu ba ITC tenki kria folder sistem keta ida mai iha seksaun M & E – ADN, I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Ainaro

Força de Trabalho ADN, I.P. Municipio Ainaro						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engineiro	Romulo J. M. Henrique	174	Enjineiru ITI		
		Joaquim de C. Madeira	167	Enjineiru EPAS		
		Claudino Soares Dos Santos	243	Enjineiru EPAS		
		Jaulino H. Rdrigues	237	Enjineiru ITI		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		

2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Lucas Alberto Soares Pereira	195	Motorista		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA ESCOLA BASICA FILIAL LIAS
LOCATION : SUCO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY						
MAIN SUMMARY			PREVIOUS MONTH		THIS MONTH	
			Amount	PERCENT %	Amount	PERCENT %
						UP TO DATE
					Amount	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ 3,575.00	2.21%	\$ -	\$ 2,275.00 2.21%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 50,185.26	30.89%	\$ 940.99	\$ 32,791.62 31.80%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US\$ 25,178.89	12.14%	\$ 135.83	\$ 12,653.99 12.27%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US\$ 14,827.89	0.00%	\$ -	\$ - 0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 93,767.04	45.24%	\$ -	\$ 47,720.61 46.28%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	0.00%	\$ -	\$ - 0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	2.27%		\$ 2,345.00 2.27%
GRAND TOTAL			US\$ 103,107.04	47.51%	\$ 1,076.82	\$ 50,065.61 48.56%

\$ 48,988.79 47.51%

Inspesasaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu, Município Ainaro
ADN, I.P.

Verfika Husi :

(Arc. Francisco X D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé Saneamentu, Município Ainaro
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P.



PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL LUAN CADOI
LOCATION : SUCO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO
AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MOUNTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ 3,575.00	\$ 1,975.00	2.00%				
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 49,729.55	\$ 39,693.29	40.28%	\$ -	0.00%	\$ 39,693.29	40.28%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US\$ 25,016.07	\$ 14,389.09	14.60%	\$ 848.39	0.86%	\$ 15,237.48	15.46%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US\$ 10,894.12	\$ -	0.00%			\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 89,214.74	\$ 56,057.38	56.88%			\$ 56,057.38	56.88%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%			\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,310.00	1.33%			\$ 1,310.00	1.33%
GRAND TOTAL			US\$ 98,554.74	\$ 57,367.38	58.21%	\$ 848.39	0.86%	\$ 58,215.77	59.07%

Inspesasaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Bee Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Bee
Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA ERNARO
LOCATION : SUCO NUN MOGE, POSTO ADMINISTRATIVO HATU BUILICO,
MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$ 3,575.00	\$ 2,275.00	2.26%	\$ -	0.00%	\$ 2,275.00	2.26%
II	DEMOLITION	DM/3	US\$ 200.00	\$ 200.00	0.20%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.20%
III	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 50,798.26	\$ 36,715.84	36.48%	\$ 13,426.32	13.34%	\$ 50,142.16	49.82%
IV	TOILET BUILDING TB	CB/50	US\$ 25,500.85	\$ 14,397.27	14.30%	\$ 5,841.56	5.80%	\$ 20,238.83	20.11%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US\$ 11,235.41	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 91,309.51	\$ 53,588.11	53.24%	\$ 19,267.88	19.14%	\$ 72,855.99	72.39%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 2,576.00	2.56%	\$ -	0.00%	\$ 2,576.00	2.56%
GRAND TOTAL			US\$ 100,649.51	\$ 56,164.11	55.80%	\$ 19,267.88	19.14%	\$ 75,431.99	74.95%

Inspesauun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Públiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Públiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P.

Verifica husi :
(Arc. Francisco X. D. D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Públiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun
de Qualidade,
ADN, I.P.



PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA FILIAL TUCARO
LOCATION : HATUBULICO, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

MAIN SUMMARY		Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,329.26	\$ 2,241.76	3.31%	\$ -	0.00%	\$ 2,241.76	3.31%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 50,948.05	\$ 16,843.10	24.84%	\$ 333.96	0.49%	\$ 17,177.06	25.33%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 4,183.95						
CONSTRUCTION COST			US\$ 58,461.26	\$ 19,084.86	28.15%	\$ 333.96	0.49%	\$ 19,418.82	28.64%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00						
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 2,452.50	3.62%	\$ -	0.00%	\$ 2,452.50	3.62%
GRAND TOTAL			US\$ 67,801.26	\$ 21,537.36	31.77%	\$ 333.96	0.49%	\$ 21,871.32	32.26%

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifica husi :

(Arc. Francisco X/D D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualide
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO
BERMOLI
LOCATION : POSTU ADMINISTRATIVO MAUBISSE, SUCCO MANLAU, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY									
	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		THIS MONTH	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,079.26	\$ 2,723.22	3.15%	\$ -	0.00%	\$ 2,723.22	3.15%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C/39 (i)	US\$ 61,149.43	\$ 36,228.28	41.90%	\$ 13,610.40	15.74%	\$ 49,838.68	57.64%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 12,902.81	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 77,131.50	\$ 38,951.50	45.05%	\$ 13,610.40	15.74%	\$ 52,561.90	60.79%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 2,600.00	3.01%	\$ -	0.00%	\$ 2,600.00	3.01%
GRAND TOTAL			US\$ 86,471.50	\$ 41,551.50	48.05%	\$ 13,610.40	15.74%	\$ 55,161.90	63.79%

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Bee Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Afc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Bee Saneamentu,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P.




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN						
Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Município de Ainaro (EBF LIAS)						
Kompanha : Grupo Komunitario						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN
I	07/03/2023	Ainaro	Joaquim Madeira & Claudio S. Santos	Tech AND.IP	1	Ekipa AND. IP halo inspesaun iha tereno, maibe grupu ho Eng de Grupi Laiha.
						Asinatura
						
						



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN																			
Naran projeto : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BÁSICA FILIAL BETULALA																			
Kompanha : Grupo Komunitari																			
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun															
I	29/03/2023	Maubessi/Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tecnico AND.IP															
<table><thead><tr><th>No</th><th>INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN</th><th>Asinatura</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Husu ba Grupu atu mantein hodi hein pedido pagamento</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>wainhira hetan oa pagamento husu ba Grupu atu aselera servisu</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Mantein Qualidade, BOQ, No desenho</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	1	Husu ba Grupu atu mantein hodi hein pedido pagamento		2	wainhira hetan oa pagamento husu ba Grupu atu aselera servisu		3	Mantein Qualidade, BOQ, No desenho		4		
No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura																	
1	Husu ba Grupu atu mantein hodi hein pedido pagamento																		
2	wainhira hetan oa pagamento husu ba Grupu atu aselera servisu																		
3	Mantein Qualidade, BOQ, No desenho																		
4																			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Município de Ainaro (EBF. LUAN CADOD)									
Kompanha : Grupo Komunitari					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
No					No				
Data inspesaun					Municipiu / Posto				
Naran Eng.					Pozisaun				
I					07/03/2023				
Ainaro					Joaquim Madeira & Claudino S. Santos				
Tech AND.IP					1				
2					Ekipa technico AND. IP Ainaro halo inspeksaun baseia ba pedido nebee mak rekomenda husi projeto nai.				
Ekipa Technico AND. IP Ainaro halo inspeksaun ba pedidu pagamento iha tereno, maiba presensa grupu komunitario ho engineiro G. Komunitario laiha					Asinatura				



MINISTÉRIO DO PLANO
E O R D E N A M E N T O
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hato-Udo Municipio de Alinaro(EBF. HUT-SEO)					
Kompanha : Grupo Komunitari					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	21/03/2023	Hut-seo/Hato-udo Vila	Joaquim Madeira & Claudino Soares dos Santos	Teknico AND. IP	1
					2

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura
Ekipa AND. IP halo inspesaun iha tereno, grupu komunitario ho Enginheiro do Grupo laiha		
Ekipa Observa progresso iha tereno, progressu mantein, tamba material konstrusaun hotu.		



MINISTÉRIO DO PLANO
E O R D E N A M E N T O
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubulico Município de Ainaro. (ERNARO)				
Kompanha : Grupo Komunitari				
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun
I	09/03/2023	Hato bulico/ Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino Soares dos Santos	Teknico
No				
Instrusaun / Rekomendasaun				
Asinatura				
Ekipa tecnico AND. IP municipio Ainaro halo inspeksaun iha tereno, grupu Komunitario laiha, eng husi G. Komunitario laiha.				
observasasaun nebe mak ekipa AND. IP observa ha tereno, fisicannete prokeito refere liur ho laran husi sala de aula nian, plester hotu ona, harris fatin mak sedauk pleste.				
1				
2				
3				
4				
5				



MINISTÉRIO DO PLANO
E O R D E N A M E N T O
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

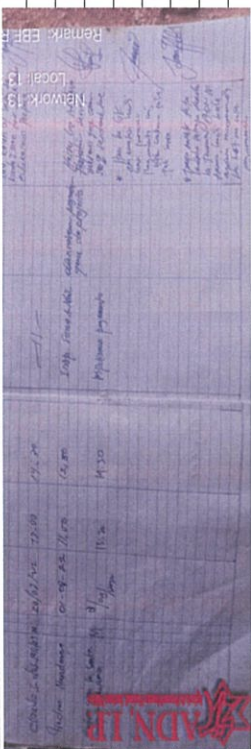


ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubulico Município de Ainaro (TUKARRO)				
Kompanha : Grupo Komunitari				
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun
I	24/03/2023	Hato bulico/AINARO	Joaquim Madeira	Tecnico
			Claudino Soares dos Santos	
No	No			Asinatura
	1			Ekipa AND. IP ainaro halo inspeksaun iha tereno, grupu komunitario laiha, engineeiro G.komunitario mos laiha.
	2			observasaun nebee mak ekipa observa, fisikamente projeto refere atinji ona iha sinta leten, no bessi beton ba ring balk nian mos monta ona, sinta leten mos cor hotubona.

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO					
Kompanha : Grupo Komunitari					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	16/11/2022	Maubisse/ Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Teknico AND.IP	1
					2

Husu ba GK atu aselera servisu, no mantein kualidade no BOQ.



Asinatura



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI					
Kompanha : Grupo Komunitari					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	27/10/2022	Maubise/Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino Soares Santos	Teknico	1
II					2
					3
					4
					5
					1
					2
					3
					4

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura
Husu grupu mantein nafatin servisu no kontrola servisu didiak atu nunee hein pagamento 50% nian hodi kontinua fila fali servisu		
husu ba grupu atu entrega desenho ba teknico AND. IP iha tempo badak nia laran		

Local: 10/10/2022

Remark: EBF



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Road Name : Rural Road Rehabilitation of Fohi Ailoco - Foho Bobe Chainage 3+500-6+000 Ainaro Municipality
Owner : MOP/R4D
Location : Ainaro
Contractor : Berdato Unip. Lda

Pay ITEM NO.	DESCRIPTION	COST \$	Progres ADN IP						Percentage	Observasaun
			Previous Billing		This Billing		To Date Billing			
			Cost	%	Cost	%	Cost	%		
R-01 General		\$ 9,950.00	\$ 6,550.00	2.22%	\$ 375.00	0.13%	\$ 6,925.00	2.34%		
R-03 Earth work		\$ 21,849.07	\$ 10,068.49	3.41%	\$ 561.62	0.19%	\$ 10,630.11	3.60%		
R-05 sub- base, base and Pavement		\$ 29,108.95	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%		
R-08 Structure		\$ 174,237.22	\$ 13,552.37	4.58%	\$ 18,354.83	6.21%	\$ 31,907.20	10.79%		
R-10 Dayworks		\$ 770.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%		
R-11 Routine maintenance		\$ 6,433.25	\$ 100.00	0.03%	\$ -	0.00%	\$ 100.00	0.03%		
R-15 Provisional Sum		\$ 1,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%		
G-01 Security		\$ 17,701.20	\$ 7,144.30	2.42%	\$ 11,463.10	3.88%	\$ 18,607.40	6.29%		
G - 03 safety and protection		\$ 4,119.00	\$ 1,566.00	0.53%	\$ -	0.00%	\$ 1,566.00	0.53%		
G - 04 Ceremonial costs		\$ 300.00	\$ 150.00	0.05%	\$ -	0.00%	\$ 150.00	0.05%		
A	Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R-11+R-15)	\$ 243,348.49	\$ 30,270.86	10.24%	\$ 19,291.45	6.53%	\$ 49,562.31	16.77%		
B	Contractor Fee (A X 10%)	\$ 24,334.85	\$ 3,027.09	1.02%	\$ 1,929.14	0.65%	\$ 4,956.23	1.68%		
C	General item (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 22,120.20	\$ 8,860.30	3.00%	\$ 11,463.10	3.88%	\$ 20,323.40	6.88%		
D	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 5,796.07	\$ 843.17	0.29%	\$ 653.67	0.22%	\$ 1,496.84	0.51%		
E	Total Contract cost (A+B+C+D)	\$ 295,599.61	\$ 43,001.42	14.55%	\$ 33,337.37	11.29%	\$ 76,338.78	25.83%		

Inspesaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :


(Eng. Romulo J.M. Henrique) (Eng. Juliano H. Rodrigues)


(Eng. Remigio da S. C. Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P.


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
dora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INAP, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN						
Naran projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality						
Kompanha : Delong Unip.Lda						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN
I	16/03/2023	Hatudo	Romulo J.M.Henrique	Eng.ADN IP M.Ainaro	1	Serbisu bajaia ba Dezenho & Boq
					2	Aselera Pagamento
					3	Iha Mudansa item Serbisu iha terreno , Koordena ho obra nain MOP antes implementa serbisu
					4	
					5	
II	16/03/2023	Hatudo	Jaulino H.Rodrigues	Eng.ADN IP M.Ainaro	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
III					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
IV					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
V					1	
					2	
					3	
					4	
					5	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN						
Naran projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality						
Kompanha : Haburas Sarai Unip.Lda						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	16/03/2023	Ainaro/Hatudo	Romulo J.M.henrique	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
II	16/03/2023	Ainaro/Hatudo	Jaulino H. Rodrigues	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
III					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
IV					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
V					1	
					2	
					3	
					4	
					5	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Road Name : Rural Roads Rehabilitation of Foho Aileco - Foho Bobe -Chainage 6+700-7+900
Owner : MOP/R4D
Location : Ainaro / Hatudo
Contractor : Haburas Sarai Unip.Lda

SUMMARY

Pay ITEM NO.	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT	Progres ADN IP						Percentage	Observasaun	
			COST \$	Previous Billing		This Billing		To Date Billing			
				Cost	%	Cost	%	Cost			%
R-01. General		\$ 4,150.00	\$ 2,000.00	0.61%	\$ 350.00	0.11%	\$ 2,350.00	0.72%			
R-03 Earth work		\$ 35,299.07	\$ 12,147.60	3.72%	\$ 16,032.14	4.91%	\$ 28,179.73	8.63%			
R-05 Granular sub- base and base		\$ 25,064.97	-	0.00%	\$ 23,142.84	7.09%	\$ 23,142.84	7.09%			
R-08 Structure		\$ 204,326.50	\$ 177,393.46	54.33%	\$ 9,962.50	3.05%	\$ 187,355.96	57.38%			
R-10 Dayworks		\$ 700.00	-	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
R-11 Routine maintenance		\$ 5,137.86	\$ 1,772.04	0.54%	\$ 1,079.36	0.33%	\$ 2,851.40	0.87%			
R-15 Provisional sum		\$ 1,000.00	-	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%			
G-01 Security		\$ 1,500.00	\$ 375.00	0.11%	\$ 375.00	0.11%	\$ 750.00	0.23%			
G-02 Project Team		\$ 10,440.00	\$ 8,015.00	2.45%	\$ 4,580.00	1.40%	\$ 12,595.00	3.86%			
G-03 Safety and protection		\$ 4,623.00	\$ 12,485.75	3.82%	\$ 749.00	0.23%	\$ 13,234.75	4.05%			
R-15 Ceremonial costs		\$ 300.00	\$ 150.00	0.05%	\$ -	0.00%	\$ 150.00	0.05%			
A	Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)	\$ 275,678.41	\$ 193,313.10	59.21%	\$ 50,566.84	15.49%	\$ 243,879.94	74.69%			
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 27,567.84	\$ 19,331.31	5.92%	\$ 5,056.68	1.55%	\$ 24,387.99	7.47%			
C	General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 16,863.00	\$ 21,025.75	6.44%	\$ 5,704.00	1.75%	\$ 26,729.75	8.19%			
D	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 6,402.18	\$ 4,673.40	1.43%	\$ 1,226.55	0.38%	\$ 5,899.95	1.81%			
E	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 326,511.43	\$ 238,343.56	73.00%	\$ 62,554.07	19.16%	\$ 300,897.63	92.16%			

Inspesasaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Romulo J.M. Henrique) (Eng. Jaulino H. Rodrigues)
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Remigio da S. C. Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade,
ADN I P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality					
Kompanha : Haburas Sarai Unip.Lda					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	16/03/2023	Ainaro/Hatudo	Romulo J.M.henrique	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1 Eng iha terreno laiha
					2
					3
					4
					5
II	16/03/2023	Ainaro/Hatudo	Jaulino H. Rodrigues	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5



MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN						
Naran projeto : New Construction of Electrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro						
Kompanha : Yoku Unip.Lda						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	15/03/2023	Ainaro/Hatudo	Romulo J.M.Henrique	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
II	15/03/2023	Ainaro/Hatudo	Jaulino H. Rodrigues	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
III					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
IV					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
V					1	
					2	
					3	
					4	
					5	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NAME OF PROJECT : New Construction of Wall Protection Tower No. 55 Section Betano - Cassa
CONTRACT NUMBER : NCB/030/MOP - 2020
LOCATION OF PROJECT : Ainaro Municipality, Timor Leste
NAME OF CONTRACT : Yoku Lda.

Pay ITEM NO.	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT	AND Progress					
			Previous Billing		This Billing		To Date Billing	
			Cost	%	Cost	%	Cost	%
I	PRELIMINARY AND GENERAL WORKS		\$ 7,095.00	0.23%	\$ 2,667.50	0.69%	\$ 3,547.50	0.92%
II	REINFORCED CONCRETE RETAINING WALL N55		\$ 287,437.21	10.75%	\$ 63,747.35	16.57%	\$ 105,119.05	27.32%
III	RIVER NORMALIZATION & EMBANKMENT		\$ 43,418.25	0.01%	\$ 964.85	0.25%	\$ 1,003.44	0.26%
A	TOTAL CONSTRUCTION COST		\$ 337,950.46	10.99%	\$ 67,379.70	17.51%	\$ 109,670.00	28.50%
B	CONTRACTOR PROFIT (10% x A)		\$ 33,795.05	1.10%	\$ 8,620.12	2.24%	\$ 12,849.15	3.34%
C	OVERHEAD		\$ 5,500.00	0.00%	\$ 945.00	0.25%	\$ 945.00	0.25%
D	TOTAL (A + B + C)		\$ 377,245.51	12.09%	\$ 75,062.67	19.51%	\$ 121,582.00	31.60%
E	CONSTRUCTION TAX (2% X D)		\$ 7,544.91	0.24%	\$ 1,501.25	0.39%	\$ 2,431.64	0.63%
F	GRAND TOTAL (D + E)		\$ 384,790.42	12.33%	\$ 76,563.92	19.90%	\$ 124,013.64	32.23%

Prepared by :

Eng. Romulo J.M Henriques
Engenheiro ba Projecto Infraestrutura transportes e Irrigasaun
Munisipio Manufahi A D N IP

Verified by :

Eng. Remigio da S. C. Santos
Engenheiro Senior Projecto Infraestrutura transportes e Irrigasaun
A D N IP

Certified by :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de controlo e validacao
qualidade



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MARSU)

					Lokalizasaun Projetu											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	78.52%	\$ 355,512.32	\$ 97,263.04	ON-GOING	Projetu nia la bele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	87.87%	\$ 334,820.71	\$ 46,223.20	ON-GOING	Projetu nia la bele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Caloko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	88.36%	79.52%	\$ 1,031,531.81	\$ 265,634.51	ON-GOING	
4	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	88.00%	\$ 110,219.55	\$ 15,029.94	PHO	Projetu 100% iha tinan 2016 maibe to agora companhia sedauk husu pagamento retensaun 10%
5	Emergency Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	91.02%	81.92%	\$ 3,543,740.61	\$ 782,035.89	ON-GOING	
6	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3,717,215.92	July 1, 2013	93.22%	71.00%	\$ 2,639,364.12	\$ 1,077,851.80	PHO	
7	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipesoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	49.52%	43.43%	\$ 2,162,279.76	\$ 2,816,071.23	ON-GOING	
8	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	91.76%	80.75%	\$ 147,667.55	\$ 35,197.14	ON-GOING	Hela 10%
9	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardim dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip. Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489,653.83	April 10, 2019	54.62%	46.82%	\$ 229,243.50	\$ 260,410.33	ON-GOING	
10	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	84.00%	\$ 27,553.61	\$ 5,248.26	ON-GOING	
11	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208,089.56	July 29, 2019	97.82%	87.86%	\$ 182,832.44	\$ 0.70	PHO	100% falta retensaun 10%
12	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	94.77%	85.29%	\$ 25,075.68	\$ 4,325.46	PHO	Projetu refere 100% ona tuir volume nebe iha tereno, falta retensaun 10%
13	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	89.59%	\$ 86,232.55	\$ 10,024.17	PHO	Projetu ferere ramata ona, husu atu hare fila fali dadus pagamento nebe iha.
14	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Lau Sta. 0+000 - 1+200 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33,889.94	June 18, 2021	96.24%	43.31%	\$ 14,678.12	\$ 19,211.82	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
15	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-lete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	\$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	12.71%	\$ 34,707.48	\$ 238,440.67	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2016
16	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	37.19%	\$ 79,200.00	\$ 133,770.88	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2015
17	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600,016.84	July 25, 2016	66.84%	31.84%	\$ 191,070.62	\$ 408,946.22	PENDENTE	Projeto refere parado 2017
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	59.07%	58.21%	\$ 57,367.38	\$ 41,187.36	ON-GOING	
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	48.56%	43.66%	\$ 45,015.75	\$ 58,091.29	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MARSU)

Lokalizaçaun Projetu																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	Ainara	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	33.95%	52.56%	\$ 57,981.37	\$ 52,332.38	ON-GOING	
21	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainara District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	Ainara	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	\$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	25.43%	22.89%	\$ 125,100.22	\$ 421,497.80	ON-GOING	
22	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainara	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no kontratu	\$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	90.00%	\$ 22,001.40	\$ 2,444.60	PHO	
23	New Construction of Electrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELÉCTRICIDADE	Hatudo	Ainara	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384,790.42	Jul,26,2021	32.23%	22.85%	\$ 87,913.49	\$ 296,876.93	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
24	Road Maintenance Section - Ainara - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainara	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	13.75%	\$ 39,581.06	\$ 248,312.97	PENDENTE	Projeto refere parado 2019
25	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	55.37%	55.37%	\$ 54,188.25	\$ 43,684.55	ON-GOING	
26	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hatu-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF HATU-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	78.77%	58.78%	\$ 40,179.86	\$ 28,176.95	ON-GOING	
27	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	32.90%	29.32%	\$ 32,455.09	\$ 78,240.30	ON-GOING	
28	Projeto Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainara	Leolico Unip. Lda	NCB/02/MEJD/DNA/2021	\$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	28.18%	18.32%	\$ 55,243.87	\$ 246,333.99	ON-GOING	
29	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainara	DELONG UNIPessoal LDA	RT/005/MOP-2021	\$ 411,500.10	08-Mar-22	12.70%	0.00%	\$ -	\$ 411,500.10	ON-GOING	
30	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainara	Bermuana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	\$ 448,953.98	08-Mar-22	29.20%	0.00%	\$ -	\$ 448,953.98	ON-GOING	
31	Rural Road Rehabilitation of Foho Alico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainara	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	\$ 295,599.61	08-Mar-22	25.83%	20.41%	\$ 60,344.67	\$ 235,254.94	ON-GOING	
32	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainara	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	\$ 326,511.43	08-Mar-22	92.16%	44.98%	\$ 146,860.44	\$ 179,650.99	ON-GOING	
33	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	96.53%	96.68%	\$ 156,198.58	\$ 5,355.61	ON-GOING	
34	Rural Roads Routine Maintenance Ainara - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	79.19%	\$ 21,935.23	\$ 5,765.84	ON-GOING	Projeto refere ramata ona husu atu hare fila fali dadus pagamento
35	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	92.66%	83.39%	\$ 162,743.65	\$ 32,407.05	ON-GOING	
36	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainara	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	92.83%	85.47%	\$ 51,568.25	\$ 8,767.74	PHO	
37	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	Ainara	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76,554.69	June 18, 2021	77.79%	70.01%	\$ 53,593.69	\$ 22,961.00	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
38	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainara Road, lot 4: Bandudatu - Aluto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aluto - Ainara (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainara	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	92.29%	\$ 3,864,572.08	\$ 322,936.53	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MARSU)

Lokalizasaun Projeto																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
39	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Hatubuilico	Ainara	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	79.02%	71.11%	\$ 874,731.27	\$ 355,327.75	ON-GOING	
40	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainara	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	32.26%	0.00%	\$ -	\$ 67,801.26	ON-GOING	
41	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainara	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	74.94%	54.62%	\$ 54,976.68	\$ 45,672.83	ON-GOING	
42	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainara	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	31.12%	30.17%	\$ 24,589.74	\$ 56,917.70	ON-GOING	
43	Rehabilitasaun Estrda Rural, Hatubelico - Santuario Nain Feto Ramelau, Sta 0+000 - 2+450	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	Ainara	Leotilya, Unipessoal Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD22001	\$ 778,076.90	July 15, 2022	8.05%	7.24%	\$ 56,368.29	\$ 721,708.61	ON-GOING	
44	Fornesimento Konstrusaun Uma Laku Ramelau	MINISTERIO TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA	LM-CD	TURISMO	Hatubuilico	Ainara	DELONG UNIPESSOAL LDA	RFP	\$ 80,277.25	Aug. 1, 2022	7.59%	6.83%	\$ 5,481.12	\$ 74,796.13	ON-GOING	
45	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainara	Bermuana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	100.00%	74.87%	\$ 176,861.91	\$ 59,362.99	ON-GOING	
46	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainara	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	80.64%	71.14%	\$ 144,636.59	\$ 58,661.91	ON-GOING	
47	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	83.32%	\$ 475,776.61	\$ 95,267.77	ON-GOING	Projeto nia la bele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laha ona no presija hadia fali nia konstrusaun
48	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Fleixa to Erelesu, and Libtutu - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	77.28%	69.81%	\$ 458,718.70	\$ 198,379.10	ON-GOING	
49	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Dauriala - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	90.00%	\$ 896,415.58	\$ 99,601.73	PHO	Hein 10 % retensaun EDTL Munisipiu maka seidaik entrega
50	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	43.84%	\$ 452,656.17	\$ 579,755.90	ON-GOING	
51	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunomoge, Tatiri and Mulo - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	88.54%	\$ 882,792.12	\$ 114,233.03	ON-GOING	Projeto nia la bele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laha ona no sei hein kompanha atu submete dokumentus
52	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainara	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	87.04%	\$ 73,728.12	\$ 10,978.14	ON-GOING	Projeto refere ramata ona iha 2019 husu atu hare fila fali dadus pagamento
53	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainara	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 84,160.28	July 29, 2019	97.43%	87.69%	\$ 73,802.68	\$ 10,357.60	ON-GOING	Projeto refere companhia sei halama pagamento adicional
54	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainara	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34,371.15	June 18, 2021	90.58%	81.52%	\$ 28,020.65	\$ 6,350.50	ON-GOING	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MARSU)

Lokalizasaun Projeto																
NU.	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
55	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	70.09%	62.10%	\$ 219,207.07	\$ 133,793.79	PHO	
56	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobulico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	16.64%	\$ 8,373.26	\$ 41,936.96	ON-GOING	Projeto refere sei parado iha tinan 2019
57	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	28.49%	28.16%	\$ 27,909.50	\$ 71,184.64	ON-GOING	
58	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	56.21%	56.21%	\$ 52,108.38	\$ 40,598.22	ON-GOING	
59	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	63.79%	48.05%	\$ 41,552.83	\$ 44,918.67	ON-GOING	
60	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	55.71%	55.71%	\$ 54,504.66	\$ 43,336.63	ON-GOING	
61	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	26.34%	26.34%	\$ 39,491.20	\$ 110,425.00	ON-GOING	
62	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	29.07%	26.27%	\$ 24,940.70	\$ 70,010.96	ON-GOING	
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	27.20%	26.51%	\$ 29,133.62	\$ 80,761.52	ON-GOING	
64	Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Atuto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	AILESU UNIPessoal LDA	RFQ-CD-MOP-22006	\$ 23,993.19	28-Jun-22	100.00%	90.00%	\$ 21,593.87	\$ 2,399.32	PHO	
65	Rural Road Maintenance and Rehabilitation of Maubise - Urlepha (Access to Edi Manelobas) Chainage 0+000 - 3+000 and Urlepha-Rita Chainage 0+000 - 2+150	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainaro	Balada	RT/004/MOP-2021	\$ 349,172.31	May 30, 2022	0.00%	9.74%	\$ 34,024.37	\$ 315,147.94	ON-GOING	
TOTAL									\$ 34,504,331.63			62.39%	\$ 21,528,946.08	\$ 12,600,956.82		

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino Soares Dos Santos)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Prepara Husi :

(Eng. Romulo J. Marques Henrique)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Jaulino H. Rodrigues)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Silvino D. R. Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



												Mar-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-1	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	0.00%	87.24%
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-2	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	0.00%	97.63%
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobulico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-3	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	88.36%	0.00%	88.36%
4	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-4	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
5	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-5	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	91.02%	0.00%	91.02%
6	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-6	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3,717,215.92	July 1, 2013	93.22%	0.00%	93.22%
7	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-7	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	49.52%	0.00%	49.52%
8	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-8	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	91.76%	0.00%	91.76%
9	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-9	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489,653.83	April 10, 2019	54.62%	0.00%	54.62%
10	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-10	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	0.00%	93.39%
11	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	ANV-11	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208,089.56	July 29, 2019	97.82%	0.00%	97.82%
12	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	ANV-12	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	94.77%	0.00%	94.77%
13	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	ANV-13	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
14	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-14	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33,889.94	June 18, 2021	96.24%	0.00%	96.24%
15	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	ANV-15	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	\$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	0.00%	64.84%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



												Mar-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
16	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainara-Vila	ANV-16	Ainara	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	0.00%	41.32%
17	Rehabilitasaun Estrada Ainara-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainara-Vila	ANV-17	Ainara	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600,016.84	July 25, 2016	66.84%	0.00%	66.84%
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-18	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	58.21%	0.86%	59.07%
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-19	Ainara	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	47.51%	1.04%	48.56%
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-20	Ainara	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	33.95%	0.00%	33.95%
21	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainara District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	ANV-21	Ainara	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	\$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	25.43%	0.00%	25.43%
22	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-1	Ainara	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no kontratu	\$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
23	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	HA-2	Ainara	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384,790.42	Jull,26,2021	12.33%	19.90%	32.23%
24	Road Maintenance Section - Ainara - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-3	Ainara	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	0.00%	15.00%
25	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-4	Ainara	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	55.37%	0.00%	55.37%
26	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-5	Ainara	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	78.77%	0.00%	78.77%
27	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-6	Ainara	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	32.90%	0.00%	32.90%
28	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	HA-7	Ainara	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	\$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	28.18%	0.00%	28.18%
29	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-8	Ainara	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	\$ 411,500.10	08-Mar-22	12.70%	0.00%	12.70%
30	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-9	Ainara	Bermuana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	\$ 448,953.98	08-Mar-22	29.20%	0.00%	29.20%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



												Mar-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
31	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico- Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-10	Ainaro	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	\$ 295,599.61	08-Mar-22	14.55%	11.28%	25.83%
32	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-11	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	\$ 326,511.43	08-Mar-22	73.00%	19.16%	92.16%
33	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-1	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	96.53%	0.00%	96.53%
34	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-2	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
35	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-3	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	92.66%	0.00%	92.66%
36	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-4	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	92.83%	0.00%	92.83%
37	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	HTB-5	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76,554.69	June 18, 2021	77.79%	0.00%	77.79%
38	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	HTB-6	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	0.00%	92.29%
39	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	HTB-7	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	79.02%	0.00%	79.02%
40	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-8	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	31.77%	0.49%	32.26%
41	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-9	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	55.80%	19.14%	74.94%
42	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-10	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	31.12%	0.00%	31.12%
43	Rehabilitasaun Estrda Rural, Hatubelico - Santuario Nain Feto Ramelau, Sta 0+000 - 2+450	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	HTB-11	Ainaro	Leotilya, Unipessoal Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD22001	\$ 778,076.90	July 15, 2022	8.05%	0.00%	8.05%
44	Fornesimento Konstrusaun Uma Laku Ramelau	MINISTERIO TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA	LM-CD	TURISMO	Hatubuilico	HTB-12	Ainaro	DELONG UNIPESOAAL LDA	RFP	\$ 80,277.25	Aug. 1, 2022	7.59%	0.00%	7.59%
45	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-1	Ainaro	Bermuana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	100.00%	0.00%	100.00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



												Mar-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
46	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-2	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	80.64%	0.00%	80.64%
47	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-3	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	0.00%	93.00%
48	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-4	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	77.28%	0.00%	77.28%
49	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-5	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
50	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-6	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	0.00%	48.72%
51	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-7	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	0.00%	98.38%
52	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-8	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
53	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-9	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 98,821.63	July 29, 2019	97.43%	0.00%	97.43%
54	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	MBS-10	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34,371.15	June 18, 2021	90.58%	0.00%	90.58%
55	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-11	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	70.09%	0.00%	70.09%
56	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-12	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	0.00%	40.00%
57	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-13	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	28.49%	0.00%	28.49%
58	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-14	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	56.21%	0.00%	56.21%
59	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-15	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	48.05%	15.74%	63.79%
60	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-16	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	55.71%	0.00%	55.71%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO



												Mar-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
61	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-17	Ainara	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	26.34%	0.00%	26.34%
62	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-18	Ainara	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	29.07%	0.00%	29.07%
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-19	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	27.20%	0.00%	27.20%
64	Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-20	Ainara	AILESU UNIPESOAAL LDA	RFQ-CD-MOP-22006	\$ 23,993.19	28-Jun-22	100.00%	0.00%	100.00%
65	Rural Road Maintenance and Rehabilitation of Maubise - Urlepha (Access to Edi Manelobas) Chainage 0+000 - 3+000 and Urlepha-Rita Chainage 0+000 - 2+150	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	MBS-21	Ainara	Balada Unipessoal Lda	RT/004/MOP-2021	\$ 349,172.31	May 30, 2022	0.00%	0.00%	0.00%

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Claudino Soares Dos Santos)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Romulo J. Marques Henrique)
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Juliano H. Rodrigues)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainara ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P.

(Deolindo de F. Marques)
Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.

Naran Eng.

Jaulino H. Rodrigues

Municipio

MUNICIPIO AINARO NO POSTOS

2023

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	MARCO																															OBS
								Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr						
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
AINARO VILA (ANV)	4	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	Emergency Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III Ainaro Municipality	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	6	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	WTJ Contraction Unipesoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	9	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	LM-CD	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																																
							Actual																																
	10	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
14	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Lau Sta. 0+000 - 1+200 Ainaro Municipality	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
						Actual																																	
15	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
						Actual																																	
17	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 - municipal of Ainaro	EI Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
						Actual																																	
HATUDO (HA)	23	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	24	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	29	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	30	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	31	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	32	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
HATUBULICO (HTB)	33	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	Gos Unip. Lda	MPW-190104	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	34	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	35	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubulico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	36	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	37	Spot Improvement Liurai - Hatubulico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																

[illegible]



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Joaquim de C. Madeira							2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Claudino Soares dos Santos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Mar-23																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AINARO VILA (ANV)	1	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Retensaun 10%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Actual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Handwritten signature



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Joaquim de C. Madeira						2023																																
	Claudino Soares dos Santos																																						
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Mar-23																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MAUBISSE (MBS)	1																																						
	2	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Falta Retensaun 10%	
							Actual																																
	3																																				On going		
	4	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet, Cuzina no Armagem no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (BERMOLI MAULAU)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															On going	
							Actual																																
	5	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Lumluli)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															On going	
							Actual																																
	6	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manelobas Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Maneloba)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															On going	
							Actual																																
	7	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Russulau)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															On going	
							Actual																																
	8	Construção de Salas de Aulas 6 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Manetu)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															On going	
							Actual																																
	9	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Rileco Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															On going	
							Actual																																
	10	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Aituto Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Betulala)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															On going	
							Actual																																

Note:



Planu Periode inspesaun iha tercinu



Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu



Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili



Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu, Município Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu, Município Ainaro
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Jauarria Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.

[illegible]

[illegible]

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriin avaliasuan mensal iha Dili

Inspesoun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi

(Silvino D. R. Rebelo Soares)
Eng. Electricidade - ADN - I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN - I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo, ADN - I.P
