



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU AINARO

NOVEMBRO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO AINARO

NOVEMBRO 2022


Prepara Husi :


(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Ainaro ADN, I.P


(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigação, Município Ainaro ADN, I.P


(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Ainaro ADN, I.P



(Eng. Jaulino H. Rodrigues)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigação, Município Ainaro ADN, I.P


(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Município Ainaro ADN, I.P


Verifica Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e
Irigação, ADN, I.P


(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifica Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Ainaro	3
1.3. Lista Projectos.....	6
II. PROGRESU FISIKU	14
2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan	14
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	14
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	14
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	15
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu.....	15

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro.....	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamentos.....	6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores.....	8
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio	11
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro	13

I. INTRODUSAUN


1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional, I.P ou ADN, I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN, I.P nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefisiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ADN, I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno caso presiza.

1.2 Perfil Municipio Ainaro

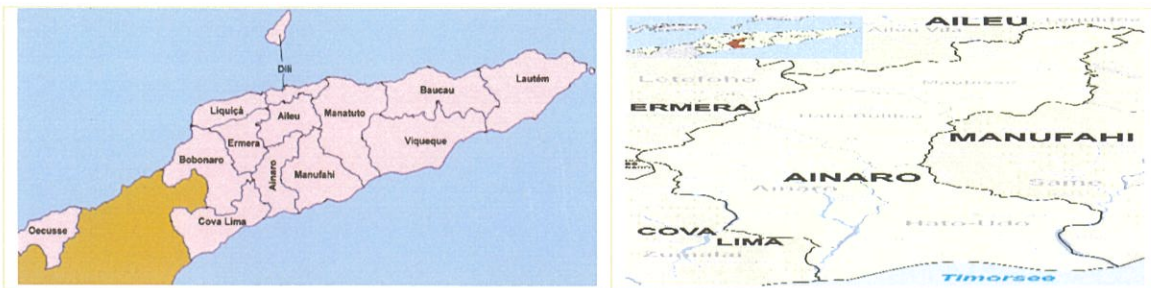

Administrasaun Munisipal Ainaro lokalizadu iha sudoeste país no mapa 2. hatudu pozisaun jeográfiku Munisipiu Ainaro ne'ebé ho luan 797 km² ho populasau nain 59,175 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Ainaro iha Postu Administraativo ha'at, Sukus 21 no Aldeias 131 hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1: Ponto Administrativo, Sukus no Total Aldeias/Sukus

Ainaro		Hatu Bulico		Hatu Udo		Maubisse	
Sukus	Aldeias	suku	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Ainaro	7	Mauchiga	7	Foho-Ailico (beikala)	6	Aituto	9
Cassa	5	Mulo	8	Leolima	10	Edi	6
Manutaci	4	Nuno Moge	6	-	-	Fatubessi	6
Mau-Nuno	3	-	-	-	-	Horai-Quic	4
Mau-Ulo	5	-	-	-	-	Liurai	4
Soro	4	-	-	-	2	Manelobas	4
Suro-Craic	4	-	-	-	4	Manetu	7
-	-	-	-	-	-	Maubisse	12
-	-	-	-	-	-	Maulau	10
Total	32	-	21	-	22	-	62

Data husi : Livro 3B OJE 2021, Pajina 22

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		4				4	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
Grand Total			5				5	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro

ASET ADN,IP MUNICIPIO AINARO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1				1	Moru hadia, monta tralis
2	Kareta		1				1	Kondisaun ladun diák
3	Desktop HP / Monitor		1				1	Diak
4	Laptop HP		1				1	Todan presija update
5	Printer Cannon		1				1	Diak
6	UPS		1				1	Aat
7	Armario File		2				2	Diak
8	Armario Tau hena		2				2	Aat 1
9	Meja escritorio		1				1	Diak
10	Meja han		1				1	Aat
11	Meja TV (kiik)		1				1	Diak
12	Kadeira escritorio		6				6	Diak
13	Kadeira han		4				4	Att 2
14	Sofa		1 Set				1	Diak
15	Springbed +sumasu 4		2 Set				2	Diak (sumasu laiha)
16	Jeleira		1				1	Diak
17	Water Dispenser		1				1	Aat
18	TV + Parabola		1 Set				1	Aat
19	Kipas Angin		5				5	Aat
20	Kompor		1				1	Diak
21	Kompor Gas		1				1	Aat
22	Rack sepatu		3				3	Aat
23	Rack Piring		1				1	Diak
24	Water Pump Sanyo		1				1	Aat

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dados projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamiento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamiento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + PDIM + LM - BS + LM - TP + Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	27	\$ 26,239,266.40	66.62%
2	Hatubuilico	13	\$ 61,980,707.17	96.72%
3	Hatudo	13	\$ 3,029,791.15	14.82%
4	Maubisse	27	\$ 7,528,008.45	65.71%
Grand Total		80	\$ 98,777,773.17	83.85%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	11	\$ 23,879,713.14	69.88%
2	Hatubuilico	4	\$ 60,431,375.42	98.35%
3	Hatudo	5	\$ 1,770,459.15	7.13%
4	Maubisse	9	\$ 5,130,827.23	72.18%
Grand Total		29	\$ 91,212,374.94	87.65%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	\$ 1,376,091.81	21.18%
2	Hatubuilico	6	\$ 1,299,373.54	35.57%
3	Hatudo	3	\$ 718,688.00	9.76%
4	Maubisse	5	\$ 741,749.82	43.12%
Grand Total		19	\$ 4,135,903.17	27.65%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	\$ 473,161.58	50.73%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	3	\$ 458,435.28	92.53%
Grand Total		8	\$ 931,596.86	71.30%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo	2	\$ 263,719.00	87.35%
4	Maubisse	1	\$ 302,126.40	98.44%
Grand Total		3	\$ 565,845.40	93.27%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	4	\$ 408,232.25	42.49%
2	Hatubuilico	3	\$ 249,958.21	22.03%
3	Hatudo	3	\$ 276,925.00	8.01%
4	Maubisse	7	\$ 730,876.53	11.17%
Grand Total		17	\$ 1,665,991.99	19.95%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	2	\$ 102,067.62	86.60%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 140,000.00	85.91%
Grand Total		3	\$ 242,067.62	86.20%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Emergency		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 23,993.19	0.00%
Grand Total		1	\$ 23,993.19	0.00%

Dados detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Proyecto Municipio Ainara Por Sectores

NO	SECTOR PROYECTO	TOTAL MUNICIPIO AINARO		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	6	\$ 940,813.03	34.66%
2	Edukasaun	19	\$ 2,292,232.62	27.37%
3	Eléctricidade	10	\$ 7,999,431.74	72.04%
4	Estradas E Pontes	16	\$ 20,726,398.81	59.64%
5	Flood Control	2	\$ 108,153.47	68.24%
6	Imprestimo	3	\$ 59,201,316.40	98.91%
7	Irigasaun	1	\$ 32,319.72	100.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	17	\$ 3,237,083.74	62.72%
9	Pontes	2	\$ 3,869,397.22	73.34%
10	Saude	3	\$ 274,369.70	47.22%
11	Turismo	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		80	\$ 98,777,773.17	83.85%

NO	SECTOR PROYECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	4	\$ 639,367.96	10.60%
2	Edukasaun	4	\$ 520,065.09	41.98%
3	Eléctricidade	3	\$ 2,130,985.59	80.80%
4	Estradas E Pontes	7	\$ 17,893,140.72	67.36%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 815,683.40	44.91%
9	Pontes	2	\$ 3,869,397.22	73.34%
10	Saude	3	\$ 274,369.70	47.22%
11	Turismo	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		27	\$ 26,239,266.40	66.62%

NO	SECTOR PROYECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	3	\$ 249,958.21	22.03%
3	Eléctricidade	1	\$ 1,230,059.02	71.11%
4	Estradas E Pontes	2	\$ 854,631.59	11.82%
5	Flood Control			
6	Imprestimo	3	\$ 59,201,316.40	98.91%
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	4	\$ 444,741.95	81.20%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		13	\$ 61,980,707.17	96.72%

NO	SECTOR PROYECTO	Hatudo		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	4	\$ 578,502.86	10.37%
3	Eléctricidade	1	\$ 384,790.42	0.00%
4	Estradas E Pontes	4	\$ 1,482,565.12	5.85%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun	1	\$ 32,319.72	100.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 551,613.03	48.94%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		13	\$ 3,029,791.15	14.82%

NO	SECTOR PROYECTO	Maubisse		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	2	\$ 301,445.07	85.70%
2	Edukasaun	8	\$ 943,706.46	31.15%
3	Eléctricidade	5	\$ 4,253,596.71	74.44%
4	Estradas E Pontes	3	\$ 496,061.38	24.45%
5	Flood Control	2	\$ 108,153.47	68.24%
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	7	\$ 1,425,045.36	72.48%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		27	\$ 7,528,008.45	65.71%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	3	\$ 260,605.35	81.30%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 32,319.72	100.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	47	\$ 94,543,521.27	85.99%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	20	\$ 2,316,678.62	28.03%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	5	\$ 484,439.64	64.13%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	0.00%
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
9	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		80	\$ 98,777,773.17	83.85%

NO	DONO DO PROJECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	1	\$ 15,000.00	0.00%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	14	\$ 24,219,553.10	69.16%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	4	\$ 520,065.09	41.98%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	4	\$ 344,439.64	55.28%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	0.00%
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
9	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		27	\$ 26,239,266.40	66.62%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	10	\$ 61,730,748.96	97.02%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	3	\$ 249,958.21	22.03%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
Grand Total		13	\$ 61,980,707.17	96.72%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 32,319.72	100.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	7	\$ 2,394,522.57	13.98%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	\$ 602,948.86	13.60%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
Grand Total		13	\$ 3,029,791.15	14.82%

NO	DONO DO PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	2	\$ 245,605.35	86.27%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	16	\$ 6,198,696.64	69.70%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	8	\$ 943,706.46	31.15%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude	1	\$ 140,000.00	85.91%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
Grand Total		27	\$ 7,528,008.45	65.71%

Dados detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dados Populasaun Munisipiu Ainaro

Posto Administrativo, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Produktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Ainaro	16,823	7170	6636	5567	5058
Hato-Udo	10,747	3130	2923	2415	2279
Hato-Builico	13,249	3457	3365	3241	3186
Maubisse	24,672	6378	6309	6222	5764

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu neébe hetan husi progresu fulan ida neé, ikus liu porsentagen actual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detallu bele hareé iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hareé #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Obstaclo neébe ami enjineiru hasoru iha terenu mak hanesan tuir mai ne'e :

1. Kompanhia nia tekniku laiha terenu
 2. Kompanhia neébe ka'er obra iha Municipio Ainaro iha hotu Dili
 3. Teknik husi Projetu nain ladun halo inspesaun ba iha terenu
 4. Kondisaun kareta ne'ebe Suporta Ekpa ADN, I.P iha tereno ho kondisaun ne'ebe sei aat
- Obstaclo parte Eletricidade
1. Durante Eng ADN, I.P halo monitorin directur kompahnia nunka iha fatin projeto e delega ema balun mak sempre hein iha fatin projeto.
 2. Kompahnia balun mak to agora sedauk hadia konstruk Linha MV & LV nebe mak avaria.
 3. Iha kompahnia seluk hein hela karta termo de entrega 10% husi EDTL – EP municipio ate agora sedauk fo ba kompahnia.
 4. Seksaun M & E - ADN, I.P sempre hasoru mak kona ba motorist.
 5. Seksaun M & E – ADN, I.P labele kontrola masimu projeto electricidade ho edificisio public tamba Eng M & E – ADN, I.P ida kontrola municipio ha'at (4).

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU


4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Buka solusaun ba projetu ne'ebe parado
2. Sistema Internet iha Municipio lalao ho diak ho difikulta enjineiru nia servisu
3. Kondisaun Rezidesia Oficial ADN, I.P Municipio Ainaro ne'ebe presija atu hadia:
 - Be'e
 - Moru
 - Tralis Jenela

➤ **Recomendação parte Eletricidade**

1. Seksaun M & E husu parte rekursu Humanu atu aumenta tan funsionario M & E.
2. Seksaun M & E – ADN, I.P husu ba ITC tenki kria folder sistem keta ida mai iha seksaun M & E – ADN, I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Ainaro

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engineiro	Manuel Bany da S. C. de Carvalho	115	Enjineiru ITI		
		Joaquim de C. Madeira	167	Enjineiru EPAS		
		Claudino Soares Dos Santos	243	Enjineiru EPAS		
		Jaulino H. Rdrigues	237	Enjineiru ITI		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		

2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Lucas Alberto Soares Pereira	195	Motorista		



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL NOVEMBRO)

Lokalizasaun Projetu																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452.775,36	June 6, 2016	87,24%	78,52%	\$ 355.512,32	\$ 97.263,04	ON-GOING	Projeto nia labelo halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381.043,91	Sept. 1, 2016	97,63%	87,87%	\$ 334.820,71	\$ 46.223,20	ON-GOING	Projeto nia labelo halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Calloko and Hatobulico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1.297.166,32	Sept. 1, 2016	88,36%	79,52%	\$ 1.031.531,81	\$ 265.634,51	ON-GOING	
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	\$ 4.223.004,05	July 1, 2013	100,00%	89,74%	\$ 3.789.830,06	\$ 433.173,99	FHO	Projeto ramata ona ho nia fisiku 100%.
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125.249,49	Nov. 7, 2016	100,00%	88,00%	\$ 110.219,55	\$ 15.029,94	PHO	Projeto 100% iha tinan 2016 maibe to agora companhia sedau husu pagamento retensaun 10%
6	Emergency Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4.325.776,50	Sept. 15, 2017	91,02%	81,92%	\$ 3.543.740,61	\$ 782.035,89	ON-GOING	
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3.717.215,92	July 1, 2013	93,22%	71,00%	\$ 2.639.364,12	\$ 1.077.851,80	PHO	
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4.978.350,99	Aug. 28, 2017	41,51%	34,96%	\$ 1.740.596,03	\$ 3.237.754,96	ON-GOING	
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co.,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	\$ 3.596.249,07	July 1, 2013	100,00%	77,94%	\$ 2.802.979,89	\$ 793.269,18	FHO	
10	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182.864,69	Nov. 9, 2016	91,76%	80,75%	\$ 147.667,55	\$ 35.197,14	ON-GOING	
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardim dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489.653,83	April 10, 2019	52,62%	46,82%	\$ 229.243,50	\$ 260.410,33	ON-GOING	
12	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32.801,87	Aug. 16, 2019	93,39%	84,00%	\$ 27.553,61	\$ 5.248,26	ON-GOING	
13	Rehabilitasaun Edifício Administrasaun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	\$ 15.000,00	Sept. 19, 2016	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 15.000,00	FHO	Projeto refere remata ona iha 2021 husu atu hare fila fali dadus pagamento (Retensaun)
14	Reabilitasaun Edifício ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/III/2018	\$ 7.700,00	Feb. 12, 2018	100,00%	90,00%	\$ 6.930,00	\$ 770,00	PHO	Projeto refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedau halama pagamento



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL NOVEMBRO)

					Lokalizasaun Projetu												
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN	
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208.089,56	July 29, 2019	97,82%	63,00%	\$ 131.088,50	\$ 0,70	ON-GOING	Projetu refere sei parado	
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29.401,14	Sept. 23, 2019	86,20%	77,58%	\$ 22.808,96	\$ 6.592,18	ON-GOING	Projetu refere 100% ona tuir volume nebe iha tereno	
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96.256,72	Dec. 19, 2016	100,00%	89,59%	\$ 86.232,55	\$ 10.024,17	PHO	Projetu ferere ramata ona, husu atu hare fila fali dadus pagamento nebe iha.	
18	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33.889,94	June 18, 2021	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 33.889,94	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno	
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	\$ 273.148,15	Aug. 1, 2015	64,84%	12,71%	\$ 34.707,48	\$ 238.440,67	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2016	
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212.970,88	July 6, 2015	41,32%	37,19%	\$ 79.200,00	\$ 133.770,88	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2015	
21	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600.016,84	July 25, 2016	66,84%	31,84%	\$ 191.070,62	\$ 408.946,22	PENDENTE	Projeto refere parado 2017	
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98.554,74	Oct. 15, 2021	31,98%	28,92%	\$ 28.497,77	\$ 70.056,97	ON-GOING		
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103.107,04	Oct. 15, 2021	30,63%	28,73%	\$ 29.620,71	\$ 73.486,33	ON-GOING		
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110.313,75	Oct. 15, 2021	33,95%	26,37%	\$ 29.091,15	\$ 81.222,60	ON-GOING		
25	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	\$ 546.598,02	Oct. 25, 2021	20,04%	0,00%	\$ -	\$ 546.598,02	ON-GOING		
26	New Construction of Laboratory for Covid-19, at Sentru Internamentu Ainaro Villa, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Adjulcojam Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-21-098C	\$ 70.069,94	14-Mar-21	74,76%	86,82%	\$ 60.831,49	\$ 9.238,45	ON-GOING		
27	Rehabilitasaun CHC ba Izolamento Ainaro Villa relasiona covid19	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Marcalas Trading Solution, Unip Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-20-212	\$ 31.997,68	Nov. 1, 2021	100,00%	86,13%	\$ 27.560,39	\$ 4.437,29	ON-GOING		
28	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	Ia mensiona no kontratu	\$ 24.446,00	Aug. 26, 2013	100,00%	90,00%	\$ 22.001,40	\$ 2.444,60	PHO	Projetu refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedauk hatama pagamento	
29	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	\$ 239.273,00	Sept. 25, 2019	100,00%	87,08%	\$ 208.360,75	\$ 30.912,25	FHO		
30	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELÉCTRICIDADE	Hatudo	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384.790,42	Jul1,26,2021	12,33%	0,00%	\$ -	\$ 384.790,42	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno	
31	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287.894,03	May 18, 2017	15,00%	13,75%	\$ 39.581,06	\$ 248.312,97	PENDENTE	Projeto refere parado 2019	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL NOVEMBRO)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	Lokalizasaun Projetu		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU										
32	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere-Ainaro	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	Ainaro	Berdato Unip Lda		\$ 32.319,72	23.8, 2021	100,00%	100,00%	\$ 32.319,72	\$ -	FHO	
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97.872,80	Oct. 15, 2021	32,78%	0,00%	\$ -	\$ 97.872,80	ON-GOING	
34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68.356,81	Oct. 15, 2021	58,78%	32,44%	\$ 22.173,99	\$ 46.182,82	ON-GOING	
35	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110.695,39	Oct. 15, 2021	32,90%	0,00%	\$ -	\$ 110.695,39	ON-GOING	
36	Projeto Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	\$ 301.577,86	Oct. 15, 2021	19,30%	12,55%	\$ 37.839,97	\$ 263.737,89	ON-GOING	
37	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	DELONG UNIPESOAAL LDA	RT/005/MOP-2021	\$ 411.500,10	08-Mar-22	12,70%	0,00%	\$ -	\$ 411.500,10	ON-GOING	
38	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	\$ 448.953,98	08-Mar-22	29,20%	0,00%	\$ -	\$ 448.953,98	ON-GOING	
39	Rural Road Rehabilitation of Foho Allico- Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	\$ 295.599,61	08-Mar-22	14,55%	6,67%	\$ 19.727,79	\$ 275.871,82	ON-GOING	
40	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	\$ 326.511,43	08-Mar-22	73,00%	20,51%	\$ 66.983,28	\$ 259.528,15	ON-GOING	
41	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161.554,19	Aug. 16, 2019	96,53%	86,20%	\$ 139.264,98	\$ 22.289,21	ON-GOING	
42	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27.701,07	Jan. 9, 2017	100,00%	79,19%	\$ 21.935,23	\$ 5.765,84	ON-GOING	Projeto refere ramata ona husu atu hare fila fali dadus pagamento
43	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195.150,70	Aug. 21, 2019	92,66%	76,02%	\$ 148.346,12	\$ 46.804,58	ON-GOING	
44	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60.335,99	Aug. 16, 2019	92,83%	85,47%	\$ 51.568,25	\$ 8.767,74	ON-GOING	
45	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76.554,69	June 18, 2021	37,11%	58,37%	\$ 44.682,98	\$ 31.871,71	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL NOVEMBRO)

					Lokalizasaun Projetu											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
46	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 28.138.737,00	Nov. 20, 2014	100,00%	99,22%	\$ 27.919.968,96	\$ 218.768,04	FHO	
47	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 26.875.070,79	Nov. 20, 2014	100,00%	99,62%	\$ 26.771.980,96	\$ 103.089,83	FHO	
48	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4.187.508,61	Dec. 12, 2014	92,29%	92,29%	\$ 3.864.572,08	\$ 322.936,53	ON-GOING	
49	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Hatubuilico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1.230.059,02	Sept. 1, 2016	79,02%	71,11%	\$ 874.731,27	\$ 355.327,75	ON-GOING	
50	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67.801,26	Oct. 15, 2021	31,77%	0,00%	\$ -	\$ 67.801,26	ON-GOING	
51	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100.649,51	Oct. 15, 2021	46,30%	30,27%	\$ 30.464,27	\$ 70.185,24	ON-GOING	
52	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81.507,44	Oct. 15, 2021	31,12%	30,17%	\$ 24.589,74	\$ 56.917,70	ON-GOING	
53	Rehabilitasaun Estrda Rural, Hatubelico - Santuario Nain Feto Ramelau, Sta 0+000 - 2+450	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	Ainaro	Leotilya, Unipessoal Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD22001	\$ 778.076,90	July 15, 2022	8,05%	7,24%	\$ 56.368,29	\$ 721.708,61	ON-GOING	
54	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236.224,90	Feb. 5, 2019	79,95%	60,75%	\$ 143.498,67	\$ 92.726,23	ON-GOING	
55	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203.298,50	Jan. 22, 2019	66,94%	49,43%	\$ 100.497,36	\$ 102.801,14	ON-GOING	
56	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571.044,38	July 6, 2016	93,00%	83,32%	\$ 475.776,61	\$ 95.267,77	ON-GOING	Projetu nia la bele halo kontinuasaun tamba espasu b linha laiha ona no presija hadi fali nia konstrusaun
57	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657.097,80	Jan. 9, 2016	77,28%	69,81%	\$ 458.718,70	\$ 198.379,10	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL NOVEMBRO)

Lokalizasaun Projeto																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
58	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Dauriala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996.017,31	July 6, 2016	100,00%	90,00%	\$ 896.415,58	\$ 99.601,73	PHO	Hein 10 % retensaun EDTL Munisipiu maka seidaok entrega
59	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1.032.412,07	July 6, 2016	48,72%	43,84%	\$ 452.656,17	\$ 579.755,90	ON-GOING	
60	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997.025,15	Sept. 1, 2016	98,38%	88,54%	\$ 882.792,12	\$ 114.233,03	ON-GOING	Projeto nia labelo halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no sei hein kompanha atu submete dokumentus
61	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	\$ 195.378,22	Aug. 16, 2019	100,00%	98,25%	\$ 191.961,64	\$ 3.416,58	FHO	
62	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84.706,26	Aug. 12, 2016	100,00%	87,04%	\$ 73.728,12	\$ 10.978,14	ON-GOING	Projeto refere ramata ona iha 2019 husu atu hare fila fali dadus pagamento
63	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urlepha Sta 0+000 - 3+000 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Delong Unip. Lda	MPW-190087	\$ 302.126,40	Aug. 16, 2019	100,00%	98,44%	\$ 297.407,48	\$ 4.718,92	FHO	
64	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 84.160,28	July 29, 2019	97,43%	87,69%	\$ 73.802,68	\$ 10.357,60	ON-GOING	Projeto refere companhia sei hatama pagamento adicional
65	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 212.829,93	July 29, 2019	99,77%	99,77%	\$ 212.337,64	\$ 492,29	FHO	
66	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 161.445,07	Aug. 16, 2019	100,00%	85,52%	\$ 138.069,82	\$ 23.375,25	ON-GOING	
67	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	\$ 112.517,92	June 18, 2021	100,00%	90,00%	\$ 101.265,05	\$ 11.252,87	ON-GOING	
68	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Sta 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34.371,15	June 18, 2021	64,74%	58,27%	\$ 20.027,34	\$ 14.343,81	ON-GOING	
69	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353.000,86	Nov. 22, 2016	70,09%	62,10%	\$ 219.207,07	\$ 133.793,79	PHO	
70	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50.310,22	Jan. 9, 2017	40,00%	13,17%	\$ 6.624,47	\$ 43.685,75	ON-GOING	Projeto refere sei parado iha tinan 2019
71	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	\$ 140.000,00	29-Apr-21	94,29%	85,91%	\$ 120.278,27	\$ 19.721,73	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL NOVEMBRO)

Lokalizasaun Projeto																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
72	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99.094,14	Oct. 15, 2021	28,49%	0,00%	\$ -	\$ 99.094,14	ON-GOING	
73	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92.706,60	Oct. 15, 2021	34,30%	29,72%	\$ 27.552,08	\$ 65.154,52	ON-GOING	
74	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86.471,50	Oct. 15, 2021	32,48%	29,40%	\$ 25.425,20	\$ 61.046,30	ON-GOING	
75	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97.841,29	Oct. 15, 2021	39,64%	29,32%	\$ 28.682,79	\$ 69.158,50	ON-GOING	
76	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149.916,20	Oct. 15, 2021	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 149.916,20	ON-GOING	
77	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94.951,66	Oct. 15, 2021	29,07%	0,00%	\$ -	\$ 94.951,66	ON-GOING	
78	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109.895,14	Oct. 15, 2021	27,20%	0,00%	\$ -	\$ 109.895,14	ON-GOING	
79	Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainara	AILESU UNIPessoal LDA	RFQ-CD-MOP-22006	\$ 23.993,19	28-Jun-22	100,00%	0,00%	\$ -	\$ 23.993,19	ON-GOING	
80	Rural Road Maintenance and Rehabilitation of Maubise - Urlepha (Access to Edi Manelobas) Chainage 0+000 - 3+000 and Urlepha-Rita Chainage 0+000 - 2+150	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainara	BaladaBalada Unipessoal Lda	RT/004/MOP-2021	\$ 349.172,31	May 30, 2022	0,00%	0,00%	\$ 1,00	\$ 349.171,31	ON-GOING	
TOTAL									\$ 98.777.773,17			83,85%	\$ 82.824.885,33	\$ 15.526.715,17		

(Eng. Joaquim de C. Madalga)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Claudy Rodrigues Dos Santos)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

Prepara Husi :

(Eng. Manuel Bony da S. C. de Carvalho)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Jaulino H. Rodrigues)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Silvino D. R. R. Soares)

Eng. M & E, Municipio Ainara ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Nov-22		
												Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-1	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452.775,36	June 6, 2016	87,24%	0,00%	87,24%
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-2	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381.043,91	Sept. 1, 2016	97,63%	0,00%	97,63%
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-3	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1.297.166,32	Sept. 1, 2016	88,36%	0,00%	88,36%
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-4	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	\$ 4.223.004,05	July 1, 2013	100,00%	0,00%	100,00%
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-5	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125.249,49	Nov. 7, 2016	100,00%	0,00%	100,00%
6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-6	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4.325.776,50	Sept. 15, 2017	91,02%	0,00%	91,02%
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-7	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3.717.215,92	July 1, 2013	93,22%	0,00%	93,22%
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28,600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-8	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4.978.350,99	Aug. 28, 2017	41,51%	0,00%	41,51%
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	ANV-9	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro, Co, Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	\$ 3.596.249,07	July 1, 2013	100,00%	0,00%	100,00%
10	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-10	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182.864,69	Nov. 9, 2016	91,76%	0,00%	91,76%
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-11	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489.653,83	April 10, 2019	52,62%	0,00%	52,62%
12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-12	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32.801,87	Aug. 16, 2019	93,39%	0,00%	93,39%
13	Rehabilitasaun Edificio Administraun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	ANV-13	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	\$ 15.000,00	Sept. 19, 2016	0,00%	0,00%	0,00%
14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	ANV-14	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/III/2018	\$ 7.700,00	Feb. 12, 2018	100,00%	0,00%	100,00%
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	ANV-15	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208.089,56	July 29, 2019	97,82%	0,00%	97,82%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Nov-22		
												Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainara-Vila	ANV-16	Ainara	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29.401,14	Sept. 23, 2019	86,20%	0,00%	86,20%
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainara	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainara-Vila	ANV-17	Ainara	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96.256,72	Dec. 19, 2016	100,00%	0,00%	100,00%
18	Rural Roads Routine Maintenance Ainara - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainara-Vila	ANV-18	Ainara	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33.889,94	June 18, 2021	0,00%	0,00%	0,00%
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainara vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainara-Vila	ANV-19	Ainara	Chik-tete Unip. Lda	RDITL-MPWTC-W-015055	\$ 273.148,15	Aug. 1, 2015	64,84%	0,00%	64,84%
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainara-Vila	ANV-20	Ainara	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212.970,88	July 6, 2015	41,32%	0,00%	41,32%
21	Rehabilitasaun Estrada Ainara-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainara-Vila	ANV-21	Ainara	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600.016,84	July 25, 2016	66,84%	0,00%	66,84%
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-22	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98.554,74	Oct. 15, 2021	31,82%	0,16%	31,98%
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-23	Ainara	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103.107,04	Oct. 15, 2021	30,21%	0,42%	30,63%
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainara-Vila	ANV-24	Ainara	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110.313,75	Oct. 15, 2021	32,44%	1,51%	33,95%
25	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainara District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	ANV-25	Ainara	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	\$ 546.598,02	Oct. 25, 2021	20,04%	0,00%	20,04%
26	New Construction of Laboratory for Covid-19, at Sentru Internamentu Ainara Villa, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainara-Vila	ANV-26	Ainara	Adjulcojam Unip. Lda	RDITL-MS-C19-DNA-RBK-21-098C	\$ 70.069,94	14-Mar-21	74,76%	0,00%	74,76%
27	Rehabilitasaun CHC ba Izolamento Ainara Villa relaciona covid19	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Ainara-Vila	ANV-27	Ainara	Marcalas Trading Solution, Unip Lda	RDITL-MS-C19-DNA-RBK-20-212	\$ 31.997,68	Nov. 1, 2021	100,00%	0,00%	100,00%
28	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-1	Ainara	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no kontratu	\$ 24.446,00	Aug. 26, 2013	100,00%	0,00%	100,00%
29	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainara (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-2	Ainara	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	\$ 239.273,00	Sept. 25, 2019	100,00%	0,00%	100,00%
30	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	HA-3	Ainara	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384.790,42	Jul1,26,2021	12,33%	0,00%	12,33%
31	Road Maintenance Section - Ainara - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-4	Ainara	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287.894,03	May 18, 2017	15,00%	0,00%	15,00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Nov-22		
												Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
32	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere-Ainaro	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	HA-5	Ainaro	Berdato Unip Lda		\$ 32.319,72	23.8, 2021	100,00%	0,00%	100,00%
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-6	Ainaro	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97.872,80	Oct. 15, 2021	30,11%	2,67%	32,78%
34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-7	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68.356,81	Oct. 15, 2021	52,56%	6,22%	58,78%
35	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-8		MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110.695,39	Oct. 15, 2021	32,27%	0,63%	32,90%
36	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	HA-9	Ainaro	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	\$ 301.577,86	Oct. 15, 2021	19,30%	0,00%	19,30%
37	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-10	Ainaro	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	\$ 411.500,10	08-Mar-22	12,70%	0,00%	12,70%
38	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-11	Ainaro	Bermuana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	\$ 448.953,98	08-Mar-22	29,20%	0,00%	29,20%
39	Rural Road Rehabilitation of Foho Allico- Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-12	Ainaro	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	\$ 295.599,61	08-Mar-22	14,55%	0,00%	14,55%
40	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-13	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	\$ 326.511,43	08-Mar-22	73,00%	0,00%	73,00%
41	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-1	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161.554,19	Aug. 16, 2019	96,53%	0,00%	96,53%
42	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-2	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27.701,07	Jan. 9, 2017	100,00%	0,00%	100,00%
43	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-3	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195.150,70	Aug. 21, 2019	92,66%	0,00%	92,66%
44	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-4	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60.335,99	Aug. 16, 2019	92,83%	0,00%	92,83%
45	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	HTB-5	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76.554,69	June 18, 2021	37,11%	0,00%	37,11%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Nov-22		
												Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
46	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrading and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	HTB-6	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 28.138.737,00	Nov. 20, 2014	100,00%	0,00%	100,00%
47	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrading and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 - km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	HTB-7	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 26.875.070,79	Nov. 20, 2014	100,00%	0,00%	100,00%
48	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	HTB-8	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4.187.508,61	Dec. 12, 2014	92,29%	0,00%	92,29%
49	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	HTB-9	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1.230.059,02	Sept. 1, 2016	79,02%	0,00%	79,02%
50	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-10	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67.801,26	Oct. 15, 2021	31,77%	0,00%	31,77%
51	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-11	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100.649,51	Oct. 15, 2021	46,30%	0,00%	46,30%
52	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-12	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81.507,44	Oct. 15, 2021	31,12%	0,00%	31,12%
53	Rehabilitasaun Estrda Rural, Hatubelico - Santuario Nain Feto Ramelau, Sta 0+000 - 2+450	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	HTB-13	Ainaro	Leotilya, Unipessoal Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD22001	\$ 778.076,90	July 15, 2022	0,00%	8,05%	8,05%
54	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-1	Ainaro	Bermuana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236.224,90	Feb. 5, 2019	79,95%	0,00%	79,95%
55	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-2	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203.298,50	Jan. 22, 2019	66,94%	0,00%	66,94%
56	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-3	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571.044,38	July 6, 2016	93,00%	0,00%	93,00%
57	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-4	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657.097,80	Jan. 9, 2016	77,28%	0,00%	77,28%
58	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-5	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996.017,31	July 6, 2016	100,00%	0,00%	100,00%
59	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-6	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1.032.412,07	July 6, 2016	48,72%	0,00%	48,72%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Nov-22		
												Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
60	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-7	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RD TL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997.025,15	Sept. 1, 2016	98,38%	0,00%	98,38%
61	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-8	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	\$ 195.378,22	Aug. 16, 2019	100,00%	0,00%	100,00%
62	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-9	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84.706,26	Aug. 12, 2016	100,00%	0,00%	100,00%
63	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urlepha Star 0+000 - 3+000 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-10	Ainaro	Delong Unip. Lda	MPW-190087	\$ 302.126,40	Aug. 16, 2019	100,00%	0,00%	100,00%
64	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-11	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 98.821,63	July 29, 2019	97,43%	0,00%	97,43%
65	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-12	Ainaro	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 212.829,93	July 29, 2019	99,77%	0,00%	99,77%
66	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	MBS-13	Ainaro	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 161.445,07	Aug. 16, 2019	100,00%	0,00%	100,00%
67	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	MBS-14	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	\$ 112.517,92	June 18, 2021	100,00%	0,00%	100,00%
68	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	MBS-15	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34.371,15	June 18, 2021	64,74%	0,00%	64,74%
69	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-16	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353.000,86	Nov. 22, 2016	70,09%	0,00%	70,09%
70	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-17	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50.310,22	Jan. 9, 2017	40,00%	0,00%	40,00%
71	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	MBS-18	Ainaro	El Constructio Unip. Lda	RD TL-MS-C19-DNA-DC-21-012	\$ 140.000,00	29-Apr-21	94,29%	0,00%	94,29%
72	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-19	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99.094,14	Oct. 15, 2021	28,49%	0,00%	28,49%
73	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-20	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92.706,60	Oct. 15, 2021	34,30%	0,00%	34,30%
74	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-21	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86.471,50	Oct. 15, 2021	32,48%	0,00%	32,48%
75	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-22	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97.841,29	Oct. 15, 2021	39,64%	0,00%	39,64%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Nov-22		
												Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
76	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-23	Ainara	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149.916,20	Oct. 15, 2021	0,00%	0,00%	0,00%
77	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-24	Ainara	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94.951,66	Oct. 15, 2021	29,07%	0,00%	29,07%
78	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-25	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109.895,14	Oct. 15, 2021	27,20%	0,00%	27,20%
79	Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-26	Ainara	AILESU UNIPESOAAL LDA	RFQ-CD-MOP-22006	\$ 23.993,19	28-Jun-22	0,00%	100,00%	100,00%
80	Rural Road Maintenance and Rehabilitation of Maubise - Urlepha (Access to Edi Manelobas) Chainage 0+000 - 3+000 and Urlepha-Rita Chainage 0+000 - 2+150	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	MBS-27	Ainara	Balada Unipessoal Lda	RT/004/MOP-2021	\$ 349.172,31	May 30, 2022	0,00%	0,00%	0,00%

Prepara Husi:

(Eng. Joaquim de C. Madeira)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Claudino Soares Dos Santos)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Manuel Bani da S. C. de Carvalho)

Eng. ba Projektu Infraestrutur e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Jaulino H. Rodrigues)

Eng. ba Projektu Infraestrutur, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Silvano D. R. Soares)

Eng. M & E, Municipio Ainara ADN, I.P.

Verifika Husi:

(Arc. Francisco X. D. D. Jeronimo)

Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)

Eng. Senior ba Projektu Infraestrutur e Irigasaun,
ADN, I.P.

(Deolindo de F. Marques)

Chefe Sek. Projektu M.E & ITC, ADN, I.P.

Sertifika Husi:

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Data Inspesaun : 16/11/2022

Fatin Inspesaun : Ruslau/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projeito refere hotu ona, preparasaun ba monta bikesting ba slotf leten. E fui hotu kontinuasaun levantamento dadus ba pagamento 50% nian e pagamento 50% nia sai maka kontinua fali uma kakuluk.	 Network: 16-Nov-2022-12:15:15 GMT+09:00 Local: 16-Nov-2022 12:15:15 GMT+09:00 8,8505S 125,6803E Timor-Leste Altitude: 1233.4m Speed: 1.1km/h Remark: EBF, RUSLAU MAULAU, MAUBISE AINARO Index number: 575

ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere hotu ona, preparasaun ba monta bikesting ba slotf leten. E fui hotu kontinuasaun levantamento dados ba pagamento 50% nian e pagamento 50% nia sai maka kontinua fali uma kakuluk.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere hotu ona,
preparasaun ba monta
bikesting ba slotf leten. E fui
hotu kontinuasaun
levantamento dadus ba
pagamento 50% nian e
pagamento 50% nia sai maka
kontinua fali uma kakuluk.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere hotu ona, preparasaun ba monta bikesting ba slotf leten. E fui hotu kontinuasaun levantamento dados ba pagamento 50% nian e pagamento 50% nia sai maka kontinua fali uma kakuluk.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU





ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Data Inspesaun : 15-11-2022

Fatin Inspesaun : Betula/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long : 8'55'42606'S Latetude: 36'23'274 E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekpa tekniko ADN, IP halo inspesaun ba Projeito Refere, Progresso ba projeto refere GK sira preparasaun monta rangka Plafon.	 Network: 15 Nov 2022 16:49:32 GMT+09:00 Local: 15 Nov 2022 16:49:31 GMT+09:00 8,9287S 125,6065E Jalan Tanpa Nama Timor-Leste Altitude: 1424.6m Speed: 0.0km/h Remark: EBF Betulala, Maubise, Ainaro Index number: 457



ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Sketch & Foto Desenho

Ekipa tekniko ADN, IP halo inspesaun ba Projeito Refere, Progresso ba projeto refere GK sira preparasaun monta rangka Plafon.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Sketch & Foto Desenho

Ekipa tekniko ADN, IP halo inspesaun ba Projeito Refere, Progresso ba projeto refere GK sira preparasaun monta rangka Plafon.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Sketch & Foto Desenho

Ekipa tekniko ADN, IP halo inspesaun ba Projeto Refere, Progresso ba projeto refere GK sira preparasaun monta rangka Plafon.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Data Inspesaun : 16/11/2022

Fatin Inspesaun : Rileco / Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long, 8,8341SLatetude: End 125,5842E

Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa Tekniku ADN, IP. Halo inspesaun progresso fisiku ba projeto refere, GK servisu atinje on aba Ranka Plafon, no instalasaun electrical	Remark: EBF, Rileco, MAUBISE AINAPIC Index number: 615 Timor-Leste Network: 16 Nov 2022 14:04:08 GMT+09:00 Local: 16 Nov 2022 14:04:07 GMT+09:00 8,8373S 125,5864E Maubisse
Sketch & Foto Desenho	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Ekipa Tekniku ADN, IP. Halo inspesaun progresso fisiku ba projeito refere, GK servisu atinje on aba Ranka Plafon, no instalasaun electrical

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Sketch & Foto Desenho

Ekpa Tekniku ADN, IP. Halo
inspesaun progresso fisiku ba
projeito refere, GK servisu atinje
on aba Ranka Plafon, no
instalasaun electrical

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Ekipa Tekniku ADN, IP. Halo inspesaun progresso fisiku ba projeito refere, GK servisu atinje on aba Ranka Plafon, no instalasaun electrical.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekpa Tekniku ADN, IP. Halo inspesaun progresso fisiku ba projeto refere, GK servisu atinje on aba Ranka Plafon, no instalasaun electrical





ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Data Inspesaun : 17-11-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :S, Latetude:E.

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa Teknico ADN, IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico ba projeto refere. Kompanha la halo servisu iha fulan novembro, tamba kompanha processo hela pedido pagamento.	 Network: 17 Nov 2022 12:22:45 GMT+09:00 Local: 17 Nov 2022 12:22:45 GMT+09:00 8,9992S 125,5057E Ainaro Timor-Leste Altitude: 856.6m Speed: 0.0km/h Remark: MSS, MUNICIPIO AINARO Index number: 746

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Ekipa Teknico ADN, IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico ba projeto refere.

Kompanha la halo servisu iha fulan novembro, tamba kompanha processo hela pedido pagamento.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Ekipa Teknico ADN, IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico ba projeto refere.

Kompanha la halo servisu iha fulan novembro, tamba kompanha processo hela pedido pagamento.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Ekapa Teknico ADN, IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico ba projeito refere.
Kompanha la halo servisu iha fulan novembro, tamba kompanha processo hela pedido pagamento.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual






ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

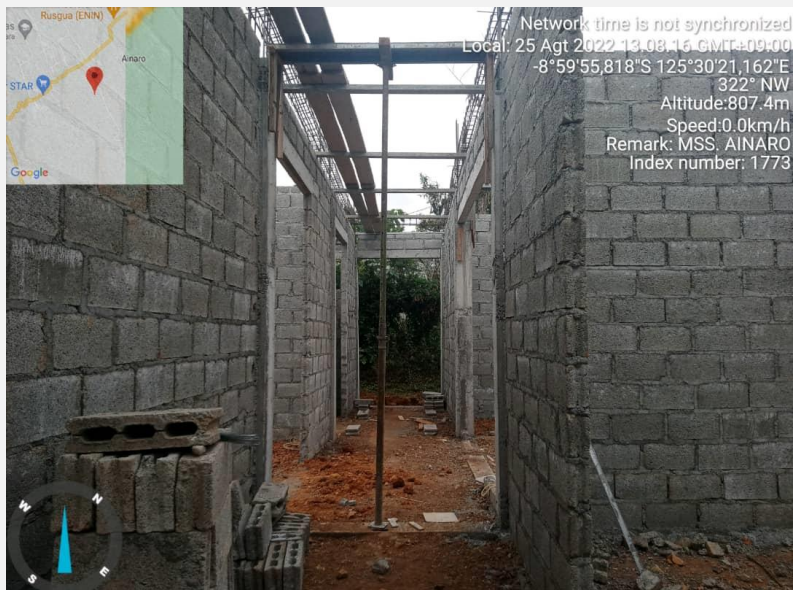



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro



Sketch & Foto Desenho



Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch Item servisu



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Companha kontinua hada
batako, ba edifisiu MSS.



Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro





ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Data Inspesaun : 16-11-2022

Fatin Inspesaun : Tukaro, Hatu builiko

Koordinadas :

Start Point : Long : -856''37.974''S 125'31'18''702 ÉLatetude:

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa Tecnico ADN, IP municipio Ainaro halo Inspeksun ba projeto refere, projeto refere ba ha item block wall remata ona, no sloft leten cor remata ona, concrete work ba ringbalk sopi sopi, mos remata.	



ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Sketch & Foto Desenho

Ekipa ADN municipio Ainaro, halo inspesaun ba pedido pagamento 50%, aproveita mos hodi controla progresso fisiku, hodi halo rekomendasaun.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Município de Ainaro (TUKARRO)

Sketch & Foto Desenho

Ekipa ADN municipio Ainaro, halo inspesaun ba pedido pagamento 50%, aproveita mos hodi controla progresso fisiku, hodi halo rekomendasaun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Sketch & Foto Desenho

Ekipa ADN municipio Ainaro, halo inspesaun ba pedido pagamento 50%, aproveita mos hodi controla progresso fisiku, hodi halo rekomendasaun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Município de Ainaro (TUKARRO)





ANEXU- HA - 36

Back-up Data

Naran Projeto : Projektu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021

Data Inspesaun : 09-11-2022

Fatin Inspesaun : Hato-udo Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :9,1246S, Latetude: 125,6119E.

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekupa ADN.IP halo inspesaun ba progresso fisiko ih tereno, hodi kontrola kualidade de implementasaun husi kompanha, no observa progresso fisiku iha tereno	



ANEXU- HA - 36

Back-up Data

Naran Projeto : Projektu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Ekipa ADN.IP halo
inspesaun ba progresso fisico
ih tereno, hodi kontrola
kualidade de implementasaun
husi kompanha, no observa
progresso fisiku iha tereno

Classroom C1 & C2 (2 unit)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

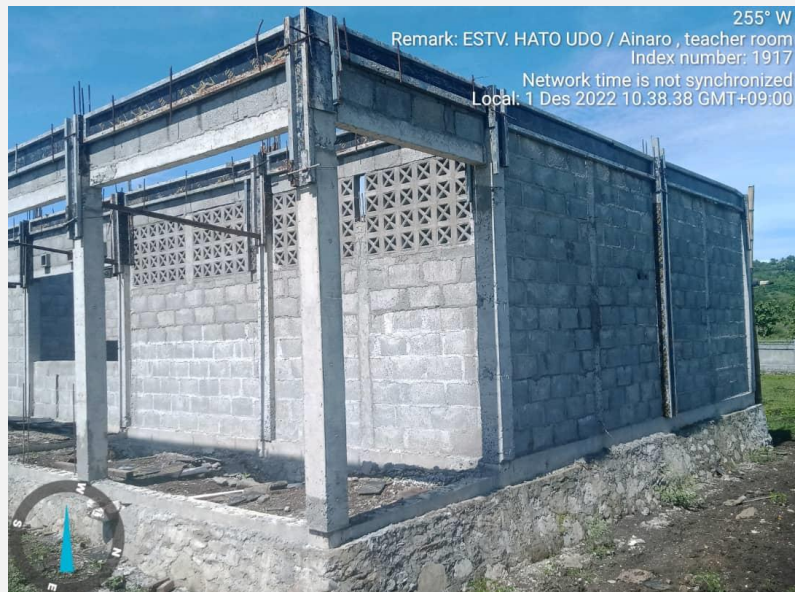



ANEXU- HA - 36

Back-up Data


Naran Projeto : Projektu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho

Ekipa ADN.IP halo
inspesaun ba progresso fisiko
ih tereno, hodi kontrola
kualidade de implementasaun
husi kompanha, no observa
progresso fisiku iha tereno

Laboratory room

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

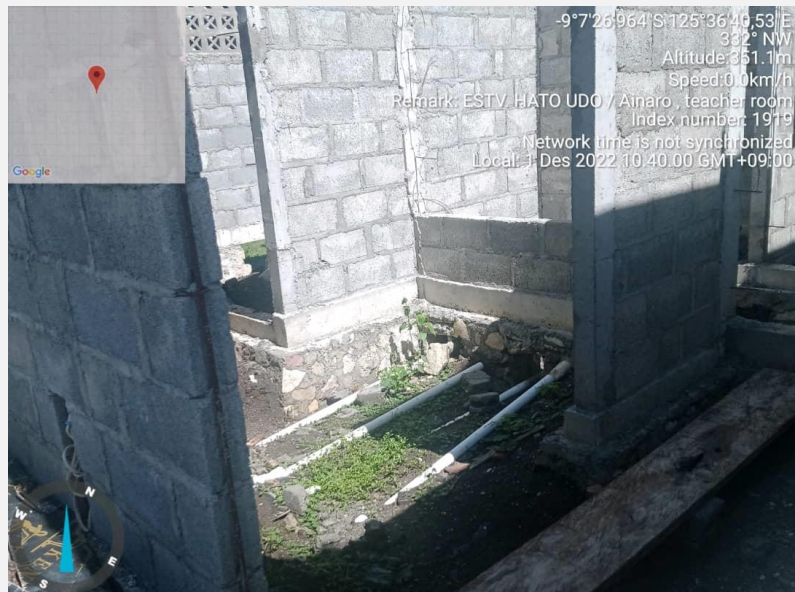



ANEXU- HA - 36

Back-up Data


Naran Projeto : Projektu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho

Ekipa ADN.IP halo
inspesaun ba progresso fisiko
ih tereno, hodi kontrola
kualidade de implementasaun
husi kompanha, no observa
progresso fisiku iha tereno

Teacher room

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

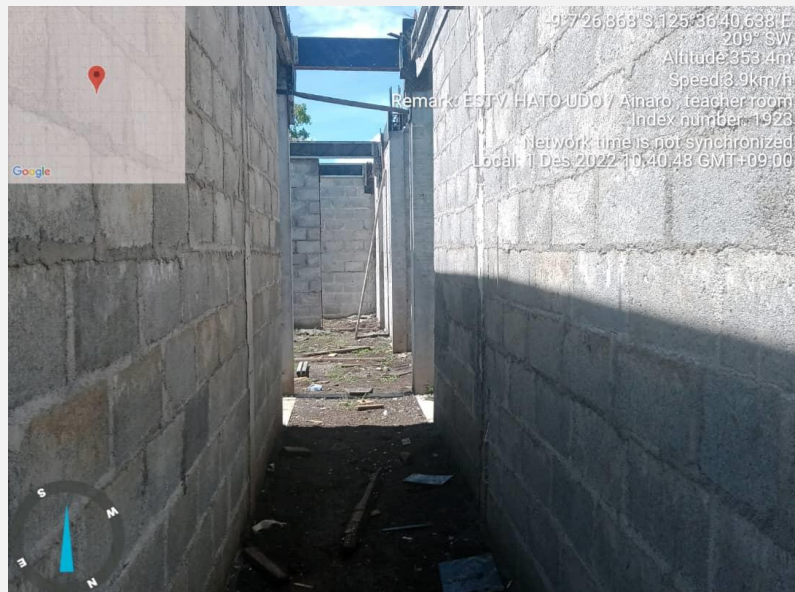



ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Data Inspesaun : 16/11/2022

Fatin Inspesaun : Bermoli/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long -84834'638''S; Latetude: 125'39'26.238' E

End Point : Long : -84834'638''S, Latetude: 125'39'26.238' E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Ekupa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba progresso fisico iha tereno, hodi kontrola qualidade de implementasaun husi GK.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Sketch & Foto Desenho

Ekipa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba progresso fisico iha tereno, hodi kontrola qualidade de implementasaun husi GK. Progresso fisiku atinje ona iha stell roof/kuda-kuda.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Sketch & Foto Desenho

Ekiba TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba progresso fisico iha tereno, hodi kontrola qualidade de implementasaun husi GK. Progresso fisiku atinje ona iha stell roof/kuda-kuda.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba progresso fisico iha tereno, hodi kontrola qualidade de implementasaun husi GK. Progresso fisiku atinje ona iha stell roof/kuda-kuda.





ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Data Inspesaun : 16-11-2022

Fatin Inspesaun :Tatiris Lases

Koordinadas :

Start Point : Long :-8°55'28,638''S Latetude: 125°34'4,392E

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Ekpa Tekniku ADN, IP halo inpesaun ba pedido pagamento.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Network: 16 Nov 2022 16:04:02 GMT+09:00
Local: 16 Nov 2022 16:04:01 GMT+09:00
8,92476 125,5679E
Jalan Tanpa Nama
Timor-Leste
Altitude:1272.7m
Speed:0.0km/h
Remark: EBF. TATIRI LASES HATUBUILICO AINARO
Index number: 669



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Sketch & Foto Desenho

Ekpa Tekniku ADN, IP halo
inpesaun ba pedido
pagamento.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Sketch & Foto Desenho

Ekpa Tekniku ADN, IP halo
inpesaun ba pedido
pagamento.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Data Inspesaun : 16/11/2022

Fatin Inspesaun : Lumluli/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long -8°47'1,122 S; Latetude: 125°41'11'238"E

End Point : Long : -8°47'1,122 S; Latetude: 125°41'11'238"E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa tekniku ADN.IP halo inspesaun iha tereno, ADN. IP observa GK halao hela servisu ba fui sinta leten, no monta batako ba haris fatin.	 Network: 16.Nov.2022 10:30:30 GMT+09:00 Local: 16.Nov.2022 10:30:30 GMT+09:00 8.7836S 125.6866E Timor-Leste Altitude: 1286.2m Speed: 0.0km/h Remark: EBF LUMULULI, MAUBISE AINARO Index number: 533

#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Sketch & Foto Desenho

Ekpa tekniku ADN.IP halo inspesaun iha tereno, ADN. IP observa GK halao hela servisu ba fui sinta leten, no monta batako ba haris fatin.

Observasaun uha tereno no foto aktual



#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Sketch & Foto Desenho

Ekipa tekniku ADN.IP halo
inspesaun iha tereno, ADN. IP
observa GK halao hela servisu ba
fui sinta leten, no monta batako
ba haris fatin.

Observasaun uha tereno no foto aktual



#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Sketch & Foto Desenho

Ekipa tekniku ADN.IP halo
inspesaun iha tereno, ADN. IP
observa GK halao hela servisu ba
fui sinta leten, no monta batako
ba haris fatin.

Observasaun uha tereno no foto aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI





Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 -
6+000, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/007/MOP-2021

Data Inspesaun : 09/11/2022

Fatin Inspesaun : Foho Ailiko - Bobe

Koordinadas :


Start Point : Long : - 9°10'38.3 Latetude: 125°6'40.8

Naran Inspector : 1. Manuel Bany
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Projetu refere kontinua hela servisu
Stone Masonry iha tereno

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

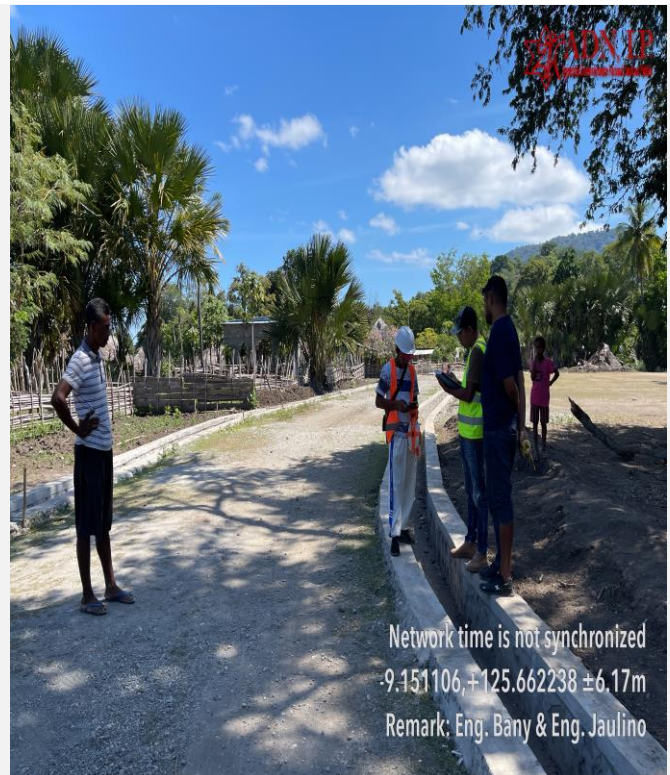

Network time is not synchronized
-9.151106,+125.662238 ±6.17m
Remark: Eng. Bany & Eng. Jaulino



Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 -
6+000, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/007/MOP-2021

Projetu refere kontinua hela servisu
Stone Masonry iha tereno



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere kontinua hela servisu
Stone Masonry iha tereno





Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 -
6+000, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/007/MOP-2021

Data Inspesaun : 21/11/2022

Fatin Inspesaun : Maubessi To Rita

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°10'38.3 Latetude: 125°6'40.8

Naran Inspector : 1. Manuel Bany
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Inspeksaun Pagamento ba IPC II

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Network: 22 Nov. 2022 at 11:04:14 GMT+9
Local: 22 Nov 2022 at 11:04:14 GMT+9
47° NE
Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino



Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 -
6+000, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/007/MOP-2021

Inspeksaun Pagamento ba IPC II

Sketch & Foto Desenho



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Inspeksaun Pagamento ba IPC II





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL





ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 -
6+000, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/007/MOP-2021





ANEXU C1 (MBS-1)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality.

No. kontratu : RT/021/MOP-2019

Data Inspesaun : 08/11/2022

Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'4,044''S, Latetude: 125°35'48,432''E

End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

**Projetu refere sei parado sei tamba sei
halo confirmasaun ho owner ba item
servisu iha tereno**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Network: 8 Nov 2022 at 14:20:17 GMT+9
Local: 8 Nov 2022 at 14:20:16 GMT+9
Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-1)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 -
6+400 Ainaro Municipality.
No. kontratu : RT/021/MOP-2019

Projetu refere sei parado



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado





ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.
No. kontratu : SSS/142/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 09/11/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'15,612''S Latetude: 125°30'39,876''E

End Point : Long : - 9°3'51,231''S Latetude: 125°30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Service Refere parado hela

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.
: SSS/142/MOPTC-2017

Servico Refere parado hela



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico Refere parado hela





ANEXU C1 (ANV-9)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III,
Ainaro Municipality

No. kontratu : SSS/005/MOPTC-2013

Data Inspesaun : 09/11/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'15,612''S Latetude: 125°30'39,876''E


End Point : Long : - 9°3'51,231''S Latetude: 125°30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Laiha aktifidades servisu iha tereno sei hein
hela konvirmasaun husi owner ba item
servisu iha tereno

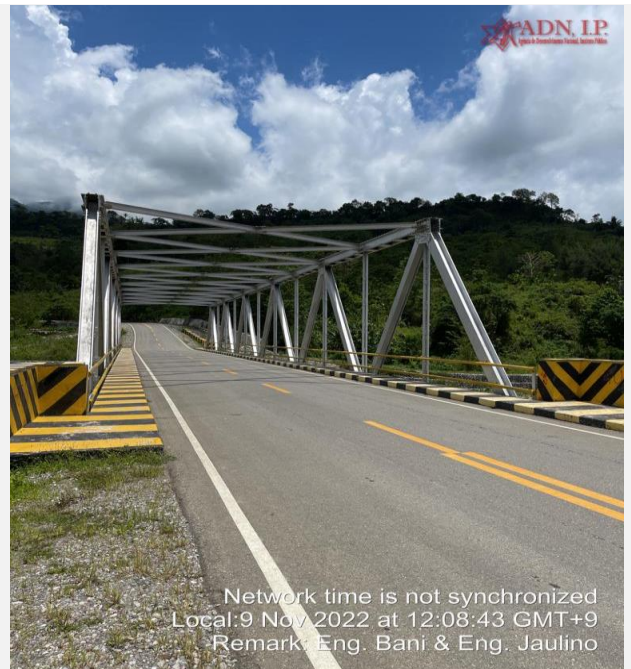



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-9)


Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III,
Ainaro Municipality

No. kontratu : SSS/005/MOPTC-2013



Laiha aktividade servisu iha tereno

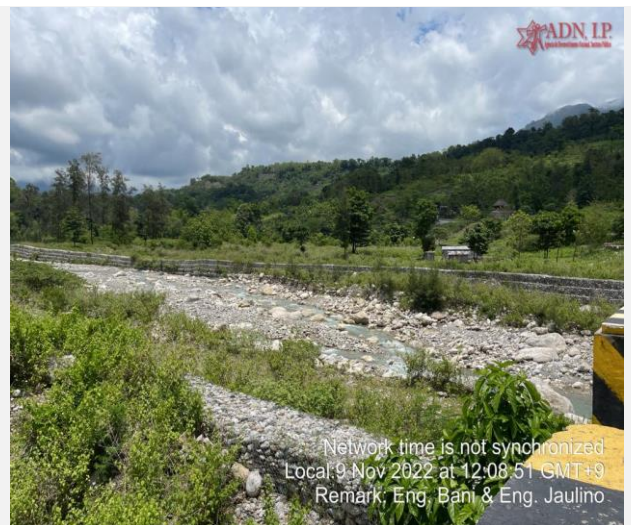



ANEXU C1 (ANV-9)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III,
Ainaro Municipality

No. kontratu : SSS/005/MOPTC-2013

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Laiha aktividade servisu iha tereno	



ANEXU C1 (HA-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02), Casa - Hatu - udo (A13).

No. kontratu : Marino Enterprises, Lda

Data Inspesaun : 09/11/2022

Fatin Inspesaun : Casa – Hatu Udo

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°8'13,374''S, Latetude: 125°32'36,181''E


End Point : Long : - 9°6'3,84''S, Latetude: 125°40'54,588''E

Naran Inspector : 1. Eng. Manuel Bany da S.C de Carvalho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
Companhia sedauk halo servisu iha tereno

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

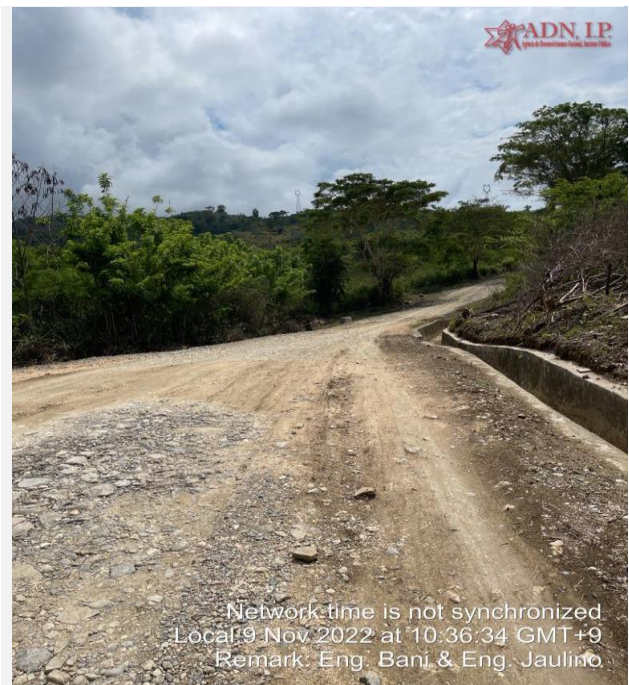

Kondisaun Estrada nebe Parado

ANEXU C1 (HA-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02), Casa - Hatu -
udo (A13).

No. kontratu : Marino Enterprises, Lda

Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
Companhia sedauk halo servisu iha tereno



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
Companhia sedauk halo servisu iha tereno





ANEXU C1 (HTB-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa
Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Data Inspesaun : 10/11/2022

Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'27,798''S Latetude: 125°31'54,408''E

End Point : Long : -8°54'43,776''S Latetude: 125°31'56,1''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projeito parado hela



Network: 10 Nov 2022 at 13:06:36 GMT+9
Local: 10 Nov 2022 at 13:06:36 GMT+9
Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino

Kondisaun Estrada Suco Liurai – Fatubolic



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa
Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Projeito parado hela





ANEXU C1 (ANV-22)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro.

No. kontratu : NCB/087/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 23/11/2022

Fatin Inspesaun : Mau Lo – Mau Nunu

Koordinadas :

Start Point : Long : -9°2'45,223''S Latetude: 125°31'17,356 ''E

End Point : Long : -9°0'59,325''S, Latetude: 125°29'12,324''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Compahia servisu cor Plum Concrete

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-22)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro.**
No. kontratu : **NCB/087/MOPTC-2016**

Compahia servisu cor Plum Concrete

Sketch & Foto Desenho



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Compahia servisu cor Plum Concrete





ANEXU C1 (ANV-8)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro
to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy

No. kontratu : SSS/098/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 09/11/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro - Bobonaro

Koordinadas :

Start Point : Long : 8°59'3,108 S Latetude: 125°29'48,432 E

End Point : Long : 8°59'24,714 S Latetude: 125°27'42,42 E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S. C de Carvalho
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado



Kondisaun Estrada Ainaro Vila – Bobonaro



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-8)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro
to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy

No. kontratu : SSS/098/MOPTC-2017

Projetu refere sei parado

Sketch & Foto Desenho

(PARADO)



Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/008/MOP-2021

Data Inspesaun : 09/11/2022

Fatin Inspesaun : Foho Ailico - Bobe

Koordinadas :


Start Point : Long : - 9°10'38.3 Latetude: 125°6'40.8

Naran Inspector : 1. Manuel Bany
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere kontinua hada stone
monsorny

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

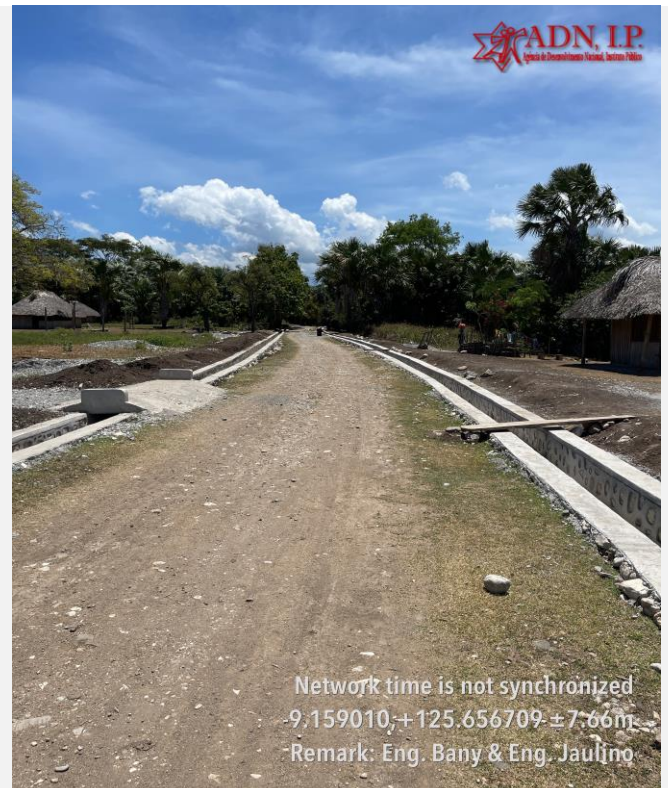

Network time is not synchronized
9.159010;+125.656709±7.66m
Remark: Eng. Bany & Eng. Jaulino



Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality
No. kontratu : RT/008/MOP-2021

Projeito refere kontinua hada stone
monsorny

Sketch & Foto Desenho



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projeito refere kontinua hada stone
monsorny





ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos
Herois Municipality Ainaro.

No. kontratu : 35/MACLNSEACLN/X/2019

Data Inspesaun : 23/11/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'59,904''S Latetude: 125°30'12,588''E

End Point : Long : - 9°1'59,496''S Latetude: 125°30'10,206''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho

:2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Kompanha hahu service Base Course	 Network: 23 Nov 2022 at 12:58:16 GMT+9 Local: 23 Nov 2022 at 12:58:15 GMT+9 Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos
Heroes Municipality Ainaro.
No. kontratu : 35/MACLNSEACLN/X/2019

Kompanha hahu service Base Course



Kondisaun iha Tereno





Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section
Betano Casa Ainaro.

No. kontratu : NCB/030/MOP-2020

Data Inspesaun : 09/11/2022

Fatin Inspesaun : Cassa

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9'821.914 Latetude: 125'3234.949

Naran Inspector : 1. Manuel Bany

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Companhia sei halo Pemasangan
penulangan.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section
Betano Casa Ainaro.
No. kontratu : NCB/030/MOP-2020

Pemasangan Penulangan ho Bekisting



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Pemasangan Penulangan ho Bekisting





ANEXU C1 (HTB-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190091

Data Inspesaun : 10/11/2022

Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°49'55,188''S Latetude: 125°32'30,108''E

End Point : Long : -8°51'9,42''S Latetude: 125°32'14,91''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho
2. Jaulino H. Rodrigues

Service Gabion hotu ona




Network: 10 Nov 2022 at 13:29:01 GMT+9
Local: 10 Nov 2022 at 13:29:01 GMT+9
Remark: Eng. Bañi & Eng. Jaulino



ANEXU C1 (HTB-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190091

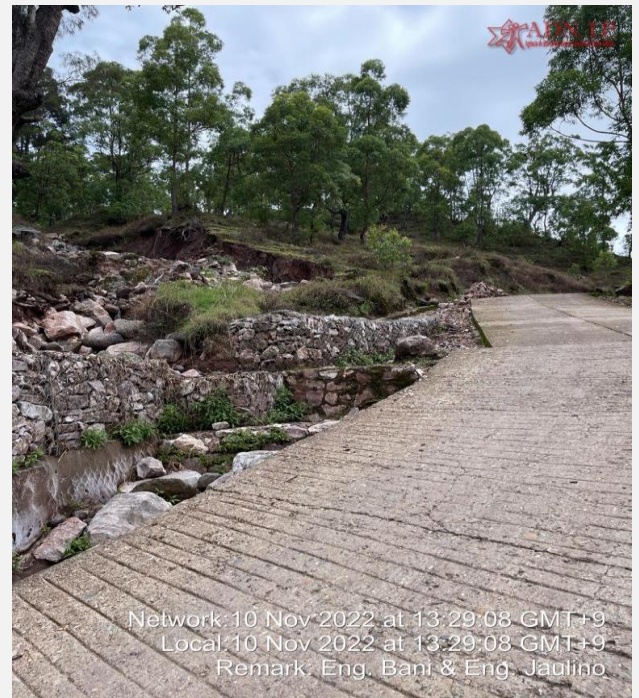

Service Gabion hotu ona





ANEXU C1 (MBS-2)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality.

No. kontratu : RT/021/MOP-2019

Data Inspesaun : 21/11/2022

Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'4,044''S, Latetude: 125°35'48,432''E

End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Halo inspeksaun ba projeitu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-2)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 -
6+400 Ainaro Municipality.
No. kontratu : RT/021/MOP-2019



Sketch & Foto Desenho



Halo inspeksaun ba projeitu





ANEXU C1 (HTB-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190104

Data Inspesaun : 22/11/2022

Fatin Inspesaun : Maubisse - Liurai

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'15,906''S Latetude: 125°35'56,839''E

End Point : Long : -8°51'9,714''S Latetude: 125°35'2,79''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

**Ekipa ADN municipio Ainaro ho
Directur Kompanha GOS
unip.Lda, halo inspeksaun ba
pagamento**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190104

**Ekipa ADN municipio Ainaro ho
Directur Kompanha GOS
unip.Lda, halo inspeksaun ba
pagamento**

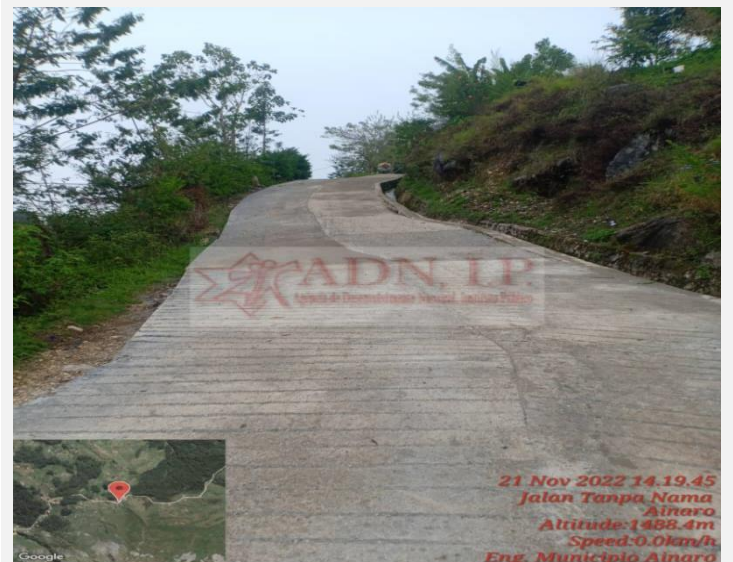



ANEXU C1 (HTB-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Data Inspesaun : 22/11/2022

Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa


Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'9,42''S Latetude: 125°32'14,91''E

End Point : Long : -8°52'43,776''S Latetude: 125°31'56,1''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

2. Jaulino H. Rodrigues

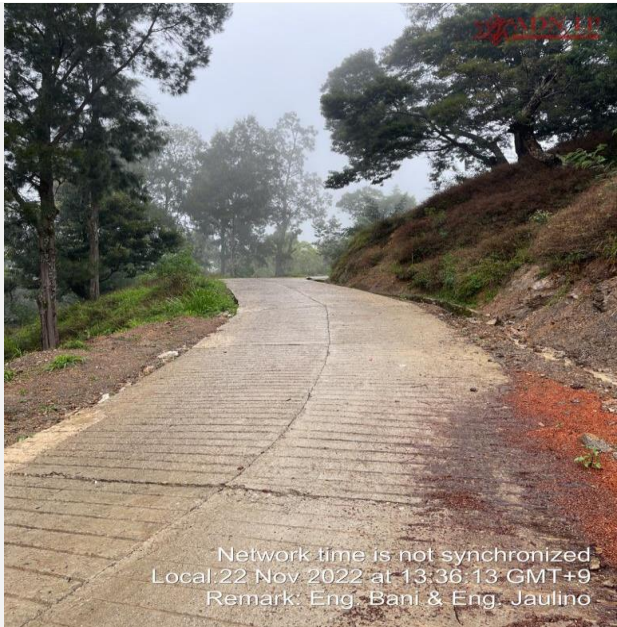Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere sei parado	 Network time is not synchronized Local: 22 Nov. 2022 at 13:36:13 GMT+9 Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino



ANEXU C1 (HTB-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Projetu refere sei parado





ANEXU C1 (ANV-19)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro-Maununu & Mau Ulu Lau
No. kontratu : MPW-190082

Data Inspesaun : 23/11/2022

Fatin Inspesaun : Mau Nunu – Mau Ulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -9°0'17,574''S Latetude: 125°29'48,294''E


End Point : Long : -9°0'48,138''S Latetude: 125°28'39,018''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S. C. de Carvalho
: Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Compahia halao hela servisu ba Stone
Masonry iha tereno

Observasaun iha tereno

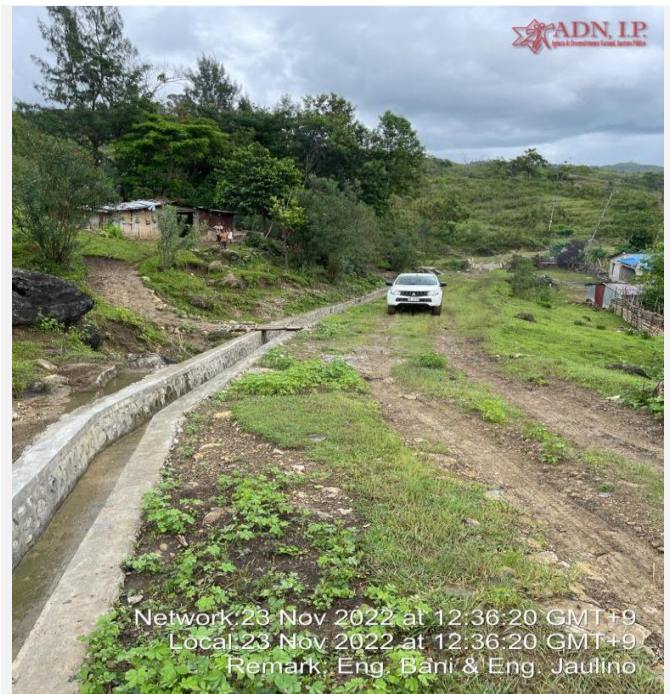



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



PADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro-Maununu & Mau Ulu Lau
: MPW-190082

**Compahia halao hela servisu ba Stone
Masonry iha tereno**

Sketch & Foto Desenho



Network: 23 Nov 2022 at 12:37:49 GMT+9
Local: 23 Nov 2022 at 12:37:49 GMT+9
Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino

Observasaun iha tereno

**Compahia halao hela servisu ba Stone
Masonry iha tereno**



Network: 23 Nov 2022 at 12:38:02 GMT+9
Local: 23 Nov 2022 at 12:38:02 GMT+9
Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino



ANEXU C1 (ANV-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 -
5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : MPW-190082

Data Inspesaun : 23/11/2022

Fatin Inspesaun : Mau Nunu – Mau Ulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -9°0'17,574''S Latetude: 125°29'48,294''E

End Point : Long : -9°0'48,138''S Latetude: 125°28'39,018''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S. C. de Carvalho
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

**Manutensaun (Hamos Duut) husi Maulo –
Mau Nunu atizi ona 100% iha ful;an
agostus 2021**

Observasaun iha tereno



Network: 23 Nov 2022 at 12:40:35 GMT+9
Local: 23 Nov 2022 at 12:40:35 GMT+9
Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino

Kondisaun Manutensaun Obra nebe kaer husi



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-12)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Ainara - Mau - Nuno Sta. 0+000 -
5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainara / 162
No. kontratu : MPW-190082

**Manutensaun (Hamos Duut) husi Maulo –
Mau Nunu atizi ona 100%**

Sketch & Foto Desenho




Observasaun iha tereno

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Joaquim de C. Madeira						2022																																
	Claudino Soares dos Santos																																						
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	November																														OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
MAUBISSE (MBS)	4	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet, Cuzina no Armagem no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (BERMOLI MAULAU)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																
							Actual																																
	5	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Lumluli)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																
							Actual																																
	6	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manelobas Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Maneloba)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																
							Actual																																
	7	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Russulau)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																
							Actual																																
	8	Construção de Salas de Aulas 6 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Manetu)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																
							Actual																																
	9	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Rileco Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																
							Actual																																
	10	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Aituto Posto Administrativo de Maubisse Município de Ainaro (Betulala)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/1/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu	Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu	Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili	Inspesaun Proceu Pagamentu
---	--	--	--




Prepara Husi :
(Eng. Joaquim de C. Madeira) & (Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Município Ainaro



Sertifika Husi :
(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



Aprova Husi :
(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.

2022



[illegible]

Note:



Planu Periode inspesaun iha tereinu



Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu



Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili



Inspesaun Prokesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)

Eng. ba Projeitu Infraestrutur e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Enq.Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :



(Eng. Januario Maia Guterres)

Adjunto Director Ejecutivo, ADN,I.P

								PLANU INSPESAUN																																			
Naran Eng.	Jaulino H Rodrigues							2022																																			
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																										
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Novembro																															OBS				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
AINARO VILA (ANV)	4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		FHO		
							Actual																																				
	5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Projetu refere 100% iha 2016 maibe companhia sedauk husu retensaun 10% ate a data		
							Actual																																				
	6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		FHO		
							Actual																																				
	7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			Projetu refere sei parado tamba afeita husi Kalamidade 04/04/2021	
							Actual																																				
	8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			Projetu refere parado tamba sei kordena ho owner	
							Actual																																				
	9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				
							Actual																																				
	11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEA/CLN/X/2019	LM	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																																				
							Actual																																				
	12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				Hela retensaun 10%
							Actual																																				
	19	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maumuno Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				
							Actual																																				
	20	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			Projetu refere parado iha tinan 2016 ate a data	
							Actual																																				
	22	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	EI Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				
							Actual																																				
HATUDO (HA)	2	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklima (Udan) halo compahia labele halo servisu normal iha tereno	
							Actual																																				
	3	New Construction of Electrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				
							Actual																																				
	4	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data	
							Actual																																				
HATUBULICO (HTB)	1	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	Gos Unip.Lda	MPW-190104	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			Hela retensaun 10%	
							Actual																																				
	2	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maumuno Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Projetu refere ADN LP Halo tia ona pagamento Retensaun (10%) iha tinan 2019. Husu atu here fila fali dadus pagamento		
							Actual																																				
	3	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubulico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				
							Actual																																				
	4	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	Ailesu Unip Lda	MPW-190091	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				
							Actual																																				
	5	Spot Improvement Liurai - Hatubulico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	Betua Calda Unip.Lda	MPW-W-210062	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				
							Actual																																				

							PLANU INSPESAUN																																	
Naran Eng.	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares						2022																																	
Municipio	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																							
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Nov																														OBS		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
AINARO VILA (ANV)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Babocla, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	Laxana Unip. Lda	RDITL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																LAIHA ONA ESPASO HODI KONTINUA OBRA	
							Actual																																	
	2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	Mantilo Unip. , Lda	RDITL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																LAIHA ONA ESPASO HODI KONTINUA OBRA	
							Actual																																	
	3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Caloko and Hatobulico - Ainaro Municipality	Terolau Unip. Lda	RDITL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																ON - GOING	
							Actual																																	
	10	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC/2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																INSPEKSAUN PAGAMENTO EIS SPK LAHANE (C QUECEN,LDA)	
								Actual																																
	14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	Gos	71/GAM-AIN MAE/II/2018	PDIM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																INSPEKSAUN PAGAMENTO HERA (SANTAN DIAK,LDA)	
								Actual																																
	15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	Simbissa	389/KDM- AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																INSPEKSAUN PAGAMENTO M. JUSTICA (FATUK MOTA,LDA)	
								Actual																																
HATUBULICO (HTB)	35	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunumoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loetelu 2- Ainaro Municipality	Se-Maunin Unip. Lda	RDITL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																ON - GOING	
MAUBISSE (MBS)	38	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	Kakuit Jaya Unip Lda	RDITL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																LAIHA ONA ESPASO HODI KONTINUA OBRA	
							Actual																																	
	39	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libutu - Ainaro Municipality	Lotas Unip. , Lda	RDITL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																ON - GOING	
							Actual																																	
	40	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurilala - Ainaro Municipality	Petaju Unip Lda	RDITL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																HELA RETENSAUN 10%	
							Actual																																	
	41	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiluku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	Ria Tu Unip. Lda	RDITL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PARADO	
							Actual																																	
	42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatri and Mulo - Ainaro Municipality	Tuto Deni Unip. Lda	RDITL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																HELA RETENSAUN 10%	
							Actual																																	
	47	Konstrusaun ESTV Bernoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM- AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIU E INDUSTRIA	Plan																																	
								Actual																																
	48	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	Mentil Unip. Lda	391/KDM- AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
								Actual																																
	63	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	Ei Constructio Unip. Lda	RDITL-MS-C19-DNA- DC-21-012	Fundo Covid-19	ESTATAL	Plan																																HELA RETENSAUN 10%	
								Actual																																
	64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maneobas	MEJD PKRIE EBF MANEOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
								Actual																																
65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																	
66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Beremoli Maulau	MEJD PKRIE EBF BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																	
67	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																	
68	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																	
69	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																	
70	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																	
TOTAL PROJETO ON-GOING																																								

Note:

 Planu Periode inspesaun iha tercinu	 Implementa Planu Periode Inspesaun iha Terenu	 Relatoriu avallasaun mensal iha Dili	 Inspesaun Processu Pagamentu
---	---	--	--

Preparu Husi:

 (Silvino D. R. Rebelo Soares)
 Eng. Electricidade - ADN - I.P.

Sertifica Husi:

 (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN - I.P.

Aprova Husi:

 (Eng. Januario Maia Guterres)
 Adjunto Director Executivo, ADN - I.P.
