



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN PROJETUS
MUNISÍPIU VIQUEQUE

FEBEREIRU 2023



Elabora Hosi Eng. Munisípiu

SUMÁRIO

RELATÓRIO IMPLEMENTASAUN PROJETU INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO VIQUEQUE FEVEREIRO 2023

Prepara Husi :




(Eng. Roberto M. Martins)

Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, Municipio Viqueque ADN, I.P




(Eng. Salvador Martins)

Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, Municipio Viqueque ADN, I.P



(Eng. Bebian C. de Jesus Lopes)

Eng. ba Projetu Edifício Publiku no Beé
Saneamentu, Municipio Viqueque ADN, I.P



(Eng. Guido Carceres Tilman)

Eng. ba Projetu Edifício Publiku no Beé
Saneamentu, Municipio Viqueque ADN, I.P



(Eng. Adonis Julio Fernandes)

Eng. ba Projetu Mekanikal Elektrial,
Municipio Viqueque ADN, I.P

Verifika Husi :



(Arc. Francisco X.D.D. Jeronimo)

Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé
Saneamentu, ADN, I.P



(Eng. Remigio da C.S dos Santos)

Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura
Transportes e Irigasaun, ADN, I.P



(Deolindo de F. Marques)

Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, ST. M.Eng)

Director Ezeutivo , ADN, I.P



INDICE

SUMÁRIO	0
INDICE	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal	3
1.2 Perfil Municipio Viqueque	3
1.3 Lista Projecto	6
II. PROGRESU FISIKU	14
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	14
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	14
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	14
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	16
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	16

INDICE TABELA

Tabela 1	: Postos Administrativos, Sucos no Aldeia.....	4
Tabela 1.1	: Forca Trabalho ADN, I.P Municipio Viqueque.....	5
Tabela 1.2	: Lista Asset ADN, I.P Municipio Viqueque.....	5
Tabela 1.3.1	: Tabela Municipio Viqueque Por Fundus Finansiamiento.....	6
Tabela 1.3.2	: Tabela Municipio Viqueque Por Sectores.....	8
Tabela 1.3.3	: Tabela Municipio Viqueque Por Ministerio.....	10
Tabela 1.4	: Dadus populasau Munisipiu Viqueque.....	13


I. INTRODUSAUN

1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Presidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu aseguira katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefisiu ne'ebe razoável no viável. Depois de Dekretu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio Viqueque

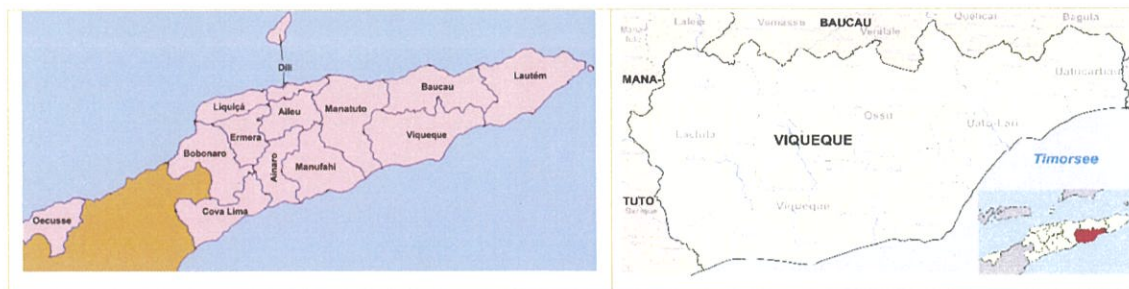

Mapa 2 hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Viqueque iha luan 1,781 km² ho populasaun 70,036 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Viqueque iha Postos Administrativos lima (5), Sukus 35 no Aldeias 228, mak hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos no Aldeia

Lacluta		Ossu		Viqueque	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Ahic	5	Builale	5	Bahalarauain	6
Dilor	5	Liaruca	5	bibileo	8
Laline	5	Loi-Huno	5	Caraubalu	7
Uma tolu	5	Naha Reka	5	Fatudere	3
-	-	Ossu Rua	12	luca	4
-	-	Ossu Decima	8	Maluru	3
-	-	Uabubo	6	Uai Mori	6
-	-	Uaguaia	6	Uma Quic	8
-	-	Uaibobo	7	Uma Uain Craic	9
-	-	-	-	Uma Uain Leten	8
Total	20	-	59	-	62

Uato-Carbau		Watulari	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Afaloicai	4	Babulo	8
Bahatata	4	Macadique	21
Irabin de Baixo	7	Matohoi	12
Irabin de Cima	5	Uaitame	5
Loi Ulo	5	Vesoru	7
Uani Uma	5	Afaloicai	4
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	30	-	57

Data husi livro 3B, OJE 2021, Pajina 86

Tabela 1.1 : Forca Trabalho ADN, I.P Municipio Viqueque

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Viqueque								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro			4			4	
2	Administrasaun no Financas			0			0	
3	Motorista			2			2	
4	Seguransa			0			0	
Total							6	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN, I.P Municipio Viqueque

ASET ADN,IP MUNICIPIO VIQUEQUE								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio			1			1	
2	Kareta			1			1	
3	Desktop HP / Monitor			1			1	
4	Laptop HP			1			1	
5	Printer Cannon (Color)			1			1	Aát
6	UPS			1			1	
7	Armario File			2			2	
8	Armario Tau hena			3			3	
9	Meja escritorio			1			1	
10	Meja han			1			1	
11	Meja TV (kiik)			1			1	
12	Kadeira escritorio			6			6	
13	Kadeira han			4			4	
14	Sofa			1 Set			1 Set	
15	Springbed			3 Set			3 Set	
16	Jeleira			1			1	
17	Water Dispenser			1			1	Aát
18	TV + Parabola			1 Set			1 Set	Parabola Aát
19	AC			4			4	
20	Kompor			1				La iha
21	Kompor Gas			1			1	Aát
22	Rack sepatu			3				La iha
23	Rack Piring			1				La iha
24	Water Pump Sanyo			1				La iha

1.3 Lista Projecto

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dadus projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamiento, tabela 1.3.2 Projetu por Sectores no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Tabela Municipio Viqueque Por Fundus Finansiamiento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI+LM-BS+LM-CD+PDIM		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta	3	\$ 5,278,154.01	61.40%
2	Regional	1	\$ 23,853,175.70	27.67%
3	Ossu	22	\$ 15,598,989.00	47.57%
4	Uatocarbau	8	\$ 10,536,604.17	56.88%
5	Uatolari	18	\$ 13,822,469.06	38.80%
6	Viqueque	17	\$ 20,690,797.93	51.61%
	Grand Total	69	\$ 89,780,189.87	43.77%

NO POSTO ADMINISTRATIVO		FI		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta	1	\$ 4,886,127.61	64.25%
2	Regional	1	\$ 23,853,175.70	27.67%
3	Ossu	4	\$ 9,461,469.53	68.26%
4	Uatocarbau	5	\$ 10,124,353.34	58.27%
5	Uatolari	5	\$ 11,155,838.98	36.83%
6	Viqueque	8	\$ 18,890,123.05	52.63%
	Grand Total	24	\$ 78,371,088.21	46.12%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta			
2	Regional			

3	Ossu			
4	Uatocarbau			
5	Uatolari	1	\$ 145,269.48	0.00%
6	Viqueque	1	\$ 150,012.65	88.75%
	Grand Total	2	\$ 295,282.13	45.09%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM + CD		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta	1	347806.68	17.76%
2	Regional			
3	Ossu	14	\$ 5,708,319.54	13.48%
4	Uatocarbau	1	\$ 236,638.85	0.00%
5	Uatolari	5	\$ 1,770,719.50	52.49%
6	Viqueque	3	\$ 1,224,941.06	34.04%
	Grand Total	24	\$ 9,288,425.63	23.44%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta			
2	Regional			
3	Ossu	4	\$ 429,199.93	45.03%
4	Uatocarbau	2	\$ 175,611.98	53.72%
5	Uatolari	7	\$ 750,641.10	43.26%
6	Viqueque	5	\$ 425,721.17	43.72%
	Grand Total	18	\$ 1,781,174.18	44.83%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Emergency		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	Lacluta	1	\$ 44,219.72	90.00%
2	Regional			
3	Ossu			
4	Uatocarbau			
5	Uatolari			
6	Viqueque			
	Grand Total	1	\$ 44,219.72	90.00%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Tabela Municipio Viqueque Por Sectores

NO	SECTOR PROJETO	TOTAL PROJECTO		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	3	\$ 5,472,502.45	77.34%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	26	\$ 4,383,853.70	37.27%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	4	\$ 2,296,509.09	65.49%
4	ESTRADAS E PONTES	33	\$ 53,165,127.88	47.25%
5	IMPRESTIMO	1	\$ 23,853,175.70	27.67%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	33.83%
Grand Total		69	\$ 89,780,189.87	43.77%

NO	SECTOR PROJETO	LA CLUTA		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 347,806.68	17.76%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
4	ESTRADAS E PONTES	2	\$ 4,930,347.33	64.48%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
Grand Total		3	\$ 5,278,154.01	61.40%

NO	SECTOR PROJETO	OSSU		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	EDIFICIOS PUBLICOS	5	\$ 756,432.59	60.51%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
4	ESTRADAS E PONTES	15	\$ 14,233,535.36	47.47%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	33.83%
Grand Total		22	\$ 15,598,989.00	47.57%

NO	SECTOR PROJETO	REGIONAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	EDIFICIOS PUBLICOS			
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
4	ESTRADAS E PONTES			
5	IMPRESTIMO	1	\$ 23,853,175.70	27.67%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
	Grand Total	1	\$ 23,853,175.70	27.67%

NO	SECTOR PROJETO	UATUCARBAU		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	2	\$ 5,025,018.02	76.54%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 412,250.83	22.89%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1,147,191.84	81.19%
4	ESTRADAS E PONTES	1	\$ 3,952,143.48	28.37%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
	Grand Total	8	\$ 10,536,604.17	56.88%

NO	SECTOR PROJETO	UATULARI		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 447,484.43	86.28%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	10	\$ 1,386,105.37	38.64%
3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1,149,317.25	49.82%
4	ESTRADAS E PONTES	5	\$ 10,839,562.01	35.69%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
	Grand Total	18	\$ 13,822,469.06	38.80%

NO	SECTOR PROJETO	VIQUEQUE		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	EDIFICIOS PUBLICOS	7	\$ 1,481,258.23	32.71%

3	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
4	ESTRADAS E PONTES	10	\$ 19,209,539.70	53.07%
5	IMPRESTIMO			
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
Grand Total		17	\$ 20,690,797.93	51.61%

Dados detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Tabela Municipio Viqueque Por Ministerio

NO	DONO DO PROJETO	TOTAL PROJECTO		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	0.00%
2	MENISTERIO DA EDUCASAUN	21	\$ 2,594,341.80	35.60%
3	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN	1	\$ 805,366.41	32.31%
4	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	3	\$ 5,472,502.45	77.34%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	\$ 79,923,833.72	41.83%
6	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL	1	\$ 275,004.50	67.53%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 236,638.85	0.00%
8	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 327,232.66	80.82%
Grand Total		69	\$ 89,780,189.87	43.77%

NO	DONO DO PROJETO	LACLUTA		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
2	MENISTERIO DA EDUCASAUN	1	\$ 347,806.68	17.76%
3	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
4	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	2	\$ 4,930,347.33	64.48%
6	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			

7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
8	MINISTERIO SAUDE			
Grand Total		3	\$ 5,278,154.01	61.40%

NO	DONO DO PROJETO	OSSU		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
2	MENISTERIO DA EDUCASAUN	4	\$ 429,199.93	45.03%
3	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
4	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	17	\$ 14,842,556.41	46.91%
6	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
8	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 327,232.66	80.82%
Grand Total		22	\$ 15,598,989.00	47.57%

NO	DONO DO PROJETO	REGIONAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
2	MENISTERIO DA EDUCASAUN			
3	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
4	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	1	\$ 23,853,175.70	27.67%
6	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
8	MINISTERIO SAUDE			
Grand Total		1	\$ 23,853,175.70	27.67%

NO	DONO DO PROJETO	UATUCARBAU		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			
2	MENISTERIO DA EDUCASAUN	2	\$ 175,611.98	53.72%
3	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
4	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	2	\$ 5,025,018.02	76.54%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 5,099,335.32	40.26%
6	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 236,638.85	0.00%
8	MINISTERIO SAUDE			
	Grand Total	8	\$ 10,536,604.17	56.88%

NO	DONO DO PROJETO	UATULARI		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	0.00%
2	MENISTERIO DA EDUCASAUN	8	\$ 965,831.39	36.23%
3	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN			
4	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 447,484.43	86.28%
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	7	\$ 11,988,879.26	37.04%
6	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL	1	\$ 275,004.50	67.53%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
8	MINISTERIO SAUDE			
	Grand Total	18	\$ 13,822,469.06	38.80%

NO	DONO DO PROJETO	VIQUEQUE		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	IGREJA PROTESTANTE TIMOR			

2	MENISTERIO DA EDUCASAUN	6	\$ 675,891.82	33.19%
3	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN	1	\$ 805,366.41	32.31%
4	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	10	\$ 19,209,539.70	53.07%
6	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTENTES DA LIBERTACAO NACIOANL			
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
8	MINISTERIO SAUDE			
Grand Total		17	\$ 20,690,797.93	51.61%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus populasau Munisipiu Viqueque

Administrative Post, Suco and Sex	2021				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Lacluta	7,098	2,152	1,917	1,528	1,501
Ossu	17,972	4621	4946	4241	4164
Uato-Lari	19,580	4,927	5,199	4,879	4,575
Uatucarbau	7,669	1,842	2,060	1,896	1,871
Viqueque	26,822	7,370	7,549	6,184	5,720

Fontes : Projeksaun Populasaun bazea ba Census Populasaun no Uma Kain 2015
Direcção Geral de Estatística, MOF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia persentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu persentagen actual fulan ida ne'e hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare'e iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hare'e #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

- ❖ Durante Equipa ADN, I.P. Viqueque halo monitorizasaun no Inspeksaun hasoru obstaklo sira iha Terreno mak hanesan tuir mai ne'e :
 - Ekpa ADN, I.P. Viqueque, halo monitorizasaun no inspeksaun indentifika kompanhia balun la kumpri rekomendasaun ne'ebe equipa hatu'o, hanesan :
 - a) Atu taka dokumentos *Time Schedule* no *Dezenho service* iha Site office maibe sira nafatin la taka ate a data.
 - b) Kompanhia servisu parado no Equipa ADN, I.P. viqueque orienta atu kontinua fali maibe ate a data seidauk kontinua.
 - c) Iha kompanhia balu nebe'e laiha *site office* iha terreno.
 - Ba projetu abandona sira ne'ebe abandona durante ne'e (husi tinan 2014 ate a data) no lokaliza iha fatin ne'ebe do'ok tuir orientasaun tenki halo planu ba observa dala rua maibe iha tempu udan defisil atu asesu ba, no maioria gastus tempu barak liu ba projetu ne'ebe abandona
 - Iha projeto sira site supervisor husi ministerio relevante la iha terreno, no kontrator sira dalaruma servisu la tuir espesifikasaun iha kontrato, maibe parte tekniko ADN, I.P. tempo la to'o atu diariamente kontrola iha terreno, hodi nune'e servisu sira ne'ebe iha rai laran ona susar atu indentifika.

tamba factor distancia (projecto ida ba projetco seluk), ho nune'e ekipa ADN, I.P. Viqueque halo monitorizasaun ba projeto hirak ne'e mais ou menus loron ida hare projetu ida ou rua deit.

❖ Durante Equipa ADN, I.P. Viqueque halo servisu iha Eskritorio ADN, I.P. Municipio hasoru obstaklo sira mak hanesan :

- Printer la diak, no lebele uza, krik atu print asuntu inportante ruma presiza ba print fali iha fatin seluk, ida nee mos bele fo impakto ba dokumentos konfidensial sira.
- Internet iha Municipio lao ladun diak hodi nune susar tebes atu asesu manda dokumentos ruma *via email* liu liu *Dropbox*.
- Sistema *Drop Box* Equipa hatama ona dados Inspeksaun no Monitorizasaun, maibe ami nia dados sira labele asesu iha nacional tamba *Memory Drop Box Full*.
- Ami nia Edificio / Residencia refere presiza manutensaun tamba iha parte electrical no odatamatan balu la seguro, no ami araska asesu be'e mos.
- Fasilidade la sufisiente apoiu servisu diariamente hanesan laptop, tamba ami tekniku munisipiu Viqueque iha deit laptop ida e nee mos la sufisiente atu halo *back up data* no update ba *folder system*.

❖ Obstaclo Parte Eletricidade :

Obtaklu nebe durante Prosesu monitorizasaun Eng. Mekanikal, Elecktrikal & ITC hasoru iha base mak hanesan tuir mai nee:

1. Laptop Laiha atu halo relatorio wainhira iha municipio.
2. Transporte (Karetu/ Motor) la suficiente atu koresponde ba plano nebe Aprovado.
3. Combustivel/Mina (Municipio Baucau, Viqueque, Lautem Pertamina Eto Laiha).
4. Kontractor laiha site ou kontaktu/telepon la tama no contractor la ba iha site/terenu
5. Menus Engenheiro ME.
6. Natureza hanesan Udan boot, Estrada kotu dalan la asesu ba karetu.

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Rekomenda ba superior ADN, I.P. atu kordena ho ministerio relevantes sira hodi nune'e bele fo penalidade ba komphia sira nebe servisu parado no abandona hela sira nia servico sem informasaun.
2. Rekomenda ba parte Lina Ministerial sira atu foti desizaun ba projeto sira ne'ebe parado no abandona iha terreno.
3. Ministerio relevante sira atu implementa projeto sira tenke iha mos *Site Supervisor*, hodi nune bele kontrola servisu Diariamente iha terreno.
4. Ami Rekomenda ba superior sira atu prepara printer nebe bele print *kertas* A3 no A4 hodi nune'e bele fasilita ami nia servisu iha Municipio.
5. Rekomenda ba Seksaun ITC hare konaba velocidade internet nebe'e mak iha munisipiu ho velocidade nebe'e ki'ik susar atu envia dokumentus ba *dropbox*.
6. Sujere mos ba seksaun ITC atu hare mos konaba kapasidade *dropbox* nian nebe'e distribui ba Munisipiu sira ho kapasidade nebe'e bo'ot hodi nune'e bele akumula dados hotu iha laran.
7. Husu ba parte Logistica atu tun Direita hodi hare ami nia residensia refere iha municipio, hodi nune'e bele halo manutensaun, tamba ami hatu'o ona proposta ba parte Logistik
8. Rekomenda mos ba seksaun ITC atu aumenta facilidade Laptop ba iha Munisipiu tamba tekniku nain tolu assesu *dropbox* iha laptop ida deit, hodi nune'e susar atu fahe servisu.

❖ **Recomendação Parte Electricidade :**

1. Rekomenda ba Parte Logistik atu prepara Laptop kada engenheiro (Ba Engenheiro nebe seidauk Hetan)
2. Rekomenda ba Logistik atu Aumenta transporte kareta ba Engenheiro Electricidade
3. Rekomenda ba parte Logistik atu hare problema kombustivel/mina iha parte leste mak hanesan Municipio Baucau, Municipio Lautem no Municipio Viqueque

monitorizasaun karik mina hotu ami tenki fila mai atesta iha municipio Manatuto

4. Rekomenda ba Superior sira atu koordena ho Dono do Projeto (EDTL, EP) oinsa atu kria linha koordenasaun nebe diak
5. Rekomenda ba HR atu Aumenta eng. Electricidade (Recruta tan engenheiro ME)
6. Rekomenda ba Parte Logistik atu prepara ou facilita simcard office nian ba engenheiro.

Note: Assinatura husi Eng Municipio Viqueque

Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Viqueque						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engenheiro	Bebiano C. de Jesus Lopes	156	Engenheiro EPAS		
2	Engenheiro	Roberto M. Martins	175	Engenheiro ITI		
3	Engenheiro	Salvador Martins	133	Engenheiro ITI		
4	Engenheiro	Guido Carceres Tilman	191	Engenheiro EPAS		

5	Engenheiro	Adonis Julio Fernandes	152	Engenheiro METIC		
6	Engenheiro	Joao Paulo Amaral	077	Engenheiro VEBD		
7.	Motorista	Bendito M. Bento	027	Motorista		
8	Motorista	Domingos da Costa		Motorista		

ANEXU A

Município Viqueque (Lista Geral)

Localizasaun Projeto																
NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	Suco	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA (%)	PAGA (\$)	BAL. (\$)	OBS
1	New COstruction Of Dilor River Protection Package 2 STA 0+800-1+612 In Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Dilor	Lacluta	Viqueque	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOPTC-2017	\$ 4,886,127.61	Aug. 25, 2017	99.39%	64.25%	\$ 3,139,406.69	\$ 1,746,720.92	ON-GOING
2	Konstrusaun foun Escola Secundária Tecnica vocacional Ravina Lacluta	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Lacluta	Viqueque	Luafamor Unipessoal. Lda	NCB/021-R/MEJD/DNA/2022	\$ 347,806.68	02/09/2022	37.37%	17.76%	\$ 61,761.72	\$ 286,044.96	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 12.03%
3	Emergency Project, Cyclone Seroja 04 April 2021, River Training Welolo, Viqueque Regularizasaun Temporária (STA 0+220 to STA 0+340)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	ESTRADAS E PONTES		Lacluta	Viqueque	Fin Los unip.lda	RFQ-CD-MOP-22007	\$ 44,219.72	June 27, 2022	100.00%	90.00%	\$ 39,797.75	\$ 4,421.97	ON-GOING
4	Road Rehabilitation of Assalaitula - Ossu Sta. 5+155 - 14+000 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque	Uhacae, Lda	SSS/064/MOPTC-2017	\$ 4,849,333.48	Aug. 25, 2017	69.41%	58.14%	\$ 2,819,358.97	\$ 2,029,974.51	ON-GOING
5	Periodic Maintenance Lolhono-Osorua Chainage 0+000-6+750 Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Loi-Huno/Ossoroa	Ossu	Viqueque	Boru- Buty Unip.Lda	RT/072/MOPTC-2016	\$ 183,928.35	Sept. 22, 2016	100.00%	88.46%	\$ 162,704.20	\$ 21,224.15	ON-GOING
6	R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liawali Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ossu de Cima/Loi-Huno	Ossu	Viqueque	Kay Seng Unip. Lda	NCB/056/MOPTC-2019	\$ 425,092.70	Aug. 25, 2020	27.84%	10.19%	\$ 43,304.63	\$ 381,788.07	ON-GOING
7	Rural Roads Periodic Maintenance Lulhono - Osorua Chainage 0+000 - 6+800 Routine Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400 Municipality Viqueque (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Loi-Huno	Ossu	Viqueque	Kay Seng Unip. Lda	MPW-W-190084	\$ 298,505.70	Aug. 16, 2019	61.88%	55.69%	\$ 166,238.32	\$ 132,267.38	ON-GOING
8	R4D Rural Road Spot Improvement Ossu-Nahareka Chainage 0+000-3+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Nahareka	Ossu	Viqueque	Costa Key Unip.Lda	MPW-W-210053	\$ 74,854.80	June 10, 2021	47.83%	21.13%	\$ 15,817.10	\$ 59,037.70	ON-GOING
9	R4D Rural Road Spot Improvement Loihunu-Uagia Chainage 0+000 - 6+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Loi-Huno	Ossu	Viqueque	Manoko Unip. Lda	MPW-W-210050	\$ 474,365.56	June 10, 2021	28.97%	10.97%	\$ 52,037.90	\$ 422,327.66	ON-GOING
10	Emergency Road Rehabilitation Package II from Ossu - Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque	Modena Tecnico Unipessoal Lda	MOPW-F1-W-166514	\$ 4,003,115.00	June 25, 2013	95.28%	85.75%	\$ 3,432,678.18	\$ 570,436.82	Parado
11	Rural Roads Periodic Maintenance Ossu Nahareka Chainage 3+400 - 5+400 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque	Fin-Los Unip.Lda JV Costa Key Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190037	\$ 491,752.56	Aug 16,2019	34.44%	28.49%	\$ 140,090.24	\$ 351,662.32	ON-GOING
12	New Construction of Health Post and Doctor's House in Buitale, Ossu, Viqueque, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Viqueque	Borala Lda	RDTL-MS-DNA-ICB21-075	\$ 327,232.66	Aug-25,2021	89.86%	80.82%	\$ 264,456.78	\$ 62,775.88	ON-GOING
13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Uibobo	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 116,976.18		24.04%	24.04%	\$ 28,123.53	\$ 88,852.65	ON-GOING
14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Uaibua/Ossu	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 86,739.52		76.88%	54.83%	\$ 47,555.72	\$ 39,183.80	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 21.78%
15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Olokassa Ossu	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 112,885.23		67.41%	53.08%	\$ 59,925.07	\$ 52,960.16	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 13.63%
16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Liaruca	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 112,599.00		51.85%	51.21%	\$ 57,657.82	\$ 54,941.18	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 25.15%
17	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruca Chainage, Viqueque 2+000 - 4+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque	Costa Key Unip.Lda	RT/028/MOP-2021	\$ 445,193.69		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 445,193.69	ON-GOING
18	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruca Chainage, Viqueque 4+000 - 6+00	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque	JVI983 Larigutu. Lda	RT/029/MOP-2021	\$ 310,049.27		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 310,049.27	ON-GOING
19	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruca Chainage, Viqueque 6+000 - 8+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque		RT/030/MOP-2021	\$ -		0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING
20	Rural Road Rehabilitation of Uagula - Nahareka Chainage 5+400-7+400 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque	Walay Unipessoal. Lda	RT/031/MOP-2021	\$ 507,050.73		30.81%	18.68%	\$ 94,729.34	\$ 412,321.39	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 8.61%
21	Rural Road Rehabilitation of Uagula - Nahareka Viqueque Chainage 7+400 - 9+400 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque	Fin-Los Unip.Lda	RT/032/MOP-2021	\$ 491,785.11		8.11%	7.30%	\$ 35,894.36	\$ 455,890.75	ON-GOING
22	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uagula-Nahareka, Viqueque Chainage9+400-11+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque	Lemadae Unipessoal Lda	RT/033/MOP-2021	\$ 471,641.93		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 471,641.93	ON-GOING
23	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uagula-Nahareka, Viqueque Chainage 11+400-13+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque	Marquesn Const. Unip. Lda	RT/034/MOP-2021	\$ 495,519.07		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 495,519.07	ON-GOING
24	ehabilitasaun Estrada Rural ,Uagula-Nahareka, Viqueque Chainage 13+400-15+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque	Uaitau Unipessoal.Lda	RT/035/MOP-2021	\$ 650,059.97	March 17 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 650,059.97	ON-GOING
25	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uagula-Nahareka, Viqueque Chainage15+400-18+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Ossu	Viqueque	Cuba Unip. Lda	RT/036/MOP-2021	\$ 670,308.49		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 670,308.49	ON-GOING
26	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	FI	AGRICULTURA		Uatocarbau	Viqueque	Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	\$ 4,009,902.86	Jan. 18, 2019	92.67%	75.04%	\$ 3,009,169.24	\$ 1,000,733.62	ON-GOING
27	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	FI	AGRICULTURA		Uatocarbau	Viqueque	PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	\$ 1,015,115.16	Dec. 6, 2019	82.46%	82.46%	\$ 837,100.99	\$ 178,014.17	ON-GOING

					Localizasaun Projeto											
NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	Suco	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA: (\$)	BAL. (\$)	OBS
28	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarbau - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		Uatocarbau	Viqueque	Divita Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441	\$ 591,750.15	Sept. 1, 2016	95.79%	85.91%	\$ 508,351.69	\$ 83,398.46	ON-GOING
29	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		Uatocarbau	Viqueque	Jonel Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346	\$ 555,441.69	July 6, 2016	98.65%	76.17%	\$ 423,062.89	\$ 132,378.80	Progres Fisiko 100%
30	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 53+000 - 58+300 (Package XI) Municipaty Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Loi-Huno	Uatocarbau	Viqueque	Sabirara, Unip. Lda	SSS/155/MOPTC-2017	\$ 3,952,143.48	Sept. 15, 2017	48.39%	28.37%	\$ 1,121,331.01	\$ 2,830,812.47	
31	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC 2,3 Uatocarbau Nunu Uata	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatocarbau	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 85,016.63		69.04%	53.26%	\$ 45,277.01	\$ 39,739.62	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 15.57%
32	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Uatocarbau	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatocarbau	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 90,595.35		71.77%	54.16%	\$ 49,067.56	\$ 41,527.79	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 16.19%
33	Supply, Instalation, Configuration, Testing, Commissioning of It equipment of GNSS Station at eight Municipality in Timor Leste Under Ministry of planting & territory.	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatocarbau	Viqueque	TeroMovigo - Earth Innovation,Lda	ICB/011/MPO-2022	\$ 236,638.85	May 24, 2022	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 236,638.85	ON-GOING
34	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uma Uain Leten	Uatolari	Viqueque	Laway	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN 0000459	\$ 97,892.93	March 25, 2015	63.38%	46.30%	\$ 45,324.43	\$ 52,568.50	Parado
35	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Liasdi, Nunumalau, Iralere and Ullusu, Uatolari - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		Uatolari	Viqueque	Habere Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433	\$ 1,051,424.32	Sept. 1, 2016	72.06%	50.15%	\$ 527,283.76	\$ 524,140.56	ON-GOING
36	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Uatolari	Viqueque	Helamula Unipessoal, Lda	SSS/096/MOPTC-2017	\$ 4,045,100.44	Aug. 28, 2017	63.29%	35.87%	\$ 1,450,811.47	\$ 2,594,288.97	ON-GOING
37	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Uatolari	Viqueque	Greu Unipessoal, Lda	SSS/093/MOPTC-2017	\$ 4,322,335.54	Aug. 25, 2017	67.28%	32.81%	\$ 1,418,141.44	\$ 2,904,194.10	ABANDONA
38	New construction of Gapura Stairs and wall protection no jardim de herois de Viqueque	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBARENTES DA LIBERTACAO NACIOANL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque	Natureza Furak Unip/ Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	\$ 275,004.50	Jan. 01, 2021	75.08%	67.53%	\$ 185,697.06	\$ 89,307.44	
39	Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 2 Uatolari - Laisorulai (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Uatolari	Viqueque	Bragtojul Unip. Lda JV PT Decont Mitra Consolindo	MPW-CS-2000025	\$ 475,000.00	March 25, 2020	70.00%	70.00%	\$ 332,500.00	\$ 142,500.00	ABANDONA
40	Rehabilitation of Miabuti Edmumo, Sapatula Road /reabilitacao de estradas distritals de Uatolari Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Uatolari	Viqueque	Karakuta Unip Lda	MPW-2013/JUNE	\$ 1,639,085.75	June 25, 2014	41.68%	40.68%	\$ 666,780.08	\$ 972,305.67	ON-GOING
41	New Construction of Capela Betesda Naedala - Afoloical- Uatolari	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque	Be'o Horis Unip. Lda		\$ 145,269.48		54.70%	0.00%	\$ -	\$ 145,269.48	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 4.86%
42	Konstrusaun Kanals Irrigasaun iha Bebul Municipio Viqueque	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA		Uatolari	Viqueque	L.M. Calcasa Medin Unip.Lda	RDTL-MAPPO2021:15965	\$ 447,484.43	Oct. 08, 2021	100.00%	86.28%	\$ 386,074.28	\$ 61,410.15	ON-GOING
43	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Nahae	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 114,134.85		50.82%	50.82%	\$ 57,998.12	\$ 56,136.73	ON-GOING
44	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Ualibra	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 103,117.97		24.18%	24.18%	\$ 24,929.02	\$ 78,188.95	ON-GOING
45	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC 07 Uatolari	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 70,191.21		64.76%	53.35%	\$ 37,443.72	\$ 32,747.49	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 11.37%
46	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Edemumo	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 98,958.49		30.69%	19.37%	\$ 19,164.77	\$ 79,793.72	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 11.32%
47	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Ualaeque	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 106,475.42		57.16%	50.81%	\$ 54,098.34	\$ 52,377.08	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 5.87%
48	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESTV Kalo-Heda Uatolari	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 159,590.65		89.59%	50.03%	\$ 79,842.48	\$ 79,748.17	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 39.36%
49	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Debuisi	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 98,172.51		54.82%	52.19%	\$ 51,239.37	\$ 46,933.14	ON-GOING
50	Road Maintenance Section : Viqueque Makadiki (A08-3)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES		Uatolari	Viqueque	Samadare Unip. Lda	MPW-W-220023	\$ 358,040.28	March 21, 2022	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 358,040.28	ON-GOING
51	Konstrusaun foun ESG Daraloi-Iraler, uatolari-Viqueque	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM.CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Viqueque	Henlopsta, Unipessoal Lda		\$ 215,190.29		12.99%	11.69%	\$ 25,163.73	\$ 190,026.56	ON-GOING
52	Emergency work package caused by climate change on June 2013 (Gablon protection works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Caraubalo	Viqueque	Viqueque	Consorcio Unidos Genero. Lda	SSS/100/MOPTC-2015	\$ 75,260.55	Dec. 1, 2015	100.00%	88.00%	\$ 66,229.28	\$ 9,031.27	Progres Fisiko 100%
53	Rehabilitation of Urban Road Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Viqueque	Viqueque	Urukai II. Unip. Lda	SSS/072/MOPTC-2017	\$ 4,246,801.85	Aug. 25, 2017	99.14%	89.07%	\$ 3,782,637.26	\$ 464,164.59	Parado
54	Rehabilitation of Roads From Junction Bemvindo Bahalara Uain We Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000 - 5+500 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Bahalara-Uain	Viqueque	Viqueque	Arpy Unipessoal, Lda	SSS/163/MOPTC-2017	\$ 3,666,919.24	Sept. 15, 2017	94.64%	85.17%	\$ 3,123,271.96	\$ 543,647.28	Progres Fisiko 100%
55	Rehabilitation of Suspension Bridge, Municipality of Viqueque.	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES		Viqueque	Viqueque	Arquins	SSS/105/MOPTC-2017	\$ 758,090.38	Sept. 7, 2017	100.00%	72.01%	\$ 545,900.59	\$ 212,189.79	Parado
56	Routine Road Maintenance Lot 1 - Viqueque - Dilor A07, Lot 2 - Jct Luca - Lacluta CS Municipality Viqueque (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	Luca	Viqueque	Viqueque	Dira Nova Unip. Lda	MPW - W - 190114	\$ 150,012.65	March 9, 2019	100.00%	88.75%	\$ 133,133.69	\$ 16,878.96	ON-GOING
57	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package: 12 Luca - Lacluta	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Luca	Viqueque	Viqueque	Hilobadi Unip. Lda JV PT Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000022	\$ 169,404.00	March 25, 2020	70.00%	70.00%	\$ 118,582.80	\$ 50,821.20	ON-GOING
58	Rehabilitation of Venilale - Hatulla, Uaimori Road Package 2 (STA. 10+300 - STA. 15+475) in Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Uai-Mori	Viqueque	Viqueque	Uma Liurai unip. Ida	SSS/138/MOPTC-2016	\$ 3,664,122.77	Aug. 1, 2016	49.30%	24.12%	\$ 883,922.53	\$ 2,780,200.24	ON-GOING
59	Rehabilitation of Venilale - Hatulla - Uaimori Road Package 3 (Sta. 15+475 - 20+625) in Municipality of Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Uai-mori	Viqueque	Viqueque	Bihalutur Unip. Ida	SSS/141/MOPTC-2016	\$ 2,073,894.13	Aug. 1, 2016	14.02%	12.33%	\$ 255,758.79	\$ 1,818,135.34	ON-GOING
60	Rehabilitation of Vanilale - Hatullari - Uaimori Road (30.880km) Roads Section : Venilale - Hatulla Roads Package 5 Sta. 20+625 - 25+755 Municipality Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Uai-mori	Viqueque	Viqueque	Loke Matan unip. Ida	SSS/307/MOPTC-2016	\$ 2,455,115.74	May 12, 2016	34.21%	24.85%	\$ 610,078.01	\$ 1,845,037.73	ON-GOING

Localizasaun Projeto																
NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	Suco	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA (%)	PAGA (\$)	BAL. (\$)	OBS
61	Rehabilitation of Venilale - Hatulla - Uaimori Roads Package 5 Sta. 25+ 775-30+ 880 (30,880 km) Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Uai-mori	Viqueque	Viqueque	Caburela unip,lda	SSS/306/MOPTC-2016	\$ 1,949,918.39	Nov. 22, 2016	53.64%	34.57%	\$ 674,139.75	\$ 1,275,778.64	ON-GOING
62	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Calixa Viqueque	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 113,359.66		55.31%	0.00%	\$ -	\$ 113,359.66	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 29.31%
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Ular Rihik Kraras	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 70,633.26		52.29%	50.39%	\$ 35,590.70	\$ 35,042.56	ON-GOING
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Maria Lobato	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 99,496.02		69.92%	50.06%	\$ 49,804.11	\$ 49,691.91	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 19.81%
65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Cabira-Oan	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 52,836.14		94.32%	94.32%	\$ 49,836.12	\$ 3,000.02	ON-GOING
66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Sebastiao Gomes	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 89,396.09		71.86%	56.91%	\$ 50,877.35	\$ 38,518.74	Progres Fisiko fulan Fevereiro aumenta 14.78%
67	New Construction Office , Warehouse and landscaping of viqueque District	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque	L.M. Calcasa Metin Unip,Lda	01/MSSI/DGAF/DNA/II/2022	\$ 805,366.41		36.90%	32.31%	\$ 260,194.11	\$ 545,172.30	ON-GOING
68	Konstrusaun Foun Escola Secundaria Geral 4 de Setembro Viqueque	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Viqueque	Gidae (Nuda Culoi) Unipessoal. Lda	NCB/020-R/MEJD/DNA/2021	\$ 250,170.65	02/09/2022	17.10%	15.28%	\$ 38,237.94	\$ 211,932.71	ON-GOING
69	Upgrading and Maintenance of Baucau - Viqueque Highway Project Lot 2: Venilale - Viqueque : Sta. 27 + 120 to Sta. 62 + 010	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO		Multi Posto Administrativo	Regional	China Railway Int. Group co. ,jv with China overseas	ICB/046/MOPTC-2017	\$ 23,853,175.70	March 21, 2019	30.75%	27.67%	\$ 6,600,703.37	\$ 17,252,472.33	ON-GOING
										\$ 65,676,843.52			49.72%	\$ 32,657,347.83	\$ 33,019,495.70	


(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P


(Eng. Bebiano C. de Jesus Lopes)
Eng. ba Projeto Edificio Publico no
Beé Saneamento ADN, I.P


(Eng. Remigio da C.S dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun ADN, I.P



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Cooordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun
de Qualidade, ADN, I.P.

(Eng. Salvador Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P


(Arch. Guido Carlos Tilman)
Eng. ba Projeto Edificio Publico no
Beé Saneamento ADN, I.P


(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico No Beé
Saneamento ADN, I.P


(Eng. Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projeto Mecanical
Electrical, ADN, I.P


(Eng. Deolindo de Fatima Marques)
Chefe Seksaun Mecanical Electrical, Informasaun Tecnologia no
Komunikasaun ADN, I.P



ANEXO B
PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU VIQUEQUE

Localizaasaun Projeto											Fevereiro 2023		
NU.	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	Suco	POSTO ADMINISTRATIVO	NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progres	Progress This Month	Progress Kumulative
1	New COstruction Of Dilor River Protection Package 2 STA 0+800-1+612 In Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Dilor	Lacluta	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOPTC-2017	\$ 4,886,127.61	Aug. 25, 2017	99.39%		99.39%
2	NOVA CONSTRUCAO ESC. TECNICO VOCACIONAL(ESTV), RAVINA LACLUTA, DILOR VIQUEQUE	MEJD	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Lacluta	MEJD		\$ 347,806.68		25.33%	12.03%	37.37%
3	Emergency Project, Cyclone Seroja 04 April 2021, River Training Welolo, Viqueque Regularizasaun Temporalia (STA 0+220 to STA 0+340)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	ESTRADAS		Lacluta	Fin-Los Unip. Lda	MPW-W-220084	\$ 44,219.72		100.00%		100.00%
4	Road Rehabilitation of Assalauala - Ossu Sta. 5+155 - 14+000 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS		Ossu	Uhacae, Lda	SSS/064/MOPTC-2017	\$ 4,849,333.48	Aug. 25, 2017	69.41%		69.41%
5	Periodic Maintenance Loihono-Osorusa Chainage 0+000-6+750 Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Loi-Huno/Ossoroa	Ossu	Boru- Buty Unip.Lda	RT/072/MOPTC-2016	\$ 183,928.35	Sept. 22, 2016	100.00%		100.00%
6	R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liawaioli Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ossu de Cima/Loi-Huno	Ossu	Kay Seng Unip. Lda	NCB/056/MOPTC-2019	\$ 425,092.70	Aug. 25, 2020	27.84%		27.84%
7	Rural Roads Periodic Maintenance Lulihono - Osorusa Chainage 0+000 - 6+800 Routine Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400 Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loi-Huno	Ossu	Kay Seng Unip. Lda	MPW-W-190084	\$ 298,505.70	Aug. 16, 2019	61.88%		61.88%
8	R4D Rural Road Spot Improvement Ossu-Nahareka Chainage 0+000-3+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Nahareka	Ossu	Costa Key Unip Lda	MPW-W-210053	\$ 74,854.80	June 10, 2021	47.83%		47.83%
9	R4D Rural Road Spot Improvement Loihunu-Uagia Chainage 0+000 - 6+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loi-Huno	Ossu	Manoko Unip. Lda	MPW-W-210050	\$ 474,365.56	June 10, 2021	28.97%		28.97%
10	Emergency Road Rehabilitation Package II from Ossu - Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS		Ossu	Modena Tecnic Unipessoal Lda	MOPW-F1-W-166514	\$ 4,003,115.00	June 25, 2013	95.28%		95.28%
11	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Ossu-Nahareka Chainage 4+350-6+350	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS		Ossu	Fin-Los Unip.Lda JV Costa Key Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190037	\$ 491,752.56	Aug 16,2019	34.44%		34.44%
12	New Construction of Health post and Doctor's House Building in Builale, Ossu, Viqueque Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Borala Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-ICB21-075	\$ 327,232.66	Aug-25,2021	89.86%		89.86%
13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Uibobo	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Grupo Komunitario		\$ 116,970.18		24.04%		24.04%
14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Uaibua/Ossu	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Grupo Komunitario		\$ 86,739.52		55.11%	21.78%	76.88%
15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Olokassa Ossu	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Grupo Komunitario		\$ 87,453.73		53.79%	13.63%	67.41%
16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Liaruka	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Ossu	Grupo Komunitario		\$ 112,599.00		26.70%	25.15%	51.85%
17	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka, Chainage 2+000 - 4+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Nahareka	Ossu	Costa Key Unip Lda	RT/028/MOP-2021	\$ 445,193.69		0.00%		0.00%
18	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 4 + 000 - 6 + 000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS		Ossu	JV1983 Larigutu. Lda	RT/029/MOP-2021	\$ 310,049.27		0.00%		0.00%
19	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 6 + 000 - 8 + 000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS		Ossu		RT/030/MOP-2021	\$ -		0.00%		0.00%
20	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 5 + 400 - 7 + 400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS		Ossu	Walay Unipessoal. Lda	RT/031/MOP-2021	\$ 507,050.73		22.19%	8.61%	30.81%
21	Rural Road Rehabilitation of Uagia -Nahareka, Chainage 7+400 – 9 + 400 (2 Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS		Ossu	Fin-Los Unip Lda	RT/032/MOP-2021	\$ 491,785.11		8.11%		8.11%
22	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 9 + 400 - 11 + 400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS		Ossu	Lemadae Unipessoal Lda	RT/033/MOP-2021	\$ 471,641.93		0.00%		0.00%
23	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 11 + 400 - 13 + 400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS		Ossu	Marques Const. Unip. Lda	RT/034/MOP-2021	\$ 495,519.07		0.00%		0.00%
24	Rehabilitation of the Rural road Uagula - Nahareka - Chainage 13 + 400 - 15 + 400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS		Ossu	Uaitau Unipessoal.Lda	RT/035/MOP-2021	\$ 650,059.97		0.00%		0.00%
25	Rehabilitation of the Rural road Uagula - Nahareka - Chainage 15 + 400 - 18 + 700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS		Ossu	Cuba Unip. Lda	RT/036/MOP-2021	\$ 670,308.49		0.00%		0.00%
26	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	FI	AGRICULTURA		Uatocarbau	Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	\$ 3,912,226.56	Jan. 18, 2019	92.67%		92.67%
27	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	FI	AGRICULTURA		Uatocarbau	PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	\$ 1,015,115.16	Dec. 6, 2019	82.46%		82.46%
28	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarbau - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		Uatocarbau	Divita Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441	\$ 591,750.15	Sept. 1, 2016	95.79%		95.79%
29	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae Olii, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		Uatocarbau	Jonel Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346	\$ 555,441.69	July 6, 2016	98.65%		98.65%
30	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Loi-Huno	Uatucarbau	Sabirara, Unip. Lda	SSS/155/MOPTC-2017	\$ 3,952,143.48	Sept. 15, 2017	48.39%		48.39%
31	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC 2,3 Uatocarbau Nunu Uata	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatocarbau	Grupo Komunitario		\$ 85,016.63		53.47%	15.57%	69.04%
32	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Uatocarbau	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatocarbau	Grupo Komunitario		\$ 90,595.35		55.58%	16.19%	71.77%
33	Supplay, Instalation, Comffiguration, Testting, Commissiong of it equipment of GNSS Station at eight Municipalty in Timor Leste Under Ministerry of plsenting & territory.	MPO	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatucarbau	Tero Movigo- Earth Inovation.Lda	ICB/011/MPO-2022	\$ 236,638.85		0.00%		0.00%
34	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawal Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Uma Uain Leten	Uatolari	Laway	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN-0000459	\$ 97,892.93	March 25, 2015	63.38%		63.38%
35	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Lisadi, Nunumalau, Iralere and Ulusu, Uatolari - Viqueque Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		Uatolari	Habere Unip.Ida	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433	\$ 1,051,424.32	Sept. 1, 2016	72.06%		72.06%
36	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS		Uatolari	Helamula Unipessoal, Lda	SSS/096/MOPTC-2017	\$ 4,045,100.44	Aug. 28, 2017	63.29%		63.29%

					Localizasaun Projeto						Fevereiro 2023		
NIL	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	Sueo	POSTO ADMINISTRATIVO	NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progres	Progress This Month	Progress Komulative
37	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31 + 800 - 37 + 100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS		Uatolari	Greu Unipessoal, Lda	SSS/093/MOPTC:2017	\$ 4,322,335.54	Aug. 25, 2017	67.28%		67.28%
38	New construction of Gapura Stairs and wall protection no jardim de herois de Viqueque	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBANTES DA LIBERTACAO NACIOANL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Natureza Furak Unip/ Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	\$ 275,004.50	Aug. 31, 2016	75.08%		75.08%
39	Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 2 Uatolari - Lalsorulai (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS		Uatolari	Bragtojul Unip. Lda JV PT Decont Mitra Consolindo	MPW-CS-2000025	\$ 475,000.00	March 25, 2020	70.00%		70.00%
40	Rehabilitation of Miabuti Edmumo, Sapatula Road /reabilitacao de estradas distritais de Uatolari Viqueque District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS		Uatolari	Karakuta Unip Lda	MPW-2013/JUNE	\$ 1,639,085.75	June 25, 2014	41.68%		41.68%
41	New Construction of Capela Betesda Naedala - Afoloicai-Uatolari	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Be'e Horis Unip. Lda		\$ 167,786.36		49.85%	4.86%	54.70%
42	Konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Bebul Municipio Viqueque	MINISTERIO DA AGRICULTURA	LM-CD	IRIGASAUN		Uatolari	L.M. Caicasa Metin Unip.Lda	RDTL-MAPPO2021:15965	\$ 447,484.43	Oct. 08, 2021	100.00%		100.00%
43	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Nahae	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Grupo Komunitario		\$ 114,134.85		50.82%		50.82%
44	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESF Uaibira	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Grupo Komunitario		\$ 103,117.97		24.18%		24.18%
45	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC 07 Uatolari	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Grupo Komunitario		\$ 70,191.21		53.38%	11.37%	64.76%
46	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Edemumo	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Grupo Komunitario		\$ 98,958.49		19.37%	11.32%	30.69%
47	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Ulaque	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Grupo Komunitario		\$ 106,475.42		51.29%	5.87%	57.16%
48	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESTV Kalo-Heda Uatolari	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Grupo Komunitario		\$ 159,590.65		50.23%	39.36%	89.59%
49	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Debuisi	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Grupo Komunitario		\$ 98,172.51		54.82%		54.82%
50	Road Maintenance Section : Viqueque Makadiki (A08-3)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Samadare.Unip.Lda	MPW-W-220023	\$ 358,040.28		0.00%		0.00%
51	Konstrusaun foun ESG Daraloi-Iraler, uatolari-Viqueque	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Uatolari	Henlopsta, Unipessoal Lda		\$ 215,190.29		12.99%		12.99%
52	Emergency work package caused by climate change on June 2013 (Gabion protection works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Carubalo	Viqueque	Consortio Unidos Genero, Lda	SSS/100/MOPTC:2015	\$ 75,260.55	Dec. 1, 2015	100.00%		100.00%
53	Rehabilitation of Urban Road Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS		Viqueque	Urukai II, Unip. Lda	SSS/072/MOPTC:2017	\$ 4,246,801.85	Aug. 25, 2017	99.14%		99.14%
54	Rehabilitation of Roads From Junction Bemvindo Bahalara - Uain We Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000 - 5+ 500 Municipality Viqueque	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Bahalara-Uain	Viqueque	Arpy Unipessoal, Lda	SSS/163/MOPTC:2017	\$ 3,666,919.24	Sept. 15, 2017	94.64%		94.64%
55	Rehabilitation of Suspension Bridge, Municipality of Viqueque.	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES		Viqueque	Arquiris Unip. Lda	SSS/105/MOPTC:2017	\$ 758,090.38	Sept. 7, 2017	100.00%		100.00%

					Localizaçaun Projeto						Fevereiro 2023		
NU.	NARAN PROJETO	DENO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	Sua	POSTO ADMINISTRATIVO	NARAN COMPANHIA	NUMERU KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progres	Progress This Month	Progress Kumulative
56	Routine Road Maintenance Lot 1 - Viqueque - Dilor A07, Lot 2 - Jct Luca - Lacluta CS Municipality Viqueque (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-B5	ESTRADAS	Luca	Viqueque	Dira Nova Unip. Lda	MPW - W - 190114	\$ 150,012.65	March 9, 2019	100.00%		100.00%
57	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package: 12 Luca - Lacluta	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Luca	Viqueque	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Sjarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000022	\$ 169,404.00	March 25, 2020	70.00%		70.00%
58	Rehabilitation of Venilale - Hatulla, Uaimori Road Package 2 (STA. 10+300 - STA. 15+475) in Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uai-Mori	Viqueque	Uma Liurai unip, lda	SSS/138/MOPTC-2016	\$ 3,664,122.77	Aug. 1, 2016	49.30%		49.30%
59	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulla - Uaimori fase 15+476-20+625	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uai-mori	Viqueque	Bihafutur Unip, lda	SSS/141/MOPTC-2016	\$ 2,073,894.13	Aug. 1, 2016	14.02%		14.02%
60	Rehabilitation of Vanilale - Hatuluri - Uaimori Road (30.880km) Roads Section : Venilale - Hatulla Roads Package 5 Sta. 20+625 - 25+755 Municipality Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uai-mori	Viqueque	Loke Matan unip, lda	SSS/307/MOPTC-2016	\$ 2,455,115.74	May 12, 2016	34.21%		34.21%
61	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulla - Uaimori fase 25+775-30+880	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Uai-mori	Viqueque	Caburela unip, lda	SSS/306/MOPTC-2016	\$ 1,949,918.39	Nov. 22, 2016	53.64%		53.64%
62	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Calixa Viqueque	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 113,359.66		26.00%	29.31%	55.31%
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Ular Rihik Kraras	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 70,633.26		25.06%	27.23%	52.29%
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Maria Lobato	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 99,496.02		50.11%	19.81%	69.92%
65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Cabira-Oan	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 52,836.14		94.32%		94.32%
66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE Sebastiao Gomes	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	Grupo Komunitario		\$ 89,396.09		57.08%	14.78%	71.86%
67	New Construction Office, Were House And Landscaping Of Viqueque Distric	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOCIAL E INCLUZAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS		Viqueque	L.M. Calcasa Medin Unip,Lda	01/MSSI/DGAF/DNA/II/2022	\$ 805,366.41		36.90%		36.90%
68	Konstrusaun Foun Escola Secundaria Geral 4 de Setembro Viqueque	MENISTERIO DA EDUCASAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Viqueque	Viqueque	Grupo Komunitario	NCB/020-R/MEJD/DNA/2021	\$ 250,170.65		17.10%		17.10%
69	Upgrading and Maintenance of Baucau - Viqueque Highway Project Lot 2: Venilale - Viqueque : Sta. 27 + 120 to Sta. 62 + 010	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO		Multi Posto Administrativo	China Railway Int. Group co, jv with China overseas	ICB/046/MOPTC-2017	\$ 23,853,175.70	March 21, 2019	30.75%		30.75%

Inspesaun Husi :


(Eng. Roberto M. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P


(Eng. Bebiano C. de Jesus Lopes)
Eng. ba Projeto Edificio Publico no
Beé Saneamento ADN, I.P


(Arch. Guido Carceres Tilman)
Eng. ba Projeto Edificio Publico no
Beé Saneamento ADN, I.P


(Eng. Salvador Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P


(Eng. Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projeto Mecanical Electrical, ADN, I.P

Verfika Husi :


(Eng. Remigio da C.S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P


(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publiku No Beé
Saneamento ADN, I.P


(Eng. Domingos Matima Marques)
Chefe Seksaun Mecanical Electrical, Informasaun Tecnologia no Komunikaun
ADN, I.P

Certifika husi


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coodenadora da Unidade de Controla e Validasaun de Qualidade, ADN,
I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NARAN PROJECTO : NOVA CONSTRUCAO ESC. TECNICO VOCACIONAL(ESTV), RAVINA LACLUTA, DILOR VIQUEQUE
MINISTERIO : MEJD

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	Previous		This Billing		Up to Date	
			Amount	%	Amount	%	Amount	%
1	Preliminaries Works	\$ 3,025.00	\$ 1,472.50	0.42%	\$ -	0.00%	\$ 1,472.50	0.42%
2	Class Room Building C (2 Units)	\$ 126,858.29	\$ 44,400.40	12.77%	\$ 19,028.74	5.47%	\$ 63,429.14	18.24%
3	Teacher Office	\$ 90,459.80	\$ 27,137.94	7.80%	\$ 13,568.97	3.90%	\$ 40,706.91	11.70%
4	Toilet Building	\$ 31,352.51	\$ 5,692.73	1.64%	\$ 4,702.88	1.35%	\$ 10,395.60	2.99%
5	Professional Sum for Water Borred	\$ 11,750.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
6	Professional Sum for SW (18% x (2+3+4))	\$ 44,760.71	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 308,206.31	\$ 78,703.57	22.63%	\$ 37,300.59	10.72%	\$ 116,004.16	33.35%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 30,820.63	\$ 7,279.27	2.09%	\$ 3,730.06	1.07%	\$ 11,009.33	3.17%
C	OVERHEAD	\$ 1,960.00	\$ 515.00	0.15%	\$ -	0.00%	\$ 515.00	0.15%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 6,819.74	\$ 1,611.74	0.46%	\$ 820.61	0.24%	\$ 2,432.35	0.70%
E	TOTAL COST (A + B + C + D + E)	\$ 347,806.68	\$ 88,109.58	25.33%	\$ 41,851.26	12.03%	\$ 129,960.84	37.37%

Prepared By

Checked By

Aproved By


Arch. Guido Carceres Tilman
Eng. Município Viqueque ADN, I.P.


Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio Publicu No Bee
Saneamento ADN, I.P.


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (LacL-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun Escola Secundario Tecnica Vocacional Revina,Lacluta
No. kontratu :

Data Inspesaun : 28-02-2023

Fatin Inspesaun : Revina,Lacluta

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.505961" 126.121089

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes


2. Guido Carceres Tilman


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Serbisu plesteran no kontinua monta kuda2
no gording.

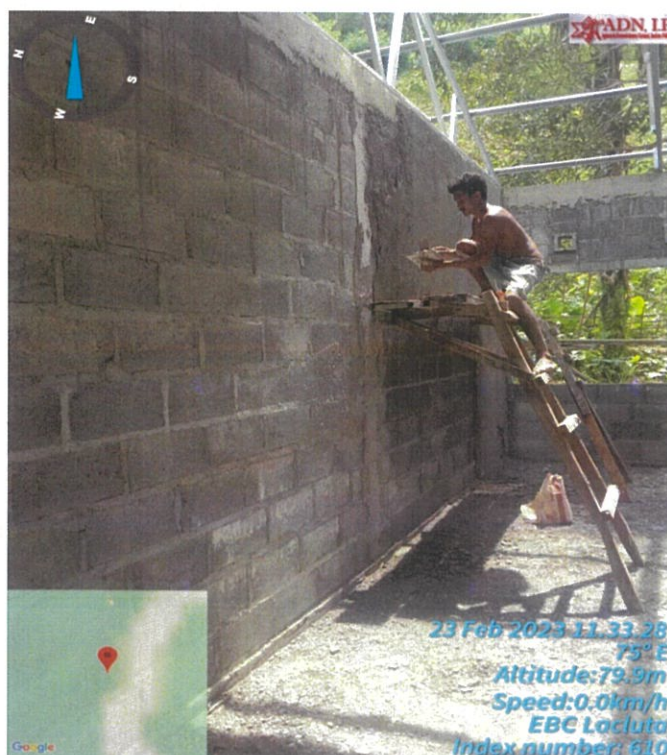

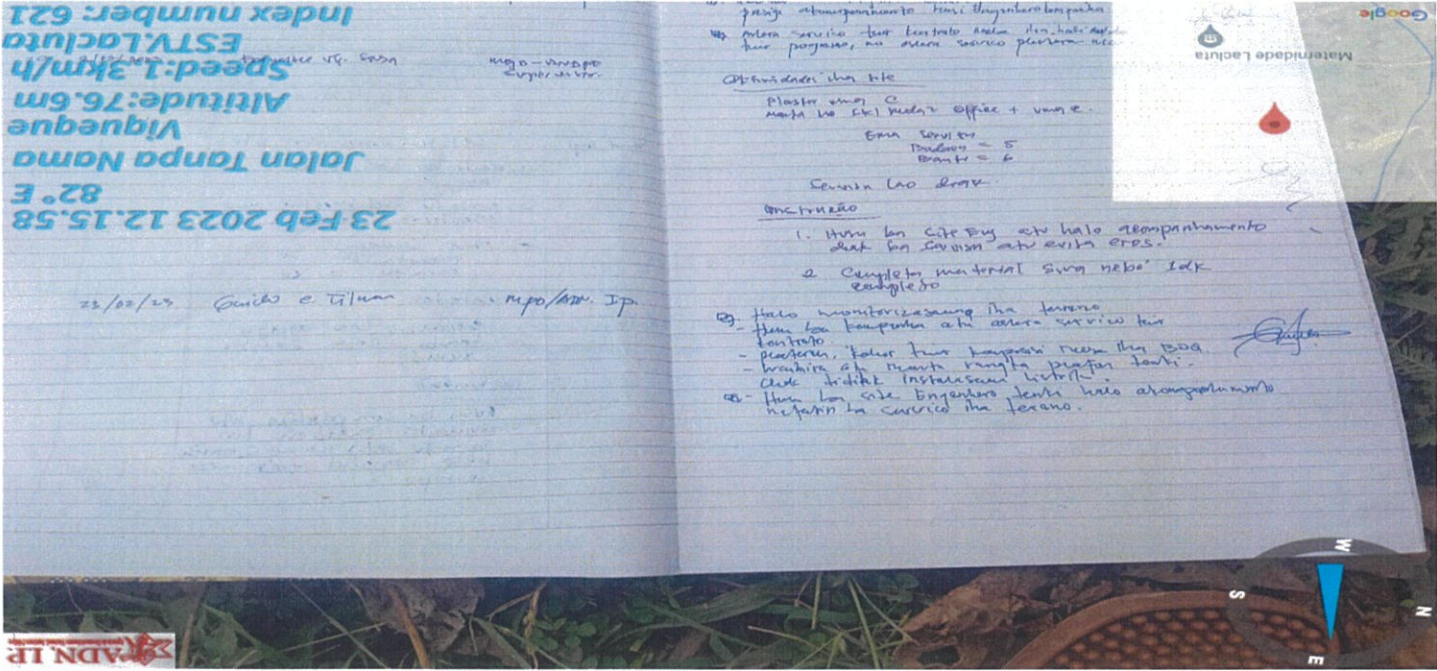 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
NOVA CONSTRUCAO ESC. TECNICO VOCASIONAL(ESTV), RAVINA LACLUTA, DILOR VIQUEQUE							
Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/02/2023	Lacluta	1. Guido Carceres Tilman	Tekniko	1	Husu ba kompanhia atu serbisu tuir nafatin dezenho,boq no spesifikasaun nebe maka iha ona kontrato laran	
					2	Husu ba site eng. Atu ativo iha tereno atu bele fasilita ou orienta badaen sira halo serbisu	
					3	Aslera servico tuir data ne'ebe termina iha contrato.	
					4		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Ossu-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre Escolar Uaibua
No. kontratu :

Data Inspesaun : 02-02-2023

Fatin Inspesaun : Ossu Decima, Ossu

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.449576" 126.228748

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes

2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu atap seng remata continua serbisu
plesteran dinding no pintura

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Naran Projētu : Nova Construção da Escola Pre Escolar Uaibua no code emis 1694
Lokalidade : Lugabuti, Ossu de Cima, Ossu, Viqueque
Projētu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

SUMMARY									
MAIN SUMMARY			Previous		This Billing		Up to Date		
			Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %	
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,579.26	2,147.56	2.48%	\$ -	0.00%	2,147.56	2.48%
II	CLASSROOM BUILDING	C/39 (i)	US\$ 62,959.35	39,105.54	45.08%	\$ 18,887.81	21.78%	57,993.35	66.86%
III	PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 10,860.91	2,437.72	2.81%	\$ -	0.00%	2,437.72	2.81%
CONSTRUCTION COST			US\$ 77,399.52	43,690.82	50.37%	\$ 18,887.81	21.78%	62,578.63	72.15%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	-	0.00%	\$ -	0.00%	-	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	4,108.50	4.74%	\$ -	0.00%	4,108.50	4.74%
GRAND TOTAL			US\$ 86,739.52	47,799.32	55.11%	\$ 18,887.81	21.78%	66,687.13	76.88%

Prepared By

Eng. Bebiano Crecêncio De Jesus Lopes
Eng. Município Viqueque ADN, I.P.

Cheked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projētu Edifício Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Aproved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projetu : Nova Construção da Escola secundária geral olocassa no code emis 1151.
Lokalidade : baca isi ossu de cima viqueque villa
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This billing		Up to Date	
				Amount \$	%	Amount \$	%	Amount \$	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,075.00	\$ 922.50	1.05%	\$ -	0.00%	\$ 922.50	1.05%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 59,579.97	\$ 32,290.17	43.48%	\$ 11,915.99	13.63%	\$ 44,206.17	57.11%
III	TOILET BUILDING		US\$ 7,549.35	\$ 7,533.95	9.25%	\$ -	0.00%	\$ 7,533.95	9.25%
IV	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 7,909.41	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		US\$ 78,113.73	\$ 40,746.63	53.79%	\$ 11,915.99	13.63%	\$ 52,662.62	67.41%
	CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	GRAND TOTAL		US\$ 87,453.73	\$ 40,746.63	53.79%	\$ 11,915.99	13.63%	\$ 52,662.62	67.41%

Prepared By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Checked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engineiro Senior ba Projeltu Edificio Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Aproved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projéto : Nova Construção da Escola básica filial butao no code emis 933
Lokalidade : Cai ua lairuca ossu viqueque.
Projéto nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount	%	Amount	%	Amount	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,679.26	\$ 919.82	0.82%	\$ -	0.00%	\$ 919.82	0.82%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	C/39 (i)	US\$ 65,212.76	\$ 25,496.36	22.64%	\$ 16,303.19	14.48%	\$ 41,799.55	37.12%
III	TOILET BUILDING		US\$ 26,695.85	\$ 2,378.67	2.11%	\$ 12,013.13	10.67%	\$ 14,391.80	12.78%
IV	PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 7,671.13	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 103,259.00	\$ 28,794.84	25.57%	\$ 28,316.32	25.15%	\$ 57,111.16	50.72%
	CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ 1,268.00	1.13%	\$ -	0.00%	\$ 1,268.00	1.13%
	GRAND TOTAL		US\$ 112,599.00	\$ 30,062.84	26.70%	\$ 28,316.32	25.15%	\$ 58,379.16	51.85%

Prepared By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Checked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projéto Edifício Público No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Aproved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Oss-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Rural road Ossu Uaguia - Nahareka, Chainage 5+400 - 7+400, Municipality Viqueque.

No. kontratu : RT/031/MOP-2021

Data Inspesaun : 21/02/2023

Fatin Inspesaun : Ossu, Uaguia - Nahareka

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,7470 S Latetude : 126.4279 E

End Point : Long : -8.7542 S Latetude : 126.6573 E

Naran Inspector : 1. Eng. Salvador Martins


Sketch & Foto Desenho

Total Volume of Plum Concrete

$0.25 \times 2 \times 600 = 300 \text{ Cu.m}$

$0.03 \times 2 \times 600 = 36 \text{ Cu.m}$

Observasaun iha tereno no Foto Aktual Plum Concrete

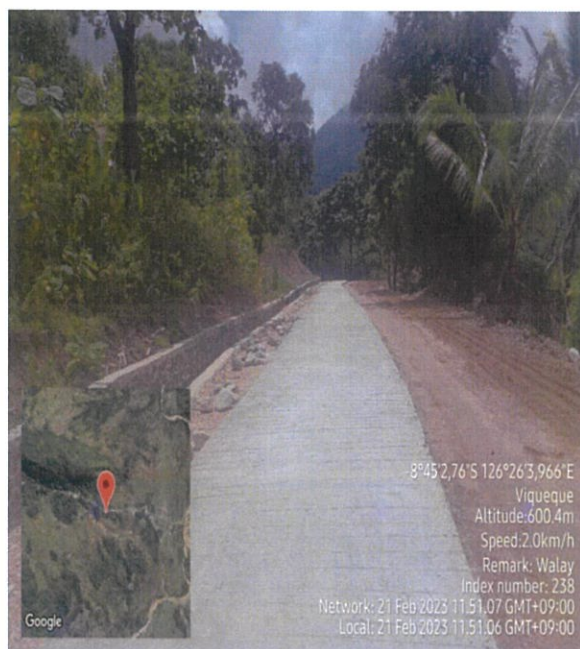



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Rehabilitation of Rural road Ossu Uaguia - Nahareka, Chainage 5 + 400 - 7 + 400 (Length= 2 Km)

Kompanha : Walay Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
II	21/2/2023	Ossu	Eng. Salvador Martins	Eng. ITI, ADN, I.P, Municipio Viqueque			

ANEXU C2 (Oss - 10)

Project Name : Rehabilitation of Rural road Ossu Uaguia - Nahareka, Chainage 5 + 400 - 7 + 400 (Length= 2 Km)
Contract Number : RT/031/MOP-2021
Contractor Name : Walay Unip. Lda
Progress : FEBREIRO 2023


SUMMARY

Pay Item No.	ITEM DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS JANERO 2023		PROGRESS MONITORING UP TO FEBREIRO 2023		
		AMOUNT (USD)	% BILLED	AMOUNT (USD)	% BILLED	AMOUNT (USD)	% BILLED	AMOUNT (USD)	% BILLED	REMARKS
R-01	General - works	\$ 5,600.00	1.10%	\$ 1,550.00	0.31%	\$ -	0.00%	\$ 1,550.00	0.31%	
R-03	Earth works	\$ 36,964.76	7.29%	\$ 33,188.67	6.55%	\$ -	0.00%	\$ 33,188.67	6.55%	
R-05	Sub-base and Pavement	\$ 15,547.62	3.07%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
R-07	Bituminous pavement	\$ 247,275.00	48.77%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
R - 08	Structures	\$ 114,511.26	22.58%	\$ 65,535.19	12.92%	\$ 38,922.00	7.68%	\$ 104,457.19	20.60%	
R - 10	Dayworks	\$ 1,400.00	0.28%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
R- 11	Routine Maintenance	\$ 3,370.00	0.66%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
R-12	Cleaning	\$ 200.00	0.04%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
R-15	Provisional sum	\$ 400.00	0.08%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
GENERAL ITEM										
G-01	Security	\$ 1,380.00	0.27%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
G-02	Project team	\$ 17,700.00	3.49%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
G-03	Safety and protection	\$ 4,077.00	0.80%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
G-04	Meetings	\$ 360.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
G-05	Ceremonial costs	\$ 600.00	0.12%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
G-06	Reinstatement	\$ 5,196.05	1.02%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
A	Construction Cost	\$ 425,268.64	83.87%	\$ 100,273.86	19.78%	\$ 38,922.00	7.68%	\$ 139,195.86	27.45%	
B	Contrator Fee (Ax10%)	\$ 42,526.86	8.39%	\$ 10,027.39	1.98%	\$ 3,892.20	0.77%	\$ 13,919.59	2.75%	
C	General Items	\$ 29,313.05	5.78%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
D	Construction Tax (A+B+C x 2%)	\$ 9,942.17	1.96%	\$ 2,206.02	0.44%	\$ 856.28	0.17%	\$ 3,062.31	0.60%	
Grand Total (US\$)		\$ 507,050.73	100.00%	\$ 112,507.27	22.19%	\$ 43,670.48	8.61%	\$ 156,177.75	30.80%	

Prepara Husi :


Eng. Salvador Martins
Eng. ba projeto infraestrutura, transporte e irigasaun
Município Viqueque ADN I.P.

Verifika Husi :


Eng. Remigio da C. S. dos Santos
Engenheiro Senior ba projeto infraestrutura, transporte e irigasaun ADN I.P.

Sertifika Husi :


Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P
Transportes e Irigasaun ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Saneamento Público

Nórná Prójétu : Nova Construção da Escola básica central uatocarbaó no code emis 5319
Lokáldade : Matadalan., Irabin de Bixo,Uatocarbaú, viqueque.
Prójétu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,879.26	\$ 2,259.08	2.66%	\$ -	0.00%	\$ 2,259.08	2.66%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	C/39 (i)	US\$ 66,202.64	\$ 37,264.96	43.83%	\$ 13,240.53	15.57%	\$ 50,505.48	59.41%
IV	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 5,594.73	\$ 2,857.02	3.36%	\$ -	0.00%	\$ 2,857.02	3.36%
	CONSTRUCTION COST		US\$ 75,676.63	\$ 42,381.05	49.85%	\$ 13,240.53	15.57%	\$ 55,621.58	65.42%
	CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ 3,076.00	3.62%	\$ -	0.00%	\$ 3,076.00	3.62%
	GRAND TOTAL		US\$ 85,016.63	\$ 45,457.05	53.47%	\$ 13,240.53	15.57%	\$ 58,697.58	69.04%

Prepared By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Checked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Prójétu Edifício Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Approved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



PROJECT OWNER : IGREJA PROTESTANTE IHA TIMOR LESTE-TEGIAO LESTE
PROJECT TITLE : NEW CONSTRUCTION OF CAPELA
PROJECT LOCATION : BETESDA NAEDALA,SUCO AFALOICAI,UATOLARI VIQUEQUE
TOTAL FLOOR AREA : 162 M2

SUMMARY

ITEM NO.	DESCRIPTION	ORIGINAL	PREVIOUS		THIS MONTH		UP TO DATE	
			AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%
	MAIN BUILDING WORKS							
I	GENERAL WORKS	\$ 10,401.01	\$ 3,953.78	2.36%	\$ 520.05	0.31%	\$ 4,473.83	2.67%
II	EARTH AND SAND WORKS	\$ 3,147.42	\$ 3,162.72	1.88%	\$ 157.37	0.09%	\$ 3,320.09	1.98%
III	WALL MASONRY AND PLASTER WORKS	\$ 4,917.75	\$ 4,917.75	2.93%	\$ 245.89	0.15%	\$ 5,163.64	3.08%
IV	CONCRETE WORKS	\$ 35,597.61	\$ 35,597.61	21.22%	\$ 1,779.88	1.06%	\$ 37,377.49	22.28%
V	ROOFING WORKS	\$ 15,555.58	\$ 10,520.20	6.27%	\$ 777.78	0.46%	\$ 11,297.98	6.73%
VI	CEILING WORKS	\$ 8,757.87	\$ -	0.00%	\$ 437.89	0.26%	\$ 437.89	0.26%
VII	CARPENTRY WORKS	\$ 11,606.00	\$ 2,628.00	1.57%	\$ 580.30	0.35%	\$ 3,208.30	1.91%
VIII	ELECTRICAL WORKS	\$ 3,474.86	\$ 2,136.00	1.27%	\$ 173.74	0.10%	\$ 2,309.74	1.38%
IX	HIDRAULIC WORKS	\$ 5,621.93	\$ 602.01	0.36%	\$ 281.10	0.17%	\$ 883.11	0.53%
X	FLOOR WORKS	\$ 12,784.71	\$ -	0.00%	\$ 639.24	0.38%	\$ 639.24	0.38%
XI	PAINTING WORKS	\$ 3,564.81	\$ -	0.00%	\$ 178.24	0.11%	\$ 178.24	0.11%
XII	NEW CONSTRUCTION OF FENCE	\$ 29,839.95	\$ 11,034.66	6.58%	\$ 1,492.00	0.89%	\$ 12,526.65	7.47%
A	TOTAL (I +II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	\$ 145,269.48	\$ 74,552.73	44.43%	\$ 7,263.47	4.33%	\$ 81,816.21	48.76%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 14,526.95	\$ 7,455.27	4.44%	\$ 726.35	0.43%	\$ 8,181.62	4.88%
C	OVERHEAD	\$ 4,700.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 3,289.93	\$ 1,640.16	0.98%	\$ 159.80	0.10%	\$ 1,799.96	1.07%
E	GRAN TOTAL	\$ 167,786.36	\$ 83,648.17	49.85%	\$ 8,149.62	4.86%	\$ 91,797.79	54.70%

Prepared By


Arch. Guido C. Tilman
Eng. Município Viqueque ADN, I.P.

Checked By


Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edifício Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Aproved By


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projectu : Nova Construção da Escola ESTV Kaluheda
Lokalidade : Matahoi, Posto Administrativo Uato Lari, Município Viqueque
Projectu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount	%	Amount	%	Amount	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,529.26	\$ 2,035.00	1.28%	\$ -	0.00%	\$ 2,035.00	1.28%
II	TEACHER OFFICE		US\$ 87,810.85	\$ 55,889.77	35.02%	\$ 43,905.43	27.51%	\$ 99,795.19	62.53%
III	LABORATORY COMPUTER		US\$ 37,827.19	\$ 18,763.50	11.76%	\$ 18,913.59	11.85%	\$ 37,677.09	23.61%
IV	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 21,083.35	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		US\$ 150,250.65	\$ 76,688.26	48.05%	\$ 62,819.02	39.36%	\$ 139,507.28	87.42%
	CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ 3,474.50	2.18%	\$ -	0.00%	\$ 3,474.50	2.18%
	GRAND TOTAL		US\$ 159,590.65	\$ 80,162.76	50.23%	\$ 62,819.02	39.36%	\$ 142,981.78	89.59%

Prepared By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Checked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior na Projectu Edificio Publiku
No Bee Saneamento ADN, I.P.

Approved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projetu : Nova Construção da Escola básica Central no code emis 5321
Lokalidade : Matahoi, Uatolari, Viqueque.
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount	%	Amount	%	Amount	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,875.00	\$ 2,332.50	3.32%	\$ -	0.000%	\$ 2,332.50	3.32%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 53,213.90	\$ 34,291.54	48.85%	\$ 7,982.09	11.37%	\$ 42,273.63	60.23%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 3,762.31	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		US\$ 60,851.21	\$ 36,624.04	52.18%	\$ 7,982.09	11.372%	\$ 44,606.13	63.5%
	CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ 847.50	1.21%	\$ -	0.00%	\$ 847.50	1.21%
	GRAND TOTAL		US\$ 70,191.21	\$ 37,471.54	53.38%	\$ 7,982.09	11.37%	\$ 45,453.63	64.76%

Prepared By


Arch. Guido Carceres Tilman
Eng. Município Viqueque ADN, I.P.

Cheked By


Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edifício Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Aproved By


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projeto : Nova Construção da Escola filial edemumo no code emis 696
Lokalidade : matadalan viqueque uatolari, viqueque.
Projeto nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

MAIN SUMMARY		Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount	%	Amount	%	Amount	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,679.26	\$ 1,404.26	1.42%	\$ -	0.00%	\$ 1,404.26	1.42%
II	CLASSROOM BUILDING CB	C/39 (i)	US\$ 74,682.86	\$ 16,363.01	16.54%	\$ 11,202.43	11.32%	\$ 27,565.44	27.86%
IV	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 11,256.37	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 89,618.49	\$ 17,767.27	17.95%	\$ 11,202.43	11.32%	\$ 28,969.70	29.27%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,397.50	1.41%	\$ -	0.00%	\$ 1,397.50	1.41%
GRAND TOTAL			US\$ 98,958.49	\$ 19,164.77	19.37%	\$ 11,202.43	11.32%	\$ 30,367.20	30.69%

Prepared By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Município Viqueque ADN, I.P.

Checked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Aproved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projetu : Nova Construção da Escola basica filial ualaka no code emis 791
Lokalidade : Sana uaitame Uatolari viqueque
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount \$	%	Amount \$	%	Amount \$	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,879.26	\$ 2,367.19	2.22%	\$ -	0.00%	\$ 2,367.19	2.22%
II	CLASSROOM BUILDING Cb	C/39 (i)	US\$ 78,149.38	\$ 50,653.06	47.57%	\$ 6,251.95	5.87%	\$ 56,905.01	53.44%
IV	PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 15,106.78	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 97,135.42	\$ 53,020.25	49.80%	\$ 6,251.95	5.87%	\$ 59,272.20	55.67%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 1,585.00	1.49%	\$ -	0.00%	\$ 1,585.00	1.49%
GRAND TOTAL			US\$ 106,475.42	\$ 54,605.25	51.29%	\$ 6,251.95	5.87%	\$ 60,857.20	57.16%

Prepared By

Arch. Guido C. Tilman
Eng. (Municipio Viqueque ADN, I.P.

Cheked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Aproved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN, I.P.



Naran Projeto : Nova Construção da Escola secundária geral calixa no code emis 5121
Lokalidade : Macdean uma quic Viqueque villa
Projeto nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY			
	MAIN SUMMARY	Page No	Amount
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,075.00
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	US\$ 58,664.20
III	TOILET BUILDING		US\$ 32,529.17
IV	PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 9,751.28
	CONSTRUCTION COST		US\$ 104,019.66
	CONTINGENCY		US\$ 3,000.00
	OVERHEAD		US\$ 6,340.00
	GRAND TOTAL		US\$ 113,359.66

Prepared By


Eng. Bebiano-Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN,I.P.

Checked By


Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior do Projeto Edifício Público No
Bee Saneamento ADN,I.P.

Aproved By


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Viqueque-13)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Bazika filial ularihic kraras
No. kontratu :

Data Inspesaun : 09-02-2023

Fatin Inspesaun : Kraras, Viqueque Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.5123748" 126.1824822

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes

2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Obra refere iha ona service ba faze plesteran

Interior nian

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIM GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projeto : Nova Construção da Escola filial ularihic kraras no code emis 5125
Lokalidade : bibileo,craras,viqueque villa.
Projeto nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount	%	Amount	%	Amount	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,075.00	\$ 1,975.00	2.80%	\$ -	0.00%	\$ 1,975.00	2.80%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US\$ 51,986.89	\$ 15,184.39	21.50%	\$ 19,235.15	27.23%	\$ 34,419.54	48.73%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 6,231.37	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		US\$ 61,293.26	\$ 17,159.39	24.29%	\$ 19,235.15	27.23%	\$ 36,394.54	51.53%
	CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ 540.00	0.76%	\$ -	0.00%	\$ 540.00	0.76%
	GRAND TOTAL		US\$ 70,633.26	\$ 17,699.39	25.06%	\$ 19,235.15	27.23%	\$ 36,934.54	52.29%

Prepared By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN, I.P.

Choked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Aproved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Viqueque-14)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção da Escola Pre-Escolar Maria Lobato
No. kontratu :

Data Inspesaun : 08-02-2023

Fatin Inspesaun : Bosa bein uma wain craic, viqueque villa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.553792" 126.242214

End Point : Long :

Naran Inspector : 1. Bebiano Crecencio de Jesus Lopes


2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Serbisu pas. Kramik no Pinta

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

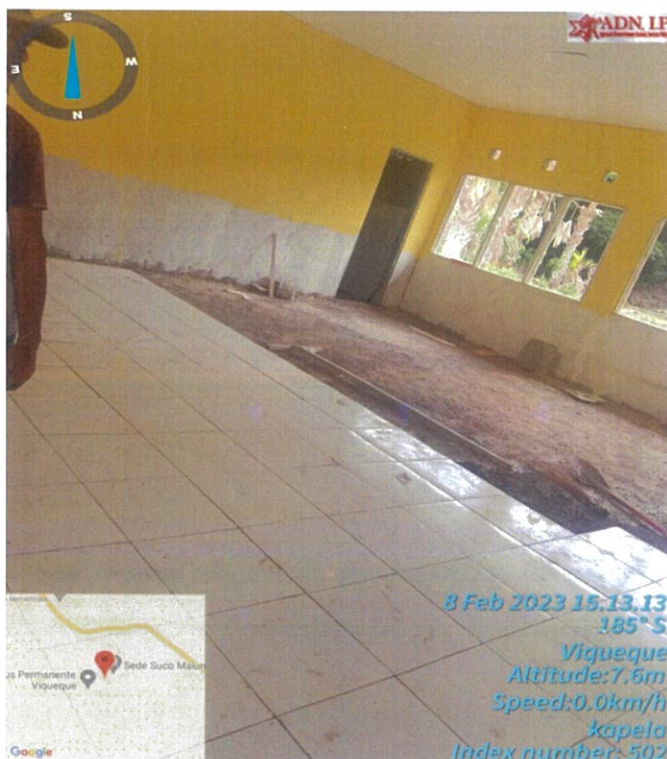



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Viqueque-14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Nova Construção da Escola Pre-Escolar Maria Lobato
:

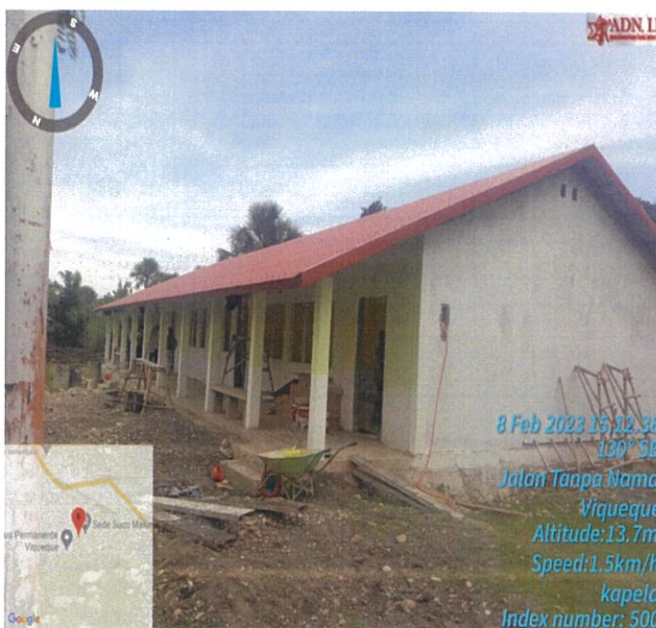

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projetu : Nova Construção da Escola maria lobato no code emis 1638
Lokalidade : Bosa bein uma wain cratic viqueque villa
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up To Date	
				Amount \$	%	Amount \$	%	Amount \$	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,279.26	\$ 2,840.96	2.95%	\$ 438.30	0.47%	\$ 3,279.26	3.42%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C/39 (i)	US\$ 56,119.79	\$ 40,881.89	42.52%	\$ 15,237.90	16.40%	\$ 56,119.79	58.92%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 24,199.84	\$ 920.71	0.93%	\$ -	0.00%	\$ 920.71	0.93%
	CONSTRUCTION COST		US\$ 83,598.89	\$ 44,643.56	46.39%	\$ 15,676.20	16.87%	\$ 60,319.76	63.26%
	CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ 3,605.50	3.71%	\$ 2,734.50	2.94%	\$ 6,340.00	6.66%
	GRAND TOTAL		US\$ 92,938.89	\$ 48,249.06	50.11%	\$ 18,410.70	19.81%	\$ 66,659.76	69.92%

Prepared By


Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN,I.P.

Cheked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeltu Edifício Publiku No
Bee Saneamento ADN,I.P.

Aproved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P.

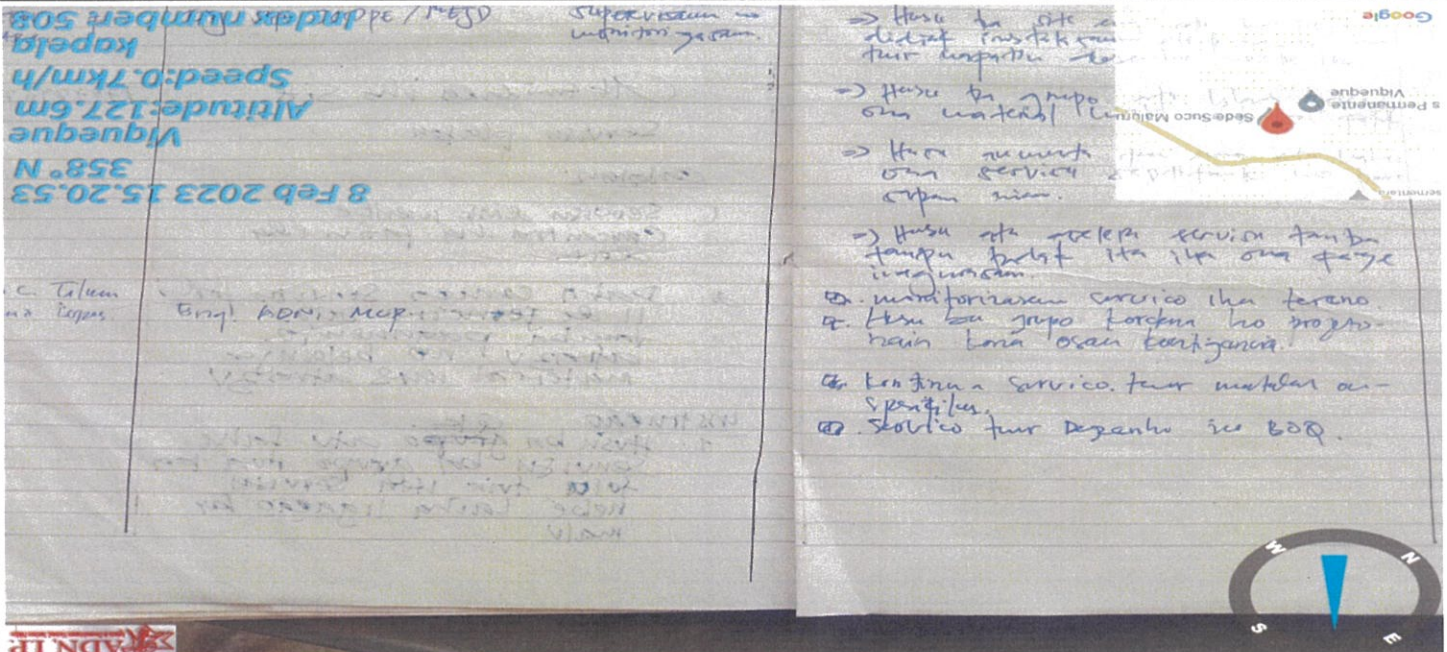 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Nova Construção da Escola Pre-Escolar Maria Lobato							
Kompanha : PKRIE,PROJECTO KOMUNITARIO							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	02/08/2023	Viqueuque Vila	Bebiano C. de Jesus Lopes	Tekniko	1	Husu ba site eng. Atu update nafatin progress fisiku iha terenu	
					2	husu mos ba site eng.atu halo komfirmasaun ho dono do projeto sobre fundus contingencia	
					3	site eng.atu controla didiak badaen sira bainhra atu taka kramik no pinta	
					4		
							



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projetu : Nova Construção da escola pre-escolar sebastiao gomes uaimoritula no code emis 1694
Lokalidade : uma liurai, uaimoritula, viqueque villa.
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS		THIS BILLING		UP TO DATE	
				AMOUNT \$	%	AMOUNT \$	%	AMOUNT \$	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 4,079.26	\$ 3,135.96	3.51%	\$ -	0.00%	\$ 3,135.96	3.51%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C/39 (i)	US\$ 66,049.28	\$ 44,577.21	49.86%	\$ 13,209.86	14.78%	\$ 57,787.07	64.64%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 9,927.55	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		US\$ 80,056.09	\$ 47,713.18	53.37%	\$ 13,209.86	14.78%	\$ 60,923.03	68.15%
	CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ 3,314.50	3.71%	\$ -	0.00%	\$ 3,314.50	3.71%
	GRAND TOTAL		US\$ 89,396.09	\$ 51,027.68	57.08%	\$ 13,209.86	14.78%	\$ 64,237.53	71.86%

Prepared By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN,I.P.

Cheked By

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projetu Edifício Publiku No Bee
Saneamento ADN,I.P.

Aproved By

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade ADN,I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projectu : Nova Construção da Escola ESG Uatucarbau
Lokalidade : Irabin de Bixo, Posto Administrativo Uato Carbau, Município Viqueque
Projectu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount	%	Amount	%	Amount	%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 4,279.26	\$ 3,120.02	3.44%	\$ -	0.00%	\$ 3,120.02	3.44%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	C/39 (i)	US\$ 73,342.16	\$ 44,150.42	48.73%	\$ 14,668.43	16.19%	\$ 58,818.85	64.92%
III	PROFESSIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 3,633.93	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
CONSTRUCTION COST			US\$ 81,255.35	\$ 47,270.44	52.18%	\$ 14,668.43	16.19%	\$ 61,938.87	68.37%
CONTINGENCY			US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
OVERHEAD			US\$ 6,340.00	\$ 3,076.00	3.40%	\$ -	0.00%	\$ 3,076.00	3.40%
GRAND TOTAL			US\$ 90,595.35	\$ 50,346.44	55.58%	\$ 14,668.43	16.19%	\$ 65,014.87	71.77%

Prepared By


Arch. Guido C. Tilman

Eng. Município Viqueque ADN, I.P.

Cheked By


Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo

Engenheiro Senior ba Projeto Edificio Publiku No
Bee Saneamento ADN, I.P.

Aproved By



Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projetu : Nova Construção da Escola básica central uatocarbaio no code emis 5319
Lokalidade : Matadalan., Irabin de Bixo,UatoCarbau, viqueque.
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	Previous		This Billing		Up to Date	
				Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %	Amount \$	Percent %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US\$ 3,879.26	\$ 2,259.08	2.66%	\$ -	0.00%	\$ 2,259.08	2.66%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	C/39 (i)	US\$ 66,202.64	\$ 37,264.96	43.83%	\$ 13,240.53	15.57%	\$ 50,505.48	59.41%
IV	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US\$ 5,594.73	\$ 2,857.02	3.36%	\$ -	0.00%	\$ 2,857.02	3.36%
	CONSTRUCTION COST		US\$ 75,676.63	\$ 42,381.05	49.85%	\$ 13,240.53	15.57%	\$ 55,621.58	65.42%
	CONTINGENCY		US\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	OVERHEAD		US\$ 6,340.00	\$ 3,076.00	3.62%	\$ -	0.00%	\$ 3,076.00	3.62%
	GRAND TOTAL		US\$ 85,016.63	\$ 45,457.05	53.47%	\$ 13,240.53	15.57%	\$ 58,697.58	69.04%

Prepared By

Checked By

Aproved By

Eng. Bebiano Crecencio De Jesus Lopes
Eng. Municipio Viqueque ADN,I.P.

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio Publiku No
Bee Saneamento ADN,I.P.

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P.

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE REPÚBLICA MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																														
Naran Eng.	Roberto M. Martins						2023																														
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																				
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																												OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	17	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 5 + 400 - 7 + 400	Walay Unip. Lda	RT/031/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	18	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 7 + 400 - 9 + 400	Fin-Los Unip. Lda	RT/032/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	19	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 9 + 400 - 11 + 400	Lamadae Unip. Lda	RT/033/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	20	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 11 + 400 - 13 + 400	Marques Const. Unip. Lda	RT/034/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	21	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 13 + 400 - 15 + 400	Uaitau Unipessoal.Lda	RT/035/MOP-2021	FI/R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	22	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 15 + 400 - 17 + 700	Borala Unip. Lda	RT/036/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
UATOCARBAU	1	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																													Projetu refere Laiha ona Actividade Servisu Iha Terreno, Eng munisipio Sedauk bele Update Progres Tamba Item Nebe'e kompania implementa iha terreno la inklui iha Original Contrak no Additional I, e Eng. Municipio Observa katak Defeitus nebe'e Akontese iha terreno Kompania Hadia ona,	
							Actual																														
	2	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																														
							Actual																														
	3	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarabau - Viqueque Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	4	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	Jonel Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	5	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)	Sabirara, Unip. Lda	SSS/155/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													ON GOING	
							Actual																														
	6	EBC 2.3 Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
							Actual																														
	7	ESG Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
							Actual																														
	8	Supply, Installation, Configuration, Testing, Commisioning of it establishment of GNSS Station at eight Municipalities in Timor Leste under Ministry of Planing & Territory.	TeroMovigo - Earth Innovation, Lda	ICB/011/MPO-2022	LM-CD	MINISTERIO PLANO E ORDENAMENTO	Plan																														
							Actual																														
	1	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	Laway	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Liasidi, Nunumalau, Iralere and Ulusu, Uatolari - Viqueque Municipality	Habere Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	3	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	Helamula Unipessoal, Lda	SSS/096/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu refere Laiha Actividade Servisu Iha terreo, Tamba kompania Hein deit Equipa Husi Laboratorium MOP no ADN tun ba terreno hodi halo Trial Ba Praim Coat no Kalibrasi AMP.	
							Actual																														
	4	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	Greu Unipessoal, Lda	SSS/093/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu refere Laiha Actividade Servisu Iha terreo, Tamba kompania Hein deit Equipa Husi Laboratorium MOP no ADN tun ba terreno hodi halo Trial Ba Praim Coat no Kalibrasi AMP.	
							Actual																														
	5	New construction of Gapura Stairs and wall protection no jardim de herois de Viqueque	Natureza Furak Unip/ Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	LM	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA	Plan																														
							Actual																														
	6	Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 2 Uatolari - Laisorulai (162)	Bragtojul Unip. Lda JV PT Decont Mitra Consolindo	MPW-CS-2000025	FI	ESTATAL	Plan																														
							Actual																														

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Roberto M. Martins
------------	---------------------------

2023

Município	MUNICIPIO VIOQUEQUE & POSTOS
-----------	------------------------------

[illegible]

Naran Eng.		Roberto M. Martins						2023																														
Municipio		MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																				
Municipio / Posto		No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																												OBS	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
VIQUEQUE	6		For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package: 12 Luca - Lacluta	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000022	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
								Actual																														
	7		Rehabilitation of Venilale - Hatulia, Uamori Road Package 2 (STA. 10+300 - STA. 15+475) in Baucau Municipality	Uma Liurai Unip. Lda	SSS/138/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
								Actual																														
	8		Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625	Bihalatur Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
								Actual																														
	9		Rehabilitation of Vanilale - Hatulari - Uaimori Road (30.880km) Roads Section : Venilale - Hatulia Roads Package 5 Sta. 20+625 - 25+755 Municipality Baucau	Loke Matan Unip. Lda	SSS/307/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
								Actual																														
	10		Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880	Caburela Unip. Lda	SSS/306/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
								Actual																														
	11		ESG Calixa	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
								Actual																														
	12		EBF Ular Rihik	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
								Actual																														
	13		Pre Escolar Maria Lobato Raithu	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
								Actual																														
	14		EBC Caibiraon	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
								Actual																														
15		Pre Escolar Sebastiao Gomes Uai Mori Tula	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																															
							Actual																															
16		New Construction Office, Were House and Landscaping Of Viqueque Distric	L.M. Caicasa Metin Unip,Lda	01/MSSI/DGAF/DNA/1/2022	LM	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN	Plan																															
							Actual																															
17		Konstrusaun Foun Escola Secundaria Geral 4 de Setembro Viqueque	Grupo Komunitario	NCB/020-R/MEJD/DNA/2021	TP	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
MULTI POSTO ADMINIS TRATIVO	1		Upgrading and Maintenance of Baucau - Viqueque Highway Project Lot 2: Venilale - Viqueque : Sta. 27 + 120 to Sta. 62 + 010	China Railway Int. Group Co. Jv with China Oversees	ICB/046/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
								Actual																														
TOTAL PROJETO ON-GOING																																						

Note:

Plano Periode inspesaun iha terenu

Implementa Planu Periode Inspesaun

Assunto Servisu iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Roberto Maria Martins)
Eng. Municipiú Viqueque ADN, I.P

Sertifikasi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo ADN, I.P.

							PLANU INSPESAUN																														
Naran Eng.	Salvador Martins						2023																														
Municipio	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																				
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																												OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Lachuta	1	New COnstruction Of Dilor River Protection Package 2 STA 0+800-1+612 In Viqueque District	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	2	Emergency Project, Cyclone Seroja 04 April 2021, River Training Welolo, Viqueque , Regularizasaun Temporaria (Sta. 0+220 toSta. 0+340)	Fin - Los Unip. Lda	RFQ-CD-MOP-22007	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	3	Konstrusaun foun Escola Secundaria Tecnica vocational Ravina Lachuta	Luafiamor Unipessoal. Lda	NCB/021-R/MEJD/DNA/2022	FI	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
							Actual																														
OSSU	1	Road Rehabilitation of Assalaitula - Ossu Sta. 5+155 - 14+000 Municipality Viqueque	Uhacae, Unip. Lda	SSS/064/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	2	Manutensaun Estrada Luihono-Osorua Sta. 0+000-6+750- Municipal of Viqueque	Boru- Buty Unip. Lda	RT/072/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	3	R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liawaioli Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality	Kay Seng Unip. Lda	NCB/056/MOPTC-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	4	Rural Roads Periodic Maintenance Luihono - Osorua Chainage 0+000 - 6+800 Routine Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400 Municipality Viqueque (162)	Kay Seng Unip. Lda	MPW-W-190084	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Ossu-Nahareka Chainage 0+000-3+400	Costa Key Unip Lda	MPW-W-210053	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Loihunu-Uagia Chainage 0+000 - 6+800	Manoko Unip. Lda	MPW-W-210050	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	7	Emergency Road Rehabilitation Package II from Ossu - Viqueque District	Modena Tecnip Unipessoal Lda	MOPW-F1-W-166514	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	8	New Construction of Health Post and Doctor's House building in Builale	Borala Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-075	LM	MINISTERIO DA SAUDE	Plan																														
							Actual																														
	9	R4D Riral Roads Periodic Maintenance ossu - Nahareka Chainage 4+350 - 6+350	Fin-Los Unip. Lda JV Costa Key Unip. Lda	MPW - W - 190085	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	10	EBF Uaibobo	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
							Actual																														
	11	Pre Escolar Uaibua	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
							Actual																														
	12	ESG Oloaasa	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
							Actual																														
	13	EBF Liaruca	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
							Actual																														
	14	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 2 + 000 - 4 + 000	Costa Key Unip Lda	RT/028/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	15	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 4 + 000 - 6 + 00	JV1983 Larigutu. Lda	RT/029/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	16	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 6 + 000 - 8 + 000		RT/030/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														



							PLANU INSPESAUN																													
Naran Eng.	Salvador Martins						2023																													
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	17	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 5 + 400 - 7 + 400	Walay Unip. Lda	RT/031/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																							Iha Fulan Febrero Comp. Fokus Liu Ba Plum Concrete						
							Actual																													
	18	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 7 + 400 - 9 + 400	Fin-Los Unip. Lda	RT/032/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																							Laiha Actividade Servico iha Fulan Febrero						
							Actual																													
	19	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 9 + 400 - 11 + 400	Lemadae Unip. Lda	RT/033/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	20	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 11 + 400 - 13 + 400	Marques Const. Unip. Lda	RT/034/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	21	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 13 + 400 - 15 + 400	Uaitau Unipessoal.Lda	RT/035/MOP-2021	FI/R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	22	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 15 + 400 - 17 + 700	Borala Unip. Lda	RT/036/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
UATOCARBAU	1	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																													
							Actual																													
	2	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																													
							Actual																													
	3	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarabau - Viqueque Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	4	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	Jonel Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	5	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)	Sabirara, Unip. Lda	SSS/155/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	6	EBC 2.3 Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													
							Actual																													
	7	ESG Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													
							Actual																													
	8	Supply, Installation, Configuration, Testing, Commisioning of it establishment of GNSS Station at eight Municipalities in Timor Leste under Ministry of Planing & Territory.	TeroMovigo - Earth Innovation, Lda	ICB/011/MPO-2022	LM-CD	MINISTERIO PLANO E ORDENAMENTO	Plan																													
							Actual																													
	1	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	Laway	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Liasidi, Nunumalau, Iralere and Ulusu, Uatolari - Viqueque Municipality	Habere Unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	3	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	Helamula Unipessoal, Lda	SSS/096/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	4	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	Greu Unipessoal, Lda	SSS/093/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	5	New construction of Gapura Stairs and wall protection no jardim de herois de Viqueque	Natureza Furak Unip/ Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	LM	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO	Plan																													
							Actual																													



							PLANU INSPESAUN																													
Naran Eng.	Salvador Martins						2023																													
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
UATOLARI	6	Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 2 Uatolari - Laisorulai (162)	Bragtojul Unip. Lda JV PT Decont Mitra Consolindo	MPW-CS-2000025	FI	ESTATAL	Plan																													
							Actual																													
	7	Rehabilitation of Miabuti Edmumo, Sapatula Road /reabilitacao de estradas distritais de Uatolari Viqueque District	Karakuta Unip Lda	MPW-2013/JUNE	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	8	New Construction of Capela Betesda Naedala - Afoloicai-Uatolari	Be'e Horis Unip. Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	9	Konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Bebui Municipio Viqueque	L. M. Caicasa Metin Unip.Lda	RDTL-MAPPO2021:15965	LM	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	Plan																													
							Actual																													
	10	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Nahae	Grupo Komunitario		LM	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													
							Actual																													
	11	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Uaibira	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													
							Actual																													
	12	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC 07 Uatolari	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													
							Actual																													
	13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Edemumo	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													
							Actual																													
	14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Ualaque	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													
							Actual																													
15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESTV Kalo-Heda Uatolari	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
						Actual																														
16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Debuisi	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
						Actual																														
17	Road Maintenance Section : Viqueque Makadiki (A08-3)	Samadare Unip. Lda	MPW-W-220023	TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
						Actual																														
18	Konstrusaun foun ESG Daraloi-Iraler, uatolari-Viqueque	Henlopsta, Unipessoal Lda		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
						Actual																														
1	Emergency work package caused by climate change on June 2013 (Gabion protection works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	Consortio Unidos Genero, Lda	SSS/100/MOPTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											PHO			
						Actual																														
2	Rehabilitation of Urban Road Municipality Viqueque	Urukai II, Unip. Lda	SSS/072/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											PHO			
						Actual																														
3	Rehabilitation of Roads From Junction Bemvindo Bahalara - Uain We Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000 - 5+500 Municipality Viqueque	Arpy Unipessoal, Lda	SSS/163/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										PHO				
						Actual																														
4	Rehabilitation of Suspension Bridge, Municipality of Viqueque.	Arquiris	SSS/105/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										PHO				
						Actual																														
5	Routine Road Maintenance Lot 1 - Viqueque - Dilor A07, Lot 2 - Jet Luca - Lacluta C5 Municipality Viqueque (162)	Dira Nova Unip. Lda	MPW - W - 190114	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
						Actual																														



							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Naran Eng.	Salvador Martins						2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																												OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VIQUEQUE	6	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package: 12 Luca - Lacluta	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000022	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Note:

 Plano Periode inspesaun iha terenu

 Implementa Planu Periode Inspesaun

 Assunto Servisu iha Dili

 Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi:

 (Eng. Salvador Martins)
 Eng. Municipiu Viqueque ADN, I.P.

Sertifika Husi:

 (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN, I.P.

Aprova Husi:

 (Eng. Januario Maia Guterres)
 Adjunto Director Executivo ADN, I.P.


 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																													
Naran Eng.	Guido C. Tilman						2023																													
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	17	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguaia - Nahareka - Chainage 5 + 400 - 7 + 400	Walay Unip. Lda	RT/031/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	18	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguaia - Nahareka - Chainage 7 + 400 - 9 + 400	Fin-Los Unip. Lda	RT/032/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	19	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguaia - Nahareka - Chainage 9 + 400 - 11 + 400	Lamadae Unip. Lda	RT/033/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	20	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguaia - Nahareka - Chainage 11 + 400 - 13 + 400	Marques Const. Unip. Lda	RT/034/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	21	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguaia - Nahareka - Chainage 13 + 400 - 15 + 400	Uaitau Unipessoal.Lda	RT/035/MOP-2021	FI/R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	22	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguaia - Nahareka - Chainage 15 + 400 - 17 + 700	Borala Unip. Lda	RT/036/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
UATOCARBAU	1	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																													
							Actual																													
	2	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																													
							Actual																													
	3	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarabau - Viqueque Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	4	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	Jonel Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	5	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)	Sabirara, Unip. Lda	SSS/155/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	6	EBC 2.3 Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													ON GOING
							Actual																													
	7	ESG Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													ON GOING
							Actual																													
	8	Supply, Installation, Configuration, Testing, Commisioning of it establishment of GNSS Station at eight Municipalities in Timor Leste under Ministry of Planing & Territory.	TeroMovigo - Earth Innovation, Lda	ICB/011/MPO-2022	LM-CD	MINISTERIO PLANO E ORDENAMENTO	Plan																													ON GOING
							Actual																													
	1	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	Laway	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Liasidi, Numumalau, Iralere and Ulusu, Uatulari - Viqueque Municipality	Habere Unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	3	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	Helamula Unipessoal, Lda	SSS/096/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	4	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	Greu Unipessoal, Lda	SSS/093/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	5	New construction of Gapura Stairs and wall protection no jardim de herois de Viqueque	Natureza Furak Unip/ Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	LM	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																													ON GOING
							Actual																													

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Naran Eng.	Guido C. Tilman							2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																												OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UATOLARI	6	Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 2 Uatolari - Laisorulai (162)	Bragtojul Unip. Lda JV PT Decont Mitra Consolindo	MPW-CS-2000025	FI	ESTATAL	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																													
Naran Eng.	Guido C. Tilman						2023																													
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
VIQUEQUE	6	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package: 12 Luca - Lacluta	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000022	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	7	Rehabilitation of Venilale - Hatulia, Uamori Road Package 2 (STA. 10+300 - STA. 15+475) in Baucau Municipality	Uma Liurai Unip. Lda	SSS/138/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	8	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625	Bihalutur Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	9	Rehabilitation of Vanilale - Hatulari - Uaimori Road (30.880km) Roads Section : Venilale - Hatulia Roads Package 5 Sta. 20+625 - 25+755 Municipality Baucau	Loke Matan Unip. Lda	SSS/307/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	10	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880	Caburela Unip. Lda	SSS/306/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	11	ESG Calixa	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													
							Actual																													
	12	EBF Ular Rihik	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													
							Actual																													
	13	Pre Escolar Maria Lobato Raithu	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													
							Actual																													
	14	EBC Caibiraon	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													
							Actual																													
15	Pre Escolar Sebastiao Gomes Uai Mori Tula	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														
						Actual																														
16	New Construction Office, Were House and Landscaping Of Viqueque Distric	L.M. Caicasa Metin Unip,Lda	01/MSSI/DGAF/DNA/I/2022	LM	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN	Plan																														
						Actual																														
17	Konstrusaun Foun Escola Secundaria Geral 4 de Setembro Viqueque	Grupo Komunitario	NCB/020-R/MEJD/DNA/2021	TP	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
						Actual																														
MULTI POSTO ADMINIS TRATIVO	1	Upgrading and Maintenance of Baucau - Viqueque Highway Project Lot 2: Venilale - Viqueque : Sta. 27 + 120 to Sta. 62 + 010	China Railway Int. Group Co. jv with China Oversees	ICB/046/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
TOTAL PROJETO ON-GOING																																				

Note:

Plano Periode inspesaun iha terenu	Implementa Planu Periode Inspesaun	Assunto Servisu iha Dili	Inspesaun Prosesu Pagamentu
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Prepara Husi :

 (Arch. Guido Carzeres Tilman)
 Eng. Municipiu Viqueque ADN, I.P.

Sertifika Husi :

 (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN, I.P.

Aprova Husi :

 (Eng. Januario Maia Guterres)
 Adjunto Director Executivo ADN, I.P.

PLANU INSPESAUN

2023

Naran Eng.	Bebiano C. de Jesus Lopes							2023																													
Municipio	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																				
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																												OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Lacluta	1	New CONstruction Of Dilor River Protection Package 2 STA 0+800-1+612 In Viqueque District	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	SSS/089/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Laiha Ona Actividade Servisu Iha Terreno Fisiku Projetu Finaliza Ona.	
							Actual																														
	2	Emergency Project, Cyclone Seroja 04 April 2021, River Training Welolo, Viqueque , Regularizasaun Temporarua (Sta. 0+220 toSta. 0+340)	Fin - Los Unip. Lda	RFQ-CD-MOP-22007	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													PHO	
							Actual																														
	3	Konstrusaun foun Escola Secundaria Tecnica vocational Ravina Lacluta	Luafiamor Unipessoal. Lda	NCB/021-R/MEJD/DNA/2022	FI	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														ON GOING
							Actual																														
OSSU	1	Road Rehabilitation of Assalaitula - Ossu Sta. 5+155 - 14+000 Municipality Viqueque	Uhacae, Unip. Lda	SSS/064/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													ON GOING	
							Actual																														
	2	Manutensaun Estrada Luihono-Osorua Sta. 0+000-6+750- Municipal of Viqueque		RT/072/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													PHO	
							Actual																														
	3	R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liawaioli Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality	Kay Seng Unip. Lda	NCB/056/MOPTC-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													ON GOING	
							Actual																														
	4	Rural Roads Periodic Maintenance Luihono - Osorua Chainage 0+000 - 6+800 Routine Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 0+000 - 3+400 Municipality Viqueque (162)	Kay Seng Unip. Lda	MPW-W-190084	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													ON GOING	
							Actual																														
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Ossu-Nahareka Chainage 0+000-3+400	Costa Key Unip Lda	MPW-W-210053	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														ABANDONA
							Actual																														
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Loihunu-Uagia Chainage 0+000 - 6+800	Manoko Unip. Lda	MPW-W-210050	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														ON GOING
							Actual																														
	7	Emergency Road Rehabilitation Package II from Ossu - Viqueque District	Modena Tecnic Unipessoal Lda	MOPW-FI-W-166514	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														ABANDONA
							Actual																														
	8	New Construction of Health Post and Doctor's House building in Builale	Borala Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-075	LM	MINISTERIO DA SAUDE	Plan	■																													ON GOING
							Actual																														
	9	R4D Riral Roads Periodic Maintenance ossu - Nahareka Chainage 4+350 - 6+350	Fin-Los Unip. Lda JV Costa Key Unip. Lda	MPW - W - 190085	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														ON GOING
							Actual																														
	10	EBF Uaibobo	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																														ON GOING
							Actual																														
	11	Pre Escolar Uaibua	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan			■																											ON GOING
							Actual			■																											
	12	ESG Oloaasa	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan			■																											ON GOING
							Actual																														
	13	EBF Liaruca	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan			■																											ON GOING
							Actual																														
	14	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 2 + 000 - 4 + 000	Costa Key Unip Lda	RT/028/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														ON GOING
							Actual																														
15	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 4 + 000 - 6 + 00	JV1983 Larigutu. Lda	RT/029/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													ON GOING		
						Actual																															
16	Rehabilitation of the Rural road Ossu de Cima - Liaruka Chainage 6 + 000 - 8 + 000		RT/030/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														ON GOING	
						Actual																															

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																													
Naran Eng.	Bebiano C. de Jesus Lopes						2023																													
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	17	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 5 + 400 - 7 + 400	Walay Unip. Lda	RT/031/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																								ON GOING					
							Actual																													
	18	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 7 + 400 - 9 + 400	Fin-Los Unip. Lda	RT/032/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																								ON GOING					
							Actual																													
	19	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 9 + 400 - 11 + 400	Lamadae Unip. Lda	RT/033/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																								ON GOING					
							Actual																													
	20	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 11 + 400 - 13 + 400	Marques Const. Unip. Lda	RT/034/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																								ON GOING					
							Actual																													
	21	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 13 + 400 - 15 + 400	Uaitau Unipessoal.Lda	RT/035/MOP-2021	FI/R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																								ON GOING					
							Actual																													
	22	Rehabilitation of the Rural road Ossu Uaguia - Nahareka - Chainage 15 + 400 - 17 + 700	Borala Unip. Lda	RT/036/MOP-2021	R4D	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																								ON GOING					
							Actual																													
UATOCARBAU	1	Construction of Dardau Irrigation Scheme Municipality Viqueque	Pembinaan Pulau Sebang SDN. BHD	ICB/041/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																							ON GOING						
							Actual																													
	2	Consulting Services For Construction Supervision of Dardau Irrigation	PT. Suwanda Karya Mandiri	RFP/042/MAP-2017	FI	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																							Eng. Nasional AND.I.P, tomakonta Konsultan Maka Responsabiliza						
							Actual																													
	3	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Mota Irabere to Mauma'a, Floresta Dirimu, Uatocarabau - Viqueque Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000441	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	4	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	Jonel Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000346	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	5	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)	Sabirara, Unip. Lda	SSS/155/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																							ON GOING						
							Actual																													
	6	EBC 2.3 Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																							ON GOING						
							Actual																													
	7	ESG Uatocarbau	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																							ON GOING						
							Actual																													
	8	Supply, Installation, Configuration, Testing, Commisioning of it establishment of GNSS Station at eight Municipalities in Timor Leste under Ministry of Planing & Territory.	TeroMovigo - Earth Innovation, Lda	ICB/011/MPO-2022	LM-CD	MINISTERIO PLANO E ORDENAMENTO	Plan																							ON GOING						
							Actual																													
	1	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	Laway	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000459	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Liasidi, Nunumalau, Iralere and Ulusu, Uatulari - Viqueque Municipality	Habere Unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000433	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	3	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 26+500 - 31+800 (Package) Area in Viqueque Municipality Viqueque	Helamula Unipessoal, Lda	SSS/096/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																							ON GOING						
							Actual																													
	4	Rehabilitation of Viqueque - Uatocarbau Road Sta. 31+800 - 37+100 (Package VII) in Uatolari Municipality Viqueque	Greu Unipessoal, Lda	SSS/093/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																							ON GOING						
							Actual																													
	5	New construction of Gapura Stairs and wall protection no jardim de herois de Viqueque	Natureza Furak Unip/ Lda	ICB/005/DNAL/MACLN/VIII/2021	LM	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																							ON GOING						
							Actual																													

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																													
Naran Eng.	Bebiano C. de Jesus Lopes						2023																													
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
UATOLARI	6	Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 2 Uatolari - Laisorulai (162)	Bragtojul Unip. Lda JV PT Decont Mitra Consolindo	MPW-CS-2000025	FI	ESTATAL	Plan																												Eng. Nasional AND.I.P, tomakonta Konsultan Maka Responsabiliza	
							Actual																													
	7	Rehabilitation of Miabuti Edmumo, Sapatula Road /reabilitacao de estradas distritais de Uatolari Viqueque District	Karakuta Unip Lda	MPW-2013/JUNE	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												ABANDONA	
							Actual																													
	8	New Construction of Capela Betesda Naedala - Afoloicai-Uatolari	Be'e Horis Unip. Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												ON GOING	
							Actual																													
	9	Konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Bebui Municipio Viqueque	L.M. Caicasa Metin Unip.Lda	RDTL-MAPPO2021:15965	LM	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	Plan																												Laiha Ona Actividade Servisu Iha Terreno Fisiku Projetu Finaliza Ona.	
							Actual																													
	10	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Nahae	Grupo Komunitario		LM	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																												ON GOING	
							Actual																													
	11	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Uaibira	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													ON GOING
							Actual																													
	12	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC 07 Uatolari	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													ON GOING
							Actual																													
	13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Edemumo	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													ON GOING
							Actual																													
	14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Ualaeue	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													ON GOING
							Actual																													
15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESTV Kalo-Heda Uatolari	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													ON GOING	
						Actual																														
16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Debuisi	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													ON GOING	
						Actual																														
17	Road Maintenance Section : Viqueque Makadiki (A08-3)	Samadare Unip. Lda	MPW-W-220023	TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN																														ON GOING	
18	Konstrusaun foun ESG Daraloi-Iraler, uatolari-Viqueque	Henlopsta, Unipessoal Lda		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																													ON GOING	
						Actual																														
	1	Emergency work package caused by climate change on June 2013 (Gabion protection works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	Consortio Unidos Genero, Lda	SSS/100/MOPTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												PHO	
							Actual																													
	2	Rehabilitation of Urban Road Municipality Viqueque	Urukai II, Unip. Lda	SSS/072/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											PHO		
							Actual																													
	3	Rehabilitation of Roads From Junction Bemvindo Bahalara - Uain We Bubur - Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000 - 5+500 Municipality Viqueque	Arpy Unipessoal, Lda	SSS/163/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											PHO		
							Actual																													
	4	Rehabilitation of Suspension Bridge, Municipality of Viqueque.	Arquiris	SSS/105/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												PHO	
							Actual																													
	5	Routine Road Maintenance Lot 1 - Viqueque - Dilor A07, Lot 2 - Jct Luca - Lacluta C5 Municipality Viqueque (162)	Dira Nova Unip. Lda	MPW - W - 190114	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												PHO	
							Actual																													

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																													
Naran Eng.	Bebiano C. de Jesus Lopes						2023																													
Município	MUNICIPIO VIQUEQUE & POSTOS																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
VIQUEQUE	6	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package: 12 Luca - Lacluta	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	MPW-CS-2000022	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Eng. Nasional AND.I.P, tomakonta Konsultan Maka Responsabiliza		
							Actual																													
	7	Rehabilitation of Venilale - Hatulia, Uamori Road Package 2 (STA. 10+300 - STA. 15+475) in Baucau Municipality	Uma Liurai Unip. Lda	SSS/138/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											ON GOING		
							Actual																													
	8	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625	Bihaltur Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											ON GOING		
							Actual																													
	9	Rehabilitation of Vanilale - Hatulari - Uaimori Road (30.880km) Roads Section : Venilale - Hatulia Roads Package 5 Sta. 20+625 - 25+755 Municipality Baucau	Loke Matan Unip. Lda	SSS/307/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												ON GOING	
							Actual																													
	10	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880	Caburela Unip. Lda	SSS/306/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												ON GOING	
							Actual																													
	11	ESG Calixa	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																												ON GOING	
							Actual																													
	12	EBF Ular Rihik	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																												ON GOING	
							Actual																													
	13	Pre Escolar Maria Lobato Raithu	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																												ON GOING	
							Actual																													
	14	EBC Caibiraon	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																												ON GOING	
							Actual																													
15	Pre Escolar Sebastiao Gomes Uai Mori Tula	Grupo Komunitario		TT	MENISTERIO DA EDUCASAUN	Plan																												ON GOING		
						Actual																														
16	New Construction Office, Were House and Landscaping Of Viqueque Distric	L.M. Caicasa Metin Unip,Lda	01/MSSI/DGAF/DNA/I/2022	LM	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN	Plan																												ON GOING		
						Actual																														
17	Konstrusaun Foun Escola Secundaria Geral 4 de Setembro Viqueque	Guidae Unip.Lda	NCB/020-R/MEJD/DNA/2021	TP	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												ON GOING		
						Actual																														
MULTI POSTO ADMINIS- TRATIVO	1	Upgrading and Maintenance of Baucau - Viqueque Highway Project Lot 2: Venilale - Viqueque : Sta. 27 + 120 to Sta. 62 + 010	China Railway Int. Group Co. jv with China Oversees	ICB/046/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Eng.Imprestimo ADN.I.P, Maka toma konta.		
							Actual																													
TOTAL PROJETO ON-GOING																																				

Note:

Plano Periode inspesaun iha terenu

Implementa Planu Periode Inspesaun

Assunto Servisu iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Bebian C. de Jesus Lopes)
Eng. Municipiu Viqueque ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN, I.P.
