



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU AINARO
FEVEREIRO 2022




SUMÁRIO


RELATÓRIO


IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO AINARO

FEVEREIRO 2022


Prepara Husi :


(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Ainaro ADN, I.P


(Eng. Manuel Bary da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigação, Município Ainaro ADN, I.P


(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Município Ainaro ADN, I.P

Verifica Husi :


(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P


(Eng. Joao Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e
Irigação, ADN, I.P


(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifica Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal	3
1.2 Perfil Municipio Ainaro	3
1.3. Lista Projectos	6
II. PROGRESU FISIKU	14
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	14
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	14
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	14
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	15
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu.....	15

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamentos	6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores.....	8
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio	11
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro	13

I. INTRODUSAUN

1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu aseguza katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeńu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável. Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno caso presiza.

1.2 Perfil Municipio Ainaro



Administrasaun Munisipal Ainaro lokalizadu iha sudoeste paíz no mapa 2. hatudu pozisaun jeográfiku Munisipiu Ainaro ne'ebé ho luan 797 km² ho populasaun nain 59,175 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Ainaro iha Postu Administraativo ha'at, Sukus 21 no Aldeias 131 hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1: Ponto Administrativo, Sukus no Total Aldeias/Sukus

Ainaro		Hatu Bullico		Hatu Udo		Maubisse	
Sukus	Aldeias	suku	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Ainaro	7	Mauchiga	7	Foho-Ailico (beikala)	6	Aituto	9
Cassa	5	Mulo	8	Leolima	10	Edi	6
Manutaci	4	Nuno Moge	6	-	-	Fatubessi	6
Mau-Nuno	3	-	-	-	-	Horai-Quic	4
Mau-Ulo	5	-	-	-	-	Liurai	4
Soro	4	-	-	-	2	Manelobas	4
Suro-Craic	4	-	-	-	4	Manetu	7
-	-	-	-	-	-	Maubisse	12
-	-	-	-	-	-	Maulau	10
Total	32	-	21	-	22	-	62

Data husi : Livro 3B OJE 2021, Pajina 22

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		2				2	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
	Grand Total		3				3	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro

ASET ADN,IP MUNICIPIO AINARO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1				1	Moru hadia, monta tralis
2	Kareta		1				1	Kondisaun ladun diák
3	Desktop HP / Monitor		1				1	Diak
4	Laptop HP		1				1	Todan presija update
5	Printer Cannon		1				1	Diak
6	UPS		1				1	Aat
7	Armario File		2				2	Diak
8	Armario Tau hena		2				2	Aat 1
9	Meja escritorio		1				1	Diak
10	Meja han		1				1	Aat
11	Meja TV (kiik)		1				1	Diak
12	Kadeira escritorio		6				6	Diak
13	Kadeira han		4				4	Att 2
14	Sofa		1 Set				1	Diak
15	Springbed +sumasu 4		2 Set				2	Diak (sumasu laiha)
16	Jeleira		1				1	Diak
17	Water Dispenser		1				1	Aat
18	TV + Parabola		1 Set				1	Aat
19	Kipas Angin		5				5	Aat
20	Kompor		1				1	Diak
21	Kompor Gas		1				1	Aat
22	Rack sepatu		3				3	Aat
23	Rack Piring		1				1	Diak
24	Water Pump Sanyo		1				1	Aat

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumulá iha lista neé bazeia ba dadus projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamiento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamiento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + PDIM + LM - BS + LM - TP + Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	21	\$ 25,278,625.23	67.13%
2	Hatubuilico	9	\$ 60,952,672.06	97.95%
3	Hatudo	5	\$ 968,723.17	28.72%
4	Maubisse	18	\$ 6,438,627.77	70.68%
Grand Total		53	\$ 93,638,648.23	87.04%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	11	\$ 23,879,713.14	68.48%
2	Hatubuilico	4	\$ 60,431,375.42	98.24%
3	Hatudo	1	\$ 287,894.03	13.75%
4	Maubisse	9	\$ 5,130,827.23	69.94%
Grand Total		25	\$ 89,729,809.82	88.43%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainara-Vila	4	\$ 829,493.79	35.07%
2	Hatubuilico	5	\$ 521,296.64	64.52%
3	Hatudo	2	\$ 417,110.14	6.97%
4	Maubisse	4	\$ 392,577.51	61.22%
Grand Total		15	\$ 2,160,478.08	41.50%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainara-Vila	5	\$ 473,161.58	50.73%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	3	\$ 473,096.63	89.94%
Grand Total		8	\$ 946,258.21	70.33%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainara-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo	2	\$ 263,719.00	79.45%
4	Maubisse	1	\$ 302,126.40	73.56%
Grand Total		3	\$ 565,845.40	76.30%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainara-Vila	1	\$ 96,256.72	89.59%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse			
Grand Total		1	\$ 96,256.72	89.59%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 140,000.00	53.14%
	Grand Total	1	\$ 140,000.00	53.14%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO AINARO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	4	\$ 324,145.07	67.68%
2	Edukasaun	2	\$ 420,919.49	76.54%
3	Eletrifikasaun Nasional	10	\$ 7,999,431.74	68.39%
4	Estradas	10	\$ 18,116,584.48	64.47%
5	Flood Control	1	\$ 98,821.63	97.48%
6	Imprestimo	3	\$ 59,201,316.40	98.89%
7	Irigasaun	1	\$ 32,319.72	90.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	17	\$ 3,237,083.74	55.72%
9	Pontes	2	\$ 3,869,397.22	81.39%
10	Saude	2	\$ 242,372.02	42.09%
11	Turismo	1	\$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	53	\$ 93,638,648.23	87.04%

NO	SECTOR PROYECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	2	\$ 22,700.00	30.53%
2	Edukasaun	1	\$ 208,089.56	63.00%
3	Eletrifikasaun Nasional	3	\$ 2,130,985.59	72.44%
4	Estradas	7	\$ 17,893,140.72	64.93%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 815,683.40	40.90%
9	Pontes	2	\$ 3,869,397.22	81.39%
10	Saude	2	\$ 242,372.02	42.09%
11	Turismo	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		21	\$ 25,278,625.23	67.13%

NO	SECTOR PROYECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun			
3	Eletrifikasaun Nasional	1	\$ 1,230,059.02	66.92%
4	Estradas	1	\$ 76,554.69	0.00%
5	Flood Control			
6	Imprestimo	3	\$ 59,201,316.40	98.89%
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	4	\$ 444,741.95	75.62%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		9	\$ 60,952,672.06	97.95%

NO	SECTOR PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun			
3	Eletrifikasaun Nasional	1	\$ 384,790.42	0.00%
4	Estradas			
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun	1	\$ 32,319.72	90.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 551,613.03	45.16%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		5	\$ 968,723.17	28.72%

NO	SECTOR PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	2	\$ 301,445.07	70.48%
2	Edukasaun	1	\$ 212,829.93	89.79%
3	Eletrifikasaun Nasional	5	\$ 4,253,596.71	72.98%
4	Estradas	2	\$ 146,889.07	42.44%
5	Flood Control	1	\$ 98,821.63	97.48%
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	7	\$ 1,425,045.36	62.07%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		18	\$ 6,438,627.77	70.68%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat	3	\$ 275,266.70	85.15%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 32,319.72	90.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	40	\$ 91,909,713.75	87.47%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	3	\$ 445,365.49	77.28%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	3	\$ 382,372.02	46.13%
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
8	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		53	\$ 93,638,648.23	87.04%

NO	DONO DO PROJECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat	1	\$ 15,000.00	0.00%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	14	\$ 24,219,553.10	67.77%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	1	\$ 208,089.56	63.00%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	2	\$ 242,372.02	42.09%
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
8	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		21	\$ 25,278,625.23	67.13%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	9	\$ 60,952,672.06	97.95%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu			
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope			
Grand Total		9	\$ 60,952,672.06	97.95%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 32,319.72	90.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	3	\$ 911,957.45	24.90%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	1	\$ 24,446.00	90.00%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope			
Grand Total		5	\$ 968,723.17	28.72%

NO	DONO DO PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	2	\$ 260,266.70	90.06%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	14	\$ 5,825,531.14	69.54%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	1	\$ 212,829.93	89.79%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude	1	\$ 140,000.00	53.14%
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope			
Grand Total		18	\$ 6,438,627.77	70.68%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Produktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Ainaro	16,823	7170	6636	5567	5058
Hato-Udo	10,747	3130	2923	2415	2279
Hato-Builico	13,249	3457	3365	3241	3186
Maubisse	24,672	6378	6309	6222	5764

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu neébe hetan husi progresu fulan ida neé, ikus liu porsentagen actual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detallu bele hareé iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografía #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hareé #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Obstaclo neébe ami enjineiru hasoru iha terenu mak hanesan tuir mai ne'e :

1. Kompanhia nia tekniku laiha terenu
2. Kompanhia neébe ka'er obra iha Municipio Ainaro iha hotu Dili
3. Teknik husi Projetu nain ladun halo inspesaun ba iha terenu
4. Kondisaun kareta ne'ebe Suporta Ekipa ADN iha tereno ho kondisaun ne'ebe sei
aat

➤ Obstaclo parte Eletricidade

1. Durante Eng ADN, I.P halo monitorin directur kompahnia nunka iha fatin projeto e delega ema balun mak sempre hein iha fatin projeto.
2. Kompahnia balun mak to agora sedauk hadia konstruk Linha MV & LV nebe mak avaria.
3. Iha kompahnia seluk hein hela karta termo de entrega 10% husi EDTL – EP municipio ate agora sedauk fo ba kompahnia.
4. Seksaun M & E - ADN, I.P sempre hasoru mak kona ba motorist.
5. Seksaun M & E – ADN, I.P la bele kontrola masimu projeto electricidade ho edificio public tamba Eng M & E – ADN, I.P ida kontrola municipio ha'at (4).

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Buka solusaun ba projetu ne'ebe parado
2. Sistema Internet iha Municipio lalao ho diak ho difikulta enjineiru nia servisu
3. Kondisaun Rezidesia Oficial ADN Municipio Ainaro ne'ebe presija atu hadia:
 - Be'e
 - Moru
 - Tralis Jenela

➤ **Recomendação parte Eletricidade**

1. Seksaun M & E husu parte rekursu Humanu atu aumenta tan funsionario M & E.
2. Seksaun M & E – ADN, I.P husu ba ITC tenki kria folder sistem keta ida mai iha seksaun M & E – ADN, I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Ainaro

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engineiro	Manuel Bany da S. C. de Carvalho	115	Enjineiru ITI		
		Joaquim de C. Madeira	167	Enjineiru EPAS		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		
2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Lucas Alberto Soares Pereira	195	Motorista		



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL FEVEREIRO)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	78.52%	\$ 355,512.32	\$ 97,263.04	ON-GOING	Projeto nia la bele halo kontinuaun tamba espasu ba linha laiha ona
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	87.87%	\$ 334,820.71	\$ 46,223.20	ON-GOING	Projeto nia la bele halo kontinuaun tamba espasu ba linha laiha ona
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Calloko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	73.10%	65.79%	\$ 853,430.72	\$ 443,735.60	ON-GOING	
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	\$ 4,223,004.05	July 1, 2013	100.00%	99.71%	\$ 4,210,922.29	\$ 12,081.76	PHO	Projeto ramata ona ho nia fisiku 100%.
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	88.00%	\$ 110,219.55	\$ 15,029.94	PHO	Projeto 100% iha tinan 2016 maibe to agora companhia sedauk husu pagamento retensaun 10%
6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	69.02%	62.12%	\$ 2,687,116.69	\$ 1,638,659.81	ON-GOING	
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3,717,215.92	July 1, 2013	86.60%	71.00%	\$ 2,639,364.12	\$ 1,077,851.80	PHO	
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	41.51%	34.96%	\$ 1,740,596.03	\$ 3,237,754.96	ON-GOING	
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	\$ 3,596,249.07	July 1, 2013	86.49%	86.60%	\$ 3,114,422.07	\$ 481,827.00	PHO	
10	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	87.28%	76.81%	\$ 140,453.21	\$ 42,411.48	ON-GOING	
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489,653.83	April 10, 2019	52.62%	46.82%	\$ 229,243.50	\$ 260,410.33	ON-GOING	
12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	82.18%	\$ 26,956.99	\$ 5,844.88	ON-GOING	
13	Rehabilitasaun Edificio Administrasaun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	\$ 15,000.00	Sept. 19, 2016	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 15,000.00	ON-GOING	Projeto refere remata ona iha 2021 husu atu hare fila fali dadus pagamento (Retensaun)
14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/II/2018	\$ 7,700.00	Feb. 12, 2018	100.00%	90.00%	\$ 6,930.00	\$ 770.00	PHO	Projeto refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedauk hatama pagamento
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208,089.56	July 29, 2019	70.00%	63.00%	\$ 131,088.50	\$ 0.70	ON-GOING	Projeto refere sei parado
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	86.20%	77.58%	\$ 22,808.96	\$ 6,592.18	ON-GOING	Projeto refere 100% ona tuir volume nebe iha tereno
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	89.59%	\$ 86,232.55	\$ 10,024.17	PHO	Projeto ferere ramata ona, husu atu hare fila fali dadus pagamento nebe iha.



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL FEVEREIRO)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
18	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Sta 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33,889.94	June 18, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 33,889.94	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	\$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	12.71%	\$ 34,707.48	\$ 238,440.67	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2016
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/II/2015	\$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	37.19%	\$ 79,200.00	\$ 133,770.88	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2015
21	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600,016.84	July 25, 2016	30.78%	27.70%	\$ 166,229.49	\$ 433,787.35	PENDENTE	Projeto refere parado 2017
22	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no contrato	\$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	90.00%	\$ 22,001.40	\$ 2,444.60	PHO	Projeto refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedauk hatama pagamento
23	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	\$ 239,273.00	Sept. 25, 2019	85.98%	78.37%	\$ 187,524.67	\$ 51,748.33	ON-GOING	
24	New Construction of Electrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384,790.42	Jul,26,2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 384,790.42	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
25	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	13.75%	\$ 39,581.06	\$ 248,312.97	PENDENTE	Projeto refere parado 2019
26	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere-Ainaro	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	Ainaro	Berdato Unip Lda		\$ 32,319.72	23.8, 2021	100.00%	90.00%	\$ 29,087.75	\$ -	PHO	
27	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	88.78%	86.20%	\$ 139,264.98	\$ 22,289.21	ON-GOING	
28	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	79.19%	\$ 21,935.23	\$ 5,765.84	ON-GOING	Projeto refere ramata ona husu atu hare fila fali dadus pagamento
29	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	83.58%	76.02%	\$ 148,346.12	\$ 46,804.58	ON-GOING	
30	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Aillesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	88.32%	44.39%	\$ 26,783.75	\$ 33,552.24	ON-GOING	
31	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Sta 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Sta 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76,554.69	June 18, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 76,554.69	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
32	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 28,138,737.00	Nov. 20, 2014	99.12%	99.22%	\$ 27,919,968.96	\$ 218,768.04	PHO	
33	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 26,875,070.79	Nov. 20, 2014	100.00%	99.57%	\$ 26,759,254.96	\$ 115,815.83	PHO	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL FEVEREIRO)


NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
34	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubulico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	92.29%	\$ 3,864,572.08	\$ 322,936.53	ON-GOING	
35	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubulico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	69.40%	66.92%	\$ 823,176.06	\$ 406,882.96	ON-GOING	
36	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Bermuana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	75.36%	60.75%	\$ 143,498.67	\$ 92,726.23	ON-GOING	
37	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	61.52%	49.43%	\$ 100,497.36	\$ 102,801.14	ON-GOING	
38	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dintete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	83.32%	\$ 475,776.61	\$ 95,267.77	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no presija hadia fali nia konstrusaun
39	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	67.52%	60.35%	\$ 396,577.37	\$ 260,520.43	ON-GOING	
40	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurfala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	90.00%	\$ 896,415.58	\$ 99,601.73	PHO	Hein 10 % retensaun EDTL Munisipiu maka seidak entrega
41	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	43.84%	\$ 452,656.17	\$ 579,755.90	ON-GOING	
42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	88.54%	\$ 882,792.12	\$ 114,233.03	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no sei hein kompanha atu submete dokumentus
43	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	\$ 195,378.22	Aug. 16, 2019	98.33%	87.71%	\$ 171,357.85	\$ 24,020.37	ON-GOING	
44	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	87.04%	\$ 73,728.12	\$ 10,978.14	ON-GOING	Projetu refere ramata ona iha 2019 husu atu hare fila fali dadus pagamento
45	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urlepha Star 0+000 - 3+000 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Delong Unip. Lda	MPW-190087	\$ 302,126.40	Aug. 16, 2019	100.00%	73.56%	\$ 222,238.48	\$ 79,887.92	ON-GOING	
46	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 98,821.63	July 29, 2019	100.00%	97.48%	\$ 96,332.33	\$ 2,489.30	ON-GOING	Projetu refere companhia sei hatama pagamento adicional
47	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 212,829.93	July 29, 2019	97.88%	89.79%	\$ 191,103.88	\$ 21,726.05	PHO	
48	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 161,445.07	Aug. 16, 2019	100.00%	85.52%	\$ 138,069.82	\$ 23,375.25	ON-GOING	
49	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	\$ 112,517.92	June 18, 2021	63.13%	55.41%	\$ 62,340.76	\$ 50,177.16	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL FEVEREIRO)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
50	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34,371.15	June 18, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 34,371.15	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
51	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	53.62%	47.18%	\$ 166,561.25	\$ 186,439.61	PENDENTE	
52	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobulico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	13.17%	\$ 6,624.47	\$ 43,685.75	ON-GOING	Projetu refere sei parado iha tinan 2019
53	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	EI Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	\$ 140,000.00	29-Apr-21	63.07%	53.14%	\$ 74,391.78	\$ 65,608.22	ON-GOING	
TOTAL									\$ 93,638,648.23			87.04%	\$ 81,502,714.82	\$ 12,055,701.08		


(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Prepara Husi :

(Eng. Manuel Bary da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.


(Silvino D. R. R. Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Feb-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	0.00%	87.24%
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	0.00%	97.63%
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	73.10%	0.00%	73.10%
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	\$ 4,223,004.05	July 1, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	69.02%	0.00%	69.02%
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3,717,215.92	July 1, 2013	86.60%	0.00%	86.60%
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	41.51%	0.00%	41.51%
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	\$ 3,596,249.07	July 1, 2013	86.49%	0.00%	86.49%
10	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	78.75%	8.53%	87.28%
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489,653.83	April 10, 2019	52.62%	0.00%	52.62%
12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	0.00%	93.39%
13	Rehabilitasaun Edificio Administrasaun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	\$ 15,000.00	Sept. 19, 2016	0.00%	0.00%	0.00%
14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/II/2018	\$ 7,700.00	Feb. 12, 2018	100.00%	0.00%	100.00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Feb-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208,089.56	July 29, 2019	50.29%	19.70%	70.00%
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	86.20%	0.00%	86.20%
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
18	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33,889.94	June 18, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	\$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	0.00%	64.84%
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	0.00%	41.32%
21	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600,016.84	July 25, 2016	30.78%	0.00%	30.78%
22	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	la menciona no contrato	\$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
23	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	\$ 239,273.00	Sept. 25, 2019	85.98%	0.00%	85.98%
24	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384,790.42	Jul1,26,2021	0.00%	0.00%	0.00%
25	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	0.00%	15.00%
26	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere-Ainaro	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	Ainaro	Berdato Unip Lda		\$ 32,319.72	23.8, 2021	100.00%	0.00%	100.00%
27	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	88.78%	0.00%	88.78%
28	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	0.00%	100.00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Feb-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
29	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	83.58%	0.00%	83.58%
30	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 260,335.99	Aug. 16, 2019	88.32%	0.00%	88.32%
31	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76,554.69	June 18, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
32	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrinding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 28,138,737.00	Nov. 20, 2014	99.12%	0.00%	99.12%
33	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrinding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 26,875,070.79	Nov. 20, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
34	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	0.00%	92.29%
35	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	69.40%	0.00%	69.40%
36	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Bermuana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	75.36%	0.00%	75.36%
37	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	61.52%	0.00%	61.52%
38	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	0.00%	93.00%
39	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	67.84%	0.00%	67.84%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Feb-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
40	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Dauriala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
41	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	0.00%	48.72%
42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	0.00%	98.38%
43	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	\$ 195,378.22	Aug. 16, 2019	98.33%	0.00%	98.33%
44	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
45	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Delong Unip. Lda	MPW-190087	\$ 302,126.40	Aug. 16, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
46	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 98,821.63	July 29, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
47	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 212,829.93	July 29, 2019	97.88%	0.00%	97.88%
48	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 161,445.07	Aug. 16, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
49	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	\$ 112,517.92	June 18, 2021	63.13%	0.00%	63.13%
50	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34,371.15	June 18, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
51	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	53.62%	0.00%	53.62%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Feb-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
52	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	0.00%	40.00%
53	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	\$ 140,000.00	29-Apr-21	63.07%	0.00%	63.07%

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Eng. Manuel Bany de S. C. de Carvalho)

Eng. ba Projektu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

(Silvino D R R Soares)

Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)

Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Joao Paulo Amaral)

Eng. Senior ba Projektu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P.

(Deolindo de F Marques)

Chefe Sek. Projektu M.E & ITC, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala
to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366

Data Inspesaun : 9/2/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro – Fatuk Maria

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,58.56.76, Latetude: 125,31.74.76

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Laiha Ona Espaso Hodi Kontinua Obra

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala
to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




9 Feb 2022 13:35:57
-8°58'54,678"S 125°31'6,384"E
Ainaro
Altitude:980.6m
Speed:0.0km/h
Eng. Silvino Soares M & E,ADN - I.P
Index number: 799


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

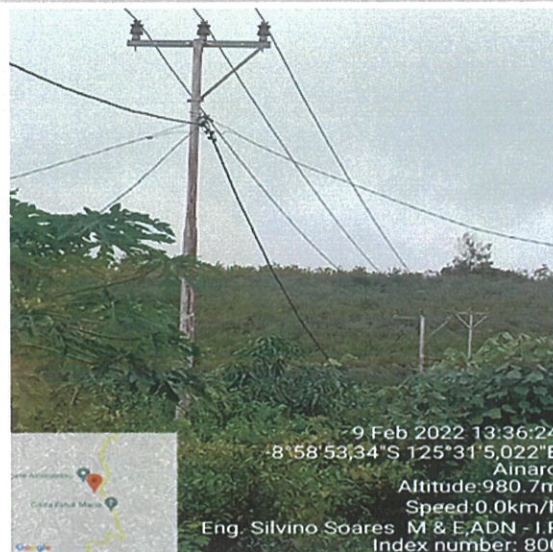

9 Feb 2022 13:36:24
-8°58'53,34"S 125°31'5,022"E
Ainaro
Altitude:980.7m
Speed:0.0km/h
Eng. Silvino Soares M & E,ADN - I.P
Index number: 800



#ANEXU C2 (ANV-1)

SUMMARY RESULTADO MONITORIN

ITEM	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRAC	AMOUNT PERVIOS	PERCENTAGE PERVIOS	AMOUNT ACTUAL	PERCENTAGE ACTUAL
A	PREPARATION WORK	\$ 20,222.12	\$ 20,222.12	4.47%	\$ -	0.00%
B	INSTALLATION MV LINE	\$ 166,830.66	\$ 137,862.66	30.45%	\$ -	0.00%
C	INSTALLATION OF TRANSFORMER 100 KVA	\$ 45,580.88	\$ 45,580.88	10.07%	\$ -	0.00%
D	EXTENTION LV LINE	\$ 172,641.69	\$ 165,318.02	36.51%	\$ -	0.00%
E	HOME CONECTION	\$ 47,500.00	\$ 26,030.00	5.75%	\$ -	0.00%
G	Grande Total	\$ 452,775.35	\$ 395,013.68	87.24275%	\$ -	0.00000%
H	Total Contract	\$ 452,775.36	-\$57,761.68	-12.757249%		0.00000%

Ekipa Inspeksaun:


Silvino D. R. R. Soares
Teknika M & E - ADN, I.P.

Verifika Husi :


(Deolindo de F. Marques)
Chefe Sek. Projeitu M.E & ITC, ADN, I.P.

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.

#ANEXU D (ANV-1)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
					Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality						
					Kompanha : Laxana Unip. Lda						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				Asinatura	
I	9/2/2022	AINARO / AINARO VILA	SILVINO D. R. R. SOARES	TEKNIKO M & E, ADN - I.P	1	Pinta Airing Nebe Mak Tinta Sai Hotu Tena					
					2	Tesi Ai Nebe Mak Besik Ba Linha MV & LV					
					3	Halos Airing 9m Nebe Mak Halis					
					4	Stika Schoor Nebe Mak Mamar e Troka Schoor Nebe Mak Kotu					
					5	Muda Tiang 9M ida besik skola (kona uma skola)					
II					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
III					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
IV					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
V					1						
					2						
					3						
					4						
					5						



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



EADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro
Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417

Data Inspesaun : 9/2/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila – Mau Ulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,58.56.76, Latetude: 125,31.74.76

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Laiha Ona Espaso Hodi Kontinua Obra

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-2)


Back-up Data

Naran Projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro
Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

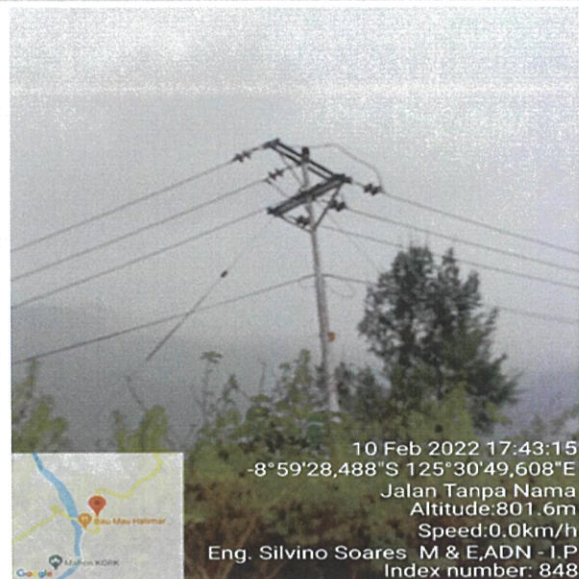

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu





#ANEXU C2 (ANV-2)

SUMMARY RESULTADO MONITORIN

ITEM	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRAC	AMOUNT PERVIOUS	PERCENTAGE PERVIOUS	AMOUNT ACTUAL	PERCENTAGE ACTUAL
A	PREPARATION WORK	\$ 18,591.67	\$ 18,591.67	4.88%	\$ -	0.00%
B	INSTALLATION MV LINE	\$ 148,197.17	\$ 128,579.72	33.74%	\$ -	0.00%
C	INSTALLATION OF TRANSFORMER 160 KVA	\$ 48,722.88	\$ 48,722.88	12.79%	\$ -	0.00%
D	EXTENTION LV LINE	\$ 135,378.43	\$ 148,826.74	39.06%	\$ -	0.00%
E	HOME CONECTION	\$ 37,400.00	\$ 27,302.00	7.17%	\$ -	0.00%
G	Grande Total	\$ 388,290.15	\$ 372,023.01	97.63258%	\$ -	0.00000%
H	Total Contract	\$ 381,043.91	-\$9,020.90	-2.36742%		0.00000%

Ekipa Inspeksaun:


Silvino D. R. R Soares
Teknika M & E - ADN, I.P

Verifika Husi :


(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

#ANEXU D (ANV-2)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Mau - Ulo1, Mau - Ulo2 - Ainaro Municipality											
Kompanha : Mantilo Unip. Lda											
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				Asinatura	
I	9/2/2022	AINARO / AINARO VILA	SILVINO D. R. R. SOARES	TEKNIKO M & E, ADN - I.P	1	Pinta Airing Nebe Mak Tinta Sai Hotu Tena					
					2	Tesi Ai Nebe Mak Besik Ba Linha MV & LV					
					3	Halos Airing 9m Nebe Mak Halis					
					4	Stika Schoor Nebe Mak Mamar e Troka Schoor Nebe Mak Kotu					
					5	Muda Tiang 9M ida besik skola (kona uma skola)					
II					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
III					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
IV					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
V					1						
					2						
					3						
					4						
					5						



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-3)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to
Cailoko and Hatubuilico - Ainaro Municipality
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415

Data Inspesaun : 9/2/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro - Hatubuilico

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,58.56.76, Latetude: 125,31.74.76

End Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Laiha Ona Espaso Hodi Kontinua Obra

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

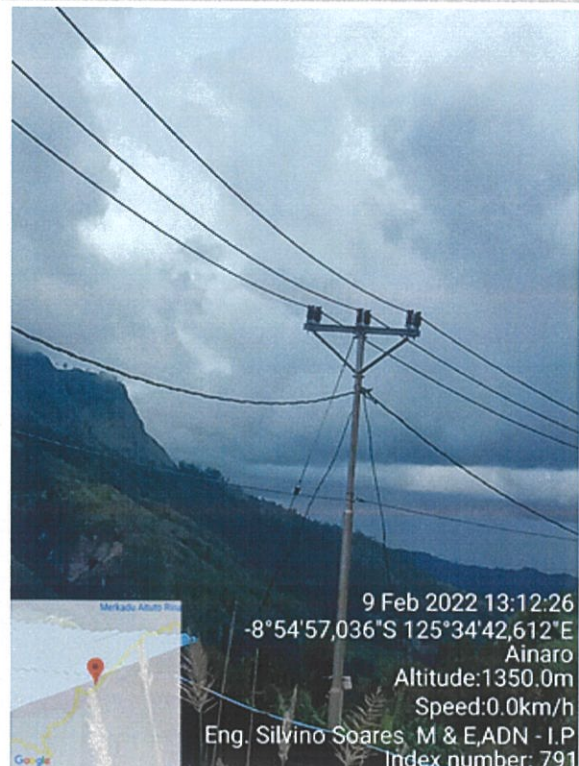



#ANEXU C1 (ANV-3)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to
Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual






#ANEXU C2 (ANV-3)

SUMMARY RESULTADO MONITORIN

ITEM	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRAC	AMOUNT PERVIOUS	PERCENTAGE PERVIOUS	AMOUNT ACTUAL	PERCENTAGE ACTUAL
A	PREPARATION WORK	\$ 59,317.79	\$ 59,317.79	4.57%	0.00%	0.00%
B	INSTALLATION MV LINE	\$ 731,071.78	\$ 681,653.01	52.55%	0.02%	0.00%
C	INSTALLATION OF TRANSFORMER 100 KVA	\$ 93,344.24	\$ 52,900.96	4.08%	3.11%	0.00%
D	EXTENTION LV LINE	\$ 261,432.50	\$ 154,384.59	11.90%	5.32%	0.00%
E	HOME CONECTION	\$ 152,000.00	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%
G	Grande Total	\$ 1,297,166.32	\$ 948,256.35	73.10214%	\$ 0.08	0.00001%
H	Total Contract	\$ 1,297,166.32	-\$348,909.97	-26.89786%	\$ -	0.00000%

Ekipa Inspeksaun:


Silvino D. R. R Soares
Teknika M & E - ADN, I.P

Verifika Husi :


(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

#ANEXU D (ANV-3)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
					Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatubuilico - Ainaro Municipality						
					Kompanha : Terolau Unip. Lda						
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				Asinatura	
I	9/2/2022	AINARO / AINARO VILA	SILVINO D. R. R. SOARES	TEKNIKO M & E, ADN - I.P	1	Pinta Airing Nebe Mak Tinta Sai Hotu Tena					
					2	Tesi Ai Nebe Mak Besik Ba Linha MV & LV					
					3	Halos Airing 9m Nebe Mak Halis					
					4	Stika Schoor Nebe Mak Mamar e Troka Schoor Nebe Mak Kotu					
					5	Muda Tiang 9M ida besik skola (kona uma skola)					
II					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
III					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
IV					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
V					1						
					2						
					3						
					4						
					5						



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai
Municipality Ainaro
No. kontratu : RDTL

Data Inspesaun : 09/02/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'15,612''S Latetude: 125°30'39,876''E


End Point : Long : - 9°3'51,231''S Latetude: 125°30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere atizi ona 100% iha tinan
2020

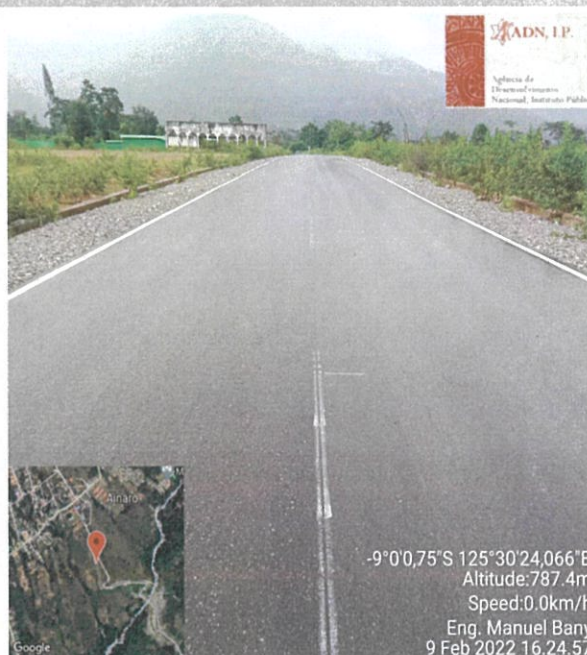

Kondisaun Estrada Sarai – Ainaro Vila



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai
Municipality Ainaro
No. kontratu : RDTL

Projetu Refere atizi ona 100% iha tinan
2020



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu Refere atizi ona 100% iha tinan
2020





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.
No. kontratu : SSS/142/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 09/02/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'15,612''S Latetude: 125°30'39,876''E

End Point : Long : - 9°3'51,231''S Latetude: 125°30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Compahia halao hela servisu iha tereno



Asphalt Concrete Binder Course (ACBC) 60mm
thick

Asphalt Concrete Wearing Course (ACWC)
40mm thick



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.
: SSS/142/MOPTC-2017


Compahia halao hela servisu iha tereno



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Compahia halao hela servisu iha tereno

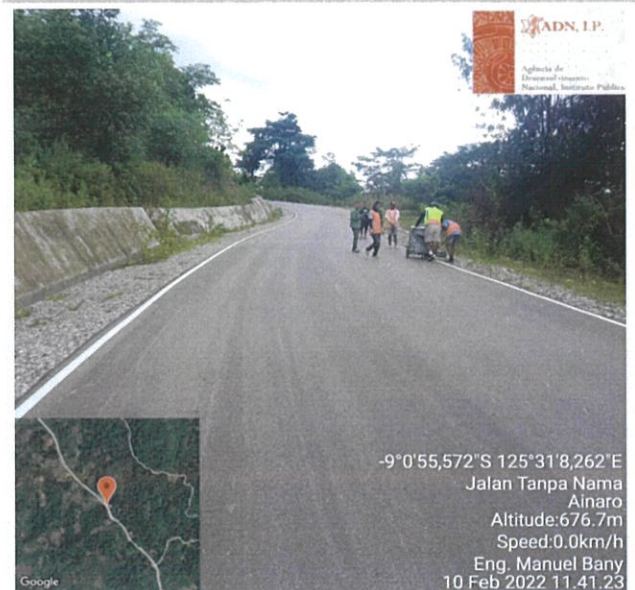



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai
Package II Municipality Ainaro
No. kontratu : SSS/141/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 09/02/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'15,612''S Latetude: 125°30'39,876''E

End Point : Long : - 9°3'51,231''S Latetude: 125°30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Kondisaun Estrada Sarai to Ainaro Villa nebe
tama ona iha fase Retensaun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Kondisaun Estrada Ainaro Vila to Sarai




ANEXU C1 (ANV-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai
Package II Municipality Ainaro
No. kontratu : SSS/141/MOPTC-2017

Kondisaun Estrada Sarai to Ainaro Villa nebe
tama ona iha fase Retensaun

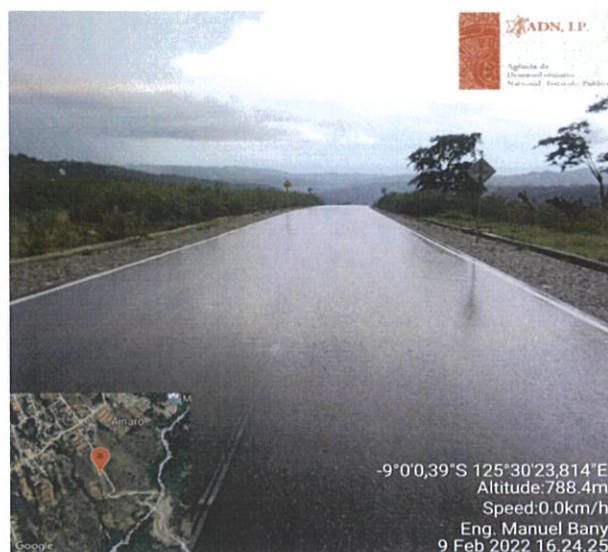

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Kondisaun Estrada Sarai to Ainaro Villa nebe
tama ona iha fase Retensaun.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-9)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III,
Ainaro Municipality

No. kontratu : SSS/005/MOPTC-2013

Data Inspesaun : 09/02/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'15,612''S Latetude: 125°30'39,876''E


End Point : Long : - 9°3'51,231''S Latetude: 125°30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

**Laiha aktifidades servisu iha tereno sei hein
hela konvirmasaun husi owner ba item
servisu iha tereno**

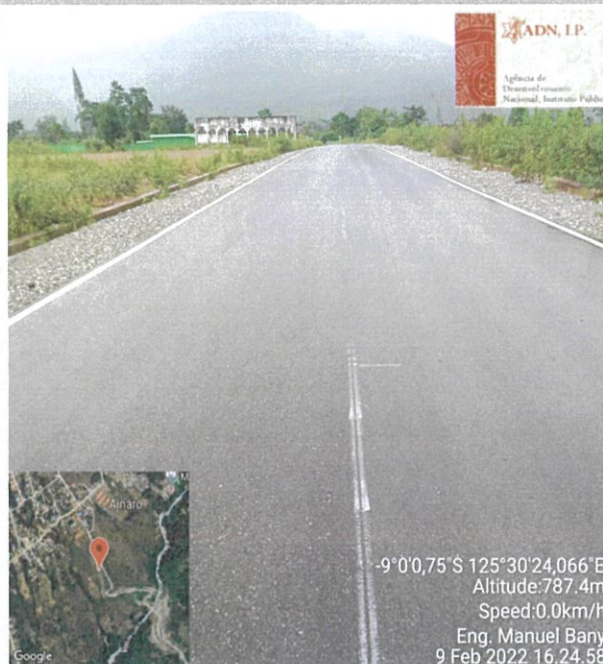



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-9)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III,
Ainaro Municipality

No. kontratu : SSS/005/MOPTC-2013

Laiha aktividade servisu iha tereno



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Laiha aktividade servisu iha tereno





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro
No. kontratu : SSS/295/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 09-02-2022

Fatin Inspesaun : Faulata Casa, Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long : -9227,834S, Latetude: 125,3035868E

End Point : Long : -953588S Latetude: 125.3147646E

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Tanki nebe fo bee ba torneira publika
atu fahe bee ba comunidade sira iha
faulata. (Projeto abandona iha 2019
ate agora).

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch & Foto Desenho





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro
No. kontratu : SSS/295/MOPTC-2016

Tangki fo bee ba torneira publica agora
dau daun diak hela maibe torneira balu
maka ladiak.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa,
Ainaro
No. kontratu : SSS/295/MOPTC-2016

Torneira public nebe comunidade sira
uza ba kuru bee mos no fase ropa agora
daudaun bee mai ho diak, kada bes la
mai tamba comunidade sira uza bee nee
ho nia horario kada loron, e kanu balu
mos kuak kada bes bee la mai.





ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)
No. kontratu : 389/KDM-AINARO/VII/2019

Data Inspesaun : 17-02-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8°59'47.2"S, Latetude: 125°30'26.8"E.

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Projeto
ida nee fisiko to ona iha
servisu kakuluk nian.
(Projeto ida nee parado
iha 2020 ate agora 2021).
Laiha informasaun ate
agora.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)
: 389/KDM-AINARO/VII/2019


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Pinta didin lolon ho
plamir para
preparasaun ba pinta
aiben.

Servisu Iha parte laran
mos kuaze plafon ho
keramik mos hotu ona.
(Projeito ida nee parado)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

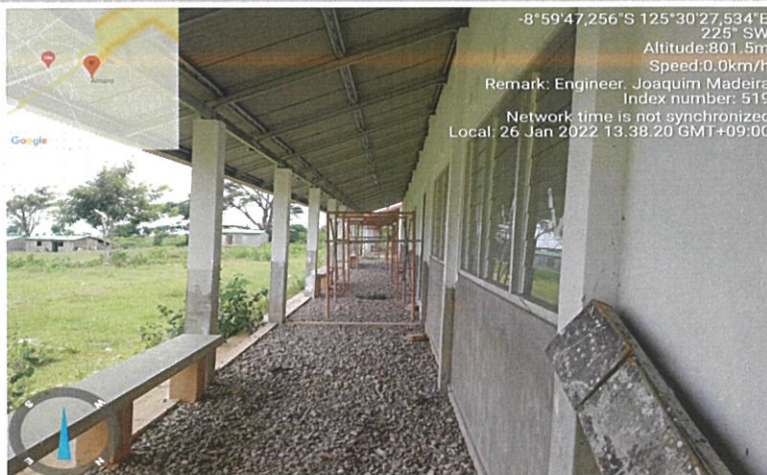

ANEXU C1 (ANV-15)


Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
No. kontratu : **389/KDM-AINARO/VII/2019**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu bee nian mos hotu
ona nia istalasaun mos tuir
desenho nebe mak iha
terreno.

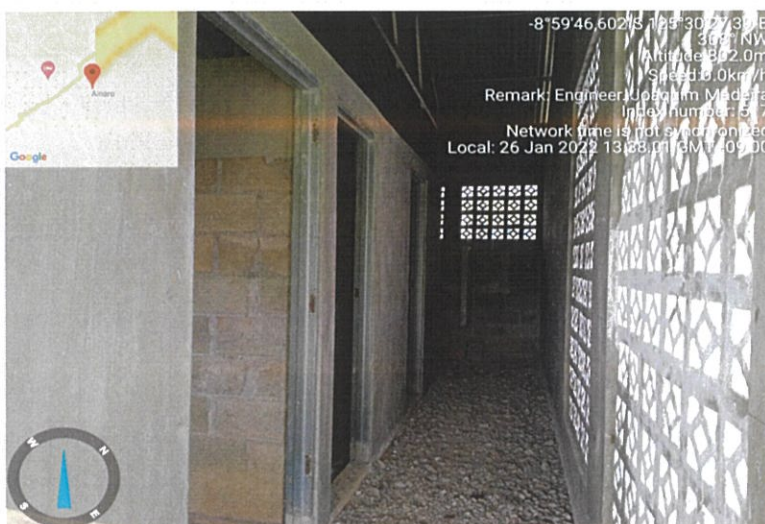

Servisu atero veranda mos
hotu ona hein deit fui
betaun. (Projeto ida nee
parado)





ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro
No. kontratu : 434/KDM-AINARO/IX/2019

Data Inspesaun : 17-02-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.9941S, Latetude: 125.5010E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidausk
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor. (Parado ate agora)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro
: 434/KDM-AINARO/IX/2019

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidauk
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro
: 434/KDM-AINARO/IX/2019

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidauk
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.

Observasaun iha tereno no Foto





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



KADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro
No. kontratu : 434/KDM-AINARO/IX/2019

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final
ona maibe nia osan resto seidauk
selu hotu ho rajaun sira projeito
nain atu altera fali ba halo Baleta
no garagem para kareta ho
motor.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-21)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi
No. kontratu : 02/GAB.AM.AIN/VII/2015

Data Inspesaun : 17-02-2022

Fatin Inspesaun : Manutasi/ AINARO

Koordinadas :

Start Point : Long : -85852344S Latetude: 125.312712E

End Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Projeito nee nia servisu to ona
iha kakuluk maibe ate agora
kompanhia la halo aktividade
servisu konstrusaun hanesan bai
bain.(ABANDONA ATE
AGORA LAIHA
INFORMASAUN IDA)

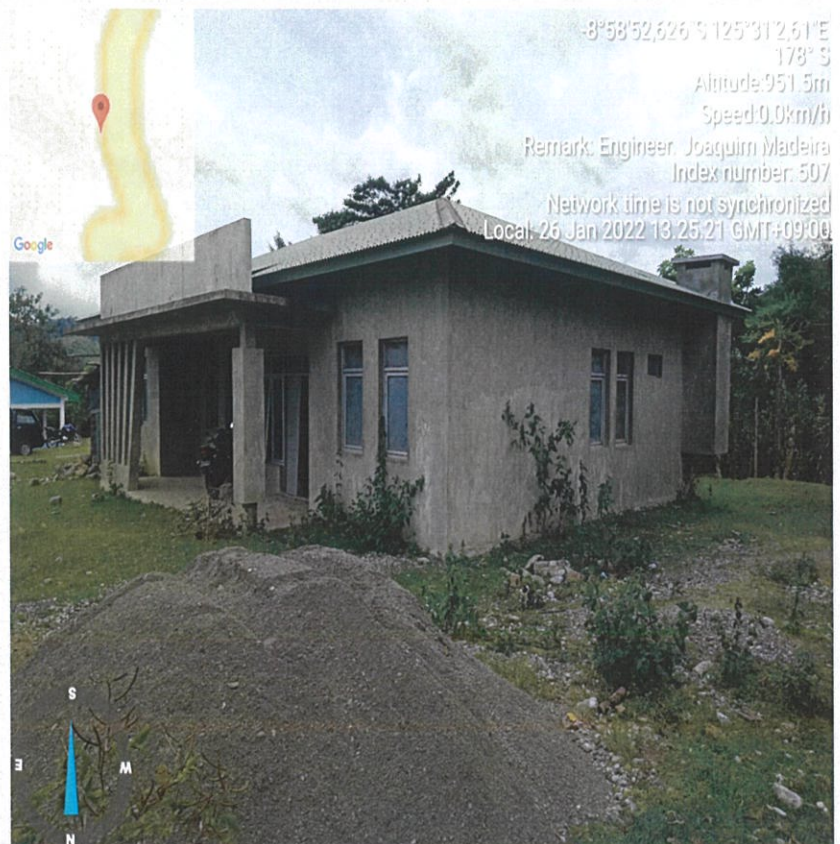



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-21)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi
: 02/GAB.AM.AIN/VII/2015

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito nee nia servisu to ona
iha kakuluk maibe ate agora
kompanhia la halo aktividade
servisu konstrusaun hanesan bai
bain.(PARADO ATE AGORA)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 (ANV-21)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi
: 02/GAB.AM.AIN/VII/2015


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Konstrusaun Uma dotor to ona
iha nia kuda kuda maibe ate
agora la halo aktividade.

Servisu laran nian reboka hotu
ona maibe la kontinuasaun.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

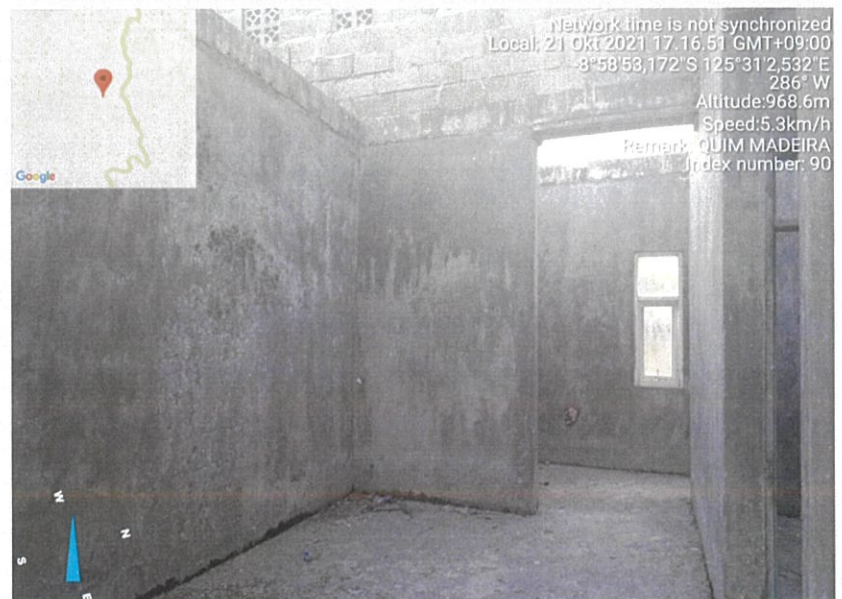



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ANV-21)

Back-up Data


Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi
: 02/GAB.AM.AIN/VII/2015

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu
Parte laran nian uma
dotor la halo aktividade
servisu

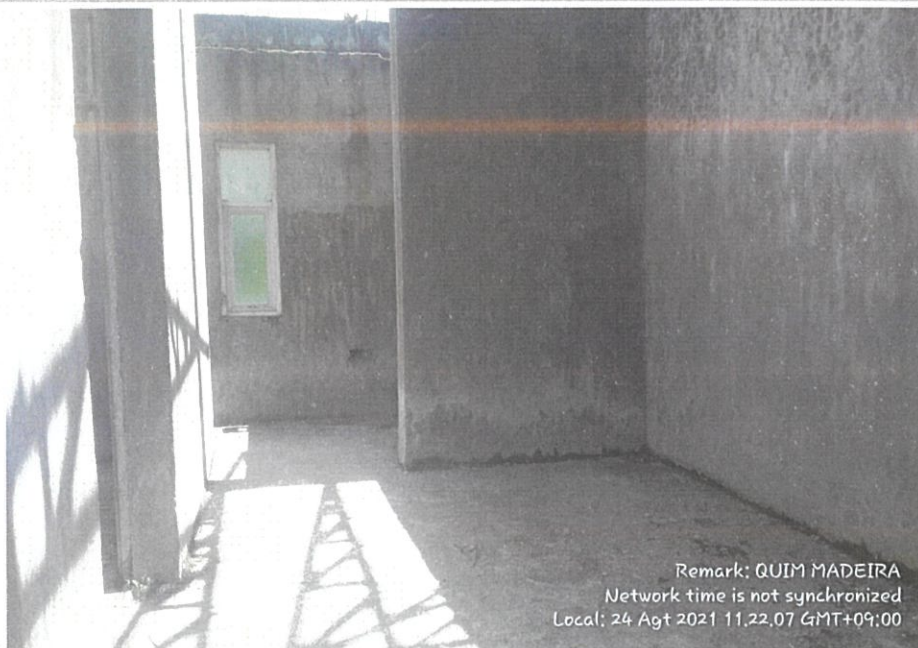

Remark: QUIM MADEIRA
Network time is not synchronized
Local: 24 Agt 2021 11:22:07 GMT+09:00



8°58'53,346"S 125°31'2,13"E
Altitude: 954.8m
Speed: 3.18m/h
Remark: Engineer: Joaquim Madeira
Index number: 510
Network time is not synchronized
Local: 26 Jan 2022 13:25:21 GMT+09:00



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HA-2)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality
Ainaro (162).
No. kontratu : MPW-190138

Data Inspesaun : 09/02/2022

Fatin Inspesaun : Casa – Hatu Udo

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°8'13,374''S, Latetude: 125°32'36,181''E


End Point : Long : - 9°6'3,84''S, Latetude: 125°40'54,588''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho

Projetu refere tama iha fase retensaun 10%

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

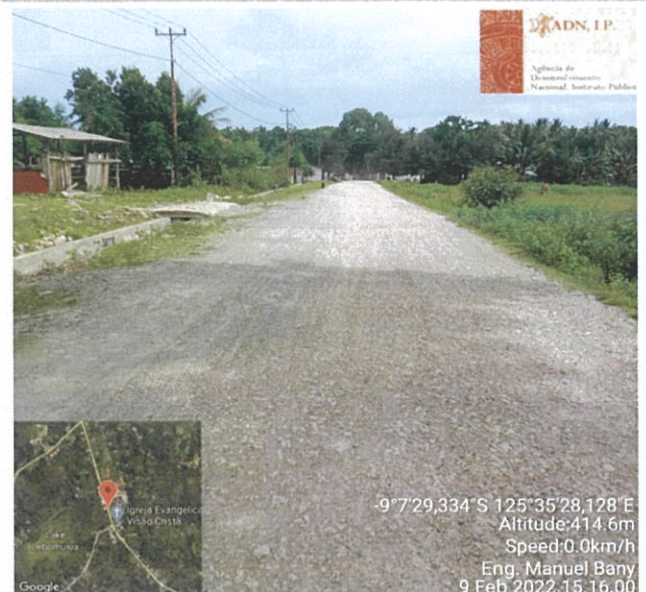



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HA-2)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality
Ainaro (162).
No. kontratu : MPW-190138

Projetu refere tama iha fase retensaun 10%



Projetu refere tama iha fase retensaun 10%





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HA-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02), Casa - Hatu -
udo (A13).
No. kontratu : Marino Enterprises, Lda

Data Inspesaun : 09/02/2022

Fatin Inspesaun : Casa – Hatu Udo

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°8'13,374''S, Latetude: 125°32'36,181''E

End Point : Long : - 9°6'3,84''S, Latetude: 125°40'54,588''E

Naran Inspector : 1. Eng. Manuel Bany da S.C de Carvalho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
Companhia sedauk halo servisu iha tereno



Kondisaun Estrada nebe Parado



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HA-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02), Casa - Hatu -
udo (A13).
No. kontratu : Marino Enterprises, Lda

Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
Companhia sedauk halo servisu iha tereno



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
Companhia sedauk halo servisu iha tereno





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Pousada Hatobuilico
No. kontratu : 073/GMTAC/x/2015

Data Inspesaun : 17-02-2021

Fatin Inspesaun : Hato builico

Koordinadas :

Start Point : Long : -854492S, Latetude: 1253113602E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere final ona iha
tinan 2015 maibe ate agora
seidauk halo pagamento
100% ate
agora.(ABANDONA IHA
2016 ATE AGORA)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-6)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Rehabilitasaun Pousada Hatobuilico
: 073/GMTAC/x/2015

Projeito refere final ona iha
tinan 2015 maibe ate agora
seidauk halo pagamento
100%.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-6)

Back-up Data

Naran Projeto
Nó. kontratu

: Rehabilitasaun Pousada Hatobuilico
: 073/GMTAC/x/2015

Projeito refere final ona iha
tinan 2015 maibe ate agora
seidauk halo pagamento
100%.

Projeito refere final ona iha
tinan 2015 maibe ate agora
seidauk halo pagamento
100%.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (HTB-9)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423

Data Inspesaun : 9/2/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro – Mausiga

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,55.51.01, Latetude: 125.36.21.45

End Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Laiha Aktividade Iha Tereno

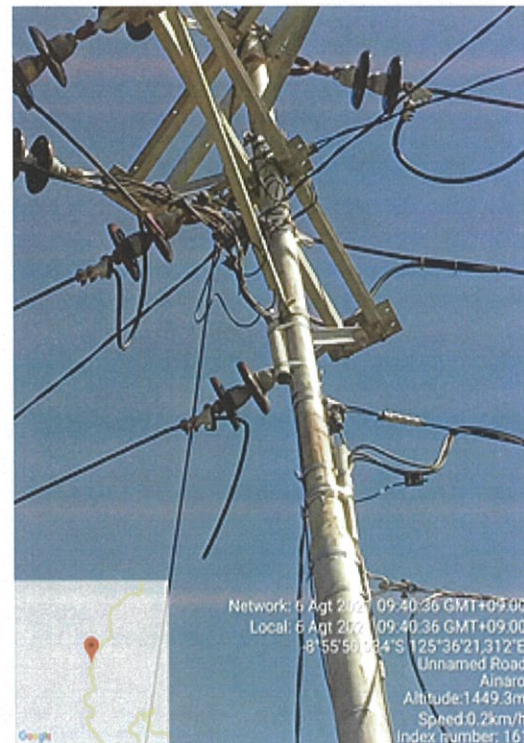



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (HTB-9)

Back-up Data



Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

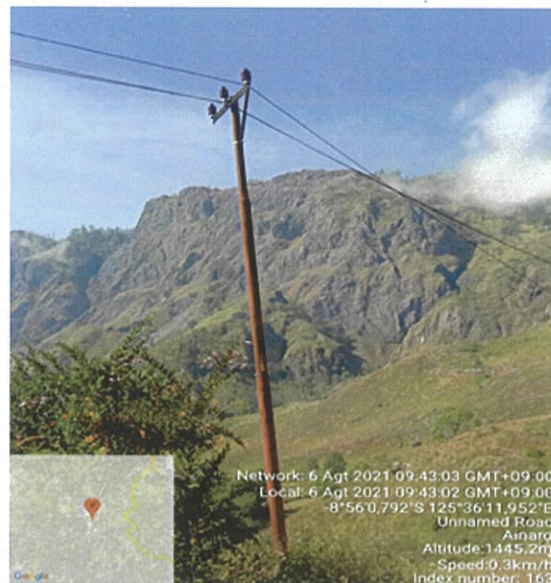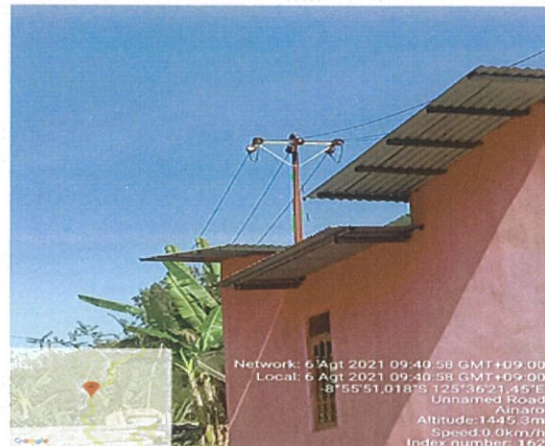



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (HTB-9)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (HTB-9)

Back-up Data



Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

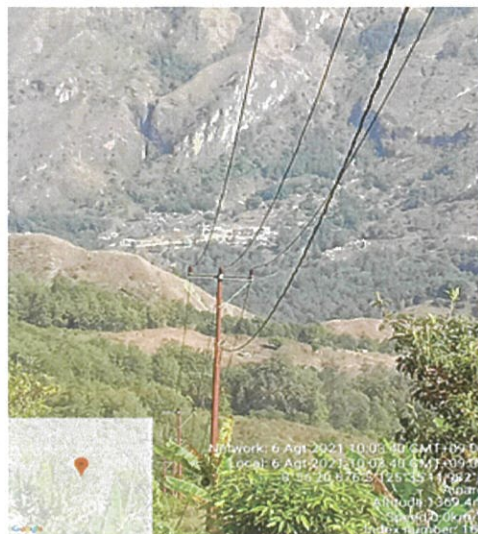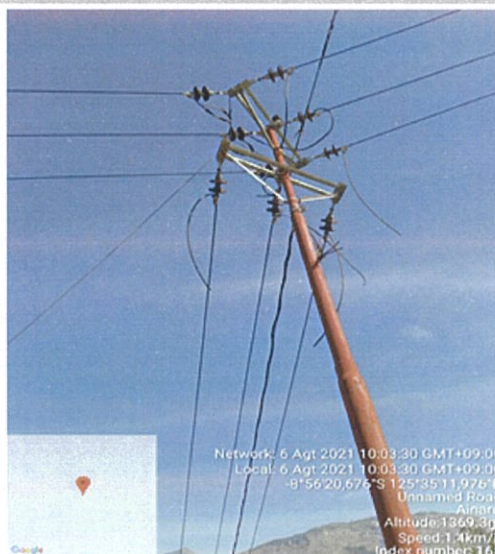



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (HTB-9)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (HTB-9)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (HTB-9)

SUMMARY RESULTADO MONITORIN

ITEM	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRAC	AMOUNT PREVIOUS	PERCENTAGPREVIO US	AMOUNT ACTUAL	PERCENTAGACTU AL
A	PREPARATION WORK	\$ 51,751.52	\$ 40,013.03	3.25%	\$ -	0.00%
B	INSTALLATION MV LINE	\$ 501,974.30	\$ 476,024.33	38.70%	\$ -	0.00%
C	INSTALLATION NEW TRANSFORMER	\$ 113,952.20	\$ 18,331.76	1.49%	\$ -	0.00%
D	EXTENTION LV LINE	\$ 393,280.99	\$ 319,240.15	25.95%	\$ -	0.00%
E	HOME CONECTION	\$ 169,100.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
F	Grande Total	\$ 1,230,059.01	\$ 853,609.27	69.40%	\$ -	0.00%
G	Total Contract	\$ 1,230,059.02	-\$376,449.75	-30.60%		

Ekipa Inspeksaun:


Silvino D. R. R. Soares
Teknika M & E - ADN, I.P

Verifika Husi :


(Deolindo de F. Marques)
Chefe Sek. Projeitu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P

#ANEXU D (HTB-9)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality

Kompanha : Se-Mauhin Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	9/2/2022	Ainaro / Hatubilico	Silvino D. R. R. Soares	Teknika M& E - ADN, I.P.	1	Sobu fondasi nebe cor tiha (Cor Ulang) tamba La uja besi Beton no iha rai leten deit	
					2	Monta Treckschoor & Druckshoor nebe ladauk monta	
					3	Tesi ai nebe satan linha no besik linha	
					4	Estika fiu nebe nia andongan makas	
					5	Troka pin isolator balun nebe mak nakfera	
II					1	Linha LV nia ending tenke monta hotu grounding, LV nebe mak nia distansia dok tenke hatun grounding	
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



EADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-4)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto
Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323

Data Inspesaun : 9/2/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro - Maubisse

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,52.18.55, Latetude: 125,35.20.41

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Espaso Laiha Ona Hodi Kontinua Obra





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-4)


Back-up Data

Naran Projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto
Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

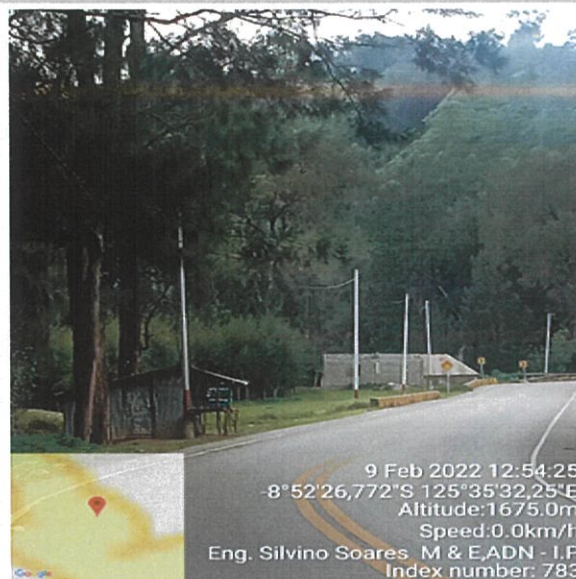



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-4)


Back-up Data

Naran Projeto

: New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto
Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality.

No. kontratu

: RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323

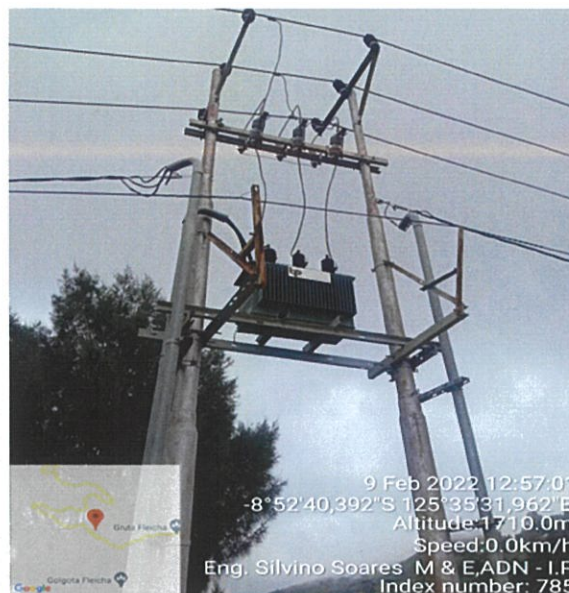



#ANEXU C2 (MBS-4)

SUMMARY RESULTADO MONITORIN

ITEM	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRAC	AMOUNT UP TO DATE	PERCENTAGE UP TO DATE
A	PREPARATION WORK	\$ 31,066.52	\$ 31,066.52	4.73%
B	INSTALLATION MV LINE	\$ 289,190.41	\$ 267,652.33	40.73%
C	INSTALLATION OF TRANSFORMER 50 KVA	\$ 46,621.88	\$ 46,621.88	7.10%
D	EXTENTION LV LINE	\$ 242,338.99	\$ 100,480.43	15.29%
E	HOME CONECTION	\$ 47,880.00	\$ -	0.00%
G	Grande Total	\$ 657,097.80	\$ 445,821.16	67.84700%
H	Total Contract	\$ 657,097.80	-\$211,276.64	-32.15300%

Ekipa/Inspeksaun:


Silvino D. R. R Soares
Teknika M & E - ADN, I.P

Verifika Husi :


(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P

#ANEXU D (MBS-4)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
Naran projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality											
Kompanha : Lotas Unip., Lda											
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				Asinatura	
I	9/2/2022	AINARO / MAUBISSE	SILVINO D. R. R. SOARES	TEKNIKO M & E ADN - I.P.	1	Tenki Halo Los Airing Antes Atu Cor e Tenki Uja Besi 6mm					
					2	Pinta Ulang Airing Nebe Mak Tinta Sai Hotu Ona					
					3	Tesi Ai Nebe Mak Besik Ba Linha MV & Linha LV					
					4						
					5						
II					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
III					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
IV					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
V					1						
					2						
					3						
					4						
					5						



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to
Lisuhati, Lihuntutu & Dauralala - Ainaro Municipality.

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351

Data Inspesaun : 23/2/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro – Simpang Tiga Flexia

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,53.78, Latetude: 125,36.14.46

End Point : Long : -8,55.50.89, Latetude: 125,36.21.31

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Hela Retensaun 10% Maibe EDTL,I.P

Municipio Mak Sedauk Halo Karta Termo de
Entrega

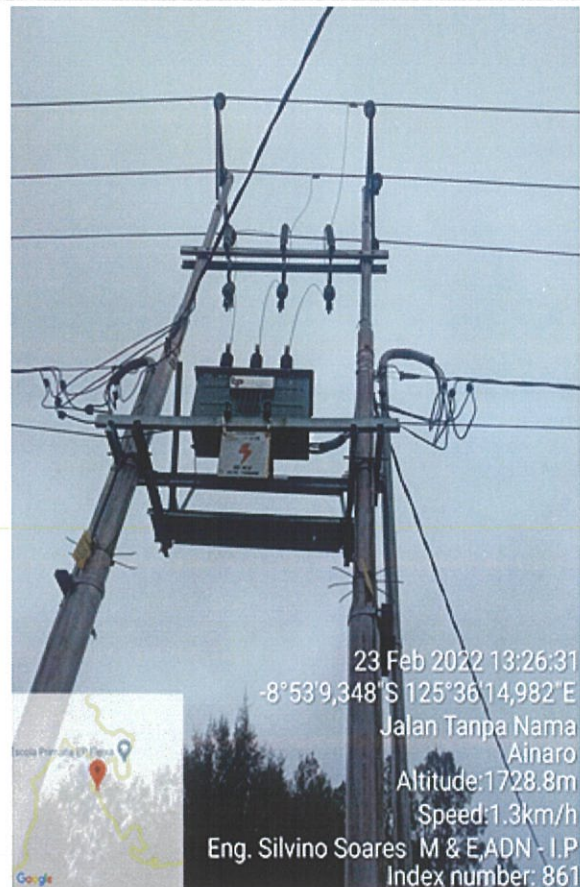



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to
Lisuhati, Lihuntutu & Dauralala - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (MBS-5)

SUMMARY RESULTADO MONITORIN

ITEM	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRAC	AMOUNT UP TO DATE	PERCENTAGE UP TO DATE
A	PREPARATION WORK	\$ 44,720.13	\$ 44,720.13	4.49%
B	INSTALLATION MV LINE	\$ 403,704.92	\$ 460,413.50	46.23%
C	INSTALLATION NEW TRANSFORMER	\$ 66,280.74	\$ 66,280.74	6.65%
D	EXTENTION LV LINE	\$ 373,604.16	\$ 334,985.92	33.63%
E	HOME CONECTION	\$ 107,730.00	\$ 90,250.00	9.06%
F	Grande Total	\$ 996,039.95	\$ 996,650.29	100.06355%
G	Total Contract	\$ 996,017.31	\$ 632.98	0.06351%

Ekipa Inspeksaun:


Silvino D. R. R. Soares
Teknika M & E - ADN, I.P

Verifika Husi :

(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projeitu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

#ANEXU D (MBS-5)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
Naran projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Dauralala - Ainaro Municipality											
Kompanha : Petaju Unip.Lda											
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				Asinatura	
I	23/2/2022	Ainaro / Maubisse	Silvino D. R. R. Soares	Teknik Electricidade	1	Tenki Hadia Schoor kotu pin Kleuk					
					2	Troka Pin Nakfera					
					3	Tenki Monta Strut Arm ladauk					
					4	Tenki Pinta Fali Airing Nebe Mak Tinta Sai Hotu Ona					
					5	Tenki Halos Airing Kleuk					
II					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
III					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
IV					1						
					2						
					3						
					4						
					5						
V					1						
					2						
					3						
					4						
					5						



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



EADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-7)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318

Data Inspesaun : 9/2/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro - Feleixa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,53.30.19, Latetude: 125,35.46.92

End Point : Long : -8,55.56.04, Latetude: 125,33.35.92

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-7)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to
Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality.
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



EADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-7)

Back-up Data

Naran Projeto

: New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to
Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality.

No. kontratu

: RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318





#ANEXU C2 (MBS-7)

SUMMARY RESULTADO MONITORIN

ITEM	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRAC	AMOUNT UP TO DATE	PERCENTAGE UP TO DATE
A	PREPARATION WORK	\$ 43,065.91	\$ 43,065.91	4.32%
B	INSTALLATION MV LINE	\$ 470,655.30	\$ 503,366.57	79.63%
C	INSTALLATION OF TRANSFORMER 50 KVA	\$ 97,394.70	\$ 77,915.76	7.03%
C	INSTALLATION OF TRANSFORMER 100 KVA	\$ 22,526.94	\$ 22,526.94	2.26%
D	EXTENTION LV LINE	\$ 254,132.30	\$ 230,644.95	23.13%
E	HOME CONECTION	\$ 109,250.00	\$ 103,360.00	10.37%
F	Grande Total	\$ 997,025.15	\$ 980,880.13	98.38068%
G	Total Contract	\$ 997,025.15	-\$16,145.02	-1.64597%

Ekipa Inspeksaun:


Silvino D. R. R Soares
Teknika M & E - ADN, I.P

Verifika Husi :


(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P

#ANEXU D (MBS-7)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality							
Kompanha : Tuto Deni Unip. Lda							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	9/2/2022	Ainaro / Maubisse	Silvino D. R. R. Soares	Teknik Electricidade	1	Hadia Pin Pos Nebe Mak Kleuk	
					2	Hadia Schoor Nebe Mak Mamar	
					3	Halos Poste Nebe Mak Halis	
					4	Troka Schoor Nebe Mak Kotu	
					5	Tenki Muda Ba Konstruksaun TM5	
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Pousada Maubisse-Município Ainaro.
No. kontratu : RDTL-74/GMTAC/X/2015

Data Inspesaun : 16-02-2022

Fatin Inspesaun : Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : -85026052S, Latetude: 125.36747E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto
Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere final
iha 2015, Selu ona
100% maibe ate
agora seidaok halo
pagamento ba
retensaun 10%
nian.(ABANDONA
ATE AGORA
LAIHA
INFORMASAUN).

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Network: 26 Okt 2021 15.00.29 GMT+09:00
Local: 26 Okt 2021 15.00.30 GMT+09:00
-8°50'25.584"S-125°36'6.942"E
230° SW
Altitude: 1474.6m
Speed: 2.0km/h
Remark: Engineer: JOAQUIM MADEIRA
Index number: 155



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-11)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Rehabilitation of Pousada Maubisse-Município Ainaro.
: RDTL-74/GMTAC/X/2015

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch & Foto

Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere final
iha 2015, Selu ona
100% maibe ate
agora seidauk halo
pagamento ba
retensaun 10% nian.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-11)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Rehabilitation of Pousada Maubisse-Município Ainaro.
: RDTL-74/GMTAC/X/2015

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch & Foto

Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere final
iha 2015, Selu ona
100% maibe ate
agora seidak halo
pagamento ba
retensaun 10% nian.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (MBS-13)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB).

No. kontratu : 390/KDM-AINARO/VII/2019

Data Inspesaun : 16-02-2022

Fatin Inspesaun :

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.8109S, Latetude: 125.6587E

End Point : Long :, Latetude:


Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Projeito nee iha fase retensaun nia
laran.

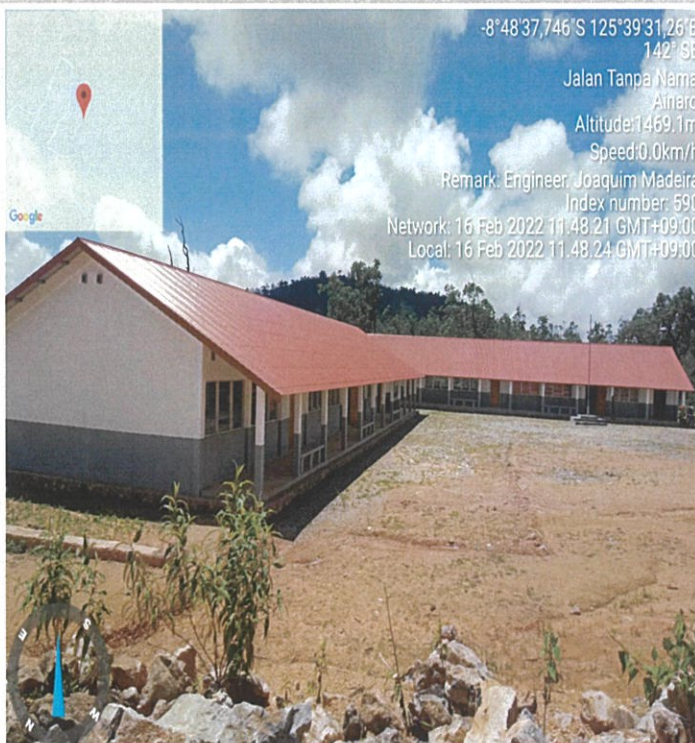



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (MBS-13)

Back-up Data



Naran Projeto : Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB).
No. kontratu : 390/KDM-AINARO/VII/2019

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Area oin nian

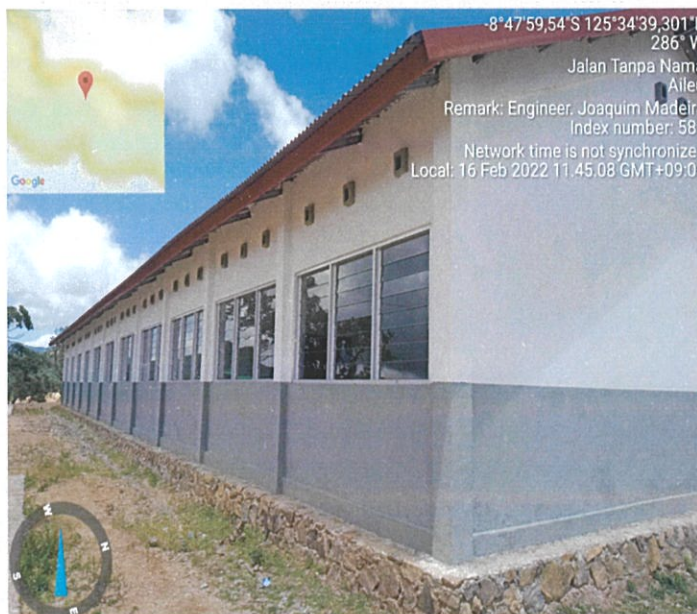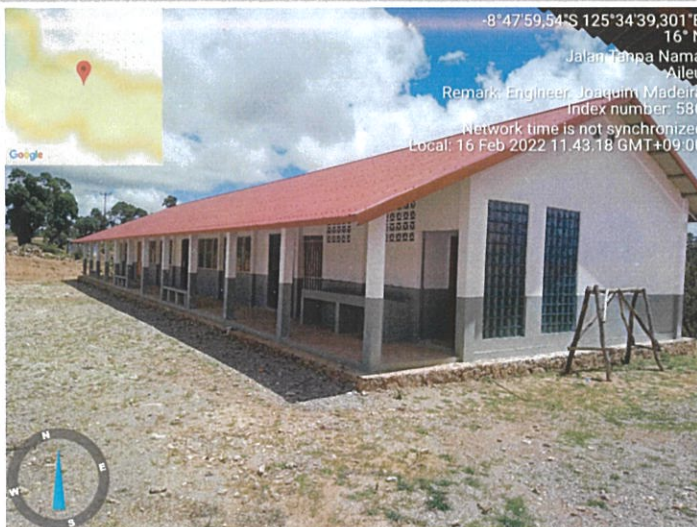




ANEXU C2 (MBS-13)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB).
No. kontratu : 390/KDM-AINARO/VII/2019

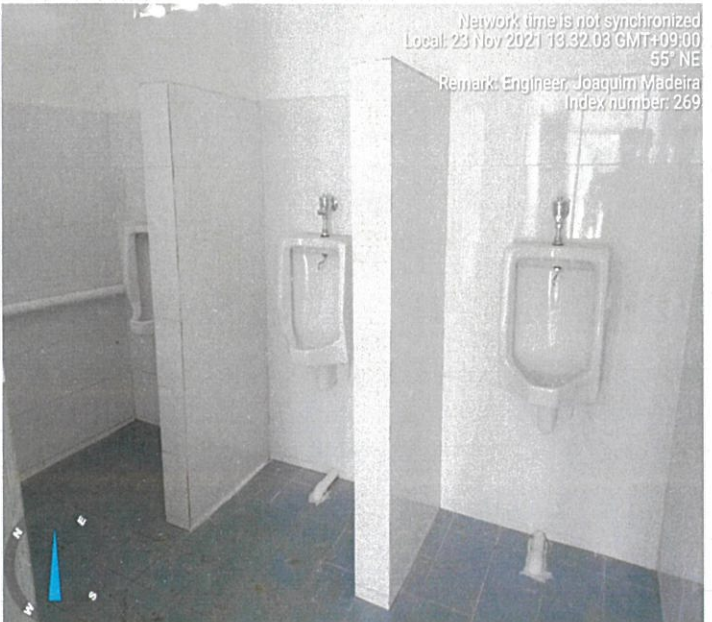Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Monta toilet haris fatin nian nebe tuir nia spek nebe determina iha b of q.	
Urinier ou Fatin mii nian	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (MBS-13)

Back-up Data


Naran Projeto : Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB).

No. kontratu : 390/KDM-AINARO/VII/2019

Sketch Item servisu

Obserbasaun iha terreno no fotu aktual

Tanki bee mos nian

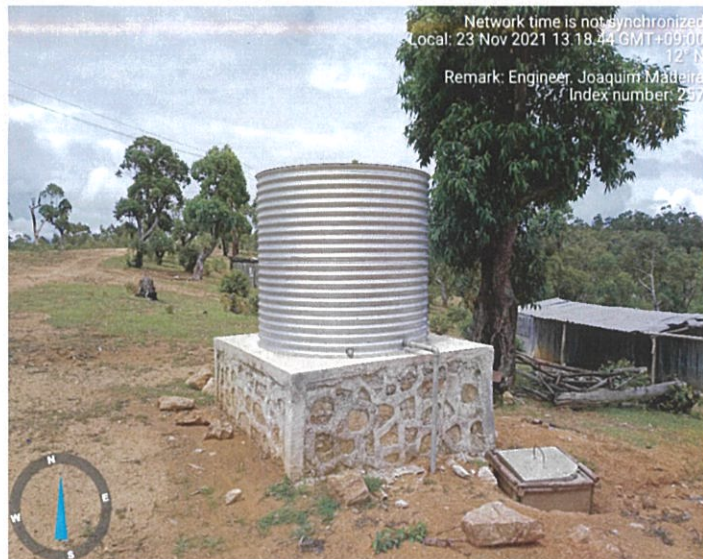

Seftiktank ba sintina nian ou Pusos.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


ANEXU C1 (MBS-14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Maubisse.
: 391/KDM-AINARO/VII/2019

(Projeito refere fisiko
final ona maibe ate
agora kompanhia
sedauk hatama pedido
pagamento 100%)

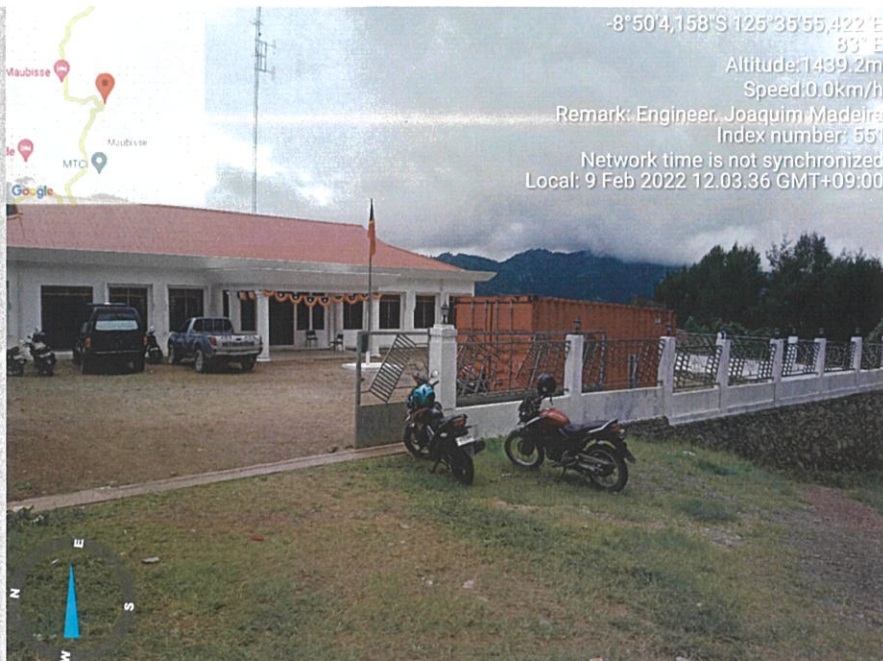



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Maubisse.
: 391/KDM-AINARO/VII/2019

Parte interior ou uma
laran kondisaun diak
hotu hela.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Maubisse.
: 391/KDM-AINARO/VII/2019

Haris Fatin

Kondisaun diak hotu
hela e bee mos mai
hela ho diak.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.
No. kontratu : SSS/287/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 16-02-2022

Fatin Inspesaun : Manulobas

Koordinadas :

Start Point : Long :- 84961042S, Latetude: 125.3996632E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Bee matan nebe dada bee mos
ba comunidade sira iha suku
mane loba, kondisaun bee
matan iha neba bee boot no
diak. (**PROJEITO NEE LA
LAO, ABANDONA HELA
ATE AGORA E LAIHA
INFORMASAUN IDA HUSI
KOMPANHIA**)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.


No. kontratu : SSS/287/MOPTC-2016

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

BEE MATAN.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

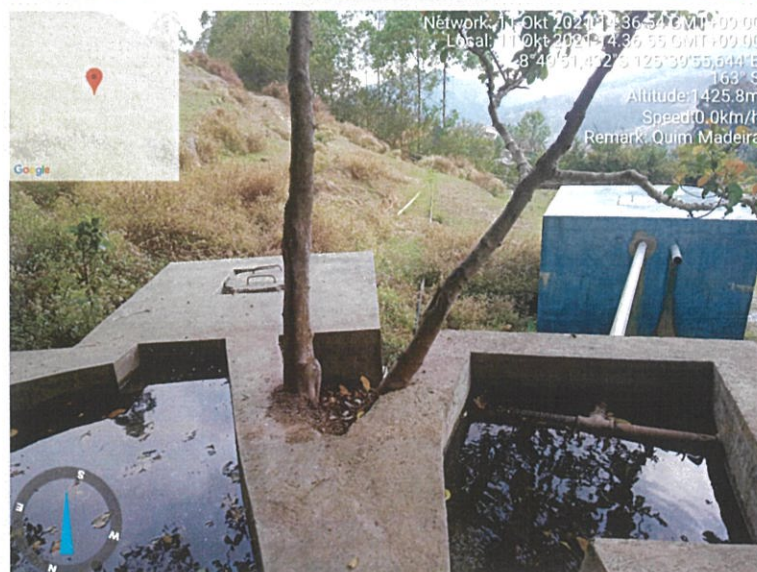



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.
No. kontratu : SSS/287/MOPTC-2016

Sketch & Foto Desenho

Instalasaun kanu 2" x 6 M
Kanu refere ho kondisaun diak
hela.

Lutu haleu tanki

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto

: Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.

No. kontratu

: SSS/287/MOPTC-2016

Sketch Item servisu

Rino tank ou tanki reserbatori

Kondisaun diak hela.



#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco
Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.
No. kontratu : SSS/287/MOPTC-2016

Instalasaun kanu 2" x 6 M

Kanu refere ho kondisaun diak
hela.



Tanki resevatori nebe distribui
bee ba comunidade sira
kondisaun diak hela no uza
hela.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ICU Room Maubesse.
No. kontratu : NCB/087/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 16-02-2022

Fatin Inspesaun : Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : -8501296S, Latetude: 1253557546E,

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere atinji ona
100%, Kompanhia agora
hatama ona relatotio ba iha
dono projeto.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun ICU Room Maubesse.
: NCB/087/MOPTC-2016

Oksigen



Parte sorin karuk





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun ICU Room Maubesse.
: NCB/087/MOPTC-2016

Parte soring Los



Parte Kotuk





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun ICU Room Maubesse.
: NCB/087/MOPTC-2016

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu halo cor ou fui
kanofi mos hotu ona agora
preparasaun ba reboka liur
no laran.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional - Instituto Público								PLANU INSPESAUN																												
Naran Eng.	Joaquim de C. Madeira							2022																												
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Februari																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
AINARO VILA (ANV)	10	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Abandona laiha informasaun ate agora	
							Actual																													Abandona laiha informasaun ate agora
	14	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	Simbissa Unip.Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																												Abandona laiha informasaun ate agora	
							Actual																													Abandona laiha informasaun ate agora
HATUBUILICO (HTB)	15	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Municipiu Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																												Abandona laiha informasaun ate agora	
							Actual																													Abandona laiha informasaun ate agora
	18	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	PDIM	ESTATAL	Plan																												Abandona laiha informasaun ate agora	
							Actual																													Abandona laiha informasaun ate agora
MAUBISSE (MBS)	6	Rehabilitasaun Pousada Hatobuilico	Levi Construction Unip.Lda	073/GMTAC/x/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																												Abandona laiha informasaun ate agora	
							Actual																													Abandona laiha informasaun ate agora
	11	Rehabilitation of Pousada Maubisse-Municipio Ainaro	Guerry II Unip.Lda	RDTL-74/GMTAC/X/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																												Fase retensaun	
							Actual																													Fase retensaun
	13	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																												Final Ona Mas Kompanhia Sedauk Hatama Pagamento Ate Agora	
							Actual																													Abandona laiha informasaun ate agora
	14	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																												Projeto refere final ona 100% hein pagamento.	
							Actual																													Projeto refere final ona 100% hein pagamento.
17	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Projeto refere final ona 100% hein pagamento.		
							Actual																												Projeto refere final ona 100% hein pagamento.	
19	Konstrusaun ICU Room Maubesse	El Constructio Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													Projeto refere final ona 100% hein pagamento.	
							Actual																													Projeto refere final ona 100% hein pagamento.
TOTAL PROJETO ON-GOING																																				


Note:


Planu Periode inspesaun iha tereinu


Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu


Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili


Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :


(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Bee Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P.

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana de Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Avaliacao de Qualidade,
ADN, I.P.

Aprova Husi :


(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.

Naran Eng.	Manuel Bany da S. C. de Carvalho							2022																												
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Febreiro																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
AINARO VILA (ANV)	4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Hela retensaun 10%
							Actual																													
	5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	Consortio Mauno Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu refere 100% iha 2016 maihe companhia sedauk husu retensaun 10% ate a data
							Actual																													
	6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going
							Actual																													
	7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Hela retensaun 10%
							Actual																													
	8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu refere sei parado tamba afeita husi Kalamidade 04/04/2021
							Actual																													
	9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro.Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	LM	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																													Projeito refere sei parado tamba sei konfirma ho owner konaba item adicional
							Actual																													
	12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Hela retensaun 10%
							Actual																													
19	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklima (Udan) halo compahia labela halo servisu normal iha tereno	
						Actual																														
20	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu refere parado iha tinan 2016 ate a data	
						Actual																														
22	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu refere parado iha tinan 2018 ate a data	
						Actual																														
HATUDO (HA)	2	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Hela retensaun 10%	
							Actual																													
	3	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklima (Udan) halo compahia labela halo servisu normal iha tereno	
							Actual																													
4	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data	
						Actual																														
HATUBUILICO (HTB)	1	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	Gos Unip.Lda	MPW-190104	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Hela retensaun 10%	
							Actual																													
	2	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Hela retensaun 10%	
							Actual																													
	3	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Projetu refere ADN I.P Halo tia ona pagamento Retensaun (10%) iha tinan 2019. Husu atu here fila fali dadus pagamento		
							Actual																													
	4	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	Ailesu Unip.Lda	MPW-190091	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Hela retensaun 10%
							Actual																													
	5	Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	Betua Calda Unip.Lda	MPW-W-210062	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projeito refere sei parado tamba sei konfirma ho owner konaba ba pagamento 100%
							Actual																													

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																													
Naran Eng.	Manuel Bany da S. C. de Carvalho						2022																													
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Febreiro																												OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
MAUBISSE (MBS)	1	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	Bermuana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklim (Udan) halo compahia labele halo servisu normal iha tereno		
							Actual																													
	2	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklim (Udan) halo compahia labele halo servisu normal iha tereno		
							Actual																													
	8	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	Leotyia Enterprises	MPW-190076	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklim (Udan) halo compahia labele halo servisu normal iha tereno		
							Actual																													
	10	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	Delong Unip. Lda	MPW-190087	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Hela retensaun 10%		
							Actual																													
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	Leotyia Enterprises	MPW-W-210066	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklim (Udan) halo compahia labele halo servisu normal iha tereno	
							Actual																													
	16	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklim (Udan) halo compahia labele halo servisu normal iha tereno	
							Actual																													
	18	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobulico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data	
							Actual																													
TOTAL PROJETO ON-GOING																																				

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :



(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)

Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :



(Eng. Januario Maia Guterres)

Adjunto Director Executivo, ADN, I.P

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIA GOVERNO CRISTIANO RONALD ADN, LP Agência de Desenvolvimento Municipal, Territórios Públicos							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Naran Eng.	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS						Fev																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
AINARO VILA (ANV)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Laiha Ona Espaso Hodi Kontinua Obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							Actual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO ALGO GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional - Instituto Público								PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng.	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares							2022																															
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Fev																															OBS
	53	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	Fundo Covid-19	ESTATAL	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Proceso Pagamentu

Prepara Husi :



(Silvino D. R. Rebelo Soares)
Eng. Electricidade, ADN - I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN - I.P



Aprova Husi :



(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN - I.P
