



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU AILEU


OUTUBRO 2022



SUMÁRIO
RELATÓRIO
IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO
AILEU
OUTUBRO 2022

Prepara Husi :


(Eng. Merinho Cuelo Lopes de Araújo)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Aileu ADN, I.P



(Silvino D.R.R. Soares)
Eng. M & E, Município Aileu ADN, I.P


(Eng. Celvio J. Alves)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Aileu ADN, I.P


(Eng. Rui Lopes)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Aileu ADN, I.P


Verifica Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transporte e Irrigação, ADN, I.P


(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN,

Sertifica Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T, M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	1
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	4
1.2 Perfil Municipio Aileu	4
1.3. Lista Projectos.....	6
II. PROGRESU FISIKU	19
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan.....	19
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	19
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	19
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	20
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	20

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.....	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Aileu.....	5
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Aileu	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Aileu Por Fundus Finansiamientos	6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Aileu Por Sectores.....	9
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Aileu Por Ministerio.....	14
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Aileu	18

I. INTRODUSAUN


1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN,I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN,I.P nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefisiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekretu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Público (IP), ADN,I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimento nian.
2. Halo fiskalizacao no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvimento nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio Aileu

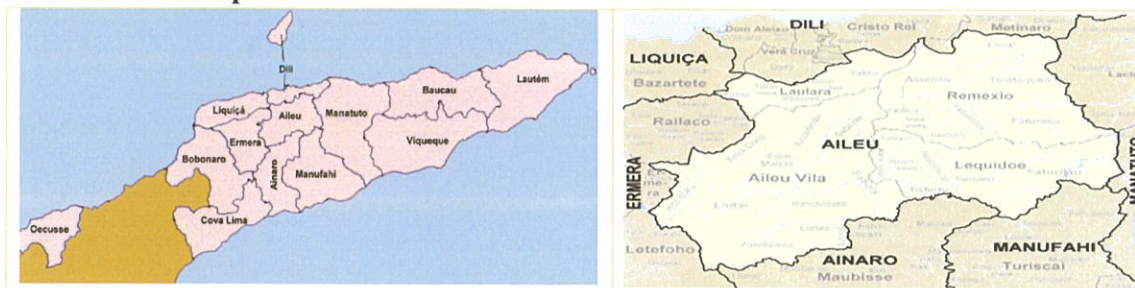

Administrasaun Munisipal Aileu lokalizadu iha parte sul Dili, kapital paíz no mapa 1 hatudu pozisaun jeográfika Munisipiu Aileu ne'ebé ho luan hamutuk 729 km² ho populasaun ema na'in 44,325 no densidade demografika ema 50.6 ba km², tuir Sensus 2015. Topografia Munisipiu Aileu ne'ebé foho dominante liu ho a'as entre 350 m to'o 1,500 m sukat husi tasi. Kapitál maka Aileu Vila iha foho Mota Mantane ho altitude 913 m. Administrasaun Munisipal Aileu iha Postos Administrativos 4, Sukus 31 no aldeias 139.

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos No Aldeias

Aileu villa		Laulara		Lequidoe		Remexio	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Aissirimou	5	Fatise	5	Aculitoho	3	Acumau	3
Bandudato	3	Cotolau	5	Bereleu	5	Fadabloco	7
Fahiria	6	Madabeno	5	Betulau	3	Fahiso	3
Fatubossa	7	Talitu	4	Fahiso	3	Faturas	4
Hoholau	5	Tohumeta	3	Faturilau	2	Hautoho	3
Lahane	5	-	-	Manucasa	2	Suco Liurai	3
Lausi	4	-	-	Namolesso	4	Maumeta	3
Suco Liurai	8	-	-	-	-	Tulataqueo	7
Seloi Malere	6	-	-	-	-	-	-
Saburia	3	-	-	-	-	-	-
Seloi Craik	10	-	-	-	-	-	-
Total	62	-	22	-	22	-	33

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 17

Tabela 1.1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Aileu

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Aileu								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		3				3	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
Total			4				4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Aileu

ASET ADN, I.P MUNICIPIO AILEU								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1				1	
2	Kareta		1				1	
3	Desktop HP / Monitor		1				1	
4	Laptop HP		1				1	Port ba USB fatin la diak , operasaun labtop Todan
5	Printer Cannon		1				1	
6	UPS		1				1	
7	Armario File		2				1	
8	Armario Tau hena		3				3	
9	Meja escritorio		1				1	
10	Meja han		1				1	
11	Meja TV (kiik)		1				1	
12	Kadeira escritorio		4				4	
13	Kadeira han		4				4	
14	Sofa		1 Set				1	
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3		3 Set				1	Springbed ida Nakles, Sumaso la Iha ba Kuarto Tolu
16	Jeleira		1				1	

17	TV + Parabola		1 Set				1	Reciver hosi Parabola la Utilija
18	Kipas Angin		5				5	Ida Kondisaun att
19	Kompor		1				1	
20	Kompor Gas		1				1	Kondisaun Att no labele uja
21	Rack sepatu		3				3	
22	Rack Piring		1				1	
23	Lampu		11				11	Rua mak att, nebe monta iha Veranda Uma oin no Veranda Kotuk ho Marka Philip
24	Water Pump Sanyo		1				1	

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dados projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Aileu Por Fundus Finansiamento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + LM - BS + LM - TP + Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	39	\$ 20,535,155.45	60.71%
2	Laulara	10	\$ 33,293,260.73	64.30%
3	Lequidoe	13	\$ 2,717,699.94	53.23%
4	Remexio	5	\$ 3,471,704.86	35.93%
Grand Total		67	\$ 60,017,820.98	60.93%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	12	\$ 15,626,577.13	68.74%
2	Laulara	7	\$ 32,987,141.18	64.29%
3	Lequidoe	1	\$ 240,048.46	84.76%
4	Remexio	1	\$ 2,567,345.51	34.72%
Grand Total		21	\$ 51,421,112.28	64.26%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	8	\$ 2,425,653.48	28.53%
2	Laulara	3	\$ 306,119.55	65.57%
3	Lequidoe	7	\$ 1,533,192.16	49.50%
4	Remexio	1	\$ 225,714.76	0.00%
Grand Total		19	\$ 4,490,679.95	36.78%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	5	\$ 316,902.42	0.00%
2	Laulara			
3	Lequidoe	1	\$ 128,221.80	0.00%
4	Remexio			
Grand Total		6	\$ 445,124.22	0.00%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	2	\$ 522,720.63	55.50%
2	Laulara			
3	Lequidoe	1	\$ 550,800.00	70.00%
4	Remexio	1	\$ 494,544.48	62.04%
Grand Total		4	\$ 1,568,065.11	62.66%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	9	\$ 1,167,916.80	37.34%
2	Laulara			
3	Lequidoe	3	\$ 265,437.52	37.16%
4	Remexio	2	\$ 184,100.11	26.75%
Grand Total		14	\$ 1,617,454.43	36.10%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundu-Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	3	\$ 475,384.99	64.46%
2	Laulara			
3	Lequidoe			
4	Remexio			
Grand Total		3	\$ 475,384.99	64.46%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Aileu Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO AILEU		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO	2	\$ 862,274.82	8.64%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	6	\$ 1,352,303.90	31.90%
3	EDUKASAUN	13	\$ 1,313,542.97	27.94%
4	ELÉCTRICIDADE	3	\$ 1,001,069.36	75.97%
5	ESTRADAS E PONTES	22	\$ 20,163,896.81	73.31%
6	FLOOD CONTROL	3	\$ 137,301.98	0.00%
7	IMPRESTIMO	4	\$ 31,371,351.03	57.94%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	\$ 1,320,533.03	64.79%
9	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS	2	\$ 1,025,800.00	62.61%
10	SAUDE	3	\$ 494,193.39	33.86%
11	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 505,151.90	0.00%
12	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	57.18%
13	TURISMO	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		67	\$ 60,017,820.98	60.93%

NO	SECTOR PROJECTO	Aileu-Vila		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO	2	\$ 862,274.82	8.64%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	5	\$ 1,224,082.10	35.24%
3	EDUKASAUN	8	\$ 864,005.34	25.36%
4	ELÉCTRICIDADE			
5	ESTRADAS E PONTES	10	\$ 2,553,763.66	22.30%
6	FLOOD CONTROL	3	\$ 137,301.98	0.00%
7	IMPRESTIMO	3	\$ 12,531,861.82	81.10%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	1	\$ 717,064.23	53.83%
9	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS	1	\$ 475,000.00	54.05%
10	SAUDE	2	\$ 194,247.81	27.49%
11	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 505,151.90	0.00%
12	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	57.18%
13	TURISMO	1	\$ 303,911.46	71.40%
	Grand Total	39	\$ 20,535,155.45	60.71%

NO	SECTOR PROYECTO	Laulara		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO			
2	EDIFICIOS PUBLICOS			
3	EDUKASAUN			
4	ELÉCTRICIDADE	2	\$ 761,020.90	73.19%
5	ESTRADAS E PONTES	6	\$ 13,652,436.58	93.89%
6	FLOOD CONTROL			
7	IMPRESTIMO	1	\$ 18,839,489.21	42.53%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	1	\$ 40,314.04	49.04%
9	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROYECTOS			
10	SAUDE			
11	SEGURANCA NO DEFESA			
12	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
13	TURISMO			
Grand Total		10	\$ 33,293,260.73	64.30%

NO	SECTOR PROYECTO	Lequidoe		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO			
2	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 128,221.80	0.00%
3	EDUKASAUN	3	\$ 265,437.52	37.16%
4	ELÉCTRICIDADE	1	\$ 240,048.46	84.76%
5	ESTRADAS E PONTES	3	\$ 670,091.82	29.12%
6	FLOOD CONTROL			
7	IMPRESTIMO			
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	3	\$ 563,154.76	79.87%
9	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROYECTOS	1	\$ 550,800.00	70.00%
10	SAUDE	1	\$ 299,945.58	37.98%
11	SEGURANCA NO DEFESA			
12	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
13	TURISMO			
Grand Total		13	\$ 2,717,699.94	53.23%

NO	SECTOR PROYECTO	Remexio		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO			
2	EDIFICIOS PUBLICOS			
3	EDUKASAUN	2	\$ 184,100.11	26.75%
4	ELÉCTRICIDADE			
5	ESTRADAS E PONTES	3	\$ 3,287,604.75	36.45%
6	FLOOD CONTROL			
7	IMPRESTIMO			
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
9	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROYECTOS			
10	SAUDE			
11	SEGURANCA NO DEFESA			
12	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
13	TURISMO			
Grand Total		5	\$ 3,471,704.86	35.93%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Aileu Por Ministerios

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	6	\$ 445,124.22	0.00%
2	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 505,151.90	0.00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	89.19%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	36	\$ 55,235,060.23	63.43%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	14	\$ 1,484,622.27	24.72%
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	54.05%
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	52.04%
8	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 775,330.57	54.21%
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	7.03%
10	SEFOPE	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		67	\$ 60,017,820.98	60.93%

NO	DONO DO PROJECTO	Aileu-Vila		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	5	\$ 316,902.42	0.00%
2	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 505,151.90	0.00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	89.19%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	15	\$ 16,630,099.71	67.31%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	9	\$ 1,035,084.64	21.17%
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	54.05%
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	52.04%
8	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 475,384.99	64.46%
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	7.03%
10	SEFOPE	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		39	\$ 20,535,155.45	60.71%

NO	DONO DO PROJECTO	Laulara		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL			
2	MINISTERIO DA DEFESA			
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	10	\$ 33,293,260.73	64.30%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL			
8	MINISTERIO SAUDE			
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN			
10	SEFOPE			
Grand Total		10	\$ 33,293,260.73	64.30%

NO	DONO DO PROJECTO	Lequidoe		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	1	\$ 128,221.80	0.00%
2	MINISTERIO DA DEFESA			
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	8	\$ 2,024,095.04	60.96%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	3	\$ 265,437.52	37.16%
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL			
8	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 299,945.58	37.98%
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN			
10	SEFOPE			
Grand Total		13	\$ 2,717,699.94	53.23%

NO	DONO DO PROJECTO	Remexio		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL			
2	MINISTERIO DA DEFESA			
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 3,287,604.75	36.45%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 184,100.11	26.75%
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL			
8	MINISTERIO SAUDE			
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN			
10	SEFOPE			
Grand Total		5	\$ 3,471,704.86	35.93%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus populasaun Munisipiu Aileu

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Poduktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Aileu Vila	28,185	8546	7976	6113	5550
Laulara	8,342	2420	2344	1837	1742
Lequidoe	7,913	2407	2192	1698	1616
Remexio	12,868	3389	3448	3035	2996

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu porsentagen actual fulan ida ne'e hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare'e iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hare'e #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

1. Iha Municipio Aileu Kompania balun sira nia Enjineiru laiha Terenu, no Enjineiru husi Dono do Projeto mos la activu iha terenu.
2. Komposisi betaun ne'ebe fo husi Laboratorio Nacional maibe bainhira halo trail iha terenu husi kompanha kontaktu sira parte Laboratorio Nacional maibe laiha resposta ne'ebe fixu ba iha kompania sira. Maibe liu tiha loron balun husi parte Laboratorio Nacional kontaktu fali sira hodi foti rasik sample.
3. Iha Municipiu Aileu kompania/empreza sira infrenta problema ba rekursu finanseiru nune'e fo inpaktu ba servisu konstrusaun nian hodi difikulta progress servisu iha terenu.
4. Tekniku ADN, I.P halo observasaun/monitorizasaun direktamente iha terenu hodi hare'e servisu kompania/empreza sira, maibe sira laiha Site Engineering.
5. Iha projectu balun ne'ebe maka kompania/empreza ladun koopera di'ak ho teknik ADN.IP no teknik husi Dono projectu, tamba instrusaun nebe'e mak ita fo hanesan prepara *time schedule* hadia *direksi keet* maibe kompania/empreza la halo tuir orientasaun.
6. Bazeia ba planu inspesaun ne'ebe ami halo balun nia implementasaun la tuir planu nebe'e mak aprova husi DE. ADN.IP, tamba iha difikuldade transporte, maibe ami

nafatin tenta ka fahe tempo hodi halo monitorizasaun ba projetu hotu neébe iha Municpiu Aileu.

7. Ba projectu neébe mak abandona no parado ami halo monitorizasaun dala 2 tamba laiha progresu fiziku neébe mak halo iha terenu tuir planu ne'ebe tekniku ADN.IP halo Monitorizasaun.

➤ Obstacle parte Eletricidade

1. Durante halo monitorizasaun ba projeto neébe mak mensiona iha lista projetu Eng. M & E, ADN – I.P, la hasoru kontraktor sira tamba televomel fora da area hotu.
2. Eng. M & E, ADN – I.P, nunka hasoru tekniku husi kompania no parte kompania sempre delega tekniku neébe ba hein iha terenu, maibe tekniku neé rasik laiha konesimentu klean ho orbra refere.
3. Seksaun M & E, ADN – I.P, la bele kontrola projeto ho maximu tamba Eng. M & E ida hodi kontrola Projeto Linha Electricidade ho Edifisio Publik Iha Municipio Ha'at (4).
4. Projeto eletricidade barak maka espasu ba lina laiha ona, hodi kompanha sira mos la halo servisu kontinuasaun.
5. Motorista menus difikulta ami nia servisu.

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Husu Superior ADN.IP atu bele hatu'o ba projectu nain konaba projetu hirak ne'ebe maka abandona no parado husi kompania/empreza ne'ebe iha responsabilidade ba projectu ne'e rasik atu bele foti medidas ruma hanesan *Black list* ou Penalidade ba kompania.
2. Ami husi tekniku/engineiru Municipiu ADN.IP husu ba Dono Projectu refere, ba oin kompania/empreza ne'ebe maka laiha responsabilidade no abandona projetu/obra ne'ebe sira halo, husu Governo la bele fo tan oportunidade ba kompana hirak ne'e hodi kaer fali obra seluk.

3. Ami husi Engineiru Municipiu ADN.IP sujere ba superior ADN.IP atu bele prepara transporte hanesan motorizada hodi nune'e bele fasilita ami halo monitorizasaun ba projectu neébe ho nia lokalizasaun besik.

➤ **Recomendação parte Eletricidade**

1. Husu ba parte ITC, ADN – I.P bele kria Folder Sistem ba Seksaun M & E, ADN – I.P.
2. Husu atu aumenta tan rekursu iha Seksaun M & E, ADN – I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Aileu

Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Aileu						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engineiro	Celvio J. Alves	108	Enjineiru ITI		
		Merinho Cuco L. de Araujo	189	Enjineiru EPAS		
		Rui Lopes	077	Enjineiru ITI		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		

2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	João Pedro Cortereal		Motorista		



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL OUTUBRO)

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL OUTUBRO)																
LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	Rehabilitation of Sloi Tocoluli roads Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Mendith UnipLda	SSS/061/MOPTK-2015	\$ 218,231.77	Nov. 14, 2014	100.00%	88.00%	\$ 192,043.96	\$ 26,187.81	PENDENTE	Projeito refere falta 10% rekomendasaun ikus iha tinan 2019
2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000 - 8+000 Munisipiu Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Aileu-Vila	Aileu	Caviq Unipessoal Lda in joint venture with Sunnines Unip. Lda	NCB/020/MOP-2019	\$ 717,064.23	Dec. 20, 2019	60.35%	53.83%	\$ 385,974.11	\$ 331,090.12	ON-GOING	
3	Consultant Design & Supervision Lot 3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Katahira and Engineers International	SSS/043/MPW-2014	\$ 4,069,793.04	Sept. 15, 2014	80.11%	80.11%	\$ 3,260,234.80	\$ 809,558.24	ON-GOING	
4	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Laulara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili - Ainaro Road (Lots 1 - 5)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Kunhwa Engineering & Consulting Co., Ltd JV with Dongsung Engineering Co.,Ltd	RFP/020/MOPTC/2017	\$ 3,318,006.82	April 27, 2018	65.58%	65.58%	\$ 2,175,851.72	\$ 1,142,155.10	ON-GOING	
5	Emergency Drainage and Slope Protection Along Aileu to Maubisse Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	My Friend Unip. Lda	MPW-W-014054	\$ 251,677.07	Oct. 5, 2014	100.00%	90.49%	\$ 227,750.76	\$ 23,926.31	ON-GOING	
6	Rehabilitation of MSS Office in Aileu	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-BS	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Borudo Matak	RDTL:47/MSS/DNPFAL-DAD/X/2016	\$ 47,720.63	Oct. 24, 2016	77.74%	69.97%	\$ 33,389.23	\$ 14,331.40	PENDENTE	
7	Programma Turismo Komunitario 2014 Selo / Malere	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Aileu-Vila	Aileu	Miror Raefusa	RDTL/SEFOPE/DNAD-NE/2013-0003	\$ 303,911.46	May 5, 2014	91.20%	71.40%	\$ 217,004.28	\$ 86,907.18	PENDENTE	
8	Preparation of Master Plan For Municipal Capitals Water Supply and Sanitation (Aileu-Gleno-Liquica) /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	MPW-CS-200028	\$ 827,410.00	May 1, 2020	10.00%	9.00%	\$ 74,466.90	\$ 752,943.10	ON-GOING	
9	Realization of the Detailed Engineering Design (DED) includes Reparation of Feasibility Study of the University of Aileu (Bem Serviso)	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Aileu-Vila	Aileu	Bernabad Arquitectura SLP	MPW-S-200024	\$ 475,000.00	March 31, 2020	54.05%	54.05%	\$ 256,732.50	\$ 218,267.50	ON-GOING	Consultant ida ne'e halo pagamento dala 2 iha Fulan Maio nia laran ho total progress 14.64% (8.36% + 6.28%)
10	New Construction of laboratory for covid 19 at CHC Aileu Vila	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	Jomy Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-257	\$ 62,128.32	Nov. 4, 2020	95.51%	85.95%	\$ 53,402.35	\$ 8,725.97	FHO	
11	Konstrusaun, Vedasaun no Jardim ba Edificio DTPSC	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kablaki Engineering Unip. Lda		\$ 200,000.00	1-Jul-12	89.19%	89.19%	\$ 178,371.29	\$ 21,628.71	PENDENTE	
12	Consultancy services for National Road No. 1 - Upgrading Project	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Philcoei International, Inc. In JV with Luis and Associates, Co	nn	\$ 5,835,991.00	Jan. 18, 2013	83.00%	81.01%	\$ 4,727,833.53	\$ 1,108,157.47	ON-GOING	
13	New Construction of Isolation Building	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-255	\$ 281,137.18	Nov. 04, 2020	100.00%	90.00%	\$ 253,023.47	\$ 28,113.71	PHO	
14	New Construction of Campas, Gate And Leveling	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Caramé Unip. Lda	No.: 37/MACLN/IX/2021	\$ 118,769.70	1-Sep-21	65.92%	52.04%	\$ 61,804.39	\$ 56,965.31	ON-GOING	
15	Konstrusaun salas de aulas 3 + Eskritorio + Laboratorio ESTV Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	NCB:01MEJD/DNA/2021	\$ 171,079.30	Dec 3.2021	71.58%	0.00%	\$ -	\$ 171,079.30	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL OUTUBRO)

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL OUTUBRO)																
					LOKALIZASAUN PROJETU											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
16	New construction office CSS of Aileu District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kevina Unip.Lda	33/MSSI/DGAF/DNA/XI /2021	\$ 427,130.00	Nov. 22, 2021	20.98%	0.00%	\$ -	\$ 427,130.00	ON-GOING	
17	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBC 3 Ciclo Selo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBC 3 CICLO SELOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 152,044.11	Oct. 15, 2021	36.58%	0.00%	\$ -	\$ 152,044.11	ON-GOING	
18	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EPE Mantane	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EPE MANTANE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 84,628.13	Oct. 15, 2021	37.29%	27.97%	\$ 23,670.49	\$ 60,957.64	ON-GOING	
19	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBF Lacio	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF LACLO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,597.13	Oct. 15, 2021	31.26%	25.12%	\$ 25,023.62	\$ 74,573.51	ON-GOING	
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Pre-Escolar Cotoabauro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE PRE-ESCOLAR COTOBAURO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 83,516.10	Oct. 15, 2021	43.81%	40.61%	\$ 33,918.40	\$ 49,597.70	ON-GOING	
21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Teblor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF TEBLOR	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 102,494.43	Oct. 15, 2021	53.92%	41.75%	\$ 42,792.08	\$ 59,702.35	ON-GOING	
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Darahe	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF DARAHE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,770.22	Oct. 15, 2021	43.26%	28.75%	\$ 28,687.58	\$ 71,082.64	ON-GOING	
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESGAM Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE ESGAM AILEU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 140,545.78	Oct. 15, 2021	39.82%	26.42%	\$ 37,129.75	\$ 103,416.03	ON-GOING	
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 101,409.44	Oct. 15, 2021	33.57%	27.47%	\$ 27,858.48	\$ 73,550.96	ON-GOING	
25	R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli-Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Oin Unip. Lda	MOP-CD-RFQ-21011	\$ 89,757.77	Oct. 1, 2021	45.21%	35.04%	\$ 31,449.34	\$ 58,308.43	ON-GOING	
26	R4D Rural Road Spot Improvement Kirelo - Lacio Chainage 0+000 - 11+300, Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Fikikay Unipessoal, Lda	MOP-W-NCB-21025	\$ 339,829.64	Oct. 1, 2021	64.77%	34.81%	\$ 118,294.10	\$ 221,535.54	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL OUTUBRO)

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL OUTUBRO)																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	LOKALIZASAUN PROJETU		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU										
27	New Construction of Fence at CSI Aileu-Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	BEHALE ENTERPRICE UNIPESOAL,LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230	\$ 132,119.49	Jan. 14, 2022	81.07%	0.00%	\$ -	\$ 132,119.49	ON-GOING	
28	Consulting services for detailed architecture & engineering design of master plan and new campos the national defence institute	MINISTERIO DA DEFESA	FI	SEGURANCA NO DEFESA	Aileu-Vila	Aileu	PT. Perentjana Djaja	SSS/0111/IDN-2014	\$ 505,151.90	Aug. 18, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 505,151.90	ON-GOING	
29	Rehabilitasaun Estrada Rural,Aituhularan - Manufoni,Aileu 0+000-1+000 (1.0Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Hatutan Moris Unipessoal Lda	RT/088/MOP-2021	\$ 98,575.19	9-May-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 98,575.19	ON-GOING	
30	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	LNG Unipessoal, Lda Jv Star King Construction Unipessoal, Lda	RT/139/MOP-2021	\$ 252,415.36	27-Apr-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 252,415.36	ON-GOING	
31	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 2+000-5+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/090/MOP-2021	\$ 353,952.41	28-Apr-22	23.81%	0.00%	\$ -	\$ 353,952.41	ON-GOING	
32	Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu-kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 5+000-8+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/091/MOP-2021	\$ 376,198.79	28-Apr-22	17.21%	0.00%	\$ -	\$ 376,198.79	ON-GOING	
33	Rehabilitasaun Estrada Rural, seloi Kraik-Halmate, Aileu (3.5Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Oin Unip. Lda	RT/092/MOP-2021	\$ 304,850.97	1-May-22	1.97%	0.00%	\$ -	\$ 304,850.97	ON-GOING	
34	Rehabilitasaun Estrada Rural,Raimansu - Fatubesi,Aileu (5.20Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	RACO LDA.	RT/093/MOP-2021	\$ 268,274.69	1-May-22	5.36%	0.00%	\$ -	\$ 268,274.69	ON-GOING	
35	Perfurasau Bee Mos Iha Seloi Ba Fatin Turismo Komunitariu	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Alenta Unip. Lda	48/SMA/AM-AIL/VIII/2021	\$ 34,864.82	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 34,864.82	ON-GOING	
36	Rehabilitasaun irigasaun Lagoa Seloi kraik incluindo Konstrusaun bareira de proteasaun in gabion	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	Alenta Unip. Lda	004/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 26,311.39	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 26,311.39	ON-GOING	
37	Konstrusaun Edifisiu Posto Administrativo Aileu Vila	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Diborna Unip. Lda	001/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 144,735.62	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 144,735.62	ON-GOING	
38	Konstrusaun Bronjong Proteje Uma Comunidade no Uma Madres Caridade Inklui Toós Comunidade	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	JOHIJEMAR Unip,Lda	005/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 61,880.06	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 61,880.06	ON-GOING	
39	Konstrusaun Bronjong Protege Igreja Assembleia de Deus no Uma Comunidade	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	Padua Unip. Lda	006/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 49,110.53	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 49,110.53	ON-GOING	
40	New Install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Madabeno to Sarlala Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Laulara	Aileu	Aldepo Murak Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000162	\$ 462,154.02	Aug. 22, 2013	81.19%	73.07%	\$ 337,695.10	\$ 124,458.92	PENDENTE	Progresu Fisiku nafatin deit tamba laiha ona espasu atu kontinua tan obra ne'e.



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL OUTUBRO)

LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
41	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku to Besilau and Fatuk Hun - Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Laulara	Aileu	osxavijoneli unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000179	\$ 298,866.88	Aug. 22, 2013	81.53%	73.38%	\$ 219,311.16	\$ 79,555.72	PENDENTE	Progresu Fisiku nafatin deit tamba laiha ona espasu atu kontinua tan obra ne'e.
42	Rehabilitation of Beducu Sarlala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Mejori, Lda	SSS/0103/MOPTC-2016	\$ 4,451,281.98	Sept. 5, 2016	98.97%	85.23%	\$ 3,793,986.33	\$ 657,295.65	ON-GOING	
43	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemós - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 0+000 - Sta. 2+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Aspalink Unip Lda	SSS/120/MOPTC-2015	\$ 4,128,651.62	Dec. 11, 2015	100.00%	99.35%	\$ 4,101,692.64	\$ 26,958.98	FHO	FHO iha Fulan Março 2022
44	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemós - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 2+800 - Sta. 6+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/121/MOPTC-2015	\$ 4,645,457.43	Dec. 11, 2015	100.00%	98.99%	\$ 4,598,764.07	\$ 46,693.36	FHO	FHO iha Fulan Março 2022
45	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laulara	Aileu	CINA WU YI CO.LTD	ICB/018/MOPTC-2017	\$ 18,839,489.21	May 31, 2019	79.61%	42.53%	\$ 8,012,695.11	\$ 10,826,794.10	ON-GOING	Responsavel Eng. ADN Impristimo
46	Rural Roads Maintenance Fahisohi - Fadabloco Sta 0+000-8+200, Hotoho - Liqueica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Ornai Sta 0+000 - 7+500 in Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laulara	Aileu	Remexio Furak Unip Lda	MPWTC-CD-170004	\$ 40,314.04	July 20, 2017	100.00%	49.04%	\$ 19,768.44	\$ 20,545.60	ON-GOING	Rekomenadasun Ikus 2018
47	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Lisimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Fin Los unip.Lda	MPW-W190086	\$ 225,977.27	Aug. 16, 2019	88.97%	80.07%	\$ 180,944.94	\$ 45,032.33	ON-GOING	
48	Laulara Solerema Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Marino Enterprises, Lda	SSS/115/MOPTC-2017	\$ 161,240.04	Sept. 7, 2017	100.00%	88.85%	\$ 143,267.06	\$ 17,972.98	PHO	Projeito refere Atinji progreso 100% baseia ba Rekomendasun ikus 2017, no agora Projeito Impristimo mak halo fali konstrusaun foun
49	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Emmanuel Milenial	MOP-CD-RFQ-21013	\$ 39,828.24	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 39,828.24	ON-GOING	
50	Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 -10+400 Dili & Aileu Municipality / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	Remexio	Aileu	Nautetu I, II Unipessoal Lda	MPW.W-1900081	\$ 494,544.48	Aug. 16, 2019	72.09%	62.04%	\$ 306,821.03	\$ 187,723.45	ON-GOING	
51	Road Rehabilitation of Remexio to Lacro Sta 0+000-20+000 Package I Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Remexio	Aileu	Mendith UnipLda	SSS/139/MOPTC-2017	\$ 2,567,345.51	Sept. 12, 2017	50.55%	34.72%	\$ 891,434.87	\$ 1,675,910.64	ON-GOING	
52	Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Remexio	Aileu	Lonacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	\$ 225,714.76	18-Jun-21	38.96%	0.00%	\$ -	\$ 225,714.76	ON-GOING	
53	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 77,252.65	Oct. 15, 2021	40.05%	27.44%	\$ 21,200.36	\$ 56,052.29	ON-GOING	
54	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 106,847.46	Oct. 15, 2021	35.45%	26.25%	\$ 28,045.29	\$ 78,802.17	ON-GOING	
55	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Lequidoe	Aileu	Cadila Supplie Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000163	\$ 240,048.46	Aug. 22, 2013	94.17%	84.76%	\$ 203,456.68	\$ 36,591.78	PENDENTE	Progresu Fisiku nafatin deit tamba laiha ona espasu atu kontinua tan obra ne'e.



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL OUTUBRO)

LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
56	R4D MPW Rural Roads rehabilitation Project in Aileu Bereleu manucasa Package 2 Sta. 3+500-13+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Seiara Irapiti Unip. Lda	MPWTC-W-015016	\$ 248,750.72	Sept. 7, 2015	97.45%	87.70%	\$ 218,159.90	\$ 30,590.82	PHO	Projeito refere Atinji deit progreso 97.45% baseia ba Rekomendasaun ikus 2017. no agora Projeito Impristimo mak halo fali konstrusaun foun
57	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 8+200, Namalesu - Faturilau Chainage 0+000 - 12+500, Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hautoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+500 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Emmanuel Milenial	MPW-W-190103	\$ 171,685.42	Aug. 21, 2019	76.31%	68.54%	\$ 117,671.59	\$ 54,013.83	ON-GOING	
58	Rural Roads Periodic Maintenance Aituhaularan - Manufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300, Routine Maintenance Coula Udo Kirelo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-190174	\$ 142,718.62	Nov. 25, 2019	98.30%	79.86%	\$ 113,980.68	\$ 28,737.94	ON-GOING	
59	For Preparation of Detailed Engineering Design For Rehabilitation of "municipio Roads" Package 8 : (Be' Cluru) to Lequidoe Town (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Lequidoe	Aileu	Team Consulting Engineering & Management Co., Ltd JV ATT Consultants Co., Ltd & Triangle Architech Consultant., Lda	MPW-CS-2000021	\$ 550,800.00	March 26, 2020	70.00%	70.00%	\$ 385,560.00	\$ 165,240.00	ON-GOING	
60	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Faturilau, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	SAUDE	Lequidoe	Aileu	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	\$ 299,945.58	Sept. 6, 2021	77.83%	37.98%	\$ 113,916.92	\$ 186,028.66	ON-GOING	
61	R4D Rural Road Spot Improvement Namalesu-Faturilau Chainage 0+000-14+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-210149	\$ 411,620.44	Sept. 21, 2021	59.06%	47.41%	\$ 195,141.27	\$ 216,479.17	ON-GOING	
62	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 117,171.14	Oct. 15, 2021	38.31%	28.91%	\$ 33,878.58	\$ 83,292.56	ON-GOING	
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Urdadan	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 73,988.60	Oct. 15, 2021	55.35%	41.66%	\$ 30,822.84	\$ 43,165.76	ON-GOING	
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 74,277.78	Oct. 15, 2021	57.43%	45.70%	\$ 33,941.87	\$ 40,335.91	ON-GOING	
65	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Lequidoe	Aileu	Blackbird Unip. Lda JV Chaicallala Unip. Lda	MOP-CD-NCB-21026	\$ 186,084.05	Oct. 1, 2021	11.71%	0.00%	\$ -	\$ 186,084.05	ON-GOING	
66	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi-Dairlouta Chainage 0+000 - 5+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Lequidoe	Aileu	Raco Lda.	MOP-CD-RFQ-21012	\$ 72,387.33	Oct. 1, 2021	29.08%	0.00%	\$ -	\$ 72,387.33	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL OUTUBRO)

LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
67	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lequidoe	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lequidoe	Aileu	Fitun Foun, Unip Lda	002/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 128,221.80	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 128,221.80	ON-GOING	
TOTAL									\$ 60,709,750.02			60.24%	\$ 36,568,863.86	\$ 24,140,886.16		

Prepara Husi :


(Eng. Celvino J. Alves)
Engenheiro ba Projetu Insfrastuctura, Transportes e Irigasaun
Municipio Aileu,
ADN, I.P.


(Eng. Rui Lopes)
Engenheiro ba Projetu Insfrastuctura, Transportes e Irigasaun
Municipio Aileu,
ADN, I.P.


(Eng. Merinho Cuco L. de Araujo)
Eng. ba Edificio Publiku no Be'e Saneamento
Municipio Aileu
ADN, I.P.


(Silvino D. R. R. Soares)
Eng. M & E, Munisipiu Aileu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :


(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											OUTUBRO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
1	Rehabilitation of Sloi Tocoluli roads Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Mendith UnipLda	SSS/061/MOPTK-2015	\$ 218,231.77	Nov. 14, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000 - 8+000 Munisipiu Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Aileu-Vila	Aileu	Caviq Unipessoal Lda in joint venture with Sunnines Unip. Lda	NCB/020/MOP-2019	\$ 717,064.23	Dec. 20, 2019	60.35%	0.00%	60.35%
3	Consultant Design & Supervision Lot 3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Katahira and Engineers International	SSS/043/MPW-2014	\$ 4,069,793.04	Sept. 15, 2014	80.11%	0.00%	80.11%
4	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Laulara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili - Ainaro Road (Lots 1 - 5)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Kunhwa Engineering & Consulting Co., Ltd JV with Dongsung Engineering Co.,Ltd	RFP/020/MOPTC/2017	\$ 2,626,077.78	April 27, 2018	65.58%	0.00%	65.58%
5	Emergency Drainage and Slope Protection Along Aileu to Maubisse Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	My Friend Unip. Lda	MPW-W-014054	\$ 251,677.07	Oct. 5, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
6	Rehabilitation of MSS Office in Aileu	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-BS	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Borudo Matak	RDTL:47/MSS/DNPFAL-DAD/X/2016	\$ 47,720.63	Oct. 24, 2016	77.74%	0.00%	77.74%
7	Programma Turismo Komunitario 2014 Seloi / Malere	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Aileu-Vila	Aileu	Miror Raefusa	RDTL/SEFOPE/DNA/DNE/2013-0003	\$ 227,981.87	May 5, 2014	91.20%	0.00%	91.20%
8	Preparation of Master Plan For Municipal Capitals Water Supply and Sanitation (Aileu-Gleno-Liquica) /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	MPW-CS-200028	\$ 827,410.00	May 1, 2020	10.00%	0.00%	10.00%
9	Realization of the Detailed Engineering Design (DED) includes Reparation of Feasibility Study of the University of Aileu (Bem Serviso)	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Aileu-Vila	Aileu	Bernabad Arquitectura SLP	MPW-S-200024	\$ 475,000.00	March 31, 2020	54.05%	0.00%	54.05%
10	New Construction of laboratory for covid 19 at CHC Aileu Vila	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	Jomy Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-257	\$ 62,128.32	Nov. 4, 2020	95.51%	0.00%	95.51%
11	Konstrusaun, Vedasaun no Jardim ba Edificio DTPSC	Ministerio da Justica	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kablaki Engineering Unip. Lda	004/PDD/DST-AIL/2012	\$ 200,000.00	1-Jul-12	89.19%	0.00%	89.19%
12	Consultancy services for National Road No. 1 - Upgrading Project	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Philcoei International, Inc. In JV with Luis and Associates, Co		\$ 5,835,991.00	Jan. 18, 2013	83.00%	0.00%	83.00%
13	Konstrusaun Fatin isolamentu iha Municipio Aileu, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-255	\$ 281,137.18	Nov. 04, 2020	100.00%	0.00%	100.00%
14	Para a Construsaun de Jardim de Herois de Aileu (New construction of Campas, Gate and Leveling)	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Caramé Unip. Lda	No.: 37/MACLN/IX/2021	\$ 118,769.70	1/09/2021	65.92%	0.00%	65.92%
15	Konstrusaun salas de aulas 3 + Eskritorio + Laboratorio ESTV Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	NCB:01MEJD/DNA/2021	\$ 171,079.30	Dec 3.2021	64.83%	6.75%	71.58%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											OUTUBRO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
16	New Cosntruction Office CSS Aileu District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kevina Unip.Lda	33/MSSI/DGAF/DNA/X I/2021	\$ 427,130.00	Nov. 22, 2021	18.42%	2.57%	20.98%
17	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBC 3 Ciclo Selo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBC 3 CICLO SELOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 152,044.11	Oct. 15, 2021	26.92%	9.67%	36.58%
18	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EPE Mantane	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EPE MANTANE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 84,628.13	Oct. 15, 2021	28.50%	8.79%	37.29%
19	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBF Lacro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF LACLO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,597.13	Oct. 15, 2021	25.41%	5.85%	31.26%
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Pre-Escolar Cotobauro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE PRE-ESCOLAR COTOBAURO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 83,516.10	Oct. 15, 2021	38.85%	4.96%	43.81%
21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Teblor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF TEBLOR	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 102,494.43	Oct. 15, 2021	46.03%	7.89%	53.92%
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Darahe	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF DARAHE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,770.22	Oct. 15, 2021	29.16%	14.10%	43.26%
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESGAM Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE ESGAM AILEU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 140,545.78	Oct. 15, 2021	26.82%	13.00%	39.82%
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 101,409.44	Oct. 15, 2021	28.60%	4.96%	33.57%
25	R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli-Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Oin Unip. Lda	MOP-CD-RFQ-21011	\$ 89,757.77		45.21%	0.00%	45.21%
26	R4D Rural Road Spot Improvement Kirlalo - Lacro Chainage 0+000 - 11+300, Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Fikikay Unipessoal, Lda	MOP-W-NCB-21025	\$ 339,829.64	Oct. 1, 2021	64.66%	0.11%	64.77%
27	New Construction of Fence at CSI Aileu-Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230	BEHALE ENTERPRICE UNIPESSOAL,LDA	\$ 132,119.49	Jan. 14, 2022	81.07%	0.00%	81.07%
28	Consulting services for detailed architecture & engineering design of master plan and new campos the national defence institute	MINISTERIO DA DEFESA	FI	SEGURANCA NO DEFESA	Aileu-Vila	Aileu	PT. Perentjana Djaja	SSS/0111/IDN-2014	\$ 505,151.90	Aug. 18, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
29	Rehabilitasaun Estrada Rural,Aituhularan - Manufoni,Aileu 0+000-1+000 (1.0Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Hatutan Moris Unipessoal Lda	RT/088/MOP-2021	\$ 98,575.19	9-May-22	0.00%	0.00%	0.00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											OUTUBRO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
30	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu - kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	LNG Unipessoal, Lda Jv Star King Construction Unipessoal, Lda	RT/139/MOP-2021	\$ 252,415.36	27-Apr-22	0.00%	0.00%	0.00%
31	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu - kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 2+000-5+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/090/MOP-2021	\$ 353,952.41	28-Apr-22	0.00%	23.81%	23.81%
32	Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu-kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 5+000-8+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/091/MOP-2021	\$ 376,198.79	28-Apr-22	0.00%	17.21%	17.21%
33	Rehabilitasaun Estrada Rural, seloi Kraik-Halmate, Aileu (3.5Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Oin Unip. Lda	RT/092/MOP-2021	\$ 304,850.97	1-May-22	0.00%	1.97%	1.97%
34	Rehabilitasaun Estrada Rural,Raimansu - Fatubesi,Aileu (5.20Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	RACO LDA.	RT/093/MOP-2021	\$ 268,274.69	1-May-22	0.00%	5.36%	5.36%
35	Perfurasau Bee Mos Iha Seloi Ba Fatin Turismo Komunitariu	Ministério da Administração Estatal	PDIM	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Alenta Unip. Lda	48/SMA/AM-AIL/VIII/2021	\$ 34,864.82	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
36	Rehabilitasaun irigasaun Lagoa Seloi kraik incluindo Konstrusaun bareira de proteasaun in gabion	Ministério da Administração Estatal	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	Alenta Unip. Lda	004/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 26,311.39	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
37	Konstrusaun Edifisiu Posto Administrativu Aileu Vila	Ministério da Administração Estatal	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Diborna Unip. Lda	001/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 144,735.62	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
38	Konstrusaun Bronjong Proteje Uma Comunidade no Uma Madres Caridade Inklui Toós Comunidade	Ministério da Administração Estatal	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	JOHIJEMAR Unip,Lda	005/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 61,880.06	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
39	Konstrusaun Bronjong Protege Igreja Assembleia de Deus no Uma Comunidade	Ministério da Administração Estatal	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	Padua Unip. Lda	006/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 49,110.53	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
40	New Install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Madabeno to Sarlala Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laulara	Aileu	Aldepo Murak Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000162	\$ 462,154.02	Aug. 22, 2013	81.19%	0.00%	81.19%
41	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku to Besilau and Fatuk Hun - Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laulara	Aileu	Osxavijoneli unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000179	\$ 298,866.88	Aug. 22, 2013	81.53%	0.00%	81.53%
42	Rehabilitation of Beducu Sarlala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Mejori, Lda	SSS/0103/MOPTC-2016	\$ 4,451,281.98	Sept. 5, 2016	98.97%	0.00%	98.97%
43	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemos - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 0+000 - Sta. 2+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Aspalink Unip Lda	SSS/120/MOPTC-2015	\$ 4,128,651.62	Dec. 11, 2015	100.00%	0.00%	100.00%
44	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemos - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 2+800 - Sta. 6+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/121/MOPTC-2015	\$ 4,645,457.43	Dec. 11, 2015	100.00%	0.00%	100.00%
45	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laulara	Aileu	CINA WU YI CO.LTD	ICB/018/MOPTC-2017	\$ 17,855,301.27	May 31, 2019	79.61%	0.00%	79.61%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											OUTUBRO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
46	Rural Roads Maintenance Fahisohi - Fadabloco Sta 0+000-8+200, Hotoho - Liquica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Ornai Sta 0+000 - 7+500 in Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laulara	Aileu	Remexio Furak Unip Lda	MPWTC-CD-170004	\$ 40,314.04	July 20, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
47	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Lisimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Fin Los unip.Ida	MPW-W190086	\$ 225,977.27	Aug. 16, 2019	88.97%	0.00%	88.97%
48	Laulara Solerema Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Marino Enterprises, Lda	SSS/115/MOPTC-2017	\$ 161,240.04	Sept. 7, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
49	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Emmanuel Milenial	MOP-CD-RFQ-21013	\$ 39,828.24	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
50	Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 -10+400 Dili & Aileu Municipality / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Nautetu I, II Unipessoal Lda	MPW.W-1900081	\$ 494,544.48	Aug. 16, 2019	72.09%	0.00%	72.09%
51	Road Rehabilitation of Remexio to Lacle Sta 0+000-20+000 Package I Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Mendith UnipLda	SSS/139/MOPTC-2017	\$ 2,567,345.51	Sept. 12, 2017	43.26%	7.29%	50.55%
52	Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Lonacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	\$ 225,714.76	18-Jun-21	33.16%	5.80%	38.96%
53	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 77,252.65	Oct. 15, 2021	31.31%	8.73%	40.05%
54	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 106,847.46	Oct. 15, 2021	28.43%	7.02%	35.45%
55	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lequidoe	Aileu	Cadila Supplie Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000163	\$ 240,048.46	Aug. 22, 2013	94.17%	0.00%	94.17%
56	R4D MPW Rural Roads rehabilitation Project in Aileu Bereleu manucasa Package 2 Sta. 3+500-13+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Seiara Irapiti Unip. Lda	MPWTC-W-015016	\$ 248,750.72	Sept. 7, 2015	97.45%	0.00%	97.45%
57	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadabloco Chainage 0+000 - 8+200, Namalesu - Faturilau Chainage 0+000 - 12+500, Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hautoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+500 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Emmanuel Milenial	MPW-W-190103	\$ 171,685.42	Aug. 21, 2019	76.31%	0.00%	76.31%
58	Rural Roads Periodic Maintenance Aituhaularan - Manufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300, Routine Maintenance Coula Udo Kirielo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-190174	\$ 142,718.62	Nov. 25, 2019	98.30%	0.00%	98.30%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



OUTUBRO 2022

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
59	For Preparation of Detailed Engineering Design For Rehabilitation of "municipio Roads" Package 8 : (Be' Cluru) to Lequidoe Town (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Lequidoe	Aileu	Team Consulting Engineering & Management Co., Ltd JV ATT Consultants Co., Ltd & Triangle Architech Consultant., Lda	MPW-CS-2000021	\$ 550,800.00	March 26, 2020	70.00%	0.00%	70.00%
60	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Faturilau, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	SAUDE	Lequidoe	Aileu	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	\$ 299,945.58	Sept. 6, 2021	77.83%	0.00%	77.83%
61	R4D Rural Road Spot Improvement Nmalesu-Faturilau Chainage 0+000-14+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-210149	\$ 411,620.44	Sept. 21, 2021	59.06%	0.00%	59.06%
62	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 117,171.14	Oct. 15, 2021	33.43%	4.88%	38.31%
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Urdadan	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 73,988.60	Oct. 15, 2021	55.35%	0.00%	55.35%
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 74,277.78	Oct. 15, 2021	54.67%	2.76%	57.43%
65	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	Blackbird Unip. Lda JV Chaicallala Unip. Lda	MOP-CD-NCB-21026	\$ 186,084.05	Oct. 1, 2021	11.24%	0.46%	11.71%
66	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi-Dairlouta Chainage 0+000 - 5+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	Raco Lda.	MOP-CD-RFQ-21012	\$ 72,387.33	Oct. 1, 2021	0.00%	29.08%	29.08%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											OUTUBRO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
67	Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Lequidoe	Ministério da Administração Estatal	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lequidoe	Aileu	Fitun Foun, Unip Lda	002/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 128,221.80	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%

Prepara Husi :

Verifika Husi :

(Eng. Celso J. Alves)
Engenheiro ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun
Município Aileu, AD, I. P.

(Eng. Rui Lopes)
Engenheiro ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun
Município Aileu, ADN, I. P.

(Eng. Merinho Cuco L. de Araújo)
Eng. ba Edifício Público no Be'e Saneamento
Município Aile, ADN, I. P.


(Eng. Remigio Dos Santos)
Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, ADN, I.
P.

(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Engenheiro Senior ba Edifício Público no Be'e Saneamento,
ADN, I. P.

(Silvino D. R. R. Soares)
Eng. M & E, Município Aileu, ADN, I. P.

(Dorinda de F. Marques)
Chefe Sec. Projeto M.E & ITC, ADN, I. P.

Sertifika Husi :
(Emerenciana da Costa Vaia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I. P.





ANEXU C1 (ALV - 11)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTO TIPO
EPE)
No. kontratu : GRUPU KOMUNITARIO

Data Inspesaun : 04 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu, Selo Malere

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,69808407 Latetude : 125.53881841

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item instala Kuda Kuda

Servisu Parado tamba grupo nia orsamento
executa hotu ona no hein pagamento foin
kontinua fali

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (ALV - 11)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTO TIPO
EPE)
No. kontratu : GRUPU KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Plesteran Servisu Parado tamba grupo nia orsamento executa hotu ona no hein pagamento foin kontinua fali	 -8° 41'53,805"S 125° 32'17,643"E Altitude: 1153.3m Speed: 0.0km/h ADN Aileu Index number: 6353 4 Okt 2022 2:23:36 PM
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (ALV - 11)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTO TIPO
EPE)
No. kontratu : GRUPU KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (ALV - 11)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTO TIPO
EPE)
No. kontratu : GRUPU KOMUNITARIO

--	--

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (ALV - 11)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTO TIPO
EPE)

No. kontratu : GRUPU KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (AVL - 8)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Escritorio
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 19 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu - Villa Selo-Craik

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Servisu iha tereno halo mak plesteran ba Escritorio	



ANEXU C1 (AVL - 8)

Back-up Data

Naran Projeto : **Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Escritorio**
No. kontratu : **Grupo Komunitario**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Instala Kuda kuda ba Escritirio	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (AVL - 8)

Back-up Data

Naran Projeto : **Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Escritório**
No. kontratu : **Grupo Komunitario**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (RE - 1)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 27 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Remexio , tulataqueu, Fatubutik

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Liu husi monotirizasaun nebe maka ekipa ADN halo iha tereno servisu nebe grupo halao maka instala Gording	



ANEXU C1 (RE - 1)

Back-up Data

Naran Projeto : **Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)**
No. kontratu : **Grupo Komunitario**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Kondisaun nebe hare husi oin ba kosntrusaun refere	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (RE - 1)

Back-up Data

Naran Projeto : **Nova Construcão 3 Salas De Aulas (Prototipo C)**
No. kontratu : **Grupo Komunitario**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU D (ALV - 12)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo komunitario

Data Inspesaun : 18 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Bandudato

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.80143040 Latetude : 125.58728635

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Plesterab ba Toilet	
Servisu nebe maka halao plesteran	



ANEXU D (ALV - 12)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo komunitario

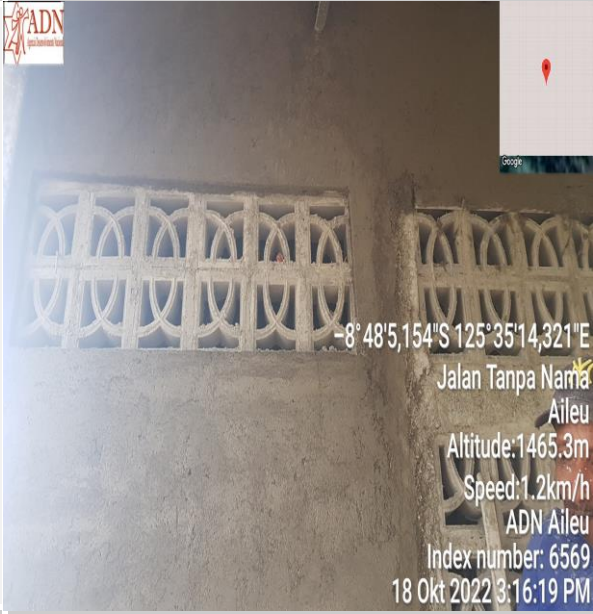Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Plesteran ba Uma Toilet Servisu nebe maka grupo halao iha tereno maka plesteran ba Building Toilet	 -8° 48'5,154"S 125° 35'14,321"E Jalan Tanpa Nama Aileu Altitude: 1465.3m Speed: 1.2km/h ADN Aileu Index number: 6569 18 Okt 2022 3:16:19 PM
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU D (ALV - 12)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU D (ALV - 12)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (ALV - 14)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Data Inspesaun : 05 de Outubro de 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Selo Malere

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.71344607 Latetude : 125.564061

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1. Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Servisu Plesteran ba Kondtrusaun Prototipo C	 -8° 42'48,453"S 125° 53'50,608"E Aileu Altitude: 1009.7m Speed: 0.0km/h ADN Aileu Index number: 6358 5.0kt 2022 10:32:44 AM



ANEXU C1 (ALV - 14)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Servisu Plesteran ba Kondtrusaun Prototipo C	 -8° 42'49,394"S 125° 33'51,115"E Aileu Altitude:1031.1m Speed:1.2km/h ADN Aileu Index number: 6365 5 Okt 2022 10:34:29 AM
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (ALV - 14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE
: GRUPO KOMUNITARIO

--	--

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 14)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Sketch Item servisu



ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU

No. kontratu : NCB: 01/MEJD/DNA/2021

Data Inspesaun : 05 , 24 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Aisirimou

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Instala Keramik ba iha Prototipo C	



ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : **KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU**
No. kontratu : **NCB: 01/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Instala ListPlafon ba Prototipo C	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU
No. kontratu : NCB: 01/MEJD/DNA/2021

Sketch Item servisu

Kondisaun aktual Konstrusaun



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Kondisaun aktual Konstrusaun





ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : **KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU**
No. kontratu : **NCB: 01/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data

Naran Projeto

: KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU

No. kontratu

: NCB: 01/MEJD/DNA/2021



ANEXU C1 (ALV - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C) + TB
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Data Inspesaun : 24 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Suku Liurai (Lacro)

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8.709141** Latetude : **125.74044227**

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Projetu refere material iha tereno hotu maibe seidauk servisu ho razaun zerador At	 -8° 48' 40.743"S 125° 29' 49.68"E Altitude: 1665.1m Speed: 1.7km/h ADN Aileu Index number: 6670 24 Okt 2022 2:50:00 PM

ANEXU C1 (ALV - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C) + TB
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Back Fill Pondasi Toilet Projeto refere material iha tereno hotu maibe seidauk servisu ho razaun zerador At	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	





ANEXU C1 (ALV - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C) + TB
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (ALV - 10)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C) + TB
: GRUPO KOMUNITARIO

ANEXU D (ALV - 13)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 18 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Lausi

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

4.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item instala kuda kuda ba toilet Projetu refere la servisu refere monta servisu nebe mak grupo monta maka kuda kuda ba toilet	

ANEXU D (ALV - 13)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Kondisaun aktual ba konstrusaun refere	 -8° 48' 10,552"S 125° 36' 19,172"E Altitude: 1230.0m Speed: 3.2km/h ADN Aileu Index number: 6541 18 Okt 2022 2:31:53 PM
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projetu refere la servisu ho razaun tamba Grupo sira nia orsamento atu executa obra refere laiha ona no Hein ba Pagamento 2 mak foin bele Kontinua	



ANEXU D (ALV - 13)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU D (ALV - 13)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	

ANEXU D (ALV - 15)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 24 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Suku Liurai, Fatubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

4.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Servisu Plesteran Servisu nebe maka grupo halao iha tereno maka plesteran	

ANEXU D (ALV - 15)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Kondisaun actual ba konstrusaun refere	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	





ANEXU D (ALV - 15)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (AVL - 9)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Edifício Pré-Escolar (Prototipo Epe)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 13 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa Sarin, Mantane

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Foto aktual ba konstrusaun EPE mantane instala ona Kuda kuda	 -8° 43' 53,76" S 125° 33' 54,983" E Jalan Tanpa Nama Aileu Altitude: 896m ADN Aileu Index number: 6520 13 Okt 2022 11:01:01 AM



ANEXU C1 (AVL - 9)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Edifício Pré-Escolar (Protótipo Epe)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Septitank ba Toilet nian	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Plesteran ba interior Konstrusaun nian.	



ANEXU C1 (AVL - 9)

Back-up Data

Naran Projeto : **Nova Construção Edifício Pré Escolar (Prototipo Epe)**
No. kontratu : **Grupo Komunitario**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (AVL - 9)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Nova Construção Edifício Pré Escolar (Prototipo Epe)
: Grupo Komunitario

--	--

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (AVL - 9)

Back-up Data

Naran Projeto : **Nova Construção Edifício Pré-Escolar (Protótipo Epe)**
No. kontratu : **Grupo Komunitario**

Sketch Item servisu



ANEXU C1 (Le - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 25 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe, Aileu Suku Manukasa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

4.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Projetu refere parado hela ho razaun grupo osan laiha atu exekuta obra refere	

ANEXU C1 (Le - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projetu refere parado hela ho razaun grupo osan laiha atu exekuta obra refere	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projetu refere parado hela ho razaun grupo osan laiha atu exekuta obra refere	



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público



ANEXU C1 (Le - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (Le - 4)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)
: Grupo Komunitario



ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Tb
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 25 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Fahisoi - Lequedoe

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8.709141** Latetude : **125.74044227**

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Instalasaun ba ba Kuda kuda no Gording.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Tb
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Instalasaun ba ba Kuda kuda no Gording.	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Tb
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Back Fill Ba Pondasi	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Nova Construcão 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Tb
: Grupo Komunitario

--	--

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Tb**
No. kontratu : **Grupo Komunitario**

Sketch Item servisu



ANEXU C1 (Le - 3)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 25 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe , Asubli Toho,Urbadan.

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8.709141** Latetude : **125.74044227**

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Projetu refere agora seidauk bele lao tamba orsamento exekuta hotu ona no hein pagamento maka foin bele komesa fila fali	 -8° 42' 41,019" S 125° 40' 8,275" E Jalan Tanpa Nama Aileu Altitude: 1243.2m Speed: 3.8km/h ADN Aileu Index number: 6685 25 Okt 2022 10:58:44 AM



ANEXU C1 (Le - 3)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projetu refere agora seidauk bele lao tamba orsamento exekuta hotu ona no hein pagamento maka foin bele komesa fila fali	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Le - 3)

Back-up Data

Naran Projeto : **Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)**
No. kontratu : **Grupo Komunitario**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Le - 3)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

--	--

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 3)

Back-up Data

Naran Projeto : **Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)**
No. kontratu : **Grupo Komunitario**

Sketch Item servisu



Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 25 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta, Remixio-Aileu

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8.709141** Latetude : **125.74044227**

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1 Merinho Cuco Lopes de Araújo**

2.

3.


4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item **Pasangan Batako ba iha Toilet**

Servisu nebe maka halao iha tereno maka
pasangan batako sopi sopi ba toilet

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

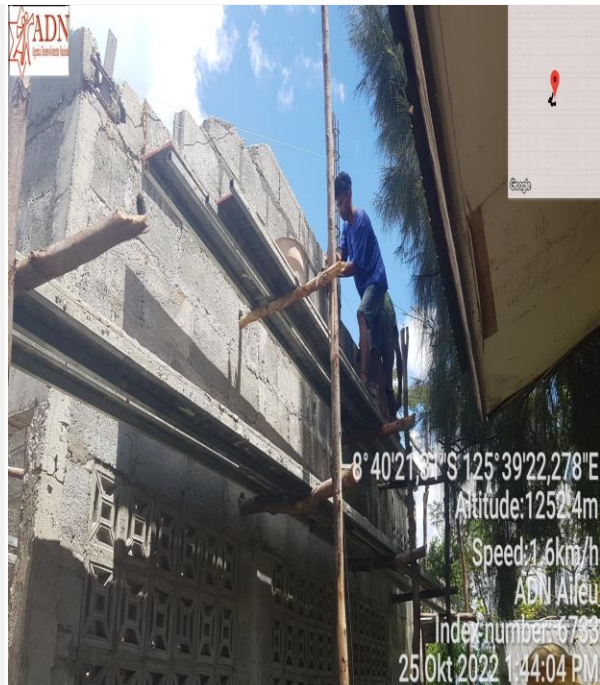



Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu instala Gording ba iha Prototipo C Item nebe maka halao iha tereno maka instala kuda kuda ba protipo C	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (AVL - 16)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu

No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230

Data Inspesaun : 13 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa , Aisirimou

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.719208862 Latetude : 125.570387095

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Servisu nebe kompanhia halao iha tereno hotu ona no hela deit maka servisu adisional no sei hein justifikasaun husi Owner.	 Altitude: 978.5m ADN Aileu Index number: 6422 13 Okt 2022 9:51:45 AM

ANEXU C1 (AVL - 16)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction Of Fence At CSI Aileu**

No. kontratu : **RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu nebe kompanhia halao iha tereno hotu ona no hela deit maka servisu adisional no sei hein justifikasaun husi Owner.	 Altitude: 978.5m ADN Aileu Index number: 6421 13 Okt 2022 9:51:43 AM
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu adisional balun nebe kompanhia halo iha BOQ liaha no hein justifikasaun ba owner kona ba item ida ne	 -8° 43'31,346"S 125° 33'56,499"E Aileu Altitude: 998.7m Speed: 0.1 km/h ADN Aileu Index number: 6412 13 Okt 2022 9:49:58 AM



ANEXU C1 (AVL - 16)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu

No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	

ANEXU C1 (AVL - 16)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu

No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu List Plafon	-8°43'31,466"S 125°83'57,439"E Aileu Altitude:995.7m Speed:0.0km/h Merinho Lopes ST Index number: 5359 28 Jul 2022 11:47:20 AM
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Finishing ba wall	Altitude:925m Merinho Lopes ST Index number: 5060 20 Jul 2022 3:52:41 PM

ANEXU C1 (AVL- 5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Cinsstruction Office CSS of Aileu District
No. kontratu : No: RDTL : 33/MSSI/ DGAF/DNA/XI/2021

Data Inspesaun : 03 Outubro 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Aisirimou

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item Servisu Pasangan batako ba interior konstrusaun nian	-8° 44' 8,425" S 125° 33' 57,012" E Aileu Altitude: 970,2m Speed: 1,6km/h ADN Aileu Index number: 6454 13 Okt 2022 10:05:48 AM
Sketch & Foto Desenho	

ANEXU C1 (AVL- 5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Cnstruction Office CSS of Aileu District
No. kontratu : No: RDTL : 33/MSSI/ DGAF/DNA/XI/2021

Sketch Item **pasangan batako**

Servisu Pasangan batako ba interior
konstrusaun nian



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu



ANEXU C1 (AVL- 5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Cnstruction Office CSS of Aileu District
No. kontratu : No: RDTL : 33/MSSI/ DGAF/DNA/XI/2021

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu pembesian Sloof post sekurity	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (AVL- 5)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: New Cnstruction Office CSS of Aileu District
: No: RDTL : 33/MSSI/ DGAF/DNA/XI/2021

--	--

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



ANEXU C1 (AVL- 5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Cnstruction Office CSS of Aileu District
No. kontratu : No: RDTL : 33/MSSI/ DGAF/DNA/XI/2021

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	

ANEXU C1 (AVL - 25)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli- Fatubosa Chainage
0+000 - 7+300 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-W-NCB-21025

Data Inpesaun : 14 / 10 / 2022

Fatin Inpesaun : Daisoli – Fatubosa, Aileu Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. -8.8378668), Latetude : (E. 125.5386965)

End Point : Long : (S. 8.83794), Latetude : (E. 125.53863)

Naran Inspector : 1. Eng. Rui Lopes
2. Eng. Celvio J. Alves

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu :	 14/10/22 10:17:08 8,82323S-125,54523E 83° E Timor-Leste Altitude: 1692.0m Speed: 0.4km/h Eng. Município Aileu Index number: 1606
	 14/10/22 10:42:36 8,80396S 125,55782E 51° NE Altitude: 1263.0m Speed: 0.0km/h Eng. Município Aileu Index number: 1613
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ANEXU C1 (AVL - 25)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli- Fatubosa Chainage
0+000 - 7+300 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-W-NCB-21025

Sketch Item servisu :

Stone masonry - finishe

Granular pavement - gravel

Stone masonry - finished

Stone masonry - finished



ANEXU C1 (ALV – 30)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000**

No. kontratu : **RT/139/MOP-2021**

Data Inspesaun : **19-10-2022**

;

Fatin Inspesaun : **Seloi Malere - Seloi Karaik**
Koordinadas :

Start Point : Long : S. -8.69714, Latetude: E. 125.53819

End Point : Long : S. -8.70731, Latetude: E. 125.53712

Naran Inspector : **1. Eng.**

2. Eng. Celvio Justino Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Site Camp - rehabilitation

Sub-base course

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (ALV – 30)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000**

No. kontratu : **RT/139/MOP-2021**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Sub-base course

Stone masonry - finished

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (ALV – 30)

Back-up Data

Naran Projeto

: **Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Cement concrete - structural concrete M20

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Cement concrete - structural concrete M20



Gabion

Gabion



ANEXU C1 (ALV – 30)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000**

No. kontratu : **RT/139/MOP-2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Gabions	

ANEXU C1 (ALV – 33)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Estrada Rural, Selo Kraik- Halmate, Aileu (3.5Km)

No. kontratu : RT/092/MOP-2021

Data Inspesaun : 19-10-2022

;

Fatin Inspesaun : Selo Kraik- Halmate

Koordinadas :

Start Point : Long : S. -8.71877, Latetude: E. 125.52328

End Point : Long : S. -8.72467, Latetude: E. 125.51182

Naran Inspector : 1. Eng.

2. Eng. Celvio Justino Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Site Camp

Excavation and disposal - soft soil

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (ALV – 33)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Rural, Selo Kraik- Halmate, Aileu (3.5Km)**

No. kontratu : **RT/092/MOP-2021**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Excavation and disposal - soft soil

Excavation and disposal - soft soil

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (ALV – 33)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Estrada Rural, Selo Kraik- Halmate, Aileu (3.5Km)

No. kontratu : RT/092/MOP-2021

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Cement concrete - structural concrete M20

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Cement concrete - structural concrete M20



Gabion

Gabion



ANEXU C1 (ALV – 33)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Rural, Selo Kraik- Halmate, Aileu (3.5Km)**

No. kontratu : **RT/092/MOP-2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Gabions	 02/09/22 12:17:19 8,70731S 125,53712E 8° N Altitude: 1167.0m Speed: 0.0km/h Eng. Municipio Aileu Index number: 1493

ANEXU C1 (ALV – 32)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu-kolohoho (Loop around Lake)**
Chainage, Aileu 5+000-8+000

No. kontratu : **RT/091/MOP-2021**

Data Inspesaun : **19-10-2022**

;

Fatin Inspesaun : **Seloi Malere - Seloi Karaik**
Koordinadas :

Start Point : Long : S. -8.71620, Latetude: E. 125.52129

End Point : Long : S. -8.70022, Latetude: E. 125.53210

Naran Inspector : **1. Eng.**

2. Eng. Celvio Justino Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Sub-base course

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sub-base course



ANEXU C1 (ALV – 32)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu-kolohoho (Loop around Lake)**
Chainage, Aileu 5+000-8+000

No. kontratu : **RT/091/MOP-2021**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Base course - crushed aggregate

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Base course - crushed aggregate



ANEXU C1 (ALV – 32)

Back-up Data

Naran Projeto

: **Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu-kolohoho (Loop around Lake)**
Chainage, Aileu 5+000-8+000

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Cement concrete - structural concrete M20

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Cement concrete - structural concrete M20



Gabion

Gabion



ANEXU C1 (ALV – 32)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu-kolohoho (Loop around Lake)**
Chainage, Aileu 5+000-8+000

No. kontratu : **RT/091/MOP-2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Gabions	

ANEXU C1 (AVL - 26)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Periodik Maintenance Kirlalo - Laclo Chainage Star
0+000 - 11+300 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-W-NCB-21025

Data Inspesaun : 24 / 10 / 2022

Fatin Inspesaun : Kirlalo Laclo – Aileu Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.81757), Latetude : (E.125.49602)

End Point : Long : (S. 8.81747), Latetude : (E. 125.49592)

Naran Inspector : 1. Eng.

2. Eng. Celvio J. Alves

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Cement concrete pavement - plum concrete	 24/10/22 15:07:35 24° NE Eng. Municipio Aileu Index number: 1671 24/10/22 15:07:49 134° SE Eng. Municipio Aileu Index number: 1673

ANEXU C1 (AVL - 26)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Periodik Maintenance Kirlalo - Laclo Chainage Star
0+000 - 11+300 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-W-NCB-21025

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Stone masonry - finished	 



ANEXU C1 (ALV – 34)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Estrada Rural, Raimansu - Fatubesi, Aileu (5.20Km)

No. kontratu : RT/093/MOP-2021

Data Inspesaun : 24 – 10 - 2022

;

Fatin Inspesaun : Raimansu - Fatubesi

Koordinadas :

Start Point : Long : S. -8.797366, Latetude: E. 125.526834

End Point : Long : S. -8.825281, Latetude: E. 125.519170

Naran Inspector : 1. Eng.

2. Eng. Celvio Justino Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Project signboard

Clearing

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (ALV – 34)

Back-up Data


Naran Projeto : Rehabilitasaun Estrada Rural, Raimansu - Fatubesi, Aileu (5.20Km)

No. kontratu : RT/093/MOP-2021

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Excavation and disposal - soft soil

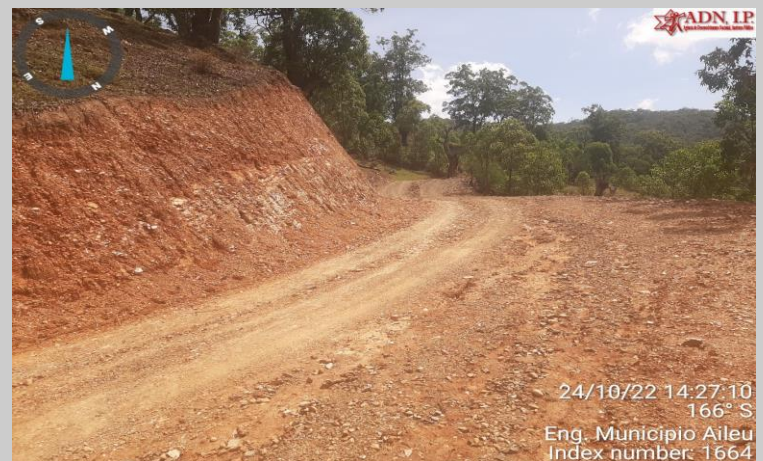



ANEXU C1 (ALV – 34)

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Cement concrete - structural concrete M20

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Cement concrete - structural concrete M20



Gabion

Gabion





ANEXU C1 (ALV – 34)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Estrada Rural, Raimansu - Fatubesi, Aileu (5.20Km)

No. kontratu : RT/093/MOP-2021

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Gabions	 02/09/22 12:17:19 8,70731S 125,53712E 8° N Altitude: 1167.0m Speed: 0.0km/h Eng. Municipio Aileu Index number: 1493

ANEXU C1 (LE - 66)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi- Dairlouta Chainage
0+000 - 5+000 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-CD-RFQ-21012

Data Inspesaun : 25 / 10 / 2022

Fatin Inspesaun : Fahisoi – Dairlouta, Lequidoe

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. -8.8378668), Latetude : (E. 125.5386965)

End Point : Long : (S. 8.83794), Latetude : (E. 125.53863)

Naran Inspector : 1. Eng.

2. Eng. Celvio J. Alves

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Cement concrete pavement - plum concrete	 25/10/22 12:24:36 8,69246S 125,63748E 344° N Altitude:1314.0m Speed:0.0km/h Eng. Municipio Aileu Index number: 1679 25/10/22 12:28:20 8,69244S 125,64083E 270° W Altitude:1278.0m Speed:0.0km/h Eng. Municipio Aileu Index number: 1681
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ANEXU C1 (LE - 66)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi- Dairlouta Chainage
0+000 - 5+000 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-CD-RFQ-21012

Sketch Item servisu :

Stone masonry - finished

Stone masonry - finished





ANEXU C1 (LE – 65)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality**

No. kontratu : **MOP-CD-NCB-21026**

Data Inspesaun : 25 / 10 / 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.66535), Latetude : (E.125.63998)

End Point : Long : (S. 8.68859), Latetude : (E. 125.69591)

Start Point : Long : (S. 8.67332), Latetude : (E.125.67735)

End Point : Long : (S. 8.66514), Latetude : (E. 125.69477)


Naran Inspector : Eng.

: Eng. Celvio J. Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Stone masonry

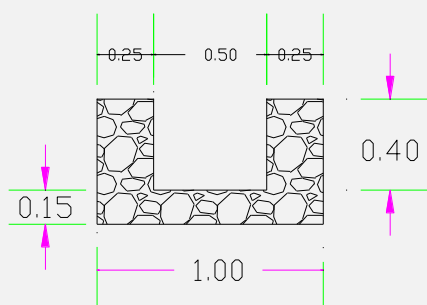

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Excavation and disposal - hard soil and
Stone masonry – finished






ANEXU C1 (LE – 65)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality**
No. kontratu : **MOP-CD-NCB-21026**



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Plum concrete (M20 - 1:1.5:3)

Plum concrete (M20 - 1:1.5:3)

Naruk : m

Naruk : m

Luan : 4.00 m

Mahar : 0.15 m

= m³

ANEXU C1 (ALV – 51)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Rehabilitation of Remexio to Lacle Sta 0+000-20+000 Package I**
Aileu Municipality

No. kontratu : **SSS / 139 / MOPTC - 2017**

Data Inspesaun : **27 – 10 - 2022**

Fatin Inspesaun : **Remexio**

Koordinadas :

Start Point : Long : S. -8.61184, Latetude: E. 125.66032

End Point : Long : S. -8.62895, Latetude: E. 125.79181

Naran Inspector : **1. Eng.**

2. Eng. Celvio Justino Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Gravel Surface Course

RCPC 100 mm diameter
Stone Masonry Wall
Gabion

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (ALV – 51)

Back-up Data

Naran Projeto

: **Road Rehabilitation of Remexio to Lacle Sta 0+000-20+000 Package I**
Aileu Municipality

No. kontratu


: **SSS / 139 / MOPTC - 2017**

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu :

Stone Masonry for RCPC 1000mm

Diameter

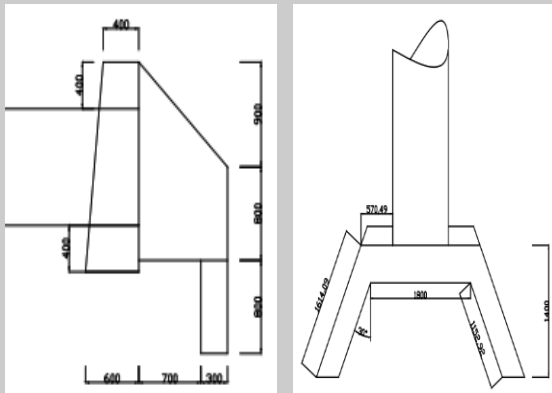

Line Drain : 424.30 m

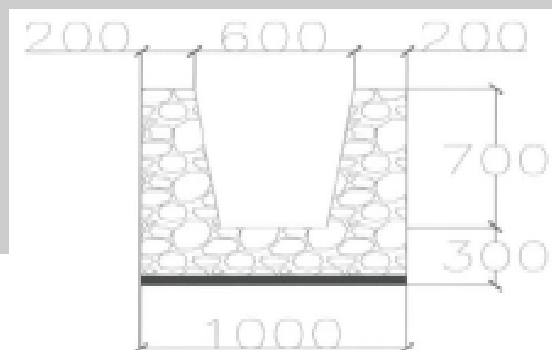

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Stone Masonry for RCPC 1000mm Diameter



Line Drain : 424.30 m





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV – 51)

Back-up Data

Naran Projeto

: Road Rehabilitation of Remexio to Lacle Sta 0+000-20+000 Package I
Aileu Municipality



ANEXU C1 (ALV – 51)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Rehabilitation of Remexio to Laclo Sta 0+000-20+000 Package I
Aileu Municipality**

No. kontratu : **SSS / 139 / MOPTC - 2017**



ANEXU C1 (RE – 52)

Back-up Data

Naran Projeto : **Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality**

No. kontratu : **MPW-W-210068**

Data Inspesaun : 27 / 10 / 2022

Fatin Inspesaun : Hera - Liurai

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.557405), Latetude : (E.125.709941)

End Point : Long : (S. 8.562408), Latetude : (E. 125.715361)

Naran Inspector : **Eng.**

: **Eng. Celvio J. Alves**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Cement concrete pavement - plum concrete Naruk : 144.17 m Luan : 4.00 m.12 Mahar : 0.12 m = 69.20 m³	Cement concrete pavement - plum concrete Naruk : 144.17 m  27/10/22 14:46:06 8,56214S 125,71694E 80° E Altitude: 689.0m Speed: 0.0km/h Eng. Municipio Aileu Index number: 1717 27/10/22 14:46:13 8,56214S 125,71694E 59° NE Altitude: 689.0m Speed: 0.0km/h Eng. Municipio Aileu Index number: 1718



ANEXU C1 (RE – 52)

Back-up Data

Naran Projeto : **Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu**
Municipality
No. kontratu : **MPW-W-210068**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Plum concrete (M20 - 1:1.5:3) Naruk : m Luan : 4.00 m Mahar : 0.15 m = m ³	Plum concrete (M20 - 1:1.5:3) Naruk : m

2022

[illegible]

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Naran Eng.	Merinho Cuco L. de Araujo						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Outubro																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Note:

Planu Periode inspesaun iha tercinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha T

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Proceso Pagamentu

Prepara Husi :



(Merinho Cuco L. de Araujo)
Eng. Municipiu Aileu

Sertifika Husi :



(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade

Aprova Husi :



(Eng. Janurio Maia Gutierrez)
Adjunto Director Executivo

MINISTÉRIO DO Povo, da Juventude e do Desporto REPÚBLICA SAMOA Ministry of the People, Youth and Sports ADN, LP Associação de Desenvolvimento Nacional, Lda Associação de Desenvolvimento Nacional, Lda							PLANU INSPESAUN																																	
Naran Eng.	Rui Lopes						2022																																	
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Outubro																															OBS	
AILEU VILA (AVT)	1	Rehabilitation of Sio Tecoluli roads Aileu	Mendith Uniplda	SSS/NG/IM/PTK-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Pagamento ikus (FHO) 100% baseia ba progreso rekomendasaun iha Setembro 2019 Falta Retenssaun (FHO)	
	2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Talforleu - Kolohoho Chainage 0+000 - 8+000 Municipiu Aileu	Cariq Unipessoal Lda in joint venture with Sumines Unip. Lda	NCB/020/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	25	R4D Rural Road Spot Improvement Daiosli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	Aileu ba Chin Unip. Lda	MOP-CD-RFQ-21011	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	26	R4D Rural Road Spot Improvement Kirlelo - Lacio Chainage 0+000 - 11+300 Aileu Municipality	Fikikay Unipessoal, Lda	MOP-W-NCB-21024	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	29	Rehabilitasaun Estrada Rural,Atuhulalan - Manufoni,Aileu 0+000-1+000 (1.0Km)	Hatutan Moris Unipessoal Lda	RTA/88/MOP-2021	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	30	Rehabilitasaun Estrada Rural,Talforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage. Aileu 0+000-2+000	URS Unipessoal, Lda Jv Star King Construction Unipessoal, Lda	KT/139/MOP-2021	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	31	Rehabilitasaun Estrada Rural,Talforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage. Aileu 2+000-5+000	Saksaur Unipessoal, Lda	RTA/90/MOP-2021	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	32	Rehabilitasaun Estrada Rural, Talforleu-kolohoho (Loop around Lake) Chainage. Aileu 5+000-8+000	Saksaur Unipessoal, Lda	RTA/91/MOP-2021	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
						Actual																																		
33	Rehabilitasaun Estrada Rural, seloi Kraik - Halmate, Aileu (3.5Km)	Aileu ba Chin Unip. Lda	RTA/92/MOP-2021	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
						Actual																																		
34	Rehabilitasaun Estrada Rural,Raimansu - Fatubesi,Aileu (5.20Km)	RACO LDA	RTA/93/MOP-2021	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
						Actual																																		
LAULARA (LA)	42	Rehabilitation of Bedacu Sarfala Roads (Ex. Japm) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	Mejori, Lda	SSS/103/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Pagamento ikus (FHO) 98.97% baseia ba progreso rekomendasaun iha Junho 2022 Falta Retenssaun (FHO)		
							Actual																																	
	46	Rural Roads Maintenance Fahisoi - Fadaboko Sta 0+000-8+200 Hatoho - Lepica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Ormai Sta 0+000 - 7+500 in Aileu Municipality	Remexio Furak Unip Lda	MPWTC-CD-17/0004	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Pagamento ikus (FHO) 84.68% baseia ba progreso rekomendasaun iha Novembro 2019 Falta Retenssaun (FHO)			
							Actual																																	
	47	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Luimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acmanu - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	Tin Los unip Lda	MPW-W/19/006	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Pagamento ikus (FHO) 88.97% baseia ba progreso rekomendasaun iha Junho 2022 Falta Retenssaun (FHO)			
							Actual																																	
48	Laulara Solerema Roads	Marino Enterprises, Lda	SSS/115/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS																																Pagamento ikus (FHO) 98.73% baseia ba progreso rekomendasaun iha Novembro 2017 Falta Retenssaun (FHO)			
49	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acmanu - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	Emmanuel Milerial	MPW-W-210141	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																	
REMEMIO (RE)	50	Rural Road Periodic Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 - 10+400 Dili & Aileu Municipality / 162	Nautetu I. II Unipessoal Lda	MPW-W-19/00081	LM-BS	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	51	Road Rehabilitation of Remexio to Lacio Sta 0+000-20+000 Package I Aileu Municipality	Mendith UnipLda	SSS/139/MOPTC-2017	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
52	Spot Improvement Hera - Luurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	Louacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																	
LEQUIDOE (LE)	56	R4D MPW Rural Roads rehabilitation Project in Aileu Bercken manicausa Package 2 Sta. 3+500-13+000	Seiara trapiti Unip. Lda	MPWTC-W-015016	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Pagamento ikus (FHO) 97.45% baseia ba progreso rekomendasaun iha Agustos 2017 Falta Retenssaun (FHO)			
							Actual																																	
	57	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadaboko Chainage 0+000 - 8+200 Namaleu - Faturilao Chainage 0+000 - 12+500 Fahisoi - Dairolta Chainage 0+000 - 2+600 and Hatoho - Lepica Chainage 0+000 - 2+500 Municipality Aileu / 162	Emmanuel Milerial	MPW-W-190103	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	58	Rural Roads Periodic Maintenance Aituhulalan - Manufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daiosli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300 Routine Maintenance Coula Udo Kirlelo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu / 162	URS Unip. Lda	MPW-W-190174	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Pagamento ikus (FHO) 98.25% baseia ba progreso rekomendasaun iha Janeiros 2022 Falta Retenssaun (FHO)			
							Actual																																	
	61	R4D Rural Road Spot Improvement Namaleu - Faturilao Chainage 0+000 - 14+000	URS Unip. Lda	MPW-W-210149	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
						Actual																																		
65	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadaboko Chainage 0+000 - 9+000 and Hatoho-Lepica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality	Blackbird Unip. Lda JV Chaicallade Unip. Lda	MOP-CD-NCB-21026	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																	
66	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Dairolta Chainage 0+000 - 5+000 Aileu Municipality	Raco Lda	MOP-CD-RFQ-21012	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																	
TOTAL PROJETO ON-GOING																																								

Note.

Planu Periode inspesaun iha tercinu

Implementa Planu Periode inspesaun iha Terceiru

Relatorio avaliasaun mensal iha Dili

Inspesaun Processu Pagamentu

Prepara Husi



(Eng. Rui Lopes)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irrigasaun ADN, LP

Sertifikatu Husi



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, LP

Aprova Husi




(Eng. Januario Maia Freitas)

Adjunto Director Executivo, ADN, LP

 MINISTERIO DO PLANO E DO DESENVOLVIMENTO  ADN, I.P.							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Celvio Justino Alves						2022																																
Municipio	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																						
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Outubro																															OBS
AILEU VILA (AVL)	1	Rehabilitation of Sioi Tocotolu roads Aileu	Mendith UnipLda	SSS.061.MOP/TC-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										Pagamento ikus (FHO) 100% baseia ba progresu rekomendasaun iha Setembro 2019 Falta Retensaun (FHO)						
							Actual																																
	2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolohoko Chainage 0+000 - 8+000 Municipality Aileu	Cavaj Unipessoal Lda in joint venture with Sumines Unip. Lda	NCR.020.MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	23	R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+500	Aileu ba Cn Unip. Lda	AKP-CTD-RFQ-21011	LAI-CTD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	26	R4D Rural Road Spot Improvement Kikileo - Lado Chainage 0+000 - 11+500 Aileu Municipality	Fikikay Unipessoal Lda	AKP-W-NCB-21024	LAI-CTD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	29	Rehabilitasaun Estrada Rural Aituluaram - Mamfoni Aileu 0+000 - 1+000 (1.0Km)	Hatutan Moris Unipessoal Lda	RT.088.MOP-2021	LAI-CTD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Projeto refere kompania seideuk halo mobilizasaun no seideuk iha atividade servico ruma iha tereno.					
							Actual																																
	30	Rehabilitasaun Estrada Rural Taliforleu - Kolohoko (loop around Lake) Chainage Aileu 0+000 - 2+000	LNG Unipessoal Lda JV Star King Construction Unipessoal Lda	RT.139.MOP-2021	LAI-CTD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Komp. la destaka site eng. no site supervisor iha site hodi akompania trabalador sira halo servico, no laha staf iha site camp hodi atende bainaka no servico iha tereno lao atraja liu.					
LAULARA (LA)	42	Rehabilitation of Beducu Saraka Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	Mejori Lda	SSS.0103.MOP/TC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										Pagamento ikus (FHO) 98.97% baseia ba progresu rekomendasaun iha Junho 2022 Falta Retensaun (FHO)						
							Actual																																
	46	Rural Roads Maintenance Fahisoi - Fadaboko Sta 0+000-8+200. Hotoho - Laquica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Ormai Sta 0+000 - 7+500 in Aileu Municipality	Remexio Turak Unip Lda	MPWTC-CTD-170004	LAI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										Pagamento ikus (FHO) 84.65% baseia ba progresu rekomendasaun iha Novembro 2019 Falta Retensaun (FHO)						
							Actual																																
	47	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Lisimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumant - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu - 162	Fin Les unipLda	MPW-W190086	LAI-CTD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										Pagamento ikus (FHO) 88.97% baseia ba progresu rekomendasaun iha Junho 2022 Falta Retensaun (FHO)						
							Actual																																
	48	Laulara Solerema Roads	Marino Enterprises Lda	SSS.113.MOP/TC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										Pagamento ikus (FHO) 98.73% baseia ba progresu rekomendasaun iha Novembro 2017 Falta Retensaun (FHO)						
							Actual																																
	49	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumant - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	Emmanuel Milenial	MPW-W-210141	LAI-CTD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	REMEKIO (RE)	50	Rural Road Periodic Maintenance Hero - Remexio Sta 0+000 - 10+400 Dili & Aileu Municipality - 162	Nautetu I, II Unipessoal Lda	MPW-W-1900081	LAI-B5	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																																
51		Road Rehabilitation of Remexio to Lado Sta 0+000 - 20+000 Package 1 Aileu Municipality	Mendith UnipLda	SSS.139.MOP/TC-2017	LAI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
LOQUIDOF (LD)	52	Spot Improvement Hera - Lualaba Sta 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	Lonacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	LAI-CTD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	56	R4D MPW Rural Roads rehabilitation: Project in Aileu Bereles manucasa Package 2 Sta. 3+500 - 13+000	Seiara Irapi Unip Lda	MPWTC-W-015016	LAI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										Pagamento ikus (FHO) 97.45% baseia ba progresu rekomendasaun iha Agustos 2017 Falta Retensaun (FHO)						
							Actual																																
	57	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadaboko Chainage 0+000 - 8+200 Namaleu - Faturlau Chainage 0+000 - 12+500 Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hantoho - Laquica Chainage 0+000 - 2+500 Municipality Aileu - 162	Emmanuel Milenial	MPW-W-190103	LAI-CTD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	58	Rural Roads Periodic Maintenance Aituluaram - Mamfoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+500 Routine Maintenance Cunda Udo Kikileo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu - 162	LNG Unip. Lda	MPW-W-190174	LAI-CTD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										Pagamento ikus (FHO) 98.25% baseia ba progresu rekomendasaun iha Janeiros 2022 Falta Retensaun (FHO)						
							Actual																																
61	R4D Rural Road Spot Improvement Namaleu - Faturlau Chainage 0+000 - 14+000	LNG Unip. Lda	MPW-W-210149	LAI-CTD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										Komp. la destaka site eng. no site supervisor iha site hodi akompania trabalador sira halo servico, no laha staf iha site camp hodi atende bainaka no servico iha tereno lao atraja liu.							
LAULARA (LA)	63	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadaboko Chainage 0+000 - 9+000 and Hantoho-Laquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality	Blackbird Unip. Lda JV Chaicallala Unip. Lda	AKP-CTD-NCB-21026	LAI-CTD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
66	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 5+000 Aileu Municipality	Raco Lda	AKP-CTD-RFQ-21012	LAI-CTD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										Komp. la destaka site eng. no site supervisor iha site hodi akompania trabalador sira halo servico, no laha staf iha site camp hodi atende bainaka no servico iha tereno lao atraja liu.							
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note.

 Planu Periode Inspesaun iha terenu
  Implementa Planu Periode Inspesaun iha Terenu
  Relatorio avaliasaun mensal iha Dili
  Inspesaun Procesa Pagamentu



Prepara Husi.

(Eng. Celvio Justino Alves)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun ADN, I.P.



Sertifica Husi.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.



Aprova Husi.

(Eng. Januario de Almeida Guterres)

Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.



 MINISTÉRIO DA SAÚDE UNIDADE DE CONTROLO E VALIDAÇÃO DE QUALIDADE UNIDADE DE CONTROLO E VALIDAÇÃO DE QUALIDADE							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares						2022																																
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Octo																															OBS
LEQUIDOE (LE)	43	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Fatuberli, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
							Actual																																
	45	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	46	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Urbadan	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	47	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili


Inspesaun Procesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Silvino B. R. Rebelo Soares)
Eng. Electricidade, ADN - I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN - I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN - I.P.



Naran Eng. Teresa Gomes									2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Municipio	MUNICIPIO DILI NO POSTOS																																						Observasaun																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		Outubro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
IMPRESTIMO	1	National road no. 1 Upgrading project Manatuto - Baucau (package A01-02)Package A01-02/sta 56+400-114+102(56.82km)	Shanghai Construcion Group Co.Ltd Jv PT. Brantas Abipraya(Persero)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Augusta da Costa Ferreira												2022																															Observasaun
Município	MUNICIPIO DILI NO POSTOS																																										
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		Outubro																																			
								Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo					
IMPRESTIMO	1	National road no. 1 Upgrading project Manatuto - Baucau (package A01-02)Package A01-02/sta 56+400-114+102(56.82km)	Shanghai Construction Group Co.Ltd Jv PT. Brantas Abipraya(Persero)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																Halo Relatorio Fulan Setembro				
							Actual																																				
	2	National road no. 1 Upgrading project Dili - Manatuto (package A01-01) (km 12+966.66-km 61+706.66)	Sinohydro Corporation Limited		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																FHO				
							Actual																																				
	3	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																Inspecsaun PBM 23				
							Actual																																				
	4	RNUSP/ Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Baucau - Lautem Section : Sta. 123 + 105 to Sta. 182 + 040 (with Exceptions)	CBMI Const.Co.,Ltd. / Chongqing Road Engineering (Group)Co.,Ltd (Joint venture)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																Inspecsaun ba pagamento				
							Actual																																				
	5	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Const.Co.,Ltd. / Chongqing Road Engineering (Group)Co.,Ltd (Joint venture)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																Halo Relatorio Pagamento				
							Actual																																				
	6	Road Network Upgrading Project (RNUP) Upgrading and Maintanace of Dili (Air Port Junction - Tibar)Road - Section 2 (Tasitolu - Tibar Road Link A03-01/ Sta 8 + 740 - Sta 13 + 290)	China Wu Yi Co.,Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																Halo Relatorio Pagamento				
							Actual																																				
	7	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrading project and maintainace of Dili- Ainaro Road Lot 3(Solerema - Bandudatu Section (Km 34 +620 - Km 64 + 000)(29km)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																FHO				
							Actual																																				
	8	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrading and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 4 Bandudatu-Aituto section (km 64+00 -km 89+000) (ICB/034/MPW-2013)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																FHO				
							Actual																																				
	9	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrading and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																FHO				
							Actual																																				
	10	Road Network Upgrading Sector Project Consulting Services : Preparation of Designs for 169 Km of National Roads (Baucau to Lospalos, Lautem to Com and Baucau to Viqueque) (ADB LOAN no . 3020 - TIM and 3021 - TIM)	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunlwa Engineering and Consulting Co.,Ltd.		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																Halo Relatorio Pagamento				
							Actual																																				
	11	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunlwa Engineering and Consulting Co.,Ltd.		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																Halo Relatorio Pagamento				
							Actual																																				
	12	Upgrading and Maintenance of Laclubar Jct Natarbora Roads Sta. 100+360 - 144+995 Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction CO.Lda		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																Inspecsaun ba Pagamento				
							Actual																																				
	13	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Laulara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili - Ainaro Road (Lots 1 - 5)	Kunlwa Eng. & Consulting Co.,Ltd in Joint Venture with Dongsung Eng. Co.,Ltd., and in Association with Desing Science, INC., and Kai Wata Kmanck Consultants, Unip.Lda		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																FHO				
							Actual																																				
	14	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620 km) Municipality Aileu	China Wu Yi Co.,Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																Halo Relatorio Pagamento				
							Actual																																				
	15	Consulting Services for Project Implementation and Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120), Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste.	Intercontinental Consultanst and Technocrats Pvt.Ltd. (India) in Association With Infra Consultants in the Philis. (Icp) Inc. (Philippines) (As Sub - Consultant) and Dezemvolve Timor Leste (Detile) Consultant. Lda (Timor Leste (As sub - Consultant)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																Halo Relatorio Pagamento				
							Actual																																				
	16	Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120)	China Railway JV COVEC		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																Halo Relatorio Pagamento				
							Actual																																				
	17	Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste.	China Railway JV COVEC		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																Halo Relatorio Pagamento				
							Actual																																				



IMPRESTIMO



2022

IMPRESTIMO

