



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU LAUTEM
DEZEMBRO 2022




SUMÁRIO
RELATÓRIO
IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO
LAUTEM DESEMBRO 2022

Prepara Husi :



(Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico
Beé no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P



(Eng. Deamantino Henrique Lopes)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P



(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Lautem,ADN,I.P



(Eng. Elnino Junior Araujo Mota)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN,
I.P



(Eng. Adonis Julio Fernades)
Eng. ba Projeito ME ADN, I.P

Verifika Husi :



(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
**Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu, ADN, I.P**



(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
**Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e
Irigasaun, ADN, I.P**



(Eng. Deolindo de F. Marques)
Chefe Seksaun ba Projetu M.E & ITC, ADN,

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
**Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN, I.P**

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T, M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	1
I. INTRODUSAUN	2
1.1 Enkuadramentu Legal	2
1.2 Perfil Municipio Lautem	2
1.3. Lista Projectos	8
II. PROGRESU FISIKU	23
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	23
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	24
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	24
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	25
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	25

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Lautem	6
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Lautem	6
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Lautem Por Fundus Finansiamentos	8
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Lautem Por Sectores	11
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Lautem Por Ministerio	17
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Lautem	23

I. INTRODUSAUN


1.1. Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Dekretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Presidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekretu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeńu, kustu no análise kustu-benefisiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekretu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2. Perfil Municipio Lautem

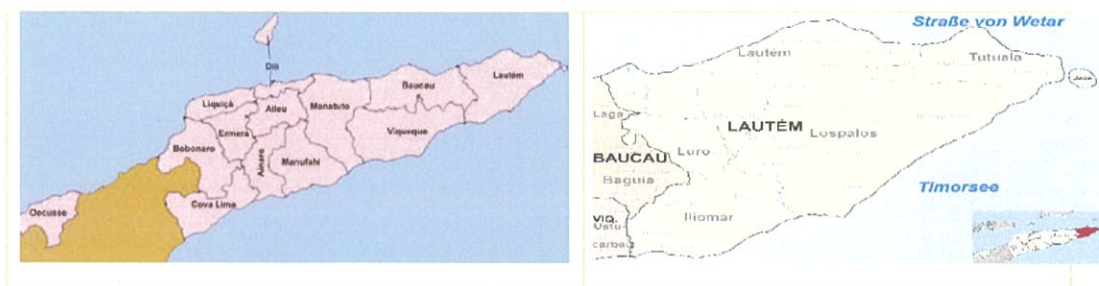

Mapa hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Lautem iha luan 1.702 km2 ho populasau 59.787 tuir Sensus 2010. Tabela 1 hatudu Administrasaun Munisipal Lautem iha Posto Administrativo 5 , Sukus 34 no aldeias 151.

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.

	Iliomar		Lautém		Lospalos	
	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Data	Ailebere	4	Baduro	5	Bauro	5
	Caenilo	5	Com	6	Cacave i	4
	fuat	3	Daudare	8	Fuiloru	11
	Iliomar I	5	Euquisi	3	Home	4
	Iliomar II	5	lilali	2	Leuro	4
	-	3	Maina I	5	Loré I	6
	-	3	Maina II	5	Loré II	3
	-	-	Pairara	4	Muapiti ne	5
	-	-	Parlamento	5	raça	3
	-	-	serelau	3	Souro	7
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	Total	28	-	46	-	52

husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 58

Luro		Tutuala	
Sukus	Aldeias	sukus	Aldeias
afabubu	2	Mehara	3
Baricafa	3	Tutuala	4
Cotamutu	3	-	
Lacawa	3	-	
Luro	5	-	
Vairoque	5	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	21	-	7

Tabela 1.1: Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Lautem.

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Lautem/ Lospalos								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	3	3				3	
2	Administrasaun no Financas	0	0				0	
3	Motorista	1	1				1	
4	Seguransa	0	0				0	
Total		4					4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Lautem

ASET ADN,IP MUNICIPIO LAUTEM								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	1	1					
2	Kareta	1	1					
3	Desktop HP / Monitor	1	1					
4	Laptop HP	1	1					
5	Printer Cannon	1	1					
6	UPS	1	1					
7	Armario File	2	2					
8	Armario Tau hena	3	3					
9	Meja escritorio	1	1					

10	Meja han	1	1					
11	Meja TV (kiik)	1	1					
12	Kadeira escritorio	6	6					
13	Kadeira han	4	4					
14	Sofa	1 Set	1 Set					
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3	3 Set	3 Set					
16	Jeleira	1	1					
17	Water Dispenser	1	1					
18	TV + Parabola	1 Set	1 Set					
19	Kipas Angin / AC	4	4					
20	Kompor	0	0					
21	Kompor Gas	1	1					
22	Rack sepatu	2	2					
23	Rack Piring	1	1					
24	Water Pump Sanyo	1	1					

1.3 : Lista Projectos

Projetu hotu ne'ebe akumulula iha lista ne'e bazeia ba dadus projetu ne'ebe sei lao hela no mos projeto ne'ebe abandona ona tinan barak, projeto hirak ne'e fahe tuir lista 1.3.1 Projeto Por Fundus Financiamento, 1.3.2 Projeto Por Sector no 1.3.3 Projeto Por Ministerio

1.3.1 : Lista Proyecto Municipio Lautem Por Fundus Finansiamento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI+Fundu Covid-19+LM-BS+LM-CD+LM-TP+PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Iliomar	10	\$ 2.523.285,03	32,82%
2	Lautem	8	\$ 12.396.944,68	79,52%
3	Loru	13	\$ 10.997.971,32	91,26%
4	Lospalos	29	\$ 11.632.061,99	62,90%
5	Tutuala	4	\$ 6.271.538,99	56,30%
	Grand Total	64	\$ 43.821.802,01	72,04%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Iliomar	2	\$ 496.832,66	73,85%
2	Lautem	3	\$ 11.851.338,35	80,57%
3	Loru	3	\$ 9.750.745,44	96,54%
4	Lospalos	4	\$ 4.693.761,44	84,02%
5	Tutuala	2	\$ 6.113.033,23	56,75%
	Grand Total	14	\$ 32.905.711,12	81,27%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Iliomar		\$ -	0,00%
2	Lautem		\$ -	0,00%
3	Loru		\$ -	0,00%
4	Lospalos	2	\$ 373.420,03	89,49%
5	Tutuala		\$ -	0,00%
	Grand Total	2	\$ 373.420,03	89,49%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Iliomar		\$ -	0,00%
2	Lautem	1	\$ 85.584,79	82,58%
3	Loru		\$ -	0,00%
4	Lospalos	5	\$ 1.017.957,22	46,27%
5	Tutuala		\$ -	0,00%
	Grand Total	6	\$ 1.103.542,01	49,09%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Iliomar	5	\$ 1.747.515,98	20,48%
2	Lautem	2	\$ 265.297,84	51,87%
3	Loru	4	\$ 606.439,09	61,28%
4	Lospalos	13	\$ 4.720.224,49	49,96%
5	Tutuala		\$ -	0,00%
	Grand Total	24	\$ 7.339.477,40	43,94%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Iliomar	3	\$ 278.936,39	37,11%
2	Lautem	2	\$ 194.723,70	51,81%
3	Loru	6	\$ 640.786,79	39,27%
4	Lospalos	3	\$ 429.359,96	48,72%
5	Tutuala	2	\$ 158.505,76	39,14%
	Grand Total	16	\$ 1.702.312,60	42,72%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Iliomar		\$ -	0,00%
2	Lautem		\$ -	0,00%
3	Loru		\$ -	0,00%
4	Lospalos	2	\$ 397.338,85	0,00%
5	Tutuala		\$ -	0,00%
	Grand Total	2	\$ 397.338,85	0,00%

1.3.2 : Lista Projecto Municipio Laudem Por Sector

NO	POR SECTOR	MUNICIPIO LAUTEM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMIENTO	3	\$ 815.564,95	0,00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	8	\$ 2.714.339,43	55,67%
3	EDUKASAUN	18	\$ 2.166.673,93	46,04%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1.026.193,79	69,98%
5	ESTRADAS	26	\$ 35.620.706,11	75,22%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	3	\$ 601.385,25	0,00%
7	SAUDE	2	\$ 373.420,03	0,00%
8	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	1	\$ 417.933,73	0,00%
9	TURISMO	1	\$ 85.584,79	0,00%
Grand Total		64	\$ 43.821.802,01	72,04%

NO	POR SECTOR	Iliomar		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMIENTO		\$ -	0,00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 280.206,72	88,16%
3	EDUKASAUN	3	\$ 278.936,39	37,11%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 432.643,32	72,00%
5	ESTRADAS	5	\$ 1.531.498,60	10,85%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
7	SAUDE		\$ -	0,00%
8	SOLIDARIEDADE E SOCIAL		\$ -	0,00%
9	TURISMO		\$ -	0,00%
	Grand Total	10	\$ 2.523.285,03	32,82%

NO	POR SECTOR	Lautem		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMIENTO		\$ -	0,00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0,00%
3	EDUKASAUN	2	\$ 194.723,70	51,81%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0,00%
5	ESTRADAS	5	\$ 12.116.636,19	79,94%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
7	SAUDE		\$ -	0,00%
8	SOLIDARIEDADE E SOCIAL		\$ -	0,00%
9	TURISMO	1	\$ 85.584,79	82,58%
	Grand Total	8	\$ 12.396.944,68	79,52%

NO	POR SECTOR	Loru		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0,00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0,00%
3	EDUKASAUN	6	\$ 640.786,79	39,27%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 593.550,47	68,51%
5	ESTRADAS	6	\$ 9.763.634,06	96,05%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
7	SAUDE		\$ -	0,00%
8	SOLIDARIEDADE E SOCIAL		\$ -	0,00%
9	TURISMO		\$ -	0,00%
Grand Total		13	\$ 10.997.971,32	91,26%

NO	POR SECTOR	Lospalos		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 815.564,95	0,00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	7	\$ 2.434.132,71	51,93%
3	EDUKASAUN	5	\$ 893.721,29	53,66%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0,00%
5	ESTRADAS	8	\$ 6.095.904,03	67,16%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	3	\$ 601.385,25	0,00%
7	SAUDE	2	\$ 373.420,03	0,00%
8	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	1	\$ 417.933,73	0,00%
9	TURISMO		\$ -	0,00%
	Grand Total	29	\$ 11.632.061,99	62,90%

NO	POR SECTOR	Tutuala		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMIENTO		\$ -	0,00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0,00%
3	EDUKASAUN	2	\$ 158.505,76	39,14%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0,00%
5	ESTRADAS	2	\$ 6.113.033,23	56,75%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0,00%
7	SAUDE		\$ -	0,00%
8	SOLIDARIEDADE E SOCIAL		\$ -	0,00%
9	TURISMO		\$ -	0,00%
	Grand Total	4	\$ 6.271.538,99	56,30%

1.3.3 : Lista Projecto Municipiu Lautem Por Ministerio

NO	POR SECTOR	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 397.338,85	0,00%
2	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	34	\$ 38.063.850,10	74,33%
3	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	19	\$ 2.474.390,58	46,08%
4	MINISTERIO FINANCAS	1	\$ 56.783,85	80,85%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	2	\$ 962.218,72	55,09%
6	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 653.626,75	88,92%
7	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	\$ 417.933,73	86,66%
8	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA	1	\$ 710.074,64	76,83%
9	SEFOPE	1	\$ 85.584,79	82,58%
Grand Total		64	\$ 43.821.802,01	72,04%

NO	POR SECTOR	Iliomar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0,00%
2	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	6	\$ 1.964.141,92	24,32%
3	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	3	\$ 278.936,39	37,11%
4	MINISTERIO FINANÇAS		\$ -	0,00%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
6	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 280.206,72	88,16%
7	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN		\$ -	0,00%
8	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA		\$ -	0,00%
9	SEFOPE		\$ -	0,00%
	Grand Total	10	\$ 2.523.285,03	32,82%

NO	POR SECTOR	Lautem		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0,00%
2	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	\$ 12.116.636,19	79,94%
3	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 194.723,70	51,81%
4	MINISTERIO FINANCAS		\$ -	0,00%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
6	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0,00%
7	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN		\$ -	0,00%
8	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA		\$ -	0,00%
9	SEFOPE	1	\$ 85.584,79	82,58%
	Grand Total	8	\$ 12.396.944,68	79,52%

NO	POR SECTOR	Loru		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0,00%
2	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	7	\$ 10.357.184,53	94,47%
3	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	6	\$ 640.786,79	39,27%
4	MINISTERIO FINANCAS		\$ -	0,00%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
6	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0,00%
7	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN		\$ -	0,00%
8	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA		\$ -	0,00%
9	SEFOPE		\$ -	0,00%
Grand Total		13	\$ 10.997.971,32	91,26%

NO	POR SECTOR	Lospalos		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 397.338,85	0,00%
2	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	14	\$ 7.512.854,23	64,91%
3	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	6	\$ 1.201.437,94	51,79%
4	MINISTERIO FINANCAS	1	\$ 56.783,85	80,85%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	2	\$ 962.218,72	55,09%
6	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 373.420,03	89,49%
7	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	\$ 417.933,73	86,66%
8	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA	1	\$ 710.074,64	76,83%
9	SEFOPE		\$ -	0,00%
	Grand Total	29	\$ 11.632.061,99	62,90%

NO	POR SECTOR	Tutuala		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0,00%
2	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	2	\$ 6.113.033,23	56,75%
3	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 158.505,76	39,14%
4	MINISTERIO FINANCAS		\$ -	0,00%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0,00%
6	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0,00%
7	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN		\$ -	0,00%
8	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA		\$ -	0,00%
9	SEFOPE		\$ -	0,00%
	Grand Total	4	\$ 6.271.538,99	56,30%

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Lautem

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Idade la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Iliomar	7,401	1,685	1,971	1,828	1,917
Lautém	16,400	4,376	4,645	3,704	3,676
Lospalos	32,336	9,067	9,699	6,814	6,756
Luro	7,266	1,988	1,948	1,677	1,653
Tutuala	3,563	911	1,014	821	817

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan nia laran, husi lista #anexu B hatudu progresu aktual fulan ida ne'e ho nia prensentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu prentangen aktual fulan ida ne'e hatudu progresu fisiku komulativu husi prosentu anterior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare iha #anexu B, detallu ba back-up #anexu C, no Instrusaun Servisu #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Durante ami nia monitorizasaun ba projecto hotu nebe mak lokaliza iha Munisipio Lautem, ami hasoru obstáclu sira hanesan tuir mai ne'e :

- Rekursu umanu seidak sufisien (enginheiro,driver,administrasaun).
- Mina La Suficiente
- Ba projecto sira nebe'e ho distancia do'ok no kondisaun estrada mos la dun diak (a'at), hanesan posto administrativo Luro no Iliomar, deficil mai ami atu halo monitorizasaun kada fulan dala tolu ou ha'at
- Ekipamentus apoio servisu sei avaria (Komputador no Laptop).
- Sistema rekolhamentu dados inspeksaun no folder system balun sei dupla hela.
- Kapasidade folder system la to'o atu guarda/save dados inspeksaun tomak ne'ebe barak.
- Kompanhia barak mak servisu la tuir tempo kontratu nebe'e mak iha
- Rekursu umanu ou engenheiro companhia nian la suficiente
- Projeito balun nebe'e mak abandona ou parrado iha tinan barak nia laran

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

Bazeia ba obstákulu ne'ebe iha leten maka ami rekomenda atu :

- Presija aumenta tan rekursu umanu atu bele aselera no fasilita prosesu servisu tomak iha Munisipio.
- Presija Aumenta tan Kupon Mina ba Kareta
- Husu mos ba Superior ADN,I.P atu tolera mos ami hodi halo monitorizasaun ba projeto nebe mak lokaliza iha posto administrativo Luro no Iliomar, se bele kada fulan maksimal dala rua tanba hare ba nia distancia nebe'e mak do'ok no kondisaun Estrada mos a'at
- Presija hadia ka troka ekipamentu apoio servisu ninian hanesan Komputador no Laptop, tamba dala barak sempre avaria/error bainhira ita uja hodi halo servisu.
- Sistema Rekolhamentu dadus inspeksaun ninian sei dupla hela, liu liu hanesan site instruction format ne'ebe iha rua (ida ita terrenu no ida fali iha sistema laran).
- Presija minimiza ka halo rezumu ba rekolhamentu dadus folder system ne'ebe dupla.
- Presija aumenta tan kapasidade/memory folder system nian halo boot, atu nune'e be'e akumula dados inspeksaun sira hotu ne'ebe iha.
- Husu mos ba Superior A D N I.P atu se bele koordena ho projeto nain sira hodi fo sansaun ka penalidade ba kompanhia sira nebe mak servico atraza ou abandona servico hodi han tempo to'o tinan 2 ba leten

Note: Asinatura Husi Eng. Municipio Lautem

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Lautem						
No	Deskrisaun	Identidade				Asinatura
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	
1	Enjineiru	Inocencio dos Reis Costa Maia	208	Enjineiru EPAS		
		Geovanio M. X. Carlos Aleixo	164	Enjineiru ITI		
		Deamantino Henrique Lopes	213	Enjineiru ITI		

		Adonis Julio Fernandes	152	Enjineiru ME		
		Elnino Junior Aroujo Mota	242	Enjineiru ITI		
		Quico Adelino Junior	240	Enjineiru EPAS		
2	Enjineira	Olivia Soares	112	Enjineira VEBD		

3	Motorista	Delio Abel Manuel Ferreira	159	Motorista		
---	-----------	-------------------------------	-----	-----------	---	---



#ANEXU A (LISTA GERAL)

Localizaçaun Projeto																
NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	NARAN KONT.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	STATUS PROJECTO	OBS
1	Rehabilitation of Lalen Road Project Road Section (Sta. 0+000 - 6+210) Maina 2 in Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lautem	Lautem	Corcorcio Irlayvon, Lda	SSS/117/MOPTC-2016	\$ 4,782,693.68	July 25, 2016	87.20%	71.50%	\$ 3,419,406.76	\$ 1,363,286.92	ON-GOING	
2	Rehabilitation Roads Maina 1 to parlamento 3.916 km	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lautem	Lautem	Samudra Unip, Lda	SSS/100/MOPTC-2017	\$ 3,039,825.77	Sept. 12, 2017	99.91%	86.30%	\$ 2,623,270.63	\$ 416,555.14	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 2.87%
3	Rural Roads Periodic Maintenance Dasidara Lequidiga 0+000 - 10+000 Chainage Municipality Lautem (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lautem	Lautem	Franam Lindo Unip. Lda	MPW-W-RTQ-190038	\$ 84,077.42	Oct. 29, 2013	56.05%	49.46%	\$ 41,581.46	\$ 42,495.96	ON-GOING	
4	Projectu Konstrusaun Turismu Komunitariu iha COM, Postu Administrativu Lautem	SEFOPE	LM-BS	TURISMO	Lautem	Lautem	Joli Toni Unip Lda	17/CNEFP?XI/2016	\$ 85,584.79	Nov. 3, 2016	91.76%	82.58%	\$ 70,676.00	\$ 14,908.79	PENDENTE	
5	Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 8+000 - 15+200 Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lautem	Lautem	Fian Const. Unip. Lda	SSS/144/MOPTC-2017	\$ 4,028,818.90	Sept. 12, 2017	94.70%	85.07%	\$ 3,427,375.18	\$ 601,443.72	ON-GOING	
6	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT DASIDARA - LIQUIDIGA CHAINAGE 0+000-10+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lautem	Lautem	ILIE CHAO, UNIPESAOAL LDA	MPW - W - 210078	\$ 181,220.42	16-Jul-21	46.87%	37.65%	\$ 68,224.52	\$ 112,995.90	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 19.59%
7	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Euquisi iha Aldeia Barlio Suco Euquisi Postu Administrativu Lautem Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lautem	Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 EUQUISI	-	\$ 105,204.19	Oct. 15, 2021	52.36%	0.00%	\$ -	\$ 105,204.19	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 1.34%
8	Rehabilitasaun ba EBF Tasi Ibut Lautem iha Aldeia Lautem Suco Parlamento Postu Administrativu Lautem Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lautem	Lautem	MEJD PKRIE EBF TASI IBUN LAUTEM	-	\$ 89,519.51	Oct. 15, 2021	54.90%	0.00%	\$ -	\$ 89,519.51	ON-GOING	
9	Konstrusaun Monumento Nino Konis Santana no Jardim iha Escola Secundaria Nino Konis Santana Publica LAUTEM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	Amor Construction	RDTL 2016	\$ 66,333.92	Dec. 16, 2016	95.72%	86.14%	\$ 57,143.15	\$ 9,190.77	PENDENTE	
10	Konstrusaun foun ba Edificio procuradoria Distrital, Residente no Edificio ba Apoio nian iha Suco Fuiloro, Municipio Lautem	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Cambota. Lda	RDTL- D.FeO/APRO/PGR/19.00 1/2019	\$ 710,074.64	Oct. 17, 2019	87.23%	72.65%	\$ 515,876.85	\$ 194,197.79	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 3.95%
11	Rural Road Rehabilitation Fuiloro - Home Chainage 1+200 - 2+500 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lospalos	Lautem	Paiahara Unipessoal Lda	RT/033/MOP - 2019	\$ 287,376.91	Jan. 22, 2020	67.48%	55.47%	\$ 159,418.56	\$ 127,958.35	ON-GOING	
12	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Lautem, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Lospalos	Lautem	Parapa Bemizuu Star Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-189	\$ 88,631.06	Nov. 1, 2021	92.09%	80.79%	\$ 71,603.01	\$ 17,028.05	ON-GOING	
13	Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct Assalaino to Caicavamoko Sta. 0+000 - 8+000 km municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	Salve, Unip. Lda	SSS/143/MOPTC-2017	\$ 4,092,376.19	Sept. 12, 2017	93.60%	84.24%	\$ 3,447,516.79	\$ 644,859.40	ON-GOING	
14	Routine Maintenance Lospalos - Souro Chainage 0+000 - 5+800, Routine Maintenance Leuro - Sorulua Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lospalos	Lautem	Afabubo f. Unip Lda.	RFQ/222/MOPTC-2016	\$ 49,805.16	July 11, 2016	96.47%	86.83%	\$ 43,243.66	\$ 6,561.50	ON-GOING	
15	Road Maintenance Sections : Lospalos - Iliomar Section (A082 - 2) Municipality Lautem (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	Lero Company, Lda	MPW-W-190120	\$ 219,745.45	Sept. 16, 2019	92.80%	83.52%	\$ 183,526.66	\$ 36,218.79	PENDENTE	
16	Prefurasaun Sistema Be'e mos iha Suku PA'Papa Postu Adm. Lospalos Vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Lospalos	Lautem	Mai Moco	MPWTC-NCB-170007	\$ 140,470.95	Aug. 25, 2017	80.38%	72.34%	\$ 101,622.87	\$ 38,848.08	PENDENTE	
17	Konstrusaun Edificio CDS Lospalos Inklui Armagem no pavimento	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Lospalos	Lautem	Delta Dini	RDTL 15/MSS/DNFALM-DAD/XII/2015	\$ 417,933.73	July 20, 2015	96.29%	86.66%	\$ 362,176.33	\$ 55,757.40	PENDENTE	
18	Konstrusaun no Instalasaun Sistema Be'e Mos iha Aldeia Homokanu, Foemaa, Nanakuru no EBF Soru Posto Administrativo Lospalos Vila, Municipio Lautem/ 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Lospalos	Lautem	Paza Conis Unip Lda	NCB-MOP-190063	\$ 255,685.00	Dec. 1, 2019	25.15%	22.64%	\$ 57,875.81	\$ 197,809.19	PENDENTE	
19	Konstrusaun Be'e Mos Sistema Pompa no Gravitasau,Tchay Titiary, Nuhalaria, Posto Administrativo Lospalos Vila, Municipio Lautem/ 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Lospalos	Lautem	Ukat Mape Goll Unip Lda	NCB-MOP-190062	\$ 419,409.00	Dec. 1, 2019	33.53%	30.18%	\$ 126,557.78	\$ 292,851.22	PENDENTE	
20	Rural Road Rehabilitation Fuiloro - Home Chainage 0+000 - 1+200 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lospalos	Lautem	Paiahara Unipessoal Lda	RT/032/MOP - 2019	\$ 264,203.18	Jan. 22, 2020	96.58%	85.00%	\$ 224,583.73	\$ 39,619.45	ON-GOING	
21	Building Minor Maintenance East Side (Manatuto, Baucau, Lospalos & Viqueque	MINISTERIO FINANÇAS	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Prify Unip Lda	01 - Prify - MOF/DGCS.2019	\$ 56,783.85	Jan. 15, 2019	80.85%	80.85%	\$ 45,907.81	\$ 10,876.04	PENDENTE	
22	Rural Roads Periodic Maintenance Lospalos Soru Chainage 0 + 000 - 2 + 500, Lautem Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	Uiau Unip. Lda	MPW-W: 190110	\$ 216,525.57	March 9, 2019	100.00%	100.00%	\$ 216,525.57	\$ -	ON-GOING	
23	Konstrusaun Fatin Izolamentu iha CHC Lospalos Municipiu Lautem	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Lospalos	Lautem	RICS Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-253	\$ 284,788.97	Dec. 9, 2020	91.94%	66.51%	\$ 189,409.82	\$ 95,379.15	ON-GOING	
24	New Construction Of Houses For Veteran 8 Unit	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Davinci	001/RDTL/MPIE/AND/DIL/VI/2016	\$ 788,921.55	Aug. 06, 2016	54.54%	49.09%	\$ 387,253.22	\$ 401,668.33	FHO	Projecto Fonaliza ona (Cancela)
25	Konstrusaun Murru Haleu Edifisiu Administasaun Munisipiu no Jardim Municipiu Lautem	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Marvong Construction Unip.Lda	02/KML-PDIM/SMA/X/2021	\$ 145,363.15	8-Jul-21	6.87%	0.00%	\$ -	\$ 145,363.15	ON-GOING	
26	Rehabilitasaun Residencia Adminitrador + Murru no Jardim Municipio Lautem	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Marvong Construction Unip.Lda	01/KML-PDIM/SMA/X/2021	\$ 251,975.70	8-Jul-21	6.18%	0.00%	\$ -	\$ 251,975.70	ON-GOING	
27	R4D RURAL ROADS SPOT IMPROVEMENT LEURO - SOURULUA CHAINAGE 0+000-2+650	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	KOMI ARA UNIPESAOAL LDA	MPW - W -210080	\$ 271,648.79	16-Jul-21	58.19%	32.77%	\$ 89,027.59	\$ 182,621.20	ON-GOING	
28	Projetu Konstrusaun Foun ESTV Lospalos	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Lero Company, Lda	NCB:14/MEJD/DNA/2021	\$ 307,716.65	Nov. 26, 2021	65.81%	29.20%	\$ 89,840.57	\$ 217,876.08	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 19.05%
29	kontrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF No-2 Lospalos	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	MEJD PKRIE EBF NO2 LOSPALOS	-	\$ 108,612.72	Oct. 15, 2021	56.44%	36.92%	\$ 40,097.35	\$ 68,515.37	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 19.52%
30	Rehabilitasaun ba Pre Escolar Ira - Ara iha Aldeia Lospala Suco Fuiluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	MEJD PKRIE PRE ESCOLAR IRA-ARA	-	\$ 111,729.45	Oct. 15, 2021	65.32%	63.05%	\$ 70,441.58	\$ 41,287.87	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 19.53%

					Localizasaun Projeto												
NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	NARAN KONT.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	STATUS PROJECTO	OBS	
31	Rehabilitasaun ba ESG Lere Anan Timur Lospalos iha Aldeia Kuluhun Suco Fuiuro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	MEJD PKRIE ESG LERE ANAN TIMOR LOSPALOS	-	\$ 209,017.79	Oct. 15, 2021	48.61%	28.17%	\$ 58,890.76	\$ 150,127.03	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 20.31%	
32	Konstrusaun Foun ba ESTV Laico Lospalos Municipio Lautem	EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	Salve, Unip. Lda	CNB:013/MEJD/DNA/2021	\$ 398,027.41	Feb. 14, 2022	69.34%	43.63%	\$ 173,654.38	\$ 224,373.03	ON-GOING		
33	Rehabilitasaun Estrada Rural,Fuiloro - Home Chainage, Lautem 2+500-3+500 (1.0 Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	Afi Hini Unipessoal. Lda	-	\$ 198,260.01	-	20.29%	0.00%	\$ -	\$ 198,260.01	ON-GOING		
34	Rehabilitation Of The Rural Road Fuiuro - Maupitine Chainage 0+000-2+000, Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	Vivacious Form Unipessoal. Lda	-	\$ 342,407.60	-	1.41%	0.00%	\$ -	\$ 342,407.60	ON-GOING		
35	Rehabilitation of the Rural Road Fuiuro - Maupitine Chainage 2+000-4+000, Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	Tchai Celeiro unipessoal. Lda	-	\$ 344,971.59	-	15.50%	0.00%	\$ -	\$ 344,971.59	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 10.87%	
36	Rehabilitation of the Rural Road Fuiuro - Maupitine Chainage 4+000-7+000 Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	Kako Anik Unipessoal. Lda	-	\$ 409,968.83	-	24.97%	22.42%	\$ 91,912.51	\$ 318,056.32	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 4.52%	
37	Complition of Veteranus Houses - Lospalos Municipality Lautem	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Venjus Unip. Lda	NCB/010CD/ADN,IP/MPO /V/DILI/2022	\$ 173,297.17	May 12, 2022	80.45%	72.40%	\$ 125,472.11	\$ 47,825.06	ON-GOING		
38	New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ulukisi, Ailembere, and Liarafa, Luro - Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Loru	Lautem	Vairoque Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000432	\$ 593,550.47	Sept. 1, 2016	81.25%	68.51%	\$ 406,628.69	\$ 186,921.78	ON-GOING		
39	Rehabilitation of Road Laivai - Vairoque - Liarava Roads Sta. 0+000 - 7+250 (7.25 km) Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Loru	Lautem	Hoven II, Unip. Lda	SSS/140/MOPTC-2017	\$ 4,207,194.97	Sept. 7, 2017	99.82%	99.82%	\$ 4,199,689.10	\$ 7,505.87	FHO	Projecto Fonaliza ona	
40	Rural Roads Periodic Maintenance Luro - Barikafa Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Lautem (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loru	Lautem	Perekiki, Unipessoal Lda	MPW-W-NVB-R-190041	\$ 161,431.38	Aug. 22, 2013	88.25%	79.42%	\$ 128,214.45	\$ 33,216.93	ON-GOING		
41	Rehabilitation of Luro - Buihomau Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Loru	Lautem	Consorcio ASCEM "CACM" Lda"	MPW-W-13-005	\$ 4,950,000.00	Oct. 1, 2012	97.11%	97.11%	\$ 4,806,765.20	\$ 143,234.80	FHO	Projecto Fonaliza ona	
42	Rural Roads Periodic Maintenance Luro - Kotamutu - Lakawa Chainage 0+000 - 6+500 Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loru	Lautem	Cambota. Lda	MPW-W:190095	\$ 62,781.36	Aug. 02, 2019	79.23%	64.69%	\$ 40,614.46	\$ 22,166.90	ON-GOING		
43	R4D Rural Road Spot Improvement Luro - Barikafa Chainage 0+000+7+000 Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loru	Lautem	Lili Unip. Lda.	MPW - W 210079	\$ 249,614.09	16-Jul-21	43.60%	37.77%	\$ 94,284.64	\$ 155,329.45	ON-GOING		
44	R4d Rural Road Spot Improvement Luro - Kotamutu - Lakawa Chainage 0+000-6+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loru	Lautem	ILIE CHAO, UNIPESSOAL LDA	MPW - W - 210077	\$ 132,612.26	16-Jul-21	66.69%	55.92%	\$ 74,159.78	\$ 58,452.48	ON-GOING		
45	Rehabilitasaun ba EBF Abere iha Aldeia Abere Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE EBF ABERE	-	\$ 103,671.57	Oct. 15, 2021	29.04%	25.99%	\$ 26,943.55	\$ 76,728.02	ON-GOING		
46	Rehabilitasaun ba Pre Escolar Amaira Luro iha Aldeia Amaira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE PRE ESCOLAR AMAIRA LURO	-	\$ 88,217.01	Oct. 15, 2021	42.39%	30.90%	\$ 27,260.91	\$ 60,956.10	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 6.54%	
47	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Barikafa iha Aldeia Sarelari Suco Baricafa Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 BARIKAFa	-	\$ 86,976.71	Oct. 15, 2021	58.99%	30.31%	\$ 26,363.46	\$ 60,613.25	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 28.68%	
48	Rehabilitasaun ba EBC Luro iha Aldeia Amaira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE EBC LURO	-	\$ 82,737.98	Oct. 15, 2021	55.71%	33.73%	\$ 27,911.40	\$ 54,826.58	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 12.68%	
49	Rehabilitasaun ba ESG Fernando Lasama de Luro iha Aldeia Amahira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE LURO	-	\$ 182,929.22	Oct. 15, 2021	29.01%	25.03%	\$ 45,786.02	\$ 137,143.20	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 3.79%	
50	Rehabilitasaun ba EBF Ussuvasu iha Aldeia Ussufasu Suco Baricafa Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE EBF USSUVASU	-	\$ 96,254.30	Oct. 15, 2021	53.74%	35.90%	\$ 34,551.96	\$ 61,702.34	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 17.84%	
51	New Installation MV, LV Line and House Connection from Ailebere to Pujiara, Arafalun and Ledo Ira, Iliomar - Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Iliomar	Lautem	Lor Construction Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000363	\$ 432,643.32	July 6, 2016	84.35%	72.00%	\$ 311,503.19	\$ 121,140.13	ON-GOING		
52	Rehabilitation of Road and Drainage Slope Protection Municipality of Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Iliomar	Lautem	Resister Unip.Lda	SSS/140/MOPTC-2016	\$ 64,189.34	Nov. 7, 2016	86.34%	86.34%	\$ 55,421.93	\$ 8,767.41	FHO	Projecto Fonaliza ona	
53	New construction of health post and doctor house building in fuat,Lautem,Iliomar	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Iliomar	Lautem	Naesalobu	RDTL-MS-DNA-ICB-21-072	\$ 280,206.72	Aug. 13, 2021	98.28%	54.30%	\$ 152,146.48	\$ 128,060.24	ON-GOING		
54	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Ta - Besi Fera Nabem - Fuat iha Aldeia Acadilro Suco Fuat Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Iliomar	Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 TA BESI FERA NABEN-FUAT	-	\$ 80,768.69	Oct. 15, 2021	40.75%	30.41%	\$ 24,562.73	\$ 56,205.96	ON-GOING		
55	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Tirilolo iha Aldeia Tirilolo Suco Tirilolo Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Iliomar	Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 TIRILOLO	-	\$ 81,437.95	Oct. 15, 2021	63.43%	45.64%	\$ 37,171.37	\$ 44,266.58	ON-GOING		
56	Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Iliomar	Lautem	MEJD PKRIE EBC DE ILIOMAR	-	\$ 116,729.75	Oct. 15, 2021	27.20%	24.56%	\$ 28,664.97	\$ 88,064.78	ON-GOING		
57	Roads Maintenance section Lospalos - Iliomar (A08-3) 2021 Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Iliomar	Lautem	Venjus Unip. Lda	MPW-W220015	\$ 326,103.83	Feb. 14, 2022	47.70%	33.97%	\$ 110,768.90	\$ 215,334.93	ON-GOING		
58	Rehabilitation Road Cainliu - Larisula Chainage 2+700 - 5+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Iliomar	Lautem	Brovven Unipessoal. Lda	-	\$ 395,790.81	-	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 395,790.81	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 0.96%	
59	Rehabilitation Road Cainliu - Larisula Chainage 8+750 - 11+050	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Iliomar	Lautem	Tapirae Unipessoal. Lda	RT/026/MOP-2021	\$ 434,498.75	March 8, 2022	2.49%	0.00%	\$ -	\$ 434,498.75	ON-GOING		
60	Rehabilitation Road Cainliu - Larisula Chainage 11+050 - 13+050	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Iliomar	Lautem	Om Brothers Unipessoal. Lda	-	\$ 310,915.87		0.00%	0.00%	\$ -	\$ 310,915.87	ON-GOING		
61	Road Rehabilitation From Tutuala to Valu Chainage 0+000 - 3+850 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Tutuala	Lautem	Consorcio Vacu-Hiamoinu Lda	SSS/063/MOPTC-2017	\$ 3,104,481.77	Aug. 25, 2017	67.71%	55.35%	\$ 1,718,327.23	\$ 1,386,154.54	ON-GOING		
62	Rehabilitation Road Section : Jct. Tutuala Roads (C2) Package 1 Sta. 3+850 - 7+725 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Tutuala	Lautem	Hamutuk Unipessoal, Lda	SSS/083/MOPTC-2017	\$ 3,008,551.46	Aug. 28, 2017	72.95%	58.19%	\$ 1,750,607.13	\$ 1,257,944.33	ON-GOING		

					Localizasaun Projeto											
NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	NARAN KONT.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	STATUS PROJECTO	OBS
63	Rehabilitasaun ba EBC Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Tutuala	Lautem	MEJD PKRIE EBC MEHARA	-	\$ 66,995.57	Oct. 15, 2021	38.24%	29.35%	\$ 19,660.64	\$ 47,334.93	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 8.39%
64	Rehabilitasaun ba EPE Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Tutuala	Lautem	MEJD PKRIE EPE MEHARA	-	\$ 91,510.19	Oct. 15, 2021	40.02%	31.29%	\$ 28,630.79	\$ 62,879.40	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Novembro Aumenta 8.73%
TOTAL									\$ 43,821,802.01				\$ 30,756,752.00	\$ 13,065,050.01		


1. Eng. Inocencio da Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Lautem, ADN, I.P


2. Eng. Deonirio Henrique Lopes
Eng. ba Projeito Infrastrutura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

Prepara Husi :

3. Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Projeito Infrastrutura
e Irigasaun Municipiu Lautem,
ADN, I.P


4. Eng. Emano Junior Araujo Mota
Eng. ba Projeito Infrastrutura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN,
I.P


5. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projeito ME, ADN, I.P

Certifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De
Qualidade ADN, I.P

#ANEXU B PROGRESSU FISIKU KADA FULAN



					LOKALIZASAUN PROJETU						Dezembro 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	LONGITUDE (END POINT)	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress	This Month Progress	Kumulativo Progress
1	Rehabilitation of Laleno Road Project Road Section (Sta. 0+000 - 6+210) Maina 2 in Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lautem	Lautem		Corcorcio Irlayon, Lda	SSS/117/MOPTC-2016	\$ 4,782,693.68	87.20%		87.20%
2	Rehabilitation Roads Maina 1 to parlamento 3.916 km	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lautem	Lautem		Samudra Unip. Lda	SSS/100/MOPTC-2017	\$ 3,039,825.77	99.91%		99.91%
3	Rural Roads Periodic Maintenance Dasidara Lequidiga 0+000 - 10+000 Chainage Municipality Lautem (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Lautem	Lautem		Franam Lindo Unip. Lda	MPW-W-RTQ-190038	\$ 84,077.42	56.05%		56.05%
4	Projectu Konstrusaun Turizmu Komunitariu iha COM. Postu Administrativu Lautem	SEFOPE	LM	TURISMO	Lautem	Lautem		Joli Toni Unip Lda	17/CNEFP/7X/2016	\$ 85,584.79	91.76%		91.76%
5	Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com. Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 8+000 - 15+200 Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lautem	Lautem		Fian Const. Unip. Lda	SSS/144/MOPTC-2017	\$ 4,028,818.90	94.70%		94.70%
6	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT DASIDARA - LIQUIDIGA CHAINAGE 9+000-10+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lautem	Lautem		ILIE CHAO, UNIPESOAAL LDA	MPW - W - 210078	\$ 181,220.42	48.87%	2.26%	49.13%
7	Rehabilitasaun ba EBF 1.2 Euquisi iha Aldeia Barlo Suco Euquisi Postu Administrativu Lautem Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lautem	Lautem		MEJD PKRIE EBF 1.2 EUQUISI	-	\$ 105,204.19	52.36%		52.36%
8	Rehabilitasaun ba EBF Tasi Ibun Lautem iha Aldeia Lautem Suco Parlamento Postu Administrativu Lautem Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lautem	Lautem		MEJD PKRIE EBF TASI IBUN LAUTEM	-	\$ 89,519.51	54.90%		54.90%
9	Konstrusaun Monumento Nino Konis Santana no Jardim iha Escola Secundaria Nino Konis Santana Publica LAUTEM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem		Amor Construction	RDTL 2016	\$ 66,333.92	95.72%		95.72%
10	Konstrusaun Edificio PGR Municipio Lautem	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	LM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem		Cambota	RDTL- D FeO/APRO/PGR/19.001/2019	\$ 710,074.64	87.23%	4.65%	91.88%
11	Rural Road Rehabilitation Fuluro - Home Chainage 1+200 - 2+500 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lospalos	Lautem		Paiahara Unipessoal Lda	RT/033/MOP - 2019	\$ 287,376.91	67.48%	22.63%	90.11%
12	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Lautem, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM	SAUDE	Lospalos	Lautem		Parapa Bemiziun Star Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-189	\$ 88,631.06	92.09%		92.09%
13	Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com. Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 0+000 - 8+000 km municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lospalos	Lautem		Salve, Unip. Lda	SSS/143/MOPTC-2017	\$ 4,092,376.19	93.60%		93.60%
14	Routine Maintenance Lospalos - Souru Chainage 0+000 - 5+800, Routine Maintenance Leuro - Sorulus Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lospalos	Lautem		Afabubo f. Unip Lda.	RFQ/222/MOPTC-2016	\$ 49,805.16	96.47%		96.47%
15	Road Maintenance Sections : Lospalos - Ilomar Section (A082 - 2) Municipality Lautem (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Lospalos	Lautem		Lero Company, Lda	MPW-W-190120	\$ 219,745.45	92.80%		92.80%
16	Prefurasaun Sistema Be'e mos iha Suku PA/Papa Postu Adm. Lospalos Vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	AGUA E SANEAMENTO	Lospalos	Lautem		Mai Moco	MPWTC-NCB-170007	\$ 140,470.95	80.38%		80.38%
17	Konstrusaun Edificio CDS Lospalos Inklui Armagem no pavimento	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Lospalos	Lautem		Delta Dini	RDTL 15MSS/DNFALM-DAD/XII/2015	\$ 417,933.73	96.29%		96.29%
18	Konstrusaun no Instalasaun Sistema Be'e Mos iha Aldeia Homokanu, Foemaa, Nanakuru no EBF Soru Postu Administrativo Lospalos Vila, Municipiu Lautem/ 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	AGUA E SANEAMENTO	Lospalos	Lautem		Paza Conis Unip Lda	NCB-MOP-190063	\$ 255,685.00	25.15%		25.15%
19	Konstrusaun Be'e Mos Sistema Pompa no Gravitasaun,Tchay Trilary, Nuhata, Postu Administrativo Lospalos Vila, Municipiu Lautem/ 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	AGUA E SANEAMENTO	Lospalos	Lautem		Ukat Mape Goll Unip Lda	NCB-MOP-190062	\$ 419,409.00	33.53%		33.53%
20	Rural Road Rehabilitation Fuluro - Home Chainage 0+000 - 1+200 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lospalos	Lautem		Paiahara Unipessoal Lda	RT/032/MOP - 2019	\$ 264,203.18	100.00%		100.00%
21	Building Minor Maintenance East Side (Manahuto, Baucau, Lospalos & Viqueque	MINISTERIO FINANÇAS	LM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem		Prify Unip Lda	01 - Prify - MOF/DGCS 2019	\$ 56,783.85	80.85%		80.85%
22	Rural Roads Periodic Maintenance Lospalos Soru Chainage 0 + 000 - 2 + 500, Lautem Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Lospalos	Lautem		Ulaui Unip. Lda	MPW-W - 190110	\$ 216,525.57	100.00%		100.00%
23	Konstrusaun Fatin Izolamentu iha CHC Lospalos Municipiu Lautem	MINISTERIO SAUDE	LM	SAUDE	Lospalos	Lautem		RICS Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-253	\$ 284,788.97	91.94%		91.94%
24	New Construction Of Houses For Veteran 8 Unit	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem		Davinci	001/RDTL/MP/IE/AND/DIL/VI/2016	\$ 788,921.55	54.54%		54.54%
25	Konstrusaun Murru Haleu Edifisiu Administrasaun Munisipiu no Jardim Municipiu Lautem	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem		Marvong Construction Unip Lda	02/KML-PDIM/SM/X/2021	\$ 145,363.15	6.87%		6.87%
26	Rehabilitasaun Residencia Administrador + Murru no Jardim Municipiu Lautem	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem		Marvong Construction Unip Lda	01/KML-PDIM/SM/X/2021	\$ 251,975.70	6.18%		6.18%
27	R4D RURAL ROADS SPOT IMPROVEMENT LEURO - SOURULUA CHAINAGE 0+000-2+650	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem		KOMI ARA UNIPESOAAL LDA	MPW - W - 210080	\$ 271,648.79	58.19%		58.19%
28	Projeto Konstrusaun Foun ESTV Lospalos	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem		Lero Company, Lda	NCB-14/MEJD/DNA/2021	\$ 307,716.65	65.81%		65.81%
29	Rehabilitasaun ba EBF No-2 Lospalos iha Aldeia Central Suco Fuluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem		MEJD PKRIE EBF NO2 LOSPALOS	-	\$ 108,612.72	36.92%		36.92%
30	Rehabilitasaun ba Pre Escolar Ira - Ara iha Aldeia Lospala Suco Fuluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem		MEJD PKRIE PRE ESCOLAR IRA-ARA	-	\$ 111,729.45	65.32%		65.32%
31	Rehabilitasaun ba ESG Lere Anan Timor Lospalos iha Aldeia Kuluhun Suco Fuluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem		MEJD PKRIE ESG LERE ANAN TIMOR LOSPALOS	-	\$ 209,017.79	48.61%		48.61%
32	Konstrusaun Foun ba ESTV Laico Lospalos Municipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem		Salve, Unip. Lda	CNB/013/MEJD/DNA/2021	\$ 398,027.41	60.34%	11.05%	80.39%
33	Rehabilitasaun Road Fuluro - Home Chainage 2 + 500 - 3 + 500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem		Ali Hini Unipessoal, Lda	-	\$ 198,260.01	20.29%		20.29%
34	Rehabilitasaun Road Fuluro - Maupline Chainage 0 + 000 - 2 + 000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem		Vivacious Form Unipessoal, Lda	-	\$ 342,407.80	1.41%	10.31%	11.72%
35	Rehabilitasaun Road Fuluro - Maupline Chainage 2 + 000 - 4 + 200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem		Tchai Celero Unipessoal, Lda	-	\$ 344,971.59	15.50%		15.50%
36	Rehabilitasaun Road Fuluro - Maupline Chainage 4 + 200 - 7 + 000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem		Kako Anik Unipessoal, Lda	-	\$ 409,958.83	24.97%		24.97%
37	Completion of Veterans Houses - Lospalos Municipality Lautem	MINISTERIO PLANO ORDENAMENTO	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem		Verjus Unip. Lda	NCB/010CD/ADN JP/MPQ/VI/DILI/2022	\$ 173,297.17	80.45%	11.13%	91.58%

					LOKALIZASAU PROJETO						Dezembro 2022		
NU.	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	LONGITUDE (END POINT)	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress	This Month Progress	Kumulativo Progress
38	New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ukukisi, Alimbere, and Liarafa, Luro - Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAU NASIONAL	Loru	Lautem		Vairoque Unip. Lda	RDTLMOPTC-VMOPTC/CGI-PEN-0000432	\$ 593.550.47	81.25%		81.25%
39	Rehabilitation of Road Lalvai - Vairoque - Liarava Roads Sta. 0+000 - 7+250 (7.25 km) Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Loru	Lautem		Hoven II, Unip. Lda	SSS/140/MOPTC-2017	\$ 4.207.194.97	99.82%		99.82%
40	Rural Roads Periodic Maintenance Luro - Barikafa Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Lautem (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Loru	Lautem		Perekiki Mori Unip. Lda	MPW-W-NVB-R-190041	\$ 161,431.38	88.25%		88.25%
41	Rehabilitation of Luro - Buihomau Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Loru	Lautem		Consorcio ASCEM "CACM" Lda"	MPW-W-13-005	\$ 4.950.000.00	97.11%		97.11%
42	Road Maintenance Periodic Luro - Kota Mutu - Lakawa Sta. 0+000 6+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Loru	Lautem		Cambota	MPW-W-190095	\$ 62.781.38	79.23%	20.77%	100.00%
43	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - BARIKAFKA CHAINAGE 0+000+7+000 LAUTEM MUNICIPALITY	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loru	Lautem		Lili Unip. Lda	MPW - W 210079	\$ 249.614.09	43.60%		43.60%
44	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - KOTAMUTU - LAKAWA CHAINAGE 0+000-6+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loru	Lautem		ILIE CHAO, UNIPESAOAL LDA	MPW - W - 210077	\$ 132.612.26	66.69%	15.47%	82.15%
45	Rehabilitasaun ba EBF Abere iha Aldeia Abere Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUIN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUIN	Loru	Lautem		MEJD PKRIE EBF ABERE	-	\$ 103.671.57	29.04%		29.04%
46	Rehabilitasaun ba Pre Escolar Amaira Luro iha Aldeia Amaira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUIN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUIN	Loru	Lautem		MEJD PKRIE PRE ESCOLAR AMAIRA LURO	-	\$ 88.217.01	42.39%		42.39%
47	Rehabilitasaun ba EBF 1.2 Barikafa iha Aldeia Sarelari Suco Barikafa Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUIN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUIN	Loru	Lautem		MEJD PKRIE EBF 1.2 BARIKAFKA	-	\$ 86.976.71	58.99%		58.99%
48	Rehabilitasaun ba EBC Luro iha Aldeia Amaira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUIN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUIN	Loru	Lautem		MEJD PKRIE EBC LURO	-	\$ 82.737.98	55.71%		55.71%
49	Rehabilitasaun ba ESG Fernando Lasama de Luro iha Aldeia Amahira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUIN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUIN	Loru	Lautem		MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE LURO	-	\$ 182.929.22	29.01%		29.01%
50	Rehabilitasaun ba EBF Ussuvasu iha Aldeia Ussuvasu Suco Barikafa Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUIN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUIN	Loru	Lautem		MEJD PKRIE EBF USSUVASU	-	\$ 96.254.30	53.74%		53.74%
51	New Installation MV, LV Line and House Connection from Alebere to Pujara, Arafalon and Ledo Ira, Ilomar - Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAU NASIONAL	Ilomar	Lautem		Lor Construction Unip. Lda	RDTLMOPTC-VMOPTC/CGI-PEN-00000363	\$ 432.643.32	84.35%		84.35%
52	Additional Emergency Ilomar Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ilomar	Lautem		Resister Unip.Lda	SSS/140/MOPTC-2016	\$ 64,189.34	86.34%		86.34%
53	NEW CONSTRUCTION OF HEALTH AND DOCTOR HOUSE IN FUAT, LAUTEM, TIMOR LESTE	MINISTERIO SAUDE	LM	SAUDE	Ilomar	Lautem		Naesalobu Unip. Lda		\$ 280.206.72	98.28%		98.28%
54	Rehabilitasaun ba EBF 1.2 Ta - Besi Fera Naben - Fuat iha Aldeia Acadiro Suco Fuat Postu Administrativu Ilomar Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUIN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUIN	Ilomar	Lautem		MEJD PKRIE EBF 1.2 TA BESI FERA NABEN-FUAT	-	\$ 80.768.69	40.75%		40.75%
55	Rehabilitasaun ba EBF 1.2 Tirilolo iha Aldeia Tirilolo Suco Tirilolo Postu Administrativu Ilomar Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUIN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUIN	Ilomar	Lautem		MEJD PKRIE EBF 1.2 TIRILOLO	-	\$ 81.437.95	63.43%		63.43%
56	Rehabilitasaun ba EBC de Ilomar iha Aldeia Ara- ara Suco Ilomar I Postu Administrativu Ilomar Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUIN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUIN	Ilomar	Lautem		MEJD PKRIE EBC DE ILIOMAR	-	\$ 116.729.75	27.20%		27.20%
57	Roads Maintenance section Loapalos - Ilomar (A08-3) 2021 Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ilomar	Lautem		Venjus Unip. Lda	MPW-W220015	\$ 340,664.96	47.70%		47.70%
58	Rehabilitasaun Road Cainlu - Larisula Chainage 2 + 700 - 5 + 400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - CD	ESTRADAS	Ilomar	Lautem		Broven Unipessoal, Lda	-	\$ 395,790.81	0.00%		0.00%
59	Rehabilitasaun Road Cainlu - Larisula Chainage 8 + 750 - 11 + 050	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - CD	ESTRADAS	Ilomar	Lautem		Tapirae Unipessoal, Lda	RT/026/MOP - 2021	\$ 434,498.75	2.49%		2.49%
60	Rehabilitasaun Road Cainlu - Larisula Chainage 11 + 050 - 13 + 050	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - CD	ESTRADAS	Ilomar	Lautem		Om Brother Unipessoal, Lda	-	\$ 310,915.87	0.00%		0.00%
61	Road Rehabilitation From Tutuala to Valu Chainage 0+000 - 3+850 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Tutuala	Lautem		Consorcio Vacu-Hiamoinu Lda	SSS/063/MOPTC-2017	\$ 3.104.481.77	67.71%		67.71%
62	Rehabilitation Road Section : Jct. Tutuala Roads (C2) Package 1 Sta. 3+850 - 7+725 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Tutuala	Lautem		Hamutuk Unipessoal, Lda	SSS/063/MOPTC-2017	\$ 3,008.551.46	72.95%		72.95%
63	Rehabilitasaun ba EBC Mehara iha Aldeia Loihero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUIN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUIN	Tutuala	Lautem		MEJD PKRIE EBC MEHARA	-	\$ 66.995.57	38.24%		38.24%
64	Rehabilitasaun ba EPE Mehara iha Aldeia Loihero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUIN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUIN	Tutuala	Lautem		MEJD PKRIE EPE MEHARA	-	\$ 91,510.19	40.02%		40.02%

Inspeksaun Husi :

1. Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Lautem, ADN, I.P

2. Eng. Chico Adriano Junior
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Lautem, ADN, I.P

6. Eng. Augusto Julio Fernandes
Eng. ba Projecto ME, ADN, I.P

4. Eng. Domingos Henrique Lopes
Eng. ba Projecto Infraestrutura e Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

5. Eng. Ema Junior Araujo Mota
Eng. ba Projecto Infraestrutura e Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

Verifica Husi :

Eng. Remigio da C. S. dos Santos
Eng. Senior ba Projecto Infraestrutura e Irigasaun, ADN, I.P

Eng. Arch. Francisco Xavier de D. Peronimo
Senior Engenheiro ba Projecto Edificio Publico Beé no Saneamento, ADN, I.P

Eng. Desindo de Fátima Marques
Chefe de Saun ME & TC, ADN, I.P

Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De Qualidade ADN, I.P



#ANEXU C1 (LO-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifício PGR Municipio Lautem**

No. kontratu : **RDTL-D.FeO/APRO/PGR/19.001/2019**

Data Inspesaun : 09/12/2022

Fatin Inspesaun : Lospalos-Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.2946073 Latetude : 126.5929706.

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1. Inocencio dos Reis Costa Maia

2. Quico Adelino Junior

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Progresso servisu ba projeitu
refere iha fulan ida ne'e nia
laran maka ba servisu
landscaping ninian hahu ona
komesa ona ho ense rai ba
parte jardim ninian no taka
ona besi iha parte drainajem
nia leten.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 (LO-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifício PGR Municipio Lautem**

No. kontratu : **RDTL-D.FeO/APRO/PGR/19.001/2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ba Support Building ninian iha fulan ida ne'e servisu monta odamatan no janela remata ona no asesoris elektroniku sira komesa hahu monta ona. Agora komesa mos monta keramik diding no haris fatin nian no monta asesoris haris fatin sira nian.	 9 Des 2022 09:14:18 8.49614874S 126.99141424E 24° NE Lautem Altitude: 437.3m Eng. ADN, IP Municipio Lautem Timor-Lestet
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	 9 Des 2022 09:14:05 8.49620233S 126.99149798E 287° W Lautem Altitude: 435.8m Eng. ADN, IP Municipio Lautem Timor-Lestet



#ANEXU C1 (LO-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifício PGR Municipio Lautem**

No. kontratu : **RDTL-D.FeO/APRO/PGR/19.001/2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu 	 9 Des 2022 09.14.23 8.49615189S 126.99141245E 274° W Lautém Altitude: 437.0m Eng. ADN, IP Municipio Lautém Timor-Lestet
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu 	 9 Des 2022 09.14.49 8.49609268S 126.99142652E 79° E Lautém Altitude: 433.7m Eng. ADN, IP Municipio Lautém Timor-Lestet

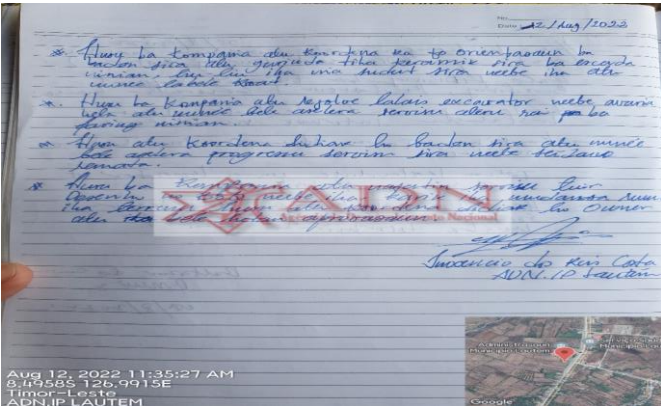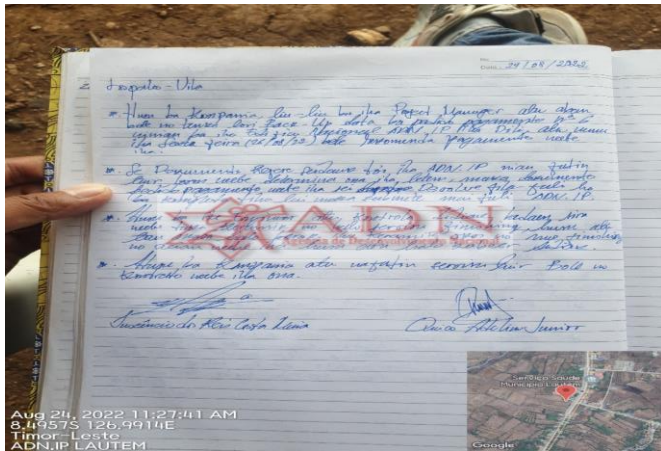 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (LO-2) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Naran projeto : Konstrusaun Edificio PGR Municipio Lautem							
Kompanha : Cambota Lda.							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	12/08/2022	Lautem/Lospalos Vila	Inocencio dos Reis Costa Maia	Tekniku	1	Husu ba Kompanhia atu koordena ka fo orientasaun ba badaen sira atu gurinda tia keramik sira ba eskada ninian, liu-liu iha nia sudut sira ne'ebe iha atu nune'elable kroat.	
			2		Husu ba kompanhia atu rejolve lalais excavator ne'ebe avaria hela nunne'e bele aselera servisu ateru rai ba parking ninian.		
			3		Husu atu koordena didiak ho ho badaen sira atu nune'e bele aselera progressu servisu sira ne'ebe seidauk remata.		
			4		Husu ba kompanhia atu nafatin servisu tuir dezenhu no BOQ ne'ebe iha, karik iha mudansa ruma iha terrenu husu atu koordena didiak ho owner atu bele hetan aprovasaun.		
II	24/08/2022	Lautem/Lospalos Vila	Inocencio dos Reis Costa Maia	Tekniku	1	Husu ba kompanhia liu-liu ba iha project manager atu aban tenki lori back up data ba pedidu pagamentu no.6 ninian ba iha edificiu AND I.P iha Dili atu nune'e iha loron sesta feira (26-08-2022) bele rekomenda pagamentu ne'ebe iha.	
			2		Se dokumentus refere seidauk to'o iha AND I.P. nia fatin tuir loron ne'ebe determina ona iha leten, maka dokumentu ba pedidu pagamentu ne'ebe iha sei devolve fila fali hodi ba kompleta tiha lai maka submete mai fali AND I.P.		
			3		Husu ba nejinheiru atu kontrola didiak badaen sira ne'ebe taka keramik no halo servisu finishing , husu atu tau masa halo barak iha keramik okos no mos finishing no acian ne'ebe iha husu atu halo kabir didiak.		
			4		Husu ba kompanhia atu nafatin servisu tuir BOQ no kontratu ne'ebe iha ona.		
			5				



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (LO-2)

SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT				INSPECTION PROGRESS REPORT BY ADN.IP					
				PREVIOUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
NU.	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	WEIGHT (%)	AMOUNT (USD)	WEIGHT (%)	AMOUNT (USD)	WEIGHT (%)	AMOUNT (USD)	WEIGHT (%)
I	PREPARATION WORK	\$ 3,180.80	0.45%	\$ 3,080.80	0.43%	\$ -	0.00%	\$ 3,080.80	0.43%
II	OFFICE BUILDING WORK	\$ 227,425.60	32.03%	\$ 178,847.84	25.19%	\$ 23,082.91	3.25%	\$ 201,930.75	28.44%
III	RESIDENT BUILDING WORK	\$ 86,425.70	12.17%	\$ 81,954.90	11.54%	\$ 144.00	0.02%	\$ 82,098.90	11.56%
IV	WAREHOUSE, ARCHIVE AND MEETING ROOM BUILDING WORK	\$ 95,089.89	13.39%	\$ 93,216.10	13.13%	\$ 1,185.58	0.17%	\$ 94,401.68	13.29%
V	GENSET BUILDING WORK	\$ 9,347.57	1.32%	\$ 8,019.80	1.13%	\$ 42.82	0.01%	\$ 8,062.62	1.14%
VI	SECURITY POST BUILDING WORK	\$ 7,703.47	1.08%	\$ 7,476.41	1.05%	\$ 220.00	0.03%	\$ 7,696.41	1.08%
VII	LANDSCAP WORK	\$ 83,020.90	11.69%	\$ 73,960.48	10.42%	\$ 2,204.79	0.31%	\$ 76,165.27	10.73%
VIII	INSTALL WATER, ELECTRICAL, INTERNET_ TELEPHON LINE TO SITE WORK	\$ 700.00	0.10%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
IX	CORIDOR BUILD	\$ 15,000.00	2.11%	\$ 11,240.00	1.58%	\$ 1,875.00	0.26%	\$ 13,115.00	1.85%
X	OVERHEAD	\$ 20,400.00	0.00%	\$ 13,540.00	1.91%	\$ 500.00	0.00%	\$ 14,040.00	1.98%
a	CONSTRUCTION COST (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)_ft	\$ 614,319.64	86.51%	\$ 539,771.23	76.02%	\$ 28,899.11	4.07%	\$ 568,650.34	80.08%
b	OVERHEAD (X)	\$ 20,400.00	2.87%	\$ 13,540.00	1.91%	\$ 500.00	0.07%	\$ 14,040.00	1.98%
c	CONSTRUCTION COST + OVERHEAD (a+b) / ft	\$ 634,719.64	89.39%	\$ 553,311.23	77.92%	\$ 29,399.11	4.14%	\$ 582,690.34	82.06%
d	CONTRACTOR FEE 10%	\$ 61,431.96	8.65%	\$ 53,977.12	7.60%	\$ 2,889.91	0.41%	\$ 56,865.03	8.01%
e	TAX 2%	\$ 13,923.03	1.96%	\$ 12,145.77	1.71%	\$ 645.78	0.09%	\$ 12,791.11	1.80%
f	GRAND TOTAL (c+d+e)	\$ 710,074.64	100.00%	\$ 619,434.12	87.23%	\$ 32,934.80	4.65%	\$ 652,346.48	91.87%

Prepara Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Baucau,ADN,I.P

(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Baucau,ADN,I.P

(Arq.Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Eng. Senior ba Projeto Edificio
Publico, Agua e Saneamento ADN,I.P.

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia)
Coordenadora da Unidade de
Controlo e Validação de Qualidade
ADN, I.P.

ANEXO C1 (LO-24) Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Foun Ba ESTV Laico Lospalos Munisipio Lautem**
No. kontratu : **CNB:013/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : 10/12/2022

Fatin Inspesaun : Lautem, Lospalos-Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.5042 , Latetude : 127.0069

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio dos Reis Costa Maia**

2. Quico Adelino Junior

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Progressu fijiku ba projeto ida
ne'e iha fulan ida ne'e maka ;
Agora dadauk iha hela servisu
monta plafon no monta
keramik ba classroom sira.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXO C1 (LO-24)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Foun Ba ESTV Laico Lospalos Munisipio Lautem**

No. kontratu : **CNB:013/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu 	 10 Des 2022 10.42.19 8.50410596S 127.00684069E 194° S Altitude: 419.8m Eng. ADN, IP Municipio Lautem Timor-Lestet
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item	 10 Des 2022 11.00.22 8.50373701S 127.00706189E 163° S Lautem Altitude: 414.5m Eng. ADN, IP Municipio Lautem Timor-Lestet




ANEXO C1 (LO-24)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Foun Ba ESTV Laico Lospalos Munisipio Lautem**

No. kontratu : **CNB:013/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu 	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item	

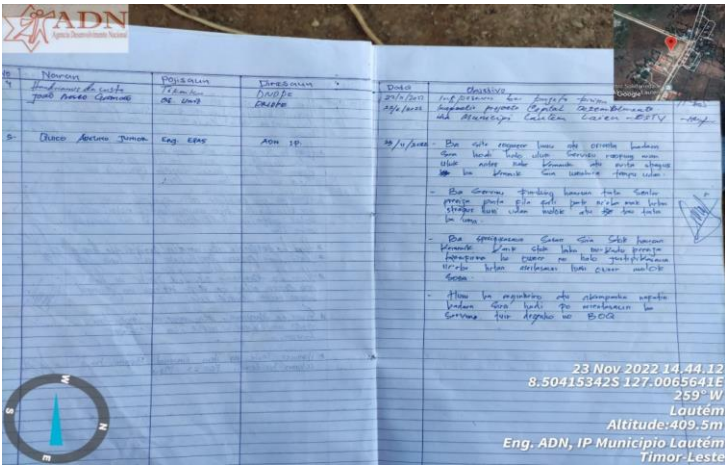 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					ANEXO D (LO-24) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
Naran projeto : Konstrusaun Foun Ba ESTV Laico Lospalos Munisipio Lautem								
Kompanha : SALVE Unipessoal Lda.								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	23/11/2022	Lautem/Lospalos-Vila	Inocencio dos Reis Costa Maia	Eng. Munisipio	1	Ba site engineer husu atu orienta badaen sira hodi halo uluk servisu roofing nian uluk antes nahe keramik atu evita stragus ba keramik sira wainhira tempu udan.		
					2	Ba servisu finishing hanesan tinta sealer presija pinta fila fali parte ne'ebe mak hetan stragus husi udan molok atu tau tinta ba uma.		
			Quico Adelino Junior		3	Ba spesifikasaun sasan sira seluk hanesan keramik , karik stok laiha merkadu presija komfirma ho owner no halo justifikasaun ne'ebe hetan aseitasaun husi owner molok sosa.		
					4	Husu ba enginheiru atu akompanha nafatin badaen sira hodi fo orientasayn ba servisu tuir dezenhu no BOQ.		
					5			



ANEXO C2 (LO-24)

Naran Projecto : Konstrusaun Sala de Aula 6 + Escritorio + Laboratorio +
Toilet + Fura Be Mos ESTV Laicu
Projecto Nain : Ministerio da Educasaun Juventude no Desporto

MAIN SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT					ADN.IP PROGRESS REPORT					
					PREVIOUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
No	DESCRIPTION of WORK	PAGE NUMBER	TOTAL PRICE	WEIGHT %	AMOUNT USD	WEIGHT %	AMOUNT USD	WEIGHT %	AMOUNT USD	WEIGHT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 6,070.00	1.53%	\$ 3,545.00	0.89%	\$ 112.50	0.03%	\$ 3,657.50	0.92%
II	CLASSROOM BUILDING C (2 UNITS)	C/41 (i)	\$ 128,874.44	32.38%	\$ 93,330.63	20.74%	\$ 14,659.77	3.68%	\$ 107,990.40	27.13%
III	TEACHER OFFICE	OF/52 (i)	\$ 93,217.76	23.42%	\$ 68,799.05	15.99%	\$ 9,644.63	2.42%	\$ 78,443.69	19.71%
IV	LABORATORY COMPUTER	LC/33 (i)	\$ 42,434.65	10.66%	\$ 26,718.15	6.19%	\$ 6,329.15	1.59%	\$ 33,047.30	8.30%
V	TOILET BUILDING Tb	TB/40 (i)	\$ 35,732.26	8.98%	\$ 28,872.38	7.05%	\$ 7,619.60	1.91%	\$ 36,491.98	9.17%
VI	SITEWORKS	SW/32 (i)	\$ 44,088.85	11.08%	\$ 21,968.45	5.52%	\$ -	0.00%	\$ 21,968.45	5.52%
VII	OVERHEAD	OH/2	\$ 4,790.00	1.20%	\$ 3,190.00	0.80%	\$ 912.50	0.23%	\$ 4,102.50	1.03%
A	CONSTRUCTION COST		\$ 355,207.96	89.24%	\$ 246,423.66	61.91%	\$ 39,278.15	9.87%	\$ 285,701.81	71.78%
B	PROFIT 10% x A		\$ 35,520.80	8.92%	\$ 24,642.37	6.19%	\$ 3,927.82	0.99%	\$ 28,570.18	7.18%
C	TAX 2% x (A + B)		\$ 7,104.16	1.78%	\$ 4,928.47	1.24%	\$ 785.56	0.20%	\$ 5,714.04	1.44%
D	TOTAL COST (A + B + C)		\$ 397,832.91	99.95%	\$ 275,994.50	69.34%	\$ 43,991.53	11.05%	\$ 319,986.03	80.39%
E	CONTIGENCY		\$ 194.50	0.05%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
F	GRAND TOTAL WITH PROVISIONAL SUM		\$ 398,027.41	100.00%	\$ 275,994.50	69.34%	\$ 43,991.53	11.05%	\$ 319,986.03	80.39%

PREPARA HUSI :

VERIFIKA HUSI :

SERTIFIKA HUSI :

Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico,
Agua e Saneamento ADN, I.P

Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P



ANEXO C1 (LO-23)

Back-up Data

Naran Projeto : **Complition Of Veteranus Houses – Lospalos Municipality Lautem**

No. kontratu : **NCB/010CD/ADN,IP/MPO/V/DILI/2022**

Data Inspesaun : 12/12/2022

Fatin Inspesaun : Lautem, Lospalos-Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.5059 , Latetude : 126.9835

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio dos Reis Costa Maia**

2. Quico Adelino Junior

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Progressu fijiku ba projeto ida
ne'e iha fulan ida ne'e finaliza
ona.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXO C1 (LO-23)

Back-up Data

Naran Projeto : **Complition Of Veteranus Houses – Lospalos Municipality Lautem**

No. kontratu : **NCB/010CD/ADN,IP/MPO/V/DILI/2022**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu 	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	



ANEXO C1 (LO-23)

Back-up Data

Naran Projeto : **Complition Of Veteranus Houses – Lospalos Municipality Lautem**


No. kontratu : **NCB/010CD/ADN,IP/MPO/V/DILI/2022**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu 	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item	



Naran projeto : Complition Of Veteranus Houses – Lospalos Municipality Lautem

Kompanha : VENJUS Unipessoal Lda.

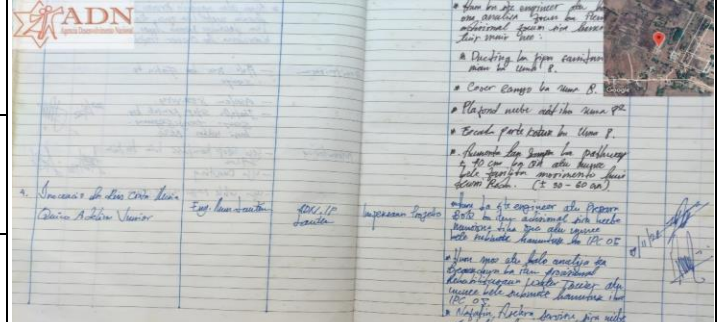No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura
1	09/11/2022	Lautem/Lospalos-Vila	Inocencio dos Reis Costa Maia	Eng. Municipio	1	Husu ba site engineer atu prepara BOQ ba item adicional sira ne'ebe mensiona tiha ona atu nune'e bele submete hamutuk ho IPC 05		
					2	Husu mos atu halo analiza ka breakdown ba item provisional reabilitasaun water tower atu nune'e bele submete hamutuk iha IPC 05.		
			Quico Adelino Junior		3	Nafatin aselera servisu sira ne'ebe sei falta atu nune'e bele finaliza iha fulan novembru ne'e.		
					4			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (LO-29)

Project Name : Completion of Veteran Houses
Location : Lautem, Lospalos-Vila

SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT								ADN.IP PAYMENT PROGRESS					
NO	WORK DESCRIPTION	AMOUNT USD	WEIGHTH	ADDITIONAL PROPOSED BY COMPANY	ADDITIONAL VERIFIED BY ADN.IP	REVISED AMOUNT	Proposed	PREVIOUS PAYMENT		THIS PAYMENT		UP TO DATE	
								AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH
							Unit	USD	%	USD	%	USD	%
1	PREPARATION WORKS	\$ 9,913.34	5.72%	\$ -	\$ -			\$ 8,347.51	4.82%	\$ 1,565.84	0.90%	\$ 9,913.34	5.72%
2	HOUSES No.1 SECTION 2	\$ 4,599.93	2.65%	\$ 425.07	\$ 355.48	\$ 4,955.41		\$ 4,126.23	2.38%	\$ 829.18	0.48%	\$ 4,955.41	2.86%
3	HOUSES No.2 SECTION 3	\$ 4,599.93	2.65%	\$ 429.57	\$ 359.86	\$ 4,959.79		\$ 4,126.23	2.38%	\$ 833.56	0.48%	\$ 4,959.79	2.86%
4	HOUSES No.3 SECTION 5	\$ 4,599.93	2.65%	\$ 459.57	\$ 389.86	\$ 4,989.79		\$ 4,126.23	2.38%	\$ 863.56	0.50%	\$ 4,989.79	2.88%
5	HOUSES No.4 SECTION 6	\$ 4,599.93	2.65%	\$ 455.07	\$ 385.48	\$ 4,985.41		\$ 4,126.23	2.38%	\$ 859.18	0.50%	\$ 4,985.41	2.88%
6	HOUSES No.5 SECTION 8	\$ 4,599.93	2.65%	\$ 459.57	\$ 389.86	\$ 4,989.79		\$ 4,126.23	2.38%	\$ 863.56	0.50%	\$ 4,989.79	2.88%
7	HOUSES No.6 SECTION 9	\$ 4,599.93	2.65%	\$ 395.07	\$ 325.48	\$ 4,925.41		\$ 4,126.23	2.38%	\$ 799.18	0.46%	\$ 4,925.41	2.84%
8	HOUSES No.7 SECTION 11	\$ 4,439.43	2.56%	\$ 455.07	\$ 385.48	\$ 4,824.91		\$ 4,016.58	2.32%	\$ 808.33	0.47%	\$ 4,824.91	2.78%
9	HOUSES No.8 SECTION 12	\$ 4,439.43	2.56%	\$ 655.82	\$ 642.61	\$ 5,082.04		\$ 4,016.58	2.32%	\$ 1,065.46	0.61%	\$ 5,082.04	2.93%
10	EXTERNAL & FURNITURE	\$ 91,958.59	53.06%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 79,582.27	45.92%	\$ 8,293.76	4.79%	\$ 87,876.03	50.71%
	CONTIGENCY			\$ 3,734.85	\$ 3,234.10								
1	Supply white yard for house no.1 section 2						m3						
2	Supply white yard for house no.2 section 3						m3						
3	Supply white yard for house no.3 section 5						m3						
4	Supply white yard for house no.4 section 6						m3						
5	Supply white yard for house no.5 section 8						m3						
6	Supply white yard for house no.6 section 9						m3						
7	Supply white yard for houses no. 7 section 11						m3						
8	Supply white yard for houses no. 8 section 12						m3						
A	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 138,350.39	79.83%					\$ 120,720.33	69.66%	\$ 16,781.60	9.68%	\$ 137,501.93	79.34%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 13,835.04	7.98%					\$ 12,072.03	6.97%	\$ 1,678.16	0.97%	\$ 13,750.19	7.93%
C	OVERHEAD	\$ 4,150.00	2.39%					\$ 3,887.50	2.24%	\$ 262.50	0.15%	\$ 4,150.00	2.39%
D	TAX (2 % x (A+ B+ C))	\$ 3,126.71	1.80%					\$ 2,733.60	1.58%	\$ 374.45	0.22%	\$ 3,108.04	1.79%
E	CONTIGENCY (10 % X A)	\$ 13,835.04	7.98%					\$ -	0.00%	\$ 192.39	0.11%	\$ 192.39	0.11%
F	GRAND TOTAL	\$ 173,297.17	100.00%					\$ 139,413.46	80.45%	\$ 19,289.09	11.13%	\$ 158,702.55	91.58%

PREPARA HUSI :

SERTIFIKA HUSI :

Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Projecto Edifício Público Beé no Saneamento
Município Lautem, ADN, I.P

Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Projecto Edifício Público Beé no Saneamento
Município Lautem, ADN, I.P

Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade ADN, I.P



#ANEXU C1 (LA-6)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Dasidara-Liquidiga Chainage 0+000-10+500

No. kontratu : MPW-W-210078

Data Inspesaun : 08/12/2022

Fatin Inspesaun : Lautem-Laivai

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.43'43,397", Latetude : 8.24'32,056"

End Point : Long : 126.44'63'460", Latetude : 8.25'33,569"


Naran Inspector : 1. Deamantino Henrique Lopes

2. Elnino Junior Araújo Mota

Sketch & Foto Desenho

✓ R-08 Structures

R-08-09-01 Stone masonry – finished
= 128.63 m³ X \$56.20 = \$ 7,228.73



R-08-18-05 Cement Concrete
Pavement - Plum Concrete m³
= 96 m³ X \$131.10 = \$ 12,585.60

R-08-19 Lean concrete m³
= 40 m³ X \$134.32 = \$ 5,372.80

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Spot Improvement Dasidara-Liquidiga Chainage 0+000-10+500**

No. kontratu : **MPW-W-210078**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Roads Rehabilitation Dasidara to Lequidiga in Lautem Municipality

Kompanha : ILLIE CHAO UNIP, LDA

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	12/08/2022	Lautem/Laivai	Deamantino H. Lopes	Eng. ITI	1	Halo inspeksaun pagamentu ba kompanhia refere IPC#3, husi resultadu inspeksaun tuir duni pedido husi kompanhia.		
					2	Husu ba tekniku kompanhia atu haruka trabalhador sira hasai tiha material rai ne'ebe ateru tama ba iha saluran laran.		
					3	Husu ba tekniku kompanhia atu haruka trabalhador sira nahe tan plum concrete 1m ba oin iha parte ponte nian.		
			Elnino Junior Araujo Mota		4	Husu ba tekniku kompanhia atu mantein iha terrenu hodi kontrola servisu trabalhador nian, hodi garantia qualidade servisu.		
			5		Sujere ba kompanhia karik iha mudansa item iha terrenu, tenki halo koordena ho dono do projeto.			



#ANEXU C2 (LA-6)

Name of Project : R4D Rural Roads Rehabilitation Dasidara to Leguidiga in Lautem Municipality
Contractor : ILLIE CHAO UNIP. LDA
Contract No. : MPW - W - 210078

SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT		PREVIOUS		PROGRESS DEZEMBRO		TO DATE	PERCENTAGE (%)
No	Item Description	Amount Contract	Amount Previous	Percentage (%)	Amount This billing	Percentage (%)	
R-01	General works	\$ 2,830.00	\$ 2,080.00	1.15%	\$ -	0.00%	\$ 2,080.00 1.15%
R-03	Earth work	\$ 15,232.67	\$ 3,090.15	1.71%	\$ -	0.00%	\$ 3,090.15 1.71%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 20,547.45	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ - 0.00%
R-08	Structures	\$ 97,317.32	\$ 51,967.91	28.68%	\$ 3,649.80	2.01%	\$ 55,617.71 30.69%
R-10	Dayworks	\$ 1,050.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ - 0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 1,620.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ - 0.00%
R-12	Cleaning	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ - 0.00%
G-1	General Items	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00	0.76%	\$ -	0.00%	\$ 1,380.00 0.76%
G-02	Project Work	\$ 12,840.00	\$ 12,840.00	7.09%	\$ -	0.00%	\$ 12,840.00 7.09%
G-03	Safety and protection	\$ 5,548.00	\$ 5,548.00	3.06%	\$ -	0.00%	\$ 5,548.00 3.06%
G-05	Meeting	\$ 360.00	\$ 360.00	0.20%	\$ -	0.00%	\$ 360.00 0.20%
G-06	Cerimonial Costs	\$ 600.00	\$ 300.00	0.17%	\$ -	0.00%	\$ 300.00 0.17%
G-07	Reinstatement	\$ 4,041.90	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ - 0.00%
G-12	Provisional sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ - 0.00%
A	Construction Cost	\$ 138,997.44	\$ 57,138.06	31.53%	\$ 3,649.80	2.01%	\$ 60,787.86 33.54%
B	Profit (net cost x %) ; 10%	\$ 13,899.74	\$ 5,713.81	3.15%	\$ 364.98	0.20%	\$ 6,078.79 3.35%
C	General Items	\$ 24,769.90	\$ 20,428.00	11.27%	\$ -	0.00%	\$ 20,428.00 11.27%
D	Tax ((A +B + C) x 2 %)	\$ 3,553.34	\$ 1,665.60	0.92%	\$ 80.30	0.04%	\$ 1,745.89 0.96%
E	Grand Total:	\$ 181,220.42	\$ 84,945.46	46.87%	\$ 4,095.08	2.26%	\$ 89,040.54 49.13%

Inspeksaun Husi :

Verifika Husi :

Certifika Husi :

(Eng. Deamantino H. Lopes)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

(Eng. Elnino Junior Araujo Mota)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projecto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN,IP

(Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Da Unidade de Controlo E
Validação De Qualidade ADN,IP



#ANEXU C1 (LO-3) Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Fuiloro - Home Chainage 1+200 - 2+500**

Municipality **Lautem**

No. kontratu : **SRT/033/MOP - 2019**

Data Inspesaun : 17/12/2022

Fatin Inspesaun : Fuiloro - Home

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.976221, Latetude : 8.508212

End Point : Long : 126.966425, Latetude : 8.501801

Naran Inspector : **1. Eng. Deamantino H. Lopes**

2. Eng. Elnino Junior Araujo Mota

Sketch & Foto Desenho

Inspesaun Pagamento # IPC.06

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 (LO-3) Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Fuloro - Home Chainage 1+200 - 2+500**

Municipality **Lautem**

No. kontratu : **SRT/033/MOP - 2019**

Sketch & Foto Desenho

Inspesaun Pagamento # IPC.06

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (LO-3)

Name of Project : Rural Road Rehabilitation Fuiloro - Home Chainage 1 + 200 - 2 + 500 Municipality Lautem

Contractor : PAIAHARA UNIPESSOAL LDA

Contract No. : RT/032/MOP - 2019

SUMMARY

No	ORIGINAL CONTRACT		PREVIOUS		PROGRESS DEZEMBRO		TO DATE	PERCENTAGE (%)
	Item Description	Amount Contract	Amount Previous	Percentage (%)	Amount This billing	Percentage (%)	Amount to Date	
R-01	General works	\$ 5,000.00	\$ 4,350.00	1.51%	\$ -	0.00%	\$ 4,350.00	1.51%
R-03	Earth work	\$ 16,242.40	\$ 15,886.56	5.53%	\$ 327.96	0.11%	\$ 16,214.52	5.64%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 20,342.86	\$ 18,736.57	6.52%	\$ 1,532.30	0.53%	\$ 20,268.87	7.05%
R-07	Bituminous pavement	\$ 93,528.75	\$ 25,928.46	9.02%	\$ 55,481.00	19.31%	\$ 81,409.46	28.33%
R-08	Structures	\$ 82,242.59	\$ 80,401.53	27.98%	\$ 616.05	0.21%	\$ 81,017.58	28.19%
R-10	Dayworks	\$ 900.00	\$ 900.00	0.31%	\$ -	0.00%	\$ 900.00	0.31%
R-11	Routine maintenance	\$ 1,765.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-12	Cleaning	\$ 100.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
G-01	Security	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00	0.48%	\$ -	0.00%	\$ 1,380.00	0.48%
G-02	Project team	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00	7.77%	\$ -	0.00%	\$ 22,320.00	7.77%
G-03	Safety and protection	\$ 5,115.47	\$ 5,087.47	1.77%	\$ -	0.00%	\$ 5,087.47	1.77%
G-05	Meetings	\$ 400.00	\$ 200.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.07%
G-06	Ceremonial costs	\$ 800.00	\$ 300.00	0.10%	\$ -	0.00%	\$ 300.00	0.10%
G-07	Mineral fees	\$ 9,372.85	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 220,321.59	\$ 146,203.11	50.88%	\$ 57,957.31	20.17%	\$ 204,160.42	71.04%
B	Profit (net cost x %) ; 10%	\$ 22,032.16	\$ 14,620.31	5.09%	\$ 5,795.73	2.02%	\$ 20,416.04	7.10%
C	General Items	\$ 39,388.32	\$ 29,287.47	10.19%	\$ -	0.00%	\$ 29,287.47	10.19%
D	Tax ((A +B + C) x 2 %)	\$ 5,634.84	\$ 3,802.22	1.32%	\$ 1,275.06	0.44%	\$ 5,077.28	1.77%
E	Grand Total:	\$ 287,376.91	\$ 193,913.11	67.48%	\$ 65,028.10	22.63%	\$ 258,941.21	90.11%

Inspeksaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Deamantino H. Lopes)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

(Eng. Elnino Junior Araujo Mota)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

(Eng. Remigio da C.S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projecto Infrastructura,
Transportes e Irigasaun, ADN,I.P

(Eng^a. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Da Unidade de Controlo e
Validação De Qualidade ADN,I.P

#ANEXU C1 (LO-26) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of the Rural Road Fuiloro - Maupitine Chainage 0 + 000
– 2 + 000, Municipality Lautem**
No. kontratu : **RT/022/MOP-2021**

Data Inspesaun : 10/12/2022

Fatin Inspesaun : Fuiloro - Maupitine

Koordinadas :

Start Point : Long :, Latetude :

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : **1. Eng. Deamantino H. Lopes**

2. Eng. Elnino Junior Araujo Mota

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
✓ 'R-03-03-01 Levelling 1382 m2 X \$ 1.32 = \$ 13978.82 ✓ 'R-05-03-03 Granular pavement - hand packed stone 157.74 m3 X \$ 43.78 = \$ 6905.86 ✓ 'R-07-01 Prime Coat 310.45 m2 X \$ 2.37 = \$ 735.77 ✓ 'R-07-08 Penetration macadam 310.45 m2 X \$ 23.08 = \$ 7165.19 ✓ 'R-08-09-01 Stone masonry – finished 3.79 m3 X \$ 79.89 = \$ 303.17 ✓ 'R-08-24 Marker Posts No. 15 X \$ 14.40 = \$ 216.60	 



#ANEXU C1 (LO-26) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of the Rural Road Fuiloro - Maupitine Chainage 0 + 000**

– **2 + 000, Municipality Lautem**


No. kontratu : **RT/022/MOP-2021**

Sketch & Foto Desenho

Inspesaun Pagamento #1

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

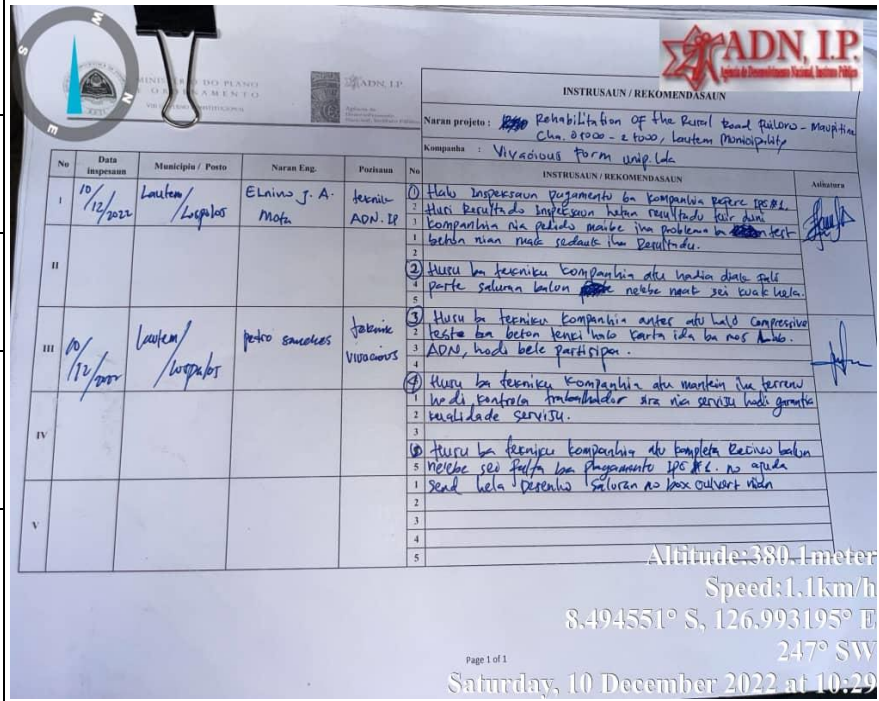

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público # ANEXU D (LO - 26)						INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : Rehabilitation of the Rural Road Fuiloro - Maupitine Chainage 0 + 000 - 2 + 000, Municipality Lautem											
Kompanha : Vivacious Form Unip. Lda.											
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura				
I	12/10/2022	Lospalos/Lautem	Deamantino H. Lopes	Eng.	1	Halo inspesaun pagamento ba kompanhia refere IPC#01, husi rezultado inspesaun hetan rezultado tuir duni kompanhia nia pedido pagamento maibe iha problema test beton nian mak seidauk iha rezultado.					
			Elnino Junior Araujo Mota		2	Husu ba tekniko kompanhia atu hadia diak fali parte saluran balun nebe'e mak sei kuak hela.					
					3	Husu ba tekniko kompanhia atu compressive test ba beton tengki halo karta ida ba mos ADN hodi bele partisipa.					
					4	Husu ba tekniko kompanhia atu mantein iha terreno hodi kontrola trabalhador sira nia servisu hodi garantia qualidade servisu.					
					5	Husu ba tekniko kompanhia atu kompleta recivo balun nebe'e sei falta ba pagamentu IPC.#01, no ajuda send hela dezenho saluran nobox culvert nian.					



#ANEXU C2 (LO-26)

Name of : Rehabilitation of the Rural Road Fuiloro - Maupitine

Project Chainage 0 + 000 - 2 + 000, Municipality Lautem

Contractor : Vivacious Form Unipessoal Limitada

Contract No. : RT/022/MOP-2021

SUMMARY

No	ORIGINAL CONTRACT		PREVIOUS		PROGRESS DEZEMBRO		TO DATE	PERCENTAGE (%)
	Item Description	Amount Contract	Amount Previous	Percentage (%)	Amount This billing	Percentage (%)	Amount to Date	
R-01	General works	\$ 2,600.00	\$ 250.00	0.07%	\$ 750.00	0.22%	\$ 1,000.00	0.29%
R-03	Earth work	\$ 41,443.67	\$ 4,051.90	1.18%	\$ 4,237.52	1.24%	\$ 8,289.43	2.42%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 22,932.93	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-07	Bituminous pavement	\$ 80,701.25	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structures	\$ 129,061.86	\$ -	0.00%	\$ 21,020.45	6.14%	\$ 21,020.45	6.14%
R-10	Dayworks	\$ 1,050.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 2,904.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-12	Cleaning	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
G-01	Security	\$ 690.00	\$ -	0.00%	\$ 575.00	0.17%	\$ 575.00	0.17%
G-02	Project team	\$ 9,360.00	\$ -	0.00%	\$ 4,015.00	1.17%	\$ 4,015.00	1.17%
G-03	Safety and protection	\$ 3,477.00	\$ -	0.00%	\$ 1,427.50	0.42%	\$ 1,427.50	0.42%
G-05	Meetings	\$ 360.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
G-06	Ceremonial costs	\$ 600.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
G-07	Mineral fees	\$ 12,003.64	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 281,093.71	\$ 4,301.90	1.26%	\$ 26,007.98	7.60%	\$ 30,309.88	8.85%
B	Profit (net cost x %) ; 10%	\$ 28,109.37	\$ 430.19	0.13%	\$ 2,600.80	0.76%	\$ 3,030.99	0.89%
C	General Items	\$ 26,490.64	\$ -	0.00%	\$ 6,017.50	1.76%	\$ 6,017.50	1.76%
D	Tax ((A +B + C) x 2 %)	\$ 6,713.87	\$ 94.64	0.03%	\$ 692.53	0.20%	\$ 787.17	0.23%
E	Grand Total:	\$ 342,407.60	\$ 4,826.73	1.41%	\$ 35,318.80	10.31%	\$ 40,145.54	11.72%

Inspeksaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Deamantino H. Lopes)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

(Eng. Elnino Junior Araujo Mota)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

(Eng. Remigio da C.S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projecto Infrastructura,
Transportes e Irigasaun, ADN,I.P

(Eng^a. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Da Unidade de Controlo e
Validação De Qualidade ADN,I.P

#ANEXU C1 (LU-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Maintenance Periodic Luro - Kota Mutu - Lakawa Sta. 0+000 6+500**

No. kontratu : **MPW-W:190095**

Data Inspesaun : 12/12/2022

Fatin Inspesaun : Luro-Kota Muto-Lakawa

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.833464, Latetude : 8.542678

End Point : Long : 126.4756435, Latetude : 8.329905

Naran Inspector : **1. Deamantino Henrique Lopes**

2. Elnino Junior Araujo Mota

Sketch & Foto Desenho

- Earth work**

'R-03-01-01 Excavation and disposal - soft soil

88.51 X \$4.83 = \$427.70

'R-03-03-01 Leveling

240 X \$0.68 = \$163.20

'R-03-03-02 Cambering

18.94 X \$21.41 = \$405.42

- Structures.**

R-08-28 Cement concrete pavement - plum concrete

28.80 X \$102.72 = \$2,958.34

R-08-28-02 Lean concrete

11.91 X \$96.84 = \$1,153.36

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 (LU-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Maintenance Periodic Luro - Kota Mutu - Lakawa Sta. 0+000 6+500**

No. kontratu : **MPW-W:190095**

Sketch & Foto Desenho

R-08-09-01 Stone masonry – finished

56.35 X \$73.36 = \$4,133.84

R-08-25 Marker drums

100PCS

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (LU-5)

Name of Project : Luro to Lakawa 6.500 m

Contractor : Cambota Unipessoal, Lda.

Contract No. : MPW-W: 190095

SUMMARY

No	ORIGINAL CONTRACT		PREVIOUS		PROGRESS DEZEMBRO		TO DATE	PERCENTAGE (%)
	Item Description	Amount Contract	Amount Previous	Percentage (%)	Amount This billing	Percentage (%)	Amount to Date	
R-01	General works	\$ 4,197.87	\$ 1,240.00	1.98%	\$ 320.00	0.51%	\$ 1,560.00	2.48%
R-03	Earth work	\$ 2,010.00	\$ 2,380.20	3.79%	\$ 996.31	1.59%	\$ 3,376.51	5.38%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 4,368.44	\$ 2,810.34	4.48%	\$ 1,918.40	3.06%	\$ 4,728.74	7.53%
R-08	Structures	\$ 23,345.65	\$ 24,139.65	38.45%	\$ 6,536.83	10.41%	\$ 30,676.48	48.86%
R-10	Dayworks	\$ 750.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 11,058.00	\$ 6,412.34	10.21%	\$ 636.16	1.01%	\$ 7,048.50	11.23%
R-13	General Expenses	\$ 5,162.00	\$ 3,657.00	5.82%	\$ 245.00	0.39%	\$ 3,902.00	6.22%
R-15	Provisional sum	\$ 400.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 51,291.96	\$ 40,639.53	64.73%	\$ 10,652.70	16.97%	\$ 51,292.23	81.70%
B	Profit (net cost x %) ; 10%	\$ 5,129.20	\$ 4,063.95	6.47%	\$ 1,065.27	1.70%	\$ 5,129.22	8.17%
C	Overheads (supervision and risk) net cost x % ; 10%	\$ 5,129.20	\$ 4,063.95	6.47%	\$ 1,065.27	1.70%	\$ 5,129.22	8.17%
D	Tax ((Net cost + profit + overhead) x 2 %)	\$ 1,231.01	\$ 975.35	1.55%	\$ 255.66	0.41%	\$ 1,231.01	1.96%
E	Grand Total:	\$ 62,781.36	\$ 49,742.79	79.23%	\$ 13,038.91	20.77%	\$ 62,781.69	100.00%

Inspeksaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Deamantino Henrique Lopes)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN,

(Eng. Elnino Junior Araujo Mota)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

(Eng. Remigio da C.S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projecto Infraestructura,
Transportes e Irigasaun, ADN,I.P

(Eng^a. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Da Unidade de Controlo e
Validação De Qualidade ADN,I.P

#ANEXU C1 (LU-7) Back-up Data

Naran Projeto : **R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - KOTAMUTU - LAKAWA CHAINAGE 0+000-6+500.**

No. kontratu : **MPW - W - 210077**

Data Inspesaun : 12/12/2022

Fatin Inspesaun : Luro-Kota Muto-Lakawa

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.4853818, Latetude : 8.344779

End Point : Long : 126.487988, Latetude : 8.3428751

Naran Inspector : **1. Deamantino Henrique Lopes**

2. Elnino Junior Araujo Mota

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha Tereno no Foto Aktual
R-03 Earth Work 'R-03-03-02 Cambering P1 = 63m P2 = 36.1m P3 = 37.6m L = 4m T = 0.06m $63 \times 4 \times 0.06 = 15.12 \text{ m}^3$ $36.1 \times 4 \times 0.06 = 8.664 \text{ m}^3$ $37.6 \times 4 \times 0.06 = 9.024 \text{ m}^3$ R-08 Structures 'R-08-19 Lean concrete P1 = 63m P2 = 36.1m P3 = 37.6m L = 4m T = 0.05m $63 \times 4 \times 0.05 = 12.60 \text{ m}^3$ $36.1 \times 4 \times 0.05 = 7.22 \text{ m}^3$ $37.6 \times 4 \times 0.05 = 7.52 \text{ m}^3$	

#ANEXU C1 (LU-7) Back-up Data

Naran Projeto : **R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - KOTAMUTU -
LAKAWA CHAINAGE 0+000-6+500.**

No. kontratu : **MPW - W - 210077**

Sketch & Foto Desenho

'R-08-18-05 Plum concrete

P1 = 63m P2 = 36.1m P3 = 37.6m

L = 4m

T = 0.12m

1. $63 \times 4 \times 0.12 = 30.24 \text{ m}^3$
2. $36.1 \times 4 \times 0.12 = 17.328 \text{ m}^3$
3. $37.6 \times 4 \times 0.12 = 18.048 \text{ m}^3$

R-08-09-01 Stone masonry – finished

$17.93 \text{ m}^3 \times \$56.20 = \$1,007.67$

Observasaun iha Tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (LU-7)

Name of Project : Luro, Kotamuto, Lakawa 6.5 Km

Contractor : Ilie Chao Unipessoal, Lda.

Contract No. : MPW-W- 210077

SUMMARY

No	ORIGINAL CONTRACT		PREVIOUS		PROGRESS DEZEMBRO		TO DATE	PERCENTAGE (%)
	Item Description	Amount Contract	Amount Previous	Percentage (%)	Amount This billing	Percentage (%)	Amount to Date	
R-01	General works	\$ 2,800.00	\$ 1,300.00	0.98%	\$ -	0.00%	\$ 1,300.00	0.98%
R-03	Earth work	\$ 4,090.34	\$ 2,183.35	1.65%	\$ 295.04	0.22%	\$ 2,478.39	1.87%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 8,061.66	\$ 2,635.20	1.99%	\$ 215.10	0.16%	\$ 2,850.30	2.15%
R-08	Structures	\$ 69,672.48	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-10	Dayworks	\$ 1,050.00	\$ 48,791.25	36.79%	\$ 15,195.07	11.46%	\$ 63,986.32	48.25%
R-11	Routine maintenance	\$ 9,732.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-12	Cleaning	\$ 200.00	\$ 8,681.00	6.55%	\$ 1,051.00	0.79%	\$ 9,732.00	7.34%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
G-01	Security	\$ 1,380.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
G-02	Project team	\$ 12,840.00	\$ 1,265.00	0.95%	\$ 115.00	0.09%	\$ 1,380.00	1.04%
G-03	Safety and protection	\$ 5,403.00	\$ 11,605.00	8.75%	\$ 1,235.00	0.93%	\$ 12,840.00	9.68%
G-05	Meetings	\$ 360.00	\$ 3,589.20	2.71%	\$ 330.00	0.25%	\$ 3,919.20	2.96%
G-06	Ceremonial costs	\$ 600.00	\$ 300.00	0.23%	\$ -	0.00%	\$ 300.00	0.23%
G-07	Mineral fees	\$ 4,041.90	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 95,806.47	\$ 63,590.80	47.95%	\$ 16,756.21	12.64%	\$ 80,347.00	60.59%
B	Profit (net cost x %) ; 10%	\$ 9,580.65	\$ 6,359.08	4.80%	\$ 1,675.62	1.26%	\$ 8,034.70	6.06%
C	General Items	\$ 24,624.90	\$ 16,759.20	12.64%	\$ 1,680.00	1.27%	\$ 18,439.20	13.90%
D	Tax ((A +B + C) x 2 %)	\$ 2,600.24	\$ 1,734.18	1.31%	\$ 402.24	0.30%	\$ 2,136.42	1.61%
E	Grand Total:	\$ 132,612.26	\$ 88,443.26	66.69%	\$ 20,514.06	15.47%	\$ 108,957.32	82.16%

Inspeksaun Husi :

Verifika Husi :

Sertifika Husi :

(Eng. Deamantino Henrique Lopes)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN,

(Eng. Elnino Junior Araujo Mota)
Eng. ba Projeito Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

(Eng. Remigio da C.S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projecto Infrastructura,
Transportes e Irigasaun, ADN,I.P

(Eng^a. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Da Unidade de Controlo e
Validação De Qualidade ADN,I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																															
Naran Eng.	Demantino H. Lopes						2022																															
Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	DEZEMBRO																														OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
LAUTEM (LA)	1	Rehabilitation of Laleno Road Project Road Section (Sta. 0+000 - 6+210) Maina 2 in Lautem	Corcorcio Irlayvon, Lda	SSS/117/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	2	Rehabilitation Roads Maina 1 to parlamento 3.916 km	Samudra Unip, Lda	SSS/100/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	3	Rural Roads Periodic Maintenance Dasidara Lequidiga 0+000 - 10+000 Chainage Municipality Lautem (162)	Franam Lindo Unip. Lda	MPW-W-RTQ-190038	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
5	Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 8+000 - 15+200 Lautem Municipality	Fian Const. Unip. Lda	SSS/144/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
6	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT DASIDARA - LIQUIDIGA CHAINAGE 0+000-10+500	ILIE CHAO, UNIPESOAAL LDA	MPW - W - 210078	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
LOSPALOS (LO)	3	Rural Road Rehabilitation Fuiloro - Home Chainage 1+200 - 2+500 Municipality Lautem	Paiahara Unipessoal Lda	RT/033/MOP - 2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	5	Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 0+000 - 8+000 km municipality Lautem	Salve, Unip. Lda	SSS/143/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	6	Routine Maintenance Lospalos - Souro Chainage 0+000 - 5+800, Routine Maintenance Leuro - Sourulua Chainage 0+000 - 3+000	Afabubo f. Unip Lda.	RFQ/222/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	7	Road Maintenance Sections : Lospalos - Iliomar Section (A082 - 2) Municipality Lautem (162)	Lero Company, Lda	MPW-W-190120	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	12	Rural Road Rehabilitation Fuiloro - Home Chainage 0+000 - 1+200 Municipality Lautem	Paiahara Unipessoal Lda	RT/032/MOP - 2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	14	Rural Roads Periodic Maintenance Lospalos Soru Chainage 0 + 000 - 2 + 500, Lautem Municipality (162)	Ulau Unip. Lda	MPW-W: 190110	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	20	R4D RURAL ROADS SPOT IMPROVEMENT LEURO - SOURULUA CHAINAGE 0+000-2+650	KOMI ARA UNIPESOAAL LDA	MPW - W -210080	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	24	Roads Maintenance Section Lospalos - Iliomar (A08 - 3) 2021 Lautem Municipality	Venjus Unip., Lda	MPW - W220015	LM - CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	25	Rehabilitation Road Fuiloro - Home Chainage 2 + 500 - 3 + 500	Afi Hini Unip., Lda	-	LM - CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
26	Rehabilitation Road Fuiloro - Maupitine Chainage 0 + 000 - 2 + 000	Vivacious Form Unip., Lda	-	LM - CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
27	Rehabilitation Road Fuiloro - Maupitine Chainage 2 + 000 - 4 + 000	Tchai Celero Unip., Lda	-	LM - CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																
28	Rehabilitation Road Fuiloro - Maupitine Chainage 4 + 000 - 7 + 000	Kako Anik Unip., Lda	-	LM - CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
						Actual																																

PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM

Naran Eng.	Demantino H. Lopes							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Categoria	Dono do Projeto	Action	DEZEMBRO																														OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
LURO (LU)	2	Rehabilitation of Road Laival - Vairoque - Liarava Roads Sta. 0+000 - 7+250 (7.25 km) Municipality Lautem	Hoven II, Unip. Lda	SSS/140/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

Eng. Deamantino Henrique Lopes
Eng. ba Projeto Infraestrutura e Irrigação Municipal de Lameira, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade , ADN,I.P


Aprova Husi :

(Eng. Januario Maja Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo ADN,I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Naran Eng.	Elnino Junior Araujo Mota							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	DEZEMBRO																														OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
LAUTEM (LA)	1	Rehabilitation of Laleno Road Project Road Section (Sta. 0+000 - 6+210) Maina 2 in Lautem	Corcorcio Irloyvon, Lda	SSS/117/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																															
Naran Eng.	Elnino Junior Araujo Mota							2022																															
Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	DEZEMBRO																														OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
LURO (LU)	2	Rehabilitation of Road Laivai - Vairoque - Liarava Roads Sta. 0+000 - 7+250 (7.25 km) Municipality Lautem	Hoven II, Unip. Lda	SSS/140/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	3	Rural Roads Periodic Maintenance Luro - Barikafa Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Lautem (162)	Perekiki Mori Unip. Lda	MPW-W-NVB-R-190041	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	Rehabilitation of Luro - Buihomau Roads	Consortio ASCEM "CACM" Lda"	MPW-W-13-005	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	Road Maintenance Periodic Luro - Kota Mutu - Lakawa Sta. 0+000 6+500	Cambota	MPW-W:190095	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	6	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - BARIKAF CHAINAGE 0+000+7+000 LAUTEM MUNICIPALITY	Lili Unip. Lda.	MPW - W 210079	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - KOTAMUTU - LAKAWA CHAINAGE 0+000-6+500	ILIE CHAO, UNIPESSOAL LDA	MPW - W - 210077	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
ILIOMAR (ILO)	2	Additional Emergency Iliomar Roads	Resister Unip.Lda	SSS/140/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	Rehabilitation Road Cainliu - Larisula Chainage 2 + 700 - 5 + 400	Broven Unip., Lda	-	LM - CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	8	Rehabilitation Road Cainliu - Larisula Chainage 8 + 750 - 11 + 050	Tapirae Unip., Lda	-	LM - CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	9	Rehabilitation Road Cainliu - Larisula Chainage 11 + 050 - 13 + 050	Om Brother Unip., Lda	-	LM - CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
TUTUALA (TU)	1	Road Rehabilitation From Tutuala to Valu Chainage 0+000 - 3+850 Municipality Lautem	Consortio Vacu-Hiamoinu Lda	SSS/063/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Rehabilitation Road Section : Jct. Tutuala Roads (C2) Package 1 Sta. 3+850 - 7+725 Municipality Lautem	Hamutuk Unipessoal, Lda	SSS/083/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

 Plano Periode inspesaun iha tereinu

 Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

 Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili

 Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :


Eng. Elnino Junior Araujo Mota
Eng. ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN,I.P

Aprova Husi :


(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN,I.P

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VULGAREMENTE CONHECIDO COMO ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Naran Eng.	Inocencio dos Reis Costa Maia							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Municipio	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	DECEMBER																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LAUTEM (LA)	7	MEJD PKRIE EBF 1.2 Euquise	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Actual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Naran Eng.	Inocencio dos Reis Costa Maia							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	DECEMBER																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ILIOMAR (IL)	3	New Construction of Health Post and Doctor Hause Building in Fuat Iliomar, Lautem Municipality Lautem	Naesalobu	RDTL-MS-DNA-ICB-21-072	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Note:



Plano Periode inspesaun iha tereinu



Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu



Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili



Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)

Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Lautem, ADN,I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN,I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN,I.P

[illegible]

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIA COFINAMENTO DO CENSO  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																															
Naran Eng.	Inocencio dos Reis Costa Maia							2022																															
Municipio	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																						
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	DECEMBER																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ILJOMAR (IL)	3	New Construction of Health Post and Doctor House Building in Fuat Ilomar, Lautem Municipality Lautem	Naesalobu	RDTL-MS-DNA-ICB-21-072	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	4	MEJD PKRIE Ta-Besi Fera Nabem	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																
							Actual																																
	5	MEJD PKRIE 1.2 Tirilolo	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																
							Actual																																
	6	MEJD PKRIE EBC Ilomar	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																
							Actual																																
TUTUALA (TU)	3	MEJD PKRIE EBC Mehara	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																
							Actual																																
	4	MEJD PKRIE Pre-Escolar Mehara	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia)

Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Lautem, ADN,I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN,I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)

Adjunto Director Executivo ADN,I.P

Naran Eng.	Adonis Julio Fernandes							2022																															
Municipio	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																						
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	DESEMBRO																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
LAUTEM (LA)	1	Konstrusaun Edificio PGR Municipio Lautem	Cambota	RDTL-D.FeO/APRO/PGR/19.001/2019	LM-CD	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	Plan																																
							Actula																																
	2	Projectu Konstrusaun Turismu Komunitariu iha COM, Postu Administrativu Lautem	Joli Toni Unip Lda	17/CNEFP?XI/2016	LM-BS	SEFOPE	Plan																																
							Actula																																
	3	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Euquisi iha Aldeia Barlio Suco Euquisi Postu Administrativu Lautem Munisiplu Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 EUQUISI	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
	4	Rehabilitasaun ba EBF Tasi Ibun Lautem iha Aldeia Lautem Suco Parlamento Postu Administrativu Lautem Munisiplu Lautem	MEJD PKRIE EBF TASI IBUN LAUTEM	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
	5	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Lautem, Ministry of Health, Timor Leste	Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-189	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actula																																
LOSPALOS (LO)	1	Rehabilitasaun ba ESG Lere Anan Timur Lospalos iha Aldeia Kuluhun Suco Fulluro Postu Administrativu Lospalos Munisiplu Lautem	MEJD PKRIE ESG LERE ANAN TIMOR LOSPALOS	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
	2	Rehabilitasaun ba Pre Escolar Ira - Ara iha Aldeia Lospala Suco Fulluro Postu Administrativu Lospalos Munisiplu Lautem	MEJD PKRIE PRE ESCOLAR IRA-ARA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
	3	Rehabilitasaun ba EBF No-2 Lospalos iha Aldeia Central Suco Fulluro Postu Administrativu Lospalos Munisiplu Lautem	MEJD PKRIE EBF NO2 LOSPALOS	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
	4	Konstrusaun Fatin Izolamentu iha CHC Lospalos Municipiu Lautem	RICS Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-253	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actula																																
	5	New Construction Of Houses For Veterant 17 Unit	Davinci	001/RDTL/MPIE/AND/DILVI/2016	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																
							Actula																																
6	Konstrusaun Murru Haleu Edifisiu Administasaun Munisiplu no Jardim Municipiu Lautem	Marvong Construction Unip.Lda	02/KML-PDIM/SMA/X2021	PDIM	ESTATAL	Plan																																	
						Actual																																	
7	Rehabilitasaun Residencia Adminitrador + Murru no Jardim Municipio Lautem	Marvong Construction Unip.Lda	01/KML-PDIM/SMA/X/2021	PDIM	ESTATAL	Plan																																	
						Actual																																	
LURO (LU)	1	Rehabilitasaun ba ESG Fernando Lasama de Luro iha Aldeia Amahira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisiplu Lautem	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE LURO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	2	Rehabilitasaun ba EBF Ussuvasu iha Aldeia Ussufasu Suco Baricafa Postu Administrativu Luro Munisiplu Lautem	MEJD PKRIE EBF USSUVASU	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	3	Rehabilitasaun ba EBC Luro iha Aldeia Amaira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisiplu Lautem	MEJD PKRIE EBC LURO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	4	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Barikafa iha Aldeia Sarelari Suco Baricafa Postu Administrativu Luro Munisiplu Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 BARIKAFA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	5	Rehabilitasaun ba Pre Escolar Amaira Luro iha Aldeia Amaira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisiplu Lautem	MEJD PKRIE PRE ESCOLAR AMAIRA LURO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
6	Rehabilitasaun ba EBF Abere iha Aldeia Abere Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisiplu Lautem	MEJD PKRIE EBF ABERE	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
						Actual																																	
7	New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ulukisi, Ailembere, and Liarafa, Luro - Lautem Municipality	Vairoque Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000432	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
						Actula																																	
	1	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Ta - Besi Fera Naben - Fuat iha Aldeia Acadiliro Suco Fuat Postu Administrativu Iliomar Munisiplu Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 TA BESI FERA NABEN-FUAT	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
														</																									

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	DESEMBRO																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ILIOMAR (IL)	2	Reabilitasaun ba EBF 1,2 Tirilolo iha Aldeia Tirilolo Suco Tirilolo Postu Administrativu Iliomar Munisípiu Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 TIRILOLO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
	3	Reabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisípiu Lautem	MEJD PKRIE EBC DE ILIOMAR	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
	6	New Installation MV, LV Line and House Connection from Ailebere to Pujiara, Arafalun and Ledo Ira, Iliomar - Lautem Municipality	Lor Construction Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI- PEN : 00000363	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actula																																
7	New Construction of Health Post and Doctor House Building in Fuat Iliomar, Lautem Municipality Lautem	Naesalobu	RDTL-MS-DNA-ICB-21-072	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
						Actula																																	
TUTUALA (TU)		Reabilitasaun ba EBC Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisípiu Lautem	MEJD PKRIE EBC MEHARA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
		Reabilitasaun ba EPE Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisípiu Lautem	MEJD PKRIE EPE MEHARA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :




(Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projeitu ME,ADN.IP

Sertifika Husi :



(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN,I.P

Aprova Husi :



(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN,I.P

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Vidal Guterres	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Município	MUNICIPIO DILI NO POSTOS																											Observasaun																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		Desembro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We		Th	Fri	Sa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMPRESTIMIO	1	National road no. 1 Upgrading project Manatuto - Baucau (package A01-02)Package A01-02/sta 56+400-114+102(56.82km)	Shanghai Construction Group Co.Ltd Jv PT. Brantas Abipraya(Persero)		IMPRESTIMIO	ADB (LOAN)	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



2022





2022

IMPRESTIMO



2022

IMPRESTIMO

