



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU BAUCAU

NOVEMBRO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO BAUCAU

NOVEMBRO 2022

Prepara Hui :


(Eng. Agostinho Aranda)
Eng. ba Projecto Edifício Público Beé no Saneamento
Município Baucau, ADN, I.P.
(Eng. Jacob da Costa Camoês)
Eng. ba Projecto Infraestrutura e Irrigação
Município Baucau, ADN, I.P.
(Eng. Jerry Gil M. Pereira)
Eng. ba Projecto Edifício Público Beé no Saneamento
Município Baucau, ADN, I.P.
(Eng. Leonito Pereira)
Eng. ba Projecto Infraestrutura e Irrigação
Município Baucau, ADN, I.P.
(Eng. Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projecto ME, ADN, I.P.

Verifika Husi :



(Arc. Francisco X D D Jeronimo)

Eng. Senior ba Edificio Publiku no Bee
Saneamentu, ADN, I.P.



(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)

Eng. Senior ba Projektu Infraestrutura e
Irigasaun, ADN, I.P.



(Eng. Deolindo de F. Marques)

Chefe Seksaun ba Projektu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)


Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN, I.P.

Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, ST., M. Eng)

Director Executivo, ADN, I.P.



INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	3
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal	3
1.2 Perfil Municipio Baucau	3
1.3. Lista Projectos	8
II. PROGRESU FISIKU	28
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	28
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	29
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	29
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	30
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	30

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Baucau	6
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Baucau	6
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Baucau Por Fundus Finansiamientos	8
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Baucau Por Sectores	12
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Baucau Por Ministerio	20
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Baucau	28

I. INTRODUSAUN.

1.1. Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefisiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekretu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2. Perfil Municipio Baucau



Mapa 3 hatudu pozisaun jeográfika Autoridade Munisipal Baucau ne'ebé ho luan área hamutuk 1,494 km² ho populasaun 111,694 tuir Sensus 2010. Autoridade Munisipal Baucau iha Posto Administrativo neen (6) ho 59 Sukus no 282 Aldeias hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.

Baguia		Baucau		Laga		Quelicaí	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Afaloicai	4	Bahu	5	Atelari	10	Abafala	3
Alaua craic	5	Bucoli	6	Libagua	5	Abo	4
Alaua leten	5	Buibau	6	Nunira	5	Afaca	3
Defa-uassi	4	Buruma	4	Saelari	9	Baguia	3
Haeconi	6	Caibada(U aima)	7	Sagadati	11	Bualale	2
Larisula	7	Gariuai	8	Samalari	7	Guruca	5
Lavateri	5	Samalari	4	Soba	6	Iacoliu	3
Osso huna	3	Seical	5	Tequi naumata	5	Laisoro Lai de baixo	4
Samalari	4	Trilolo	6	-	-	Laisorolai De cima	3
Uacala	4	Triloca	4	-	-	Ielalai	4
-	-	Ualili	10	-	-	Letemumo	5
-	-	-	-	-	-	Macalaco	3
-	-	-	-	-	-	Maluro	4
-	-	-	-	-	-	Namanei	4
-	-	-	-	-	-	Uaitame	4
Total	48		65		58		54

Vemasse		Venilale	
sukus	Aldeia	Suku	Aldeia
Caicua	2	Bado-Ho'o	5
Loilubo	3	Baha Mori	6
Ossouala	5	Fatulia	4
Ostico	3	Uailaha	4
Uaigae	2	Uai-Oli	4
Uatulari	3	Uatu Hoco	4
Vemasse	4	Uma AnaUlo	4
-	-	Uma Ana Ico	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
	22		35

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Baucau

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Baucau								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	3	2				3	
2	Administrasaun no Financas	0	0				0	
3	Motorista	1	1				1	
4	Seguransa	0	0				0	
Total		4					4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Baucau.

ASET ADN,IP MUNICIPIO BAUCAU								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	1	1				1	
2	Kareta	1	1					
3	Desktop HP / Monitor	0	0					
4	Laptop HP	2	2					
5	Printer Cannon	1	1					
6	UPS	0	0					
7	Armario File	1	1					
8	Armario Tau hena	3	3					

9	Meja escritorio	1	1					
10	Meja han	1	1					
11	Meja TV (kiik)	1						
12	Kadeira escritorio	6	6					
13	Kadeira han	4	4					
14	Sofa	1 Set	1					
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3	3 Set	1					
16	Jeleira	1	1					
17	Water Dispenser	1	1					
18	TV + Parabola	1 Set	1					
19	AC	4	4					
20	Kompor	0	0					
21	Kompor Gas	0	0					
22	Rack sepatu	0	0					
23	Rack Piring	0	0					
24	Water Pump Sanyo	1	1					

1.3 : Lista Projectos

Projeto hotu ne'ebe akumula iha lista ne'e bazeia ba dadus projeto ne'ebe sei lao hela no mos projeto ne'ebe abandona ona tinan barak, projeto hirak ne'e fahe tuir lista 1.3.1 Projeto Por Fundus Finansiamentos, 1.3.2 Projeto Por Sectors no 1.3.3 Projeto Por Ministerios.

1.3.1 : Lista Projectos Municipio Baucau Por Fundus Finansiamentos

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI+Fundu Covid-19+LM-BS+LM-CD+LM-TP+PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Baguia	14	\$ 2,230,497.80	64.05%
2	Baucau Villa	20	\$ 10,638,283.98	68.80%
3	Laga	11	\$ 2,698,206.10	55.45%
4	Multi Posto	6	\$ 110,461,376.54	75.93%
5	Quelicaí	20	\$ 11,842,330.73	56.26%
6	Vemasse	7	\$ 1,824,722.56	66.75%
7	Venilale	14	\$ 8,353,697.70	34.18%
	Grand Total	92	\$ 148,049,115.41	70.82%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Baguia	2	\$ 561,399.61	89.89%
2	Baucau Villa	5	\$ 8,312,880.92	74.08%
3	Laga	2	\$ 719,359.34	81.57%
4	Multi Posto	4	\$ 109,889,602.64	76.09%
5	Quelicaí	8	\$ 9,854,959.45	58.76%
6	Vemasse	1	\$ 690,194.30	90.00%
7	Venilale	9	\$ 7,717,771.14	33.26%
	Grand Total	31	\$ 137,746,167.40	72.48%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundu Covid-19		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Baguia		\$ -	0.00%
2	Baucau Villa	1	\$ 469,360.62	70.14%
3	Laga		\$ -	0.00%
4	Multi Posto		\$ -	0.00%
5	Quelicaí		\$ -	0.00%
6	Vemasse		\$ -	0.00%
7	Venilale		\$ -	0.00%
	Grand Total	1	\$ 469,360.62	70.14%

Dados kada projeto: Anexu A

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Baguia	1	\$ 255,148.17	71.44%
2	Baucau Villa	2	\$ 207,288.36	65.36%
3	Laga	2	\$ 595,138.56	55.24%
4	Multi Posto		\$ -	0.00%
5	Quelicaí		\$ -	0.00%
6	Vemasse	1	\$ 50,000.00	60.97%
7	Venilale		\$ -	0.00%
	Grand Total	6	\$ 1,107,575.09	61.12%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Baguia	1	\$ 316,447.42	99.83%
2	Baucau Villa	3	\$ 487,013.64	60.01%
3	Laga	2	\$ 968,003.94	44.59%
4	Multi Posto	2	\$ 571,773.90	44.70%
5	Quelicaí	4	\$ 1,205,716.58	53.94%
6	Vemasse	4	\$ 1,030,442.93	53.09%
7	Venilale	1	\$ 282,288.02	43.36%
	Grand Total	17	\$ 4,861,686.43	53.79%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Baguia	8	\$ 845,834.12	29.35%
2	Baucau Villa	7	\$ 786,409.33	37.06%
3	Laga	3	\$ 288,126.88	28.98%
4	Multi Posto		\$	0.00%
5	Quelicaí	8	\$ 781,654.70	28.33%
6	Vemasse		\$	0.00%
7	Venilale	3	\$ 298,750.16	49.11%
	Grand Total	29	\$ 3,000,775.19	33.04%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Baguia	2	\$ 251,668.48	70.50%
2	Baucau Villa	2	\$ 375,331.11	29.93%
3	Laga	2	\$ 127,577.38	51.30%
4	Multi Posto		\$ -	0.00%
5	Quelicaí		\$ -	0.00%
6	Vemasse	1	\$ 54,085.33	35.55%
7	Venilale	1	\$ 54,888.38	35.55%
	Grand Total	8	\$ 863,550.68	45.62%

1.3.2 : Lista Projectos Municipio Baucau Por Sectors

NO	POR SECTOR	MUNICIPIO BAUCAU		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 316,447.42	99.83%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	13	\$ 1,999,417.79	29.65%
3	EDUKASAUN	31	\$ 3,743,421.04	43.34%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	10	\$ 3,110,591.49	84.79%
5	ESTRADAS	17	\$ 22,189,429.73	60.50%
6	ESTRADAS E PONTES	7	\$ 3,777,133.80	4.02%
7	IMPRESTIMO	4	\$ 109,889,602.64	76.09%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	8	\$ 2,553,710.88	84.55%
9	SAUDE	1	\$ 469,360.62	70.14%
Grand Total		92	\$ 148,049,115.41	70.82%

NO	POR SECTOR	Baguia		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 316,447.42	99.83%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 251,668.48	70.50%
3	EDUKASAUN	8	\$ 845,834.12	29.35%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 485,365.98	89.88%
5	ESTRADAS		\$ -	0.00%
6	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
7	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 331,181.80	75.70%
9	SAUDE		\$ -	0.00%
	Grand Total	14	\$ 2,230,497.80	64.05%

NO	POR SECTOR	Baucau Villa		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$	0.00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	4	\$ 464,962.08	34.44%
3	EDUKASAUN	8	\$ 1,463,612.86	58.56%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 584,858.54	82.59%
5	ESTRADAS	5	\$ 7,655,489.88	71.70%
6	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
7	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
9	SAUDE	1	\$ 469,360.62	70.14%
	Grand Total	20	\$ 10,638,283.98	68.80%

NO	POR SECTOR	Laga		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 574,764.00	19.63%
3	EDUKASAUN	4	\$ 353,569.20	42.12%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
5	ESTRADAS	2	\$ 656,863.79	58.74%
6	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
7	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	3	\$ 1,113,009.11	76.23%
9	SAUDE		\$ -	0.00%
	Grand Total	11	\$ 2,698,206.10	55.45%

NO	POR SECTOR	Multi Posto		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0.00%
3	EDUKASAUN		\$ -	0.00%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
5	ESTRADAS	2	\$ 571,773.90	44.70%
6	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
7	IMPRESTIMO	4	\$ 109,889,602.64	76.09%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
9	SAUDE		\$ -	0.00%
Grand Total		6	\$ 110,461,376.54	75.93%

NO	POR SECTOR	Quelicaí		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 549,049.52	13.32%
3	EDUKASAUN	8	\$ 781,654.70	28.33%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 729,303.13	95.71%
5	ESTRADAS	4	\$ 7,527,992.12	75.31%
6	ESTRADAS E PONTES	4	\$ 2,254,331.26	0.00%
7	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
9	SAUDE		\$ -	0.00%
	Grand Total	20	\$ 11,842,330.73	56.26%

NO	POR SECTOR	Vemasse		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 104,085.33	47.76%
3	EDUKASAUN		\$ -	0.00%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 840,963.28	86.66%
5	ESTRADAS	3	\$ 879,673.95	49.95%
6	ESTRADAS E PONTES		\$ -	0.00%
7	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
9	SAUDE		\$ -	0.00%
	Grand Total	7	\$ 1,824,722.56	66.75%

NO	POR SECTOR	Venilale		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$	0.00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 54,888.38	35.55%
3	EDUKASAUN	3	\$ 298,750.16	49.11%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 470,100.56	61.99%
5	ESTRADAS	1	\$ 4,897,636.09	24.21%
6	ESTRADAS E PONTES	3	\$ 1,522,802.54	9.98%
7	IMPRESTIMO		\$	0.00%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	3	\$ 1,109,519.97	95.54%
9	SAUDE		\$	0.00%
	Grand Total	14	\$ 8,353,697.70	34.18%

1.3.3 : Lista Projectos Municipio Baucau Por Ministerios

NO	POR MINISTERIO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	7	\$ 798,108.36	41.16%
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	1	\$ 316,447.42	99.83%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	47	\$ 141,540,306.57	72.07%
4	MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	31	\$ 3,743,421.04	43.34%
5	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 748,725.31	53.73%
6	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 50,000.00	60.97%
7	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	2	\$ 782,313.77	14.42%
8	SAMES	1	\$ 69,792.94	42.92%
Grand Total		92	\$ 148,049,115.41	70.82%

NO	POR MINISTERIO	Baguia		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 251,668.48	70.50%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 316,447.42	99.83%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 816,547.78	84.13%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	8	\$ 845,834.12	29.35%
5	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
7	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
8	SAMES		\$ -	0.00%
	Grand Total	14	\$ 2,230,497.80	64.05%

NO	POR MINISTERIO	Baucau Villa		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 375,331.11	29.93%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	8	\$ 8,260,186.45	72.52%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	8	\$ 1,463,612.86	58.56%
5	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 469,360.62	70.14%
6	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
7	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
8	SAMES	1	\$ 69,792.94	42.92%
	Grand Total	20	\$ 10,638,283.98	68.80%

NO	POR MINISTERIO	Laga		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 62,135.06	0.00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	\$ 1,769,872.90	69.74%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	4	\$ 353,569.20	42.12%
5	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
7	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 512,628.94	22.01%
8	SAMES		\$ -	0.00%
	Grand Total	11	\$ 2,698,206.10	55.45%

NO	POR MINISTERIO	Multi Posto		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	6	\$ 110,461,376.54	75.93%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
7	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
8	SAMES		\$ -	0.00%
	Grand Total	6	\$ 110,461,376.54	75.93%

NO	POR MINISTERIO	Quelicai		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	10	\$ 10,511,626.51	60.58%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	8	\$ 781,654.70	28.33%
5	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 279,364.69	26.17%
6	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
7	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 269,684.83	0.00%
8	SAMES		\$ -	0.00%
	Grand Total	20	\$ 11,842,330.73	56.26%

NO	POR MINISTERIO	Vemasse		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 54,085.33	35.55%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	\$ 1,720,637.23	67.90%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 50,000.00	60.97%
7	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
8	SAMES		\$ -	0.00%
Grand Total		7	\$ 1,824,722.56	66.75%

NO	POR MINISTERIO	Venilale		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 54,888.38	35.55%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	10	\$ 8,000,059.16	33.62%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	3	\$ 298,750.16	49.11%
5	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
7	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL		\$ -	0.00%
8	SAMES		\$ -	0.00%
	Grand Total	14	\$ 8,353,697.70	34.18%

1.4. Dadus Populasaun Munisipiu Baucau

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade Produktivu (idade 15-64)		idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Baguia	13,569	4,111	3,962	2,769	2,727
Baucau	48,990	14,524	14,547	10,211	9,709
Laga	16,291	4,549	4,591	3,567	3,585
Quelicaí	6,127	1,774	1,413	1,536	1,405
Vemasse	2,783	711	698	707	667
Venilale	5,136	1,223	1,197	1,369	1,347

Fontes : Projeksaun Populasaun bazea ba Census Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan nia laran, husi lista #anexu B hatudu progresu aktual fulan ida ne'e ho nia prensentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu prentangen aktual fulan ida ne'e hatudu progresu fisiku komulativu husi prosentu antrior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare iha #anexu B, detallu ba back-up #anexu C, no Instrusaun Servisu #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

1. Transporte no Engenheiro la Suficiente
2. Ho Volume Servisu ne'ebe barak Planu Inspeksaun kada fulan dala Tolu(3) ba visita Projetu sente todan ou la kobre (**karik iha villa laran bele halo Monitorizasaun kada fulan bele dala tolu(3) maibe ho distancia ne'ebe do'ok no estrada ne'ebe grave hanesan Laga, Quelicai, Baguia no Venilale sebele halo monitorizasaun kada fulan dala ida (1) deit**).
3. Mina la suficiente
4. Pakote hodi asesu ba **Dropbox** ami husi Baucau sei uza ida idak nia pakote ou pulsa pribado
5. Ami Engenheiro Municipio sente todan tamba planu inspeksaun kada fulan dala tolu (3) ho distancia balun ne'ebe do'ok no estrada grave ami dala ruma la iha tempu atu sukat kada item por item tamba ami maneija tempu hodi ba fali projetu seluk no dala ruma mos ami fila kalan bo'ot to'o des oras (10) hanesan ne'e ami la konsege **update** informasaun kada projetu ba **Dropbox**.

➤ Obstaclo Parte Eletricidade

1. Laptop laiha atu halo relatorio waihira iha Municipiu
2. Transporte (Kareta / motor) la Suficiente atu koresponde ba plano ne'ebe Aprovado
3. Combustibel / Mina (Municipiu Baucau, Viqueque, Lautem, Pertamina Eto laiha)
4. Kontractor laiha site ou kontaktu / telefone la tama no contractor la ba iha site/terenu
5. Menus Enginheiro ME
6. Natureza hanesan Udan Boot, Estrada kotu dalan la asesu ba kareta

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU


4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Sujere ba Superior sebele aumenta transporte no Enginheiro
2. Sujere ba Superior karik bele planu Inspeksaun kada fulan dala tolu (3) ba visita projetu sente todan ou la kobre (**ho distancia ne'ebe do'ok no estrada ne'ebe grave hanesan Posto Administrativo Laga, Quelicai no Baguia sebele halo monitorizasaun kada fulan dala ida 1 deit**).
3. Sujere ba Superior karik bele planu Inspeksaun kada fulan dala ida 2 ou tuir planu Inspesaun ba projetu sira ne'ebe iha **Posto Administrativo Baucau villa, Vemase no Venilale**.
4. Projecto nebe'e mak engenheiro la iha terenu ami la presija halo monitorizasaun no sukat nia volume
5. Presija aumenta mina
6. Husu ba Logistik sebele resolve tiha linha Internet iha Residence ADN Baucau.

➤ **Recomedacasaun Parte Eletricidade**

1. Rekomenda ba parte Logistik atu prepara Laptop kada Engenheiro (ba Eng. Ne'ebe seidauk hetan).
2. Rekomenda ba Logistik atu Aumenta tranporte ka kareta ba Engenheiro Electricidade.
3. Rekomeda ba parte Logistik atu hare problema konbustibel / Mina iha parte leste mak hanesan Municipio Baucau, Lautem no Viqueque problema iha neba Pertamina Eto laiha nemak dificulta Ami nia plano monitorizasaun karik mina hotu ami tenki fila mai atesta iha municipio Manatuto.
4. Rekomenda ba Superior sira atu koordena ho Dono do projeto (EDTL,EP) oinsa atu kria linha koordenasaun ne'ebe diak.
5. Rekomenda ba HR atu Amenta Eng. Electricidade (Recruta tan Eng. ME)
6. Rekomenda ba parte Logistik atu prepara / Facilita simcard Office nian ba Eng. Electrica.

Note: Asinatura Husi Eng. Municipio Baucau

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Baucau						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Enjineiru	Agustinho Aranda	153	Enjineiru EPAS		
		Jacob da Costa Camoes	165	Enjineiru ITI		
		Jerry Gil M. Pereira	255	Enjineiru EPAS		

		Leonito Pereira	241	Enjineiru ITI		
		Adonis Julio Fernandes	152	Enjineiru ME		
2	Enjineira	Olivia Soares	112	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Anacleto de S. Belo	048	Motorista		

#ANEXU A

MUNICIPIO BAUCAU (LISTA GERAL)

LOKALIZASAUN PROJETU

NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNICIPIO	NARAN COMP.	NARAN KONT.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA (%)	PAGA (\$)	BAL. (\$)	STATUS PROJECTO	OBS
1	Instalasaun Media tensaun husi Dokubere to'o Ponte Seical	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Baucau Villa	Baucau	Alandio Tahame	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000162	\$ 22,000.00	Jan. 1, 2016	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 22,000.00	ON-GOING	
2	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Caibada Makasae to Lutumumu, Kaibada Waimua, Knua Waimataoli, Kaiwa'a and Haucati - Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Baucau Villa	Baucau	Lover Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000340	\$ 562,858.54	July 6, 2016	95.35%	85.82%	\$ 483,039.75	\$ 79,818.79	ON-GOING	
3	Rehabilitasaun Estrada Jct Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.0+000-6+025	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Baucau Villa	Baucau	Domin Timor Diak, Lda	SSS/078/MOPTC-2017	\$ 3,599,951.87	Sept. 12, 2017	93.55%	73.52%	\$ 2,646,594.70	\$ 953,357.17	ON-GOING	
4	Rehabilitasaun Estrada Jct Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.6+025-12+075	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Baucau Villa	Baucau	Gihon Unip, Lda	SSS/066/MOPTC-2017	\$ 3,450,866.98	Sept. 12, 2017	92.50%	71.36%	\$ 2,462,579.07	\$ 988,287.91	ON-GOING	
5	Rehabilitation Of MPWTC Office in the Municipality of Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Baucau Villa	Baucau	Co. Cactus Unip. Lda	546/DGCS-MOPTC/VI/2016	\$ 19,838.03	Aug. 1, 2016	100.00%	90.00%	\$ 17,854.23	\$ 1,983.80	ON-GOING	
6	Rural Roads Routine Maintenance Baucau - Uatobo Chainage 0+000 - 4+800 and Boile - Uatobo Chainage 0+000 - 5+200 in Municipality Baucau / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Baucau Villa	Baucau	Talamori	MPWTC-W-190090	\$ 63,815.15	Jan. 10, 2012	80.00%	68.56%	\$ 43,751.20	\$ 20,063.95	ON-GOING	
7	Road Maintenance Section: Baucau Urbans, Baucau Town, Baucau Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Baucau Villa	Baucau	Jomarjo Unipessoal Lda	MPW-W-190158	\$ 137,495.42	Nov. 30, 2019	85.28%	76.75%	\$ 105,530.79	\$ 31,964.63	ON-GOING	
8	Rehabilitasaun Eis hospital Trilolo Baucau ba Fatin Karantina,ICU,Laboratorium no Izolamento Ministerio	MINISTERIO SAUDE	Fundu Covid-19	SAUDE	Baucau Villa	Baucau	Central Hill Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-252	\$ 469,360.62	Dec. 10, 2020	97.69%	70.14%	\$ 329,188.84	\$ 140,171.78	ON-GOING	
9	R4D Rural Road Spot Improvement Baucau-Uatobo Chainage 0+000 - 4+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Baucau Villa	Baucau	Mexa	MPW-W-210047	\$ 403,360.46	June 10, 2021	83.70%	57.18%	\$ 230,643.85	\$ 172,716.61	ON-GOING	
10	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	Sanira Construction Unip Lda	RDTL-326	\$ 677,203.53	Nov. 12, 2012	92.82%	83.53%	\$ 565,698.21	\$ 111,505.32	ABANDONA	
11	Konstrusaun Sede Suku, Suku Samalari Baucau Villa Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Baucau Villa	Baucau	Rozi Unipessoal, Lda	04/KDM-BAUCAU/IX/2021	\$ 59,323.84	08-Jul-21	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 59,323.84	ON-GOING	
12	Konstrusaun Moru Haleu Mercadu Tualiku Baucau Villa Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Baucau Villa	Baucau	Gardel Unipessoal.Lda	07/KDM-BAUCAU/IX/2021	\$ 316,007.27	08-Jul-21	39.50%	35.55%	\$ 112,329.98	\$ 203,677.29	ON-GOING	
13	Konstrusaun Foun ba Moru Protesaun ba Armazen SAMES Regional Baucau iha Municipio Baucau	SAMES	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Baucau Villa	Baucau	Talamori	RDTL-SAMES-RFQ-021-071	\$ 69,792.94	08-Jul-21	77.99%	42.92%	\$ 29,956.90	\$ 39,836.04	ON-GOING	
14	Rehabilitasaun ba EBF Maucale iha Aldeia Maucale Suco Gariuai Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE EBF MAUCALE	-	\$ 83,515.23	Oct. 15, 2021	77.98%	77.14%	\$ 64,422.25	\$ 19,092.98	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 44.84%
15	Rehabilitasaun ba EBF Zona Golgota iha Aldeia Ro - Ulo Suco Bahu Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE EBF ZONA GOLGOTA	-	\$ 82,531.68	Oct. 15, 2021	36.04%	58.48%	\$ 48,262.44	\$ 34,269.24	ON-GOING	
16	Rehabilitasaun ba ESG 02 Vila Nova Baucau iha Aldeia Samalatu Liba Suco Buibau Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE ESG NU. 02 VILA NOVA BAUCAU	-	\$ 144,241.57	Oct. 15, 2021	64.75%	53.42%	\$ 77,047.61	\$ 67,193.96	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 22.10%
17	Rehabilitasaun ba EPEC/ESTV Baucau iha Aldeia Samalaculiba Suco Buibau Posto Administrativu Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE EPEC/ESTV BAUCAU	-	\$ 164,157.57	Oct. 15, 2021	58.14%	0.00%	\$ -	\$ 164,157.57	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 25.49%
18	Rehabilitasaun ba ESG Filial Kilik Waiga'e iha Aldeia Caiobilale Suco Caibada Posto Administrativo Baucau Villa Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE ESG FILIAL KILIK WAIGA'E	-	\$ 76,528.56	Oct. 15, 2021	66.51%	30.70%	\$ 23,491.72	\$ 53,036.84	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 22.99%
19	Rehabilitasaun ba EBF Caibada Macassae iha Aldeia Caiobilale Suco Caibada Posto Administrativo Baucau Villa Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE EBF CAIBADA MACASSAE	-	\$ 117,273.54	Oct. 15, 2021	69.34%	36.15%	\$ 42,397.88	\$ 74,875.66	ON-GOING	
20	Rehabilitasaun ba ESG 01 Baucau iha Aldeia Lutumutu Suco Tirilolo Posto Administrativo Baucau Villa Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE ESG NO. 01 BAUCAU	-	\$ 118,161.18	Oct. 15, 2024	30.33%	30.33%	\$ 35,835.85	\$ 82,325.33	ON-GOING	
21	R4D Rural Road Rehabilitation Teriluedae - Saelari - Binagua Chainage 0+000 - 1+600 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laga	Baucau	Lalaisi, Unip. Lda	RT/023/MOP-2019	\$ 377,873.70	Jan. 15, 2020	97.47%	64.91%	\$ 245,269.41	\$ 132,604.29	ON-GOING	ongoing
22	R4D Rural Road Rehabilitation Teriluedae - Saelari - Binagua Chainage 1+600 - 3+300 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laga	Baucau	Rozi Unipessoal, Lda	RT/024/MOP-2019	\$ 341,485.64	Jan. 1, 2020	100.00%	100.00%	\$ 341,485.63	\$ 0.01	FHO	Projecto Finaliza ona
23	Rural Roads Periodic Maintenance Samagua - Namanai Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Baucau / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laga	Baucau	Delalina	MPTCW-W-190091	\$ 393,649.77	Aug. 23, 2019	84.80%	66.48%	\$ 261,685.75	\$ 131,964.02	ON-GOING	
24	Konstrusaun EBF Publiku Selegua	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Laga	Baucau	Sumber Urip Unip. Lda	04/KDAM-BCU/IX/2019	\$ 65,442.32	Sept. 24, 2019	100.00%	100.00%	\$ 65,442.32	\$ -	FHO	Falta Retensaun
25	Roads Maintenance Section Laga Baguia Municipality Baucau (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laga	Baucau	Uatoos Unip. Lda	MOP-W-200002	\$ 201,488.79	May 5, 2014	40.00%	33.29%	\$ 67,076.91	\$ 134,411.88	Abomdona	Abomdona

NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNICIPIO	NARAN COMP.	NARAN KONT.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	STATUS PROJECTO	OBS
26	For Preparation of Detailed Engineering Design For Rehabilitation of Municipio Roads Packager 4 :Laga to Baguia	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laga	Baucau	Detile Consultant Lda, in Association with PDP Utek (M) SDN. BHD	MPW-CS-2000027	\$ 455,375.00	March 25, 2020	70.00%	70.00%	\$ 318,762.50	\$ 136,612.50	ON-GOING	
27	Konstrusaun Sede Suku, Suku Atelari Laga Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Laga	Baucau	Costa Estelia Unipessoal,Lda	05/KDM-BAUCAU/IX/2021	\$ 62,135.06	08-Jul-21	20.29%	0.00%	\$ -	\$ 62,135.06	ON-GOING	
28	New Construction of Camp and Leveling, pavement works no jardim de herois de laga Baucau	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laga	Baucau	Juga Te Figa Unipessoal Lda	40/MACLN/X/2021	\$ 512,628.94	Jan. 1, 2022	35.79%	22.01%	\$ 112,848.70	\$ 399,780.24	ON-GOING	
29	Rehabilitasaun ba EBF. Lala - Bu'u iha Aldeia Sire - Bu'u Suco Sagadate Postu Administrativu Laga Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laga	Baucau	MEJD PKRIE EBF LALA-BU'U	-	\$ 109,706.08	Oct. 15, 2021	24.49%	0.00%	\$ -	\$ 109,706.08	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 24.49%
30	Rehabilitasaun ba EBF 1 no 2 ciclo Libagua iha Aldeia Libagua Suco Libagua Posto Administrativo Laga Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laga	Baucau	MEJD PKRIE EBF 1 NO 2 CICLO LIBAGUA	-	\$ 87,554.29	Oct. 15, 2021	55.34%	47.23%	\$ 41,347.91	\$ 46,206.38	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 21.35%
31	Rehabilitasaun ba EBF Fitun Sagadate - Laga iha Aldeia Samagata Suco Sagadate Postu Administrativu Laga Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laga	Baucau	MEJD PKRIE EBF, FITUN SAGADATE-LAGA	-	\$ 90,866.51	Oct. 15, 2021	54.27%	46.39%	\$ 42,148.79	\$ 48,717.72	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 20.43%
32	New Installation MV, LV Line and House Connection from Buava to Defawasi - Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Baguia	Baucau	Power Engineering Construction Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000377	\$ 485,365.98	July 6, 2016	100.09%	89.88%	\$ 436,225.01	\$ 49,140.97	ON-GOING	
33	Manutensaun Estrada Baquia-Larisula Sta. 0+000-12+900-Municipal of Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Baguia	Baucau	Mr Construction Unip Lda	RFQ/129/MOPTC-2016	\$ 76,033.63	Nov. 15, 2016	100.00%	90.00%	\$ 68,430.27	\$ 7,603.36	PHO	Falta Retensaun
34	Konstrusaun Posto Administrativo Baguia	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Baguia	Baucau	Delatina Unip. Lda	02/KDAM-BCU/VIII/2019	\$ 197,153.25	Aug. 1, 2019	100.00%	90.00%	\$ 177,437.92	\$ 19,715.33	PHO	Falta Retensaun
35	Rural Roads Periodic Maintenance Baguia - Larisula Chainage 0+000 - 12+900 in Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Baguia	Baucau	Lamegua Star Unip Lda	MPW-W-190088	\$ 255,148.17	Aug. 23, 2019	79.37%	71.44%	\$ 182,270.76	\$ 72,877.41	ON-GOING	
36	Konstrusaun Sede Suku, Suku Samalari Baguia Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Baguia	Baucau	Mexa	06/KDM-BAUCAU/IX/2021	\$ 54,515.23	08-Jul-21	12.06%	0.00%	\$ -	\$ 54,515.23	ON-GOING	
37	Konstrusaun Intek no Kanais Irigasaun Larisula iha Baguia Municipio Baucau	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Baguia	Baucau	Makasae Construction LDA	RDTL-2021-14628	\$ 316,447.42	Sept. 16, 2021	99.83%	99.83%	\$ 315,897.63	\$ 549.79	FHO	Projecto Finaliza ona
38	Rehabilitasaun ba EBF Gulari iha Aldeia Daraloi de Baixo Suco Samalari Postu Administrativu Baguia Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EBF GULARI	-	\$ 89,797.83	Oct. 15, 2021	56.26%	31.52%	\$ 28,306.76	\$ 61,491.07	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 24.74%
39	Rehabilitasaun ba EBC Ossu - Ufulari iha Aldeia Ossu - Ufulari Suco Samalari Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EBF OSSU-UFULARI	-	\$ 105,390.82	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 105,390.82	ON-GOING	
40	Rehabilitasaun ba EBF Uacala iha Aldeia Uacala Suco Uacala Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EBF UACALA	-	\$ 81,847.60	Oct. 15, 2021	25.97%	25.97%	\$ 21,252.40	\$ 60,595.20	ON-GOING	
41	Rehabilitasaun ba EPE Fini Baguia ih Aldeia Neolidae Suco Alaua Craic Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EPE FINI BAGUIA	-	\$ 91,267.16	Oct. 15, 2021	37.47%	35.58%	\$ 32,475.54	\$ 58,791.62	ON-GOING	
42	Rehabilitasaun ba EPE Lari - Sula iha Aldeia Lauhare Suco Lari - Sula Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EPE LARI-SULA	-	\$ 97,046.05	Oct. 15, 2021	47.95%	28.43%	\$ 27,585.59	\$ 69,460.46	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 24.52%
43	Rehabilitasaun ba EBC Ossu - Huna iha Aldeia Ualcade Suco Ossu - Huna Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EBC OSSU-HUNA	-	\$ 84,264.57	Oct. 15, 2021	65.75%	53.23%	\$ 44,856.62	\$ 39,407.95	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 10.43%
44	Rehabilitasaun ba EBC Buava Lavateri iha Aldeia Fanaloto Suco Lavateri Postu Administrativu Baguia Munisipiu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EBC BUAVA LAVATERI	-	\$ 120,700.62	Oct. 15, 2021	30.26%	30.26%	\$ 36,520.58	\$ 84,180.04	ON-GOING	
45	Rehabilitasaun ba ESG de Baguia iha Aldeia Neolidae Suco Alua Kraik Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE ESG DE BAGUIA	-	\$ 175,519.47	Oct. 15, 2021	33.91%	32.64%	\$ 57,288.30	\$ 118,231.17	ON-GOING	
46	Aumenta C. O no Kliesntes	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Venilale	Baucau	Pae-Le Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000445	\$ 24,365.04	Jan. 1, 2017	100.00%	90.00%	\$ 21,928.54	\$ 2,436.50	PHO	Falta Retensaun
47	New Installation MV, LV Line and House Connection from Uaihacu to Tugu SP3 - Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Venilale	Baucau	Hawa-Ali Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000344	\$ 163,447.50	July 6, 2016	100.00%	90.00%	\$ 147,102.75	\$ 16,344.75	PHO	Falta Retensaun
48	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 0+000-10+300, Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Venilale	Baucau	Ruvic unip, Ida	SSS/118/MOPTC-2016	\$ 4,897,636.09	July 29, 2016	27.52%	24.21%	\$ 1,185,891.06	\$ 3,711,745.03	PENDENTE	
49	Rehabilitation Bercoli - Bahamori 1 Chainage Sta. 0+000-1+500 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Venilale	Baucau	Caidailale Unip.Lda	RT/069/MOPTC-2016	\$ 343,674.56	Aug. 18, 2016	96.10%	96.10%	\$ 330,254.08	\$ 13,420.48	FHO	Projecto Finaliza ona
50	Rehabilitasaun Estrada Bercoli-Bahamori 3 Sta. 2+750-4+000-Municipal of Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Venilale	Baucau	Maubere Spirit	RT/071/MOPTC-2016	\$ 282,114.39	Aug. 18, 2016	100.00%	99.31%	\$ 280,155.69	\$ 1,958.70	FHO	Projecto Finaliza ona
51	Construction of Water Supply with Pump System (Multy Suco) Watuhaço – Venilale In Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Venilale	Baucau	Wetodo Unip. Lda	SSS/296/MOPTC-2016	\$ 483,731.02	Nov. 22, 2016	100.00%	92.96%	\$ 449,670.20	\$ 34,060.82	FHO	Projecto Finaliza ona
52	Instalacao Electricidade Linha Medium Voltagem & Transformer Ba Comunidade (Energia Eletricidade ba Sistema Bomba Be'e Mos) ba Comunidade Fatulia Watuhaço & Waihaia (Venilale)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Venilale	Baucau	Bozer Construcao.unip.Ida	MOP-W-190173	\$ 282,288.02	Oct. 30, 2019	48.18%	43.36%	\$ 122,394.52	\$ 159,893.50	ON-GOING	
53	Konstrusaun Sede Suku, Suku Uailaha Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Venilale	Baucau	Caidara Lata Unipessoal,Lda	02/KDM-BAUCAU/IX/2021	\$ 54,888.38	08-Jul-21	39.50%	35.55%	\$ 19,512.87	\$ 35,375.51	ON-GOING	
54	Rehabilitasaun ba EBC Uai - Bua iha Aldeia Uato - Hassa Suco Uato - Haco Postu Administrativu Venilale Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Venilale	Baucau	MEJD PKRIE EBC UAI-BUA	-	\$ 88,801.74	Oct. 15, 2021	58.56%	58.56%	\$ 52,000.00	\$ 36,801.74	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 22.84%
55	Rehabilitasaun ba EBF Culina - Ossu - Uailale, Ossu - Uaque iha Aldeia Ossu - Uaque Suco Fatulia Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Venilale	Baucau	MEJD PKRIE EBF CULINA-OSSU-UAILALE	-	\$ 120,371.07	Oct. 15, 2021	56.33%	30.20%	\$ 36,350.32	\$ 84,020.75	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 26.13%
56	Rehabilitasaun ba EPE Publico Amizade Venilale iha Aldeia Uato Hasa Suco Uato - Haco Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Venilale	Baucau	MEJD PKRIE EPE PÚBLICO AMIZADE VENILALE	-	\$ 89,577.35	Oct. 15, 2021	65.85%	65.16%	\$ 58,370.24	\$ 31,207.11	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 22.50%

NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNICIPIO	NARAN COMP.	NARAN KONT.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	STATUS PROJECTO	OBS
57	Rehabilitasaun Estrada Rural,Venilale-Uaioli, Baucau Chainage 6+000-8+550	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Venilale	Baucau	Morenda Construction Unipessoal,Lda	RT/016/MOP-2021	\$ 365,170.02		35.58%	22.35%	\$ 81,603.53	\$ 283,566.49	ON-GOING	
58	Rehabilitasaun Estrada Rural,Venilale -Uaioli, Baucau Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Venilale	Baucau	Putra Baucau Unipessoal,Lda	RT/014/MOP-2021	\$ 666,971.12		23.30%	0.00%	\$ -	\$ 666,971.12	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 11.72%
59	R4D Rural Road Rehabilitation of Venilale - Uaioli Chainage 3+000 - 6+000 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Venilale	Baucau	Macaloco Construction Unipessoal, Lda	RT/015/MOP-2021	\$ 490,661.40		28.54%	14.33%	\$ 70,312.09	\$ 420,349.31	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 13.32%
60	New Installation MV, LV Line and House Connection from Laisorulai Nara Aba to Liuraga and Batikasa - Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Quelical	Baucau	Lolulai Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000338	\$ 471,847.32	July 6, 2016	98.83%	98.83%	\$ 466,310.41	\$ 5,536.91	ON-GOING	
61	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Darabata Bere, Lelalai, Walliko, Daramutu to Waibobo and Boronaha, Laisorulai - Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Quelical	Baucau	Mau - Tasi	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000343	\$ 257,455.81	Sept. 1, 2016	100.00%	90.00%	\$ 231,710.23	\$ 25,745.58	PHO	Falta Retensaun
62	Rehabilitation Of Roads Uiaca - Queleqai - Lacluta Sta. 5+400 to 10+800 (5,40 Km) Municipality of Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Quelical	Baucau	Develop Timor, Lda	RDTL-SSS/123/MOPTC-2016	\$ 3,451,113.20	Oct. 28, 2016	94.61%	75.53%	\$ 2,606,757.82	\$ 844,355.38	ON-GOING	
63	Rural Roads Rutine maintenance Laisorulai - Nae - Chainage 0+000 - 1+500 and Quelical Chainage 0+000 - 10 + 000 in Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Quelical	Baucau	Lalaisi, Unip. Lda	MPWTC-W-190089	\$ 157,601.26	Aug. 23, 2019	58.92%	53.03%	\$ 83,569.34	\$ 74,031.92	ON-GOING	
64	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 3 Uacala - Quelical to Ossu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Quelical	Baucau	Niceles Unipessoal Lda	MPW-CS-2000026	\$ 499,065.80	March 25, 2020	98.92%	98.92%	\$ 493,665.80	\$ 5,400.00	ON-GOING	
65	Rehabilitation of Roads, Road Section: Uaiaca - Quelical - Lacudala Sta. 0+000 - Sta. 5+400 (Package 1) Municipality Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Quelical	Baucau	Wingstone Const. Lda JV PT. Putra Mas Pratama	RDTL-SSS/298/MOPTC-2016	\$ 3,420,211.86	Oct. 28, 2016	92.14%	72.67%	\$ 2,485,573.04	\$ 934,638.82	ON-GOING	
66	New Construction of Health Post and Douctor House Building in Bualale ,Baucau, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Quelical	Baucau	Jova Construction Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-21-069	\$ 279,364.69	Aug. 23, 2021	29.08%	26.17%	\$ 73,115.51	\$ 206,249.18	ON-GOING	
67	New construction of Tom,pavement and Gabion no jardim de Herois de Quelical	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Quelical	Baucau	Samadare Unip. Lda	40/MACLN/XI/2021	\$ 269,684.83	Jan. 1, 2022	2.90%	0.00%	\$ -	\$ 269,684.83	ON-GOING	
68	Rehabilitasaun ba EBF. Uada - Boru iha Aldeia Uada - Buro Suco Guruca Postu Administrativu Quelical Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBF UADA-BORU	-	\$ 61,695.67	Oct. 15, 2021	29.73%	22.02%	\$ 13,583.17	\$ 48,112.50	ON-GOING	
69	Rehabilitasaun ba EBF. Uai-Aca/Mulia iha Aldeia Uai-Aca/Mulia Suco Tame Postu Administrativu Quelical Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBF UAI-ACA/MULIA	-	\$ 101,309.07	Oct. 15, 2021	55.32%	54.15%	\$ 54,858.01	\$ 46,451.06	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 24.55%
70	Rehabilitasaun ba EBF Abo - Lir Laletek iha Aldeia Abor Lir Suco Abo Postu Administrativu Quelical Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBF ABO-LIR LALETEK	-	\$ 75,117.25	Oct. 15, 2021	23.28%	0.00%	\$ -	\$ 75,117.25	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 23.28%
71	Rehabilitasaun ba EBC Letemumo iha Aldeia Lebenei Suco Letemumo Postu Administrativu Quilecal Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBC LETEMUMO	-	\$ 159,065.75	Oct. 15, 2021	21.99%	21.99%	\$ 34,981.77	\$ 124,083.98	ON-GOING	
72	Rehabilitasaun ba ESGPF Dom Carlos Filipe Ximenes Belo Afaca iha Aldeia Veco - Buti Suco Afaca Postu Administrativu Quelica Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE ESGPF DOM CARLOS FILIPE XIMENES BELO AFAÇA	-	\$ 125,450.86	Oct. 15, 2021	30.54%	29.01%	\$ 36,387.75	\$ 89,063.11	ON-GOING	
73	Rehabilitasaun ba EBF Catolica Darenafa iha Aldeia Siri - Laco/Loi - Rae Suco Namanei Postu Administrativu Quelecal Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBF CATOLICA DARENAFA	-	\$ 47,094.07	Oct. 15, 2021	60.43%	34.72%	\$ 16,351.32	\$ 30,742.75	ON-GOING	
74	Rehabilitasaun ba EBF Mauro Darala/Borumodo iha Aldeia Namanei Suco Maluro Postu Administrativu Quelical Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBF MAURO DARALA/BORUMODO	-	\$ 106,571.86	Oct. 15, 2021	66.52%	61.23%	\$ 65,259.15	\$ 41,312.71	ON-GOING	
75	Rehabilitasaun ba EBF Uaidora Ossolia iha Aldeia Ossolia Suco Letemumo Postu Administrativu Quelical Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBF UAIDORA/OSSOLIA	-	\$ 105,350.17	Oct. 15, 2021	22.02%	0.00%	\$ -	\$ 105,350.17	ON-GOING	
76	Rehabilitasaun Estrada Rural,Afaca-Uaitame Chainage 3+00 - 6+000 Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Quelical	Baucau	Helcia Unipessoal,Lda	RT/010/MOP-2021	\$ 619,654.00		16.09%	0.00%	\$ -	\$ 619,654.00	ON-GOING	
77	Rehabilitasaun Estrada Rural,Afaca-Uaitame Chainage 6+00-9+000 Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Quelical	Baucau	DVP Construção Unipessoal,Lda	RT/011/MOP-2021	\$ 588,618.90		37.18%	0.00%	\$ -	\$ 588,618.90	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 3.03%
78	Rural Road Rehabilitation Of Road Afaca-Uaitame Chainage 9+000-12+0000, Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Quelical	Baucau	Lia-Lura Unipessoal, Lda	RT/123/MOP-2021	\$ 535,826.40		12.93%	0.00%	\$ -	\$ 535,826.40	ON-GOING	
79	R4D Rural Road Rehabilitation of Afaca - Uaitame Chainage 0+000 -3+000 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Quelical	Baucau	Flores Unipessoal, Lda	RT/099/MOP-2021	\$ 510,231.96		66.77%	0.00%	\$ -	\$ 510,231.96	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 24.88%
80	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Vemasse to Cairabela and Waigoa - Baucau District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Vemasse	Baucau	We-Rua Unip, Lda	RDTL-11003725	\$ 690,194.30	Oct. 22, 2010	100.00%	90.00%	\$ 621,173.06	\$ 69,021.24	PHO	Falta Retensaun
81	Instalacao Electricidade Linha Distribuicao ba uma (Energia Electricidade ba Sistema Bomba Be'e) ba Comunidade Loiubu (Watulari)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Vemasse	Baucau	El Nicholay unip.Lda	MOP-W-190181	\$ 150,768.98	May 11, 2019	79.32%	71.39%	\$ 107,628.62	\$ 43,140.36	ON-GOING	
82	R4D Rural Road Spot Improvement Loiubu-Osoala Chainage 0+000-2+500 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Vemasse	Baucau	Rozi const. unip. Lda	MPW-W-210048	\$ 379,137.63	June 10, 2021	93.14%	49.35%	\$ 187,112.08	\$ 192,025.55	ON-GOING	
83	R4D Rural Road Spot Improvement Loiubu-Osoala Chainage 2+500-4+500 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Vemasse	Baucau	Rozi const. unip. Lda	MPW-W-210051	\$ 258,534.75	June 10, 2021	94.10%	64.53%	\$ 166,842.60	\$ 91,692.15	ON-GOING	
84	R4D Rural Road Spot Improvement Vemasse-Osoala Chainage 0+000-21+600	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Vemasse	Baucau	Chacailala Unipessoal Lda	MPW-W-210052	\$ 242,001.57	June 10, 2021	48.53%	35.32%	\$ 85,484.90	\$ 156,516.67	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 30.54%
85	Rehabilitasaun of Cairabela Mini Tradisional Food in Vemasse	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Vemasse	Baucau	Esa-Un	56/DNAL-MTAC/III/2017	\$ 50,000.00	Aug. 18, 2015	67.74%	60.97%	\$ 30,483.00	\$ 19,517.00	PENDENTE	
86	Konstrusaun Sede Suco, Uaigae Vemasse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Vemasse	Baucau	Wrangler Unipessoal,Lda	01/KDM-BAUCAU/IX/2021	\$ 54,085.33	08-Jul-21	65.19%	35.55%	\$ 19,227.89	\$ 34,857.44	ON-GOING	
87	National road no. 1 Upgrading project Manatuto - Baucau (package A01-02)/Package A01-02/sta 56+400-114+102(56.82km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Multi Posto	Baucau	Shangai Construction Group Co.,Ltd	ICB/021/MPWTC-2015	\$ 59,287,453.57	Aug. 18, 2016	95.32%	85.78%	\$ 50,859,624.44	\$ 8,427,829.13	ON-GOING	
88	RNUSP/ Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Baucau - Lautem Section : Sta. 123 + 105 to Sta. 182 + 040 (with Exceptions)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Multi Posto	Baucau	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/078/MPWTC-2015	\$ 29,315,346.10	Nov. 12, 2016	94.12%	84.70%	\$ 24,831,459.78	\$ 4,483,886.32	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan novembro 2022 Aumenta 6.86%

NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNICIPIO	NARAN COMP.	NARAN KONT.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	STATUS PROJECTO	OBS
89	Upgrading and Maintenance of Baucau - Viqueque Highway Project Lot 1: Baucau - Venilale : Sta. 03 + 740 to Sta. 27 + 120	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Multi Posto	Baucau	China Railway Int. Group co, JV with China overseas	ICB/046/MOPTC-2017	\$ 16,024,500.97	March 21, 2019	40.22%	32.95%	\$ 5,279,664.53	\$ 14,508,434.30	ON-GOING	
90	Consulting Services for Project Implementation and Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120), Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Multi Posto	Baucau	INTERCONTINENTAL CONSULTANTS AND TECHNOCRATS PVT.LTD IN ASSOCIATION WITH INFRA CONSULTANTS IN THE PHILS. (ICP) INC. (PHILIPPINES) AND DEZEMVOLVE TIMOR LESTE (DETILE CONSULTANT, LDA (TIMOR LESTE)	RFP/003/MOP/2018	\$ 5,262,302.00	Apr. 03, 2019	50.29%	50.29%	\$ 2,646,278.85	\$ 2,616,023.15	ON-GOING	
91	R4D Rural Road Spot Improvement Baguia Larisula Chainage 0+000-12+900, Rural Roads Routine Maintenance Samalari-Sorugua Chainage 0+000-2+800 Teriluedae-Saelari-Binagua Chainage 0+000-3+600 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Multi Posto	Baucau	Juga Te Figa Unipessoal Lda	MPW-W-210054	\$ 272,285.28	June 10, 2021	24.23%	11.29%	\$ 30,752.96	\$ 241,532.32	ON-GOING	
92	R4D Rural Road Routine Maintenance Caicoli-Liabala Chainage 0+000-6+500 Uma Ana Iku Chainage 0+000-4+500 Bercoli-Bahamori Chainage 0+000-4+000 Buruma-Uaimateme Chainage 0+000-2+800 Boile-Uatabo Chainage 0+000-2+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Multi Posto	Baucau	DB-Ingracia Unipessoal Lda	MPW-W-210049	\$ 299,488.62	June 10, 2021	95.93%	75.07%	\$ 224,828.92	\$ 74,659.70	ON-GOING	
TOTAL									\$ 148,049,115.41				\$ 104,851,471.41	\$ 46,961,241.86		

PREPARA HUSI

1. 
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Baucau, ADN, I.P

1. 
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Baucau, ADN, I.P

2. 
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun
Municipiu Baucau, ADN, I.P

2. 
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun
Municipiu Baucau, ADN, I.P

3. 
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

CERTIFIKA HUSI


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De Qualidade ADN, I.P

#ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNICIPIO BAUCAU



LOKALIZASAUN PROJETU											Novembro 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress	This Month Progress	Kumulativu Progress
1	Instalasaun Media tensaun husi Dokubere to'o Ponte Seical	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Baucau Villa	Baucau	Alandio Tahame	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000162	\$ 22,000.00	Jan. 1, 2016	0.00%		0.00%
2	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Caibada Makasae to Lutumumu, Kaibada Waimua, Knua Waimataoli, Kaiwa'a and Haucati - Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Baucau Villa	Baucau	Lover Unip,Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000340	\$ 562,858.54	July 6, 2016	95.35%		95.35%
3	Rehabilitasaun Estrada Jct Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.0+000-6+025	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Baucau Villa	Baucau	Domin Timor Diak, Lda	SSS/078/MOPTC-2017	\$ 3,599,951.87	Sept. 12, 2017	93.55%		93.55%
4	Rehabilitasaun Estrada Jct Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.6+025-12+075	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Baucau Villa	Baucau	Gihon Unip, Lda	SSS/066/MOPTC-2017	\$ 3,450,866.98	Sept. 12, 2017	92.50%		92.50%
5	Rehabilitation of MPWTC Office in the Municipality Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Baucau Villa	Baucau	Co. Cactus Unip, Lda	546/DGCS-MOPTC/VI/2016	\$ 19,838.03	Aug. 1, 2016	100.00%		100.00%
6	Rural Roads Routine Maintenance Baucau - Uatabo Chainage 0+000 - 4+800 and Bolle - Uatabo Chainage 0+000 - 5+200 in Municipality Baucau / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Baucau Villa	Baucau	Talamori	MPWTC-W-190090	\$ 63,815.15	Jan. 10, 2012	80.00%		80.00%
7	Road Maintenance Section: Baucau Urbans, Baucau Town, Baucau Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Baucau Villa	Baucau	Jomarjo Unipessoal Lda	MPW-W-190158	\$ 137,495.42	Nov. 30, 2019	85.28%		85.28%
8	Rehabilitasaun Eis hospital Trilolo Baucau ba Fatin Karantina,ICU,Laboratorium no Izolamento Ministerio	MINISTERIO SAUDE	Fundu Covid-19	SAUDE	Baucau Villa	Baucau	Central Hill Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-252	\$ 469,360.62	Dec. 10, 2020	97.69%		97.69%
9	R4D Rural Road Spot Improvement Baucau-Uatabo Chainage 0+000 - 4+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Baucau Villa	Baucau	Mexa Unip.Ida	MPW-W-210047	\$ 403,360.46	June 10, 2021	83.70%		83.70%
10	Construsaun Escola Polo Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	Sanira Construction Unip Lda	RDTL-326	\$ 677,203.53	Nov. 12, 2012	92.82%		92.82%
11	Konstrusaun Sede Suku, Suku Samalari Baucau Villa Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Baucau Villa	Baucau	Rozi Unipessoal, Lda	04/KDM-BAUCAU/IX/2021	\$ 59,323.84	08-Jul-21	0.00%		0.00%
12	konstrusaun Moru Haleu Mercado Tualiku Baucau Villa Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Baucau Villa	Baucau	Gardel Unipessoal.Lda	07/KDM-BAUCAU/IX/2021	\$ 316,007.27	08-Jul-21	39.50%		39.50%
13	Konstrusaun Foun ba Moru Protesaun ba Armazen SAMES Regional Baucau iha Municipio Baucau	SAMES	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Baucau Villa	Baucau	Talamori	RDTL-SAMES-RFQ-021-071	\$ 69,792.94	08-Jul-21	77.99%		77.99%
14	Rehabilitasaun ba EBF Maucale iha Aldeia Maucale Suco Gariuai Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE EBF MAUCALE	-	\$ 83,515.23	Oct. 15, 2021	33.15%	44.84%	77.98%
15	Rehabilitasaun ba EBF Zona Golgota iha Aldeia Ro - Ulo Suco Bahu Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE EBF ZONA GOLGOTA	-	\$ 82,531.68	Oct. 15, 2021	36.04%		36.04%
16	Rehabilitasaun ba ESG 02 Vila Nova Baucau iha Aldeia Samalatu Liba Suco Bulbau Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE ESG NU. 02 VILA NOVA BAUCAU	-	\$ 144,241.57	Oct. 15, 2021	41.85%	22.90%	64.75%
17	Rehabilitasaun ba EPEC/ESTV Baucau iha Aldeia Samalaculiba Suco Bulbau Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE EPEC/ESTV BAUCAU	-	\$ 164,157.57	Oct. 15, 2021	35.12%	23.02%	58.14%
18	Rehabilitasaun ba EBF Caibada Macassae iha Aldeia Caiobilale Suco Caibada Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE ESG FILIAL KILIK WAIGAE	-	\$ 76,528.56	Oct. 15, 2021	41.02%	25.49%	66.51%
19	Rehabilitasaun ba EBF Caibada Macassae iha Aldeia Caiobilale Suco Caibada Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE EBF CAIBADA MACASSAE	-	\$ 117,273.54	Oct. 15, 2021	46.34%	22.99%	69.34%
20	Rehabilitasaun ba ESG 01 Baucau iha Aldeia Lutumutu Suco Tinilolo Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baucau Villa	Baucau	MEJD PKRIE ESG NO. 01 BAUCAU	-	\$ 118,161.18	Oct. 15, 2024	30.33%		30.33%
21	R4D Rural Road Rehabilitation Teriluedae - Saelari - Binagua Chainage 0+000 - 1+600 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laga	Baucau	Lalaisi, Unip. Lda	RT/023/MOP-2019	\$ 377,873.70	Jan. 15, 2020	97.47%		97.47%
22	R4D Rural Road Rehabilitation Teriluedae - Saelari - Binagua Chainage 1+600 - 3+300 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laga	Baucau	Rozi Unipessoal, Lda	RT/024/MOP-2019	\$ 341,485.64	Jan. 1, 2020	100.00%		100.00%
23	Rural Roads Periodic Maintenance Samagua - Namanei Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Baucau / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laga	Baucau	Delatina	MPTCW-W-190091	\$ 393,649.77	Aug. 23, 2019	84.80%		84.80%
24	Konstrusaun EBF Publiku Selegua	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Laga	Baucau	Sumber Urip Unip, Lda	04/KDAM-BCU/IX/2019	\$ 65,442.32	Sept. 24, 2019	100.00%		100.00%
25	Roads Maintenance Section Laga Baguia Municipality Baucau (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laga	Baucau	Uatoos Unip. Lda	MOP-W-200002	\$ 201,488.79	May 5, 2014	40.00%		40.00%
26	For Preparation of Detailed Engineering Design For Rehabilitation of Municipio Roads Packager 4 :Laga to Baguia	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laga	Baucau	Detile Consultant Lda, in Association with PDP Utek (M) SDN. BHD	MPW-CS-2000027	\$ 455,375.00	March 25, 2020	70.00%		70.00%
27	Konstrusaun Sede Suku, Suku Atelari Laga Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Laga	Baucau	Costa Estelia Unipessoal,Lda	05/KDM-BAUCAU/IX/2021	\$ 62,044.03	08-Jul-21	20.29%		20.29%
28	New Construction of Camp and Leveling, pavement works no jardim de herois de laga Baucau	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laga	Baucau	Juga Te Figa Unipessoal Lda	40/MACLN/X/2021	\$ 512,628.94	Jan. 1, 2022	35.79%		35.79%
29	Rehabilitasaun ba EBF, Lala - Bu'u iha Aldeia Sire - Bu'u Suco Sagadate Posto Administrativo Laga Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laga	Baucau	MEJD PKRIE EBF LALA-BU'U	-	\$ 109,706.08	Oct. 15, 2021	0.00%	24.49%	24.49%
30	Rehabilitasaun ba EBF 1 no 2 ciclo Libagua iha Aldeia Libagua Suco Libagua Posto Administrativo Laga Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laga	Baucau	MEJD PKRIE EBF 1 NO 2 CICLO LIBAGUA	-	\$ 87,554.29	Oct. 15, 2021	33.99%	21.35%	55.34%
31	Rehabilitasaun ba EBF Fitun Sagadate - Laga iha Aldeia Samagata Suco Sagadate Posto Administrativo Laga Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laga	Baucau	MEJD PKRIE EBF. FITUN SAGADATE-LAGA	-	\$ 90,866.51	Oct. 15, 2021	33.84%	20.43%	54.27%
32	New Installation MV, LV Line and House Connection from Buava to Defawasi - Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Baguia	Baucau	Power Engineering Construction Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000377	\$ 485,365.98	July 6, 2016	100.09%		100.09%
33	Manutensaun Estrada Baquia-Larisula Sta. 0+000-12+900-Municipal of Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Baguia	Baucau	Mr Construction Unip Lda	RFQ/129/MOPTC-2016	\$ 76,033.63	Nov. 15, 2016	100.00%		100.00%
34	Konstrusaun Posto Administrativo Baguia	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Baguia	Baucau	Delatina Unip. Lda	02/KDAM-BCU/VIII/2019	\$ 197,153.25	Aug. 1, 2019	100.00%		100.00%
35	Baguia - Larisula Chainage 0+000 - 12+900 / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Baguia	Baucau	Lamegua Star Unip Lda	MPW-W-190088	\$ 255,148.17	Aug. 23, 2019	79.37%		79.37%
36	Konstrusaun Sede Suku, Suku Samalari Baguia Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Baguia	Baucau	Mexa Unip.Ida	06/KDM-BAUCAU/IX/2021	\$ 54,515.23	08-Jul-21	12.06%		12.06%
37	Konstrusaun Intek no Kanais Irrigasaun Larisula iha Baguia Municipio Baucau	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Baguia	Baucau	Makasae Construction LDA	RDTL-2021-14628	\$ 316,447.42	Sept. 16, 2021	99.83%		99.83%
38	Rehabilitasaun ba EBF Gutari iha Aldeia Daraloi de Baixo Suco Samalari Posto Administrativo Baguia Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EBF GULARI	-	\$ 89,797.83	Oct. 15, 2021	31.52%	24.74%	56.26%
39	Rehabilitasaun ba EBF Ossu - Ufulari iha Aldeia Ossu - Ufulari Suco Samalan Posto Administrativo Baguia Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EBF OSSU-UFULARI	-	\$ 105,390.82	Oct. 15, 2021	0.00%		0.00%
40	Rehabilitasaun ba EBF Uacala iha Aldeia Uacala Suco Uacala Posto Administrativo Baguia Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EBF UACALA	-	\$ 81,847.60	Oct. 15, 2021	25.97%		25.97%
41	Rehabilitasaun ba EPE Fini Baguia iha Aldeia Neolidae Suco Alaua Craic Posto Administrativo Baguia Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EPE FINI BAGUIA	-	\$ 91,267.16	Oct. 15, 2021	37.47%		37.47%

											Novembro 2022		
					LOKALIZASAU PROJETU								
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress	This Month Progress	Komulativu Progress
42	Rehabilitasaun ba EPE Lari - Sula iha Aldeia Lauhare Suco Lari -Sula Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EPE LARI-SULA	-	\$ 97,046.05	Oct. 15, 2021	23.44%	24.52%	47.95%
43	Rehabilitasaun ba EBC Ossu - Huna iha Aldeia Uaicade Suco Ossu - Huna Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EBC OSSU-HUNA	-	\$ 84,264.57	Oct. 15, 2021	55.32%	10.43%	65.75%
44	Rehabilitasaun ba EBC Buaua Lavateri iha Aldeia Fanalolo Suco Lavateri Postu Administrativu Baguia Munisipiu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE EBC BUAAU LAVATERI	-	\$ 120,700.62	Oct. 15, 2021	30.26%		30.26%
45	Rehabilitasaun ba ESG de Baguia iha Aldeia Neolidae Suco Alua Kraik Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Baguia	Baucau	MEJD PKRIE ESGF DE BAGUIA	-	\$ 175,519.47	Oct. 15, 2021	33.91%		33.91%
46	Aumenta C. O no Kliesntes	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Venilale	Baucau	Pae-Le Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VOMPTC/CGI-PEN:0000445	\$ 24,365.04	Jan. 1, 2017	100.00%		100.00%
47	New Installation MV, LV Line and House Connection from Uaihacu to Tugu SP3 - Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Venilale	Baucau	Hawa-Ali Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000344	\$ 163,447.50	July 6, 2016	100.00%		100.00%
48	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 0+000-10+300, Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Venilale	Baucau	Ruvic unip. Ida	SSS/118/MOPTC-2016	\$ 4,897,636.09	July 29, 2016	27.52%		27.52%
49	Rehabilitation Bercoli - Bahamori 1 Chainage Sta. 0+000-1+500 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Venilale	Baucau	Caidallale Unip.Lda	RT/069/MOPTC-2016	\$ 343,674.56	Aug. 18, 2016	96.10%		96.10%
50	Rehabilitasaun Estrada Bercoli-Bahamori 3 Sta. 2+750-4+000-Municipal of Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Venilale	Baucau	Maubere Spirit	RT/071/MOPTC-2016	\$ 282,114.39	Aug. 18, 2016	100.00%		100.00%
51	Construction of Water Supply with Pump System (Multy Suco) Watuhaco – Venilale In Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Venilale	Baucau	Wetodo Unip. Lda	SSS/296/MOPTC-2016	\$ 483,731.02	Nov. 22, 2016	100.00%		100.00%
52	Instalacao Electricidade Linha Medium Voltagem & Transformor Ba Comunidade (Energia Eletricidade ba Sistema Bomba Be'e Mos) ba Comunidade Fatulia Watuhaco & Waihaia (Venilale)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Venilale	Baucau	Bozer Construciao,unip.Ida	MOP-W-190173	\$ 282,288.02	Oct. 30, 2019	48.18%		48.18%
53	Konstrusaun Sede Suku, Suku Uailaha Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Venilale	Baucau	Caidara Lata Unipessoal,Lda	02/KDM-BAUCAU/IX/2021	\$ 54,888.38	08-Jul-21	39.50%		39.50%
54	Rehabilitasaun ba EBC Uai - Bua iha Aldeia Uato - Hassa Suco Uato - Haco Postu Administrativu Venilale Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Venilale	Baucau	MEJD PKRIE EBC UAI-BUA	-	\$ 88,801.74	Oct. 15, 2021	37.97%	22.84%	58.56%
55	Rehabilitasaun ba EBF Culina - Ossu - Uailale, Ossu - Uaque iha Aldeia Osso - Uaque Suco Fatulia Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Venilale	Baucau	MEJD PKRIE EBF CULINA-OSSU-UAILALE	-	\$ 120,371.07	Oct. 15, 2021	30.20%	26.13%	56.33%
56	Rehabilitasaun ba EPE Publico Amizade Venilale iha Aldeia Uato Hasa Suco Uato - Haco Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Venilale	Baucau	MEJD PKRIE EPE PUBLICO AMIZADE VENILALE	-	\$ 89,577.35	Oct. 15, 2021	43.35%	22.50%	65.85%
57	Rehabilitasaun Estrada Rural,Venilale-Uaioli, Baucau Chainage 6+000-8+550	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Venilale	Baucau	Morende Construction Unipessoal,Lda	RT/016/MOP-2021	\$ 365,170.02		35.58%		35.58%
58	Rehabilitasaun Estrada Rural,Venilale -Uaioli, Baucau Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Venilale	Baucau	Putra Baucau Unipessoal,Lda	RT/014/MOP-2021	\$ 666,971.12		11.59%	11.72%	23.30%
59	Rehabilitasaun Estrada Rural,Venilale-Uaioli, Baucau Chainage 3+000-6+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Venilale	Baucau	Macaloco Construction Unipessoal, Lda	RT/015/MOP-2021	\$ 490,661.40		15.22%	13.32%	28.54%
60	New Installation MV, LV Line and House Connection from Laisorulai Nara Aba to Luraga and Batikasa - Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Quelical	Baucau	Lolulai Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000338	\$ 471,847.32	July 6, 2016	98.83%		98.83%
61	New Installation, MV, LV Line and House Connection from Darabata Bere, Lelalai, Waliliko, Daramutu to Walibobo and Boronaha, Laisorulai - Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Quelical	Baucau	Mau - Tasi	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000343	\$ 257,455.81	Sept. 1, 2016	100.00%		100.00%
62	Rehabilitation Of Roads Uaiaca - Queleqai - Lactuta Sta. 5+400 to 10+800 (5,40 Km) Municipality of Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Quelical	Baucau	Develop Timor, Lda	RDTL-SSS/123/MOPTC-2016	\$ 3,451,113.20	Oct. 28, 2016	94.61%		94.61%
63	Rural Roads Rutine maintenance Laisorulai - Nae - Chainage 0+000 - 1500 and Quelical Chainage 0+000 - 10 + 000 In Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Quelical	Baucau	Lalaisi, Unip. Lda	MPWTC-W-190089	\$ 157,601.26	Aug. 23, 2019	58.92%		58.92%
64	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 3 Uacala - Quelical to Ossu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Quelical	Baucau	Niceles Unipessoal Lda	MPW-CS-2000026	\$ 499,065.80	March 25, 2020	98.92%		98.92%
65	Rehabilitation of Roads, Road Section: Uaiaca - Quelical - Lacudala Sta. 0+000 - Sta. 5+400 (Package 1) Municipality Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Quelical	Baucau	Wingstone Const. Lda Jv PT. Putra Mas Pratama	RDTL-SSS/298/MOPTC-2016	\$ 3,420,211.86	Oct. 28, 2016	92.14%		92.14%
66	New Construction of Health Post and Douctor House Building Municipality Baucau	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Quelical	Baucau	Jova Construction Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-21-069	\$ 279,364.69	Aug. 23, 2021	29.08%		29.08%
67	New construction of Tom,pavement and Gabion no jardim de Herois de Quelical	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Quelical	Baucau	Samadare Unip. Lda	40/MACLN/XI/2021	\$ 269,684.83	Jan. 1, 2022	2.90%		2.90%
68	Rehabilitasaun ba EBF. Uada - Boru iha Aldeia Uada - Buro Suco Guruca Postu Administrativu Quelical Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBF UADA-BORU	-	\$ 61,695.67	Oct. 15, 2021	29.73%		29.73%
69	Rehabilitasaun ba EBF. Uai-Aca/Mulia iha Aldeia Uai-Aca/Mulia Suco Tame Postu Administrativu Quelical Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBF UAI- ACA/MULIA	-	\$ 101,309.07	Oct. 15, 2021	30.77%	24.55%	55.32%
70	Rehabilitasaun ba EBF Abo - Lir Laletek iha Aldeia Abor Lir Suco Abo Postu Administrativu Quelical Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBF ABO-LIR LALETEK	-	\$ 75,117.25	Oct. 15, 2021	0.00%	23.28%	23.28%
71	Rehabilitasaun ba EBC Letemumo iha Aldeia Lebenei Suco Letemumo Postu Administrativu Quilecal Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBC LETEMUMO	-	\$ 159,065.75	Oct. 15, 2021	21.99%		21.99%
72	Rehabilitasaun ba ESGPF Dom Carlos Filipe Ximenes Belo Afaca iha Aldeia Veco - Buti Suco Afaca Postu Administrativu Quelica Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE ESGPF DOM CARLOS FILIPE XIMENES BELO AFAÇA	-	\$ 125,450.86	Oct. 15, 2021	30.54%		30.54%
73	Rehabilitasaun ba EBF Catolica Darenafa iha Aldeia Siri - Laco/Loi - Rae Suco Namanei Postu Administrativu Quelecal Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBF CATOLICA DARENAFA	-	\$ 47,094.07	Oct. 15, 2021	34.72%		60.43%
74	Rehabilitasaun ba EBF Mauro Darala/Borumodo iha Aldeia Namanei Suco Maluro Postu Administrativu Quelical Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBF MAURO DARALA/BORUMODO	-	\$ 106,571.86	Oct. 15, 2021	40.81%	25.71%	66.52%
75	Rehabilitasaun ba EBF Uaidora Ossolia iha Aldeia Ossolia Suco Letemumu Postu Administrativu Quelical Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Quelical	Baucau	MEJD PKRIE EBF UAIDORA/OSSOLIA	-	\$ 105,350.17	Oct. 15, 2021	22.02%		22.02%
76	Rehabilitasaun Estrada Rural,Afaca-Uaitame Chainage 3+00 -6+000 Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Quelical	Baucau	Helcia Unipessoal,Lda	RT/010/MOP-2021	\$ 619,654.00		16.09%		16.09%
77	Rehabilitasaun Estrada Rural,Afaca-Uaitame Chainage 6+00-9+000 Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Quelical	Baucau	DVP Construção Unipessoal,Lda	RT/011/MOP-2021	\$ 588,618.90		34.16%	3.03%	37.18%
78	Rehabilitasaun Estrada Rural,Afaca-Uaitame Chainage 9+000 - 12+000 Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Quelical	Baucau	Lia-Lura Unipessoal, Lda	RT/123/MOP-2021	\$ 535,826.40		12.93%		12.93%
79	Rehabilitasaun Estrada Rural,Afaca-Uaitame Chainage 0+000 -3+000 Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Quelical	Baucau	Flores Unipessoal. Lda	RT/099/MOP-2021	\$ 588,618.90		41.89%	24.88%	66.77%
80	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Vemasse to Cairabela and Waigoa - Baucau District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Vemasse	Baucau	We-Rua Unip, Lda	RDTL-11003725	\$ 690,194.30	Oct. 22, 2010	100.00%		100.00%
81	Instalacao Electricidade Linha Distribuicao ba uma (Energia Eletricidade ba Sistema Bomba Be'e) ba Comunidade Lolubu (Watulari)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Vemasse	Baucau	El Nicholay unip.Lda	MOP-W-190181	\$ 150,768.98	May 11, 2019	79.32%		79.32%
82	R4D Rural Road Spot Improvement Lolubu-Osoala Chainage 0+000-2+500 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Vemasse	Baucau	Rozi const. unip. Lda	MPW-W-210048	\$ 379,137.63	June 10, 2021	93.14%		93.14%
83	R4D Rural Road Spot Improvement Lolubu-Osoala Chainage 2+500-4+500 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Vemasse	Baucau	Rozi const. unip. Lda	MPW-W-210051	\$ 258,534.75	June 10, 2021	94.10%		94.10%
84	R4D Rural Road Spot Improvement Vemas-Osoala Chainage 0+000-21+600	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Vemasse	Baucau	Chacailala Unipessoal Lda	MPW-W-210052	\$ 242,001.57	June 10, 2021	17.99%	30.54%	48.53%
85	Rehabilitasaun of Cairabela Mini Tradisional Food in Vemasse	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Vemasse	Baucau	Esa-Un	56/DNAL-MTAC/III/2017	\$ 50,000.00	Aug. 18, 2015	67.74%		67.74%
86	Konstrusaun Sede Suku, Suku Uaigae Vemasse Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Vemasse	Baucau	Wrangler Unipessoal,Lda	01/KDM-BAUCAU/IX/2021	\$ 54,085.33	08-Jul-21	65.19%		65.19%
87	National road no. 1 Upgrading project Manatulo - Baucau (package A01-02)Package A01-02/sta 56+400-114+102(56.82km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	Multi Posto	Baucau	Shangai Construction Group Co.,Ltd	ICB/021/MPWTC-2015	\$ 59,287,454.00	Aug. 18, 2016	95.32%		95.32%
88	Road nrtwork Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baucau - Lautem Road	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	Multi Posto	Baucau	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/078/MPWTC-2015	\$ 29,315,346.10	Nov. 12, 2016	87.26%	6.86%	94.12%

LOKALIZASAUN PROJETU											Novembro 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress	This Month Progress	Kumulativu Progress
89	Upgrading and Maintenance of Baucau - Viqueque Highway Project Lot 1: Baucau - Venilale : Sta. 03 + 740 to Sta. 27 + 120	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Multi Posto	Baucau	China Railway Int. Group co. jr with China oversees	ICB/046/MOPTC-2017	\$ 16,024,500.97	March 21, 2019	40.22%		40.22%
90	Consulting Services for Project Implementation and Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120), Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	Multi Posto	Baucau	INTERCONTINENTAL CONSULTANTS AND TECHNOCRATS PVT.LTD IN ASSOCIATION WITH INFRA CONSULTANTS IN THE PHILS. (ICP) INC. (PHILIPPINES) AND DEZEMVOLVE TIMOR LESTE (DETILE CONSULTANT, LDA (TIMOR LESTE)	RFP/003/MOP/2018	\$ 5,262,302.00	Apr. 03, 2019	50.29%		50.29%
91	R4D Rural Road Spot Improvement Baguia Larisula Chainage 0+000-12+900, Rural Roads Routine Maintenance Samalari-Sorugua Chainage 0+000-2+800 Teriluedae-Saelari-Binagua Chainage 0+000-3+600 Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Multi Posto	Baucau	Juga Te Figa Unipessoal Lda	MPW-W-210054	\$ 272,285.28	June 10, 2021	24.23%		24.23%
92	R4D Rural Road Routine Maintenance Calcoli-Liabala Chainage 0+000-6+500 Uma Ana Iku Chainage 0+000-4+500 Bercoli-Bahamori Chainage 0+000-4+000 Buruma-Uaimateme Chainage 0+000-2+800 Boile-Uatabo Chainage 0+000-2+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Multi Posto	Baucau	DB-Ingracia Unipessoal Lda	MPW-W-210049	\$ 299,488.62	June 10, 2021	95.93%		95.93%

Inspeksaun Husi :

1. 
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Baucau,ADN,I,P

3. 
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Baucau,ADN,I,P

2. 
Eng. ba Projeto Infrastrutctura e Irigasaun Municipiu Baucau, ADN, I,P

4. 
Eng. ba Projeto Infrastrutctura e Irigasaun Municipiu Baucau, ADN, I,P

5. 
Eng. ba Projeto ME, ADN, I,P

Verifika Husi :


Eng. Remigio da C. S. dos Santos
Eng. Senior ba Projeto Infrastrutctura e Irigasaun, ADN, I,P


Eng. Senior ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento ADN,I,P


Eng. Deuindo de Fatima Marques
ChefeSeksau ME& ITC, ADN, I,P

Certifika Husi :


Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De Qualidade ADN,I,P

#ANEXU CI (BA-7)

Back-up Data

Naran Projeto: **KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF GULARI**

No. kontratu :

Data Inspesaun : Wednesday, 16 November, 2022

Fatin Inspesaun : Baucau , Baguia, Gulari

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8°37'40,872"** Latetude : **126°39'14,382"**

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : **1. Agostinho Aranda**

: **2. Jerry Gil M. Pereira**

Foto iha terenu



Observasaun iha tereno

1. Servisu real iha terenu agora dadauk ne to tena iha Kuda-kuda .
2. Arus Janela no odamatan ceidauk monta.
3. Site eng.Grupo karik bele halo planu mobiliza stok material maibe iha terenu hodi facil badaen atu halo servisu no iha tempu udan karik labele difikulta servisu.
4. Agora dadauk ne grupo invrenta problema hanesan asesu Estrada ba lokasi ho kondisaun grave tebes tan ne dalabarak servisu lao tarde liu.



ANEXO C2 (BA-7)

NARAN PROJETO : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF GULARI
FATIN PROJETO : SAMALARI-BAGUIA-BAUCAU

MAIN SUMMARY			Progres November 2022					
			PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	AMOUNT\$	WEIGH %	AMOUNT\$	WEIGH %	AMOUNT\$	WEIGH %
I	PRELIMINARIES	\$ 3,355.84	\$ 1,789.25	1.99%	\$ 293.32	0.33%	\$ 2,082.57	2.32%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	\$ 70,402.93	\$ 24,285.43	27.04%	\$ 20,710.11	23.06%	\$ 44,995.54	50.11%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 6,699.07	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 80,457.83	\$ 26,074.68	29.04%	\$ 21,003.43	23.39%	\$ 47,078.11	52.43%
B	CONTINGENCY	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	OVERHEAD	\$ 6,340.00	\$ 2,231.00	2.48%	\$ 1,213.80	1.35%	\$ 3,444.80	3.84%
E	TOTAL COST (A + B)	\$ 89,797.83	\$ 28,305.68	31.52%	\$ 22,217.23	24.74%	\$ 50,522.91	56.26%

Prepara husi :
Date; / / 2022

Verifika husi :
Date; / / 2022


Serttika husi :
Date; / / 2022

Eng. Agostinho Aranda
Engineiro AND, I. P. Municipio de Baucau

Eng/Arch. Francisco Xavier de D. Jeronimo
Senior Engineiro ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento ADN, I. P.

Eng. Emerenciana da Costa Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação
de Qualidade ADN, I. P.

Eng. Jerry Gil M. Pereira
Engineiro AND, I. P. Municipio de Baucau

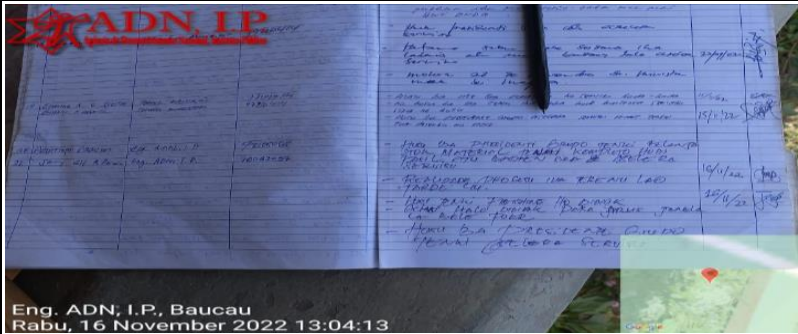 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  Agência de Desenvolvimento Nacional					#ANEXU D (BA-7) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
Naran projeto : Konstrusaun Ka Rehabilitadaun EPE FINI BAGUIA									
Kompanhia : GRUPO MEJD EPE FINI BAGUIA									
No.	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Inspetor	Pozisaun	No.	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura		
I	Wednesday, 16 November 2022	Baucau , Baguia	Eng.Agustinho Aranda	Eng.ADN Municipio Baucau	1	Eng.Grupo tenki kontrola badaen molok atu monta kalen tenki setting kuda-kuda kemiringan atap tenki tuir Dezenho			
					2	Hanesan Sujestaun deit ba eng.Grupo karik atu taka kalen konfirma ho owner hodi bele akompanha			
					3	pengecoran Beton nia medida tenki hanesan hotu tuir dezenu, labele lintle beam nian hodi sae kiik fali			
			Eng. Jerry Gil M. Pereira		4	Servisu nafatin tuir Dezenu no BOQ ne'ebe iha			
					5	halo nafatin linha kordenasaun ho owner			
					6	Aselera Servisu			



#ANEXU C2 (BA-11)

NARAN PROJETU : NOVA CONSTRUCAO PRE ESKOLAR-1342 LARISULA
FATIN PROJETU : LARISULA-BAGUIA-BAUCAU
PROJETU NAIN : MEJD

MAIN SUMMARY			Progress November 2022					
			PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %
I	PRELIMINARIES	3,379.27	\$ 1,946.28	2.01%	\$ -	0.00%	\$ 1,946.28	2.01%
II	CLASSROOM BUILDING C2	69,330.85	\$ 17,415.74	17.95%	\$ 23,794.35	24.52%	\$ 41,210.08	42.46%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	14,995.93	\$ -	0.00%		0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	87,706.05	19,362.02	19.95%	23,794.35	24.52%	43,156.37	44.47%
B	CONTINGENCY	3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
C	OVER HEAD	6,340.00	\$ 3,389.00	3.49%	\$ -	0.00%	\$ 3,389.00	3.49%
D	TOTAL COST (A + B + C)	97,046.05	22,751.02	23.44%	23,794.35	24.52%	46,545.37	47.96%

Prepara husi :
Date; / / 2022

Verifika husi :
Date; / / 2022

Serttika husi :
Date; / / 2022

Eng.Agustinho Aranda
Engineiro AND, I. P. Municipio de Baucau

Eng/Arch.Francisco Xavier de D. Jeronimo
Senior Engineiro ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento ADN, I. P.

Eng.Emerenciana da Costa Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN , I. P.

Eng.Jerry Gil M. Pereira
Engineiro AND, I. P. Municipio de Baucau

#ANEXU C1 (BA-12)

Back-up Data

Naran Projeto: KONSTRUSAUN KA REHABILUITASAUN EBC OSSU-HUNA

No. kontratu :

Data Inspesaun : Wednesday, November 16, 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa

Koordinadas :

Start Point : Long :, Latetude :

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1. AGUSTINHO ARANDA

2. Jerry Gil M. Pereira

Foto iha terenu



Observasaun iha tereno

1. Servisu real iha terenu atap too tena atap
2. Husu ba eng.grupo karik iha perubahan rangka kuda-kuda keta haluhan halo as build drawing no tenki aprova husi owner
3. Eng.Grupo tenki halo jestaun servisu hodi bele aselera servisu tamba obra refere lao tarde liu
4. Rangka plafond ceidauk monta maibe stok material kompletu ona iha terenu
5. Kusen janela no odamtan nian monta hotu ona



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (BA-12)

PROJECT NAME : KONSTRUSAUN KA REHABILUITASAUN EBC OSSU-HUNA
LOCATION : SUCO OSSO HUNA, POSTO ADMINISTRATIVO, BAGUIA MUNICIPIO BAUCAU.

SUMMARY			PROGRES NOVEMBRO 2022					
No	ITEM SERVISU	VERIFIED BY A D N	PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE	
			AMOUNT\$	WEIGH %	AMOUNT\$	WEIGH %	AMOUNT\$	WEIGH %
1	Preliminaries Work	\$ 3,075.00	\$ 2,015.00	2.39%	\$ -	0.00%	\$ 2,015.00	2.39%
2	Refurbished Room Building RF1	\$ 36,310.43	\$ 20,810.10	24.70%	\$ 7,262.09	8.62%	\$ 28,072.18	33.31%
3	Refurbished Room Building RF2	\$ 30,599.03	\$ 19,946.51	23.67%	\$ 1,529.95	1.82%	\$ 21,476.47	25.49%
3	Provisional for external Electrical instalation	\$ 4,493.91	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
4	Provisional for Demolition	\$ 446.20	\$ 446.20	0.53%	\$ -	0.00%	\$ 446.20	0.53%
I	Total Constructio Cost	\$ 74,924.57	\$ 43,217.81	51.3%	\$ 8,792.04	10.4%	\$ 52,009.85	61.7%
II	Overhead	\$ 6,340.00	\$ 3,394.50	4.0%	\$ -	0.00%	\$ 3,394.50	4.03%
II	Contingency	\$ 3,000.00	\$ -	0.0%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
IV	Grand Total	\$ 84,264.57	\$ 46,612.31	55.32%	\$ 8,792.04	10.43%	\$ 55,404.35	65.75%

Prepara husi :
Date; / / 2022

Verifika husi :
Date; / / 2022

Serttifica husi :
Date; / / 2022

Eng.Agustinho Aranda
Engineiro AND, I. P. Municipio de Baucau

Eng/Arch.Francisco Xavier de D. Jeronimo
Senior Engineiro ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento ADN, I. P.

Eng.Emerenciana da Costa Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN , I. P.

Eng.Jerry Gil M. Pereira
Engineiro AND, I. P. Municipio de Baucau

 				
---	--	--	--	--

#ANEXU C1 (BV-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Caibada Makasae**
No. kontratu :

Data Inspesaun : 20 de Outubro de 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa

Koordinadas :


Start Point : Long: **E 15502361** , Latetude : **N 7123437**

End Point : Long: , Latetude :

Naran Inspector : **1. Eng. AGUSTINHO ARANDA**


2. Eng. JERRY GIL M. PEREIRA

Sketch & Foto Desenho

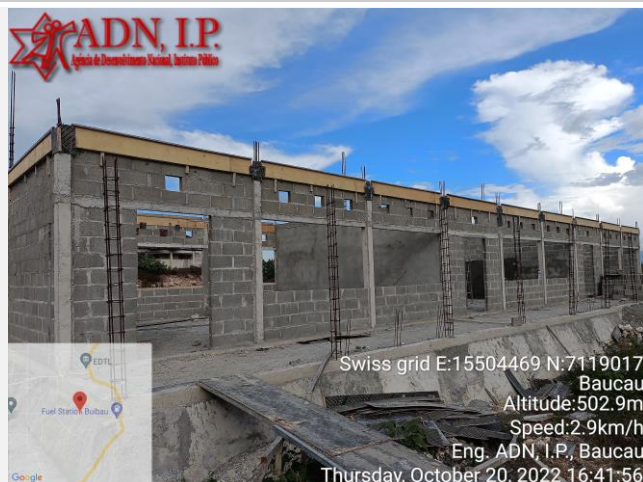

Observ. iha tereno no Foto Aktual

Husi observasaun visual nota
katak kolom C1 15 x 15cm atinji
ona 70%

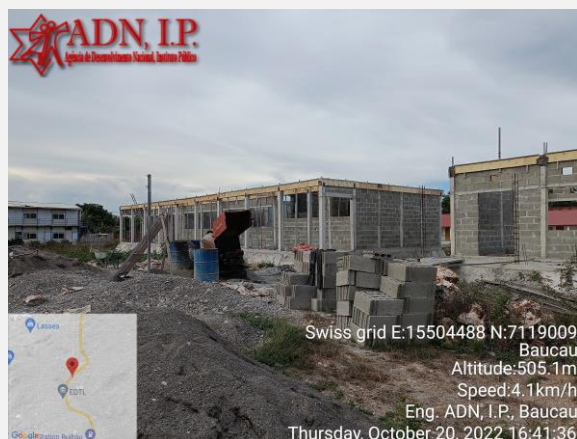


Item servisu sinta jeral atinji ona
100%



#ANEXU C1 (BV-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Caibada Makasae**
No. kontratu :



Data Inspesaun : Monday, 19 July 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa

Koordinadas :

Start Point : Long: **E 15504387**, Latetude : **N 7119296**

End Point : Long:, Latetude :

Naran Inspector : 1. Eng. AGUSTINHO ARANDA

2. Eng. JERRY GIL M. PEREIRA

Sketch & Foto Desenho

Observ. iha tereno no Foto Aktual

#ANEXU C1 (BV-17)


Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Caibada Makasae**
No. kontratu :

Sketch Item servisu reboku ho mahar
1.5 cm no Reinforcement Steel

Dimensaun

Koluna typu C2 15x15 cm

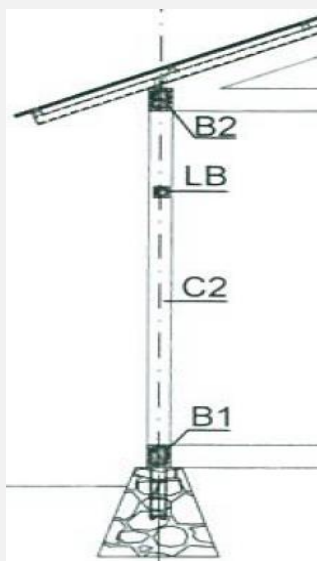

Grupo trabalhador sira halo servisu
reboka no servisu beton ba sloof la tuir
Dezenho nebe iha



Data Inspesaun : Thursday, February 17, 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa

Koordinadas :

Start Point : Long: **8.48686333**, Latetude : **126.447713**

End Point : Long:, Latetude :

Naran Inspector : 1. AGUSTINHO ARANDA

2.

3.

#ANEXU C1 (BV-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Caibada Makasae**
No. kontratu :

4.


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Reinforced concrete Volume = 5.6 Cu.m	Reinforced concrete of Ground beam 250mm x 200mm, 24 Mpa



#ANEXU C1 (BV-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Caibada Makasae**
No. kontratu :





C2- BV -17

Naran Projetu

:Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPEC/ESTV Baucau

Lokal Projetu

:Aldeia Samalaculiba, Suku Buibau Postu Administrativu Baucau villa, Munisipiu Baukau

SUMMARY			RECOMMENDED BY ADN					
No	ITEM SERVISU	VERIFIED BY A.D.N	PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE	
			AMOUNT \$	WEIGH %	AMOUNT \$	WEIGH %	AMOUNT \$	WEIGH %
1	Preliminaries Work	\$ 3,075.00	\$ 1,975.00	1.20%	\$ -	0.00%	\$ 1,975.00	1.20%
2	Class Room Building C	\$ 54,919.08	\$ 24,434.47	14.88%	\$ 18,203.60	11.09%	\$ 42,638.07	25.97%
3	Techer Office	\$ 78,538.28	\$ 27,781.43	16.92%	\$ 19,588.59	11.93%	\$ 47,370.02	28.86%
5	Professiona Sum For Site Works	\$ 18,285.21	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
I	Total Constructio Cost	\$ 154,817.57	\$ 54,190.90	33.01%	\$ 37,792.19	23.02%	\$ 91,983.09	56.03%
II	Overhead	\$ 6,340.00	\$ 3,451.00	2.10%	\$ -	0.00%	\$ 3,451.00	2.10%
III	Contingency	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
IV	Grand Total	\$ 164,157.57	\$ 57,641.90	35.11%	\$ 37,792.19	23.02%	\$ 95,434.09	58.14%

Prepara husi :

Date; / / 2022

Verifika husi :

Date; / / 2022

Sertifika husi :

Date; / / 2022

Eng.Agustinho Aranda

Engineiro AND, I. P. Municipio de Baucau

Eng/Arch.Francisco Xavier de D. Jeronimo

Senior Engineiro ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento ADN, I. P.

Eng.Emerenciana da Costa Freitas

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN , I. P.

Eng.Jerry Gil M. Pereira

Engineiro AND, I. P. Municipio de Baucau

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE UNIDADE PROGRESSO RD TL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (BV-17) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EPE/ESTV		
					Kompanhia : MEJD PKRIE BUIBAU EPE/ESTV		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	Thursday, 20 October 2022	Baucau Villa	Eng.Agustinho Aranda	Eng.ADN Municipio Baucau	1	ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público Eng. Agustinho Aranda Eng. ADN Eng. Jerry Gil M. Pereira Monitorização Swiss grid E:15504432 N:7119000 Baucau Altitude:513.0m Speed:0.1km/h Eng. ADN, I.P., Baucau Thursday, October 20, 2022 16:56:19	
			2				
			3				
			4				
			5				

#ANEXU C1 (BV-14)

Back-up Data

Naran Projeto: **KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF MAUCALE**

No. kontratu :

Data Inspesaun : Wednesday, 09 November 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa

Koordinadas :

Start Point : Long :-8°29'13,014" Latetude : 126°27'22,488"

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1. Eng. AGUSTINHO ARANDA

2. Eng. JERRY GIL M. PEREIRA

Foto Actual Ihaterenu

Observasaun Iha terenu



1. Servisu dadauk ne'e too ona iha keramik
2. Arus janela odamatan remata
3. Plafond remata
4. Stok material preparado iha terenu





NARAN PROJETU : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF MAUCALE
FATIN PROJETU : GARIUAI-BAUCAU-BAUCAU
PROJETU NAIN : MEJD

#ANEXU C2 (BV-14)

MAIN SUMMARY			PROGRESS NOVEMBER 2022					
			Previous		This Bill		Up do date	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	Amount \$	Weigh %	Amount \$	Weigh %	Amount \$	Weigh %
I	PRELIMINARIES	3,144.97	\$ 1,609.99	1.4%	\$ 1,102.00	1.32%	\$ 2,711.99	2.68%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	64,183.71	\$ 31,888.58	29.9%	\$ 32,091.85	38.43%	\$ 63,980.43	68.28%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	6,846.56	\$ -	0.0%	\$ 2,137.00	2.56%	\$ 2,137.00	2.56%
A	CONSTRUCTION COST	74,175.23	33,498.56	31.2%	35,330.85	42.31%	68,829.42	73.52%
B	CONTINGENCY	3,000.00	\$ -	0.0%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	OVERHEAD	6,340.00	\$ 2,271.00	1.92%	\$ 2,108.00	2.52%	\$ 4,379.00	4.45%
E	TOTAL COST (A + B)	83,515.23	27,676.18	33.15%	37,438.85	44.84%	65,115.03	77.98%

Prepara husi :
Date; / / 2022

Verifika husi :
Date; / / 2022

Serttifica husi :
Date; / / 2022

Eng.Agustinho Aranda
Engineiro AND, I. P. Municipio de Baucau

Eng/Arch.Françisco Xavier de D. Jeronimo
Senior Engineiro ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento ADN, I. P.

Eng.Emerenciana da Costa Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN , I. P.

Eng.Jerry Gil M. Pereira
Engineiro AND, I. P. Municipio de Baucau



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (BV-14)
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto :KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF MAUCALE

Kompanhia : GRUPO MEJD EBF MAUCALE

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Inspetor	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura	
I	Wednesday, 09 November 2022	Baucau Villa ,Garuwai,maucale	Eng.Agustinho Aranda	Eng.ADN Municipio Baucau	1	Servisu real iha terenu too ona iha keramik			
					2	Plafon Monta hotu ona			
					3	servisu karpintaria hotu ona			
			Eng. Jerry Gil M. Pereira		4	husu nafatin ba eng.grupo halo nanfatin linha kordenasaun ho dono do projecto			
			5		mantein servisu hotu tuir nafatin dezenu no BOQ ne'ebe iha				

#ANEXU C1 (BV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN ESGP 02 VILA NOVA
No. kontratu :

Data Inspesaun : 2 de oct 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa

Koordinadas :

Start Point : Long :E 15504387 , Latetude : N 7119296

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1. Eng. Agostinho Aranda
2. Eng. Jerry Gil M. Pereira

Foto actual iha terenu



Observasaun iha terenu

1. Servisu dadauk ne too iha kakuluk eng grupo hein tekniku husi owner no parte ADN,I.P atu akompanha hodi taka kalen,
2. iha parte seluk hanesan reboka no nahe uma laran kontinua nafatin servisu
3. Arus janela no odamatan monta hotu ona





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN ESGP 02 VILA NOVA
No. kontratu :





#ANEXU C2 (BV -16)

NARAN PROJETU : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN ESGP 02 VILA NOVA
FATIN PROJETU : TIRILOLO-BAUCAU-BAUCAU
PROJETU NAIN : MEJD

MAIN SUMMARY			PROGRESS NOVEMBER 2022					
			Previous		THIS BILL		Up to Date	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	Amount \$	Weigh %	Amount \$	Weigh %	Amount \$	Weigh %
I	PRELIMINARIES	3,059.06	\$ 2,017.03	1.40%	\$ 1,042.03	0.72%	\$ 3,059.06	2.12%
II	(CLASSROOM BUILDING C) X (2 BUILDING)	116,568.16	\$ 54,723.93	37.94%	\$ 29,142.04	20.20%	\$ 83,865.97	58.14%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	15,274.35	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	134,901.57	\$ 56,740.96	39.34%	\$ 30,184.07	20.93%	\$ 86,925.03	60.26%
B	CONTINGENCY	3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	OVERHEAD	6,340.00	\$ 3,619.00	2.51%	\$ 2,853.00	1.98%	\$ 6,472.00	4.49%
E	TOTAL COST (A + B)	144,241.57	\$ 60,359.96	41.85%	\$ 33,037.07	22.90%	\$ 93,397.03	64.75%

Prepara husi :
Date; / / 2022

Verifika husi :
Date; / / 2022

Serttifica husi :
Date; / / 2022

Eng.Agustinho Aranda
Engenheiro AND, I. P. Municipio de Baucau

Eng/Arch.Francisco Xavier de D. Jeronimo
Senior Engenheiro ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento ADN, I. P.

Eng.Emerenciana da Costa Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN , I. P.

Eng.Jerry Gil M. Pereira
Engenheiro AND, I. P. Municipio de Baucau



#ANEXU C1 (BV-18)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba ESG Kilik Waigae Suco Caibada Makasae Posto Administrativo Baucau Villa Municipiu Baucau**

No. kontratu :

Data Inspesaun : Wednesday, September 10 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : E:15502072 Latetude : N: 7123437

and Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : **1. AGUSTINHO ARANDA**

2. Jerry Gil M. Pereira

3.

4.


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Plasteran

Item servisu plasteran kuaze Atinji ona 100%

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Tebal plasteran 1.5cm

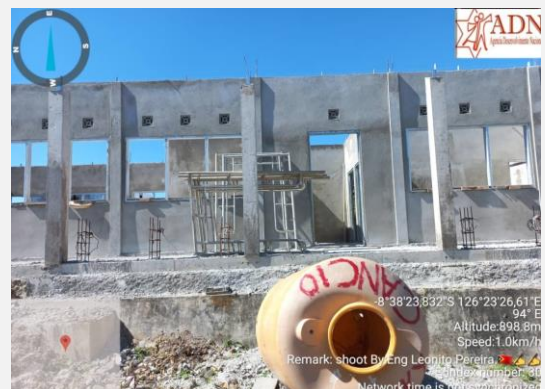



#ANEXU C1 (BV-18)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba ESG Kilik Waigae Suco Caibada Makasae Posto**

Administrativo Baucau Villa Municipiu Baucau

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Reinforcement Steel	Reinforcement Steel of 200mm x 200mm sloof, 24 Mpa (Y12mm x Ø8mm)
Reinforcement Steel Y12mm = 300 kg Reinforcement Steel Ø8mm = 107 kg	



#ANEXU C1 (BV-18)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba ESG Kilik Waigae Suco Caibada Makasae Posto**

Administrativo Baucau Villa Municipiu Baucau

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Data Inspesaun : Thursday, February 10, 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa



#ANEXU C1 (BV-18)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba ESG Kilik Waigae Suco Caibada Makasae Posto Administrativo Baucau Villa Municipiu Baucau**

No. kontratu :

Koordinadas :

Start Point : Long : **8.47472576** , Latetude : **126.456180**

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1. AGUSTINHO ARANDA**

2.

3.

4.


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Reinforced concrete
Footing

Volume = 1.4 Cu.m

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Reinforced concrete Footing, 24 mpa

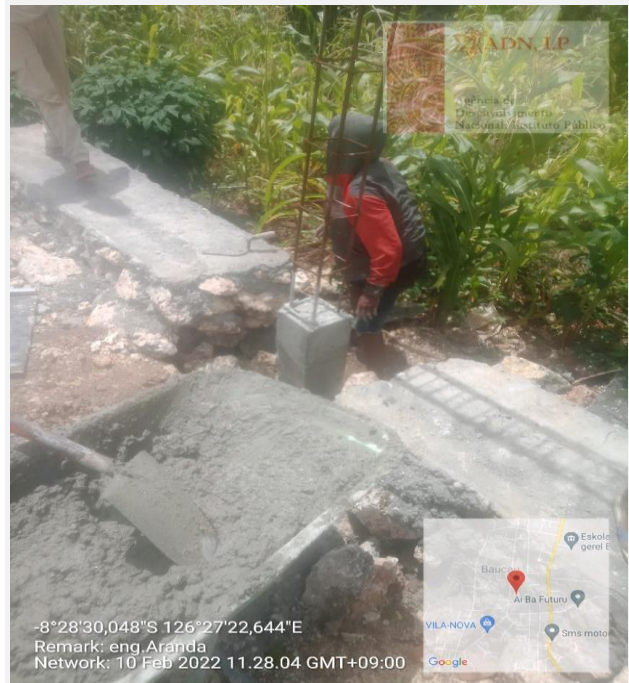

Data Inspesaun : **Thursday, February 17, 2022**

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa



#ANEXU C1 (BV-18)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba ESG Kilik Waigae Suco Caibada Makasae Posto Administrativo Baucau Villa Municipiu Baucau**

No. kontratu :

Koordinadas :

Start Point : Long : **8.48686333** , Latetude : **126.447713**

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1. AGUSTINHO ARANDA**

2.

3.

4.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Reinforced concrete Volume = 5.6 Cu.m	Reinforced concrete of Ground beam 250mm x 200mm, 24 Mpa



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


#ANEXU C1 (BV-18)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba ESG Kilik Waigae Suco Caibada Makasae Posto**

Administrativo Baucau Villa Municipiu Baucau

No. kontratu :





Naran Projetu
Lokal Projetu

:Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Filial Kilik Waiga'e
:Aldeia Caiboilale, Suku Caibada Makasae, Postu Administrativu Baucau Villa Munisípiu Baukau

MAIN SUMMARY			Progress November 2022					
			PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %
I	PRELIMINARIES	\$ 2,782.93	\$ 1,457.93	1.91%	\$ -	0.00%	\$ 1,457.93	1.91%
II	CLASSROOM BUILDING C	\$ 57,505.03	\$ 27,200.82	35.54%	\$ 19,507.17	25.49%	\$ 46,707.99	61.03%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 6,900.60	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 67,188.56	28,658.75	37.45%	19,507.17	25.49%	48,165.92	62.94%
B	CONTINGENCY	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
C	OVERHEAD	\$ 6,340.00	\$ 2,735.00	3.57%	\$ -	0.00%	\$ 2,735.00	3.57%
E	TOTAL COST (A + B + C)	\$ 76,528.56	\$ 31,393.75	41.02%	\$ 19,507.17	25.49%	\$ 50,900.92	66.51%

Prepara husi :

Date; / / 2022

Verifika husi :

Date; / / 2022

Sertifika husi :

Date; / / 2022

Eng. Agostinho Aranda

Enjeñeiru AND, I. P., Munisípiu Baukau

Arch. Francisco Xavier de D. Jerónimo

Seniór Enjeñeiru ba Porjetu Edifísiu Públiku Beé-Mós
no Saneamento ADN, I. P.

Enga. Emerenciana da Costa Freitas

Koordenadora Unidade Kontrolu i Validasaun
Kualidade ADN, I. P.

Eng. Jerry Gil Maia Pereira

Enjeñeiru AND, I. P., Munisípiu Baukau

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público						#ANEXU D (BV-18) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
Naran projeto : Rehabilitasaun ba ESG Kilik Waigae Suco Caibada Makasae Posto Administrativo Baucau Villa Municipiu Baucau									
Kompanhia : MEJD PKRIE ESG CAIBADA MAKASAE									
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura	
I	Wednesday, 10 August 2022	Baucau Villa	Eng.Agustinho Aranda	Eng.ADN Municipio Baucau	1	Husu ENG grupo Atu nafatin iha site hodi kontrola traballador hotu hodi garantia kualidade Obra			
					2	Husu eng responsavel atu fo intrusaun servisu ho diak ba traballador sira			
					3	Mantein servisu hotu tuir nafatin matadalan ne'ebe iha hanesan Dezenu no BOQ			
			Eng. Jerry Gil M. Pereira		4	Asselera servisu tuir tempo ne'ebe determina			
			5						

#ANEXU C1 (BV-19)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Caibada Makasae**
No. kontratu :

Data Inspesaun : 20 de Outubro de 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa

Koordinadas :

Start Point : Long: **E 15502361**, Latetude : **N 7123437**

End Point : Long:, Latetude :

Naran Inspector : **1. Eng. AGUSTINHO ARANDA**

2. Eng. JERRY GIL M. PEREIRA


Sketch & Foto Desenho	Observ. iha tereno no Foto Aktual
	Husi observasaun visual nota katak kolom C1 15 x 15cm kuaze kropos hotu
	Pasangan kuda kuda ho gordin Atinji ona 100%



#ANEXU C1 (BV-19)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Caibada Makasae**
No. kontratu :



Data Inspesaun : Monday, 19 July 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa

Koordinadas :

Start Point : Long: **E 15504387**, Latetude : **N 7119296**

End Point : Long:, Latetude :

Naran Inspector : 1. Eng. AGUSTINHO ARANDA

2. Eng. JERRY GIL M. PEREIRA

Sketch & Foto Desenho

Observ. iha tereno no Foto Aktual

#ANEXU C1 (BV-19)


Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Caibada Makasae**
No. kontratu :

Sketch Item servisu reboku ho mahar
1.5 cm no Reinforcement Steel

Dimensaun

Koluna typu C2 15x15 cm

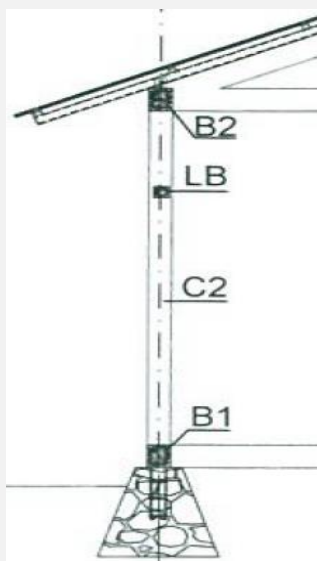

Grupo trabalhador sira halo servisu
reboka no servisu beton ba sloof la tuir
Dezenho nebe iha



Data Inspesaun : Thursday, February 17, 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa

Koordinadas :

Start Point : Long: **8.48686333**, Latetude : **126.447713**

End Point : Long:, Latetude :

Naran Inspector : 1. AGUSTINHO ARANDA

2.

3.

#ANEXU C1 (BV-19)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Caibada Makasae**
No. kontratu :

4.


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Reinforced concrete Volume = 5.6 Cu.m	Reinforced concrete of Ground beam 250mm x 200mm, 24 Mpa



#ANEXU C1 (BV-19)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Caibada Makasae**
No. kontratu :





Naran Projeto
Lokal Projeto

:Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Caibada Makasae
:Aldeia caiobiale, Suku Caibada Makasae, Postu Administrativu Baukau villa, Munisipiu Baukau

MAIN SUMMARY			PROGRESS OCTOBER 2022					
			PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %
I	PRELIMINARIES	\$ 2,682.93	\$ 1,507.93	1.29%	\$ 75.00	0.06%	\$ 1,582.93	1.35%
II	CLASSROOM BUILDING C	\$ 51,019.00	\$ 20,938.00	17.85%	\$ 5,846.40	4.99%	\$ 26,784.40	22.84%
III	CLASSROOM BUILDING CDL	\$ 45,541.20	\$ 17,429.45	14.86%	\$ 5,659.06	4.83%	\$ 23,088.51	19.69%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 8,690.42	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 107,933.54	39,875.38	34.00%	\$ 11,580.46	9.87%	51,455.84	43.88%
B	CONTINGENCY	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
C	OVERHEAD	\$ 6,340.00	\$ 2,522.50	2.15%	\$ 367.50	0.31%	\$ 2,890.00	2.46%
E	TOTAL COST (A + B + C)	\$ 117,273.54	\$ 42,397.88	36.15%	\$ 11,947.96	10.19%	\$ 54,345.84	46.34%

Prepara husi :

Date; / / 2022

Verifika husi :

Date; / / 2022

Sertifika husi :

Date; / / 2022

Eng. Agostinho Aranda

Enjeñeiru AND, I. P., Munisipiu Baukau

Arch. Francisco Xavier de D. Jerónimo


Seniór Enjeñeiru ba Porjetu Edifisiu Públiku Beé-Mós
no Saneamento ADN, I. P.

Enga. Emerenciana da Costa Freitas

Koordenadora Unidade Kontrolu i Validasaun
Kualidade ADN, I. P.

Eng. Jerry Gil Maia Pereira

Enjeñeiru AND, I. P., Munisipiu Baukau

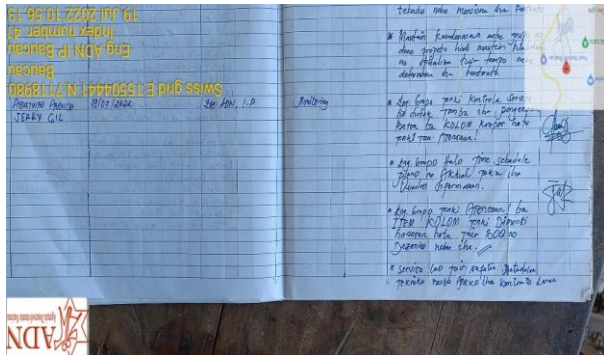 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (BV-19) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
					Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Caibada Makasae				
					Kompanhia : MEJD PKRIE CAIBADA MAKASAE				
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura	
I	Thursday, 20 October 2022	Baucau Villa	Eng.Agustinho Aranda	Eng.ADN Município Baucau	1	Mantein Linha kordenasaun entre grupo no Dono de projeto Tanba iha kolom Baluh baluh kropos tenki hadia			
					2	Mantein Linha kordenasaun entre grupo no Dono de projeto hodi mantein qualidade no finaliza tuir tempo ne'ebe determina			
					3	Eng. Grupo presija halo Time Schedule plano atual taka iha Quadro informasaun			
			Eng. Jerry Gil M. Pereira		4	Eng. Grupo presija Tenki tau atensaun ba ITEM kolom tenki dimensi hanesan hotu tuir BOQ no dezenho ne'ebe iha			
					5	Servisu tenki nafatin lao tuir matadalan tekniku ne'ebe anexu iha kontratu			



#ANEXU C1 (LA- 9)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA CENTRAL BUAUA /
LAVATERI

No. kontratu :

Data Inspesaun : Thursday, nov 23, 2022

Fatin Inspesaun : Baucau , Laga,Lavateri

Koordinadas :

Start Point : Long:, Latetude :

End Point : Long:, Latetude :

Naran Inspector : 1. Agostinho Aranda

Foto iha terenu	Observa/Recommend. iha tereno
Class Room Building C 	1. Eng.grupo tenki mantein iha terenu hodi bele kontrola servisu hodi garante qualidade projecto 2. Molok atu halo pengecoran ba lantai tenki Stamper/halo pemdatan lai hafoin bele cor 3. Pres.grupo tenki halo linha kordenasaun ho projecto nain(Owner)relasiona ho servisu iha terenu

#ANEXU C1 (LA- 9)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA CENTRAL BUAUA /
LAVATERI

No. kontratu :

Foto iha terenu

Observa/Recommend. iha tereno

Class Room Building CDL



1. Trabalhador sira instala besi ba penutup Concrete Stand include finishing by brush stone and maebale to cover concrete stand as shown by design
2. Atu halo pengecoran ba beton pastikan udan labele tau atu nune labele impaktu ba mutu beton



1. ELECTRICAL INSTALLATION
Tenki instala ho didiak tuir BOQ nebe iha



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA- 9)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA CENTRAL BUAUA /
LAVATERI

No. kontratu :



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



(ANEXO C2 LA-9)

Naran Projetu :Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Lala-Bu'u
Lokal Projetu :Aldeia Sre-Bu'u, Suku Sagadate, Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baukau

MAIN SUMMARY			PROGRES NOVEMBER 2022					
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	PREVIOUS		THIS BILLING		UP TO DATE	
I	PRELIMINARIES	3,316.79	\$ -	0.00%	\$ 1,717.54	1.57%	\$ 1,717.54	1.57%
II	CLASSROOM BUILDING C	55,390.76	\$ -	0.00%	\$ 21,121.69	19.25%	\$ 21,121.69	19.25%
III	TOILET BUILDING Tb	27,657.91	\$ -	0.00%	\$ 4,023.20	3.67%	\$ 4,023.20	3.67%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	14,000.62	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	100,366.08	\$ -	0.00%	\$ 26,862.43	24.49%	\$ 26,862.43	24.49%
B	CONTINGENCY	3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	OVERHEAD	6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
E	TOTAL COST (A + B)	109,706.08	\$ -	0.00%	\$ 26,862.43	24.49%	\$ 26,862.43	24.49%

Prepara husi :
Date; / / 2022

Verifika husi :
Date; / / 2022


Serttifica husi :
Date; / / 2022

Eng. Agostinho Aranda
Enjeñeiru AND, I. P., Munisípiu Baukau

Arch. Francisco Xavier de D. Jerónimo
Seniór Enjeñeiru ba Porjetu Edifísiu Públiku Beé-Mós no
Saneamento ADN, I. P.

Enga. Emerenciana da Costa Freitas
Koordenadora Unidade Kontrolu i Validasaun Kualidade ADN, I. P.

Eng. Jerry Gil Maia Pereira
Enjeñeiru AND, I. P., Munisípiu Baukau

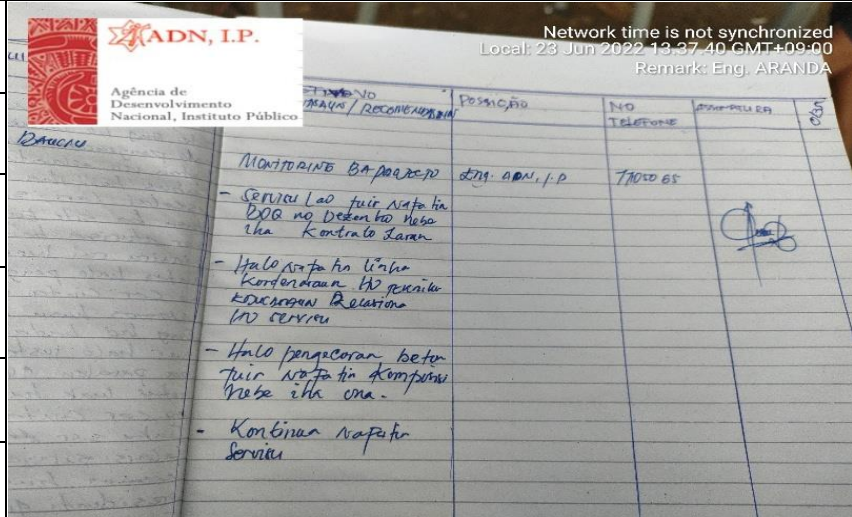 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  Agência de Desenvolvimento Nacional						#ANEXU D (LA-9) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Naran projeto : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA CENTRAL BUAUA / LAVATERI								
Kompanhia : Grupo Comunitaria								
No.	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura
I	Thursday, 23 June 2022	Baucau ,Laga	Eng.Agustinho Aranda	Eng.ADN Município Baucau	1	Eng.grupo tenki mantein iha terenu hodi bele kontrola servisu hodi garante qualidade projecto		
					2	Molok atu halo pengecoran ba lantai tenki Stamper/halo pemdatan lai hafoin bele cor		
					3	Pres.grupo tenki halo linha kordenasaun ho projecto nain(Owner)relasiona ho servisu iha terenu		
					4	Eng,Grupo Prepara relatori progres servisu kada semanal Fulanhodi submete ba teknik educasaun		
					5	Servisu lao tuir nafatin BOQ no Dezenho nebe anexo iha kontrato laran		
					6	Kontinua nafatin servisu		



NARAN PROJETU : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF FITUN SAGADATE
FATIN PROJETU : SAGADATE-LAGA-BAUCAU

MAIN SUMMARY			Progres November 2022					
			PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %
I	PRELIMINARIES	\$ 3,316.79	\$ 2,595.90	2.86%	\$ -	0.00%	\$ 2,595.90	2.86%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	\$ 68,006.03	\$ 25,328.83	27.87%	\$ 17,587.15	19.35%	\$ 42,915.98	47.23%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 10,203.69	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 81,526.51	\$ 27,924.73	30.73%	\$ 17,587.15	19.35%	\$ 45,511.88	50.09%
B	CONTINGENCY	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	OVERHEAD	\$ 6,340.00	\$ 2,825.00	3.11%	\$ 975.00	1.07%	\$ 3,800.00	4.18%
E	TOTAL COST (A + B)	\$ 90,866.51	\$ 30,749.73	33.84%	\$ 18,562.15	20.43%	\$ 49,311.88	54.27%

Prepara husi :

Date; / / 2022

Verifika husi :

Date; / / 2022

Sertifika husi :

Date; / / 2022

Eng. Agostinho Aranda

Engenheiro AND, I. P. Municipio

Eng/Arch. Francisco Xavier de D. Jeronimo

Senior Engenheiro ba Porjecto Edificio Publico Beé
no
Saneamento ADN, I. P.

Eng. Emerenciana da Costa Freitas

Coordenadora da Unidade de Controlo
e Validação
de Qualidade ADN, I. P.

Eng. Jerry Gil M. Pereira

Engenheiro AND, I. P. Municipio de
Baucau

#ANEXU C1 (LA-10)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF No 2 Ciclo Libagua
No. kontratu :

Data Inspesaun : Wednesday, 09 Nov 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8.465788** , Latetude : **126.56446**

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1. Eng. AGUSTINHO ARANDA**

2. Eng. JERRY GIL M. PEREIRA

Sketch & Foto Desenho	Observ. iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	1. Servisu real iha terenu agora dadauk ne to tena sinta Geral , no iha servisu seluk hanesan reboka iha aula balu hotu tiha 2. Servisu fulan 2 ona provisorimente Parado/labele kontinua tamba kestaun financeiro 3. Site eng.Grupo dadaun ne la iha terenu tamba servisu parado

#ANEXU C1 (LA-10)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF No 2 Ciclo Libagua
No. kontratu :

Data Inspesaun : Monday, 19 July 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa


Koordinadas :

Start Point : Long : E 15504387 , Latetude : N 7119296

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1. Eng. AGUSTINHO ARANDA

2. Eng. JERRY GIL M. PEREIRA

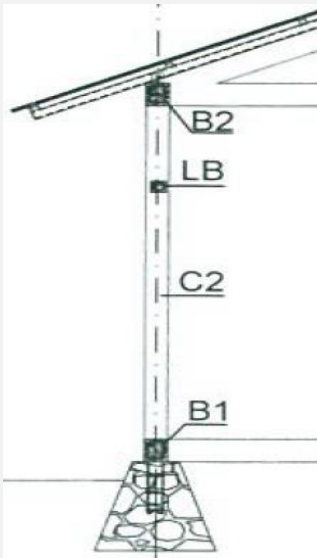Sketch & Foto Desenho	Observ. iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu reboku ho mahar 1.5 cm no Reinforcement Steel Dimensaun Koluna typu C2 15x15 cm 	Grupo trabalhador sira halo servisu reboka no servisu beton ba sloof la tuir Dezenho nebe iha 

Data Inspesaun : Thursday, February 17, 2022



#ANEXU C1 (LA-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF No 2 Ciclo Libagua**
No. kontratu :

Fatin Inspesaun : Baucau, Baucau Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : **8.48686333**, Latetude : **126.447713**

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : **1. AGUSTINHO ARANDA**

2.

3.

4.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Reinforced concrete Volume = 5.6 Cu.m	Reinforced concrete of Ground beam 250mm x 200mm, 24 Mpa



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-10)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF No 2 Ciclo Libagua
No. kontratu :





NARAN PROJECTO : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF No 2 Ciclo Libagua
FATIN PROJECTO : LIBAGUA , LAGA, BAUCAU
PROJECTO NAIN : MEJD

MAIN SUMMARY			Progres November 2022					
			PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL \$	WEIGH %	TOTAL \$	WEIGH %	TOTAL \$	WEIGH %
I	PRELIMINARIES	\$ 3,262.12	\$ -	0.00%	\$ 1,668.56	1.91%	\$ 1,668.56	1.91%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	\$ 67,401.77	\$ 29,756.03	33.99%	\$ 14,632.39	16.71%	\$ 44,388.43	50.70%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 7,550.40	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 78,214.29	\$ 29,756.03	33.99%	\$ 16,300.95	18.62%	\$ 46,056.99	52.60%
B	CONTINGENCY	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	OVERHEAD	\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 2,395.00	2.74%	\$ 2,395.00	2.74%
E	TOTAL COST (A + B)	\$ 87,554.29	\$ 29,756.03	33.99%	\$ 18,695.95	21.35%	\$ 48,451.99	55.34%

Prepara husi :

Date; / / 2022

Verifika husi :

Date; / / 2022

Sertifika husi :

Date; / / 2022

Eng.Agustinho Aranda

Engenheiro AND, I. P. Municipio de Baucau

Eng/Arch.Françisco Xavier de D. Jeronimo

Senior Engenheiro ba Porjecto Edificio Publico
Beé no Saneamento ADN, I. P.

Eng.Emerenciana da Costa Freitas

Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN , I. P.

Eng.Jerry Gil M. Pereira

Engenheiro AND, I. P. Municipio de Baucau



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (LA - 10)
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF No 2 Ciclo Libagua

Kompanhia : Grupo Komunitario EBF No 2 Ciclo Libagua

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura	
I	Wednesday, 09 November 2022	Baucau Villa	Eng.Agustinho Aranda	Eng.ADN Municipio Baucau	1	Mantein Linha kordenasaun entre grupo no Dono de projeto Tanba iha kolom Baluh baluh kropos tenki hadia			
					2	Mantein Linha kordenasaun entre grupo no Dono de projeto hodi mantein kualidade no finaliza tuir tempo ne'ebe determina			
					3	Eng. Grupo presija halo Time Schedule plano no atual taka iha Quadro informasaun			
			Eng. Jerry Gil M. Pereira		4	Eng. Grupo presija Tenki tau atensaun ba ITEM kolom tenki dimensi hanesan hotu tuir BOQ no dezenho ne'ebe iha			
			5		Servisu tenki nafatin lao tuir matadalan tekniku ne'ebe anexu iha kontratu				



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Naran Projeitu
Lokal Projeitu

:Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Abo-Lir Laletak
:Aldeia Abolir, Suku Abo, Postu Administrativu Quelecai, Munisipiu Baukau

MAIN SUMMARY			Progress November 2022					
			PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %
I	PRELIMINARIES	3,308.98	\$ -	0.00%	\$ 2,081.99	2.77%	\$ 2,081.99	2.77%
II	CLASSROOM BUILDING C	55,274.10	\$ -	0.00%	\$14,174.04	18.87%	\$14,174.04	18.87%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	7,194.17	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	65,777.25	\$ -	0.00%	\$16,256.03	21.64%	\$16,256.03	21.64%
B	CONTINGENCY	3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	OVERHEAD	6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 1,230.00	1.64%	\$ 1,230.00	1.64%
E	TOTAL COST (A + B)	75,117.25	\$ -	0.00%	\$17,486.03	23.28%	\$17,486.03	23.28%

Prepara husi :
Date; / / 2022

Verifika husi :
Date; / / 2022

Sertifika husi :
Date; / / 2022

Eng. Agostinho Aranda
Enjeñeiru AND, I. P., Munisipiu Baukau

Arch. Francisco Xavier de D. Jerónimo
Seniór Enjeñeiru ba Porjetu Edifisiu Públiku Beé-Mós no
Saneamento ADN, I. P.

Enga. Emerenciana da Costa Freitas
Koodenadora Unidade Kontrolu i Validasaun Kualidade
ADN, I. P.

Eng. Jerry Gil Maia Pereira
Enjeñeiru AND, I. P., Munisipiu Baukau



NARAN PROJETO : NOVA CONSTRUCAO EBF-1114 DARLA'A
FATIN PROJETO : LAISORULAI-QUELICAI-BAUCAU
PROJETO NAIN : MEJD

#ANEXU C2 (QUE-15)

MAIN SUMMARY			Progress Novembro 2022					
			PREVIOUS		THIS BILLING		UP TO DATE	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %
I	PRELIMINARIES	3,348.03	\$ 1,674.02	1.57%	\$ 1,584.21	1.49%	\$ 3,258.23	3.06%
II	CLASSROOM BUILDING C	55,772.91	\$ 27,886.45	26.17%	\$ 13,585.08	12.75%	\$ 41,471.54	38.91%
III	TOILET BUILDING Tb	27,864.48	\$ 13,932.24	13.07%	\$ 10,412.03	9.77%	\$ 24,344.27	22.84%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	10,246.45	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	97,231.86	43,492.71	40.81%	25,581.32	24.00%	69,074.03	64.81%
B	CONTINGENCY	3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	OVERHEAD	6,340.00	\$ 2,536.00	0.00%	\$ 2,718.00	1.71%	\$ 5,254.00	4.93%
E	TOTAL COST (A + B)	106,571.86	\$ 46,028.71	40.81%	\$ 28,299.32	25.71%	\$ 74,328.03	69.74%

Prepara husi :
Date; / / 2022

Verifika husi :
Date; / / 2022

Sertifika husi :
Date; / / 2022

Eng.Agustinho Aranda
Engineiro AND, I. P. Municipio de
Baucau

Eng/Arch.Françisco Xavier de D. Jeronimo
Senior Engineiro ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento ADN, I. P.

Eng.Emerenciana da Costa Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação
de Qualidade ADN , I. P.

#ANEXU CI (QUE- 10)

Back-up Data

Naran Projeto: NOVA CONSTRUCAO EBF-379 WAIACA

No. kontratu : GRUPO MEJD PKRIE EBF UAI- ACA/MULIA

Data Inspesaun : Wednesday, Nov 16, 2022

Fatin Inspesaun : Baucau , Quelicai, Mulia

Koordinadas :

Start Point : Long:-8°29',2874" Latetude: 126°33'49,554"

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1. Agostinho Aranda

2. Jerry Gil M. Pereira

Foto Actual Iha Terenu



Observasaun iha Terenu

1. Projeto dadauk ne'e too ona iha kakuluk
2. Parte kakuluk nian sei falta gording parte oin ak grupo seidauk monta maibe material kompletu ona iha terenu
3. Servisu reboka parte laran , no haris fatin ceidauk hotu
4. Arus janela no odadmtan material on site ona maibe ceidauk monta



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



#ANEXU C2 (QUE- 10)

NARAN PROJETU : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EBF WAIACA
FATIN PROJETU : QUELICALI . UAITAME -BAUCAU
PROJETU NAIN : MEJD

MAIN SUMMARY			Progress November 2022					
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	PREVIOUS		THIS BILLING		UP TO DATE	
I	PRELIMINARIES	\$ 3,277.74	\$ 2,276.37	2.25%	\$ -	0.00%	\$ 2,276.37	2.25%
II	CLASSROOM BUILDING Cb	\$ 77,900.49	\$ 25,796.13	25.46%	\$ 23,370.15	23.07%	\$ 49,166.28	48.53%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 10,790.84	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 91,969.07	\$ 28,072.50	27.71%	\$ 23,370.15	23.07%	\$ 51,442.65	50.78%
B	CONTINGENCY	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	OVERHEAD	\$ 6,340.00	\$ 3,099.00	3.06%	\$ 1,500.00	1.48%	\$ 3,099.00	4.54%
E	TOTAL COST (A + B)	\$ 101,309.07	\$ 31,171.50	30.77%	\$ 24,870.15	24.55%	\$ 54,541.65	55.32%

Prepara husi :
Date; / / 2022

Verifika husi :
Date; / / 2022


Serttika husi :
Date; / / 2022

Eng.Agustinho Aranda
Engineiro AND, I. P. Municipio de Baucau

Eng/Arch.Francisco Xavier de D. Jeronimo
Senior Engineiro ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento ADN, I. P.

Eng.Emerenciana da Costa Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN , I. P.

Eng.Jerry Gil M. Pereira
Engineiro AND, I. P. Municipio de Baucau

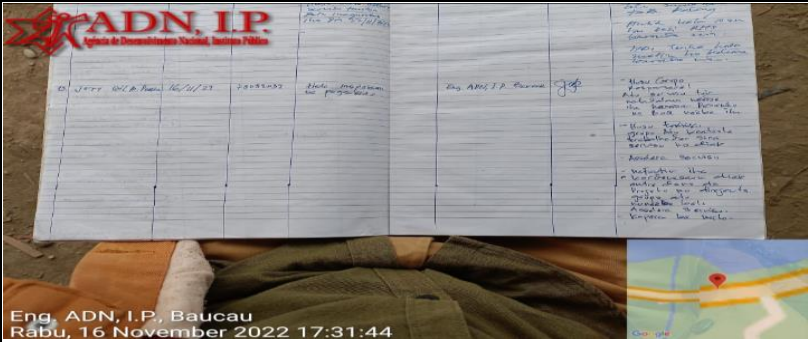 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 						#ANEXU D (QUE-10) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
						Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun EBF Uai-Aca/Mulia iha Aldeia Uai-Aca/Mulia		
						Kompanhia : GRUPU KOMUNITARIU MEJD PKRIE EBF UAI- ACA/MULIA		
No.	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Inspetor	Pozisaun	No.	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura
I	Wednesday, 16 November 2022	Baucau , Quelicaí,Mulia	Eng.Agustinho Aranda	Eng.ADN Municipio Baucau	1	Parte kakuluk nian eng.tenki kontrola badaen sira ho didiak para setting didiak nia kemiringan atap tuir Dezenho ne'ebe iha		
					2	Husu ba Eng. Grupo tenki aselera ituan servisu tamba obra refere lao tarde liu.		
					3	Husu ba Tekniku Kompanhia tenki mantein iha terenu hodi kontrola servisu para bele garante ni kualidade		
			Eng. Jerry Gil M. Pereira	Eng.ADN Municipio Baucau	4	eng.kompanhia tenki halo monitorizasaun diariamente		
					5	eng.Grupo halo nafatin linha kordensaun ho dono do Projecto		
					6	servisu tenki lao tuir Dezenu no BOQ ne'ebe iha		

#ANEXU CI (QUE- 14)

Back-up Data

Naran Projeto: **NOVA CONSTRUCAO EBF-379 WAIACA**

No. kontratu : **GRUPU MEJD PKRIE EBF Catolica Darenafa**

Data Inspesaun : Thursday, Nov 17, 2022

Fatin Inspesaun : Baucau , Quelicai, Mulia

Koordinadas :

Start Point : Long:-8°29',2874" Latetude: 126°33'49,554"

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : **1. Agostinho Aranda**

2. Jerry Gil M. Pereira

Foto Actual Iha Terenu



Observasaun iha Terenu

1. Projeto dadauk ne'e too ona iha kakuluk taka hotu tiha ona
2. Parte rangka plafond monta hotu tiha ona maibe triplex ceidauk monta
3. Servisu Pinta parte laran , no haris fatin 2 lapis ceidauk
4. Servisu keramik iha aula balu seidauk finalize
5. Parte haris fatin nian instalasaun ba be'e nian ceidauk hotu



#ANEXU C2 (QUE- 14)

Naran Projectu : Konstrusaun ka Rehabilitasaun EBF Catolica Darenafa
Projectu Nain : Ministerio da Edukasaun, Juventude e Desporto
Fatin Projectu : Suco Namanei, Posto Admin Quelicai, Municipio Baucau - Timor Leste

SUMMARY			Progress November 2022					
NO	DESCRIPTION	VERIFIED by A.D.N	PREVIOUS		THIS BILLING		UP TO DATE	
		AMOUNT \$	AMOUNT \$	WEIGH %	AMOUNT \$	WEIGH %	AMOUNT \$	WEIGH %
I	PRELIMINARIES	\$ 2,640.25	\$ -	0.00%	\$ 1,400.25	2.97%	\$ 1,400.25	2.97%
II	REFURBISHED CLASSROOM BUILDING RF	\$ 35,113.82	\$ -	0.00%	\$ 23,952.90	50.86%	\$ 23,952.90	50.86%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 37,754.07	\$ -	0.00%	\$ 25,353.15	53.84%	\$ 25,353.15	53.84%
B	OVERHEAD	\$ 6,340.00	\$ -	0.00%	\$ 3,108.00	6.60%	\$ 3,108.00	6.60%
C	CONTIGENCY	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	TOTAL COST (A + B)	\$ 47,094.07	\$ -	0.00%	\$ 28,461.15	60.43%	\$ 28,461.15	60.43%

Prepara husi :

Date; / / 2022

Verifika husi :

Date; / / 2022

Serttifika husi :

Date; / / 2022

Eng.Agustinho Aranda

Engenheiro AND, I. P. Municipio de
Baucau

Eng/Arch.Francisco Xavier de D. Jeronimo


Senior Engenheiro ba Porjecto Edificio Publico Beé
no
Saneamento ADN, I. P.

Eng.Emerenciana da Costa Freitas

Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação
de Qualidade ADN , I. P.

Eng.Jerry Gil M. Pereira

Engineiro AND, I. P. Municipio de
Baucau

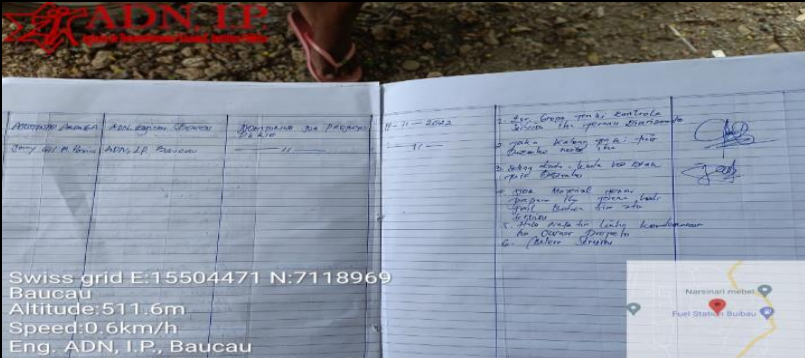 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN Agência de Desenvolvimento Nacional					#ANEXU D (QUE-14) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun EBF Catolica Darenafa									
Kompanhia : GRUPU MEJD PKRIE EBF Catolica Darenafa									
No.	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Inspetor	Pozisaun	No.	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura	
I	Thursday, 17 November 2022	Baucau , Quelicaí,Mulia	Eng.Agustinho Aranda	Eng.ADN Municipio Baucau	1	Parte kakuluk nian eng.tenki kontrola badaen sira ho didiak para setting didiak nia kemiringan atap tuir Dezenho ne'ebe iha			
					2	Husu ba Eng. Grupo tenki mobiliza sasan kontrusaun nian ba terenu hodi bele badaen sira fasil atu servisu no tempo udan karik labele difikulta servisu			
					3	Husu ba Tekniku Kompanhia tenki mantein iha terenu hodi kontrola servisu para bele garante ni <u>kualidade</u>			
			Eng. Jerry Gil M. Pereira	Eng.ADN Municipio Baucau	4	eng.kompanhia tenki halo monitorizasaun diariamente			
					5	eng.Grupo halo nafatin linha kordensaun ho dono do Projecto			
					6	servisu tenki lao tuir Dezenu no BOQ ne'ebe iha			



#ANEXU C1 (VEN-9)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Uai-Bua, Iha Aldeia
Uato-Hassa, Suku Uato-Haco

No. kontratu :

Data Inspesaun : Wednesday, 9 November 2022

Fatin Inspesaun : Baucau, Venilale, Uailaha

Koordinadas :

Start Point : Long :-8°38'33,352"S Latetude : 126°22'43,14"E

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1. Agostinho Aranda

2. Jerry Gil M. Pereira

Foto iha terenu



Observasaun iha tereno

1. Konstrusaun real iha terenu too ona iha atap
2. Arus janele no odamtan monta hotu ona
3. Reboka iha parte laran no parte haris fatin ceidauk hotu
4. Instalasaun pipa toilet nian hotu ona
5. Instalsaun electricidade nian husi ekipa electridade adn. I.O nian sei mai halo inspeksaun fali



#ANEXU C2 (VEN-9)

Naran Projetu :Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Uai-Bua
Lokal Projetu :Aldeia Uato-Hassa, Suku Uato-Haco, Postu Administrativu Venilale,
Munisipiu Baukau

MAIN SUMMARY			Progress November 2022					
			PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %
I	PRELIMINARIES	\$ 3,075.00	\$ 1,800.00	2.03%	\$ 825.00	0.93%	\$ 2,625.00	2.96%
II	CLASSROOM BUILDING C	\$ 68,979.42	\$ 29,881.88	33.65%	\$ 17,883.82	20.14%	\$ 47,765.71	53.79%
III	PROVISIONAL SUM FOR DEMOLETION	\$ 625.00	\$ 625.00	0.70%	\$ -	0.00%	\$ 625.00	0.70%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 6,782.32	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 79,461.74	\$ 32,306.88	36.38%	\$ 18,708.82	21.07%	\$ 51,015.71	57.45%
B	CONTINGENCY	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
C	OVERHEAD	\$ 6,340.00	\$ 1,412.50	1.59%	\$ 1,570.00	1.77%	\$ 2,982.50	3.36%
E	TOTAL COST (A + B + C)	\$ 88,801.74	\$ 33,719.38	37.97%	\$ 20,278.82	22.84%	\$ 53,998.21	60.81%

Prepara husi :
Date; / / 2022

Verifika husi :
Date; / / 2022

Serttifica husi :
Date; / / 2022

Eng. Agostinho Aranda
Enjeñeiru AND, I. P., Munisípiu Baucau

Arch. Francisco Xavier de D. Jerónimo
Seniór Enjeñeiru ba Projetu Edifísiu Públiku Bee-Mós no
Saneamento ADN, I. P.

Enga. Emerenciana da Costa Freitas
Koordenadora Unidade Kontrolu i Validasaun
Kualidade ADN, I. P.

Eng. Jerry Gil Maia Pereira
Enjeñeiru AND, I. P., Munisípiu Baucau



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (VEN -9)

INSTRUSAUN /
REKOMENDASAUN

Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Uai-Bua, Iha Aldeia Uato-Hassa, Suku Uato-Haco

Kompanha : Grupo MEJD EBC Uai-Bua

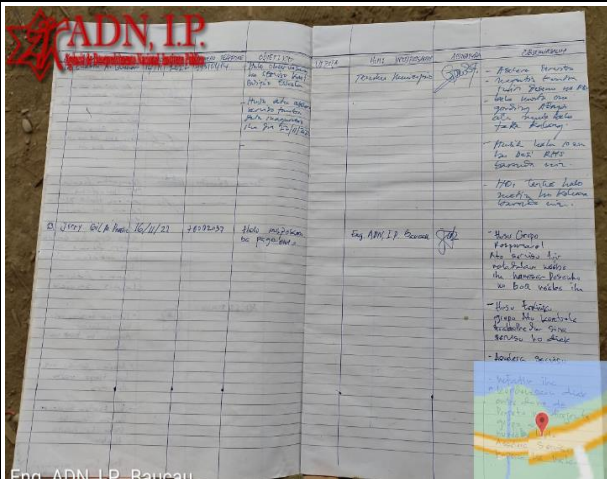No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No.	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura
I	Wednesday, 09 November 2022	Venilale , Uabua	Eng.Agustinho Aranda	Eng.Adn Baucau	1	Ba instalasaun electricidade halo linha kordenasaun owner no adn parte electricade nian		
					2	Servisu kontinua lao nafatin tir BOQ no Dezenu ne'ebe iha kontratu		
			Eng. Jerry Gil M. Pereira		3	konaba eltrisidade depois ekipa husi ADN, I.P Electricidade sei halo inspesaun		
					4	Ba servisu provicional sum karik implementa ona iha terenu tenki justifika no halo breakdown submete mai adn hodi verifika		
					5	Aselera Servisu		



NARAN PROJETO : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN EPE PUBLICO AMIZADE VENILALE
FATIN PROJETO : UATOACO-VENILALE-BAUCAU
PROJETO NAIN : MEJD

			Progres november 2022								
No.	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE				
I	PRELIMINARIES	3,254.31	\$	1,964.66	2.19%	\$	800.69	0.89%	\$	2,765.34	3.09%
II	CLASSROOM BUILDING C2	64,684.56	\$	33,066.44	36.91%	\$	18,606.95	20.77%	\$	51,673.39	57.69%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	12,298.48	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	80,237.35	\$	35,031.10	39.11%	\$	19,407.64	21.67%	\$	54,438.74	60.77%
B	CONTINGENCY	3,000.00	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
IV	OVER HEAD	6,340.00	\$	3,805.00	4.25%	\$	751.50	0.84%	\$	4,556.50	5.09%
C	TOTAL COST (A + B + C)	89,577.35	\$	38,836.10	43.35%	\$	20,159.14	22.50%	\$	58,995.24	65.86%

Prepara husi :
Date; / / 2022

Verifika husi :
Date; / / 2022

Sertifika husi :
Date; / / 2022

Eng.Agustinho Aranda
Engineiro AND, I. P. Municipio de
Baucau

Eng/Arch.Françisco Xavier de D. Jeronimo
Senior Engineiro ba Porjecto Edificio Publico Beé
no
Saneamento ADN, I. P.

Eng.Emerenciana da Costa Freitas
Coordenadora da Unidade de
Controlo e Validação
de Qualidade ADN , I. P.

Eng.Jerry Gil M. Pereira
Engineiro AND, I. P. Municipio
de Baucau

#ANEXU C1 (VEN-10)

Back-up Data

Naran Projeto: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun Ba EBF Culina-Ossu-Uailale, Ossu-Uaque,**
No. kontratu :

Data Inspesaun : Wednesday, 09 November 2022

Fatin Inspesaun : Venilale , ossu-Uaque

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8°40'21,996"S** Latetude : **126°18'42,66"E**

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1. Eng. Agostinho Aranda**

2. Eng. Jerry Gil Maia Pereira

Foto actual iha terenu



Observasaun iha tereno

1. Servisu refere to ona iha kuda-kuda hein para atu taka kalen deit
2. Eng.grupo tenki setting didiak nia kemiringan atap hanesan ho dezenho ne'ebe iha
3. Reboka hotu tiha ona arus janela no odamatan monta hotu tiha ona
4. Stok material kompletu iha terenu



Naran Projetu
Lokal Projetu

:Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Culina-Osso-Uailale, Osso Uaque
:Aldeia Osso Uaque, Suku Fatulia, Postu Administrativu Venilale, Munisípiu Baukau

#ANEXU C2 (VEN-10)

MAIN SUMMARY			Progress November 2022					
			PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %	TOTAL	WEIGH %
I	PRELIMINARIES	\$ 2,986.59	\$ 1,636.59	1.36%	\$ -	1.36%	\$ 1,636.59	2.72%
II	CLASSROOM BUILDING CA	\$ 65,162.94	\$ 21,353.89	17.74%	\$ 22,807.03	18.95%	\$ 44,160.92	36.69%
III	TOILET BUILDING Tb	\$ 26,400.18	\$ 11,359.86	9.44%	\$ 5,808.04	4.83%	\$ 17,167.89	14.26%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 16,481.36	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 111,031.07	\$ 34,350.34	28.54%	\$ 28,615.07	25.13%	\$ 62,965.41	53.67%
B	CONTINGENCY	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
C	OVERHEAD	\$ 6,340.00	\$ 2,000.00	1.66%	\$ 1,200.00	1.00%	\$ 3,200.00	2.66%
E	TOTAL COST (A + B + C)	\$ 120,371.07	\$ 36,350.34	30.20%	\$ 29,815.07	26.13%	\$ 66,165.41	56.33%

Prepara husi :

Date; / / 2022

Verifika husi :

Date; / / 2022

Serttifica husi :

Date; / / 2022

Eng. Agostinho Aranda

Enjeñeiru AND, I. P., Munisípiu Baukau

Arch. Francisco Xavier de D. Jerónimo

Seniór Enjeñeiru ba Porjetu Edifísiu Públiku Beé-Mós no
Saneamento ADN, I. P.

Enga. Emerenciana da Costa Freitas

Koordenadora Unidade Kontrolu i Validasaun
Kualidade ADN, I. P.

Eng. Jerry Gil Maia Pereira

Enjeñeiru AND, I. P., Munisípiu Baukau



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (VEN-10) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun Ba EBF Culina-Ossu-Uailale,
Ossu Uaque, Suku Fatulia, Postu Administrativu Venilale, Municipio Baucau

Kompanhia : MEJD PKRIE EBF CULINA-OSSU-MAILALE

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Inspetor	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	Wednesday, November 09, 2022	Baucau,Venilale,O ssuoaque	Eng. Agostinho Aranda Eng. Jerry Gil Maia Pereira	Eng. ADN, I.P., Baucau	1	Servisu lao tuir nafatin matadalan ne'ebe iha	
					2	Halo nafatin linha kordenasaun ho owner	
					3	Eng.Grupo tenki iha terenu hodi kontrola servisu Diariamente	
					4	Stok material tenki mobiliza mai terenu hodi fasil badaen sira servisu	
					5	Aselera servisu	



#Anexu C1 (MP-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baucau - Lautem Road**

No. kontratu : **ICB/078/MPWTC-2015**

Data Inspesaun : 15-16/ 11/ 2022

Fatin Inspesaun : Baucau-Lautem

Koordinadas :

Start Point : Long : 126'27"3,361 E, Latetude: -8.27'39, 004S

End Point : Long : 126'53"58,999 E, Latetude: -8.27'39, 004S

Naran Inspector : **1. Eng. Tito Edgar F.N. de Jesus**


2. Eng. Augusta da Costa Ferreira

3. Eng. Elnino J.A. Mota

4. Eng. Leonito Pereira

Sketch & Foto Desenho

Item servisu Retaining Wall

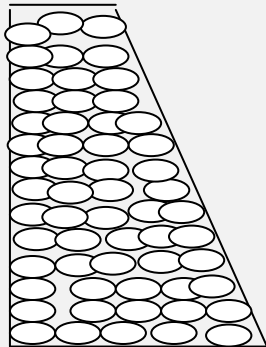

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#Anexu C1 (MP-2)


Back-up Data

Naran Projeto : **Road Network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baucau - Lautem Road**

No. kontratu : **ICB/078/MPWTC-2015**

Sketch & Foto Desenho

Item servisu Line Ditch



Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#Anexu C1 (MP-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baucau - Lautem Road**

No. kontratu : **ICB/078/MPWTC-2015**

Sketch & Foto Desenho

Item Servisu Grouted Rip Rap

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#Anexu C1 (MP-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of
Baucau - Lautem Road**

No. kontratu : **ICB/078/MPWTC-2015**



#ANEXU C2 (MP- 2)

Project Name : Road Network Upgrading Sector Project (RNUSP) ADB Loan Nos.3341/3342(SF)-TIM Upgrading and Maintenance of Baucau-Lautem Section
Sta.123+105 to Sta.182+040(with exceptions) ICB/078/MPWTC/2015
Contractor : CBMI Const.Co.,Ltd./Chongqing Road Engineering(Group)Co.,Ltd.

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	TOTAL VALUE OF WORK PREVIOUSLY	PERCENT PREVIOUS	TOTAL VALUE OF WORK THIS BILLING	PERCENT THIS MONTH	TOTAL VALUE OF WORK TO DATE	% TO DATE	BALANCE OF COST TO DATE
		(US Dollar)	(US Dollar)	%	(US Dollar)	%	(US Dollar)	%	(US Dollar)
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 2,063,252.00	\$ 2,063,252.00	7.04%	\$ -	0.00%	\$ 2,063,252.00	7.04%	\$ 0.00
200	EARHWORKS	\$ 5,155,850.16	\$ 5,022,403.73	17.13%	\$ 102,284.49	0.35%	\$ 5,124,688.22	17.48%	\$ 31,161.94
300	SUBBASE AND BASE COURSES	\$ 6,522,335.98	\$ 6,192,155.84	21.12%	\$ 339,552.14	1.16%	\$ 6,531,707.98	22.28%	\$ (9,372.00)
400	SURFACE COURSE	\$ 4,955,077.48	\$ 4,830,795.05	16.48%	\$ 189,508.24	0.65%	\$ 5,020,303.29	17.13%	\$ (65,225.81)
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 1,071,229.18	\$ 1,008,191.25	3.44%	\$ 26,425.07	0.09%	\$ 1,034,616.32	3.53%	\$ 36,612.86
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 6,455,958.11	\$ 5,633,896.42	19.22%	\$ 591,798.49	2.02%	\$ 6,225,694.91	21.24%	\$ 230,263.20
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	\$ 1,193,530.20	\$ 367,643.25	1.25%	\$ 760,452.18	2.59%	\$ 1,128,095.43	3.85%	\$ 65,434.77
800	BIO ENGINEERING	\$ 142,981.40	\$ -	0.00%	\$ 1,386.00	0.00%	\$ 1,386.00	0.00%	\$ 141,595.40
DW	DAYWORKS	\$ 305,612.88	\$ 137,311.52	0.47%	\$ -	0.00%	\$ 137,311.52	0.47%	\$ 168,301.36
	PROVISIONAL SUM AND CONTINGENCY	\$ 1,062,211.51	\$ 324,535.66	1.11%	\$ -	0.00%	\$ 324,535.66	1.11%	\$ 737,675.85
	TOTAL =	\$ 28,928,038.90	\$ 25,580,184.71	87.26%	\$ 2,011,406.61	6.86%	\$ 27,591,591.32	94.12%	\$ 1,336,447.57
	PERFORMANCE BASED MAINTENANCE WORKS	\$ 387,307.20	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 387,307.20
	CONTRACT AMOUNT	\$ 29,315,346.10	\$ -	87.26%	\$ 2,011,406.61	6.86%	\$ -	94.12%	\$ 29,315,346.10
	GRAND TOTAL	\$ 29,315,346.10	\$ 25,580,184.71	87.26%	\$ 2,011,406.61	6.86%	\$ 27,591,591.32	94.12%	\$ 1,723,754.77

Prepara Husi :

Verifika Husi :

Sertifika husi :

1. (Eng. Augusta da Costa Ferreira)
Eng. PMU ba Projecto (Imprestimo)
ADN, I.P.

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba projeito Infraestrutura,
Transporte e Irrigasaun, ADN, I.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.

2. (Eng. Tito Edgar F.N. de Jesus)
Eng. PMU ba Projecto (Imprestimo)
ADN, I.P.

3. (Eng. Vidal Guterres)
Eng. PMU ba Projecto (Imprestimo)
ADN, I.P.

4. (Eng. Elnino J.A. Mota)
Eng. PMU ba Projecto (Imprestimo)
ADN, I.P.

5.(Eng. Vidal Guterres)
Eng. PMU ba Projecto (Imprestimo)
ADN, I.P.

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					# ANEXU D (MP-2)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baucau - Lautem Road		
					Kompanha : CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I.	15-16/11/2022	Baucau-Lautem	Augusta da Costa Ferreira	Eng PMU ba Projetu (Imprestimo) ADN.I.P	1	Inspesaun Pagamento Outstanding Works	
II.			Tito Edgar F. N. de Jesus				
III.			Elnino J.A. Mota	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Lautem, ADN, I.P.	2	Husi Inspesaun refere Eng. ADN identifika item balun la instala iha terenu	
IV.			Leonito	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Baucau, ADN, I.P.			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baucau - Lautem Road

Kompanha : CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15, 16, 17	Baucau Lautem	Augusta da Costa Ferreira	Eng. PMU ba Projeto (Imprestimo) ADN.I.P	1	Inspesaun Pagamento Outstanding Works	
II			Tito Edgar F. N. de Jesus		2	Inspesaun refere Eng. ADN identifika item balun la instala iha terenu	
III			Elnino J.A. Mota	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Lautem, ADN, I.P.	2	Husi Inspesaun refere Eng. ADN identifika item balun la instala iha terenu	
IV			Leonito	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Baucau, ADN, I.P.	3	Orienta mos ba parte Kontraktor atu kontrola defeitos balun ne'ebe mak identifika iha terenu.	



ITEM	L	WI	WII	HI	Area	CUM
Stone masonry	300				0.35	105
		TOTAL				105



ANEXU C1 (QL - 24)
BACK UP DATA

Naran Projecto , R4D Rural Road Spot Improvement Vemasse Osoala Rehabilitation Chainage 0 + 000 - 21 + 600
No kontrato , MPW - W - 210052
Data Inspeksaun , 10. October 2022
Fatin Inspeksaun , Vemasse Osoala
Koordinadas
Star Point , - 8.352879 **Latetude** , 126.1821629
End Point , - 8.5064764 **Latetude** , 126.2314987

Naran Inspector
1. Jacob Da Costa Camoes
2. Leonito Pereira

Sketch / photo Desenho




Photo Observasaun Iha terreno (Aktual)



ITEM	L	WI	WII	HI	Area	CUM
Stone Masonry	120				0.98	117.6
					TOTAL	117.6

222.6





ANEXO C2 - (VEM - 5)

project Name : Rural Road Spot Improvement Vemase - Ossoala Chainaage 0 + 000 - 21 + 6000, Rural Road Routine Maintanace Baucau Municipality
Company : Chacailala, Unipessoal Lda
Location : Baucau Municipality, Vemase Ossoala

Pay item No.	DESCRIPTION	SUMMARY OF BILLED WORKS							
		CONTRACT AMOUNT (\$)	RELATIVE WEIGHTAGE (%)	SUMMARY					
				PREVIOUS		PROGRESS NOVEMBRO		TODATE	
						THIS PERIOD			
				AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%
R01	General	\$ 1,680.00	0.69%		0.00%	\$ 565.00	0.23%	\$ 565.00	0.23%
R03	Earth work	\$ 21,675.72	8.96%	\$ 413.60	0.17%	\$ 9,863.19	4.08%	\$ 10,276.79	4.25%
R05	Sub-base, base and pavement	\$ 50,132.49	20.72%	\$ 7,147.40	2.95%	\$ -	0.00%	\$ 7,147.40	2.95%
R08	Structures	\$ 80,557.52	33.29%	\$ -	0.00%	\$ 24,007.94	9.92%	\$ 24,007.94	9.92%
R10	Dayworks	\$ 525.00	0.22%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R11	Routine maintenance	\$ 25,907.16	10.71%	\$ -	0.00%	\$ 23,286.42	9.62%	\$ 23,286.42	9.62%
R13	Clearing	\$ 300.00	0.12%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R15	Provisional sum	\$ 300.00	0.12%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Total Construction Cost	\$ 181,077.89	74.83%	\$ 7,561.00	3.12%	\$ 57,722.55	23.85%	\$ 65,283.55	26.98%
B	Contractor fee (A x 10 %)	\$ 18,107.79	7.48%	\$ 756.10	0.00%	\$ 5,772.26	2.39%	\$ 6,528.36	2.70%
C	General Item	\$ 38,070.76	15.73%	\$ 5,548.50	14.57%	\$ 8,967.84	3.71%	\$ 14,516.34	6.00%
D	Construction tax (A + B + C) x 2%	\$ 4,745.13	1.96%	\$ 277.31	0.29%	\$ 1,449.25	0.60%	\$ 1,726.56	0.71%
Grand Total (US\$)		\$ 242,001.57	100.00%	\$ 14,142.91	17.99%	\$ 73,911.90	30.54%	\$ 88,054.81	36.39%

Prepara HbsI

VERIFIKAHOSI

Cerifika Hbsi

Eng. Jacob da Costa Camoes

Eng. Remigio D.C . dos Santos
Eng. Senior ba Projeto Infrastrutura Tranporte e
Irigasaun ADN,I.P

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Cordenadora Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN,IP


Eng. Leoniton Pereira

Eng. ba Projeto Infrastrutura Tranporte e Irigasaun ADN,IP



Naran projeto . Rural Road Spot Improvement Vemase – Osoala Chainaage 0 + 000 – 21 + 6000, Rural Road Routine Maintanace Baucau Municipality

Kompanha . Chacailala, Unipessoal Lda

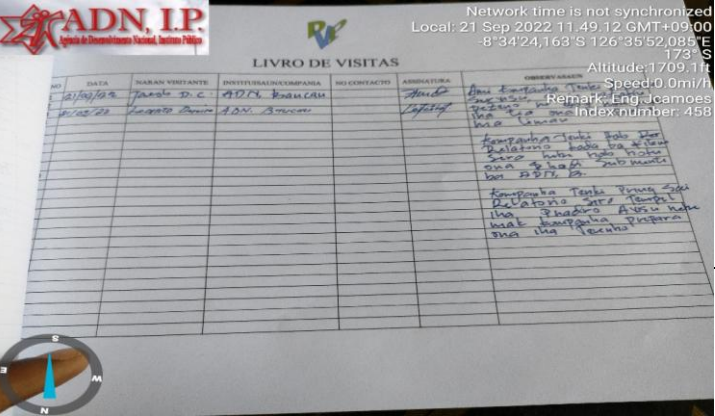No	Data Inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	INSTRUSAUN / REKOMENDASUN(LIVRO BAINAKA)	Asinatura
1	11/11/2022	VEMASSE	Jacob da Costa Camos	Eng. Baucau	1	Husu ba Kompanhia tenki servico tuir Desenho no Boq nebe mak iha.		
2			Leonito Pereira		2	Kompanha tenke halo relatori kada fulan hodi submete ba A D N, ba Item Servico nebe mak remata ona		
					3	Kompanha tengke Aselera servico tuir tempo nebe determinado		





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXUC(Q-18)

Road name	Afaca to Uaitame	Chainage start	6+ 000
Municipality	Baucau	Chainage end	9+ 000
Postu	Quelicaí	Length	3.00 km
Contractor	Lialura Unipessoal Lda		

Item	Description	PRICE			Previous		Progress phisic On Novembro		Up To Date	
					Amount	Weight	Amount	Weight	Amount	Weight
R-01	General works	\$	7,300.00	\$	5,900.00	1.00%	\$	-	\$	5,900.00
R-03	Earth work	\$	114,382.39	\$	102,312.99	17.38%	\$	-	\$	102,312.99
R-05	Sub-base, base and pavement	\$	52,087.81	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-
R-07	Bituminous pavement			\$	-	0.00%			\$	-
R-08	Structures	\$	308,050.91	\$	65,306.79	11.09%	\$	15,874.88	\$	81,219.67
R-10	Dayworks	\$	750.00	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-
R-11	Routine maintenance	\$	3,064.00	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-
R-12	Cleaning	\$	400.00	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-
R-15	Provisional sum	\$	400.00	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-
				\$	-				\$	-
A	Construction cost	\$	486,435.11	\$	173,519.78	29.48%	\$	15,874.88	\$	189,432.66
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$	48,643.51	\$	17,351.98	2.95%	\$	1,587.49	\$	18,943.27
C	General items	\$	41,998.73	\$	6,210.00	1.06%	\$	0.07	\$	6,210.07
D	Construction tax (A+ B+ C x 2%)	\$	11,541.55	\$	3,941.64	0.67%	\$	349.25	\$	4,291.72
E	Total	\$	588,618.90	\$	201,023.39	34.16%	\$	17,811.69	\$	218,877.72

Inspesaun Hosi :

Verifiks Hosi :

Sertifika Hosi :

Eng Jacob dacosta Camoes
Eng. ba Projeto Insfrasturtura e Irigasaun Municipiu
Baucau, ADN, I.P

Eng. Leonito Pereira
Eng. ba Projeto Insfrasturtura e Irigasaun
Municipiu Baucau, ADN, I.P

Eng. Remigio D.C dos Santos
Eng. Senior ba Projeto Infrastrutura Transporte e Irigasaun
ADN,I.P

Eng. Emerenciana da Costa
Corordenadora Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade, ADN,IP

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					# ANEXU D (QL-18)																															
					Naran projeto : Road Rehabilitation of Afaca Uitame 6 +00 To 9 + 000																															
					Kompanha : DVP Konstrukção Unipessoal Lda																															
No	Data Inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	INSTRUSAUN / REKOMENDASUN(LIVRO BAINAKA)	Asinatura																												
I			Jacob da Costa Camoes	Eng. Baucau	1	Husu ba Kompanhia tenki servico tuir Desenho no Boq nebe mak iha.	 Network time is not synchronized Local: 21 Sep 2022 11:49:12 GMT+09:00 -8°34'24,163"S 126°35'52,085"E Altitude: 1709.11 Speed: 0.0mi/h Remark: Eng. Camoes Index number: 458 LIVRO DE VISITAS <table><tr><th>NO</th><th>DATA</th><th>NARAN VISITANTE</th><th>INSTITUSUAUN/KOMPAHIA</th><th>NO CONTRATO</th><th>ASSINATURA</th><th>COMENTARIO</th></tr><tr><td>1</td><td>21/09/22</td><td>Jacob da Costa Camoes</td><td>ADN Baucau</td><td></td><td>Jacob</td><td>Kompanha Tenke halo relatori kada fulan hodi submete ba A D N, ba Item Servico nebe mak iha.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kompanha Tenke Aselera servico Antes udan</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	DATA	NARAN VISITANTE	INSTITUSUAUN/KOMPAHIA	NO CONTRATO	ASSINATURA	COMENTARIO	1	21/09/22	Jacob da Costa Camoes	ADN Baucau		Jacob	Kompanha Tenke halo relatori kada fulan hodi submete ba A D N, ba Item Servico nebe mak iha.	2						Kompanha Tenke Aselera servico Antes udan	3							
					NO	DATA		NARAN VISITANTE	INSTITUSUAUN/KOMPAHIA	NO CONTRATO	ASSINATURA	COMENTARIO																								
					1	21/09/22		Jacob da Costa Camoes	ADN Baucau		Jacob	Kompanha Tenke halo relatori kada fulan hodi submete ba A D N, ba Item Servico nebe mak iha.																								
2						Kompanha Tenke Aselera servico Antes udan																														
3																																				
2	Kompanha tenke halo relatori kada fulan hodi submete ba A D N, ba Item Servico nebe mak i																																			
3	Kompanha tengke Aselera servico Antes udan																																			
2			Leonito Pereira																																	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

SUMMARY

Rural Road Rehabilitation of Afaca - Uaitame Chainage 6+000 - 9+000, Baucau Municipality

Road name	Afaca to Uaitame
Municipality	Baucau
Postu	Quelicaí
Sukos	Afaca to Uaitame

Chainage start	6+000
Chainage end	9+000
Length	3.00 km

Item	Description		PRICE			Previous		Progress phisic Novembro		Up To Date	
						Amount	Weight	Amount	Weight	Amount	Weight
R-01	General works		\$		7,300.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-03	Earth work		\$		114,382.39	\$ 154,197.49	26.20%	\$ 126,549.49	21.50%	\$ 280,746.98	47.70%
R-05	Sub-base, base and pavement		\$		52,087.81	\$ 40,566.25	6.89%	\$ -	0.00%	\$ 40,566.25	6.89%
R-07	Bituminous pavement					0	0.00%			\$ -	0.00%
R-08	Structures		\$		308,050.91	\$ 3,968.72	0.67%	\$ 3,968.72	0.67%	\$ 7,937.44	1.35%
R-10	Dayworks		\$		750.00	\$ 700.00	0.12%	\$ -	0.00%	\$ 700.00	0.12%
R-11	Routine maintenance		\$		3,064.00	\$ 440.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ 440.00	0.07%
R-12	Cleaning		\$		400.00	\$ 400.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ 400.00	0.07%
R-15	Provisional sum		\$		400.00	\$ 400.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ 400.00	0.07%
						0					
A	Construction cost		\$		486,435.11	\$ 200,672.46	34.09%	\$ 130,518.21	22.17%	\$ 331,190.67	56.27%
B	Contractor Fee (A x 10%)		\$		48,643.51	\$ 20,067.25	3.41%	\$ 13,051.82	2.22%	\$ 33,119.07	5.63%
C	General items		\$		41,998.73	\$ 21,004.58	3.57%	\$ -	0.00%	\$ 21,004.58	3.57%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)		\$		11,541.55	\$ 4,834.89	0.82%	\$ 2,871.40	0.49%	\$ 7,706.29	1.31%
E	Total		\$		588,618.90	\$ 246,579.17	41.89%	\$ 146,441.43	24.88%	\$ 393,020.60	66.77%

Inspesaun Hbsi :

Verifiks Hbsi :

Sertifika Hbsi :

Eng. Jacob dacosta Camoes
Eng. ba Projeto Insfrasturtura e Irigasaun Municipiu
Baucau, ADN, I.P

Eng. Leonito Pereira
Eng. ba Projeto Insfrasturtura e Irigasaun
Municipiu Baucau, ADN, I.P

Eng. Remigio D.C dos Santos
Eng. Senior ba Projeto Insfrastutura Tranporte e Irigasaun
ADN,I.P

Eng. Emerenciana da Costa
Corordenadora Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade, ADN,IP

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO  ADN, I.P.					# ANEXU D (QL-20)			
					Naran projeto : Road Rehabilitation of Afaca Uitame 0 + 000 To 3 + 000			
					Kompanha : Flores Unipessoal Lda			
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN(LIVRO BAINAKA)	Asinatura
I		Baucau Villa	Jacob da Costa Camoes	Eng. Baucau	1	Husu ba Contractor Kontinua halo ona Servisu Item Servico ne'ebe Seidauk halo	IHA TERRENO PARTE KOMPANHIA SEIDAUK PREPARA LIVRO BAINAKA NEBE BA OIN KOMPANHIA SEI PREPARA LIVRO BAINAKA IHA TERRENO	
					2	Husu ba Contractor hatama Relatorio kada Fulan,Ba Item Servico nebe mak halo tiha ona. no aselera Servisu antes Udan		
			Leonito Pereira		3			
					4			
					5			



ANEXU C2 (VEN - 13)

Road name	Venilale to Uaioli
Municipality	Baucau
Postu	Venilale
Sukos	Uatuhaco, Uailaha,Uaioli
Contractor	Putra Baucau Unipessoal Lda

Chainage start	0 + 000
Chainage end	3 + 000
Length	3.00

Summary

ITEM	DESCRIPTION	PRICE	%	PREVIOUS		PROGRESS ON NOVEMBRO		UP TO DATE	
				KOST (\$)	%	KOST (\$)	%	KOST (\$)	%
R-01	General works	7320.00	1.03%	\$ 6,690.00	0.94%	\$ 625.00	0.09%	\$ 7,315.00	1.02%
R-02	Drainage	0.00	0.00%	0	0.00%		0.00%	\$ -	0.00%
R-03	Earth work	77220.85	10.81%	\$ 17,807.15	2.49%	\$ -	0.00%	\$ 17,807.15	2.49%
R-05	Sub-base, base and pavement	38613.31	5.41%	\$ 8,483.99	1.19%	\$ 35,549.89	4.98%	\$ 44,033.89	6.17%
R-07	Bituminous pavement	0.00	0.00%	0	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structures	432731.21	60.60%	\$ 25,190.05	3.53%	\$ 19,443.87	2.72%	\$ 44,633.92	6.25%
R-10	Dayworks	750.00	0.11%	\$ 500.00	0.07%	\$ 500.00	0.07%	\$ 1,000.00	0.14%
R-11	Routine maintenance	2910.00	0.41%	\$ -	0.00%	\$ 2,585.00	0.36%	\$ 2,585.00	0.36%
R-12	Cleaning	400.00	0.06%	\$ -	0.00%	\$ 400.00	0.06%	\$ 400.00	0.06%
R-15	Provisional sum	400.00	0.06%	\$ -	0.00%	\$ 400.00	0.06%	\$ 400.00	0.06%
A	Construction cost	\$ 560,345.36	78.47%	\$ 58,671.19	8.22%	\$ 59,503.76	8.33%	\$ 118,174.95	16.55%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 56,034.54	7.85%	\$ 5,867.12	0.82%	\$ 5,950.38	0.83%	\$ 11,817.50	1.65%
C	General items	\$ 83,692.95	11.72%	\$ 16,570.00	2.32%	\$ 16,570.00	2.32%	\$ 33,140.00	4.64%
D	Construction tax (A+ B+ C x 2%)	\$ 14,001.46	1.96%	\$ 1,622.17	0.23%	\$ 1,640.48	0.23%	\$ 3,262.65	0.46%
E	Total	\$ 714,074.31	100.00%	\$ 82,730.48	11.59%	\$ 83,664.62	11.72%	\$ 132,592.30	23.30%

Inspesaun Hbsi ;

Verifika Hbsi ;

Sertifika Hbsi ;

Eng. Jacob da Costa Camoes
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Baucau,
ADN, I.P

Eng. Remigio D.C.dos Santos
Eng. Senior ba Projeto Infrastutura Transporte e Irigasaun ADN,I.P

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Corordenadora Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,IP

Eng. Leonito Pereira
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Baucau,



ANEXU C1 (VN- 17) BACK UP DATA

Naran Projecto : Rural Road Rehabilitation of Venilale Uaioli Chainage 3 + 000 To 6 + 000 Baucau Municipality
No kontrato : RT / / MOP - 2021
Data Inspeccsaun : 20, September 2022
Fatin Inspeccsaun : Venilale - Uaioli
Koordinadas
Star Point : -8.665648 Latitude : 126.400650
End Point : - 8.665189 Latitude : 126.401123

Naran Inspector :
1. Jacob Da Costa Camoes
2. Leonito Pereira

Sketch / photo Desenho




Photo Observasaun Iha Terreno (Aktual)



	L	WI	WII	HI	HII	CU.M
	340	0.25	0.70	0.15	0.55	129.2
			TOTAL			129.2





ANEXU C1 (VM- 17) BACK UP DATA


Naran Projecto : Rural Road Rehabilitation of Venilale Uaioli Chainage 6 + 000 To 8+ 550 Baucau Municipality
No kontrato : RT / / MOP - 2021
Data Inspeccsaun : 20, September 2022
Fatin Inspeccsaun : Venilale - Uaioli
Koordinadas

Star Point : - Latetude :
End Point : - Latetude :

Nara Inspector :
1 Jacob Da Costa Camoes
2 Leonito Pereira

Sketch / photo Desenho

Photo observasaun Iha terreno (Aktual)

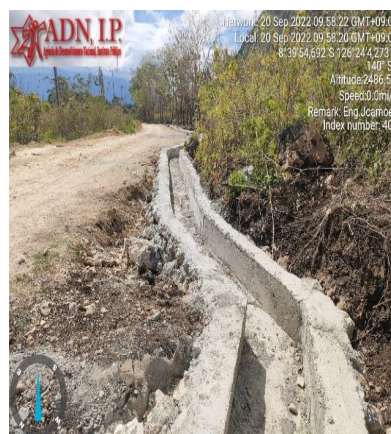

	L	WI	WII	HI	HII	CU.M
	340	0.25	0.70	0.15	0.55	129.2





ANEXU C2 (VEN- 14)

Road name	Venilale to Uaioli
Municipality	Baucau
Postu Administrative	Venilale
Contractor	Macaloco Unipessoal Lda
Contract Value	\$490,628.68

Chainage start	3+ 000
Chainage end	6+ 000
Length	3.00Km

SUMMARY

Item	Description		PRICE (USD)	Weight (%)	Progress Previous		Progress Phisic Novembro		Up to date	
					Amount (US\$)	Weight (%)	Amount (US\$)	Weight (%)	Amount (US\$)	Weight (%)
R-01	General works		\$ 6,500.00	1.32%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-03	Earth work		\$ 39,557.20	8.06%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-05	Sub-base, base and pavement		\$ 35,314.09	7.20%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-07	Bituminous pavement		\$ -	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%
R-08	Structures		\$ 311,630.88	63.52%	\$ 66,533.69	13.56%	\$ 58,254.29	11.87%	\$ 124,787.97	25.43%
R-10	Dayworks		\$ 3,000.00	0.61%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance		\$ 3,631.00	0.74%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-12	Cleaning		\$ 400.00	0.08%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum		\$ 400.00	0.08%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction cost		\$ 400,433.16	81.62%	\$ 66,533.69	13.56%	\$ 58,254.29	11.87%	\$ 124,787.97	25.43%
B	Contractor Fee (A x 10%)		\$ 40,043.32	8.16%	\$ 6,653.37	1.36%	\$ 5,825.43	1.19%	\$ 12,478.80	2.54%
C	General items		\$ 40,532.03	8.26%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	Construction tax (A+ B+ C x 2%)		\$ 9,620.17	1.96%	\$ 1,463.74	0.30%	\$ 1,281.59	0.26%	\$ 2,745.34	0.56%
E	Total		\$ 490,628.68	100.00%	\$ 74,650.80	15.22%	\$ 65,361.31	13.32%	\$ 140,012.11	28.54%

Inspeksaun Husi :

Verifika Husi :

Cerifika Husi :

Eng. Jacob Da Costa Camoes


Eng. Ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun, M. Baucau ADN, I.P

Eng. Remigio Da .C. S Dos Santos
Eng. Senior ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun, ADN, I.P

Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De Qualidade ADN,I.P

Eng. Leonito Pereira


Eng. Ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun, M. Baucau ADN, I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO  ADN, LP					# ANEXU D (VN-17)			
Naran projeto : Rural Road Rehabilitasaun of Venilale Uaioli Ch. 3 + 000 TO 6 + 000 Baucau Municipality								
Kompanha : Macaloco Unipessoal Lda								
No	Data Inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN (LIVRO BAINAKA)	Asinatura
1		Baucau Villa	Jacob da Costa Carnoes	Eng. Baucau	1	Husu ba Contractor Kontinua halo Servisu ba Item ne'ebe mak Seidauk halo		
					2	Husu ba Contractor hatama Relatorio kada Falanha Item servico nebe mak remata ona. no aselera Servisu antes Udan		
2			Leonito pereira					

Naran Eng. Municipio								PLANU INSPESAUN																																
Eng. Leonito Pereira								2022																																
Baucau																																								
POSTO	NU.	NARAN PROJETO	KAT. PROJETO	SECTOR	NARAN COMP.	NARAN KONT.	DONO PROJETO	Action	Novembro																														OBS	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
BAUCAU VILLA	3	Rehabilitasaun Estrada Jet Trileka -jet Fatumaca-jet Venilale Ch 0+000-6+025	II	ESTRADAS	Domin Timor Unip. Lda	SSS/078/MOFTC-2017	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On going	
								Actual																																
	4	Rehabilitasaun Estrada Jet Trileka -jet Fatumaca-jet Venilale Ch 6+025-12+075	II	ESTRADAS	Gihon Unip. Lda	SSS/066/MOFTC-2017	RIO DAS OBRAS	Plan																															On going	
								Actual																																
	6	Rural Roads Routine Maintenance Baucau - Uatobo Chainage 0+000 - 4+800 and Boile - Uatobo Chainage 0+000 - 5+200 in Municipality Baucau / 162	LM-CD	ESTRADAS	Talamori	MPWTC-W-190090	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Falta Retensau	
								Actual																																
	7	Road Maintenance Section. Baucau Urbans. Baucau Town. Baucau Municipality (162)	LM-BS	ESTRADAS	Jomarjo Unipesscal Lda	MPW-W-190158	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Falta Retensau	
								Actual																																
	9	R410 Rural Road Spot Improvement Baucau-Uatobo Chainage 0+000 - 4+800	LM-CD	ESTRADAS	Alexa	MPW-W-210047	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On going	
								Actual																																
LAGA	1	R410 Rural Road Rehabilitation Teriludae - Saclari - Binagua Chainage 0+000 - 1+600 Baucau Municipality	II	MANUTENSA UN NO REHABILITAS AUN	Lalaisi Unip. Lda	KT/023/MOP-2019	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Parado	
								Actual																																
	2	R410 Rural Road Rehabilitation Quecai - Binagua Chainage 1+600 - 3+300 Baucau Municipality	II	ESTRADAS	Flores Unipesscal Lda	KT/024/MOP-2019	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On going		
								Actual																																
	3	Rural Roads Periodic Maintenance Samagua - Namanci Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Baucau / 162	LM-BS	MANUTENSA UN NO REHABILITAS AUN	Delatina	MPTCW-W-190091	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On going		
								Actual																																
	5	Roads Maintenance Section Laga Baguia Municipality Baucau (162)	LM-BS	ESTRADAS	Uatobo Unip. Lda	MOP-W-200002	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Parado		
								Actual																																
	6	For Preparation of Detailed Engineering Design For Rehabilitation of Municipio Roads Package 4 Laga to Baguia	LM-CD	ESTRADAS	Detile Consultant Lda. in Association with PDF Ueck (M) SDN BHD	MPW-CS-2000027	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Nasional mak halo Monitoring ba projeitu imprestima		
								Actual																																
BAGUIA	2	Manutensaun Estrada Baguia-Larissula Sta 0+000-12+900-Municipal of Baucau	II	MANUTENSA UN NO REHABILITAS AUN	Mr Construction Unip Lda	RFQ 129/MOFTC-2016	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Falta Retensau		
								Actual																																
								Plan																																
								Actual																																
	4	Baguia - Larissula Chainage 0+000 - 12+900 / 162	LM-BS	MANUTENSA UN NO REHABILITAS AUN	Lamegua Star Unip Lda	MPW-W-190088	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Parado		
								Actual																																
	6	Konstrusaun Intek na Kanais Irrigasaun Larissula iha Baguia Municipio Baucau	LM-CD	AGRICULTURA	Makasse Construction LDA	RDTL-2021-14628	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																														PHO		
								Actual																																
VENILALE	3	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 0+000-10+300. Baucau Municipality	II	ESTRADAS	Ravio unip. Lda	SSS/118/MOFTC-2016	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Parado		
								Actual																																
	4	Rehabilitation Bercoli - Bahamori 1 Chainage Sta 0+000-1+500 Baucau Municipality	II	MANUTENSA UN NO REHABILITAS AUN	Caidulale Unip Lda	KT/069/MOFTC-2016	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														PHO		
								Actual																																
	5	Rural Road Rehabilitation of Venilale - Uaisoli Chainage Sta 0 + 000 - 3 + 000. Baucau Municipality	II	ESTRADAS	Putra Baucau. Unip.Lda	KT/014/MOP - 2021	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On going		
								Actual																																
	6	Rural Road Rehabilitation of Venilale - Uaisoli Chainage Sta 6 + 000 -8 + 550. Baucau Municipality	II	ESTRADAS	Macaloco. Unip. Lda	KT/... /MOP - 2021	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On going		
								Actual																																
	7	Rural Road Rehabilitation of Venilale - Uaisoli Chainage Sta 6 + 000 -8 + 550. Baucau Municipality	II	ESTRADAS	Morende Const. Unip.Lda	KT/016/ MOP - 2021	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On going		
								Actual																																

Naran Eng.		Eng. Leonito Pereira						PLANU INSPESAUN																																	
Municipio		Baucau						2022																																	
POSTO	NU.	NARAN PROJETO	KAT. PROJETO	SECTOR	NARAN COMP.	NARAN KONT.	DONO PROJETO	Action	Novembro																															OBS	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
QUEILAU	3	Rehabilitation Of Roads Utaica - Queilequi - Lachuta Sta 5+400 to 10+800 (3.40 Km) Municipality of Baucau	FI	ESTRADAS	Develop Timor, Lda	RDTL-SSS/125/MOFTC-2016	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																On going	
								Actual																																	
	4	Rural Roads Rutine maintenance Laisorulai - Nae - Chainage 0+000 - 1500 and Quelcaci Chainage 0+000 - 10+000 in Baucau Municipality	LM-CD	ESTRADAS	Lalaisi Unip Lda	MPWTC-W-190089	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Parado	
								Actual																																	
	5	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of 'Municipal Road' Package 3 Uacala - Quelcaci to Oson	LM-CD	ESTRADAS	Niceles Unipessoal Lda	MPW-CS-2000026	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Nasional mak hale Monitoring ba projeitu imprestimu	
								Actual																																	
	6	Rehabilitation of Roads, Road Section. Utaica - Quelcaci - Lachudala Sta. 0+000 - Sta. 5+400 (Package 1) Municipality Baucau	FI	ESTRADAS	Wingstone Const Lda JV PT Putra Mas Pratama	RDTL-SSS/298/MOFTC-2016	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On going		
									Actual																																
7	R4D Rural Road Rehabilitation Of afaca - Uaitame Chainage 0+000 - 3+000 Baucau Municipality	FI	ESTRADAS	Flores Unipessoal, Lda	KT/099/MOP-2021	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																On going		
								Actual																																	
8	R4D Rural Road Rehabilitation Of afaca - Uaitame Chainage 6+000 - 9+000 Baucau Municipality	FI	ESTRADAS	DVP Const. Unip Lda	KT/011/MOP-2020	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																On going		
								Actual																																	
9	R4D Rural Road Rehabilitation Of afaca - Uaitame Chainage 6+000 - 9+000 Baucau Municipality	FI	ESTRADAS	Lia - Lara Unip. Lda	KT/...../MOP-2021	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																On going		
								Actual																																	
10	R4D Rural Road Rehabilitation Of afaca - Uaitame Chainage 3+000 - 6+000 Baucau Municipality	FI	ESTRADAS	Helcia Unip. Lda	KT/010/MOP-2021	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																On going		
								Actual																																	
VEMASSE	3	R4D Rural Road Spot Improvement Loilubu-Osuala Chainage 0+000-2+300 Baucau Municipality	LM-CD	ESTRADAS	Rezi const. unip Lda	MPW-W-210048	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On going		
								Actual																																	
	4	R4D Rural Road Spot Improvement Loilubu-Osuala Chainage 2+500-4+500 Baucau Municipality	LM-CD	ESTRADAS	Rezi const. unip Lda	MPW-W-210051	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On going		
								Actual																																	
5	R4D Rural Road Spot Improvement Vemase-Osuala Chainage 0+000-21+600	LM-CD	ESTRADAS	Chacailala Unipessoal Lda	MPW-W-210052	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On going			
								Actual																																	
8	Nasional Road no 1 Upgrading project Manatuto Baucau (package A01 - 02, STA 56+400-114+102 (56.82km)	FI	ESTRADAS IMPRESTIMO	Shangai Construction Group Co Ltd	ICR/021/MPWTC-2015	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Nasional mak hale Monitoring ba projeitu imprestimu			
								Actual																																	
AULUTINISTO	1	KNUSP, Road Link No. A01 - 03 - Upgrading and Maintenance of Baucau - Lautem Section - Sta. 123 + 105 to Sta. 182 + 040 (with Exceptions)	FI	ESTRADA-IMPRESTIMO	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICR/078/MPWTC-2015	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Nasional mak hale Monitoring ba projeitu imprestimu			
								Actual																																	
	2	Upgrading and Maintenance of Baucau - Viqueque Highway Project Lot 1. Baucau - Venilale - Sta. 03 + 740 to Sta. 27 + 120	FI	IMPRESTIMO	China Railway Int. Group co. jv with China overseas	ICR/046/MOFTC-2017	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Nasional mak hale Monitoring ba projeitu imprestimu			
								Actual																																	
	3	Consulting Services for Project Implementation and Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project. Lot 1. Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120) Lot 2. Venilale - Viqueque R4D Rural Road Spot Improvement Baguia Larilala Chainage 0+000-12+900, Rural Roads Routine Maintenance Samalari-Sorigua Chainage 0+000-2+800 Teriludae-Saelari-Binagua Chainage 0+000-3+600 Baucau Municipality	FI	ESTRADA-IMPRESTIMO	INTERCONTINENTAL CONSULTANTS AND TECHNOCRATS PVT LTD IN ASSOCIATION WITH INFRA CONSULTANTS IN THE PHILS (ICP) INC (PHILIPPINES) AND DEZEMVOLVUE	RTP/003/MOP/2018	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Nasional mak hale Monitoring ba projeitu imprestimu			
								Actual																																	
4	R4D Rural Road Routine Maintenance Caicoli-Liabala Chainage 0+000-6+500 Una Ita Chainage 0+000-4+500 Bercoli-Bahameri Chainage 0+000-4+000 Buruma-Uaimafeme Chainage 0+000-2+800 Boile-Uatobo Chainage 0+000-2+800	LM-CD	ESTRADAS	Juga Te Figa Unipessoal Lda	MPW-W-210054	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On going				
								Actual																																	
5	R4D Rural Road Routine Maintenance Caicoli-Liabala Chainage 0+000-6+500 Una Ita Chainage 0+000-4+500 Bercoli-Bahameri Chainage 0+000-4+000 Buruma-Uaimafeme Chainage 0+000-2+800 Boile-Uatobo Chainage 0+000-2+800	LM-CD	ESTRADAS	DB-Ingracia Unipessoal Lda	MPW-W-210049	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On going			
								Actual																																	
TOTAL PROJETO ON - GOING - 56 PROJETO																																									
Note:																																									
Periode inspesaun iha terenu									Implementasaun Plano Periode inspesaun iha terenu									Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili									Inspesaun Pagamentu Anual iha terenu														

Note: Periode Inpesaun Iha Tereinu Implementasaun Plano Periode Inpesaun Iha Tereinu Relatoriu Avaliasaun Mensal Iha Dili Inpesaun Pagamentu Anual Iha Tereinu

Prepara Hosi ;

 Eng. Ba Projeto Infrastructura e
 Irigasaun Municipiu Baucau, ADN, LP

Sertifika Husi ;

 (Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Eng. Coordenadora da unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN, LP

Aprova Husi ;

 (Eng. Augusto Maia Guterres)
 Eng. Adjunto Director Executivo - ADN, LP

[illegible]



Naran Eng.		JERRY GIL M. PEREIRA						INSPECTION PLAN 2022																																									
Município / Posto		MUNICIPIO BAUCAU NO POSTOS						NOVEMBER																																									
Posto	NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	NARAN COMPANHA	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVASAUN										
B A U C A U V I L L A	5	Rehabilitation of MPWTC Office in the Municipality Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Co. Cactus Unip. Lda	PLAN																																		FHO								
							ACTUAL																																										
	8	Rehabilitasaun Eis hospital Trilolo Baucau ba Fatim Karantina,ICU,Laboratorium no Izolamento Ministerio	MINISTERIO SAUDE	Fundu Covid-19	SAUDE	Central Hill Unipessoal Lda	PLAN																																						OG GOING				
							ACTUAL																																										
	10	Construsaun Escola Polo Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUKASAUN	Sanira Construction Unip Lda	PLAN																																						ABANDONA				
							ACTUAL																																										
	11	Konstrusaun Sede Suku, Suku Samalari Baucau Villa Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Rozi Unipessoal, Lda	PLAN																																						PROJECTO REFERE ENTREGA TIHA ONA BA MUNICIPIO				
							ACTUAL																																										
	12	konstrusaun Moru Haleu Mercadu Tualiku Baucau Villa Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Gardel Unipessoal,Lda	PLAN																																								PROJECTO REFERE ENTREGA TIHA ONA BA MUNICIPIO		
							ACTUAL																																										
	13	Konstrusaun Foun ba Moru Profesaun ba Armazen SAMES Regional Baucau iha Municipio Baucau	SAMES	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Talamori	PLAN																																									ON GOING	
							ACTUAL																																										
	14	Rehabilitasaun ba EBF Maucale iha Aldeia Maucale Suco Gariuai Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF MAUCALE	PLAN																																										ON GOING
							ACTUAL																																										
	15	Rehabilitasaun ba EBF Zona Golgota iha Aldeia Ro - Ulo Suco Bahu Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF ZONA GOLGOTA	PLAN																																										ON GOING
							ACTUAL																																										
	16	Rehabilitasaun ba ESG 02 Vila Nova Baucau iha Aldeia Samalatu Liba Suco Bulbau Postu Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE ESGP NU. 02 VILA NOVA BAUCAU	PLAN																																										ON GOING
							ACTUAL																																										
	17	Rehabilitasaun ba EPEC/ESTV Baucau iha Aldeia Samalaculiba Suco Bulbau Postu Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EPEC/ESTV BAUCAU	PLAN																																										ON GOING
							ACTUAL																																										
18	Rehabilitasaun ba EBF Caibada Macassae iha Aldeia Caiobilale Suco Caibada Postu Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF CAIBADA MACASSAE	Plan																																											

Posto	NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	NARAN COMPANHA	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVASAUN		
L a g a	8	New Construction of Camp and Leveling, pavement works no jardim de heróis de laga Baucau	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Juga Te Figa Unipessoal Lda	PLAN																																		
							ACTUAL																																		
	9	Rehabilitasaun ba EBF. Lala - Bu'u iha Aldeia Sire - Bu'u Suco Sagadate Postu Administrativu Laga Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF LALA-BU'U	PLAN																																		
							ACTUAL																																		
	10	Rehabilitasaun ba EBF 1 no 2 ciclo Libagua iha Aldeia Libagua Suco Libagua Postu Administrativu Laga Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF 1 NO 2 CICLO LIBAGUA	PLAN																																		
							ACTUAL																																		
	11	Rehabilitasaun ba EBF Fitun Sagadate - Laga iha Aldeia Samagata Suco Sagadate Postu Administrativu Laga Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF. FITUN SAGADATE-LAGA	PLAN																																		
							ACTUAL																																		
B A G U I A	5	Konstrusaun Sede Suku, Suku Samalari Baguia Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Mexa Unip.Lda	PLAN																																		
							Actual																																		
	7	Rehabilitasaun ba EBF Gulari iha Aldeia Daralot de Baixo Suco Samalari Postu Administrativu Baguia Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF GULARI	PLAN																																		
							ACTUAL																																		
	8	Rehabilitasaun ba EBC Ossu - Ufulari iha Aldeia Ossu - Ufulari Suco Samalari Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF OSSU-UFULARI	PLAN																																		
							ACTUAL																																		
	9	Rehabilitasaun ba EBF Uacala iha Aldeia Uacala Suco Uacala Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF UACALA	PLAN																																		
							ACTUAL																																		
	10	Rehabilitasaun ba EPE Fini Baguia iha Aldeia Neolidae Suco Alava Craic Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EPE FINI BAGUIA	PLAN																																		
							ACTUAL																																		
	11	Rehabilitasaun ba EPE Lari - Sula iha Aldeia Lauhare Suco Lari -Sula Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EPE LARI-SULA	PLAN																																		
							ACTUAL																																		
	12	Rehabilitasaun ba EBC Ossu - Huna iha Aldeia Ualcade Suco Ossu - Huna Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBC OSSU-HUNA	Plan																																		
							Actual																																		
	13	Rehabilitasaun ba EBC Buaua Lavateri iha Aldeia Fanaloto Suco Lavateri Postu Administrativu Baguia Munisipiu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBC BUAAU LAVATERI	PLAN																																		
							ACTUAL																																		
	14	Rehabilitasaun ba ESG de Baguia iha Aldeia Neolidae Suco Alua Kraik Postu Administrativu Baguia Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE ESG DE BAGUIA	PLAN																																		
							ACTUAL																																		
V e n i l a	6	Construction of Water Supply with Pump System (Multy Suco) Watuhaco – Venilale In Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Welodo Unip. Lda	PLAN																																		
							ACTUAL																																		
	8	Konstrusaun Sede Suku, Suku Uailaha Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Caidara Lala Unipessoal,Lda	PLAN																																		
							ACTUAL																																		
	9	Rehabilitasaun ba EBC Uai - Bua iha Aldeia Uato - Hassa Suco Uato - Haco Postu Administrativu Venilale Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBC UAI-BUA	PLAN																																		
							ACTUAL																																		

Posto	NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	NARAN COMPANHA	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVASAUN
I e	10	Rehabilitasaun ba EBF Culina - Ossu - Uailale, Ossu - Uaque iha Aldeia Ossu - Uaque Suco Fatulia Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF CULINA-OSSU-UAILALE	PLAN																																
							ACTUAL																																
	11	Rehabilitasaun ba EPE Publico Amizade Venilale iha Aldeia Uato Hasa Suco Uato - Haco Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EPE PÚBLICO AMIZADE VENILALE	PLAN																																
							ACTUAL																																
Q u e l i c a i	7	New Construction of Health Post and Douctor House Building Municipality Baucau	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Jova Construction Unip. Lda	PLAN																																
							ACTUAL																																
	8	New construction of Tom,pavement and Gabion no Jardim de Herois de Quelicai	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Samadare Unip. Lda	PLAN																																
							ACTUAL																																
	9	Rehabilitasaun ba EBF. Uada - Boru iha Aldeia Uada - Buro Suco Guruca Postu Administrativu Quelicai Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF UADA-BORU	PLAN																																
							ACTUAL																																
	10	Rehabilitasaun ba EBF. Uai-Aca/Mulia iha Aldeia Uai-Aca/Mulia Suco Tame Postu Administrativu Quelicai Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF UAI-ACA/MULIA	PLAN																																
							ACTUAL																																
	11	Rehabilitasaun ba EBF Abo - Lir Lalelek iha Aldeia Abor Lir Suco Abo Postu Administrativu Quelicai Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF ABO-LIR LALETEK	PLAN																																
							ACTUAL																																
	12	Rehabilitasaun ba EBC Letemumo iha Aldeia Lebenei Suco Letemumo Postu Administrativu Quilecai Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBC LETEMUMO	PLAN																																
							ACTUAL																																
	13	Rehabilitasaun ba ESGPF Dom Carlos Filipe Ximenes Belo Afaca iha Aldeia Veco - Buti Suco Afaca Postu Administrativu Quelica Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE ESGPF DOM CARLOS FILIPE XIMENES BELO AFAÇA	PLAN																																
							ACTUAL																																
	14	Rehabilitasaun ba EBF Catolica Darenafa iha Aldeia Siri - Laco/Loi - Rae Suco Namanei Postu Administrativu Quilecai Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF CATOLICA DARENAFA	PLAN																																
							ACTUAL																																
	15	Rehabilitasaun ba EBF Mauro Darala/Borumodo iha Aldeia Namanei Suco Maluro Postu Administrativu Quelicai Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF MAURO DARALA/BORUMODO	PLAN																																
							ACTUAL																																
	16	Rehabilitasaun ba EBF Uaidora Ossolia iha Aldeia Ossolia Suco Letemumu Postu Administrativu Quelicai Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF UAIDORA/OSSOLIA	PLAN																																
							ACTUAL																																
V e m a s s e	6	Rehabilitasaun of Cairabela Mini Tradisional Food In Vemasse	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Esa-Un	PLAN																																
							ACTUAL																																
	7	Konstrusaun Sede Suku, Suku Uaigae Vemasse Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Wrangler Unipessoal,Lda	PLAN																																
							ACTUAL																																

Note:

Període inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Període inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :



(Eng. JERRY GIL M. PEREIRA)

Eng. Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento ADN, I. P.

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade ADN , I. P.

Aprova Husi :



(Eng. Januario Maia Guterres)

Adjunto Director Executivo ADN , I. P.



Naran Eng.		AGUSTINHO ARANDA						INSPECTION PLAN 2022																															
Município / Posto		MUNICIPIO BAUCAU NO POSTOS						NOVEMBER																															
Posto	NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	NARAN COMPANHA	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVASAUN
B A U C A U V I L L A	5	Rehabilitation of MPWTC Office in the Municipality Baucau	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Co. Cactus Unip. Lda	PLAN																															FHO	
							ACTUAL																																
	8	Rehabilitasaun Eis hospital Trilolo Baucau ba Fatim Karantina,ICU,Laboratorium no Izolamento Ministerio	MINISTERIO SAUDE	Fundu Covid-19	SAUDE	Central Hill Unipessoal Lda	PLAN																															OG GOING	
							ACTUAL																																
	10	Construsaun Escola Polo Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUKASAUN	Sanira Construction Unip Lda	PLAN																															ABANDONA	
							ACTUAL																																
	11	Konstrusaun Sede Suku, Suku Samalari Baucau Villa Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Rozi Unipessoal, Lda	PLAN																															PROJECTO REFERE ENTREGA TIHA ONA BA MUNICIPIO	
							ACTUAL																																
	12	konstrusaun Moru Haleu Mercadu Tualiku Baucau Villa Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Gardel Unipessoal,Lda	PLAN																															PROJECTO REFERE ENTREGA TIHA ONA BA MUNICIPIO	
							ACTUAL																																
	13	Konstrusaun Foun ba Moru Protesaun ba Armazen SAMES Regional Baucau iha Municipio Baucau	SAMES	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Talamori	PLAN																															ON GOING	
							ACTUAL																																
	14	Rehabilitasaun ba EBF Maucale iha Aldeia Maucale Suco Garuoi Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF MAUCALE	PLAN																															ON GOING	
							ACTUAL																																
	15	Rehabilitasaun ba EBF Zona Golgota iha Aldeia Ro - Ulo Suco Bahu Posto Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF ZONA GOLGOTA	PLAN																															ON GOING	
							ACTUAL																																
	16	Rehabilitasaun ba ESG 02 Vila Nova Baucau iha Aldeia Samalatu Liba Suco Buibau Postu Administrativo Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE ESGP NU. 02 VILA NOVA BAUCAU	PLAN																															ON GOING	
							ACTUAL																																
	17	Rehabilitasaun ba EPEC/ESTV Baucau iha Aldeia Samalaculiba Suco Buibau Postu Administrativu Baucau Villa Municipio Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EPEC/ESTV BAUCAU	PLAN																															ON GOING	
							ACTUAL																																
18	Rehabilitasaun ba EBF Caibada Macassae iha Aldeia Caibilale Suco Caibada Postu Administrativo Baucau Villa Munisiplu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF CAIBADA MACASSAE	Plan																															ON GOING		
						ACTUAL																																	
19	Rehabilitasaun ba EBF Caibada Macassae iha Aldeia Caibilale Suco Caibada Postu Administrativo Baucau Villa Munisiplu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF CAIBADA MACASSAE	PLAN																															ON GOING		
						ACTUAL																																	
20	Rehabilitasaun ba ESG 01 Baucau iha Aldeia Lutumutu Suco Tirilolo Postu Administrativo Baucau Villa Munisiplu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE ESG NO. 01 BAUCAU	PLAN																															ON GOING		
						ACTUAL																																	
	4	Konstrusaun EBF Publiku Selegua	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Sumber Urip Unip. Lda	PLAN																															PHO	
							ACTUAL																																
	7	Konstrusaun Sede Suku, Suku Atelari Laga Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Costa Estelia Unipessoal,Lda	PLAN																															PROJECTO REFERE ENTREGA TIHA ONA BA MUNICIPIO	
							ACTUAL																																

Posto	NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	NARAN COMPANHA	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVASAUN
L a g a	8	New Construction of Camp and Leveling, pavement works no jardim de herois de laga Baucau	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Juga Te Figa Unipessoal Lda	PLAN																																
							ACTUAL																																
	9	Rehabilitasaun ba EBF. Lala - Bu'u iha Aldeia Sire - Bu'u Suco Sagadate Postu Administrativu Laga Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF LALA-BU'U	PLAN																																
							ACTUAL																																
	10	Rehabilitasaun ba EBF 1 no 2 ciclo Libagua iha Aldeia Libagua Suco Libagua Postu Administrativu Laga Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF 1 NO 2 CICLO LIBAGUA	PLAN																																
							ACTUAL																																
	11	Rehabilitasaun ba EBF Fitun Sagadate - Laga iha Aldeia Samagata Suco Sagadate Postu Administrativu Laga Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF. FITUN SAGADATE-LAGA	PLAN																																
							ACTUAL																																
B A G U I A	5	Konstrusaun Sede Suku, Suku Samalari Baguia Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Mexa Unip.Lda	PLAN																																
							Actual																																
	7	Rehabilitasaun ba EBF Gulari iha Aldeia Daraloi de Baixo Suco Samalari Postu Administrativu Baguia Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF GULARI	PLAN																																
							ACTUAL																																
	8	Rehabilitasaun ba EBC Ossu - Ufulari iha Aldeia Ossu - Ufulari Suco Samalari Postu Administrativu Baguia Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF OSSU-UFULARI	PLAN																																
							ACTUAL																																
	9	Rehabilitasaun ba EBF Uacala iha Aldeia Uacala Suco Uacala Postu Administrativu Baguia Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF UACALA	PLAN																																
							ACTUAL																																
	10	Rehabilitasaun ba EPE Fini Baguia ih Aldeia Neolidae Suco Alava Craic Postu Administrativu Baguia Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EPE FINI BAGUIA	PLAN																																
							ACTUAL																																
	11	Rehabilitasaun ba EPE Lari - Sula iha Aldeia Lauhare Suco Lari -Sula Postu Administrativu Baguia Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EPE LARI-SULA	PLAN																																
							ACTUAL																																
	12	Rehabilitasaun ba EBC Ossu - HUNA iha Aldeia Ualcade Suco Ossu - Huna Postu Administrativu Baguia Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBC OSSU-HUNA	Plan																																
							Actual																																
	13	Rehabilitasaun ba EBC Buava Lavateri iha Aldeia Fanalolo Suco Lavateri Postu Administrativu Baguia Municipiu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBC BUAVA LAVATERI	PLAN																																
							ACTUAL																																
	14	Rehabilitasaun ba ESG de Baguia iha Aldeia Neolidae Suco Alua Kraik Postu Administrativu Baguia Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE ESG DE BAGUIA	PLAN																																
							ACTUAL																																
V e n i l a	6	Construction of Water Supply with Pump System (Multy Suco) Watuhaco – Venilale In Baucau Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Welodo Unip. Lda	PLAN																																
							ACTUAL																																
	8	Konstrusaun Sede Suku, Suku Uailaha Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Caidara Lata Unipessoal,Lda	PLAN																																
							ACTUAL																																
	9	Rehabilitasaun ba EBC Uai - Bua iha Aldeia Uato - Hassa Suco Uato - Haco Postu Administrativu Venilale Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBC UAI-BUA	PLAN																																
							ACTUAL																																

Posto	NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	NARAN COMPANHA	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVASAUN
I e	10	Rehabilitasaun ba EBF Culina - Ossu - Uailale, Ossu - Uaque iha Aldeia Ossu - Uaque Suco Fatulia Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF CULINA-OSSU-UAILALE	PLAN																																
							ACTUAL																																
	11	Rehabilitasaun ba EPE Publico Amizade Venilale iha Aldeia Uato Hasa Suco Uato - Haco Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EPE PÚBLICO AMIZADE VENILALE	PLAN																																
							ACTUAL																																
Q u e l i c a i	7	New Construction of Health Post and Doctor House Building Municipality Baucau	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Jova Construction Unip. Lda	PLAN																																
							ACTUAL																																
	8	New construction of Tom.pavement and Gabion no jardim de Heróis de Quelicai	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Samadare Unip. Lda	PLAN																																
							ACTUAL																																
	9	Rehabilitasaun ba EBF. Uada - Boru iha Aldeia Uada - Buro Suco Guruca Postu Administrativu Quelicai Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF UADA-BORU	PLAN																																
							ACTUAL																																
	10	Rehabilitasaun ba EBF. Uai-Aca/Mulia iha Aldeia Uai-Aca/Mulia Suco Tame Postu Administrativu Quelicai Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF UAI-ACA/MULIA	PLAN																																
							ACTUAL																																
	11	Rehabilitasaun ba EBF Abo - Lir Laletek iha Aldeia Abor Lir Suco Abo Postu Administrativu Quelicai Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF ABO-LIR LALETEK	PLAN																																
							ACTUAL																																
	12	Rehabilitasaun ba EBC Letemumo iha Aldeia Lebenei Suco Letemumo Postu Administrativu Quilecai Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBC LETEMUMO	PLAN																																
							ACTUAL																																
	13	Rehabilitasaun ba ESGPF Dom Carlos Filipe Ximenes Belo Afaca iha Aldeia Veco - Buti Suco Afaca Postu Administrativu Quelica Municipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE ESGPF DOM CARLOS FILIPE XIMENES BELO AFAÇA	PLAN																																
							ACTUAL																																
	14	Rehabilitasaun ba EBF Catolica Darenafa iha Aldeia Siri - Laco/Loi - Rae Suco Namanei Postu Administrativu Quelecai Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF CATOLICA DARENAFA	PLAN																																
							ACTUAL																																
	15	Rehabilitasaun ba EBF Mauro Darala/Borumodo iha Aldeia Namanei Suco Maluro Postu Administrativu Quelicai Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF MAURO DARALA/BORUMODO	PLAN																																
							ACTUAL																																
	16	Rehabilitasaun ba EBF Uaidora Ossolia iha Aldeia Ossolia Suco Letemumu Postu Administrativu Quelicai Munisipiu Baucau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MEJD PKRIE EBF UAIDORA/OSSOLIA	PLAN																																
							ACTUAL																																
V e m a s s e	6	Rehabilitasaun of Cairabela Mini Tradisional Food in Vemasse	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Esa-Un	PLAN																																
							ACTUAL																																
	7	Konstrusaun Sede Suku, Suku Ualgae Vemasse Municipio Baucau	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Wrangler Unipessoal,Lda	PLAN																																
							ACTUAL																																

Note:

Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :



(Eng. AGUSTINHO ARANDA)
Eng. Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento ADN, I. P.

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade ADN , I. P.

Aprova Husi :



(Eng. Januario maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN , I. P.



2022





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
N.º 1/2018/MSPE/2018



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional - Investimentos Públicos

PLANU INSPESAUN


Naran Eng. Augusta da Costa Ferreira							2022																															Observasaun																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Município	MUNICIPIO DILI NO POSTOS							Novembro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Handwritten signature or mark.



2022

IMPRESTIMO

Município / Posto	No.	Nódo Projeto	Nódo Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		Novembro																													
								Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	18	Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of Municipio Roads Package 7 : Seloi - Aileu to Gleno - Emcra (162)	Raya Konsultan LDA	MPW- Cs 2000020	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	19	Preparation of Detail Engineering & Bidding Dokument Preparation for New Bridges in 2019 suco Liurai maubara 1 Bera Railako, Sanfuk, tutu luru same fahii nehan	Lelo eng. Unip Lda Jv. PT.Muhi Karidi - Guna Jasa & PT. Cipta Design Indonesia	MPW-Cs -2000032	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	20	Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of Municipio Roads Package 2 : Uatulari - Iaisorulai	Bratopul Unip Lda	MPW-CS -2000025	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	21	For Preparation of detailed engineering for Rehabilitation of Municipios Roads Package 12 : Luca to Lacluta	Hilobadi Jv Pt. Starplan Utama	MPW - CS- 2000022	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	22	Preparation of Detailed Engineering For Rehabilitation of Municipio Roads Package : 1 JCT A - 16 (bobonaro) to Iolotoe Town	Hilobadi Jv Pt. Starplan Utama	MPW - CS- 2000030	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	23	preparation of DED for Rehabilitation of Municipio Roads Package 10 : Soibada to Soibada town	Hilobadi Jv Pt. Starplan Utama	MPW- CS 2000024	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	24	Preparation of detailed Design for Rehabilitation municipio Roads Package 4 : turiscat to Alas	Wan Husin & Associates SDN. BHD Jv Consultant & eng. Intercontinental Unip Lda	MPW- CS 2000028	LM		Plan																														
							Actual																														
	25	Preparation Detaled Design for Rahbilitation of Municipios	Detile Consultant	MPW- CS 2000029	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
26	Preparation Detaled Design for Rahbilitation of Municipios	Detile Consultant	MPW- CS 2000027	LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
27	Preparation Detaled Design for Rahbilitation of Municipios	Niceles Unip Lda	MPW- CS 2000026	LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
28	Preparation of Detailed Engineering & bid Preparation for new Bridge in 2019 package 1 : Samalari, sana uatulari- lai sorulai, sumaco (lacluta uma tolu) molas matadoro - RTK, Comoro mota ulun	Vox Da Vinci Consultant Engineering Lda	MPW- CS 2000031	LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
29	Preparation Detaled Design for Rahbilitation of Municipios	Team Consultant Jv. ATT & ATT & Triangle	MPW- CS 2000021	LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
30	Preparation Detaled Design for Rahbilitation of Municipios	Aureum Solis Consultant, Unip Lda Jv PT Bikarma	MPW- CS 2000033	LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
31	Preparation Detaled Design for Rahbilitation of Municipios	PT. Bikarma JV Aureum Solis Consultant, Unip Lda	MPW- CS 2000023	LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
32	Intersection in the Existing dili liquisa road to conce akses road from tibar Bay Port	TPT Timor Unipessoal Lda	REP/009/MOP/2019	FI	MOP	Plan																															
						Actual																															
33	Preparation Detaled Design for Enginnering Desing Dili Urban Roads	Kiat Konsultan				Plan																															
						Actual																															
34	Konsultan Suprevisi for Konstruction Suprevison of daradau irigation Schema	PT.Suanda karya Jv KWK	REP/042/MAP/2017	FI	MOP	Plan																															
						Actual																															
35	Suprevison Consultant for Construction of Intersection in the Existing Dili-Liquisa Road to Connect Access Road from Tibar Bay port (National Road)	Lelo Unipessoal Lda.		LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
36	Preparation of Detailed Engineering Design (DED) For New Cable Stayed Bridge Over the Becusse Rwer, in Dili Total Length +	TPT Timor Unip Lda		LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
TOTAL PROJETO ON-GOING																																					
Note:							Planu Periode inspesaun iha tereinu Implementa Periode inspesaun iha tereinu Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu																														
Prepara Husi :							Sertifika Husi :							Aprova Husi :																							
																																					
(Eng. Tito Edgar F.N. de Jesus) Eng. PMU ba Projeto (Imprestimo), ADN, I.P.							(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas) Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasau de Qualidade, ADN, I.P.							(Eng. Januario Maia Guterres) Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.																							

SERVISU BA
KONSULTAN DESIGN
SEI AJUSTA TUIR
PLANO HUSI
PROJECTO NAIN .OU
BAZEIA BA
DOKUMENTOS
KONSULTAN NIAN
NEBE SUPMETE MAI
HUSI PROJECTO
NAIN.

FHO

Konsultan la serviso ona
iha tereno,maibe
pagamento seidauk hotu



MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
REPUBLICA DE TIMOR-LESTE



ADN, L.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional - Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Teresa Gomes									2022																														Observasaun	
Município	MUNICIPIO DILI NO POSTOS							Novembro																																
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We										
IMPRESTIMO	1	National road no. 1 Upgrading project Manatuto - Baucau (package A01-02)Package A01-02 sta 56+400-114+102(56.82km)	Shanghai Construction Group Co.Ltd Jv PT. Brantas Abiprayat(Persero)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													Halo Relatorio Mensal				
							Actual																																	
	2	National road no. 1 Upgrading project Dili - Manatuto (package A01-01) (km 12+966.66-km 61+706.66)	Sinohydro Corporation Limited		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													FHO				
							Actual																																	
	3	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													Inspecsaun Pagamento				
							Actual																																	
	4	RNUSP/ Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Baucau - Lautem Section : Sta. 123 + 105 to Sta. 182 + 040 (with Exceptions)	CBMI Const.Co.Ltd / Chongqing Road Engineering GroupCo.,Ltd.(Joint venture)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													Inspecsaun Pagamento				
							Actual																																	
	5	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Aitaba - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Const.Co.Ltd / Chongqing Road Engineering (Group)Co.,Ltd.(Joint venture)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													Halo Relatorio Pagamento				
							Actual																																	
	6	Road Network Upgrading Project (RNUP) Upgrading and Maintanace of Dili (Air Port Junction - Tibar)Road - Section 2 (Tasitolu - Tibar Road Link A03-01/ Sta 8 + 740 - Sta 13 + 290)	China Wu Yi Co.,Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													Halo Relatorio				
							Actual																																	
	7	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrading project and maintainace of Dili- Ainaro Road Lot 3(Solerema - Bandudatu Section (Km 34 +620 - Km 64 + 000)(29km)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													Halo Relatorio				
							Actual																																	
	8	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrading and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aitudo section (km 64+00 -km 89+000) (ICB.034/MPW-2013)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													Halo Relatorio				
							Actual																																	
	9	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrading and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 5 Aitudo-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													Halo Relatorio				
							Actual																																	
	10	Road Network Upgrading Sector Project Consulting Services : Preparation of Designs for 169 Km of National Roads (Baucau to Lospalos, Lautem to Com and Baucau to Viqueque) (ADB LOAN no. 3020 - TIM and 3021 - TIM)	Dongsung Engineering Co.Ltd JV with Kuhlita Engineering and Consulting Co.Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													PHO				
							Actual																																	
	11	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Aitaba to Mota Ain Roads	Dongsung Engineering Co.Ltd JV with Kuhlita Engineering and Consulting Co.Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													Halo Relatorio				
							Actual																																	
	12	Upgrading and Maintenance of Laclubar Jet Natarbora Roads Sta. 100+360 - 144+995 Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction CO.Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													Halo Relatorio				
							Actual																																	
	13	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Lautara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili - Ainaro Road (Lots 1 - 5)	Kuhlita Eng. & Consulting Co.Ltd in Joint Venture with Dongsung Eng. Co.,Ltd., and in Association with Desing Science, BIC, and Kai Wan Kmanek Consultants, Unip Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													Halo Relatorio				
							Actual																																	
	14	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Lautara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620 km) Municipality Aileu	China Wu Yi Co.,Ltd		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													Inspecsaun Pagamento				
							Actual																																	
	15	Consulting Services for Project Implementation and Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120), Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste.	Intercontinental Consultatort and Technocrats Pvt Ltd (India) in Association With Indira Consultants in the Philis. (Icp) Inc (Philippines) (As Sub- Consultant) and Dezenvolve Timor Leste (Dcile) Consultant, Ltd (Timor Leste (As sub- Consultant)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																													Halo Relatorio Pagamento				
							Actual																																	
	16	Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120)	China Railway JV COVEC		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																	
							Actual																																	
	17	Upgrading and Maintenance of the Baucau-Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste.	China Railway JV COVEC		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																	
							Actual																																	

