



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN PROJETUS
MUNISÍPIU LIQUIÇÁ

JANEIRU 2023




SUMÁRIO

RELATÓRIO


IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO LIQUICA JANEIRO 2023

Prepara Husi :


(Eng. Juninho Antonio A. Da Cruz)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Liquica ADN, I.P



(Eng. Camilo de Jesus)
Eng. ba Projeto Mechanical Electrical
Município Liquica ADN, I.P


(Eng. Marcos Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Liquica ADN, I.P


(Eng. Domingos S. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Liquica ADN, I.P

Verifica Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e
Irigação, ADN, I.P


(Deolindo de Fátima Marques)
Chefe Secção ba Projeto M. E & ITC, ADN, I.P

Sertifica Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO.....	1
I. INTRODUSAUN.	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Liquica	3
1.3 Lista Projecto.....	7
II. PROGRESU FISIKU	18
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan.....	18
III OBSTÁKLU IHA TERENU.....	18
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	18
VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU	19
4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu.....	19

INDICE TABELA

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquica	5
Tabela 1. 2: Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquica.....	5
Tabela 1.3. 1 Projecto Municipio Liquica Por Fundus Financiamento	7
Tabela 1.3. 2 Projecto Municipio Liquica Por Sectores	10
Tabela 1.3. 3 Projecto Municipio Liquica Por Ministerios	14
Tabela 4. 1 Dadus Populasaun Munisipiu Liquica.....	18

I. INTRODUSAUN.

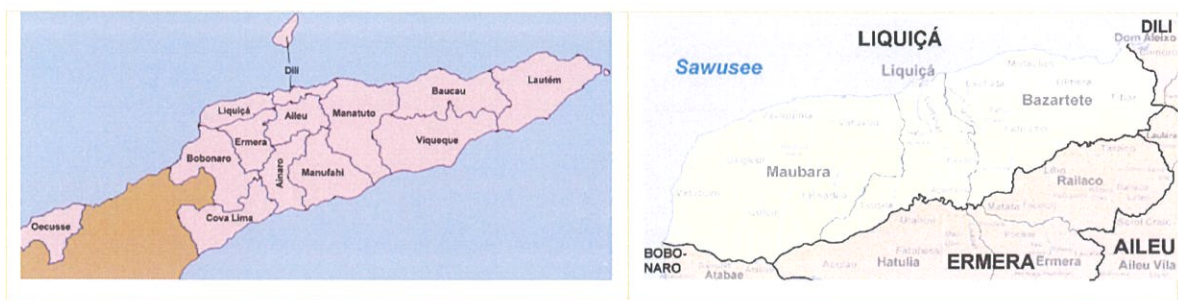
1.1 Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba Projeto sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio Liquica



Mapa hatudu pozisaun Administrasaun Munisipal Liquica iha luan area 543 km² ho populusaun nain – 63.403 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Liquica iha Postu Administrativu tolu (3) , Sukus 23 no aldeias 134, mak hanesan hatudu iha Tabela 1

Tabela 1: Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.

Bazartete		Liquica		Maubara	
sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Fahilelo	3	Açumano	4	Gugleur	11
Fatumasi	4	Darulete	4	Guiço	5
Lauhata	5	Dato	10	Lissadila	7
Leorema	10	Hatuquesi	8	Maubaralissa	5
Maumeta	4	Leotala	5	Vatuboro	5
Metagou	3	Loidahar	4	Vatuvou	10
Motaulun	3	Luculai	4	Vaviquinia	7
Tibar	4	-	-	-	-
Ulmera	9	-	-	-	-
Total	45	-	39	-	50

Data husi: Livro 3B OJE 2021, pag 58

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquica

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Liquica								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro			3			3	
2	Administrasaun no Financas			0			0	
3	Motorista			1			1	
4	Seguransa			0			0	
Total				4			4	

Tabela 1. 2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquica

ASSET ADN,IP MUNICIPIO LIQUICA								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio			1				
2	Kareta			1				
3	Desktop HP / Monitor			1				
4	Laptop HP			1				
5	Printer Cannon			1				
6	UPS			1				
7	Armario File			1				
8	Armario Tau hena			3				
9	Meja escritorio			1				
10	Meja han			1				
11	Meja TV (kiik)			1				
12	Kadeira escritorio			6				
13	Kadeira han			4				

14	Sofa			1 Set				
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3			3 Set				
16	Jeleira			1				
17	Water Dispenser			1				Aát
18	TV + Parabola			1 Set				
19	AC			4				
20	Kipas Angin			1				
21	Kompor			1				
22	Kompor Gas			1				
23	Rack sepatu			3				
24	Rack Piring			1				
25	Lampu			11				
26	Water Pump Sanyo			0				

1.3 Lista Projecto

Projeto hotu ne'ebe akumula iha lista ne'e bazeia ba dados Projeto nebe sei la'o hela no mos Projeto nebe abandona ona iha tinan barak nia laran, Projeto hirak ne'e fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projeto Por Fundus Financiamento, Tabela 1.3.2 Projeto Por Sector no tabela 1.3.3 Projeto Por Ministerio, no lista detallu kada Projeto bele hare iha #Aneksu A.

Tabela 1.3. 1 Projeto Municipio Liquica Por Fundus Financiamento



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM (CD + BS + TP + FUNDO COVID etc..) + EMERGENCY + PDIM			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	22	\$9,585,865.18	\$3,283,809.68	34.26%
2	LIQUICA VILA	25	\$5,791,632.70	\$2,471,345.22	42.67%
3	MAUBARA	19	\$10,696,940.96	\$7,451,783.50	69.66%
	Grand Total	66	\$26,074,438.84	\$13,206,938.40	50.65%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	4	\$7,489,606.18	\$2,214,796.66	29.57%
2	LIQUICA VILA	5	\$3,436,614.05	\$1,575,474.31	45.84%
3	MAUBARA	6	\$8,985,274.03	\$6,662,111.82	74.14%
	Grand Total	15	\$19,911,494.26	\$10,452,382.79	52.49%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM -CD			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	6	\$761,513.24	\$420,905.30	55.27%
2	LIQUICA VILA	9	\$1,401,618.58	\$631,728.54	45.07%
3	MAUBARA	7	\$951,175.37	\$485,422.60	51.03%
	Grand Total	22	\$3,114,307.19	\$1,538,056.44	49.39%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM -BS			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	4	\$264,355.05	\$97,250.67	36.79%
2	LIQUICA VILA	2	\$178,518.94	\$97,774.82	54.77%
3	MAUBARA	2	\$344,450.27	\$228,841.80	66.44%
	Grand Total	8	\$787,324.26	\$423,867.29	53.84%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM -TP			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	4	\$289,002.61	\$65,528.17	22.67%
2	LIQUICA VILA	8	\$597,947.63	\$166,367.55	27.82%
3	MAUBARA	3	\$359,595.59	\$75,407.28	20.97%
	Grand Total	15	\$1,246,545.83	\$307,303.00	24.65%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FUNDO - COVID			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	\$124,725.48	\$44,268.56	35.49%
2	LIQUICA VILA				
3	MAUBARA				
	Grand Total	2	\$124,725.48	\$44,268.56	35.49%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	EMERGENCY			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	1	\$ 502,473.28	\$ 441,060.32	87.78%
2	LIQUICA VILA				
3	MAUBARA				
	Grand Total	1	\$ 502,473.28	\$ 441,060.32	87.78%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	1	\$154,189.34	-	-
2	LIQUICA VILA	1	\$176,933.50		
3	MAUBARA	1	\$56,445.70	-	-
	Grand Total	3	\$387,568.54	-	-

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

Tabela 1.3. 2 Projeto Municipio Liquica Por Sectores



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$23,950.17	\$16,726.74	69.84%
2	AGUA E SANEAMENTO	3	\$293,629.77	\$167,315.56	56.98%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	4	\$333,652.02	\$33,401.02	10.01%
4	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	17	\$2,314,878.59	\$520,961.57	22.50%
5	ELÉCTRICIDADE	7	\$6,985,634.87	\$2,740,591.91	39.23%
6	ESTRADAS E PONTES	27	\$13,878,612.12	\$8,881,152.98	63.99%
7	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$224,232.82	\$40,744.14	18.17%
8	PORTOS	1	\$1,394,750.00	\$657,275.92	47.12%
9	SAUDE	2	\$124,725.48	\$44,268.56	35.49%
10	TURISMO	2	\$500,373.00	\$104,500.00	20.88%
GRAND TOTAL		66	\$26,074,438.84	\$13,206,938.40	50.65%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	AGRICULTURA	1	\$23,950.17	\$16,726.74	69.84%
2	AGUA E SANEAMENTO	2	\$122,664.12	\$94,609.06	77.13%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$154,189.34		
4	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	6	\$620,756.13	\$241,468.72	38.90%
5	ELÉCTRICIDADE	2	\$5,296,850.84	\$1,578,737.87	29.81%
6	ESTRADAS E PONTES	8	\$3,242,729.10	\$1,307,998.73	40.34%
7	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN				
8	PORTOS				
9	SAUDE	2	\$124,725.48	\$44,268.56	35.49%
10	TURISMO				
Grand Total		22	\$9,585,865.18	\$3,283,809.68	34.26%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR	LIQUICA VILA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO				
3	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$123,016.98	\$33,401.02	27.15%
4	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	8	\$1,334,526.87	\$204,085.57	15.29%
5	ELÉCTRICIDADE	2	\$896,984.00	\$525,578.75	58.59%
6	ESTRADAS E PONTES	10	\$1,818,122.03	\$1,010,259.82	55.57%
7	MANUTENSAUN NO	2	\$224,232.82	\$40,744.14	18.17%
8	PORTOS	1	\$1,394,750.00	\$657,275.92	47.12%
9	SAUDE				
10	TURISMO				
Grand Total		25	\$5,791,632.70	\$2,471,345.22	42.67%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR	MAUBARA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$170,965.65	\$72,706.50	42.53%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$56,445.70	\$-	
4	EDUKASAUN	3	\$359,595.59	\$75,407.28	20.97%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$791,800.03	\$636,275.29	80.36%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO	9	\$8,817,760.99	\$6,562,894.43	74.43%
7	ESTRADAS				
8	FLOOD CONTROL				
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN				
10	PORTOS	2	\$500,373.00	\$104,500.00	20.88%
Grand Total		19	\$10,696,940.96	\$7,451,783.50	69.66%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

Tabela 1.3. 3 Projeto Municipio Liquica Por Ministerios



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	ESTATAL	3	\$387,568.54		
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	2	\$71,249.49	\$57,470.88	80.66%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	36	\$21,058,391.96	\$11,706,557.76	55.59%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	17	\$2,314,878.59	\$520,961.57	22.50%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$99,484.80	\$82,502.69	82.93%
6	MINISTERIO SAUDE	2	\$124,725.48	\$44,268.56	35.49%
7	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$1,394,750.00	\$657,275.92	47.12%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$500,373.00	\$104,500.00	20.88%
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS	2	\$123,016.98	\$33,401.02	27.15%
Grand Total		66	\$26,074,438.84	\$13,206,938.40	50.65%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	ESTATAL	1	\$154,189.34		
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$23,950.17	\$16,726.74	69.84%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	11	\$8,562,759.26	\$2,898,842.97	33.85%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	6	\$620,756.13	\$241,468.72	38.90%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$99,484.80	\$82,502.69	82.93%
6	MINISTERIO SAUDE	2	\$124,725.48	\$44,268.56	35.49%
7	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN				
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL				
Grand Total		22	\$9,585,865.18	\$3,283,809.68	34.26%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	LIQUICA VILA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$176,933.50		
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	1	\$47,299.32	\$40,744.14	86.14%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	12	\$2,715,106.03	\$1,535,838.57	56.57%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	8	\$1,334,526.87	\$204,085.57	15.29%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU				
6	MINISTERIO SAUDE				
7	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$1,394,750.00	\$657,275.92	47.12%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	2	\$123,016.98	\$33,401.02	27.15%
Grand Total		25	\$5,791,632.70	\$2,471,345.22	42.67%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	MAUBARA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	ESTATAL	1	\$56,445.70		
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS				
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	13	\$9,780,526.67	\$7,271,876.22	74.35%
4	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	3	\$359,595.59	\$75,407.28	20.97%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU				
6	MINISTERIO SAUDE				
7	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN				
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$500,373.00	\$104,500.00	20.88%
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL				
Grand Total		19	\$10,696,940.96	\$7,451,783.50	69.66%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

Tabela 4. 1 : Dadus Populasaun Munisipiu Liquica

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2023				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Bazartete	31,983	9,158	9,039	7,089	6,697
Liquiça	25,334	6,978	7,348	5,672	5,337
Maubara	25,234	7,088	6,802	5,766	5,578

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi Progressu servisu nebe kompanha sira atinji iha fulan neé nia laran, husi lista nebe iha #Anexu B hatudu progressu aktual fulan ida neé ho nia persentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento nebe hetan husi progressu fulan ida neé, ikus liu persentagen aktual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativa husi porsento anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detailho bele hare iha #Anexu B, detallu ba Backup Fotografia #Anexu C1, Detallu ba Backup BoQ #Anexu C2 no Instrusaun servisu bele hare #Anexu D

III. OBSTÁKLU IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Durante iha Fulan ida nia laran, problema nebe ami enjineiru municipio hasoru mak hanesan :

1. Projeto lao tarde
2. Companhia balun servisu la tuir spesifikasaun
3. Companhia balun servisu la iha Site Engineer
4. Difikulidade ba Ekipa ADN M.Liquica hasoru susar ba Be'e mos

VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu

1. Rekomenda ba Kompanhia sira servisu tuir spesifikasaun nebe iha ona
2. Rekomenda ba Kompanhia sira tenke iha Site Engineer iha terenu

Rekomenda ba ADN.I.P. Nacional liu-liu ba Superior sira hodi hare ba Edificio ADN.I.P.

Note : Assinatura Husi Enjineiru Municipio Liquica

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Liquica					
No	Deskrisaun	Identidade			
		Naran Kompletu e Asinatura	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia
1	Enjineiru	 Juninho António A. Da Cruz	216	Enjineiru EPAS	
		 Marcus Ximenes de Araujo	172	Enjineiru ITI	
		 Domingos S. Martins	160	Enjineira ITI	

		 Camilio de Jesus	061	Enjineiru METIC	
2	Enjineira	 Nencia F.O. do Rêgo	173	Enjineira VEBD	
3	Motorista	 Rui Antonio Gaio	029	Motorista	



#ANEXO A

Lista Geral Projeto On-going Municipio Liquica - Janeiro 2023

NU	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESO FISIKU (%)	PROGRESO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
1	New Installation MV/LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	BAZARTETE	LIQUICA	Mina Petro Leste Unip, Lda	RDTL-11004589	\$ 499,250.84		100.00%	90.00%	\$ 449,325.76	\$ 49,925.08	ABANDONA	
2	Konstrusaun Moraiha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Manoko Unip, Lda	RDTL-MAP-PO2019-19726	\$ 23,950.17	Dec. 5, 2019	77.60%	69.84%	\$ 16,726.74	\$ 7,223.43	ON-GOING	Provezoriamente servisu paradu hela
3	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	Milcha Unip Lda	(RFO:19/029-Q-R)	\$ 67,492.69	Nov. 10, 2019	41.01%	36.91%	\$ 24,910.52	\$ 42,582.17	ON-GOING	
4	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuals Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	\$ 23,179.32	Oct. 22, 2019	79.42%	52.23%	\$ 12,106.37	\$ 11,072.90	ON-GOING	Provezoriamente servisu paradu hela
5	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	\$ 66,557.90	Oct. 23, 2020	73.90%	66.51%	\$ 44,268.56	\$ 22,289.34	ON-GOING	ongoing
6	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Cravtasaun iha Alpeio-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFO/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	\$ 99,484.80	Sept. 9, 2019	92.14%	82.93%	\$ 82,502.69	\$ 16,982.11	ON-GOING	Falta retensaun
7	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Sall Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	\$ 502,473.28	Sept. 20, 2021	99.75%	87.78%	\$ 441,060.32	\$ 61,412.96	ON-GOING	ON-GOING
8	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 154,189.34	Aug. 31, 2021	9.33%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
9	R4D Rural Road Spot Improvement Fahliebo-Bucumera Chainage 0 + 000-3 + 000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip,Lda	MOP - CD-NCB-R -21030	\$ 149,732.87	Oct. 01, 2021	46.91%	29.06%	\$ 43,507.04	\$ 106,225.83	ON-GOING	
10	R4D Rural Road Spot Improvement Fahliebo - Fatumasi Chainage 0 + 000-2 + 300 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip,Lda	MOP - CD-RFO - 21017	\$ 88,852.44	Oct. 01, 2021	25.17%	13.35%	\$ 11,862.47	\$ 76,989.97	ON-GOING	
11	R4D Rural Road Spot Improvement Libalao - Fahliebo Chainage 0 + 000-7 + 000, Iliquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Hatuleo Unip Lda	MPW-W-210144	\$ 88,425.80	Oct. 01, 2021	96.78%	81.72%	\$ 72,258.53	\$ 16,167.27	ON-GOING	
12	Rural Road Spot improvement Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0 + 000 - 10 + 000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	CRAELEKI BERCOLI UNIPESSOAL LDA	MPW-W-210145	\$ 62,024.04	Oct. 01, 2021	65.81%	59.23%	\$ 36,734.04	\$ 25,290.00	ON-GOING	
13	R4D Rural Road Spot improvement Fahliebo - Bucumera Chainage 3 + 000 + 6 + 500 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	TM Calleba Unip,Lda	MPW-W-210158	\$ 158,465.33	Oct. 01, 2021	50.29%	41.98%	\$ 66,517.54	\$ 91,947.79	ON-GOING	
14	Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	ZYC UNIPESSOAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	\$ 58,167.58	11/01/2022	24.74%	0.00%	\$ -		ON-GOING	
15	Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	U-Rema Unip, Lda.	NCB:15/MEJD/DNA/2021	\$ 264,260.83	1/11/2021	68.07%	57.15%	\$ 151,030.03	\$ 113,230.80	ON-GOING	
16	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE BAURA	-	\$ 9,072.12	15/10/2021	47.14%	0.00%	\$ -		ON-GOING	
17	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Ermeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE ERMETA	-	\$ 86,365.84	15/10/2021	49.47%	23.28%	\$ 20,102.04	\$ 66,263.80	ON-GOING	
18	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE CASSAIT	-	\$ 78,250.89	15/10/2021	46.41%	23.32%	\$ 18,248.47	\$ 60,002.42	ON-GOING	
19	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESC-Paralelo Bogoro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE ESC-PARALELO	-	\$ 115,313.76	15/10/2021	42.14%	23.57%	\$ 27,177.66	\$ 88,136.10	ON-GOING	
20	Melhoramento no Supply Energia Elektricidade husi Sub Stasaun Liquisa ba Portu Tibar (Engineering Procurement Construction - Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning Extension Transformer Bay Of the Existing 150/20kV Liquica Substation to Supply Power to Tibar Bay Port)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	BAZARTETE	LIQUICA	China Shandong International Economic And Technical Cooperation Group, LTD	RFP/054/MOP-2021	\$ 4,797,600.00	Dec. 16, 2021	31.39%	23.54%	\$ 1,129,412.11	\$ 3,668,187.89	ON-GOING	
21	Supervision Consultant for Construction of Intersection in the Existing Dili - Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road - A03) Sta. 0 + 000 - Sta. 0 + 620	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Leio Engineering Unipessoal Lda	RFP/072/MOP-2021	\$ 154,000.00	Dec. 14, 2021	79.80%	75.81%	\$ 116,748.95	\$ 37,251.05	ON-GOING	
22	Construction of Intersection in the Existing Dili-Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road-A03)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Altula Construction, Lda	RT/070/MOP-2021	\$ 2,038,755.34	Dec. 1, 2021	76.50%	25.47%	\$ 519,309.84	\$ 1,519,445.50	ON-GOING	



#ANEXO A

Lista Geral Projeto On-going Municipio Liquica - Janeiro 2023

NU	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESO FISIKU (%)	PROGRESO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
23	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	ECT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	\$ 1,394,750.00	May 17, 2017	47.12%	47.12%	\$ 657,275.92	\$ 737,474.08	ON-GOING	
24	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Liquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Alipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	LIQUICA VILA	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	\$ 276,484.00	July 6, 2016	92.77%	83.49%	\$ 230,841.25	\$ 45,642.75	ON-GOING	
25	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokaiako Chainage 0 + 000 - 5 + 000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	\$ 452,362.93	Dec. 20, 2019	97.15%	86.79%	\$ 392,619.64	\$ 59,743.29	ON-GOING	
26	Manutensaun Kanals Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Banir Lema Unip.Lda	RDTL 0000	\$ 47,299.32	Aug. 18, 2021	95.71%	86.14%	\$ 40,744.14	\$ 6,555.18	PHO	
27	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 176,933.50	Aug. 31, 2021	3.83%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
28	R4D Rural Road Spot Improvement Beriakuldu-Laberika Chainage 0 + 000-2 + 500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21025	\$ 131,219.62	Oct. 01, 2021	88.11%	43.46%	\$ 57,030.68	\$ 74,188.94	ON-GOING	
29	R4D Rural Road Spot Improvement Taltabl - Kutulau Chainage 0 + 000-1 + 700, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MOP - CD - NCB-R - 21036	\$ 123,631.72	Oct. 01, 2021	74.70%	55.75%	\$ 68,927.23	\$ 54,704.49	ON-GOING	
30	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou - Albenu Chainage 0 + 000-7 + 600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	MOP - CD - NCB - R - 21038	\$ 238,739.71	Oct. 01, 2021	71.27%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
31	R4D Rural Road Spot Improvement Dato - Loidahar Chainage 0 + 000-12 + 300, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Luquell Oan Unipessoal Lda	MOP-CD-NCB-R - 21039	\$ 188,589.13	Oct. 01, 2021	85.82%	63.30%	\$ 119,370.39	\$ 69,218.74	ON-GOING	
32	R4D Rural Road Spot Improvement Albenu - Asumanu - Leurema Chainage 5 + 000 - 10 + 000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Calulu, Unip Lda	MOP - CD - NCB - R - 21035	\$ 162,215.27	Oct. 01, 2021	71.13%	62.80%	\$ 101,878.04	\$ 60,337.23	ON-GOING	
33	R4D Rural Road Spot Improvement Albenu - Asumanu - Leurema Chainage 0 + 000-5 + 000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Vicaroman, Unip Lda	MOP - CD NCB - R - 21034	\$ 165,363.43	Oct. 01, 2021	87.85%	77.84%	\$ 128,723.68	\$ 36,639.75	ON-GOING	
34	R4D Rural Road Spot Improvement Beriakuldu - Laberika Chainage 2 + 500-5 + 400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Claridade Unip.Lda	MPW-W-210163	\$ 167,071.89	Oct. 01, 2021	60.51%	42.49%	\$ 70,992.44	\$ 96,079.45	ON-GOING	
35	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0 + 000-2 + 000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Craeleki Bercoil, Unip Lda	MPW-W-210143	\$ 76,423.05	Oct. 01, 2021	77.68%	49.95%	\$ 38,170.38	\$ 38,252.67	ON-GOING	
36	Projeltu Konstrusaun foun ESG publico 01 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	Roman Furak Unip.Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	\$ 167,079.099	Nov. 1, 2021	50.50%	42.57%	\$ 71,119.04	\$ 95,960.05	ON-GOING	
37	For Roads Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara, Carimbala - Loes (A03)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Chanel Chander Unipessoal Lda	MPW-W-210202	\$ 112,505.280	13/12/2021	96.58%	28.93%	\$ 32,547.34	\$ 79,957.94	ON-GOING	
38	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Mauboque	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBC MAUBOQUE	-	\$ 112,530.010	15/10/2021	44.70%	25.45%	\$ 28,640.50	\$ 83,889.51	ON-GOING	
39	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBC 1,2,3 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBC 1,2,3 LIQUICA	-	\$ 99,456.040	15/10/2021	41.73%	41.55%	\$ 41,321.84	\$ 58,134.20	ON-GOING	
40	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Loidahar	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE LOIDAHAR	-	\$ 79,735.630	15/10/2021	47.50%	25.63%	\$ 20,432.50	\$ 59,303.13	ON-GOING	
41	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Laciolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE Ebf 1,2 LACIOLEMA	-	\$ 89,650.660	15/10/2021	46.40%	22.88%	\$ 20,511.00	\$ 69,139.66	ON-GOING	
42	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Tolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF 1,2 TOLEMA	-	\$ 88,407.020	15/10/2021	32.76%	24.95%	\$ 22,060.69	\$ 66,346.33	ON-GOING	
43	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Luculai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF 1,2 LUCULAI	-	\$ 5,151.290	15/10/2021	50.48%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
44	Consultant Services to Supervise EPC Contractor for the Up-Gratation of Liquica 150/20kV Substation to Supply Power to Tibar Bay Port	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	LIQUICA VILA	LIQUICA	PT. Artefak Arkindo (Indonesia) JV with Jazicasnu Unipessoal Lda	RFP/054/MOP-2021	\$ 620,500.000	Dec. 16, 2021	50.00%	4750.00%	\$ 294,737.50	\$ 325,762.50	ON-GOING	
45	New Construction of "Escola CAFE" Building at Liquica Municipality	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	RICS Unipessoal Lda	NCB/138/MEJD-2021	\$ 692,517.120	June 8, 2022	0.00%					
46	New Construction Of Water Drill Installation and House For Panel No Jardim Dos Heróis De Liquica	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	12/MACLN/XI/2022	\$ 43,007.950	Nov. 1, 2022	30.26%	26.23%	\$ 11,279.95	\$ 31,728.00	ON-GOING	



#ANEXO A

Lista Geral Projeto On-going Municipio Liquica - Janeiro 2023

NU	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESO FISIKU (%)	PROGRESO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
47	New Construction Of Excavation Work Wall, Levelling Work and Pavement Work No Jardim De Herois De Liquica	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-TP	EDIFÍCIOS PUBLICOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara Unip Lda	26/MACLN/XI/2022	\$ 80,009.030	Nov. 23, 2022	31.83%	1.11%	\$ 22,121.07	\$ 57,887.96	ON-GOING	
48	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Fu Unip,Lda	RDTL - 0000	\$ 13,000.00	Jan. 1, 2016	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 13,000.00	ON-GOING	Kontratu ladaukiha no fiziku la eziste
49	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	\$ 288,760.22	July 6, 2016	83.73%	75.36%	\$ 217,606.07	\$ 71,154.15	ON-GOING	
50	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	\$ 275,000.00	Dec. 27, 2016	40.00%	0.00%	\$ 104,500.00	\$ 170,500.00	ON-GOING	ADN, I.P la hare
51	Rehabilitasaun Sistema be'e mos lha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Gulco /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ACUA E SANEAMENTO	MAUBARA	LIQUICA	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	\$ 170,965.65	Jan. 3, 2019	54.99%	42.53%	\$ 72,706.50	\$ 98,259.15	ON-GOING	Provizoriamente paradu hela
52	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbaia and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	\$ 7,693,101.00	May 3, 2017	87.42%	76.97%	\$ 5,921,336.53	\$ 1,771,764.47	ON-GOING	
53	R4D Rural Road Maintenance Beriakulidu - Laberlaka Chainage 0 + 000 - 5 + 400 Nunuleta - Darulema Chainage 0 + 000 - 1 + 600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0 + 000 - 12 + 500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-190098	\$ 50,702.59	Aug. 28, 2019	95.90%	86.31%	\$ 43,761.73	\$ 6,940.86	PHO	
54	Konstrusaun Moru Haleu no Posto Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	EDIFÍCIOS PUBLICOS	MAUBARA	LIQUICA	Rafio Unip. Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	\$ 56,445.70	July 21, 2021	16.32%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	ADN, I.P La Hare
55	R4D Rural Road Spot Improvement Nunulete - Darulema Chainage 0 + 000-2 + 000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Rito - Pu, Unipessoal,Lda	MOP -CD-RFQ - 21013	\$ 67,382.23	Oct. 01, 2021	25.33%	21.35%	\$ 14,389.17	\$ 52,993.06	ON-GOING	
56	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera - Lissadila Chainage 4 + 800-9 + 600	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Malibo, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21033	\$ 152,622.90	Oct. 01, 2021	55.49%	50.97%	\$ 77,792.62	\$ 74,830.28	ON-GOING	
57	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia)-Maubaralisa Chainage 0 + 000-4 + 200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Nheu, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21027	\$ 173,484.62	Oct. 01, 2021	100.00%	90.00%	\$ 156,135.30	\$ 17,349.32	ON-GOING	
58	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 0 + 000-4 + 800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Murak, Unipessoal Lda	MPW-W-210157	\$ 153,049.65	Oct. 01, 2021	68.99%	62.06%	\$ 94,989.12	\$ 58,060.53	ON-GOING	
59	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8 + 400-12 + 500)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Meta Loe Crae Bau Unip,Lda	MPW-W-210160	\$ 198,698.25	Oct. 01, 2021	61.98%	51.14%	\$ 101,607.79	\$ 97,090.46	ON-GOING	
60	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo -Gisu Chainage 0 + 000-2 + 000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Nazico Unip Lda	-	\$ 114,789.50	Oct. 01, 2021	45.71%	41.04%	\$ 47,107.97	\$ 67,681.53	ON-GOING	
61	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4 + 200-8 + 400)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-210161	\$ 213,930.25	Oct. 01, 2021	61.58%	49.44%	\$ 105,774.20	\$ 108,156.05	ON-GOING	
62	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Gariana	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MAUBARA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF GARIANA	-	\$ 117,902.04	Oct. 15, 2021	20.01%	20.01%	\$ 23,588.34	\$ 94,313.70	ON-GOING	
63	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Tapo Manuhulu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MAUBARA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF TAPO MANUHULU	-	\$ 100,033.33	Oct. 15, 2021	23.69%	22.89%	\$ 22,901.88	\$ 77,131.45	ON-GOING	
64	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESC-Paralelo Maubara/Batuvou	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MAUBARA	LIQUICA	MEJD PKRIE ESC-PARALELO MAUBARA/BATUVOU	-	\$ 141,660.22	Oct. 15, 2021	30.05%	20.41%	\$ 28,917.06	\$ 112,743.16	ON-GOING	



#ANEXO A

Lista Geral Projeto On-going Municipio Liquica - Janeiro 2023

NU	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESO FISIKU (%)	PROGRESO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
65	Feasibility study for New Construction of Industrial Park in Liquica, Timor Leste	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	HABERAN UNIPESSOAL LDA (TIMOR LESTE) in Joint Venture with PT ITS TEKNO SAINS (INDONESIA)	RFP/077/MTCI-2021	\$ 225,373.00	March 24, 2022	0.00%			\$ 225,373.00	ON-GOING	
66	Installation four ba Linha de Media Tensaun, Balxa Tensaun e Balxadas em Liquica - Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Nia construction, Lda	0000	\$ 490,039.81	Dec. 4, 2012	0.00%	85.44%	\$ 418,669.22	\$ 71,370.59	ON-GOING	
	TOTAL								\$ 26,074,438.84				\$ 13,206,938.40	50.65%		

PREPARA HUSI,

(Eng. Marcos Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infraestrutura Transporte e
Irigasaun, ADN, I.P

VERIFIKA HUSI,

(Eng. Remigio da C.S.dos Santos)
Engineru Senior ba Projeto Infraestrutura Transporte e
Irigasaun ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI,

(Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Eng. ba Edificio Publiku Agua e Saneamento,
ADN, I.P

(Arq. Francisco Xavier D D. Jeronimo)
Engineru Senior ba Projeto Edificio Publiko
no Be'e Saneamento ADN, I.P

(Eng. Domingos S. Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura Transporte e
Irigasaun, ADN, I.P

(Eng. Deolindo de Fatima Marques)
Chefe Seksaun Mekanikal
e Elektrikal & ITC ADN, I.P

(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. Mekanikal e Elektrikal ADN, I.P

# ANEXO B													
PROGRESSU FISICO MUNICIPIO LIQUICA													
										Jan-23			
NU	NARAN PROJETU	DONO DO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO	KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Commulative Progress (%)
1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	BAZARTETE	LIQUICA	Mina Petro Leste Unip, Lda	RDTL-11004589		\$ 499,250.84	100.00%	0.00%	100.00%
2	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726		\$ 23,950.17	77.60%	0.00%	77.60%
3	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)		\$ 67,492.69	41.01%	0.00%	41.01%
4	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184		\$ 23,179.32	79.42%	0.00%	79.42%
5	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	FUNDO COVID	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178		\$ 66,557.90	73.90%	0.00%	73.90%
6	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM -CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT		\$ 99,484.80	92.14%	0.00%	92.14%
7	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Sali Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021		\$ 502,473.28	99.75%	0.00%	99.75%
8	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021		\$ 154,189.34	9.33%	0.00%	9.33%
9	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-NCB-R -21030		\$ 149,732.87	41.45%	1.39%	42.84%
10	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 , Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-RFQ - 21017		\$ 88,852.44	19.17%	0.00%	19.17%
11	R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa-Fahilebo Chainage 0+000-7+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Hatuleo Unip Lda	MPW-W-210144		\$ 88,425.80	90.80%	5.98%	96.78%
12	Rural Road Spot Improvement Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000 - 10+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Craeleki Bercoli Unip,Lda	MPW-W-210145		\$ 62,024.04	65.81%	0.00%	65.81%
13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	TM Cailaba Unip,Lda	MPW-W-210158		\$ 158,465.33	48.17%	2.12%	50.29%
14	Supply and installation connection for isolation and laboratorium Building Maumeta Liquica	MINISTERIO DA SAUDE	FUNDO COVID	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	ZYC UNIPESOAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228		\$ 58,167.58	24.74%	0.00%	24.74%
15	Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM -BS	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	U-Rema Unip. Lda.	NCB:15/MEJD/DNA/2021		\$ 264,260.83	63.50%	0.00%	63.50%
16	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE BAURA	-		\$ 9,072.12	31.61%	0.00%	31.61%
17	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Ermeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE ERMETA	-		\$ 86,365.84	24.47%	22.72%	47.19%
18	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE CASSAIT	-		\$ 78,250.89	23.32%	1.72%	25.04%
19	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Bogoro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	BAZARTETE	LIQUICA	MEJD PKRIE ESG-PARALELO	-		\$ 115,313.76	24.13%	17.06%	41.19%
20	Engineering Procurement Construction-Design, Suply, Installation, Testing and Commisioning Extension Transformer Bay Of The Existing 150/20KV Liquica Substation to Suply Power to Tibar Bay Port	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	BAZARTETE	LIQUICA	China Shandong International Economic And Technical Cooperation Group. LTD	RFP/054/MOP-2021		\$ 4,797,600.00	31.39%	0.00%	31.39%
21	Supervision Consultant for Construction of Intersection in the Existing Dili - Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road - Ao3) Sta. 0+000 - Sta. 0+620	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Lelo Engineering Unipessoal Lda	RFP/072/MOP-2021		\$ 154,000.00	79.80%	0.00%	79.80%
22	Construction of Intersection in the Existing Dili-Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road-Ao3)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Aitula Construction, Lda	RT/070/MOP-2021		\$ 1,738,869.60	28.30%	32.34%	60.64%
23	R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Maumeta - Metagou - Bazartete Chainage 0+000 - 10+000, Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 - 2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	AP Santava Unip. Lda	MOP/CD/RFQ/ERD/22006		\$ 41,712.18			
24	R4D Rural Roads Routine Maintenance : Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000, Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300, Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000 - 6+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	BAZARTETE	LIQUICA	Ambou Unip. Lda	MOP/CD/RFQ/ERD/22004		\$ 61,864.99			
25	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017		\$ 1,394,750.00	47.12%	0.00%	47.12%
26	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	LIQUICA VILA	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371		\$ 276,484.00	92.77%	0.00%	92.77%
27	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019		\$ 452,362.93	97.15%	0.00%	97.15%
28	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Banir Lema Unip,Lda	RDTL 0000		\$ 47,299.32	95.71%	0.00%	95.71%




29	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAU	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 176,933.50	3.83%	0.00%	3.83%
30	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21025	\$ 131,219.62	48.29%	0.00%	48.29%
31	R4D Rural Road Spot Improvement Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MOP - CD - NCB-R - 21036	\$ 123,631.72	63.76%	2.85%	66.61%
32	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou - Aibenu Chainage 0+000-7+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	MOP - CD - NCB-R - 21038	\$ 238,739.71	40.21%	0.00%	40.21%
33	R4D Rural Road Spot Improvement Dato - Loidahar Chainage 0+000-12+300, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Luqueli Oan Unipessoal Lda	MOP-CD-NCB-R - 21039	\$ 188,589.13	81.67%	0.00%	81.67%
34	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 5+000-10+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Caiulu, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21035	\$ 162,215.27	70.35%	0.78%	71.13%
35	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leurema Chainage 0+000-5+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Vicaroman, Unip Lda	MOP - CD NCB - R - 21034	\$ 165,363.43	87.85%	0.00%	87.85%
36	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu - Laberlaka Chainage 2+500-5+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Claridade Unip,Lda	MPW-W-210163	\$ 167,071.89	48.21%	0.00%	48.21%
37	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Craeleki Bercoli, Unip Lda	MPW-W-210143	\$ 76,423.05	56.53%	0.00%	56.53%
38	Projeitu Konstrusaun foun ESG publico 01 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM -CD	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	Roman Furak Unip,Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	\$ 167,079.10	47.97%	2.11%	50.08%
39	Roads Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (A03)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Chanel Chander Unipessoal Lda	MPW-W-210202	\$ 112,505.28	32.15%	4.52%	36.67%
40	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Mauboque	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBC MAUBOQUE	-	\$ 112,530.01	26.16%	0.42%	26.58%
41	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBC 1,2,3 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBC 1,2,3 LIQUICA	-	\$ 99,456.040	24.71%	16.84%	41.55%
42	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Loidahar	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EPE LOIDAHAR	-	\$ 79,735.630	26.77%	0.00%	26.77%
43	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Laclelema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE Ebf 1,2 LACLOLEMA	-	\$ 89,650.660	24.47%	0.00%	24.47%
44	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Tolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF 1,2 TOLEMA	-	\$ 88,407.020	26.91%	0.00%	26.91%
45	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Luculai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF 1,2 LUCULAI	-	\$ 5,151.290	50.48%	0.00%	50.48%
46	Consultant Services to Supervise EPC Contractor for the Up-Grading of Liquica 150/20kV Substation to Supply Power to Tibar Bay Port	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉTRICIDADE	LIQUICA VILA	LIQUICA	PT. Artefak Arkindo (Indonesia) JV with Jazicasnu Unipessoal Lda	RFP/054/MOP-2021	\$ 620,500.000	50.00%	0.00%	50.00%
47	New Construction of "Escola CAFE" Building at Liquica Municipality	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E	FI	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	LIQUICA VILA	LIQUICA	RICS Unipessoal Lda	NCB/138/MEJD-2021	\$ 692,517.120	0.00%	0.00%	0.00%
48	New Construction Of Water Drill Installation and House For Panel No Jardim Dos Herois De Liquica	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	12/MACLN/XI/2022	\$ 43,007.950	29.14%	0.56%	29.70%
49	New Construction Of Excavation Work Wall, Levelling Work and Pavement Work No Jardim De Herois De Liquica	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara Unip Lda	26/MACLN/XI/2022	\$ 80,009.030	30.72%	0.46%	31.18%
50	Rehabilitasaun Estrada,Bebadiri - Lebokalako Chainage , Liquica 0+000-5+000 (5.0 Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raelti Unip. Lda	RT/003/MOP-2021	\$ 313,023.190			
51	R4D Rural Roads Rehabilitasaun Estrada Rural Dato - Liquica Package I Sta. 0+000-2+500, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	LIQUICA VILA	LIQUICA	Kay Megi Lara Unip. Lda JV Nheu Unip. Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD/220010	\$ 344,788.120			
52	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Fu Unip,Lda	RDTL - 0000	\$ 13,000.000	0.00%	0.00%	0.00%
53	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	\$ 288,760.220	83.73%	0.00%	83.73%
54	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	\$ 275,000.000	40.00%	0.00%	40.00%
55	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	MAUBARA	LIQUICA	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	\$ 170,965.65	54.99%	0.00%	54.99%
56	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	\$ 7,693,101.00	87.42%	0.00%	87.42%
57	R4D Rural Road Maintenance Berlakuidu - Laberlaka Chainage 0+000-5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubarlisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-190098	\$ 50,702.59	95.90%	0.00%	95.90%
58	Konstrusaun Moru Haleu no Posto Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAU	MAUBARA	LIQUICA	Rafio Unip. Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	\$ 56,445.70	16.32%	0.00%	16.32%
59	R4D Rural Road Spot Improvement Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Rito - Pu, Unipessoal,Lda	MOP -CD-RFQ - 21013	\$ 67,382.23	25.33%	0.00%	25.33%

60	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Malibo, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21033	\$	152,622.90	55.49%	0.00%	55.49%
61	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia)-Maubaralisa Chainage 0+000-4+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Nheu, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21027	\$	173,484.62	100.00%	0.00%	100.00%
62	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 0+000-4+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Murak, Unipessoal Lda	MOP - CD- NCB-R- 21032	\$	153,049.65	68.99%	0.00%	68.99%
63	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia) - Maubaralisa - Chainage 8+400-12+500)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Meta Loe Crae Bau Unip,Lda	MPW-W-210160	\$	198,698.25	57.01%	0.00%	57.01%
64	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo -Gisu Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Nazico Unip Lda	MPW-W-210152	\$	114,789.50	45.71%	0.00%	45.71%
65	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina) - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-210161	\$	213,930.25	55.28%	0.00%	55.28%
66	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Gariana	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MAUBARA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF GARIANA	-	\$	117,902.04	20.01%	0.00%	20.01%
67	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Tapo Manuhulu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MAUBARA	LIQUICA	MEJD PKRIE EBF TAPO	-	\$	100,033.33	22.89%	0.00%	22.89%
68	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Maubara/Batuvou	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MAUBARA	LIQUICA	MEJD PKRIE ESG-PARALELO	-	\$	141,660.22	20.86%	0.00%	20.86%
69	Feasibility study for New Construction of Industrial Park in Liquica, Timor Leste	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	HABERAN UNIPessoal LDA (TIMOR LESTE) in Joint Venture with PT ITS TEKNO SAINS (INDONESIA)	RFP/077/MTCI-2021	\$	225,373.00	0.00%	0.00%	0.00%
70	Installation foun ba Linha de Media Tensaun, Baixa Tensaun e Baixadas em Liquica - Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Nia construction, Lda	0000	\$	490,039.81	0.00%	0.00%	0.00%
71	Calamidade, Obra Construção de Recuperação de Calamidade Muro Estrutura Protecção de Ponte em Loes, Pacote II, (Sta. 0+000 - Sta. 0+080 & Sta. 0+200 - Sta. 0+440)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E RESPOSTA AS ESTRUTURAS DANIFICADAS CALAMIDADES	MAUBARA	LIQUICA	Conjunto Mulheres Empresarial de Timor (CEMT), Lda	MPW-W 220256	\$	585,119.40			
72	R4D Rural Roads Periodic Maintenance: Barcau - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500, Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Nheu Unip.Lda	MOP/CD/RFQ/ERD/22008	\$	45,935.36			
73	R4D Rural Road Periodic Maintenance: Malaisera-Lisadila Chainage 0+000 - 9+600, Samarapo-Gisu 0+000 - 2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	MAUBARA	LIQUICA	Raio Unip. Lda	MOP/CD/RFQ/ERD/22009	\$	41,821.35			

INSPESAUN HUSI,

 (Eng. Marcos de Araújo Ximenes)
 Engineru ba Projeto Infraestrutura Transporte e Irigasaun ADN, I.P



 (Eng. Domingos Soares Martins)
 Engineru ba Projeto Infraestrutura Transporte e Irigasaun ADN, I.P



 (Eng. Juninho António Abrantes da Cruz)
 Engineru ba Projeto Edifício Público Água e Saneamento ADN, I.P



 (Eng. Camilo de Jesus)
 Engineru ba Projeto Mecanikal e Elektrial ADN, I.P

VERIFIKA HUSI,

 (Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
 Engineru Senior ba Projeto Infraestrutura Transporte e Irigasaun ADN, I.P


 (Arq. Francisco Xavier D. D. Jeronimo)
 Engineru Senior ba Projeto Edifício Público Água e Saneamento ADN, I.P


 (Eng. Domingo de Fatima Marques)
 Chefe Departamentu Mecanikal e Elektrial & ITC ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI,

 (Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas)
 Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade ADN, I.P

MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2023

Husi loron 3-6 Janeiro 2023 iha edificio Nasional ADN hodi hein prosesu teste interna ba tabela salarial nian, no husi loron 9 - 20 Janeiro 2023, hadia relatoriu fulan Dezembro 2022 nian, inklui prepara planu ba projetu foun nebe'e fornese ona dadus husi base de dadus, inklui mos tuir treinamentu ba programa tracking dadus projetu husi aplikasaun foun nebe'e instala iha android telephone

Eng. Domingos Soares Martins						2023																																
Município	MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS																																					
Município / Posto	No. Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategori	Dono do Projeto	Accion	JANEIRO																															OBS
Bazartete (BZT)	8	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Tumor Leste	Serizu	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															
							Actual																															
	9	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasau Iha Apeilo-Liquica	Tinocys	022LM/RD/TLA/MP/E/AN D/DA-RFQ/02/2019/EDIFICIO DEPARTAMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																															
							Actual																															
	10	Emergency Project For Tibar River	Sali-Magu Unip.Lda	RT/067/MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Fahlebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Fahlebo-Fatuman Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210142	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Labaloe- Fahlebo Chainage 0+000-7+000 Liquica Municipality	Hatuleo Unip.Lda	MPW-W-210144	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	14	Routine Maintenance Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000-10+000	Craeleki Beroli Unip.Lda	MPW-W-210145	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Fahlebo-Bucumera Chainage 3+000-6+500 Liquica Municipality	TM,Caleba Unip.Lda	MPW-W-210158	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	16	Construction of Intersection in the Existing Dila-Liquica Road to Connect Access Road From Tibar Bay Port (Nacional Road-A03)	Athala Unip.Lda	RT/070/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
TOTAL PROJETO ON-GOING																																						

Note:

	Piano Periode inspesaun iha tercinu
	Relatoria avaliasuan mensal iha Dili
	Inspesaun Pagamentu Anual iha tercinu
	Implementasaun Piano Periode Inspesaun iha tercinu
	Iha Municipio Liquica
	Loron Ferias ou Tolerancia de Ponto

Prepara Husi :



(Eng. Domingos Soares Martins)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun

Municipio Liquica ADN, I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de

Qualidade ADN.I.P



Aprova Husi :



(Eng. Januario Maia Dutra)

Adjunto Director Executivo ADN.I.P

[illegible]

Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Municipio	MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Note:

	Piano Periode inspesaun iha tereinu
	Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili
	Inspeaun Pagamentu Anual iha tereinu
	Implementasaun Plano Periode Inspeaun iha tereinu
	Iha Municipio Liquica
	Loron Ferias ou Tolerancia de Ponto

Prepara Husi :

(Eng Marcos X. de Araujo)

(Eng. Marcos X. de Araujo)
Eng. ba Projeto Infraestructura, Transportes e Irigasaun
Município Liquica ADN, I.P

Sertifikasi Hutan :


(Mariana da Costa Maia Freitas)

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade ADN.I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januário Maia Guterres)

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo ADN.I.P

[illegible]

 REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público			PLANU INSPESAUN																																				
Naran Eng.	Juninho António Abrantes da Cruz						2023																																
Município	MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiro																															OBS
	39	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	Luliana Unip. Lda.	MPW-W-210161	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																														On-going		
	40	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Gariana	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																														On-going		
	41	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Tapo Manuhulu	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																														On-going		
	42	Konstrusaun ka Reabilitasaun ESG-Paralelo Maubara	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																														On-going		
	43	Feasibility study for New Construction of Industrial Park in Liquica, Timor Leste	HABERAN UNIPESSOAL LDA (TIMOR LESTE) in Joint Venture with PT ITS TEKNO SAINS (INDONESIA)	RFP/077/MTCI-2021	FI	MINISTERIO TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA	Plan Actual																														On-going		
	44	Installation foun ba Linha de Media Tensaun, Baixa Tensaun e Baixadas em Liquica - Maubara	Nia Construction, Lda	0000	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																														On-going		
Bazartete (BZT)	45	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District- Liquica District	Mina Petro Leste Unip, Lda	RDTL-11004589	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																														Abandona		
	46	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda.	RDTL-MAP-PO2019:19726	LM	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan Actual																														Paradu		
	47	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip. Lda.	(RFQ:19/029-Q-R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																														Paradu		
	48	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unip. Lda.	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																														Pagamentu Seidauk 100%		
	49	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministry of Health, Timor Leste	Queson SQ Unip. Lda.	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan Actual																														Pagamentu Seidauk 100%		
	50	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasau Iha Aipelo-Liquisa	Tinocya Unip. Lda.	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan Actual																														PHO		
	51	Emergency Project For Tibar River	Sali-Magu Unip. Lda.	RT/067/MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																														On-going		
	52	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	PDIM	ESTATAL																															On-going		
	53	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000)	Hatumeta Oan Unip. Lda.	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																														On-going		
	54	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Fatunasi Chainage 0+000-2+300) Liquica Municipality	Hatumeta Oan Unip. Lda.	MPW-W-210142	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																														On-going		
	55	R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality	Hatuleo Unip. Lda.	MPW-W-210144	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																														On-going		
	56	Routine Maintenance Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000-10+000	Craeleki Bercoli Unip. Lda.	MPW-W-210145	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																														On-going		
	57	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 3+000-6+500) Liquica Municipality	TM.Caileba Unip. Lda.	MPW-W-210158	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																														On-going		
	58	Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica	Zyc Unip. Lda.	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan Actual																														On-going		
	59	Projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica	U-Rema Unip. Lda.	NCB:15/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																														On-going		
	60	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																														On-going		
	61	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Ermeta	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																														On-going		
	62	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																														On-going		
	63	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Bogoro	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																														On-going		
	64	Engineering Procurement Construction-Design, Suply, Installation, Testing and Commisioning Extension Transformer Bay Of The Existing 150/20KV Liquica Substation to Supply Power to Tibar Bay Port	China Shandong International Economic And Technical Cooperation Group. LTD	RFP/054/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																														On-going		
65	Supervision Consultant for Construction of Intersection in the Existing Dili - Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road - A03) Sta. 0+000 - Sta. 0+620	Lelo Engineering Unipessoal Lda	RFP/072/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																														On-going			
66	Construction of Intersection in the Existing Dili-Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road-A03)	Aitula Construction, Lda	RT/070/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																														On-going			
TOTAL PROJETO ON-GOING			66																																				



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA EPE ERMETA
FATIN PROJEITO : FAHILEBO, BAZARTETE
DONO DO PROJEITO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

# ANEXU C2 - (BZT25)					VERIFIED BY A D N , I P												
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO		AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU						PREVIOUS BILLING	BILLED %	THIS BILLING	BILLED %	TOTAL TO DATE	BILLED %	
					FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%	TOTAL PROGRESU	%							
I	PRELIMINARIES	PP/3		US\$	\$ 3.075,00	\$ 1.487,50	1,72%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,72%	\$ 1.487,50	1,72%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,72%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47	(i)	US\$	\$ 59.793,47	\$ 18.380,36	21,28%	\$ 18.352,16	21,25%	\$ 36.732,52	42,53%	\$ 17.346,54	20,08%	\$ 19.385,98	22,45%	\$ 36.732,52	42,53%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/23	(i)	US\$	\$ 14.157,37	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST			US\$	\$ 77.025,84	\$ 19.867,86	23,00%	\$ 18.352,16	21,25%	\$ 38.220,02	44,25%	\$ 18.834,04	21,81%	\$ 19.385,98	22,45%	\$ 38.220,02	44,25%
B	OVERHEAD			US\$	\$ 6.340,00	\$ 1.268,00	1,47%	\$ 1.268,00	1,47%	\$ 2.536,00	2,94%	\$ 1.268,00	1,47%	\$ 1.268,00	1,47%	\$ 2.536,00	2,94%
C	CONTIGENCY			US\$	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	GRAND TOTAL			US\$	\$ 86.365,84	\$ 21.135,86	24,47%	\$ 19.620,16	22,72%	\$ 40.756,02	47,19%	\$ 20.102,04	23,28%	\$ 20.653,98	23,91%	\$ 40.756,02	47,19%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua
Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineru ba Projeitu
Edifício Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

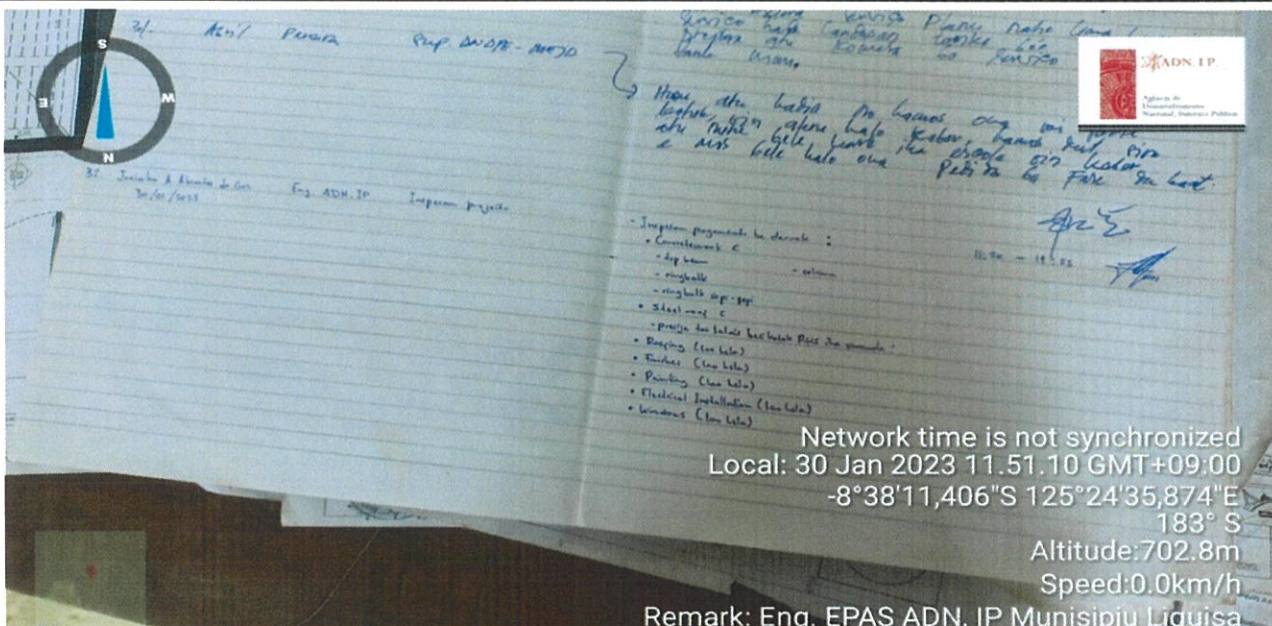
#ANEXU D - (BZT25)



INTRUSAUN / REKOMENDASAUN

**Naran projeto : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA EPE
ERMETA**


GRUPU KOMUNITARIU

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	30/01/2023	Fahilebo, Bazartete	Juninho António Abrantes da Cruz	Enjineiru ADN, IP Liquisa		 Network time is not synchronized Local: 30 Jan 2023 11:51:10 GMT+09:00 -8°38'11,406"S 125°24'35,874"E 183° S Altitude:702.8m Speed:0.0km/h Remark: Eng. EPAS ADN, IP Munisipiu Liquisa	




# ANEXU C2 - (BZT26)					VERIFIED BY A D N , I P											
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO		AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU						PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL BILLED	
					FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%	TOTAL PROGRESU	%	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3		US\$ 3.075,00	\$ 1.487,50	1,90%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,90%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,90%	\$ 1.487,50	1,90%
II	PROVISIONAL SUM FOR DEMOLITION	DM/3		US\$ 686,50	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
III	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47	(i)	US\$ 57.955,41	\$ 15.492,97	19,80%	\$ 1.349,73	1,72%	\$ 16.842,71	21,52%	\$ -	0,00%	\$ 15.492,97	19,80%	\$ 15.492,97	19,80%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/19	(i)	US\$ 7.193,98	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST			US\$ 68.910,89	\$ 16.980,47	21,70%	\$ 1.349,73	1,72%	\$ 18.330,21	23,42%	\$ -	0,00%	\$ 16.980,47	21,70%	\$ 16.980,47	21,70%
B	OVERHEAD			US\$ 6.340,00	\$ 1.268,00	1,62%	\$ -	0,00%	\$ 1.268,00	1,62%	\$ -	0,00%	\$ 1.268,00	1,62%	\$ 1.268,00	1,62%
C	CONTIGENCY			US\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	GRAND TOTAL			US\$ 78.250,89	\$ 18.248,47	23,32%	\$ 1.349,73	1,72%	\$ 19.598,21	25,05%	\$ -	0,00%	\$ 18.248,47	23,32%	\$ 18.248,47	23,32%


Inspeksaun Husi :


Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento,
ADN, I.P

Verifika Husi :


Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineru ba Projeitu
Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P.

Sertifika Husi :


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT26)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA EPE
CASSAIT

GRUPU KOMUNITARIU

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	25/01/2023	Lauhata, Bazartete	Juninho António Abrantes da Cruz	Enjineiru ADN, IP Likisa		Network time is not synchronized Local: 25 Jan 2023 12:32:22 GMT+09:00 -8°34'19,794"S 125°27'52,956"E 72° E Altitude:33.5m Speed:6.3km/h Remark: Eng. EPAS ADN, IP Munisipiu Liquisa	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



TÍTULO DO PROJEITO : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA ESG-PARALELO BOGORO
FATIN PROJEITO : MOTAULUN, BAZARTETE
DONO DO PROJEITO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

# ANEXU C2 - (BZT27)					VERIFIED BY A D N , I P												
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO		AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU						PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL BILLED		
					FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%	TOTAL PROGRESU	%	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	
I	PRELIMINARIES	PP/3		US\$	\$ 3.075,00	\$ 1.487,50	1,29%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,29%	\$ 1.487,50	1,29%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,29%
II	CLASSROOM BUILDING CA	CA/39	(i)	US\$	\$ 65.492,93	\$ 20.578,76	17,85%	\$ 17.264,17	14,97%	\$ 37.842,94	32,82%	\$ 19.933,38	17,29%	\$ 17.909,55	15,53%	\$ 37.842,94	32,82%
III	TOILET BUILDING Tb	TB/39	(i)	US\$	\$ 24.504,47	\$ 4.488,77	3,89%	\$ 1.141,13	0,99%	\$ 5.629,90	4,88%	\$ 4.488,77	3,89%	\$ 1.141,13	0,99%	\$ 5.629,90	4,88%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/28	(i)	US\$	\$ 12.901,36	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST			US\$	\$ 105.973,76	\$ 26.555,04	23,03%	\$ 18.405,30	15,96%	\$ 44.960,34	38,99%	\$ 25.909,66	22,47%	\$ 19.050,68	16,52%	\$ 44.960,34	38,99%
B	OVERHEAD			US\$	\$ 6.340,00	\$ 1.268,00	1,10%	\$ 1.268,00	1,10%	\$ 2.536,00	2,20%	\$ 1.268,00	1,10%	\$ 1.268,00	1,10%	\$ 2.536,00	2,20%
C	CONTIGENCY			US\$	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	GRAND TOTAL			US\$	\$ 115.313,76	\$ 27.823,04	24,13%	\$ 19.673,30	17,06%	\$ 47.496,34	41,19%	\$ 27.177,66	23,57%	\$ 20.318,68	17,62%	\$ 47.496,34	41,19%

Inspeksaun Husi :


Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua
Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi:


Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineru ba Projeitu
Edificio Publiku, Agua e Saneamento, ADN, I.P.

Sertifika Husi :


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO
FATIN PROJEITO
DONO DO PROJEITO

: NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA SECUNDÁRIA GERAL LIQUIÇA
: CAIMEO VILA, SUÇO DATO
: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

ANEKSU C2 - (LV20)			VERIFIED BY A D N , I P											
NO	WORK DESCRIPTION	AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU						PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL BILLED TO DATE	
			FULAN KOTUK	PERCENT %	FULAN NEE	PERCENT %	TOTAL PROGRESU	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	\$ 2.870,00	\$ 1.385,00	0,83%	\$ -	0,00%	\$ 1.385,00	0,83%	\$ -	0,00%	\$ 1.385,00	0,83%	\$ 1.385,00	0,83%
II	CLASSROOM BUILDING C	\$ 53.423,84	\$ 26.158,63	15,66%	\$ 2.706,56	1,62%	\$ 28.865,18	17,28%	\$ -	0,00%	\$ 25.478,95	15,25%	\$ 25.478,95	15,25%
III	CLASSROOM BUILDING Cb	\$ 75.136,99	\$ 35.986,28	21,54%	\$ 428,81	0,26%	\$ 36.415,09	21,80%	\$ -	0,00%	\$ 35.660,32	21,34%	\$ 35.660,32	21,34%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 13.000,00	\$ 6.111,84	3,66%	\$ -	0,00%	\$ 6.111,84	3,66%	\$ -	0,00%	\$ 6.111,84	3,66%	\$ 6.111,84	3,66%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 144.430,83	\$ 69.641,75	41,68%	\$ 3.135,36	1,88%	\$ 72.777,11	43,56%	\$ -	0,00%	\$ 68.636,10	41,08%	\$ 68.636,10	41,08%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 14.443,08	\$ 6.964,17	4,17%	\$ 313,54	0,19%	\$ 7.277,71	4,36%	\$ -	0,00%	\$ 6.863,61	4,11%	\$ 6.863,61	4,11%
C	OVERHEAD	\$ 4.930,00	\$ 1.972,00	1,18%	\$ -	0,00%	\$ 1.972,00	1,18%	\$ -	0,00%	\$ 1.972,00	1,18%	\$ 1.972,00	1,18%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 3.276,08	\$ 1.571,56	0,94%	\$ 68,98	0,04%	\$ 1.640,54	0,98%	\$ -	0,00%	\$ 1.549,43	0,93%	\$ 1.549,43	0,93%
E	CONTIGENCY	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
F	TOTAL COST (A + B + C + D + E)	\$ 167.079,99	\$ 80.149,48	47,97%	\$ 3.517,88	2,11%	\$ 83.667,36	50,08%	\$ -	0,00%	\$ 79.021,15	47,30%	\$ 79.021,15	47,30%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento,
ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineru ba Projeitu
Edifício Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV20)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

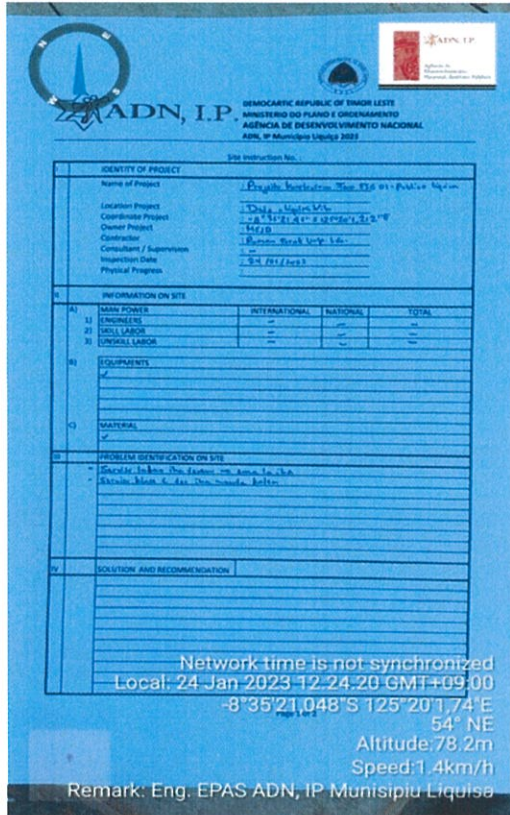



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran Projeitu: Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-
Liquisa

Kompanha : ROMAN FURAK Unip. Lda.

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	24/01/2023	Dato, Liquisa Vila	Juninho António Abrantes da Cruz	Enjeineiru ADN, IP Liquisa		 Network time is not synchronized Local: 24 Jan 2023 12:24:20 GMT+09:00 -8°35'21,048"S 125°20'1,74"E 54° NE Altitude: 78.2m Speed: 1.4km/h Remark: Eng. EPAS ADN, IP Municipiu Liquisa	 Network time is not synchronized Local: 24 Jan 2023 12:24:32 GMT+09:00 -8°35'21,108"S 125°20'1,734"E 51° NE Altitude: 77.3m Speed: 0.4km/h Remark: Eng. EPAS ADN, IP Municipiu Liquisa



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN EBF MAUBOQUE
FATIN PROJEITO : DATO, LIQUICA
DONO DO PROJEITO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

# ANEXU C2 - (LV 22)					VERIFIED BY A D N , I P											
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO		AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU						PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL BILLED	
					FULAN KOTUK	PERCENT %	FULAN NEE	PERCENT %	TOTAL PROGRESU	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US\$	\$ 3.075,00	\$ 1.487,50	1,32%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,32%	\$ 1.487,50	1,32%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,32%
II	PROVISIONAL SUM FOR DEMOLITION	DM/3	US\$	\$ 590,80	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
III	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	US\$ \$ 48.285,30	\$ 14.354,73	12,76%	\$ 472,36	0,42%	\$ 14.827,09	13,18%	\$ 13.859,77	12,32%	\$ -	0,00%	\$ 13.859,77	12,32%
IV	CLASSROOM BUILDING Cdl	C/36	(i)	US\$ \$ 43.049,04	\$ 12.328,49	10,96%	\$ -	0,00%	\$ 12.328,49	10,96%	\$ 12.025,23	10,69%	\$ -	0,00%	\$ 12.025,23	10,69%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/27	(i)	US\$ \$ 8.189,87	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST		US\$	\$ 103.190,01	\$ 28.170,72	25,03%	\$ 472,36	0,42%	\$ 28.643,09	25,45%	\$ 27.372,50	24,32%	\$ -	0,00%	\$ 27.372,50	24,32%
B	OVERHEAD		US\$	\$ 6.340,00	\$ 1.268,00	1,13%	\$ -	0,00%	\$ 1.268,00	1,13%	\$ 1.268,00	1,13%	\$ -	0,00%	\$ 1.268,00	1,13%
C	CONTIGENCY		US\$	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	GRAND TOTAL		US\$	\$ 112.530,01	\$ 29.438,72	26,16%	\$ 472,36	0,42%	\$ 29.911,09	26,58%	\$ 28.640,50	25,45%	\$ -	0,00%	\$ 28.640,50	25,45%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento,
ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineru ba Projeitu
Edifício Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV22)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



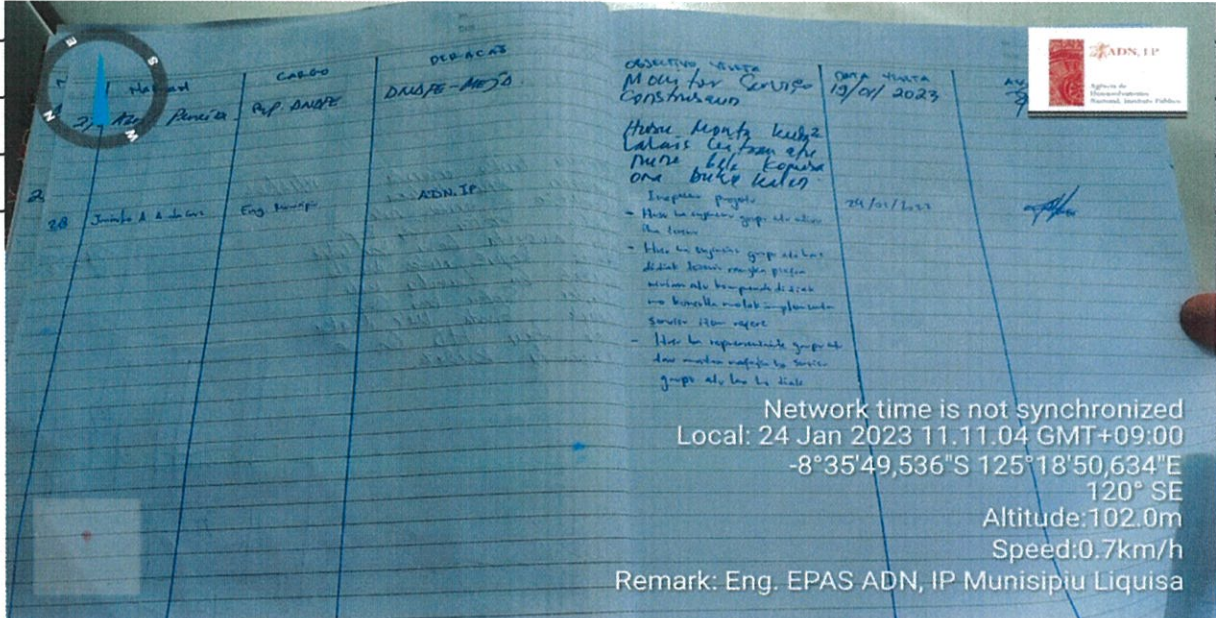
ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA EBF
MAUBOQUE

GRUPU KOMUNITARIU

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	24/01/2023	Dato, Liquisa Vila	Juninho António Abrantes da Cruz	Enjineiru ADN, IP Liquisa		 Network time is not synchronized Local: 24 Jan 2023 11:11:04 GMT+09:00 -8°35'49,536"S 125°18'50,634"E 120° SE Altitude:102.0m Speed:0.7km/h Remark: Eng. EPAS ADN, IP Munisipiu Liquisa	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA EBC 1,2,3 LIQUICA
FATIN PROJEITO : DATO, LIQUICA
DONO DO PROJEITO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

# ANEXU C2 - (LV23)						VERIFIED BY A D N , I P											
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU						PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL BILLED	
						FULAN KOTUK	PERCENT %	FULAN NEE	PERCENT %	TOTAL PROGRESU	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3		US\$	\$ 3.075,00	\$ 1.487,50	1,50%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,50%	\$ 1.487,50	1,50%	\$ -	0,00%	\$ 1.487,50	1,50%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	US\$	\$ 45.885,30	\$ 14.721,68	14,80%	\$ 14.386,84	14,47%	\$ 29.108,51	29,27%	\$ 13.338,17	13,41%	\$ 15.770,34	15,86%	\$ 29.108,51	29,27%
III	TOILET BUILDING Tb	C/39	(i)	US\$	\$ 23.742,51	\$ 7.098,51	7,14%	\$ 1.091,31	1,10%	\$ 8.189,82	8,23%	\$ 7.001,25	7,04%	\$ 1.188,57	1,20%	\$ 8.189,82	8,23%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/27	(i)	US\$	\$ 17.413,23	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST			US\$	\$ 90.116,04	\$ 23.307,69	23,44%	\$ 15.478,15	15,56%	\$ 38.785,84	39,00%	\$ 21.826,93	21,95%	\$ 38.785,84	17,05%	\$ 60.612,76	39,00%
B	OVERHEAD			US\$	\$ 6.340,00	\$ 1.268,00	1,27%	\$ 1.268,00	1,27%	\$ 2.536,00	2,55%	\$ 1.268,00	1,27%	\$ 2.536,00	1,27%	\$ 3.804,00	2,55%
C	CONTIGENCY			US\$	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	GRAND TOTAL			US\$	\$ 99.456,04	\$ 24.575,69	24,71%	\$ 16.746,15	16,84%	\$ 41.321,84	41,55%	\$ 23.094,93	23,22%	\$ 41.321,84	18,33%	\$ 64.416,76	41,55%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento,
ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu
Edificio Publiku Agua Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV23)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

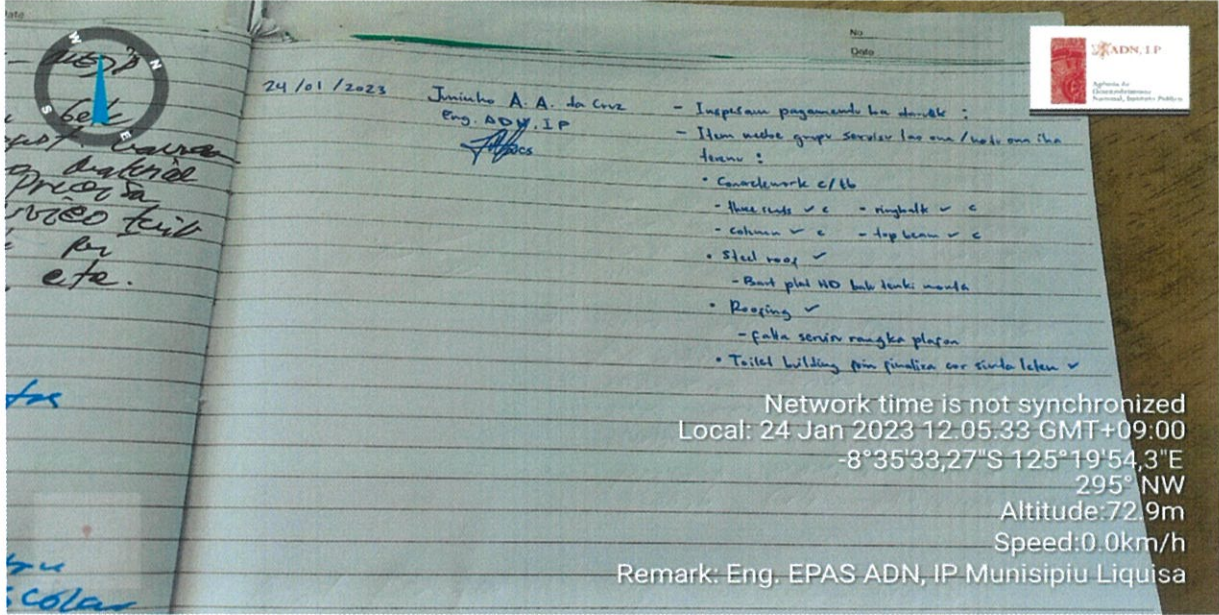


ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN KA REABILITASAUN BA EBC
1,2,3 LIQUICA

GRUPU KOMUNITARIU

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	24/01/2023	Dato, Liquisa Vila	Juninho António Abrantes da Cruz	Enjineiru ADN, IP Liquisa			

#ANEXU D - (LV29)



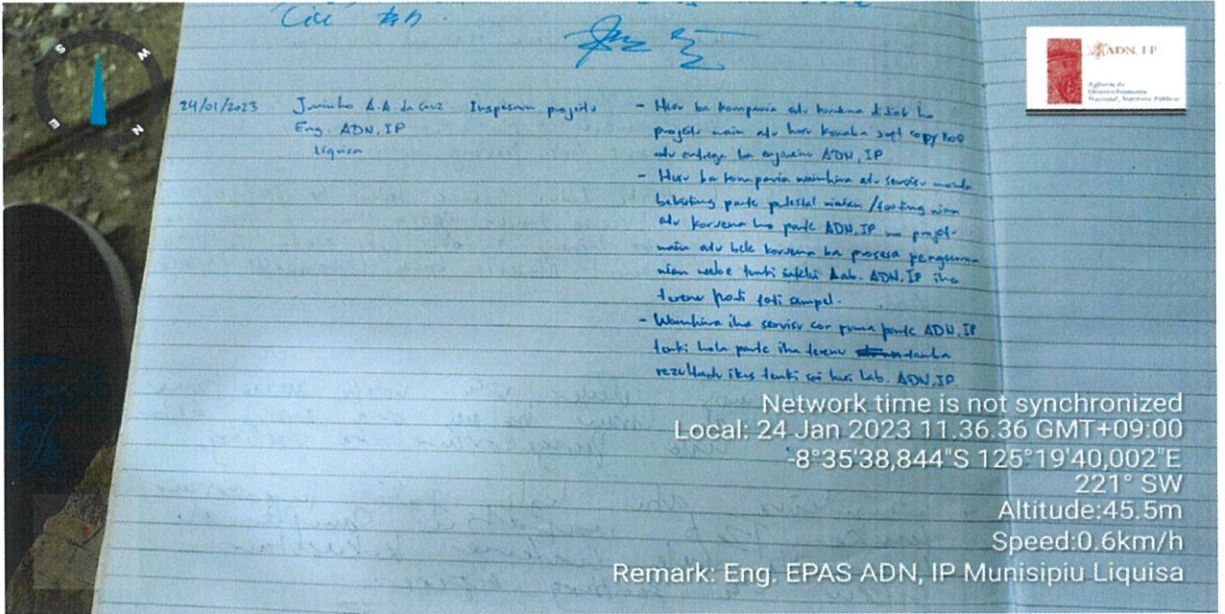
MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NEW CONSTRUCTION OF "ESCOLA CAFÉ"
BUILDING AT LIQUICA MUNICIPALITY
RICS UNIP. LDA.

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	24/01/2023	Dato, Liquisa Vila	Juninho António Abrantes da Cruz	Enjineiru ADN, IP Liquisa			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Project Name : New Construction for Water Drill Installation and House for Panel
no Jardim dos Heróis de Liquiça
Project Location : Dato, Liquiça
Project Owner : Ministério Para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional

SUMMARY C2 - (LV30)				PROGRESU FIZIKU IHA TERENU											
NO	WORK DESCRIPTION		AMOUNT USD	PROGRESU FULAN KOTUK		PROGRESU FULAN NEE		TOTAL PROGRESU		PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL BILLED	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
A	PERSIAPAN	US\$	\$ 2.170,42	\$ 885,21	2,06%	\$ -	0,00%	\$ 885,21	2,06%	\$ -	0,00%	\$ 885,21	2,06%	\$ 885,21	2,06%
B	KONSTRUKSI PONDASI WATER TANK/TANK AIR & INSTALASI PIPA	US\$	\$ 29.729,50	\$ 9.876,18	22,96%	\$ 214,25	0,50%	\$ 10.090,43	23,46%	\$ -	0,00%	\$ 9.876,18	22,96%	\$ 9.876,18	22,96%
C	KONSTRUKSI RUMAH PANEL LISTRIK	US\$	\$ 4.386,13	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	TOTAL	US\$	\$ 36.286,05	\$ 10.761,39	25,02%	\$ 214,25	0,50%	\$ 10.975,64	25,52%	\$ -	0,00%	\$ 10.761,39	25,02%	\$ 10.761,39	25,02%
E	JASA KONTRAKTOR 10% X (D)	US\$	\$ 3.628,60	\$ 1.076,14	2,50%	\$ 21,43	0,05%	\$ 1.097,56	2,55%	\$ -	0,00%	\$ 1.076,14	2,50%	\$ 1.076,14	2,50%
F	OVERHEAD	US\$	\$ 2.250,00	\$ 450,00	1,05%	\$ -	0,00%	\$ 450,00	1,05%	\$ -	0,00%	\$ 450,00	1,05%	\$ 450,00	1,05%
G	TAX 2% X (D + E + F)	US\$	\$ 843,29	\$ 245,75	0,57%	\$ 4,71	0,01%	\$ 250,46	0,58%	\$ -	0,00%	\$ 245,75	0,57%	\$ 245,75	0,57%
H	GRAND TOTAL (D + E + F + G)	US\$	\$ 43.007,95	\$ 12.533,28	29,14%	\$ 240,39	0,56%	\$ 12.773,66	29,70%	\$ -	0,00%	\$ 12.533,28	29,14%	\$ 12.533,28	29,14%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Água Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineru ba Projeitu
Edifício Publiku, Água Saneamento, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koodenadora UCVC, ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Project Name : New construction of excavation work wall, levelling work and pavement work
no Jardim de Heróis de Liquiça
Project Location : Dato, Liquiça
Project Owner : Ministério Para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional

SUMMARY C2 - (LV31)				PROGRESU FIZIKU IHA TERENU						VERIFIED BY ADN, I.P.					
NO	WORK DESCRIPTION		AMOUNT USD	PROGRESU FULAN KOTUK		PROGRESU FULAN NEE		TOTAL PROGRESU		PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL BILLED	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	US\$	\$ 3.753,42	\$ 1.000,00	1,25%	\$ -	0,00%	\$ 1.000,00	1,25%	\$ -	0,00%	\$ 1.000,00	1,25%	\$ 1.000,00	1,25%
II	PEKERJAAN TANAH	US\$	\$ 20.759,58	\$ 18.711,23	23,39%	\$ -	0,00%	\$ 18.711,23	23,39%	\$ -	0,00%	\$ 18.711,23	23,39%	\$ 18.711,23	23,39%
III	SALURAN/DRAINASE & TEMBOK PENAHAN	US\$	\$ 38.874,75	\$ 1.513,34	1,89%	\$ 324,49	0,41%	\$ 1.837,83	2,30%	\$ -	0,00%	\$ 1.513,34	1,89%	\$ -	1,89%
A	TOTAL	US\$	\$ 63.387,75	\$ 21.224,57	26,53%	\$ 324,49	0,41%	\$ 21.549,06	26,93%	\$ -	0,00%	\$ 21.224,57	26,53%	\$ 19.711,23	26,53%
B	CONTRACTOR FEE (10% X A)	US\$	\$ 6.338,78	\$ 2.122,46	2,65%	\$ 32,45	0,04%	\$ 2.154,91	2,69%	\$ -	0,00%	\$ 2.122,46	2,65%	\$ 1.971,12	2,65%
C	OVERHEAD	US\$	\$ 2.500,00	\$ 750,00	0,94%	\$ -	0,00%	\$ 750,00	0,94%	\$ -	0,00%	\$ 750,00	0,94%	\$ 750,00	0,94%
D	TAX 2% X (A + B + C)	US\$	\$ 1.444,53	\$ 481,94	0,60%	\$ 7,14	0,01%	\$ 489,08	0,61%	\$ -	0,00%	\$ 481,94	0,60%	\$ 448,65	0,60%
E	CONTINGENCY (10% X A)	US\$	\$ 6.338,78	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
F	GRAND TOTAL	US\$	\$ 80.009,83	\$ 24.578,96	30,72%	\$ 364,08	0,46%	\$ 24.943,04	31,17%	\$ -	0,00%	\$ 24.578,96	30,72%	\$ 22.880,99	30,72%

Inspeksaun Husi:

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P.

Verifika Husi:

Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineru ba Projeitu
Edifício Publiku, Agua Saneamento, ADN, I.P.

Sertifika Husi:

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVO, ADN, I.P.

**INVOICE SUMMARY
CONSULTING SERVICES FOR**

**Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to
Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads**



**MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO**
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Interim Billing No. : Janeiro , 2023

CONTRACT							ADN REVIEW				
No.	Description	Contract Amount	Contract Amendement No.1	Contract Amendement No.2	Contract Amendement No.3	Contract Amendement No.4	Previous	Progress Fevereiro	Total to Date	weight %	Balance
A.	REMUNERATION										
	Key Expert (International)	3,613,250.00	3,613,250.00	3,653,250.00	5,117,362.00	5,328,957.80	4,760,060.25	199,740.95	\$ 4,959,801.20	64.47%	\$ 369,156.60
	Non- Key Expert (National)	753,000.00	857,000.00	857,000.00	1,257,247.00	1,276,964.03	1,159,077.64	24,999.10	\$ 1,184,076.74	15.39%	\$ 92,887.29
B	REIMBURSABLE EXPENSES									0.00%	
	Reimbursable Expenses (including Perdiem, International Travel, Miscellaneous Travel and other reimbursable expenses) & Support Administrative Staff	497,550.00	497,550.00	506,550.00	771,492.00	731,458.14	566,299.84	15,131.47	\$ 581,431.31	7.56%	\$ 150,026.83
C.	Contingency	700,000.00	596,000.00	547,000.00	547,000.00	-	-	-	\$ -	0.00%	\$ -
E	SUB-TOTAL I	5,563,800.00	5,563,800.00	5,563,800.00	7,693,101.00	7,337,379.97	\$ 6,485,437.72	239,871.52	\$ 6,725,309.24	87.42%	\$ 612,070.73
TOTAL		\$ 5,563,800.00	\$ 5,563,800.00	\$ 5,563,800.00		\$ 7,337,379.97					
	Income Tax on Non-Resident Experts (10%)	\$ 361,325.00	\$ 436,625.00	\$ 436,625.00		\$ 7,337,379.97					
	Income Tax on Resident Experts (10%)	\$ 75,300.00	\$ -	#REF!		0.00					
	incoming tax on Corporation / Withholding Tax (4%)	\$ 222,552.00	\$ 222,552.00	\$ 222,552.00		355,721.03					
	Total Estimate for Indirect Local Tax	\$ 659,177.00	\$ 659,177.00	\$ 659,177.00		659,177.00					
	Grand Total / Contract Amount	\$ 6,222,977.00	\$ 6,222,977.00	\$ 6,222,977.00		\$ 7,693,101.00					

Checked by :

Verified by:

Certified by


Eng. Teresa Gomes
(Eng. Ba Projeto Impristimo Consultan e Contractor I.T.I, ADN, I.P.)


Eng. Remigio C.S. Dos Santos
(Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, ADN, I.P.)


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
(Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade , ADN, I.P.)


Eng. Tito Edgar F.N de Jesus
(Eng. Ba Projeto Impristimo Consultan e Contractor I.T.I, ADN, I.P.)


Eng. Aniceto da Costa
(Eng. Ba Projeto Impristimo Consultan e Contractor I.T.I, ADN, I.P.)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
MÍNISTRO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Agência de
Desenvolvimento
Nacional - Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Teresa Gomes												2023																															Observasaun																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Município	MUNICIPIO DILI NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Município / Posto	No.		Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		Janeiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1		National road no. 1 Upgrading project Manatuto - Baucau (package A01-02)Package A01-02/sta 56+400-114+102(56.82km)	Shanghai Construction Group Co.Ltd Jv PT. Brantas Abipraya(Persero)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

[illegible]

Janeiro



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Tito Edgar F. N. de Jesus						2023																															Observasaun																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Município	MUNICIPIO DILI NO POSTOS						Janeiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Município / Posto	No.		Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo		Tu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	National road no. 1 Upgrading project Manatuto - Baucau (package A01-02)Package A01-02/sta 56+400-114+102(56.82km)	Shanghai Construction Group Co.,Ltd Jv PT. Brantas Abipraya(Persero)		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



2023

Naran Eng.	Vidal Guterres	2023																															Observasaun				
Município	MUNICIPIO DILI NO POSTOS																																				
Município / Posto	No.	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		Janeiro																														
							Sa	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	National road no. 1 Upgrading project Manatuto - Baucau (package A01-02)Package A01-02/sta 56+400-114+102(56.82km)	Shanghai Construction Group Co.,Ltd Jv PT. Brantas Abipraya(Persero)		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																															PHO
						Actual																															
2	National road no. 1 Upgrading project Dili - Manatuto (package A01-01) (km 12+966.66-km 61+706.66)	Sinohydro Corporation Limited		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																															FHO
						Actual																															
3	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																															PHO
						Actual																															
4	RNUSP/ Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Baucau - Lautem Section : Sta. 123 + 105 to Sta. 182 + 040 (with Exceptions)	CBMI Const.Co.,Ltd / Chongqing Road Engineering (GroupCo.,Ltd (Joint venture)		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																														Encontro DED Konsultan landing Facility. M BCU, M. Vqq	
						Actual																															
5	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae-Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Const.Co.,Ltd / Chongqing Road Engineering (GroupCo.,Ltd (Joint venture)		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																														Encontro DED Konsultan landing Facility. M BCU, M. Vqq	
						Actual																															
6	Road Network Upgrading Project (RNUP) Upgrading and Maintanace of Dili (Air Port Junction - Tibar)Road - Section 2 (Tasitolu - Tibar Road Link A03-01/ Sta 8 + 740 - Sta 13 + 290)	China Wu Yi Co.,Ltd		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																														Encontro DED Konsultan landing Facility. M Baucau, M. Viqueque	
						Actual																															
7	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrandng project and maintance of Dili- Ainaro Road Lot 3(Solerema - Bandudatu Section (Km 34 +620 - Km 64 + 000)(29km)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																														FHO	
						Actual																															
8	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrandng and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aitutu section (km 64+00 -km 89+000) (ICB/034MPW-2013)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																														FHO	
						Actual																															
9	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrandng and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	Chongqing International Construction Corporation		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																														FHO	
						Actual																															
10	Road Network Upgrading Sector Project Consulting Services : Preparation of Designs for 169 Km of National Roads (Baucau to Lospalos, Lautem to Com and Baucau to Viqueque) (ADB LOAN no . 3020 - TIM and 3021 - TIM)	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunhua Engineering and Consulting Co.,Ltd.		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																														PHO	
						Actual																															
11	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunhua Engineering and Consulting Co.,Ltd.		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																														Encontro DED Urban Ainaro,	
						Actual																															
12	Upgrading and Maintenance of Laclubar Jet Natarabora Roads Sta. 100+360 - 144+995 Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction CO Lda		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																														PHO	
						Actual																															
13	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Laulara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili-Ainaro Road (Lots 1 - 5)	Kunhua Eng. & Consulting Co.,Ltd in Joint Venture with Dongsung Eng. Co.,Ltd., and in Association with Desing Science, INC., and Kai Watu Kmanek Consultants, Unip Lda		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																														Halo Palnu Monotorizasaun	
						Actual																															
14	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620 km) Municipality Aileu	China Wu Yi Co.,Ltd		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																														Halo Monotorizasaun	
						Actual																															
15	Consulting Services for Project Implementation and Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120), Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste.	Intercontinental Consultantst and Technocrats Pvt.Ltd. (India) in Association With Infra Consultants in the Philis, (kp) Inc. (Philippines) (As Sub - Consultant) and Dezernolve Timor Leste (Detlie) Consultant, Lda (Timor Leste (As sub - Consultant)		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																													Halo Relatorio Monotorizasaun		
						Actual																															
16	Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120)	China Railway JV COVEC		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																														Enkontro ho PMU	
						Actual																															
17	Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste.	China Railway JV COVEC		IMPRESTIM O	ADB (LOAN)	Plan																														halo Relatorio	
						Actual																															

[illegible]



[illegible]
