



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU COVALIMA

NOVEMBRO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO COVALIMA

NOVEMBRO 2022

Prepara Husi :

(Eng. Madelino D J Magno)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Covalima ADN, I.P

(Eng. Domingos Soares Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Covalima ADN, I.P

(Eng. Prezenzio L C D Ximenes)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Covalima ADN, I.P

(Eng. Bosco Diniz de Sousa)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Covalima ADN, I.P

(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Município Covalima ADN, I.P

Verifica Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P

(Eng. Remigio da C. Soares dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transporte e Irrigação, ADN, I.P

(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifica Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE.....	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Covalima	3
1.3. Lista Projectos	6
II. PROGRESU FISIKU	21
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	21
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	21
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu.....	21
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	22
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu.....	22

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Covalima	5
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Covalima	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Covalima Por Fundus Finansiamentos	7
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Covalima Por Sectores	11
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Covalima Por Ministerio	16
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Covalima	20

I. INTRODUCTION


1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional,I.P ou ADN, I.P. hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Presidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P. hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN, I.P. nian maka atu aseguara katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P. hanesan insituto Público (IP), ADN, I.P. nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimentu nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvimentu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio Covalima

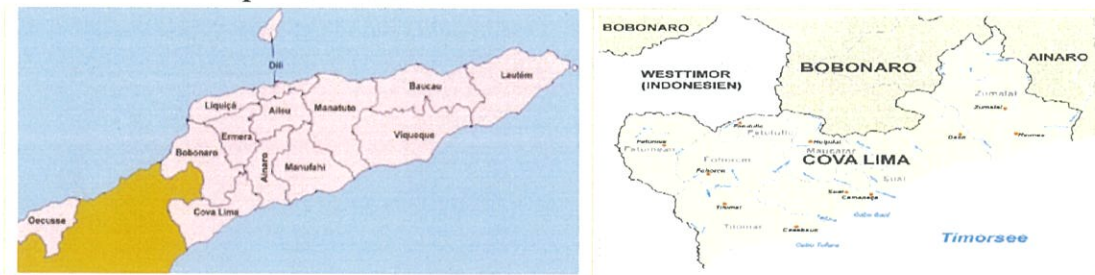

Hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Covalima iha area luan 1,226 km², ho populasaun ema nain – 59,455 tuir Sensus 2010. Munisipiu Covalima iha Posto

Administrativo 7, Sucus 30 no aldeias 148 ne'ebé hatudu iha Tabela 1. Posto Administrativo Zumalai iha Sucus barak liu kompara ho Sucus seluk iha Administrasaun Munisipal Cova-Lima.

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias

Fatululik		Fohorem		Zumalai		Maucatar	
Sucus	Aldeia	Sucus	Aldeia	Suku	Aldeia	Sucus	Aldeia
Fatululik	3	Dato 2	3	Tashilin	4	Belecassac	7
Taroman	5	Dato 3	3	fatutetu	5	Holpilat	6
		Fohorem	5	lepo	5	Matai	4
		Lactos	4	Lour	7	Ogues	5
				Mape	3		
				Raimea	4		
				Ucecai	2		
				Zulo	4		
Total	8		15		34		22
Suai		Timolar		Fatumean			
sucus	Aldeia	sucus	Aldeia	Suku	Aldeia		
Beco	11	Beiseuk	7	Belulik leten	4		
Debos	9	lalawa	6	fatumean	4		
Camnaça	4	Maudemo	7	Nunu	4		
Labarai	5	Casabauk	3				
Suai Loro	5						
	43		23		12		

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 39

Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Covalima

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Covalima/Suai								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engenheiro		4				4	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
Total			5				5	

Tabela 1.2. : Lista Asset ADN,I.P Municipio Covalima

ASET ADN,IP MUNICIPIO COVALIMA								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1				1	Eletricidade, odamatan, janela, ho plumbing presija hadia no pinta foun
2	Kareta		1				1	
3	Desktop HP / Monitor		1				1	Diak
4	Laptop HP		1				1	Presija Troka no aumenta 1
5	Printer HP (Kiik hitam&Mutin)		1				1	Aat presija troka (A3 warna)
6	UPS		1				0	
7	Armario File		2				2	1 Aat
8	Armario Tau hena		3				3	Diak
9	Meja escritorio		1				1	Diak
10	Meja han		1				1	Diak

11	Meja TV (kiik)		1				1	Diak
12	Kadeira han		6				6	Diak
13	Kadeira Rotan + Massa		6				6	Diak
14	Sofa		1 Set				1	Aat presija troka
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3		3 Set				3	Sprei presija troka
16	Jeleira		1				1	Diak
17	Water Dispenser		1				1	Aat
18	TV + Parabola		1 Set				1	Aat
19	AC		4				4	1 aat, 3 presija manutensaun
20	Kompor		1				1	Aat
21	Kompor Gas		1				1	Aat
22	Rack Piring		1				1	Diak
23	Water Pump Sanyo		1				1	Diak

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dadus projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Covalima Por Fundus Finansiamentos

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + FUNDU COVID-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik	2	\$ 2,745,409.37	81.02%
2	Fatumea	5	\$ 4,001,670.86	74.52%
3	Fohorem	8	\$ 8,327,418.54	83.79%
4	Maucatar	4	\$ 1,639,034.35	55.41%
5	Multy Posto	5	\$ 5,614,470.32	81.98%
6	Suai Villa	26	\$ 86,760,234.54	89.54%
7	Tilomar	9	\$ 2,240,664.36	51.75%
8	Zumalai	16	\$ 22,463,076.04	64.31%
Grand Total		75	\$ 133,791,978.38	82.95%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik	1	\$ 2,445,005.95	86.59%
2	Fatumea	1	\$ 3,407,674.66	78.79%
3	Fohorem	4	\$ 7,282,268.51	95.05%
4	Maucatar	2	\$ 1,326,918.81	56.19%
5	Multy Posto	3	\$ 5,471,153.29	83.57%
6	Suai Villa	10	\$ 84,429,538.98	90.49%
7	Tilomar	3	\$ 1,143,572.50	56.50%
8	Zumalai	8	\$ 19,799,020.63	65.09%
Grand Total		32	\$ 125,305,153.33	85.37%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik			
2	Fatumea			
3	Fohorem	2	\$ 823,468.03	0.00%
4	Maucatar			
5	Multy Posto	2	\$ 143,317.03	21.06%
6	Suai Villa	6	\$ 1,211,412.57	54.00%
7	Tilomar	4	\$ 877,157.49	34.83%
8	Zumalai	2	\$ 807,886.00	33.98%
Grand Total		16	\$ 3,863,241.12	32.73%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik			
2	Fatumea	1	\$ 228,246.62	96.66%
3	Fohorem			
4	Maucatar			
5	Multy Posto			
6	Suai Villa			
7	Tilomar	1	\$ 186,843.31	98.57%
8	Zumalai	1	\$ 177,630.77	96.79%
Grand Total		3	\$ 592,720.70	97.30%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik	1	\$ 300,403.42	35.69%
2	Fatumea			
3	Fohorem			
4	Maucatar	1	\$ 242,501.42	51.26%
5	Multy Posto			
6	Suai Villa			
7	Tilomar	1	\$ 33,091.06	72.00%
8	Zumalai			
Grand Total		3	\$ 575,995.90	44.33%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik			
2	Fatumea	3	\$ 365,749.58	20.90%
3	Fohorem	2	\$ 221,682.00	25.19%
4	Maucatar	1	\$ 69,614.12	54.87%
5	Multy Posto			
6	Suai Villa	6	\$ 585,794.35	27.95%
7	Tilomar			
8	Zumalai	5	\$ 1,678,538.64	66.28%
Grand Total		17	\$ 2,921,378.69	49.52%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FUNDU COVID-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik			
2	Fatumea			
3	Fohorem			
4	Maucatar			
5	Multy Posto			
6	Suai Villa	4	\$ 533,488.64	87.54%
7	Tilomar			
8	Zumalai			
Grand Total		4	\$ 533,488.64	87.54%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Covalima Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO COVALIMA		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos	2	\$ 72,430,992.54	92.84%
2	Agua E Saneamento	1	\$ 264,381.80	100.00%
3	Edificios Publicos	9	\$ 2,585,789.57	59.67%
4	Edukasaun	18	\$ 2,722,556.08	24.86%
5	Eletrifikasaun Nasional	5	\$ 2,730,729.02	61.19%
6	Estradas	24	\$ 40,767,708.41	71.22%
7	Flood Control	3	\$ 1,338,610.18	44.23%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	7	\$ 1,507,681.83	63.69%
9	Pontes	2	\$ 8,755,658.60	95.58%
10	Saude	4	\$ 687,870.35	90.95%
	Grand Total	75	\$ 133,791,978.38	82.95%

NO	SECTOR PROJECTO	Fatululik		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos			
4	Edukasaun			
5	Eletrifikasaun Nasional			
6	Estradas	1	\$ 300,403.42	35.69%
7	Flood Control			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun			
9	Pontes	1	\$ 2,445,005.95	86.59%
10	Saude			
	Grand Total	2	\$ 2,745,409.37	81.02%

NO	SECTOR PROYECTO	Fatumea		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos			
4	Edukasaun	3	\$ 365,749.58	20.90%
5	Eletrifikasaun Nasional			
6	Estradas	1	\$ 3,407,674.66	78.79%
7	Flood Control			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun			
9	Pontes			
10	Saude	1	\$ 228,246.62	96.66%
Grand Total		5	\$ 4,001,670.86	74.52%

NO	SECTOR PROYECTO	Fohorem		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos			
4	Edukasaun	2	\$ 221,682.00	25.19%
5	Eletrifikasaun Nasional			
6	Estradas	2	\$ 823,468.03	0.00%
7	Flood Control			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 971,615.86	68.98%
9	Pontes	1	\$ 6,310,652.65	99.06%
10	Saude			
Grand Total		8	\$ 8,327,418.54	83.79%

NO	SECTOR PROYECTO	Maucatar		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos			
4	Edukasaun	1	\$ 69,614.12	54.87%
5	Eletrifikasaun Nasional			
6	Estradas	2	\$ 1,326,918.81	56.19%
7	Flood Control			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	1	\$ 242,501.42	51.26%
9	Pontes			
10	Saude			
Grand Total		4	\$ 1,639,034.35	55.41%

NO	SECTOR PROYECTO	Multy Posto		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos			
4	Edukasaun			
5	Eletrifikasaun Nasional			
6	Estradas	3	\$ 5,430,116.11	82.93%
7	Flood Control			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	2	\$ 184,354.21	53.84%
9	Pontes			
10	Saude			
Grand Total		5	\$ 5,614,470.32	81.98%

NO	SECTOR PROYECTO	Suai Villa		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos	2	\$ 72,430,992.54	92.84%
2	Agua E Saneamento	1	\$ 264,381.80	100.00%
3	Edificios Publicos	4	\$ 593,329.82	57.01%
4	Edukasaun	7	\$ 1,406,000.97	11.64%
5	Eletrifikasaun Nasional	2	\$ 1,218,543.47	34.52%
6	Estradas	6	\$ 9,496,118.52	90.88%
7	Flood Control	2	\$ 1,078,087.00	37.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun			
9	Pontes			
10	Saude	2	\$ 272,780.42	80.97%
	Grand Total	26	\$ 86,760,234.54	89.54%

NO	SECTOR PROYECTO	Tilomar		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos	4	\$ 795,799.75	33.04%
4	Edukasaun			
5	Eletrifikasaun Nasional	1	\$ 323,539.34	87.54%
6	Estradas	2	\$ 825,271.62	43.97%
7	Flood Control			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	1	\$ 109,210.34	60.83%
9	Pontes			
10	Saude	1	\$ 186,843.31	98.57%
	Grand Total	9	\$ 2,240,664.36	51.75%

NO	SECTOR PROYECTO	Zumalai		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos	1	\$ 1,196,660.00	78.70%
4	Edukasaun	5	\$ 659,509.41	51.97%
5	Eletrifikasaun Nasional	2	\$ 1,188,646.21	81.35%
6	Estradas	7	\$ 19,157,737.24	62.65%
7	Flood Control	1	\$ 260,523.18	74.10%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun			
9	Pontes			
10	Saude			
	Grand Total	16	\$ 22,463,076.04	64.31%

Dados detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Covalima Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro	1	\$ 1,196,660.00	78.70%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 260,523.18	74.10%
3	Ministerio Da Justica	1	\$ 149,292.80	61.70%
4	Ministerio Das Obras Publicas	40	\$ 54,839,864.86	73.73%
5	Ministerio Do Interior	1	\$ 337,328.10	0.00%
6	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	19	\$ 2,905,884.88	23.29%
7	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 264,381.80	100.00%
8	Ministerio Saude	8	\$ 1,373,959.16	80.85%
9	Ministerio Tranportes E Komunikaun	2	\$ 72,430,992.54	92.84%
10	Ministerio Turismo Komercio E Industria	1	\$ 33,091.06	72.00%
Grand Total		75	\$ 133,791,978.38	82.95%

NO	DONO DO PROJECTO	Fatululik		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas	2	\$ 2,745,409.37	81.02%
5	Ministerio Do Interior			
6	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu			
7	Ministerio Planu E Ordenamentu			
8	Ministerio Saude			
9	Ministerio Tranportes E Komunikaun			
10	Ministerio Turismo Komercio E Industria			
Grand Total		2	\$ 2,745,409.37	81.02%

NO	DONO DO PROJECTO	Fatumea		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas	1	\$ 3,407,674.66	78.79%
5	Ministerio Do Interior			
6	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	3	\$ 365,749.58	20.90%
7	Ministerio Planu E Ordenamentu			
8	Ministerio Saude	1	\$ 228,246.62	96.66%
9	Ministerio Tranportes E Komunikaun			
10	Ministerio Turismo Komercio E Industria			
Grand Total		5	\$ 4,001,670.86	74.52%

NO	DONO DO PROJECTO	Fohorem		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas	6	\$ 8,105,736.54	85.39%
5	Ministerio Do Interior			
6	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	2	\$ 221,682.00	25.19%
7	Ministerio Planu E Ordenamentu			
8	Ministerio Saude			
9	Ministerio Tranportes E Komunikaun			
10	Ministerio Turismo Komercio E Industria			
Grand Total		8	\$ 8,327,418.54	83.79%

NO	DONO DO PROJECTO	Maucatar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas	3	\$ 1,569,420.23	55.43%
5	Ministerio Do Interior			
6	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	1	\$ 69,614.12	54.87%
7	Ministerio Planu E Ordenamentu			
8	Ministerio Saude			
9	Ministerio Tranportes E Komunikasaun			
10	Ministerio Turismo Komercio E Industria			
Grand Total		4	\$ 1,639,034.35	55.41%

NO	DONO DO PROJECTO	Multy Posto		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas	5	\$ 5,614,470.32	81.98%
5	Ministerio Do Interior			
6	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu			
7	Ministerio Planu E Ordenamentu			
8	Ministerio Saude			
9	Ministerio Tranportes E Komunikasaun			
10	Ministerio Turismo Komercio E Industria			
Grand Total		5	\$ 5,614,470.32	81.98%

NO	DONO DO PROJECTO	Suai Villa		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica	1	\$ 149,292.80	61.70%
4	Ministerio Das Obras Publicas	10	\$ 11,792,748.99	80.13%
5	Ministerio Do Interior			
6	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	8	\$ 1,589,329.77	10.30%
7	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 264,381.80	100.00%
8	Ministerio Saude	4	\$ 533,488.64	87.54%
9	Ministerio Tranportes E Komunikaun	2	\$ 72,430,992.54	92.84%
10	Ministerio Turismo Komercio E Industria			
Grand Total		26	\$ 86,760,234.54	89.54%

NO	DONO DO PROJECTO	Tilomar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas	4	\$ 1,258,021.30	56.64%
5	Ministerio Do Interior	1	\$ 337,328.10	0.00%
6	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu			
7	Ministerio Planu E Ordenamentu			
8	Ministerio Saude	3	\$ 612,223.90	69.13%
9	Ministerio Tranportes E Komunikaun			
10	Ministerio Turismo Komercio E Industria	1	\$ 33,091.06	72.00%
Grand Total		9	\$ 2,240,664.36	51.75%

NO DONO DO PROJECTO		Zumalai		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro	1	\$ 1,196,660.00	78.70%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 260,523.18	74.10%
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas	9	\$ 20,346,383.45	63.74%
5	Ministerio Do Interior			
6	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	\$ 659,509.41	51.97%
7	Ministerio Planu E Ordenamentu			
8	Ministerio Saude			
9	Ministerio Tranportes E Komunikasaun			
10	Ministerio Turismo Komercio E Industria			
Grand Total		16	\$ 22,463,076.04	64.31%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Covalima

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Poduktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Fatululic	2,173	1,840	1,989	1,878	1,782
Fatumean	3,516	830	903	921	862
Fohorem	4,442	1,216	1,282	981	963
Maucatar	9,764	2,886	2,893	2,056	1,930
Suai	28,195	8,707	8,409	5,590	5,488
Tilomar	8,515	2,394	2,281	1,967	1,873
Zumalai	14,266	3,923	3,966	3,255	3,122

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu porsentagen actual fulan ida ne'e hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare'e iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hare'e #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

1. Durante Equipa ADN,I.P. Covalima halo monitorizasaun no Inspeksaun hasoru obstaklo sira iha Terreno mak hanesan:
 - Iha Covalima Projeto PKRIE balu iha fulan ida nee ami la konsege ba tamba asesu dalan ba fatin neba la diak iha tempo udan ho nu'ne progresu fisiko sei mantein ho Fulan kotuk nian nian.
 - Projeto balu atu hahu Kontrator no Projeto nain la informa ba Parte AND,IP no servisu nonok deit to pagamento mak foin informa.
 - Dados ne'ebe ami prepara exemplo hanesan Lista Geral Anexo A no Lista progresu Fisiko Anexo B, tuir Back no Sumario nebe ami Prepara bazeia ba iha terreno. Maibe liu tiha loron balu lista Geral Anexo A nia resultado progresu fisiko la hanesan fali ho saida mak ami update ona. Ida nee bele fo inpakto ba superior sira halo apresentasaaun.
- ❖ Durante Equipa ADN,I.P. Covalima halo servisu iha Eskritorio ADN,I.P. Municipiu hasoru obstaklo sira mak hanesan:
 - Ami nafatin hasoru difikuldade ba Printer, tamba printer ne'ebe iha at no la funsiona ona.

- La Iha UPS ne'ebe atu suporta Komputador

- Obstacle parte Eletricidade

1. Iha Fulan Novembro nia laran iha projetu balun ne'ebe ami la bele ba halo inspesaun tamba espasu ba lina eletricidade mak laiha desde tinan kotuk no mos tempu latoo.

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

- Sujere ba Parte Unidade UAP karik halo verifikasaun tenke hatama mos osan ba **Access Road** bazeia ba Kondisaun iha terreno hodi nune bele Orienta Grupo ou Kompanhia normaliza dalan sira ba terreno.
 - Atu Informa ba superior sira atu informa superior sira husi Lina Ministerial wanhira atu hahu servisu tenke iha lina Kordenasaun ho Tekniko sira iha Municipio.
 - Sujere ba parte baze de Dados atu hare asunto ne tamba wanhira lista Geral ou Lista Anexo A, nia progresu fisiko la bazeia ba progresu iha terreno.
 - Husu ba Parte ITC atu Prepara Printer ida ba Municipio Covalima hodi nune bele Fasilita servisu iha Municipio.
 - Husu ba Parte IT atu prepara UPS hodi nune ahi mate derepente bele *save* lalais servisu ne'ebe seidauk *save* ba Komputador.
 - Rekomendasaun parte Eletricidade
1. Husu ba Parte superior atu bele hare ba kestaun hirak ne'e tamba karik projetu ne'ebe laiha ona lina eletricidade, husi parte ADN, I.P. sei kontinua ba halo inspesaun ou lae.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Covalima

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Covalima/Suai						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Enjineiru	Madelino Deonizo José Magno	170	Enjineiru EPAS		
		Domingos Soares Martins	160	Enjineiru ITI		
		Prezenzio Legorio do Carmo Dias Ximenes	212	Enjineiru EPAS		
		Bosco Dinis de Sousa	215	Enjineiru ITI		

		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		
2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Agustinho Amaral	068	Motorista		



ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL NOVEMBRO)

LOKALIZASAUN PROJETU

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Suai Villa	Covalima	Divita Unip. Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052	\$ 230.560,12	July 18, 2017	100,00%	90,00%	\$ 207.504,11	\$ 23.056,01	PHO	Projeto ida ne iha Fase Retensaun
2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Halihun, MDGS, Matai, MDGS Halihun - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Suai Villa	Covalima	Eron Power, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000435	\$ 987.983,35	Sept. 1, 2016	24,00%	21,57%	\$ 213.139,22	\$ 774.844,13	PENDENTE	Projeto ida ne Parado Hela
3	Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	AEROPORTOS	Suai Villa	Covalima	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	ICB/035/TGAP-2013	\$ 67.687.412,46	April 24, 2014	100,00%	92,65%	\$ 62.709.401,97	\$ 4.978.010,49	PHO	La halo monitorizasaun tamba kompanhia la hadia defeitus iha tereno hahu husi 2020 to agora.
4	Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	AEROPORTOS	Suai Villa	Covalima	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	ICB/035/TGAP-2013	\$ 4.743.580,08	May 30, 2014	100,00%	95,67%	\$ 4.538.294,94	\$ 205.285,14	PHO	Projeto ida ne ate a data la iha informasaun
5	New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Suai Villa	Covalima	Consorcio Naroman Covalima, Group Lda	SSS/266/MOPTC-2016	\$ 1.223.216,12	July 10, 2016	72,06%	67,52%	\$ 825.918,46	\$ 397.297,66	Paradu/abandona	Projecto ne'e depois de halo pagamentu iha fulan abril 2022, ate agora seidauk kontinua servisu iha tereno, tamba kompanhia sei hein rejultadu VO nebe'e seidauk iha aprovasaun husi dono projecto.
6	Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Suai Villa	Covalima	Consorcio Zemo Lda	SSS/346/MOPTC-2016	\$ 970.974,30	Dec. 12, 2016	74,13%	74,13%	\$ 719.783,67	\$ 251.190,63	ON-GOING	Projecto ne'e hahu fali ona servisu iha tereno.
7	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge to Zumalai Jct. Phase II 5+020 - 10+140 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Suai Villa	Covalima	Nobre Labadai Unipessoal, Lda	SSS/051/MOPTC-2017	\$ 3.802.446,29	Sept. 11, 2017	100,00%	98,83%	\$ 3.758.112,41	\$ 44.333,88	FHO	Fisiku 100%, Intrega ona final ba dono projecto.
8	New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Giovania	RDTL-MS-DNA-NCB-20-150	\$ 189.960,54	Sept. 1, 2020	95,44%	95,44%	\$ 181.291,82	\$ 8.668,72	FHO	Projeto ida ne FHO ona, no Osan Balansu \$ <u>8.668,72</u> fila ba Kofre Estado
9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Suai Villa	Covalima	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	\$ 262.452,00	Sept. 23, 2020	93,51%	84,15%	\$ 220.866,46	\$ 41.585,54	PHO	Projeto ida nee remata ona no iha fase retensaun nia laran
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital, Ministry of Health Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Manu Bey Unip Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-184	\$ 70.747,68	Jan. 11, 2021	91,69%	91,69%	\$ 64.870,21	\$ 5.877,47	PHO	Projeto ida nee remata ona no iha fase retensaun nia laran
11	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge - Zumalai Jct. Phase I 0+000 - 5+020 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Suai Villa	Covalima	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/322/MOPTC-2016	\$ 3.445.877,60	Nov. 21, 2016	100,00%	96,54%	\$ 3.326.487,08	\$ 119.390,52	FHO	Halo pagamentu retensaun 12% (FHO)
12	New Construction of Interior Fence for Prison in Suai Municipality	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Fraternity Unipessoal Lda	MJ-062/OUTUBRO/2021	\$ 149.292,80	Sept. 19, 2021	92,60%	61,70%	\$ 92.120,77	\$ 57.172,03	ON-GOING	Projeto ida nee agora remata ona no hein pagamento final no Break Down ba Contigencia
13	Prefurasaun No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Suai Villa	Covalima	Paya's Sisters	002.LM/RDTL/MPIE/A.D.N /Da Rfq/VI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	\$ 264.381,80	July 3, 2019	100,00%	100,00%	\$ 264.381,80	\$ 1.398,61	FHO	Projeto ida nee halo ona pagamento retensaun balu, tuir CPV nebe parte finansas ADN,I.P Prepara, no balansu \$ 1.398.61 sei halo tan pagamento iha tinan 2022
14	Projeto Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB/04/MEJD/DNA/2021	\$ 183.328,80	26-11-2021	48,11%	0,00%	\$ -	\$ 183.328,80	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Laen Tolu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	MEJD PKRIE EBF LAEN TOLU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 128.627,66	Oct. 15, 2021	48,52%	25,00%	\$ 32.163,19	\$ 96.464,47	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Holbolu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	MEJD PKRIE EBF HOLBULO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 72.561,80	Oct. 15, 2021	52,26%	52,26%	\$ 37.921,70	\$ 34.640,10	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela



ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL NOVEMBRO)

LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
17	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maucola	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	MEJD PKRIE EBF MAUCOLA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 65.448,21	Oct. 15, 2021	56,58%	56,58%	\$ 37.030,50	\$ 28.417,71	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Busacucun	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	MEJD PKRIE EPE BUSACUCUN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 112.750,45	Oct. 15, 2021	49,29%	25,00%	\$ 28.183,50	\$ 112.750,45	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Akar Laran	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	MEJD PKRIE EPE AKAR LARAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 102.502,01	Oct. 15, 2021	50,94%	26,02%	\$ 26.669,42	\$ 75.832,59	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESGP Suai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	MEJD PKRIE ESGP SUAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103.904,22	Oct. 15, 2021	50,05%	50,05%	\$ 52.003,81	\$ 51.900,41	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
21	Project Construction of Check Dam in Zolai River Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	FLOOD CONTROL	Suai Villa	Covalima	Santana Diak Unipessoal Lda	MOP-W-220003	\$ 560.804,96	Jan. 31, 2022	99,92%	53,08%	\$ 297.693,25	\$ 560.804,96	ON-GOING	PHO
22	New Construction of Path way Conection of ICU Building and Isolation Building at Hospital Referral Suai, Covalima, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Suai Villa	Covalima	Milcha Unip Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-234	\$ 10.328,42	Jan. 15, 2022	87,25%	0,00%	\$ -	\$ 10.328,42	PHO	Projeto ida nee remata ona no iha fase retensaun nia laran
23	New Construction of ESCOLA CAFE building in Covalima Municipality	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	JLC,LDA., IN JOINT VENTURE WITH AITULA, LDA	NCB/321/MEJD-2021	\$ 820.206,62	08-Jun-22	10,97%	0,00%	\$ -	\$ 820.206,62	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
24	Project Check Dam In Haimanu River, Municipality of Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	FLOOD CONTROL	Suai Villa	Covalima	Romante Pty. Ltd	MOP-W-220005	\$ 517.282,04	Jan. 24, 2022	66,11%	19,57%	\$ 101.252,82	\$ 517.282,04	ON-GOING	Prjeto ida ne agora lao hela
25	Roads Maintenance Section : Urban Road Maintenance Suai (45 KM) Periodic Maintenance Suai Vila (Tribunal and DIO Office) Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Suai Villa	Covalima	Jufado	RFQ/CD/MOP/22003A	\$ 24.132,86	09-May-22	18,14%	0,00%	\$ -	\$ 24.132,86	ON-GOING	
26	Road Maintenance Section : Urban Road Suai Town 2021, Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Suai Villa	Covalima	Joelamor, Unipessoal, Lda		\$ 29.471,35	01-Jun-22	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 29.471,35	ON-GOING	
27	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Tilomar	Covalima	Lalenok Fronteira, unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 0000366	\$ 323.539,34	July 6, 2016	100,00%	87,54%	\$ 283.223,74	\$ 40.315,60	ON-GOING	Projeto ida ne remata ona no la iha tan item seluk atu kontinua
28	River normalization and protection in Fatuk Oan	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Tilomar	Covalima	Consorcio Lorico Covalima	SSS/263/MOPTC-2016	\$ 482.705,06	July 10, 2016	75,18%	75,18%	\$ 362.886,49	\$ 119.818,57	ABANDONA	Projecto refere abandona kleur ona husi kompanhia ate agora la iha aktividade servisu iha tereno.
29	Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Suai- Covalima	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Tilomar	Covalima	Ota Gelor	RDTL/73/GMTAC/X/2015	\$ 33.091,06	Aug. 8, 2014	80,00%	72,00%	\$ 23.825,57	\$ 9.265,49	ON-GOING	Projeto ida ne agora rehabilita fali ona ba fatin karantina
30	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Tilomar	Covalima	Joia Camenasa Unip. Lda	06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019	\$ 186.843,31	Sept. 16, 2019	98,57%	98,57%	\$ 184.165,90	\$ 2.677,41	FHO	Projeto ida ne FHO ona, no Osan Balansu \$ <u>2.677,41</u> fila ba Kofre Estado



ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL NOVEMBRO)

LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
31	R4D Rural Roads Routine Maintenance Dato Tolu Chainage 0+000 - 9+600, Lookeu Chainage 0+000 - 6+000, Casabau 008 Chainage 0+000 - 3+000, Casabau 012 Chainage 0+000 - 3+500, Casabau 018 Chainage 0+000 - 2+700, Lauwala Chainage 0+000 - 3+500, Boardikun - Mape Chainage 0+000 - 8+000, Naguidal - Lepo Chainage 0+000 - 4+000 Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Tilomar	Covalima	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	RDTL	\$ 109.210,34	Aug. 13, 2019	72,42%	60,83%	\$ 66.429,82	\$ 42.780,52	PENDENTE	Projeto nee paradu tamba husi kompanhia sei hein hela rekomendasaun pagamentu anterior nian nebe to agora seidauk tama iha konta bankaria kompania nian.
32	Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Tilomar	Covalima	Figelato Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-217	\$ 129.595,17	Abr. 21, 2021	99,78%	89,80%	\$ 116.381,60	\$ 13.213,57	PHO	Projeto ida ne agora iha fase retensaun
33	New Construction of Health Post and Doctor House Buiding in Beisuk, Tilomar, Covalima, Timor Leste (Niquir)	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Tilomar	Covalima	Caramé Unip Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-071	\$ 295.785,42	Aug. 18, 2021	52,29%	41,48%	\$ 122.690,87	\$ 173.094,55	ON-GOING	Projeto ida nee agora lao hela, maibe kontrator ezekurta servisu tarde no servisu la tuir espek nebe iha kontrato. Ho nune Parte A D N kordena ona ho parte Ministerio da Saude atu hare hamotuk assunto ida nee
34	New Construction of U.P.F. Building in Covalima. LOT.1: New Construction of U.P.F. Building at Mota Masin	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	EDIFICIOS PUBLICOS	Tilomar	Covalima	Joia Camenasa Unip. Lda	NCB/087/MI-2021	\$ 337.328,10	Jan. 10, 2022	28,99%	0,00%	\$ -	\$ 337.328,10	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
35	R4D Rural Roads Rehabilitation Tilomar Border Chainage 0+000-3+000 Municipio Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Tilomar	Covalima	Unidade Unip Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD/22003	\$ 342.566,56	July 30, 2022	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 342.566,56	ON-GOING	
36	R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 9+600 - 11+100 Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Fohorem	Covalima	Unidade Unip Lda	RT/027/MOP-2019	\$ 284.245,59	Dec. 20, 2019	100,00%	89,64%	\$ 254.811,22	\$ 29.434,37	FHO	FHO, halo ona rekomendasaun pagamentu retensaun. Nomos projecto ne'e entrega ona ba dono projecto
37	R4D Rural Road Rehabilitation Dato- Tolu Chainage 11+100 - 12+600 Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Fohorem	Covalima	Verde Caisahe Lda	NCB/057/MOP-2019	\$ 283.833,62	March 1, 2020	100,00%	90,00%	\$ 255.450,25	\$ 28.383,37	PHO	Progresu Fisiku 100% PHO
38	Construction, Rehabilitation and Installation of Clean Water with System Gravitation in Suco Fohorem Villa	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Fohorem	Covalima	Loro Metan Unipesola. Lda	SSS/293/MOPTC-2016	\$ 403.536,65	Nov. 22, 2016	45,05%	39,65%	\$ 159.993,44	\$ 243.543,21	FHO	Projeto ida ne agora kontinua abandonan no abandona hahu kedas husi tinan 2018.
39	Construction of Baer Bridge	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Fohorem	Covalima	PT. Duta Graha	RDTL- 120002189	\$ 6.310.652,65	23-May-10	100,00%	99,06%	\$ 6.251.415,94	\$ 59.236,71	PENDENTE	Projeto refere atinge 100% iha tinan 7 liu ba kotuk, balansu nebe'e iha presija halo konfirmasaun ho dono projeto e nomos hare fila fali iha pagamentu anterior nian, hodi nune bele hatene lolos osamentu nebe'e sei iha balansu nia disposizaun
40	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF 1,2 Aitos	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Fohorem	Covalima	MEJD PKRIE EBF 1,2 AITOS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109.418,63	Oct. 15, 2021	25,38%	25,38%	\$ 27.767,83	\$ 81.650,80	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
41	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESTV Nutetu de Fohorem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Fohorem	Covalima	MEJD PKRIE ESTV NUTETU DE FOHOREM	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 112.263,37	Oct. 15, 2021	25,00%	25,00%	\$ 28.063,18	\$ 84.200,19	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
42	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taroman - Dato-Tolu Chainage, Covalima 0+000-2+000 (2.0 Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Fohorem	Covalima	Verde Caisahe Lda	RT/038/MOP-2021	\$ 341.768,07	08-Mar-22	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 341.768,07	ON-GOING	Iha terreno Kontrator seidauk hahu servisu
43	Rehabilitasaun Estrada Rural, Natardik - Dato Tolu Roads Chainage 0+000-3+000, Municipio Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Fohorem	Covalima	Delta Nova Junior unip lda	MOP/CD/NCB-R/ERD/22009	\$ 481.699,96	Sept. 30, 2022	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 481.699,96	ON-GOING	
44	Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Fatumea	Covalima	Be'e horis, Unip. Lda	SSS/103/MOPTC-2017	\$ 3.407.674,66	Sept. 15, 2017	90,63%	78,79%	\$ 2.685.016,49	\$ 722.658,17	ON-GOING	Progressu Fisiku finaliza ona 100% iha tereno, no hein aprovasaun CCO No.2 husi Dono projecto hodi lori ba prosesu pagamentu nian iha periode tuir mai.



ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL NOVEMBRO)

LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
45	Konstrusaun Edifício Posto Saude No Konstrusaun Recidencia Mediku Nanu-Fatumea	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Fatumea	Covalima	Unidade Unip Lda	05/A.M.Covalima/KDM-AMP/VII/2019	\$ 228.246,62	Sept. 16, 2019	96,66%	96,66%	\$ 220.615,79	\$ 7.630,83	ON-GOING	Projeto ida ne halo ona pagamento Retensaun bazeia ba Justifikasaun husi Projeto nain. Balansu osan \$ <u>7.630,83</u> fila ba Kofre Estado
46	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macocon	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Fatumea	Covalima	MEJD PKRIE EBF 1,2 MACOCON	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 75.543,07	Oct. 15, 2021	56,45%	56,45%	\$ 42.641,19	\$ 32.901,88	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
47	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Fatumea	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Fatumea	Covalima	MEJD PKRIE EBC FATUMEA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 174.827,75	Oct. 15, 2021	50,06%	30,83%	\$ 53.903,46	\$ 120.924,29	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
48	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Traducama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Fatumea	Covalima	MEJD PKRIE EBF TRADUCAMA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 115.378,76	Oct. 15, 2021	50,12%	29,30%	\$ 33.802,61	\$ 81.576,15	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
49	Road Maintenance Section Taroman - Datorua Fatumeta (A016) 13.15 Km Section Covalima Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	Fatululik	Covalima	Jufado	NCB-MOP-190014	\$ 300.403,42	Oct. 8, 2019	39,66%	35,69%	\$ 107.214,96	\$ 193.188,46	ABANDONA	Kondisaun aktual agora iha tereno abandona hela tamba kompanhia la iha finaseiru nebe'e suficiente hodi apoiu aktividade servisu iha tereno
50	Construction of Taroman Bridge	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Fatululik	Covalima	Ensul Engenharia, S.A.	RDTL- 11005004	\$ 2.445.005,95	Nov. 10, 2011	100,00%	86,59%	\$ 2.117.121,82	\$ 327.884,13	PENDENTE	Projeto refere atinge 100% iha tinan 7 liu ba kotuk, balansu nebe'e iha presija halo konfirmasaun ho dono projetu e nomos hare fila fali iha pagamentu anterior nian, hodi nune bele hatene lolo osamentu nebe'e sei iha balansu nia disposizaun
51	Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore to Aldeia iha Roads Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Maucatar	Covalima	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/135/MOPTC-2016	\$ 955.722,62	July 29, 2016	97,84%	78,02%	\$ 745.653,07	\$ 210.069,55	PHO	Progressu fisiku finaliza ona 100% iha tereno, Maibe dezenho no Variation seidaik iha aprovasaun husi dono projecto
52	Rebidding of Project Road Maintenance Sections ; Suai, Maucatar - Lelaus Municipality Covalima (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maucatar	Covalima	Verde Caisahe Lda	NCB-MOP-190010	\$ 242.501,42	Dec. 15, 2019	56,96%	51,26%	\$ 124.309,81	\$ 118.191,61	ABANDONA	Kondisaun aktual agora iha tereno Abandona hela tamba kompanhia la iha finaseiru nebe'e suficiente hodi apoiu aktividade servisu iha tereno
53	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Has-Ain	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maucatar	Covalima	MEJD PKRIE EBF HAS -AIN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 69.614,12	Oct. 15, 2021	54,87%	54,87%	\$ 38.194,23	\$ 31.419,89	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
54	Rural Road Rehabilitation of Lookou Chainage 6+000-9+000 (3km), Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Maucatar	Covalima	Holpilat Unipessoal Lda	RT/037/MOP-2021	\$ 371.196,19	Jan. 3, 2022	12,72%	0,00%	\$ -	\$ 371.196,19	ON-GOING	On Progress
55	New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Zumalai	Covalima	Foho Rua Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000404	\$ 466.841,13	July 6, 2016	82,01%	73,80%	\$ 344.551,37	\$ 122.289,76	ON-GOING	Projeto ida ne remata ona no la iha tan item seluk atu kontinua
56	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Zumalai	Covalima	Mania Unip, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000427	\$ 721.805,08	Sept. 1, 2016	96,00%	86,24%	\$ 622.455,90	\$ 99.349,18	ON-GOING	Projeto ida ne remata ona no la iha tan item seluk atu kontinua
57	Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Zumalai	Covalima	Clardel Interprice Unip Lda	SSS/227/MOPTC-2016	\$ 3.026.312,56	Sept. 13, 2016	70,39%	60,64%	\$ 1.835.036,16	\$ 1.191.276,40	ABANDONA	Obra ne'e sei iha balansu osamentu ba fisiku kontrusaun nian, maibe obra ne'e Abandona iha tinan 2019 to agora la iha informasaun ruma husi kompanhia konaba continuidade obra refere.
58	Rehabilitation of Road From Haemanu Bridge Zumalai Junction (0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Zumalai	Covalima	Star Suai, Lda	SSS/050/MOPTC-2017	\$ 3.461.708,40	Sept. 7, 2017	100,00%	89,51%	\$ 3.098.636,12	\$ 363.072,28	PHO	Fisiku 100%, PHO.
59	Rehabilitation of Roads and Slope Protection Road Section: Be'e Mean Zumalai National Road (250 M)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Zumalai	Covalima	Roman Junior Unipessoal, Lda	SSS/049/MOPTC-2017	\$ 3.986.121,62	Sept. 5, 2017	96,33%	86,56%	\$ 3.450.202,89	\$ 535.918,73	PHO	Hein prosesu pagamentu 100%,no halo PHO ba dono projecto
60	Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Zumalai	Covalima	Aitula Construction, Lda	002/NC-ZC/II/2015	\$ 1.196.660,00	Aug. 1, 2015	87,44%	78,70%	\$ 941.722,09	\$ 254.937,91	ON-GOING	Projeto ida remata ona no ate a data kompanhia seidaik submete pagamento final



ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL NOVEMBRO)

LOKALIZASAUN PROJETU

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
61	Konstrusaun Eskola Tekniko Professional Zumalai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Zumalai	Covalima	Sabudoj Unip. Lda	03/A.M.Covalima/KDM-AMP/VII/2019	\$ 177.630,77	July 15, 2019	96,79%	96,79%	\$ 171.935,57	\$ 5.695,20	FHO	Projeto ida ne halo ona FHO. No Osan balansu \$ 5.695,20 fila fali ba Kofre Estado
62	Rural Roads Periodik Maintenance Lepo - Lour Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Zumalai	Covalima	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	MPW-W-190260	\$ 73.033,49	Dec. 19, 2019	89,63%	80,66%	\$ 58.910,72	\$ 14.122,77	PHO	Obra ne'e remata ona 100%,iha fulan Junho 2021 hein submisaun pagamentu husi kompanhia ba dono projecto
63	Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai (50+900 km) Road Section : Jct A16 Uele'o - Jct A02 Zumalai (35+120) Road Section 8 : Zulo - Jct Zumalai (30+100 - 35+120 km) Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Zumalai	Covalima	Octogono Constr. Unip. Lda	SSS/067/MOPTC-2017	\$ 3.748.915,76	Sept. 7, 2017	52,05%	43,24%	\$ 1.621.097,23	\$ 2.127.818,53	ON-GOING	Projecto ne'e lao hela
64	Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai (50+900 km), Road Section : Jct A16 Uele'o - Jct A02 Zumalai (35+120) Road Section 7 : Fatulito - Zulo (25+800 - 30+100) Municipality Bobonaro - Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Zumalai	Covalima	Marino Enterprises, Lda	SSS/065/MOPTC-2017	\$ 4.314.282,59	Sept. 12, 2017	48,95%	43,04%	\$ 1.857.021,22	\$ 2.457.261,37	ON-GOING	
65	Manutensaun no Konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Oebaba - Covalima	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	FLOOD CONTROL	Zumalai	Covalima	Lifran Unip. Lda	RDTL-2021-15595	\$ 260.523,18	Oct. 5, 2021	97,04%	74,10%	\$ 193.054,93	\$ 67.468,25	PHO	Progressu iha tereno finaliza ona 100%,hein prosesu pagamentu
66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Zumalai	Covalima	MEJD PKRIE EBC ZUMALAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 160.283,28	Oct. 15, 2021	53,12%	53,12%	\$ 85.142,51	\$ 75.140,77	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
67	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Uce-Cai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Zumalai	Covalima	MEJD PKRIE EBF UCE-CAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109.981,83	Oct. 15, 2021	25,01%	25,01%	\$ 27.506,75	\$ 82.475,08	ON-GOING	Projeto ida ne asesu dalan ba terreno susar tebes, ho nune plano sei up date progressu fisico iha fulan Setembro wanhira Grupo hadia ona dalan hodi mobiliza material ba terreno
68	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Zumalai	Covalima	MEJD PKRIE EBF SALASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110.004,78	Oct. 15, 2021	50,32%	28,11%	\$ 30.925,14	\$ 79.079,64	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
69	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soiliga	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Zumalai	Covalima	MEJD PKRIE EBF SOILIGA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 101.608,75	Oct. 15, 2021	51,24%	26,78%	\$ 27.215,29	\$ 74.393,46	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
70	Mola - Mota Masin/Roads Maintenance section Zumalai - Mota Masin Border (Multy Year program/RM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Zumalai	Covalima	Delta Dini	MPW - W - 220008	\$ 547.362,82	Jan. 3, 2022	17,09%	14,89%	\$ 81.498,89	\$ 465.863,93	ON-GOING	Projeto ida nee agora lao hela



ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL NOVEMBRO)

LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
71	Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro and Manufahi	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Multy Posto	Covalima	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/029/MOPTC-2017	\$ 379.631,20	July 7, 2017	100,00%	84,10%	\$ 319.270,12	\$ 60.361,08	ON-GOING	Ate a data la iha informasaun konaba projeto ida nee
72	Rehabilitation of Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 17+500-23+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Multy Posto	Covalima	Expres Distribution Services Unip. Lda	SSS/318/MOPTC-2016	\$ 4.941.274,57	Dec. 9, 2016	100,00%	84,68%	\$ 4.184.042,48	\$ 757.232,09	PHO	Obra ne'e remata ona 100%, iha tinan 2019 hein submisaun pagamentu husi kompanhia ba dono projecto, nomos iha problema adisional nebe'e seidaik iha aprovasaun husi dono do projeto.
73	Manutensaun Estrada Lookeu. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200-Municipal of Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Multy Posto	Covalima	Manu Bey Unip Lda	RT/079/MOPTC-2016	\$ 150.247,52	Aug. 19, 2016	51,08%	45,97%	\$ 69.074,95	\$ 81.172,57	PENDENTE	Projecto refere abandona / parado iha tinan 2019 ate agora tamba problema menus financeiro, Agora dadaun iha ona projeto foun halo manutensaun ba lokasaun refere husi ILO-R4D nebe'e implementa hela husi kompania Futuru Manemesak
74	Rural Roads Routine Maintenance Lepo-Lour Sta 0+000-3+000, Naguidal - Lour Sta 0+000-5+000, Boardikun - Mape Sta 0+000-8+000 / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Multy Posto	Covalima	Futuro Mane Mesak Unip Lda	MPWTC-CD-170015	\$ 34.106,69	Jan. 8, 2017	88,48%	88,48%	\$ 30.176,89	\$ 3.929,80	PENDENTE	Agora dadaun iha ona projeto foun halo manutensaun ba lokasaun refere husi ILO-R4D nebe'e implementa hela husi kompania Futuru Manemesak, ho kontratu foun
75	Rural Roads Routine Maintenance Dato Tolu Cha 0+000 - 9+600, Lookeu Cha 0+000 - 6+000, Casabauc 008 Cha 0+000 - 3+000, Casabauc 012 Cha 0+000 - 3+500, Casabauc 018 Cha 0+000 - 2+700, Lalawa Cha 0+000 - 3+500, Boraikun Mape Cha 0+000 - 8+000, Naguidal Lepo Cha 0+000 - 4+000 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Multy Posto	Covalima	Lufi Raica Unip Lda	MPW/WNCB/R/190048	\$ 109.210,34	Aug. 13, 2019	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 109.210,34	PENDENTE	Projeto ne'e seidaik implementa iha tereno, no iha ona projeto foun husi R4D implementa ona area fefere husi kompanhia Futuru-Manemesak.
TOTAL									\$ 133.791.978,38			83,03%	\$ 111.090.147,61	\$ 23.130.358,95		

Prepara Husi :

(Eng. Madelino D J Magno)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Covalima ADN, I.P

(Eng. Prezenzio L C D Ximenes)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Covalima ADN, I.P

(Eng. Domingos Soares Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Covalima ADN, I.P

(Eng. Bosco Dinis de Sousa)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Covalima ADN, I.P

(Silvino D.R.R. Soares)
Eng. M & E, Municipio Covalima ADN, I.P

Sertifica Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA											Novembro 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	LOKALIZASAUN PROJETU		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU							
1	The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Suai Villa	Covalima	Divita Unip. Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052	\$ 230.560,12	July 18, 2017	100,00%	0,00%	100,00%
2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Haliun, MDGS, Matai, MDGS Haliun - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Suai Villa	Covalima	Eron Power, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000435	\$ 987.983,35	Sept. 1, 2016	24,00%	0,00%	24,00%
3	Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	AEROPORTOS	Suai Villa	Covalima	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	ICB/035/TGAP-2013	\$ 67.687.412,46	April 24, 2014	100,00%	0,00%	100,00%
4	Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	AEROPORTOS	Suai Villa	Covalima	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	ICB/035/TGAP-2013	\$ 4.743.580,08	May 30, 2014	100,00%	0,00%	100,00%
5	New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Suai Villa	Covalima	Consortio Naroman Covalima, Group Lda	SSS/266/MOPTC-2016	\$ 1.223.216,12	July 10, 2016	70,84%	1,22%	72,06%
6	Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Suai Villa	Covalima	Consortio Zemo Lda	SSS/346/MOPTC-2016	\$ 970.974,30	Dec. 12, 2016	74,13%	0,00%	74,13%
7	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge to Zumalai Jct. Phase II 5+020 - 10+140 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Suai Villa	Covalima	Nobre Labadai Unipessoal, Lda	SSS/051/MOPTC-2017	\$ 3.802.446,29	Sept. 11, 2017	100,00%	0,00%	100,00%
8	New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Giovania	RDTL-MS-DNA-NCB-20-150	\$ 189.960,54	Sept. 1, 2020	95,44%	0,00%	95,44%
9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Suai Villa	Covalima	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	\$ 262.452,00	Sept. 23, 2020	93,51%	0,00%	93,51%
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital, Ministry of Health Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Manu Bey Unip Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-184	\$ 70.747,68	Jan. 11, 2021	91,69%	0,00%	91,69%
11	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge - Zumalai Jct. Phase I 0+000 - 5+020 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Suai Villa	Covalima	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/322/MOPTC-2016	\$ 3.445.877,60	Nov. 21, 2016	100,00%	0,00%	100,00%
12	New Construsaun of Interior Fence for Prison in Suai Municipality	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Fraternity Unipessoal Lda	MJ-062/OUTUBRO/2021	\$ 149.042,88	Sept. 19, 2021	92,60%	0,00%	92,60%
13	Prefurasaun No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Suai Villa	Covalima	Paya's Sisters	002.LM/RDTL/MPJE/A.D. N/Da Rfq/VI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	\$ 264.381,80	July 3, 2019	100,00%	0,00%	100,00%
14	Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB:04/MEJD/DNA/2021	\$ 183.328,80	26-11-2021	20,70%	27,41%	48,11%
15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Laen Tolu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	MEJD PKRIE EBF LAEN TOLU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 128.627,66	Oct. 15, 2021	26,07%	22,45%	48,52%
16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Holbolu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	MEJD PKRIE EBF HOLBOLU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 72.561,80	Oct. 15, 2021	27,42%	24,84%	52,26%
17	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maucola	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	MEJD PKRIE EBF MAUCOLA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 65.448,21	Oct. 15, 2021	33,17%	23,41%	56,58%
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Busacucun	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	MEJD PKRIE EPE BUSACUCUN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 112.750,45	Oct. 15, 2021	29,80%	19,49%	49,29%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA													
					LOKALIZASAUN PROJETU						Novembro 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Akar Laran	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	MEJD PKRIE EPE AKAR LARAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 102.502,01	Oct. 15, 2021	28,23%	22,72%	50,94%
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Suai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	MEJD PKRIE ESGP SUAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103.904,22	Oct. 15, 2021	33,46%	16,59%	50,05%
21	Project Construction of Check Dam in Zolai River Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	FLOOD CONTROL	Suai Villa	Covalima	MOP-W-220003	Santana Diak Unipessoal Lda	\$ 560.804,96	Jan. 31, 2022	98,00%	1,92%	99,92%
22	New Construction of Path way Conection of ICU Building and Isolation Building at Hospital Referral Suai, Covalima, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Suai Villa	Covalima	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-234	Milcha Unip Lda	\$ 10.328,42	Jan. 15, 2022	87,25%	0,00%	87,25%
23	New Construction of ESCOLA CAFE building in Covalima Municipality	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUKASAUN	Suai Villa	Covalima	NCB/321/MEJD-2021	JLC,LDA., IN JOINT VENTURE WITH AITULA, LDA	\$ 820.206,62	08-Jun-22	10,68%	0,29%	10,97%
24	Project Check Dam In Haimanu River, Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	FLOOD CONTROL	Suai Villa	Covalima	MOP-W-220005	Romante Pty. Ltd	\$ 517.282,04	Jan. 24, 2022	49,68%	16,43%	66,11%
25	Roads Maintenance Section : Urban Road Maintenance Suai (45 KM) Periodic Maintenance Suai Vila (Tribunal and DIO Office) Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Suai Villa	Covalima	RFQ/CD/MOP/22003A	Jufado	\$ 24.132,86	09-May-22	18,14%	0,00%	18,14%
26	Road Maintenance Section : Urban Road Suai Town 2021, Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Suai Villa	Covalima	MPW-W-220067	Joelamor, Unipessoal, Lda	\$ 29.471,35	01-Jun-22	0,00%	0,00%	0,00%
27	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Tilomar	Covalima	Lalenok Fronteira, unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 323.539,34	July 6, 2016	100,00%	0,00%	100,00%
28	River normalization and protection in Fatuk Oan	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Tilomar	Covalima	Consortio Lorico Covalima	SSS/263/MOPTC-2016	\$ 482.705,06	July 10, 2016	75,18%	0,00%	75,18%
29	Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Sua- Covalima	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Tilomar	Covalima	Ota Gelor	RDTL:73/GMTAC/XI/2015	\$ 33.091,06	Aug. 8, 2014	80,00%	0,00%	80,00%
30	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Tilomar	Covalima	Joia Camenasa Unip. Lda	06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019	\$ 186.843,31	Sept. 16, 2019	98,57%	0,00%	98,57%
31	R4D Rural Roads Routine Maintenance Dato Tolu Chainage 0+000 - 9+600, Lookeu Chainage 0+000 - 6+000, Casabau 008 Chainage 0+000 -3+000, Casabauc 012 Chainage 0+000 - 3+500, Casabauc 018 Chainage 0+000 - 2+700, Lauwala Chainage 0+000 - 3+500, Boardikun - Mape Chainage 0+000 - 8+000, Naguidal - Lepo Chainage 0+000 - 4+000 Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Tilomar	Covalima	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	RDTL	\$ 109.210,34	Aug. 13, 2019	72,42%	0,00%	72,42%
32	Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Tilomar	Covalima	Figelato Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-217	\$ 129.595,17	Abr. 21, 2021	99,78%	0,00%	99,78%
33	New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk, Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	SAUDE	Tilomar	Covalima	Caramé Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-21-071	\$ 295.785,42	Aug. 18, 2021	52,29%	0,00%	52,29%
34	New Construction of U.P.F. Building in Covalima. LOT.1: New Construction of U.P.F. Building at Mota Masin	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	EDIFICIOS PUBLICOS	Tilomar	Covalima	Joia Camenasa Unip. Lda	NCB/087/MI-2021	\$ 337.328,10	Jan. 10, 2022	21,44%	7,55%	28,99%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA											Novembro 2022		
					LOKALIZASAUN PROJETU								
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
35	R4D Rural Roads Rehabilitation Tilomar Border Chainage 0+000-3+000 Municipio Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Tilomar	Covalima	Unidade Unip Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD/22003	\$ 342.566,56	July 30, 2022	0,00%	0,00%	0,00%
36	R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 9+600 - 11+100 Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Fohorem	Covalima	Unidade Unip Lda	RT/027/MOP-2019	\$ 284.245,59	Dec. 20, 2019	100,00%	0,00%	100,00%
37	R4D Rural Road Rehabilitation Dato- Tolu Chainage 11+100 - 12+600 Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Fohorem	Covalima	Verde Caisahe Lda	NCB/057/MOP-2019	\$ 283.833,62	March 1, 2020	100,00%	0,00%	100,00%
38	Construction, Rehabilitation and Installation of Clean Water with System Gravitation in Suco Fohorem Villa	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Fohorem	Covalima	Loro Metan Unipesola. Lda	SSS/293/MOPTC-2016	\$ 403.536,65	Nov. 22, 2016	45,05%	0,00%	45,05%
39	Construction of Baer Bridge	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Fohorem	Covalima	PT. Duta Graha	RDTL- 120002189	\$ 6.310.652,65	23-May-10	100,00%	0,00%	100,00%
40	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF 1,2 Aitos	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Fohorem	Covalima	MEJD PKRIE EBF 1,2 AITOS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109.418,63	Oct. 15, 2021	25,38%	0,00%	25,38%
41	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESTV Nutetu de Fohorem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Fohorem	Covalima	MEJD PKRIE ESTV NUTETU DE FOHOREM	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 112.263,37	Oct. 15, 2021	25,00%	0,00%	25,00%
42	Rehabilitasaun Estrada Rural, Taroman - Dato-Tolu Chainage, Covalima 0+000-2+000 (2.0 Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Fohorem	Covalima	Verde Caisahe Lda	RT/038/MOP-2021	\$ 341.768,07	08-Mar-22	0,00%	0,00%	0,00%
43	Rehabilitasaun Estrada Rural, Natardik - Dato Tolu Roads Chainage 0+000-3+000, Municipio Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Fohorem	Covalima	Delta Nova Junior unip Ida	MOP/CD/NCB-R/ERD/22009	\$ 481.699,96	Sept. 30, 2022	0,00%	0,00%	0,00%
44	Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Fatumea	Covalima	Be'e horis, Unip. Lda	SSS/103/MOPTC-2017	\$ 3.407.674,66	Sept. 15, 2017	90,63%	0,00%	90,63%
45	Konstrusaun Edificio Posto Saude No Konstrusaun Recidencia Mediku Nanu-Fatumea	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Fatumea	Covalima	Unidade Unip Lda	05/A.M.Covalima/KDM-AMP/VII/2019	\$ 228.246,62	Sept. 16, 2019	96,66%	0,00%	96,66%
46	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macocon	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Fatumea	Covalima	MEJD PKRIE EBF 1,2 MACOCON	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 75.543,07	Oct. 15, 2021	30,05%	26,40%	56,45%
47	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumea	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Fatumea	Covalima	MEJD PKRIE EBF FATUMEA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 174.827,75	Oct. 15, 2021	30,83%	19,23%	50,06%
48	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Traducama	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Fatumea	Covalima	MEJD PKRIE EBF TRADUCAMA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 115.378,76	Oct. 15, 2021	29,30%	20,82%	50,12%
49	Road Maintenance Section Taroman - Datorua - Fatumeta (A016) 13.15 Km Section Covalima Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Fatululik	Covalima	Jufado	NCB-MOP-190014	\$ 300.403,42	Oct. 8, 2019	39,66%	0,00%	39,66%
50	Construction of Taroman Bridge	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Fatululik	Covalima	Ensul Engenharia, S.A.	RDTL- 11005004	\$ 2.445.005,95	Nov. 10, 2011	100,00%	0,00%	100,00%
51	Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore to Aldeia iha Roads Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Maucatar	Covalima	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/135/MOPTC-2016	\$ 955.722,62	July 29, 2016	97,84%	0,00%	97,84%
52	Rebidding of Project Road Maintenance Sections ; Suai, Maucatar - Lelaus Municipality Covalima (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maucatar	Covalima	Verde Caisahe Lda	NCB-MOP-190010	\$ 242.501,42	Dec. 15, 2019	56,96%	0,00%	56,96%
53	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Has-Ain	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maucatar	Covalima	MEJD PKRIE EBF HAS -AIN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 69.614,12	Oct. 15, 2021	42,90%	11,96%	54,87%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA											Novembro 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	LOKALIZASAUN PROJETU		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU							
54	Rural Road Rehabilitation of Lookou Chainage 6+000-9+000 (3km), Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Maucatar	Covalima	Holpilat Unipessoal Lda	RT/037/MOP-2021	\$ 371.196,19	Jan. 3, 2022	12,72%	0,00%	12,72%
55	New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Zumalai	Covalima	Foho Rua Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000404	\$ 466.841,13	July 6, 2016	82,01%	0,00%	82,01%
56	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Zumalai	Covalima	Mania Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000427	\$ 721.805,08	Sept. 1, 2016	96,00%	0,00%	96,00%
57	Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Clardel Interprice Unip Lda	SSS/227/MOPTC-2016	\$ 3.026.312,56	Sept. 13, 2016	70,39%	0,00%	70,39%
58	Rehabilitation of Road From Haemanu Bridge Zumalai Junction (0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Star Suai, Lda	SSS/050/MOPTC-2017	\$ 3.461.708,40	Sept. 7, 2017	100,00%	0,00%	100,00%
59	Rehabilitation of be'e mean roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Roman Junior Unipessoal, Lda	SSS/049/MOPTC-2017	\$ 3.645.870,73	Sept. 5, 2017	96,33%	0,00%	96,33%
60	Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Zumalai	Covalima	Aitula Construction, Lda	002/NC-ZC/VII/2015	\$ 1.196.660,00	Aug. 1, 2015	87,44%	0,00%	87,44%
61	Konstrusaun Eskola Tekniko Professional Zumalai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Zumalai	Covalima	Sabudoir Unip. Lda	03/A.M.Coalima/KDM-AMP/VII/2019	\$ 177.630,77	July 15, 2019	96,79%	0,00%	96,79%
62	Rural Roads Periodik Maintenance Lepo - Lour Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	MPW-W-190260	\$ 73.033,49	Dec. 19, 2019	89,63%	0,00%	89,63%
63	Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai Road Section 8 : Zulo - Jct Zumalai (30+100 - 35+120 km) Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Octogono Constr. Unip. Lda	SSS/067/MOPTC-2017	\$ 3.748.915,76	Sept. 7, 2017	49,72%	2,32%	52,05%
64	Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai (50+900 km), Road Section : Jct A16 Uele'o - Jct A02 Zumalai (35+120) Road Section 7 : Fatulito - Zulo (25+800 - 30+100) Municipality Bobonaro - Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Marino Enterprises, Lda	SSS/065/MOPTC-2017	\$ 4.314.282,59	Sept. 12, 2017	48,95%	0,00%	48,95%
65	Manutensaun no konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Oebaba - Covalima	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	FLOOD CONTROL	Zumalai	Covalima	Lifran Unip. Lda	RDTL - 2021 - 15595	\$ 260.523,18	Oct ,5,2021	97,04%	0,00%	97,04%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA											Novembro 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	LOKALIZASAUN PROJETU		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU			
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU					Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Zumalai	Covalima	MEJD PKRIE EBC ZUMALAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 160.283,28	Oct. 15, 2021	39,30%	13,82%	53,12%
67	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Uce-Cai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Zumalai	Covalima	MEJD PKRIE EBF UCE-CAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109.981,83	Oct. 15, 2021	25,01%	0,00%	25,01%
68	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Zumalai	Covalima	MEJD PKRIE EBF SALASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110.004,78	Oct. 15, 2021	28,11%	22,21%	50,32%
69	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soiliga	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Zumalai	Covalima	MEJD PKRIE EBF SOILIGA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 101.608,75	Oct. 15, 2021	28,02%	23,22%	51,24%
70	Mola - Mota Masin/Roads Maintenance section Zumalai - Mota Masin Border (Multy Year program/RM)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Delta Dini	MPW - W - 220008	\$ 547.362,82	Jan. 3, 2022	17,09%	0,00%	17,09%
71	Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro and Manufahi	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Multy Posto	Covalima	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/029/MOPTC-2017	\$ 379.631,20	July 7, 2017	100,00%	0,00%	100,00%
72	Rehabilitation of Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 17+500-23+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Multy Posto	Covalima	Expres Distribution Services Unip. Lda	SSS/318/MOPTC-2016	\$ 4.941.274,57	Dec. 9, 2016	100,00%	0,00%	100,00%
73	Manutensaun Estrada Looku. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200-Municipal of Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Multy Posto	Covalima	Manu Bey Unip Lda	RT/079/MOPTC-2016	\$ 150.247,52	Aug. 19, 2016	51,08%	0,00%	51,08%
74	Rural Roads Routine Maintenance Lepo-Lour Sta 0+000-3+000, Naguidal - Lour Sta 0+000-5+000, Boardikun - Mape Sta 0+000-8+000 / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Multy Posto	Covalima	Futuro Mane Mesak Unip Lda	MPWTC-CD-170015	\$ 34.106,69	Jan. 8, 2017	88,48%	0,00%	88,48%
75	Rural Roads Routine Maintenance Dato Tolu Cha 0+000 - 9+600, Looku Cha 0+000 - 6+000, Casabauc 008 Cha 0+000 - 3+000, Casabauc 012 Cha 0+000 - 3+500, Casabauc 018 Cha 0+000 - 2+700, Lalawa Cha 0+000 - 3+500, Boraikun Mape Cha 0+000 - 8+000, Naguidal Lepo Cha 0+000 - 4+000 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Multy Posto	Covalima	Lufi Raica Unip Lda	MPW/WNCB/R/190048	\$ 109.210,34	Aug. 13, 2019	0,00%	0,00%	0,00%

(Eng. Madelino D J Magno)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Covalima
ADN, I.P.

(Eng. Prezenzio L C D Ximenes)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Covalima
ADN, I.P.

(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Municipio Covalima ADN, I.P.

Prepara Husi :

(Eng. Domingos Soares Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun,
Municipio Covalima
ADN, I.P.

(Eng. Bosco Dinis de Sousa)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio
Covalima
ADN, I.P.

Verifica Husi :

(Arc. Francisco X B D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Remigio da C. Soares dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun,
ADN, I.P.

(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P.



#ANEXU C1 (TL-7)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk,
Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)

No. kontratu : RDTL-MS-DNA-NCB-21-071

Data Inspesaun : 17 –November -2022

Fatin Inspesaun : Biseuk (Niquer), Tilomar, Covalima

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.34476142 Latetude: 125.07355645

Naran Inspector : 1.Madelino Deonizo Jose Magno

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Informasaun- Tuir resultado

*Monitirizasaun A D N nian iha Dia 17 de
Novembro 2022 la iha progrssu Fisiko ba
Fulan ida nee*

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Remark: ADN I.P. Covalima
Index number: 3485
Network: 17 Nov 2022 09:36:34 GMT+09:00
Local: 17 Nov 2022 09:36:36 GMT+09:00



Remark: ADN I.P. Covalima
Index number: 3481
Network: 17 Nov 2022 09:34:46 GMT+09:00
Local: 17 Nov 2022 09:34:49 GMT+09:00



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (TL-7)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk,
Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-21-071**





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (TL-7)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk,
Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)**
No. kontratu : **RD TL-MS-DNA-NCB-21-071**





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (TL-7)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk,
Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)**
No. kontratu : **RD TL-MS-DNA-NCB-21-071**





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (TL-7)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk,
Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-21-071**





ANEXU C1 (ZU -14)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Data Inspesaun : **30 -11-2022**

Fatin Inspesaun : **Selasa- Zumalain**

Koordinadas :


Start Point : Long : -9.123031 Latetude: 125.444578

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Servisu – (seng gelombang "custom orb" colorbond
0.35mm dipasang dengan sekrup pada baja
gording.

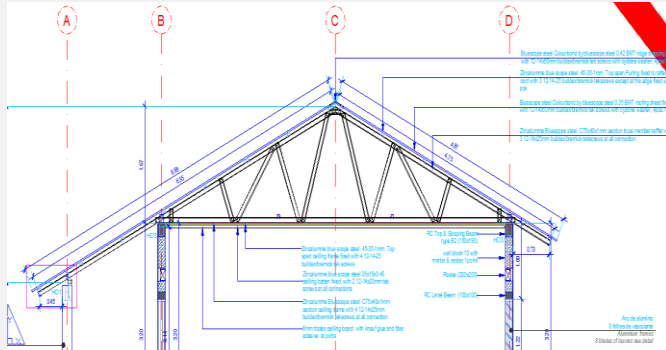

Area Send = **291 m2**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ZU -14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**



S



#ANEXU C1 (TL-4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk**

No. kontratu : **06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019**

Data Inspesaun : **04-11 -2022**

Fatin Inspesaun : Wetaba Tilomar

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.419300 Latetude: 125.114669

Naran Inspector : **1. Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Informasaun Husi Terreno

Informasaun- Inpeksaun pagamento retensaun nian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (TL-4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk**

No. kontratu : **06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019**





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (TL-4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk**

No. kontratu : **06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019**





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (TL-4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk**

No. kontratu : **06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019**



ANEXU C1 (MA-3)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Has-Ain**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Servisu – Fascia (lisplank baja)

*Bent plate 230mm girth colorbond fascia (seng plat
berwarna dengan lebar toal 230mm)*

Panjang = **50** meter





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MA-3)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Has-Ain**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**





ANEXU C1 (SV-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maucola**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Data Inspesaun : **15-11-2022**

Fatin Inspesaun : Maucola, Beco, Suai Villa

Koordinadas :


Start Point : Long : -9.208362 Latetude: 125.394975

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Servisu – (seng gelombang "custom orb" colorbond
0.35mm dipasang dengan sekrup pada baja
gording.

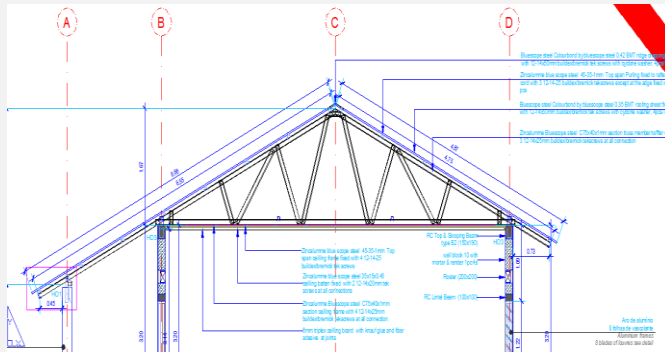

Area Send = **291** m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (SV-17)


Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maucola**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Servisu – Fascia (lisplank baja)

*Bent plate 230mm girth colorbond fascia (seng plat
berwarna dengan lebar toal 230mm)*

Panjang = **50** mete

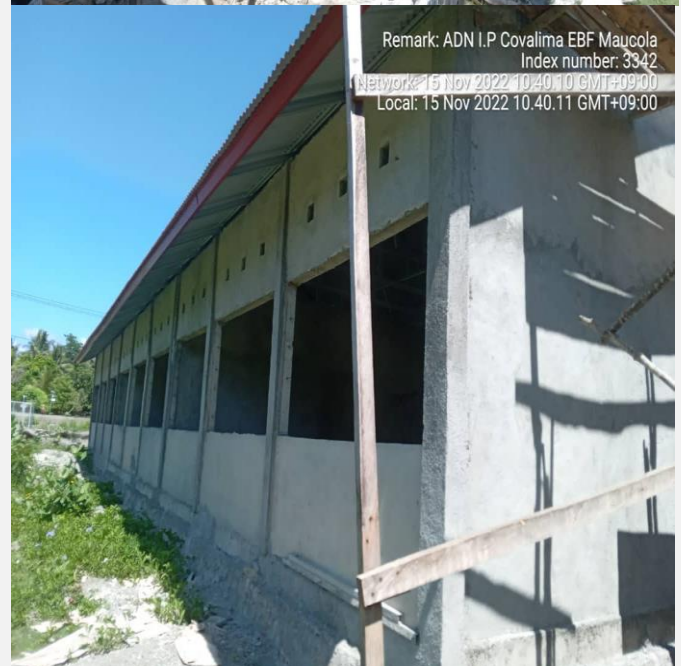



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-17)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maucola**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**





ANEXU C1 (SV-20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Suai**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Data Inspesaun : **15-11-2022**

Fatin Inspesaun : Serankotek - Suai Villa

Koordinadas :


Start Point : Long : -9.324756 Latetude: 125.244624

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Servisu – (seng gelombang "custom orb"
colorbond 0.35mm dipasang dengan sekrup
pada baja gording.

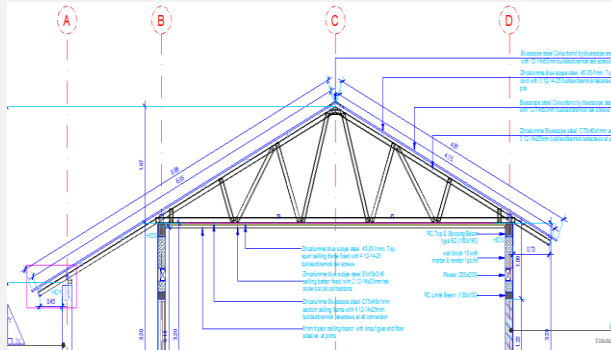

Area Send = **291 m2**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-20)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Suai**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-20)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Suai**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**



ANEXU C1 (ZU-12)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Data Inspesaun : **15-11-2022**

Fatin Inspesaun : Zulo - Zumalain

Koordinadas :


Start Point : Long : **-9.163185** Latetude: **125.447650**

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Servisu – (seng gelombang "custom orb"
colorbond 0.35mm dipasang dengan sekrup
pada baja gording.

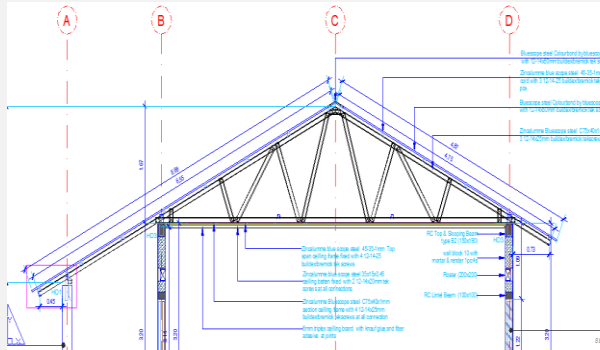

Area Send = **291** m2 x 2 Unit Building
= **582** m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (ZU-12)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Servisu – Fascia (lisplank baja)

*Bent plate 230mm girth colorbond fascia
(seng plat berwarna dengan lebar toal
230mm)*

*Panjang = **50** meter x 2 Unit Building
= 100 meter*





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ZU-12)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-18)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Busacucun**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**





#ANEXU C1 (TL-8)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of U.P.F. Building in Covalima. LOT.1: New
Construction of U.P.F. Building at Mota Masin
No. kontratu : NCB/087/MI-2021

Data Inspesaun : 16- 11-2022

Fatin Inspesaun : Mota-Masin Tilomar, Covalima

Koordinadas :

Start Point : Long : 9,4488 S Latetude: 125,0969

Naran Inspector : 1.Madelino Deonizo Jose Magno

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

**Servisu –ROOFING WORKS FOR OFFICE
WORKS**

Galv. Purlin Ø 2" = 69.32 m

Servisu –ROOFING WORKS

Galv. Purlin Ø 3" = 22.42 m

Observasaun iha tereno no Foto Aktual






#ANEXU C1 (TL-8)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of U.P.F. Building in Covalima. LOT.1: New
Construction of U.P.F. Building at Mota Masin
No. kontratu : NCB/087/MI-2021





ANEXU C1 (SV-19)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Akar Laran**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Data Inspesaun : **15-11-2022**

Fatin Inspesaun : Akar Laran Suai Villa

Koordinadas :


Start Point : Long : -9.347111 Latetude: 125.248295

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Servisu – (seng gelombang "custom orb" colorbond
0.35mm dipasang dengan sekrup pada baja
gording.

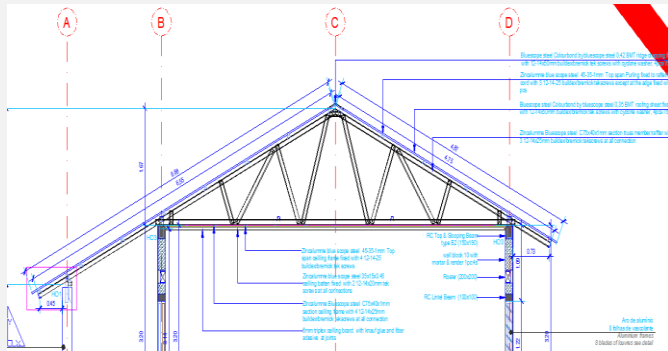

Area Send = **284.62m²**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Remark: ADN I.P. Covalima EPE Akar Laran
Index number: 3383
Network: 15 Nov 2022 11:42:12 GMT+09:00
Local: 15 Nov 2022 11:42:13 GMT+09:00



Remark: ADN I.P. Covalima EPE Akar Laran
Index number: 3390
Network: 15 Nov 2022 11:48:16 GMT+09:00
Local: 15 Nov 2022 11:48:17 GMT+09:00



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Akar Laran**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**





ANEXU C1 (SV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai**
No. kontratu : **NCB:04/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : **24-11-2022**

Fatin Inspesaun : Akar Laran Suai Villa

Koordinadas :


Start Point : Long : -9.350792 Latetude: 125.249381

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Servisu – Fence Works



60x60x3mm SHS galvanised post
approximately 3.00m long, one end cast into
concrete

Berat Qty = **3729.753 Kg**

50x50x3mm steel angle as framing (besi siku
50x50x3mm sebagai rangka)

Berat Qty = **3776.032 Kg**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai**
: **NCB:04/MEJD/DNA/2021**





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai**
: **NCB:04/MEJD/DNA/2021**





ANEXU C1 (ZU- 15)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soiliga**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Data Inspesaun : **30-11-2022**

Fatin Inspesaun : Soiliga, Zumalain

Koordinadas :


Start Point : Long : **9,0827** Latetude: **125.3789**

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Servisu – (seng gelombang "custom orb" colorbond
0.35mm dipasang dengan sekrup pada baja
gording.

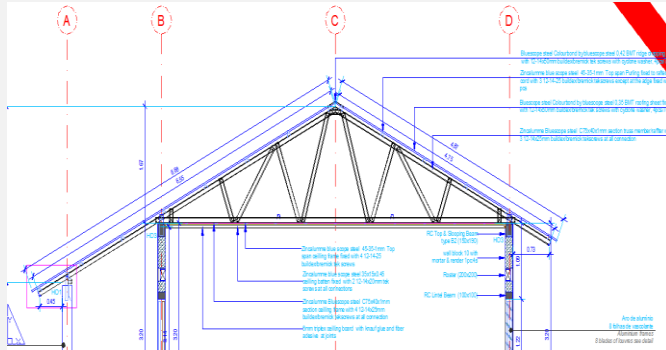

Area Send = **291 m2**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ZU- 15)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soiliga**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**





ANEXU C1 (SV-15)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Laen Tolu**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Data Inspesaun : **30-11-2022**

Fatin Inspesaun : Laen Tolu, Loro, Suai Villa

Koordinadas :


Start Point : Long : -9.364287 Latetude: 125.253958

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Servisu – (seng gelombang "custom orb" colorbond 0.35mm dipasang dengan sekrup pada baja gording.

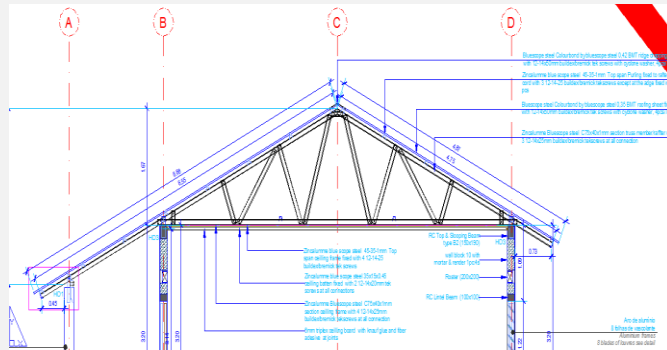

Area Send = **347.10 m2**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-15)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Laen Tolu**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**

--	--



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-15)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Laen Tolu**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**



ANEXU C1 (SV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Holbolu**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Data Inspesaun : **30-11-2022**

Fatin Inspesaun : Holbolu, Suai Villa

Koordinadas :


Start Point : Long : -9.220216 Latetude: 125.374991

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Servisu – (seng gelombang "custom orb" colorbond
0.35mm dipasang dengan sekrup pada baja
gording.

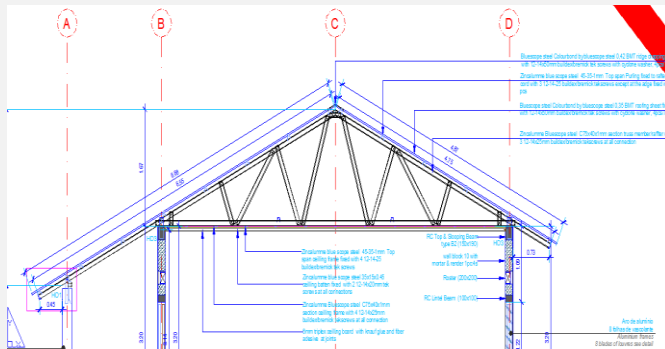

Area Send = **291** m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual






ANEXU C1 (SV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Holbolu**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**





ANEXU C1 (SV-23)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of ESCOLA CAFE building in Covalima Municipality**

No. kontratu : **NCB/321/MEJD-2021**

Data Inspesaun : **30-11-2022**

Fatin Inspesaun : **Ladi, Debos- Suai Villa**

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Servisu- Kontrator monta ona Tulangan ba
Strutur Colom

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-23)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of ESCOLA CAFE building in Covalima Municipality**

No. kontratu : **NCB/321/MEJD-2021**





ANEXU C1 (MPA-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 17+500-23+800**
No. kontratu : **SSS/318/MOPTC-2016**

Data Inspesaun : 09-11-2022

Fatin Inspesaun : Suai Villa – Tilomar, Covalima

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.35178295098843, Latetude: 125.191396996378

End Point : Long : -9.3247869878989, Latetude: 125.239201001822


Naran Inspector : **1. Domingos Soares Martins**

2. Bosco Dinis de Sousa

Sketch & Foto Desenho

Projetu neé finaliza ona 100% iha tinan 2019, maibe seidauk realiza pagamentu 100% tamba projetu neé iha adisional nebeé seidauk aprova husi dono projetu tamba kuantidade nebeé husu ba adisional bot liu ona kontratu original.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

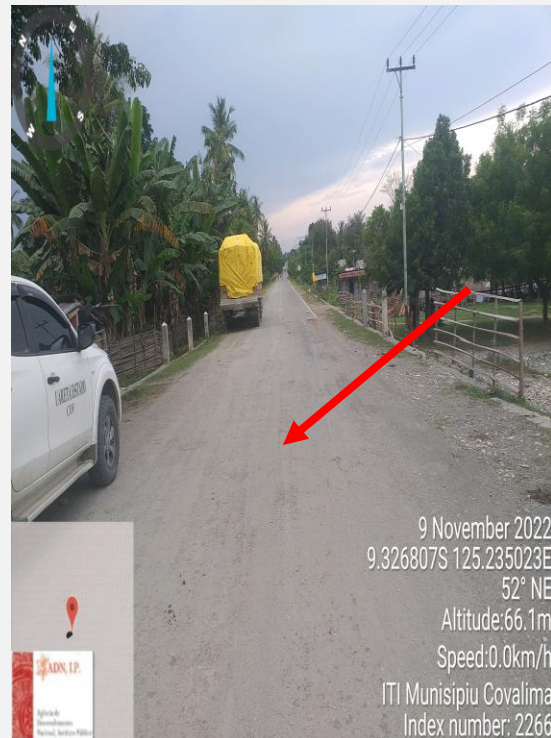

9 November 2022
9.326807S 125.235023E
52° NE
Altitude: 66.1m
Speed: 0.0km/h
ITI Munisipiu Covalima
Index number: 2266



ANEXU C1 (SV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun**

No. kontratu : **SSS/346/MOPTC-2016**

Data Inspesaun : **9/11/2022**

Fatin Inspesaun : Suai Villa, Busakukun

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.326811, Latetude: 125.234821

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**

2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Informasaun


1. Progreso fisiko atingi 74.13%, nebeé mak update iha Sistema presija reviu fila fali tamba la tuir progressu fisiku nebeé halo ona pagamentu iha anterior nian.
2. Pagamentu ikus nian iha tinan 2017 ho porsentu 44.27%
3. Husu atu hadia fila fali progressu pagamentu nebeé hatama ona iha Sistema.
4. Projecto refere kontinua fila fali ona servisu iha tereno no mobiliza material konstrusaun lokaliza ona iha fatin konstrusaun.

ANEXU C1 (SV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun**

No. kontratu : **SSS/346/MOPTC-2016**

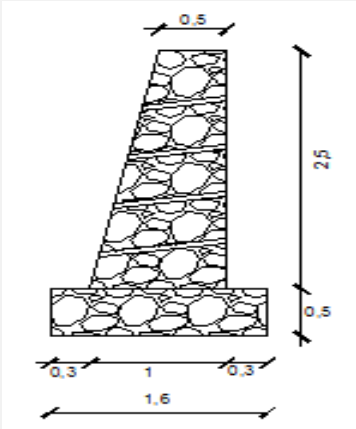Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch item servisu ba Excavation no stone masonry R/S no L/S La iha aktividade kontrusaun iha tereno tamba empreza sei hadia ekipamentus pesadus nebeé avaria hela Stone Masonry wall Down stream nian  Seidauk iha kontinuasaun servisu iha tereno tamba ekipamentus apoiu servisu avaria	 



ANEXU C1 (SV-24)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction Chek Dam In Haimanu River, Municipality of Covalima**
No. kontratu : **MOP-W-220004**

Data Inspesaun : **09/11/2022**

Fatin Inspesaun : Suai Villa

Koordinadas :

Start Point : Latetude: -9.256322

Long :125.346614

End Point : Latetude: -9.258470

Long : 125.348598

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**

2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu, Masonry wall Masonry wall nebeé instala ona iha tereno dimensaun tuir dezenho nebeé iha kontratu	



ANEXU C1 (SV-24)


Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Construction Chek Dam In Haimanu River, Municipality of Covalima**
: **MOP-W-220004**


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu, Stone Main Dam

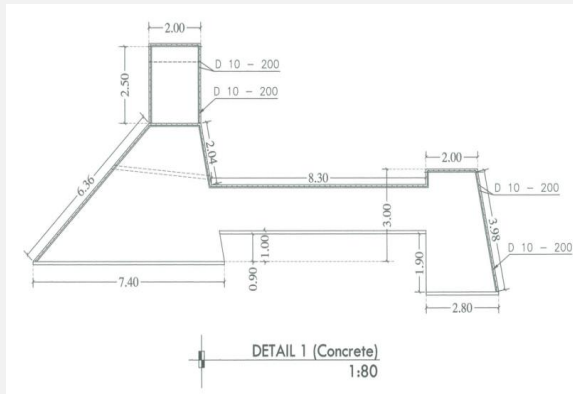


Stone Masonry Main Dam, sub dam no Apron
Q = 997.43 m.cu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

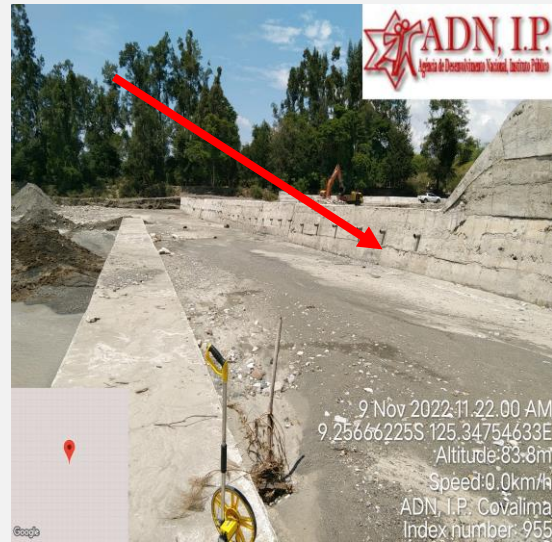

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu, Embankment

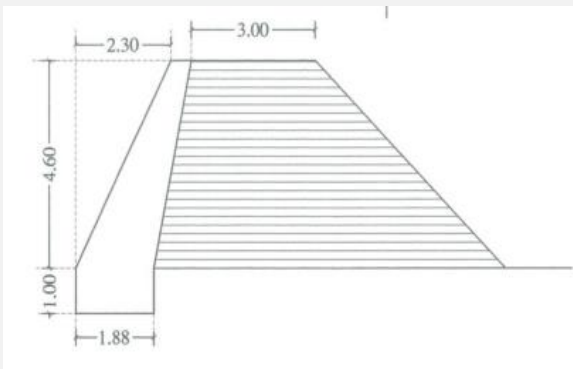

Embankemnt

Q = 1290 m.cu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (ZU-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of be'e mean roads
No. kontratu : SSS/049/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 09 / 11 / 2022

Fatin Inspesaun : Zumalai – Be'e Mean


Koordinadas :

Start Point : Long : -9.08912877432965, Latetude: 125.388369709253

End Point : Long : -9.09257813782961, Latetude: 125.390407182276

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos Soares Martins

2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

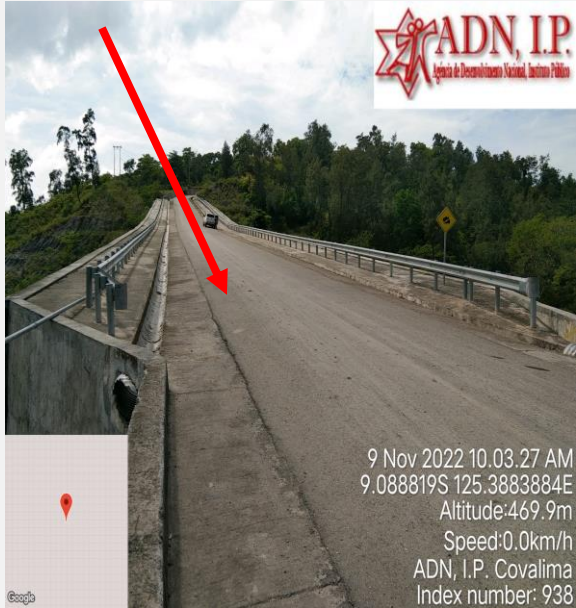Informasaun	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Parte estrutura no asesoris konstusaun diak hela no tempu retensaun 10% remata ona tuir tempu nebe determina iha kontratu no empreza entrega ona final projetu neé ba ona dono projetu.	



ANEXU C1 (ZU-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of be'e mean roads
No. kontratu : SSS/049/MOPTC-2017

Informasaun	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Gabion box nebe proteje erosaun ba estruktura konstusaun rai nian diak hela	
Informasaun	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Bio Engineering vertiver grass no shrub nebe proteje rai moris ho diak iha tereno.	



ANEXU C1 (ZU-9)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai Road Section 8
: Zulo - Jct Zumalai (30+100 - 35+120 km) Municipality Covalima
No. kontratu : SSS/067/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 09-11-2022

Fatin Inspesaun : Zumalai - Zulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.13517812863851, Latetude: 125.43390087783337

End Point : Long : -9.158220932745419, Latetude: 125.45011013746262

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos Soares Martins


2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Sketch item servisu

Item servisu Prime Coat

Empreza hahu servisu rega prime coat tuir
espesifikasaun nebe'e iha kontratu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

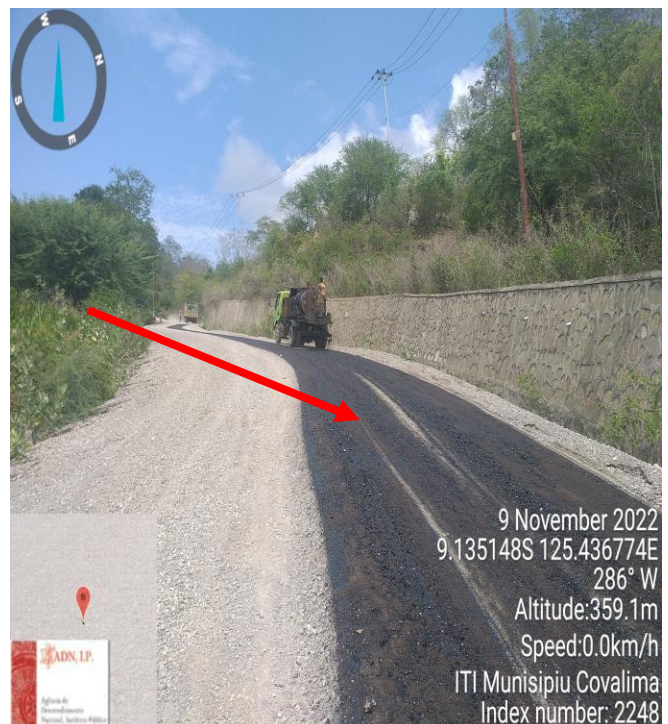



ANEXU C1 (ZU-9)


Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai Road Section 8
No. kontratu : Zulo - Jct Zumalai (30+100 - 35+120 km) Municipality Covalima
: SSS/067/MOPTC-2017

Sketch item servisu iha tereno

Empreza hahu halo servisu nahe aspalt HRS iha tereno baseia ba rejultadu nebeé fo sai ona husi Laboratorium Nasional MOP nian. Ho luan 6m no mahar 0.05 m.

Observasaun iha tereno no foto actual

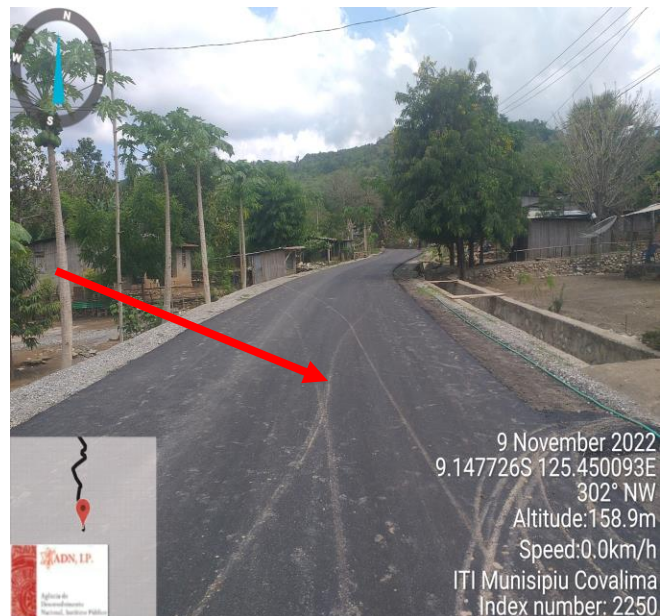



ANEXU C1 (ZU-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai (50+900 km), Road Section : Jct A16 Uele'o - Jct A02 Zumalai (35+120) Road Section 7 : Fatulito - Zulo (25+800 - 30+100) Municipality Bobonaro - Covalima

No. kontratu : SSS/065/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 09-11-2022

Fatin Inspesaun : Covalima - Zumalai

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.108627052, Latetude: 125.4078439

End Point : Long : -9.135178129, Latetude: 125.4339009

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**
2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Informasaun	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Item base course iha tereno atingi ona 100% ho nia luan 6 m no nia mahar 0.2 m	



ANEXU C1 (SV-5)

Back-up Data

Naran Projeto : New construction of drainagen in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)
No. kontratu : SSS/266/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 9/11/2022

Fatin Inspesaun : Suai Villa- Suai Loro

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.32708999715697, Latetude: 125.261079110205

End Point : Long : -9.35355117970772, Latetude: 125.259350091218

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos Soares Martins

2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Informasaun	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tekniku ADN, I.P. Halo monitorisazaun ba projecto new construction of drainagen in suai loro hodi hare prosesu servisu ba item ateru embankment iha tereno no item refere seidauk mensiona iha kontratu (Item Foun).	

ANEXU C1 (SV-5)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu


: New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)
: SSS/266/MOPTC-2016

Informasaun

Tekniku ADN, I.P. Halo monitorisazaun ba
projecto new construction of drainagen in
suai loro hodi hare prosesu servisu ba


Item servisu stone masonry Retaining wall

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

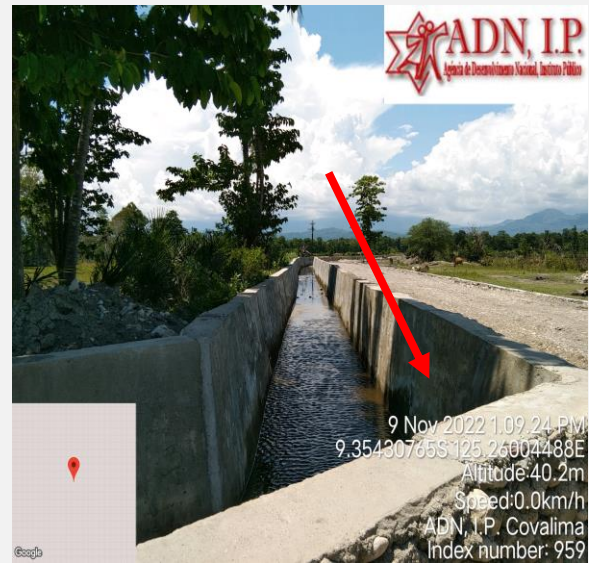

Informasaun

Item servisu stone masonry Retaining wall

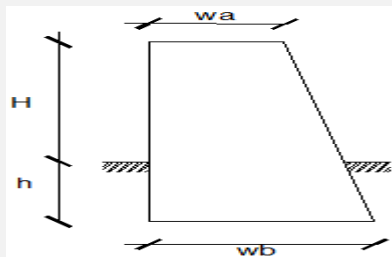

No	Wa	Wb	H	Area (sq.m)	Average Area	L (m)	Qty	Unit
1	0.3	0.5	0.9	0.36				
2	0.3	0.5	0.9	0.36	0.36	100	36	Cu.m
3	0.3	0.5	0.9	0.36	0.36	100	36	Cu.m
4	0.3	0.5	0.9	0.36	0.36	100	36	Cu.m
5	0.3	0.5	0.9	0.36	0.36	100	36	Cu.m
6	0.3	0.5	0.9	0.36	0.36	100	36	Cu.m
Sub total							180	Cu.m

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (FTM-1)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for
Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160**
No. kontratu : **SSS/103/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : 10 de Novembro de 2022

Fatin Inspesaun : Fatumea-Covalima

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.2461232232 Latetude: 125.00242497772

End Point : Long : -9.19206164881 Latetude: 124.996615313

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**
: **2. Eng. Bosco Dinis de Sousa**

NB



Projecto nee atinge 100% iha fulan janeiro 2022, tamba neé iha back data ida neé la halo kalkulasaun ba kuantidade maibe hatama deit kuantidade nebeé finaliza ona iha tinan kotuk nian bazeia ba aprovasaun variation no-2 nian.



ANEXU C1 (FTM-1)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for
Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160**
No. kontratu : **SSS/103/MOPTC-2017**

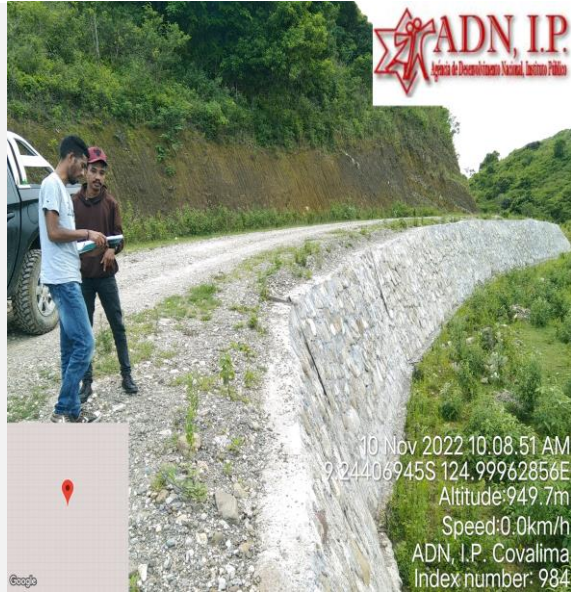
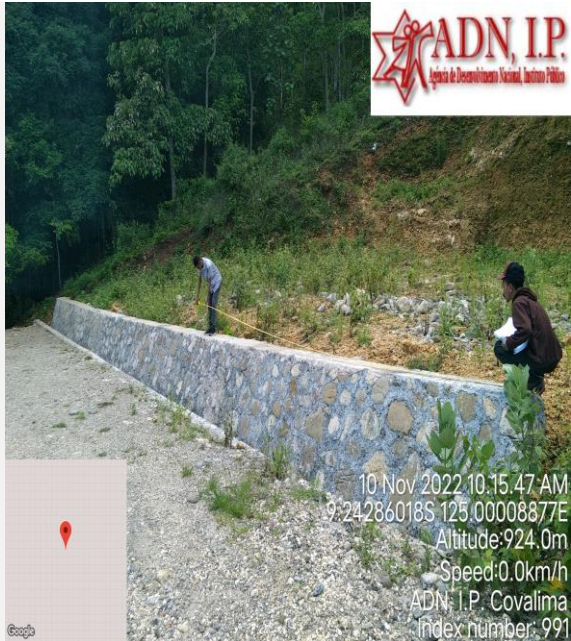
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Informasaun tereno Projecto refere kondisaun fisiku diak hela no fisikamete iha tereno atinge ona 100% iha fulan janeiro 2022,	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Informasaun tereno Projecto refere kondisaun fisiku diak hela no fisikamete iha tereno atinge ona 100% iha fulan janeiro 2022, no re-check fila fali stone Masonry wall iha tereno ba Variation No-2	



ANEXU C1 (FTM-1)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for
Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160**
No. kontratu : **SSS/103/MOPTC-2017**

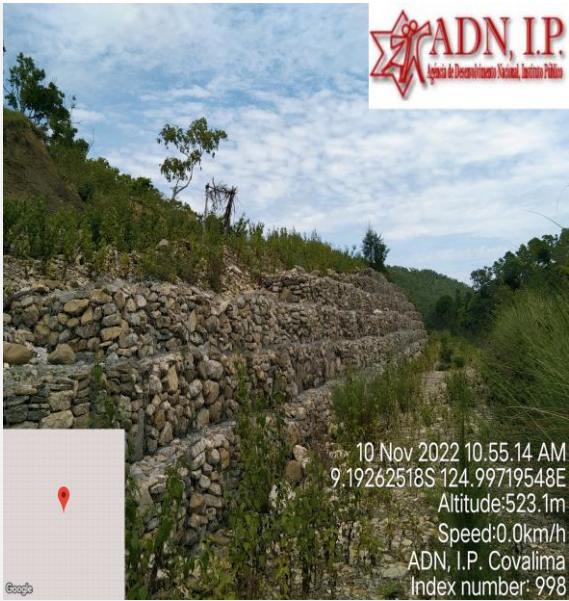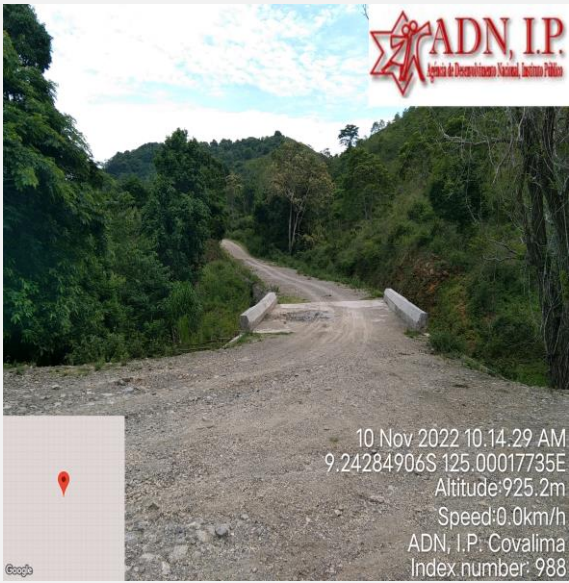Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Informasaun tereno Gabio box nebeé atinge ona 100% iha tereno diak hela no quantidade liu ona original contrato tama iha variation no-2	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Informasaun tereno Projecto refere kondisaun fisiku diak hela no fisikamete iha tereno atinge ona 100% iha fulan janeiro 2022, to agora kondisaun ba Estrada refere diak hela.	



ANEXU C1 (SV-9)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital,
Covalima, Timor Leste

No. kontratu : RDTL-MS-DNA-NCB-20-166

Data Inspesaun : 10-11-2022

Fatin Inspesaun : Debos Suai Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.313346 Latetude: 125.255521

Naran Inspector : 1 Madelino D J Magno

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

*Informasaun – Projeto ida ne agora iha
fase retensaun nia laran.(Durasaun
retensaun 12 Bulan)*

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Remark: ADN I.P. Covalima
Index number: 3313
Network time is not synchronized
Local: 10 Nov 2022 14:55:16 GMT+09:00



Remark: ADN I.P. Covalima
Index number: 3314
Network time is not synchronized
Local: 10 Nov 2022 14:55:18 GMT+09:00



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-9)

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital,
Covalima, Timor Leste

No. kontratu

: RDTL-MS-DNA-NCB-20-166



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL





ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-9)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital,
Covalima, Timor Leste
No. kontratu : RDTL-MS-DNA-NCB-20-166





ANEXU C1 (SV-22)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Path way Conection of ICU Building and Isolation Building at Hospital Referral Suai, Covalima, Timor-Leste

No. kontratu : RDTL-MS-DNA-NCB-20-166

Data Inspesaun : 10-11-2022

Fatin Inspesaun : Debos Suai Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.313346 Latetude: 125.255521

Naran Inspector : 1 Madelino D J Magno

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

*Informasaun- Enjinero Elektrikal A D N no
Enjinero A D N Covalima Inklui enjinero Saude
halo Inspeksaun ba Fase retensaun nian.*

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-22)

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction of Path way Conection of ICU Building and Isolation
Building at Hospital Referral Suai, Covalima, Timor-Leste

No. kontratu

: RDTL-MS-DNA-NCB-20-166



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-22)

Back-up Data

Naran Projeto

: New Construction of Path way Conection of ICU Building and Isolation
Building at Hospital Referral Suai, Covalima, Timor-Leste

No. kontratu

: RDTL-MS-DNA-NCB-20-166



ANEXU C1 (FTK-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Section Taroman - Datorua - Fatumeta (A016) 13.15
Km Section Covalima Municipality (162)
No. kontratu : NCB-MOP-190014

Data Inspesaun : 14/11/2022

Fatin Inspesaun : Fatululik

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.168337871638178, Latetude: 125.18876038491725

End Point : Long : -9.20955897236318, Latetude: 125.10828908532858

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos Soares Martins
2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Assunto : Informasaun ba projecto ne,e agora kontinua fali servisu iha tereno.

1. Projetu ne'e A D N halo ona pagamentu ho 39.66% tuir fisiku nebe'e instala ona iha tereno
2. Agora dadaun iha tereno contractor kontinua fali servisu mak hanesan: Gravel Surface Course (Selected Material).



ANEXU C1 (FTK-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Section Taroman - Datorua - Fatumeta (A016) 13.15
Km Section Covalima Municipality (162)
No. kontratu : NCB-MOP-190014

Sketch & Foto Desenho

informasaun

Tekniku AND, I.P. halo monitorizasaun ba projecto Road Maintenance Section Taroman - Datorua - Fatumeta (Ao16) 13.15 Km Section I Covalima Municipality. Kontinua fila fali servisu iha tereno ba item Gravel Sufice Course (Selected Material) no halo mos compaksaun.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEKSU C1 (FTK – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of Taroman Bridge**
No. kontratu : **RDTL- 11005004**

Data Inspesaun : **14/11/2022**

Fatin Inspesaun :

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.177809104085867, Latetude: 125.18132798373699

End Point : Long : -9.17832279081974, Latetude: 125.18104199320078

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**
2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Assunto : Informasaun ba projecto nebe'e abandona iha fase retensaun

1. Progreso fisiko atingi 100%, no ADN halo ona pagamentu tuir progresu nebe'e instala ona iha terenu
2. Projetu refere atinge 100% iha tinan 7 liu ba kotuk
3. Projetu ne'e kondisaun fisiku aktual iha terenu diak hela
4. Projetu ne'e tama ona iha fase retensaun maibe to agora husi kompanhia la husu konba pagamentu retensaun nian
5. Sujere mos ba dono projetu hare didiak pagamentu anterior nian hodi nune'e bele hatene lolos estatus projetu ne'e nia retensaun
6. Husu mos ba dono projetu hare mos termo entrega ba obra ne'e nian
7. Husu ba dono do projetu tau konsiderasaun ba assunto nebe'e temi ona iha leten hodi buka informasaun no fo solusaun ba balansu nebe'e sei iha
8. Sujere atu hare fila fali pagamentu anterior



ANEKSU C1 (FTK – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of Taroman Bridge**
No. kontratu : **RDTL- 11005004**

Sketch & Foto Desenho

Ponte ne'e uja tipo Material Baja no beteon
ho Naruk 60 m

Ponte ne'e kondisaun actual iha tereno diak
hela

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEKSU C1 (FTK – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of Taroman Bridge**
No. kontratu : **RDTL- 11005004**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Gabion Box instala iha up Stream hola parte iha liman los nian no fisikamente diak no metin hela.	 14 November 2022 9.177984S 125.181195E 60° NE Altitude: 579.9m Speed: 0.0km/h Munisipiu Covalima Index number: 2296
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Gabion Box instala iha up Stream hola parte iha liman karuk nian no fisikamente diak no metin hela.	 14 November 2022 9.177972S 125.181201E 350° N Altitude: 579.0m Speed: 0.0km/h Munisipiu Covalima Index number: 2297



ANEXU C2 (MA-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rebidding of Project Road Maintenance Sections ; Suai, Maucatar -
Lelaus Municipality Covalima (162)**

No. kontratu : **NCB-MOP-190010**

Data Inspesaun : 14/11/2022

Fatin Inspesaun : Maucatar

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.168337871638178, Latetude: 125.18876038491725

End Point : Long : -9.286377000575598, Latetude: 125.22541880607605

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**

2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Projecto nebeé implementa husi kompanhia Verde Kaisahe Unip.Lda, agora dadaun la iha aktividade konstrusaun fisiku iha tereno (abandona) husi tinan 2020 to agora 2022, tuir informasaun husi kompanhia katak apoiu finanseiro la suficiente, nomos husi dono projecto orienta atu kontinua servisu iha tereno maibe husi contractor hakarak husi dono projecto tenke iha aprovasaun dezenho detalho no indika fatin nebeé nesessario halo konstrusaun maka husi kontraktor foin bele atu kontinua servisu iha tereno, maibe to agora husi dono projecto seidauk responde ejisensia husi kontraktor nian.



ANEXU C2 (MA-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rebidding of Project Road Maintenance Sections ; Suai, Maucatar - Lelaus Municipality Covalima (162)**
No. kontratu : **NCB-MOP-190010**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projecto neé abandona husi tinan 2020 to agora, la iha konstrusaun foun iha tereno. Husi kompanhia informa katak apoiu financeiro maka la sufisiente, nomos empreza hakarak husi dono Projetu tenke halo dezenho aprovasaun tuir nesesidade tereno.	 14 November 2022 9.279265S 125.219279E 285° W Altitude:263.8m Speed:0.0km/h Munisipiu Covalima Index number: 2304



ANEXU C1 (ZU-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Mola - Mota Masin/Roads Maintenance section Zumalai - Mota Masin
Border (Multy Year program/RM**
No. kontratu : **MPW - W - 220008**

Data Inspesaun : **15 / 11 /2022**

Fatin Inspesaun : Zumalai – Mota Masin

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.170587, Latetude: 125.448221

End Point : Long : -9.45052, Latetude: 125.089063

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**
2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Informasaun	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Fase daruak nian husi empreza hahu fali servisu iha tereno, ba shoulder clearing, drainagen of Clering,	



ANEXU C1 (SV-21)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction Chek Dam In Zolai River, Municipality Covalima**
No. kontratu : **MOP-W-220003**

Data Inspesaun : **16/11/2022**

Fatin Inspesaun : Suai Villa

Koordinadas :

Start Point : Latetude: -9.26365765

Long :125.3204251

End Point : Latetude: -9.26432115

Long : 125.32071529


Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**
2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu, Stone Masonry retaining wall R/S
no L/S

Tekniku ADN, I.P. hamutuk ho contractor halo
inspeksaun conjunta ba projecto construction check
dam in zolai river, municipality covalima ne,ebe mak
nia fisiku atingi ona 100%.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

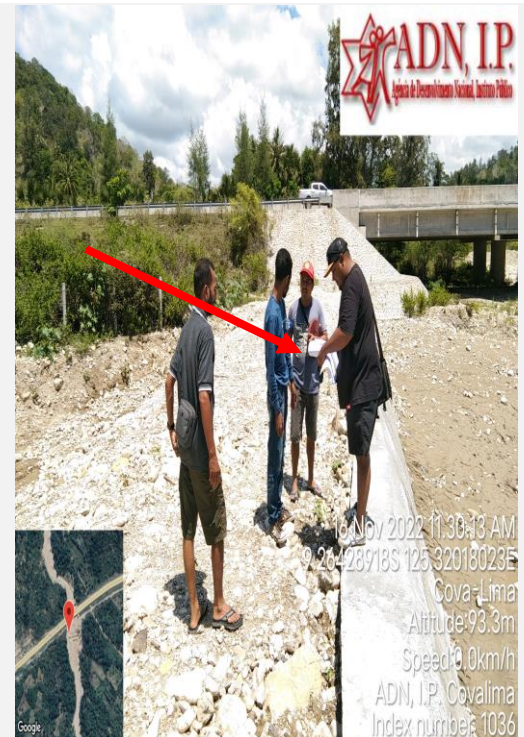



ANEXU C1 (SV-21)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction Chek Dam In Zolai River, Municipality Covalima**
No. kontratu : **MOP-W-220003**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu, Stone masonry Stone Masonry Main Dam nia fisiku atingi 100% no concrete 30 MPA iha Tereno atinge ona 100%	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu, Sub-Dam Stone Masonry ba Sub-Dam nia fisiku Atinge ona 100% no Concrete 30 Mpa atinge 100%	



ANEXU C1 (ZU-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Manutensaun no konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Oebaba - Covalima
No. kontratu : RDTL – 2021 - 15595

Data Inspesaun : 16-11-2022

Fatin Inspesaun : Covalima - Zumalai

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.18895361, Latetude: 125.51541044

End Point : Long : -9.19223243, Latetude: 125.508700982

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**

2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Sketch & Foto Desenho

Sketch item stone masonry Retaining wall

Tekniku AND, I.P. hamutuk ho empreza halo inspeksaun conjunta pagamento 100% ba projecto Manutensaun no Konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Oebaba – Covalima.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (ZU-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Manutensaun no konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Oebaba - Covalima
No. kontratu : RDTL – 2021 - 15595

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu, kanais irrigasaun Item stone masonry ba kanais irrigasaun iha tereno atingi ona 100% no kondisaun actual agora diak hela.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu, concrete retaining wall Konstrusaun ba moru protesaun concrete retaining wall atingi ona 100% no kondisaun actual iha tereno diak hela.	



#ANEXU C1 (FTM-3)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macocon**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Data Inspesaun : **17-11-2022**

Fatin Inspesaun : Macocon, Fatumea Covalima

Koordinadas :


Start Point : Long : 9,3090 Latetude : 125,0492

Naran Inspector : **1. Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Informasaun Husi Terreno

Servisu – (seng gelombang "custom orb" colorbond 0.35mm dipasang dengan sekrup pada baja gording.

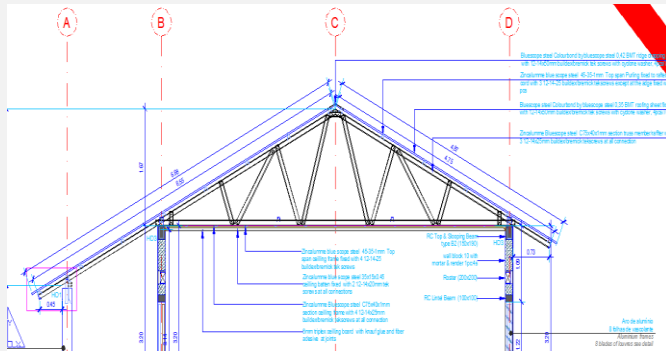

Area Send = **291 m2**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 (FTM-3)

Back-up Data

Naran Projeto

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macocon**

No. kontratu

: **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Servisu – Fascia (lisplank baja)

*Bent plate 230mm girth colorbond fascia (seng plat
berwarna dengan lebar toal 230mm)*

Panjang = **50** meter



Remark: ADN I.P. Covalima EBF Macocon
Index number: 3487
Network: 17 Nov 2022 10:05:26 GMT+09:00
Local: 17 Nov 2022 10:05:28 GMT+09:00



Remark: ADN I.P. Covalima EBF Macocon
Index number: 3501
Network: 17 Nov 2022 10:30:10 GMT+09:00
Local: 17 Nov 2022 10:30:12 GMT+09:00



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (FTM-3)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macocon**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**

--	--



#ANEXU C1 (FTM-4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Fatumea**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Data Inspeasaun : **29-11-2022**

Fatin Inspeasaun : **Fatumea**

Koordinadas :


Start Point : Long : -9.247549 Latitude : 125.003543

Naran Inspector : **1. Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Informasaun Husi Terreno

Servisu – (seng gelombang "custom orb" colorbond 0.35mm dipasang dengan sekrup pada baja gording.

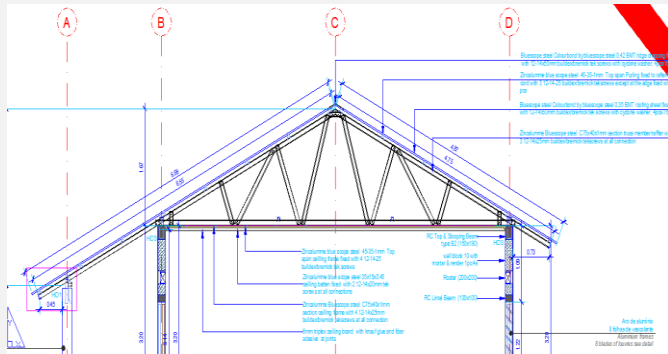

Area Send = **291** m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 (FTM-4)


Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Fatumea**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Servisu – Fascia (lisplank baja)

*Bent plate 230mm girth colorbond fascia (seng plat
berwarna dengan lebar toal 230mm)*

Panjang = **50** meter

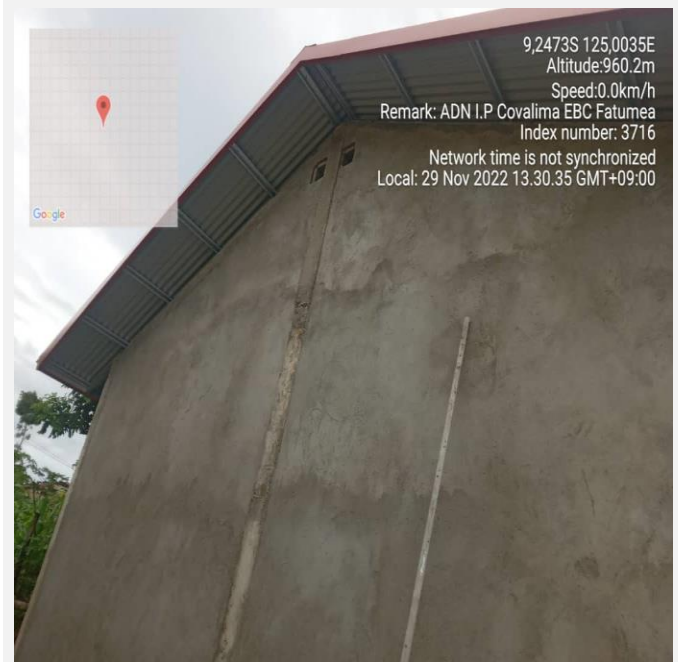



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (FTM-4)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Fatumea**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**

--	--





#ANEXU C1 (FTM-4)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Fatumea**
: **Kontratu ho Grupo Comunitario**



#ANEXU C1 (FTM-5) Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Traducama**
No. kontratu : **Kontratu ho Grupo Comunitario**

Data Inspesaun : **29-11-2022**

Fatin Inspesaun : Traducama, Nano Fatumean

Koordinadas :


Start Point : Latetude : - 9.279045 Longitude : 125.008682

Naran Inspector : **1. Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Informasaun Husi Terreno

Servisu – (seng gelombang "custom orb" colorbond
0.35mm dipasang dengan sekrup pada baja
gording.

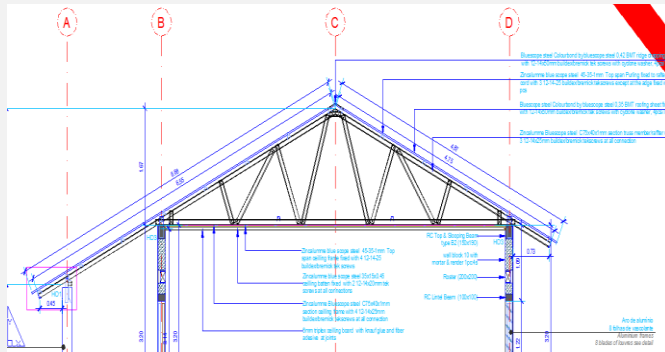

Area Send = **291** m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 (FTM-5)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Traducama
: Kontratu ho Grupo Comunitario

--	--

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Naran Eng.	Madelino Deonizo J Magno							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Novembro 2022																														OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SUAI VILLA (SV)	9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



PLANU INSPESAUN

Naran Eng. **Madelino Deonizo J Magno**

Município **MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS**

2022

Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Novembro 2022																														OBS		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
FATUMEA (FTM)	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macoon	MEJD PKRIE EBF 1,2 MACOON	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	4	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Fatumea	MEJD PKRIE EBC FATUMEA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	5	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Traducama	MEJD PKRIE EBF TRADUCAMA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
MAUCATAR (MA)	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Has-Ain	MEJD PKRIE EBF HAS -AIN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
ZUMALAI (ZU)	6	Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai	Aitula Construction, Lda	002/NC-ZC/VII/2015	LM	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	Plan																																	
							Actual																																	
	12	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai	MEJD PKRIE EBC ZUMALAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Uce-Cai	MEJD PKRIE EBF UCE-CAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa	MEJD PKRIE EBF SALASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soiliga	MEJD PKRIE EBF SOILIGA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
		TOTAL PROJETO																																						

Note: ■ Planu Periode inspesaun iha tercinu ■ Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu ■ Relatorio avaliasaun mensal iha Dili ■ Inspesaun Proceso Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Madelino Deonizo J. Magno)

Engenheiro ba Projecto Edificio Publico Agua e Saneamento ADN,I.P. Munisipiu Covalima

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Vandalasaun de Qualidade, ADN,I.P.

Aprva Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN,I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto de Planeamento							PLANU INSPEAUN																															
Naran Eng. Domingos Soares Martins							2022																															
Município MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																						
Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Novembro 2022																														OBS
ZUMALAI (ZU)	2	New Installation Mt. Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hobopa, Zumalai - Covalima Municipality	Mania Unip, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGH-PEN - 00000427	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Parte Electrical mk sei halo plano				
							Actual																													Fisiku 100%		
	3	Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00-000 Km 04-000), Municipality of Covalima	Clardel Interprice Unip Lda	SSS/227/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	4	Rehabilitation of Road From Hacmanu Bridge Zumalai Junction (0-000 - 20-316) Phase III Sta 10-140 - 15-180 Municipality Covalima	Star Suai, Lda	SSS/050/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											PHO				
							Actual																															
	5	Rehabilitation of be'e mean roads	Roman Junior Unipessal, Lda	SSS/049/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											PHO				
							Actual																													Projeto refere seidauk rekomenda 10% retensaua tamba termo entrega la tuit termo legais nebeé iha kontrato.		
	6	Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai	Aitula Construction, Lda	002/NC-ZC/VIL/2015	LM	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	Plan																												Parte EPAS mk sei halo plano			
							Actual																															
	7	Konstrusaun Escola Técnico Professional Zumalai	Sabodoi Unip. Lda	03/A.M.Covalima/KDM-AMP/VIL/2019	PDIM	MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																												Parte EPAS mk sei halo plano			
							Actual																															
	8	Rural Roads Periodic Maintenance Lepo - Lour Chainage 0-000-3-000	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	MPW-W-190260	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Fisiku 100%			
							Actual																													PHO		
	9	Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai Road Section 8 - Zulo - Jct Zumalai (10-100 - 35-120 km) Municipality Covalima	Octogono Construa Unip. Lda	SSS/067/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going			
							Actual																													on Progress		
	10	Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai (50-900 km), Road Section Jct A16 Uelelo - Jct A02 Zumalai (35-120) Road Section 7 - Fanalio - Zulo (25-800 - 30-100) Municipality Bebonaro - Covalima	Mariao Enterprises, Lda	SSS/065/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going			
							Actual																													on Progress		
11	Manutensaun no konstrusaun Kamas Irrigasaun iha Oebabo - Covalima	Lifran Unip Lda	RDTL-2021-15595	LM-CD	MINISTERIO AGRICULTURA E PESÇAS	Plan																												Fisiku 100%				
							Actual																															
12	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai	MEJD PKRIE EBC ZUMALAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																												Parte EPAS mk sei halo plano				
							Actual																															
13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Uce-Cai	MEJD PKRIE EBF UCE-CAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																												Parte EPAS mk sei halo plano				
							Actual																															
14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa	MEJD PKRIE EBF SALASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																												Parte EPAS mk sei halo plano				
							Actual																															
15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soiliga	MEJD PKRIE EBF SOILIGA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																												Parte EPAS mk sei halo plano				
							Actual																															
16	Mola - Mota Masin/Roads Maintenance section Zumalai - Mota Masin Border (Multy Year program/RM	Delta Dim	MPW - W - 220008	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going				
							Actual																												On Going			
MULTY POSTO ADMINT (MPA)	1	Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro and Manufahi	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/029/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Tekniko nebe responsavel ba Konsultan mk sei halo plano				
							Actual																															
	2	Rehabilitation of Mota Masin to Hacmanu Roads Sta. 17-500-23-800	Expres Distribution Services Unip. Lda	SSS/318/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Fisiku 100%				
							Actual																												Projeto neé fisiku atinge ona 100% iha tinan 2019, no PHO tia ona ba dono projeto, maibe pagamentu 100% seidauk realiza tamba kompanhia sei hein aprovasaun Vo.1 husi dono projeto ba rejultadu nebeé verifika tia ona husi ADN.I.P.			
	3	Manutensaun Estrada Lookou, Sta. 0-000-6-000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour, Sta. 0-000-1-000, Manutensaun Estrada Naguadai-Lour, Sta. 0-000-4-200-Municipal of Covalima	Manu Bey Unip Lda	RT/079/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Pendente, Presija konfirma ho dono projeto ba estatus projeto refere, tamba kondisaun actual agora husi kompanhia Futuru Manemesak maka iha aktividade manutensaun ho kontratu foun iha lokasi refere.				
							Actual																															
	4	Rural Roads Routine Maintenance Lepo-Lour Sta 0-000-3-000, Naguadai - Lour Sta 0-000-5-000, Boardikan - Mape Sta 0-000-8-000 / 162	Futuro Mane Mesak Unip Lda	MPWTC-CD-170015	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Projeto neé Abandona iha tinan 2019 to agora, no lokasi refere iha ona projectu foun husi R4D iha tinan 2019 implementa husi kompanhia Futuru Manemesak				
							Actual																															
	5	Rural Roads Routine Maintenance Dato Tohi Cha 0-000 - 9-600, Lookou Cha 0-000 - 6-000, Casabuc 008 Cha 0-000 - 3-000, Casabuc 012 Cha 0-000 - 3-500, Casabuc 018 Cha 0-000 - 2-700, Lalaia Cha 0-000 - 3-500, Beraikan Mape Cha 0-000 - 8-000, Naguadai Lepo Cha 0-000 - 4-000 Municipality Covalima	Lufi Raica Unip Lda	MPW/WNC/B/R/190048	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Presija konfirma ho dono projeto ba estatus projeto refere, tamba kondisaun actual agora husi kompanhia Futuru Manemesak maka iha aktividade manutensaun ho kontratu foun iha lokasi refere.				
							Actual																															
TOTAL PROJETO																																						

Note:

Plann Periodo inspesaun iha Teremu

Implementa Plann Periodo Inspeasaun iha Teremu

Relatorio avaliasaun mensal iha Di

Inspeasaun Processu Pagamentu

Prepara Husi :

 (Eng. Domingos Soares Martins)
 Engenheiro ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irrigasaun Munisipiu Covalima ADN, I.P.

Sertifika Husi :

 (Eng. Emerenciana de Costa Maia Freitas)
 Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.

Aprova Husi :

 (Eng. Januario Maria Guterres)
 Adjunto Director Executivo ADN, I.P.

2022

Page 2 of 3

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO MATERIAL CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Municipal, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng.	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares						2022																															
Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Nov																														OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
SUAI VILLA (SV)	1	The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															HELA RETENSAUN 10%
							Actual																															
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debo's Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Halihun, MDGS, Matai, MDGS Halihun - Covalima Municipality	Eron Power, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000435	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PARADO
							Actual																															
	3	Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	ICB/035/TGAP-2013	FI	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																															
							Actual																															
	4	Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	ICB/035/TGAP-2013	FI	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																															
							Actual																															
	9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															HELA RETENSAUN 10%
							Actual																															
	10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital, Ministry of Health Timor-Leste	Manu Bey Unip Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-184	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															HELA RETENSAUN 10%
							Actual																															
	13	Prefurasau No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala	Paya's Sisters	002.LM/RDTL/MPIE/A.D.N/Da Rfq/VI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM-CD	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																															
							Actual																															
	14	Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB:04/MEJD/DNA/2021	LM-CD	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Laen Tolu	MEJD PKRIE EBF LAEN TOLU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Holbolu	MEJD PKRIE EBF HOLBULO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
17	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maucola	MEJD PKRIE EBF MAUCOLA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
						Actual																																
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Busacucun	MEJD PKRIE EPE BUSACUCUN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
						Actual																																
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Akar Laran	MEJD PKRIE EPE AKAR LARAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
						Actual																																
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESGP SUAI	MEJD PKRIE ESGP SUAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
						Actual																																
TILOMAR (TL)	21	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality	Lalenok Fronteira, unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														LAIHA ONA ESPASO HODI KONTINUA OBRA	
							Actual																															
	24	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk	Joia Camenasa Unip. Lda	06/A.M.Coalima/KDM-AMP/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																														INSPEKSAUN PAGAMENTO RETENSAUN 10%	
							Actual																															
	26	Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste	Figelato Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-217	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																														INSPEKSAUN PAGAMENTO RETENSAUN 10%	
							Actual																															
27	New Construction of Health Post and Doctor House Buiding in Beisuk, Tilomar, Covalima, Timor Leste (Niquir)	Joia Camenasa Unip. Lda	NCB/087/MI-2021	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan																														INSPEKSAUN PAGAMENTO RETENSAUN 10%		
						Actual																																
28	New Construction of U.P.F. Building in Covalima. LOT.1: New Construction of U.P.F. Building at Mota Masin	Carama Unip Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-071	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
						Actual																																
FOHOREM	33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF 1,2 Aitos	MEJD PKRIE EBF 1,2 AITOS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESTV Nutetu de Fohorem	MEJD PKRIE ESTV NUTETU DE FOHOREM	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	37	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macocon	MEJD PKRIE EBF 1,2 MACOCON	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	38	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba	MEJD PKRIE EBC	Kontratu ho	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN	Plan																															
							Actual																															

REPUBLICA DE DILÍ MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO MINISTERIO DA ENERGIA ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instrumentos Públicos							PLANU INSPESAUN																																	
Naran Eng.	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares							2022																																
Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Nov																														OBS		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	38	Escola EBC Fatumea	FATUMEA	Grupo Comunitario	LM-TP	JUVENTUDE E DESPORTU	Actual																																	
							Plan																																	
	39	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Traducama	MEJD PKRIE EBF TRADUCAMA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Actual																																	
							Plan																																	
MAUCAT AR (MA)	44	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Has-Ain	MEJD PKRIE EBF HAS -AIN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
ZUMALAI (ZU)	45	New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covalima Municipality	Foho Rua Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000404	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	46	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai - Covalima Municipality	Mania Unip, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000427	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	50	Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai	Aitula Construction, Lda	002/NC-ZC/VII/2015	LM	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	Plan																																	
							Actual																																	
	56	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai	MEJD PKRIE EBC ZUMALAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	57	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Uce-Cai	MEJD PKRIE EBF UCE-CAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	58	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa	MEJD PKRIE EBF SALASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	59	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soitiga	MEJD PKRIE EBF SOILIGA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
		TOTAL PROJETO																																						

Note: Planu Periode inspesaun iha tereinu Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili Inspesaun Proceso Pagamentu

Prepara Husi :

(Silvino D. R. Rebelo Soares)
Eng. Electricidade, ADN - I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN - I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN - I.P

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN. I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	PREZENZIO L C D XIMENES						2022																																
Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																						
Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Novembro 2022																														OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
SUAI VILLA (SV)	9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referal Hospital, Covalima, Timor Leste	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referal Hospital, Ministry of Health Timor-Leste	Manu Bey Unip Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-184	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	12	New Construction of Interior Fence for Prison in Suai Municipality	Fraternity Unipessoal Lda	MJ-062/OUTOBRO/2021	LM-CD	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																																
							Actual																																
	13	Prefurasao No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala	Pay's Sisters	002.LM/RDTL/MPIE/A.D.N/D a Rfq/VI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM-CD	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																
							Actual																																
	14	Konstrusaun Foun ba ESTV Akar laran, Suai	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB:04/MEJD/DNA/2021	LM-CD	MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																
							Actual																																
	15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Laen Tolu	MEJD PKRIE EBF LAEN TOLU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																
							Actual																																
	16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Holbulu	MEJD PKRIE EBF HOLBULO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																
							Actual																																
	17	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maucola	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maucola	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																
							Actual																																
	18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Busacucun	MEJD PKRIE EPE BUSACUCUN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																
							Actual																																
	19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Akar Laran	MEJD PKRIE EPE AKAR LARAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																
							Actual																																
	20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Suai	MEJD PKRIE ESGP SUAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																
							Actual																																
	22	New Construction of Path way Conection of ICU Building and Isolation Building at Hospital Referral Suai, Covalima, Timor-Leste	Milcha Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	LM-CD	MINISTERIO DA SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	23	New Construction of ESCOLA CAFE building in Covalima Municipality	JLC.LDA., IN JOINT VENTURE WITH AITULA, LDA	NCB/321/MEJD-2021	FI	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
TILOMAR (TL)	3	Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Sua- Covalima	Ota Gelor	RDTL-73/GMTAC/X/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																
							Actual																																
	4	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk	Joia Camenasa Unip. Lda	06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	6	Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste	Figelato Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-217	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	7	New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk, Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)	Carama Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-21-071	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
8	New Construction of U.P.F. Building in Covalima. LOT.1: New Construction of U.P.F. Building at Mota Masin	Joia Camenasa Unip. Lda	NCB/087/MI-2021	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan																																	
						Actual																																	
FOHOREM (FO)	3	Construction, Rehabilitation and Installation of Clean Water with System Gravitation in Suco Fohorem Villa	Loro Metan Unipesoal. Lda	SSS/293/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF 1,2 Aitos	MEJD PKRIE EBF 1,2 AITOS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	6	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESTV Nutetu de Fohorem	MEJD PKRIE ESTV NUTETU DE FOHOREM	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. **PREZENZIO L C D, XIMENES**

Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS
-----------	------------------------------

2022 14

Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Novembro 2022																														OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
FATUEA (FTM)	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Macoon	MEJD PKRIE EBF 1,2 MACOCON	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	4	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Fatumea	MEJD PKRIE EBC FATUEA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	5	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Traducama	MEJD PKRIE EBF TRADUCAMA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
MAUCATAR (MA)	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Has-Ain	MEJD PKRIE EBF HAS -AIN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
ZUMALAI (ZU)	6	Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai	Aitula Construction, Lda	002/NC-ZC/VII/2015	LM	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	Plan																															
							Actual																															
	12	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Zumalai	MEJD PKRIE EBC ZUMALAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	13	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Uce-Cai	MEJD PKRIE EBF UCE-CAI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	14	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Salasa	MEJD PKRIE EBF SALASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Soiliga	MEJD PKRIE EBF SOILIGA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
		TOTAL PROJETO																																				

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriin avaliasuan mental ha Dili

Innesiaun Proses Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Prezenzio L C D XIMENES)

Engenheiro de Projecto Edifício Público Água e Saneamento ADN,I.P. Munisipiu Covalima

Sertifikasi Hutan :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN,I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo ADN.I.P.
