



**REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE**  
**MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO**

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



**RELATÓRIU MENSÁL**  
**IMPLEMENTASAUN PROJETUS**  
**MUNISÍPIU MANATUTO**  
**JANEIRU 2023**






**SUMÁRIO**  
**RELATÓRIO**  
**IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO**  
**MANATUTO**  
**JANEIRO 2023**

Prepara Husi :



( Eng. Quico Adelino Junior )  
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no  
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P



( Eng. Jose R. Carlos Gusmão )  
Eng. ba Projecto Insfrasturctura e  
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P



( Eng. Adonis Julio Fernandes )  
Eng. ba Projecto ME, ADN, I.P



( Eng. Domingos da Costa e Silva )  
Eng. ba Projecto Insfrasturctura e  
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

**Verifika Husi :**



( Arc. Fransisco X D D Jeronimo )  
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé  
Saneamentu, ADN, I.P



( Eng. Remigio da C. S. dos Santos )  
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e  
Irigasaun, ADN, I.P



( Eng. Deolindo de F. Marques )  
Chefe Seksaun ba Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

**Sertifika Husi :**




( Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,  
ADN, I.P

**Aprova Husi :**



( Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng )  
Director Executivo, ADN, I.P



## INDICE

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>SUMÁRIO</b> .....                       | 1  |
| <b>INDICE</b> .....                        | 3  |
| <b>I. INTRODUSAUN</b> .....                | 3  |
| 1.1 Enkuadramentu Legal.....               | 3  |
| 1.2 Perfil Municipio Manatuto.....         | 3  |
| 1.3. Lista Projectos.....                  | 7  |
| <b>II. PROGRESU FISIKU</b> .....           | 25 |
| 2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan .....       | 25 |
| <b>III. OBSTÁCLO IHA TERENU</b> .....      | 26 |
| 3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu .....     | 26 |
| <b>IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU</b> .....  | 27 |
| 4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu ..... | 27 |

## INDICE TABELA

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias .....                   | 4  |
| Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto.....            | 4  |
| Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto .....                  | 6  |
| Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamentos ..... | 7  |
| Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Manatuto Por Sectores.....               | 11 |
| Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Manatuto Por Ministerio.....             | 18 |
| Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto .....                     | 25 |



# I. INTRODUSAUN.


## 1.1.Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefisiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimentu nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvimentu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria

## 1.2. Perfil Municipio Manatuto

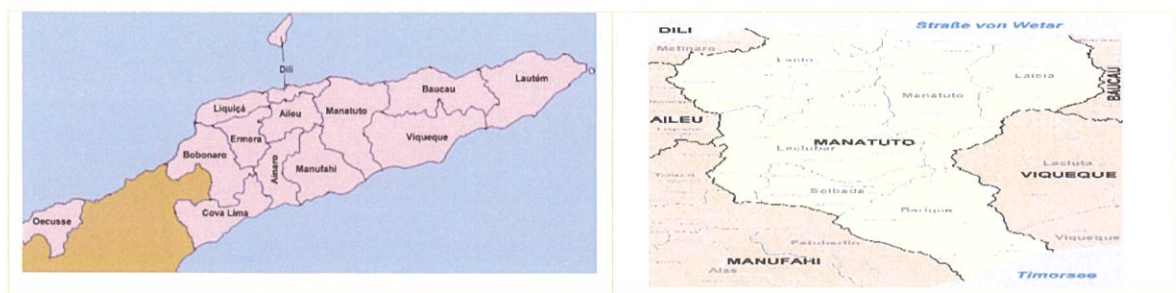

Mapa 2 hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Manatuto iha luan 1,706 km<sup>2</sup> ho populusaun nain 42,742 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Manatutoiha Postos Administrativos nen (6), Sukus 29 no aldeias 99 , mak hanesan hatudu iha Tabela 1.

**Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.**

| Natarbora    |           | Laclo         |           | Laklubar                 |           | Laleia        |           |
|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Sukus        | Aldeia    | Sukus         | Aldei     | Suku                     | Aldeia    | Sukus         | Aldeias   |
| Aubeon       | 2         | Hohorai       | 4         | Batara                   | 4         | Cairui        | 7         |
| Barique      | 2         | Locomesak     | 5         | Hatu<br>ma<br>quere<br>k | 3         | Hatulara<br>n | 3         |
| Fatuwaque    | 2         | Uma<br>kaduak | 3         | Funar                    | 4         | Lifau         | 3         |
| Manehat      | 3         | Uma<br>naruk  | 4         | Mane<br>lima             | 6         |               |           |
| Uma Boco     | 2         |               |           | -                        | 8         |               |           |
|              |           |               |           | Sanan<br>a<br>Na'i       | 4         |               |           |
| <b>Total</b> | <b>11</b> |               | <b>18</b> |                          | <b>30</b> |               | <b>13</b> |

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 69



| Manatuto |           | Soibada       |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| sukus    | Aldeia    | sukus         | aldeias   |
| Ailili   | 2         | Fatuma querek | 2         |
| Aitekas  | 4         | Leo-hat       | 2         |
| Cribas   | 5         | Manlala       | 2         |
| Iliheu   | 5         | Maun Fahe     | 2         |
| Ma'abat  | 2         | Somoro        | 2         |
| Sau      | 2         |               |           |
|          | <b>22</b> |               | <b>10</b> |

**Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto**

| Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Manututu |                                |                          |      |      |      |      |          |     |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|----------|-----|
| No                                           | Deskrisaun                     | Total Membros Kada Tinan |      |      |      |      |          |     |
|                                              |                                | 2021                     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total    | OBS |
| 1                                            | Engineiro                      | 3                        | 3    | 3    |      |      | <b>3</b> |     |
| 2                                            | Administrasau<br>n no Financas | 0                        | 0    | 0    |      |      | <b>0</b> |     |
| 3                                            | Motorista                      | 1                        | 1    | 1    |      |      | <b>1</b> |     |
| 4                                            | Seguransa                      | 0                        | 0    | 0    |      |      | <b>0</b> |     |
| <b>Total</b>                                 |                                | <b>4</b>                 |      |      |      |      | <b>4</b> |     |

**Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto.**

| ASET ADN,IP MUNICIPIO MANATUTO |                                |                       |       |       |      |      |       |              |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|------|------|-------|--------------|
| No                             | Deskrisaun                     | Total Aset Kada Tinan |       |       |      |      | Total | OBS          |
|                                |                                | 2021                  | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |       |              |
| 1                              | Edificio                       | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 2                              | Kareta                         | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 3                              | Desktop HP / Monitor           | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 4                              | Laptop HP                      | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 5                              | Printer Cannon                 | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 6                              | UPS                            | 1                     | 1     | 1     |      |      |       | Aát<br>ona   |
| 7                              | Armario File                   | 2                     | 2     | 2     |      |      |       |              |
| 8                              | Armario Tau hena               | 3                     | 3     | 3     |      |      |       |              |
| 9                              | Meja escritorio                | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 10                             | Meja han                       | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 11                             | Meja TV (kiik)                 | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 12                             | Kadeira escritorio             | 6                     | 6     | 6     |      |      |       |              |
| 13                             | Kadeira han                    | 4                     | 4     | 4     |      |      |       |              |
| 14                             | Sofa                           | 1 Set                 | 1 Set | 1 Set |      |      |       |              |
| 15                             | Springbed +sumasu<br>4+sprei 3 | 3 Set                 | 3 Set | 3 Set |      |      |       |              |
| 16                             | Jeleira                        | 1                     | 1     | 1     |      |      |       | Aát<br>ona   |
| 17                             | Water Dispenser                | 1                     | 1     | 1     |      |      |       |              |
| 18                             | TV + Parabola                  | 1 Set                 | 1 Set | 1 Set |      |      |       |              |
| 19                             | AC                             | 4                     | 4     | 4     |      |      |       | 1 aát<br>ona |
| 20                             | Kipas Angin                    | 4                     | 4     | 4     |      |      |       |              |
| 21                             | Kompor Listrik                 | 1                     | 1     | 1     |      |      |       | Aát<br>ona   |

|    |                  |    |    |    |  |  |  |            |
|----|------------------|----|----|----|--|--|--|------------|
| 22 | Kompor Gas       | 1  | 1  | 1  |  |  |  | Aát<br>ona |
| 23 | Rack sepatu      | 3  | 3  | 3  |  |  |  |            |
| 24 | Rack Piring      | 1  | 1  | 1  |  |  |  |            |
| 25 | Lampu            | 11 | 11 | 11 |  |  |  |            |
| 26 | Water Pump Sanyo | 1  | 1  | 1  |  |  |  |            |

### 1.3 : Lista Projectos

Projetu hotu ne'ebe akumula iha lista ne'e bazeia ba dadus projetu ne'ebe sei lao hela no mos projetu ne'ebe abandona ona tinan barak, projetu hirak ne'e fahe tuir lista 1.3.1 Projeto Por Fundus Finansiamientos, 1.3.2 Projeto Por Sectors no 1.3.3 Projeto Por Ministerios.

#### 1.3.1 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamientos

| NO | POSTO<br>ADMINISTRATIVU | TOTAL FI+Fundu Covid-19+LM-BS+LM-CD+LM-TP+PDIM |                           |                              |
|----|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|    |                         | TOTAL<br>PROJECTO                              | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EZECUSAUN (%) |
| 1  | Barique                 | 10                                             | \$ 2.398.501,20           | 42,62%                       |
| 2  | Laclo                   | 9                                              | \$ 49.837.529,51          | 87,47%                       |
| 3  | Laclubar                | 10                                             | \$ 36.823.796,83          | 86,10%                       |
| 4  | Laleia                  | 2                                              | \$ 392.472,03             | 12,03%                       |
| 5  | Manatuto Villa          | 18                                             | \$ 42.264.184,24          | 79,49%                       |
| 6  | Soibada                 | 5                                              | \$ 4.286.667,82           | 85,46%                       |
|    | Grand Total             | 54                                             | \$ 136.003.151,63         | 83,55%                       |



| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | FI             |                        |                           |
|----|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EZECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 2  | Laclo                | 3              | \$ 48.698.873,04       | 87,85%                    |
| 3  | Laclubar             | 2              | \$ 35.075.150,37       | 88,18%                    |
| 4  | Laleia               |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 5  | Manatuto Villa       | 6              | \$ 40.765.491,57       | 80,74%                    |
| 6  | Soibada              | 1              | \$ 3.553.954,20        | 93,93%                    |
|    | Grand Total          | 12             | \$ 128.093.469,18      | 85,85%                    |

| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | Fundo Covid-19 |                        |                           |
|----|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EZECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 2  | Laclo                |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 3  | Laclubar             |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 4  | Laleia               |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 5  | Manatuto Villa       | 2              | \$ 598.668,36          | 86,09%                    |
| 6  | Soibada              |                | \$ -                   | 0,00%                     |
|    | Grand Total          | 2              | \$ 598.668,36          | 86,09%                    |

| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | LM-BS          |                        |                           |
|----|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EZECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              | 2              | \$ 404.938,08          | 54,93%                    |
| 2  | Laclo                | 2              | \$ 240.323,02          | 44,35%                    |
| 3  | Laclubar             | 2              | \$ 675.432,39          | 40,19%                    |
| 4  | Laleia               |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 5  | Manatuto Villa       | 1              | \$ 29.275,84           | 15,92%                    |
| 6  | Soibada              |                | \$ -                   | 0,00%                     |
|    | Grand Total          | 7              | \$ 1.349.969,33        | 44,82%                    |

| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | LM-CD          |                        |                           |
|----|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EZECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              | 7              | \$ 1.876.648,24        | 38,63%                    |
| 2  | Laclo                | 2              | \$ 646.243,79          | 84,96%                    |
| 3  | Laclubar             | 2              | \$ 661.982,34          | 55,55%                    |
| 4  | Laleia               | 2              | \$ 305.588,74          | 8,32%                     |
| 5  | Manatuto Villa       | 1              | \$ 182.701,57          | 6,14%                     |
| 6  | Soibada              | 3              | \$ 630.201,31          | 47,08%                    |
|    | Grand Total          | 17             | \$ 4.303.365,99        | 45,90%                    |

| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | LM-TP          |                        |                           |
|----|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EZECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 2  | Laclo                | 1              | \$ 98.147,27           | 23,56%                    |
| 3  | Laclubar             | 2              | \$ 202.223,29          | 25,59%                    |
| 4  | Laleia               | 1              | \$ 86.883,29           | 25,06%                    |
| 5  | Manatuto Villa       | 5              | \$ 382.490,63          | 15,84%                    |
| 6  | Soibada              | 1              | \$ 102.512,31          | 27,56%                    |
|    | Grand Total          | 10             | \$ 872.256,79          | 21,27%                    |

| NO | POSTO ADMINISTRATIVU | PDIM           |                        |                           |
|----|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                      | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EZECUSAUN (%) |
| 1  | Barique              | 1              | \$ 116.914,88          | 63,99%                    |
| 2  | Laclo                | 1              | \$ 153.942,39          | 84,29%                    |
| 3  | Laclubar             | 2              | \$ 209.008,44          | 41,51%                    |
| 4  | Laleia               |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 5  | Manatuto Villa       | 2              | \$ 305.556,27          | 28,66%                    |
| 6  | Soibada              |                | \$ -                   | 0,00%                     |
|    | Grand Total          | 6              | \$ 785.421,98          | 48,24%                    |



### 1.3.2 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Sectors

| NO          | POR SECTOR                    | TOTAL MUNICIPIO MANATUTO |                        |                          |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|             |                               | TOTAL PROYECTO           | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN(%) |
| 1           | AGRICULTURA                   | 1                        | \$ 370.511,25          | 15,83%                   |
| 2           | AGUA E SANEAMIENTO            | 1                        | \$ 162.377,94          | 41,85%                   |
| 3           | COMERCIO                      | 1                        | \$ 153.942,39          | 84,29%                   |
| 4           | EDIFICIOS PUBLICOS            | 7                        | \$ 1.168.395,22        | 54,65%                   |
| 5           | EDUKASAUN                     | 10                       | \$ 1.054.958,36        | 18,65%                   |
| 6           | ELETRIFIKASAUN NASIONAL       | 2                        | \$ 1.076.003,44        | 78,57%                   |
| 7           | ESTRADAS                      | 15                       | \$ 9.109.569,39        | 61,96%                   |
| 8           | ESTRADAS E PONTES             | 1                        | \$ 394.194,73          | 0,00%                    |
| 9           | FLOOD CONTROL                 | 2                        | \$ 432.138,16          | 56,30%                   |
| 10          | IMPRESTIMO                    | 4                        | \$ 115.112.106,35      | 86,96%                   |
| 11          | JUVENTUDE NO DESPORTU         | 1                        | \$ 2.362.976,44        | 76,00%                   |
| 12          | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | 2                        | \$ 157.560,52          | 41,96%                   |
| 13          | PONTES                        | 1                        | \$ 3.553.954,20        | 93,93%                   |
| 14          | SAUDE                         | 4                        | \$ 588.906,97          | 70,84%                   |
| 15          | TURISMO                       | 2                        | \$ 305.556,27          | 28,66%                   |
| Grand Total |                               | 54                       | \$ 136.003.151,63      | 83,55%                   |

| NO | POR SECTOR                    | Barique        |                        |                          |
|----|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
|    |                               | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN(%) |
| 1  | AGRICULTURA                   | 1              | \$ 370.511,25          | 15,83%                   |
| 2  | AGUA E SANEAMIENTO            | 1              | \$ 162.377,94          | 41,85%                   |
| 3  | COMERCIO                      |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 4  | EDIFICIOS PUBLICOS            | 1              | \$ 408.460,73          | 78,09%                   |
| 5  | EDUKASAUN                     |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 6  | ELETRIFIKASAUN NASIONAL       |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 7  | ESTRADAS                      | 3              | \$ 940.115,74          | 29,92%                   |
| 8  | ESTRADAS E PONTES             |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 9  | FLOOD CONTROL                 | 1              | \$ 242.560,14          | 63,68%                   |
| 10 | IMPRESTIMO                    |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 11 | JUVENTUDE NO DESPORTU         |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 12 | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | 2              | \$ 157.560,52          | 41,96%                   |
| 13 | PONTES                        |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 14 | SAUDE                         | 1              | \$ 116.914,88          | 63,99%                   |
| 15 | TURISMO                       |                | \$ -                   | 0,00%                    |
|    | Grand Total                   | 10             | \$ 2.398.501,20        | 42,62%                   |

| NO          | POR SECTOR                    | Laclo          |                        |                          |
|-------------|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
|             |                               | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN(%) |
| 1           | AGRICULTURA                   |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 2           | AGUA E SANEAMIENTO            |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 3           | COMERCIO                      | 1              | \$ 153.942,39          | 84,29%                   |
| 4           | EDIFICIOS PUBLICOS            | 1              | \$ 50.745,00           | 34,95%                   |
| 5           | EDUKASAUN                     | 1              | \$ 98.147,27           | 23,56%                   |
| 6           | ELETRIFIKASAUN NASIONAL       | 1              | \$ 380.582,61          | 72,08%                   |
| 7           | ESTRADAS                      | 3              | \$ 649.558,35          | 84,99%                   |
| 8           | ESTRADAS E PONTES             |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 9           | FLOOD CONTROL                 | 1              | \$ 189.578,02          | 46,86%                   |
| 10          | IMPRESTIMO                    | 1              | \$ 48.314.975,87       | 87,98%                   |
| 11          | JUVENTUDE NO DESPORTU         |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 12          | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 13          | PONTES                        |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 14          | SAUDE                         |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 15          | TURISMO                       |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| Grand Total |                               | 9              | \$ 49.837.529,51       | 87,47%                   |



| NO          | POR SECTOR                    | Laclubar       |                        |                          |
|-------------|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
|             |                               | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN(%) |
| 1           | AGRICULTURA                   |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 2           | AGUA E SANEAMENTO             |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 3           | COMERCIO                      |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 4           | EDIFICIOS PUBLICOS            |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 5           | EDUKASAUN                     | 2              | \$ 202.223,29          | 25,59%                   |
| 6           | ELETRIFIKASAUN NASIONAL       | 1              | \$ 695.420,83          | 82,11%                   |
| 7           | ESTRADAS                      | 3              | \$ 1.337.414,73        | 47,79%                   |
| 8           | ESTRADAS E PONTES             |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 9           | FLOOD CONTROL                 |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 10          | IMPRESTIMO                    | 1              | \$ 34.379.729,54       | 88,30%                   |
| 11          | JUVENTUDE NO DESPORTU         |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 12          | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 13          | PONTES                        |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 14          | SAUDE                         | 2              | \$ 209.008,44          | 41,51%                   |
| 15          | TURISMO                       |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| Grand Total |                               | 9              | \$ 36.823.796,83       | 86,10%                   |

| NO          | POR SECTOR                    | Laleia         |                        |                          |
|-------------|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
|             |                               | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN(%) |
| 1           | AGRICULTURA                   |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 2           | AGUA E SANEAMENTO             |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 3           | COMERCIO                      |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 4           | EDIFICIOS PUBLICOS            | 1              | \$ 277.330,43          | 0,00%                    |
| 5           | EDUKASAUN                     | 1              | \$ 86.883,29           | 25,06%                   |
| 6           | ELETRIFIKASAUN NASIONAL       |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 7           | ESTRADAS                      | 1              | \$ 28.258,31           | 90,00%                   |
| 8           | ESTRADAS E PONTES             |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 9           | FLOOD CONTROL                 |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 10          | IMPRESTIMO                    |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 11          | JUVENTUDE NO DESPORTU         |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 12          | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 13          | PONTES                        |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 14          | SAUDE                         |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 15          | TURISMO                       |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| Grand Total |                               | 3              | \$ 392.472,03          | 12,03%                   |

| NO | POR SECTOR                    | Manatuto Villa |                        |                          |
|----|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
|    |                               | TOTAL PROYECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EXECUSAUN(%) |
| 1  | AGRICULTURA                   |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 2  | AGUA E SANEAMIENTO            |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 3  | COMERCIO                      |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 4  | EDIFICIOS PUBLICOS            | 3              | \$ 364.960,55          | 72,47%                   |
| 5  | EDUKASAUN                     | 5              | \$ 565.192,20          | 12,70%                   |
| 6  | ELETRIFIKASAUN NASIONAL       |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 7  | ESTRADAS                      | 2              | \$ 5.590.919,46        | 69,52%                   |
| 8  | ESTRADAS E PONTES             | 1              | \$ 394.194,73          | 0,00%                    |
| 9  | FLOOD CONTROL                 |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 10 | IMPRESTIMO                    | 2              | \$ 32.417.400,94       | 84,01%                   |
| 11 | JUVENTUDE NO DESPORTU         | 1              | \$ 2.362.976,44        | 76,00%                   |
| 12 | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 13 | PONTES                        |                | \$ -                   | 0,00%                    |
| 14 | SAUDE                         | 1              | \$ 262.983,65          | 97,19%                   |
| 15 | TURISMO                       | 2              | \$ 305.556,27          | 28,66%                   |
|    | Grand Total                   | 17             | \$ 42.264.184,24       | 79,49%                   |



| NO | POR SECTOR                       | Soibada           |                           |                             |
|----|----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|    |                                  | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EXECUSAUN(%) |
| 1  | AGRICULTURA                      |                   | \$ -                      | 0,00%                       |
| 2  | AGUA E<br>SANEAMENTO             |                   | \$ -                      | 0,00%                       |
| 3  | COMERCIO                         |                   | \$ -                      | 0,00%                       |
| 4  | EDIFICIOS PUBLICOS               | 1                 | \$ 66.898,51              | 55,80%                      |
| 5  | EDUKASAUN                        | 1                 | \$ 102.512,31             | 27,56%                      |
| 6  | ELETRIFIKASAUN<br>NASIONAL       |                   | \$ -                      | 0,00%                       |
| 7  | ESTRADAS                         | 3                 | \$ 563.302,80             | 46,05%                      |
| 8  | ESTRADAS E<br>PONTES             |                   | \$ -                      | 0,00%                       |
| 9  | FLOOD CONTROL                    |                   | \$ -                      | 0,00%                       |
| 10 | IMPRESTIMO                       |                   | \$ -                      | 0,00%                       |
| 11 | JUVENTUDE NO<br>DESPORTU         |                   | \$ -                      | 0,00%                       |
| 12 | MANUTENSAUN NO<br>REHABILITASAUN |                   | \$ -                      | 0,00%                       |
| 13 | PONTES                           | 1                 | \$ 3.553.954,20           | 93,93%                      |
| 14 | SAUDE                            |                   | \$ -                      | 0,00%                       |
| 15 | TURISMO                          |                   | \$ -                      | 0,00%                       |
|    | Grand Total                      | 6                 | \$ 4.286.667,82           | 85,46%                      |

### 1.3.3 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Ministerios

| NO          | POR MINISTERIO                                                   | GRAND TOTAL    |                        |                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                                                  | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EZECUSAUN (%) |
| 1           | ESTATAL                                                          | 2              | \$ 305.556,27          | 28,66%                    |
| 2           | MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS                                  | 1              | \$ 370.511,25          | 15,83%                    |
| 3           | MINISTERIO DA DEFESA                                             | 1              | \$ 189.578,02          | 46,86%                    |
| 4           | MINISTERIO DA JUSTICA                                            | 1              | \$ 29.275,84           | 15,92%                    |
| 5           | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | 27             | \$ 129.808.326,71      | 84,90%                    |
| 6           | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU                        | 12             | \$ 1.121.856,87        | 20,86%                    |
| 7           | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU                                   | 1              | \$ 277.330,43          | 0,00%                     |
| 8           | MINISTERIO SAUDE                                                 | 5              | \$ 924.591,68          | 73,22%                    |
| 9           | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA                          | 2              | \$ 204.687,39          | 72,06%                    |
| 10          | MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL | 1              | \$ 408.460,73          | 78,09%                    |
| 11          | SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU                         | 1              | \$ 2.362.976,44        | 76,00%                    |
| Grand Total |                                                                  | 54             | \$ 136.003.151,63      | 83,55%                    |

| NO | POR MINISTERIO                                                               | Barique           |                           |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|    |                                                                              | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EZECUSAUN (%) |
| 1  | ESTATAL                                                                      |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 2  | MINISTERIO<br>AGRIKULTURA E<br>PESCAS                                        | 1                 | \$ 370.511,25             | 15,83%                       |
| 3  | MINISTERIO DA<br>DEFESA                                                      |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 4  | MINISTERIO DA<br>JUSTICA                                                     |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 5  | MINISTERIO DAS<br>OBRAS PUBLICAS                                             | 7                 | \$ 1.502.614,34           | 37,92%                       |
| 6  | MINISTERIO<br>EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                           |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 7  | MINISTERIO PLANU E<br>ORDENAMENTU                                            |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 8  | MINISTERIO SAUDE                                                             | 1                 | \$ 116.914,88             | 63,99%                       |
| 9  | MINISTERIO<br>TURISMO KOMERCIO<br>E INDUSTRIA                                |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 10 | MINISTRO PARA OS<br>ASSUNTOS DOS<br>COMBATENTES DA<br>LIBERTAÇÃO<br>NACIONAL | 1                 | \$ 408.460,73             | 78,09%                       |
| 11 | SECRETARIADO<br>ESTADO JUVENTUDE<br>E DESPORTU                               |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
|    | Grand Total                                                                  | 10                | \$ 2.398.501,20           | 42,62%                       |



| NO | POR MINISTERIO                                                               | Laclo             |                           |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|    |                                                                              | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EZECUSAUN (%) |
| 1  | ESTATAL                                                                      |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 2  | MINISTERIO<br>AGRIKULTURA E<br>PESCAS                                        |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 3  | MINISTERIO DA<br>DEFESA                                                      | 1                 | \$ 189.578,02             | 46,86%                       |
| 4  | MINISTERIO DA<br>JUSTICA                                                     |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 5  | MINISTERIO DAS<br>OBRAS PUBLICAS                                             | 5                 | \$ 49.345.116,83          | 87,81%                       |
| 6  | MINISTERIO<br>EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                           | 1                 | \$ 98.147,27              | 23,56%                       |
| 7  | MINISTERIO PLANU E<br>ORDENAMENTU                                            |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 8  | MINISTERIO SAUDE                                                             |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 9  | MINISTERIO<br>TURISMO KOMERCIO<br>E INDUSTRIA                                | 2                 | \$ 204.687,39             | 72,06%                       |
| 10 | MINISTRO PARA OS<br>ASSUNTOS DOS<br>COMBATENTES DA<br>LIBERTAÇÃO<br>NACIONAL |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 11 | SECRETARIADO<br>ESTADO JUVENTUDE<br>E DESPORTU                               |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
|    | Grand Total                                                                  | 9                 | \$ 49.837.529,51          | 87,47%                       |

| NO | POR MINISTERIO                                                   | Laclubar       |                        |                           |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                                                                  | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EZECUSAUN (%) |
| 1  | ESTATAL                                                          |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 2  | MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS                                  |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 3  | MINISTERIO DA DEFESA                                             |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 4  | MINISTERIO DA JUSTICA                                            |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 5  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | 5              | \$ 36.412.565,10       | 86,69%                    |
| 6  | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU                        | 2              | \$ 202.223,29          | 25,59%                    |
| 7  | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU                                   |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 8  | MINISTERIO SAUDE                                                 | 2              | \$ 209.008,44          | 41,51%                    |
| 9  | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA                          |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 10 | MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 11 | SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU                         |                | \$ -                   | 0,00%                     |
|    | Grand Total                                                      | 9              | \$ 36.823.796,83       | 86,10%                    |

| NO | POR MINISTERIO                                                               | Laleia            |                           |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|    |                                                                              | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EZECUSAUN (%) |
| 1  | ESTATAL                                                                      |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 2  | MINISTERIO<br>AGRIKULTURA E<br>PESCAS                                        |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 3  | MINISTERIO DA<br>DEFESA                                                      |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 4  | MINISTERIO DA<br>JUSTICA                                                     |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 5  | MINISTERIO DAS<br>OBRAS PUBLICAS                                             | 1                 | \$ 28.258,31              | 90,00%                       |
| 6  | MINISTERIO<br>EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                           | 1                 | \$ 86.883,29              | 25,06%                       |
| 7  | MINISTERIO PLANU E<br>ORDENAMENTU                                            | 1                 | \$ 277.330,43             | 0,00%                        |
| 8  | MINISTERIO SAUDE                                                             |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 9  | MINISTERIO<br>TURISMO KOMERCIO<br>E INDUSTRIA                                |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 10 | MINISTRO PARA OS<br>ASSUNTOS DOS<br>COMBATENTES DA<br>LIBERTAÇÃO<br>NACIONAL |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 11 | SECRETARIADO<br>ESTADO JUVENTUDE<br>E DESPORTU                               |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
|    | Grand Total                                                                  | 3                 | \$ 392.472,03             | 12,03%                       |



| NO | POR MINISTERIO                                                               | Manatuto Villa    |                           |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|    |                                                                              | TOTAL<br>PROJECTO | MONTANTE<br>KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN<br>EZECUSAUN (%) |
| 1  | ESTATAL                                                                      | 2                 | \$ 305.556,27             | 28,66%                       |
| 2  | MINISTERIO<br>AGRIKULTURA E<br>PESCAS                                        |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 3  | MINISTERIO DA<br>DEFESA                                                      |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 4  | MINISTERIO DA<br>JUSTICA                                                     | 1                 | \$ 29.275,84              | 15,92%                       |
| 5  | MINISTERIO DAS<br>OBRAS PUBLICAS                                             | 4                 | \$ 38.402.515,13          | 81,04%                       |
| 6  | MINISTERIO<br>EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E<br>DESPORTU                           | 6                 | \$ 565.192,20             | 12,70%                       |
| 7  | MINISTERIO PLANU E<br>ORDENAMENTU                                            |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 8  | MINISTERIO SAUDE                                                             | 3                 | \$ 598.668,36             | 86,09%                       |
| 9  | MINISTERIO<br>TURISMO KOMERCIO<br>E INDUSTRIA                                |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 10 | MINISTRO PARA OS<br>ASSUNTOS DOS<br>COMBATENTES DA<br>LIBERTAÇÃO<br>NACIONAL |                   | \$ -                      | 0,00%                        |
| 11 | SECRETARIADO<br>ESTADO JUVENTUDE<br>E DESPORTU                               | 1                 | \$ 2.362.976,44           | 76,00%                       |
|    | Grand Total                                                                  | 17                | \$ 42.264.184,24          | 79,49%                       |

| NO | POR MINISTERIO                                                   | Soibada        |                        |                           |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
|    |                                                                  | TOTAL PROJECTO | MONTANTE KONTRATO (\$) | PRESENTAZEN EZECUSAUN (%) |
| 1  | ESTATAL                                                          |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 2  | MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS                                  |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 3  | MINISTERIO DA DEFESA                                             |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 4  | MINISTERIO DA JUSTICA                                            |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 5  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | 4              | \$ 4.117.257,00        | 87,38%                    |
| 6  | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU                        | 2              | \$ 169.410,82          | 38,71%                    |
| 7  | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU                                   |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 8  | MINISTERIO SAUDE                                                 |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 9  | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA                          |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 10 | MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL |                | \$ -                   | 0,00%                     |
| 11 | SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU                         |                | \$ -                   | 0,00%                     |
|    | Grand Total                                                      | 6              | \$ 4.286.667,82        | 85,46%                    |

#### 1.4. Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto

| Posto Administrativo, Suco<br>no Sexu | 2022          |                                   |              |                                              |              |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
|                                       | Total         | Idade produktivu<br>(idade 15-64) |              | Idade la produktivu (idade 0-14+65 ba leten) |              |
|                                       |               | Male                              | Female       | Male                                         | Female       |
| <b>Barique</b>                        | <b>5,833</b>  | <b>1,924</b>                      | <b>1,617</b> | <b>1,183</b>                                 | <b>1,109</b> |
| <b>Laclo</b>                          | <b>8,193</b>  | <b>2,250</b>                      | <b>2,185</b> | <b>1,919</b>                                 | <b>1,838</b> |
| <b>Laclubar</b>                       | <b>12,777</b> | <b>3,445</b>                      | <b>3,571</b> | <b>2,924</b>                                 | <b>2,836</b> |
| <b>Laleia</b>                         | <b>3,930</b>  | <b>1,181</b>                      | <b>1,189</b> | <b>817</b>                                   | <b>743</b>   |
| <b>Manatuto</b>                       | <b>15,446</b> | <b>4,741</b>                      | <b>4,609</b> | <b>3,109</b>                                 | <b>2,987</b> |
| <b>Soibada</b>                        | <b>3,511</b>  | <b>237</b>                        | <b>213</b>   | <b>239</b>                                   | <b>259</b>   |

Fontes : Projeksaun Populasaun bazea ba Census Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

## II. PROGRESU FISIKU

### 2.1. Progressu Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan nia laran, husi lista #anexu B hatudu progresu aktual fulan ida ne'e ho nia prensentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu prentangen aktual fulan ida ne'e hatudu progresu fisiku komulativu husi prosentu antrior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare iha #anexu B, detallu ba back-up #anexu C, no Instrusaun Servisu #Anexu D.



### III. OBSTÁCLO IHA TERENU

#### 3.1. Obtáclo Servisu iha Terenu

Observasaun geral ba projeto hirak nebe mak implementa iha Munisipio Manatuto

1. Projeto Lao la tuir tempo nebee asina entre parte rua
2. Laiha tekniko supervisaun husi projeto nain atu halo kontrolo diaramente
3. Tekniko kompanha la iha tereno
4. Skill badaen neebe mak la dun professional

Obstalku teknik A.D.N hasoru

1. Distansia ne'ebe dook difikulta teknik atu servisu lalais
2. Kondisaun estrada neébe a'at
3. Kontraktor sira ne'ebe mak servisu iha terreno barak mak la tuir Spesifikasaun ne'ebe iha kontartu laran.
4. Planu Mapamentu Engenheiro Munisipiu la konsege realiza tuir planu tamba hare hosi nia distansia ne'ebe dook.
5. Sistema dropbox iha Munisipiu dala ruma iha problema lina internet

## **IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU**

### **4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu**

1. Presija tebes atu aumenta ema iha Munisipiu atu nune bele halo servisu ba administrasaun ne'ebe efektivu.
2. Sebele sistema dropbox tau mos iha dekstop Munisipiu para labele atraja ami nia servisu.

**Note: Asinatura Husi Eng. Municipio Manatuto**

| Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Manatuto |            |                           |             |                |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                           | Deskrisaun | Identidade                |             |                |                                                                                       | Asinatura                                                                             |
|                                              |            | Naran Kompletu            | Nu. ID Card | Pozisaun       | Fotografia                                                                            |                                                                                       |
| 1                                            | Enjineiru  | Quico Adelino Junior      | 240         | Enjineiru EPAS |    |    |
|                                              |            | José R. Carlos Gusmão     | 168         | Enjineiru ITI  |   |  |
|                                              |            | Domingos da Costa e Silva | 250         | Enjineiru ITI  |  |  |



|   |           |                            |     |                   |                                                                                       |                                                                                       |
|---|-----------|----------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           | Adonis Julio<br>Fernandes  | 152 | Enjineiru<br>ME   |    |    |
| 2 | Enjineira | Olivia Soares              | 112 | Enjineira<br>VEBD |    |    |
| 3 | Motorista | Timoteo da Silva<br>Morais | 120 | Motorista         |  |  |

# #ANEXU A

## MUNICIPIO MANATUTO ( LISTA GERAL )

### Localizasaun Projeto

| NU. | PMIS CODE | NARAN PROJ.                                                                                                       | DONO PROJ.                                | KAT. PROJ.     | SECTOR                | Posto Administrativo | MUNI.    | NARAN COMP.                                                    | MONT. KONT. (\$) | DATA KONT.     | PROG. FISIKU (%) | PROG. PAGA. (%) | PAGA. (\$)       | BAL. (\$)       | Status Projecto | OBS                                                        |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | P0281     | Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila ( 3.72 km ) area in Manatuto Municipality Manatuto                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI             | ESTRADAS              | Manatuto Villa       | Manatuto | Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda                        | \$ 2,561,405.06  | Aug. 25, 2018  | 63.80%           | 57.33%          | \$ 1,468,479.04  | \$ 1,092,926.02 | ON-GOING        |                                                            |
| 2   | P0282     | Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte ( 4.68 km ) in Manatuto Municipio Manatuto | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI             | ESTRADAS              | Manatuto Villa       | Manatuto | Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda                           | \$ 3,029,514.40  | Aug. 25, 2017  | 89.20%           | 79.82%          | \$ 2,418,275.38  | \$ 611,239.02   | ON-GOING        |                                                            |
| 3   | P0326     | Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto                                                                 | SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU  | FI             | JUVENTUDE NO DESPORTU | Manatuto Villa       | Manatuto | Obrai Unipessoal, Lda                                          | \$ 2,362,976.44  | June 30, 2015  | 82.08%           | 76.00%          | \$ 1,795,843.89  | \$ 567,132.55   | ON-GOING        |                                                            |
| 4   | P0377     | Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction ( Sta. 65+235 - 100+355 )           | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI             | IMPRESTIMO            | Manatuto Villa       | Manatuto | R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group | \$ 28,011,854.94 | Feb. 10, 2014  | 94.91%           | 85.62%          | \$ 23,983,565.18 | \$ 4,028,289.76 | ON-GOING        |                                                            |
| 5   | P0379     | Consultant Supervision (M-L & L-N)                                                                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI             | IMPRESTIMO            | Manatuto Villa       | Manatuto | Sinotech Engineering Consultant                                | \$ 4,405,546.00  | Sept. 3, 2014  | 73.76%           | 73.76%          | \$ 3,249,684.75  | \$ 1,155,861.25 | ON-GOING        |                                                            |
| 6   | P0788     | Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto                                | ESTATAL                                   | PDIM           | TURISMO               | Manatuto Villa       | Manatuto | Carya Timor Leste Unip. Lda                                    | \$ 79,155.54     | Dec. 18, 2019  | 88.07%           | 79.26%          | \$ 62,737.67     | \$ 16,417.87    | ON-GOING        |                                                            |
| 7   | P0789     | Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto                                             | ESTATAL                                   | PDIM           | TURISMO               | Manatuto Villa       | Manatuto | Carya Timor Leste Lda                                          | \$ 226,400.73    | Dec. 18, 2019  | 43.70%           | 10.97%          | \$ 24,834.32     | \$ 201,566.41   | ON-GOING        |                                                            |
| 8   | P0872     | Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto                                                               | MINISTERIO DA JUSTICA                     | LM-BS          | EDIFICIOS PUBLICOS    | Manatuto Villa       | Manatuto | Baboe Unip Lda                                                 | \$ 29,275.84     | March 1, 2020  | 15.92%           | 15.92%          | \$ 4,660.85      | \$ 24,614.99    | ON-GOING        |                                                            |
| 9   | P0954     | Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Municipiu Manatuto, Timor Leste                                                  | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19 | SAUDE                 | Manatuto Villa       | Manatuto | Talamori Unip.Lda                                              | \$ 262,983.65    | 09-Dec-20      | 100.00%          | 97.19%          | \$ 255,587.87    | \$ 7,395.78     | ON-GOING        |                                                            |
| 10  | P2538     | New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality                                  | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19 | EDIFICIOS PUBLICOS    | Manatuto Villa       | Manatuto | K-6, UNIPESSOAL LDA                                            | \$ 257,748.51    | Jan. 12, 2022  | 88.89%           | 74.56%          | \$ 192,164.43    | \$ 65,584.08    | ON-GOING        |                                                            |
| 11  | P2539     | Supply and Installtion Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality           | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19 | EDIFICIOS PUBLICOS    | Manatuto Villa       | Manatuto | Fraternity Unipessoal Lda                                      | \$ 77,936.20     | Jan. 12, 2022  | 92.28%           | 86.81%          | \$ 67,657.50     | \$ 10,278.70    | ON-GOING        |                                                            |
| 12  | P1806     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala                                                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP          | EDUKASAUN             | Manatuto Villa       | Manatuto | MEJD PKRIE ESG KAY RALA                                        | \$ 62,996.83     | Oct. 15, 2021  | 31.90%           | 24.62%          | \$ 15,507.66     | \$ 47,489.17    | ON-GOING        |                                                            |
| 13  | P1808     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau                                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP          | EDUKASAUN             | Manatuto Villa       | Manatuto | MEJD PKRIE EBF RENTAU                                          | \$ 64,383.50     | Oct. 15, 2021  | 52.40%           | 50.49%          | \$ 32,504.67     | \$ 31,878.83    | ON-GOING        | Progreso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 23.85% |
| 14  | P1809     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor                                                                        | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP          | EDUKASAUN             | Manatuto Villa       | Manatuto | MEJD PKRIE PE REMBOR                                           | \$ 88,918.34     | Oct. 15, 2021  | 29.45%           | 0.00%           | \$ -             | \$ 88,918.34    | ON-GOING        | Progreso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 5.07%  |
| 15  | P1811     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato                                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP          | EDUKASAUN             | Manatuto Villa       | Manatuto | MEJD PKRIE EBF OBRATO                                          | \$ 66,144.65     | Oct. 15, 2021  | 38.17%           | 22.03%          | \$ 14,570.40     | \$ 51,574.25    | ON-GOING        |                                                            |
| 16  | P2041     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik                                                                      | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP          | EDUKASAUN             | Manatuto Villa       | Manatuto | MEJD PKRIE EBF BAHADIK                                         | \$ 100,047.31    | Oct. 15, 2021  | 14.58%           | 14.58%          | \$ 14,590.20     | \$ 85,457.11    | ON-GOING        |                                                            |
| 17  | P1953     | Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto                                                                    | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-CD          | EDUKASAUN             | Manatuto Villa       | Manatuto | Parapa Bemizuu Star Unipessoal Lda                             | \$ 182,701.57    | Dec. 7, 2022   | 6.82%            | 6.14%           | \$ 11,214.18     | \$ 171,487.39   | ON-GOING        |                                                            |
| 18  | P1581     | Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km                                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI             | ESTRADAS E PONTES     | Manatuto Villa       | Manatuto | Kartini Unipessoal Lda                                         | \$ 394,194.73    | April 28, 2022 | 0.00%            | 0.00%           | \$ -             | \$ 394,194.73   | ON-GOING        |                                                            |
| 19  | P0627     | Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia                                                     | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU            | LM-CD          | EDIFICIOS PUBLICOS    | Laleia               | Manatuto | DCO Unip.Lda                                                   | \$ 277,330.43    | July 18, 2019  | 0.00%            | 0.00%           | \$ -             | \$ 277,330.43   | ON-GOING        |                                                            |



# #ANEXU A

## MUNICIPIO MANATUTO ( LISTA GERAL )

### Localizasaun Projeto

| NU. | PMIS CODE | NARAN PROJ.                                                                                                                                    | DONO PROJ.                                | KAT. PROJ. | SECTOR                        | Posto Administrativo | MUNI.    | NARAN COMP.                                        | MONT. KONT. (\$) | DATA KONT.     | PROG. FISIKU (%) | PROG. PAGA. (%) | PAGA. (\$)       | BAL. (\$)       | Status Projecto | OBS                                                         |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 20  | P0986     | R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800                                                                     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | ESTRADAS                      | Laleia               | Manatuto | As Jazesia Unipessoal Lda                          | \$ 28,258.31     | June 10, 2021  | 100.00%          | 90.00%          | \$ 25,432.48     | \$ 2,825.83     | ON-GOING        |                                                             |
| 21  | P1810     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui                                                                                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP      | EDUKASAUN                     | Laleia               | Manatuto | MEJD PKRIE EP CAIRUI                               | \$ 86,883.29     | Oct. 15, 2021  | 28.43%           | 25.06%          | \$ 21,771.04     | \$ 65,112.25    | ON-GOING        |                                                             |
| 22  | P0114     | New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality                             | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI         | ELETRIFIKASAUN NASIONAL       | Laclubar             | Manatuto | Tasibala III Unip. Lda                             | \$ 695,420.83    | June 7, 2016   | 91.52%           | 82.11%          | \$ 571,034.27    | \$ 124,386.56   | ON-GOING        |                                                             |
| 23  | P0378     | Road Network Upgrading Sector Project ( RNUSP )Upgrading and Maintenance of Laclubar Junction - Natarbora Road ( Sta. 100+360 - Sta. 144+995 ) | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI         | IMPRESTIMO                    | Laclubar             | Manatuto | China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD   | \$ 34,379,729.54 | Nov. 20, 2014  | 92.04%           | 88.30%          | \$ 30,356,507.52 | \$ 4,023,222.02 | ON-GOING        |                                                             |
| 24  | P0899     | Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)                                                      | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS      | ESTRADAS                      | Laclubar             | Manatuto | Hatuwari Unip. Lda                                 | \$ 481,029.67    | Aug. 25, 2020  | 54.37%           | 11.80%          | \$ 126,501.30    | \$ 354,528.37   | ON-GOING        |                                                             |
| 25  | P0917     | Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)                                                                  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS      | ESTRADAS                      | Laclubar             | Manatuto | Ryzena Unipessoal Lda                              | \$ 194,402.72    | Dec. 20, 2019  | 82.83%           | 74.55%          | \$ 144,924.09    | \$ 49,478.63    | ON-GOING        |                                                             |
| 26  | P0977     | R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000                                                                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | ESTRADAS                      | Laclubar             | Manatuto | Sun Rise Golden Construction 02 Lda                | \$ 448,209.39    | June 10, 2021  | 95.04%           | 82.05%          | \$ 367,756.59    | \$ 80,452.80    | ON-GOING        |                                                             |
| 27  | P0983     | R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000                                                                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | ESTRADAS                      | Laclubar             | Manatuto | Adahiak Orlao Unipessoal Lda                       | \$ 213,772.95    | June 10, 2021  | 7.12%            | 0.00%           | \$ -             | \$ 213,772.95   | ON-GOING        |                                                             |
| 28  | P0775     | Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek                                                                                           | MINISTERIO SAUDE                          | PDIM       | SAUDE                         | Laclubar             | Manatuto | Hatuwari Unip. Lda                                 | \$ 120,962.71    | July 28, 2019  | 71.23%           | 64.11%          | \$ 77,547.51     | \$ 43,415.20    | ON-GOING        |                                                             |
| 29  | P1803     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara                                                                                                    | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP      | EDUKASAUN                     | Laclubar             | Manatuto | MEJD PKRIE EBF BATARA                              | \$ 102,060.99    | Oct. 15, 2021  | 44.47%           | 25.60%          | \$ 26,125.75     | \$ 75,935.24    | ON-GOING        | Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 18.87% |
| 30  | P1804     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um                                                                                                  | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP      | EDUKASAUN                     | Laclubar             | Manatuto | MEJD PKRIE EBF AISIU-UM                            | \$ 100,162.30    | Oct. 15, 2021  | 25.60%           | 25.59%          | \$ 25,626.77     | \$ 74,535.53    | ON-GOING        |                                                             |
| 31  | P0316     | Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste                                              | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI         | PONTES                        | Soibada              | Manatuto | FIRDO UNIPESSOAL LDA                               | \$ 3,553,954.20  | Feb. 27, 2017  | 100.00%          | 93.93%          | \$ 3,338,377.84  | \$ 215,576.36   | ON-GOING        |                                                             |
| 32  | P0932     | For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town                  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | ESTRADAS                      | Soibada              | Manatuto | Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan | \$ 164,154.00    | March 25, 2020 | 70.00%           | 70.00%          | \$ 114,907.80    | \$ 49,246.20    | ON-GOING        |                                                             |
| 33  | P0981     | R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000                                                         | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | ESTRADAS                      | Soibada              | Manatuto | Manufahi Kiik Unip. Lda                            | \$ 203,036.57    | June 10, 2021  | 47.63%           | 41.78%          | \$ 84,819.65     | \$ 118,216.92   | ON-GOING        |                                                             |
| 34  | P0984     | R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700                                                                    | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | ESTRADAS                      | Soibada              | Manatuto | Ryzena Unipessoal Lda                              | \$ 196,112.23    | June 10, 2021  | 50.20%           | 30.42%          | \$ 59,662.31     | \$ 136,449.92   | ON-GOING        |                                                             |
| 35  | P1814     | Projetu Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto                                                                  | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-CD      | EDIFICIOS PUBLICOS            | Soibada              | Manatuto | Manufahi Kiik Unip. Lda                            | \$ 66,898.51     | Nov. 26, 2021  | 78.97%           | 55.80%          | \$ 37,330.95     | \$ 29,567.56    | ON-GOING        |                                                             |
| 36  | P1807     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik                                                                                                 | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP      | EDUKASAUN                     | Soibada              | Manatuto | MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK                           | \$ 102,512.31    | Oct. 15, 2021  | 31.76%           | 27.56%          | \$ 28,253.89     | \$ 74,258.42    | ON-GOING        |                                                             |
| 37  | P0940     | Construction of Sahen Bridge Approach Protection ( A14 ) Manatuto ( MPW-W-190157 ) (162)                                                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS      | FLOOD CONTROL                 | Barique              | Manatuto | Yoku Unipessoal Lda                                | \$ 242,560.14    | Oct. 24, 2019  | 70.75%           | 63.68%          | \$ 154,455.92    | \$ 88,104.22    | Abandona        |                                                             |
| 38  | P0404     | New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora                                                                  | MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS           | LM-CD      | AGRICULTURA                   | Barique              | Manatuto | Tasibala II Const                                  | \$ 370,511.25    | Sept. 13, 2016 | 17.59%           | 15.83%          | \$ 58,645.87     | \$ 311,865.38   | Abandona        | Abandona                                                    |
| 39  | P0540     | Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)                                     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD      | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Barique              | Manatuto | Zenobia Diak Unip.Lda                              | \$ 15,875.56     | Jan. 7, 2017   | 100.00%          | 87.26%          | \$ 13,853.09     | \$ 2,022.47     | PHO             | Abandona                                                    |
| 40  | P0784     | Konstrusaun Postu Saude Ameta Laran-Barique                                                                                                    | MINISTERIO SAUDE                          | PDIM       | SAUDE                         | Barique              | Manatuto | Malack II Unip. Lda                                | \$ 116,914.88    | Sept. 23, 2019 | 71.10%           | 63.99%          | \$ 74,817.23     | \$ 42,097.65    | ON-GOING        |                                                             |



## #ANEXU A

### MUNICIPIO MANATUTO ( LISTA GERAL )

#### Localizasaun Projeto

| NU. | PMIS CODE | NARAN PROJ.                                                                                                                       | DONO PROJ.                                                       | KAT. PROJ. | SECTOR                        | Posto Administrativo | MUNI.    | NARAN COMP.                   | MONT. KONT. (\$)         | DATA KONT.     | PROG. FISIKU (%) | PROG. PAGA. (%) | PAGA. (\$)               | BAL. (\$)               | Status Projecto | OBS                                                         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 41  | P0873     | Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Ametalaran /162                                                                    | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-BS      | AGUA E SANEAMENTO             | Barique              | Manatuto | Malaca Unip Lda               | \$ 162,377.94            | Oct. 8, 2019   | 46.50%           | 41.85%          | \$ 67,961.57             | \$ 94,416.37            | ON-GOING        |                                                             |
| 42  | P0921     | R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162) | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD      | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Barique              | Manatuto | Manufahi Kiik Unip. Lda       | \$ 141,684.96            | Aug. 25, 2019  | 41.78%           | 36.88%          | \$ 52,260.01             | \$ 89,424.95            | ON-GOING        |                                                             |
| 43  | P0978     | R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200                                                  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD      | ESTRADAS                      | Barique              | Manatuto | We"coi Unipessoal Lda         | \$ 343,111.47            | June 10, 2021  | 63.25%           | 21.97%          | \$ 75,370.79             | \$ 267,740.68           | ON-GOING        | Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 18.45% |
| 44  | P0982     | R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000                                              | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD      | ESTRADAS                      | Barique              | Manatuto | Linoel                        | \$ 296,211.81            | June 10, 2021  | 18.83%           | 15.96%          | \$ 47,266.94             | \$ 248,944.87           | ON-GOING        |                                                             |
| 45  | P0985     | R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000                                                         | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD      | ESTRADAS                      | Barique              | Manatuto | Gimso Brothers Unip. Lda      | \$ 300,792.46            | July 10, 2021  | 88.60%           | 52.76%          | \$ 158,690.94            | \$ 142,101.52           | ON-GOING        |                                                             |
| 46  | P1056     | New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora                                            | MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL | LM-CD      | EDIFICIOS PUBLICOS            | Barique              | Manatuto | Senizu                        | \$ 408,460.73            | Oct. 18, 2021  | 94.45%           | 78.09%          | \$ 318,953.66            | \$ 89,507.07            | ON-GOING        | Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 7.70%  |
| 47  | P0061     | New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality                                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | FI         | ELETRIFIKASAUN NASIONAL       | Lacio                | Manatuto | Anopa Electrical Unip. Lda    | \$ 380,582.61            | Sept. 1, 2016  | 95.99%           | 72.08%          | \$ 274,330.03            | \$ 106,252.58           | ON-GOING        |                                                             |
| 48  | P0221     | Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto                                                                 | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | FI         | ESTRADAS                      | Lacio                | Manatuto | Sahan I Unip.Lda              | \$ 3,314.56              | Sept. 27, 2016 | 100.00%          | 90.00%          | \$ 2,983.11              | \$ 331.45               | PHO             | Falta Retensaun                                             |
| 49  | P0926     | For Roads & Bridges Maintenance Section : Mantanen Lacio, Manatuto Municipality                                                   | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD      | ESTRADAS                      | Lacio                | Manatuto | Egana, Unip. Lda              | \$ 223,843.79            | Dec. 13, 2019  | 68.89%           | 56.58%          | \$ 126,647.74            | \$ 97,196.05            | ON-GOING        |                                                             |
| 50  | P0692     | Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food                                                                                     | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA                          | LM-BS      | EDIFICIOS PUBLICOS            | Lacio                | Manatuto | Esa-Un                        | \$ 50,745.00             | May 2, 2016    | 38.83%           | 34.95%          | \$ 17,736.12             | \$ 33,008.88            | PENDENTE        |                                                             |
| 51  | P0776     | Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilimano                                                                                     | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA                          | PDIM       | COMERCIO                      | Lacio                | Manatuto | Surprise Unip. Lda            | \$ 153,942.39            | Sept. 12, 2016 | 97.16%           | 84.29%          | \$ 129,753.97            | \$ 24,188.42            | ON-GOING        |                                                             |
| 52  | P0396     | National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)                                                             | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | FI         | IMPRESTIMO                    | Lacio                | Manatuto | Sinohydro Corporation Limited | \$ 48,314,975.87         | May.3, 2016    | 87.98%           | 87.98%          | \$ 42,506,027.78         | \$ 5,808,948.09         | ON-GOING        |                                                             |
| 53  | P1805     | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun                                                                                    | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU                        | LM-TP      | EDUKASAUN                     | Lacio                | Manatuto | MEJD PKRIE EBC REMANARUN      | \$ 98,147.27             | Oct. 15, 2021  | 23.59%           | 23.56%          | \$ 23,122.26             | \$ 75,025.01            | ON-GOING        |                                                             |
| 54  | P2603     | Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp at Behau                                                                               | MINISTERIO DA DEFESA                                             | LM-BS      | FLOOD CONTROL                 | Lacio                | Manatuto | Baboe Unip Lda                | \$ 189,578.02            | May 23, 2022   | 52.07%           | 46.86%          | \$ 88,843.95             | \$ 100,734.07           | ON-GOING        |                                                             |
|     |           | <b>TOTAL</b>                                                                                                                      |                                                                  |            |                               |                      |          |                               | <b>\$ 135,492,705.90</b> |                |                  |                 | <b>\$ 113,210,178.73</b> | <b>\$ 22,181,793.10</b> |                 |                                                             |

  
1. Eng. José Roberto C. Gusmão  
Eng. ba Projeto Infrastrutura e  
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Prepara Husi:  
  
2. Eng. Domingos D.X. Silva  
Eng. ba Projeto Infrastrutura e  
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

  
3. Eng. Quico Adelino Junior  
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Edificiu Público, Be'e  
no Saneamento Municipiu Manatuto, ADN, I.P

  
4. Eng. Adonys Julio Fernandes  
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

Certifika Husi:  
  
Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas  
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De  
Qualidade ADN,I.P



LISTA #ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN

| LOKALIZASAUN PROJETU |                                                                                                                                  |                                           |                   |                               |                      |           |                                                                |                                                  |                             |                        |                | Jan-23            |                     |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| NU.                  | NARAN PROJETU                                                                                                                    | DONO PROJETU                              | KATEGORIA PROJETU | SECTOR                        | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHA                                                 |                                                  | NUMERO KONTRATU             | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU  | Previous Progress | This Month Progress | Komulativo Progress |
| 1                    | Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila ( 3.72 km ) area in Manatuto Municipality Manatuto                                  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                      | Manatuto Villa       | Manatuto  | Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda                        |                                                  | SSS/062/MOPTC-2017          | \$ 2,561,405.06        | Aug. 25, 2018  | 63.80%            |                     | 63.80%              |
| 2                    | Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte ( 4.68 km ) in Manatuto Municipio Manatuto                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS                      | Manatuto Villa       | Manatuto  | Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda                           |                                                  | SSS/061/MOPTC-2017          | \$ 3,029,514.40        | Aug. 25, 2017  | 89.20%            |                     | 89.20%              |
| 3                    | Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto                                                                                | SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU  | FI                | JUVENTUDE NO DESPORTU         | Manatuto Villa       | Manatuto  | Obrai Unipessoal, Lda                                          |                                                  | ICB/0128/SEJD-2014          | \$ 2,362,976.44        | June 30, 2015  | 82.08%            |                     | 82.08%              |
| 4                    | Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction ( Sta. 65+235 - 100+355 )                          | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | IMPRESTIMO                    | Manatuto Villa       | Manatuto  | R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group |                                                  | ICB/023/MPW-2013            | \$ 28,011,854.94       | Feb. 10, 2014  | 94.91%            |                     | 94.91%              |
| 5                    | Consultant Supervision (M-L & L-N)                                                                                               | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | IMPRESTIMO                    | Manatuto Villa       | Manatuto  | Sinotech Engineering Consultant                                |                                                  | QCBS/019/MPW-2013           | \$ 4,405,546.00        | Sept. 3, 2014  | 73.76%            |                     | 73.76%              |
| 6                    | Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto                                               | ESTATAL                                   | PDIM              | TURISMO                       | Manatuto Villa       | Manatuto  | Carya Timor Leste Unip. Lda                                    |                                                  | 08/PDIM-I/MNTT/XII/2019     | \$ 79,155.54           | Dec. 18, 2019  | 88.07%            |                     | 88.07%              |
| 7                    | Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto                                                            | ESTATAL                                   | PDIM              | TURISMO                       | Manatuto Villa       | Manatuto  | Carya Timor Leste Lda                                          |                                                  | 01/PDIM-I/MNTT/XII/2019     | \$ 226,400.73          | Dec. 18, 2019  | 43.70%            |                     | 43.70%              |
| 8                    | Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisiupi Manatuto                                                                              | MINISTERIO DA JUSTICA                     | LM-BS             | EDIFICIOS PUBLICOS            | Manatuto Villa       | Manatuto  | Baboe Unip Lda                                                 |                                                  | 019/Janeiro/2020            | \$ 29,275.84           | March 1, 2020  | 15.92%            |                     | 15.92%              |
| 9                    | Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Municipiu Manatuto, Timor Leste                                                                 | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | SAUDE                         | Manatuto Villa       | Manatuto  | Talamori Unip.Lda                                              |                                                  | RDTL-MS-DNA-DC-20-254       | \$ 262,983.65          | 9-Dec-20       | 100.00%           |                     | 100.00%             |
| 10                   | New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality                                                 | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | EDIFICIOS PUBLICOS            | Manatuto Villa       | Manatuto  | K-6, UNIPESOAL LDA                                             |                                                  | RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227   | \$ 257,748.51          | Jan. 12, 2022  | 88.89%            |                     | 88.89%              |
| 11                   | Supply and Installtion Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality                          | MINISTERIO SAUDE                          | Fundo Covid-19    | EDIFICIOS PUBLICOS            | Manatuto Villa       | Manatuto  | Fraternity Unipessoal Lda                                      |                                                  | RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227   | \$ 77,936.20           | Jan. 12, 2022  | 92.28%            |                     | 92.28%              |
| 12                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala                                                                                    | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Manatuto Villa       | Manatuto  | MEJD PKRIE ESG KAY RALA                                        |                                                  | -                           | \$ 62,996.83           | Oct. 15, 2021  | 31.90%            |                     | 31.90%              |
| 13                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau                                                                                      | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Manatuto Villa       | Manatuto  | MEJD PKRIE EBF RENTAU                                          |                                                  | -                           | \$ 64,383.50           | Oct. 15, 2021  | 26.64%            | 29.33%              | 55.97%              |
| 14                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor                                                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Manatuto Villa       | Manatuto  | MEJD PKRIE PE REMBOR                                           |                                                  | -                           | \$ 88,918.34           | Oct. 15, 2021  | 24.37%            | 5.15%               | 29.52%              |
| 15                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato                                                                                      | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Manatuto Villa       | Manatuto  | MEJD PKRIE EBF OBRATO                                          |                                                  | -                           | \$ 66,144.65           | Oct. 15, 2021  | 38.17%            |                     | 38.17%              |
| 16                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik                                                                                     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Manatuto Villa       | Manatuto  | MEJD PKRIE EBF BAHADIK                                         |                                                  | -                           | \$ 100,047.31          | Oct. 15, 2021  | 14.58%            |                     | 14.58%              |
| 17                   | Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto                                                                                   | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-CD             | EDUKASAUN                     | Manatuto Villa       | Manatuto  | Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda                            |                                                  |                             | \$ 182,701.57          | Dec. 7, 2022   | 6.82%             |                     | 6.82%               |
| 18                   | Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km                                                      | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ESTRADAS E PONTES             | Manatuto Villa       | Manatuto  | Kartini Unipessoal Lda                                         |                                                  |                             | \$ 394,194.73          | April 28, 2022 | 0.00%             |                     | 0.00%               |
| 19                   | Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia                                                                    | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU            | LM-CD             | EDIFICIOS PUBLICOS            | Laleia               | Manatuto  | DCO Unip.Lda                                                   | 011LM/AND/MPIE/VII/DILI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT |                             | \$ 277,330.43          | July 18, 2019  | 0.00%             |                     | 0.00%               |
| 20                   | R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800                                                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                      | Laleia               | Manatuto  | As Jazesia Unipessoal Lda                                      |                                                  | MPW-W-210055                | \$ 28,258.31           | June 10, 2021  | 100.00%           |                     | 100.00%             |
| 21                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui                                                                                       | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Laleia               | Manatuto  | MEJD PKRIE EP CAIRUI                                           |                                                  | -                           | \$ 86,883.29           | Oct. 15, 2021  | 25.20%            |                     | 25.20%              |
| 22                   | New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality               | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | ELETRIFIKASAUN NASIONAL       | Laclubar             | Manatuto  | Tasibala III Unip. Lda                                         | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412             |                             | \$ 695,420.83          | June 7, 2016   | 91.52%            |                     | 91.52%              |
| 23                   | Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)                                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | IMPRESTIMO                    | Laclubar             | Manatuto  | China Nuclear Industry 22ND Construction Co., LTD              |                                                  | ICB/04/MPW-2014             | \$ 34,379,729.54       | Nov. 20, 2014  | 92.04%            |                     | 92.04%              |
| 24                   | Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS             | ESTRADAS                      | Laclubar             | Manatuto  | Hatuwari Unip. Lda                                             |                                                  | MPW-W-NCB-R-190035          | \$ 481,029.67          | Aug. 25, 2020  | 54.37%            |                     | 54.37%              |
| 25                   | Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)                                                    | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS             | ESTRADAS                      | Laclubar             | Manatuto  | Ryzena Unipessoal Lda                                          | MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020                   |                             | \$ 194,402.72          | Dec. 20, 2019  | 82.83%            |                     | 82.83%              |
| 26                   | R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000                                                     | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                      | Laclubar             | Manatuto  | Sun Rise Golden Construction 02 Lda                            |                                                  | MPW-W-210057                | \$ 448,209.39          | June 10, 2021  | 95.04%            |                     | 95.04%              |
| 27                   | R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000                                                         | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                      | Laclubar             | Manatuto  | Adahiak Orlao Unipessoal Lda                                   |                                                  | MPW-W-210056                | \$ 213,772.95          | June 10, 2021  | 7.12%             |                     | 7.12%               |
| 28                   | Konstrasaun Postu Saude Laclubar Funar- Postu Administrativo Laclubar                                                            | MINISTERIO SAUDE                          | PDIM              | SAUDE                         | Laclubar             | Manatuto  | MERCY, Unipessoal Lda                                          |                                                  | 04/PDIM-I/MNTT/VIII/2022    | \$ 120,962.71          | July 28, 2019  | 0.00%             | 11.63%              | 11.63%              |
| 29                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara                                                                                      | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Laclubar             | Manatuto  | MEJD PKRIE EBF BATARA                                          |                                                  | -                           | \$ 102,060.99          | Oct. 15, 2021  | 25.60%            | 19.96%              | 45.57%              |
| 30                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um                                                                                    | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Laclubar             | Manatuto  | MEJD PKRIE EBF AISIU-UM                                        |                                                  | -                           | \$ 100,162.30          | Oct. 15, 2021  | 25.59%            |                     | 25.59%              |
| 31                   | Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct Fatucamanau, Soibada, Timor Leste                                | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | FI                | PONTES                        | Soibada              | Manatuto  | FIRDO UNIPESOAL LDA                                            |                                                  | SSS/013/MOPTC-2017          | \$ 3,384,214.14        | Feb. 27, 2017  | 100.00%           |                     | 100.00%             |
| 32                   | For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town    | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                      | Soibada              | Manatuto  | Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan             |                                                  | MPW-CS-2000024              | \$ 164,154.00          | March 25, 2020 | 70.00%            |                     | 70.00%              |
| 33                   | R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000                                           | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                      | Soibada              | Manatuto  | Manufahi Kiik Unip. Lda                                        |                                                  | MPW-W-210059                | \$ 203,036.57          | June 10, 2021  | 47.63%            |                     | 47.63%              |
| 34                   | R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700                                                      | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                      | Soibada              | Manatuto  | Ryzena Unipessoal Lda                                          |                                                  | MPW-W-210060                | \$ 196,112.23          | June 10, 2021  | 50.20%            |                     | 50.20%              |
| 35                   | Projctu Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto                                                    | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-CD             | EDIFICIOS PUBLICOS            | Soibada              | Manatuto  | Manufahi Kiik Unip. Lda                                        |                                                  | RFQ-R : 21/036 - Q          | \$ 66,898.51           | Nov. 26, 2021  | 55.08%            |                     | 55.08%              |
| 36                   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik                                                                                   | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | LM-TP             | EDUKASAUN                     | Soibada              | Manatuto  | MEJD PKRIE EBC WEAIHUEDIK                                      |                                                  | -                           | \$ 102,512.31          | Oct. 15, 2021  | 28.06%            |                     | 28.06%              |
| 37                   | Construction of Sahen Bridge Approach Protection ( A14 ) Manatuto ( MPW-W-190157 ) (162)                                         | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS             | FLOOD CONTROL                 | Barique              | Manatuto  | Yoku Unipessoal Lda                                            |                                                  | MPW-W-190157                | \$ 242,560.14          | Oct. 24, 2019  | 70.75%            |                     | 70.75%              |
| 38                   | New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora                                                    | MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS           | LM-CD             | AGRICULTURA                   | Barique              | Manatuto  | Tasibala II Const                                              |                                                  | RDTL/PO-2016-11272          | \$ 370,511.25          | Sept. 13, 2016 | 17.59%            |                     | 17.59%              |
| 39                   | Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Barique              | Manatuto  | Zenobia Diak Unip.Lda                                          |                                                  | MPWTC - CD - 170003         | \$ 15,875.56           | Jan. 7, 2017   | 100.00%           |                     | 100.00%             |
| 40                   | Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique                                                                                     | MINISTERIO SAUDE                          | PDIM              | SAUDE                         | Barique              | Manatuto  | Malack II Unip. Lda                                            |                                                  | 03/PDIM-I/MNTT/IX/2019      | \$ 116,914.88          | Sept. 23, 2019 | 71.10%            |                     | 71.10%              |
| 41                   | Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162                                                                  | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-BS             | AGUA E SANEAMENTO             | Barique              | Manatuto  | Malaca Unip Lda                                                |                                                  | No. Kontratu : MOP-W-190233 | \$ 162,377.94          | Oct. 8, 2019   | 46.50%            |                     | 46.50%              |
| 42                   | R4D Rural Penodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162) | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN | Barique              | Manatuto  | Manufahi Kiik Unip. Lda                                        |                                                  | MPW-W-W-190080              | \$ 141,684.96          | Aug. 25, 2019  | 41.78%            |                     | 41.78%              |
| 43                   | R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200                                                 | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | LM-CD             | ESTRADAS                      | Barique              | Manatuto  | We"coi Unipessoal Lda                                          |                                                  | MPW-W-210062                | \$ 343,111.47          | June 10, 2021  | 44.80%            | 18.45%              | 63.25%              |



# LISTA #ANEXU B

| PROGRESSU FISIKU KADA FULAN |                                                                                                 |                                                                  |                   |                         |                      |           |                               |                                      |                        |                |                   |                     |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                             |                                                                                                 |                                                                  |                   |                         |                      |           | LOKALIZASAUN PROJETU          |                                      |                        |                |                   |                     |                     |
| NU.                         | NARAN PROJETU                                                                                   | DONO PROJETU                                                     | KATEGORIA PROJETU | SECTOR                  | POSTO ADMINISTRATIVO | MUNISIPIU | NARAN COMPANHA                | NUMERO KONTRATU                      | MONTANTE KONTRATU (\$) | DATA KONTRATU  | Previous Progress | This Month Progress | Komulativo Progress |
| 44                          | R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000            | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD             | ESTRADAS                | Barique              | Manatuto  | Linoel                        | MPW-W-210061                         | \$ 296,211.82          | June 10, 2021  | 18.83%            |                     | 18.83%              |
| 45                          | R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000                       | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD             | ESTRADAS                | Barique              | Manatuto  | Gimso Brothers Unip. Lda      | MPW-W-210058                         | \$ 300,792.46          | July 10, 2021  | 88.60%            |                     | 88.60%              |
| 46                          | New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora          | MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL | LM-CD             | EDIFICIOS PUBLICOS      | Barique              | Manatuto  | Senizu                        |                                      | \$ 408,460.73          |                | 84.79%            | 7.70%               | 92.49%              |
| 47                          | New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | FI                | ELETRIFIKASAUN NASIONAL | Lacio                | Manatuto  | Anopa Electrical Unip. Lda    | RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421 | \$ 380,582.61          | Sept. 1, 2016  | 95.99%            |                     | 95.99%              |
| 48                          | Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto                               | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | FI                | ESTRADAS                | Lacio                | Manatuto  | Sahan I Unip.Lda              | SSS/304/MOPTC-2016                   | \$ 3,314.56            | Sept. 27, 2016 | 100.00%           |                     | 100.00%             |
| 49                          | Routine Roads Maintenance - Lacio, Manatuto Municipality                                        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | LM-CD             | ESTRADAS                | Lacio                | Manatuto  | Egana, Unip. Lda              | MPW-W-190251                         | \$ 223,836.50          | Dec. 13, 2019  | 68.89%            |                     | 68.89%              |
| 50                          | Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food                                                   | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA                          | LM-BS             | EDIFICIOS PUBLICOS      | Lacio                | Manatuto  | Esa-Un                        | RDTL:74/GMTAC/X/2015                 | \$ 50,745.00           | May 2, 2016    | 38.83%            |                     | 38.83%              |
| 51                          | Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilmano                                                    | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA                          | PDIM              | COMERCIO                | Lacio                | Manatuto  | Surprise Unip. Lda            | 07/PDIM-II/MNTT/VIII/2016            | \$ 153,942.39          | Sept. 12, 2016 | 97.16%            |                     | 97.16%              |
| 52                          | National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)                           | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS                                    | FI                | IMPRESTIMO              | Lacio                | Manatuto  | Sinohydro Corporation Limited | ICB/07/MPW-2014                      | \$ 48,314,975.87       | May.3, 2016    | 87.98%            |                     | 87.98%              |
| 53                          | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun                                                  | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU                        | LM-TP             | EDUKASAUN               | Lacio                | Manatuto  | MEJD PKRIE EBC REMANARUN      | -                                    | \$ 98,147.27           | Oct. 15, 2021  | 23.59%            |                     | 23.59%              |
| 54                          | Rehabilitation of Reinforced Concrete Ramp at Behau                                             | MINISTERIO DA DEFESA                                             | LM-BS             | FLOOD CONTROL           | Lacio                | Manatuto  | Baboe Unip Lda                |                                      | \$ 189,578.02          | May 23, 2022   | 52.07%            |                     | 52.07%              |

Prepara Husi:

1. Eng. José Carlos, Gusmão  
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun  
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

3. Eng. Adonis Julio Fernandes  
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

2. Eng. Domingos D.X.Silva  
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun  
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

4. Eng. Quico Adelino Junior  
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun  
Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :

Eng. Remigio da c.s dos Santos  
Eng. Senior ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun, ADN, I.P

Eng/Arch.Francisco Xavier de D. Jeronimo  
Eng. Senior ba Porjecto Edificio Publico Bee no Saneamento,ADN,I.P

Eng. Decindo de Fatima Marques  
ChefeSeksau ME& ITC, ADN, I.P

Certifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas  
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validacao  
De Qualidade ADN,I.P





MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES  
DIRECÇÃO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA

#ANEXU C2 ( BA - 7 )

Naran Projeto : RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT AGRICULTURE CENTRE - AUBEON CHAINAGE ( STA 3 + 000 - 6 + 200)  
No. kontratu : MPW - W - 210062  
Postu : Natarbora  
Suku : Aubeon  
Naran Kompanhia : We' Coi Unip, Lda.

SUMMARY

| SECTION NO. | DESCRIPTION                  | TOTAL CONTRACT COST<br>(US\$) | PROGRESS PAYMENT BY A D N |                          |                    |                    |                     |           |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|
|             |                              |                               | PREVIOUS BILLING (USD)    | PERCENT PREVIOUS BILLING | THIS BILLING (USD) | PERCENT THIS MONTH | TOTAL TO DATE (USD) | % TO DATE |
|             |                              |                               |                           |                          |                    |                    |                     |           |
| R-01        | General                      | \$ 2,340.00                   | \$ 2,020.00               | 0.59%                    | \$ 320.00          | 0.09%              | \$ 2,340.00         | 0.68%     |
| R-03        | Earth work                   | \$ 10,796.77                  | \$ 24,093.57              | 7.02%                    | \$ -13,296.80      | -3.88%             | \$ 10,796.77        | 3.15%     |
| R - 05      | Sub-base, Base and Pavement  | \$ 57,631.73                  | \$ 57,817.39              | 16.85%                   | \$ -185.67         | -0.05%             | \$ 57,631.73        | 16.80%    |
| R - 07      | Bituminous pavement          | \$ 175,067.20                 | \$ -                      | 0.00%                    | \$ 64,848.00       | 18.90%             | \$ 64,848.00        | 18.90%    |
| R-08        | Structures                   | \$ 35,867.39                  | \$ 34,636.79              | 10.09%                   | \$ 876.89          | 0.26%              | \$ 35,513.68        | 10.35%    |
| R-10        | Dayworks                     | \$ 175.00                     | \$ 350.00                 | 0.10%                    | \$ 175.00          | 0.05%              | \$ 525.00           | 0.15%     |
| R-11        | Routine Maintenance          | \$ 6,341.00                   | \$ 5,966.00               | 1.74%                    | \$ 375.00          | 0.11%              | \$ 6,341.00         | 1.85%     |
| R-15        | Provisional Sum              | \$ 100.00                     | \$ -                      | 0.00%                    | \$ 100.00          | 0.03%              | \$ 100.00           | 0.03%     |
| A           | Construction Cost            | \$ 288,319.09                 | \$ 124,883.76             | 36.40%                   | \$ 53,212.42       | 15.5%              | \$ 178,096.17       | 51.9%     |
| B           | Profit & Over Head (10% x A) | \$ 28,831.91                  | \$ 12,488.38              | 3.64%                    | \$ 5,321.24        | 1.55%              | \$ 17,809.62        | 5.19%     |
| C           | General Item                 | \$ 19,232.79                  | \$ 12,350.50              | 3.60%                    | \$ 3,539.00        | 1.03%              | \$ 15,889.50        | 4.63%     |
| D           | Tax 2 % x (A+B)              | \$ 6,727.68                   | \$ 2,994.45               | 0.87%                    | \$ 1,241.45        | 0.36%              | \$ 4,235.91         | 1.23%     |
| E           | GRAND/GROSS TOTAL            | \$ 343,111.47                 | \$ 152,717.08             | 44.80%                   | \$ 63,314.11       | 18.45%             | \$ 216,031.20       | 63.25%    |

Inspeksaun Husi:

1. ( Eng. Domingos D.X.Silva)  
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irrigação  
Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

2. ( José R. Carlos Gusmão)  
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irrigação  
Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

( Eng. Remigio da C.S. dos Santos)  
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,  
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

( Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e  
Validação de Qualidade, ADN.I.P



## #ANEXU C2 ( BA-10) SUMMARY BOQ

PEMILIK PROYEK : MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA  
LIBERTAÇÃO NACIONAL  
NAMA PROYEK : NEW CONSTRUCTION OF GAPURA AND GABION WALL  
PROTECTION IN GARDEN OF HEROES  
LOKASI : NATARBORA - MANATUTO

### SUMMARY

| NO  | URAIAN PEKERJAAN         | ORIGINAL CONTRACT  | PROGRESS BY A D N |        |                  |       |                  |        |
|-----|--------------------------|--------------------|-------------------|--------|------------------|-------|------------------|--------|
|     |                          |                    | PREVIOUS PROGRESS |        | PROGRESS JANUARY |       | PROGRESS TO DATE |        |
|     |                          | TOTAL BIAYA (US\$) | AMOUNT            | (%)    | AMOUNT           | (%)   | AMOUNT           | (%)    |
| I   | PERSIAPAN                | \$ 6.550,00        | \$ 4.600,00       | 1,13%  | \$ -             | 0,00% | \$ 4.600,00      | 1,13%  |
| II  | KONSTRUKSI GAPURA        | \$ 34.469,21       | \$ 11.751,51      | 2,88%  | \$ 2.797,11      | 0,68% | \$ 14.548,62     | 3,56%  |
| III | PEMASANGAN BRONJONG      | \$ 318.618,69      | \$ 292.328,64     | 71,57% | \$ 23.150,42     | 5,67% | \$ 315.479,06    | 77,24% |
| A   | TOTAL                    | \$ 359.637,90      | \$ 308.680,15     | 75,57% | \$ 25.947,53     | 6,35% | \$ 334.627,68    | 81,92% |
| B   | CONTRACTOR FEE (10% x A) | \$ 35.963,79       | \$ 30.868,02      | 7,56%  | \$ 2.594,75      | 0,64% | \$ 33.462,77     | 8,19%  |
| C   | OVERHEAD                 | \$ 4.850,00        |                   | 0,00%  | \$ 2.272,50      | 0,56% | \$ 2.272,50      | 0,56%  |
| D   | TAX (2% x (A+B+C))       | \$ 8.009,03        | \$ 6.790,96       | 1,66%  | \$ 616,30        | 0,15% | \$ 7.407,26      | 1,81%  |
| E   | GRAND TOTAL (A+B+C+D)    | \$ 408.460,73      | \$ 346.339,13     | 84,79% | \$ 31.431,08     | 7,70% | \$ 377.770,21    | 92,49% |

Prepara husi :

( Eng. Quico Adelino Junior )  
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no  
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P


Verifika Husi :

( Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo )  
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua  
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

( Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação  
de Qualidade ADN, I.P



| <div>  <div> MINISTERIO DO PLANO<br/>E ORDINAMENTO<br/>VLT GOVERNO CONSTITUCIONAL </div> </div> <div>  <div> ADN, I.P.<br/>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público </div> </div> |                |                   |                      |               | #ANEXU D (LAC-8)<br>INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN |                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO BATARA            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data inspesaun | Municipiu / Posto | Naran Eng.           | Pozisaun      | No                                             | INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN                                                                                                                                                            | Fotografia                                                                          | Asinatura                                                                           |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26/01/2023     | Laclubar          | Quico Adelino Junior | Tek A D N, IP | 1                                              | Husu ba grupo atu hasai rai balu iha parte Varanda no classroom nia laran, no halo stamper (pemadatan) antes cor plat lantai. Instrusaun hanesan mos ba parte toilet building ninian. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | 2                                              | Amenta beton ba parte balun ne'ebe sei kuak ho campuran ne'ebe uza antes ona.                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               | 3                                              | Kontinua servisu tuir BOQ no mos Dezenhu ne'ebe iha, no husu enjinheiru grupu atu bele akompanha hodi fo instrusaun servisu ba grupu.                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |               |                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO  
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C2 ( LAC-8)

TÍTULO DO PROJECTO : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA EBF BATARA  
FATIN PROJEITO : BATARA, MANATUTO  
DONO DO PROJEITO : MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

| NO. | MAIN SUMMARY<br>WORK DESCRIPTION | ORIGINAL CONTRACT<br>AMOUNT US\$ WEIGHT (%) |         | REPORT PROGRESS BY ADN IP |        |              |        |               |        |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------------------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|     |                                  |                                             |         | Previous Month            |        | This month   |        | Up to Date    |        |
|     |                                  |                                             |         | Amount (US\$)             |        | Weigth (%)   |        | Amount (US\$) |        |
|     |                                  |                                             |         | Amount (US\$)             |        | Weigth (%)   |        | Amount (US\$) |        |
| I   | PRELIMINARIES                    | \$ 3.575,00                                 | 3,50%   | \$ 2.195,00               | 2,15%  | \$ -         | 0,00%  | \$ 2.195,00   | 2,15%  |
| II  | DEMOLITION                       | \$ 300,00                                   | 0,29%   | \$ 300,00                 | 0,29%  | \$ -         | 0,00%  | \$ 300,00     | 0,29%  |
| III | CLASSROOM BUILDING               | \$ 50.717,94                                | 49,69%  | \$ 15.331,43              | 15,02% | \$ 15.358,84 | 15,05% | \$ 30.690,27  | 30,07% |
| IV  | TOILET BUILDING                  | \$ 25.427,93                                | 24,91%  | \$ 6.094,82               | 5,97%  | \$ 3.897,45  | 3,82%  | \$ 9.992,28   | 9,79%  |
| V   | PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK     | \$ 12.700,12                                | 12,44%  | \$ -                      | 0,00%  | \$ -         | 0,00%  | \$ -          | 0,00%  |
| A   | CONSTRUCTION COST                | \$ 92.720,99                                | 90,85%  | \$ 23.921,25              | 23,44% | \$ 19.256,30 | 18,87% | \$ 43.177,55  | 42,31% |
| B   | CONTIGENCY                       | \$ 3.000,00                                 | 2,94%   | \$ -                      | 0,00%  | \$ -         | 0,00%  | \$ -          | 0,00%  |
| C   | OVERHEAD                         | \$ 6.340,00                                 | 6,21%   | \$ 2.204,50               | 2,16%  | \$ -         | 0,00%  | \$ 2.204,50   | 2,16%  |
| D   | GRAND TOTAL                      | \$ 102.060,99                               | 100,00% | \$ 26.125,75              | 25,60% | \$ 19.256,30 | 18,87% | \$ 45.382,05  | 44,47% |

Prepara Husi :


Verifika Husi :

Sertifika husi :

( Eng. Quico Adelino Junior )  
Eng. ba Projecto Edificio Publico no Agua  
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P.

( Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo )  
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua Saneamento ADN, I.P.

( Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de  
Qualidade ADN,I.P
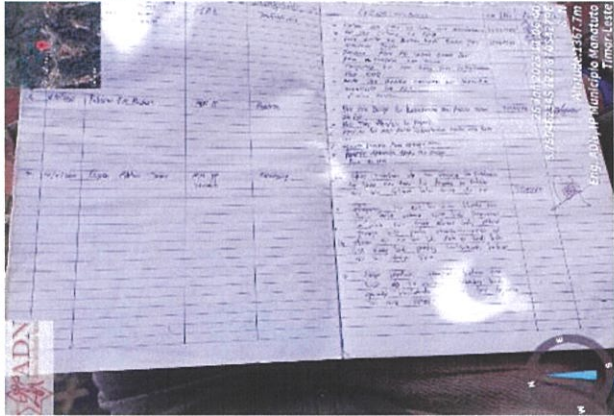
| <div>  <div> MINISTERIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO<br/>VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL </div> </div> <div>  <div> ADN, I.P.<br/>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público </div> </div> |                |                   |                      |                                      | <div>#ANEXU D1 (LAC-10)</div> <div>INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN</div> |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |                                      | <div>Projetu : Konstrusaun Postu Saude Funar, Laclubar</div>        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |                                      | <div>Kompanhia : MERCY UNIP. LDA</div>                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data inspesaun | Municipiu / Posto | Naran Eng.           | Pozisaun                             | No                                                                  | INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN                                                                                                                                                                                      | Fotografia                                                                          | Asinatura                                                                           |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26/01/2023     | Funar, Laclubar   | Quico Adelino Junior | Engenheiru ADN IP Municipiu Manatuto | 1                                                                   | Husu engenheiru atu tau atensaun ba pambesian top beam nian tenke tuir dezenhu no mantem mos nia selimut beton molok atu cor.                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |                                      | 2                                                                   | Komfirma fila fali ho obras konaba mix design anterior laiha entaun presija halo carta acompanhamento ba lab obras no CC ba lab. ADN IP hodi halo test ulang hodi produz sertifikadu betaun no mix design foun. |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |                                      | 3                                                                   | Husu enjinheiru nafatin akompanha badaen sira hodi fo assistensia tekniku hodi garante servisu tuir dezenhu no mos BOQ.                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |                                      | 4                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                      |                                      | 5                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |





## #ANEXU C2 (LAC 10)

Project Name : Konstrusaun Posto saude Funar  
Location : Suco Funar Post.Admin Laclubar Municipio Manatuto

### SUMMARY

| No   | DESCRIPTION                        | AMOUNT (USD) | PROGRESS REPORT BY A D N |    |                     |        |                     |           |
|------|------------------------------------|--------------|--------------------------|----|---------------------|--------|---------------------|-----------|
|      |                                    |              | PREVIOUS MONTH<br>(USD)  | %  | THIS MONTH<br>(USD) | %      | UP TO DATE<br>(USD) | TOTAL (%) |
| I    | Preliminaries                      | \$ 450,00    | \$ -                     | 0% | \$ 300,00           | 0,34%  | \$ 300,00           | 0,34%     |
| II   | GROUND WORKS                       | \$ -         | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0,00%  | \$ -                | 0,00%     |
| III  | CONCRETE WORKS                     | \$ 5.480,02  | \$ -                     | 0% | \$ 5.479,88         | 6,22%  | \$ 5.479,88         | 6,22%     |
| IV   | MASONRY WORKS                      | \$ 10.454,66 | \$ -                     | 0% | \$ 3.342,91         | 3,80%  | \$ 3.342,91         | 3,80%     |
| V    | STRUCTURAL STEEL WORKS             | \$ 6.761,89  | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| VI   | ROOFING AND CLADDING WORKS         | \$ 6.243,92  | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| VII  | DOORS AND WINDOWS WORKS            | \$ 8.060,00  | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| VIII | HARDWARE                           | \$ 1.040,00  | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| IX   | PAINTING WORKS                     | \$ 2.175,82  | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| X    | TILLING WORKS                      | \$ 4.895,74  | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| XI   | CEILING WORKS                      | \$ 5.027,25  | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| XII  | HIDROULIC WORKS                    | \$ 5.611,00  | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| XIII | ELECTRICAL SERVICES                | \$ 4.822,00  | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| XIV  | MECHANICAL SERVICES INSTALLATIONS  | \$ 313,00    | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| XV   | FURNITURE                          | \$ 7.200,00  | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| XVI  | PROVISIONAL SUM                    | \$ 500,00    | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| XVII | External Works as Additional Works | \$ 5.611,83  | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| A    | Total Cost Helath Post             | \$ 74.647,13 | \$ -                     | 0% | \$ 9.122,79         | 10,36% | \$ 9.122,79         | 10,36%    |
| B    | Contractor Fee (10% *A)            | \$ 7.464,71  | \$ -                     | 0% | \$ 912,28           | 1,04%  | \$ 912,28           | 1,04%     |
| C    | Over Head                          | \$ 4.207,50  | \$ -                     | 0% | \$ -                | 0%     | \$ -                | 0%        |
| D    | Tax (2%*(A+B+C))                   | \$ 1.726,39  | \$ -                     | 0% | \$ 200,70           | 0,23%  | \$ 200,70           | 0,23%     |
| E    | Grand Total (A+B+C+D)              | \$ 88.045,73 | \$ -                     | 0% | \$ 10.235,77        | 11,63% | \$ 10.235,77        | 11,63%    |

Inspesaun husi :

(Eng. Quico Adelino Junior)  
Engenheiru ba Projetu Edificiu Be'e no  
Saneamentu Municipio Manatuto ADN, I.P


Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)  
Engenheiro Senior ba Edificio Publico no Agua Saneamento ADN,  
I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia)  
Kordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de  
Koalidade ADN, I.P

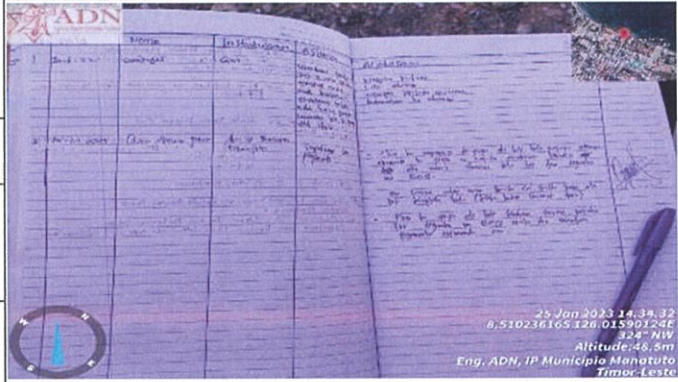

| <div>  <div> MINISTERIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO<br/>VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL </div> </div> <div>  <div> ADN, I.P.<br/>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público </div> </div> |                |                   |                      |                                         | <div>#ANEXU D ( MV-13)</div> <div>INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN</div> |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |                      |                                         | Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau        |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |                      |                                         | Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO RENTAU                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data inspesaun | Municipiu / Posto | Naran Eng.           | Pozisaun                                | No                                                                 | INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN                                                                                                                                        | Fotografia                                                                          | Asinatura                                                                           |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25/01/2023     | Manatuto Vila     | Quico Adelino Junior | Enginheiru ADN IP<br>Municipiu Manatuto | 1                                                                  | Husu ba enginheeiru do grupu atu bele halo nafatin akompanhamentu ba grupu no nafatin fo assistensia tekniku atu nune'e servisu bele lao tuir dezenhu no mos BOQ. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |                      |                                         | 2                                                                  | Ba servisu atap nian ne'ebe sei falta husu atu bele kompleta hotu (kalen balun seidaok taka)                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |                      |                                         | 3                                                                  | Husu ba grupu atu bele kontinua servisu nafatin tuir dezenhu no BOQ ne'ebe iha wainhira pagamentu rekomenda ona.                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |                      |                                         | 4                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |



MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO  
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.  
Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## #ANEXU C2 ( MV-13)

### SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau  
Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto  
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

| SUMMARY |                                | ORIGINAL CONTRACT |              | PROGRESS REPORT BY A D N |            |                  |            |               |            |
|---------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| No      | MAIN SUMMARY                   | Page No           | Amount       | Progress Previous        |            | Progress January |            | Total To Date |            |
|         |                                |                   |              | Amount (US\$)            | Weigth (%) | Amount (US\$)    | Weigth (%) | Amount (US\$) | Weigth (%) |
| I       | PRELIMINARIES                  | PP/3              | \$ 3,075.00  | \$ 1,950.00              | 3.03%      | \$ -             | 0.00%      | \$ 1,950.00   | 3.03%      |
| II      | CLASSROOM BUILDING C           | C/39              | \$ 48,345.34 | \$ 13,971.64             | 21.70%     | \$ 18,315.54     | 28.45%     | \$ 32,287.18  | 50.15%     |
| III     | PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS | SW/10             | \$ 3,623.16  | \$ -                     | 0.00%      | \$ -             | 0.00%      | \$ -          | 0.00%      |
| A       | CONSTRUCTION COST              |                   | \$ 55,043.50 | \$ 15,921.64             | 24.73%     | \$ 18,315.54     | 28.45%     | \$ 34,237.18  | 53.18%     |
| B       | CONTIGENCY                     |                   | \$ 3,000.00  | \$ -                     | 0.00%      | \$ -             | 0.00%      | \$ -          | 0.00%      |
| C       | OVERHEAD                       |                   | \$ 6,340.00  | \$ 1,230.00              | 1.91%      | \$ 565.00        | 0.88%      | \$ 1,795.00   | 2.79%      |
| D       | GRAND TOTAL                    |                   | \$ 64,383.50 | \$ 17,151.64             | 26.64%     | \$ 18,880.54     | 29.33%     | \$ 36,032.18  | 55.96%     |

Prepara husi :

( Eng. Quico Adelino Junior )  
Eng. ba Projetu Edificio Publico Beé no  
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P.


Verifika Husi :

( Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo )  
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua  
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

( Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de  
Qualidade ADN,I.P

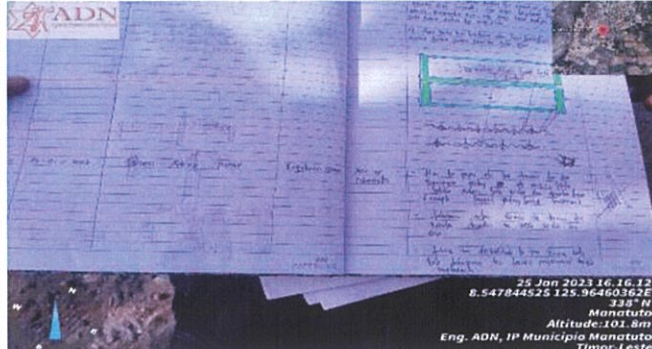

| <div><div><div><div>MINISTÉRIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO</div><div>VII GOVERNO CONSTITUCIONAL</div></div></div><div><div><div>ADN, I.P.</div><div>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público</div></div></div></div> |                |                   |                      |                                         | #ANEXU D2 ( MV-14)<br>INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN |                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Naran projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                      |                                         |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO REMBOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |                      |                                         |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data inspesaun | Municipiu / Posto | Naran Eng.           | Pozisaun                                | No                                               | INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN                                                                                                                                   | Fotografia                                                                          | Asinatura                                                                           |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25/01/2023     | Manatuto Vila     | Quico Adelino Junior | Enginheiru AND IP<br>Municipiu Manatuto | 1                                                | Husu ba grupu atu tau atensaun ba iha pasangan gording atu nune'e keta haluha assessoris balu iha dezenhu laran ( Ezemplu pengikat gording bentuk trapezium) |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                      |                                         | 2                                                | Kontinua aselera servisu iha terrenu tuir nafatin dezenhu no mos BOQ ne'ebe iha ona.                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                      |                                         | 3                                                | Karik iha difikuldade ba item servisu balun bele komfirma ho tekniku responsavel molok implementa.                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                      |                                         | 4                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |



## #ANEXU C2 ( MV-14) SUMMARY BOQ

Naran Projetu: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor  
Lokalidade : Suco Aiteas, Posto Administrativo Manatuto  
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

| NO  | MAIN SUMMARY                   | ORIGINAL CONTRACT |              | PROGRESS BY A D N |            |                  |            |                  |            |
|-----|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|     |                                | Page No           | AMOUNT       | PREVIOUS PROGRESS |            | PROGRESS JANUARY |            | PROGRESS TO DATE |            |
|     |                                |                   |              | Amount (US\$)     | Weigth (%) | Amount (US\$)    | Weigth (%) | Amount (US\$)    | Weigth (%) |
| I   | PRELIMINARIES                  | PP/3 (i)          | \$ 3.075,00  | \$ 1.725,00       | 1,94%      | \$ -             | 0,00%      | \$ 1.725,00      | 1,94%      |
| II  | CLASSROOM BUILDING C2          | C2/47 (i)         | \$ 57.778,14 | \$ 18.324,74      | 20,61%     | \$ 4.512,30      | 5,07%      | \$ 22.837,03     | 25,68%     |
| III | PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS | SW/23 (i)         | \$ 9.959,28  | \$ -              | 0,00%      | \$ -             | 0,00%      | \$ -             | 0,00%      |
| A   | CONSTRUCTION COST              |                   | \$ 70.812,42 | \$ 20.049,74      | 22,55%     | \$ 4.512,30      | 5,07%      | \$ 24.562,03     | 27,62%     |
| B   | CONTIGENCIA                    |                   | \$ 3.000,00  |                   |            | \$ -             | 0,00%      | \$ -             | 0,00%      |
| C   | OVERHEAD                       |                   | \$ 6.340,00  | \$ 1.620,00       | 1,82%      | \$ -             | 0,00%      | \$ 1.620,00      | 1,82%      |
| D   | GRAND TOTAL                    |                   | \$ 88.918,34 | \$ 21.669,74      | 24,37%     | \$ 4.512,30      | 5,07%      | \$ 26.182,03     | 29,45%     |

Prepara husi :

  
( Eng. Quico Adelino Junior )  
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no  
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P.

Verifika Husi :

  
( Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo )  
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua  
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

  
( Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e  
Validação de Qualidade ADN,I.P.





MINISTÉRIO DO PLANO  
E ORDENAMENTO



ADN, I.P.  
Agência de  
Desenvolvimento  
Nacional, Instituto Público

## PLANU INSPESAUN

| Naran Eng.           |     | Quico Adelino Junior                                                                       |                             |                           |                |                                           |        | 2023    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|-----|
| Município            |     | MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS                                                               |                             |                           |                |                                           |        |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
| Município / Posto    | No. | Naran Projeto                                                                              | Naran Companhia             | No Contrato               | Kategoria      | Dono do Projeto                           | Action | Janeiru |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    | OBS |
|                      |     |                                                                                            |                             |                           |                |                                           |        | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29       | 30       | 31 |     |
| MANATUTO VILA ( MV ) | 3   | Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto                                          | Obrai Unipesoal, Lda        | ICB/0128/SEJD-2014        | FI             | SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU  | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |     |                                                                                            |                             |                           |                |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 6   | Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto         | Carya Timor Leste Unip. Lda | 08/PDIM-IMNTT/XII/2019    | PDIM           | ESTATAL                                   | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |     |                                                                                            |                             |                           |                |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 7   | Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto                      | Carya Timor Leste Lda       | 01/PDIM-IMNTT/XII/2019    | PDIM           | ESTATAL                                   | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |    |     |
|                      |     |                                                                                            |                             |                           |                |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 8   | Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto                                        | Baboe Unip Lda              | 019/Janeiro/2020          | LM             | MINISTERIO DA JUSTICA                     | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |     |                                                                                            |                             |                           |                |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 9   | Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Munisipiu Manatuto                                        | Talamori Unip,Lda           | RDTL-MS-DNA-DC-20-254     | Fundo Covid-19 | MINISTERIO SAUDE                          | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |     |                                                                                            |                             |                           |                |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 10  | New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality           | MINISTERIO SAUDE            | RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227 | Fundo Covid-19 | MINESTERIO SAUDE                          | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |     |                                                                                            |                             |                           |                |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 11  | Supplay and Installation Main Power For Isolation an Laboratorium Building Maabat Manatuto | MINISTERIO SAUDE            | RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-229 | Fundo Covid-19 | MINESTERIO SAUDE                          | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |     |                                                                                            |                             |                           |                |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 12  | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala                                              | MEJD PKRIE ESG KAY RALA     | -                         | LM-TP          | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |     |                                                                                            |                             |                           |                |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 13  | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau                                                | MEJD PKRIE EBF RENTAU       | -                         | LM-TP          | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |     |                                                                                            |                             |                           |                |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 14  | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor                                                 | MEJD PKRIE PE REMBOR        | -                         | LM-TP          | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |     |                                                                                            |                             |                           |                |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 15  | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato                                                | MEJD PKRIE EBF OBRATO       | -                         | LM-TP          | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |     |                                                                                            |                             |                           |                |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |

~X



| Naran Eng.           |                              | Quico Adelino Junior                                          |                                   |                                                   |           |                                           |        | 2023    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----|-----|
| Município            | MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           |        |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
| Município /<br>Posto | No.                          | Naran Projeto                                                 | Naran Companhia                   | No Contrato                                       | Kategoria | Dono do Projeto                           | Action | Janeiru |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    | OBS |
|                      |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           |        | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29       | 30       | 31 |     |
|                      | 16                           | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik                  | MEJD PKRIE EBF BAHADIK            | -                                                 | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 17                           | Konstrusaun EBC Vasco da Gama - Manatuto                      | Parapa Bemizu Stae Unipessoal Lda | -                                                 | LM-CD     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |    |     |
|                      |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
| LALEA (LAL)          | 1                            | Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia | DCO Unip.Lda                      | 011LM/AND/MPIE/VII/DILI/2019/E DIFICIO DEPARTMENT | LM        | MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU            | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |    |     |
|                      |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 3                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui                    | MEJD PKRIE EP CAIRUI              | -                                                 | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |    |     |
|                      |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
| LACLUBAR (LAC)       | 7                            | Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek          | Hatuwari Unip. Lda                | 02/PDD-II/MNTT/VII/2015                           | PDIM      | MINISTERIO SAUDE                          | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |    |     |
|                      |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 8                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara                   | MEJD PKRIE EBF BATARA             |                                                   | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |    |     |
|                      |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 9                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um                 | MEJD PKRIE EBF AISIU-UM           |                                                   | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |    |     |
|                      |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |
|                      | 10                           | Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Lklubar          | Mercy Unipessoal Lda.             |                                                   | PDIM      | MINISTERIO SAUDE                          | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |    |     |
|                      |                              |                                                               |                                   |                                                   |           |                                           | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |    |     |

✕



| Naran Eng.             |                              | Quico Adelino Junior                                                                  |                          |                             |           |                                           |        |         | 2023 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |  |  |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|--|--|
| Municipio              | MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS |                                                                                       |                          |                             |           |                                           |        |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |  |  |
| Municipio /<br>Posto   | No.                          | Naran Projeto                                                                         | Naran Companhia          | No Contrato                 | Kategoria | Dono do Projeto                           | Action | Janeiru |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | OBS      |          |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           |        | 1       | 2    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |          |          |  |  |
| SOIBADA (SO)           | 5                            | Projetu Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto         | Manufahi Kiik Unip. Lda  | -                           | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |  |  |
|                        | 6                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik                                        | MEJD PKRIE EBF WEAIHUDIK |                             | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |  |  |
| BARIQUE ( BA )         | 2                            | New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora         | Tasibala II Const        | RDTL/PO 2016-11272          | LM        | MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS           | Plan   |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Abandona |          |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |  |  |
|                        | 4                            | Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique                                          | Malack II Unip. Lda      | 03/PDIM-VMNTT/IX/2019       | PDIM      | MINISTERIO SAUDE                          | Plan   |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |  |  |
|                        | 5                            | Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162                       | Malaca Unip Lda          | No. Kontratu : MOP-W-190233 | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS             | Plan   |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |  |  |
|                        | 9                            | New Contruction of Gapura and Gabion Wall Protection no Jardim de Herois de Natarbora | Senizu Unip. Lda         | 215/MACLN/X/2021            | LM        | MACLN                                     | Plan   |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |  |  |
| LACLO ( LA )           | 5                            | Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food                                         | Esa-Un                   | RDTL 74/GMTAC/XI/2015       | LM        | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA   | Plan   |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Pendente |          |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |  |  |
|                        | 6                            | Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilimano                                         | Surprise Unip. Lda       | 07/PDIM-VMNTT/VIII/2016     | PDIM      | MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA   | Plan   |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |  |  |
|                        | 8                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun                                        | MEJD PKRIE EBC REMANARUN |                             | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |  |  |
|                        |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           | Actual |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |  |  |
| TOTAL PROJETO ON-GOING |                              |                                                                                       |                          |                             |           |                                           |        |         |      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |  |  |


Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu


Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :  
  
Eng. Quico Adelino Junior  
(Eng. Projeto Edificio Publico, Agua e Saneamento Municipiu Manatuto, ADN.I.P.)

Sertifika Husi :  
  
Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas  
(Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN.I.P.)

Aprova Husi :  
  
Eng. Januario Maia Guterres  
(Adjunto Director Executivo, ADN.I.P.)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               |                 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div>REPÚBLICA DE DILÍ</div></div><div><div><span></span></div><div>MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO</div></div><div><div><span></span></div><div>VICIA GOVERNACÃO ESTRUTURAL</div></div></div><div><div><span></span></div><div>ADN, I.P.</div></div><div><div><span></span></div><div>Agência de Desenvolvimento Nacional, Investimento Público</div></div></div></div></div> |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | PLANU INSPESAUN |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Naran Eng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | José Roberto.C.Gusmão |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | 2023            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manatuto              |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               |                 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Município / Posto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No.                   | Naran Projeto                                                                                                     | Naran Companhia                                                | No Contrato                    | Kategoria | Dono do Projeto               | Action          | Janeiro |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | OBS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               |                 | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| MANATUTO VILA (MV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                     | Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila ( 3.72 km ) area in Manatuto Municipality Manatuto                   | Maran-Dal, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda                        | SSS/062/MOPTC-2017             | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going | Relatorio Fulan Janeiro Eng. Municipio Manatuto la halo Inpesaun Maximo tamba hein kontratu foun hui Nasional, atu informa deit projeto refere finaliza 100% iha tercino, no kompania hein rekomendadasaun ikus hui DNEPCC (MOP).                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                     | Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte ( 4.68 km ) in Manatuto Municipio Manatuto | Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda                           | SSS/061/MOPTC-2017             | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relatorio Fulan Janeiro Eng. Municipio Manatuto la halo Inpesaun Maximo tamba hein kontratu foun hui Nasional, atu informa deit projeto refere finaliza 100% iha tercino, no kompania hein rekomendadasaun ikus hui DNEPCC (MOP).    |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction ( Sta. 65+235 - 100+355 )           | R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group | ICB/023/MPW-2013               | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relatorio Fulan Janeiro Eng. Municipio Manatuto la halo Inpesaun Maximo tamba hein kontratu foun hui Nasional, atu informa deit projeto refere monitoriza hui Eng nebe mak toma konta hui Inpesaun.                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                     | Consultant Supervision (M-L & L-N)                                                                                | Sinotech Engineering Consultant                                |                                | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | On Going                                                                                                                                                                                                                             | Relatorio Fulan Janeiro Eng. Municipio Manatuto la halo Inpesaun Maximo tamba hein kontratu foun hui Nasional, atu informa deit projeto refere monitoriza hui Eng nebe mak toma konta konsultant mak responsabliza. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                    | Rehabilitasaun Estrada Rural Rembor, Chainage 0+000-3+000 Km                                                      | Kartini Unipessoal Lda                                         |                                | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | On Going                                                                                                                                                                                                                             | Relatorio Fulan Janeiro Eng. Municipio Manatuto la halo Inpesaun Maximo tamba hein kontratu foun hui Nasional, atu informa deit projeto refere hahu ona iha tercino,maibe kompania foin mak mobiliza material.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| LALEIA ( LAL )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                     | R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800                                        | As Jazesia Unipessoal Lda                                      | MPW-W-210055                   | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| LACLUBAR ( LAC )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                     | Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)                                         | China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD               | ICB/04/MPW-2014                | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relatorio Fulan Janeiro Eng. Municipio Manatuto la halo Inpesaun Maximo tamba hein kontratu foun hui Nasional, atu informa deit projeto refere monitoriza hui Eng nebe mak toma konta hui Inpesaun.                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                     | Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)                         | Hatuwari Unip. Lda                                             | MPW-W-NCB-R-190035             | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going | Relatorio Fulan Janeiro Eng. Municipio Manatuto la halo Inpesaun Maximo tamba hein kontratu foun hui Nasional, atu informa deit projeto refere komeza servisu fha fali ona iha tercino, no kompania servisu nta volume nebe sedauk kompleta.                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                     | Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)                                     | Ryzena Unipessoal Lda                                          | MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020 | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going | Relatorio Fulan Janeiro Eng. Municipio Manatuto la halo Inpesaun Maximo tamba hein kontratu foun hui Nasional, atu informa deit projeto refere sei abandona kontinua iha tinan 2022 ate agora 2023 kompania sedauk kontinua servisu.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                     | R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000                                      | Sun Rise Golden Construction 02 Lda                            | MPW-W-210057                   | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going | Relatorio Fulan Janeiro Eng. Municipio Manatuto la halo Inpesaun Maximo tamba hein kontratu foun hui Nasional, atu informa deit projeto refere remata ona nia servisu iha tercino maibe teknik mak sedauk ba ho rajuan tamba estrada liga ba fatuk makerek mak sedauk bele asau ho diuk. |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                     | R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000                                          | Adahiak Ortao Unipessoal Lda                                   | MPW-W-210056                   | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relatorio Fulan Janeiro Eng. Municipio Manatuto la halo Inpesaun Maximo tamba hein kontratu foun hui Nasional, atu informa deit projeto refere sei abandona kontinua iha tinan 2022 ate agora 2023 kompania sedauk kontinua servisu. |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| SOIBADA ( SO )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                     | Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste                 | FIRDO UNIPESOAAL LDA                                           | SSS/013/MOPTC-2017             | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kilik) - Soibada Chainage 0+000-2+000                           | Manufahi Kilik Unip. Lda                                       | MPW-W-210059                   | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going | Relatorio Fulan Janeiro Eng. Municipio Manatuto la halo Inpesaun Maximo tamba hein kontratu foun hui Nasional, atu informa deit projeto refere kompania kontinua nia servisu iha tercino.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                     | R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700                                       | Ryzena Unipessoal Lda                                          | MPW-W-210060                   | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relatorio Fulan Janeiro Eng. Municipio Manatuto la halo Inpesaun Maximo tamba hein kontratu foun hui Nasional, atu informa deit projeto refere kompania kontinua nia servisu iha tercino.                                            |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |

✕



[illegible]

**Note:**

**Plano Periode inspesaun iha tercinu**

### Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

**Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili**

**Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu**

Preparado por:   
( Eng. José Roberto C. Gusmão )  
Eng. do Projeto Infraestrutura Transporte e Irrigação Municipal  
Manatuto, A.D.N.I.P.

Sertifika Hosi : 

( Eng. Emerenciana de Costa Nêta Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controle e Validação de Qualidade, ADN.I.P.

Aprova-Hus: 

( Eng. Januária Maia Guterres )  
Adjunto Director Ejecutivo, ADN.LF



| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div>MINISTERIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO</div><div>SECRETARIA-Geral do Planeamento</div></div></div><div><div><div></div></div><div>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público</div></div></div> |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | PLANU INSPESAUN |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Naran Eng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Domingos D. X. Silva |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               |                 | 2023    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Manatuto             |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               |                 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
| Município /<br>Posto                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No.                  | Naran Projeto                                                                                                     | Naran Companhia                                                | No Contrato                    | Kategoria | Dono do Projeto               | Action          | Janeiro |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | OBS      |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               |                 | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |          |                                                                                                                                                                                             |          |
| MANATUTO VILA ( MV )                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                    | Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila ( 3.72 km ) area in Manatuto Municipality Manatuto                   | Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda                        | SSS/062/MOPTC-2017             | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                    | Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte ( 4.68 km ) in Manatuto Municipio Manatuto | Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda                           | SSS/061/MOPTC-2017             | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                    | Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction ( Sta. 65+235 - 100+355 )           | R.D Interior Junior Construction / Hebel Road and Bridge Group | ICB/023/MPW-2013               | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                    | Consultant Supervision (M-L & L-N)                                                                                | Sinotech Engineering Consultant                                |                                | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18                   | Rehabilitasaun Estrada Rural Rembor, Chainage 0+000-3+000 Km                                                      | Kartini Unipessoal Lda                                         |                                | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             | On Going |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
| LALEIA ( LAL )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800                                        | As Jazesia Unipessoal Lda                                      | MPW-W-210055                   | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
| LACLUBAR ( LAC )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                    | Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)                                         | China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD               | ICB/04/MPW-2014                | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                    | Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)                         | Hatuwari Unip. Lda                                             | MPW-W-NCB-R-190035             | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                    | Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)                                     | Ryzena Unipessoal Lda                                          | MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020 | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                    | R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000                                      | Sun Rise Golden Construction 02 Lda                            | MPW-W-210057                   | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                    | R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000                                          | Adahiak Orlao Unipessoal Lda                                   | MPW-W-210056                   | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
| SOIBADA ( SO )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                    | Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, Jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste                 | FIRDO UNIPESOAAL LDA                                           | SSS/013/MOPTC-2017             | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                    | R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kilik) - Soibada Chainage 0+000-2+000                           | Manufahi Kilik Unip. Lda                                       | MPW-W-210059                   | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                    | R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700                                       | Ryzena Unipessoal Lda                                          | MPW-W-210060                   | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                |           |                               | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | Relatorio Fulan Janeiro Eng. Municipio Manatuto la halo Inspeccao Maximo tamba hein kontratu foun hosi Nacional, atu informa deit projeto refere kompania kontinua nia servisu iha tereinu. |          |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  |                 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><span></span></div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div></div></div><div><div><span></span></div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div></div></div><div><div><span></span></div><div></div></div></div></div><div><div>MINISTERIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO</div><div>VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><span></span></div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div></div></div><div><div><span></span></div><div></div></div></div></div><div><div>ADN.I.P.</div><div>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público</div></div></div></div></div> |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  | PLANU INSPESAUN |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
| Naran Eng. Domingos D. X. Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  | 2023            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Manatuto |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  |                 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
| Município /<br>Posto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No.      | Naran Projeto                                                                                                                           | Naran Companhia               | No Contrato         | Kategoria | Dono do Projeto                  | Action          | Janeiro |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | OBS      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  |                 | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31       |          |          |
| BARIQUE (BA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | Construction of Sahan Bridge Approach Protection ( A14 )<br>Manatuto ( MPW-W-190157 ) (162)                                             | Yoku Unipessoal Lda           | MPW-W-190157        | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        | Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta.<br>0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)                           | Zenobia Diak Unip.Lda         | MPWTC - CD - 170003 | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7        | R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique<br>Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cainui Chainage<br>0+000-9+800 (162) | Manufahi Kik Unip. Lda        | MPW-W-W-190080      | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | On Going |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8        | R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center -<br>Aubeon Chainage 3+000-6+200                                                     | We'col Unipessoal Lda         | MPW-W-210062        | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          | On Going |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9        | R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture<br>Center Chainage 0+000 - 3+000                                                 | Linoel                        | MPW-W-210061        | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          | On Going |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10       | R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique<br>Chainage 0+000-9+000                                                            | Gimso Brothers Unip. Lda      | MPW-W-210058        | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          | On Going |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
| LACLO (LA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2        | Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio<br>Manatuto                                                                    | Sahan I Unip.Lda              | SSS/304/MOPTC-2016  | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          | On Going |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | Routine Roads Maintenance - Lado, Manatuto Municipality                                                                                 | Egana, Unip. Lda              | MPW-W-190251        | LM        | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8        | National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto<br>(Package A01-01)                                                                | Sinohydro Corporation Limited | ICB/07/MPW-2014     | FI        | MINISTERIO DAS OBRAS<br>PUBLICAS | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10       | Rehabillation of Reinforced Concrete Ramp at Behau                                                                                      | Baboe Unip Lda                |                     | LM-BS     | MINISTERIO DA DEFESA             | Plan            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | On Going |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  | Actual          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |
| TOTAL PROJETO ON-GOING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                         |                               |                     |           |                                  |                 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |

Note: Plano Periode inspesaun iha tereinu Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Hui :  
  
( Eng. Domingos D. X. Silva )  
Eng. ba Projeto Infraestrutura Transporte e Irigasaun  
Município Manatuto, ADN.I.P

Sertifika Hui :  
  
( Eng. Emerenciana de Jesus Mala Freitas )  
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de  
Qualidade, ADN.I.P

Aprova Hui :  
  
( Eng. Janyario Mala Guterres )  
Adjunto Director Executivo, ADN.I.P



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           |                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>MINISTÉRIO DO PLANO<br/>E ORDENAMENTO</div><div>VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>ADN, I.P.</div><div>Agência de<br/>Desenvolvimento<br/>Nacional, Instituto Público</div></div></div></div> |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | PLANU INSPESAUN |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| Naran Eng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Adonis Julio Fernandes       |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | 2023            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           |                 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| Município / Posto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No.                          | Naran Projeto                                                                               | Naran Companhia                     | No Contrato               | Kategoria | Dono do Projeto                           | Action          | JANEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBS |
| MANATUTO VILA ( MV )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara                                                 | MEJD PKRIE EBF BATARA               | 00                        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um                                               | MEJD PKRIE EBF AISIU-UM             | 00                        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun                                              | MEJD PKRIE EBC REMANARUN            | 00                        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik                                              | MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK            | 00                        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau                                                 | MEJD PKRIE EBF RENTAU               | 00                        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala                                               | MEJD PKRIE ESG KAY RALA             | 00                        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato                                                 | MEJD PKRIE EBF OBRATO               | 00                        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                            | Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto                                           | Obrai Unipesoal, Lda                | ICB/0128/SEJD-2014        | FI        | SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU  | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                            | Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto                                         | Baboe Unip Lda                      | 019/Janeiro/2020          | LM-BS     | MINISTERIO DA JUSTICA                     | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                           | Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto          | Carya Timor Leste Unip. Lda         | 08/PDIM-I/MNTT/XII/2019   | PDIM      | ESTATAL                                   | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                           | Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto                       | Carya Timor Leste Lda               | 01/PDIM-I/MNTT/XII/2019   | PDIM      | ESTATAL                                   | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           | Costrusaun Fatin Isolamento Iha Municipio Manatuto                                          | Talamori Unip.Lda                   | RDTL-MS-DNA-DC-20-254     | LM        | SAUDE                                     | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                           | Supplay and installation Main Power for Isolation and Laboratorium Building Maabat Manatuto | Fraternity Unip.Lda                 | RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-229 | LM        | MINISTERIO DA SAUDE                       | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                           | Konstrusaun foun ba EBC Vasco da Gama-Manatuto                                              | Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda | -                         | LM-CD     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ( LAL )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                            | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui                                                  | MEJD PKRIE EP CAIRUI                | 00                        | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU | Plan            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                             |                                     |                           |           |                                           | Actual          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |







| Município /<br>Posto | No. | Naran Projeto                              | Naran Companhia      | No Contrato | Kategoria | Dono do Projeto                              | Action | JANEIRO |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | OBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |     |                                            |                      |             |           |                                              |        | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | 5   | Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor | MEJD PKRIE PE REMBOR | 00          | LM-TP     | MINISTERIO EDUKASAUN<br>JUVENTUDE E DESPORTU | Plan   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |     |                                            |                      |             |           |                                              | Actual |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note:


Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili


Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :



(Adonis Julio Fernandes)  
Eng. Electricidade, ADN, I.P


Sertifika Husi :



(Emerenciana da Costa Maia Freitas)  
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P



Aprova Husi :



(Eng. Januario Maia Guterres)  
Adjunto Director Executivo, ADN, I.P
