



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU LIQUICA

JANEIRO 2022




SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO LIQUISA JANEIRO 2022

Prepara Husi :


(Eng. Juninho Antonio A. Da Cruz)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Liquisa ADN, I.P


(Eng. Marcus Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Liquisa ADN, I.P


(Eng. Camillo de Jesus)
Eng. ba Projeto ME Município Liquisa
ADN, I.P

Verifica Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P


(Eng. Aniceto da Costa)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e
Irigação, ADN, I.P


(Deolindo de Fatima Marques)
Chefe Secção Chefe Secção Projeto M. E &
ITC, ADN, I.P

Sertifica Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO.....	1
I. INTRODUSAUN.....	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Liquisa.....	3
1.3 Lista Projecto	7
II. PROGRESU FISIKU	16
2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan	16
III OBSTÁKLU IHA TERENU	16
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	16
VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU	17
4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu.....	17

INDICE TABELA

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquisa	5
Tabela 1. 2: Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquisa.....	5
Tabela 1.3. 1 Projecto Municipio Ermera Por Fundus Financiamento	7
Tabela 1.3. 2 Projecto Municipio Liquisa Por Sectores.....	10
Tabela 1.3. 3 Projecto Municipio Ermera Por Ministerios	12
Tabela 4. 1 : Dadus populaçãun Munisipiu Liquisa.....	16

I. INTRODUSAUN.


1.1 Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio Liquisa

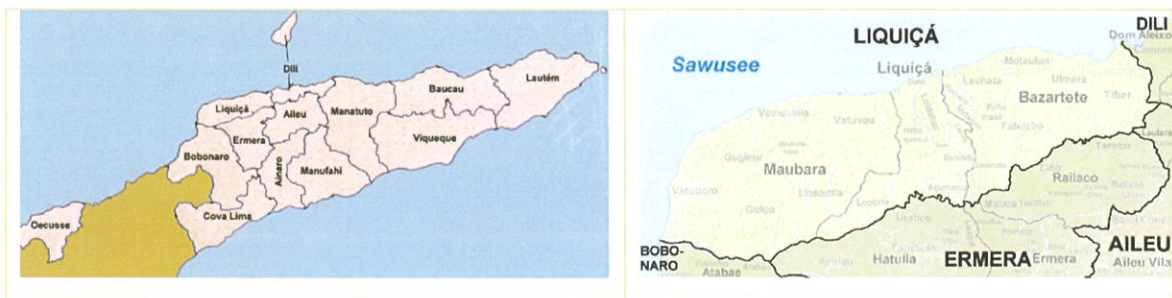

Mapa hatudu pozisaun Administrasaun Munisipal Liquisa iha luan area 543 km² ho populasau nain – 63.403 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Liquisa iha Postu Administrativu tolu (3) , Sukus 23 no aldeias 134, mak hanesan hatudu iha Tabela 1

Tabela 1: Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.

Bazartete		Liquisa		Maubara	
sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Fahilelo	3	Açumano	4	Gugleur	11
Fatumasi	4	Darulete	4	Guiço	5
Lauhata	5	Dato	10	Lissadila	7
Leorema	10	Hatuquesi	8	Maubaralilssa	5
Maumeta	4	Leotala	5	Vatuboro	5
Metagou	3	Loidahar	4	Vatuvou	10
Motaulun	3	Luculai	4	Vaviquinia	7
Tibar	4	-	-	-	-
Ulmera	9	-	-	-	-
Total	45	-	39	-	50

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 58

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquisa

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Liquisa								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		2				2	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
Total			3				3	

Tabela 1. 2: Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquisa

ASET ADN,IP MUNICIPIO LIQUISA								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1					
2	Kareta		1					
3	Desktop HP / Monitor		1					
4	Laptop HP		1					
5	Printer Cannon		1					
6	UPS		1					
7	Armario File		1					
8	Armario Tau hena		3					
9	Meja escritorio		1					
10	Meja han		1					
11	Meja TV (kiik)		1					
12	Kadeira escritorio		6					
13	Kadeira han		4					

14	Sofa		1 Set					
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3		3 Set					
16	Jeleira		1					
17	Water Dispenser		1					Aát
18	TV + Parabola		1 Set					
19	AC		4					
20	Kipas Angin		1					
21	Kompor		1					
22	Kompor Gas		1					
23	Rack sepatu		3					
24	Rack Piring		1					
25	Lampu		11					
26	Water Pump Sanyo		0					

1.3 Lista Projecto

Projetu hotu ne'ebe akumulua iha lista ne'e bazeia ba dadus projetu nebe sei lao hela no mos projetu nebe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak ne'e fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu Por Fundus Financiamento, Tabela 1.3.2 Projetu Por Sector no tabela 1.3.3 Projetu Por Ministerio, no lista detalhu kada projetu bele hare iha #Aneksu A.

Tabela 1.3. 1 Projecto Municipio Liquisa Por Fundus Financiamento



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM (FUNDO COVID + CD + BS + etc..) + PDIM			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EXEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	17	\$ 2,934,430.12	\$ 1,967,361.04	67.04%
2	LIQUISA VILA	16	\$ 4,398,093.95	\$ 1,792,621.07	40.76%
3	MAUBARA	13	\$11,167,699.84	\$ 8,082,332.46	72.37%
	Grand Total	46	\$18,500,223.91	\$11,842,314.57	64.01%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EXEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	\$ 557,358.72	\$ 496,949.07	89.16%
2	LIQUISA VILA	4	\$ 2,716,690.73	\$ 1,516,050.42	55.81%
3	MAUBARA	5	\$10,171,195.89	\$ 7,827,948.46	76.96%
	Grand Total	11	\$13,445,245.34	\$9,840,947.95	73.19%

Dados Detalho kada Projetu #anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FUNDO COVID			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EXEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	\$ 309,925.98	\$ 256,424.78	82.74%
2	LIQUISA VILA				
3	MAUBARA				
	Grand Total	2	\$ 309,925.98	\$ 256,424.78	82.74%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM -CD			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EXEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	6	\$ 1,002,239.70	\$ 468,768.51	46.77%
2	LIQUISA VILA	9	\$ 1,303,318.52	\$ 113,789.99	8.73%
3	MAUBARA	5	\$ 597,241.99	\$ 43,761.73	7.33%
	Grand Total	20	\$ 2,902,800.21	\$ 626,320.23	21.58%

Dados Detalho kada Projeto #anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EXEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	\$ 316,904.17	\$ 140,119.76	44.22%
2	LIQUISA VILA	1	\$ 176,933.50		
3	MAUBARA	2	\$ 228,296.31	\$ 137,915.77	60.41%
	Grand Total	5	\$ 722,133.98	\$ 278,035.53	38.50%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EXEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	5	\$ 748,001.55	\$ 605,098.92	80.90%
2	LIQUISA VILA	2	\$ 201,151.20	\$ 162,780.66	80.92%
3	MAUBARA	1	\$ 170,965.65	\$ 72,706.50	42.53%
	Grand Total	8	\$ 1,120,118.40	\$ 840,586.08	75.04%

Dados Detalho kada Projeto #anexu A

Tabela 1.3. 2 Projecto Municipio Liquisa Por Sectores



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	2	\$ 91,877.21	\$ 67,036.01	72.96%
2	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 293,629.77	\$ 167,315.56	56.98%
3	EDUKASAUN	4	\$ 569,137.23	\$ 302,946.05	53.23%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 1,670,588.86	\$ 1,297,809.30	77.69%
5	ESTRADA- IMPRESTIMO	1	\$ 7,693,101.00	\$ 5,795,051.15	75.33%
6	ESTRADAS	16	\$ 3,908,617.16	\$ 1,819,111.23	46.54%
7	FLOOD CONTROL	1	\$ 502,473.28	\$ 321,707.56	64.02%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	9	\$ 1,733,015.54	\$ 1,005,513.70	58.02%
9	PORTOS	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%
10	SAUDE	2	\$ 309,925.98	\$ 256,424.78	82.74%
11	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%
12	TURISMO	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	46	\$18,500,223.91	\$11,842,314.57	64.01%

NO	SECTOR	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	2	\$ 91,877.21	\$ 67,036.01	72.96%
2	AGUA E SANEAMENTO	2	\$ 122,664.12	\$ 94,609.06	77.13%
3	EDUKASAUN	2	\$ 230,207.52	\$ 165,030.28	71.69%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 499,250.84	\$ 449,325.76	90.00%
5	ESTRADA- IMPRESTIMO				
6	ESTRADAS	4	\$ 400,281.62	\$ 64,558.26	16.13%
7	FLOOD CONTROL	1	\$ 502,473.28	\$ 321,707.56	64.02%
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 719,641.67	\$ 501,046.02	69.62%
9	PORTOS				
10	SAUDE	2	\$ 309,925.98	\$ 256,424.78	82.74%
11	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%
12	TURISMO				
	Grand Total	17	\$2,934,430.12	\$1,967,361.04	67.04%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR	LIQUISA VILA			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO				
3	EDUKASAUN	1	\$ 167,079.10		
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 869,577.80	\$ 630,877.47	72.55%
5	ESTRADA- IMPRESTIMO				
6	ESTRADAS	6	\$ 1,009,758.88		
7	FLOOD CONTROL				
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	6	\$ 956,928.17	\$ 504,467.68	52.72%
9	PORTOS	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%
10	SAUDE				
11	SEGURANCA NO DEFESA				
12	TURISMO				
Grand Total		16	\$4,398,093.95	\$1,792,621.07	40.76%

NO	SECTOR	MAUBARA			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (\$)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 170,965.65	\$ 72,706.50	42.53%
3	EDUKASAUN	1	\$ 171,850.61	\$ 137,915.77	80.25%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 301,760.22	\$ 217,606.07	72.11%
5	ESTRADA- IMPRESTIMO	1	\$ 7,693,101.00	\$ 5,795,051.15	75.33%
6	ESTRADAS	6	\$ 2,498,576.66	\$ 1,754,552.97	70.22%
7	FLOOD CONTROL				
8	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	1	\$ 56,445.70	\$ -	
9	PORTOS				
10	SAUDE				
11	SEGURANCA NO DEFESA				
12	TURISMO	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%
Grand Total		13	\$11,167,699.84	\$8,082,332.46	72.37%

Dados Detalho kada Projeitu #anexu A

Tabela 1.3. 3 Projecto Municipio Liquisa Por Ministerios



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (\$)
1	ESTATAL	3	\$ 387,568.54		
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	3	\$ 139,176.53	\$ 104,901.53	75.37%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	30	\$15,267,072.95	\$10,286,140.29	67.37%
4	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	4	\$ 569,137.23	\$ 302,946.05	53.23%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 99,484.80	\$ 82,502.69	82.93%
7	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 309,925.98	\$ 256,424.78	82.74%
8	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	46	\$ 18,500,223.91	\$ 11,842,314.57	64.01%

Dados Detalho kada Projeitu #anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (\$)
1	ESTATAL	1	\$ 154,189.34		
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PESKAS	2	\$ 91,877.21	\$ 67,036.01	72.96%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	8	\$1,990,637.39	\$1,348,743.97	67.75%
4	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 230,207.52	\$ 165,030.28	71.69%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 99,484.80	\$ 82,502.69	82.93%
7	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 309,925.98	\$ 256,424.78	82.74%
8	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN				
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
Grand Total		17	\$ 2,934,430.12	\$ 1,967,361.04	

Dados Detalho kada Projeitu #anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	LIQUISA VILA			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAG EM EXEKUSAUN (\$)
1	ESTATAL	1	\$ 176,933.50		
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 47,299.32	\$ 37,865.52	80.06%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	12	\$2,612,032.03	\$1,097,479.63	42.02%
4	MINISTERIO DO INTERIOR				
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 167,079.10		
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU				
7	MINISTERIO SAUDE				
8	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
Grand Total		16	\$ 4,398,093.95	\$ 1,792,621.07	40.76%

Dados Detalho kada Projeitu #anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	MAUBARA			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE EZEKUSAUN (\$)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (\$)
1	ESTATAL	1	\$ 56,445.70		
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS				
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	10	\$10,664,403.53	\$7,839,916.69	73.51%
4	MINISTERIO DO INTERIOR				
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 171,850.61	\$ 137,915.77	80.25%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU				
7	MINISTERIO SAUDE				
8	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN				
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	13	\$ 11,167,699.84	\$ 8,082,332.46	72.37%

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

Tabela 4. 1 : Dadus Populasaun Munisipiu Liquisa

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Bazartete	31,983	9,158	9,039	7,089	6,697
Liquiça	25,334	6,978	7,348	5,672	5,337
Maubara	25,234	7,088	6,802	5,766	5,578

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi Progressu servisu nebe kompanha sira atinji iha fulan neé nia laran, husi lista nebe iha #Anexu B hatudu progressu aktual fulan ida neé ho nia persentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento nebe hetan husi progressu fulan ida neé, ikus liu persentagen aktual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativa husi porsento anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detailho bele hare iha #Anexu B, detailhu ba Backup Fotografia #Anexu C1, detalho ba Backup BoQ #Anexu C2 no Instrusaun servisu bele hare #Anexu D

III. OBSTÁKLU IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Durante iha Fulan ida nia laran, problema nebe ami enjineiru municipio hasoru mak hanesan :

1. Projetu lao tarde
2. Companhia balun servisu la tuir spesifikasaun
3. Companhia balun servisu la iha Site Engineer
4. Difikulidade ba Ekpa ADN M.Liquisa hasoru susar ba Be'e mos

VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu

1. Rekomenda ba Kompanhia sira servisu tuir spesifikasaun nebe iha ona
2. Rekomenda ba Kompanhia sira tenke iha Site Engineer iha terenu

Rekomenda ba ADN.I.P. Nacional liu-liu ba Superior sira hodi hare ba Edificio ADN.I.P.

Note : Assinatura Husi Enjineiru Municipio Liquisa

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Liquisa					
No	Deskrisaun	Identidade			
		Naran Kompletu e Asinatura	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia
1	Enjineiru	 Juninho António A. Da Cruz	216	Enjineiru EPAS	
		 Marcus Ximenes de Araujo	172	Enjineiru ITI	
		 Camilio de Jesus	061	Enjineiru METIC	

2	Enjineira	 Nencia F.O. do Rêgo	173	Enjineira VEBD	
3	Motorista	 Rui Antonio Gaio	029	Motorista	



#ANEXO A

Lista Geral Projeto On-going Municipio Liquica - Janeiro 2022

NU	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
1	New Installation MV/LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	BAZARTETE	LIQUICA	Mina Petro Leste Unip. Lda	RDTL-11004589	\$ 499,250.84		100.00%	90.00%	\$ 449,325.76	\$ 49,925.08	ABANDONA	
2	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Banir Lema	MPW-W-190097	\$ 565,452.33	Aug. 14, 2019	100.00%	88.61%	\$ 501,046.02	\$ 64,406.31	PHO	Progresu Fisiko 100% e hela pagamento retensaun 10%
3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	\$ 162,714.83	Aug. 16, 2019	95.68%	86.11%	\$ 140,119.76	\$ 22,595.07	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
4	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libalao - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	\$ 73,270.51	Sept. 5, 2019	100.00%	88.11%	\$ 64,558.26	\$ 8,712.25	PHO	Progresu fizikamente 100 % e sei falta pagamento ba retensaun
5	Konstrusaun Moralha Foun Matadouro Tibar	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-P02019:19726	\$ 23,950.17	Dec. 5, 2019	77.60%	69.84%	\$ 16,726.74	\$ 7,223.43	ON-GOING	Provezoriamente servisu paradu hela
6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Milcha Unip. Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	\$ 67,492.69	Nov. 10, 2019	41.01%	36.91%	\$ 24,910.52	\$ 42,582.17	ON-GOING	
7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No MOP-W-190184	\$ 23,179.32	Oct. 22, 2019	79.24%	52.23%	\$ 12,106.37	\$ 11,072.90	ON-GOING	Provezoriamente servisu paradu hela
8	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	SEGURANCA NO DEFESA	BAZARTETE	LIQUICA	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	\$ 58,107.88	Nov. 29, 2019	86.27%	81.96%	\$ 47,623.31	\$ 10,484.57	ON-GOING	
9	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Naesalobu	MAP-P02019:19532	\$ 67,927.04	Dec. 5, 2019	82.29	74.06%	\$ 50,309.27	\$ 17,617.77	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	FUNDO COVID	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	\$ 66,557.90	Oct. 23, 2020	73.90%	66.51%	\$ 44,268.56	\$ 22,289.34	ON-GOING	ongoing
11	New construction of isolation for covid 19 in liquica, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	FUNDO COVID	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	\$ 243,368.08	Oct. 22, 2020	96.86%	87.18%	\$ 212,156.22	\$ 31,211.86	PHO	Projeto refere hela retensaun (10%) e Fisiku iha Tereno atinji deit 96.86%
12	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDTL/MPJE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	\$ 99,484.80	Sept. 9, 2019	92.14%	82.93%	\$ 82,502.69	\$ 16,982.11	ON-GOING	Falta retensaun
13	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	FLOOD CONTROL	BAZARTETE	LIQUICA	Sali Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	\$ 502,473.28	Sept. 20, 2021	73.03%	64.02%	\$ 321,707.56	\$ 180,765.72	ON-GOING	ON-GOING
14	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Aquarius Construction Unip.Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 154,189.34	Aug. 31, 2021	9.33%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
15	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-NCB-R -21030	\$ 149,732.87	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
16	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-RFQ - 21017	\$ 88,852.44	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
17	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Libalao - Fahilebo Chainage 0+000-7+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatuleo Unip. Lda	MPW-W-210144	\$ 88,425.80	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
18	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	\$ 153,851.88	Dec. 5, 2019	95.23%	81.19%	\$ 124,915.14	\$ 28,936.74	ON-GOING	Servisu iha Tereno remata tiha ona, sei hein kompanha Amenda kontratu nebe mate tiha ona
19	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOP/TC-2017	\$ 1,394,750.00	May 17, 2017	47.12%	47.12%	\$ 657,275.92	\$ 737,474.08	ON-GOING	



#ANEXO A

Lista Geral Projeto On-going Municipio Liquica - Janeiro 2022

NU	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECT	OBSERVA SAUN
20	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	\$ 55,012.05	Aug. 22, 2019	100%	89.92%	\$ 49,468.35	\$ 5,543.70	PHO	Projeto refere hela retensaun (10%) e Fisiku iha Tereno atinji deit 99.91%
21	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	\$ 71,468.49	Aug. 19, 2019	100%	90.00%	\$ 64,321.64	\$ 7,146.85	PHO	Projeto ida neé Remata ona, no hela Retensaun 10% e pagamento atinji 100%
22	New Installation MV, LV Line and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	\$ 593,093.80	Jan. 6, 2017	91.66%	67.45%	\$ 400,036.22	\$ 193,057.58	ON-GOING	
23	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Liquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	\$ 276,484.00	July 6, 2016	92.77%	83.49%	\$ 230,841.25	\$ 45,642.75	ON-GOING	
24	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	\$ 452,362.93	Dec. 20, 2019	76.44%	50.38%	\$ 227,897.03	\$ 224,465.90	ON-GOING	
25	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Banir Lema Unip.Lda	RDTL 0000	\$ 47,299.32	Aug. 18, 2021	88.95%	80.06%	\$ 37,865.52	\$ 9,433.80	ON-GOING	
26	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 176,933.50	Aug. 31, 2021	3.83%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
27	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-2+500, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21025	\$ 131,219.62	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
28	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MOP - CD - NCB-R - 21036	\$ 123,631.72	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
29	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Metagou - Aibenu Chainage 0+000-7+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	MOP - CD - NCB-R - 21038	\$ 238,739.71	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
30	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Dato - Loidahar Chainage 0+000-12+300, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Luqueli Oan Unipessoal Lda	MOP-CD-NCB-R - 21039	\$ 188,589.13	Oct. 01, 2021	1.46%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
31	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 0+000 - 10 +000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Caiulu, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21035	\$ 162,215.27	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
32	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 0+000 - 5+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Vicaroman, Unip Lda	MOP - CD NCB - R - 21034	\$ 165,363.43	Oct. 01, 2021	1.48%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
33	Projeitu Konstrusaun foun ESG publico 01 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM -CD	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Roman Furak Unip.Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	\$ 167,079.099	Nov. 1, 2021	5.28%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
34	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Fu Unip.Lda	RDTL - 0000	\$ 13,000.00	Jan. 1, 2016	0.00	0.00%	\$ -	\$ 13,000.00	New	
35	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	\$ 288,760.22	July 6, 2016	83.73%	75.36%	\$ 217,606.07	\$ 71,154.15	ON-GOING	
36	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	\$ 1,901,334.67	Sept. 7, 2017	99.98%	89.98%	\$ 1,710,791.24	\$ 190,543.43	ON-GOING	
37	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	\$ 275,000.00	Dec. 27, 2016	40.00	38.00%	\$ 104,500.00	\$ 170,500.00	ON-GOING	
38	Novo Konstrusaun Edificio ESTV Lisadila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	\$ 171,850.61	Aug. 16, 2019	89.17%	80.25%	\$ 137,915.77	\$ 33,934.84	ON-GOING	



#ANEXO A

Lista Geral Projeto On-going Municipio Liquica - Janeiro 2022

NU	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
39	Rehabilitasaun Sistema be'e mo iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	MAUBARA	LIQUICA	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	\$ 170,965.65	Jan. 3, 2019	54.99%	42.53%	\$ 72,706.50	\$ 98,259.15	ON-GOING	Provizoriamente paradu hela
40	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	MAUBARA	LIQUICA	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunlwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	\$ 7,693,101.00	May 3, 2017	75.33%	75.33%	\$ 5,795,051.15	\$ 1,898,049.85	ON-GOING	
41	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip.Lda	MPW-W-190098	\$ 50,702.59	Aug. 28, 2019	95.90%	86.31%	\$ 43,761.73	\$ 6,940.86	ON-GOING	
42	Konstrusaun Moru Haleu no Posto Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Rafio Unip. Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	\$ 56,445.70	July 21, 2021	16.32%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
43	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Rito - Pu, Unipessoal,Lda	MOP -CD-RFQ - 21013	\$ 67,382.23	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
44	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Malibo, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21033	\$ 152,622.90	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
45	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Nheu, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21027	\$ 173,484.62	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
46	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Murak, Unipessoal Lda	MOP - CD- NCB-R- 21032	\$ 153,049.65	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
TOTAL									\$ 18,500,223.91				\$ 11,842,314.57	64.01%		

(Eng. Marcus Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infraestrutura Transporte e Irigasaun, ADN,I.P

PREPARA HUSI,

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Eng. ba Edificio Publiku Agua e Saneamento, ADN,I.P

(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. Mekanikal no Elektrikal ADN,I.P

SERTIFIKA HUSI,

(Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P



#ANEXO B

PROGRESSU FISIKU FULAN JANEIRO MUNICIPIO LIQUICA



LOKALIZASAUN PROJETO										Jan-22		
NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Commulative Progress (%)
1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	BAZARTETE	LIQUICA	Mina Petro Leste Unip, Lda	RDTL-11004589	\$ 499,250.84			
2	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Banir Lema	MPW-W-190097	\$ 565,452.33			
3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	\$ 162,714.83			
4	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libalao - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	\$ 73,270.51			
5	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	\$ 23,950.17			
6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	\$ 67,492.69			
7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	\$ 23,179.32			
8	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	SEGURANCA NO DEFESA	BAZARTETE	LIQUICA	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	\$ 58,107.88			
9	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Naesalobu	MAP-P02019:19532	\$ 67,927.04			
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	FUNDO COVID	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Qeson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	\$ 66,557.90			
11	New construction of isolation for covid 19 in liquica, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	FUNDO COVID	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	\$ 243,368.08			
12	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasau Iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM -CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDTP/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	\$ 99,484.80			
13	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	FLOOD CONTROL	BAZARTETE	LIQUICA	Sali Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	\$ 502,473.28	36.74%	36.29%	73.03%
14	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 154,189.34			
15	R4D Rural Road Spot Improvemnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-NCB-R -21030	\$ 149,732.87			
16	R4D Rural Road Spot Improvemnt Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-RFQ - 21017	\$ 88,852.44			
17	R4D Rural Road Spot Improvemnt Libalao - Fahilebo Chainage 0+000-7+000, liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatuleo Unip Lda	MPW-W-210144	\$ 88,425.80			
18	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	\$ 153,851.88			
19	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	\$ 1,394,750.00			

20	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	\$ 55,012.05			
21	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	\$ 71,468.49			
22	New Installation MV, LV Line and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	\$ 593,093.80			
23	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Liquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	\$ 276,484.00			
24	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	\$ 452,362.93			
25	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Banir Lema Unip,Lda	RDTL 0000	\$ 47,299.32			
26	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 176,933.50			
27	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000- 2+500, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21025	\$ 131,219.62			
28	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000- 1+700, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MOP - CD - NCB-R - 21036	\$ 123,631.72			
29	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Metaqou - Aibenu Chainage 0+000- 7+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	MOP - CD - NCB -R - 21038	\$ 238,739.71			
30	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Dato - Liodahar Chainage 0+000- 12+300, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Luqueli Oan Unipessoal Lda	MOP-CD-NCB-R - 21039	\$ 188,589.13	0.00%	1.46%	1.46%
31	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 5+000 - 10 +000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Caiulu, Unip Lda	MOP - CD - NCB -R - 21035	\$ 162,215.27			
32	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 0+000 - 5+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Vicaroman, Unip Lda	MOP - CD NCB - R - 21034	\$ 165,363.43	0.00%	1.48%	1.48%
33	Projeitu Konstrusaun foun ESG publico 01 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM -CD	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Roman Furak Unip,Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	\$ 167,079.099	0.00%	5.28%	5.28%
34	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Fu Unip,Lda	RDTL - 0000	\$ 13,000.00			
35	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	\$ 288,760.22			
36	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	\$ 1,901,334.67	99.74%	0.25%	99.98%
37	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	\$ 275,000.00			
38	Novo Konstrusaun Edificio ESTV Lisadila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	\$ 171,850.61			
39	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	MAUBARA	LIQUICA	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	\$ 170,965.65			
40	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA-IMPRESTIMO	MAUBARA	LIQUICA	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	\$ 7,693,101.00			
41	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-190098	\$ 50,702.59			
42	Konstrusaun Moru Haleu no Posto Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Rafio Unip. Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	\$ 56,445.70			

43	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Rito - Pu, Unipessoal,Lda	MOP -CD-RFQ - 21013	\$ 67,382.23			
44	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Malibo, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21033	\$ 152,622.90			
45	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Nheu, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21027	\$ 173,484.62			
46	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Murak, Unipessoal Lda	MOP - CD- NCB-R- 21032	\$ 153,049.65			

INSPECAO HUSI

(Eng. Marcos de Araujo Ximenes)

Engeneru ba Projetu Infrastrutura Transporte e Irigasaun ADN,I.P

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)

Engeneru ba Edificio Publiku Agua e Saneamento ADN,I.P

VERIFICA HUSI

(Eng. Aniceto da Costa)

Engeneru Senoir ba Projetu Infrastrutura Transporte e Irigasaun ADN,I.P

(Arg. Francisco Xavier D.D. Jeronimo)

Engeneru Senior ba Projetu Edificio Publiku no Be'e Saneamento ADN,I.P

SERTIFIKA HUSI

(Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao de Qualidade, ADN,I.P

ANEXO C1 (BZT14)
Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Project For Tibar River

No. kontratu : RT/067/MOP-2021

Data Inspeksaun : 19/01/2022

Fatin Inspeksaun : Tibar


Koordinat :
Start Point : Long : -8°34'29,372
End Point : Long

Latitude : -125°29'27,612
Latitude

Naran Inspektor : I Eng. Marcos Ximenes de Araujo (Teknik ADN.IP)

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Cyclop concrete (K-250) 21 Mpa

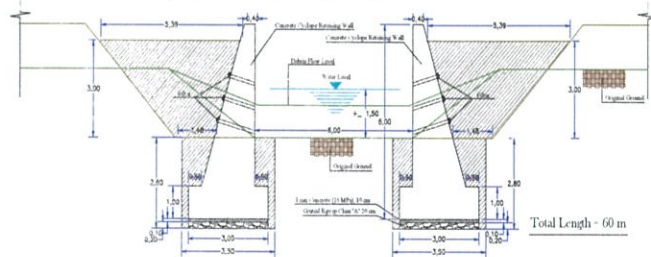


Uptrend Left & Right

T	W1	w2	area	Distacia	Volume
1.00	3.00		3.00	78.00	234.00
Total					234.00

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




Sketch Item servisu : Cyclop concrete (K-250) 21 Mpa

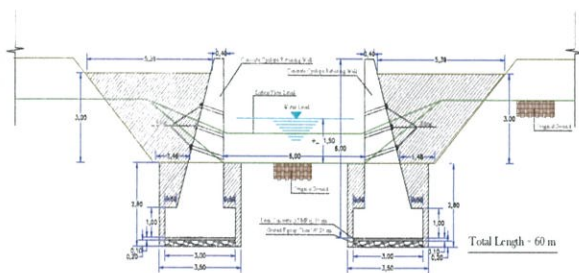

Downtrend Left & Right

T	W1	w2	area	Distacia	Volume
Wall					
5.00	2.00	0.40	6.00	100.00	600.00
Total					600.00

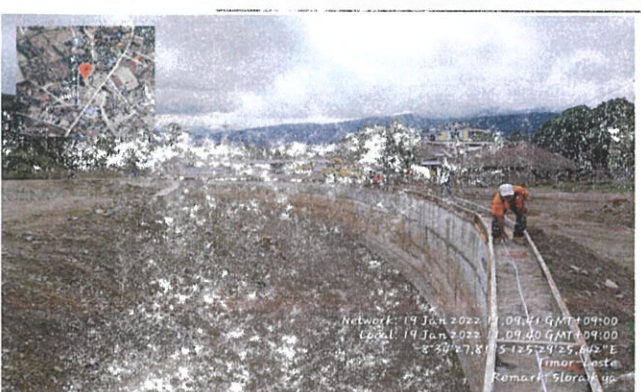



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (BZT14)

Contract Name : Emergency Project For Tibar River

No Contract : RT/067/MOP-2021

Name of Contractor : Sali - Magu Unip.Lda

SUMMARY											
NO	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 1,790.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447.50	0.09%	\$ 447.50	0.09%	\$ 895.00	0.18%
200	EARTHWORKS	\$ 29,230.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,923.48	1.98%	\$ 357.90	0.07%	\$ 10,281.38	2.05%
300	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 403,718.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,234.84	28.91%	\$ 159,765.24	31.80%	\$ 305,000.08	60.71%
400	DRAINAGE AND SLOP PROTECTION WORKS	\$ 10,802.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,901.20	1.77%	\$ 914.10	0.18%	\$ 9,815.30	1.95%
Total - net cost		\$ 445,541.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,507.02	32.74%	\$ 161,484.74	32.14%	\$ 325,991.75	64.88%
Profit (net cost x %) ; 10%		\$ 44,554.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,450.70	3.27%	\$ 16,148.47	3.21%	\$ 32,599.18	6.49%
Over Head		\$ 2,525.00						\$ 1,138.88	0.23%	\$ 1,138.88	0.23%
Tax (net cost + profit + overhead) x 2 %)		\$ 9,801.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,619.15	0.72%	\$ 3,575.44	0.71%	\$ 7,194.60	1.43%
Total gross-cost		\$ 502,422.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184,576.87	36.74%	\$ 182,347.53	36.29%	\$ 366,924.40	73.03%

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestrutura, Transporte e
irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng. Aniceto da Costa
Engenheiro Senior ba Projeto
Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da
Qualidade, ADN I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (BA14)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Emergency Project For Tibar River

Kompanha : Sali - Magu Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura																									
I	19/01/2022	Liquica/Bazartete	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	LIVRO Vizitantes <table><tr><th>Data</th><th>Naran</th><th>Institusaun/Org.</th><th>Asunto</th><th>Assinatura</th></tr><tr><td>19/12/2021</td><td>Equipa Inspeccao (DNERCC).</td><td>DNERCC - Mop.</td><td>- Halo inspesaun ba posto de pagamento bazar.</td><td></td></tr><tr><td>19/01/2022</td><td>Marcos Ximenes de A.</td><td>ADN.I.P.M.Liquica</td><td>- Huru ba companhia atu cek didiak uran nebe menus</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Huru ba companhia servisu tuir nafatin marta-talan nebe mator lu.</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Huru ajiu monten nafatin tuir-tuan servisu no atu a progresu servisu.</td><td></td></tr></table> Network: 19 Jan 2022 12.01.14 GMT+09:00 Local: 19 Jan 2022 12.01.13 GMT+09:00 -8°34'30.269"S 125°29'27.277"E Timor-Leste Remark: 5loraik ya	Data	Naran	Institusaun/Org.	Asunto	Assinatura	19/12/2021	Equipa Inspeccao (DNERCC).	DNERCC - Mop.	- Halo inspesaun ba posto de pagamento bazar.		19/01/2022	Marcos Ximenes de A.	ADN.I.P.M.Liquica	- Huru ba companhia atu cek didiak uran nebe menus					- Huru ba companhia servisu tuir nafatin marta-talan nebe mator lu.					- Huru ajiu monten nafatin tuir-tuan servisu no atu a progresu servisu.		
Data	Naran	Institusaun/Org.	Asunto	Assinatura																												
19/12/2021	Equipa Inspeccao (DNERCC).	DNERCC - Mop.	- Halo inspesaun ba posto de pagamento bazar.																													
19/01/2022	Marcos Ximenes de A.	ADN.I.P.M.Liquica	- Huru ba companhia atu cek didiak uran nebe menus																													
			- Huru ba companhia servisu tuir nafatin marta-talan nebe mator lu.																													
			- Huru ajiu monten nafatin tuir-tuan servisu no atu a progresu servisu.																													
II					1																											
					2																											
					3																											
					4																											
					5																											
III					1																											
					2																											
					3																											
					4																											
					5																											

ANEXO C1 (MBR3)

Back-up Data

Naran Projeto : Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liqueica Municipality de Liqueica

No. kontratu : SSS/126/MOPTC-2017

Data Inspeksaun : 31/01/2022

Fatin Inspeksaun : Karimbala

Koordinat :

Start Point : Long : 125°6'36.435

End Point : Long :


Latitude : - 8°40'0.514

Latitude


Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu :Aggregate Subbase Course




Sketch Item servisu : Concrete Precast Lined Drain 25 Mpa




Sketch Item servisu : Concrete Precast Lined Drain 25 Mpa



Sketch Item servisu :Structural Concrete Class "A" (30 Mpa)



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

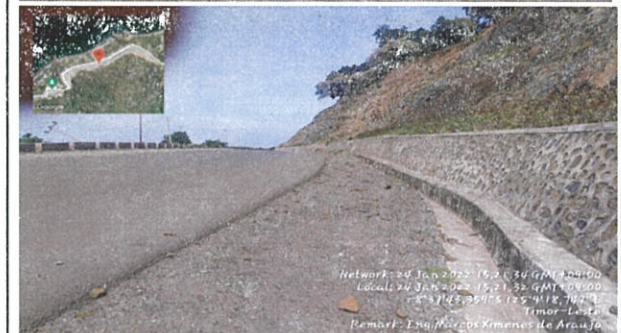

ANEXO C1 (MBR3)

Back-up Data

Naran Projeto : Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liqueica Municipality de Liqueica

No. kontratu : SSS/126/MOPTC-2017

Data Inspeksaun : 16/12/2021

Fatin Inspeksaun : Karimbala

Koordinat :

Start Point : Long : 125°6'36.435

End Point : Long :


Latetude : - 8°40'0.514

Latetude


Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho





Sketch Item servisu : Asphalt Concrete Binder Course (ACBC), 60mm thick

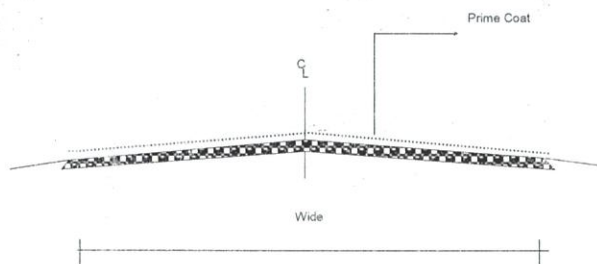

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

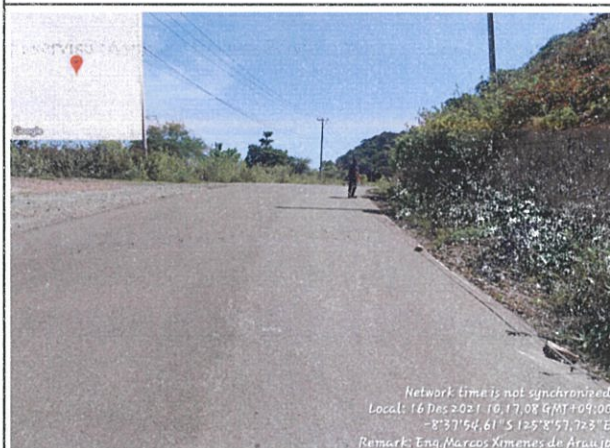

Sketch Item servisu : Asphalt Concrete Binder Course (ACBC), 60mm thick

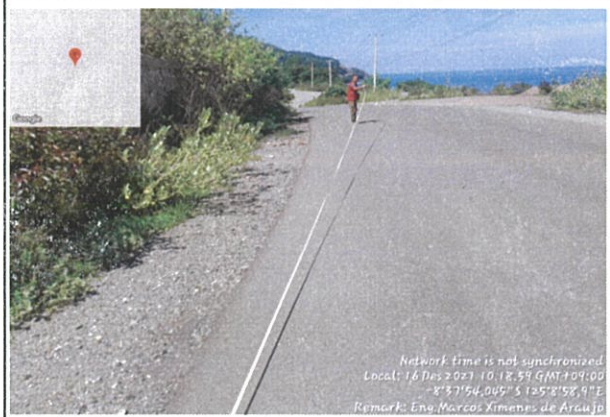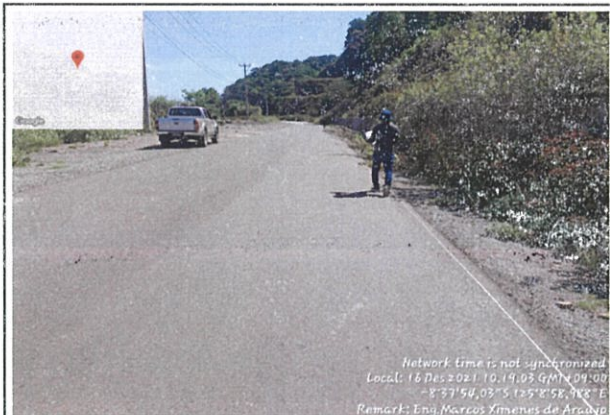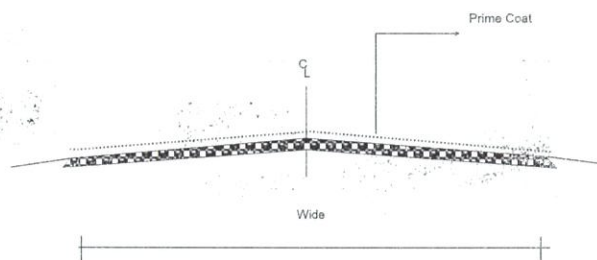



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (MBR3)

Name of Roads : Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica

Contract No : SSS/126/MOPTC-2017

Contractor : Montana Diak Unipessoal, Lda

SUMMARY											
NO	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	REVISED CONTRACT	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.				
				PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 65,576.40	\$ 65,576.40	\$ 65,576.40	\$ -	\$ 65,576.40	\$ 65,576.40	3.45%	\$ -	0.00%	\$ 65,576.40
200	EARTHWORKS	\$ 423,268.34	\$ 605,281.79	\$ 605,281.79	\$ -	\$ 605,281.79	\$ 605,281.79	31.83%	\$ -	0.00%	\$ 605,281.79
300	SUB BASE AND BASE COURSE	\$ 180,522.77	\$ 185,378.39	\$ 181,170.08	\$ 4,208.31	\$ 185,378.39	\$ 181,170.08	9.53%	\$ 4,208.31	0.22%	\$ 185,378.39
400	SURFACE COURSE	\$ 505,503.57	\$ 335,390.69	\$ 335,390.69	\$ -	\$ 335,390.69	\$ 335,390.69	17.64%	\$ -	0.00%	\$ 335,390.69
500	ROAD CONSTRUCTION	\$ 25,445.41	\$ 18,418.76	\$ 18,418.76	\$ -	\$ 18,418.76	\$ 18,418.76	0.97%	\$ -	0.00%	\$ 18,220.46
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 484,277.69	\$ 474,548.15	\$ 474,340.46	\$ -	\$ 474,340.46	\$ 474,340.46	24.95%	\$ -	0.00%	\$ 474,340.46
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.53%	\$ -	0.00%	\$ 10,000.00
Total - net cost		\$ 1,694,594.18	\$ 1,694,594.18	\$ 1,690,178.19	\$ 4,208.31	\$ 1,694,386.50	\$ 1,690,178.19	88.89%	\$ 4,208.31	0.22%	\$ 1,694,188.20
Profit (net cost x %) ; 10%		\$ 169,459.42	\$ 169,459.42	\$ 169,017.82	\$ 420.83	\$ 169,438.65	\$ 169,017.82	8.89%	\$ 420.83	0.02%	\$ 169,438.65
Tax (net cost + profit + overhead) x 2 %		\$ 37,281.07	\$ 37,281.07	\$ 37,183.92	\$ 92.58	\$ 37,276.50	\$ 37,183.92	1.96%	\$ 92.58	0.00%	\$ 37,276.50
Total gross-cost		\$ 1,901,334.67	\$ 1,901,334.67	\$ 1,896,379.93	\$ 4,721.72	\$ 1,901,101.65	\$ 1,896,379.93	99.74%	\$ 4,721.72	0.25%	\$ 1,901,101.65

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestrutura, Transporte e
irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng. Aniceto da Costa
Engenheiro Senior ba Projeito Infraestrutura, Transportes e Irigasaun,
ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da
Qualidade, ADN I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran projeto : Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala
Liquica Municipality de Liquica

Kompanha : Montana Diak Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	IN Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	31/01/2022	Liquica/Maubara	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Servisu iha Terreno remata ona, no hein pedido pagamentu Retensaun 10%	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



ANEXO C1 (LV15)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)

No. kontratu : MPW-W-210150

Data Inspeksaun : 26/01/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Loidahar

Koordinat :

Start Point : Long : 125°19'36.41779

Latitude : - 8°36'46.93352

End Point : Long : 125°19'36.41779


Latitude : - 8°36'46.93352

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Stone Masonry

Sta, 3+250 - 3+300



<i>T</i>	w	<i>Distacia</i>	<i>Volume</i>
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m³


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halo Line drain iha Suco Loidahar no Sta,
3+250 - 3+300



Sketch Item servisu : Stone Masonry

Sta, 3+600 - 3+650



<i>T</i>	w	<i>Distacia</i>	<i>Volume</i>
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m³

Companhia halo Line drain iha Suco Loidahar no Sta,
3+600 - 3+650





ANEXO C2 (LV15)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)

Contract No : MPW-W-210150

Contractor : Luqueli Oan Unipessoal.Lda

SUMMARY									
NO	DESCRIPTION	CONTRAC ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.			
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	TO DATE	%
R-01	General works	\$ 1,300.00							
R-02	Drainage	\$ 1,905.47							
R-03	Earth work	\$ 19,160.19							
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 5,007.60							
R-08	Structures	\$ 97,539.20					\$ 2,450.00	\$ 2,450.00	1.30%
R-11	Routine maintenance	\$ 18,278.00							
R-15	Provisional sum	\$ 250.00							
	Sub Total	\$ 143,440.46						\$ 2,450.00	1.30%
	General items								
G-01	Security	\$ 1,680.00							
G-02	Project team	\$ 9,960.00							
G-03	Safety and protection	\$ 6,094.50							
G-05	Meetings	\$ 100.00							
G-06	Ceremonial costs	\$ 175.00							
G-07	Mineral fees	\$ 9,097.30							
	Sub Total	\$ 27,106.80							
A	CONSTRUCTION COST	\$ 143,440.46						\$ 2,450.00	1.30%
B	PROFIT 10% x A	\$ 14,344.05						\$ 245.00	0.13%
C	OVERHEAD	\$ 27,106.80							0.00%
D	TAX 2% (A+B+C)	\$ 3,697.83						\$ 53.90	0.03%
E	GRAND TOTAL (A+B+C)	\$ 188,589.13						\$ 2,748.90	1.46%

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engenheiro ba Projecto
Infraestrutura, Transporte e irigaaun Municipio
Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng. Aniceto da Costa
Engenheiro Senior ba Projeto
Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da
Qualidade, ADN I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV15)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage
0+000-12+300)

Kompanha : Luqueli Oan Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	26/01/2022	Liquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Ekipa AND.I.P.M,Liquica halo monitorizasaun iha terreno husi kompanhia seidauk prepara buku tamu,no sasan iha gudang mos sei mamuk hela, ami rekomenda ona ba kompanhia tengki prepara buku tamu hodi tau iha gudang.	
II					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (LV16)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu Chainage 5+000-10+000)

No. kontratu : MPW-W-210154

Data Inspeksaun : 26/01/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Asumanu

Koordinat :

Start Point : Long : 125°20'42.60178

Latitude : - 8°41'10.7671

End Point : Long : 125°22'26.08136

Latitude : - 8°41'3.33064

Naran Inspektor : 1.00 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Companhia foin hahu servisu iha parte CMG leader - Dry season, no progresu servisu iha tereno seidauk iha

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch Item servisu :

Companhia foin hahu servisu iha parte CMG leader - Dry season, no progresu servisu iha tereno seidauk iha



Companhia foin hahu servisu iha parte CMG leader - Dry season, no progresu servisu iha tereno seidauk iha





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV16)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu Chainage
5+000-10+000)

Kompanha : Caiulu Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	26/01/2022	Liquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Ekipa AND.I.P.M,Liquica halo monitorizasaun iha terreno husi kompanhia seidauk prepara buku tamu,no sasan iha gudang mos sei mamuk hela, ami rekomenda ona ba kompanhia tengki prepara buku tamu hodi tau iha gudang.	
II					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (LV17)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leorema Chainage 0+000-5+000)

No. kontratu : MPW-W-210155

Data Inspeksaun : 26/01/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Aibenu - Asumanu

Koordinat :

Start Point : Long : 125°20'48.07781
End Point : Long : 125°20'47.77872


Latetude : - 8°39'26.83062
Latetude : - 8°40'32.30753

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu : Gabion

Sta, 1+250 - 1+280

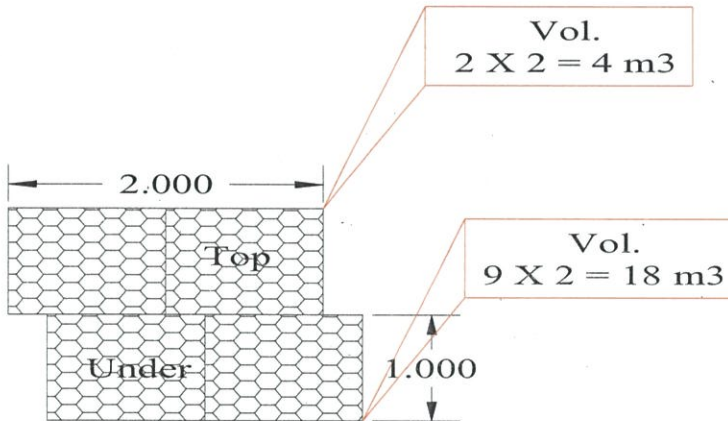

Sketch Item servisu : Gabion

Sta, 3+600 - 3+650

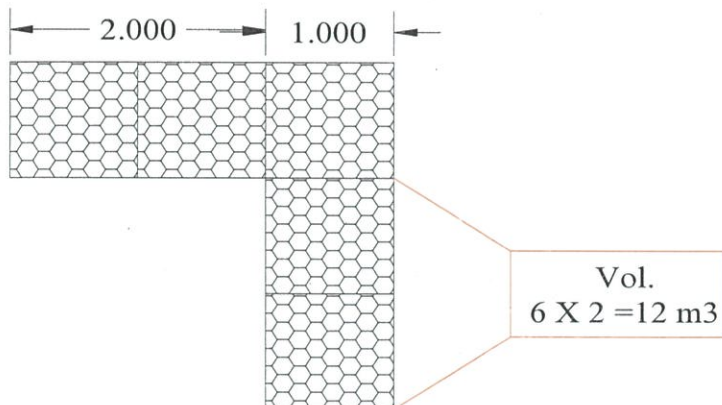


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halo Gabion iha Suco Aibenu iha Sta, 1+250 - 1+280



Companhia halo Gabion iha Suco Aibenu iha Sta, 4+120 - 4+155

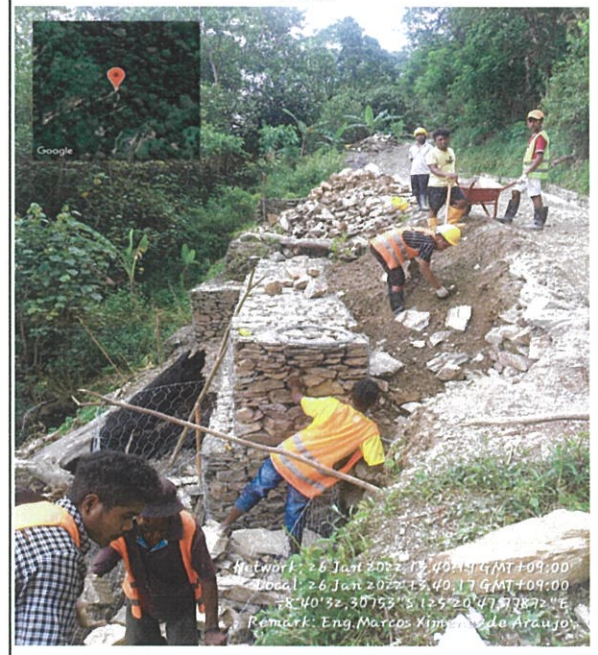



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV17)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leorema Chainage 0+000-5+000)

Contract No : MPW-W-210155

Contractor : Vicaroman Unip.Lda

SUMMARY											
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	\$ 1,750.00									
R-02	Drainage	\$ 37.00									
R-03	Earth work	\$ 13,233.46									
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 8,729.99									
R-08	Structures	\$ 82,879.01						\$ 2,182.40	1.32%	\$ 2,182.40	1.32%
R-11	Routine maintenance	\$ 8,882.00									
R-15	Provisional sum	\$ 250.00									
G-01	Security	\$ 1,380.00									
G-02	Project team	\$ 17,520.00									
G-03	Safety and protection	\$ 6,501.00									
G-05	Meetings	\$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	\$ 200.00									
G-07	Mineral fees	\$ 8,290.40									
A	Construction cost	\$ 115,761.46						\$ 2,182.40		\$ 2,182.40	1.32%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 11,576.15						\$ 218.24		\$ 218.24	0.13%
C	General items	\$ 33,991.40						\$ -		\$ -	0.00%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	\$ 3,226.58						\$ 48.01		\$ 48.01	0.03%
E	Total	\$ 165,363.43						\$ 2,448.65		\$ 2,448.65	1.48%

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engenheiro ba Projecto Infraestrutura, Transporte e
irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng. Aniceto da Costa
Engenheiro Senior ba Projeito Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV17)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leorema
Chainage 0+000-5+000)

Kompanha : Vicaroman Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	26/01/2022	Liquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Ekipa AND.I.P.M,Liquica halo monitorizasaun iha terreno husi kompanhia seidauk prepara buku tamu,no sasan iha gudang mos sei mamuk hela, ami rekomenda ona ba kompanhia tengki prepara buku tamu hodi tau iha gudang.	
					2		
					3		
					4		
					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BZT4)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Moralha Foun Matadouro Tibar
No. kontratu : RDTL-MAP-PO2019:19726

Data Inspesaun : 27 Janeiro 2022

Fatin Inspesaun : Matadouro, Tibar, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : S 8° 35' 3.605'', Latetude :

End Point : Long : E 125° 29' 4.209'', Latetude :

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2.

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Provezoriamente servisu iha terenu paradu
hela no la iha aktividade ruma husi
autoridade sira tan nee seidauk iha
informasaun klaru husi terenu. Pagamentu
ikus atinji deit 77,60%.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BZT4)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Moralha Foun Matadouro Tibar
: RDTL-MAP-PO2019:19726

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (BZT6)
Back-up Data

Naran Projeto : Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar
No. kontratu : MOP-W-190184

Data Inspesaun : 27 Janeiro 2022

Fatin Inspesaun : Tibar, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : S 8° 34' 30.252'', Latetude :

End Point : Long : E 125° 29' 57.093'', Latetude :

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2.


3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Tuir autoridade/seguransa iha terenu hateten
katak projeitu refere remata tiha ona, maibe
too agora seidauk iha informasaun klaru husi
kompania neebe toma konta ba projeitu
refere.

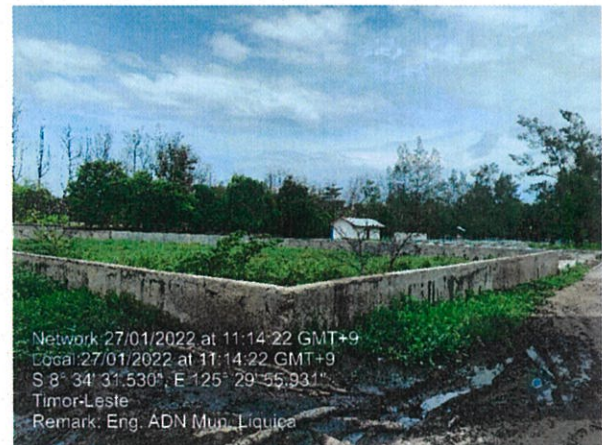



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (BZT6)
Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar
: MOP-W-190184

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Tuir nia progresu pagamentu ikus update nee
atinji 79,42%.



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (BZT8)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Armajen Foun Matadoro-Tibar
No. kontratu : RDTL-MAP-PO2019:19532

Data Inspesaun : 27 Janeiro 2022

Fatin Inspesaun : Matadouru, Tibar, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.35'4.56"S, Latetude :

End Point : Long : 125.28'59.582"E, Latetude :

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2.

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Progresu atual remata ona no pagamentu atinji deit 82,29% tanba iha item balu mak seidauk implementa husi kompania no sei hein konfirmasaun ho projeitu nain. Tanba la iha dadus ka dezeniu neebe kompania bele implementa tuir iha terenu tuir item neebe sei falta, kompania sei tenta buka solusaun ho projeitu nain atu tetu ba servisu refere.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (BZT8)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun Armajen Foun Matadoro-Tibar
: RDTL-MAP-PO2019:19532

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 – (LV15)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : **12 Janeiro 2022**

Fatin Inspesaun : Dato, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.35'21.273"S, Latetude :

End Point : Long : 125.20'1.933"E, Latetude :

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2.

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projeitu foun husi Ministeriu Edukasaun
neebe implementa husi kompania Roman
Furak Unip. Lda. Iha Dato – Liquica Vila
munisipiu Liquica.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 – (LV15) Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica
: NCB:16/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho

Projeitu refere foin mak hahuu servisu durante semana ida ho balu. Konsisti husi: tekniku kompania nain ida, mandor nain ida no badain hamutuk sanulu resin hitu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Servisu foin tama iha galian tanah ba pemasangan pondasi batu kali, galian kuaze finaliza ona no servisu hada pondasi komesa lao ona.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 – (LV15)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
: **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 – (LV15) Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : 25 Janeiro 2022

Fatin Inspesaun : Dato, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.35'21.273"S, Latetude :

End Point : Long : 125.20'1.933"E, Latetude :

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2.

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Tuir badain hirak neebe mak iha terenu
servisu paradu hela durante semana ida resin,
tanba stock material ba besi nian hotu no iha
loja kuaze seidauk hetan tuir spec.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 – (LV15)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
: **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho

Tuir kompania hatutan katak servisu ba
pondasi nian iha mudansa ba dimensaun husi
dezeniu tanba kondisaun terenu atual la
hanesan ho iha design/dezeniu rai la niveladu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 – (LV15)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
: **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho

Pondasi ba uma oin/terras nian kuaze aumenta
husi design: 0,50m (iha dezeniu) muda ba iha
0,70m too iha 0,80m (iha terenu).

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Diametru husi pondasi uma kotuk nian muda
husi design: 0,80m too 1,00m (iha dezeniu)
muda ba iha 1,50m (iha terenu).

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 – (LV15) Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Projeto Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica
: NCB:16/MEJD/DNA/2021


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

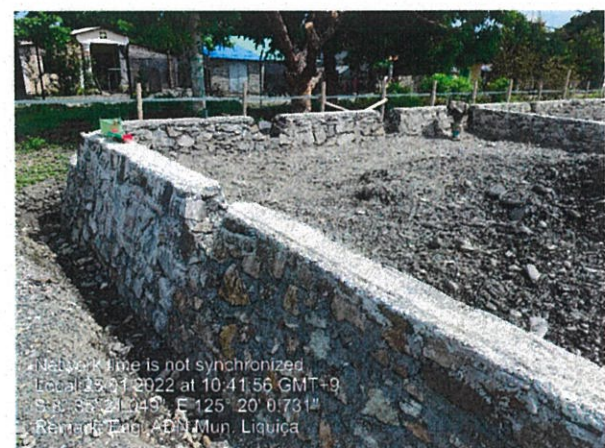



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

SUMMARY

Naran Projeitu : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA SECUNDÁRIA GERAL LIQUIÇA
Fatin Projeitu : CAIMEO VILA, SUCO DATO
Projeitu Nain : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

ANEXU C2 - (LV20)			VERIFIED BY A D N , I P							
NO.	WORK DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	PREVIOUS	BILLED (%)	THIS BILLING	BILLED (%)	TO DATE	BILLED (%)	PROGRESU IHA TERENU	BILLED (%)
I	PRELIMINARIES	\$ 2,870.00							\$ 1,435.00	0.86%
II	CLASSROOM BUILDING C	\$ 53,423.84							\$ 2,671.19	1.60%
III	CLASSROOM BUILDING CB	\$ 75,136.99							\$ 3,756.85	2.25%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 13,000.00							\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 144,430.83							\$ 7,863.04	4.71%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 14,443.08							\$ 786.30	0.47%
C	OVERHEAD	\$ 4,930.00							\$ -	0.00%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 3,276.08							\$ 172.99	0.10%
E	CONTIGENCY	\$ -							\$ -	0.00%
F	TOTAL COST (A+B+C+D)	\$ 167,079.99							\$ 8,822.33	5.28%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifisiu Publiku Agua Saneamentu,
ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineer ba Projeitu
Edificio Publiku Agua Saneamento
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ
ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV15)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran Projeitu: Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica

Kompanha : ROMAN FURAK Unip. Lda.

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	12/01/2022	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquica	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
					6		
II	25/01/2022	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquica	1		
					2		
					3		
					4		
					5		

Note:

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo ADN.I.P

Eng. ba Projeto Infraestructura, Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Note:	Plano Periode insesamu iha tereinu	Relatoria avalluasu mensal iha Dili	Insipesau Pagamentu Anual iha tereinu	Implementasao Plano Periode insesau iha tereinu
-------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---

Aprica Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo ADN.I.P



Note:					
Plano Periode inspeksian iha tercinu		Relatoriu avaliasuan mental iha Dili		Inspeksan Pagamentu Anual iha tercinu	Implementasuan Plano Periode inspeksian iha tercinu

Sertifikasi Hutan :



(Emergensi dan Kondisi Freitas)

Coordenador da Unidade de Controle e Validasaun do



Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T.M., Eng)
Director Executivo ADN, I.P





Juninho Antônio Abrantes da Cruz						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Município	MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS					Action	Janeiro																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No. Contrato	Kategoria		Dono do Projeto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Liquica Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda.	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



Juninho António Abrantes da Cruz						2022																																					
MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS						Janeiro																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS				
Bazartete (BZT)	7	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	Holuli Unip. Lda.	SSS/054/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan																																	PHO			
							Actual																																				
	8	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	Naesalobu Unip. Lda.	MAP-P02019:19532	LM	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																																		Parado		
							Actual																																				
	9	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministry of Health, Tumor Leste	Queson SQ Unip. Lda.	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																		Pagamentu seidauk 100%		
							Actual																																				
	10	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Senizu Unip. Lda.	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																		PHO		
							Actual																																				
	11	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	Tinocya Unip. Lda.	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/1X/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																			PHO	
							Actual																																				
	12	Emergency Project For Tibar River	Sali-Magu Unip. Lda.	RT/067/MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				
							Actual																																				
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000)	Hatumeta Oan Unip. Lda.	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				
							Actual																																				
	14	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Fatunasi Chainage 0+000-2+300) Liquica Municipality	Hatumeta Oan Unip. Lda.	MPW-W-210142	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				
							Actual																																				
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality	Hatuleo Unip. Lda.	MPW-W-210144	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				
							Actual																																				
16	Routine Maintenance Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000-10+000	Craeleki Bercoli Unip. Lda.		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																					
						Actual																																					
17	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 3+000-6+500) Liquica Municipality	TM. Caileba Unip. Lda.		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																					
						Actual																																					
TOTAL PROJETO ON-GOING																																											

Note: Plano Período inspeção iha tereinu Relatório avaliação mensal iha Dili Inspeção Pagamento Anual iha tereinu Implementação Plano Período inspeção iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng. Juninho António Abrantes da Cruz)
Eng. ba Projeto Edifício Público Água e Saneamento ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validação de

Aprova Husi :

(Eng. Anabela Maria Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN, I.P
