




REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATORIU MENSAL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISIPIU LIQUIÇA
OUTUBRO 2021

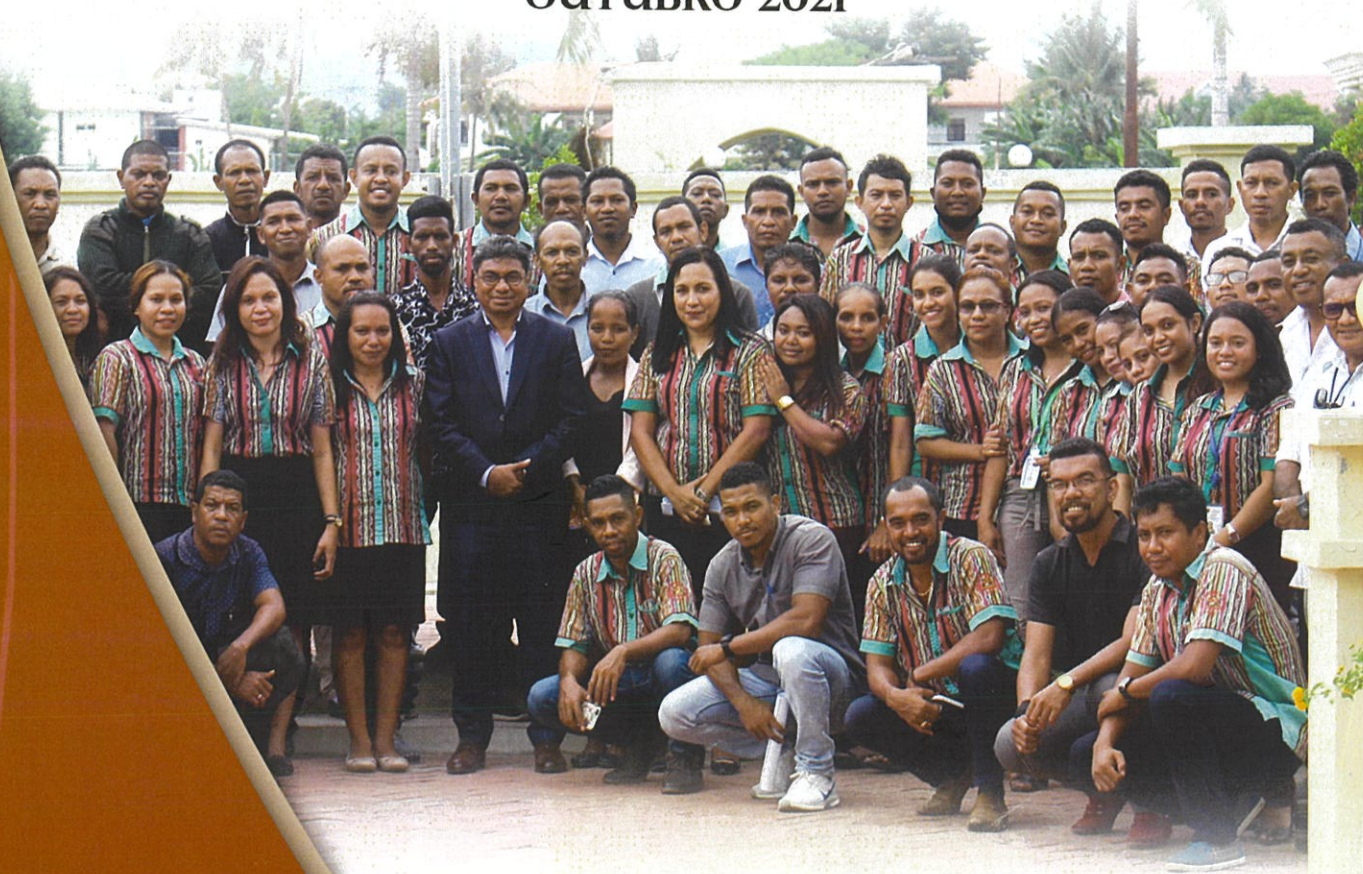


SUMÁRIO

RELATÓRIO IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO LIQUICA OUTUBRO 2021

Prepara Husi :


(Eng. Juninho Antonio A. Da Cruz)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Liquica ADN, I.P.


(Eng. Marcus Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Liquica ADN, I.P.


(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. ba Projeto M.E. Município Liquica
ADN, I.P.

Verifica Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P.


(Eng. Aniceto da Costa)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e
Irigação, ADN, I.P.


(Deolindo de Fatima Marques)
Chefe Secção Chefe Secção Projeto M. E &
ITC, ADN, I.P.

Sertifica Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P.

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P.

INDICE

SUMÁRIO.....	0
I. INTRODUSAUN.....	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Liquisa.....	3
1.3 Lista Projecto	7
II. PROGRESU FISIKU	17
2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan	17
III OBSTÁKLU IHA TERENU	17
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	17
VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU	18
4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu	18

INDICE TABELA

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquisa	5
Tabela 1. 2: Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquica	5
Tabela 1.3. 1 Projecto Municipio Ermera Por Fundus Financiamento	7
Tabela 1.3. 2 Projecto Municipio Liquica Por Sectores	10
Tabela 1.3. 3 Projecto Municipio Ermera Por Ministerios	14
Tabela 4. 1 : Dadus populasun Munisipiu Liquica	17

I. INTRODUSAUN.


1.1 Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu aseguza katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 PERFIL MUNICIPIO LIQUIÇA

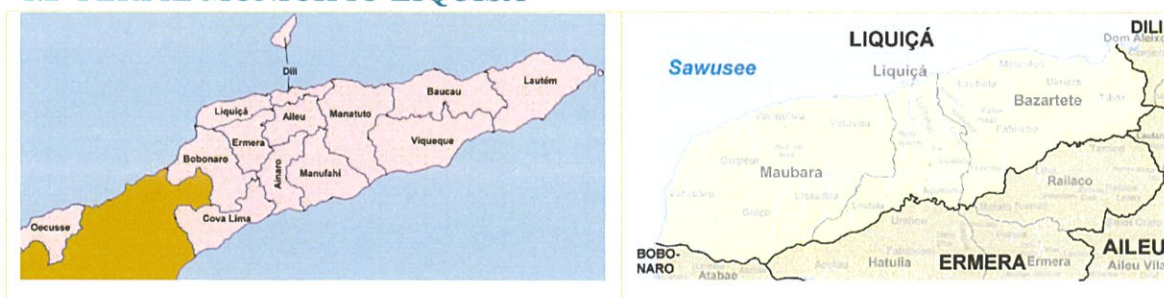

Mapa hatudu pozisaun Administrasaun Munisipal Liquiça iha luan area 543 km² ho populasau nain – 63.403 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Liquiça iha Postu Administrativu tolu (3), Sukus 23 no aldeias 134, mak hanesan hatudu iha Tabela 1

Tabela 1: Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.

Bazartete		Liquisa		Maubara	
sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Fahilelo	3	Açumano	4	Gugleur	11
Fatumasi	4	Darulete	4	Guiço	5
Lauhata	5	Dato	10	Lissadila	7
Leorema	10	Hatuquesi	8	Maubaralilssa	5
Maumeta	4	Leotala	5	Vatuboro	5
Metagou	3	Loidahar	4	Vatuvou	10
Motaulun	3	Luculai	4	Vaviquinia	7
Tibar	4	-	-	-	-
Ulmera	9	-	-	-	-
Total	45	-	39	-	50

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 58

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquisa

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Liquisa								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	5					5	
2	Administrasaun no Financas	0					0	
3	Motorista	1					1	
4	Seguransa	0					0	
Total		6					6	

Tabela 1. 2: Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquica

ASET ADN,IP MUNICIPIO LIQUICA								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	1						
2	Kareta	1						
3	Desktop HP / Monitor	1						
4	Laptop HP	1						
5	Printer Cannon	1						
6	UPS	1						
7	Armario File	2						
8	Armario Tau hena	3						
9	Meja escritorio	1						
10	Meja han	1						
11	Meja TV (kiik)	1						
12	Kadeira escritorio	6						
13	Kadeira han	4						

14	Sofa	1 Set						
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3	3 Set						
16	Jeleira	1						
17	Water Dispenser	1						
18	TV + Parabola	1 Set						
19	AC	4						
20	Kipas Angin	4						
21	Kompor	1						
22	Kompor Gas	1						
23	Rack sepatu	3						
24	Rack Piring	1						
25	Lampu	11						
26	Water Pump Sanyo	1						

1.3 LISTA PROJECTO

Projetu hotu ne'ebe akumulá iha lista neé bazeia ba dados projetu nebe sei lae hela no mos projetu nebe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak ne'e fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu Por Fundus Financiamento, Tabela 1.3.2 Projetu Por Sector no tabela 1.3.3 Projetu Por Ministerio, no lista detalhu kada projetu bele hare iha #Aneksu A.

Tabela 1.3. 1 Projecto Municipio Ermera Por Fundus Financiamento



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Por Fundus FI

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM (Fundus Covid, CD,BS) + PDIM			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EXECUSAUN	PRESENTASEN EJEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	15	\$ 2,676,130.29	\$1,505,684.83	56.26%
2	LIQUICA VILA	11	\$ 3,717,048.19	\$2,161,252.92	58.14%
3	MAUBARA	9	\$10,621,160.44	\$7,038,264.00	66.27%
	GRAND TOTAL	35	\$17,014,338.92	\$10,705,201.75	62.92%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EXECUSAUN	PRESENTASEN EJEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	\$557,358.72	\$470,168.33	84.36%
2	LIQUICA VILA	4	\$2,716,690.73	\$1,516,050.42	55.81%
3	MAUBARA	5	\$10,171,195.89	\$6,821,105.89	67.06%
	GRAND TOTAL	11	\$13,445,245.34	\$8,807,324.64	65.51%

Dados Detalho kada Projetu #anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EXECUSAUN	PRESENTASEN EJEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	\$309,925.98	\$112,547.98	36.31%
2	LIQUICA VILA				
3	MAUBARA				
	GRAND TOTAL	2	\$309,925.98	\$112,547.98	36.31%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EXECUSAUN	PRESENTASEN EJEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	4	\$743,939.87	\$199,732.12	26.85%
2	LIQUICA VILA	3	\$438,455.64	\$391,542.34	89.30%
3	MAUBARA	1	\$50,702.59	\$43,761.73	86.31%
	GRAND TOTAL	8	\$1,233,098.10	\$635,036.19	51.50%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EXECUSAUN	PRESENTASEN EJEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	5	\$748,001.55	\$598,351.62	79.99%
2	LIQUICA VILA	2	\$201,151.20	\$99,079.60	49.26%
3	MAUBARA	1	\$170,965.65	\$72,706.50	42.53%
	GRAND TOTAL	8	\$1,120,118.40	\$770,137.72	68.76%

Dados Detalho kada Projeto #anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EXECUSAUN	PRESENTASEN EJEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	\$316,904.17	\$124,884.78	39.41%
2	LIQUICA VILA	2	\$360,750.62	\$154,580.56	42.85%
3	MAUBARA	2	\$228,296.31	\$100,689.88	44.10%
	GRAND TOTAL	6	\$905,951.10	\$380,155.22	41.96%

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

Tabela 1.3. 2 Projecto Municipio Liquica Por Sectores



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR PROJETO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EJEKUSAUN (\$)	PRESENTASEN EJEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	2	\$ 91,877.21	\$ 67,036.01	72.96%
2	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 293,629.77	\$ 167,315.56	56.98%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 183,817.12	\$ 154,580.56	84.09%
4	EDUKASAUN	3	\$ 402,058.13	\$ 243,737.88	60.62%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 276,484.00	\$ 230,841.25	83.49%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 593,093.80	\$ 400,036.22	67.45%
7	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 801,011.06	\$ 666,931.83	83.26%
8	ESTRADA	1	\$ 50,702.59	\$ 43,761.73	86.31%
9	ESTRADA- IMPRESTIMO	1	\$ 7,693,101.00	\$ 4,992,774.97	64.90%
10	ESTRADAS	2	\$ 1,974,605.18	\$ 1,570,783.11	79.55%
11	FLOOD CONTROL	3	\$883,109.16	\$330,423.52	37.42%
12	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	9	\$ 1,733,015.54	\$ 941,812.64	54.35%
13	PORTOS	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%
14	SAUDE	2	\$ 309,925.98	\$ 112,547.98	36.31%
15	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 58,107.88	\$ 20,842.57	35.87%
16	TURISMO	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%
	GRAND TOTAL	35	\$17,014,288.42	\$10,686,713.76	62.81%

Dados Detalho kada Projektu #anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR PROJETO	MAUBARA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EXECUSAUN	PRESENTASEN EJEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$170,965.65	\$72,706.50	42.53%
3	EDIFICIOS PUBLICOS				
4	EDUKASAUN	1	\$171,850.61	\$100,689.88	58.59%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$301,760.22	\$217,606.07	72.11%
6	ESTRADA	1	\$50,702.59	\$43,761.73	86.31%
7	ESTRADA- IMPRESTIMO	1	\$7,693,101.00	\$4,992,774.97	64.90%
8	ESTRADAS	1	\$1,901,334.67	\$1,506,224.85	79.22%
9	FLOOD CONTROL				
10	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	1	\$56,445.70	\$-	0.00%
11	PORTOS				
12	SAUDE				
13	SEGURANCA NO DEFESA				
14	TURISMO	1	\$275,000.00	\$104,500.00	38.00%
	GRAND TOTAL	9	\$10,621,160.44	\$7,038,264.00	66.27%

Dados Detalho kada Projektu #anexu



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR PROJETO	LIQUICA VILA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EXECUSAUN	PRESENTASEN EJEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO				
3	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$183,817.12	\$154,580.56	84.09%
4	EDUKASAUN				
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$276,484.00	\$230,841.25	83.49%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$593,093.80	\$400,036.22	67.45%
7	ESTRADA				
8	ESTRADA- IMPRESTIMO				
9	ESTRADAS				
10	FLOOD CONTROL	1	\$311,975.10	\$277,752.35	89.03%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	6	\$956,928.17	\$440,766.62	46.06%
12	PORTOS	1	\$1,394,750.00	\$657,275.92	47.12%
13	SAUDE				
14	SEGURANCA NO DEFESA				
15	TURISMO				
	GRAND TOTAL	11	\$3,717,048.19	\$2,161,252.92	58.14%

Dados Detalho kada Projeto #anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR PROJETO	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EXECUSAUN	PRESENTASEN EJEKUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	2	\$ 91,877.21	\$67,036.01	72.96%
2	AGUA E SANEAMENTO	2	\$122,664.12	\$94,609.06	77.13%
3	EDIFICIOS PUBLICOS				
4	EDUKASAUN	2	\$230,207.52	\$143,048.00	62.14%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$499,250.84	\$449,325.76	90.00%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO				
7	ESTRADAS	1	\$73,270.51	\$64,558.26	88.11%
8	FLOOD CONTROL	2	\$571,184.56	\$52,671.17	9.22%
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$719,641.67	\$501,046.02	69.62%
10	PORTOS				
11	SAUDE	2	\$309,925.98	\$112,547.98	36.31%
12	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$58,107.88	\$20,842.57	35.87%
13	TURISMO				
	GRAND TOTAL	15	\$2,676,130.29	\$1,505,684.83	56.26%

Dados Detalho kada Projeto #anexu A

Tabela 1.3. 3 Projecto Municipio Ermera Por Ministerios



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	GRAND TOTAL LIQUICA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EJEKUSAUN	PERSENTAGEN EJEKUSAUN (%)
1	ESTATAL	4	\$571,385.66	\$154,580.56	27.05%
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$139,176.53	\$67,036.01	48.17%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	18	\$13,452,424.34	\$8,984,425.79	66.79%
4	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$58,107.88	\$20,842.57	35.87%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	3	\$402,058.13	\$243,737.88	60.62%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	2	\$411,459.90	\$360,255.04	87.56%
7	MINISTERIO SAUDE	2	\$309,925.98	\$112,547.98	36.31%
8	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$1,394,750.00	\$657,275.92	47.12%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$275,000.00	\$104,500.00	38.00%
GRAND TOTAL		35	\$17,014,288.42	\$10,705,201.75	62.92%

Dados Detalho kada Projektu #anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EJEKUSAUN	PERSENTAGEN EJEKUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 154,189.34	\$-	0.00%
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCA	2	\$ 91,877.21	\$67,036.01	72.96%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	6	\$1,732,337.56	\$1,079,707.58	62.33%
4	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 58,107.88	\$20,842.57	35.87%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 230,207.52	\$143,048.00	62.14%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 99,484.80	\$82,502.69	82.93%
7	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 309,925.98	\$112,547.98	36.31%
8	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN				
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
GRAND TOTAL		15	\$ 2,676,130.29	\$1,505,684.83	56.26%

Dados Detalho kada Projektu #anexu A



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	LIQUICA VILA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EJEKUSAUN	PERSENTAGEN EJEKUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$360,750.62	\$154,580.56	42.85%
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	1	\$47,299.32	\$-	0.00%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	6	\$1,602,273.15	\$1,071,644.09	66.88%
4	MINISTERIO DO INTERIOR				
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU				
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$311,975.10	\$277,752.35	89.03%
7	MINISTERIO SAUDE				
8	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$1,394,750.00	\$657,275.92	47.12%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
	GRAND TOTAL	11	\$3,717,048.19	\$2,161,252.92	58.14%

NO	DONO DO PROJETO	MAUBARA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	TOTAL EJEKUSAUN	PERSENTAGEN EJEKUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$56,445.70	\$-	0.00%
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS				
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	6	\$10,117,864.13	\$6,833,074.12	67.53%
4	MINISTERIO DO INTERIOR				
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$171,850.61	\$100,689.88	58.59%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU				
7	MINISTERIO SAUDE				
8	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN				
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$275,000.00	\$104,500.00	38.00%
	GRAND TOTAL	9	\$10,621,160.44	\$7,038,264.00	66.27%

Dados Detalho kada Projektu #anexu A

Tabela 4. 1 : Dadus populasaun Munisipiu Liquica

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2021				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Bazartete	31,517	8,971	8,847	7,044	6,655
Liquiça	24,968	6,840	7,192	5,633	5,303
Maubara	24,809	6,921	6,639	5,719	5,529

Fontes : Projeksaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccão Geral de Estatística, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi Progressu servisu nebe kompanha sira atinji iha fulan ne,e nia laran, husi lista nebe iha #Aneksu B hatudu progressu aktual fulan ida ne,e ho nia porsentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento nebe hetan husi progressu fulan ida ne,e, ikus liu persentagen aktual fulan ida ne,e hatudu progressu fisiku komulativa husi porsento anterior no fulan ida ne,e nian, lista kompletu ba detailho bele hare iha #Aneksu B, detailhu ba Backup Fotografia #Aneksu C1, detalho ba Backup BoQ #Aneksu C2 no Instrusaun servisu bele hare #Aneksu D

III OBSTÁKLU IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Durante iha Fulani da nia laran, problema nebe ami enjineiru municipio hasoru mak hanesan :

1. Kapasidade linha internet iha Municipio lao ladun diak ,no difikulta dados nebe prepara ona iha Dropbox maibe iha Nacional la acesso.
2. Projeitu lao tarde
3. Companhia balun servisu la tuir spesifikasaun
4. Companhia balun servisu la iha Site Engineer
5. Difikulidade ba Ekipa ADN M.Liquica hasoru susar ba Be'e mos

VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu

1. Husu Atu hadia linha internet iha Municipio no dala barak liu ami utiliza Telemovel hodi Acesso ba Internet.
2. Husu ba Kompanhia sira atu aslera servisu hodi nune servisu tuir tempo nebe mensiona iha kontrato
3. Rekomenda ba Kompanhia sira servisu tuir spesifikasaun nebe iha ona
4. Rekomenda ba Kompanhia sira tenke iha Site Engineer iha terenu

Rekomenda ba ADN.I.P. Nacional liu-liu ba Superior sira hodi hare ba Edificio ADN.I.P.

Note : Assinatura Husi Enjineiru Municipio Liquica

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Liquica					
No	Deskrisaun	Identidade			
		Naran Kompletu e Asinatura	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia
1	Enjineiru	 Juninho António A. Da Cruz	216	Enjineiru EPAS	

		 Marcus Ximenes de Araujo		Enjineiru ITI	
		 Camilio de Jesus	061	Enjineiru METIC	
2	Enjineira	 Ana Maria L. D.C. Guterres	039	Enjineira VEBD	
3	Motorista	 Rui Antonio Gaio		Motorista	



#ANEXO A

Lista Geral Projeto On-going Municipio Liquica

NU	NARAN PROJ.	DONO PROJETO	KAT. PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONT.	MONT. KONT. (\$)	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGAMENTO (%)	PAGA. (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	\$ 153,851.88	80.41%	64.40%	\$ 99,079.60	\$ 54,772.28	ON-GOING	Servisu iha Tereno remata tiha ona, sei hein kompanha Amenda kontratu nebe mate tiha ona
2	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	\$ 1,394,750.00	47.12	47.12%	\$ 657,275.92	\$ 737,474.08	ON-GOING	
3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	\$ 55,012.05	100%	89.92%	\$ 49,468.35	\$ 5,543.70	PHO	Projeto refere hela retensaun (10%) e Fisiku iha Tereno atinji deit 99.91%
4	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	\$ 71,468.49	100%	90.00%	\$ 64,321.64	\$ 7,146.85	PHO	Projeto ida neé Remata ona, no hela Retensaun 10% e pagamento atinji 100%
5	New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquica	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	FLOOD CONTROL	LIQUICA VILA	LIQUICA	HL Fica	013LM/RDTL/MPIE/A.D.N/D IL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt	\$ 311,975.10	98.92%	83.10%	\$ 259,264.36	\$ 52,710.74	PHO	Projeto refere hela retensaun (10%) e Fisiku iha Tereno atinji deit 98.92%
6	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Liquica	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/01	\$ 183,817.12	93.44%	84.09%	\$ 154,580.56	\$ 29,236.56	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
7	New Installation MV, LV Line and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	\$ 593,093.80	90.05%	67.45%	\$ 400,036.22	\$ 193,057.58	ON-GOING	
8	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Liquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	\$ 276,484.00	92.77%	83.49%	\$ 230,841.25	\$ 45,642.75	ON-GOING	
9	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	\$ 452,362.93	71.92%	50.38%	\$ 227,897.03	\$ 224,465.90	ON-GOING	
10	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Banir Lema Unip.Lda	RDTL 0000	\$ 47,299.32	56.52%	0.00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	
11	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 176,933.50	0.28%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
12	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Fu Unip.Lda	RDTL - 0000	\$ 13,000.00	0.00	0.00%	\$ -	\$ 13,000.00	New	
13	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	\$ 288,760.22	83.73%	75.36%	\$ 217,606.07	\$ 71,154.15	ON-GOING	
14	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	\$ 1,901,334.67	99.36%	79.22%	\$ 1,506,224.85	\$ 395,109.82	ON-GOING	
15	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	\$ 275,000.00	40.00	38.00%	\$ 104,500.00	\$ 170,500.00	ON-GOING	
16	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquica (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	\$ 171,850.61	81.73%	58.59%	\$ 100,689.88	\$ 71,160.73	ON-GOING	
17	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	MAUBARA	LIQUICA	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	\$ 170,965.65	54.99%	42.53%	\$ 72,706.50	\$ 98,259.15	ON-GOING	Provizoriamente paradu hela
18	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	MAUBARA	LIQUICA	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	\$ 7,693,101.00	64.90%	64.90%	\$ 4,992,774.97	\$ 2,700,326.03	ON-GOING	
19	R4D Rural Road Maintenance Belakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADA	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip.Lda	MPW-W-190098	\$ 50,702.59	95.90%	86.31%	\$ 43,761.73	\$ 6,940.86	ON-GOING	
20	Konstrusaun Moru Haleu no Postu Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Rafiq Unip. Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	\$ 56,445.70	11.60%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
21	New Installation MV, LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema - Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	BAZARTETE	LIQUICA	Mina petro leste Lda	RDTL-11004589	\$ 499,250.84	100.00	90.00%	\$ 449,325.76	\$ 49,925.08	ABANDONA	
22	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Banir Lema	MPW-W-190097	\$ 565,452.33	100.00%	88.61%	\$ 501,046.02	\$ 64,406.31	PHO	Progresio Fisiko 100% e hela pagamento retensaun 10%



#ANEXO A

Lista Geral Projeto On-going Municipio Liquica

NU	NARAN PROJ.	DONO PROJETO	KAT. PROJETO	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONT.	MONT. KONT. (\$)	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGAMENTO (%)	PAGA. (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECT	OBSERVAUN
23	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquica (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	\$ 162,714.83	95.56%	76.75%	\$ 124,884.78	\$ 37,830.05	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
24	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	\$ 73,270.51	100.00%	88.11%	\$ 64,558.26	\$ 8,712.25	PHO	Progresu fizikamente 100 % e sei falta pagamento ba retensaun
25	Konstrusaun Moralha Foun Matadouro Tibar	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Manoko Unip. Lda	RDITL-MAP-PO2019:19726	\$ 23,950.17	77.60%	69.84%	\$ 16,726.74	\$ 7,223.43	ON-GOING	Provezoriamente servisu paradu hela
26	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	\$ 67,492.69	29.90%	26.91%	\$ 18,163.22	\$ 49,329.47	ON-GOING	
27	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	\$ 23,179.32	79.24%	52.23%	\$ 12,106.37	\$ 11,072.90	ON-GOING	Provezoriamente servisu paradu hela
28	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	SEGURANCA NO DEFESA	BAZARTETE	LIQUICA	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	\$ 58,107.88	86.27%	35.87%	\$ 20,842.57	\$ 37,265.31	ON-GOING	
29	Konstrusaun Armacen Foun Matadouro (Bem Servisu)	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Naesalobu	MAP-P02019:19532	\$ 67,927.04	82.29	74.06%	\$ 50,309.27	\$ 17,617.77	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona
30	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	\$ 66,557.90	64.60	58.14%	\$ 38,698.37	\$ 27,859.53	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
31	New construction of isolation for covid 19 in liquica, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	\$ 243,368.08	74.95%	30.34%	\$ 73,849.61	\$ 169,518.47	ON-GOING	
32	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Alpele-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDITL/MPJE/AND/D A-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	\$ 99,484.80	92.14%	82.93%	\$ 82,502.69	\$ 16,982.11	ON-GOING	Falta retensaun
33	For River Normalization & Landslide Clearing Works Of Tibar - Gleno Emergency Project	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	FLOOD CONTROL	BAZARTETE	LIQUICA	Shabryca Const. Unip,Lda	MPW-W-SS-EP 210011	\$ 68,711.28	100.00%	76.66%	\$ 52,671.17	\$ 16,040.11	ON-GOING	Projeto refere fisikamente 100 %
34	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	FLOOD CONTROL	BAZARTETE	LIQUICA	Sali Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	\$ 502,422.78	1.28%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
35	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Bazartete no Moru haleu	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 154,189.34	5.81%	0.00%	\$ -	\$ -	New	
TOTAL									\$ 17,014,288.42			\$ 10,686,713.76	62.81%		

(Eng. Marcus Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infrastrutura Transporte e Irigasaun,
ADN,I.P

PREPARA HUSI,

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Eng. ba Edificio Publiku Agua e Saneamento, ADN,I.P

(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. Mechanical Electricidade ADN,I.P

SERTIFIKA HUSI,

(Eng. Emerenciana da Cocta M. Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade, ADN,I.P



#ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNICIPIO LIQUICA

					LOKALIZASAUN PROJETU					Out-2021		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN KOMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Kumulativ Progress (%)
1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Liquica Vila	Liquica	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	\$ 153,851.88			
2	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	Liquica Vila	Liquica	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	\$ 1,394,750.00			
3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Liquica Vila	Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	\$ 55,012.05			
4	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Liquica Vila	Liquica	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	\$ 71,468.49			
5	New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquica	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM - CD	FLOOD CONTROL	Liquica Vila	Liquica	HL Fica	013LM/RDTL/MPIE/A. D.N/DIL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt	\$ 311,975.10			
6	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Liquica	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Liquica Vila	Liquica	Metalika Unipessoal, Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/01	\$ 159,807.73			
7	New Installation MV, LV Line and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Liquica Vila	Liquica	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	\$ 593,093.80			
8	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Liquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Liquica Vila	Liquica	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	\$ 276,484.00			
9	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Liquica Vila	Liquica	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	\$ 452,362.93	68.03%	3.89%	71.92%
10	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM - BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Liquica Vila	Liquica	Banir Lema	RDTL 0000	\$ 47,299.32	4.40%	52.12%	56.52%
11	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Liquica Vila	Liquica	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 176,933.50	0.00%	0.28%	0.28%



#ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNICIPIO LIQUICA



					LOKALIZASAUN PROJETU					Out-2021		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN KOMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Komulativ Progress (%)
12	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubara	Liquica	Fu Unip,Lda	0000	\$ 13,000.00			
13	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubara	Liquica	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	\$ 288,760.22			
14	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Maubara	Liquica	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	\$ 1,901,334.67	88.02%	11.34%	99.36%
15	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	Maubara	Liquica	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	\$ 275,000.00			
16	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubara	Liquica	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	\$ 171,850.61	73.50%	8.23%	81.73%
17	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - BS	AGUA E SANEAMENTO	Maubara	Liquica	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	\$ 170,965.65			
18	Consultant Supervision Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota Ain Roads, and Baucau - Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADA- IMPRESTIMO	Maubara	Liquica	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	\$ 7,693,101.00	64.01%	64.90%	64.90%
19	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubarlisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADA	Maubara	Liquica	Luliana Unip,Lda	MPW-W-190098	\$ 50,702.59			
20	Konstrusaun Moru Haleu no Posto Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubara	Liquica	RafiQ Unipessoal, Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	\$ 56,445.70	0%	11.60%	11.60%
21	New Installation MV, LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema - Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Bazartete	Liquica	Mina petro leste Lda	RDTL-11004589	\$ 499,250.84			



#ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNICIPIO LIQUICA



					LOKALIZASAUN PROJETU					Out-2021		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN KOMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Kumulativ Progress (%)
22	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Bazartete	Liquica	Banir Lema	MPW-W-190097	\$ 565,452.33			
23	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquica (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Bazartete	Liquica	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	\$ 162,714.83	85.82%	9.74%	95.56%
24	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libalao - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - CD	ESTRADAS	Bazartete	Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	\$ 73,270.51			
25	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM - BS	AGRICULTURA	Bazartete	Liquica	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	\$ 23,950.17			
26	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM - BS	EDUKASAUN	Bazartete	Liquica	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	\$ 67,492.69			
27	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - BS	AGUA E SANEAMENTO	Bazartete	Liquica	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	\$ 23,179.32			
28	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	SEGURANCA NO DEFESA	Bazartete	Liquica	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	\$ 58,107.88			
29	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM - BS	AGRICULTURA	Bazartete	Liquica	Naesalobu	MAP-P02019:19532	\$ 67,927.04			
30	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM - Fundu Covid	SAUDE	Bazartete	Liquica	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	\$ 66,557.90			
31	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM - Fundu Covid	SAUDE	Bazartete	Liquica	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	\$ 243,368.08	62.89%	12.06%	74.95%



#ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNICIPIO LIQUICA

					LOKALIZASAUN PROJETU					Out-2021		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN KOMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Kumulativ Progress (%)
32	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasau Iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM - CD	AGUA E SANEAMENTO	Bazartete	Liquica	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AN D/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	\$ 99,484.80			
33	For River Normalization & Landslide Clearing Works Of Tibar - Gleno Emergency Project	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - CD	FLOOD CONTROL	Bazartete	Liquica	Shabryca Const. Unip,Lda	MPW-W-SS-EP 210011	\$ 68,711.28			
34	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - CD	FLOOD CONTROL	Bazartete	Liquica	Sali Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	\$ 502,422.78	0%	1.28%	1.28%
35	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Bazartete	Liquica	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	\$ 154,189.34	0.00%	5.81%	5.81%

INSPEKSAUN-HUSI,

(Eng. Marcus de Araujo Ximenes)
Engineru ba Projetu Infrastrutura Transporte e Irigasaun ADN,I.P

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Engineru ba Edificio Publiku Agua e Saneamento ADN,I.P

(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. M & E, ADN,I.P

VERIFIKA HUSI,

(Eng. Aniceto da Costa)
Engineru Senoir ba Projetu Infrastrutura Transporte e Irigasaun ADN,I.P

(Arq. Francisco Xavier D D. Jeronimo)
Engineru Senior ba Projetu Edificio Publiku no Be'e Saneamento ADN,I.P

(Deolindo D. F. Marques)
Chefe Seksaun Projetu M. E & ITC, ADN,I.P

SERTIFIKA HUSI,

(Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao de Qualidade, ADN,I.P
