



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público




RELATÓRIU SEGUNDU TRIMESTRÁL IMPLEMENTASAUN PROJETUS INFRAESTRUTURAS

**ABRIL, MAIO, JUNHO
2022**



TERMU NO ABRAVIASAUN

RDTL	República Democrática de Timor-Leste
MPO	Ministério Do Plano E Ordenamento
ADN, I.P.	Agência Desenvolvimento Nasional, Instituto Publico
DE	Diretor Executivo
DA	Diretor Adjunto
GADE	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo
UGA	Unidade Gestão Administrativa
UAP	Unidade de Avaliação de Projetos
UCVQ	Unidade Controlo e Validação de Qualidade
UEDC	Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências
FI	Fundo das Infraestruturas
LM-CD	Liña Ministerial-Capital Desenvolvimento
LM-BS	Liña Ministerial-Bens de Serviços
LM-TP	Liña Ministerial-Transferensia Pública
PDIM	Programa Desenvolvimento Integrado Municipál




FOLHA VALIDADE

SUMÁRIO

RELATÓRIO SEGUNDO TRIMESTRAL IMPLEMENTAÇÃO PROJETUS INFRAESTRUTURAS 2022

Prepara Husi :



(Miguel Marques Monteiro de Jesus, S.T., M. Eng.)

Assesor Nasional – ADN, I.P.

Verifika Husi :



(Susana Sinala do Rego Amaral, S.T.)

Chefe Ekipa Validasaun Baze de Dadus – ADN, I.P.

Sertifika (I) Husi :



(Emerenciana da Costa Maia Freitas, S.T., M.T.)

Koordenadora UCVQ – ADN, I.P.

Sertifika (II) Husi :



(Melenia da Costa Baros, B. EC., S.T.)

Koordenadora UAP – ADN, I.P.

Approva Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, ST, M. Eng.)

Lista Kontributór

Diretor Ezekutivo Agência Desenvolvimento Nasional, I.P.

Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M. Eng.

Adjunto Diretor Agência Dsenvolvimento Nasional, I.P.

Januario Maia Guterres, S.T.

Konpilador

Miguel Marques Monteiro de Jesus

Prossesu Baze de Dadus no Validasaun

Susana Sinala do Rego Amaral

Johanes Hornai

Nencia F. O. Rego

Ana Maria L. Da Costa Gurerres

Olivia Soares

João Paulo Amaral

Tifania Ornai Guterres

Tekniku Inspesaun no Monitorizasaun

Emerenciana da Costa M. F.

Deolindo F. Marques

Merinho Cuco L. de Araujo

Rui Lopes

Manuel Bany da S. C. de Carvalho

Joaquim de C. Madeira

Jacob da Costa Camoes

Agustinho Aranda

Ambrosio Martins Nuno

Salvador Martins

Zulkarnaen Depari

Jose Aparicio S. Soares

Madelino Deonizo José Magno

Domingos Soares Martins

Prezenzio Legorio do Carmo Dias Ximenes

Bosco Dinis de Sousa

João Q. do Rego

Manuel Estrela Soares

Pedro de Lourdes Alves

Tito Edgar F. N. de Jesus

Antonio Mendonça Faria da Silva

Jaimito Manuel Quintão

Geovanio M. X. Carlos Aleixo

Inocencio dos Reis Costa Maia

Deamantino Henrique Lopes

Marcus Ximenes de Araújo

Juninho António Abrantes da Cruz

José R. Carlos Gusmão

Aleixo da C. Andrade

Augusta da Costa Ferreira

Fidelis Mardiano da Costa

Romulo J. M. Henrique

Celvio J. Alves

Bebiano C. de Jesus Lopes

Roberto Maria Martins

Adonis Julio Fernades

Camilio de Jesus

Silvino Ribeiro

Dezeña, Setting ho Publikasaun

David da Silva

PREÁMBULU



Uluk nanain molok hatu'o objetivu husi publikasaun *relatóriu 2º trimestrá*, ha'u-nia saudasaun no hakru'uk ba ita-boot sira hotu.

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, I.P.) nu'udar instituisaun governu nian ida ne'ebé tutela iha Ministeriu Planu no Ordenamentu (MPO) bazeia ba Decreto-Lei N.º 60 /2020 de 25 de Novembro, ho nia funsaun prinsipál mak atu halo verifikasaun no Sertifikasaun ba servisu infraestutura Estadu nian liuliu obra konstrusaun sivil. Nu'udar Instituisaun Importante Governu nian, ADN iha responsabilidade bo'ot atu garante katak Verifikasaun no Sertifikasaun ba implementasaun projetu sira ne'ebé governu hari'i iha duni kualidade no fó benefísiu ba povu nia moris di'ak, hodi asegura nafatin dezenvolvimentu Timor-Leste ne'ebé inkluzivu no sustentável.

Nu'udar Diretór Ezekutivu asumi responsabilidade boot hodi fó orientasaun servisu ba kargu xefia sira hotu-hotu atu garante nafatin funsionamentu instituisaun nian inklui elabora planu atividade anuál, plurianuál no mós relatóriu atividade bazeia ba rezultadu serbisu loroloron iha terenu tuir dekretu lei ne'ebé atribui ba.

Deseja katak ho relatóriu ida ne'e bele representa hanesan evidénsia réal hodi sukat rezultadu atinjimentu, dezafiu no mós karik presiza rekomendasaun atu mellora serbisu hotu-hotu tuir responsabilidade ne'ebé ida-idak asumi ba.

Ha'u agradece ba ekipa elaborasaun nia iniciativa ho vontade tomak inklui fontes informasaun sira ne'ebé kontribui husi tékniku sira, maski relatóriu ida ne'e la dauk perfeito maibé ba oin ho defeitu ne'ebé hasoru sai hanesan lisaun ida ne'ebé fó biban atu prodús di'ak liu tan relatóriu tuir mai.


Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M. Eng.
Diretor Exekutivo – ADN, I.P.

Tabela Konteúdo

I.	INTRODUSAUN	1
1.1	Enkuadramentu Legal	1
1.2	Estrutura da Agência Desenvolvimento Naional, I.P.	2
1.3.	Competensias Orgaun ADN, I.P.	3
1.4.	Flow-Prosesu Fluxograma Pedido Verifikasaun Dokumentus iha ADN, I.P.	6
1.5.	Flow-Prosesu Fluxograma Pedido Sertifikasaun Pagamentu Iha ADN, I.P.	6
II.	SUMARIO	8
2.1.	Bens e Móveis ou Patrimonio ADN, I.P.	8
2.2.	Bens e Móveis ou Patrimonio – Ekipamentus no Mesuramentu ADN, I.P.	8
2.3.	Força de Trabalho Funsionario ADN, I.P. Funções no Unidades	9
2.4.	Projetos 13 Municipio por Fontes Financiamento	15
2.5.	Projetos 13 Municipio por Setores	21
2.6.	Projetos 13 Municipio por Ministerio	21
2.9.	Prefil Pagamentu Komulativu Segundo Trimestral	25
III.	OBSTÁCLO	27
3.1	Obstaklu hosi Parte Companhia	27
3.2	Obstaku hosi Parte ADN, I.P.	27
IV.	REKOMENDASAUN	29
4.1.	Rekomendasaun ba Parte Companhia, ADN, I.P. no Ministeria Relevantes	29
ANEKSU		
A.	Detalha Progresu fisiku Infrastruturas Segundo Trimestral 2022	
B.	Lista Ekipamentus no Mesuramentu Laboratorio ADN, I.P.	
C.	Lista Ekipamentus no Mesuramentu Mecânica e Elétrica	
D.	Checklist Completidade & Validasaun Dokumentus Teknika	
E.	Perfil Fungsionarios ADN, I.P.	

I. INTRODUSAUN

1.1. Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN, I.P. hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revolgasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P. hanesan Insituto Público (IP), ho Misaun ADN, I.P. nian maka atu aseguira katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (Infraestruturas) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekertu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P. hanesan Insituto Público (IP), ADN, I.P. nia knar principal iha 3 mak hanesan :

1. Halo avaliasaun previa ba projeitu Kapital Desenvolvimento nian.
2. Halo inspesaun no sertifikasaun ba projetu Kapital Desenvolvimento
3. Elabora standarizasaun tekniku ne'ebe relasiona ho Desenvolvimento Innfraestruturas
4. Kontinua jere no finansia projeto PDIM no LM em curso hosi tinan anterior.

Tuir Decreto Exekusaun Orsamentu 2021, ADN, I.P. mos iha papel atu halo avaliasaun previa, inspesaun no sertifikasaun ba projetos ne'ebe finansia liu husi orsamentu bens de servicos no transferensia publica ne'ebe nia kusto boot liu \$ 50,000 (Exepto projeto husi BTL, EP no EDTL, EP)


Vizaun

ADN, I.P. garantia qualidade prestasaun serbisu husi ninian funcionarios no adapta nia estrutura interna hodi responde (hatán) ho forma ne'ebé efikáz liu, hasoru dezafius (sasidik oioin).

Misaun

Funcionarios no membros associados hotu ne'ebe iha ona akordo serbisu ho ADN, I.P. hatene nia responsabilidade sei obdese ba politikas no prosedimento ne'ebe regula ona durante ezerse nia funsaun iha ADN, I.P.

1.2. Estrutura da Agência Desenvolvimento Nacional, I. P.

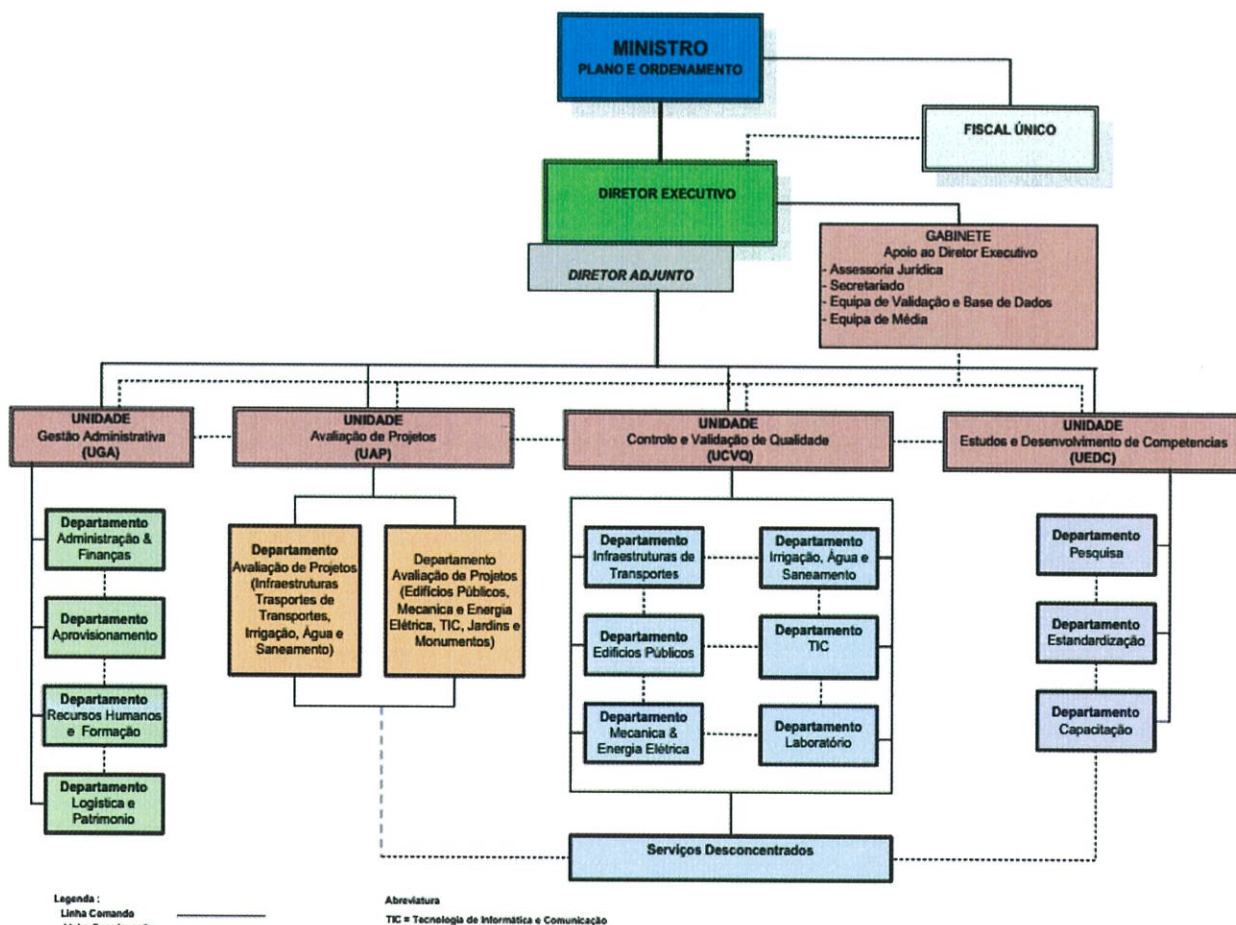

Bazeia ba decreto lei No. 60/2020, 25 Novembro Estatuta Agência ba Desenvolvimento Nacional, I.P. Capítulo II seksaun I artigo 7 ho 8; Estrutura Organica ADN, I.P. composto husi :

- Ministro Plano e Ordenamento (MPO)
- Fiscal Unico (FU)
- Diretor Executivo (DE)
- Adjunto Diretor Executivo (ADE)
- Gabinete de Apoio ao Diretor Executivo (GADE)
- Unidade de Gestão Administrativa (UGA)
- Unidade de Avaliação de Projetos (UAP)
- Unidade de Controlo e Validação de Qualidade (UCVQ)
- Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências (UEDC)

1.3. Competencias Orgaun ADN, I.P.

1. Kompete ba Diretór Ezekutivu :

- a) Representa ADN, I.P. ho entidade sira hotu públiku no privadu, nasionál no estranjeiru;
- b) Dirije, kordena no orienta servisu sira hotu no atividade sira hotu, fó ordem no instrusaun sira conforme nesesidade servisu hodi asegura servisu nia funsionamentu di'ak;
- c) Kordena elaborasaun no propoin ba tutela planu atividade sira anuál no plurianuál;
- d) Kordena elaborasaun no submete relatóriu atividade sira ba apresiasaun husi tutela;
- e) Kordena elaborasaun husi regulamentu internu, estrutura no organizaun ADN, I.P. nian no quadro pesoál hodi propoin aprovasaun husi tutela;
- f) Aprova ordem ba kompras, responsabiliza ba kompromisu sira hotu, despeza no pagamentus tuir lei nomós ho respeito ba limite orsamentu nian katak aprova ona ba ADN, I.P.;
- g) Akompaña ezekeusaun no gestaun husi orsamentu no haloos dezviu ruma relasiona ho previsoens;
- h) Asegura katak kobransa reseita nomós realizaun despeza sira hotu regulár;
- i) Autoriza atu hahú prosedimentu aprovizionamentu sira no adjudikasaun husi kontratu públiku sira, tuir valór no bazeia ba lei;
- j) Asina kontratu servisu ho traballadór sira hotu ne'ebé katak laiha vínkulu ho funsaun públika;
- k) Dirije, avalia no hala'o podér disiplinár relasiona ho traballadór sira iha ADN, I.P. no koordena ho Komisaun Funsan Públika;
- l) Aprova no asina pareser tekniku ne'ebé relasiona ho atribuisoens ADN, I.P. nian;
- m) Aprova validaun husi projetu no obras hodi halo pagamentu, haktuir atribuisoens ADN, I.P. nian;
- n) Hetan koñesimentu no foti medidas hodi rezolve keixas relasiona ho servisu ADN, I.P. nian;
- o) Deside kona-ba reklamasan sira husi ADN, I.P. nia servisu relasiona ho ADN, I.P. nia kompeténsias;
- p) Promove kordenasaun ho orgaun sira seluk iha Governu nomós ho parseiru dezvoltamentu nasionál no estranjeiru sira hodi asegura kumprimentu ba objetivus dezvoltamentu nasionál nian.
- q) Representa ADN, I.P. liuhusi asinatura husi kontratu no akordu sira hotu nomós pratika atu sira seluk katak nesesáriu hodi ADN, I.P. hala'o ninia kna'ar;
- r) Hala'o funsaun sira seluk tuir Ministru nia instrusoens.

2. Unidade de Gestão Administrativa

1. Unidade de Gestão Administrativa, ho abreviatura UGA, mak servisu ADN, I.P. nian ne'ebé responsavel ba servisu administrativu, finanseiru, rekursus humanus nomós aprovizionamentu no lojístika.
2. Kompete ba UGA hodi :
 - a) Fó apoiu tékniku no administrativu ba servisu sira hotu iha ADN, I.P.;
 - b) Jere rekursus finanseirus, humanus no materiais husi ADN, I.P.;
 - c) Promove formasaun no kapasitasaun husi quadro pesoál administrativu ADN, I.P. nian;

- d) Verifika legalidade husi despesa, promove ninia pagamentu nomós asegura ninia rejistu;
 - e) Tau matan ba kumprimentu husi leis, regulamentus no norma sira seluk ne'ebé mak relasiona ho administrasaun no finansas;
 - f) Avalia nesesidade finanseiru sira iha ADN, I.P. no apresenta orsamentu bazeia ba nesesidades;
 - g) Fó apoiu relasiona ho ekipamentu, manutensaun no inovasaun iha área teknolojia informátiku;
 - h) Emite relatóriu finanseiru kona-ba reseita no despesa ADN, I.P. nian;
 - i) Hala'o kna'ar seluk bazeia ba Diretor Ezekutivu nia instrusoens.
3. Desizaun sira ne'ebé mak koordinadór UGA nian halo sujeitu ba rekursu ierárkiku nesesáriu hato'o ba Diretor Ezekutivu.

3. Unidade de Avaliação de Projetos

- 1. Unidade de Avaliação de Projetos, ho abreviatura UAP, mak servisu ADN, I.P. nian ne'ebé responsavel ba avaliaun husi projetu públiku sira relasiona ho arkitetura no enjeñaria husi pontu de vista tékniku no finanseiru.
- 2. Kompete ba UAP hodi:
 - a) Emite pareser vinkulativu kona-ba projetu molok submete ba prosesu aprovizionamentu relasiona ho atividade ne'ebé hatuur iha alíneas a) no b), número 2 husi artigu 4;
 - b) Pronuncia kona-ba projetu sira ne'ebé relasiona ho arkitetura no enjeñaria katak la hatuur iha alinea anteriór hafoin pedidu husi entidade competente;
 - c) Hala'o avaliaun detalladu kona-ba qualidade projetu nian, nomós atu verifika aspektu tékniku hotu-hotu, nu'udar ezemplu aspektu jeolójiku no idrolójiku sira, haktuir norma no regulamentu sira ne'ebé mak bele aplika;
 - d) Hala'o avaliaun detalladu hodi asegura viabilidade projetu nian, ho estimativa husi kustu no kuantidade sira nomós verifika aspetu finanseiru hotu-hotu;
 - e) Avalia no aprova, husi ponto de vista tékniku no finanseiru, razoabilidade husi estudu sira relasiona ho viabilidade husi projetu no obra sira hatu'ur iha número 2, artigu 4.
- 3. Desizaun sira ne'ebé mak koordinadór UAP nian halo sujeitu ba rekursu ierárkiku nesesáriu hato'o ba Diretor Ezekutivu.

4. Unidade de Controlo e Validação de Qualidade

- 1. Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ho abreviatura UCVQ, mak servisu ADN, I.P. nian ne'ebé responsavel ba servisu sira ne'ebé katak halo kontrolu husi evolusaun no implementasaun obras konstrusaun sivil nian no validasaun respetivu.
- 2. Kompete ba UCVQ hodi:
 - a) Kontrola no inspesiona beibeik kona-ba evolusaun no progresu obras konstrusaun nian;
 - b) Verifika ezekusaun obras nian, nu'udar ezemplu qualidade husi matérial no ekipamentu sira ne'ebé mak utiliza, haktuir kontratu nomós haktuir norma no regulamentu sira ne'ebé mak bele aplika;
 - c) Hala'o inspesaun husi obras kuando nesesáriu, hodi bele determina progresu físiku respetivu no, konsekuentemente, hodi bele valida valór servisu nian mak ezekuta ona;
 - d) Kontrola no avalia proposta alterasaun no ajustamentu sira mak nesesáriu durante faze konstrusaun nia laran;


- e) Emite autorizasaun ba pagamentu sira bazeia ba progresu ezekusaun projetu nian nomós bazeia ba kualidade ne'ebé mak ezijidu;
- f) Sertifika kualidade konstrusaun, Infraestrutura ka obras tipu seluk;
- 3. Desizaun sira ne'ebé mak koordinadór UCVQ nian halo sujeitu ba rekursu ierárkiku nesesáriu ható'o ba Diretor Ezekutivu.

5. Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências

- 1. Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências, ho abreviatura UEDC, mak servisu ADN, I.P. nian ne'ebé responsavel ba estudus no investigasaun iha área projetus no iha área obras konstrusaun no projetu sira seluk ho interese estratéjiku, nomós responsavel ba dezvoltamentu husi kapasidades iha áreas arkitetura, projetu no enjeñaria.
- 2. Kompetente ba UEDC :
 - a) Realiza no promove estudus investigasaun no dezvoltamentu teknolójiku relasiona ho obras konstrusaun sivil no indústria materiais nian, sasán no produktu sira seluk ba konstrusaun no área sira seluk relasiona ho konstrusaun;
 - b) Realiza estudus kona-ba normalizasaun no regulamentasaun tékniku no elabora dokumentu sira refere, ho kolaborasaun husi entidade sira seluk competente;
 - c) Omologa kualidade materiais nian, sasán no produktu sira seluk ba konstrusaun nomós elementu, prosesu no empreendimentu sira ba konstrusaun;
 - d) Hala'o ensaius, emite pareser sira no responde ba konsultas, nomós realiza ezame no perísia sira kona-ba UEDC nia atividade;
 - e) Elabora ka propoin adosaun padraun no norma espesial sira ba sertifikasaun kualidade, ho kolaborasaun husi entidade competente sira seluk;
 - f) Promove dezvoltamentu ba formasaun no kapasitasaun husi traballadór sira Estadu nian iha áreas arkitetura, enjeñaria no fiskalizasaun obras, nomós fó valor ba kualifikasaun profisional respetivu, ho koordinasaun husi entidade sira ne'ebé mak relevante.
- 3. Desizaun sira ne'ebé mak koordinadór UEDC nian halo sujeitu ba rekursu ierárkiku nesesáriu ható'o ba Diretor Ezekutivu.

1.4. Flow- Prosesu Fluxograma Pedido Verifikasaun Dokumentus iha ADN, I.P.

Funksaun prinsipal fluxograma ba Pedido verifikasaun dokumentus hodi fornese informasaun jeral relasiona ho prosesu verifikasaun faseadamente husi prosesu ida ba prosesu sira seluk, ho nune hafasil servisu atendentu ninian nomos simplifika prosedimentus atu bele fasilita entendentu relasiona ho verifikasaun dokumentus infraestruras fiziku.

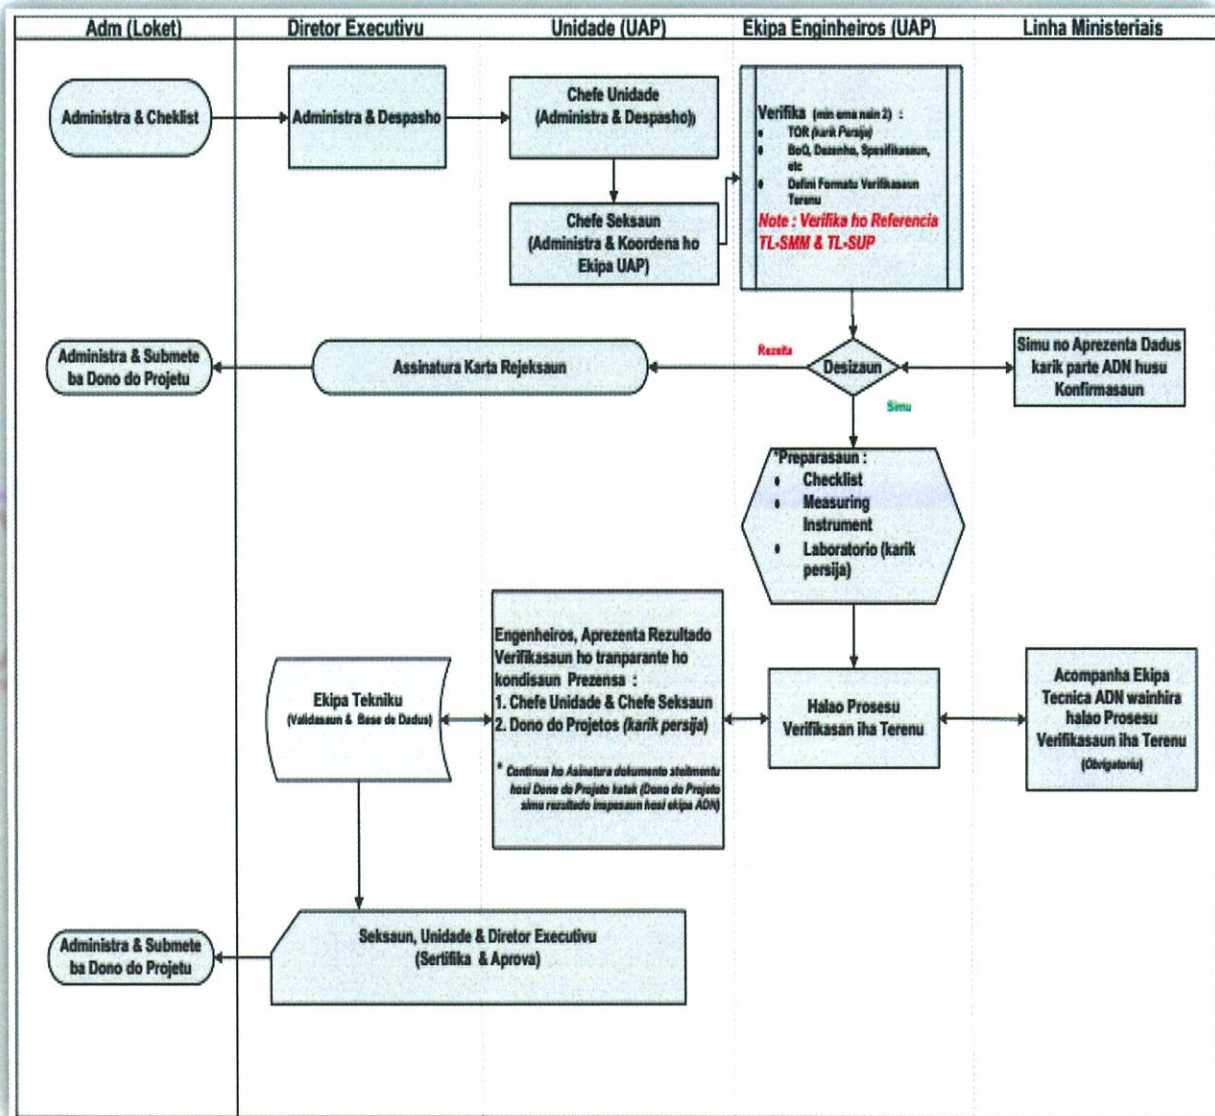


Fluxograma 1.4. Pedido Verifikasaun Dokumentus iha ADN, I.P.

1.5. Flow – Prosesu Fluxograma Pedido Sertifikasaun Pagamento iha ADN, I.P.

Funksaun prinsipal fluxograma ba pedido sertifikasaun pedido dokumentus pagamentu hodi fornese informasaun jeral relasiona ho prosesu sertifikasaun dokumentus faseadamente husi

prosesu ida ba prosesu sira seluk, ho nune hafasil servisu atendentu ninian nomos simplifika prosedimentus atu bele fasilita entendentu ba prosesu sertifikasaun pagamentus projetus infraestruturas molok hala'o pagamentu.

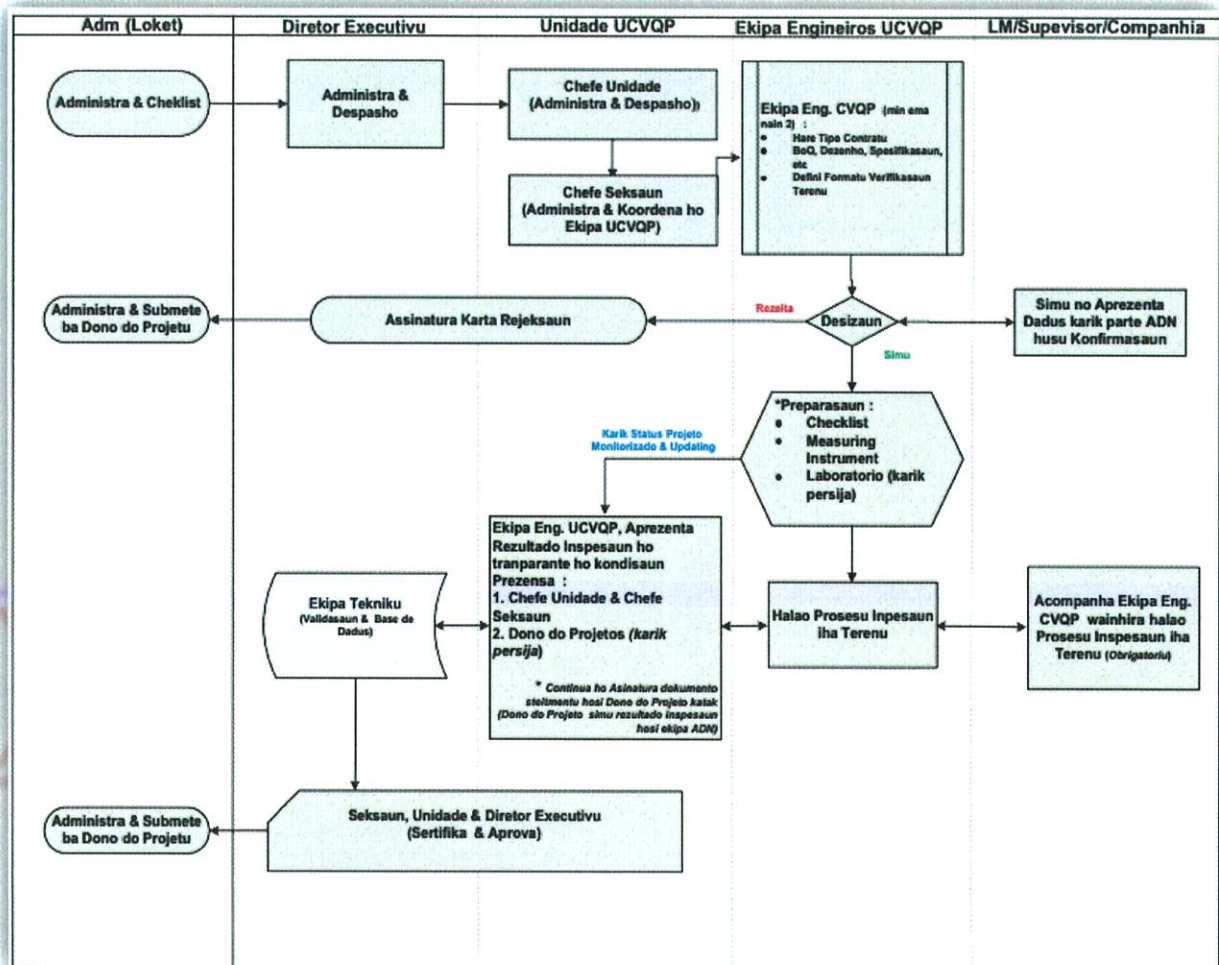

Fluxograma 1.5. Pedido Sertifikasaun Dokumentus Pagamento iha ADN, I.P.

II. SUMÁRIO

2.1. Bens e Móveis ou Patrimônio ADN, I.P.

Bens e Móveis ou Patrimônio ADN, I.P. ba tipo A-C kofre ba eskritorio prinsipal ADN, I.P. iha Dili nomos ba 12 municipios iha teritorio tomak ne'ebe defini ba tipo A ba bens e móveis (Veículo, makina, ekipamentus eletrônica no elétrica), tipo B ba bens e móveis hanesan (Mobiliário Armário, meja e Kadeiras) no tipo C ba bens e móveis (Escritório, Armagem no Residência)

Nu	Tipo A	Kuantidade	Tipo B	Qty	Tipo C	Kuantidade
1	Veículo (<i>Toyota & Mitsubishi</i>)	21	Meja Executivo	15	Ecritorio	3
2	Motocikleta	42	Meja Partisan	100	Residencia	12
3	Desktop Computer	72	Meja Secretariado	43	Armagem	4
4	Laptop	35	Sofa	1	Laboratorio	1
5	Projector Screen	3	Kadeira Executivu	112		
6	Server Compouting	1	Kadeira Secretariado	126		
7	Television (TV)	1	Armario Aluminium	68		
8	Makina fotokopia	10	Armario Baja	16		
9	UPS	31	Armario Ai	12		
10	AC	56	Gaveta	115		
11	Lampu	321				
12	Handcam	4				
13	Printer	22				
Total		619		608		20

Tabela 2.1. Bens e Móveis ou Patrimônio ADN, I.P.

2.2. Bens e Móveis ou Patrimônio – Ekipamentus Labótorio no Mesuramentu ADN, I.P.

Bens e Móveis ou Patrimônio – Ekipamentus Labótorio no Mesuramentu ADN, I.P. relaciona ho ekipamentus teste no mesuramentu ba inspesaun projetus ninian ne'ebe fahe ba kategoria 3 mak hanesan : ekipamentus teste ne'ebe lokaliza iha laboratório nacional ADN, I.P. e maioria ba testing material konstrusaun sivil, material testing ne'ebe lokaliza ou fahe ba Serviços desconcentrados (*Engenheiros ADN, I.P. Municipios*) nomos ekipamentus testing no mesuramentu ba mecânica e elétrica ne'ebe lokaliza iha Departamento no engenheiro mecânica e elétrica ninias eskritorio.

UCVQ		
Laboratório	Serviços Desconcentrados - (Eng.12 Municipius)	Mecânica no Elétrica
100	96	18
214		
TOTAL		

Tabela 2.2. Bens e Móveis ou Patrimônio – Ekipamentus Labótorio no Mesuramentu ADN, I.P.

2.3. Força de Trabalho Funcionário ADN, I.P. – Funções no Unidades

Forsa trabalho haktuir iha tabela 2.3.1 iha kraik Eskreve detalho relasionamente numeru ba Jenero, numeru funsoens e Numeru kada Unidades iha ADN, I.P. ninian forsa de trabalho.

NU	NARAN	POSISAUN	MANE	FETO	DE & DA	CORDENADOR	CHEFE DEP.SEC.	ENGENHEIROS ESPECIALIZADO	ADM/FINANSA/AROV/ LOGISTICA	ASSESSOR/A NACIONAL	ASSESSOR INTERNACIONAL
I Diretor Executivo - ADN, I.P.											
1	Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M. Eng	Diretor Executivo ADN, I.P.	M	1							
II Gabinete Apoio ao Diretor Executivo (GADE) - ADN, I.P.											
II.1. Diretor Adjunto - ADN, I.P.											
1	Januario Maia Guterres, S.T.	Diretor Adjunto	M	1							
2	DR. Manuel Moita da Silva Júnior	Assesor Jurídico	M								1
3	Brijita Joanila Fernandes	Secretaria Diretor Adjunto		F					1		
II.2. Secretariado Unidade Apoio ao Diretor Exekutivo - ADN, I.P.											
1	Joedia Marni Tavares	Secretaria e Asistente Administraun Diretor Executivo		F					1		
2	Carla Angela Idalina Viegas Monteiro	Secretaria e Asistente Administraun Diretor Executivo		F					1		
3	Marfa Zita Cristovão do Carmo Vieira, Lic. CSH.	Secretaria e Asistente Administraun Diretor Executivo		F					1		
4	Basílio Da Conceição Silva	Motoristas & Administraun Unidade ao Apoio Diretor Exekutivo	M						1		
5	Mateus da Silva	Motoristas & Administraun Unidade ao Apoio Diretor Exekutivo	M						1		
II.3. Equipa de Validação e Base de Dados -ADN, I.P.											
1	Susana Sinala do Rego Amaral, S.T.	Chefe Equipa - VBD		F			1				
2	Ana Maria Lourdes da Costa Guterres, B.ETT.	Eng. Equipa - VBD (Mecânica e Elétrica)		F				1			
3	Johanes Hornay, S.T.	Eng. Equipa - VBD (Edifício Publicas)	M					1			
4	João Paulo Amaral, S.T.	Eng. Equipa - VBD (Pontes, Estrada e Seias)	M					1			
5	Olivia Soares, B.EC.	En. Equipa - VBD (Pontes, Estrada e Seias)		F				1			
6	Nencia Filomena Oliveira do Rego, S.Kom.	Eng. Equipa - VBD (TIC)		F				1			
7	Tifânia Clotária Guterres Ormai, Lic. Eng.	Eng. Equipa - VBD (Kompiladora Datus Projetus e GIS-Geographic Information System)		F				1			
II.4 Equipa de Mídia - ADN, I.P.											
1	Samuel Soares	Assesor Nacional da Mídia	M							1	
2	David da Silva	Designer de Mídia	M						1		
3	Franzela Pinto	Assistente Mídia		F					1		

III Unidade Gestão Administrativa (UGA) - ADN, I.P.												
III.1. Departamento Administração & Finanças - ADN, I.P.												
1	Nelson Soares Pinto, L. Ec.	Koordenador- UGA	M			1						
2	Epi Orleães, Lic. Educ., M.M.	Public Finance Management and Gender & Social Inclusion Advisor		F							1	
3	Amélia da Costa, L. Ec.	Chefe Departamento - Adm & Finanças		F		1						
4	Angela Merisia Egong Correia, S.E.	Oficial Finanças		F						1		
5	Abelito da Costa, L.Agrn.	Oficial Finanças	M							1		
6	Sonyta Mariana Elisabeth Da Silva Henuk, S.I.P.	Oficial Administraun		F						1		
7	Elisabeth Felizarda Ximenes, S.T.	Oficial Administraun		F						1		
8	Nelson Teotonio Barros Fernandes Magno, Lic. CSH.	Oficial Administraun	M							1		
9	Edivijes Soares Lobo	Assistente Oficial Administraun		F						1		
10	Lourdes Pereira, S.T.	Assistente Oficial Administraun		F						1		
11	Carlos Mendonça Calapes	Assistente Oficial Administraun	M							1		
III.2. Departamento Aprovezimento - ADN, I.P.												
1	Jose Antonio Filomeno Gago Exposto, Lic. Eco.	Oficial Aprovezimento	M			1						
2	Sertorio Martins	Oficial Aprovezimento	M							1		
3	Lidia da Cruz Monteiro, B. Educ.	Assistente Oficial Aprovezimento		F						1		
III.3. Departamento Recursos Humanos e Formação - ADN, I.P.												
1	Tomas Magno do Carmo, S.E., M. Eco.	Acting & Assessor Nacional Recursos Humanos e Formação	M								1	
2	Isabel Gomes Lopes, Lic. Eco.	Assesora Politicas Publicas		F							1	
3	Gicella Jong Gonçalves, Lic. Eco.	Oficial Recursos Humanos		F						1		
III.4. Departamento Logística e Patrimonio - ADN, I.P.												
1	Jose Amaral, S.I.P.	Chefe Dept. Logística e Patrimonio	M			1						
2	Sandra Ribeiro Belo, Lic. Eco.	Assistente Adminstracao da Logística e Patrimonio		F						1		
3	Marcelino Soares do Carmo, S.T.	Assistente da Logística e Patrimonio	M							1		
4	Sergio Gomes	Assistente da Logística e Patrimonio	M							1		
5	Arcenio Magno Do Rego	Mecânico de Automóveis	M							1		
6	Jony Maia da Silva dos Santos	Motoristas Bobonaro	M							1		
7	João Pedro Cortereal	Motoristas Aileu	M							1		
8	Silveiro da Costa	Motoristas Manufahi	M							1		
9	Bernado Da Cruz Amaral Perreira	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	M							1		
10	Manuel Antonio Soriano	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	M							1		
11	Bendito Mendes Bento	Motoristas Viqueque	M							1		
12	Domingos Da Costa	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	M							1		
13	Agostinho Amaral	Motoristas Covalima	M							1		
14	Rui Antonio Gaio	Motoristas Liquisa	M							1		
15	Gilroy Marcal daa Cunha Braz	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	M							1		
16	Rafael Joaquim Mousaco Galucho	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	M							1		
17	Timoteo Da Silva Morais	Motoristas Manatuto	M							1		
18	Joel Barreto Abrantes	Motoristas Dili (Laboratório)	M							1		
19	Delio Abel Manuel Perreira	Motoristas Lautem	M							1		
20	Anacleto de Sousa Belo	Motoristas Baucau	M							1		
21	Salvador Ruas Amaral	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	M							1		
22	Siltonio Pinto de Araujo	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	M							1		
23	Rosario Saores de Deus	Motorista Ermera	M							1		
24	Lucas Alberto Soares Pereira	Motoristas Ainaro	M							1		

IV	Unidade de Avaliação de Projetos (UAP) - ADN, I.P.									
IV.1. Secretariado UAP - ADN, I.P.										
1	Melenia da Costa Barros, B. EC., S.T.	Koordenadora - UAP		F		1				
2	Miguel Marques Monteiro de Jesus, S.T., M. Eng.	Assessor Nacional Mecânica e Elétrica (UAP & UCVQ)	M						1	
3	Joanito Doutel Pereira, B. Eng.	Assessor Nacional Water & Irrigation (UAP no UCVQ)	M						1	
4	Rosaria Elizabeth Aniceto Cardoso Amaral, B.S, M.S.	Assesora Nacional Project Management (UAP no UCVQ)		F					1	
5	Maryanti Kota dos Santos, Lic. Eco.	Official Administração - UAP		F					1	
6	Fidelia Auxiliadora da Conceicao Freitas, Lic. Eco.	Assistente Administração - UAP		F					1	
IV.2. Departamento Avaliação de Projetos Infraestruturas Transportes, Irrigação, Água e Saneamento (ITIAS) - ADN, I.P.										
1	Rogério Marçal Pires, B. EC., Lic. Eng.	Eng. Senior - ITIAS	M			1				
2	Daniel Arcanjo Alves, S.T.	Eng. ITIAS	M						1	
3	Martinho da Costa Graciano, B. EC., Lic. Eng.	Eng. ITIAS	M						1	
4	Mario Gusmao Mendeita da Cruz Nunes Silva, S.T.	Eng. ITIAS	M						1	
5	Anjelita Maria de Jesus Cardoso, S.T.	Eng. ITIAS		F					1	
6	Olivio Marcos da Silva Correia, S.T.	Eng. ITIAS	M						1	
IV.3. Departamento Avaliação de Projetos Edifício Públicos, Mecânica e Energia Electrica, TIC, Jardins e Monumentos (EMETIJM) - ADN, I.P.										
1	Amorin Soriano Menezes, ST	Eng. Senior - EMETIJM	M			1				
2	Arlindo Sarmento Monteiro, S.T.	Eng. EMETIJM	M						1	
3	Paulino Abrantes Correia, B. EC.	Eng. EMETIJM	M						1	
4	Oscar Monteiro Gomes, S.T.	Eng. EMETIJM	M						1	
5	Maria Melania Mendonça Oca, S.T.	Eng. EMETIJM		F					1	
6	Angelica da Costa, B. ETT.	Eng. EMETIJM		F					1	
V	Unidade Controlo e Validação de Qualidade (UCVQ) - ADN, I.P.									
V.1. Secretariado UCVQ - ADN, I.P.										
1	Emerenciana da Costa Maia Freitas, S.T., M.T.	Koordenadora - UCVQ		F		1				
2	Santos, S.T.	Assessor Internacional Estrutura (UCVQ & UAP)	M							1
3	Aleixo Amaral do Carmo, S.T.	Assessor Nacional Pontes Estradas (UCVQ & UAP)	M						1	
4	Joaninha da Costa	Official Administrasaun		F					1	
5	João Marcos Napoleão Gracia	Assistente Official Administrasaun	M						1	
V.2. Departamento Infraestruturas de Transportes e Irigasaun - ITI										
1	Remigio da Conceição Soares dos Santos, S.T.	Eng Senior - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	M			1				
2	Aniceto da Costa, B. EC, Lic. Eng.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontraktor ba Projecto Imprestimo)	M						1	
3	Manuel Bary da Silva Cristovão de Carvalho, S.T.	Eng. Ainaro - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	M						1	
4	Jacob da Costa Camões, Lic. Eng.	Eng. Baucau - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	M						1	
5	Jose Aparicio Sanches Soares, B.EC.	Eng Bobonaro - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	M						1	
6	Salvador Martins, S,T,	Eng. Viqueque - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	M						1	
7	Domingos Soares Martins, B. EC.	Eng. Covalima - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	M						1	
8	Bosco Dinis de Sousa, S.T.	Eng. Covalima - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	M						1	
9	Joao Quintao do Rego, S.T.	Eng. Dili - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	M						1	
10	Eduardo dos Santos, S.T.	Eng. Dili - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	M						1	
11	Antonio Mendonça Faria Da Silva, Lic. Eng.	Eng. Emera - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	M						1	
12	Marcus Ximenes de Araujo, S.T.	Eng Liquisa - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	M						1	
13	Geovanio Mateus Xavier Carlos Aleixo, B.EC.	Eng. Lautem - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	M						1	
14	Deomentino Henrique Lopes, Lic. Eng.	Eng. Lautem - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	M						1	

15	Augusta da Costa Ferreira, B.EC.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)		F				1			
16	Jose Roberto Carlos Gusmao, Lic. Eng.	Eng. Manututo (Seksau Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	M					1			
17	Romulo João Marques Henrique, S.T.	Eng. Manufahi (Seksau Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	M					1			
18	Celvio Justino Alves, B.EC, Lic. Eng.	Eng. Aileu - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	M					1			
19	Roberto Maria Martins, Lic. Eng.	Eng. Viqueque - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	M					1			
20	Vidal Guterres, B.EC, Lic. Eng.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	M					1			
21	Tito Edgar Fatima Napoleão de Jesus, S.T.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	M					1			
22	Terresa Gomes, S.T.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)		F				1			
23	Rui Lopes, Lic. Eng.	Eng. Aileu - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	M					1			
V.3. Departamento Edifícios Públicos no Be'e Mos - EPBM											
1	Francisco Xavier de Jeronimo, S.T.	Eng. Senior - Edifício Publicas no Be'e Mos	M					1			
2	Ir. Musalam Bin Umar Bassarewan	Assesor Nasional Edifício Publicas (UCVQ & UAP)	M							1	
3	Julmira Soares Sampaio, B. EC.	Eng. Edifício Dili - Konsultan ba Edifisio Publiko, Agua e Saneamento		F				1			
4	Egídio Gonçalves, S.T.	Eng. Edifício Dili - Konsultan ba Edifisio Publiko, Agua e Saneamento	M					1			
5	Aleixo da Costa Andrade, S.T.	Eng. Manututo - Edifisio no Be'e mos	M					1			
6	Bebiano Crecêncio De Jesus Lopes, S.T.	Eng. Viqueque - Edifisio no Be'e mos	M					1			
7	Fidelis Mardiano da Costa, Lic. Eng.	Eng. Manufahi Edifisio no Be'e mos	M					1			
8	Merinho Cuco Lopes de Araujo, S.T.	Eng. Aileu - Edifisio no Be'e mos	M					1			
9	Joaquim de Carvalho Madeira, S.T.	Eng. Ainaro Edifisio no Be'e mos	M					1			
10	Agostinho Aranda, S.T.	Eng. Baucau Edifisio no Be'e mos	M					1			
11	Zulkamaen Depari, S.T.	Eng. Bobonaro - Edifisio no Be'e mos	M					1			
12	Madelino Deonizio Jose Magno, Lic. Eng.	Eng. Covalima - Edifisio no Be'e mos	M					1			
13	Prezencio Legorio Carmo Dias Ximenes, Lic. Eng.	Eng. Covalima - Edifisio no Be'e mos	M					1			
14	Manuel Estrela Soares de Oliveira, S.T.	Eng. Dili - Edifisio no Be'e mos	M					1			
15	Pedro de Lourdes Alves, S.T.	Eng. Dili - Edifisio no Be'e mos	M					1			
16	Jaimito Manuel Quintao, S.T.	Eng. Ermera - Edifisio no Be'e mos	M					1			
17	Juninho Antonio Abrantes da Cruz, B. Eng.	Eng. Liquisa - Edifisio no Be'e mos	M					1			
18	Inocencio dos Reis Costa Maria, Lic. Eng.	Eng. Lautem - Edifisio no Be'e mos	M					1			
19	Rosalia de Fatima, Lic. Eng.	Eng. Dili - Edifisio no Be'e mos		F				1			
V.4. Departamento Mecânica & Energia Eléctrica											
1	Deolindo de Fatima Marques, B.ETT	Eng. Senior - Mecânica e Energia	M					1			
2	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares, S.T.	Eng. Mecânica e Eletrica	M					1			
3	Camilo de Jesus, B.ETT.	Eng. Mecânica e Eletrica	M					1			
4	Adonis Julio Fernandes, B.ETT.	Eng. Mecânica e Eletrica	M					1			
V.5. Departamento Tecnogia da Infomação e Comunicação - TIC											
1	Romualdo Duarte Guterres	Assesor Nacional TIC (UAP, UCVQ, e UGA)	M							1	
2	Ezequiel Ricardo de Oliveira, S.T.	Eng. Senior - Official ICT (UCVQ, UAP e UGA)	M					1			
V.6. Departamento Laboratório											
1	Jony Rodrigues Varela, S.T.	Eng. Senior Laboratorio	M					1			
2	Eng. Agus Widiato	Assesor Internacional (Laboratorio & UEDC)	M								1
3	Angelina Amaral, S.T.	Eng. Laboratório - Manufahi, Aileu e Manatuto		F				1			
4	Lizete Magno de Jesus, Lic. Eng.	Eng. Laboratório Baucau, Viqueque e Lautem		F				1			
5	Guido Carceres Tilman, Lic. Tec.	Eng. Laboratório - Maliana, Covalima e Ainaro	M					1			
6	Abel Soares da Silva, Lic. Eng.	Eng. Laboratório - Maliana, Covalima e Ainaro	M					1			
7	Alcino Francisco Paicheco, Lic. Eng.	Eng. Laboratório - Baucau, Viqueque e Lautem	M					1			
8	Barbara Carmelinda Gusmao, S.T.	Eng. Laboratório - Manufahi, Aileu e Manatuto		F				1			
9	Abel Fernando, S.T.	Eng. Laboratório - Dili, Liquisa e Ermera	M					1			

VI	Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências - UEDC									
VI.1.	Secretariado UEDC - ADN, I.P.									
1	Valentina Violet Correia Bianco, S.T.	Koordenadora - UEDC		F	1					
2	Maria José Rosário de Jesus, B. B.	Official Administração - UEDC		F				1		
VI.2	Departamento Pesquisa									
1	Jose Fernando Liu Soares, S.T.	Eng. Senior Pesquisa	M			1				
2	Joaquim da Silva Pinto, B. EC., Lic Eng.	Eng. Pesquisa	M					1		
3	Hindun Nofitri da Conceição Isya, B.S. MSE.	Eng. Pesquisa		F				1		
VI.3.	Departamento Estandardização									
1	Demistocles Graciliano Ximenes Fernandes Cabral, S.T.	Eng. Senior - Estandardização	M			1				
2	Marcelino Amaral, B. EC.	Eng. Estandardização	M					1		
VI.4.	Departamento Capacitação									
1	To be Name	Chefe Dept. Capacitação								
2	To be Name	Eng. Dept. Capacitação								

Tabela 2.3.1. Força de Trabalho Haktuir Funsau no Unidades

Tabela 2.3.1. Deskrisaun detalho ba perfil fungsionarios ADN, I.P. segundo trimestal relasionamente ho Unidades no Funsau ne'be ADN, I.P. atribui ba kada fungsionario tuir ida-idak nia espesialidade akademica no esperensia sevisu.

	FUNGSIONARIO ADN, I.P.		TOTAL
	MANE	FETO	147
	107	40	

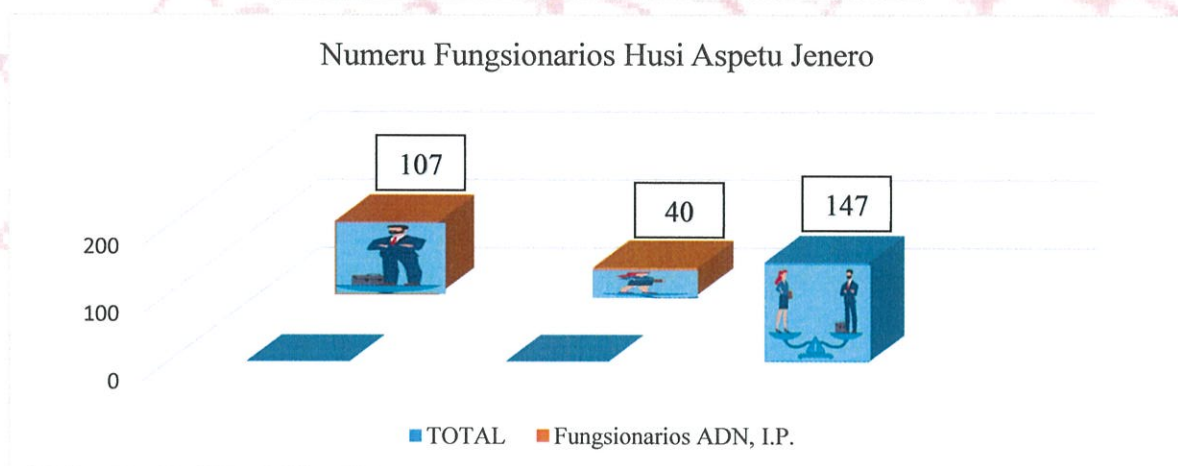


Tabela 2.3.2 Força de Trabalho ho Numeru Jeneru

Tabela 2.3.2. Deskrisaun detalho ba perfil fungsionarios ADN, I.P. segundo trimestal relasionamente ho jenero ne'be iha tabela no grafiku indika katak, total fungsionarios hamutuk 147 pesoas (Mane 107 pesoas no Feto 40 pesoas), ne'be lokaliza ba Unidades/Departamento tuir ida-idak ninian kompetensias.

Nu	Funsoens	Total
1	Diretor Executivo & Direor Adjunto	2
2	Coordenador/a	4
3	Chefe Dep./Sec.	12
4	Engeneiro Espesializado	69
5	Adm/Finansa/Aprovisionamento/Logistica	47
6	Assesor/a Nasional	10
7	Assesor Internasional	3
Grand Total		147

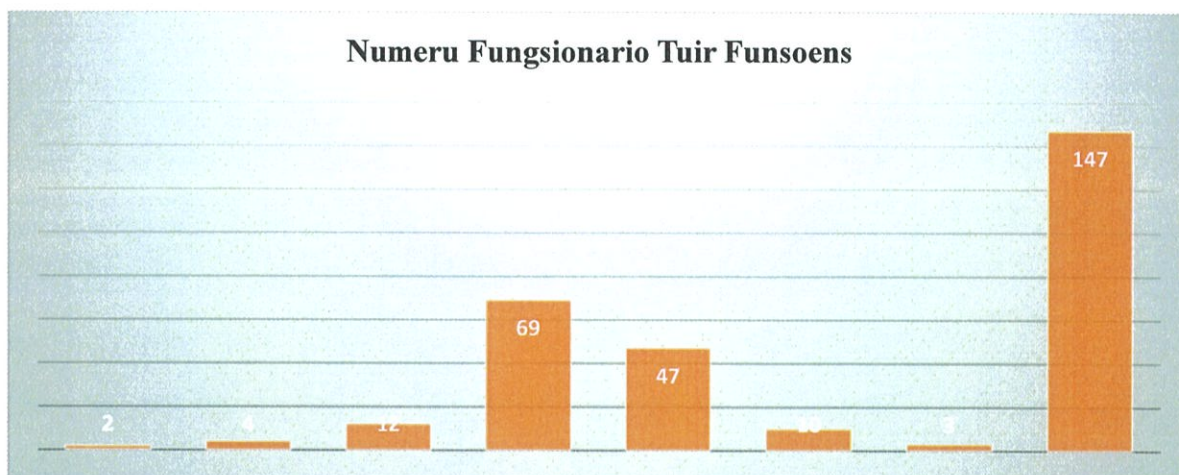


Tabela 2.3.3. Força de Trabalho Haktuir Funsau no Knar

Tabela 2.3.3. Deskrisaun detalho ba perfil funksionarios ADN, I.P. segundo trimestal relasionamente ho nian funsoens, husi dadus iha leten indika katak separasaun funsoens servisu prinsipal fahe ba kategoria 7 (hitu) mak hanesan Diretor Exekutivu no Adjunto (nain 2), Kordenadores (nain 4), Chefe Dep/Sec (nain 12), Engiñeiro Espesializado (nain 69), Adm/Finansa/Aprovisionamento/Lojistica (nain 47), Assesor Nasional (nain 10), no Assesor Internasional (nain 3).

Nu	Unidades	Total
1	DE & DA (GADE)	19
2	UGA	41
3	UAP	18
4	UCVQ	62
5	UEDC	7
Grand Total		147

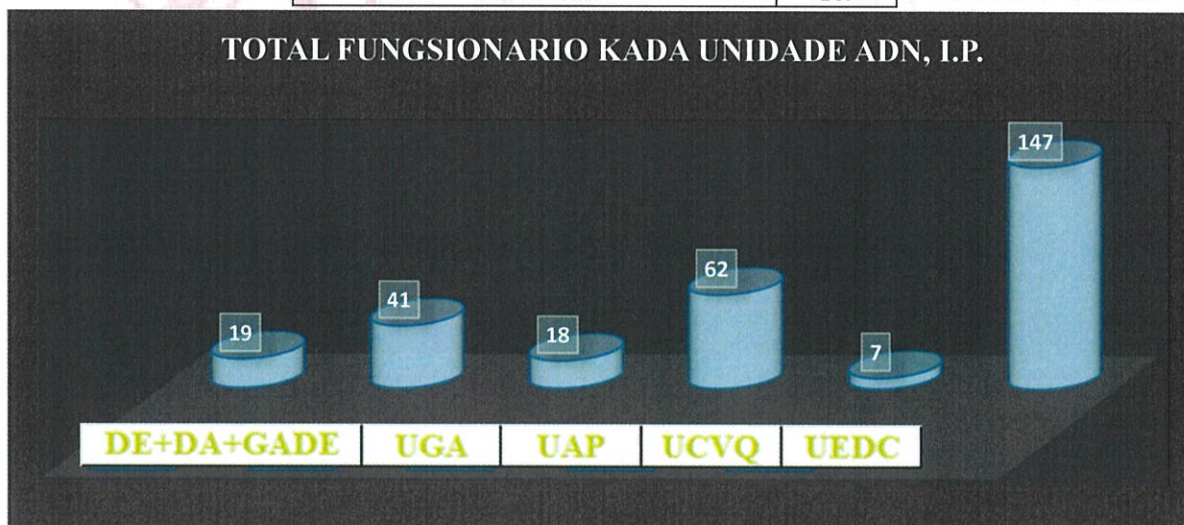


Tabela 2.3. 4. Força de Trabalho Haktuir Unidades

Tabela 2.3.4. Deskrisaun detalho ba perfil funksionarios ADN, I.P. segundo trimestal relasionamente ho nian Unidades , husi dadus iha leten indika katak separasaun unidades servisu prinsipal fahe ba Unidade 4 (ha'at) mak hanesan, Diretor Exekutivu/Adjunto no GADE (nain 19), UGA (nain 41), UAP (nain 18), UCVQ (nain 62), no UEDC (nain 7).

2.4. Projetos 13 Municipios ho Fontes Financiamento

Projetos 13 Municipios ho Fontes Financiamento kompostu hosi Fundus das Infraestruturas (FI), Linha Ministerial-Capital Desenvolvimento (LM-CD), Programa Desenvolvementu Integrado Munisipal (PDIM), Linha Ministerial-Bens Servisu (LM-BS) Linha Ministerial Transferensia Publica (LM-TP), Fundo Covid-19 no Emergencia. Detalho exekusaun pagamento ho total projetus, husi Fulan Abril-Junho deskreve iha tabela no grafiku 2.4.a-c iha kraik.

NO	MUNICIPIO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	49	\$ 55,701,202.48	\$ 32,293,358.35	57.98%
2	Ainaro	71	\$ 96,056,559.38	\$ 80,884,393.25	84.20%
3	Baucau	85	\$ 144,271,981.61	\$ 93,752,663.05	64.98%
4	Bobonaro	78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,273,395.02	54.54%
5	Covalima	65	\$ 129,965,712.60	\$ 108,179,651.59	83.24%
6	Dili	229	\$ 297,548,905.20	\$ 178,672,162.63	60.05%
7	Ermera	49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,143,970.91	63.89%
8	Lautem	54	\$ 40,487,287.14	\$ 27,624,992.47	68.23%
9	Liquica	70	\$ 21,115,360.08	\$ 12,233,720.85	57.94%
10	Manatuto	63	\$ 139,910,297.98	\$ 106,178,137.61	75.89%
11	Manufahi	68	\$ 24,424,916.58	\$ 14,626,865.52	59.89%
12	Nasional	8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,532,824.76	69.46%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional	4	\$ 85,431,329.14	\$ 49,085,855.96	57.46%
15	Viqueque	57	\$ 65,690,314.87	\$ 31,883,705.01	48.54%
Grand Total		954	\$ 1,268,525,474.09	\$ 843,218,264.83	66.47%

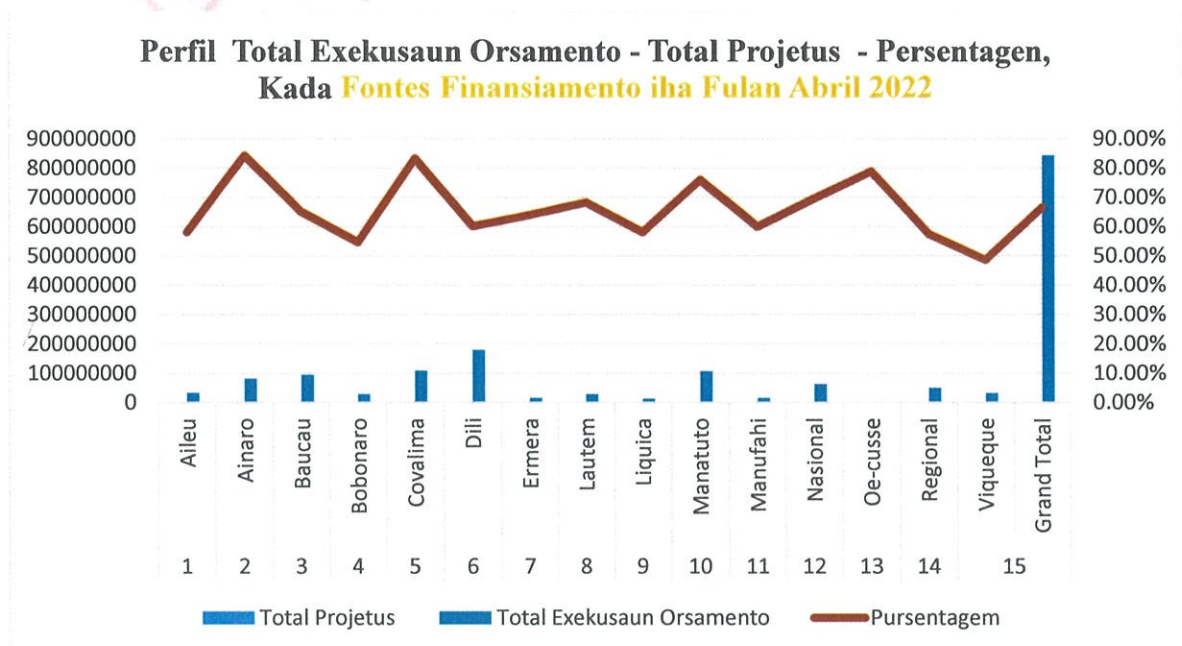


Tabela & Grafiku 2.4.a. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu - Fontes Financiamento Abril 2022

Fulan abril segundo trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.4.a. ho total projetus iha 13 munisipios nomos kategoria projetus Nasional/Regional hamutuk 954 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 843,218,264.83 ekivalen 66.47 % husi total kontratus \$ 1,268,525,474.09. Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Municipio Dili ho montante \$ 178,672,162.63 (229 projetus) no Percentagen exekusaun bo'ot liu iha Municipio Ainaro ho percentagen 84.20 % (71 projetus)

NO	MUNICIPIO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	54	\$ 56,429,089.51	\$ 32,480,933.75	57.56%
2	Ainaro	73	\$ 96,158,627.00	\$ 81,019,298.23	84.24%
3	Baucau	85	\$ 144,271,981.61	\$ 96,524,215.95	66.90%
4	Bobonaro	78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,487,753.28	54.95%
5	Covalima	67	\$ 130,884,271.61	\$ 108,513,775.37	82.91%
6	Dili	233	\$ 302,724,634.97	\$ 181,060,621.30	59.81%
7	Ermera	49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,202,068.71	64.14%
8	Lautem	54	\$ 40,487,287.14	\$ 27,786,057.35	68.63%
9	Liquica	70	\$ 21,115,360.08	\$ 12,272,376.55	58.12%
10	Manatuto	63	\$ 139,910,297.98	\$ 108,746,406.89	77.73%
11	Manufahi	69	\$ 24,556,810.39	\$ 15,418,120.22	62.79%
12	Nasional	11	\$ 93,306,829.83	\$ 62,758,778.76	67.26%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional	4	\$ 85,431,329.14	\$ 49,085,855.96	57.46%
15	Viqueque	57	\$ 65,664,883.37	\$ 31,817,425.60	48.45%
Grand Total		971	\$ 1,278,838,824.86	\$ 853,026,255.77	66.70%

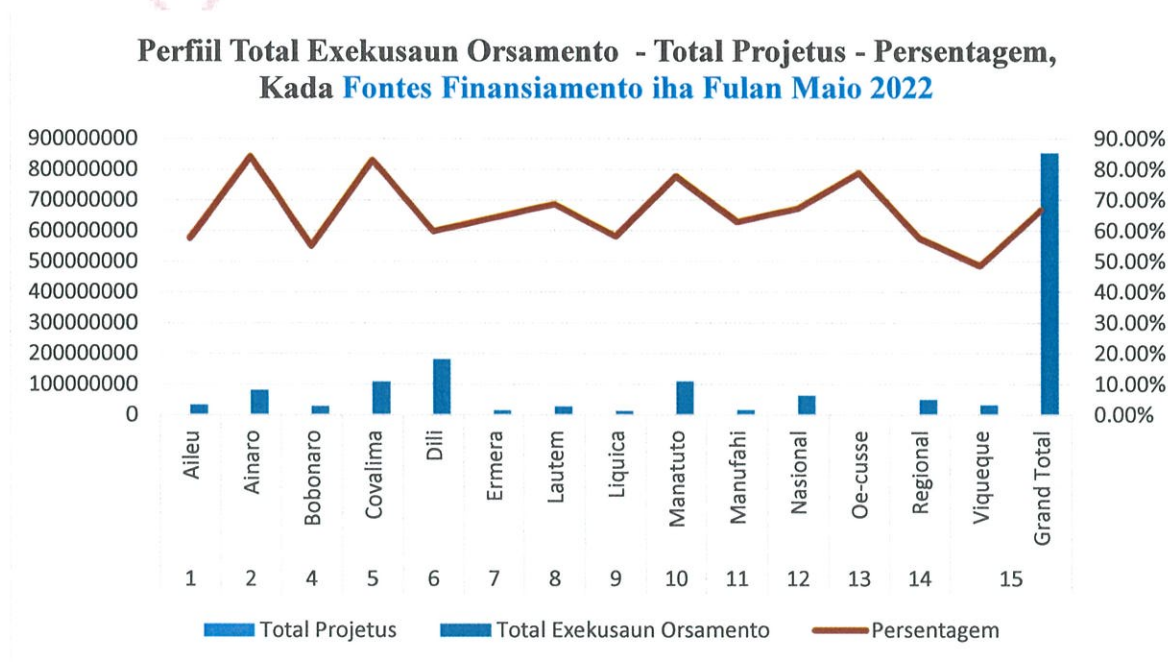


Tabela no Grafiku 2.4.b. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu - Fontes Finansiamento Maio 2022

Fulan maio segundo trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.4.b. ho total projetus iha 13 munisipios nomos kategoria projetus Nasional/Regional hamutuk 971 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 853,026,255.77 ekivalen 66.70 % husi total kontratus \$ 1,278,838,824.86 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Municipio Dili ho montante \$ 181,060,621.30 (233 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha Municipio Ainaro ho persentagen 84.24 % (73 projetus)

NO	MUNICIPIO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	54	\$ 56,429,089.51	\$ 32,630,196.98	57.83%
2	Ainaro	73	\$ 96,143,965.65	\$ 82,153,495.08	85.45%
3	Baucau	85	\$ 144,271,981.61	\$ 98,209,610.04	68.07%
4	Bobonaro	78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,487,753.28	54.95%
5	Covalima	69	\$ 131,714,806.65	\$ 108,605,642.65	82.46%
6	Dili	230	\$ 180,886,898.28	\$ 97,035,248.03	53.64%
7	Ermera	49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,299,367.66	64.55%
8	Lautem	57	\$ 41,399,276.68	\$ 27,936,672.67	67.48%
9	Liquica	72	\$ 26,533,460.08	\$ 12,272,376.55	46.25%
10	Manatuto	63	\$ 140,080,038.04	\$ 113,524,454.92	81.04%
11	Manufahi	70	\$ 24,849,464.13	\$ 15,465,950.35	62.24%
12	Nasional	16	\$ 96,460,346.83	\$ 64,683,913.95	67.06%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional	4	\$ 85,431,329.14	\$ 50,211,552.86	58.77%
15	Viqueque	57	\$ 65,690,314.87	\$ 32,895,674.87	50.08%
Grand Total		981	\$ 1,167,788,393.70	\$ 781,264,477.73	66.90%

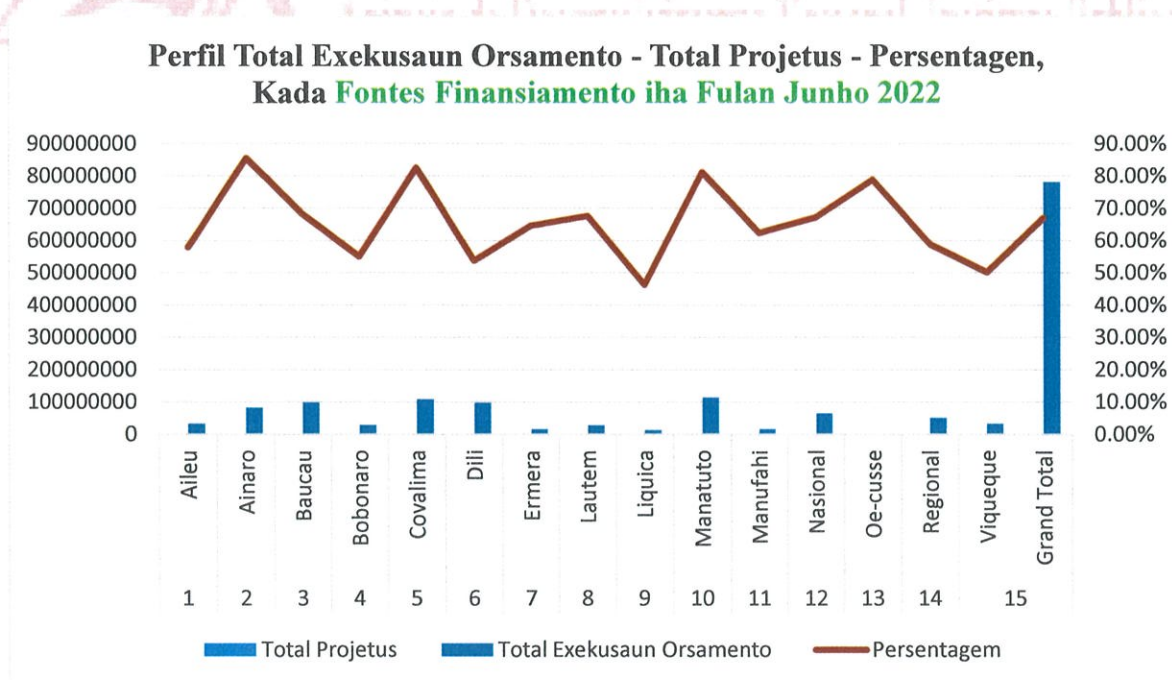


Tabela no grafiku 2.4.c. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu - Fontes Finansiamento Junho 2022

Fulan junho segundo trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.4.c. ho total projetus iha 13 munisipios nomos kategoria projetus Nasional/Regional hamutuk 981 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 781,264,477.73 ekivalen 66.90 % husi total kontratus \$ 1,167,788,393.70 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Municipio Manatuto ho montante \$ 113,524,454.92 (63 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha Municipio Ainaro ho persentagen 85.45 % (73 projetus)

2.5. Projetos 13 Municipio por Setores

Projetos iha 13 Municipios ba kada setores projetus hamutuk 23 setores, ho detalho exekusaun pagamento kada setores no total projetus, husi Fulan Abril-Junho eskreve iha tabela no grafiku 2.5.a-c iha kraik.

NO	SECTOR PROJECTO	Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	11	\$ 6,968,249.42	\$ 4,626,765.65	66.40%
3	AGUA E SANEAMENTO	43	\$ 13,353,663.56	\$ 6,878,172.94	51.51%
4	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3	\$ 24,631,890.50	\$ 17,611,806.26	71.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	161	\$ 51,861,321.07	\$ 17,697,739.90	34.13%
7	EDUKASAUN	187	\$ 23,070,427.01	\$ 2,554,796.65	11.07%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	89	\$ 141,236,922.99	\$ 96,808,140.18	68.54%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO	4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,075,710.61	89.12%
10	ESTRADAS	213	\$ 287,119,365.96	\$ 174,882,029.65	60.91%
11	FLOOD CONTROL	12	\$ 3,295,706.50	\$ 1,650,896.46	50.09%
12	IMPRESTIMO	26	\$ 558,650,150.07	\$ 403,629,883.54	72.25%
13	IRIGASAUN	1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	10	\$ 5,690,086.23	\$ 3,484,869.96	61.24%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	90	\$ 19,046,822.17	\$ 12,162,879.27	63.86%
16	PONTES	10	\$ 20,195,686.46	\$ 15,220,083.24	75.36%
17	PORTOS	3	\$ 2,241,460.87	\$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	10	\$ 3,498,406.35	\$ 1,661,501.50	47.49%
19	SAUDE	54	\$ 9,514,759.48	\$ 5,056,908.83	53.15%
20	SEGURANCA NO DEFESA	6	\$ 13,448,811.18	\$ 1,776,285.89	13.21%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,466,564.84	79.40%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	6	\$ 1,570,981.66	\$ 1,217,734.53	77.51%
23	TURISMO	10	\$ 1,733,927.24	\$ 769,667.85	44.39%
Grand Total		954	\$ 1,268,525,474.09	\$ 843,218,264.83	66.47%

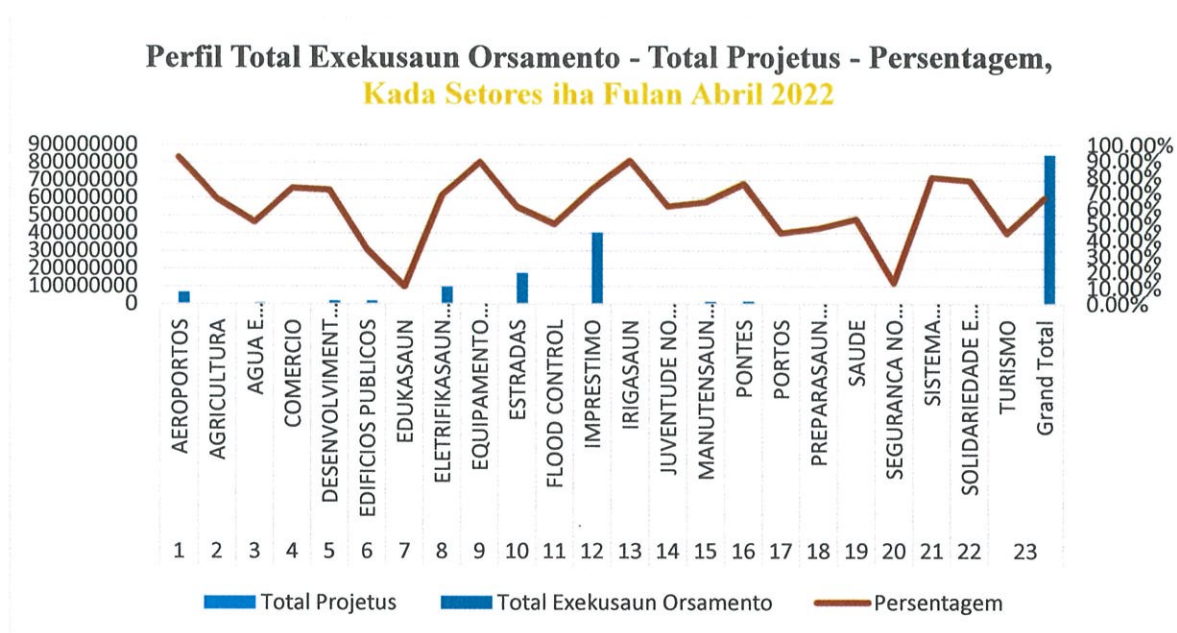


Tabela no Grafiku 2.5. a Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Setores Abril 2022

Fulan abril segundo trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.5.a. ho total 23 setores iha 13 munisipios hamutuk 954 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 843,218,264.83 ekivalen 66.47 % husi total kontratus \$ 1,128,525,474.09 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Sector Imprestimu ho montante \$ 403,629,883.54 (26 projetos) no Percentagen exekusaun bo'ot liu iha sector Aeroportos ho percentagen 92.27 % (3 projetos)

NO	SECTOR PROJECTO	Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	11	\$ 6,968,249.42	\$ 4,673,469.51	67.07%
3	AGUA E SANEAMENTO	43	\$ 13,353,663.56	\$ 7,293,061.61	54.61%
4	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5	\$ 27,142,490.50	\$ 17,837,760.26	65.72%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	163	\$ 52,325,401.51	\$ 19,487,536.44	37.24%
7	EDUKASAUN	187	\$ 23,070,427.01	\$ 2,627,170.57	11.39%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	89	\$ 141,236,922.99	\$ 96,808,140.18	68.54%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO	4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,075,710.61	89.12%
10	ESTRADAS	224	\$ 293,616,132.34	\$ 176,570,119.75	60.14%
11	FLOOD CONTROL	12	\$ 3,295,706.50	\$ 1,650,896.46	50.09%
12	IMPRESTIMO	26	\$ 558,650,150.07	\$ 407,852,355.04	73.01%
13	IRIGASAUN	1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	10	\$ 5,690,086.23	\$ 3,484,869.96	61.24%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	90	\$ 19,046,822.17	\$ 12,245,918.80	64.29%
16	PONTES	10	\$ 20,195,686.46	\$ 15,539,328.77	76.94%
17	PORTOS	3	\$ 2,241,460.87	\$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN-NOVOS PROJECTOS	10	\$ 3,498,406.35	\$ 1,731,026.52	49.48%
19	SAUDE	55	\$ 9,546,757.16	\$ 5,461,784.77	57.21%
20	SEGURANCA NO DEFESA	7	\$ 14,258,717.45	\$ 2,071,353.27	14.53%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,466,564.84	79.40%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	6	\$ 1,570,981.66	\$ 1,322,908.90	84.21%
23	TURISMO	10	\$ 1,733,927.24	\$ 837,220.46	48.28%
Grand Total		971	\$ 1,278,838,824.86	\$ 863,026,255.77	66.70%

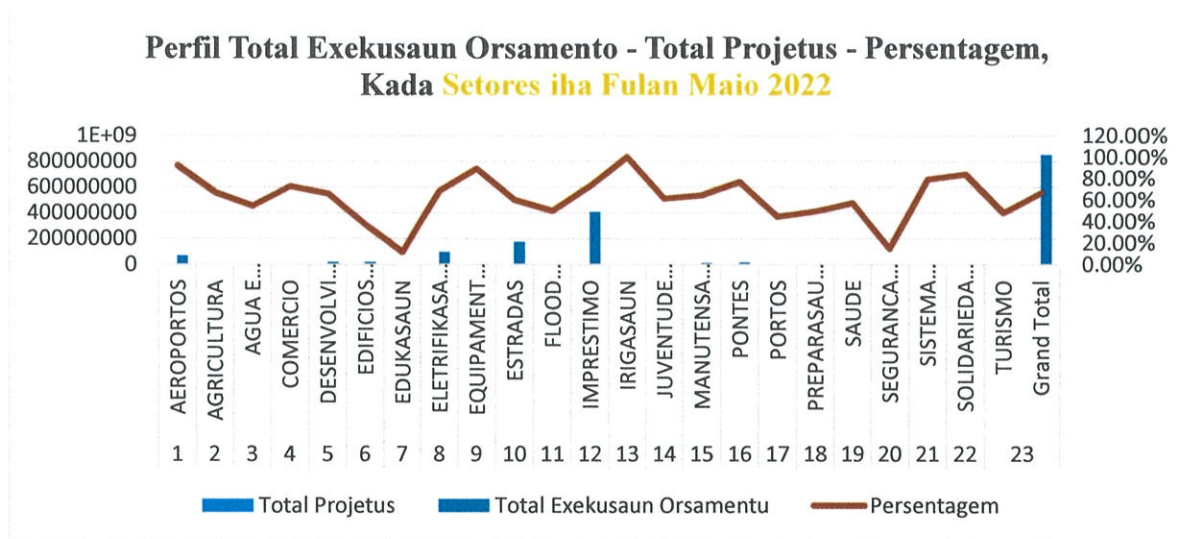


Tabela no grafiku 2.5. b. Perfil Execusaun Pagamentu Komulativu – Setores Maio 2022

Fulan maio segundo trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.5.b. ho total 23 setores iha 13 munisipios hamutuk 971 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 853,026,255.77 ekivalen 66.70% husi total kontratus \$ 1,278,838,824.86 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Sector Imprestimu ho montante \$ 407,852,355.04 (26 projetos) no Percentagen exekusaun bo'ot liu iha sector Irigasaun ho percentagen 100 % (1 projetos)

NO	SECTOR PROJECTO	Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	11	\$ 6,968,249.42	\$ 4,829,695.98	69.31%
3	AGUA E SANEAMENTO	43	\$ 13,353,663.56	\$ 7,258,332.44	54.35%
4	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5	\$ 27,142,490.50	\$ 17,837,760.26	65.72%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	165	\$ 53,003,276.23	\$ 19,994,200.96	37.72%
7	EDUKASAUN	190	\$ 24,568,504.28	\$ 2,829,248.93	11.52%
8	ELÉTRICIDADE	92	\$ 146,947,676.73	\$ 97,048,382.60	66.04%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO	4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,084,250.86	89.31%
10	ESTRADAS	227	\$ 294,335,175.20	\$ 179,098,455.65	60.85%
11	FLOOD CONTROL	12	\$ 3,281,045.15	\$ 1,628,366.81	49.63%
12	IMPRESTIMO	21	\$ 436,343,381.19	\$ 330,796,600.08	75.81%
13	IRIGASAUN	1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	10	\$ 5,690,086.23	\$ 3,542,117.69	62.25%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	90	\$ 19,046,822.17	\$ 12,427,512.16	65.25%
16	PONTES	10	\$ 20,365,426.52	\$ 15,620,471.17	76.70%
17	PORTOS	3	\$ 2,241,460.87	\$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	10	\$ 3,498,406.35	\$ 1,731,026.52	49.48%
19	SAUDE	56	\$ 9,557,085.58	\$ 5,695,005.36	59.59%
20	SEGURANCA NO DEFESA	7	\$ 14,258,717.45	\$ 2,071,353.27	14.53%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	2	\$ 5,291,216.00	\$ 3,613,443.84	68.29%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	7	\$ 1,645,809.66	\$ 1,331,973.64	80.93%
23	TURISMO	11	\$ 1,959,500.24	\$ 837,220.46	42.73%
Grand Total		981	\$ 1,167,788,393.70	\$ 781,264,477.73	66.90%

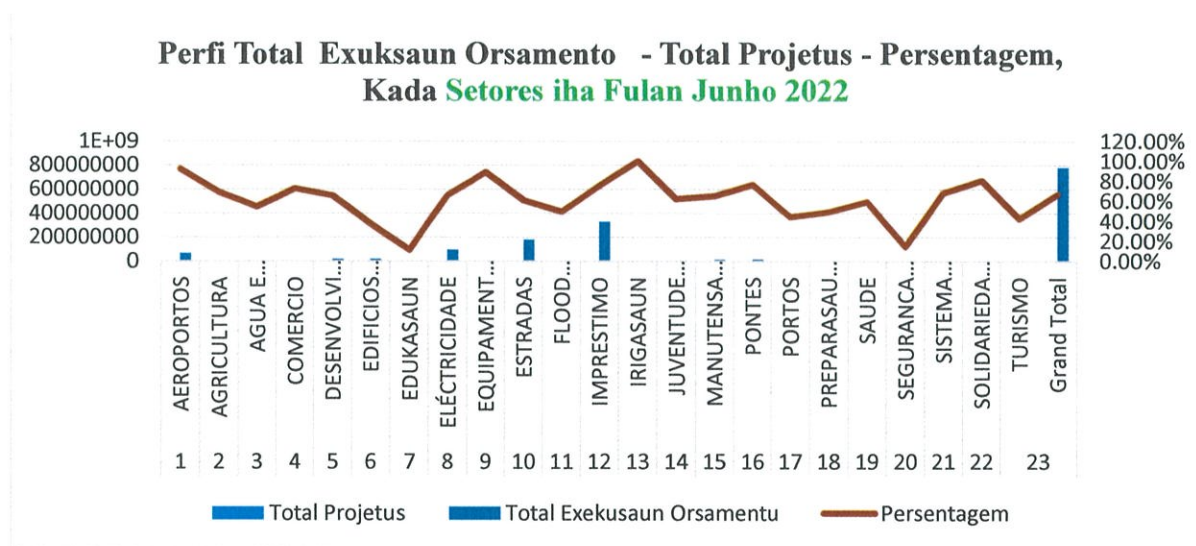


Tabela no Grafiku 2.5. c. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Setores Junho 2022

Fulan junho segundo trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.5.c. ho total 23 setores iha 13 munisipios hamutuk 981 ho emite certificado pagamentu montante \$ 781,264,477.73 ekivalen 66.90% husi total kontratus \$ 1,167,788,393.70 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Sector Imprestimu ho montante \$ 330,796,600.08 (21 projetos) no Percentagen exekusaun bo'ot liu iha sector Irigasaun ho percentagen 100 % (1 projetos)

2.6. Projetos 13 Municipio por Ministerio

Projetos iha 13 Municipios, implementador ou dono projetos hamutuk 36 Ministerio, ho detalho exekusaun pagamento kada Ministerio no total projetos, husi Fulan Abril-Junho eskreve iha tabela no grafiku 2.6.a-c iha kraik.

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC	1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega	2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25	63.30%
3	CFP	1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRESA	1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
5	ESTATAL	34	\$ 3,866,773.65	\$ 1,962,613.40	50.76%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	11	\$ 14,232,230.92	\$ 7,871,882.61	55.31%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75	82.11%
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
9	MINISTERIO SOLIDARIDADE SOCIAL E INCLUZAUN	1	\$ 805,366.41	\$ -	0.00%
10	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	15	\$ 7,327,640.67	\$ 4,905,222.88	66.94%
11	MINISTERIO DA DEFESA	9	\$ 4,275,352.80	\$ 2,355,239.06	55.09%
12	MINISTERIO DA JUSTICA	9	\$ 1,132,235.19	\$ 275,290.25	24.31%
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	471	\$ 1,044,937,618.92	\$ 713,299,683.52	68.26%
15	MINISTERIO DO INTERIOR	7	\$ 11,693,682.23	\$ 566,977.15	4.85%
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	231	\$ 26,900,180.76	\$ 2,898,326.61	10.77%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	2	\$ 482,583.06	\$ 104,335.47	21.62%
18	MINISTERIO FINANÇAS	4	\$ 4,453,824.10	\$ 3,158,348.70	70.91%
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus	1	\$ 119,578.85	\$ 45,153.74	37.76%
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	11	\$ 3,916,673.52	\$ 412,875.65	10.54%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	13	\$ 2,670,796.70	\$ 1,334,870.42	49.98%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS	2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
23	MINISTERIO SAUDE	69	\$ 12,692,171.17	\$ 6,591,894.15	51.94%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	5	\$ 1,888,982.61	\$ 745,822.12	39.48%
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	7	\$ 74,771,154.32	\$ 68,250,565.56	91.28%
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	10	\$ 1,497,954.55	\$ 711,426.11	47.49%
27	PARLAMENTU NASIONAL	1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43	90.00%
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	2	\$ 1,266,687.38	\$ 849,412.77	67.06%
29	RADIO TELEVISAO TIMOR LESTE	1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
30	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ -	0.00%
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	8	\$ 5,623,529.34	\$ 3,435,210.39	61.09%
33	SEFOPE	4	\$ 946,006.97	\$ 713,700.51	75.44%
34	TRADE INVEST	1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
35	TRIBUNAL RECUSSO	3	\$ 11,680,926.39	\$ 2,978,884.91	25.50%
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	10	\$ 6,013,776.15	\$ 1,752,021.12	29.13%
Grand Total		954	\$ 1,268,525,474.09	\$ 843,218,264.83	66.47%

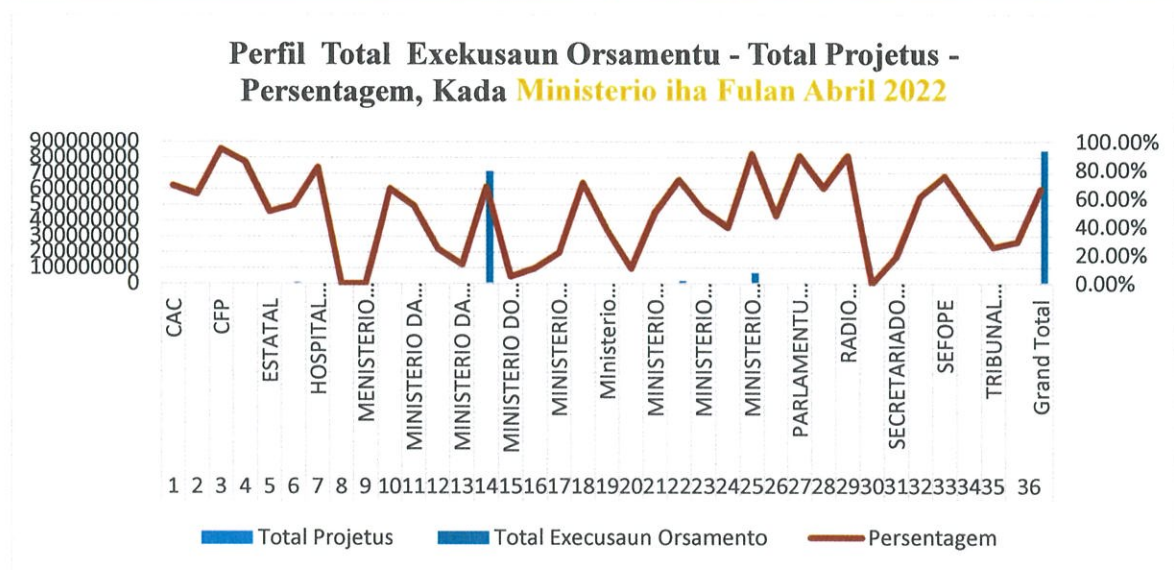


Tabela no Grafiku 2.6.a Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Ministerio Abril 2022

Fulan abril segundo trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.6.a. ho total 36 Ministerio iha 13 munisipios hamutuk 954 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 843,218,264.83 ekivalen 66.47% husi total kontratus \$ 1,268,525,474.09 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Ministerio das Obras Publicas ho montante \$ 713,299,683.52 (471 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha CFP ho persentagen 95.00 % (1 projetus)

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC	1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega	2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25	63.30%
3	CFP	1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRENSA	1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
5	ESTATAL	34	\$ 3,866,773.65	\$ 2,024,707.53	52.36%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	11	\$ 14,232,230.92	\$ 7,871,882.61	55.31%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75	82.11%
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	15	\$ 7,327,640.67	\$ 4,955,158.71	67.62%
10	MINISTERIO DA DEFESA	10	\$ 5,085,259.07	\$ 2,945,373.82	57.92%
11	MINISTERIO DA JUSTICA	9	\$ 1,132,235.19	\$ 275,290.25	24.31%
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	481	\$ 1,051,367,637.52	\$ 719,825,795.21	68.47%
14	MINISTERIO DO INTERIOR	7	\$ 11,693,682.23	\$ 566,977.15	4.85%
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	231	\$ 26,874,749.26	\$ 2,970,700.53	11.05%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	2	\$ 482,583.06	\$ 173,860.49	36.03%
17	MINISTERIO FINANÇAS	4	\$ 4,453,824.10	\$ 3,192,269.24	71.67%
18	Ministerio Koordinator Asuntus Ekonomikus	1	\$ 119,578.85	\$ 45,153.74	37.76%
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	11	\$ 3,916,673.52	\$ 1,104,489.24	28.20%
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	16	\$ 5,230,996.70	\$ 1,569,184.00	30.00%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS	2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
22	MINISTERIO SAUDE	71	\$ 12,794,238.79	\$ 7,293,724.79	57.01%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	6	\$ 2,694,349.02	\$ 745,822.12	27.68%
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	8	\$ 74,837,902.10	\$ 68,250,565.56	91.20%
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	10	\$ 1,497,954.55	\$ 711,426.11	47.49%
26	PARLAMENTU NASIONAL	1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43	90.00%
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	2	\$ 1,266,687.38	\$ 849,412.77	67.06%
28	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE	1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
29	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ 29,956.90	42.92%
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	8	\$ 5,623,529.34	\$ 3,435,210.39	61.09%
32	SEFOPE	4	\$ 946,006.97	\$ 713,700.51	75.44%
33	TRADE INVEST	1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
34	TRIBUNAL RECUSSO	3	\$ 12,050,768.39	\$ 3,725,065.25	30.91%
35	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	10	\$ 6,013,776.15	\$ 1,752,021.12	29.13%
Grand Total		971	\$ 1,278,836,824.66	\$ 863,026,256.77	66.70%

Perfil Total Exekusaun Orsamento - Total Projetus - Persentagem, Kada Ministerio Iha Fulan Maio 2022

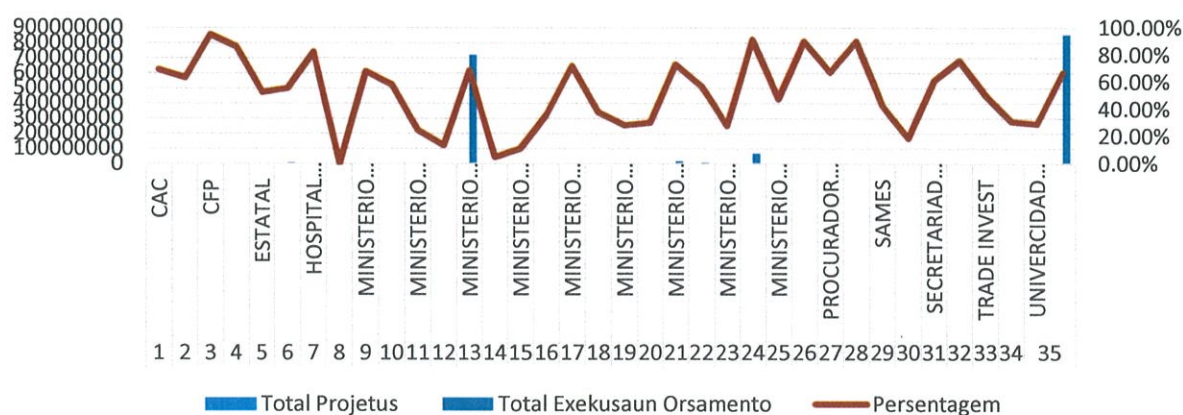


Tabela no Grafiku 2.6.b. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Ministerio Maio 2022

Fulan Maio segundo trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.6.b. ho total 35 Ministerio iha 13 munisipios hamutuk 971 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 853,026,255.77 ekivalen 66.70% husi total kontratus \$ 1,278,838,824.86 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Ministerio das Obras Publicas ho montante \$ 719,825,795.21 (481 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha CFP ho persentagen 95.00 % (1 projetus)

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC	1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega	2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25	63.30%
3	CFP	1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRENSA	1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	\$ 292,653.74	\$ -	0.00%
6	ESTATAL	35	\$ 4,331,258.35	\$ 2,266,743.59	52.33%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	11	\$ 14,232,230.92	\$ 7,871,882.61	55.31%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75	82.11%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
10	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	15	\$ 7,327,640.67	\$ 5,111,385.18	69.75%
11	MINISTERIO DA DEFESA	10	\$ 5,085,259.07	\$ 2,945,373.82	57.92%
12	MINISTERIO DA JUSTICA	9	\$ 1,132,235.19	\$ 275,290.25	24.31%
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	481	\$ 935,367,751.56	\$ 645,699,877.37	69.03%
15	MINISTERIO DO INTERIOR	7	\$ 11,693,682.23	\$ 566,977.15	4.85%
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	234	\$ 28,398,258.03	\$ 3,194,696.18	11.25%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	2	\$ 482,583.06	\$ 173,860.49	36.03%
18	MINISTERIO FINANÇAS	5	\$ 6,638,605.10	\$ 4,339,148.24	65.36%
19	Ministerio Coordenador Asuntu Ekonómikus	1	\$ 119,578.85	\$ 92,618.05	77.45%
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	12	\$ 3,991,501.52	\$ 1,148,744.24	28.78%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	17	\$ 5,404,293.87	\$ 1,577,724.25	29.19%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS	2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
23	MINISTERIO SAUDE	72	\$ 12,804,567.21	\$ 7,552,932.66	58.99%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	6	\$ 2,694,349.02	\$ 745,822.12	27.68%
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	8	\$ 74,837,902.10	\$ 68,317,313.34	91.29%
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	11	\$ 1,723,527.55	\$ 711,426.11	41.28%
27	PARLAMENTU NASIONAL	1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43	90.00%
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	2	\$ 1,266,687.38	\$ 960,952.45	75.86%
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE	1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
30	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ 29,956.90	42.92%
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	8	\$ 5,623,529.34	\$ 3,492,458.12	62.10%
33	SEFOPE	4	\$ 946,006.97	\$ 713,700.51	75.44%
34	TRADE INVEST	1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
35	TRIBUNAL RECUSSO	3	\$ 12,050,768.39	\$ 3,725,065.25	30.91%
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	10	\$ 6,013,776.15	\$ 1,752,021.12	29.13%
Grand Total		981	\$ 1,167,788,393.70	\$ 781,264,477.73	66.90%

**Perfil Total Exekusaun Orsamento - Total Projetus -Persentagem,
Kada **Ministerio** iha **Fulan Junho 2022****

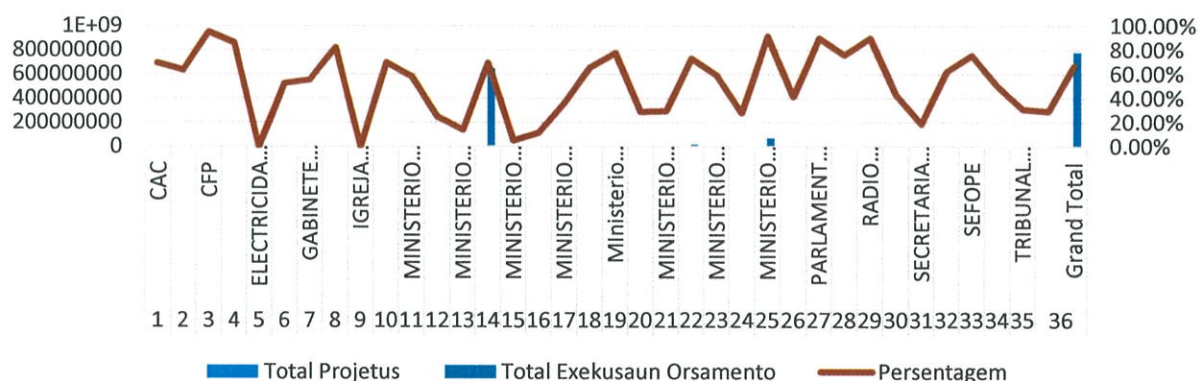


Tabela no Grafiku 2.6.c. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Ministerio Junho 2022

Fulan junho segundo trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.6.c. ho total 36 Ministerio iha 13 munisipios hamutuk 981 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 781,264,477.73 ekivalen 66.90% husi total kontratus \$ 1,167,788,393.70 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Ministerio das Obras Publicas ho montante \$ 645,699,877.37 (481 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha CFP ho persentagen 95.00 % (1 projetus)

2.7. Perfil Pagamentu Komulativu Segundo Trimestral (Abril, Maio no Junho) 2022

Deskripsaun (\$)	Abril 2022			Maio 2022		
	Fundus Finansiamto	Sectores	Ministerios	Fundus Finansiamto	Sectores	Ministerios
Montante Kontratu	\$ 1,268,525,474.09	\$ 1,268,525,474.09	\$ 1,268,525,474.09	\$ 1,278,838,824.86	\$ 1,278,838,824.86	\$ 1,278,838,824.86
Pagamentu Komulativu	\$ 843,218,264.83	\$ 843,218,264.83	\$ 843,218,264.83	\$ 853,026,255.77	\$ 853,026,255.77	\$ 853,026,255.77

	Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu Segundo Trimestral ba Fulan , Abril 2022			Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu Segundo Trimestral ba Fulan, Maio 2022		

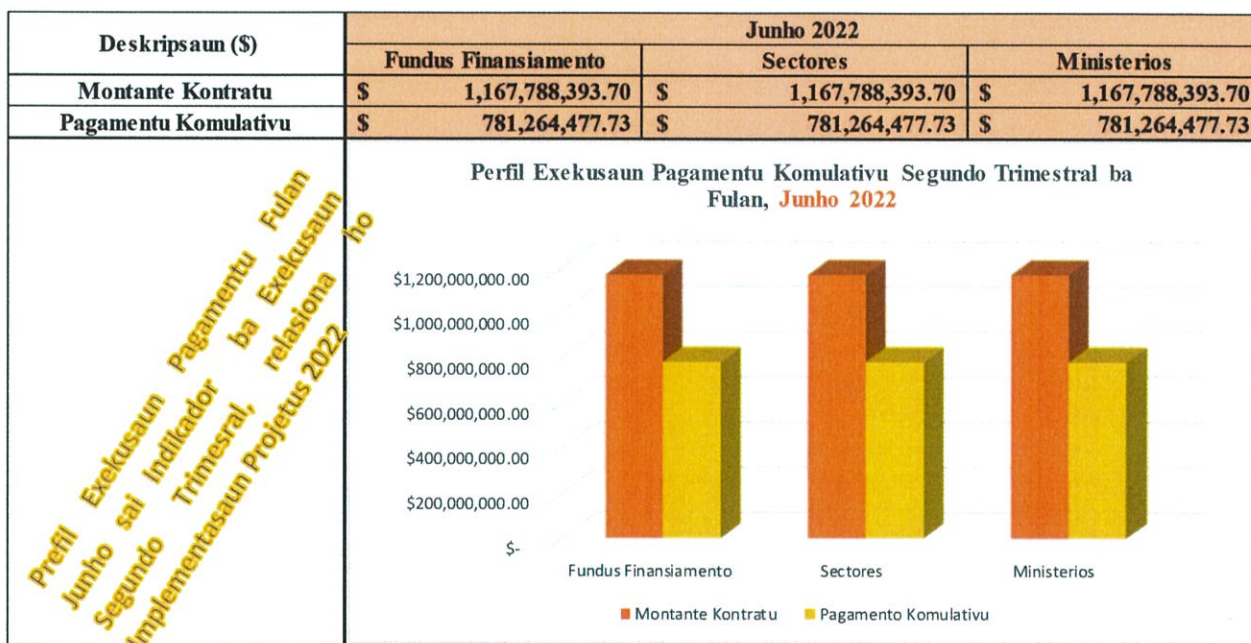


Tabela & Grafiku 2.7. Perfil Exekusaun Orsamentu Segundo Trimestral 2022

Tabela no grafiku 2.7. indika katak, ate fim Segundo Trimestral ba implementasaun projetus ano fiskal 2022 husi total projetus 981 ne'ebe implementa iha teritorio RDTL tomak exekutado ho komulativu \$ 781,264,477.73 (66.90 %) husi total kontratu \$ 1,167,788,393.70.

III. OBSTAKLU

3.1. Obstaklu hosi parte Companhias

1. Kompania/empreza sira infrenta problema iha rekursu finanseiru nune'e fo inpaktu ba serbisu konstrusaun nian hodi difikulta progress serbisu iha terenu.
2. Supervisor husi Ministerio relevantes la iha terreno, no kontrator sira dalaruma servisu la halo tuir spesifikasaun tekniku iha kontrato.
3. Kontrator laiha iha site/terenu ou kontaktu liu hosi telefonika maibe dala barak lai foti ou lakohi hit telefone.
4. Mudansa Schedule la tuir kontratu ho razaun pagamentu tarde, situasaun nebe'e ita hotu la espera ho covid-19 nebe'e invade Timor-Leste fulan hirak liu ba sai difikuldade mos ba kompania/empreza sira la halo serbisu tuir planu refere.
5. Projeito obra barak abandona ou parado iha tinan barak nia laran
6. Projeito Lao la tuir tempo ne'ebe termina iha kontratu
7. Companhia la kumpri rekomendasaun no sujestaun ba defeitus sira nebe parte ADN, I.P. rekomenda ba.

3.2. Obstaku hosi Parte ADN, I.P.

1. Kondisaun Kareta Nian nebe ladun diak (Sempre Manutensaun Hela Deit) hodi halo Projeitu balu nebe tama ona ba Faze Retensaun la konsege halao inspesaun abril - junho tamba Kondisaun estrada ba Projeitu refere Kondisaun Grave.
2. Ho Volume Servisu ne'ebe barak Planu Inspeksaun kada fulan dala Tolu (3) ba visita Projeitu sente todan ou la kobre hotu.
3. Engenheiros la suficiente atu monitoriza projeto ho quantidade barak tanba ho distansia nebe'e do'ok. Liu-liu iha parte Mecanica e Eletrica.
4. Fasilidade la suficiente apoiu servisu diariamente hanesan laptop hodi halo back up data no update ba folder system.
5. Motorista menus difikulta atividades servisu.
6. Iha parte Mecanica e Eletrica ekipa engineiro nunka hasoru tekniku husi kompania no parte kompania sempre delega tekniku ne'ebe ba hein iha terenu, maibe tekniku ne'e rasik laiha konesimentu klean ho orbra refere.
7. Kuantidade transporte ne'ebe la suficiente hodi halo monitorizasaun ba projeto iha terenu tuir plano ne'ebe iha.
8. Departamento Mecanica e Eletrica labele kontrola masimu projeto electricidade ho instalasaun eletrica ba edificio publica tanba engineiros ida kontrola municipio ha'at (4).
9. Ho kuantidade projeto ne'ebe barak no ho distansia ne'ebe do'ok Engenheiro la suficiente hodi kobre.
10. Velocidade Internet iha Municipio lao ladun diak hodi nune'e susar tebes atu asesu no submete documentos ruma via email liu- iu Drop box.

11. Engenheiro enfrenta problema wainhira atu input data konsultan design ba Sistema drop box tamba folder nebe prepara ona responde liu ba servisu kontraktor nian.
12. Kapasidade folder system la to'o atu guarda/save dados inspeksaun tomak ne'ebe barak.
13. Kondisaun eskritorio no Residencia ADN, I.P. municipio la halo rehabilitasaun no manutensaun periodika.



IV. REKOMENDASAUN

4.1. Rekomendasaun ba Parte Companhia, ADN, I.P. no Ministerio Relevantes

1. Husu Superior ADN, I.P. atu bele hatu'o ba projetu nain konaba projetu hirak ne'ebe maka abandona no parado husi kompania/empresa ne'ebe iha responsabilidade ba projetu ne'e rasik atu bele foti medidas ruma hanesan Blacklist ou Penalidade ba kompania.
2. ADN, I.P. Municipio husu ba Dono Projectu refere, ba oin kompania/empresa ne'ebe maka laiha responsabilidade no abandona projetu/obra ne'ebe sira halo, husu Governo la bele fo tan oportunidade ba kompania hirak ne'e hodi konkore iha prosesu aprovisionamentu ba prozetu hira ne'ebe tuir mai.
3. Ba Superior ADN, I.P. atu kordena ho Ministerio relevantes sira hodi nune'e bele fo penalidade ba kompania sira ne'ebe servisu paradu sem informasaun.
4. Rekomenda ba Companhia atu orienta nia tekniku hodi standby iha tereno
5. Kondisaun Rezidencia Oficial ADN, I.P. Municipio balun ne'ebe presija atu hadia : Be'e, Moru & Tralis Janela etc.
6. Rekomenda ba Ministerio relevante hodi orienta nia Engenheiro sira hodi halo supervisaun maximo iha tereno
7. Rekomenda mos ba seksaun ITC atu aumenta facilidade Laptop ba iha Munisipiu tamba tekniku nain hat assesu dropbox iha laptop ida deit, hodi nune'e susar atu fahe servisu.
8. Rekomenda ba superior sira atu prepara printer nebe bele print kertas A3 no A4 hodi nune'e bele fasilita servisu iha Municipio.
9. Sujere ba Superior karik bele planu Inspeksaun kada fulan dala tolu (3) ba visita projetu sente todan ou la kobre
10. Husu atu aumenta tan rekursu humano (engenheiro mecanica e eletrica) iha Departamento Mecanica e Eletrica.
11. Husu ba ekipa base de dados atu kria folder iha Sistema drop box nebe bele relata imformasaun kona ba servisu konsultan design nian

Aneksu A

Detalha Progresu fisiku Infrastruturas Segundo Trimestral 2022

Abril

**Projeto 13 Municipios
Por Fundos
Finansiamiento**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	FI				LM-CD			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	\$ 48,277,505.03	\$ 29,822,680.78	61.77%	14	\$ 3,762,792.92	\$ 1,123,740.98	29.86%
2	Ainaro	25	\$ 89,729,809.82	\$ 78,614,361.16	87.61%	17	\$ 3,008,653.96	\$ 945,845.39	31.44%
3	Baucau	24	\$ 133,969,033.60	\$ 91,530,110.60	68.32%	17	\$ 4,861,686.43	\$ 1,246,110.10	25.63%
4	Bobonaro	24	\$ 42,470,567.79	\$ 24,670,835.56	58.09%	14	\$ 3,928,103.04	\$ 1,752,195.18	44.61%
5	Covalima	29	\$ 123,256,217.59	\$ 105,448,228.54	85.55%	10	\$ 2,096,239.50	\$ 662,463.80	31.60%
6	Dili	73	\$ 258,941,665.36	\$ 162,268,650.81	62.67%	64	\$ 17,459,891.23	\$ 6,984,149.31	40.00%
7	Ermera	13	\$ 18,547,937.15	\$ 13,848,477.69	74.66%	7	\$ 1,356,638.14	\$ 289,626.12	21.35%
8	Lautem	14	\$ 32,905,711.12	\$ 25,147,469.59	76.42%	14	\$ 4,004,962.53	\$ 1,681,540.67	41.99%
9	Liquica	11	\$ 13,445,245.34	\$ 10,031,035.87	74.61%	25	\$ 3,314,058.24	\$ 317,280.42	9.57%
10	Manatuto	13	\$ 131,346,907.75	\$ 103,680,517.95	78.94%	18	\$ 4,288,931.05	\$ 813,708.30	19.06%
11	Manufahi	21	\$ 17,093,297.24	\$ 11,340,094.87	66.34%	17	\$ 2,691,128.65	\$ 1,249,073.45	46.41%
12	Nasional	6	\$ 43,081,867.42	\$ 32,785,346.25	76.10%	1	\$ 46,872,339.00	\$ 29,682,899.05	63.33%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%				
14	Regional	2	\$ 32,032,062.14	\$ 11,237,401.24	35.08%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
15	Viqueque	24	\$ 59,413,345.74	\$ 30,562,768.83	51.44%	10	\$ 3,838,970.62	\$ 949,991.69	24.75%
	Grand Total	297	\$ 1,046,864,494.74	\$ 732,840,547.59	70.00%	229	\$ 154,489,996.31	\$ 85,285,513.58	55.20%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	PDIM				LM-BS			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					4	\$ 1,568,065.11	\$ 823,506.49	52.52%
2	Ainaro	8	\$ 946,258.21	\$ 665,533.49	70.33%	3	\$ 565,845.40	\$ 498,028.88	88.02%
3	Baucau	8	\$ 863,550.68	\$ 387,406.75	44.86%	6	\$ 1,107,575.09	\$ 382,024.96	34.49%
4	Bobonaro	8	\$ 746,047.73	\$ 509,771.16	68.33%	4	\$ 860,900.42	\$ 494,898.58	57.49%
5	Covalima	3	\$ 592,720.70	\$ 504,661.47	85.14%	3	\$ 575,995.90	\$ 255,350.34	44.33%
6	Dili	6	\$ 998,304.29	\$ 852,674.80	85.41%	49	\$ 5,918,127.59	\$ 3,066,463.79	51.81%
7	Ermera	5	\$ 845,470.49	\$ 689,901.14	81.60%	2	\$ 365,450.73	\$ 87,439.28	23.93%
8	Lautem	2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%	6	\$ 1,103,542.01	\$ 541,687.21	49.09%
9	Liquica	5	\$ 722,133.98	\$ 278,035.53	38.50%	11	\$ 1,574,555.51	\$ 909,883.93	57.79%
10	Manatuto	12	\$ 1,596,152.81	\$ 1,026,986.21	64.34%	6	\$ 1,160,391.31	\$ 446,513.42	38.48%
11	Manufahi	7	\$ 1,205,539.81	\$ 811,593.88	67.32%	5	\$ 1,464,659.68	\$ 961,897.04	65.67%
12	Nasional					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
13	Oe-cusse								
14	Regional					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
15	Viqueque	2	\$ 355,840.92	\$ 292,976.54	82.33%	3	\$ 300,989.41	\$ 77,967.95	25.90%
	Grand Total	66	\$ 9,269,358.47	\$ 6,019,540.97	64.94%	104	\$ 17,009,742.54	\$ 8,871,806.93	52.16%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	LM-TP				Fundo Covid-19			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Alleu	14	\$ 1,617,454.43	\$ 217,004.28	13.42%	3	\$ 475,384.99	\$ 306,425.82	64.46%
2	Ainaro	17	\$ 1,665,991.99	\$ 86,232.55	5.18%	1	\$ 140,000.00	\$ 74,391.78	53.14%
3	Baucau	29	\$ 3,000,775.19	\$ -	0.00%	1	\$ 469,360.62	\$ 207,010.64	44.10%
4	Bobonaro	23	\$ 3,106,600.00	\$ 301,021.90	9.69%	5	\$ 729,315.76	\$ 544,672.64	74.68%
5	Covalima	17	\$ 2,921,378.69	\$ 941,722.09	32.24%	3	\$ 523,160.22	\$ 367,225.35	70.19%
6	Dili	24	\$ 11,248,554.33	\$ 3,954,520.14	35.16%	5	\$ 1,828,899.27	\$ 777,778.99	42.53%
7	Ermera	20	\$ 2,252,742.01	\$ 25,966.19	1.15%	2	\$ 334,327.32	\$ 202,560.49	60.59%
8	Lautem	16	\$ 1,702,312.60	\$ -	0.00%	2	\$ 373,420.03	\$ 254,295.00	68.10%
9	Liquica	13	\$ 1,123,528.85	\$ -	0.00%	4	\$ 433,364.88	\$ 256,424.78	59.17%
10	Manatuto	10	\$ 872,256.79	\$ -	0.00%	4	\$ 665,658.27	\$ 210,411.73	31.61%
11	Manufahi	15	\$ 1,566,878.39	\$ -	0.00%	3	\$ 383,412.81	\$ 264,206.28	68.91%
12	Nasional								
13	Oe-cusse								
14	Regional								
15	Viqueque	18	\$ 1,781,168.18	\$ -					
Grand Total		216	\$ 32,879,641.45	\$ 5,526,467.15	16.81%	33	\$ 6,356,304.17	\$ 3,465,401.50	54.52%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	Emergency				TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					49	\$ 55,701,202.48	\$ 32,293,358.35	57.98%
2	Ainaro					71	\$ 96,056,559.38	\$ 80,884,393.25	84.20%
3	Baucau					85	\$ 144,271,981.61	\$ 93,752,663.05	64.98%
4	Bobonaro					78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,273,395.02	54.54%
5	Covalima					65	\$ 129,965,712.60	\$ 108,179,651.59	83.24%
6	Dili	8	\$ 1,153,463.13	\$ 767,926.79	66.58%	229	\$ 297,548,905.20	\$ 178,672,162.63	60.05%
7	Ermera					49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,143,970.91	63.89%
8	Lautem					54	\$ 40,487,287.14	\$ 27,624,992.47	68.23%
9	Liquica	1	\$ 502,473.28	\$ 441,060.32	87.78%	70	\$ 21,115,360.08	\$ 12,233,720.85	57.94%
10	Manatuto					63	\$ 139,910,297.98	\$ 106,178,137.61	75.89%
11	Manufahi					68	\$ 24,424,916.58	\$ 14,626,865.52	59.89%
12	Nasional					8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,532,824.76	69.46%
13	Oe-cusse					4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional					4	\$ 85,431,329.14	\$ 49,085,855.96	57.46%
15	Viqueque					57	\$ 65,690,314.87	\$ 31,883,705.01	48.54%
	Grand Total	9	\$ 1,655,936.41	\$ 1,208,987.11	73.01%	954	\$ 1,268,525,474.09	\$ 843,218,264.83	66.47%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P.

Abril

**Projeto 13 Municipios
Por Sector**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Alieu				Ainaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 827,410.00	\$ 74,466.90	9.00%				
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	4	\$ 1,079,346.48	\$ 431,394.76	39.97%	5	\$ 870,743.09	\$ 219,391.60	25.20%
7	EDUKASAUN	13	\$ 1,313,542.97	\$ -	0.00%	19	\$ 2,292,232.62	\$ 322,192.38	14.06%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 1,001,069.36	\$ 760,462.94	75.97%	10	\$ 7,999,431.74	\$ 5,471,157.66	68.39%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS	11	\$ 17,781,742.37	\$ 14,389,448.16	80.92%	10	\$ 18,116,584.48	\$ 11,284,281.49	62.29%
11	FLOOD CONTROL					1	\$ 98,821.63	\$ 96,332.33	97.48%
12	IMPRESTIMO	4	\$ 30,387,163.09	\$ 15,045,148.91	49.51%	3	\$ 59,201,316.40	\$ 58,542,548.00	98.89%
13	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	\$ 1,320,533.03	\$ 747,673.66	56.62%	17	\$ 3,237,083.74	\$ 1,893,473.16	58.49%
16	PONTES					2	\$ 3,869,397.22	\$ 2,837,687.37	73.34%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	2	\$ 1,025,800.00	\$ 483,296.23	47.11%				
19	SAUDE	3	\$ 494,193.39	\$ 111,073.28	22.48%	2	\$ 242,372.02	\$ 102,008.96	42.09%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	\$ 33,389.23	20.05%				
23	TURISMO	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
	Grand Total	49	\$ 55,701,202.48	\$ 32,293,358.35	57.98%	71	\$ 96,056,559.38	\$ 80,884,393.25	84.20%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	1	\$ 316,447.42	\$ 81,377.54	25.72%	2	\$ 373,662.01	\$ 108,424.87	29.02%
3	AGUA E SANEAMENTO					3	\$ 511,112.23	\$ 443,532.84	86.78%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	13	\$ 1,999,417.79	\$ 449,961.40	22.50%	3	\$ 770,809.57	\$ 277,437.78	35.99%
7	EDUKASAUN	31	\$ 3,743,421.04	\$ 624,596.30	16.69%	21	\$ 2,409,512.03	\$ -	0.00%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	10	\$ 3,110,591.49	\$ 2,553,398.81	82.09%	8	\$ 2,152,484.95	\$ 1,606,554.18	74.64%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS	17	\$ 22,189,429.73	\$ 11,173,313.81	50.35%	15	\$ 16,841,802.59	\$ 9,263,742.31	55.00%
11	FLOOD CONTROL					2	\$ 437,194.54	\$ 36,987.35	8.46%
12	IMPRESTIMO	4	\$ 109,889,602.64	\$ 76,859,856.95	69.94%	1	\$ 20,748,566.21	\$ 13,773,957.09	66.39%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	8	\$ 2,553,710.88	\$ 1,803,147.60	70.61%	5	\$ 1,317,219.88	\$ 666,238.28	50.58%
16	PONTES					1	\$ 2,860,755.63	\$ 581,091.24	20.31%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	1	\$ 469,360.62	\$ 207,010.64	44.10%	16	\$ 2,536,031.77	\$ 1,455,141.12	57.38%
20	SEGURANCA NO DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 60,287.96	6.83%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
Grand Total		85	\$ 144,271,981.61	\$ 93,752,663.05	64.98%	78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,273,395.02	54.54%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Covallima				Dili			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNETAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNETAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%	1	\$ 1,100,000.00	\$ 600,000.00	54.55%
2	AGRICULTURA					1	\$ 273,270.70	\$ 191,289.49	70.00%
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	21	\$ 6,682,282.66	\$ 3,769,543.21	56.41%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					1	\$ 781,121.90	\$ 222,619.74	28.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	9	\$ 2,585,789.57	\$ 1,309,506.53	50.64%	57	\$ 32,904,859.36	\$ 13,107,841.22	39.84%
7	EDUKASAUN	17	\$ 1,902,349.46	\$ 154,742.01	8.13%	23	\$ 4,491,950.51	\$ 528,937.80	11.78%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 2,730,729.02	\$ 1,670,874.34	61.19%	21	\$ 7,103,218.29	\$ 4,385,763.75	61.74%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO					2	\$ 1,209,890.98	\$ 981,869.25	81.15%
10	ESTRADAS	17	\$ 38,289,259.71	\$ 27,529,004.63	71.90%	35	\$ 45,040,253.42	\$ 25,040,840.54	55.60%
11	FLOOD CONTROL	2	\$ 821,328.14	\$ 193,054.93	23.51%	4	\$ 923,846.66	\$ 688,688.66	74.55%
12	IMPRESTIMO					6	\$ 170,621,744.75	\$ 120,447,367.69	70.59%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					8	\$ 3,303,412.24	\$ 1,670,011.31	50.55%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	\$ 1,507,681.83	\$ 946,253.70	62.76%	22	\$ 2,494,823.18	\$ 1,636,129.71	65.58%
16	PONTES	2	\$ 8,755,658.60	\$ 8,368,537.76	95.58%	2	\$ 238,814.51	\$ -	0.00%
17	PORTOS					2	\$ 846,710.87	\$ 339,787.68	40.13%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					8	\$ 2,472,606.35	\$ 1,178,205.27	47.65%
19	SAUDE	3	\$ 677,541.93	\$ 495,598.98	73.15%	8	\$ 2,113,445.85	\$ 704,435.49	33.33%
20	SEGURANCA NO DEFESA					2	\$ 10,771,998.20	\$ 174,219.47	1.62%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,466,564.84	79.40%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
23	TURISMO					3	\$ 618,619.54	\$ 187,790.95	30.36%
	Grand Total	65	\$ 129,965,712.60	\$ 108,179,651.59	83.24%	229	\$ 297,649,905.20	\$ 178,672,162.63	60.05%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Ermera			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Lautem			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	4	\$ 448,959.83	\$ 146,375.20	32.60%	3	\$ 815,564.95	\$ 286,056.46	35.07%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	24	\$ 3,162,567.78	\$ 25,986.19	0.82%	7	\$ 2,541,042.26	\$ 845,259.70	33.26%
7	EDUKASAUN	1	\$ 368,226.28	\$ 277,666.37	75.41%	17	\$ 1,768,646.52	\$ 57,143.15	3.23%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	9	\$ 6,825,025.51	\$ 5,362,124.31	78.57%	2	\$ 1,026,193.79	\$ 718,131.88	69.98%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	3	\$ 11,486,392.80	\$ 8,273,990.94	72.03%	18	\$ 32,857,515.82	\$ 24,704,473.43	75.19%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO								
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 388,544.22	\$ 364,344.79	93.77%	3	\$ 601,385.25	\$ 326,780.52	54.34%
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 693,503.11	67.80%	2	\$ 373,420.03	\$ 254,295.00	68.10%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
23	TURISMO					1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
	Grand Total	49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,143,970.91	63.89%	54	\$ 40,487,287.14	\$ 27,624,992.47	68.23%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Liquida			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Manatuto			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	2	\$ 91,877.21	\$ 80,662.08	87.79%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
3	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 293,629.77	\$ 167,315.56	56.98%	1	\$ 162,377.94	\$ 67,961.57	41.85%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 210,635.04	\$ -	0.00%	9	\$ 1,430,360.48	\$ 255,380.51	17.85%
7	EDUKASAUN	18	\$ 1,956,926.91	\$ 302,946.05	15.48%	12	\$ 1,236,740.28	\$ 286,572.59	23.17%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 1,670,588.86	\$ 1,297,809.30	77.69%	2	\$ 1,076,003.44	\$ 845,364.30	78.57%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	24	\$ 5,012,524.75	\$ 2,016,370.42	40.23%	19	\$ 13,075,209.38	\$ 8,092,650.00	61.89%
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 502,473.28	\$ 441,060.32	87.78%	1	\$ 242,560.14	\$ 154,455.92	63.68%
12	IMPRESTIMO	1	\$ 7,693,101.00	\$ 5,795,051.15	75.33%	4	\$ 115,112,106.35	\$ 91,100,199.71	79.14%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	\$ 1,522,380.50	\$ 1,066,681.96	70.07%	2	\$ 157,560.52	\$ 66,113.10	41.96%
16	PONTES					1	\$ 3,384,214.14	\$ 2,733,851.74	80.78%
17	PORTOS	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	4	\$ 433,364.88	\$ 256,424.78	59.17%	7	\$ 840,178.96	\$ 521,547.59	62.08%
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%	2	\$ 305,556.27	\$ 87,571.99	28.66%
	Grand Total	70	\$ 21,115,360.08	\$ 12,233,720.85	57.94%	63	\$ 139,910,297.98	\$ 106,178,137.61	75.89%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Manufahi				PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Nasional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)			TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS									
2	AGRICULTURA						1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
3	AGUA E SANEAMENTO	5	\$ 444,587.79	\$ 184,573.83		41.52%	1	\$ 2,903,356.59	\$ 1,473,965.57	50.77%
4	COMERCIO									
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 610,160.22	\$ 405,808.45		66.51%				
7	EDUKASAUN	15	\$ 1,586,878.39	\$ -						
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 3,653,988.20	\$ 3,004,275.07		82.22%	1	\$ 46,872,339.00	\$ 29,682,899.05	63.33%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO						2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	91.99%
10	ESTRADAS	21	\$ 13,196,382.44	\$ 7,584,537.15		57.47%				
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 269,482.11	\$ 40,316.95		14.96%				
12	IMPRESTIMO						1	\$ 12,964,487.49	\$ 10,828,352.80	83.52%
13	IRIGASAUN									
14	JUVENITUDE NO DESPORTU	1	\$ 23,697.55	\$ 19,014.76		80.24%				
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	10	\$ 3,336,878.09	\$ 2,491,650.40		74.67%				
16	PONTES	1	\$ 328,755.98	\$ 153,014.54		46.54%				
17	PORTOS									
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS									
19	SAUDE	2	\$ 312,000.61	\$ 255,869.88		82.01%				
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 76,149.37	\$ -		0.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUORTAS INFRAESTRUTURAS									
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 536,957.37	\$ 471,912.41		87.89%				
23	TURISMO	1	\$ 48,998.46	\$ 15,892.08		32.43%				
	Grand Total	68	\$ 24,424,916.58	\$ 14,626,865.52		59.89%	8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,532,824.76	69.46%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO								
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS								
7	EDUKASAUN								
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO					2	\$ 32,032,062.14	\$ 11,237,401.24	35.08%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN								
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE								
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
	Grand Total	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 49,085,855.96	57.46%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Viqueque			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO KOMULATIVO (\$)		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	3	\$ 5,472,502.45	\$ 4,041,786.34	73.86%	11	\$ 6,968,249.42	\$ 4,626,765.65	66.40%
3	AGUA E SANEAMENTO					43	\$ 13,353,663.56	\$ 6,878,172.94	51.51%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					3	\$ 24,631,890.50	\$ 17,611,806.26	71.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	25	\$ 3,695,589.43	\$ 369,791.76	10.01%	161	\$ 51,861,321.07	\$ 17,697,739.90	34.13%
7	EDUKASAUN					187	\$ 23,070,427.01	\$ 2,554,796.65	11.07%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	4	\$ 2,296,509.09	\$ 1,504,022.77	65.49%	89	\$ 141,236,922.99	\$ 96,808,140.18	68.54%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO					4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,075,710.61	89.12%
10	ESTRADAS	22	\$ 52,858,602.47	\$ 25,267,811.17	47.80%	213	\$ 287,119,365.96	\$ 174,882,029.65	60.91%
11	FLOOD CONTROL					12	\$ 3,295,706.50	\$ 1,650,896.46	50.09%
12	IMPRESTIMO					26	\$ 558,650,150.07	\$ 403,629,883.54	72.25%
13	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
14	JUVITUDE NO DESPORTU					10	\$ 5,690,086.23	\$ 3,484,869.96	61.24%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	\$ 154,392.39	25.35%	90	\$ 19,046,822.17	\$ 12,162,879.27	63.86%
16	PONTES	1	\$ 758,090.38	\$ 545,900.59	72.01%	10	\$ 20,195,686.46	\$ 15,220,083.24	75.36%
17	PORTOS					3	\$ 2,241,460.87	\$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					10	\$ 3,498,406.35	\$ 1,661,501.50	47.49%
19	SAUDE					54	\$ 9,514,759.48	\$ 5,056,908.83	53.15%
20	SEGURANCA NO DEFESA					6	\$ 13,448,811.18	\$ 1,776,285.89	13.21%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,466,564.84	79.40%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					6	\$ 1,570,981.66	\$ 1,217,734.53	77.51%
23	TURISMO					10	\$ 1,733,927.24	\$ 769,667.85	44.39%
	Grand Total	57	\$ 65,690,314.87	\$ 31,883,705.01	48.54%	954	\$ 1,268,525,474.09	\$ 843,218,264.83	66.47%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ormai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Abril

**Projeto 13 Municípios
Por Ministério**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Alieu			Alnaro				
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL					3	\$ 275,266.70	\$ 234,402.15	85.15%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MENISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN								
10	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS					1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
11	MINISTERIO DA DEFESA								
12	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	\$ 178,371.29	89.19%				
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	25	\$ 51,868,717.85	\$ 31,402,760.57	60.54%	40	\$ 91,909,713.75	\$ 79,777,902.78	86.80%
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	14	\$ 1,484,622.27	\$ -	0.00%	20	\$ 2,316,678.62	\$ 344,193.78	14.86%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	\$ 97,736.23	20.58%				
18	MINISTERIO FINANÇAS								
19	Ministerio Koordinator Asunttu Ekonomikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	\$ -	0.00%	1	\$ 489,653.83	\$ 229,243.50	46.82%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 7,700.00	\$ 6,930.00	90.00%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 775,330.57	\$ 364,096.75	46.96%	3	\$ 382,372.02	\$ 176,400.74	46.13%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	\$ 33,389.23	7.03%	1	\$ 546,598.02	\$ -	0.00%
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		49	\$ 55,701,202.48	\$ 32,293,358.35	57.98%	71	\$ 96,056,559.38	\$ 80,884,393.25	84.20%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Baucau			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Bobonaro			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL	7	\$ 798,108.36	\$ 328,508.66	41.16%	1	\$ 15,508.35	\$ 9,975.03	64.32%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					1	\$ 564,695.97	\$ 221,586.70	39.24%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO SOLIDARIDADE SOCIAL E INCLUZAUN								
10	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 316,447.42	\$ 81,377.54	25.72%	2	\$ 373,662.01	\$ 108,424.87	29.02%
11	MINISTERIO DA DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 60,287.96	6.83%
12	MINISTERIO DA JUSTICA								
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	\$ 137,763,172.77	\$ 92,407,571.40	67.08%	35	\$ 45,020,840.95	\$ 26,333,876.12	58.49%
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	31	\$ 3,743,421.04	\$ 624,596.30	16.69%	22	\$ 2,541,904.03	\$ 79,435.20	3.13%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANÇAS					1	\$ 190,605.25	\$ 45,876.05	24.07%
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekotónikuk								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	2	\$ 782,313.77	\$ -	0.00%				
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 220,190.97	\$ 192,487.56	87.42%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 748,725.31	\$ 280,126.15	37.41%	14	\$ 2,031,743.88	\$ 1,221,445.53	60.12%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 50,000.00	\$ 30,483.00	60.97%				
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ -	0.00%				
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
Grand Total		85	\$ 144,271,981.81	\$ 93,752,663.06	64.98%	78	\$ 81,841,534.74	\$ 28,273,396.02	54.54%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Covallima				Dili			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC					1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega					2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25	63.30%
3	CFP					1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRESA					1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
5	ESTATAL					7	\$ 493,677.26	\$ 277,251.76	56.16%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	\$ 1,186,660.00	\$ 941,722.09	78.70%	7	\$ 9,107,620.21	\$ 3,614,732.46	39.69%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75	82.11%
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO SOLIDARIDADE SOCIAL E INCLUZAUN								
10	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 260,523.18	\$ 193,054.93	74.10%	2	\$ 292,519.73	\$ 209,738.52	71.70%
11	MINISTERIO DA DEFESA					7	\$ 1,732,797.07	\$ 800,795.95	46.21%
12	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 149,282.80	\$ -	0.00%	5	\$ 593,610.53	\$ 92,258.11	15.54%
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	32	\$ 51,844,134.12	\$ 38,514,670.43	74.29%	107	\$ 235,898,774.01	\$ 158,607,400.07	67.24%
15	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 337,328.10	\$ -	0.00%	3	\$ 10,861,982.32	\$ 250,277.24	2.30%
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	\$ 2,085,678.26	\$ 154,742.01	7.42%	21	\$ 3,010,898.52	\$ 771,031.16	25.61%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					1	\$ 7,583.06	\$ 6,599.24	87.03%
18	MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 4,206,435.00	\$ 3,086,564.84	72.90%
19	Ministerio Koordinator Asunttu Ekonomikus					1	\$ 119,578.85	\$ 45,153.74	37.76%
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					3	\$ 1,434,737.07	\$ 135,605.75	9.45%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	6	\$ 1,007,079.87	\$ 401,315.15	39.85%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE	7	\$ 1,363,630.74	\$ 839,557.85	61.57%	13	\$ 3,394,018.46	\$ 1,584,277.95	46.68%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%	4	\$ 945,411.78	\$ 345,592.73	36.55%
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIU E INDUSTRIA	1	\$ 33,091.06	\$ 23,825.57	72.00%	4	\$ 756,542.64	\$ 294,507.14	38.93%
27	PARLAMENTU NASIONAL					1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43	90.00%
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					1	\$ 556,612.74	\$ 499,422.83	89.73%
29	RADIO TELEVISAU TIMOR LESTE					1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					7	\$ 3,280,552.90	\$ 1,639,366.50	50.28%
33	SEFOPE					1	\$ 460,254.00	\$ 339,787.68	73.83%
34	TRADE INVEST					1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
35	TRIBUNAL RECUSSO					3	\$ 11,680,926.39	\$ 2,978,884.91	25.50%
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E					10	\$ 6,013,776.15	\$ 1,752,021.12	29.13%
	Grand Total	65	\$ 129,965,712.60	\$ 108,179,651.59	83.24%	229	\$ 297,548,905.20	\$ 178,672,162.63	60.05%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Emira			Lautem				
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL					2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO SOLIDARIDADE SOSIAL E INCLUZAUN								
10	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS								
11	MINISTERIO DA DEFESA								
12	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 160,056.02	\$ -	0.00%				
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	18	\$ 19,148,922.36	\$ 14,146,835.24	73.88%	26	\$ 35,300,659.81	\$ 26,035,442.29	73.75%
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	23	\$ 3,012,002.58	\$ 277,666.37	9.22%	18	\$ 2,076,363.17	\$ 57,143.15	2.75%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANÇAS					1	\$ 56,783.85	\$ 45,907.81	80.85%
19	Ministerio Koordinator Asunttu Ekonomikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 358,735.46	\$ 25,966.19	7.24%				
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 788,921.55	\$ 387,253.22	49.09%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 693,503.11	67.80%	3	\$ 653,626.75	\$ 316,403.73	48.41%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA					1	\$ 710,074.64	\$ 349,989.94	49.29%
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE					1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		49	\$ 23,702,665.84	\$ 15,143,970.91	63.89%	54	\$ 40,487,287.14	\$ 27,624,992.47	68.23%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Liquida			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Manatudo			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL	3	\$ 387,568.54	\$ -	0.00%	4	\$ 567,521.53	\$ 317,298.93	55.91%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO SOLIDARIDADE SOCIAL E INCLUZAUN								
10	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$ 139,176.53	\$ 118,527.60	85.16%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
11	MINISTERIO DA DEFESA								
12	MINISTERIO DA JUSTICA					1	\$ 29,275.84	\$ 4,660.85	15.92%
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	38	\$ 16,370,980.54	\$ 10,663,920.50	65.14%	30	\$ 133,210,031.91	\$ 103,060,596.34	77.37%
15	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	\$ 1,956,926.91	\$ 302,946.05	15.48%	13	\$ 1,303,638.79	\$ 286,572.59	21.98%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANÇAS								
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					1	\$ 408,460.73	\$ 3,256.60	0.80%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 99,484.80	\$ 82,502.69	82.93%	1	\$ 277,330.43	\$ -	0.00%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 433,364.88	\$ 256,424.76	59.17%	9	\$ 1,175,863.67	\$ 521,547.59	44.35%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%	2	\$ 204,687.39	\$ 129,714.95	63.37%
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
Grand Total		70	\$ 21,115,350.08	\$ 12,233,720.85	57.94%	63	\$ 139,910,297.98	\$ 106,178,137.61	75.89%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Manufahi				PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Nasional			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)			TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC									
2	Centro Nacional Chega									
3	CFP									
4	CONSELHO DA EMPRESA									
5	ESTATAL	5	\$ 575,943.14	\$ 502,200.33		87.20%	2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.35	91.99%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO									
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES									
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR									
9	MINISTERIO SOLIDARIDADE SOCIAL E INCLUZAUN									
10	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS						1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
11	MINISTERIO DA DEFESA									
12	MINISTERIO DA JUSTICA									
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS									
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	41	\$ 21,214,786.39	\$ 13,447,094.78		63.39%	3	\$ 62,740,183.08	\$ 41,985,217.42	66.92%
15	MINISTERIO DO INTERIOR	2	\$ 436,263.93	\$ 269,076.60		61.68%				
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	15	\$ 1,586,878.39	\$ -		0.00%				
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA									
18	MINISTERIO FINANÇAS									
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus									
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 48,988.46	\$ 15,892.08		32.43%				
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU									
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS						2	\$ 23,850,788.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
23	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 383,412.81	\$ 264,206.28		68.91%				
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN									
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN									
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 178,633.46	\$ 128,395.45		71.88%				
27	PARLAMENTU NASIONAL									
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA									
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE									
30	SAMES									
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN									
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU									
33	SEFOPE									
34	TRADE INVEST									
35	TRIBUNAL RECUSSO									
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E									
Grand Total		68	\$ 24,424,916.68	\$ 14,526,865.52		59.89%	8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,532,824.76	69.45%

Maio

**Projeto 13 Municipios
Por Fundos
Finansiamiento**



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	FI				LM-CD			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	\$ 48,277,505.03	\$ 29,822,680.78	61.77%	19	\$ 4,490,679.95	\$ 1,241,791.36	27.65%
2	Ainaro	25	\$ 89,729,809.82	\$ 78,628,335.16	87.61%	17	\$ 3,008,653.96	\$ 969,681.15	32.23%
3	Baucau	24	\$ 133,969,033.60	\$ 93,802,316.54	70.02%	17	\$ 4,861,686.43	\$ 1,561,889.13	32.13%
4	Bobonaro	24	\$ 42,470,567.79	\$ 24,670,835.56	58.09%	14	\$ 3,928,103.04	\$ 1,925,683.06	49.02%
5	Covalima	30	\$ 123,627,413.78	\$ 105,642,364.75	85.45%	11	\$ 2,643,602.32	\$ 767,128.63	29.02%
6	Dili	73	\$ 259,311,507.36	\$ 163,503,304.75	63.05%	66	\$ 18,336,545.28	\$ 7,819,437.87	42.64%
7	Ermera	13	\$ 18,547,937.15	\$ 13,848,477.69	74.66%	7	\$ 1,356,638.14	\$ 289,626.12	21.35%
8	Lautem	14	\$ 32,905,711.12	\$ 25,151,719.78	76.44%	14	\$ 4,004,962.53	\$ 1,838,355.36	45.90%
9	Liquica	11	\$ 13,445,245.34	\$ 10,031,035.87	74.61%	25	\$ 3,314,058.24	\$ 324,427.27	9.79%
10	Manatuto	13	\$ 131,346,907.75	\$ 105,936,055.04	80.65%	18	\$ 4,268,931.05	\$ 1,042,135.42	24.41%
11	Manufahi	21	\$ 17,093,297.24	\$ 11,944,627.25	69.88%	18	\$ 2,823,022.46	\$ 1,385,120.52	49.07%
12	Nasional	8	\$ 45,592,467.42	\$ 33,011,300.25	72.41%	2	\$ 47,644,384.03	\$ 29,682,899.05	62.30%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%				
14	Regional	2	\$ 32,032,062.14	\$ 11,237,401.24	35.08%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
15	Viqueque	24	\$ 59,413,345.74	\$ 30,562,768.83	51.44%	10	\$ 3,838,970.62	\$ 883,712.28	23.02%
Grand Total		300	\$ 1,050,116,132.93	\$ 739,645,791.34	70.43%	239	\$ 157,545,839.05	\$ 87,318,776.34	55.42%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	PDIM				LM-BS			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					4	\$ 1,568,065.11	\$ 893,031.51	56.95%
2	Ainaro	8	\$ 946,258.21	\$ 686,767.25	72.58%	3	\$ 565,845.40	\$ 527,769.63	93.27%
3	Baucau	8	\$ 863,550.68	\$ 387,406.75	44.86%	6	\$ 1,107,575.09	\$ 443,414.69	40.03%
4	Bobonaro	8	\$ 746,047.73	\$ 509,771.16	68.33%	4	\$ 860,900.42	\$ 528,819.12	61.43%
5	Covalima	3	\$ 592,720.70	\$ 521,855.03	88.04%	3	\$ 575,995.90	\$ 255,350.34	44.33%
6	Dili	6	\$ 998,304.29	\$ 852,674.80	85.41%	50	\$ 5,967,727.59	\$ 3,381,581.00	56.66%
7	Ermera	5	\$ 845,470.49	\$ 689,901.14	81.60%	2	\$ 365,450.73	\$ 87,439.28	23.93%
8	Lautem	2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%	6	\$ 1,103,542.01	\$ 541,687.21	49.09%
9	Liquica	5	\$ 722,133.98	\$ 278,035.53	38.50%	11	\$ 1,574,555.51	\$ 909,883.93	57.79%
10	Manatuto	12	\$ 1,596,152.81	\$ 1,048,062.00	65.66%	6	\$ 1,160,391.31	\$ 446,513.42	38.48%
11	Manufahi	7	\$ 1,205,539.81	\$ 854,963.86	70.92%	5	\$ 1,464,659.68	\$ 969,202.31	66.17%
12	Nasional					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
13	Oe-cusse								
14	Regional					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
15	Viqueque	2	\$ 355,840.92	\$ 292,976.54	82.33%	3	\$ 300,989.41	\$ 77,967.95	25.90%
	Grand Total	66	\$ 9,269,358.47	\$ 6,122,414.06	66.05%	105	\$ 17,059,342.54	\$ 9,388,805.45	55.04%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	LM-TP				Fundo Covid-19			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	\$ 1,617,454.43	\$ 217,004.28	13.42%	3	\$ 475,384.99	\$ 306,425.82	64.46%
2	Ainaro	17	\$ 1,665,991.99	\$ 86,232.55	5.18%	3	\$ 242,067.62	\$ 120,512.49	49.78%
3	Baucau	29	\$ 3,000,775.19	\$ -	0.00%	1	\$ 469,360.62	\$ 329,188.84	70.14%
4	Bobonaro	23	\$ 3,106,600.00	\$ 301,021.90	9.69%	5	\$ 729,315.76	\$ 551,622.48	75.64%
5	Covalima	17	\$ 2,921,378.69	\$ 941,722.09	32.24%	3	\$ 523,160.22	\$ 385,354.53	73.66%
6	Dili	24	\$ 11,248,554.33	\$ 3,954,520.14	35.16%	5	\$ 1,828,899.27	\$ 777,776.99	42.53%
7	Ermera	20	\$ 2,252,742.01	\$ 84,063.99	3.73%	2	\$ 334,327.32	\$ 202,560.49	60.59%
8	Lautem	16	\$ 1,702,312.60	\$ -	0.00%	2	\$ 373,420.03	\$ 254,295.00	68.10%
9	Liquica	13	\$ 1,123,528.85	\$ -	0.00%	4	\$ 433,364.88	\$ 287,933.63	66.44%
10	Manatuto	10	\$ 872,256.79	\$ -	0.00%	4	\$ 665,658.27	\$ 273,641.01	41.11%
11	Manufahi	15	\$ 1,586,878.39	\$ -	0.00%	3	\$ 383,412.81	\$ 264,206.28	68.91%
12	Nasional								
13	Oe-cusse								
14	Regional								
15	Viqueque	18	\$ 1,755,736.68	\$ -	0.00%				
	Grand Total	216	\$ 32,854,209.95	\$ 5,584,564.95	17.00%	35	\$ 6,458,371.79	\$ 3,753,517.56	58.12%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	Emergency				TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					54	\$ 56,429,089.51	\$ 32,480,933.75	57.56%
2	Ainaro					73	\$ 96,158,627.00	\$ 81,019,298.23	84.24%
3	Baucau					85	\$ 144,271,981.61	\$ 96,524,215.95	66.90%
4	Bobonaro					78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,487,753.28	54.95%
5	Covalima					67	\$ 130,884,271.61	\$ 108,513,775.37	82.91%
6	Dili	9	\$ 5,033,096.85	\$ 771,325.75	15.33%	233	\$ 302,724,634.97	\$ 181,060,621.30	59.81%
7	Ermera					49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,202,068.71	64.14%
8	Lautem					54	\$ 40,487,287.14	\$ 27,786,057.35	68.63%
9	Liquica	1	\$ 502,473.28	\$ 441,060.32	87.78%	70	\$ 21,115,360.08	\$ 12,272,376.55	58.12%
10	Manatuto					63	\$ 139,910,297.98	\$ 108,746,406.89	77.73%
11	Manufahi					69	\$ 24,556,810.39	\$ 15,418,120.22	62.79%
12	Nasional					11	\$ 93,306,829.83	\$ 62,758,778.76	67.26%
13	Oe-cusse					4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional					4	\$ 85,431,329.14	\$ 49,085,855.96	57.46%
15	Viqueque					57	\$ 65,664,883.37	\$ 31,817,425.60	48.45%
	Grand Total	10	\$ 5,535,570.13	\$ 1,212,386.07	21.90%	971	\$ 1,278,838,824.86	\$ 853,026,255.77	66.70%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P.

Maio

**Projeto 13 Municipios
Por Sector**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Aileu			Ainaro			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)				
1	AEROPORTOS											
2	AGRICULTURA											
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 827,410.00	\$ 74,466.90	9.00%							
4	COMERCIO											
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL											
6	EDIFICIOS PUBLICOS	4	\$ 1,079,346.48	\$ 431,394.76	39.97%	6	\$ 940,813.03	\$ 251,007.13	26.66%			
7	EDUKASAUN	13	\$ 1,313,542.97	\$ -	0.00%	19	\$ 2,292,232.62	\$ 343,426.14	14.98%			
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 1,001,069.36	\$ 760,462.94	75.97%	10	\$ 7,999,431.74	\$ 5,471,157.66	68.39%			
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO											
10	ESTRADAS	16	\$ 18,509,629.40	\$ 14,389,448.16	77.74%	10	\$ 18,116,584.48	\$ 11,284,281.49	62.29%			
11	FLOOD CONTROL					1	\$ 98,821.63	\$ 96,332.33	97.48%			
12	IMPRESTIMO	4	\$ 30,387,163.09	\$ 15,045,148.91	49.51%	3	\$ 59,201,316.40	\$ 58,556,522.00	98.91%			
13	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%			
14	JUVENTUDE NO DESPORTU											
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	\$ 1,320,533.03	\$ 747,673.66	56.62%	17	\$ 3,237,083.74	\$ 1,943,817.70	60.05%			
16	PONTES					2	\$ 3,869,397.22	\$ 2,837,687.37	73.34%			
17	PORTOS											
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	2	\$ 1,025,800.00	\$ 552,821.25	53.89%							
19	SAUDE	3	\$ 494,193.39	\$ 167,319.27	33.86%	3	\$ 274,369.70	\$ 116,514.14	42.47%			
20	SEGURANCA NO DEFESA											
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS											
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	\$ 95,193.62	57.18%							
23	TURISMO	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%			
Grand Total		54	\$ 56,429,089.51	\$ 32,480,933.75	57.56%	73	\$ 96,158,627.00	\$ 81,019,298.23	84.24%			



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	1	\$ 316,447.42	\$ 284,307.87	89.84%	2	\$ 373,662.01	\$ 108,424.87	29.02%
3	AGUA E SANEAMENTO					3	\$ 511,112.23	\$ 443,532.84	86.78%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	13	\$ 1,999,417.79	\$ 592,767.00	29.65%	3	\$ 770,809.57	\$ 311,358.32	40.39%
7	EDUKASAUN	31	\$ 3,743,421.04	\$ 624,596.30	16.69%	21	\$ 2,409,512.03	\$ -	0.00%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	10	\$ 3,110,591.49	\$ 2,553,398.81	82.09%	8	\$ 2,152,484.95	\$ 1,606,554.18	74.64%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	17	\$ 22,189,429.73	\$ 11,204,746.64	50.50%	15	\$ 16,841,802.59	\$ 9,263,742.31	55.00%
11	FLOOD CONTROL					2	\$ 437,194.54	\$ 36,987.35	8.46%
12	IMPRESTIMO	4	\$ 109,889,602.64	\$ 79,132,062.89	72.01%	1	\$ 20,748,566.21	\$ 13,773,957.09	66.39%
13	IRIGASAUN								
14	JUVVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	8	\$ 2,553,710.88	\$ 1,803,147.60	70.61%	5	\$ 1,317,219.88	\$ 666,238.28	50.58%
16	PONTES					1	\$ 2,860,755.63	\$ 581,091.24	20.31%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	1	\$ 469,360.62	\$ 329,188.84	70.14%	16	\$ 2,536,031.77	\$ 1,635,578.84	64.49%
20	SEGURANCA NO DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 60,287.96	6.83%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
	Grand Total	85	\$ 144,271,981.61	\$ 96,524,215.95	66.90%	78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,487,753.28	54.95%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Covallima				Dili			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%	1	\$ 1,100,000.00	\$ 600,000.00	54.55%
2	AGRICULTURA					1	\$ 273,270.70	\$ 191,289.49	70.00%
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	21	\$ 6,682,282.66	\$ 4,184,431.88	62.62%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					1	\$ 781,121.90	\$ 222,619.74	28.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	9	\$ 2,585,789.57	\$ 1,418,307.86	54.85%	58	\$ 33,324,301.36	\$ 14,176,172.67	42.54%
7	EDUKASAUN	17	\$ 1,902,349.46	\$ 171,935.57	9.04%	23	\$ 4,491,950.51	\$ 541,808.61	12.06%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 2,730,729.02	\$ 1,670,874.34	61.19%	21	\$ 7,103,218.29	\$ 4,385,763.75	61.74%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO					2	\$ 1,209,890.98	\$ 981,869.25	81.15%
10	ESTRADAS	19	\$ 39,207,818.72	\$ 27,723,140.84	70.71%	37	\$ 48,986,634.92	\$ 25,554,696.21	52.17%
11	FLOOD CONTROL	2	\$ 821,328.14	\$ 193,054.93	23.51%	4	\$ 923,846.66	\$ 688,688.66	74.55%
12	IMPRESTIMO					6	\$ 170,621,744.75	\$ 120,447,367.69	70.59%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					8	\$ 3,303,412.24	\$ 1,670,011.31	50.55%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	\$ 1,507,681.83	\$ 960,246.38	63.69%	22	\$ 2,494,823.18	\$ 1,636,129.71	65.58%
16	PONTES	2	\$ 8,755,658.60	\$ 8,368,537.76	95.58%	2	\$ 238,814.51		0.00%
17	PORTOS					2	\$ 846,710.87	\$ 339,787.68	40.13%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					8	\$ 2,472,606.35	\$ 1,178,205.27	47.65%
19	SAUDE	3	\$ 677,541.93	\$ 495,598.98	73.15%	8	\$ 2,113,445.85	\$ 704,435.49	33.33%
20	SEGURANCA NO DEFESA					3	\$ 11,581,904.47	\$ 469,286.85	4.05%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,466,564.84	79.40%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
23	TURISMO					3	\$ 618,619.54	\$ 271,235.64	43.85%
Grand Total		67	\$ 130,884,271.61	\$ 108,513,775.37	82.91%	233	\$ 302,724,634.97	\$ 181,060,621.30	59.81%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROYECTO	Emera				Lautem			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	4	\$ 448,959.83	\$ 146,375.20	32.60%	3	\$ 815,564.95	\$ 286,056.46	35.07%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	24	\$ 3,162,567.78	\$ 84,063.99	2.66%	7	\$ 2,541,042.26	\$ 935,297.45	36.81%
7	EDUKASAUN	1	\$ 368,226.28	\$ 277,666.37	75.41%	17	\$ 1,768,646.52	\$ 57,143.15	3.23%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	9	\$ 6,825,025.51	\$ 5,362,124.31	78.57%	2	\$ 1,026,193.79	\$ 718,131.88	69.98%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	3	\$ 11,486,392.80	\$ 8,273,990.94	72.03%	18	\$ 32,857,515.82	\$ 24,771,250.37	75.39%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO								
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 388,544.22	\$ 364,344.79	93.77%	3	\$ 601,385.25	\$ 331,030.71	55.04%
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROYECTOS								
19	SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 693,503.11	67.80%	2	\$ 373,420.03	\$ 254,295.00	68.10%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
23	TURISMO					1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
	Grand Total	49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,202,068.71	64.14%	54	\$ 40,487,287.14	\$ 27,786,057.35	68.63%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Liquida				Manatuto			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	2	\$ 91,877.21	\$ 80,662.08	87.79%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
3	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 293,629.77	\$ 167,315.56	56.98%	1	\$ 162,377.94	\$ 67,961.57	41.85%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 210,635.04	\$ -	0.00%	9	\$ 1,430,360.48	\$ 421,619.99	29.48%
7	EDUKASAUN	18	\$ 1,956,926.91	\$ 302,946.05	15.48%	12	\$ 1,236,740.28	\$ 307,648.38	24.88%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 1,670,588.86	\$ 1,297,809.30	77.69%	2	\$ 1,076,003.44	\$ 845,364.30	78.57%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS	24	\$ 5,012,524.75	\$ 2,016,370.42	40.23%	19	\$ 13,075,209.38	\$ 8,218,066.92	62.85%
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 502,473.28	\$ 441,060.32	87.78%	1	\$ 242,560.14	\$ 154,455.92	63.68%
12	IMPRESTIMO	1	\$ 7,693,101.00	\$ 5,795,051.15	75.33%	4	\$ 115,112,106.35	\$ 93,036,491.27	80.82%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	\$ 1,522,380.50	\$ 1,073,828.81	70.54%	2	\$ 157,560.52	\$ 66,113.10	41.96%
16	PONTES					1	\$ 3,384,214.14	\$ 3,053,097.27	90.22%
17	PORTOS	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	4	\$ 433,364.88	\$ 287,933.63	66.44%	7	\$ 840,178.96	\$ 521,547.59	62.08%
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%	2	\$ 305,556.27	\$ 87,571.99	28.66%
	Grand Total	70	\$ 21,115,360.08	\$ 12,272,376.55	58.12%	63	\$ 139,910,297.98	\$ 108,746,406.89	77.73%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROYECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
3	AGUA E SANEAMIENTO	5	\$ 444,587.79	\$ 184,573.83	41.52%	1	\$ 2,903,356.59	\$ 1,473,965.57	50.77%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					4	\$ 26,361,368.60	\$ 17,615,140.52	66.82%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 610,160.22	\$ 405,808.45	66.51%				
7	EDUKASAUN	15	\$ 1,586,878.39						
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 3,653,988.20	\$ 3,004,275.07	82.22%	1	\$ 46,872,339.00	\$ 29,682,899.05	63.33%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO					2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	91.99%
10	ESTRADAS	22	\$ 13,328,276.25	\$ 8,341,008.68	62.58%	1	\$ 772,045.03	\$ -	0.00%
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 269,482.11	\$ 40,316.95	14.96%				
12	IMPRESTIMO					1	\$ 12,964,487.49	\$ 10,828,352.80	83.52%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 23,697.55	\$ 19,014.76	80.24%				
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	10	\$ 3,336,878.09	\$ 2,498,955.67	74.89%				
16	PONTES	1	\$ 328,755.98	\$ 153,014.54	46.54%				
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROYECTOS								
19	SAUDE	2	\$ 312,000.61	\$ 255,869.88	82.01%				
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 76,149.37	\$ -	0.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 536,957.37	\$ 515,282.39	95.96%				
23	TURISMO	1	\$ 48,998.46		0.00%				
	Grand Total	69	\$ 24,556,810.39	\$ 15,418,120.22	62.79%	11	\$ 93,306,829.83	\$ 62,758,778.76	67.26%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO								
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS								
7	EDUKASAUN								
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO					2	\$ 32,032,062.14	\$ 11,237,401.24	35.08%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN								
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE								
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
Grand Total		4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 49,085,855.96	57.46%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ADN, I.P.

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Viqueque				Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	3	\$ 5,472,502.45	\$ 3,885,559.87	71.00%	11	\$ 6,968,249.42	\$ 4,673,469.51	67.07%
3	AGUA E SANEAMENTO					43	\$ 13,353,663.56	\$ 7,293,061.61	54.61%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					5	\$ 27,142,490.50	\$ 17,837,760.26	65.72%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	25	\$ 3,670,157.93	\$ 459,738.82	12.53%	163	\$ 52,325,401.51	\$ 19,487,536.44	37.24%
7	EDUKASAUN					187	\$ 23,070,427.01	\$ 2,627,170.57	11.39%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	4	\$ 2,296,509.09	\$ 1,504,022.77	65.49%	89	\$ 141,236,922.99	\$ 96,808,140.18	68.54%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO					4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,075,710.61	89.12%
10	ESTRADAS	22	\$ 52,858,602.47	\$ 25,267,811.17	47.80%	224	\$ 293,616,132.34	\$ 176,570,119.75	60.14%
11	FLOOD CONTROL					12	\$ 3,295,706.50	\$ 1,650,896.46	50.09%
12	IMPRESTIMO					26	\$ 558,650,150.07	\$ 407,852,355.04	73.01%
13	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
14	JUVVENTUDE NO DESPORTU					10	\$ 5,690,086.23	\$ 3,484,869.96	61.24%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	\$ 154,392.39	25.35%	90	\$ 19,046,822.17	\$ 12,245,918.80	64.29%
16	PONTES	1	\$ 758,090.38	\$ 545,900.59	72.01%	10	\$ 20,195,686.46	\$ 15,539,328.77	76.94%
17	PORTOS					3	\$ 2,241,460.87	\$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					10	\$ 3,498,406.35	\$ 1,731,026.52	49.48%
19	SAUDE					55	\$ 9,546,757.16	\$ 5,461,784.77	57.21%
20	SEGURANCA NO DEFESA					7	\$ 14,258,717.45	\$ 2,071,353.27	14.53%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,466,564.84	79.40%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					6	\$ 1,570,981.66	\$ 1,322,908.90	84.21%
23	TURISMO					10	\$ 1,733,927.24	\$ 837,220.46	48.28%
	Grand Total	57	\$ 65,664,883.37	\$ 31,817,425.60	48.45%	971	\$ 1,278,838,824.86	\$ 853,026,255.77	66.70%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Onai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariana Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Maio

**Projeto 13 Municípios
Por Ministério**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Alieu			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Ainaro			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ESTATAL					3	\$ 275,266.70	\$ 234,402.15	85.15%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	\$ 178,371.29	89.19%				
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	30	\$ 52,596,604.88	\$ 31,402,760.57	59.70%	40	\$ 91,909,713.75	\$ 79,842,221.32	86.87%
14	MINISTERIO DO INTERIOR								
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	14	\$ 1,484,622.27	\$ -	0.00%	20	\$ 2,316,678.62	\$ 365,427.54	15.77%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	\$ 167,261.25	35.21%				
17	MINISTERIO FINANCAS								
18	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus								
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	\$ 61,804.39	52.04%	1	\$ 489,653.83	\$ 229,243.50	46.82%
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 7,700.00	\$ 6,930.00	90.00%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
22	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 775,330.57	\$ 420,342.74	54.21%	5	\$ 484,439.64	\$ 222,521.45	45.93%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	\$ 33,389.23	7.03%	1	\$ 546,598.02	\$ -	0.00%
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
26	PARLAMENTU NASIONAL								
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
28	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
29	SAMES								
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
32	SEFOPE	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
33	TRADE INVEST								
34	TRIBUNAL RECUSSO								
35	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		64	\$ 56,426,069.51	\$ 32,480,933.76	57.56%	73	\$ 96,169,627.00	\$ 81,015,298.23	84.24%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Baucau			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Bobonaro			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ESTATAL	7	\$ 798,108.36	\$ 328,508.66	41.16%	1	\$ 15,508.35	\$ 9,975.03	64.32%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					1	\$ 564,895.97	\$ 221,586.70	39.24%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 316,447.42	\$ 284,307.87	89.84%	2	\$ 373,662.01	\$ 108,424.87	29.02%
10	MINISTERIO DA DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 60,287.96	6.83%
11	MINISTERIO DA JUSTICA								
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	\$ 137,763,172.77	\$ 94,711,210.17	68.75%	35	\$ 45,020,840.95	\$ 26,420,552.37	58.69%
14	MINISTERIO DO INTERIOR								
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	31	\$ 3,743,421.04	\$ 624,596.30	16.69%	22	\$ 2,541,904.03	\$ 79,435.20	3.13%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO FINANCAS					1	\$ 190,605.25	\$ 79,796.59	41.86%
18	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonómikus								
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	2	\$ 782,313.77	\$ 112,848.70	14.42%				
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 220,190.97	\$ 192,487.56	87.42%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
22	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 748,725.31	\$ 402,304.35	53.73%	14	\$ 2,031,743.88	\$ 1,315,207.00	64.73%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 50,000.00	\$ 30,483.00	60.97%				
26	PARLAMENTU NASIONAL								
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
28	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
29	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ 29,956.90	42.92%				
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
32	SEFOPE								
33	TRADE INVEST								
34	TRIBUNAL RECUSSO								
35	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		85	\$ 144,271,981.61	\$ 96,524,216.95	66.90%	78	\$ 51,841,534.74	\$ 25,487,753.28	54.95%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Covallina			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	DIII		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)			MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC					1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega					2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25	63.30%
3	CFP					1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRESA					1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
5	ESTATAL					7	\$ 493,677.26	\$ 295,975.91	59.95%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	\$ 1,196,660.00	\$ 941,722.09	78.70%	7	\$ 9,107,620.21	\$ 3,614,732.46	39.69%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75	82.11%
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 260,523.18	\$ 193,054.93	74.10%	2	\$ 292,519.73	\$ 209,738.52	71.70%
10	MINISTERIO DA DEFESA					8	\$ 2,542,703.94	\$ 1,390,930.71	54.70%
11	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 149,292.80	\$ -	0.00%	5	\$ 593,610.53	\$ 92,258.11	15.54%
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	34	\$ 52,762,693.13	\$ 38,722,799.32	73.39%	108	\$ 239,778,407.73	\$ 159,247,844.52	66.41%
14	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 337,328.10	\$ -	0.00%	3	\$ 10,861,982.32	\$ 250,277.24	2.30%
15	MINISTERIO EDUKASAU JUVENTUDE E DESPORTU	18	\$ 2,085,678.26	\$ 171,935.57	8.24%	21	\$ 3,010,898.52	\$ 783,901.97	26.04%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					1	\$ 7,583.06	\$ 6,599.24	87.03%
17	MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 4,206,435.00	\$ 3,066,564.84	72.90%
18	Ministerio Koordinator Asuntlu Ekonomikus					1	\$ 119,578.85	\$ 45,153.74	37.76%
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					3	\$ 1,434,737.07	\$ 507,350.33	35.36%
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	7	\$ 1,056,679.87	\$ 409,674.73	38.77%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
22	MINISTERIO SAUDE	7	\$ 1,363,630.74	\$ 948,359.18	69.55%	13	\$ 3,394,018.46	\$ 1,584,277.95	46.68%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUIN	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%	5	\$ 1,012,159.56	\$ 345,592.73	34.14%
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 33,091.06	\$ 23,825.57	72.00%	4	\$ 756,542.84	\$ 294,507.14	38.93%
26	PARLAMENTU NASIONAL					1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43	90.00%
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA					1	\$ 556,612.74	\$ 499,422.83	89.73%
28	RADIO TELEVISAUIN TIMOR LESTE					1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
29	SAMES								
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUIN					2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					7	\$ 3,260,552.90	\$ 1,639,366.50	50.28%
32	SEFOPE					1	\$ 460,254.00	\$ 339,787.68	73.83%
33	TRADE INVEST					1	\$ 37,562.90	\$ 18,900.89	50.29%
34	TRIBUNAL RECUSO					3	\$ 12,050,768.39	\$ 3,725,065.25	30.91%
35	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE					10	\$ 6,013,776.15	\$ 1,752,021.12	29.13%
Grand Total		67	\$ 130,884,271.61	\$ 108,513,775.37	82.91%	233	\$ 302,724,534.57	\$ 181,060,621.30	59.81%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Emera			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Lautem			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ESTATAL					2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 160,056.02	\$ -	0.00%				
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	18	\$ 19,145,922.36	\$ 14,146,835.24	73.88%	26	\$ 35,300,659.81	\$ 26,106,469.42	73.95%
14	MINISTERIO DO INTERIOR								
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	23	\$ 3,012,002.58	\$ 277,666.37	9.22%	18	\$ 2,076,363.17	\$ 57,143.15	2.75%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO FINANÇAS					1	\$ 56,783.85	\$ 45,907.81	80.85%
18	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus								
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 358,735.46	\$ 84,063.99	23.43%				
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 788,921.55	\$ 387,253.22	49.09%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
22	MINISTERIO SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 683,503.11	67.80%	3	\$ 653,626.75	\$ 406,441.48	62.18%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
26	PARLAMENTU NASIONAL								
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA					1	\$ 710,074.64	\$ 349,989.94	49.29%
28	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
29	SAMES								
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
32	SEFOPE					1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
33	TRADE INVEST								
34	TRIBUNAL RECUSSO								
35	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,202,068.71	64.14%	54	\$ 40,487,287.14	\$ 27,786,057.35	68.63%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Liquida			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Manatuto			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	IAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ESTATAL	3	\$ 387,568.54	\$ -	0.00%	4	\$ 567,521.53	\$ 317,298.93	55.91%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$ 139,176.53	\$ 118,527.60	85.16%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA					1	\$ 29,275.84	\$ 4,660.85	15.92%
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	38	\$ 16,370,980.54	\$ 10,671,067.35	65.18%	30	\$ 133,210,031.91	\$ 105,441,550.35	79.15%
14	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	\$ 1,956,926.91	\$ 302,946.05	15.48%	13	\$ 1,303,638.79	\$ 307,648.38	23.60%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO FINANÇAS								
18	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus								
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					1	\$ 408,460.73	\$ 106,266.80	26.02%
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 99,484.80	\$ 82,502.69	82.93%	1	\$ 277,330.43	\$ -	0.00%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
22	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 433,364.88	\$ 287,933.63	66.44%	9	\$ 1,175,863.67	\$ 564,776.87	49.73%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%	2	\$ 204,687.39	\$ 129,714.95	63.37%
26	PARLAMENTU NASIONAL								
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
28	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
29	SAMES								
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
32	SEFOPE								
33	TRADE INVEST								
34	TRIBUNAL RECURSU								
35	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
	Grand Total	70	\$ 21,115,360.03	\$ 12,272,376.55	58.12%	63	\$ 139,910,297.98	\$ 108,746,406.89	77.73%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO		DONO DO PROJECTO	Manufahi				Nasional				
			TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	
1		CAC									
2		Centro Nacional Chega									
3		CFP									
4		CONSELHO DA EMPRESA									
5		ESTATAL	5	\$ 575,943.14	\$ 545,570.31	94.73%					
6		GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO									
7		HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES									
8		IGREJA PROTESTANTE TIMOR									
9		MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS									
10		MINISTERIO DA DEFESA									
11		MINISTERIO DA JUSTICA									
12		MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS									
13		MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	42	\$ 21,346,680.20	\$ 14,210,871.58	66.57%					
14		MINISTERIO DO INTERIOR	2	\$ 436,263.93	\$ 269,076.60	61.68%	4	\$ 63,512,228.11	\$ 41,985,217.42	\$	66.11%
15		MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU									
16		MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	15	\$ 1,586,878.39	\$ -	0.00%					
17		MINISTERIO FINANÇAS									
18		Ministerio Koordinator Asuntú Ekonomikus									
19		MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 48,998.46	\$ -	0.00%					
20		MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU									
21		MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 2,510,600.00	\$ 225,954.00	\$	9.00%
22		MINISTERIO SAUDE	3	\$ 383,412.81	\$ 264,206.28	68.91%	2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	\$	72.91%
23		MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN									
24		MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN									
25		MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 178,633.46	\$ 128,395.45	71.88%					
26		PARLAMENTU NASIONAL									
27		PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA									
28		RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE									
29		SAMES									
30		SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN									
31		SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU									
32		SEFOPE									
33		TRADE INVEST									
34		TRIBUNAL RECUSSO									
35		UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE									
Grand Total			69	\$ 24,566,810.39	\$ 15,418,120.22	62.79%	11	\$ 93,306,829.83	\$ 62,758,778.76		67.26%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Oo-clus99				PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	Regional		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	TOTAL PROJETU		MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ESTATAL								
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS								
10	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%				
11	MINISTERIO DA JUSTICA								
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 49,085,855.96	57.46%
14	MINISTERIO DO INTERIOR								
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU								
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO FINANÇAS								
18	Ministerio Koordinator Asunttu Ekonómikus								
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU								
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
22	MINISTERIO SAUDE								
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
26	PARLAMENTU NASIONAL								
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
28	RADIO TELEISAUN TIMOR LESTE								
29	SAMES								
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
32	SEFOPE								
33	TRADE INVEST								
34	TRIBUNAL RECUSO								
35	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
	Grand Total	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,667.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 49,085,855.96	57.46%

Junho

**Projeto 13 Municipios
Por Fundos
Finansiamiento**



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	FI				LM-CD			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	\$ 48,277,505.03	\$ 29,822,680.78	61.77%	19	\$ 4,490,679.95	\$ 1,391,054.59	30.98%
2	Ainaro	25	\$ 89,729,809.82	\$ 79,785,061.66	88.92%	17	\$ 3,008,653.96	\$ 969,681.15	32.23%
3	Baucau	24	\$ 133,969,033.60	\$ 95,487,710.63	71.28%	17	\$ 4,861,686.43	\$ 1,561,889.13	32.13%
4	Bobonaro	24	\$ 42,470,567.79	\$ 24,670,835.56	58.09%	14	\$ 3,928,103.04	\$ 1,925,683.06	49.02%
5	Covalima	31	\$ 124,447,620.40	\$ 105,671,799.11	84.91%	11	\$ 2,643,602.32	\$ 793,115.91	30.00%
6	Dili	68	\$ 137,004,738.48	\$ 78,797,434.23	57.51%	68	\$ 18,805,577.47	\$ 8,221,024.61	43.72%
7	Ermera	13	\$ 18,547,937.15	\$ 13,848,477.69	74.66%	7	\$ 1,356,638.14	\$ 347,354.13	25.60%
8	Lautem	14	\$ 32,905,711.12	\$ 25,190,795.42	76.55%	17	\$ 4,916,952.07	\$ 1,949,895.04	39.66%
9	Liquica	13	\$ 18,863,345.34	\$ 10,031,035.87	53.18%	25	\$ 3,314,058.24	\$ 324,427.27	9.79%
10	Manatuto	13	\$ 131,516,647.81	\$ 110,702,147.58	84.17%	18	\$ 4,268,931.05	\$ 1,042,135.42	24.41%
11	Manufahi	22	\$ 17,385,950.98	\$ 11,944,627.25	68.70%	18	\$ 2,823,022.46	\$ 1,385,120.52	49.07%
12	Nasional	10	\$ 48,002,821.42	\$ 34,554,428.58	71.98%	3	\$ 47,833,572.98	\$ 29,818,151.05	62.34%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%				
14	Regional	2	\$ 32,032,062.14	\$ 12,363,098.14	38.60%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
15	Viqueque	24	\$ 59,413,345.74	\$ 31,408,644.37	52.86%	10	\$ 3,838,970.62	\$ 1,085,422.61	28.27%
	Grand Total	301	\$ 936,920,418.47	\$ 666,131,344.72	71.10%	245	\$ 159,116,049.73	\$ 88,401,843.60	55.56%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	PDIM				LM-BS			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					4	\$ 1,568,065.11	\$ 893,031.51	56.95%
2	Ainaro	8	\$ 931,596.86	\$ 664,237.60	71.30%	3	\$ 565,845.40	\$ 527,769.63	93.27%
3	Baucau	8	\$ 863,550.68	\$ 387,406.75	44.86%	6	\$ 1,107,575.09	\$ 443,414.69	40.03%
4	Bobonaro	8	\$ 746,047.73	\$ 509,771.16	68.33%	4	\$ 860,900.42	\$ 528,819.12	61.43%
5	Covalima	3	\$ 592,720.70	\$ 558,300.67	94.19%	3	\$ 575,995.90	\$ 255,350.34	44.33%
6	Dili	6	\$ 998,304.29	\$ 875,375.74	87.69%	50	\$ 5,967,727.59	\$ 3,525,373.94	59.07%
7	Ermera	5	\$ 845,470.49	\$ 729,472.08	86.28%	2	\$ 365,450.73	\$ 87,439.28	23.93%
8	Lautem	2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%	6	\$ 1,103,542.01	\$ 541,687.21	49.09%
9	Liquica	5	\$ 722,133.98	\$ 278,035.53	38.50%	11	\$ 1,574,555.51	\$ 909,883.93	57.79%
10	Manatuto	12	\$ 1,596,152.81	\$ 1,060,017.49	66.41%	6	\$ 1,160,391.31	\$ 446,513.42	38.48%
11	Manufahi	7	\$ 1,205,539.81	\$ 864,028.60	71.67%	5	\$ 1,464,659.68	\$ 986,926.57	67.38%
12	Nasional					3	\$ 623,952.43	\$ 311,334.32	49.90%
13	Oe-cusse								
14	Regional					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
15	Viqueque	2	\$ 355,840.92	\$ 301,722.65	84.79%	3	\$ 300,989.41	\$ 77,967.95	25.90%
	Grand Total	66	\$ 9,254,697.12	\$ 6,228,368.27	67.30%	107	\$ 17,613,316.59	\$ 9,797,077.51	55.62%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	LM-TP				Fundo Covid-19			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	\$ 1,617,454.43	\$ 217,004.28	13.42%	3	\$ 475,384.99	\$ 306,425.82	64.46%
2	Ainaro	17	\$ 1,665,991.99	\$ 86,232.55	5.18%	3	\$ 242,067.62	\$ 120,512.49	49.78%
3	Baucau	29	\$ 3,000,775.19	\$ -	0.00%	1	\$ 469,360.62	\$ 329,188.84	70.14%
4	Bobonaro	23	\$ 3,106,600.00	\$ 301,021.90	9.69%	5	\$ 729,315.76	\$ 551,622.48	75.64%
5	Covalima	17	\$ 2,921,378.69	\$ 941,722.09	32.24%	4	\$ 533,488.64	\$ 385,354.53	72.23%
6	Dili	24	\$ 11,248,554.33	\$ 3,985,794.37	35.43%	5	\$ 1,828,899.27	\$ 777,776.99	42.53%
7	Ermera	20	\$ 2,252,742.01	\$ 84,063.99	3.73%	2	\$ 334,327.32	\$ 202,560.49	60.59%
8	Lautem	16	\$ 1,702,312.60	\$ -	0.00%	2	\$ 373,420.03	\$ 254,295.00	68.10%
9	Liquica	13	\$ 1,123,528.85	\$ -	0.00%	4	\$ 433,364.88	\$ 287,933.63	66.44%
10	Manatuto	10	\$ 872,256.79	\$ -	0.00%	4	\$ 665,658.27	\$ 273,641.01	41.11%
11	Manufahi	15	\$ 1,586,878.39	\$ -	0.00%	3	\$ 383,412.81	\$ 285,247.41	74.40%
12	Nasional								
13	Oe-cusse								
14	Regional								
15	Viqueque	18	\$ 1,781,168.18	\$ 21,917.29	1.23%				
Grand Total		216	\$ 32,879,641.45	\$ 5,637,756.47	17.15%	36	\$ 6,468,700.21	\$ 3,774,558.69	58.35%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	Emergency				TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					54	\$ 56,429,089.51	\$ 32,630,196.98	57.83%
2	Ainaro					73	\$ 96,143,965.65	\$ 82,153,495.08	85.45%
3	Baucau					85	\$ 144,271,981.61	\$ 98,209,610.04	68.07%
4	Bobonaro					78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,487,753.28	54.95%
5	Covalima					69	\$ 131,714,806.65	\$ 108,605,642.65	82.46%
6	Dili	9	\$ 5,033,096.85	\$ 852,468.15	16.94%	230	\$ 180,886,898.28	\$ 97,035,248.03	53.64%
7	Ermera					49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,299,367.66	64.55%
8	Lautem					57	\$ 41,399,276.68	\$ 27,936,672.67	67.48%
9	Liquica	1	\$ 502,473.28	\$ 441,060.32	87.78%	72	\$ 26,533,460.08	\$ 12,272,376.55	46.25%
10	Manatuto					63	\$ 140,080,038.04	\$ 113,524,454.92	81.04%
11	Manufahi					70	\$ 24,849,464.13	\$ 15,465,950.35	62.24%
12	Nasional					16	\$ 96,460,346.83	\$ 64,683,913.95	67.06%
13	Oe-cusse					4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional					4	\$ 85,431,329.14	\$ 50,211,552.86	58.77%
15	Viqueque					57	\$ 65,690,314.87	\$ 32,895,674.87	50.08%
	Grand Total	10	\$ 5,535,570.13	\$ 1,293,528.47	23.37%	981	\$ 1,167,788,393.70	\$ 781,264,477.73	66.90%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ormai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Junho

**Projeto 13 Municipios
Por Sector**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Alieu				Ainaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 827,410.00	\$ 74,466.90	9.00%				
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	4	\$ 1,079,346.48	\$ 431,394.76	39.97%	6	\$ 940,813.03	\$ 251,007.13	26.68%
7	EDUKASAUN	13	\$ 1,313,542.97	\$ -	0.00%	19	\$ 2,292,232.62	\$ 343,426.14	14.98%
8	ELÉCTRICIDADE	3	\$ 1,001,069.36	\$ 760,462.94	75.97%	10	\$ 7,999,431.74	\$ 5,711,400.08	71.40%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	16	\$ 18,509,629.40	\$ 14,538,711.39	78.55%	10	\$ 18,116,584.48	\$ 12,140,905.41	67.02%
11	FLOOD CONTROL					1	\$ 84,160.28	\$ 73,802.68	87.69%
12	IMPRESTIMO	4	\$ 30,387,163.09	\$ 15,045,148.91	49.51%	3	\$ 59,201,316.40	\$ 58,556,522.00	98.91%
13	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	\$ 1,320,533.03	\$ 747,673.66	56.62%	17	\$ 3,237,083.74	\$ 2,003,677.86	61.90%
16	PONTES					2	\$ 3,869,397.22	\$ 2,837,687.37	73.34%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	2	\$ 1,025,800.00	\$ 552,821.25	53.89%				
19	SAUDE	3	\$ 494,193.39	\$ 167,319.27	33.86%	3	\$ 274,369.70	\$ 116,514.14	42.47%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	\$ 95,193.62	57.18%				
23	TURISMO	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
	Grand Total	54	\$ 56,429,089.51	\$ 32,630,196.98	57.83%	73	\$ 96,143,965.65	\$ 82,153,495.08	85.45%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	1	\$ 316,447.42	\$ 284,307.87	89.84%	2	\$ 373,662.01	\$ 108,424.87	29.02%
3	AGUA E SANEAMENTO					3	\$ 511,112.23	\$ 443,532.84	86.78%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	13	\$ 1,999,417.79	\$ 592,767.00	29.65%	3	\$ 770,809.57	\$ 311,358.32	40.39%
7	EDUKASAUN	31	\$ 3,743,421.04	\$ 624,596.30	16.69%	21	\$ 2,409,512.03	\$ -	0.00%
8	ELÉCTRICIDADE	10	\$ 3,110,591.49	\$ 2,553,398.81	82.09%	8	\$ 2,152,484.95	\$ 1,606,554.18	74.64%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	17	\$ 22,189,429.73	\$ 11,204,746.64	50.50%	15	\$ 16,841,802.59	\$ 9,263,742.31	55.00%
11	FLOOD CONTROL					2	\$ 437,194.54	\$ 36,987.35	8.46%
12	IMPRESTIMO	4	\$ 109,889,602.64	\$ 80,781,958.04	73.51%	1	\$ 20,748,566.21	\$ 13,773,957.09	66.39%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	8	\$ 2,553,710.88	\$ 1,838,646.54	72.00%	5	\$ 1,317,219.88	\$ 666,238.28	50.58%
16	PONTES					1	\$ 2,860,755.63	\$ 581,091.24	20.31%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	1	\$ 469,360.62	\$ 329,188.84	70.14%	16	\$ 2,536,031.77	\$ 1,635,578.84	64.49%
20	SEGURANCA NO DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 60,287.96	6.83%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
Grand Total		85	\$ 144,271,981.61	\$ 98,209,610.04	68.07%	78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,487,753.28	54.95%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Covalima				Dili			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%	1	\$ 1,100,000.00	\$ 600,000.00	54.55%
2	AGRICULTURA					1	\$ 273,270.70	\$ 191,289.49	70.00%
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	21	\$ 6,682,282.66	\$ 3,753,453.38	56.17%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					1	\$ 781,121.90	\$ 222,619.74	28.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	9	\$ 2,585,789.57	\$ 1,444,295.14	55.86%	58	\$ 33,324,301.36	\$ 14,267,891.98	42.82%
7	EDUKASAUN	18	\$ 2,722,556.08	\$ 171,935.57	6.32%	24	\$ 4,771,793.75	\$ 704,316.03	14.76%
8	ELÉCTRICIDADE	5	\$ 2,730,729.02	\$ 1,670,874.34	61.19%	21	\$ 7,103,218.29	\$ 4,385,763.75	61.74%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO					2	\$ 1,209,890.98	\$ 990,409.50	81.86%
10	ESTRADAS	19	\$ 39,207,818.72	\$ 27,723,140.84	70.71%	38	\$ 49,175,823.87	\$ 26,050,533.56	52.97%
11	FLOOD CONTROL	2	\$ 821,328.14	\$ 193,054.93	23.51%	4	\$ 923,846.66	\$ 688,688.66	74.55%
12	IMPRESTIMO					1	\$ 48,314,975.87	\$ 35,849,928.14	74.20%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					8	\$ 3,303,412.24	\$ 1,727,259.04	52.29%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	\$ 1,507,681.83	\$ 989,680.74	65.64%	22	\$ 2,494,823.18	\$ 1,636,129.71	65.58%
16	PONTES	2	\$ 8,755,658.60	\$ 8,368,537.76	95.58%	2	\$ 238,814.51	\$ 81,142.40	33.98%
17	PORTOS					2	\$ 846,710.87	\$ 339,787.68	40.13%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					8	\$ 2,472,606.35	\$ 1,178,205.27	47.65%
19	SAUDE	4	\$ 687,870.35	\$ 532,044.62	77.35%	8	\$ 2,113,445.85	\$ 810,485.81	38.35%
20	SEGURANCA NO DEFESA					3	\$ 11,581,904.47	\$ 469,286.85	4.05%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,466,564.84	79.40%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
23	TURISMO					3	\$ 618,619.54	\$ 271,235.64	43.85%
	Grand Total	69	\$ 131,714,806.65	\$ 108,605,642.65	82.46%	230	\$ 180,886,898.28	\$ 97,035,248.03	53.64%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	4	\$ 448,959.83	\$ 146,375.20	32.60%	3	\$ 815,564.95	\$ 286,056.46	35.07%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	24	\$ 3,162,567.78	\$ 84,063.99	2.66%	8	\$ 2,714,339.43	\$ 1,046,837.13	38.57%
7	EDUKASAUN	1	\$ 368,226.28	\$ 317,237.31	86.15%	18	\$ 2,166,673.93	\$ 57,143.15	2.64%
8	ELÉCTRICIDADE	9	\$ 6,825,025.51	\$ 5,362,124.31	78.57%	2	\$ 1,026,193.79	\$ 718,131.88	69.98%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	3	\$ 11,486,392.80	\$ 8,273,990.94	72.03%	19	\$ 33,198,180.78	\$ 24,771,250.37	74.62%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO								
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 388,544.22	\$ 364,344.79	93.77%	3	\$ 601,385.25	\$ 370,106.35	61.54%
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 751,231.12	73.44%	2	\$ 373,420.03	\$ 254,295.00	68.10%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
						1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
	Grand Total	49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,299,367.66	64.55%	57	\$ 41,399,276.68	\$ 27,936,672.67	67.48%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Liquida				Manatuto			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	2	\$ 91,877.21	\$ 80,662.08	87.79%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
3	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 293,629.77	\$ 167,315.56	56.98%	1	\$ 162,377.94	\$ 67,961.57	41.85%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 210,635.04	\$ -	0.00%	9	\$ 1,430,360.48	\$ 421,619.99	29.48%
7	EDUKASAUN	18	\$ 1,956,926.91	\$ 302,946.05	15.48%	12	\$ 1,236,740.28	\$ 307,648.38	24.88%
8	ELÉCTRICIDADE	7	\$ 7,088,688.86	\$ 1,297,809.30	18.31%	2	\$ 1,076,003.44	\$ 845,364.30	78.57%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS	24	\$ 5,012,524.75	\$ 2,016,370.42	40.23%	19	\$ 13,075,209.38	\$ 8,218,066.92	62.85%
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 502,473.28	\$ 441,060.32	87.78%	1	\$ 242,560.14	\$ 154,455.92	63.68%
12	IMPRESTIMO	1	\$ 7,693,101.00	\$ 5,795,051.15	75.33%	4	\$ 115,112,106.35	\$ 97,802,583.81	84.96%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	\$ 1,522,380.50	\$ 1,073,828.81	70.54%	2	\$ 157,560.52	\$ 66,113.10	41.96%
16	PONTES					1	\$ 3,553,954.20	\$ 3,053,097.27	85.91%
17	PORTOS	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	4	\$ 433,364.88	\$ 287,933.63	66.44%	7	\$ 840,178.96	\$ 533,503.08	63.50%
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%	2	\$ 305,556.27	\$ 87,571.99	28.66%
	Grand Total	72	\$ 26,533,460.08	\$ 12,272,376.55	46.25%	63	\$ 140,080,038.04	\$ 113,524,454.92	81.04%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROYECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
3	AGUA E SANEAMIENTO	5	\$ 444,587.79	\$ 184,573.83	41.52%	1	\$ 2,903,356.59	\$ 1,870,214.90	64.42%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					4	\$ 26,361,368.60	\$ 17,615,140.52	66.82%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 610,160.22	\$ 405,808.45	66.51%	1	\$ 479,146.05	\$ 246,754.86	
7	EDUKASAUN	15	\$ 1,586,878.39	\$ -					
8	ELÉCTRICIDADE	6	\$ 3,946,641.94	\$ 3,004,275.07	76.12%	1	\$ 46,872,339.00	\$ 29,682,899.05	63.33%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO					2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	91.99%
10	ESTRADAS	22	\$ 13,328,276.25	\$ 8,341,008.68	62.58%	2	\$ 961,233.98	\$ 135,252.00	
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 269,482.11	\$ 40,316.95	14.96%				
12	IMPRESTIMO					1	\$ 12,964,487.49	\$ 10,828,352.80	83.52%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 23,697.55	\$ 19,014.76	80.24%				
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	10	\$ 3,336,878.09	\$ 2,516,679.93	75.42%				
16	PONTES	1	\$ 328,755.98	\$ 153,014.54	46.54%				
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROYECTOS								
19	SAUDE	2	\$ 312,000.61	\$ 276,911.01	88.75%				
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 76,149.37	\$ -	0.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					1	\$ 2,184,781.00	\$ 1,146,879.00	52.49%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 536,957.37	\$ 524,347.13	97.65%	1	\$ 74,828.00	\$ -	0.00%
23	TURISMO	1	\$ 48,998.46	\$ -	0.00%	1	\$ 225,573.00	\$ -	0.00%
	Grand Total	70	\$ 24,849,464.13	\$ 15,465,950.35	62.24%	16	\$ 96,460,346.83	\$ 64,683,913.95	67.06%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO								
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS								
7	EDUKASAUN								
8	ELÉCTRICIDADE	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO					2	\$ 32,032,062.14	\$ 12,363,098.14	38.60%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN								
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE								
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
Grand Total		4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 50,211,552.86	58.77%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROYECTO	Viqueque				Total 13 Municipios			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	3	\$ 5,472,502.45	\$ 4,041,786.34	73.86%	11	\$ 6,968,249.42	\$ 4,829,695.98	69.31%
3	AGUA E SANEAMENTO					43	\$ 13,353,663.56	\$ 7,258,332.44	54.35%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					5	\$ 27,142,490.50	\$ 17,837,760.26	65.72%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	25	\$ 3,695,589.43	\$ 490,402.22	13.27%	165	\$ 53,003,276.23	\$ 19,994,200.96	37.72%
7	EDUKASAUN					190	\$ 24,568,504.28	\$ 2,829,248.93	11.52%
8	ELÉCTRICIDADE	4	\$ 2,296,509.09	\$ 1,504,022.77	65.49%	92	\$ 146,947,676.73	\$ 97,048,382.60	66.04%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO					4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,084,250.86	89.31%
10	ESTRADAS	22	\$ 52,858,602.47	\$ 26,159,170.57	49.49%	227	\$ 294,335,175.20	\$ 179,098,455.65	60.85%
11	FLOOD CONTROL					12	\$ 3,281,045.15	\$ 1,628,366.81	49.63%
12	IMPRESTIMO					21	\$ 436,343,381.19	\$ 330,796,600.08	75.81%
13	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					10	\$ 5,690,086.23	\$ 3,542,117.69	62.25%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	\$ 154,392.39	25.35%	90	\$ 19,046,822.17	\$ 12,427,512.16	65.25%
16	PONTES	1	\$ 758,090.38	\$ 545,900.59	72.01%	10	\$ 20,365,426.52	\$ 15,620,471.17	76.70%
17	PORTOS					3	\$ 2,241,460.87	\$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROYECTOS					10	\$ 3,498,406.35	\$ 1,731,026.52	49.48%
19	SAUDE					56	\$ 9,557,085.58	\$ 5,695,005.36	59.59%
20	SEGURANCA NO DEFESA					7	\$ 14,258,717.45	\$ 2,071,353.27	14.53%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					2	\$ 5,291,216.00	\$ 3,613,443.84	68.29%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					7	\$ 1,645,809.66	\$ 1,331,973.64	80.93%
23	TURISMO					11	\$ 1,959,500.24	\$ 837,220.46	42.73%
	Grand Total	57	\$ 65,690,314.87	\$ 32,895,674.87	50.08%	981	\$ 1,167,788,393.70	\$ 781,264,477.73	66.90%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ormai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P
Page 8 of 8

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Junho

**Projeto 13 Municípios
Por Ministério**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Aileu			Ainaro			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)					
1	CAC												
2	Centro Nacional Chega												
3	CFP												
4	CONSELHO DA EMPRESA												
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P												
6	ESTATAL					3	\$ 260,605.35	\$ 211,872.50	81.30%				
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO												
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES												
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR												
10	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%				
11	MINISTERIO DA DEFESA												
12	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	\$ 178,371.29	89.19%								
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS												
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	30	\$ 52,596,604.88	\$ 31,552,023.80	59.99%	40	\$ 91,909,713.75	\$ 80,998,947.82	88.13%				
15	MINISTERIO DO INTERIOR												
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	14	\$ 1,484,622.27	\$ -	0.00%	20	\$ 2,316,678.62	\$ 365,427.54	15.77%				
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	\$ 167,261.25	35.21%								
18	MINISTERIO FINANÇAS												
19	Ministerio Koordinator Asuntus Ekonomikusk												
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	\$ 61,804.39	52.04%	1	\$ 489,653.83	\$ 229,243.50	46.82%				
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 7,700.00	\$ 6,930.00	90.00%				
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS												
23	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 775,330.57	\$ 420,342.74	54.21%	5	\$ 484,439.64	\$ 222,521.45	45.93%				
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	\$ 33,389.23	7.03%	1	\$ 546,598.02	\$ -	0.00%				
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN												
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA												
27	PARLAMENTU NASIONAL												
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA												
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE												
30	SAMES												
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN												
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU												
33	SEFOPE	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%				
34	TRADE INVEST												
35	TRIBUNAL RECUSSO												
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE												
Grand Total		54	\$ 56,429,089.51	\$ 32,630,196.98	57.83%	73	\$ 96,143,965.65	\$ 82,153,495.08	85.45%				



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Baucau			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Bobonaro			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL	7	\$ 798,108.36	\$ 328,508.66	41.16%	1	\$ 15,508.35	\$ 9,975.03	64.32%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					1	\$ 564,695.97	\$ 221,586.70	39.24%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 316,447.42	\$ 284,307.87	89.84%	2	\$ 373,662.01	\$ 108,424.87	29.02%
11	MINISTERIO DA DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 60,287.96	6.83%
12	MINISTERIO DA JUSTICA								
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	\$ 137,763,172.77	\$ 96,396,604.26	69.97%	35	\$ 45,020,840.95	\$ 26,420,552.37	58.69%
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	31	\$ 3,743,421.04	\$ 624,596.30	16.69%	22	\$ 2,541,904.03	\$ 79,435.20	3.13%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANÇAS					1	\$ 190,605.25	\$ 79,796.59	41.86%
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonómikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	2	\$ 782,313.77	\$ 112,848.70	14.42%				
21	MINISTERIO PLANO E ORDENAMENTU					1	\$ 220,190.97	\$ 192,487.56	87.42%
22	MINISTERIO PLANO E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 748,725.31	\$ 402,304.35	53.73%	14	\$ 2,031,743.88	\$ 1,315,207.00	64.73%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 50,000.00	\$ 30,483.00	60.97%				
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ 29,956.90	42.92%				
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
Grand Total		85	\$ 144,271,981.61	\$ 98,209,610.04	68.07%	78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,487,753.28	54.95%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Covalima				Dili			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC					1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega					2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25	63.30%
3	CFP					1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRESA					1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL					7	\$ 493,677.26	\$ 295,975.91	59.95%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	\$ 1,196,660.00	\$ 941,722.09	78.70%	7	\$ 9,107,620.21	\$ 3,614,732.46	39.69%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75	82.11%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 260,523.18	\$ 193,054.93	74.10%	2	\$ 292,519.73	\$ 209,738.52	71.70%
11	MINISTERIO DA DEFESA					8	\$ 2,542,703.34	\$ 1,390,930.71	54.70%
12	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 149,292.80	\$ -	0.00%	5	\$ 593,610.53	\$ 92,258.11	15.54%
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	34	\$ 52,762,693.13	\$ 38,752,233.68	73.45%	104	\$ 117,660,827.80	\$ 74,729,658.44	63.51%
15	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 337,328.10	\$ -	0.00%	3	\$ 10,861,982.32	\$ 250,277.24	2.30%
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	19	\$ 2,905,884.88	\$ 171,935.57	5.92%	22	\$ 3,290,741.76	\$ 946,409.39	28.76%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					1	\$ 7,583.06	\$ 6,599.24	87.03%
18	MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 4,206,435.00	\$ 3,066,564.84	72.90%
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus					1	\$ 119,578.85	\$ 92,618.05	77.45%
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					3	\$ 1,434,737.07	\$ 551,605.33	38.45%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	7	\$ 1,056,679.87	\$ 418,214.98	39.58%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE	8	\$ 1,373,959.16	\$ 1,010,792.10	73.57%	13	\$ 3,394,018.46	\$ 1,690,328.27	49.80%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%	5	\$ 1,012,159.56	\$ 412,340.51	40.74%
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 33,091.06	\$ 23,825.57	72.00%	4	\$ 756,542.64	\$ 294,507.14	38.93%
27	PARLAMENTU NASIONAL					1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43	90.00%
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					1	\$ 556,612.74	\$ 499,422.83	89.73%
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE					1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					7	\$ 3,260,552.90	\$ 1,696,614.23	52.03%
33	SEFOPE					1	\$ 460,254.00	\$ 339,787.68	73.83%
34	TRADE INVEST					1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
35	TRIBUNAL RECUSSO					3	\$ 12,050,768.39	\$ 3,725,065.25	30.91%
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE					10	\$ 6,013,776.15	\$ 1,752,021.12	29.13%
Grand Total		69	\$ 131,714,806.65	\$ 108,605,642.65	82.46%	230	\$ 180,886,898.28	\$ 97,035,248.03	53.64%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Ermera			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Lautem			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL					2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								
11	MINISTERIO DA DEFESA								
12	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 160,056.02	\$ -	0.00%				
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	18	\$ 19,148,922.36	\$ 14,146,835.24	73.88%	27	\$ 35,641,324.77	\$ 26,145,545.06	73.36%
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	23	\$ 3,012,002.58	\$ 317,237.31	10.53%	19	\$ 2,474,390.58	\$ 57,143.15	2.31%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANCAS					1	\$ 56,783.85	\$ 45,907.81	80.85%
19	Ministerio Koordinator Asuntú Ekonomikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 358,735.46	\$ 84,063.99	23.43%				
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					2	\$ 962,218.72	\$ 387,253.22	40.25%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
23	MINISTERIO SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 751,231.12	73.44%	3	\$ 653,626.75	\$ 406,441.48	62.18%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					1	\$ 710,074.64	\$ 461,529.62	65.00%
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE					1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,299,367.66	64.55%	57	\$ 41,399,276.68	\$ 27,936,672.67	67.48%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Liquida			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Manatuto			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL	3	\$ 387,568.54	\$ -	0.00%	4	\$ 567,521.53	\$ 317,298.93	55.91%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$ 139,176.53	\$ 118,527.60	85.16%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
11	MINISTERIO DA DEFESA								
12	MINISTERIO DA JUSTICA					1	\$ 29,275.84	\$ 4,660.85	15.92%
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	\$ 21,789,080.54	\$ 10,671,067.35	48.97%	30	\$ 133,379,771.97	\$ 110,207,642.89	82.63%
15	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	\$ 1,956,926.91	\$ 302,946.05	15.48%	13	\$ 1,303,638.79	\$ 307,648.38	23.60%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANÇAS								
19	Ministerio Koordinator Asuntus Ekonomikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					1	\$ 408,460.73	\$ 106,266.80	26.02%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 99,484.80	\$ 82,502.69	82.93%	1	\$ 277,330.43	\$ -	0.00%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 433,364.88	\$ 287,933.63	66.44%	9	\$ 1,175,863.67	\$ 596,732.36	50.75%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%	2	\$ 204,687.39	\$ 129,714.95	63.37%
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
Grand Total		72	\$ 26,533,460.08	\$ 12,272,376.55	46.25%	63	\$ 140,080,038.04	\$ 113,524,454.92	81.04%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Manufáhi			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Nasional			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	\$ 292,653.74	\$ -	0.00%				
6	ESTATAL	5	\$ 575,943.14	\$ 554,635.05	96.30%	1	\$ 479,146.05	\$ 246,754.86	51.50%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	91.99%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
11	MINISTERIO DA DEFESA								
12	MINISTERIO DA JUSTICA								
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	42	\$ 21,346,680.20	\$ 14,228,595.84	66.65%	5	\$ 63,701,417.06	\$ 42,516,718.75	66.74%
15	MINISTERIO DO INTERIOR	2	\$ 436,263.93	\$ 269,076.60	61.68%				
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	15	\$ 1,586,878.39	\$ -	0.00%				
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANÇAS					1	\$ 2,184,781.00	\$ 1,146,879.00	52.49%
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonómikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 48,998.46	\$ -	0.00%	1	\$ 74,828.00	\$ -	0.00%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					2	\$ 2,510,600.00	\$ 225,954.00	9.00%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
23	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 383,412.81	\$ 285,247.41	74.40%				
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 178,633.46	\$ 128,395.45	71.88%	1	\$ 225,573.00	\$ -	0.00%
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
Grand Total		70	\$ 24,849,464.13	\$ 15,465,950.35	62.24%	16	\$ 96,460,346.83	\$ 64,683,913.95	67.06%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Oe-cusse			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Regional			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL								
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								
11	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%				
12	MINISTERIO DA JUSTICA								
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 50,211,552.86	58.77%
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU								
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANÇAS								
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU								
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE								
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
	Grand Total	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 50,211,552.86	58.77%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO		DONO DO PROJECTO	Viqueque				GRAND TOTAL			
			TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
1		CAC					1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
2		Centro Nacional Chega					2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25	63.30%
3		CFP					1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
4		CONSELHO DA EMPRESA					1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
5		ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P					1	\$ 292,653.74	\$ -	0.00%
6		ESTATAL	2	\$ 355,840.92	\$ 301,722.65	84.79%	35	\$ 4,331,258.35	\$ 2,266,745.59	52.33%
7		GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					11	\$ 14,232,230.92	\$ 7,871,882.61	55.31%
8		HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75	82.11%
9		IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
10		MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$ 5,472,502.45	\$ 4,041,786.34	73.86%	15	\$ 7,327,640.67	\$ 5,111,385.18	69.75%
11		MINISTERIO DA DEFESA					10	\$ 5,085,259.07	\$ 2,945,373.82	57.92%
12		MINISTERIO DA JUSTICA					9	\$ 1,132,235.19	\$ 275,290.25	24.31%
13		MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
14		MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	29	\$ 56,522,222.99	\$ 28,363,486.31	50.18%	481	\$ 935,367,751.56	\$ 645,699,877.37	69.03%
15		MINISTERIO DO INTERIOR					7	\$ 11,693,682.23	\$ 566,977.15	4.85%
16		MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	\$ 1,781,168.18	\$ 21,917.29	1.23%	234	\$ 28,398,258.03	\$ 3,194,696.18	11.25%
17		MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					2	\$ 482,583.06	\$ 173,860.49	36.03%
18		MINISTERIO FINANÇAS					5	\$ 6,638,605.10	\$ 4,339,148.24	65.36%
19		Ministerio Koordinator Asuntus Ekonomikus					1	\$ 119,578.85	\$ 92,618.05	77.45%
20		MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 275,004.50	\$ 2,911.53	1.06%	12	\$ 3,991,501.52	\$ 1,148,744.24	28.78%
21		MINISTERIO PLANO E ORDENAMENTU	1	\$ 5,707.28	\$ -	0.00%	17	\$ 5,404,293.87	\$ 1,577,724.25	29.19%
22		MINISTERIO PLANO E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
23		MINISTERIO SAUDE	1	\$ 327,232.66	\$ 163,850.75	50.07%	72	\$ 12,804,567.21	\$ 7,552,932.66	58.99%
24		MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	\$ 805,366.41	\$ -		6	\$ 2,694,349.02	\$ 745,822.12	27.68%
25		MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN					8	\$ 74,837,902.10	\$ 68,317,313.34	91.29%
26		MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA					11	\$ 1,723,527.55	\$ 711,426.11	41.28%
27		PARLAMENTU NASIONAL					1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43	90.00%
28		PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					2	\$ 1,266,687.38	\$ 960,952.45	75.86%
29		RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE					1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
30		SAMES					1	\$ 69,792.94	\$ 29,956.90	42.92%
31		SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
32		SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					8	\$ 5,623,529.34	\$ 3,492,458.12	62.10%
33		SEFOPE					4	\$ 946,006.97	\$ 713,700.51	75.44%
34		TRADE INVEST					1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
35		TRIBUNAL RECUSSO					3	\$ 12,050,768.39	\$ 3,725,065.25	30.91%
36		UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE					10	\$ 6,013,776.15	\$ 1,752,021.12	29.13%
Grand Total			57	\$ 65,690,314.87	\$ 32,895,674.87	50.08%	981	\$ 1,167,788,393.70	\$ 781,264,477.73	66.90%

Prepara Husi :

Sertifika Husi :

Aprova Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Omal)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

(Eng. Susana S.D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Aneksu B

Lista Ekipamentus no Mesuramentu Laboratorio ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

LISTA INVENTARISASI LABORATORY EQUIPMENT ADN, I.P.
NO EQUIPAMENTOS NEBE SUPORTA SERVISU LABORATORI ADN, I.P.
2013 – 2022



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

LISTA INVENTARISASI LABORATORY EQUIPMENT ADN, I.P.

2013 - 2022

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
1	CORE DRILL BETON HUSGVARNA & MATA BOX			1 SET	1	-	COMPLETO
2	PRD REFUSAL DENSITY			1 SET	1	-	COMPLETO
3	SIEVE ANALYSIS			84	77	7	COMPLETO SARINGAN NEBE MAK A'AT NO. 3,=1, 1 1/2=1, 1/2=1 3/4=2, 200=1, 12=1




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
4	TERMOMETER AIR KACA			2 PCS	2	-	COMPLETO
5	TERMOMETER ASPHALT OTOMATIS			2 PCS	2	-	COMPLETO
6	TERMOMETER ASPHALT			13	6	3	RUA A'AT IHA LAB IDA A'AT IHA MUNICIPIO NO RESTU SEI IHA MUNICIPIO (SEI CHECK IHA MUNICIPIO)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
7	OVEN			2 UNIT	-	2	COMPLETO IDA LAKAN MAIS LA MANAS IDA LA LAKAN
8	PICNOMETER TANAH 50 ML			2 PCS	2	-	COMPLETO
9	PICNOMETER TANAH 100 ML			2 PCS	2	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
10	PICNOMETER TANAH 100 ML			2 PCS	-	2	COMPLETO (Rahun)
11	TIMBANGAN ELETRIC			2 UNIT	2	-	COMPLETO IDA NIA AIN MAK TOHAR
12	MOL PROCTOR MODIFIT			3+3 UNIT	6	-	COMPLETO PARFUJU MAK DOL




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
13	MOLD PROCTOR STANDAR			3 +1UNIT	4	-	COMPLETO
14	MOLD CBR			3 + 3UNIT	6	-	COMPLETO 3 PARFUJU MAK DOL
15	MIXER CONCRETE FOUN			1 UNIT	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
16	KERTAS FILTER EXTRASI			2 SET	-	-	UJA HOTU
17	BOTLE CHATELIAR			1 PCS	1	-	COMPLETO
18	AIR ENTERTIMEN						?
19	ARMARI BESI			4 UNIT	4	-	COMPLETO




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

N O	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAU N			REMARKS
					DIA K	A'A T		
20	CYLINDER CAPPING 6'' Bot ho kiik			2 SET	2	-		COMPLETO
21	AUTOMATIC COMPACTION ASPHALT			1 SET	1	-		COMPLETO A'at
22	FILTER PAPER ASPHALT			5 BOX	-	-		BOX 4 HOTU FALTA BOX 1



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
23	CYLINDER MOLD 15 X 30 CM			12 PCS	12	-	COMPLETO PARFUJU BALU MAK LA IHA
24	TRIPLE BEAM SCALE CAPACITY 2610r		RDTL - 10998/2020 - 10999/2020	3	3	-	COMPLETO IDA A'AT TAMBA NABEN IDA NIA 500 GR MAK LA IHA
25	HIDRAN 3 KG			5 PCS	-	-	UJA 3 FALTA 2
26	ALAT P3K			3 PCS	-	-	UJA HOTU



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
27	TCE 50 LTR			50 LTR	-	-	UJA HOTU
28	TOTAL STATION PRIME LESS			1 SET	1	-	COMPLETO fALTA CAS HO BATRIA MK LAKON
29	CETAKAN 15 X 15 X 75			2 PCS	2	-	COMPLETO
30	KUBUS 15 X 15 X 15 CM			12 PCS	12	-	COMPLETO PARFUJU BALU LA IHA BALU DOL



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
31	DYNAMIC CONE PENETROMETER / DCP			3 SET	3	-	COMPLETO
32	CONCRETE HAMMER (SCHMIDT HAMMER)		RDTL – 10856/2013 – 10868/2020	13	12		FALTA 1 (IDA)
33	POCKET PENETROMETER			8 SET	8		COMPLETO
34	SLUMP TEST SET+SCOOP MATERIAL			13 SET	13	-	BESI IDA LAKON, BESI IDA SEI IHA KOMPANHIA CHETLY NO PLAT IDA SEI IHA KOMPANHIA LIGELINA



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público



NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
35	SIEVE SHAKER			4 SET	3	1	COMPLETO IDA A'AT TOLU LA LAKAN
36	SPEEDY MOISTURE TESTER		RDTL- 10870/2013 – 10884/2020	15 SET	15	-	COMPLETO CARVIT HOTU
37	SOFTENING POINT TEST		RDTL – 10888/2020 – 10887/2020	2 SET	1	1	COMPLETO IDA KONDISAUN A'AT HO GAS HOTU
38	FLASH AND FIRE POINT BY CLEVELAND OPEN CUP		RDTL – 10886/2020 – 10885/2020	2 SET	2	-	COMPLETO IDA KONDISAUN A'AT (GAS HOTU)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
39	SAND CONE TEST			2 SET	2	-	COMPLETO PASIR HOTU, MARETA NO KANURU MAK A'AT
40	CORE DRILLING MACHINE INCLUDED DIAMOND BIT		RDTL - 10889/2020 - 10890/2020	2 UNIT	2	-	IDA A'AT IDA RODA MAK LA DIAK 'NO BE'E SAI LA DUN DIAK
41	REBAR DETECTION SYSTEM + CONCRETE COVER METER		RDTL - 10897/2020 - 10906/2020	3 UNIT	3	-	COMPLETO
42	REFLUX EXTRATOR TEST		RDTL- 10894/2020	2 SET	2	-	COMPLETO PEMANAS LA DIAK NO KONDISAUN A'AT



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
43	CURRENT METER		RDTL - 10896/2020	1 SET	1		COMPLETO
44	HANDELD GPS		RDTL - 10897/2020 - 10906/2020	10	10	-	COMPLETO
45	SINGLE RANGE METRIC ELECTRONIC BALANCE			1	1	-	COMPLETO NIA CAS MAK LA IHA
46	BENGKLEMAN BEAM			1 SET	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
47	PENETRATION TEST			2 SET	2	-	COMPLETO
48	DUCTILITY MACHINE			1	1	-	COMPLETO
49	WATERBATH – 1450 WATT			1 SET	1	-	COMPLETO DOBRALISA HO REDI MAK A'AT (KONDISAUN A'AT)
50	THING WALL DIAMON 3 INCH RESETTABLEK TYPE DILENGKAPI EXPANDING ADAPTER (KIIK)			4 BH	4	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
51	THIN WALL DIAMOND (BOOT)			3 BH	1	2	COMPLETO
52	MARSHALL TEST		RDTL- 12502/2020	1 SET	1	-	COMPLETO NIA PARFUJU NO BESI KAIT MAK DOL (KONDISAUN A'AT)
53	CENTRIFUGAL EXTRACTOR TEST SET			1 SET	-	1	A'AT TAMBA AKONTESE AHI HAN LAB
54	VACUUM STAND (GMM)			1 SET	1	-	COMPLETO KRAN TORNEIRA A'AT NO NIA OLI MESIN MAK HOTU (MANUTENSAUN)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
55	COMPRESSION MACHINE			1 UNIT	1	-	COMPLETO JARUM DEAL MAK LA DIAK NO OLI HYDROLIT MAK MENUS (MANUTENSAUN)
56	TIME OF SETTING OF HIDRAULIK CEMENT BY VICAT NEEDLE		RDTL - 12507/2020	4 SET	4	-	COMPLETO
57	UNIT WEIGHT (ALAT PENAKAR BULK DENSITY TEST) YIELD BUCKET 2.8 LTRS YIELD BUCKET 9.3 LTRS			1 SET	1	-	COMPLETO (Boot 1 & kiik 1)
58	SOIL SODIUM & SAUNITY TEST			1 SET	1		COMPLETO UJA HOTU



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
59	SETTING TIME BY PENETRATION RESISTANCE			1 SET	1	-	COMPLETO
60	CYLINDER SPECIMENT CAPPING SET			1 UNIT	1	-	COMPLETO (Diameter 15 ida & Diameter 10 ida)
61	CONCRETE BEAM MOLD			4 PCS	4	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
62	HYDRAULIC CONCRETE BEAM TESTING MACHINE		RDTL - 12493/2020	1 UNIT	1	-	COMPLETO
63	ABRASSION MACHINE		RDTL - 12491/2020	1 SET	1	-	COMPLETO BAUT TUTUPAN MAK DOL (MANUTENSAUN)
64	HYDROMETER ANALYSIS TEST SET		RDTL - 11000/2020	1 SET	1	-	COMPLETO (BAHAN KIMIA HOTU SODIUM HEXA IHA 2014)
65	SAND EQUIVALENT TEST SET			1 SET	1	-	COMPLETO




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
66	SAMPLE EJECTOR 6"		RDTL - 12492/2020	1 SET	1	-	COMPLETO (MANUTENSAUN)
67	CENT O GRAM BALANCE 311 G CAP X 0.01 GR SENSITIVITY			1 UNIT	1	-	COMPLETO
68	DESSICATOR			1 UNIT	1	-	COMPLETO
69	DIGITAL BALANCE 6000 G		RDTL - 404245159/2020	1 UNIT	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
70	ADJUSTABLE WRENCH (KUNCI INGGRIIS BOOT &KIUK)			2 UNIT	2	-	COMPLETO
71	FLAKINESS GAGUE		RDTL - 12499/2020	1 SET	1	-	COMPLETO
72	ELONGATION INDEX		RDTL - 12500/2020	1 SET	1	-	COMPLETO
73	METER DORONG			2 PC	1	1	IDA (1) KONDISAUN A'AT ENTREGA ONA BA LOGISTIC



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
74	SAMPLE SPLITER (FA) FINE AGGREGATE 1/4 * 32		RDTL - 12498/2014	1 SET	-	1	STEING LISTH (A'AT)
75	SAMPLE SPLITER (CA) COARSE AGGREGATE SAMPLE SPLITER "1"		RDTL - 12496/2014	1 SET	1	-	COMPLETO
76	SAMPLE SPLITER "1/2"		RDTL - 12497/2014	1 SET	1	-	COMPLETO
77	CAT PILOX			1 DOS	-	-	UJA HOTU




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
78	FARDA LAB			4 UNIT	3	-	FALTA IDA (1)
79	MASKER, KACA MATA, RAMBU-RAMBU			4 SET	-	-	A'AT HOTU / UJA HOTU
80	SINGLE RANGE ELECTRONIC BALANCE 5000 G			1 UNIT	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
81	CALIBRATION ANVIL			1 UNIT	1	-	COMPLETO
82	CBR LAB TEST SET		RDTL - 12505/2020	1 SET	1	-	COMPLETO MANUTENSAUN
83	GELAS UKUR 1000 ML			3 SET (6)	5	1	COMPLETO IDA MAK RAHUN
84	GELAS UKUR 100 ML			1 UNIT	1	-	COMPLETO




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
85	GELAS UKUR 500 ML			1	1	-	COMPLETO
86	ARMARI BESI			4 UNIT	4	-	COMPLETO (DOUBLE LIST)
87	GELAS UKUR 1000 ML			3 SET (6)	5	1	COMPLETO IDA MAK RAHUN
88	CBR ON SITE			1 SET			KOMPLETO NO KONDISAUN DIAK




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
89	METRO 10 M x 33 FT			2	-	-	LAKON
90	METRO 3M			1	1	-	COMPLETO
91	BRIKET TEST			1 SET			KONDISAUN LA DUN DIAK




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

92	KERUCUT CONE & TAMPER			1 SET				KONDISAUN DIAK
93	KERANJANG KAWAT SAMPLE BASKET			1 SET				KONDISAUN DIAK
94	WADAH PEMBESAR SAMPLE TANAH			4				KONDISAUN DIAK
95	LIQUIT LIMIT DEVICE			1 SET				KONDISAUN DIAK




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

96	MORTAR MIXER			1 SET			KONDISAUN DIAK
97	KOMPOR+ TABUNG GAS 12 KG			1 SET			KONDISAUN DIAK
98	ACRILYC TEMPAT SAMPEL TULANGAN			1			KONDISAUN DIAK
99	MEJA LABORATORIUM 530 x 75 x 85 CM			2			KONDISAUN DIAK



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
100	MEJA LABORATORIUM 240 x 120 x 85 CM			2			KONDISAUN DIAK

Aneksu C

Lista Ekipamentus no Mesuramentu Mecanica e Eletrica

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	Naran Ekipamentus or Mesuramento	Funsaun	Qty (unit)	Kondisaun
1	Digital AVO Meter 	Sukat: - Voltajen (Voltagen) - Korrente Eletrica (Corrente) - Rejistencia (Resistencia)	1	Diak
2	Ultrasonic Thickness Gauge 	Sukat mahar (Daimeter) husi Poste eletricidade no material besi seluk	3	Diak
3	Clamp meter/tang amper(AC/DC) 	Sukat Arus Beban	2	Diak
4	Hypsometer 	Atu sukat Distancia Horijontal no vertikal	2	Diak
5	Film/Coating Thickness Gauge 	Sukat mahar (Daimeter) husi tinta (Galvanize) poste nian	2	Diak

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	Naran Ekipamentus or Mesuramento	Funsaun	Qty (unit)	Kondisaun
6	Digital Insulation Resistance Tester & Multitester 	Sukat Rejistensia Isolasi husi Fiu	2	Diak
7	Power Analyser 	Sukat ka Analiza Daya (W, VA, Whr), Power Factor, Voltajen no Arus	2	Diak
8	Earth Tester 	Atu sukat Rejistensia husi ligasaun Grounding	2	Diak
9	High Voltage Insulation Tester 	Sukat Isolasi Voltajen Alta Tensaun nian	1	Diak

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	Naran Ekipamentus or Mesuramento	Funsaun	Qty (unit)	Kondisaun
10	Megger 	Sukat Rejistencia Instalasaun fasa R - S - T, N & G, wainhira atu hatama Enerjia	2	Diak
11	Toolkit Box	Fatin atu Guarda ekipamentu alat ukur	2	Diak
12	Measure Tape 50 m 	Sukat Distancia	1	Diak
13	Measure Tape 5m 	Sukat Distancia	1	Diak
14	Measure wheel 	Sukat Distancia	1	Diak

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	Naran Ekipamentus or Mesuramento	Funsaun	Qty (unit)	Kondisaun
15	Handy Talky (HT) 	Uja ba komunikasaun	2	Diak
16	Caliper 	Sukat mahar (Diameter) husi Poste eletricidade no material besi seluk	1	Diak
17	GPS 	Rekolha pontu kordinado fatin projetu	1	Diak
18	binoculars/Terompong 	Hare koneksaun no asesores iha poste tutun	2	Diak

Aneksu D

Checklist Completidade & Validasaun Dokumentus Teknika

Fund :		CHECKLIST No. 1 (Public Building)			Verified by:	Validated by:
Program:	Project Name:	Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verification Date:		
Objective:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)			Project Owner:		
Stage:				c) Village:		
Project Location:	a) District:	b) Sub-district:	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items	
A) DRAWING						
Architectural Drawing						
1	Cover Page	Apresentasaun dezenho hotu-hotu ho formatu meter (m)				
2	Table of Contents					
3	Point of Coordinates, or Site Plan	Validation of the Project Site & Status of the Land.				
4	Topography					
5	Layout	Benefits, and Objective of the Building.				
6	3D View (Optional)					
7	Floor Plan					
8	Existing Plan & New Plan (for building rehabilitation only)					
9	Building Front View					
10	Building Rear View					
11	Building Left/Right View					
12	Section (Transverse and Longitudinal)					
13	Roof Plan (Top View)					
14	Roof Frame					
15	Ceiling Plan					
16	Ceiling Frame					
17	Ceiling Details					
18	Door/Window Plan					
19	Door/Window Details					
20	Tile Plan					
21	Architectural Details (for ornaments and other architectural works)					
22	Architectural Details for Doors & Windows					
23	Access for Disability					
Structural Drawing						
1	Foundation Plan					
2	Sloof / Ground Beam Plan					
3	Column Plan					
4	Beam/Top Beam Plan					
5	Slab Plan					
6	Structural Section (for more than 1 storey building)					
7	Foundation Details	Reinforced Concrete Schedule.				
8	Sloof/Ground Beam Details	Reinforced Concrete Schedule.				
9	Column Details	Reinforced Concrete Schedule.				
10	Top Beam Details	Reinforced Concrete Schedule.				
11	Slab Details	Reinforced Concrete Schedule.				
12	Stairs Details	Reinforced Concrete Schedule.				

CHECKLIST No. 1 (Public Building)				Verified by:	Validated by:
Fund :	Project Name:				
Program:	Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verification Date:		
Objective:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:		
Stage:	a) District:		c) Village:		
Project Location:	b) Sub-district:				
Item for Verification		Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items	
13	Roof Details (Truss Details)				
14	Other Structural Details If Needed	Reinforced Concrete Schedule.			
B STRUCTURAL ANALYSIS					
1	Soil Investigation Report (<i>For more than 1 storey building</i>)	Sondir, or Boring.			
2	Structural Analysis Using Software (STAAD, SAP2K, ETABS, etc)				
2.1	Design Criteria	General Description of Structure, Structure System, Design Standard and References, Material Property, Load and Load Combinations, Modelling and Structural Analysis.			
2.3	Structural Member Design	Truss design if there is construction, Reinforced Concrete Beam Design, Reinforced Concrete Column Design, Foundation Analysis Design, and Concrete Slab Design.			
C BILL OF QUANTITY (BoQ)					
1	Bill of Quantity (BoQ)	BoQ, Overhead.			
2	Time Schedule (S Curve)				
3	Unit Price Analysis				
4	Basic Price	Reference of Local Material/Quarry & Manufacturing Resource & Co			
5	Back Up Quantity				
6	Technical Specification				
D MECHANICAL AND ELECTRICAL					
1	Layout				
1.1	Lighting	Safety, comfort & Function.			
1.2	Socked Outlets	Safety, comfort & Function.			
1.3	Other Material M/E	Safety, comfort & Function.			
2	Single Diagram Line				
2.1	Schedule Diagram Main Panels	Description, Connected Load, Phase, CB/MCB, Cable, Current RST &			
2.2	Schedule Diagram Sub Panels	Description, Connected Load, Phase, CB/MCB, Cable, Current RST & Load			
2.3	Lighting Calculation Summary	Service Area, WLH, Working Plan, Vertical Distance, Lux, Room, etc (<i>see ADN, I.P. Format</i>)			
2.4	Demand & Connected Load Summary	Description, Connected Load, Current, Demand Factor & Demand Load.			
2.5	Panel Details, MDP & SDP	Technical Specification.			
3	System Protection	Details & Specification of Arrester, Grounding, Lightning Protection, et			
4	Main Power Supply 220/380 V & 20 KV	Low Voltage/Average Voltage , and Approval by EDTL, I.P.			
5	Standard, Reference, Consideration & Literature	Related to the Referred Works.			
E TIC					
1	Local Are Network, Metropolitan Area Network, Wide Area Network				

CHECKLIST No. 1 (Public Building)				Verified by:	Validated by:
Fund :	Project Name:		Verification Date:		
Program:	Items/checklist necessary for verification by UAP team		Project Owner:		
Objective:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		c) Village:		
Stage:	a) District:	b) Sub-district:			
Project Location:	Item for Verification		Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
1.1	General Requirement	Study and Assessment, Data, Voice, Data Center, Security System and Software.			
1.2	Specific Requirement	Layout of Data, Voice, Security System, software Specification, Technical Specification, and Bill of Quantity.			
2	Software Application and Design				
2.1	User Requirement	Describe Plans and Needs of the Project Owner. Initial Assessment by the Project Owner regarding system Requirement Study Corresponding to the Owner's User Requirement			
2.2	System Requirement Study	Cost of Each Line Item Described in the System Requirement Study.			
2.3	Detailed Specification				
F	PLUMBING AND SANITATION				
1	Pipe Installation Plan				
1.1	Clean Water Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
1.2	Waste Water Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2	Detailed Drawing				
2.1	Toilet/WC	Outlet, Dimension, Inclined Pipe Installation & Construction Drawing and Absorption.			
2.2	Septic Tank and Infiltration	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.3	Floor Drain	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.4	Urinoir	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.5	Wastafel	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.6	Kitchen Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.7	Drain Detail	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.8	Rain Water Detail	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.9	Vent Pipe Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.1	Isometric Waste Pipe	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.1	Isometric Clean Water Pipe	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
G	All hard copy, and electronic copy files (excel file for cost estimates, backup quantity & AutoCad for drawing).				

Fund :		CHECKLIST No. 2 (Bridge)				Verified by	Validated by
Program		Project Name		Verification Date			
Objective		Items/checklist necessary for verification by UAP team		Project Owner			
Stage		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		c) Village:			
Project Location		a) District :		b) Sub district :			
Item for Verification		Point for Verification		Verify (Yes/No)		Comments for unavailable items	
A Drawing							
1	Cover Page	Owner's logo, Project Name, Designer, Location, etc.					
2	Approval Sheet	Signatures (Designer & Owner).					
3	Table of Contents	Drawing list.					
4	Standard Drawings	Typical drawings of bridge.					
5	Structural Notes	Load standards, and Material used.					
6	General Notes	Load standards, and Material used.					
7	Location Map	Position of the bridge including the coordinates point.					
8	Legends and Abbreviations						
9	Topography	Contour lines, and Bench Marks (BM).					
10	Plan, Elevation and Details	Bridge layout, elevations, and section drawings of bridge.					
11	Foundation Plan & Details of Bridge	Type, Dimensions, Layout, and Depth.					
12	Sub Structure Plan & Details of Bridge	Layout, Dimensions, Reinforcement Details & Bar Bending Schedule.					
13	Super Structure Plan & Details of Bridge	Dimensions, reinforcement details & bar bending schedule.					
14	Drainage Plan & Details of Bridge	Layout, dimensions, reinforcement details & bar bending schedule.					
15	Construction Method	Method of works to be used in constructing the bridge.					
16	Bridge Accessories	Guide Post, Bridge Illumination, Railings, etc.					
17	Access Road Plan	Cross section, Elevation, Foundation and Pavement Details.					
18	River Training Plan & Details	Layout, Sections, Details.					
19	3D Views (Optional)						
Cost Estimation		Owner's approval.					
1	Back Up Quantity Computation	Signatures (Designer & Owner).					
2	Unit Price Analysis	Signatures (Designer & Owner).					
2.1	Reference of Local Material/Quarry	Quarry map, Capacity, and Distance to the Project Site.					
2.2	Reference of Manufacture Resource & Cost	Reference of Imported Materials Basic Price, and Delivery Cost.					
2.3	Transportation Rate	From Supply Point to the Project Site.					
3	Overhead						
B							

Fund :		CHECKLIST No. 2 (Bridge)				Verified by	Validated by
Program		Project Name					
Objective		Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verification Date			
Stage		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner			
Project Location		a) District :		c) Village:			
		b) Sub district :		Verify (Yes/No)			
		Item for Verification		Point for Verification		Comments for unavailable items	
C		Time Schedule (S-Curve)		Signatures (Designer & Owner).			
D		Design Report		Design Criteria, Studies Conducted, Design Result, etc.			
E		Bidding Documents					
F		Technical Specification					
G		All hard copy, and electronic copy files (excel file for cost estimates, backup quantity & AutoCad for drawing).					

Fund:		CHECKLIST No. 3 (Roads- New and Rehabilitation)				Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:		Verification Date:			
Objective:		Items/checklist necessary for verification by UAP team		Project Owner:			
Stage:		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:			
Project Location:		a) District:		b) Sub-district:		c) Village:	
		Item for Verification		Point for Verification		Verify (Yes/No)	
		Comments for unavailable items					
A	Drawing						
1	Cover Page						
2	Approval Sheet						
3	Table of Content						
4	Standard Drawing						
	4.1 Location Map			Status of the Land			
	4.2 Legend & Abbreviations						
	4.3 General Notes						
	4.4 Typical Roadway Cross Sections						
	4.5 Standard Drawing of Road Geometric Design						
	4.6 Typical Drawing of Drainage and Slope Protection Structures						
	4.7 Standard Drawing & Detail of Miscellaneous Structures						
5	Schedule						
	5.1 Schedule of Drainage & Slope Protection Structures						
	5.2 Schedule of Miscellaneous Structures						
	5.3 Schedule of Intersections						
6	Plan & Profile						
7	Cross Sections						
8	Drainage Cross Sections						
9	Structures						
	9.1 General notes						
	9.2 Detailed Drawing of structures						
10	Bio Engineering						
	10.1 Bio Engineering Schedule						
	10.2 Bio Engineering Details						
11	Intersection Details						
12	Road Marking Plan						
13	Other Plan and Details						
14	Appendix						

Fund:		CHECKLIST No. 3 (Roads- New and Rehabilitation)				Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:					
Objective:		Items/checklist necessary for verification by UAP team				Verification Date:	
Stage:		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)				Project Owner:	
Project Location:		a) District:				c) Village:	
		b) Sub-district:					
		Item for Verification		Point for Verification		Verify (Yes/No)	
						Comments for unavailable items	
B		Cost Estimation					
1		Back-Up Quantity Computation					
2		Unit Price Analysis					
	2.1	Reference Price of Local Material/Quarry					
	2.2	Reference Price of Material Import or Fabrication					
	2.3	Transportation Rate					
3		Overhead					
C		Time Schedule (S-Curve)					
D		Technical Specification					
E		Design report					
F		Bidding documents					
G		All hard copy, and electronic copy files (excel file for cost estimates, backup quantity & AutoCad for drawing).					

Fund :		CHECKLIST No. 4 (FS, DED, SC, AS & Geotechnical Investigation)		Verified by:	Validated by:
Program:	Objective:	Project Name:	Verification Date:		
Stage:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)	Project Owner:	Project Owner:		
Project Location:	a) District:	b) Sub-district:	c) Village:	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
Item for Verification		Point for Verification			
A TOR Feasibility Study					
TOR should follow MPS FS Guidelines					
1	Objective of Project				
2	Background				
3	Scope of Works				
3.1	General Requirement of FS				
3.2	Specific Request				
3.3	Cooperation				
3.4	Responsibility of the Government				
3.5	Services and Facilities provided by the Employer				
4	Assignment of Experts				
4.1	Period of FS				
4.2	Assignment of Experts				
5	Reports and documents				
5.1	Reports to be submitted				
5.2	Contents of Reports				
5.3	Reports copy number and submission date				
5.4	Attachment to study report				
6	Outline of Project				
B TOR Detailed Engineering Design					
1	Introduction				
1.1	Definitions				
1.2	Background				
1.3	Objective				
1.4	Scope of Service				
1.5	Project Location				
2	Scope of Works				
3	Responsibilities of Design Consultant				
4	Design Cost				
5	Output of Design Activities				
5.1	Inception Report				
5.2	Interim Report				
5.3	Draft Final Report				
5.4	Final Report				
6	Principle				
7	Design Criteria				
7.1	General Criteria				
7.2	Specific Criteria				
8	Design Process				
9	Design Input				
9.1	Information				
9.2	Personnel				
9.3	Person-Month Requirement				
9.4	Facilities Provided by the Government				
9.5	Facilities Provided by the Consultant				
10	Payment				
11	Work Program				
12	Cost Estimation				

Fund :		CHECKLIST No. 4 (FS, DED, SC, AS & Geotechnical Investigation)		Verified by:	Validated by:
Program:	Project Name:	Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verification Date:	
Stage:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)	Project Owner:		Project Owner:	
Project Location:	a) District:	b) Sub-district:		c) Village:	
Item for Verification		Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items	
C TOR Supervision Consultant					
1	Introduction				
	1.1 Definitions	Name of Activity, Project Owner, Management of Activities, Procurement Process, and Supervision Consultant.			
	1.2 Background				
	1.3 Objective				
	1.4 Scope of Service				
	1.5 Project Location	Location map & Site plan.			
2	Scope of Works				
3	Responsibilities of Supervision Consultant				
4	Construction Supervision Cost				
5	Output of Construction Supervision Activities				
	5.1 Inception Report				
	5.2 Daily Record				
	5.3 Weekly Report				
	5.4 Monthly Report				
	5.5 Time Schedule				
	5.6 Construction Progress Reports				
	5.7 Shop Drawings				
	5.8 Document of Design Changes				
	5.9 Document of Quality Control				
	5.10 Document of Extra Items or Extra Claims				
	5.11 Minutes of Site Meeting				
	5.12 Photographs				
	5.13 As-built drawings				
	5.14 Manuals				
	5.15 Record of Commissioning				
	5.16 Construction Supervision Completion Report				
6	Principles				
7	Construction Supervision Criteria				
	7.1 General Criteria				
	7.2 Objective Criteria				
	7.3 Functional Criteria				
	7.4 Procedure Criteria				
	7.5 Technical Criteria				
8	Construction Supervision Process				
	8.1 Preparation				
	8.2 Implementation				
	8.3 Consultation				
	8.4 Reports				
	8.5 Document				
9	Construction Supervision Input				
	9.1 Information				
	9.2 Personnel				
	9.3 Person-Month of Consulting Services	Key experts and their experiences.			
	9.4 Facilities Provided by the Government of Timor-Leste	Table of the person month requirement.			
	9.5 Facilities Provided by the Supervision Consultant				
10	Work Program				
11	Payment	The type of payment to Supervision Consultant (time or progress based).			
12	Cost Estimation	Submitted.			

Fund :		CHECKLIST No. 4 (FS, DED, SC, AS & Geotechnical Investigation)		Verified by:	Validated by:
Program:	Objective:	Project Name:	Verification Date:		
Stage:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)	Project Owner:	Project Owner:		
Project Location:	a) District:	b) Sub-district:	c) Village:		
Item for Verification		Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items	
D	T.O.R Advisory Service				
1	Introduction				
	1.1 Background	A background of the project.			
	1.2 Project Location	Map.			
	1.3 Objective				
	1.4 Project Scope	A description of the project scope.			
2	The Services				
	2.1 Assessment				
	2.1.1 Legal	Legal due diligence.			
	2.1.2 Technical	Technical due diligence.			
	2.1.3 Financial	Financial due diligence.			
	2.1.4 Environmental and Social [(E & S) if needed]	E&S Scoping.			
	2.2 Findings and Recommendation	Legal, Technical, Financial, and E&S findings and recommendations (subject to the project type).			
	2.2.1 Present Findings and/or Recommendation	Minutes of Meeting reflecting recommendation, comments, and decision from the client.			
	2.2.2 Reports				
3	Report Outputs/Deliverables				
	3.1 Report to be Submitted	Interim Report, and Final Report.			
	3.2 Contents of Report	Legal framework and regulatory requirements. Financial Model, Financial Projections, Internal Rate of Return (IRR) etc-subject to the project type. Development Plan, Design, Cost estimate etc. E&S risks and impacts and their corresponding mitigation measures (e.g. Resettlement action plan , IEE, EIA, SIA, or ESIA, E&S Management Plan). Summary of the Legal, Technical, Financial, E&S Findings, Conclusions, and Recommendations.			
	3.3 Reports Copy Number and Submission Date				
	3.4 Attachment to Study Report	Project Information, Photographs, Project Scope in Details, Services in Details, Staffing in details with target timetable commencement and completion date, Case Studies (if required), Work Program and Indicative Timetable, etc.			
4	Principle				
	4.1 Work Program				
	4.2 Indicative Timetable or Schedule	Schedule per each deliveries.			
	4.3 Personnel Required	Appropriate educational degree, relevant training and adequate years of experience.			
	4.4 Remuneration	Table of the person month requirement.			
	4.5 Ownership of Information and Confidentiality				
E	TOR Geotechnical Investigation (Stand Alone)				
1	Introduction				
	1.1 Background	Location map (with coordinates, if necessary) & Status of the Land.			
	1.2 Project Location	A description of project objectives.			
	1.3 Objective				
	1.4 Project Scope	A description of the project scope.			
2	Scope of Work				
	2.1 Subsurface Soil Exploration Work	Sondir Testing or Boreholes: Results of the field work and laboratory tests, report with conclusions on the geotechnical properties of the soil strata underlying the site in relation to the usage of the site and any recommendations for further action if needed.			

Fund :		CHECKLIST No. 4 (FS, DED, SC, AS & Geotechnical Investigation)				Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:		Verification Date:			
Objective:		Items/checklist necessary for verification by UAP team		Project Owner:			
Stage:		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		c) Village:			
Project Location:		a) District:		Verify (Yes/No)		Comments for unavailable items	
Item for Verification		Point for Verification					
	2.2 Reports and Documents						
3	Deliverables						
	3.1 Report to be Submitted		Inception Report, Interim Report, and Final Report.				
	3.2 Contents of Report		Site/location (soil morphology and site geology), procedure or methodology used in investigation, ground investigations work carried out, field works/ tests with tests results, ground conditions, geotechnical characteristics/sections (description of the soil stratigraphy based on the boreholes, if required), hydrological conditions, geotechnical considerations, recommendations based on the investigation.				
	3.3 Reports Copy Number and Submission Date						
	3.4 Attachment to Study Report		Photograph, Plots of location, Diagram, Test Certificates, etc.				
4	Principle						
	4.1 Work Program						
	4.2 Indicative Timetable		Schedule per each deliverables.				
	4.3 Personnel Required		Educational degree, relevant training and adequate years of experience.				
	4.4 Remuneration		Table of the person month requirement.				
	4.5 Ownership of Information and Confidentiality						
5	Duration		Total number of working days, from commencement to completion.				
6	File (Hard copies and Electronic Copies)		Submitted.				

Fund :		CHECKLIST No. 5 (Clean Water and Irrigation)			Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:				
Objective:		Items/checklist necessary for verification by UAP team			Verification Date:	
Stage:		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)			Project Owner:	
Project Location:		a) District:			c) Village:	
		b) Sub-district:				
Item for Verification		Point for Verification			Verify (Yes/No)	
Comments for unavailable items						
A Clean Water – Gravitation						
1	Clean Water Data /Water Source with Debit					
2	Population Data of the Referred Location					
3	Clean Water Debit Plan for the Referred Location					
4	Water Source Coordinates and Community Area Coordinates					
5	General Map (Google Map)					
6	Topography (Hand Level, and Total Station)					
7	Long Section /Profile					
8	Installation Plan based on the Survey Data					
9	Capturing: Section and Detail					
10	Reservoir: Section and Detail					
11	Bpt Placement (if needed)					
12	Public Faucet Placement					
13	Hydraulic Analysis					
14	Community Map					
B Clean Water – Drilling						
1	Drill Location Plan					
2	Referred Water Location Coordinates					
3	Public Location (Require Authorization Letter from the Land and Property)					
4	License Issuance Letter / Authroization from I.P.G					
5	Debit Plan Needed					
6	Electrical Resistivity Test Data/ Survey.					
7	Hydraulic Analysis					
8	Population Data of the Referred Location					
9	Clean Water Debit Plan for the Referred Location					
10	Water Source Coordinates and Community Area Coordinates					
C						
1	Irrigation					
2	Coordinates of the Referred Location					
3	Water Source Data : Debit					
4	Agricultural Area (Ha)					
5	Debit Plan needed					
6	General Map (Google Map)					
7	Topography Survey (Hand Level, or Total Station)					
8	Long Section / Profile					
9	Cross Section					
10	Distribution Map / Principal Line					
11	Hydraulic Analysis					
12	Population Data (Farmers)					

Fund :		CHECKLIST No. 5 (Clean Water and Irrigation)				Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:					
Objective:		Items/checklist necessary for verification by UAP team				Verification Date:	
Stage:		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)				Project Owner:	
Project Location:		a) District:				c) Village:	
		b) Sub-district:					
		Item for Verification		Point for Verification		Verify (Yes/No)	
						Comments for unavailable items	
12		General Layout of the Agricultural Area					
13		Primary Line Plan					
14		Secondary Line Plan					
15		Tertiary Line Plan					
16		Specification for Utilities Prepared in the Design					
17		All hard copy, and electronic copy files (excel file for cost estimates, backup quantity & AutoCad for drawing).					

Aneksu E

Perfil Fungsionarios ADN, I.P.



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
I				
Diretor Executivo - ADN, I.P.				
1	Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M. Eng.	Escritorio Diretor Executivo	Diretor Executivo ADN, I.P.	
II				
Gabinete Apoio ao Diretor Executivo (GADE) - ADN, I.P.				
II.1. Diretor Adjunto - ADN, I.P.				
1	Januario Maia Guterres, S.T.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Diretor Adjunto	
2	DR. Manuel Moita da Silva Júnior	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Assesor Juridico	
3	Brijita Joanila Fernandes	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Secretaria Diretor Adjunto	
II.2. Secretariado Unidade Apoio ao Diretor Exekutivo - ADN, I.P.				
1	Joedia Marni Tavares	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Secretaria e Asistente Administrasaun Diretor Executivo	
2	Carla Angela Idalina Viegas Monteiro	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Secretaria e Asistente Administrasaun Diretor Executivo	
3	Marfa Zita Cristovão do Carmo Vieira, Lic. CSH.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Secretaria e Asistente Administrasaun Diretor Executivo	
4	Basilio Da Conceição Silva	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Motoristas & Administrasaun Unidade ao Apoio Diretor Exekutivo	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
5	Mateus da Silva	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Motoristas & Administrasaun Unidade ao Apoio Diretor Exekutivo	
II.3. Equipa de Validação e Base de Dados -ADN, I.P.				
1	Susana Sinala do Rego Amaral, S.T.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Chefe Equipa - VBD	
2	Ana Maria Lourdes da Costa Guterres, B.ETT.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (Mecânica e Elétrica)	
3	Johanes Hornay, S.T.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (Edificio Publicas)	
4	João Paulo Amaral, S.T.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (Pontes, Estrada e Seias)	
5	Olivia Soares, B.EC.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	En. Equipa - VBD (Pontes, Estrada e Seias)	
6	Nencia Filomena Oliveira do Rego, S.Kom.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (TIC)	
7	Tifânia Clotária Guterres Ornai, Lic. Eng.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (Kompiladora Dadus Projetus e GIS-Geographic Information System)	
II.4 Equipa de Mídia - ADN, I.P.				



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
1	Samuel Soares	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Assesor Nacional da Mídia	
2	David da Silva	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Designer de Mídia	
3	Franzela Pinto	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Assistente Mídia	
III Unidade Gestão Administrativa (UGA) - ADN, I.P.				
III.1. Departamento Administração & Finanças - ADN, I.P.				
1	Nelson Soares Pinto, L. Ec.	UGA - Administração & Finanças	Koordenador- UGA	
2	Epi Orleães, Lic. Educ., M.M.	UGA - Administração & Finanças	Public Finance Management and Gender & Social Inclusion Advisor	
3	Amélia da Costa, L. Ec.	UGA - Administração & Finanças	Chefe Departamento - Adm & Finanças	
4	Angela Merisia Egong Correia, S.E.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Finanças	
5	Abelito da Costa, L.Agrn.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Finanças	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
6	Sonyta Mariana Elisabeth Da Silva Henuk, S.I.P.		Oficial Administrasaun	
7	Elisabeth Felizarda Ximenes, S.T.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Administrasaun	
8	Nelson Teotonio Barros Fernandes Magno, Lic. CSH.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Administrasaun	
9	Edivijes Soares Lobo	UGA - Administração & Finanças	Assistente Official Administrasaun	
10	Lourdes Pereira, S.T.	UGA - Administração & Finanças	Assistente Official Administrasaun	
11	Carlos Mendonça Calapes	UGA - Administração & Finanças	Assistente Official Administrasaun	
III.2. Departamento Aproximacionamento - ADN, I.P.				
1	Jose Antonio Filomeno Gago Exposto, Lic. Eco.	UGA - Aproximacionamento	Oficial Aproximacionamento	
2	Sertorio Martins	UGA - Aproximacionamento	Oficial Aproximacionamento	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
3	Lidia da Cruz Monteiro, B. Educ.	UGA - Aproxionamento	Assistente Official Aproxionamento	
III.3. Departamento Recursos Humanos e Formação - ADN, I.P.				
1	Tomas Magno do Carmo, S.E., M. Eco.	UGA - Recursos Humanos e Formação	Acting & Assessor Nacional Recursos Humanos e Formação	
2	Isabel Gomes Lopes, Lic. Eco.	UGA - Recursos Humanos e Formação	Assesora Politicas Publicas	
3	Gicella Jong Gonçalves, Lic. Eco.	UGA - Recursos Humanos e Formação	Official Recursos Humanos	
III.4. Departamento Logística e Patrimonio - ADN, I.P.				
1	Jose Amaral, S.I.P.	UGA - Logística e Patrimonio	Chefe Dept. Logística e Patrimonio	
2	Sandra Ribeiro Belo, Lic. Eco.	UGA - Logística e Patrimonio	Assistente Administracao da Logística e Patrimonio	
3	Marcelino Soares do Carmo, S.T.	UGA - Logística e Patrimonio	Assistente da Logística e Patrimonio	
4	Sergio Gomes	UGA - Logística e Patrimonio	Assistente da Logística e Patrimonio	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
5	Arcenio Magno Do Rego	UGA - Logística e Patrimonio	Mecânico de Automóveis	
6	Jony Maia da Silva dos Santos	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Bobonaro	
7	João Pedro Cortereal	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Aileu	
8	Silveiro da Costa	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Manufahi	
9	Bernado Da Cruz Amaral Perreira	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
10	Manuel Antonio Soriano	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
11	Bendito Mendes Bento	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Viqueque	
12	Domingos Da Costa	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
13	Agostinho Amaral	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Covalima	
14	Rui Antonio Gaio	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Liquisa	
15	Gilroy Marcal daa Cunha Braz	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasiona)	
16	Rafael Joaquim Mousaco Galucho	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasiona)	
17	Timoteo Da Silva Morais	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Manatuto	
18	Joel Barreto Abrantes	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Laboratório)	
19	Delio Abel Manuel Perreira	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Lautem	
20	Anacleto de Sousa Belo	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Baucau	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
21	Salvador Ruas Amaral	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
22	Siltonio Pinto de Araujo	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
23	Rosario Saores de Deus	UGA - Logística e Patrimonio	Motorista Ermera	
24	Lucas Alberto Soares Pereira	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Ainaro	
IV	Unidade de Avaliação de Projetos (UAP) - ADN, I.P.			
IV.1.	Secretariado UAP - ADN, I.P.			
1	Melenia da Costa Barros, B. EC., S.T.	UAP	Koordenadora - UAP	
2	Miguel Marques Monteiro de Jesus, S.T., M. Eng.	UAP	Assesor Nacional Mecânica e Elétrica (UAP & UCVQ)	
3	Joanito Doutel Pereira, B. Eng.	UAP	Assesor Nacional Water & Irrigation (UAP no UCVQ)	
4	Rosaria Elizabeth Aniceto Cardoso Amaral, B.S, M.S.	UAP	Assesora Nacional Project Management (UAP no UCVQ)	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
5	Maryanti Kota dos Santos, Lic. Eco.	UAP	Official Administração - UAP	
6	Fidelia Auxiliadora da Conceicao Freitas, Lic. Eco.	UAP	Assistente Administração - UAP	
IV.2. Departamento Avaliação de Projetos Infraestruturas Transportes, Irrigação, Água e Saneamento (ITIAS) - ADN, I.P.				
1	Rogério Marçal Pires, B. EC., Lic. Eng.	UAP-ITIAS	Eng. Senior - ITIAS	
2	Daniel Arcanjo Alves, S.T.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	
3	Martinho da Costa Graciano, B. EC., Lic. Eng.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	
4	Mario Gusmao Mendeita da Cruz Nunes Silva, S.T.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	
5	Anjelita Maria de Jesus Cardoso, S.T.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	
6	Olivio Marcos da Silva Correia, S.T.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	
IV.3. Departamento Avaliação de Projetos Edifício Públicos, Mecânica e Energia Elétrica, TIC, Jardins e Monumentos (EMETIJM) - ADN, I.P.				



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
1	Amorin Soriano Menezes, ST	UAP-EMETIJM	Eng. Senior - EMETIJM	
2	Arlindo Sarmento Monteiro, S.T.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
3	Paulino Abrantes Correia, B. EC.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
4	Oscar Monteiro Gomes, S.T.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
5	Maria Melania Mendonça Oca, S.T.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
6	Angelica da Costa, B. ETT.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
V	Unidade Controlo e Validação de Qualidade (UCVQ) - ADN, I.P.			
V.1.	Secretariado UCVQ - ADN, I.P.			
1	Emerenciana da Costa Maia Freitas, S.T., M.T.	UCVQ	Koordenadora - UCVQ	
2	Santoso, S.T.	UCVQ	Assesor Internacional Estrutura (UCVQ & UAP)	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
3	Aleixo Amaral do Carmo, S.T.	UCVQ	Assesor Nasional Pontes Estradas (UCVQ & UAP)	
4	Joaninha da Costa	UCVQ	Official Administrasaun	
5	João Marcos Napoleão Gracia	UCVQ	Assistente Official Administrasaun	
V.2. Departamento Infraestruturas de Transportes e Irigasaun - ITI				
1	Remigio da Conceição Soares dos Santos, S.T.	UCVQ-ITI	Eng Senior - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
2	Aniceto da Costa, B. EC, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
3	Manuel Bany da Silva Cristovão de Carvalho, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Ainaro - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
4	Jacob da Costa Camões, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Baucau - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
5	Jose Aparicio Sanches Soares, B.EC.	UCVQ-ITI	Eng Bobonaro - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
6	Salvador Martins, S.T,	UCVQ-ITI	Eng. Viqueque - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
7	Domingos Soares Martins, B. EC.	UCVQ-ITI	Eng. Covalima - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
8	Bosco Dinis de Sousa, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Covalima - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
9	Joao Quintao do Rego, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Dili - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
10	Eduardo dos Santos, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Dili - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
11	Antonio Mendonça Faria Da Silva, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Ermera - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
12	Marcus Ximenes de Araujo, S.T.	UCVQ-ITI	Eng Liquisa - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
13	Geovanio Mateus Xavier Carlos Aleixo, B.EC.	UCVQ-ITI	Eng Lautem - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
14	Deomentino Henrique Lopes, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Lautem - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
15	Augusta da Costa Ferreira, B.EC.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
16	Jose Roberto Carlos Gusmao, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Manututo (Siksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	
17	Romulo João Marques Henrique, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Manufahi (Siksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	
18	Celvio Justino Alves, B.EC, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Aileu - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
19	Roberto Maria Martins, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Viqueque - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
20	Vidal Guterres, B.EC, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
21	Tito Edgar Fatima Napoleão de Jesus, S.T.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
22	Terresa Gomes, S.T.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
23	Rui Lopes, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Aileu - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
V.3. Departamento Edifícios Públicos no Be'e Mos - EPBM				
1	Francisco Xavier de Jeronimo, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng Senior - Edificio Publicas no Be'e Mos	
2	Ir. Musalam Bin Umar Bassarewan	UCVQ-EPBM	Assesor Nasional Edificio Publicas (UCVQ & UAP)	
3	Julmira Soares Sampaio, B. EC.	UCVQ-EPBM	Eng. Edificio Dili - Konsultan ba Edifisio Publiko, Agua e Saneamento	
4	Egidio Gonçalves, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Edificio Dili - Konsultan ba Edifisio Publiko, Agua e Saneamento	
5	Aleixo da Costa Andrade, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Manututo - Edifisio no Be'e mos	
6	Bebiano Crecêncio De Jesus Lopes, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Viqueque - Edifisio no Be'e mos	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
7	Fidelis Mardiano da Costa, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Manufahi Edifisiu no Be'e mos	
8	Merinho Cuco Lopes de Araujo, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Aileu - Edifisiu no Be'e mos	
9	Joaquim de Carvalho Madeira, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Ainaro Edifisiu no Be'e mos	
10	Agostinho Aranda, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Baucau Edifisiu no Be'e mos	
11	Zulkarnaen Depari, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Bobonaro - Edifisiu no Be'e mos	
12	Madelino Deonizio Jose Magno, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Covalima - Edifisiu no Be'e mos	
13	Prezencio Legorio Carmo Dias Ximenes, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Covalima - Edifisiu no Be'e mos	
14	Manuel Estrela Soares de Oliveira, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Dili - Edifisiu no Be'e mos	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
15	Pedro de Lourdes Alves, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Dili - Edifisiu no Be'e mos	
16	Jaimito Manuel Quintao, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Ermera - Edifisiu no Be'e mos	
17	Juninho Antonio Abrantes da Cruz, B. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Liquisa - Edifisiu no Be'e mos	
18	Inocencio dos Reis Costa Maria, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Lautem -Edifisiu no Be'e mos	
19	Rosalia de Fatima, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Dili -Edifisiu no Be'e mos	
V.4. Departamento Mecânica & Energia Eléctrica				
1	Deolindo de Fatima Marques, B.ETT	UCVQ-M & E	Eng Senior - Mecânica e Energia	
2	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares, S.T.	UCVQ-M & E	Eng. Mecânica e Eletrica	
3	Camilio de Jesus, B.ETT.	UCVQ-M & E	Eng. Mecânica e Eletrica	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
4	Adonis Julio Fernandes, B.ETT.	UCVQ-M & E	Eng. Mecânica e Eletrica	
V.5. Departamento Tecnogia da Infomação e Comunicação - TIC				
1	Romualdo Duarte Guterres	UCVQ- TIC	Assesor Nacional TIC (UAP, UCVQ, e UGA)	
2	Ezequiel Ricardo de Oliveira, S.T.	UCVQ- TIC	Eng. Senior - Official ICT (UCVQ, UAP e UGA)	
V.6. Departamento Laboratório				
1	Jony Rodrigues Varela, S.T.	UCVQ - Laboratório	Eng. Senior Laboratorio	
2	Eng. Agus Widiando	UCVQ - Laboratório	Assesor Internacional (Laboratorio & UEDC)	
3	Angelina Amaral, S.T.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Manufahi, Aileu e Manatuto	
4	Lizete Magno de Jesus, Lic. Eng.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório Baucau, Viqueque e Lautem	
5	Guido Carceres Tilman, Lic. Tec.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Maliana, Covalima e Ainaro	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
6	Abel Soares da Silva, Lic. Eng.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Maliana, Covalima e Ainaro	
7	Alcino Francisco Paicheco, Lic. Eng.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Baucau, Viqueque e Lautem	
8	Barbara Carmelinda Gusmao, S.T.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Manufahi, Aileu e Manatuto	
9	Abel Fernando, S.T.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Dili, Liquisa e Ermera	
VI	Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências - UEDC			
VI.1.	Secretariado UEDC - ADN, I.P.			
1	Valentina Violet Correia Bianco, S.T.	UEDC	Koordenadora - UEDC	
2	Maria José Rosário de Jesus, B. B.	UEDC	Official Administração - UEDC	
VI.2	Departamento Pesquisa			
1	Jose Fernando Liu Soares, S.T.	UEDC - Pesquisa	Eng. Senior Pesquisa	
2	Joaquim da Silva Pinto, B. EC., Lic Eng.	UEDC - Pesquisa	Eng. Pesquisa	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. SEGUNDO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
3	Hindun Nofitri da Conceição Isya, B.S. MSE.	UEDC - Pesquisa	Eng. Pesquisa	
VI.3. Departamento Estandardização				
1	Demistocles Graciliano Ximenes Fernandes Cabral, S.T.	UEDC - Estandardização	Eng. Senior - Estandardização	
2	Marcelino Amaral, B. EC.	UEDC - Estandardização	Eng. Estandardização	
VI.4. Departamento Capacitação				
1	To be Name	UEDC - Capacitação	Chefe Dept. Capacitação	
2	To be Name	UEDC - Capacitação	Eng. Dept. Capacitação	

