



REPÚBLIKA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATORIU MENSAL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISIPIU DILI

SETEMBRO 2021



SUMARIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTASAUN PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO DILI

SETEMBRO 2021

Prepara Husi :



(Eng. Manuel Estrela)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Dili ADN,IP



(Eng. Pedro de Lurdes Alves)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Dili ADN,IP



(Eng. Julmira S. Sampaio)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Dili ADN,IP




(Eng. Egídio Gonçalves)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Dili ADN,IP




(Eng. Eduardo do Santos)

Eng. ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Dili ADN, I.P



(Eng. João Q. do Rego)

Eng. ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Dili ADN, I.P



(Camilio de Jesus)

Eng. M & E, Municipio Dili ADN, I.P



(Arc. Francisco X. D. D. Jeronimo)

Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, ADN, I.P



(Eng. Aniceto da Costa)

Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun, ADN, I.P



(Deolindo de F. Marques)

Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng.)

Director Executivo, ADN, I.P



Contents

I. INTRODUSAUN.....	2
1.1 Enkuadramentu Legal.....	2
1.2 Perfil Municipio Dili	2
Tabel 1.2.1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.	3
Tabel 1.2.2 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Dili	4
Tabel 1.2.3: Lista Asset ADN,I.P Municipio Dili.	4
1.3. Lista Projectos	5
Tabel 1.3.1: Projecto Municipio Dili Por Fundus Finansiamento	5
Tabel 1.3.2: Projecto Municipio Dili Por Sector.....	9
Tabel 1.3.3: Projecto Municipio Dili Por Ministerio	19
Tabela 1.3.4 : Population Projection Municipiu, Postu Administrativo, Suco tuir Sexu no Grupu idade 2015-2022.	38
II. PROGRESU FISIKU	39
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	39
III. OBSTÁCLO IHA TERENU.....	39
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	39
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	40
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	40

I. INTRODUSAUN


1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefisiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimento nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvimento nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio Dili

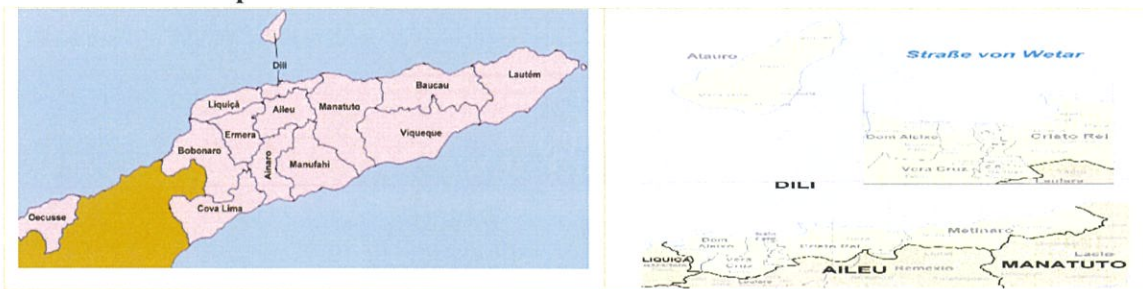

Dadus husi Livru 3B OJE 2021, Pajina 46

Mapa hatudu pozisaun jeográfika Autoridade Munisipal Dili iha luan hamutuk 372 km² ho populasaun 234,026 tuir Sensus 2010. Autoridade Munisipal Dili iha Posto Administrativo 6 ho Sukus 31 no aldeias 241 hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabel 1.2.1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.

Cristo Rei		Dom Aleixo		Vera Cruz	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	T.Aldeias
Balibar		Bairro Pite		Caicoli	
Becora		Comoro		Colmera	
Bidau Santana		Fatuhada		Dare	
Camea		Kampung Alor		Lahane Occidental	
Culu Hun				Mascarenhas	
Hera				Motael	
Metiaut				Vila Verde	
Total					
Nain Feto		Atauro		Metinaro	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	T.Aldeias
<u>Acadiru Hun</u>		<u>Beloi</u>		<u>Duyung</u>	
Bemori		<u>Biqueli</u>		<u>Sabuli</u>	
<u>Bidau</u> <u>Lecidere</u>		<u>Macadade</u>			
Gricenfor		<u>Maquili</u>			
Lahane Oriental		<u>Vila</u> <u>Maumeta</u>			
Santa Cruz	-	-	-		
Total					

Tabel 2.2.2 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Dili

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Dili								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	7					7	
2	Administrasaun no Financas	0					0	
3	Motorista	0					0	
4	Seguransa	0					0	
Total		7					7	

Tabel 3.2.3: Lista Asset ADN,I.P Municipio Dili.

ASET ADN,IP MUNICIPIO DILI								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	0						
2	Armazem	0						
3	Kareta	0						
4	Motor	0						
5	Destop	6						
6	Laptop	1						
7	Printer	0						
8	Maquina Foto copya	0						
9	UPS	0						
10	Projector	0						
11	Saund System	0						
12	Server	0						
13	Handy Cam	0						
14	TV							
15	Equipamento Laboratorium	0						
16	Mesa	0						
17	Mesa Parti san	0						
18	Kadeira Roda	7						
19	Kadeira Biasa	0						
20	Armario File Besi	0						
21	Armario File Aluminium	0						
22	Armario File Ai	0						
23	Gaveta	7						
24	Sofa	0						
25	AC	0						
26	Lampu	0						

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dados projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Financiamento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabel 1.3.1: Projecto Municipio Dili Por Fundus Financiamento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL Emergency		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Atauro	4	\$ 752,749.10	67.97%
2	Cristo Rei	5	\$ 509,786.59	90.00%
3	Dom aleixo			
4	Metinaro	1	\$ 122,960.04	90.00%
5	Nain Feto			
6	nasional			
7	Oe-cusse			
8	vera cruz			
	Grand Total	10	\$ 1,385,495.73	78.03%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Atauro	1	\$ 297,409.09	13.56%
2	Cristo Rei	20	\$ 16,769,036.37	83.71%
3	Dom aleixo	25	\$ 38,591,037.23	53.98%
4	Metinaro	1	\$ 2,390.32	0.00%
5	Nain Feto	8	\$ 10,429,350.36	72.59%
6	nasional	18	\$ 101,481,840.87	70.86%
7	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	66.42%
8	vera cruz	1	\$ 8,178,886.44	81.13%
	Grand Total	94	\$ 205,535,282.41	35.73%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL LM-BS		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Atauro			
2	Cristo Rei	7	\$ 1,089,743.64	44.91%
3	Dom aleixo	13	\$ 1,928,351.38	80.05%
4	Metinaro	2	\$ 669,754.20	83.84%
5	Nain Feto	10	\$ 631,118.32	49.97%
6	nasional	4	\$ 473,527.76	75.75%
7	Oe-cusse			
8	vera cruz	1	\$ 373,666.00	40.00%
	Grand Total	12	\$ 752,681.53	78.62%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL LM-CD		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Atauro			
2	Cristo Rei	10	\$ 1,317,580.01	31.56%
3	Dom aleixo	15	\$ 2,925,417.81	63.66%
4	Metinaro	2	\$ 861,013.77	78.86%
5	Nain Feto	8	\$ 1,537,247.18	83.13%
6	nasional	6	\$ 48,615,298.46	62.96%
7	Oe-cusse			
8	vera cruz	1	\$ 53,025,601.00	70.88%
	Grand Total	11	\$ 3,585,214.15	30.45%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL LM-Covid 19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Atauro	2	\$ 373,000.50	52.90%
2	Cristo Rei			
3	Dom aleixo	2	\$ 698,317.59	81.48%
4	Metinaro			
5	Nain Feto			
6	nasional			
7	Oe-cusse			
8	vera cruz			
	Grand Total	2	\$ 715,961.43	66.86%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL LM-TP		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Atauro			
2	Cristo Rei	1	\$ 2,068,587.24	86.48%
3	Dom aleixo	3	\$ 4,953,699.81	60.55%
4	Metinaro	1	\$ 460,254.00	73.83%
5	Nain Feto	1	\$ 52,232.55	85.62%
6	nasional			
7	Oe-cusse			
8	vera cruz			
	Grand Total	2	\$ 2,033,100.61	34.44%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Atauro			
2	Cristo Rei	3	\$ 628,119.11	53.12%
3	Dom aleixo	3	\$ 165,681.95	66.04%
4	Metinaro			
5	Nain Feto			
6	nasional			
7	Oe-cusse			
8	vera cruz			
	Grand Total	1	\$ 143,579.83	43.13%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL MUNICIPIO DILI,NASIONAL,RAEOA		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Atauro	3	\$ 670,409.59	35.45%
2	Cristo Rei	45	\$ 22,625,815.47	77.69%
3	Dom aleixo	66	\$ 49,772,292.36	57.01%
4	Metinaro	6	\$ 1,993,412.29	79.28%
5	Nain Feto	28	\$ 12,772,908.45	72.96%
6	nasional	28	\$ 150,570,667.09	68.33%
7	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	66.42%
8	vera cruz	3	\$ 61,578,153.44	72.06%
	Grand Total	44	\$ 34,662,547.63	39.64%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabel 1.3.2: Projecto Municipio Dili Por Sector

N O	SECTOR PROJECTO	Atauro		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS			
2	AGUA E SANEAMENTO			
3	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
4	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 373,000.50	52.90%
5	EDUKASAUN			
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
7	EQUIPAMENTO INFROMATICO			
8	ESTRADA			
9	ESTRADA- IMPRESTIMO			
10	ESTRADAS			
11	FLOOD CONTROL			
12	ICT			
13	IMPRESTIMO			
14	JUVENTUDE NO DESPORTU			
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	1	\$ 297,409.09	13.56%
16	PORTOS			
17	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS			
18	SAUDE			
19	SEGURANCA NO DEFESA			
20	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS			
21	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
22	TURISMO			
	Grand Total	3	\$ 670,409.59	35.45%

NO	SECTOR PROJECTO	CRISTO REI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS			
2	AGUA E SANEAMENTO	5	\$ 318,322.19	37.66%
3	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
4	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 2,467,276.44	75.86%
5	EDUKASAUN	2	\$ 571,210.91	55.90%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	9	\$ 2,921,692.53	78.41%
7	EQUIPAMENTO INFROMATICO			
8	ESTRADA	3	\$ 689,602.94	65.96%
9	ESTRADA-IMPRESTIMO			
10	ESTRADAS	12	\$ 13,673,541.49	84.48%
11	FLOOD CONTROL	3	\$ 594,124.98	9.57%
12	ICT			
13	IMPRESTIMO			
14	JUVENTUDE NO DESPORTU			
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	3	\$ 557,519.85	59.89%
16	PORTOS			
17	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS			
18	SAUDE	5	\$ 832,524.14	69.55%
19	SEGURANCA NO DEFESA			
20	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS			
21	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
22	TURISMO			
	Grand Total	45	\$ 22,625,815.47	77.69%

NO	SECTOR PROJECTO	DOM ALEIXO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS			
2	AGUA E SANEAMENTO	8	\$ 1,304,770.24	66.85%
3	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
4	EDIFICIOS PUBLICOS	12	\$ 6,660,673.67	59.72%
5	EDUKASAUN			
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	6	\$ 2,830,884.39	40.44%
7	EQUIPAMENTO INFOMATICO	1	\$ 56,935.00	45.00%
8	ESTRADA	4	\$ 451,479.05	90.00%
9	ESTRADA-IMPRESTIMO			
10	ESTRADAS	17	\$ 34,320,569.52	54.99%
11	FLOOD CONTROL	3	\$ 1,250,095.00	85.28%
12	ICT	1	\$ 1,152,955.98	80.96%
13	IMPRESTIMO			
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 42,859.34	71.50%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	10	\$ 895,349.31	78.53%
16	PORTOS			
17	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	2	\$ 486,700.00	21.08%
18	SAUDE			
19	SEGURANCA NO DEFESA			
20	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS			
21	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	1	\$ 319,020.86	74.56%
22	TURISMO			
	Grand Total	66	\$ 49,772,292.36	57.01%

NO	SECTOR PROJECTO	METINARO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS			
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 87,856.59	43.07%
3	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 581,897.61	90.00%
5	EDUKASAUN			
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 2,390.32	0.00%
7	EQUIPAMENTO INFROMATICO			
8	ESTRADA			
9	ESTRADA-IMPRESTIMO			
10	ESTRADAS	1	\$ 411,413.54	79.91%
11	FLOOD CONTROL			
12	ICT			
13	IMPRESTIMO			
14	JUVENTUDE NO DESPORTU			
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
16	PORTOS	1	\$ 460,254.00	73.83%
17	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS			
18	SAUDE			
19	SEGURANCA NO DEFESA			
20	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS			
21	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	1	\$ 449,600.23	77.90%
22	TURISMO			
	Grand Total	6	\$ 1,993,412.29	79.28%

NO	SECTOR PROJECTO	NAIN FETO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS			
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 139,971.80	16.50%
3	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
4	EDIFICIOS PUBLICOS	8	\$ 2,487,077.53	80.21%
5	EDUKASAUN			
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 843,062.08	75.03%
7	EQUIPAMENTO INFROMATICO			
8	ESTRADA			
9	ESTRADA-IMPRESTIMO			
10	ESTRADAS	4	\$ 7,795,275.79	72.31%
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 129,168.62	0.00%
12	ICT			
13	IMPRESTIMO			
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	3	\$ 897,569.09	81.73%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	6	\$ 394,693.72	58.22%
16	PORTOS			
17	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS			
18	SAUDE			
19	SEGURANCA NO DEFESA			
20	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS			
21	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
22	TURISMO	2	\$ 86,089.82	80.29%
	Grand Total	28	\$ 12,772,908.45	72.96%

NO	SECTOR PROJECTO	VERA CRUZ		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS			
2	AGUA E SANEAMENTO	2	\$ 209,926.33	63.54%
3	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
4	EDIFICIOS PUBLICOS	18	\$ 17,232,846.27	37.43%
5	EDUKASAUN	1	\$ 299,184.89	88.17%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 1,008,330.31	74.33%
7	EQUIPAMENTO INFOMATICO			
8	ESTRADA			
9	ESTRADA-IMPRESTIMO			
10	ESTRADAS	4	\$ 3,049,692.04	95.03%
11	FLOOD CONTROL			
12	ICT			
13	IMPRESTIMO			
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 285,700.00	66.50%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	9	\$ 721,671.24	78.99%
16	PORTOS			
17	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS	4	\$ 1,083,198.35	36.34%
18	SAUDE			
19	SEGURANCA NO DEFESA	2	\$ 10,771,998.20	19.42%
20	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS			
21	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
22	TURISMO			
	Grand Total	44	\$ 34,662,547.63	39.64%

NO	SECTOR PROJECTO	NASIONAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	1	\$ 1,100,000.00	36.36%
2	AGUA E SANEAMENTO	8	\$ 7,917,384.29	36.32%
3	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2	\$ 23,850,768.60	72.91%
4	EDIFICIOS PUBLICOS			
5	EDUKASAUN			
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 46,872,339.00	63.33%
7	EQUIPAMENTO INFROMATICO	2	\$ 3,363,254.74	91.99%
8	ESTRADA			
9	ESTRADA-IMPRESTIMO	1	\$ 12,964,487.49	75.88%
10	ESTRADAS	4	\$ 554,166.24	80.04%
11	FLOOD CONTROL	3	\$ 849,763.19	88.43%
12	ICT			
13	IMPRESTIMO	1	\$ 48,314,975.87	74.20%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU			
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
16	PORTOS			
17	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS	4	\$ 1,677,092.67	60.73%
18	SAUDE			
19	SEGURANCA NO DEFESA			
20	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	1	\$ 3,106,435.00	49.51%
21	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
22	TURISMO			
	Grand Total	28	\$ 150,570,667.09	68.33%

NO	SECTOR PROJECTO	REGIONAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS			
2	AGUA E SANEAMENTO			
3	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
4	EDIFICIOS PUBLICOS			
5	EDUKASAUN			
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 53,025,601.00	70.88%
7	EQUIPAMENTO INFROMATICO			
8	ESTRADA			
9	ESTRADA-IMPRESTIMO	1	\$ 8,178,886.44	81.13%
10	ESTRADAS	1	\$ 373,666.00	40.00%
11	FLOOD CONTROL			
12	ICT			
13	IMPRESTIMO			
14	JUVENTUDE NO DESPORTU			
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
16	PORTOS			
17	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS			
18	SAUDE			
19	SEGURANCA NO DEFESA			
20	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS			
21	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
22	TURISMO			
Grand Total		3	\$ 61,578,153.44	72.06%

NO	SECTOR PROJECTO	OECUSSE		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS			
2	AGUA E SANEAMENTO			
3	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
4	EDIFICIOS PUBLICOS			
5	EDUKASAUN			
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 693,149.25	51.71%
7	EQUIPAMENTO INFOMATICO			
8	ESTRADA			
9	ESTRADA-IMPRESTIMO			
10	ESTRADAS			
11	FLOOD CONTROL			
12	ICT			
13	IMPRESTIMO			
14	JUVENTUDE NO DESPORTU			
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
16	PORTOS			
17	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS			
18	SAUDE			
19	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	72.57%
20	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS			
21	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
22	TURISMO			
Grand Total		4	\$ 2,353,321.65	66.42%

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO DILI,REGIONAL,NASIONAL,RAEOA		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	1	\$ 1,100,000.00	36.36%
2	AGUA E SANEAMENTO	25	\$ 9,978,231.44	40.71%
3	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2	\$ 23,850,768.60	72.91%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	44	\$ 29,802,772.02	50.38%
5	EDUKASAUN	3	\$ 870,395.80	67.00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	27	\$ 108,197,448.88	66.96%
7	EQUIPAMENTO INFROMATICO	3	\$ 3,420,189.74	91.21%
8	ESTRADA	7	\$ 1,141,081.99	75.47%
9	ESTRADA-IMPRESTIMO	2	\$ 21,143,373.93	77.91%
10	ESTRADAS	43	\$ 60,178,324.62	66.27%
11	FLOOD CONTROL	10	\$ 2,823,151.79	66.39%
12	ICT	1	\$ 1,152,955.98	80.96%
13	IMPRESTIMO	1	\$ 48,314,975.87	74.20%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	5	\$ 1,226,128.43	77.82%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	29	\$ 2,866,643.21	65.48%
16	PORTOS	1	\$ 460,254.00	73.83%
17	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	10	\$ 3,246,991.02	46.65%
18	SAUDE	5	\$ 832,524.14	69.55%
19	SEGURANCA NO DEFESA	3	\$ 12,432,170.60	26.52%
20	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	1	\$ 3,106,435.00	49.51%
21	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 768,621.09	76.51%
22	TURISMO	2	\$ 86,089.82	80.29%
	Grand Total	227	\$ 336,999,527.97	65.18%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabel 1.3.3: Projecto Municipio Dili Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	Atauro		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC			
2	CFP			
3	CONSELHO DA EMPRENSA			
4	ESTATAL			
5	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO			
6	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES			
7	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS			
8	MINISTERIO DA DEFESA			
9	MINISTERIO DA JUSTICA			
10	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS			
11	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	1	\$ 297,409.09	13.56%
12	MINISTERIO DEFESA			
13	MINISTERIO DO INTERIOR			
14	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
15	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
16	MINISTERIO FINANÇAS			
17	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
18	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU,			

	MINISTERIO FINANCAS			
19	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 373,000.50	52.90%
20	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN			
21	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN			
22	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
23	PARLAMENTU NASIONAL			
24	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA			
25	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE			
26	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN			
27	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU			
28	SEFOPE			
29	SEJD			
30	TRADE INVEST			
31	TRIBUNAL RECUSO			
32	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E			
	Grand Total	3	\$ 670,409.59	35.45%

NO	DONO DO PROJECTO	Cristo Rei		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC			
2	CFP			
3	CONSELHO DA EMPRENSA			
4	ESTATAL	1	\$ 56,908.20	25.13%
5	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	\$ 2,068,587.24	86.48%
6	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	1	\$ 63,076.61	82.11%
7	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
8	MINISTERIO DA DEFESA			
9	MINISTERIO DA JUSTICA			
10	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS			
11	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	33	\$ 18,281,427.46	79.39%
12	MINISTERIO DEFESA			
13	MINISTERIO DO INTERIOR			
14	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	3	\$ 981,510.82	57.20%
15	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
16	MINISTERIO FINANCAS			
17	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 100,269.72	77.16%
18	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU,			

	MINISTERIO FINANCAS			
19	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 872,420.19	46.27%
20	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN			
21	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN			
22	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
23	PARLAMENTU NASIONAL			
24	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA			
25	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE			
26	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN			
27	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU			
28	SEFOPE			
29	SEJD			
30	TRADE INVEST			
31	TRIBUNAL RECUSO			
32	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	1	\$ 201,615.23	82.51%
	Grand Total	45	\$ 22,625,815.47	77.69%

NO	DONO DO PROJECTO	Dom Aleixo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC			
2	CFP			
3	CONSELHO DA EMPRENSA			
4	ESTATAL	3	\$ 165,681.95	66.04%
5	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	3	\$ 4,953,699.81	60.55%
6	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES			
7	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	1	\$ 19,249.03	95.84%
8	MINISTERIO DA DEFESA	4	\$ 302,542.80	80.14%
9	MINISTERIO DA JUSTICA			
10	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS			
11	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	43	\$ 42,036,566.45	56.12%
12	MINISTERIO DEFESA	1	\$ 38,450.39	90.04%
13	MINISTERIO DO INTERIOR			
14	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
15	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
16	MINISTERIO FINANCAS			
17	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	5	\$ 288,060.70	66.79%
18	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS			

19	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 698,317.59	81.48%
20	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	\$ 319,020.86	74.56%
21	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$ 464,002.78	59.55%
22	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 486,700.00	21.08%
23	PARLAMENTU NASIONAL			
24	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA			
25	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE			
26	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN			
27	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU			
28	SEFOPE			
29	SEJD			
30	TRADE INVEST			
31	TRIBUNAL RECUSSO			
32	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E			
	Grand Total	66	\$ 49,772,292.36	57.01%

NO	DONO DO PROJECTO	Metinaro		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC			
2	CFP			
3	CONSELHO DA EMPRENSA			
4	ESTATAL			
5	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO			
6	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES			
7	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
8	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 581,897.61	90.00%
9	MINISTERIO DA JUSTICA			
10	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS			
11	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 501,660.45	73.07%
12	MINISTERIO DEFESA			
13	MINISTERIO DO INTERIOR			
14	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
15	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
16	MINISTERIO FINANCAS			
17	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
18	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS			
19	MINISTERIO SAUDE			

20	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	\$ 449,600.23	77.90%
21	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN			
22	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
23	PARLAMENTU NASIONAL			
24	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA			
25	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE			
26	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN			
27	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU			
28	SEFOPE	1	\$ 460,254.00	73.83%
29	SEJD			
30	TRADE INVEST			
31	TRIBUNAL RECUSSO			
32	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E			
	Grand Total	6	\$ 1,993,412.29	79.28%

NO	DONO DO PROJECTO	Nain Feto		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC	1	\$ 256,843.00	69.08%
2	CFP			
3	CONSELHO DA EMPRENSA	1	\$ 97,498.81	85.89%
4	ESTATAL	1	\$ 46,905.00	81.41%
5	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	\$ 52,232.55	85.62%
6	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES			
7	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS			
8	MINISTERIO DA DEFESA			
9	MINISTERIO DA JUSTICA			
10	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2	\$ 158,889.74	13.60%
11	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	13	\$ 10,979,091.72	72.62%
12	MINISTERIO DEFESA			
13	MINISTERIO DO INTERIOR			
14	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
15	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 7,583.06	87.03%
16	MINISTERIO FINANCAS			
17	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	2	\$ 485,893.15	76.13%
18	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS			
19	MINISTERIO SAUDE			

20	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN			
21	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$ 26,426.13	
22	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 95,425.00	88.63%
23	PARLAMENTU NASIONAL	2	\$ 69,221.96	83.75%
24	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA			
25	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE			
26	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN			
27	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU			
28	SEFOPE			
29	SEJD	2	\$ 496,898.33	88.32%
30	TRADE INVEST			
31	TRIBUNAL RECUSSO			
32	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E			
	Grand Total	28	\$ 12,772,908.45	72.96%

NO	DONO DO PROJECTO	Vera Cruz		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC			
2	CFP	1	\$ 35,500.00	95.00%
3	CONSELHO DA EMPRESA			
4	ESTATAL	1	\$ 143,579.83	43.13%
5	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	2	\$ 2,033,100.61	34.44%
6	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES			
7	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS			
8	MINISTERIO DA DEFESA			
9	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 9,000.00	74.07%
10	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS			
11	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	18	\$ 5,269,077.55	82.19%
12	MINISTERIO DEFESA			
13	MINISTERIO DO INTERIOR	3	\$ 10,813,026.95	19.68%
14	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 372,558.92	86.63%
15	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
16	MINISTERIO FINANÇAS			
17	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 338,164.04	73.71%
18	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS			
19	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 715,961.43	66.86%

20	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 20,386.65	82.07%
21	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN			
22	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
23	PARLAMENTU NASIONAL			
24	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA	1	\$ 551,668.03	58.88%
25	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE	1	\$ 37,605.25	90.00%
26	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	\$ 412,212.00	18.44%
27	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 285,700.00	66.50%
28	SEFOPE			
29	SEJD			
30	TRADE INVEST	1	\$ 37,582.90	50.29%
31	TRIBUNAL RECUSSO	2	\$ 11,557,966.35	30.22%
32	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE	3	\$ 2,029,457.12	62.86%
	Grand Total	44	\$ 34,662,547.63	39.64%

NO	DONO DO PROJECTO	Nasional		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC			
2	CFP			
3	CONSELHO DA EMPRENSA			
4	ESTATAL	1	\$ 492,968.75	95.00%
5	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	2	\$ 3,363,254.74	91.99%
6	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES			
7	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	1	\$ 164,136.52	90.00%
8	MINISTERIO DA DEFESA			
9	MINISTERIO DA JUSTICA			
10	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS			
11	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	19	\$ 118,424,577.48	67.38%
12	MINISTERIO DEFESA			
13	MINISTERIO DO INTERIOR			
14	MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
15	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
16	MINISTERIO FINANÇAS	2	\$ 4,206,435.00	46.07%
17	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
18	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS	2	\$ 23,850,768.60	72.91%
19	MINISTERIO SAUDE			

20	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN			
21	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$ 68,526.00	68.03%
22	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
23	PARLAMENTU NASIONAL			
24	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA			
25	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE			
26	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN			
27	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU			
28	SEFOPE			
29	SEJD			
30	TRADE INVEST			
31	TRIBUNAL RECUSSO			
32	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E			
	Grand Total	28	\$ 150,570,667.09	68.33%

NO	DONO DO PROJECTO	OECUSSE		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC			
2	CFP			
3	CONSELHO DA EMPRENSA			
4	ESTATAL			
5	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO			
6	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES			
7	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
8	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	72.57%
9	MINISTERIO DA JUSTICA			
10	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS			
11	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 693,149.25	51.71%
12	MINISTERIO DEFESA			
13	MINISTERIO DO INTERIOR			
14	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
15	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
16	MINISTERIO FINANCAS			
17	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
18	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS			
19	MINISTERIO SAUDE			
20	MINISTERIO SOLIDARIEDADE			

	SOCIAL E INKLUSAUN			
21	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN			
22	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
23	PARLAMENTU NASIONAL			
24	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA			
25	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE			
26	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN			
27	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU			
28	SEFOPE			
29	SEJD			
30	TRADE INVEST			
31	TRIBUNAL RECUSO			
32	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E			
	Grand Total	4	\$ 2,353,321.65	66.42%

NO	DONO DO PROJECTO	Regional		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC			
2	CFP			
3	CONSELHO DA EMPRENSA			
4	ESTATAL			
5	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO			
6	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES			
7	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
8	MINISTERIO DA DEFESA			
9	MINISTERIO DA JUSTICA			
10	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS			
11	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 61,578,153.44	72.06%
12	MINISTERIO DEFESA			
13	MINISTERIO DO INTERIOR			
14	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
15	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
16	MINISTERIO FINANCAS			
17	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
18	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS			
19	MINISTERIO SAUDE			

NO	DONO DO PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO DILI,NASIONAL,REGIONAL, RAE OA		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC	1	\$ 256,843.00	69.08%
2	CFP	1	\$ 35,500.00	95.00%
3	CONSELHO DA EMPRENSA	1	\$ 97,498.81	85.89%
4	ESTATAL	7	\$ 906,043.73	76.39%
5	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	9	\$ 12,470,874.95	69.18%
6	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	1	\$ 63,076.61	82.11%
7	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	2	\$ 183,385.55	90.61%
8	MINISTERIO DA DEFESA	6	\$ 2,544,612.81	77.45%
9	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 9,000.00	74.07%
10	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2	\$ 158,889.74	13.60%
11	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	136	\$ 258,061,112.89	67.95%
12	MINISTERIO DEFESA	1	\$ 38,450.39	90.04%
13	MINISTERIO DO INTERIOR	3	\$ 10,813,026.95	19.68%
14	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	5	\$ 1,354,069.74	65.30%
15	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 7,583.06	87.03%
16	MINISTERIO FINANCAS	2	\$ 4,206,435.00	46.07%
17	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	9	\$ 1,212,387.61	73.32%
18	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS	2	\$ 23,850,768.60	72.91%
19	MINISTERIO SAUDE	10	\$ 2,659,699.71	61.98%

20	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	4	\$ 789,007.74	76.66%
21	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	3	\$ 558,954.91	61.83%
22	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	3	\$ 582,125.00	32.15%
23	PARLAMENTU NASIONAL	2	\$ 69,221.96	83.75%
24	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA	1	\$ 551,668.03	58.88%
25	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE	1	\$ 37,605.25	90.00%
26	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	\$ 412,212.00	18.44%
27	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 285,700.00	66.50%
28	SEFOPE	1	\$ 460,254.00	73.83%
29	SEJD	2	\$ 496,898.33	88.32%
30	TRADE INVEST	1	\$ 37,582.90	50.29%
31	TRIBUNAL RECUSSO	2	\$ 11,557,966.35	30.22%
32	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	4	\$ 2,231,072.35	64.64%
	Grand Total	227	\$ 336,999,527.97	65.18%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.4 : Population Projection Municipiu, Postu Administrativo, Suco tuir Sexu no Grupu idade 2015-2022.

Administrativo Posto, Suco no Sexu	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Idade la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Atauro	12,023	3,350	3,420	2,681	2,572
Cristo Rei	79,517	25,925	23,736	15,261	14,595
Dom Aleixo	165,269	56,200	50,673	30,035	28,360
Metinaro	7,208	2,111	1,940	1,600	1,557
Nain Feto	41,863	14,510	13,220	7,278	6,856
Vera Cruz	46,673	15,914	14,707	8,261	7,790

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan ne'e hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu katak progresu actual fulan ida ne'e siknifika porsentagen servisu ne'ebe atinje deit iha fulan ne'e nia laran, montante actual fulan ida ne'e bazeia ba orsamentu ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e nia rasik no ikus porsentagen actual fulan ida ne'e hatudu progresu fisiku komulativu ne'ebe akumulula husi porsento anterior no fulan ida ne'e nian, kompletu ba detallu bele haree iha #Anexu B, detallu ba Back-Up #Anexu C no Fotografia bele hare #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

➤ Obstaclo I ba ITI no EPAS

1. Buka solusaun lalais ba projetu sira ne'ebé abandona ho projetu na'in se la'e engenheiru munisipiu ninia relatoriu laiha rejultadu no projetu sira sei kontinua abandona
2. Aumenta transporte nune'e bele fasilita hala'o inspesaun
3. Hasa'e kapasidade internet
4. Diminui tiha parte instrusaun serbisu tamba enjinheru munisipiu halo "*tribe*" hodi aumenta volume serbsu maibe fungsaun ida de'it.

➤ Responsavel Konsultan

1. Ba servisu konsultan design ami imfrenta problema wainhira atu halo planu inspeksaun tamba ezelesaun ba servisu hirak ne'e bazeia husi relatorio nebe Ministerio/Dono do projeto submete mai ADN. Ne'e duni susar baa ami atu prienxe planu servisu.
2. Ami imfrenta problema wainhira atu input data konsultan design ba Sistema drop box tamba folder nebe prepara ona responde liu ba servisu kontraktor nian.
3. Menos transporte hodi afeita ba planu inspeksaun iha terenu

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

➤ **Recomendação parte Konsultan**

1. Husu ba ekipa base de dados atu kria folder iha Sistema drop box nebe bele relata informasaun kona ba servisu konsultan design nian
2. Husu atu iha Sistema manjamen logistika nebe diak hodi la bele fo impaktu wainhira atu halo inspeksaun iha terenu tuir planu servisu nebe engineiru sira prepara ona.

➤ **Recomendação parte Eletricidade**

1. Husu ba parte ITC, ADN – I.P bele kria Folder Sistem ba Seksaun M & E, ADN – I.P.
2. Husu atu aumenta tan rekursu iha Seksaun M & E, ADN – I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Dili

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Dili						
No	Deskrisaun	Identidade				Asinatura
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	
1	Enjineiru	Pedro de Lurdes Alves		Enjineiru EPAS		
		Julmira Soares Sampaio		Enjineiru EPAS		
		Egidio Goncalves		Enjineiru EPAS		
		Joao Q do Rego		Enjineiru ITI		
		Manuel Estrela		Enjineiru EPAS		

		Eduardo do Santos		Enjineiru ITI		
		Camilio de Jesus		Enjineiru METIC		
2	Enjineira	Johanes Hornay		Enjineira VEBD		
3	Motorista			Motorista		

Nao identifikado
