REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

A.D.N. I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

RELATÓRIU MENSÁL IMPLEMENTASAUN PROJETUS MUNISÍPIU AINARO

SETEMBRO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTASAUN PROJETU INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO AINARO

SETEMBRO 2022

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro ADN, I.P

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro ADN, I.P

(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro ADN, I.P

(Eng. Jaulino H. Rodrigues)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro ADN, I.P

(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, ADN, I.P

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, ADN, I.P

(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T, M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO 1
INDICE 2
I. INTRODUSAUN 3
1.1 Enkuadramentu Legal 3
1.2 Perfil Municipio Ainaro 3
1.3. Lista Projectos 6
II. PROGRESU FISIKU 14
2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan 14
III. OBSTÁCLO IHA TERENU 14
3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu 14
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU 15
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu 15

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias 4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro 4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro 5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamentos 6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores 8
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio 11
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro 13

I. INTRODUSAUN

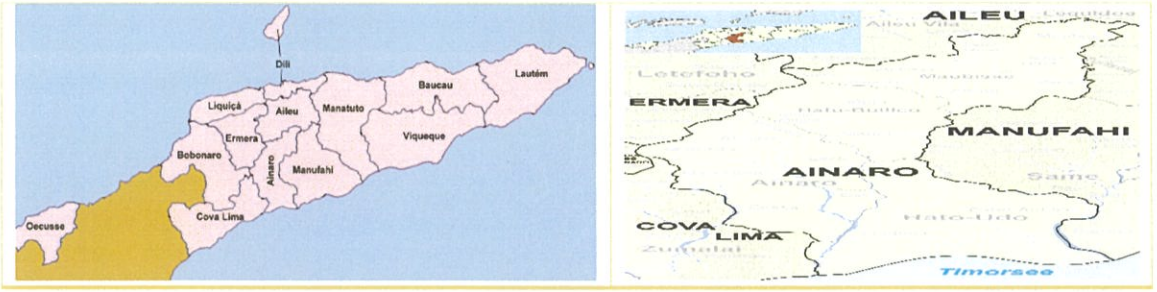
1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional,I.P ou ADN,I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Púbico (IP), ho Misaun ADN,I.P nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análize kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viavél.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Púbico (IP), ADN,I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimentu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvimentu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno caso presiza.

1.2 Perfil Municipio Ainaro



Administrasaun Munisipal Ainaro lokalizadu iha sudoeste paíz no mapa 2. hatudu pozisaun jeográfiku Munisipiu Ainaro ne'ebé ho luan 797 km² ho populasaun nain 59,175 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Ainaro iha Postu Administraativo ha'at, Sukus 21 no Aldeias 131 hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1: Ponto Administrativo, Sukus no Total Aldeias/Sukus

Ainaro		Hatu Builico		Hatu Udo		Maubisse	
Sukus	**Aldeias**	**suku**	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**
Ainaro	7	Mauchiga	7	Foho-Ailico (beikala)	6	Aituto	9
Cassa	5	Mulo	8	Leolima	10	Edi	6
Manutaci	4	Nuno Moge	6	-	-	Fatubessi	6
Mau-Nuno	3	-	-	-	-	Horai-Quic	4
Mau-Ulo	5	-	-	-	-	Liurai	4
Soro	4	-	-	-	2	Manelobas	4
Suro-Craic	4	-	-	-	4	Manetu	7
-	-	-	-	-	-	Maubisse	12
-	-	-	-	-	-	Maulau	10
Total	**32**	**-**	**21**	**-**	**22**	**-**	**62**

Data husi : Livro 3B OJE 2021, Pajina 22

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro							
No	**Deskrisaun**	**Total Membros Kada Tinan**					
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**	**OBS**
1	Engineiro		**4**				**4**	
2	Administrasaun no Financas		**0**				**0**	
3	Motorista		**1**				**1**	
4	Seguransa		**0**				**0**	
	Grand Total		**5**				**5**	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro

ASET ADN,IP MUNICIPIO AINARO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1				1	Moru hadia, monta tralis
2	Kareta		1				1	Kondisaun ladun diák
3	Desktop HP / Monitor		1				1	Diak
4	Laptop HP		1				1	Todan presija update
5	Printer Cannon		1				1	Diak
6	UPS		1				1	Aat
7	Armario File		2				2	Diak
8	Armario Tau hena		2				2	Aat 1
9	Meja escritorio		1				1	Diak
10	Meja han		1				1	Aat
11	Meja TV (kiik)		1				1	Diak
12	Kadeira escritorio		6				6	Diak
13	Kadeira han		4				4	Att 2
14	Sofa		1 Set				1	Diak
15	Springbed +sumasu 4		2 Set				2	Diak (sumasu laiha)
16	Jeleira		1				1	Diak
17	Water Dispenser		1				1	Aat
18	TV + Parabola		1 Set				1	Aat
19	Kipas Angin		5				5	Aat
20	Kompor		1				1	Diak
21	Kompor Gas		1				1	Aat
22	Rack sepatu		3				3	Aat
23	Rack Piring		1				1	Diak
24	Water Pump Sanyo		1				1	Aat

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dadus projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + PDIM + LM - BS + LM - TP + Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	27	$ 26,239,266.40	66.46%
2	Hatubuilico	12	$ 61,202,630.27	97.79%
3	Hatudo	13	$ 3,029,791.15	11.36%
4	Maubisse	26	$ 7,178,836.14	67.87%
	Grand Total	**78**	**$ 97,650,523.96**	**84.49%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	11	$ 23,879,713.14	69.88%
2	Hatubuilico	4	$ 60,431,375.42	98.35%
3	Hatudo	5	$ 1,770,459.15	3.35%
4	Maubisse	9	$ 5,130,827.23	72.18%
	Grand Total	**29**	**$ 91,212,374.94**	**87.58%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	$ 1,376,091.81	21.14%
2	Hatubuilico	5	$ 521,296.64	74.18%
3	Hatudo	3	$ 718,688.00	4.50%
4	Maubisse	4	$ 392,577.51	81.48%
	Grand Total	**17**	**$ 3,008,653.96**	**34.23%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	$ 473,161.58	50.73%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	3	$ 458,435.28	92.53%
	Grand Total	**8**	**$ 931,596.86**	**71.30%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo	2	$ 263,719.00	87.35%
4	Maubisse	1	$ 302,126.40	98.44%
	Grand Total	**3**	**$ 565,845.40**	**93.27%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	4	$ 408,232.25	42.49%
2	Hatubuilico	3	$ 249,958.21	12.19%
3	Hatudo	3	$ 276,925.00	8.01%
4	Maubisse	7	$ 730,876.53	7.25%
	Grand Total	**17**	**$ 1,665,991.99**	**16.75%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	2	$ 102,067.62	45.19%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	$ 140,000.00	53.14%
	Grand Total	**3**	**$ 242,067.62**	**49.78%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Emergency		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	$ 23,993.19	0.00%
	Grand Total	**1**	**$ 23,993.19**	**0.00%**

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO AINARO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	6	$ 940,813.03	26.68%
2	Edukasaun	19	$ 2,292,232.62	23.39%
3	Eléctricidade	10	$ 7,999,431.74	72.04%
4	Estradas E Pontes	14	$ 19,599,149.60	62.35%
5	Flood Control	2	$ 108,153.47	68.24%
6	Imprestimo	3	$ 59,201,316.40	98.91%
7	Irigasaun	1	$ 32,319.72	100.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	17	$ 3,237,083.74	62.70%
9	Pontes	2	$ 3,869,397.22	73.34%
10	Saude	3	$ 274,369.70	42.47%
11	Turismo	1	$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	**78**	**$ 97,650,523.96**	**84.49%**

NO	SECTOR PROJECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	4	$ 639,367.96	6.03%
2	Edukasaun	4	$ 520,065.09	41.98%
3	Eléctricidade	3	$ 2,130,985.59	80.80%
4	Estradas E Pontes	7	$ 17,893,140.72	67.36%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	$ 815,683.40	44.83%
9	Pontes	2	$ 3,869,397.22	73.34%
10	Saude	3	$ 274,369.70	42.47%
11	Turismo	1	$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	**27**	**$ 26,239,266.40**	**66.46%**

NO	SECTOR PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	3	$ 249,958.21	12.19%
3	Eléctricidade	1	$ 1,230,059.02	71.11%
4	Estradas E Pontes	1	$ 76,554.69	33.40%
5	Flood Control			
6	Imprestimo	3	$ 59,201,316.40	98.91%
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	4	$ 444,741.95	81.20%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
	Grand Total	**12**	**$ 61,202,630.27**	**97.79%**

NO	SECTOR PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	4	$ 578,502.86	3.83%
3	Eléctricidade	1	$ 384,790.42	0.00%
4	Estradas E Pontes	4	$ 1,482,565.12	1.33%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun	1	$ 32,319.72	100.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	$ 551,613.03	48.94%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
	Grand Total	**13**	**$ 3,029,791.15**	**11.36%**

NO	SECTOR PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	2	$ 301,445.07	70.48%
2	Edukasaun	8	$ 943,706.46	28.11%
3	Eléctricidade	5	$ 4,253,596.71	74.44%
4	Estradas E Pontes	2	$ 146,889.07	82.57%
5	Flood Control	2	$ 108,153.47	68.24%
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	7	$ 1,425,045.36	72.48%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
	Grand Total	**26**	**$ 7,178,836.14**	**67.87%**

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	3	$ 260,605.35	81.30%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	$ 32,319.72	100.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	45	$ 93,416,272.06	86.87%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	20	$ 2,316,678.62	24.10%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	5	$ 484,439.64	45.93%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	$ 546,598.02	0.00%
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	$ 489,653.83	46.82%
9	Sefope	1	$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	**78**	**$ 97,650,523.96**	**84.49%**

NO	DONO DO PROJECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	1	$ 15,000.00	0.00%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	14	$ 24,219,553.10	69.15%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	4	$ 520,065.09	41.98%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	4	$ 344,439.64	43.01%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	$ 546,598.02	0.00%
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	$ 489,653.83	46.82%
9	Sefope	1	$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	**27**	**$ 26,239,266.40**	**66.46%**

NO	DONO DO PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	9	$ 60,952,672.06	98.14%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	3	$ 249,958.21	12.19%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
	Grand Total	**12**	**$ 61,202,630.27**	**97.79%**

NO	DONO DO PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	$ 32,319.72	100.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	7	$ 2,394,522.57	11.18%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	$ 602,948.86	7.33%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
	Grand Total	**13**	**$ 3,029,791.15**	**11.36%**

NO	DONO DO PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	2	$ 245,605.35	86.27%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	15	$ 5,849,524.33	73.86%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	8	$ 943,706.46	28.11%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude	1	$ 140,000.00	53.14%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
	Grand Total	**26**	**$ 7,178,836.14**	**67.87%**

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Poduktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Ainaro	16,823	7170	6636	5567	5058
Hato-Udo	10,747	3130	2923	2415	2279
Hato-Builico	13,249	3457	3365	3241	3186
Maubisse	24,672	6378	6309	6222	5764

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu neébe hetan husi progresu fulan ida neé, ikus liu porsentagen actual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detallu bele hareé iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hareé #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu

Obstaclo neébe ami enjineiru hasoru iha terenu mak hanesan tuir mai ne'e :

1. Kompanhia nia tekniku laiha terenu
2. Kompanhia neébe ka'er obra iha Municipio Ainaro iha hotu Dili
3. Teknik husi Projetu nain ladun halo inspesaun ba iha terenu
4. Kondisaun kareta ne'ebe Suporta Ekipa AND, I.P iha tereno ho kondisaun ne'ebe sei aat

- Obstaclo parte Eletricidade

1. Durante Eng ADN, I.P halo monitorin directur kompahnia nunka iha fatin projeto e delega ema balun mak sempre hein iha fatin projeto.
2. Kompahnia balun mak to agora sedauk hadia konstruk Linha MV & LV nebe mak avaria.
3. Iha kompahnia seluk hein hela karta termo de entrega 10% husi EDTL – EP municipio ate agora sedauk fo ba kompahnia.
4. Seksaun M & E - ADN, I.P sempre hasoru mak kona ba motorist.
5. Seksaun M & E – ADN, I.P labele kontrola masimu projeto electricidade ho edifisio public tamba Eng M & E – ADN, I.P ida kontrola municipio ha'at (4).

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Buka solusaun ba projetu ne'ebe parado
2. Sistema Internet iha Municipio lalao ho diak ho difikulta enjineiru nia servisu
3. Kondisaun Rezidesia Oficial AND, I.P Municipio Ainaro ne'ebe presija atu hadia:
    - Be'e
    - Moru
    - Tralis Jenela

➢ Recomendação parte Eletricidade

1. Seksaun M & E husu parte rekursu Humanu atu aumenta tan funsionario M & E.
2. Seksaun M & E – ADN, I.P husu ba ITC tenki kria folder sistem keta ida mai iha seksaun M & E – ADN, I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Ainaro

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro						
No	**Deskrisaun**	**Identidade**				
		Naran Kompletu	**Nu. ID Card**	**Pozisaun**	**Fotografia**	**Asinatura**
1	Engineiro	Manuel Bany da S. C. de Carvalho	115	Enjineiru ITI		
		Joaquim de C. Madeira	167	Enjineiru EPAS		
		Claudino Soares Dos Santos	243	Enjineiru EPAS		
		Jaulino H. Rdrigues	237	Enjineiru ITI		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		

2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Lucas Alberto Soares Pereira	195	Motorista		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL SETEMBRO)

					Lokalizasaun Projetu											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	78.52%	$ 355,512.32	$ 97,263.04	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	87.87%	$ 334,820.71	$ 46,223.20	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	88.36%	79.52%	$ 1,031,531.81	$ 265,634.51	ON-GOING	
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	$ 4,223,004.05	July 1, 2013	100.00%	89.74%	$ 3,789,830.06	$ 433,173.99	FHO	Projetu ramata ona ho nia fisiku 100%.
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Consorcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	88.00%	$ 110,219.55	$ 15,029.94	PHO	Projetu 100% iha tinan 2016 maibe to agora companhia sedauk husu pagamento retensaun 10%
6	Emergency Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	91.02%	81.92%	$ 3,543,740.61	$ 782,035.89	ON-GOING	
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	$ 3,717,215.92	July 1, 2013	93.22%	71.00%	$ 2,639,364.12	$ 1,077,851.80	PHO	
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipesoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	41.51%	34.96%	$ 1,740,596.03	$ 3,237,754.96	ON-GOING	
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	$ 3,596,249.07	July 1, 2013	100.00%	77.94%	$ 2,802,979.89	$ 793,269.18	FHO	
10	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	91.76%	80.75%	$ 147,667.55	$ 35,197.14	ON-GOING	
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	، Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/ 2019	$ 489,653.83	April 10, 2019	52.62%	46.82%	$ 229,243.50	$ 260,410.33	ON-GOING	
12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	82.18%	$ 26,956.99	$ 5,844.88	ON-GOING	
13	Rehabilitasaun Edificio Administrasaun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	$ 15,000.00	Sept. 19, 2016	0.00%	0.00%	$ -	$ 15,000.00	FHO	Projetu refere remata ona iha 2021 husu atu hare fila fali dadus pagamento (Retensaun)
14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/II/2018	$ 7,700.00	Feb. 12, 2018	100.00%	90.00%	$ 6,930.00	$ 770.00	PHO	Projetu refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedauk hatama pagamento
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	$ 208,089.56	July 29, 2019	97.82%	63.00%	$ 131,088.50	$ 0.70	ON-GOING	Projetu refere sei parado
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	86.20%	77.58%	$ 22,808.96	$ 6,592.18	ON-GOING	Projetu refere 100% ona tuir volume nebe iha tereno
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	89.59%	$ 86,232.55	$ 10,024.17	PHO	Projetu ferere ramata ona, husu atu hare fila fali dadus pagamento nebe iha.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL SETEMBRO)

					Lokalizasaun Projetu												
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
18	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	$ 33,889.94	June 18, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ 33,889.94	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	12.71%	$ 34,707.48	$ 238,440.67	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2016
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	37.19%	$ 79,200.00	$ 133,770.88	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2015
21	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	$ 600,016.84	July 25, 2016	66.84%	31.84%	$ 191,070.62	$ 408,946.22	PENDENTE	Projeto refere parado 2017
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	29.81%	28.92%	$ 28,497.77	$ 70,056.97	ON-GOING	
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	28.73%	28.73%	$ 29,620.71	$ 73,486.33	ON-GOING	
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	26.63%	26.37%	$ 29,091.15	$ 81,222.60	ON-GOING	
25	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	20.04%	0.00%	$ -	$ 546,598.02	ON-GOING	
26	New Construction of Laboratory for Covid-19, at Sentru Internamentu Ainaro Villa, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Adijulcojam Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-21-098C	$ 70,069.94	14-Mar-21	74.76%	45.12%	$ 31,615.53	$ 38,454.41	ON-GOING	
27	Rehabilitasaun CHC ba Izolamento Ainaro Villa relasiona covid19	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Marcalas Trading Solution, Unip Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-20-212	$ 31,997.68	Nov. 1, 2021	100.00%	45.33%	$ 14,505.18	$ 17,492.50	ON-GOING	
28	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no contratu	$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	90.00%	$ 22,001.40	$ 2,444.60	PHO	Projetu refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedauk hatama pagamento
29	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	$ 239,273.00	Sept. 25, 2019	100.00%	87.08%	$ 208,360.75	$ 30,912.25	FHO	
30	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELÉCTRICIDADE	Hatudo	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	$ 384,790.42	Jull,26,2021	12.33%	0.00%	$ -	$ 384,790.42	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
31	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	13.75%	$ 39,581.06	$ 248,312.97	PENDENTE	Projeto refere parado 2019
32	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere-Ainaro	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	Ainaro	Berdato Unip Lda		$ 32,319.72	23.8, 2021	100.00%	100.00%	$ 32,319.72	$ -	FHO	
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	21.62%	0.00%	$ -	$ 97,872.80	ON-GOING	
34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	34.36%	32.44%	$ 22,173.99	$ 46,182.82	ON-GOING	
35	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	29.94%	0.00%	$ -	$ 110,695.39	ON-GOING	
36	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	19.30%	0.00%	$ -	$ 301,577.86	ON-GOING	
37	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	$ 411,500.10	08-Mar-22	12.70%	0.00%	$ -	$ 411,500.10	ON-GOING	
38	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	$ 448,953.98	08-Mar-22	29.20%	0.00%	$ -	$ 448,953.98	ON-GOING	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL SETEMBRO)

					Lokalizasaun Projetu											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
39	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	$ 295,599.61	08-Mar-22	14.55%	6.67%	$ 19,727.79	$ 275,871.82	ON-GOING	
40	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	$ 326,511.43	08-Mar-22	73.00%	0.00%	$ -	$ 326,511.43	ON-GOING	
41	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	96.53%	86.20%	$ 139,264.98	$ 22,289.21	ON-GOING	
42	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	79.19%	$ 21,935.23	$ 5,765.84	ON-GOING	Projetu refere ramata ona husu atu hare fila fali dadus pagamento
43	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	84.46%	76.02%	$ 148,346.12	$ 46,804.58	ON-GOING	
44	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	92.83%	85.47%	$ 51,568.25	$ 8,767.74	ON-GOING	
45	Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	$ 76,554.69	June 18, 2021	37.11%	33.40%	$ 25,570.78	$ 50,983.91	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
46	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	$ 28,138,737.00	Nov. 20, 2014	100.00%	99.22%	$ 27,919,968.96	$ 218,768.04	FHO	
47	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	$ 26,875,070.79	Nov. 20, 2014	100.00%	99.62%	$ 26,771,980.96	$ 103,089.83	FHO	
48	Construction Supervision of Road Rehabilitatiom works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	92.29%	$ 3,864,572.08	$ 322,936.53	ON-GOING	
49	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Hatubuilico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	79.02%	71.11%	$ 874,731.27	$ 355,327.75	ON-GOING	
50	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	28.66%	0.00%	$ -	$ 67,801.26	ON-GOING	
51	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	32.14%	30.27%	$ 30,464.27	$ 70,185.24	ON-GOING	
52	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	30.17%	0.00%	$ -	$ 81,507.44	ON-GOING	
53	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	100.00%	60.75%	$ 143,498.67	$ 92,726.23	ON-GOING	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL SETEMBRO)

					Lokalizasaun Projetu											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
54	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	80.64%	49.43%	$ 100,497.36	$ 102,801.14	ON-GOING	
55	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	83.32%	$ 475,776.61	$ 95,267.77	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no presija hadia fali nia konstrusaun
56	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	77.28%	69.81%	$ 458,718.70	$ 198,379.10	ON-GOING	
57	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	90.00%	$ 896,415.58	$ 99,601.73	PHO	Hein 10 % retensaun EDTL Munisipiu maka seidauk entrega
58	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	43.84%	$ 452,656.17	$ 579,755.90	ON-GOING	
59	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	88.54%	$ 882,792.12	$ 114,233.03	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no sei hein kompanha atu submete dokumentus
60	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	$ 195,378.22	Aug. 16, 2019	100.00%	98.25%	$ 191,961.64	$ 3,416.58	FHO	
61	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	87.04%	$ 73,728.12	$ 10,978.14	ON-GOING	Projetu refere ramata ona iha 2019 husu atu hare fila fali dadus pagamento
62	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urlephha Star 0+000 - 3+000 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Delong Unip. Lda	MPW-190087	$ 302,126.40	Aug. 16, 2019	100.00%	98.44%	$ 297,407.48	$ 4,718.92	FHO	
63	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	$ 84,160.28	July 29, 2019	97.43%	87.69%	$ 73,802.68	$ 10,357.60	ON-GOING	Projetu refere companhia sei hatama pagamento adicional
64	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	$ 212,829.93	July 29, 2019	99.77%	99.77%	$ 212,337.64	$ 492.29	FHO	
65	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	$ 161,445.07	Aug. 16, 2019	100.00%	85.52%	$ 138,069.82	$ 23,375.25	ON-GOING	
66	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	$ 112,517.92	June 18, 2021	100.00%	90.00%	$ 101,265.05	$ 11,252.87	ON-GOING	
67	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	$ 34,371.15	June 18, 2021	64.74%	58.27%	$ 20,027.34	$ 14,343.81	ON-GOING	
68	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	70.09%	62.10%	$ 219,207.07	$ 133,793.79	PHO	
69	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	13.17%	$ 6,624.47	$ 43,685.75	ON-GOING	Projetu refere sei parado iha tinan 2019
70	New Construction for ICU Building in Referal Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	$ 140,000.00	29-Apr-21	94.29%	53.14%	$ 74,391.78	$ 65,608.22	ON-GOING	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL SETEMBRO)

					Lokalizasaun Projetu											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
71	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	28.49%	0.00%	$ -	$ 99,094.14	ON-GOING	
72	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	30.92%	29.72%	$ 27,552.08	$ 65,154.52	ON-GOING	
73	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	29.40%	29.40%	$ 25,425.20	$ 61,046.30	ON-GOING	
74	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	30.10%	0.00%	$ -	$ 97,841.29	ON-GOING	
75	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ 149,916.20	ON-GOING	
76	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	29.07%	0.00%	$ -	$ 94,951.66	ON-GOING	
77	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	26.47%	0.00%	$ -	$ 109,895.14	ON-GOING	
78	Emergency project Cyclone Seroja 04 de Abril 2021 "Construsaun moru protesaun (Gabion) Aituto (Sta. 0+000-Sta. 0+028.71)", Munisipio Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	AILESU UNIPESSOAL LDA	RFQ-CD-MOP-22006	$ 23,993.19	28-Jun-22	0.00%	0.00%	$ -	$ 23,993.19	ON-GOING	
TOTAL									$ 97,650,523.96			84.49%	$ 82,502,554.78	$ 15,070,968.82		

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Baé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Baé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Prepara Husi :

(Eng. Manuel Bary da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Jaulino H. Rodrigues)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Silvino D.R.R Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Sep-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	0.00%	87.24%
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	0.00%	97.63%
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	88.36%	0.00%	88.36%
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	$ 4,223,004.05	July 1, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Consorcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	91.02%	0.00%	91.02%
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	$ 3,717,215.92	July 1, 2013	93.22%	0.00%	93.22%
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipesoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	41.51%	0.00%	41.51%
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	$ 3,596,249.07	July 1, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
10	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	91.76%	0.00%	91.76%
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	$ 489,653.83	April 10, 2019	52.62%	0.00%	52.62%
12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	0.00%	93.39%
13	Rehabilitasaun Edificio Administrasaun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	$ 15,000.00	Sept. 19, 2016	0.00%	0.00%	0.00%
14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/II/2018	$ 7,700.00	Feb. 12, 2018	100.00%	0.00%	100.00%

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Sep-22 Previous Progress (%)	Sep-22 This Month Progress (%)	Sep-22 Comulative Progress (%)
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	$ 208,089.56	July 29, 2019	70.00%	27.82%	97.82%
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	86.20%	0.00%	86.20%
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
18	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	$ 33,889.94	June 18, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	0.00%	64.84%
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	0.00%	41.32%
21	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	EI Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	$ 600,016.84	July 25, 2016	59.84%	7.00%	66.84%
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	29.81%	0.00%	29.81%
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	28.12%	0.61%	28.73%
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	26.11%	0.52%	26.63%
25	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	19.87%	0.17%	20.04%
26	New Construction of Laboratory for Covid-19, at Sentru Internamentu Ainaro Villa, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Adijulcojam Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-21-098C	$ 70,069.94	14-Mar-21	74.76%	0.00%	74.76%
27	Rehabilitasaun CHC ba Izolamento Ainaro Villa relasiona covid19	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Marcalas Trading Solution, Unip Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-20-212	$ 31,997.68	Nov. 1, 2021	100.00%	0.00%	100.00%
28	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no contratu	$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
29	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	$ 239,273.00	Sept. 25, 2019	100.00%	0.00%	100.00%

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Sep-22 Previous Progress (%)	Sep-22 This Month Progress (%)	Sep-22 Comulative Progress (%)
30	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	$ 384,790.42	Jull,26,2021	10.00%	2.33%	12.33%
31	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	0.00%	15.00%
32	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere-Ainaro	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	Ainaro	Berdato Unip Lda		$ 32,319.72	23.8, 2021	100.00%	0.00%	100.00%
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	0.00%	21.62%	21.62%
34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	34.36%	0.00%	34.36%
35	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	29.94%	0.00%	29.94%
36	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	0.00%	19.30%	19.30%
37	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	$ 411,500.10	08-Mar-22	7.00%	5.70%	12.70%
38	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	$ 448,953.98	08-Mar-22	13.00%	16.20%	29.20%
39	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	$ 295,599.61	08-Mar-22	8.34%	6.21%	14.55%
40	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	$ 326,511.43	08-Mar-22	60.00%	13.00%	73.00%
41	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	96.53%	0.00%	96.53%
42	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
43	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	84.46%	0.00%	84.46%

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Sep-22 Previous Progress (%)	Sep-22 This Month Progress (%)	Sep-22 Comulative Progress (%)
44	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	92.83%	0.00%	92.83%
45	Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	$ 76,554.69	June 18, 2021	37.11%	0.00%	37.11%
46	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	$ 28,138,737.00	Nov. 20, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
47	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 - km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	$ 26,875,070.79	Nov. 20, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
48	Construction Supervision of Road Rehabilitatiom works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	0.00%	92.29%
49	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	79.02%	0.00%	79.02%
50	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	28.66%	0.00%	28.66%
51	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	32.14%	0.00%	32.14%
52	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	30.17%	0.00%	30.17%
53	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	79.95%	0.00%	79.95%
54	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	66.94%	0.00%	66.94%
55	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	0.00%	93.00%
56	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	77.28%	0.00%	77.28%
57	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	0.00%	100.00%

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Sep-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
58	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	0.00%	48.72%
59	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	0.00%	98.38%
60	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	$ 195,378.22	Aug. 16, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
61	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
62	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urlephha Star 0+000 - 3+000 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Delong Unip. Lda	MPW-190087	$ 302,126.40	Aug. 16, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
63	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	$ 98,821.63	July 29, 2019	97.43%	0.00%	97.43%
64	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	$ 212,829.93	July 29, 2019	99.77%	0.00%	99.77%
65	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	$ 161,445.07	Aug. 16, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
66	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	$ 112,517.92	June 18, 2021	100.00%	0.00%	100.00%
67	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	$ 34,371.15	June 18, 2021	0.00%	64.74%	64.74%
68	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	70.09%	0.00%	70.09%
69	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	0.00%	40.00%
70	New Construction for ICU Building in Referal Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	$ 140,000.00	29-Apr-21	94.29%	0.00%	94.29%
71	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	28.49%	0.00%	28.49%
72	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	30.92%	0.00%	30.92%
73	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	29.29%	0.11%	29.40%

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Sep-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
74	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	30.10%	0.00%	30.10%
75	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
76	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	29.07%	0.00%	29.07%
77	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	26.47%	0.00%	26.47%
78	Emergency project Cyclone Seroja 04 de Abril 2021 "Construsaun moru protesaun (Gabion) Aituto (Sta. 0+000-Sta. 0+028.71)", Munisipio Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	AILESU UNIPESSOAL LDA	RFQ-CD-MOP-22006	$ 23,993.19	28-Jun-22	0.00%	0.00%	0.00%

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino Soares Dos Santos)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Jaulino H. Rodrigues)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

Agência de Desenvolvimento Nacional

Naran Projeito : **New Construction of Classroom Building CA and CB Escola Secundaria Tecnica Vocasional Ainaro**
Fatin Projeito : **Ainaro Vila - Ainaro**

Tinan : **2019**

ORIGINAL CONTRACT					PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		UP TO DATE	
		Page No		AMOUNT ($)	AMOUNT ($)	PROGRESS (%)	AMOUNT ($)	PROGRESS (%)	AMOUNT ($)	PROGRESS (%)
	PRELIMINARIES	PP/3		$ 3,632.48	$ 2,302.48	1.09%	$ 1,330.00	0.64%	$ 3,632.48	1.73%
	CLASSROOM BUILDING CA	CA/37	(i)	$ 68,608.44	$ 50,388.23	24.21%	$ 18,220.21	8.76%	$ 68,608.44	32.97%
	CLASSROOM BUILDING CB	CB/51	(i)	$ 81,415.72	$ 66,315.03	31.87%	$ 15,100.69	7.26%	$ 81,415.72	39.13%
	SITE WORK	SW/20	(i)	$ 24,268.46	$ 8,788.97	4.22%	$ 15,479.48	7.44%	$ 24,268.46	11.66%
A	**SUB TOTAL PRICE**			**$ 177,925.09**	**$ 127,794.71**	**61.40%**	**$ 50,130.38**	**24.09%**	$ 177,925.09	85.49%
B	PROFIT 10% X A			$ 17,792.51	$ 12,779.47	6.14%	$ 5,013.04	2.41%	$ 17,792.51	8.55%
C	OVERHEAD			$ 3,880.00	$ 2,265.00	1.09%	$ 1,615.00	0.78%	$ 3,880.00	1.86%
D	TAXA 2 % X (A + B + C)			$ 3,991.95	$ 2,856.78	1.37%	$ 1,135.17	0.55%	$ 3,991.95	1.92%
E	**TOTAL PRICE (A+B+C)**			**$ 203,589.56**	**$ 145,695.96**	**70.00%**	**$ 57,893.59**	**27.82%**	$ 203,589.56	97.82%
F	CONTIGENCY			$ 4,500.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
G	**GRAND TOTAL WITH CONTIGENCY**			**$ 208,089.56**	**$ 145,695.96**	**70.00%**	**$ 57,893.59**	**27.82%**	**$ 203,589.56**	**97.82%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arq. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
No. kontratu : **389/KDM-AINARO/VII/2019**

Data Inspesaun : **12-09-2022**
Fatin Inspesaun : Ainaro Vila
Koordinadas :
Start Point : Long : 8°59'47.2"S, Latetude: 125°30'26.8"E.
End Point : Long : ....., Latetude: .....
Naran Inspector : **1. Joaquim de C. Madeira**
: **2. Claudino Soares dos Santos**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projeito ida nee fisiko to ona agora hein Pagamento 100%



ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
No. kontratu : **389/KDM-AINARO/VII/2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Parte interior no veranda	 

ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
No. kontratu : **389/KDM-AINARO/VII/2019**

Sketch & Foto Desenho

Kontinuasaun hadia item siara nebee durante parado ne at hela..

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (ANV-27)

Back-up Data

Naran Projeto : **NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19,AT SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE**

Data Inspesaun : 12-09-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8°59'47.2"S, Latetude: 125°30'26.8"E.

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu **Parte Oin Edificio Laboratorium Hospital Ainaro** Projeto refere hotu, falta deit orsamento kontigency mak sedauk executa hotu. Maibe realmente fisiko iha terreno hotu ona, e kompanha mos submete ona pedidu pagamentu ba Dono de Projeto.	

ANEXU C1 (ANV-27)

Back-up Data

Naran Projeto : **NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19,AT SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE**

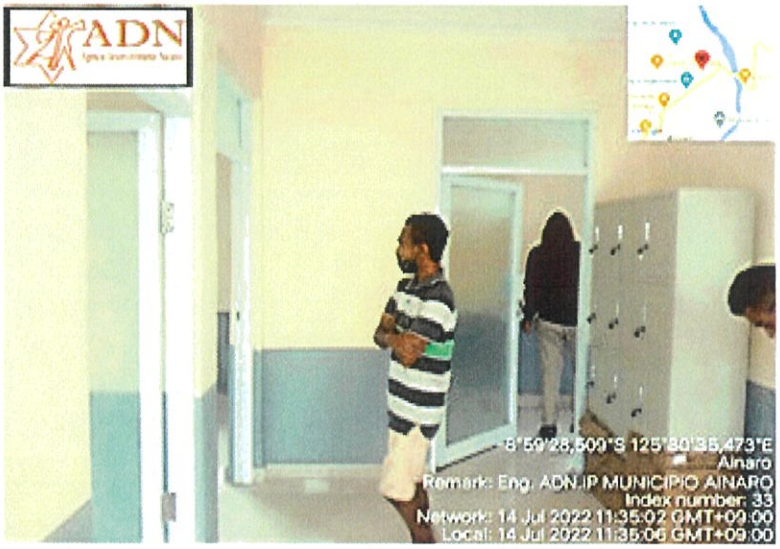
Sketch & Foto Desenho Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Parte Interior Laboratory

Hospital Ainaro.

.





ANEXU C1 (ANV-27)

Back-up Data

Naran Projeto : **NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19,AT SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Parte Soin, no Kotuk Laboratory Hospital Ainaro.	

ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro**

No. kontratu : **SSS/295/MOPTC-2016**

Data Inspesaun : 12-09-2022

Fatin Inspesaun : Faulata Casa, Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long : -9227,834. S, Latetude: 125,3035868E

End Point : Long : -953588S Latetude: 125.3147646E

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Torneira publika agora dau-daun diak hela no komunidade uza hela. Projeito instalasaun bee refere atinge ona pagamento ba 100%, e agora dadauk iha hela fase Retensaun ba 10% nian. Fisikamente kondisaun tanki, no instalasaun kanu, torneira sira diak hela, komunidade sira mos uja hela ba nesesidades loron loron nian.	

ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro**

No. kontratu : **SSS/295/MOPTC-2016**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tanki no Torneira publika agora daudaun diak hela no komunidade uza hela.	 

ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro**

No. kontratu : **SSS/295/MOPTC-2016**

Torneira publico nebe komunidade sira uza ba kuru bee mos no fase ropa agora daudaun bee mai ho diak.





ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.

Data Inspesaun : 12-09-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°5930366 "S, Latetude: 125,3019,0666E

End Point : Long Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos santos

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Projeto refere nia progresso atinje ona 100%, e kompanha submete ona pedidu pagamento 100% ba iha dona de Projeto

ANEXU C1 (ANV-26)

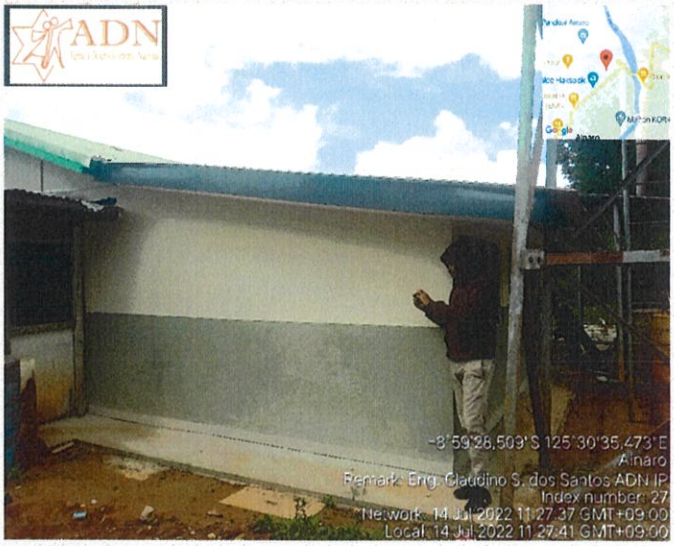
Back-up Data

Naran Projeto SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere nia progresso atinje ona 100%, e kompanha submete ona pedidu pagamento 100% ba iha dona de Projeto

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

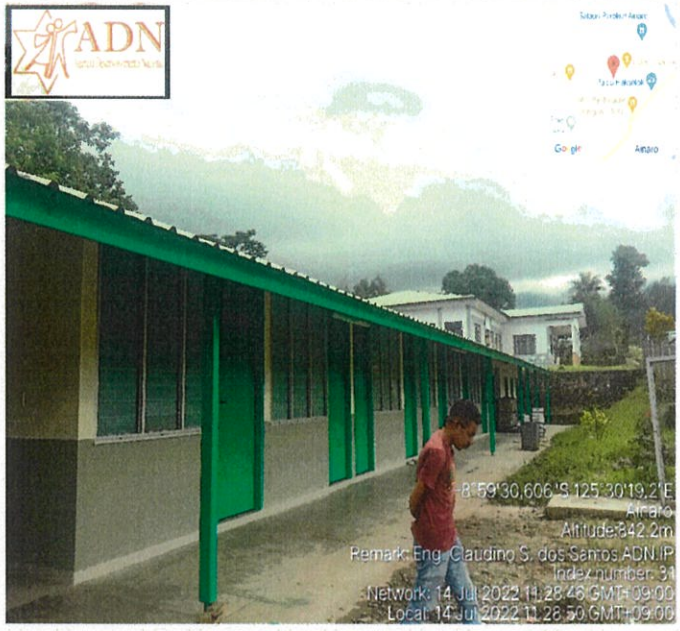




ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projeto refere nia progresso atinje ona 100%, e kompanha submete ona pedidu pagamento 100% ba iha dona de Projeto	 

ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Data Inspesaun : **12-09-2022**

Fatin Inspesaun : Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long : **8.9941S**, Latetude: **125.5010E**

End Point : Long : ....., Latetude: .....

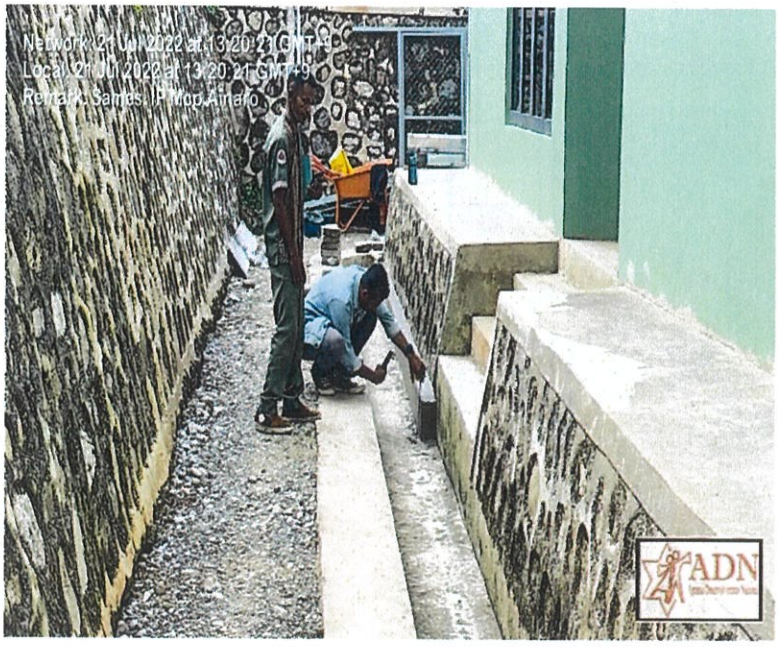
Naran Inspector : **1. Joaquim de C. Madeira**

: **2. Claudino Soares dos Santos**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final ona maibe nia osan resto seidauk selu hotu ho rajaun sira projeito nain atu altera fali ba halo Baleta no garagem para kareta ho motor.



ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere nia fisiko final ona maibe nia osan resto seidauk selu hotu ho rajaun sira projeito nain atu altera fali ba halo Baleta no garagem para kareta ho motor.	 

ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto



Projeito refere nia fisiko final ona maibe nia osan resto seidauk selu hotu ho rajaun sira projeito nain atu altera fali ba halo Baleta no garagem para kareta ho motor.

ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final ona maibe nia osan resto seidauk selu hotu ho rajaun sira projeito nain atu altera fali ba halo Baleta no garagem para kareta ho motor.



Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi**
No. kontratu : **02/GAB.AM.AIN/VII/2015**

Data Inspesaun :**12-09-2022**

Fatin Inspesaun : Manutasi/ AINARO

Koordinadas :

Start Point : Long : -85852344S Latetude: 125.312712E

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : **1. Joaquim de C. Madeira**

: **2. Claudino Soares dos Santos**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeto refere agora dadauk kompanha mobiliza hela material tuan sira nebe mak at ona, no material konstrusaun foun nebe mak foin mobliza mai tereno.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi**
No. kontratu : **02/GAB.AM.AIN/VII/2015**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Konstrusaun sala de Doutor sira nian, posto saude Manutasi, agora dadauk kondisaun parede sira dodok hotu, hetan rekomendasaun husi ekipa Technico AND.IP atu hadia hafoin kontinua ba plaster foun.	

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Data Inspesaun : 05-09-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : .....S, Latetude: ....."E.

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Companha monta Bikesting ba landscaping remata ona	

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Comapanha preparasaun atu cor, ba item sloft concrete 25 MPA ba iha sala landscaping nian.




MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Kompanha : Atramor Unipessoal Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	5/08/2022	Ainaro Villa	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1	Husu ba Site Eng. Kompanha nafatin servisu no hare didiak item servisu nebe iha BOQ hodi orienta badaen sira servisu.	
					2		
					3		
					4		
					5		
					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

SUMMARY OF PROGRESS WORK

Project Name : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro
Contract No. : RDTL/29/MSSI/DGAF/X/2021
Loaction : Ainaro Vila, Ainaro Municipality, Timor-Leste
Date : 8 Marsu 2022

NO	*SUMMARY* DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	*PREVIOUS MONTH* AMOUNT (USD)	*PREVIOUS MONTH* ACCOMPLISH TO DATE (%)	THIS MONTH AMOUNT (USD)	THIS MONTH ACCOMPLISH TO DATE (%)	UP TO DATE AMOUNT (USD)	UP TO DATE ACCOMPLISH TO DATE (%)
A	**OFFICE BUILDING**							
1	PREPARATION WORKS	$ 14,915.67	$ 10,679.11	2.25%	$ -	0.00%	$ 10,679.11	2.25%
2	EARTH WORKS	$ 13,584.96	$ 2,611.35	0.55%	$ -	0.00%	$ 2,611.35	0.55%
3	MASONRY WORKS	$ 56,144.28	$ 25,585.55	5.40%	$ -	0.00%	$ 25,585.55	5.40%
4	CONCRETE WORKS	$ 50,863.89	$ 39,737.64	8.38%	$ -	0.00%	$ 39,737.64	8.38%
5	ROOFING WORKS	$ 32,805.38	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
6	CEILING WORKS	$ 21,285.46	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
7	CARPENTERY WORKS	$ 22,850.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
8	ELECTRICAL WORKS	$ 13,270.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
9	SANITATION WORKS	$ 12,382.50	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
10	PAINTING WORKS	$ 8,205.65	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
B	**WAREHOUSE**							
1	EARTH WORKS	$ 5,311.77	$ 1,210.87	0.26%	$ 826.55	0.17%	$ 2,037.42	0.43%
2	MASONRY WORKS	$ 14,333.87	$ 4,929.58	1.04%	$ -	0.00%	$ 4,929.58	1.04%
3	CONCRETE WORKS	$ 34,136.60	$ 9,482.64	2.00%	$ -	0.00%	$ 9,482.64	2.00%
4	ROOFING WORKS	$ 23,008.23		0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
5	CARPENTERY WORKS	$ 6,008.18		0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
6	ELECTRICAL WORKS	$ 2,635.00		0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
7	PAINTING WORKS	$ 2,760.19		0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
C	**LANDSCAPING WORKS**							
1	PARK AND OFFICE PLATFORM WORKS	$ 69,230.90		0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
2	PARK ELECTRICAL WORKS	$ 4,070.00		0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
3	FENCE WORKS	$ 52,405.65		0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
4	SECURITY POST	$ 14,018.31		0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
I	COST CONSTRUCTION	**$ 474,226.49**	**$ 94,236.74**	**19.87%**	**$ 826.55**	**0.17%**	**$ 95,063.29**	**20.05%**
II	CONTRACTOR FEE & OVERHEAD 10% x I	$ 47,422.65						
III	OVERHEAD	$ 5,000.00						
IV	TAX 2% x (I+II+III)	$ 10,532.98						
V	CONTINGENCY 2% x I	$ 9,484.53						
A	**CONTRACT PRICE**	**$ 546,666.66**						

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Data Inspesaun : 13/09/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

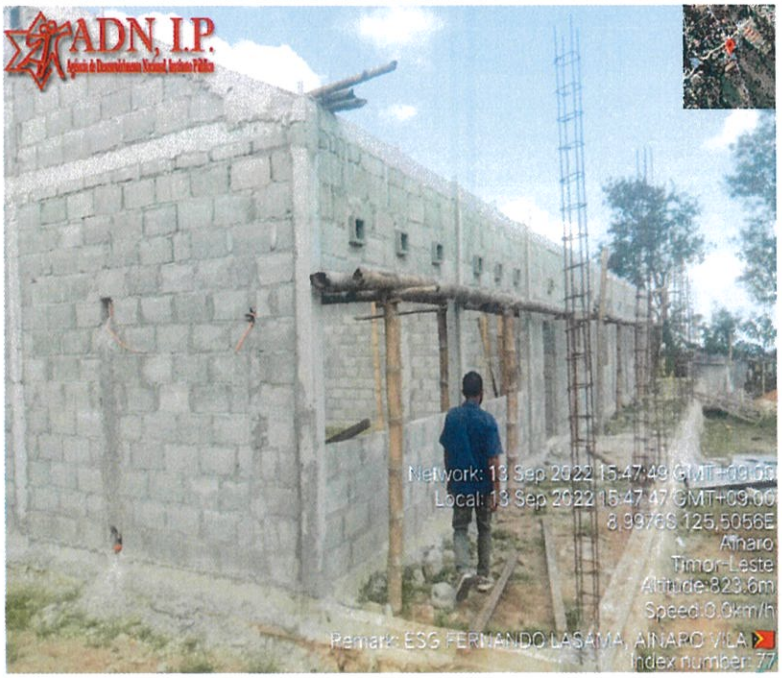
Koordinadas :

Start Point : Long 8,9976S Latetude: 125,505,6E

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa teknico ADN. IP halo inspeksaun pagamento 50% ba projeito Refere.	

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Ekipa teknico ADN. IP halo inspeksaun pagamento 50% ba projeito Refere.	

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Sketch & Foto Desenho Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa teknico ADN. IP halo inspeksaun pagamento 50% ba projeito Refere.

.





ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Sketch & Foto Desenho

Ekipa teknico ADN. IP halo inspeksaun pagamento 50% ba projeito Refere.






MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG. FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO AINARO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	13/09/2022	Ainaro Vila	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1	Husu ba GK atu prepara Material atu nunee bele aselera servisu.	
					2	Husu ba Eng GK, atu mantein iha tereno, hodi garantia progresso servisu ho kualidade nebee diak.	
II					3		

 # ANEXU-ANV-22 #

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Data Inspesaun : 08/09/2022

Fatin Inspesaun : LUAN CADOI / Ainaro

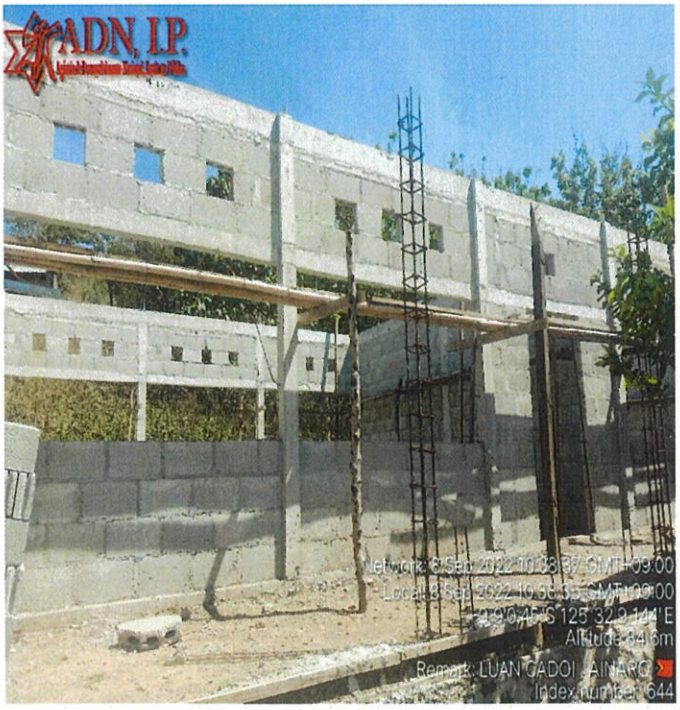
Koordinadas :

Start Point : Long :-9'9,176'S Latetude: 125, 32'9,042 E.

End Point : Long : …… Latetude: …….

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere hada bloco 40 x 20 x10 sala de aulas 3 kuase hada besik hotu ona e tuir desenho nebe maka approvado. Material construsaun ba sala de Aula hotu, GK iha material konstrusaun sufisiente hodi konstrui haris fatin. No GK sira submete ona pedido pagamento 50% nian. GK sei hein pagamento 50% foi bele kontinua servisu.	

 # ANEXU-ANV-22 #

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Sketch & Foto Desenho

Construsaun haris fatin, nian, GK hateten, material konstrusaun la sufisiente, tamba nee, GK kontinua servisu hodi cor Sloft rai nian,, depois kontinuasaun ba hada bloko, hodi hein pagamento 50% sai hafoin kontinua servisu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





 # ANEXU-ANV-22 #

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Sketch & Foto Desenho

Construsaun haris fatin, nian, GK hateten, material konstrusaun la sufisiente, tamba nee, GK kontinua servisu hodi cor Sloft rai nian,, depois kontinuasaun ba hada bloko, hodi hein pagamento 50% sai hafoin kontinua servisu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/09/2022	Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1	Ekipa Technico AND. IP Ainaro halo inspeksaun ba pedidu pagamento iha tereno, maiba presensa grupu komunitario ho engineiro G. Komunitario laiha	
					2		
					3		
					4	Ekipa technico AND. IP Ainaro halo inspeksaun baseia ba pedido nebee mak rekomenda husi projeito nai.	
					5		

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Data Inspesaun : 08/09/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : -9°6'42,882°S Latetude: 125 °32'2.67"E

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu . 10 de Agosto 2022, Projeito refere servisu hada bloco 40 x 20 x 10 tuir planta e b of q nebe aprovado. Provisoriamente parado, tamba GK sei hein pagamento 50%, material ba konstrusaun sala de aula nian hotu. Sei kontinua fila fali wainhira hetan ona pagamento 50% nian.	

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Projeito Refere servisu atingi ona iha Sinta Leten, maibe sei parado tamba hein hela orsamento.	
Haris Fatin, Projeito Refere hada batako sedauk hotu tamba material hotu.	

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Haris Fatin, Projeito Refere hada batako sedauk hotu tamba material hotu.	
Projeito Refere servisu atingi ona iha Sinta Leten, maibe sei parado tamba hein hela orsamento.	


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/09/2022	Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1	Ekipa AND. IP halo inspesaun iha tereno, maibe grupu ho Eng de Grupu Laiha.	

ANEXU- HA - 6

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Data Inspesaun : 08-09-2022

Fatin Inspesaun : Hato-udo Vila

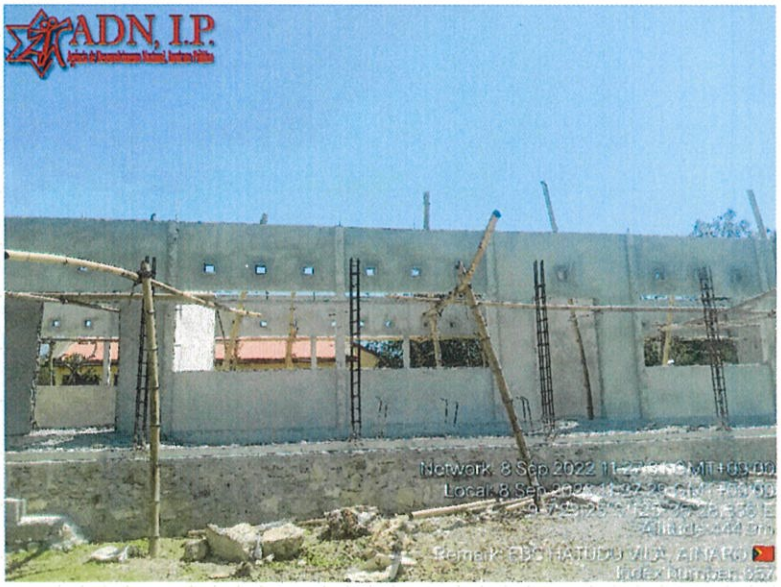
Koordinadas :

Start Point : Long : .....S, Latetude: ....."E.

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

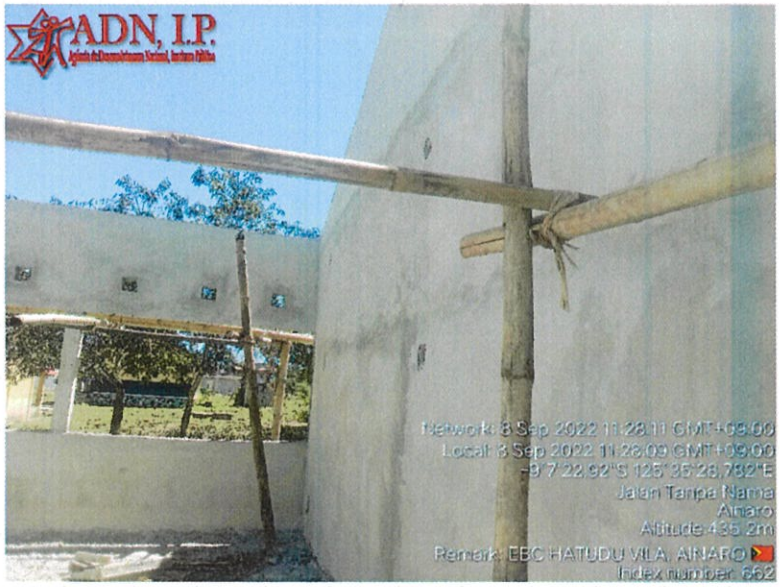
: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere lao hela, maibe material konstrusaun mak hotu, maibe GK sira submete ona pagamento 50% nian. GK sei kontinua fila servisu wainhira hetan ona pagamento.	

ANEXU- HA - 6

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
GK sei kontinua fila servisu wainhira hetan ona pagamento	
.	

ANEXU- HA - 6

Back-up Data

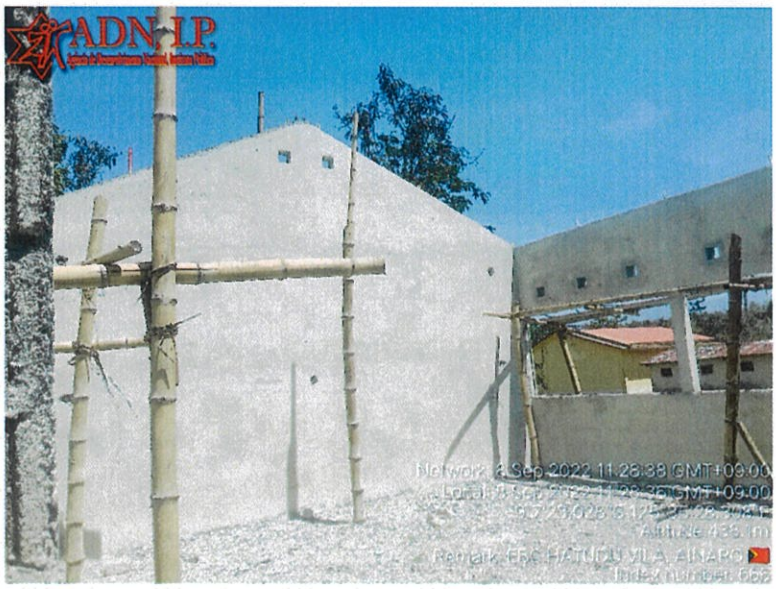
Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Sketch & Foto Desenho

GK sei kontinua fila servisu wainhira hetan ona pagamento

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU- HA-7#

Back-up Data

Naran Projeto : **Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBF. FATU-META))**

No. kontratu : **023/DNDPE-MEJD/I/2022**

Data Inspesaun : 14-09-2022

Fatin Inspesaun : hatu-Udo villa

Koordinadas :

Start Point : Long : **9,1523**, Latetude: **125, 5820E**

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito provisoriomente parado tamba material ba construsaun hotu.	

ANEXU- HA-7#

Back-up Data

Naran Projeto : **Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBF. FATU-META))**

No. kontratu : **023/DNDPE-MEJD/I/2022**

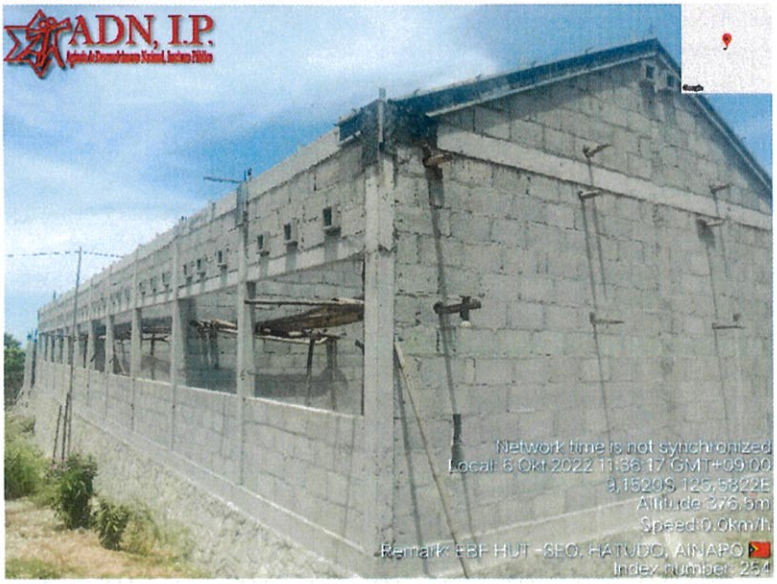
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Iha sala de toilet nian, batako sedauk atingi 100%, tamba material konstrusaun batako latoó.	
Ring balk ba Sopi Sopi nian foin hahu cor.	

ANEXU- HA-7#

Back-up Data

Naran Projeto : **Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBF. FATU-META))**

No. kontratu : **023/DNDPE-MEJD/I/2022**

Sketch & Foto Desenho Sketch Item servisu	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ring balk ba Sopi Sopi nian foin hahu cor.	 

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENATO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FATUMETA
LOCATION : LEOLIMA, HATU-UDO , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$ 3,575.00			$ 893.75	0.91%	$ 893.75	0.91%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 50,073.93			$ 16,328.55	16.68%	$ 16,328.55	16.68%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US$ 25,155.88			$ 764.82	0.78%	$ 764.82	0.78%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$ 9,727.99						
	CONSTRUCTION COST		**US$ 88,532.80**			**$ 17,987.11**	**18.38%**	**$ 17,987.11**	**18.38%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00						
	OVERHEAD		US$ 6,340.00			$ 3,170.00	3.24%	**$ 3,170.00**	**3.24%**
	GRAND TOTAL		**US$ 97,872.80**	**$ -**	**0.00%**	**$ 21,157.11**	**21.62%**	**$ 21,157.11**	**21.62%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Data Inspesaun : 08-09-2022

Fatin Inspesaun : Hut-seo / Hato-udo - vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -9''9'7'902'S Latetude: 125'34''55,668 E

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere provisoriomente parado	

ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Sketch Item servisu	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projeito refere provisoriamente parado tamba orsamento laiha, no matetrial konstrusaun hanesan semente, besi laiha. Tamba nee GK sira sedauk kontinua servisu.	 

ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Sketch Item servisu

Projeito refere provisoriamente parado tamba orsamento laiha, no matetrial konstrusaun hanesan semente, besi laiha. Tamba nee GK sira sedauk kontinua servisu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/09/2022	Hut-seo/Hato-udo Vila	Joaquim Madeira & Claudino Soares dos Santos	Teknico AND. IP	1	Ekipa AND. IP halo inspesaun iha tereno, grupu komunitario ho Engineeiro do Grupo laiha	
					2	Ekipa Observa progresso iha tereno, progressu mantein, tamba material konstrusaun hotu.	

ANEXU- HA - 36

Back-up Data

Naran Projeto : Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021

Data Inspesaun : 14-09-2022

Fatin Inspesaun : Hato-udo Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :9,1246S, Latetude: 125,6119E.

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa ADN.IP halo inspesaunnba pedido pagamento, tuir progresso nebee mak owner rekomenda iha IPC no#1. Building C1	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECTO : PROJETU KONSTRUSAUN FOUN BA ESTV HATU-UDO , AINARO
LOCATION : SUCO LEO LIMA,
POSTO ADMINISTRATIVO : HATO UDO VILA ,
MUNICIPIO : AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH AMOUNT	PREVIOUS MONTH PERCENT %	THIS MONTH AMOUNT	THIS MONTH PERCENT %	UP TO DATE AMOUNT	UP TO DATE PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$ 1,752.92	$ -	0.00%	$ 1,040.42	0.34%	$ 1,040.42	0.34%
II	CLASSROOM BUILDING C (2 UNITS)	C/39 (i)	US$ 124,045.06	$ -	0.00%	$ 26,721.38	8.86%	$ 26,721.38	8.86%
III	TEACHER OFFICE	CB/50	US$ 88,628.36	$ -	0.00%	$ 18,128.20	6.01%	$ 18,128.20	6.01%
IV	LABORATORY COMPUTER (IT)	LB	US$ 40,059.64	$ -		$ 5,995.32	1.99%	$ 5,995.32	1.99%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$ $ 10,500.00	$ -	-				
	CONSTRUCTION COST		**US$ 264,985.98**	$ -	0.00%	**$ 51,885.33**	**17.20%**	**$ 51,885.33**	**17.20%**
	CONTRACTOR FEE (10% X A)		**US$ 26,498.60**	$ -	0.00%	**$ 5,188.53**	**1.72%**	**$ 5,188.53**	**1.72%**
	OVERHEAD		**US$ 4,180.00**	$ -	0.00%	$ -	**0.00%**	$ -	0.00%
	TAX (2%X (A+B+C))		**US$ 5,913.29**	$ -		$ 1,141.48	**0.38%**	$ 1,141.48	0.38%
	CONTIGENCY		US$ **9,000.00**	$ -	0.00%	$ -	**0.00%**	$ -	0.00%
	GRAND TOTAL		**US$ 301,577.87**			**$ 58,215.34**	**19.30%**	**$ 58,215.34**	**19.30%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X/D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro

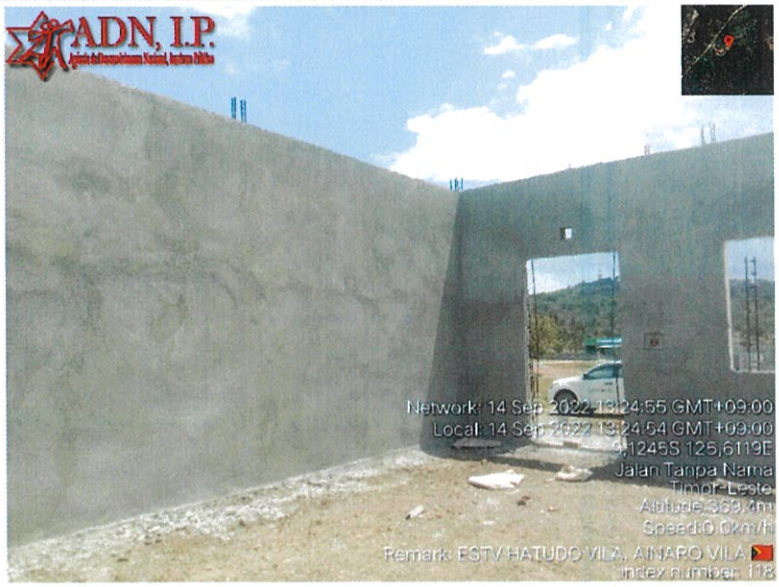
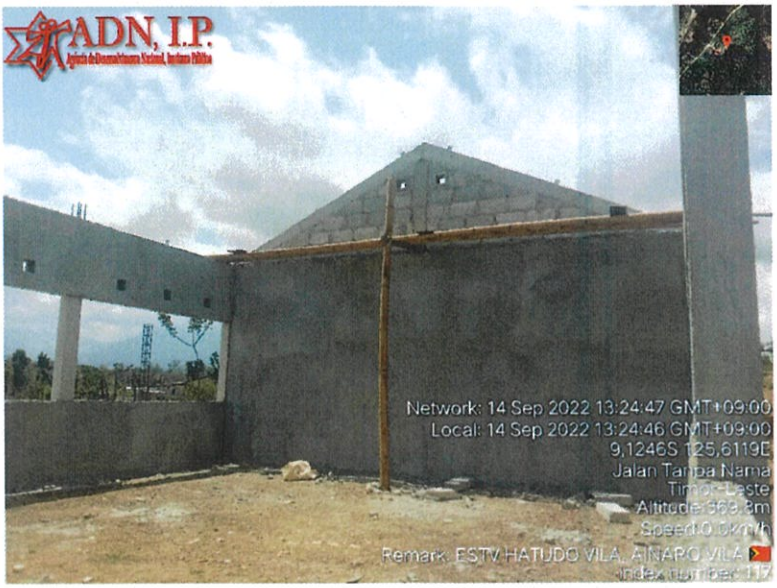
Kompanha : Leolico Lda.

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	14/09/2022,	Hato-udo / Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1	Husu ba companha aselera servisu no kontrola didiak BOQ, no Site Engineer Kompanha kontrola nafatin wainhira badaen sira halo servisu	
					2	Tempo badak husu ba companha atu hadia BOQ nebee nak sei balanco 	

ANEXU- HA - 36

Back-up Data

Naran Projeto : Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Ekipa ADN.IP halo inspesaunnba pedido pagamento, tuir progresso nebee mak owner rekomenda iha IPC no#1	
Building C2	

.

ANEXU- HA - 36

Back-up Data

Naran Projeto : Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa ADN.IP halo inspesaunnba pedido pagamento, tuir progresso nebee mak owner rekomenda iha IPC no#1.	
Laboratory room	

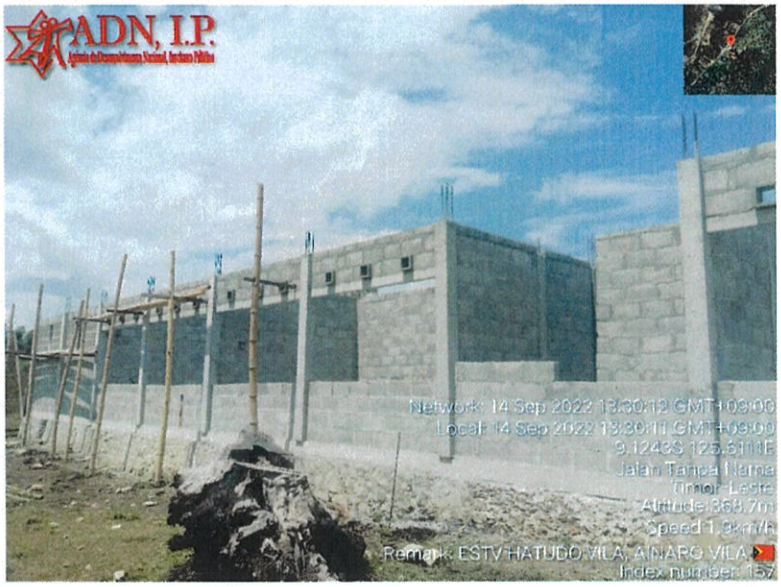
Sketch & Foto Desenho

ANEXU- HA - 36

Back-up Data

Naran Projeto : Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro
Nu. Contract : NCB:02/MEJD/DNA/2021

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Ekipa ADN.IP halo inspesaunnba pedido pagamento, tuir progresso nebee mak owner rekomenda iha IPC no#1.

Teacher room



ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Data Inspesaun : 07-09-2022

Fatin Inspesaun : Ernaro

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8'55'45 S** Latetude: **125'34''39,546 E**

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Equipa teknico ADN.IP municipio Ainaro, halo inspeksaun ba pedidu pagamento ba projeto refere, baseia ba rekomendasaun husi projeito Nain.	

ANEXU# HTB-11#

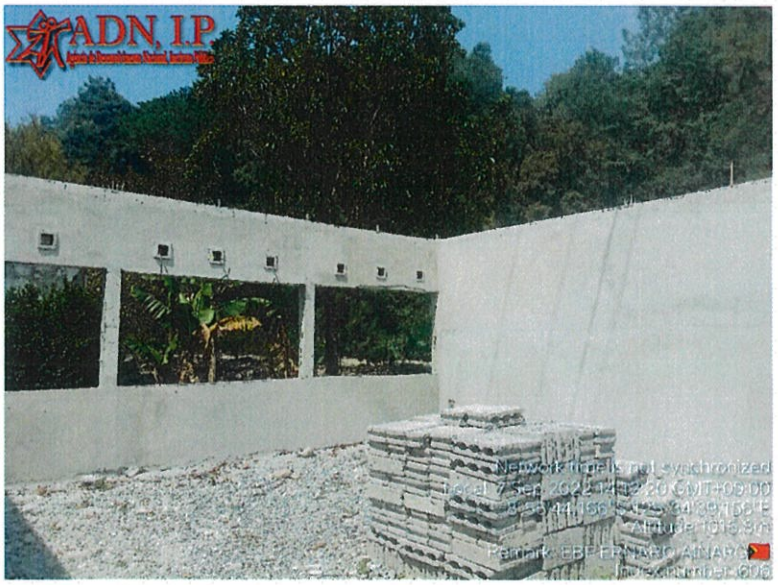
Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Equipa teknico ADN.IP municipio Ainaro, halo inspeksaun ba pedidu pagamento ba projeto refere, baseia ba rekomendasaun husi projeito Nain.





ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Equipa teknico ADN.IP municipio Ainaro, halo inspeksaun ba pedidu pagamento ba projeto refere, baseia ba rekomendasaun husi projeito Nain.	 


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	7/09/2022	Hato builico/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Ekipa technico AND. IP municipio Ainaro halo inspeksaun iha tereno, grupu Komunitario laiha, eng husi G. Komunitario laiha.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	7/09/2022	Hato builico/ Ainaro	Claudino Soares Santos	Teknico	1	observasasaun nebe mak ekipa AND. IP observa ha tereno, fisicamnete prokeito refere liur ho laran husi sala de aula nian, plester hotu ona, haris fatin mak sedauk pleste.	
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Data Inspesaun : 07-09-2022

Fatin Inspesaun : Tukaro, Hatu builiko

Koordinadas :

Start Point : Long : -856''37.974''S 125'31'18''702 ÉLatetude: ……

End Point : Long : …….. Latetude: ……

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa Tecnico ADN, IP municipio Ainaro halo Inspeksun ba projeito refere, projeito refere ba ha item block wall remata ona, no sloft leten cor remata ona, concrete work ba ringbalk nian mak sedauk cor.	

ANEXU# HTB-10#

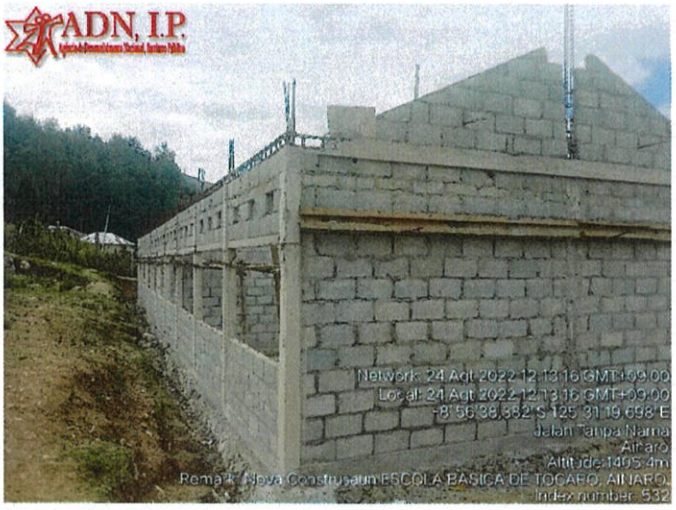
Back-up Data

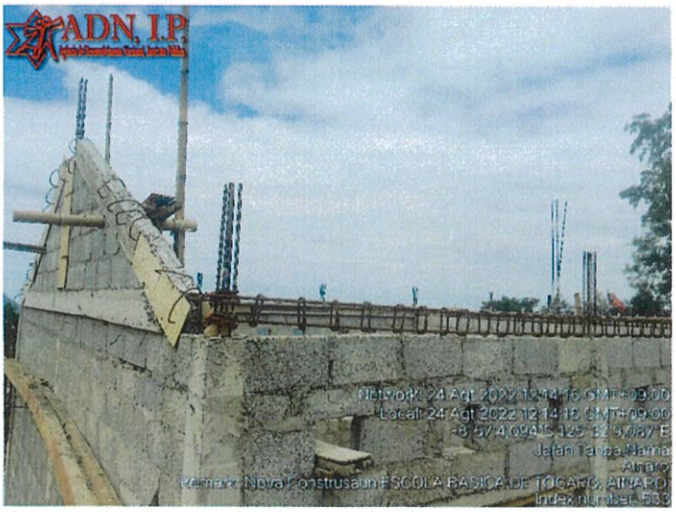
Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Sketch & Foto Desenho

Ekipa Tecnico ADN, IP municipio Ainaro halo Inspeksun ba projeito refere, projeito refere ba ha item block wall remata ona, no sloft leten cor remata ona, concrete work ba ringbalk nian mak sedauk cor.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



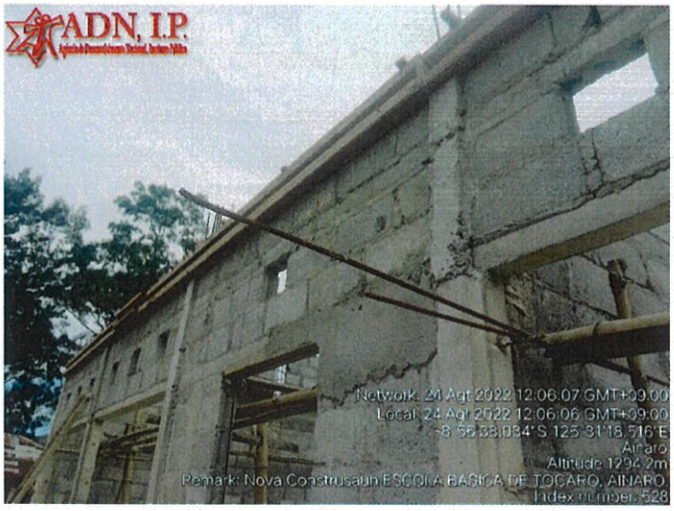


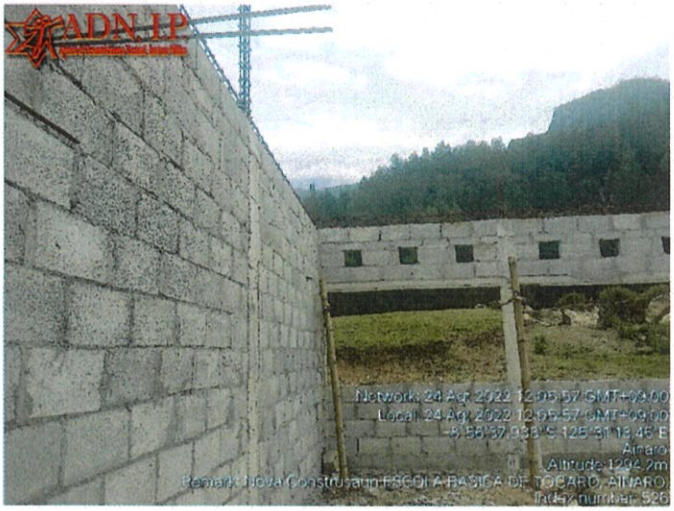
ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Ekipa Tecnico ADN, IP municipio Ainaro halo Inspeksun ba projeito refere, projeito refere ba ha item block wall remata ona, no sloft leten cor remata ona, concrete work ba ringbalk nian mak sedauk cor.





MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL


ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	7/09/2022	Hato builico/AINARO	Joaquim Madeira	Teknico	1	Ekipa AND. IP ainaro halo inspeksaun iha tereno, grupu komunitario laiha, engineeiro G.komunitario mos laiha.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	7/09/2022	Hato builico/AINARO	Claudino Soares Santos	Teknico	1	observasaun nebee mak ekipa observa, fisikamente projeito refere atinji ona iha sinta leten, no bessi beton ba ring balk nian mos monta ona, sinta leten mos cor hotubona.	
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Data Inspesaun : 06-09-2022

Fatin Inspesaun :Tatiris Lases

Koordinadas :

Start Point : Long :-8'55'28,638''S Latetude: 125'34'4,392E

End Point : Long : ..... Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere hada blocu no sinta leten hotu ona, e agora provisoriomente laiha servisu, tamba material hotu,e agora GK hatama ona pedido pagamento 50% ba iiha Dono de Projeito.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere hada blocu no sinta leten hotu ona, e agora provisoriomente laiha servisu, tamba material hotu,e agora GK hatama ona pedido pagamento 50% ba iiha Dono de Projeito.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projeito refere hada blocu no sinta leten hotu ona, e agora provisoriomente laiha servisu, tamba material hotu,e agora GK hatama ona pedido pagamento 50% ba iiha Dono de Projeito.	 

ANEXU C1 (MBS-14)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse.**
No. kontratu : **391/KDM-AINARO/VII/2019**

Data Inspesaun :**23-09-2022**

Fatin Inspesaun : Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8.834443** Latetude: **125.598862**

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : **1. Joaquim de C.Madeira**

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere fisiko final ona e selu tiha 98.97%, e hein deit halo pagamento kompleto ba 100% nian. Maibe ate agora kompanhia la Submete dokumentus (Laiha informasaun ate agora)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (MBS-14)

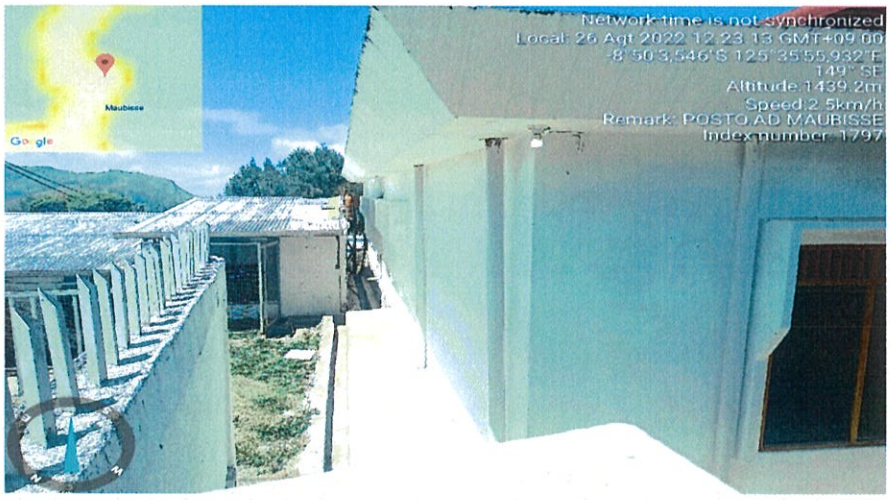
Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse.**
No. kontratu : **391/KDM-AINARO/VII/2019**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktua

Projeito refere fisiko Final ona maibe ate agora kompanhia sedauk submete pedido pagamento 100%)





ANEXU C1 (MBS-14)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse.**
No. kontratu : **391/KDM-AINARO/VII/2019**

Sketch & Foto Desenho

Parte interior ou uma laran kondisaun diak hotu hela.





#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.**

No. kontratu : **SSS/287/MOPTC-2016**

Data Inspesaun :**23-09-2022**

Fatin Inspesaun :Manulobas

Koordinadas :

Start Point : Long :- 84961042S, Latetude: 125.3996632E

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : **1. Joaquim de C. Madeira**

: **2. Claudino Soares dos Santos**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Bee matan nebe dada bee mos ba komunidade sira iha suku mane loba, kondisaun bee matan iha neba bee boot no diak. **(pagamento 100%.**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.**

No. kontratu : **SSS/287/MOPTC-2016**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

BEE MATAN.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



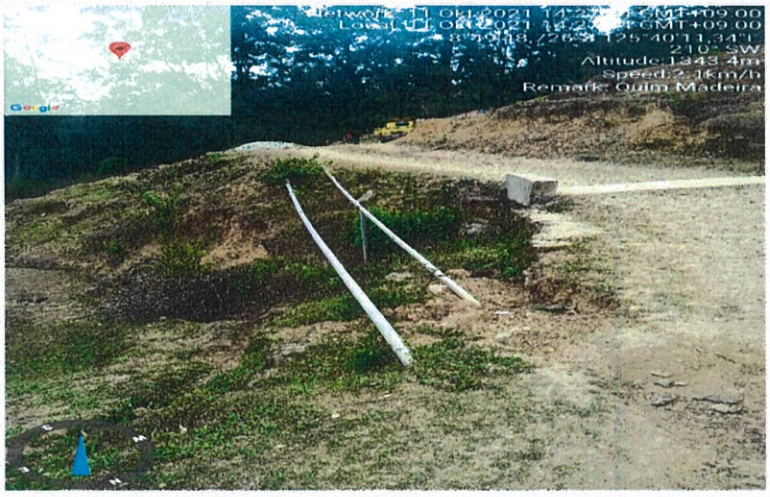


#ANEXU C1 (MBS-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro.**

No. kontratu : **SSS/287/MOPTC-2016**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Instalasaun kanu 2" x 6 M Kanu refere ho kondisaun diak hela.	
Lutu haleu tanki	

ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ICU Room Maubesse.**
No. kontratu : **NCB/087/MOPTC-2016**

Data Inspesaun :**23/09/2022**

Fatin Inspesaun : Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : -8501296S, Latetude: 1253557546E,

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : **1. Joaquim de C. Madeira**

: **2. Claudino Soares dos Santos**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Parte oin

Projeito refere atinji ona **100%**, Kompanhia agora hatama ona relatotio ba iha dono projeito.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (MBS-19)

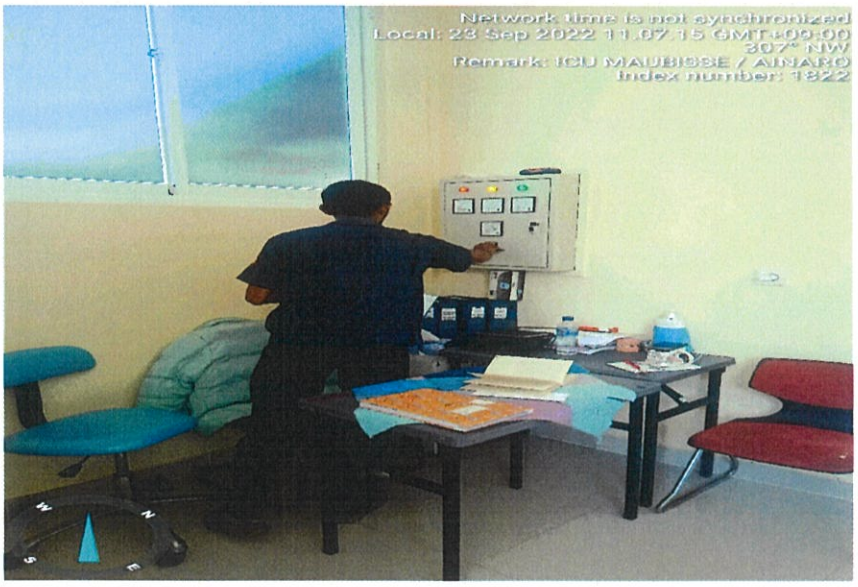
Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ICU Room Maubesse.**
No. kontratu : **NCB/087/MOPTC-2016**

Sketch & Foto Desenho

Parte interior sala ICU.





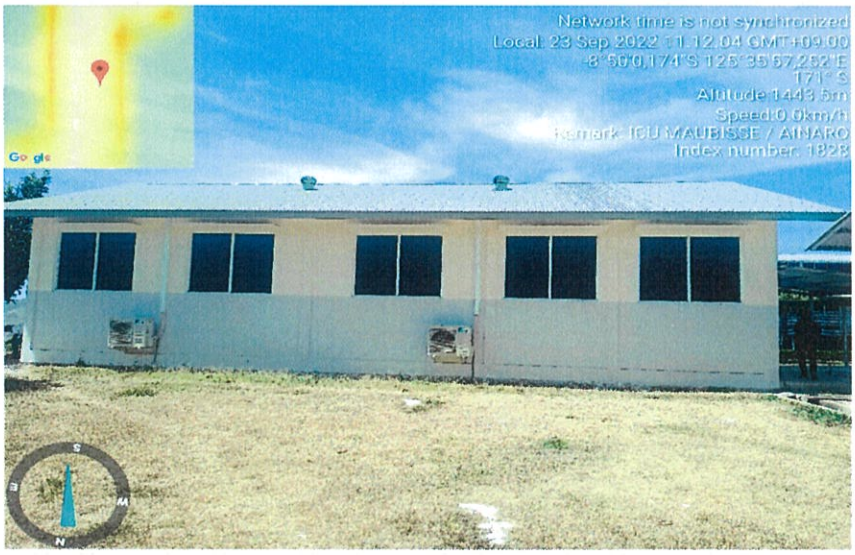
ANEXU C1 (MBS-19)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ICU Room Maubesse.**
No. kontratu : **NCB/087/MOPTC-2016**

Parte soring kuana no karuk





ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Data Inspesaun :13/09/2022

Fatin Inspesaun : Rileco / Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long :, 8,8341SLatetude: End 125,5842E

Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Inspesaun ba Pedido Pagamento 50% nian iha tereno. Hodi hein processo pagamento.	

ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Inspesaun ba Pedido Pagamento 50% nian iha tereno. Hodi hein processo pagamento.





ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Inspesaun ba Pedido Pagamento 50% nian iha tereno. Hodi hein processo pagamento.	 

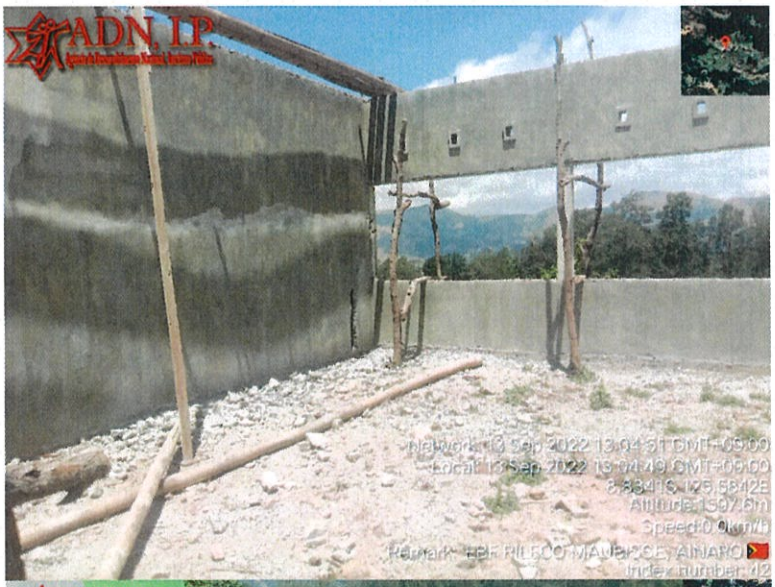
ANEXU-MBS-12#
Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Inspesaun ba Pedido Pagamento 50% nian iha tereno. Hodi hein processo pagamento.





Sketch & Foto Desenho

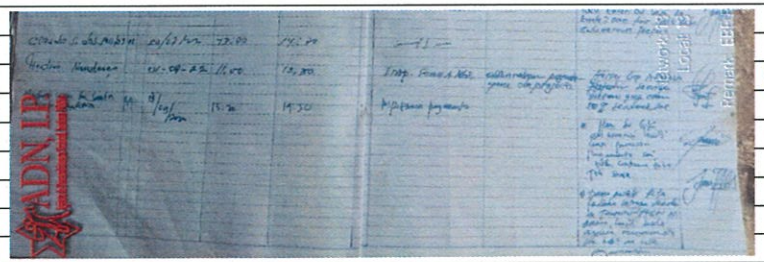
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	13/07/2022	Maubisse/ Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Teknico AND.IP	1	Husu ba GK atu mantein hodi hein processo pagamento, hodi bele kontinua fila fali servisu	
					2		

ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Data Inspesaun : 13/09/2022

Fatin Inspesaun : Bermoli/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long -84834'638''S: Latetude: 125'39'26.238' E

End Point : Long : -84834'638''S, Latetude: 125'39'26.238' E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba pedidu pagamento nebe mak rekomenda husi projeito nain.	

ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

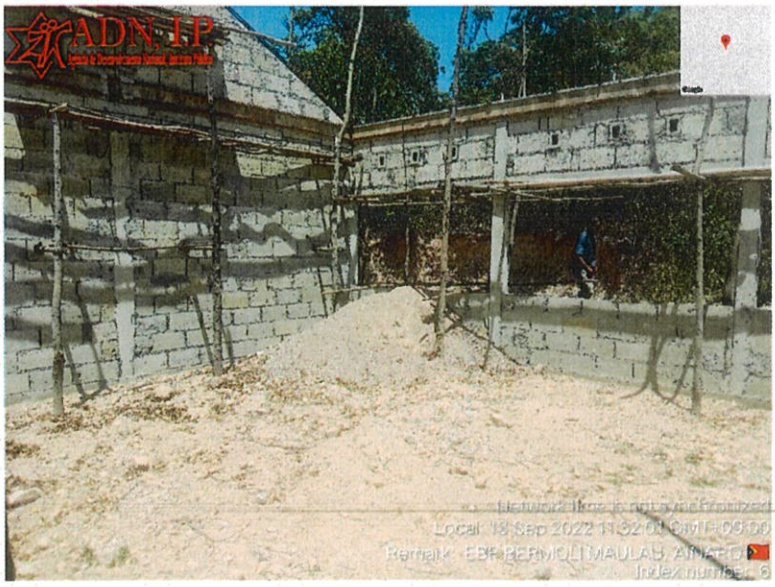
Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Sketch & Foto Desenho

Ekipa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba pedidu pagamento nebe mak rekomenda husi projeito nain.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual






MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/09/2022	Maubise/Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino Soares Santos	Teknico	1	Husu grupu mantein nafatin servisu no kontrola servisu didiak atu nunee hein pagamento 50% nian hodi kontinua fila fali servisu	
					2	husu ba grupu atu entrega desenho ba teknico AND. IP iha tempo badak nia laran	
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		

ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Data Inspesaun : 07-09-2022

Fatin Inspesaun :Betula/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long : 8'55'42606'S Latetude: 36'23'274 E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Inspesaun ba pedidu pagamento 50% nian iha rtereno	

ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Inspesaun ba pedidu pagamento 50% nian iha rtereno

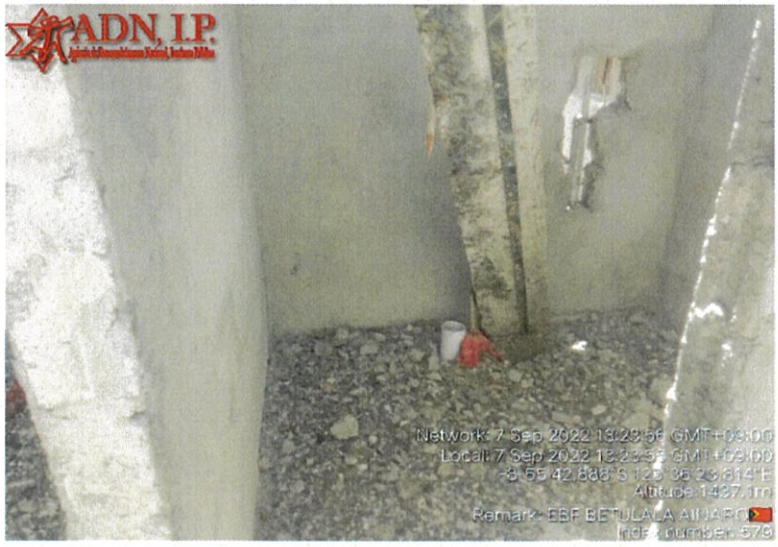




ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Inspesaun ba pedidu pagamento 50% nian iha rtereno	 

Observasaun iha tereno no Foto Aktual


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	7/09/2022	Maubessi/ Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tecnico AND.IP	1	Husu ba Grupu atu mantein hodi hein pedido pagamento	
					2	wainhira hetan oa pagamento husu ba Grupu atu aselera servisu	
					3	Mantein Qualidade, BOQ, No desenho	
					4		

#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Data Inspesaun : 01/09/2022

Fatin Inspesaun : Lumluli/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long -8'471,122 S: Latetude: 125'41'11'238'E

End Point : Long : -8'471,122 S, Latetude: 125'41'11'238'E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

2. Claudino Soares dos Santos

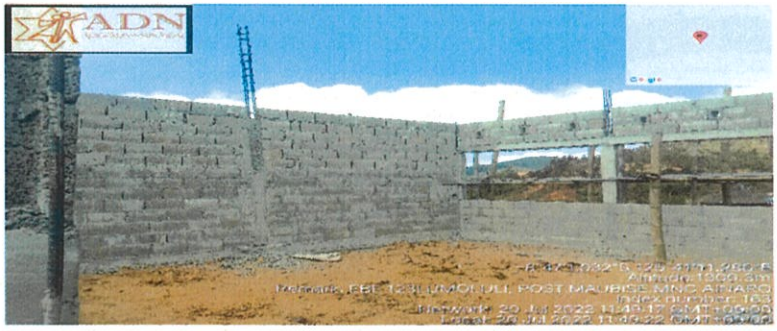
Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeto refere lao hela, GK preparasaun Levantamento dadus ba pagamento 50%, nian sai maka foin kontinua servisu ba uma kakuluk.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU-MBS-17#

Back-up Data

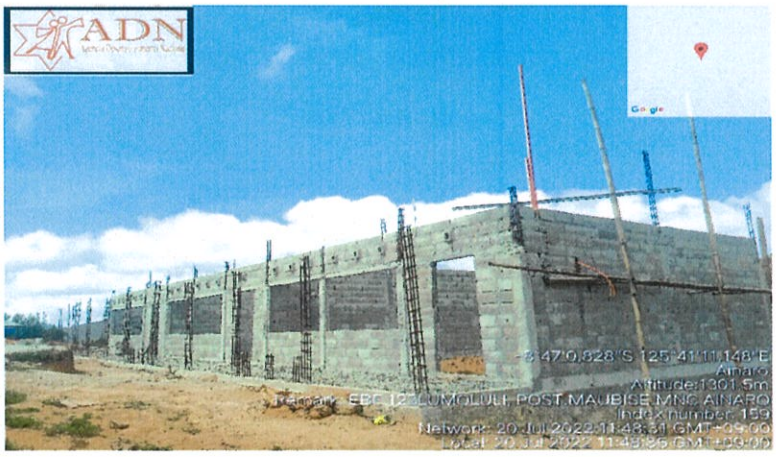
Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere lao hela, GK preparasaun Levantamento dadus ba pagamento 50%, nian sai maka foin kontinua servisu ba uma kakuluk.

Observasaun uha tereno no foto aktual







ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Data Inspesaun : 01/09/2022

Fatin Inspesaun : Ruslau/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere hotu ona, preparasaun ba monta bikesting ba slotf leten. E fui hotu kontinuasaun levantamento dadus ba pagamento 50% nian e pagamento 50% nia sai maka kontinua fali uma kakuluk.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch & Foto Desenho



Projeito refere bloko hada hotu ona, preparasaun ba monta bikesting ba slotf leten.



ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch & Foto Desenho



Projeito refere bloko hada hotu ona, preparasaun ba monta bikesting ba slotf leten.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Sep-22		
											Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	$ 452,775.36	June 6, 2016			
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	$ 381,043.91	Sept. 1, 2016			
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016			
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	$ 4,223,004.05	July 1, 2013			
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Consorcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	$ 125,249.49	Nov. 7, 2016			
6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017			
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	$ 3,717,215.92	July 1, 2013			
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipesoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017			
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	$ 3,596,249.07	July 1, 2013			
10	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	91.76%	0.00%	91.76%
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	$ 489,653.83	April 10, 2019			
12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	$ 32,801.87	Aug. 16, 2019			
13	Rehabilitasaun Edificio Administrasaun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	$ 15,000.00	Sept. 19, 2016	0	0.00%	0
14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/II/2018	$ 7,700.00	Feb. 12, 2018	0	0.00%	0
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	$ 208,089.56	July 29, 2019	70.00%	27.82%	97.82%
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	86.20%	0.00%	86.20%
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	0	0.00%	0
18	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	$ 33,889.94	June 18, 2021			
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	$ 273,148.15	Aug. 1, 2015			

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Sep-22		
											Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	0.00%	41.32%
21	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	$ 600,016.84	July 25, 2016			
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	29.81%	0.00%	29.81%
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	28.12%	0.00%	28.12%
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	26.11%	0.00%	26.11%
25	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	19.87%	0.17%	20.05%
26	New Construction of Laboratory for Covid-19, at Sentru Internamentu Ainaro Villa, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Adijulcojam Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-21-098C	$ 70,069.94	14-Mar-21	74.76%	0.00%	74.76%
27	Rehabilitasaun CHC ba Izolamento Ainaro Villa relasiona covid19	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Marcalas Trading Solution, Unip Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-20-212	$ 31,997.68	Nov. 1, 2021	100	0.00%	100
28	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no contratu	$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	0	0.00%	0
29	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	$ 239,273.00	Sept. 25, 2019			
30	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	$ 384,790.42	Jull,26,2021			
31	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	$ 287,894.03	May 18, 2017			
32	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere-Ainaro	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	Ainaro	Berdato Unip Lda		$ 32,319.72	23.8, 2021			
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	0	21.62%	21.62%
34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	34.36%	0.00%	34.36%
35	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	29.93%	0.00%	29.9%
36	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	0.00%	19.30%	19.30%

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Sep-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
37	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	$ 411,500.10	8-Mar-22			
38	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	$ 448,953.98	8-Mar-22			
39	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	$ 295,599.61	8-Mar-22			
40	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	$ 326,511.43	8-Mar-22			
41	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	$ 161,554.19	Aug. 16, 2019			
42	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	$ 27,701.07	Jan. 9, 2017			
43	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	$ 195,150.70	Aug. 21, 2019			
44	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	$ 60,335.99	Aug. 16, 2019			
45	Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	$ 76,554.69	June 18, 2021			
46	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	$ 28,138,737.00	Nov. 20, 2014			
47	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	$ 26,875,070.79	Nov. 20, 2014			

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Sep-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
48	Construction Supervision of Road Rehabilitatiom works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014			
49	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016			
50	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	28.66%	0.00%	28.66%
51	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	32.14%	0.00%	32.14%
52	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	30.17%	0.00%	30.17%
53	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	$ 236,224.90	Feb. 5, 2019			
54	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	$ 203,298.50	Jan. 22, 2019			
55	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	$ 571,044.38	July 6, 2016			
56	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	$ 657,097.80	Jan. 9, 2016			
57	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	$ 996,017.31	July 6, 2016			
58	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	$ 1,032,412.07	July 6, 2016			
59	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	$ 997,025.15	Sept. 1, 2016			
60	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	$ 195,378.22	Aug. 16, 2019			
61	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	$ 84,706.26	Aug. 12, 2016			
62	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urlephha Star 0+000 - 3+000 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Delong Unip. Lda	MPW-190087	$ 302,126.40	Aug. 16, 2019			
63	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	$ 98,821.63	July 29, 2019			

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											Sep-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
64	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	$ 212,829.93	July 29, 2019	0	0.00%	0
65	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	$ 161,445.07	Aug. 16, 2019	100%	0.00%	100.00%
66	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	$ 112,517.92	June 18, 2021			
67	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	$ 34,371.15	June 18, 2021			
68	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	100%	0.00%	100.00%
69	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	$ 50,310.22	Jan. 9, 2017			
70	New Construction for ICU Building in Referal Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	$ 140,000.00	29-Apr-21	94.29%	0.00%	94.29%
71	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	28.49%	0.00%	28.49%
72	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	30.92%	0.00%	30.92%
73	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	29.29%	0.00%	29.29%
74	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	30.10%	0.00%	30.10%
75	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
76	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	29.07%	0.00%	29.07%
77	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	26.47%	0.00%	26.47%

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Sep-22		
											Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X. D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Certifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Joaquim de C. Madeira

Claudino Soares dos Santos

Municipio MUNICIPIO AINARO NO POSTOS

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Setembro 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	OBS
AINARO VILA (ANV)	1	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Retensaun 10%
							Actual																																
	2	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	Simbissa Unip.Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Remata ona hein Pedido Pagamento 100%
							Actual																																
	3	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																Projeto refere final ona 100%, maibe iha item balun mak sedauk kompleta, nemak atu altera fali ba halo baleta ho garajen para fatin
							Actual																																
	4	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	PDIM	ESTATAL	Plan																																On going
							Actual																																
	5	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG. FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO AINARO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																Pagamento / Rekomenda progresso fisiko
							Actual																																
	6	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																Pagamento / Rekomenda progresso fisiko
							Actual																																
	7	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																Pagamento / Rekomenda progresso fisiko
							Actual																																
	8	New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro	Atramor Unip Lda		LM	MSSI	Plan																																On going
							Actual																																
	9	NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19,AT SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE	ADIJULCOJAM UNIPESSOAL Lda	RDTL-MS-19-DNA-RBK-21-098C	LM	SAUDE	Plan																																Projeito 100% ona
							Actual																																
	10	SERVISU REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE	MARCALAS TRADING SOLUTION UNIP Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-20-212	LM	SAUDE	Plan																																Projeito 100% ona
							Actual																																
HATUDO (HA)	1	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																Pagamento / Rekomenda progresso fisiko
							Actual																																
	2	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																parado provisorio, tamba hein hela pagamento 50%
							Actual																																
	3	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBF. FATU-META))	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																on going (dalan ba projeito grave liu wainhira udan)
							Actual																																
	4	Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-udo, Ainaro	LEOLICO LDA	NCB/02/DNA/2021	LM	EDUCAÇÃO	Plan																																Pagamento
							Actual																																
HATUBULICO (HTB)	1	Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																on going
							Actual																																
	2	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																Pagamento / Rekomenda progresso fisiko
							Actual																																
	3	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																on going
							Actual																																

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	**Joaquim de C. Madeira**
	Claudino Soares dos Santos
Municipio	**MUNICIPIO AINARO NO POSTOS**

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Setembro 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	OBS
MAUBISSE (MBS)	1	Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Maubisse	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																															Hein Pagamento 100%
							Actual																															
	2	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Retensaun 10%
							Actual																															
	3	Konstrusaun ICU Room Maubesse	El Constructio Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															Projeito refere 100% ona, hein companha submete as-build drawing, As-Build QTY ba contigency
							Actual																															
	4	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet, Cuzina no Armagem no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (BERMOLI MAULAU)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															Pagamento / Rekomenda progresso fisiko
							Actual																															
	5	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Lumluli)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															provisorimente para tamba hein pagamento 50%
							Actual																															
	6	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manelobas Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Maneloba)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															Estrada aat kareta ba ladiak
							Actual																															
	7	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Russulau)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															provisorimente para tamba hein pagamento 50%
							Actual																															
	8	Construção de Salas de Aulas 6 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Manetu)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															Estrada aat kareta ba ladiak
							Actual																															
	9	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Rileco Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															Pagamento / Rekomenda progresso fisiko
							Actual																															
	10	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Aituto Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Betulala)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															Pagamento / Rekomenda progresso fisiko
							Actual																															

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Procesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng.Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo de Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januarrio Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN, I.P

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/008/MOP-2021**

Data Inspesaun : 21/09/2022

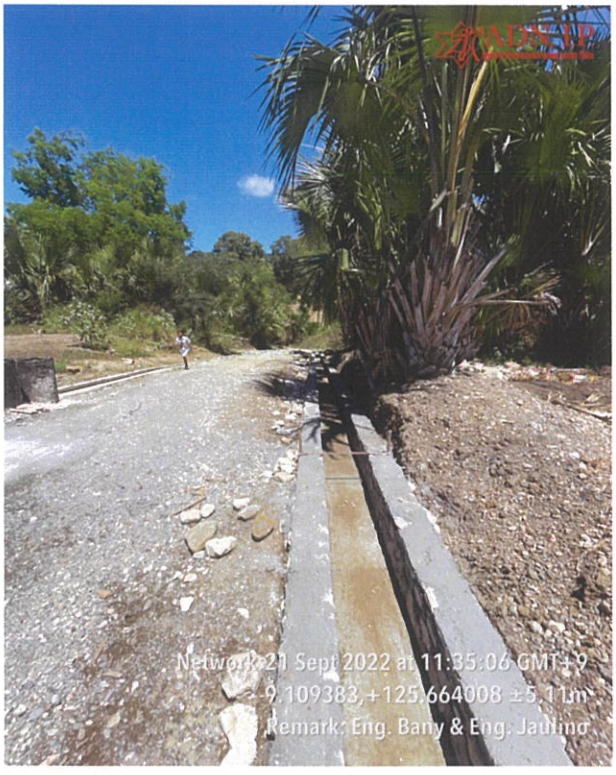
Fatin Inspesaun : Foho Ailico - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9 109383 Latetude: 125'664008

Naran Inspector : 1. Manuel Bany

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Companhia sei halo Servico Stone Massonry	

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/008/MOP-2021**

Companhia sei halo Servico Stone Massonry



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia sei halo Servico Stone Massonry



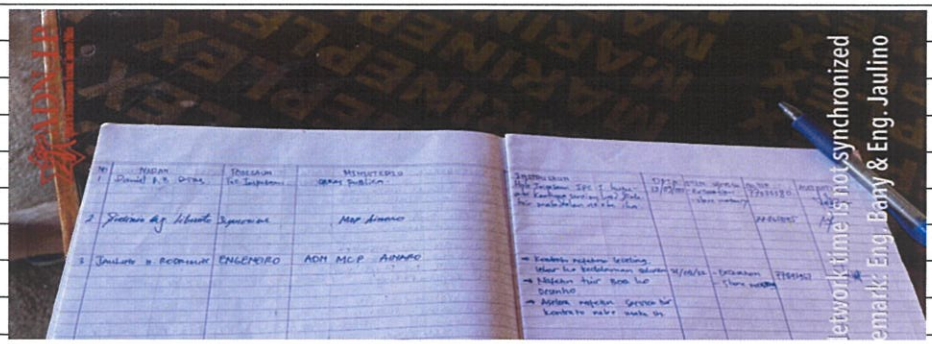
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality

Kompanha : Haburas Sarai Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	21/09/22	Ainaro/Hatudo	Manuel Bany	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1	Kontrola nafatin Leveling lebar ho kedalaman saluran.	
					2	Nafatin tuir BOQ ho Desenho	
					3	Aselera nafatin servico tuir kontrato nebe maka iha	
					4		
					5		
II	21/09/22	Ainaro/Hatudo	Jaulino H. Rodrigues	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

Roads Name : Rural Road Rehabilitation of Fohi Ailoco - Foho Bobe Chainege 3+500-6+000 Ainaro Municipality
Lokasi : Bobe - Hatu Udo
Contractor : BERDATO Unip. Lda

Pay item No.	DESCRIPTION	SUMMARY OF BILLED WORKS									
		CONTRACT AMOUNT ($)	PRESENTAGEN	BILLED WORKS AMOUNT						BALANCE OF WORK	
				PREVIOUS		THIS PERIOD		TOTAL			
				AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%
		(1)	(%)	(2)		(3)		(4) = (2) + (3)		(5) = (1) - (4)	
R-01	General	$ 9,950.00	3.37%	$ 6,425.00	2.17%	$ 1,000.00	0.34%	$ 7,425.00	2.51%	$ 2,525.00	0.9%
R-03	Drainage	$ 21,849.07	7.39%	$ 8,629.69	2.92%	$ 4,533.00	1.53%	$ 13,162.69	4.45%	$ 8,686.38	2.9%
R-05	Earth work	$ 29,108.95	9.85%	$ -	0.00%	$ 6,490.00	2.20%	$ 6,490.00	2.20%	$ 22,618.95	7.7%
R-08	Granular sub- base and base	$ 174,237.22	58.94%	$ 1,305.65	0.44%	$ 8,734.00	2.95%	$ 10,039.65	3.40%	$ 164,197.58	55.5%
R-10	Structure	$ 770.00	0.26%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ 770.00	0.3%
R-11	Dayworks	$ 6,433.25	2.18%	$ 100.00	0.03%	$ 2,345.00	0.79%	$ 2,445.00	0.83%	$ 3,988.25	1.3%
R-15	Routine maintenance	$ 1,000.00	0.34%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ 1,000.00	0.3%
G-01	Provisional sum	$ 17,701.20	5.99%	$ 1,667.60	0.56%	$ 5,632.00	1.91%	$ 7,299.60	2.47%	$ 10,401.60	3.5%
G-03	Security	$ 4,119.00	1.39%	$ 1,566.00	0.53%	$ 1,457.00	0.49%	$ 3,023.00	1.02%	$ 1,096.00	0.4%
G-04	Ceremonial costs	$ 300.00	0.10%	$ 150.00	0.05%		0.00%	$ 150.00	0.05%	$ 150.00	0.1%
A	**Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)**	**$ 243,348.49**	**82.32%**	**$ 16,460.34**	**5.57%**	**$ 23,102.00**	**7.82%**	**$ 39,562.34**	**13.38%**	**$ 203,786.15**	**68.94%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 24,334.85**	**8.23%**	**$ 1,646.03**	**0.56%**	**$ 2,310.20**	**0.78%**	**$ 3,956.23**	**1.34%**	**$ 20,378.62**	**6.89%**
C	**General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)**	**$ 22,120.20**	**7.48%**	**$ 3,383.60**	**1.14%**	**$ 7,089.00**	**2.40%**	**$ 10,472.60**	**3.54%**	**$ 11,647.60**	**3.94%**
D	**Construction tax (A+B+C) x 2%**	**$ 5,796.07**	**1.96%**	**$ 429.80**	**0.15%**	**$ 650.02**	**2.97%**	**$ 1,079.82**	**0.37%**	**$ 4,716.25**	**1.60%**
F	**Total contract cost (A+B+C+D)**	**$ 295,599.61**	**100.00%**	**$ 21,919.77**	**7.42%**	**$ 33,151.22**	**13.96%**	**$ 55,070.99**	**18.63%**	**$ 240,528.61**	**81.37%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho) **(Eng. Jaulino H. Rodrigues)**
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Eng.Remigio da C. S. Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/008/MOP-2021**

Data Inspesaun : 03/08/2022

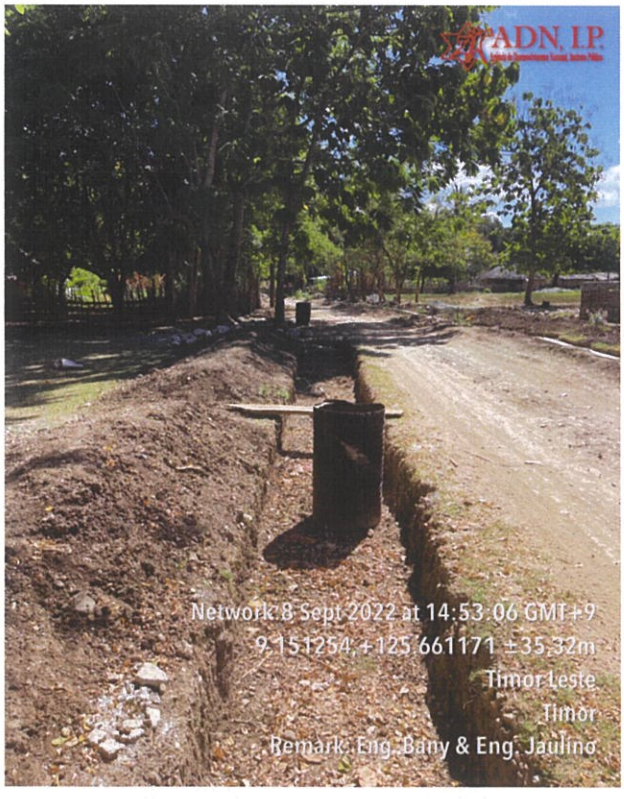
Fatin Inspesaun : Foho Ailico - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9 109383 Latetude: 125'664008

Naran Inspector : 1. Manuel Bany

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Companhia sei halo Servico Stone Massonry	

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/008/MOP-2021**

Companhia sei halo Servico Stone Massonry



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia sei halo Servico Stone Massonry



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Roads Name : Rural Road Rehabilitation of Fohi Ailoco - Foho Bobe Chainege 6+700-7+900 Ainaro Municipality
Lokasi : Bobe - Hatudo
Contractor : HABURAS SARAI Unip. Lda

Pay item No.	DESCRIPTION	SUMMARY OF BILLED WORKS									
		CONTRACT AMOUNT ($)	PRESENTA GEN	BILLED WORKS AMOUNT						BALANCE OF WORK	
				PREVIOUS		THIS PERIOD		TOTAL			
				AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%
		(1)	(%)	(2)		(3)		(4) = (2) + (3)		(5) = (1) - (4)	
R-01	General	$ 4,150.00	1.27%	$ 2,250.00	0.69%	$ 500.00	0.15%	$ 2,750.00	0.84%	$ 1,400.00	0.43%
R-03	Drainage	$ 35,299.07	10.82%	$ 12,147.60	3.72%	$ 21,457.00	6.58%	$ 33,604.60	10.30%	$ 1,694.48	0.52%
R-05	Earth work	$ 25,065.01	7.68%	$ -	0.00%	$ 13,546.46	4.15%	$ 13,546.46	4.15%	$ 11,518.55	3.53%
R-08	Granular sub- base and base	$ 204,326.50	62.63%	$ 45,180.81	13.85%	$ 87,546.00	26.83%	$ 132,726.81	40.68%	$ 71,599.69	21.95%
R-10	Structure	$ 700.00	0.21%	$ -	0.00%	$ 700.00	0.21%	$ 700.00	0.21%	$ -	0.00%
R-11	Dayworks	$ 5,168.86	1.58%	$ 1,089.36	0.33%	$ 3,260.00	1.00%	$ 4,349.36	1.33%	$ 819.50	0.25%
R-15	Routine maintenance	$ 1,000.00	0.31%	$ -	0.00%	$ 1,000.00	0.31%	$ 1,000.00	0.31%	$ -	0.00%
G-01	Provisional sum	$ 1,500.00	0.46%	$ 375.00	0.11%	$ 1,125.00	0.34%	$ 1,500.00	0.46%	$ -	0.00%
G-03	Security	$ 11,640.00	3.57%	$ 3,435.00	1.05%	$ 4,344.00	1.33%	$ 7,779.00	2.38%	$ 3,861.00	1.18%
G-04	Project Team	$ 4,623.00	1.42%	$ 3,158.00	0.97%	$ 1,465.00	0.45%	$ 4,623.00	1.42%	$ -	0.00%
G-05	Safety and protection	$ 300.00	0.09%	$ 150.00	0.05%	$ 150.00	0.05%	$ 300.00	0.09%	$ -	0.00%
A	**Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)**	**$ 275,709.45**	**84.51%**	**$ 60,667.77**	**18.60%**	**$ 128,009.46**	**39.24%**	**$ 188,677.23**	**57.83%**	**$ 87,032.22**	**26.68%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 27,570.95**	**8.45%**	**$ 6,066.78**	**1.86%**	**$ 12,800.95**	**3.92%**	**$ 18,867.72**	**5.78%**	**$ 8,703.22**	**2.67%**
C	**General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)**	**$ 16,563.00**	**5.08%**	**$ 7,118.00**	**2.18%**	**$ 7,084.00**	**2.17%**	**$ 14,202.00**	**4.35%**	**$ 3,861.00**	**1.18%**
D	**Construction tax (A+B+C) x 2%**	**$ 6,396.87**	**1.96%**	**$ 1,477.05**	**0.45%**	**$ 2,957.89**	**0.91%**	**$ 4,434.94**	**1.36%**	**$ 1,991.93**	**0.61%**
F	**Total contract cost (A+B+C+D)**	**$ 326,240.26**	**100.00%**	**$ 75,329.59**	**23.09%**	**$ 150,852.29**	**46.24%**	**$ 226,181.89**	**69.33%**	**$ 101,588.38**	**31.14%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho) **(Eng. Jaulino H. Rodrigues)**
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Eng.Remigio da C. S. Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/007/MOP-2021**

Data Inspesaun : 08/08/2022

Fatin Inspesaun : Foho Ailiko - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9 109383 Latetude: 125'664008

Naran Inspector : 1. Manuel Bany

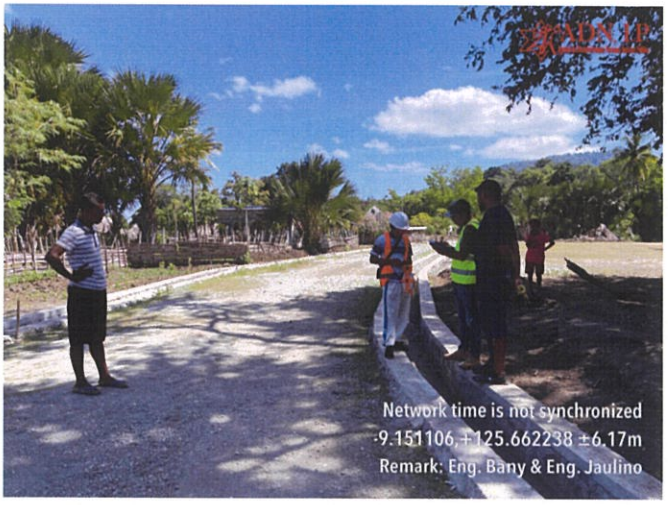
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Inspeksaun Pagamento ba IPC I	

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/007/MOP-2021**



Inspeksaun Pagamento ba IPC I



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/007/MOP-2021**



Inspeksaun Pagamento ba IPC I



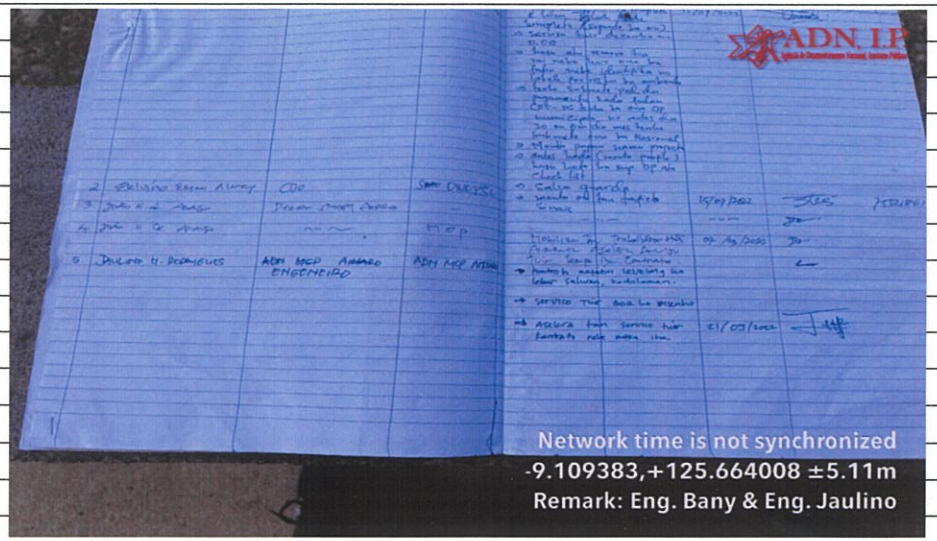
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality

Kompanha : Berdato Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	21/09/22	Ainaro/Hatudo	Manuel Bany	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
II	21/09/22	Ainaro/Hatudo	Jaulino H. Rodrigues	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Roads Name : Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Star 0+000 - 5+000 and Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800 in Ainaro Municipality
Lokasi : Mauchiga - Maubisse
Contractor : HATUTAN MORIS Unip. Lda

Pay item No.	DESCRIPTION	SUMMARY OF BILLED WORKS									
		CONTRACT AMOUNT ($)	PRESENTA GEN	BILLED WORKS AMOUNT						BALANCE OF WORK	
				PREVIOUS		THIS PERIOD		TOTAL			
				AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%
		(1)	(%)	(2)		(3)		(4) = (2) + (3)		(5) = (1) - (4)	
R-01	General	$ 500.00	1.45%	$ 500.00	1.45%	$ -	0.00%	$ 500.00	1.45%	$ -	0.0%
R-02	Drainage	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.0%
R-03	Earth work	$ 993.25	2.89%	$ 808.50	2.35%	$ 184.75	0.54%	$ 993.25	2.89%	$ -	0.0%
R-05	Granular sub- base and base	$ 1,936.00	5.63%	$ 1,653.00	4.81%	$ 283.00	0.82%	$ 1,936.00	5.63%	$ -	0.0%
R-08	Structure	$ 3,242.11	9.43%	$ 1,020.68	2.97%	$ 1,200.00	3.49%	$ 2,220.68	6.46%	$ 1,021.43	3.0%
R-10	Dayworks	$ 154.00	0.45%	$ 84.00	0.24%	$ 70.00	0.20%	$ 154.00	0.45%	$ -	0.0%
R-11	Routine maintenance	$ 16,367.33	47.62%	$ 10,685.44	31.09%	$ 3,200.00	9.31%	$ 13,885.44	40.40%	$ 2,481.89	7.2%
R-12	Cleaning	$ 75.00	0.22%	$ -	0.00%	$ 75.00	0.22%	$ 75.00	0.22%	$ -	0.0%
R-15	Provisional sum	$ 950.00	2.76%	$ 500.00	1.45%	$ 450.00	1.31%	$ 950.00	2.76%	$ -	0.0%
G-02	Project Team	$ 4,500.00	13.09%	$ 3,300.00	9.60%	$ 700.00	2.04%	$ 4,000.00	11.64%	$ 500.00	1.5%
G-03	Safety and Protection	$ 2,307.75	6.71%	$ 1,489.50	4.33%	$ 500.00	1.45%	$ 1,989.50	5.79%	$ 318.25	0.9%
R-15	Ceremonial Costs	$ 250.00	0.73%	$ 250.00	0.73%	$ -	0.00%	$ 250.00	0.73%	$ -	0.0%
A	**Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)**	**$ 24,217.69**	**70.46%**	**$ 15,251.62**	**44.37%**	**$ 5,462.75**	**15.89%**	**$ 20,714.37**	**60.27%**	**$ 3,503.32**	**10.19%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 2,421.77**	**7.05%**	**$ 1,525.16**	**4.44%**	**$ 546.28**	**1.59%**	**$ 2,071.44**	**6.03%**	**$ 350.33**	**1.02%**
C	**General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)**	**$ 7,057.75**	**20.53%**	**$ 5,039.50**	**14.66%**	**$ 1,200.00**	**3.49%**	**$ 6,239.50**	**18.15%**	**$ 818.25**	**2.38%**
D	**Construction tax (A+B+C) x 2%**	**$ 673.94**	**1.96%**	**$ 436.33**	**1.27%**	**$ 144.18**	**0.42%**	**$ 580.51**	**1.69%**	**$ 93.44**	**0.27%**
F	**Total contract cost (A+B+C+D)**	**$ 34,371.15**	**100.00%**	**$ 22,252.60**	**64.74%**	**$ 7,353.21**	**21.39%**	**$ 29,605.81**	**86.14%**	**$ 4,765.34**	**13.86%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho) **(Eng. Jaulino H. Rodrigues)**
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Eng.Remigio da C. S. Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/007/MOP-2021**

Data Inspesaun : 03/08/2022

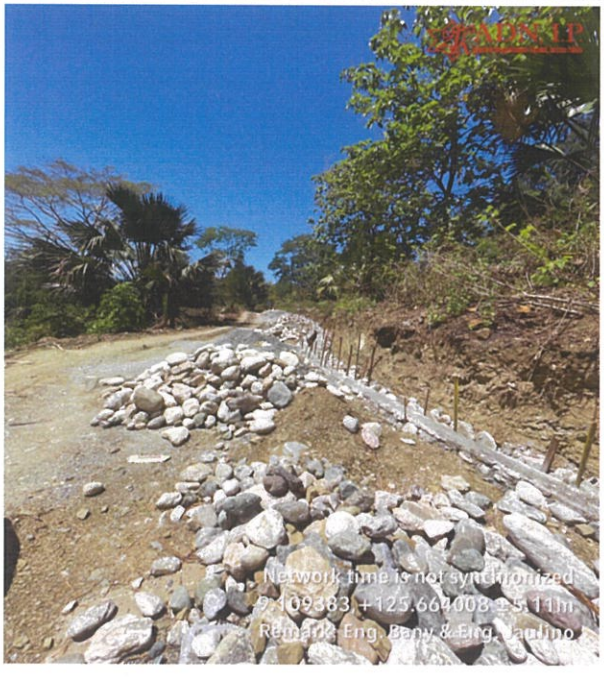
Fatin Inspesaun : Foho Ailico - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9 109383Latetude: 125'664008

Naran Inspector : 1. Manuel Bany

: 2. Jaulino H. Rodrigues

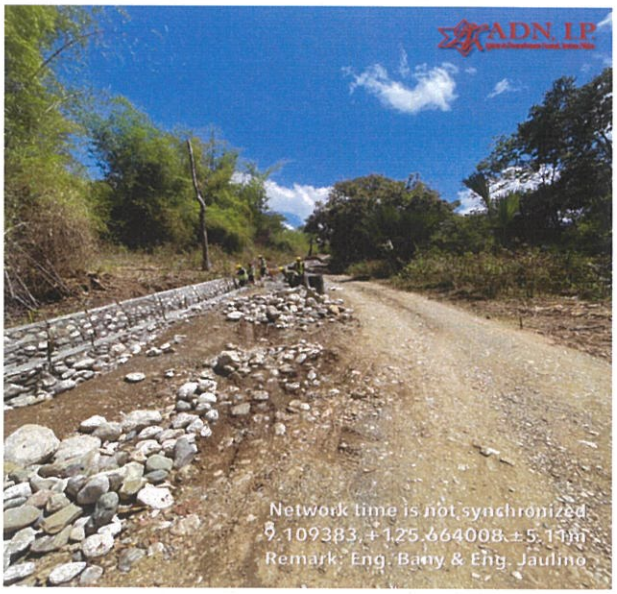
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Companhia sei halo Servico Stone Massonry	

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/007/MOP-2021**

Companhia sei halo Servico Stone Massonry





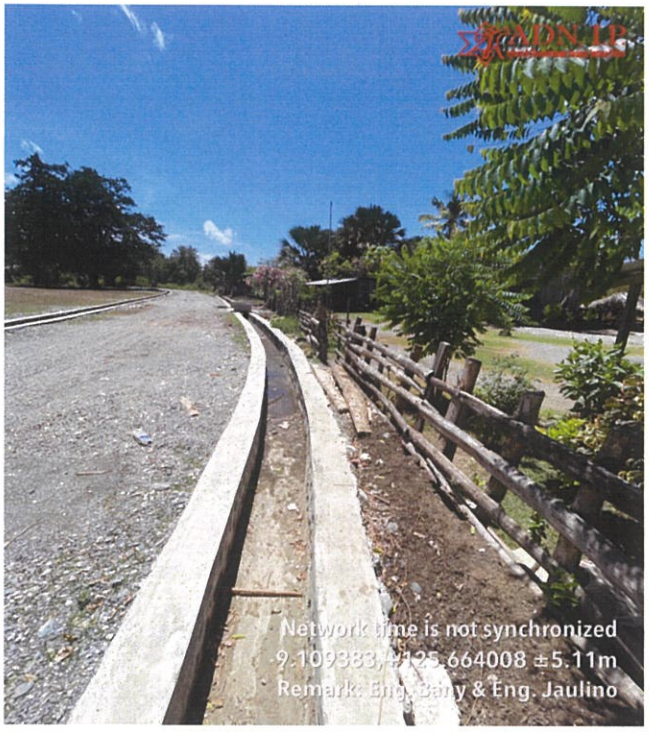
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/007/MOP-2021**

Companhia sei halo Servico Stone Massonry



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

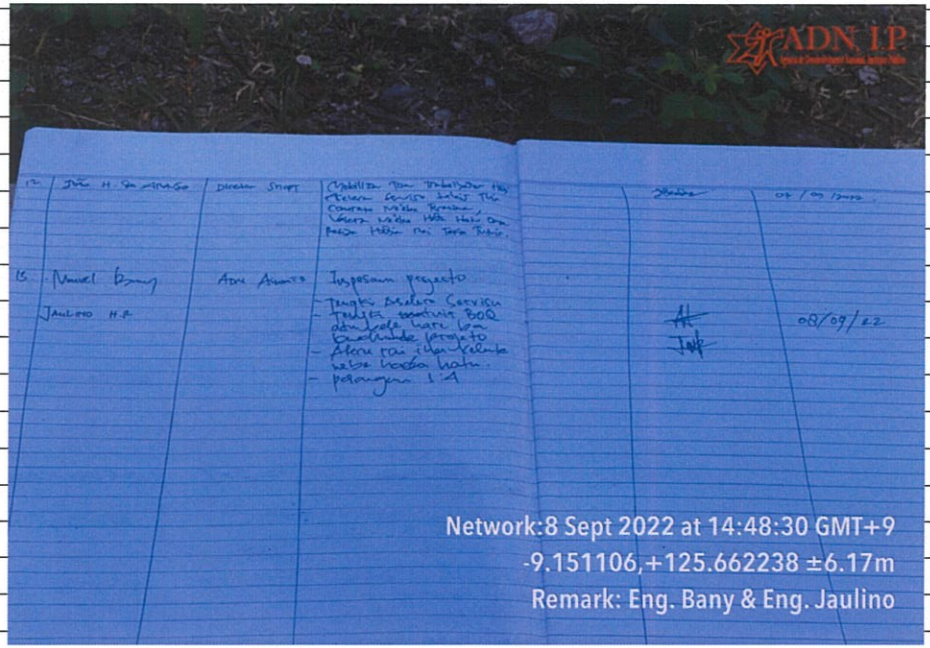
ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality

Kompanha : Berdato Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/9/2022	Ainaro/Hatudo	Manuel Bany	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1	Inspeksaun Servico	
					2	Tenki aselera servico	
					3	tenki tuir BOQ atu bele hare kualidade Projeito	
					4	Aterunrai nebe iha Valeta nebe maka hada hotu	
					5	Pasangan stone massonry 1:4	
II	8/9/2022	Ainaro/Hatudo	Jaulino H. Rodrigues	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Roads Name : Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro-Mau-nuno sta 0+000-5+500,Mau-Ulo sta 0+000-1+200
Lokasi : Maununu - Maulo
Contractor : HABURAS SARAI Unip. Lda

Pay item No.	DESCRIPTION	SUMMARY OF BILLED WORKS									
		CONTRACT AMOUNT ($)	PRESENTA GEN	BILLED WORKS AMOUNT						BALANCE OF WORK	
				PREVIOUS		THIS PERIOD		TOTAL			
				AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%
		(1)	(%)	(2)		(3)		(4) = (2) + (3)		(5) = (1) - (4)	
R-01	General	$ 1,000.00	3.06%	$ 600.00	1.83%	$ -	0.00%	$ 600.00	1.83%	$ 400.00	1.22%
R-03	Drainage	$ 1,958.08	5.98%	$ 1,958.08	5.98%	$ -	0.00%	$ 1,958.08	5.98%	$ -	0.00%
R-05	Earth work	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
R-08	Granular sub- base and base	$ 9,132.38	27.90%	$ 9,132.38	27.90%		0.00%	$ 9,132.38	27.90%	$ -	0.00%
R-10	Structure	$ 55.00	0.17%	$ 55.00	0.17%	$ -	0.00%	$ 55.00	0.17%	$ -	0.00%
R-11	Dayworks	$ 11,029.54	33.70%	$ 9,718.59	29.69%	$ 541.60	1.65%	$ 10,260.19	31.35%	$ 769.35	2.35%
R-15	General expenses	$ 3,464.70	10.59%	$ 2,906.70	8.88%	$ -	0.00%	$ 2,906.70	8.88%	$ 558.00	1.70%
G-01	Provisional sum	$ 100.00	0.31%	$ 100.00	0.31%	$ -	0.00%	$ 100.00	0.31%	$ -	0.00%
A	**Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)**	**$ 26,739.70**	**81.70%**	**$ 24,370.75**	**74.77%**	**$ 541.60**	**1.65%**	**$ 24,912.35**	**76.42%**	**$ 1,727.35**	**5.28%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 2,673.97**	**8.17%**	**$ 2,437.08**	**7.45%**	**$ 54.16**	**0.17%**	**$ 2,491.23**	**7.61%**	**$ 172.73**	**0.53%**
D	**Over head (net cost x %);10%**	**$ 2,673.97**	**8.17%**	**$ 2,437.08**	**7.45%**	**$ 54.16**	**0.17%**	**$ 2,491.23**	**7.61%**	**$ 172.73**	**0.53%**
D	**Tax((net cost+ profit + Over head) x%);2%**	**$ 641.75**	**1.96%**	**$ 584.90**	**1.79%**	**$ 13.00**	**0.04%**	**$ 597.90**	**2.00%**	**$ 41.46**	**0.13%**
F	**Total contract cost (A+B+C+D)**	**$ 32,729.41**	**100.00%**	**$ 29,829.80**	**91.45%**	**$ 662.91**	**2.03%**	**$ 30,492.72**	**93.65%**	**$ 2,114.29**	**6.46%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Jaulino H. Rodrigues)

Verifika Husi :

(Eng.Remigio da C. S. Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/006/MOP-2021**

Data Inspesaun : 21/09/2022

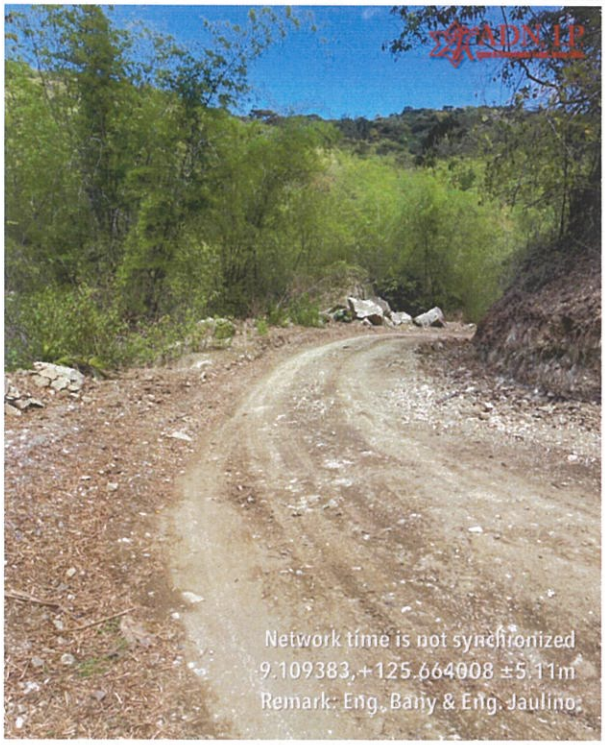
Fatin Inspesaun : Foho Ailico - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9 109383 Latetude: 125'664008

Naran Inspector : 1. Manuel Bany

: 2. Jaulino H. Rodrigues

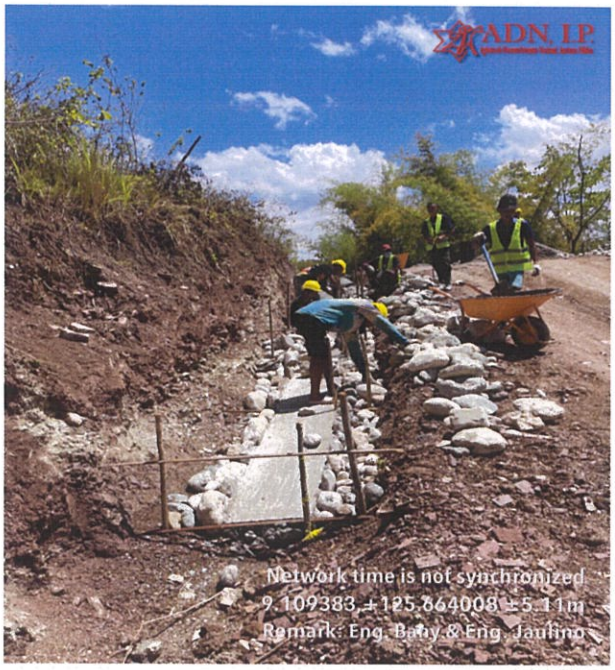
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Companhia sei halo Servico Stone Massonry	

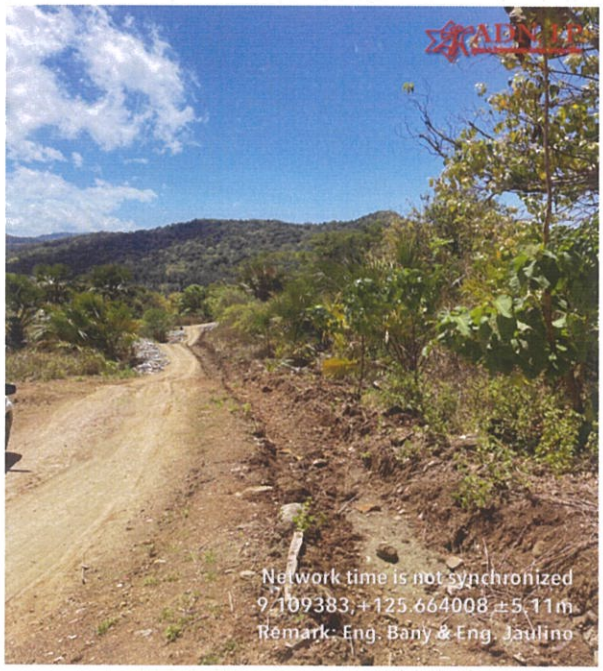
Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/006/MOP-2021**

Companhia sei halo Servico Stone Massonry





Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/006/MOP-2021**



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

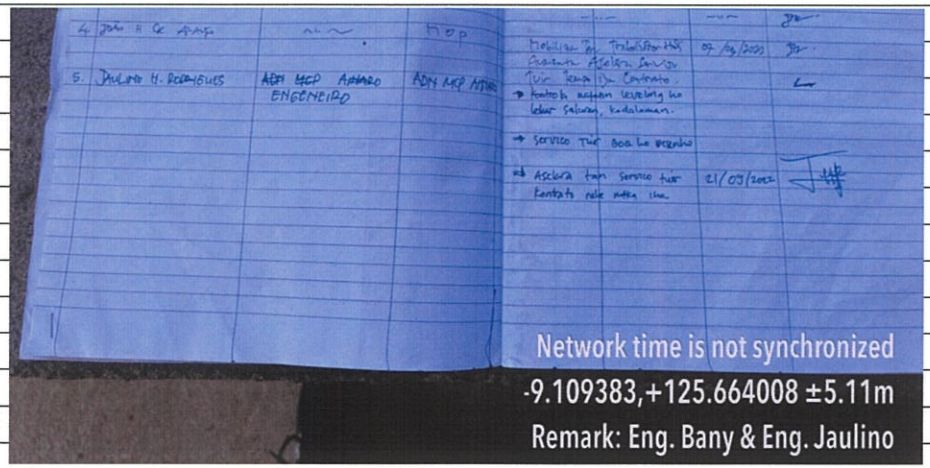
ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality

Kompanha : Bermauana Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	21/09/22	Ainaro/Hatudo	Manuel Bany	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1	Kontrola nafatin leveling, lebar saluran ho Kedalaman saluran.	
					2	Servico Tuir BOQ ho Desenho	
					3	Aselera tan servico tuir kontato nebe maka iha	
					4		
					5		
II	21/09/22	Ainaro/Hatudo	Jaulino H. Rodrigues	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



Roads Name : Rehabilition Ainaro - Maununo (Chinage, 0+000 - 5+553) Ainaro Municipality
Lokasi : Mau-Nunu
Contractor : EL Construction Unip. Lda

Pay item No.	DESCRIPTION	SUMMARY OF BILLED WORKS									
		CONTRACT AMOUNT ($)	PRESENTAGEN	BILLED WORKS AMOUNT						BALANCE OF WORK	
				PREVIOUS		THIS PERIOD		TOTAL			
				AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%
		(1)	(%)	(2)		(3)		(4) = (2) + (3)		(5) = (1) - (4)	
1.00	General protection	$ 10,435.00	1.74%	$ 6,970.00	1.16%	$ 1,000.00	0.17%	$ 7,970.00	1.33%	$ 2,465.00	0.4%
2.00	General works	$ 5,595.00	0.93%	$ 3,345.00	0.56%	$ 1,200.00	0.20%	$ 4,545.00	0.76%	$ 1,050.00	0.2%
3.00	Site Clerance	$ 1,725.10	0.29%	$ 1,137.14	0.19%	$ 587.96	0.10%	$ 1,725.10	0.29%	$ -	0.0%
4.00	Earth work	$ 42,956.18	7.16%	$ 13,831.61	2.31%	$ 4,200.00	0.70%	$ 18,031.61	3.01%	$ 24,924.57	4.2%
5.00	Road works	$ 26,899.30	4.48%	$ 3,849.00	0.64%	$ 23,050.30	3.84%	$ 26,899.30	4.48%	$ -	0.0%
6.00	Road surfacing	$ 327,675.77	54.61%	$ 89,067.40	14.84%	$ 25,000.00	4.17%	$ 114,067.40	19.01%	$ 213,608.37	35.6%
7.00	Routine maintenance	$ 173,457.68	28.91%	$ 93,840.59	15.64%	$ 5,623.00	0.94%	$ 99,463.59	16.58%	$ 73,994.09	12.3%
8.00	Provisional sum	$ 2,780.00	0.46%	$ -	0.00%	$ 1,000.00	0.17%	$ 1,000.00	0.17%	$ 1,780.00	0.3%
9.00	Security	$ 2,210.00	0.37%	$ 260.00	0.04%	$ 1,950.00	0.32%	$ 2,210.00	0.37%	$ -	0.0%
10.00	Project Team	$ 6,282.81	1.05%	$ -	0.00%	$ 2,500.00	0.42%	$ 2,500.00	0.42%	$ 3,782.81	0.6%
TOTAL CONTRACT		**$ 600,016.84**	**100.00%**	**$ 212,040.73**	**35.34%**	**$ 61,661.26**	**10.28%**	**$ 273,701.99**	**45.62%**	**$ 317,822.04**	**52.67%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Jaulino H. Rodrigues)

Verifika Husi :

(Eng.Remigio da C. S. Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/005/MOP-2021**

Data Inspesaun : 21/09/2022

Fatin Inspesaun : Foho Ailico - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9 109295 Latetude: 125'664233

Naran Inspector : 1. Manuel Bany

: 2. Jaulino H. Rodrigues

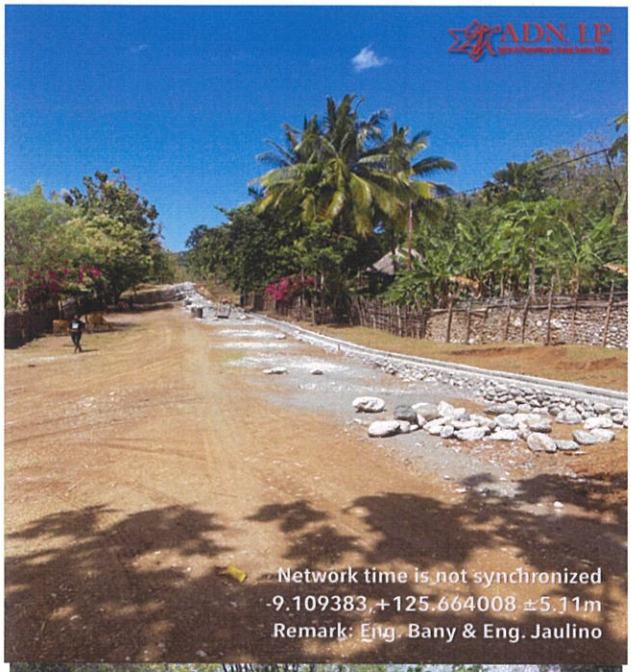
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Companhia sei halo Servico Stone Massonry	

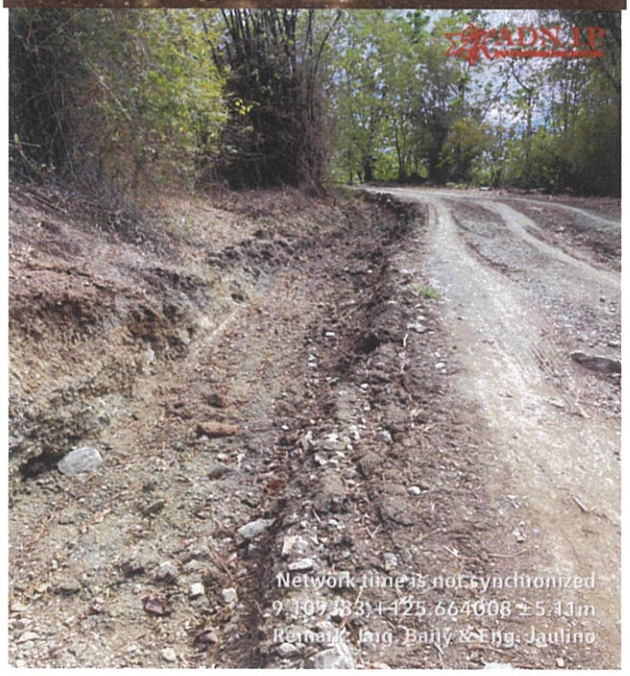
Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/005/MOP-2021**

Companhia sei halo Servico Stone Massonry





Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/005/MOP-2021**



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MBS-1)

Roads Name : Rural Roads Periodic Maintenance Liurai -Fatubosa Star 0+000-3+000
Lokasi : Suku LIURAI
Contractor : AILESU Unip. Lda

Pay item No.	DESCRIPTION	SUMMARY OF BILLED WORKS									
		CONTRACT AMOUNT ($)	PRESENTA GEN	BILLED WORKS AMOUNT						BALANCE OF WORK	
				PREVIOUS		THIS PERIOD		TOTAL			
				AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%
		(1)	(%)	(2)		(3)		(4) = (2) + (3)		(5) = (1) - (4)	
R-01	General	$ 925.00	1.53%	$ 925.00	1.53%	$ -	0.00%	$ 925.00	1.53%	$ -	0.0%
R-03	Drainage	$ 451.16	0.75%	$ 444.80	0.74%	$ -	0.00%	$ 444.80	0.74%	$ 6.35	0.0%
R-05	Earth work	$ 17,094.09	28.33%	$ 16,982.77	28.15%	$ -	0.00%	$ 16,982.77	28.15%	$ 111.32	0.2%
R-08	Granular sub- base and base	$ 22,534.37	37.35%	$ 20,170.07	33.43%	$ 1,863.12	3.09%	$ 22,033.19	36.52%	$ 501.18	0.8%
R-10	Structure	$ 27.50	0.05%	$ 27.50	0.05%	$ -	0.00%	$ 27.50	0.05%	$ -	0.0%
R-11	Dayworks	$ 5,688.00	9.43%	$ 5,688.00	9.43%	$ -	0.00%	$ 5,688.00	9.43%	$ -	0.0%
R-13	General expenses	$ 2,574.00	4.27%	$ 2,574.00	4.27%	$ -	0.00%	$ 2,574.00	4.27%	$ -	0.0%
R-15	Routine maintenance	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.0%
A	**Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)**	**$ 49,294.11**	**81.70%**	**$ 46,812.14**	**77.59%**	**$ 1,863.12**	**3.09%**	**$ 48,675.26**	**80.67%**	**$ 618.85**	**1.03%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 4,929.41**	**8.17%**	**$ 4,681.21**	**7.76%**	**$ 186.31**	**0.31%**	**$ 4,867.53**	**8.07%**	**$ 61.89**	**0.10%**
C	**Over head 10% x Total Net Cost**	**$ 4,929.41**	**8.17%**	**$ 4,681.21**	**7.76%**	**$ 186.31**	**0.31%**	**$ 4,867.53**	**8.07%**	**$ 61.89**	**0.10%**
D	**Construction tax (A+B+C) x 2%**	**$ 1,183.06**	**1.96%**	**$ 1,123.49**	**1.96%**	**$ 44.71**	**0.07%**	**$ 1,168.21**	**2.04%**	**$ 14.85**	**0.65%**
E	**Total contract cost (A+B+C+D)**	**$ 60,335.99**	**100.00%**	**$ 57,298.06**	**95.06%**	**$ 2,280.46**	**3.78%**	**$ 59,578.52**	**98.85%**	**$ 757.48**	**1.88%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Manuel Bano da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Jaulino H. Rodrigues)

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C.S do Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro**

No. kontratu : **RDTL**

Data Inspesaun : 21/09/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

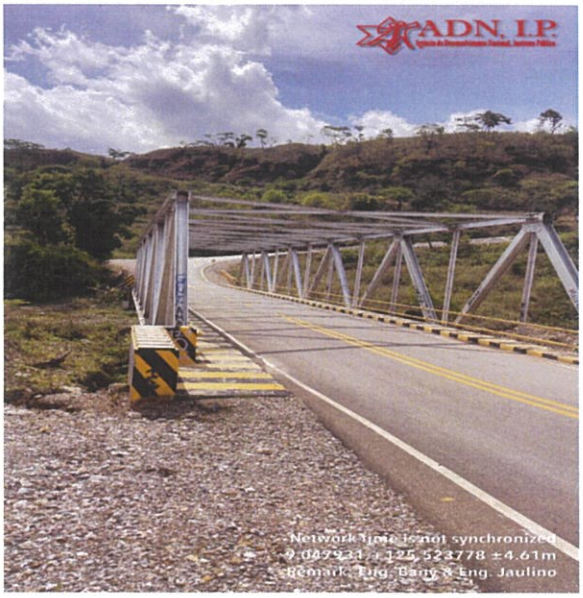
Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º0'15,612''S Latetude: 125º30'39,876''E

End Point : Long : - 9º3'51,231''S Latetude: 125º30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servico Marker Post	

Kondisaun Estrada Sarai – Ainaro Vila

ANEXU C1 (ANV-4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro**

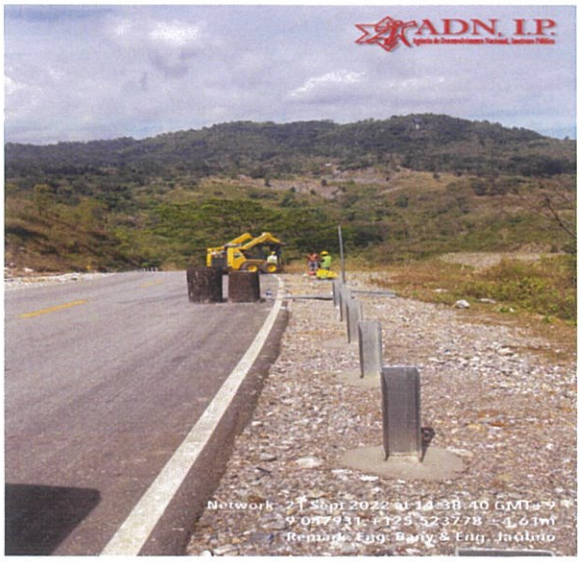
No. kontratu : **RDTL**

Servico Marker Post



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico Marker Post



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14.**
No. kontratu : **SSS/3003/MOPTC-2016**

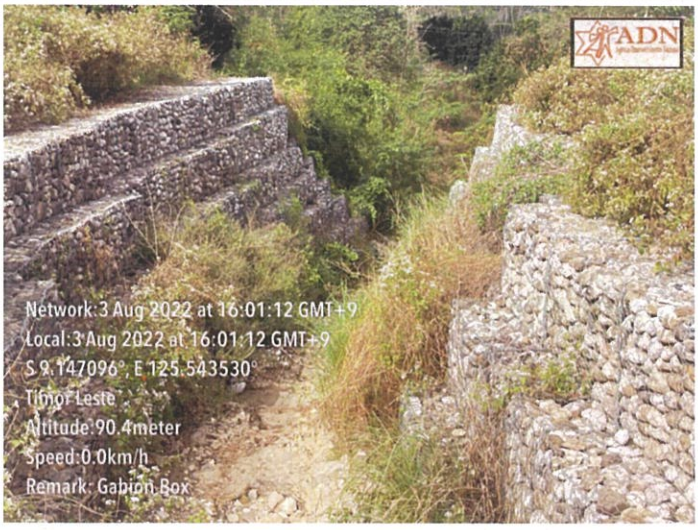
Data Inspesaun : 21/09/2022

Fatin Inspesaun : Cassa

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º5'42''S Latetude: 125º31'32,052''E

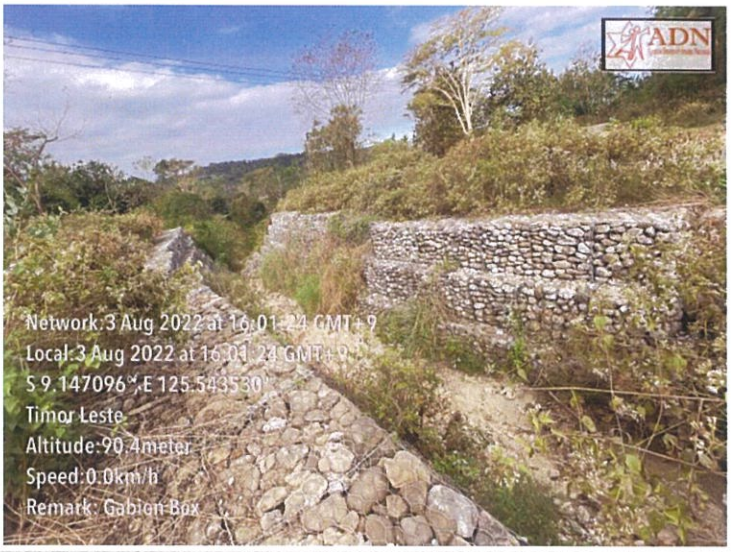
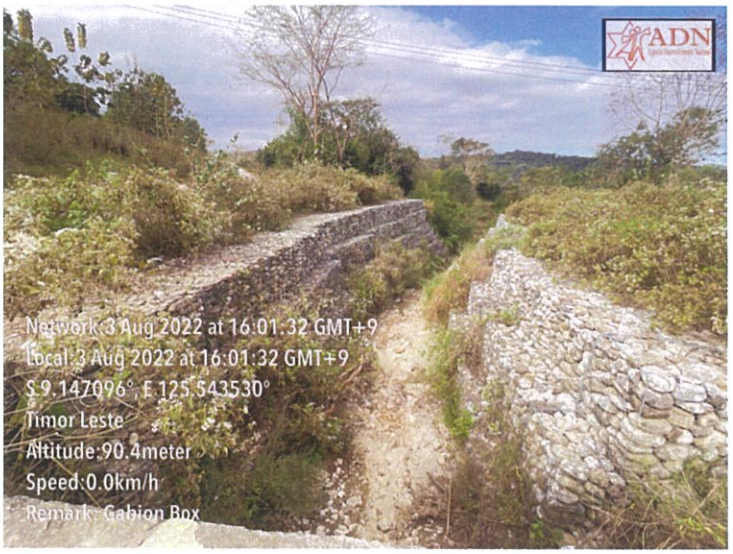
Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere atizi ona 100% iha tinan 2016, maibe companhia sedauk husu pagamento 10% ate a data.	 Projetu 100% iha tinan 2016

ANEXU C1 (ANV-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14.**
No. kontratu : **SSS/3003/MOPTC-2016**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere atizi ona 100% iha tinan 2016	
Projetu refere atizi ona 100% iha tinan 2016, maibe companhia sedauk husu pagamento 10% ate a data.	

ANEXU C1 (ANV-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14.**
No. kontratu : **SSS/3003/MOPTC-2016**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere atizi ona 100% iha tinan 2016, maibe companhia sedauk husu pagamento 10% ate a data.	

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.**
No. kontratu : **SSS/142/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : 21/09/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

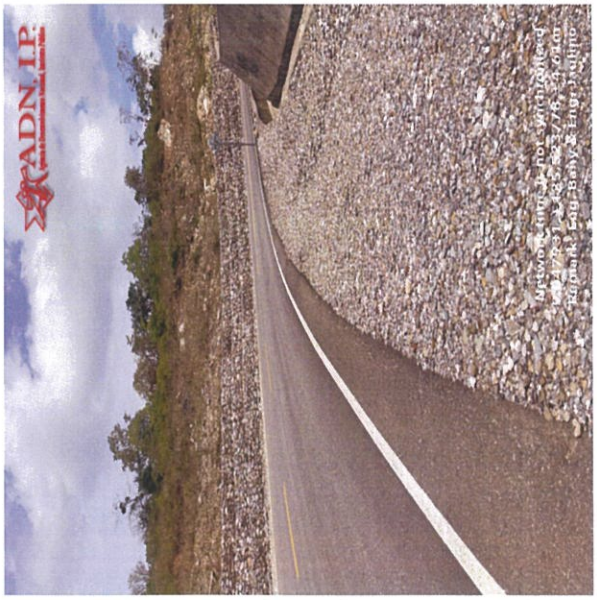
Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º0'15,612''S Latetude: 125º30'39,876''E

End Point : Long : - 9º3'51,231''S Latetude: 125º30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

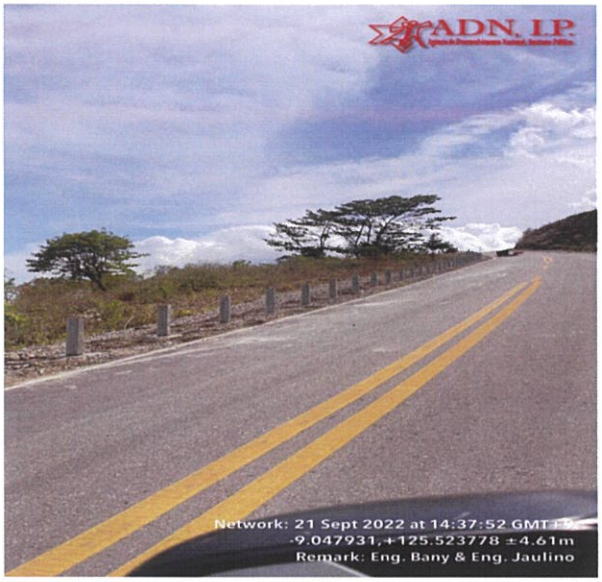
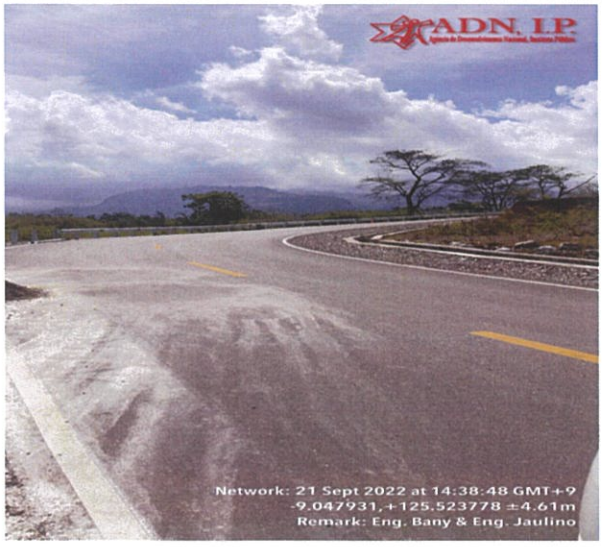
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servico Refere atinzi ona	

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.**
No. kontratu : **SSS/142/MOPTC-2017**

Servico Refere atinzi ona	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servico Refere atinzi ona	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-8)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy**

No. kontratu : **SSS/098/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : 21/09/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro - Bobonaro

Koordinadas :

Start Point : Long : 8°59'3,108 S Latetude: 125°29'48,432 E

End Point : Long : 8°59'24,714 S Latetude: 125°27'42,42 E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S. C de Carvalho

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere sei parado	

Kondisaun Estrada Ainaro Vila – Bobonaro

ANEXU C1 (ANV-8)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy**

No. kontratu : **SSS/098/MOPTC-2017**

(PARADO)

Service ateru rai



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ANEXU C1 (ANV-9)

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **SSS/005/MOPTC-2013**

Data Inspesaun : **21/09/2022**

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

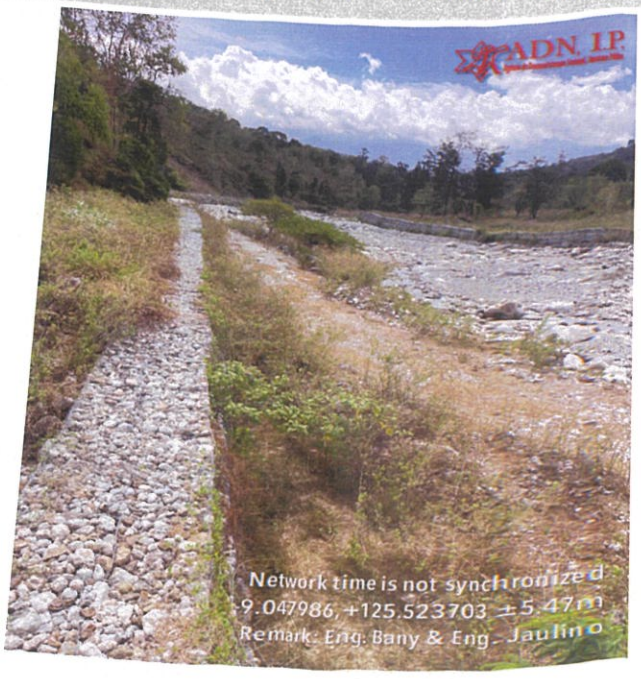
Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º0'15,612''S Latetude: 125º30'39,876''E

End Point : Long : - 9º3'51,231''S Latetude: 125º30'37,065''E

Naran Inspector : **1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho**

: **2. Jaulino H. Rodrigues**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Laiha aktifidades servisu iha tereno sei hein hela konvirmasaun husi owner ba item servisu iha tereno	

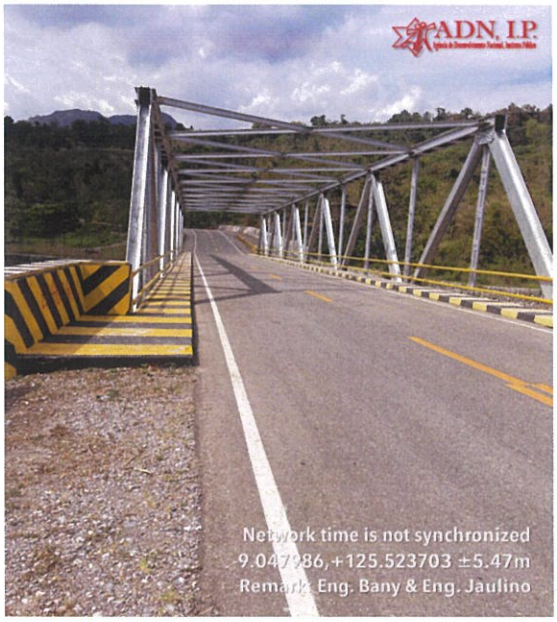
ANEXU C1 (ANV-9)

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **SSS/005/MOPTC-2013**

Laiha aktividade servisu iha tereno



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Laiha aktividade servisu iha tereno



ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro.**

No. kontratu : **35/MACLNSEACLN/X/2019**

Data Inspesaun : 21/09/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

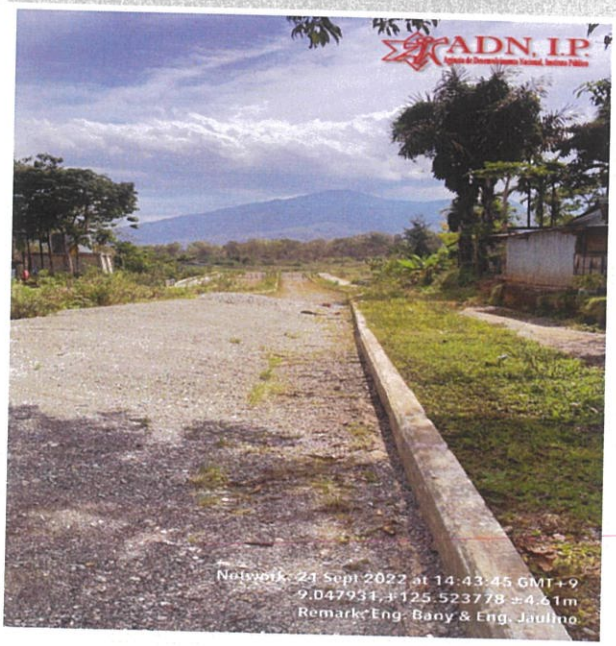
Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º0'59,904''S Latetude: 125º30'12,588''E

End Point : Long : - 9º1'59,496''S Latetude: 125º30'10,206''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho

:2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Laiha aktivisades servisu	

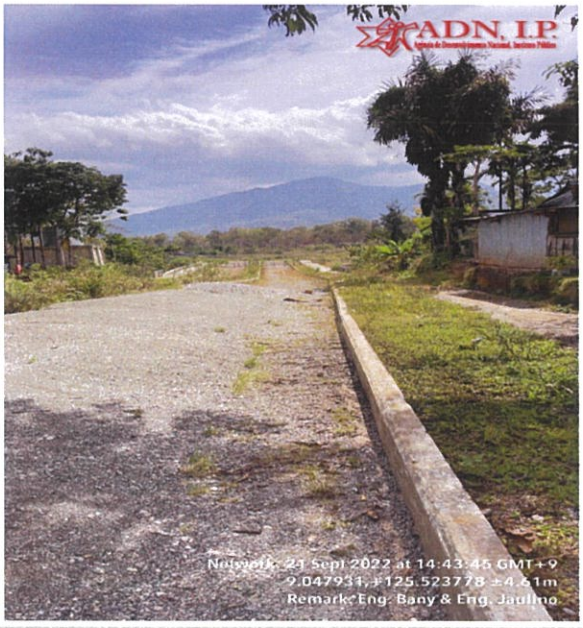
Kondisaun iha Tereno

ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro.**

No. kontratu : **35/MACLNSEACLN/X/2019**



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-19)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro-Maununu & Mau Ulu Lau**
No. kontratu : **MPW-190082**

Data Inspesaun : 21/09/2022

Fatin Inspesaun : Mau Nunu – Mau Ulo

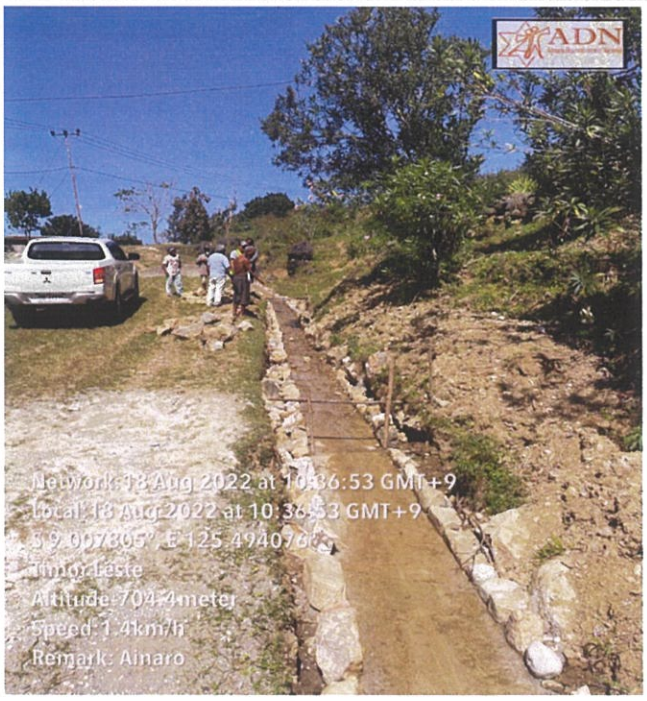
Koordinadas :

Start Point : Long : -9º0'17,574''S Latetude: 125º29'48,294''E

End Point : Long : -9º0'48,138''S Latetude: 125º28'39,018''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S. C. de Carvalho

: Jaulino H. Rodrigues

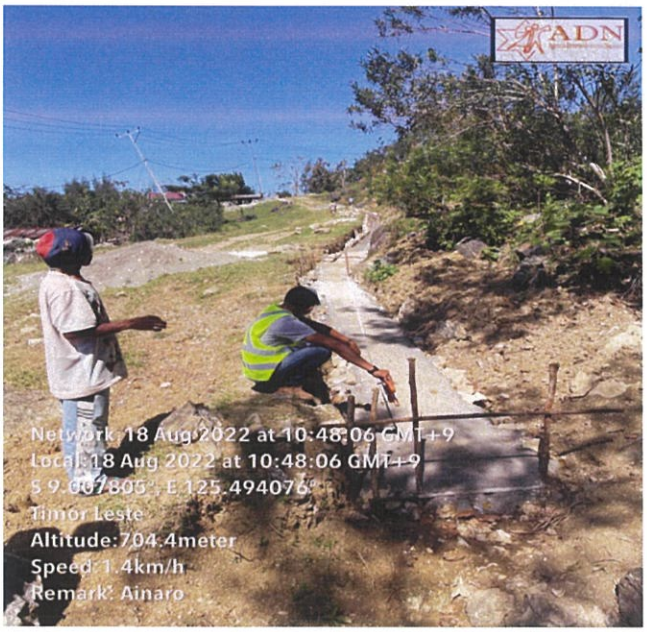
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno
Servico komesa Hada Saluran husi Maulo – Mau Nunu. Kaer husi companhia Azra	

ANEXU C1 (ANV-19)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro-Maununu & Mau Ulu Lau**
No. kontratu : **MPW-190082**

Servico komesa Hada Saluran husi Maulo – Mau Nunu. Kaer husi companhia Azra



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno

Servico komesa Hada Saluran husi Maulo – Mau Nunu. Kaer husi companhia Azra



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila.**
No. kontratu : **RDTL-MPWTC-W-015055**

Data Inspesaun : **21/09/2022**

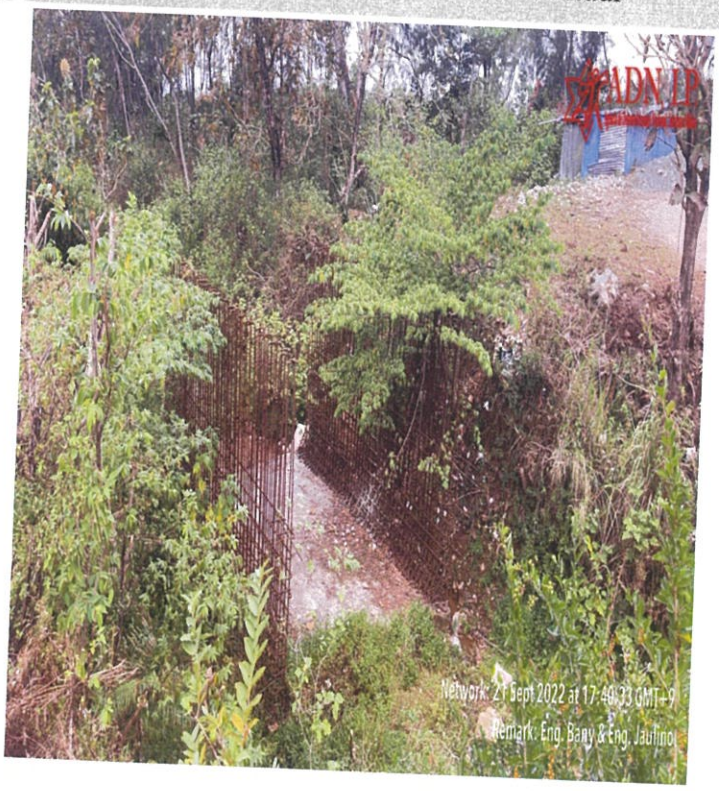
Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°59'20,238''S Latetude: 125°30'11,568''E

Naran Inspector : **1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho**

: **2. Jaulino H. Rodrigues**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu parado iha tinan 2016 ate a data laiha aktividades iha tereno	

ANEXU C1 (ANV-22)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro.**

No. kontratu : **NCB/087/MOPTC-2016**

Data Inspesaun : 21/09/2022

Fatin Inspesaun : Mau Lo – Mau Nunu

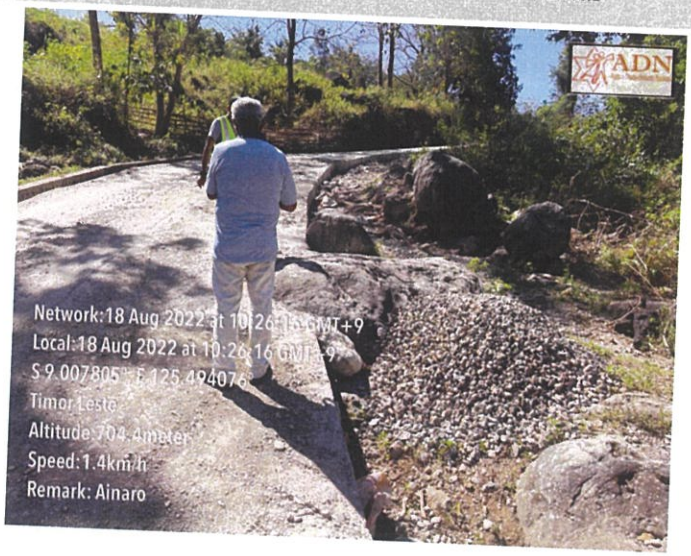
Koordinadas :

Start Point : Long : -9º2'45,223''S Latetude: 125º31'17,356 ''E

End Point : Long : -9º0'59,325''S, Latetude: 125º29'12,324''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho

: 2. Jaulino H. Rodrigues

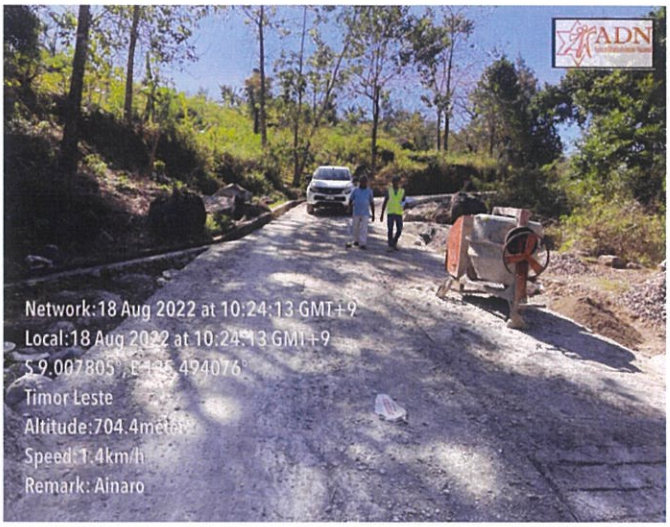
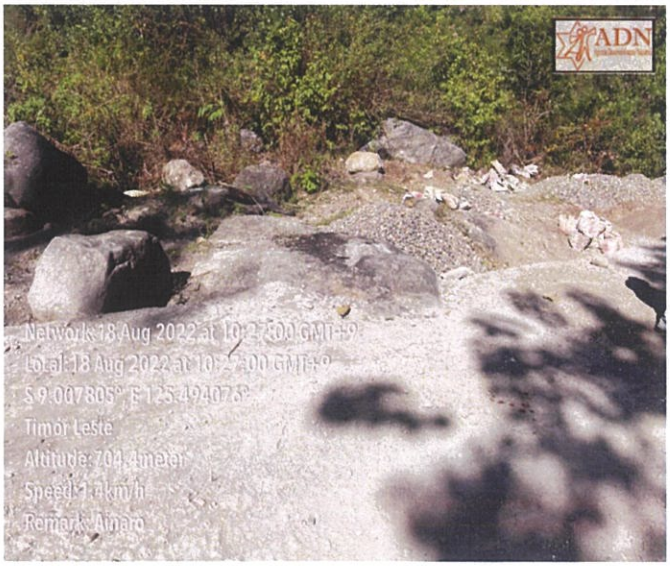
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Compahia halo hela servisu Plum Concrete	

ANEXU C1 (ANV-22)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro.**

No. kontratu : **NCB/087/MOPTC-2016**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Compahia halo hela servisu Plum Concrete	
Compahia halo hela servisu Plum Concrete	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Roads Name : Rural Roads Periodik Maintenance Dare-Mau Chiga Star 0+000-5+000
Lokasi : Mausiga
Contractor : BEREMAUANAN Unip. Lda

Pay item No.	DESCRIPTION	SUMMARY OF BILLED WORKS									
		CONTRACT AMOUNT ($)	PRESENTA GEN	BILLED WORKS AMOUNT						BALANCE OF WORK	
				PREVIOUS		THIS PERIOD		TOTAL			
				AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%	AMOUNT	%
		(1)	(%)	(2)		(3)		(4) = (2) + (3)		(5) = (1) - (4)	
R-01	General	$ 4,975.00	2.11%	$ 4,200.00	1.78%	$ 775.00	0.33%	$ 4,975.00	2.11%	$ -	0.0%
R-03	Drainage	$ 3,120.00	1.32%	$ -	0.00%	$ 3,120.00	1.32%	$ 3,120.00	1.32%	$ -	0.0%
R-05	Earth work	$ 35,162.65	14.89%	$ 19,446.15	8.23%	$ 15,716.50	6.65%	$ 35,162.65	14.89%	$ -	0.0%
R-08	Granular sub- base and base	$ 11,790.52	4.99%	$ 5,798.82	2.45%	$ 5,991.70	2.54%	$ 11,790.52	4.99%	$ -	0.0%
R-10	Structure	$ 112,275.13	47.53%	$ 103,899.24	43.98%	$ 8,375.88	3.55%	$ 112,275.13	47.53%	$ -	0.0%
R-11	Dayworks	$ 27.50	0.01%	$ -	0.00%	$ 27.50	0.01%	$ 27.50	0.01%	$ -	0.0%
R-15	Routine maintenance	$ 1,386.02	0.59%	$ -	0.00%	$ 1,386.02	0.59%	$ 1,386.02	0.59%	$ -	0.0%
G-01	Provisional sum	$ 2,000.00	0.85%	$ -	0.00%	$ 2,000.00	0.85%	$ 2,000.00	0.85%	$ -	0.0%
G-03	Security	$ 1,800.00	0.76%	$ 1,800.00	0.76%	$ -	0.00%	$ 1,800.00	0.76%	$ -	0.0%
G-04	Project Team	$ 24,240.00	10.26%	$ 5,280.00	2.24%	$ 18,960.00	8.03%	$ 24,240.00	10.26%	$ -	0.0%
G-05	Safety and protection	$ 3,777.00	1.60%	$ 2,455.00	1.04%	$ 1,322.00	0.56%	$ 3,777.00	1.60%	$ -	0.0%
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00	0.08%	$ 100.00	0.04%	$ 100.00	0.04%	$ 200.00	0.08%	$ -	0.0%
G-07	Mineral fees	$ 13,767.00	5.83%	$ -	0.00%	$ 13,767.00	5.83%	$ 13,767.00	5.83%	$ -	0.0%
A	**Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R11+R15)**	**$ 170,736.82**	**72.28%**	**$ 133,344.22**	**56.45%**	**$ 37,392.59**	**15.83%**	**$ 170,736.82**	**72.28%**	**$ -**	**0.00%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 17,073.68**	**7.23%**	**$ 13,334.42**	**5.64%**	**$ 3,739.26**	**1.58%**	**$ 17,073.68**	**7.23%**	**$ -**	**0.00%**
C	**General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)**	**$ 43,784.00**	**18.53%**	**$ 9,635.00**	**4.08%**	**$ 34,149.00**	**14.46%**	**$ 43,784.00**	**18.53%**	**$ -**	**0.00%**
D	**Construction tax (A+B+C) x 2%**	**$ 4,630.40**	**1.96%**	**$ 3,126.27**	**1.32%**	**$ 1,505.62**	**0.64%**	**$ 4,631.89**	**1.96%**	**$ -**	**0.00%**
F	**Total contract cost (A+B+C+D)**	**$ 236,224.90**	**100.00%**	**$ 159,439.92**	**67.49%**	**$ 76,786.47**	**32.51%**	**$ 236,224.90**	**100.00%**		**0.00%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho) **(Eng. Jaulino H. Rodrigues)**
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Eng.Remigio da C. S. Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU C1 (HTB-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality

No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Data Inspesaun : 11/08/2022

Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

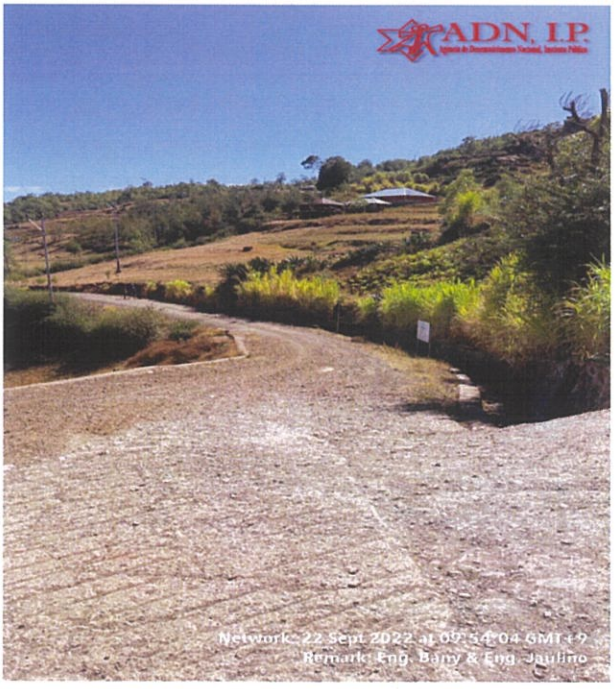
Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'27,798''S Latetude: 125°31'54,408''E

End Point : Long : -8°54'43,776''S Latetude: 125°31'56,1''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere sei parado	

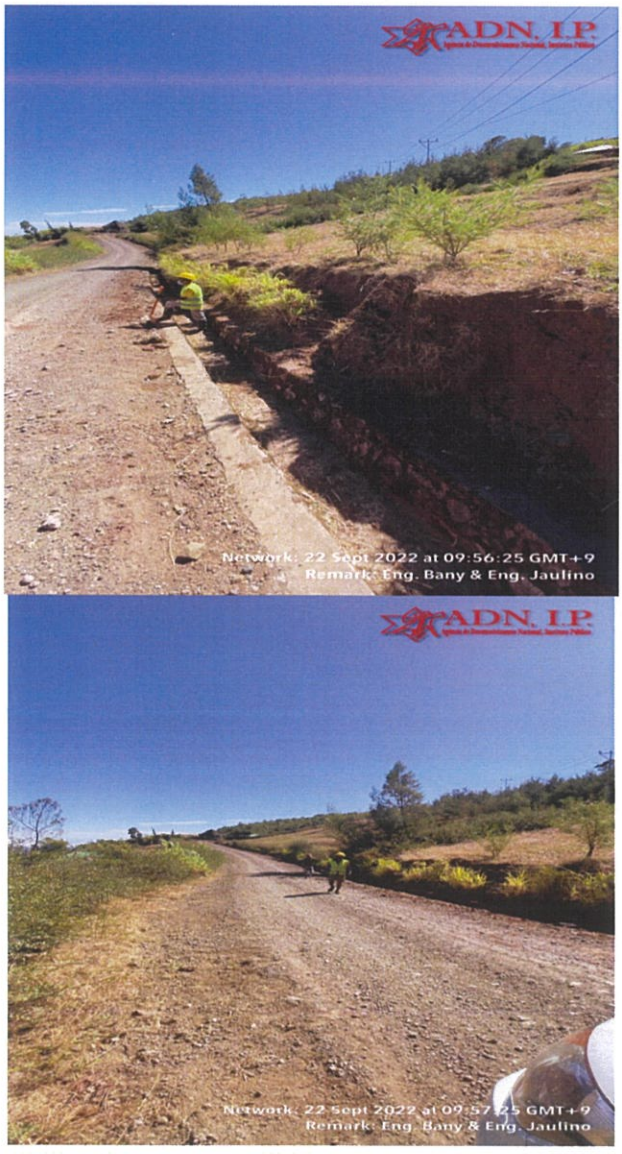
ANEXU C1 (HTB-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality

No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Projeito Refere sei Servico halo



Kondisaun Estrada Suco Liurai - Fatubolic

ANEXU C1 (HTB-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162

No. kontratu : MPW-190104

Data Inspesaun : 22/09/2022

Fatin Inspesaun : Maubisse - Liurai

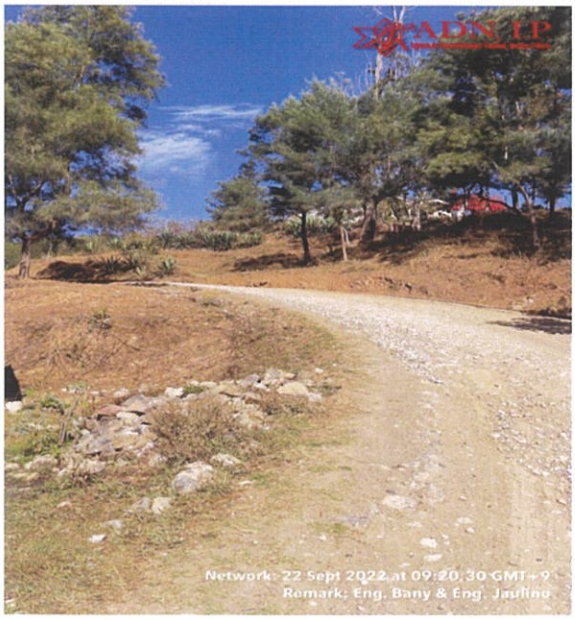
Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'15,906''S Latetude: 125°35'56,839''E

End Point : Long : -8°51'9,714''S Latetude: 125°35'2,79''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servico Sei Refere Parado hela	

ANEXU C1 (HTB-1)

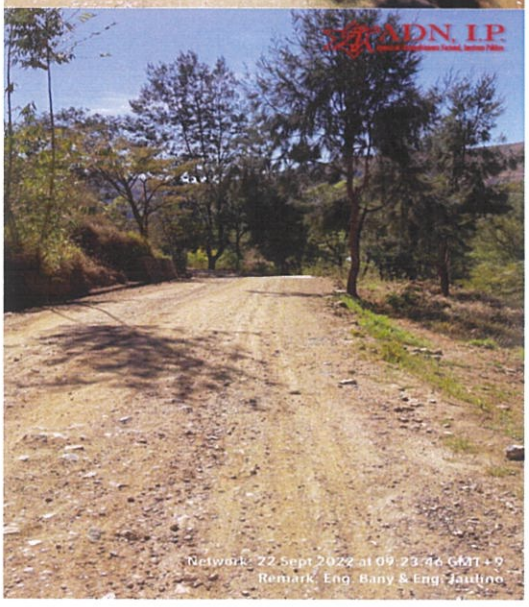
Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162

No. kontratu : MPW-190104

Servico Refere Sei Parado hela





ANEXU C1 (HTB-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600
No. kontratu : Municipality Ainaro / 162
: Betua Calda Unip.Lda

Data Inspesaun : 11/08/2022

Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'9,42''S Latetude: 125°32'14,91''E

End Point : Long : -8°52'43,776''S Latetude: 125°31'56,1''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho
2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Projetu refere sei parado

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



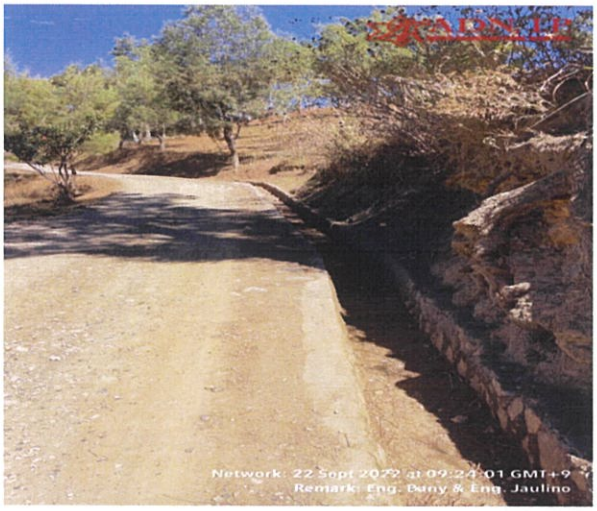
ANEXU C1 (HTB-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162

No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Projetu refere sei parado





ANEXU C1 (MBS-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RT/021/MOP-2019**

Data Inspesaun :**07/09/2022**

Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

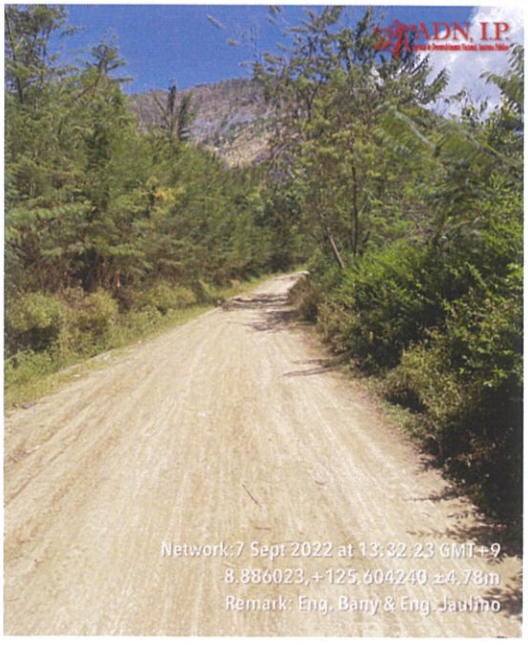
Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'4,044''S, Latetude: 125°35'48,432''E

End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

Naran Inspector : **1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho**

: **2. Jaulino H. Rodrigues**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projeito refere parado hela	

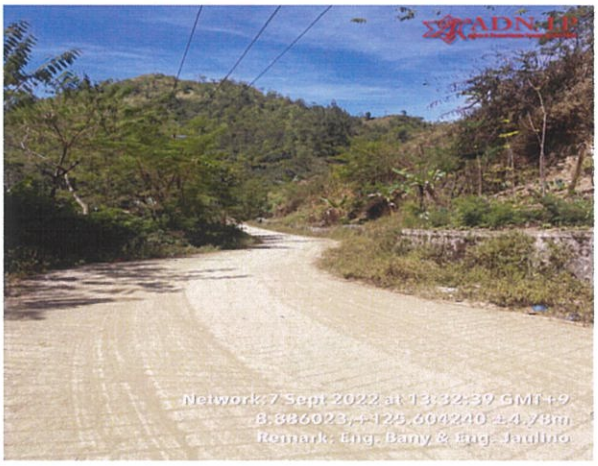
ANEXU C1 (MBS-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality.**

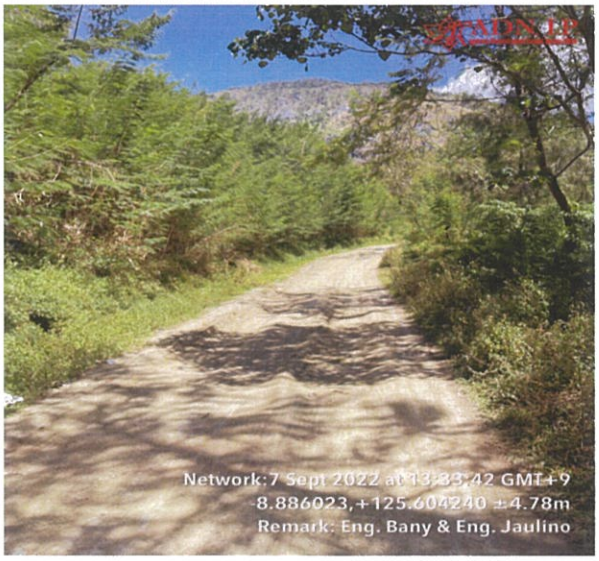
No. kontratu : **RT/021/MOP-2019**

Projeito refere parado hela



Sketch & Foto Desenho

Projeito refere parado hela



Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro.**

No. kontratu : **NCB/030/MOP-2020**

Data Inspesaun : 03/08/2022

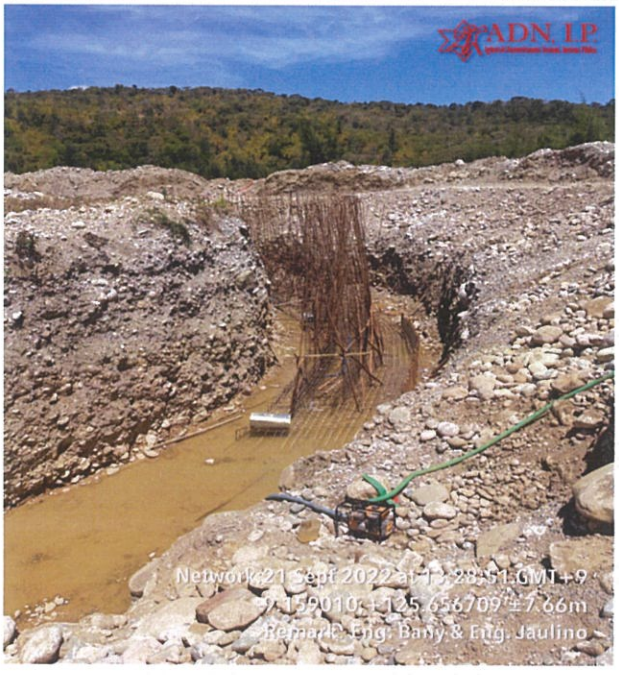
Fatin Inspesaun : Cassa

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9 821.914 Latetude: 125'3234.949

Naran Inspector : 1. Manuel Bany

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Companhia sei halo Pemasangan penulangan.	 Compahia halo hela servisu manutensaun

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro.**

No. kontratu : **NCB/030/MOP-2020**

Pemasangan Penulangan



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Pemasangan Penulangan



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

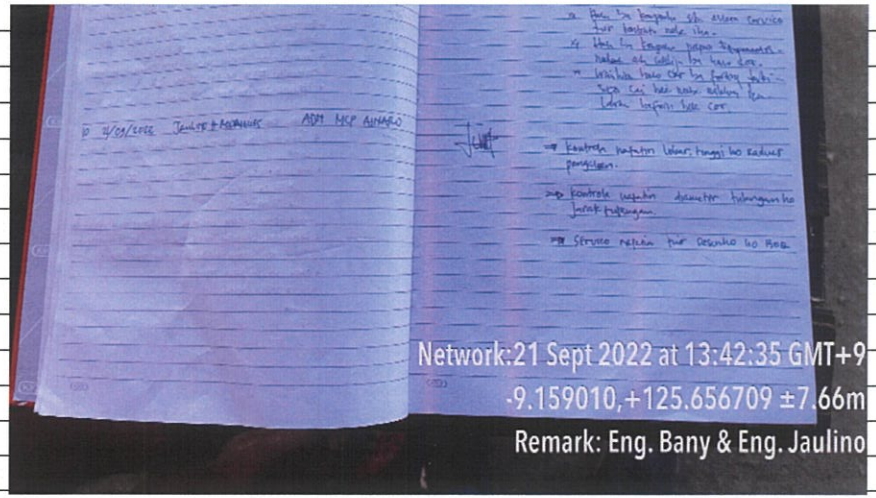
ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro

Kompanha : Yoku Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	21/09/22	Ainaro/Hatudo	Manuel Bany	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1	kontrola nafatin Lebar, Tinggi ho Radius Pengalian	
					2	Kontrola nafatin diameter tulangan ho jarak tulangan	
					3	Servico nafatin tuir Desenho ho BOQ	
					4		
					5		
II	21/09/22	Ainaro/Hatudo	Jaulino H. Rodrigues	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro.**

No. kontratu : **NCB/030/MOP-2020**

Data Inspesaun : 28/09/2022

Fatin Inspesaun : Cassa

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9 821.914 Latetude: 125'3234.949

Naran Inspector : 1. Manuel Bany

: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Halo inspecsaun ba jarak penulangan ho bekisting	

Back-up Data

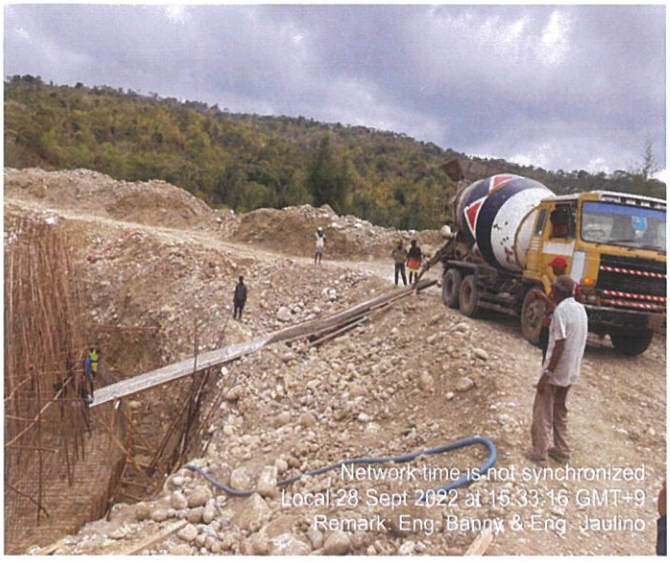
Naran Projeto : **New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro.**

No. kontratu : **NCB/030/MOP-2020**

Pengukuaran pada slum test 10 cm



Pengecoran Footing



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

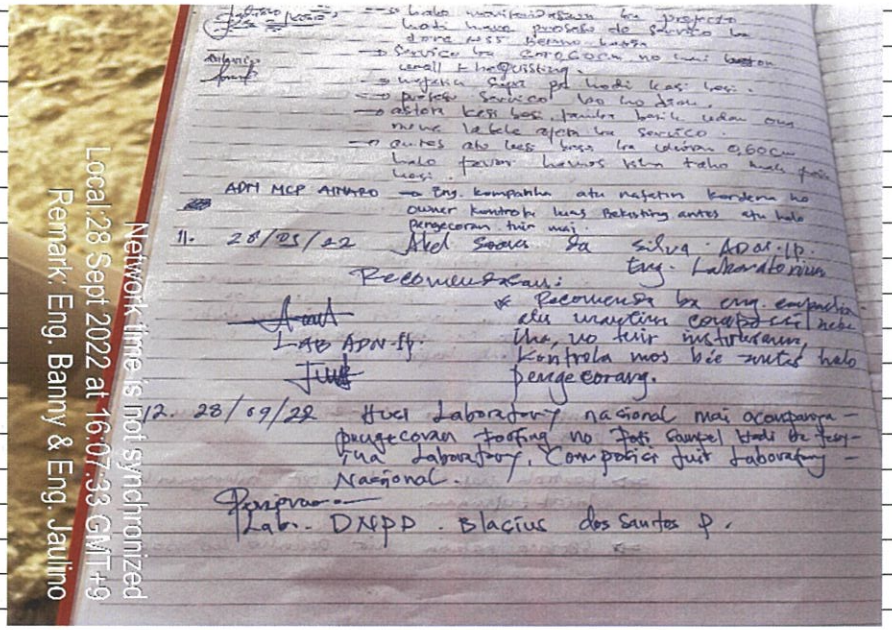
ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro

Kompanha : Yoku Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/09/22	Ainaro/Hatudo	Manuel Bany	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1	Rekomenda ba Eng. Companha atu nafatin komposis nebe maka iha no tuir instrucsaun	
					2	Kontrola mos ba bee ante halo pengecoran	
					3	Kontrola nafatin Luas Bekisting Antes atu halo Pengecoran	
					4		
					5		
II	28/09/22	Ainaro/Hatudo	Jaulino H. Rodrigues	Eng. AND I.P Municipio Ainaro	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO SETOR ESTATAL CONSTITUCIONAL

ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional Instituto Público

PLANU INSPESAUN

2022

Naran Eng. Jaulino H Rodrigues

Municipio MUNICIPIO AINARO NO POSTOS

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Setembro 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	OBS
AINARO VILA (ANV)	4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	Consorcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Projetu refere 100% iha 2016 maibe companhia sedauk husu retensaun 10% ate a data
							Actual																															
	6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	FHO
							Actual																															
	7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Projetu refere sei parado tamba afeita husi Kalamidade 04/04/2021
							Actual																															
	8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy	WTJ Contraction Unipesoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Projetu refere parado tamba sei kordena ho owner
							Actual																															
	9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	LM	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																																	
							Actual																																	
	12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	19	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	20	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Projetu refere parado iha tinan 2016 ate a data
							Actual																															
	22	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
HATUDO (HA)	2	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	3	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	4	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
							Actual																															
	5	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	6	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	7	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	8	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
HATUBULILICO (HTB)	1	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	Gos Unip.Lda	MPW-190104	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Hela retensaun 10%
							Actual																															
	2	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Projetu refere ADN LP Halo tia ona pagamento Retensaun (10%) iha tinan 2019. Husu atu here fila fali dadus pagamento
							Actual																															
	3	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubulico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	4	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	Ailesu Unip.Lda	MPW-190091	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	5	Spot Improvement Liurai - Hatubulico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	Betua Calda Unip.Lda	MPW-W-210062	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	

MAUBISSE (MBS)	1	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	
							Actual	
	2	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	
							Actual	
	8	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	Leotylia Enterprises	MPW-190076	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	
							Actual	
	10	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	Delong Unip.Lda	MPW-190087	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	
							Actual	
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	Leotylia Enterprises	MPW-W-210066	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	
							Actual	
	16	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	
							Actual	
	18	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	
							Actual	
TOTAL PROJETO ON-GOING								

Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Procesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Jaulino H Rodrigues)
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng.Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN,I.P

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO TERRITORIAL

ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho

Municipio MUNICIPIO AINARO NO POSTOS

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Setembro 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	OBS
AINARO VILA (ANV)	4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	Consorcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Projetu refere 100% iha 2016 maibe companhia sedauk husu retensaun 10% ate a data
							Actual																														
	6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																FHO
							Actual																														
	7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Projetu refere sei parado tamba afeita husi Kalamidade 04/04/2021
							Actual																														
	8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy	WTJ Contraction Unipesoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Projetu refere parado tamba sei kordena ho owner
							Actual																														
	9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	LM	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																																
							Actual																																
	12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	19	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	20	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Projetu refere parado iha tinan 2016 ate a data
							Actual																														
	22	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
HATUDO (HA)	2	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	3	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
							Actual																														
	5	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	6	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	8	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
HATUBULICO (HTB)	1	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	Gos Unip.Lda	MPW-190104	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Hela retensaun 10%
							Actual																														
	2	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Projetu refere ADN I.P Halo tia ona pagamento Retensaun (10%) iha tinan 2019. Husu atu here fila fali dadus pagamento
							Actual																														
	3	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubulico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	Ailesu Unip.Lda	MPW-190091	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	Betua Calda Unip.Lda	MPW-W-210062	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																

MAUBISSE (MBS)	1	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	
							Actual	
	2	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	
							Actual	
	8	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	Leotylia Enterprises	MPW-190076	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	
							Actual	
	10	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	Delong Unip.Lda	MPW-190087	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	
							Actual	
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	Leotylia Enterprises	MPW-W-210066	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	
							Actual	
	16	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	
							Actual	
	18	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan	Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
							Actual	
TOTAL PROJETO ON-GOING								

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Procesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng.Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN,I.P

#ANEXU C1 (MBS-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351**

Data Inspesaun : 27/9/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro – Simpang Tiga Flexia

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,53.78, Latetude: 125,36.14.46

End Point : Long : -8,55.50.89, Latetude: 125,36.21.31

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

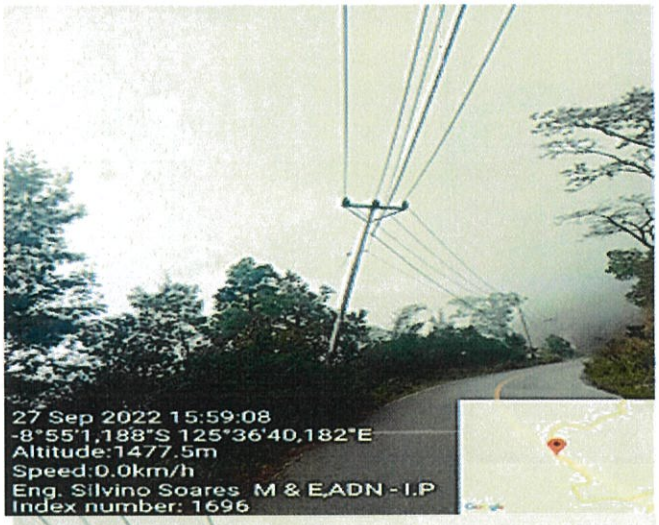
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	

#ANEXU C1 (MBS-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	 

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality

Kompanha : Petaju Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	27/9/2022	Ainaro / Maubisse	Silvino D. R. R. Soares	Teknik Electricidade	1	Tenki Hadia Schoor kotu pin Kleuk	
					2	Troka Pin Nakfera	
					3	Tenki Monta Strut Arm ladauk	
					4	Tenki Pinta Fali Airing Nebe Mak Tinta Sai Hotu Ona	
					5	Tenki Halos Airing Kleuk	
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

PLANU INSPESAUN

2022

| | | |
