REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

A.D.N, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

RELATÓRIU MENSÁL IMPLEMENTASAUN PROJETUS MUNISÍPIU LIQUICA

JUNHO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTASAUN PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO LIQUICA JUNHO 2022

Prepara Husi :

(Eng. Juninho Antonio A. Da Cruz)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Liquica ADN, I.P

(Eng. Marcus Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,Transporte e Irigasaun, Municipio Liquica ADN, I.P

(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. ba Projeto ME Municipio Liquica ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, ADN, I.P

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun, ADN, I.P

(Deolindo de Fátima Marques)
Chefe Seksaun ba Projeto M. E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T, M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO..... 1

I. INTRODUSAUN. 3

1.1 Enkuadramentu Legal..... 3

1.2 Perfil Municipio Liquica 3

1.3 Lista Projecto..... 7

II. PROGRESU FISIKU 18

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan.....18

III OBSTÁKLU IHA TERENU..... 18

3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu 18

VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU 19

4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu.....19

INDICE TABELA

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquica..... 5

Tabela 1. 2: Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquica..... 5

Tabela 1.3. 1 Projecto Municipio Liquica Por Fundus Financimento 7

Tabela 1.3. 2 Projecto Muncipio Liquica Por Sectores 9

Tabela 1.3. 3 Projecto Municipio Liquica Por Ministerios 14

Tabela 4. 1 Dadus Populasaun Munisipiu Liquica..... 18

I. INTRODUSAUN.

1.1 Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Púbico (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análize kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viavél.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Púbico (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimentu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun kualidade ba Projeto sira iha programa Kapital Desenvolvimentu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio Liquica





Mapa hatudu pozisaun Administrasaun Munisipal Liquica iha luan area 543 km² ho populasaun nain – 63.403 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Liquica iha Postu Administrativu tolu (3) , Sukus 23 no aldeias 134, mak hanesan hatudu iha Tabela 1

Tabela 1: Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.

Bazartete		Liquica		Maubara	
sukus	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**
Fahilelo	3	Açumano	4	Gugleur	11
Fatumasi	4	Darulete	4	Guiço	5
Lauhata	5	Dato	10	Lissadila	7
Leorema	10	Hatuquesi	8	Maubaralissa	5
Maumeta	4	Leotala	5	Vatuboro	5
Metagou	3	Loidahar	4	Vatuvou	10
Motaulun	3	Luculai	4	Vaviquinia	7
Tibar	4	-	-	-	-
Ulmera	9	-	-	-	-
Total	**45**	-	**39**	-	**50**

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 58

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquica

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Liquica								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		2				2	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
Total			**3**				**3**	

Tabela 1. 2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquica

ASSET ADN,IP MUNICIPIO LIQUICA								
No	**Deskrisaun**	**Total Aset Kada Tinan**					**Total**	**OBS**
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**		
1	Edificio		1					
2	Kareta		1					
3	Desktop HP / Monitor		1					
4	Laptop HP		1					
5	Printer Cannon		1					
6	UPS		1					
7	Armario File		1					
8	Armario Tau hena		3					
9	Meja escritorio		1					
10	Meja han		1					
11	Meja TV (kiik)		1					
12	Kadeira escritorio		6					
13	Kadeira han		4					

14	Sofa		1 Set					
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3		3 Set					
16	Jeleira		1					
17	Water Dispenser		1					Aát
18	TV + Parabola		1 Set					
19	AC		4					
20	Kipas Angin		1					
21	Kompor		1					
22	Kompor Gas		1					
23	Rack sepatu		3					
24	Rack Piring		1					
25	Lampu		11					
26	Water Pump Sanyo		0					

1.3 Lista Projecto

Projeto hotu ne'ebe akumula iha lista neé bazeia ba dadus Projeto nebe sei lao hela no mos Projeto nebe abandona ona iha tinan barak nia laran, Projeto hirak ne'e fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projeto Por Fundus Finansiamento, Tabela 1.3.2 Projeto Por Sector no tabela 1.3.3 Projeto Por Ministerio, no lista detallu kada Projeto bele hare iha #Aneksu A.

Tabela 1.3. 1 Projeto Municipio Liquica Por Fundus Financiamento



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM (CD + BS + TP + FUNDO COVID etc..) + EMERGENCY + PDIM			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	27	$ 8,629,221.83	$ 2,228,621.08	25.83%
2	LIQUICA VILA	26	$ 5,849,524.82	$ 1,812,569.72	30.99%
3	MAUBARA	19	$12,054,713.43	$ 8,398,705.76	69.67%
	Grand Total	**72**	**$26,533,460.08**	**$12,439,896.56**	**46.88%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	3	$ 5,354,958.72	$ 499,455.56	9.33%
2	LIQUICA VILA	5	$ 3,337,190.73	$ 1,516,050.42	45.43%
3	MAUBARA	5	$10,171,195.89	$ 8,144,321.76	80.07%
	Grand Total	**13**	**$18,863,345.34**	**$10,159,827.74**	**53.86%**

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM -CD			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	7	$ 834,783.75	$185,655.04	22.24%
2	LIQUICA VILA	11	$1,528,099.12	$126,433.32	8.27%
3	MAUBARA	7	$ 951,175.37	$ 43,761.73	4.60%
	Grand Total	**25**	**$3,314,058.24**	**$355,850.09**	**10.74%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM –BS			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	6	$ 897,734.42	$674,396.77	75.12%
2	LIQUICA VILA	3	$ 332,370.82	$170,085.98	51.17%
3	MAUBARA	2	$ 344,450.27	$ 72,706.50	21.11%
	Grand Total	**11**	**$1,574,555.51**	**$917,189.25**	**58.25%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM -TP			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	4	$ 289,002.61		
2	LIQUICA VILA	6	$ 474,930.65		
3	MAUBARA	3	$ 359,595.59		
	Grand Total	**13**	**$1,123,528.85**		

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FUNDO - COVID			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%
2	LIQUICA VILA				
3	MAUBARA				
	Grand Total	**4**	**$433,364.88**	**$287,933.63**	**66.44%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	EMERGENCY			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	1	$ 502,473.28	$ 441,060.32	87.78%
2	LIQUICA VILA				
3	MAUBARA				
	Grand Total	**1**	**$ 502,473.28**	**$441,060.32**	**87.78%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	$ 316,904.17	$140,119.76	44.22%
2	LIQUICA VILA	1	$ 176,933.50		
3	MAUBARA	2	$ 228,296.31	$137,915.77	60.41%
	Grand Total	**5**	**$722,133.98**	**$278,035.53**	**38.50%**

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

Tabela 1.3. 2 Projeto Municipio Liquica Por Sectores

NO	SECTOR	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	AGRICULTURA	2	$ 91,877.21	$ 80,662.08	87.79%
2	AGUA E SANEAMENTO	3	$ 293,629.77	$ 167,315.56	56.98%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	2	$ 210,635.04		
4	EDUKASAUN	18	$ 1,956,926.91	$ 302,946.05	15.48%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	7	$ 7,088,688.86	$ 1,297,809.30	18.31%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO	1	$ 7,693,101.00	$ 5,921,336.53	76.97%
7	ESTRADAS	24	$ 5,012,524.75	$ 2,047,793.24	40.85%
8	FLOOD CONTROL	1	$ 502,473.28	$ 441,060.32	87.78%
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	$ 1,522,380.50	$ 1,081,134.13	71.02%
10	PORTOS	1	$ 1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%
11	SAUDE	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%
12	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 58,107.88	$ 50,129.80	86.27%
13	TURISMO	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	**72**	**$26,533,460.08**	**$12,439,896.56**	**46.88%**

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

NO	SECTOR	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	AGRICULTURA	2	$ 91,877.21	$ 80,662.08	87.79%
2	AGUA E SANEAMENTO	2	$ 122,664.12	$ 94,609.06	77.13%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	1	$ 154,189.34		
4	EDUKASAUN	7	$ 783,470.96	$ 165,030.28	21.06%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	$5,296,850.84	$ 449,325.76	8.48%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO				
7	ESTRADAS	6	$ 620,770.99	$ 103,152.35	16.62%
8	FLOOD CONTROL	1	$ 502,473.28	$ 441,060.32	87.78%
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	1	$ 565,452.33	$ 556,717.80	98.46%
10	PORTOS				
11	SAUDE	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%
12	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 58,107.88	$ 50,129.80	86.27%
13	TURISMO				
	Grand Total	**27**	**$8,629,221.83**	**$2,228,621.08**	**25.83%**

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

NO	SECTOR	LIQUICA VILA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO				
3	EDIFICIOS PUBLICOS				
4	EDUKASAUN	7	$ 642,009.75		
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	$1,490,077.80	$ 630,877.47	42.34%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO				
7	ESTRADAS	9	$1,365,759.10		
8	FLOOD CONTROL				
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	6	$ 956,928.17	$ 524,416.33	54.80%
10	PORTOS	1	$1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%
11	SAUDE				
12	SEGURANCA NO DEFESA				
13	TURISMO				
	Grand Total	**26**	**$5,849,524.82**	**$1,812,569.72**	**30.99%**

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

NO	SECTOR	MAUBARA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO	1	$ 170,965.65	$ 72,706.50	42.53%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	1	$ 56,445.70	$ -	
4	EDUKASAUN	4	$ 531,446.20	$ 137,915.77	25.95%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	$ 301,760.22	$ 217,606.07	72.11%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO	1	$ 7,693,101.00	$5,921,336.53	76.97%
7	ESTRADAS	9	$ 3,025,994.66	$1,944,640.89	64.26%
8	FLOOD CONTROL				
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN				
10	PORTOS				
11	SAUDE				
12	SEGURANCA NO DEFESA				
13	TURISMO	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	**19**	**$12,054,713.43**	**$8,398,705.76**	**69.67%**

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

Tabela 1.3. 3 Projeto Municipio Liquica Por Ministerios



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	ESTATAL	3	$ 387,568.54		
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	3	$ 139,176.53	$ 118,527.60	85.16%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	$21,789,080.54	$10,836,080.87	49.73%
4	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$ 58,107.88	$ 50,129.80	86.27%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	$ 1,956,926.91	$ 302,946.05	15.48%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 99,484.80	$ 82,502.69	82.93%
7	MINISTERIO SAUDE	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	1	$ 1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	**72**	**$26,533,460.08**	**$12,439,896.56**	**46.88%**

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

NO	DONO DO PROJETO	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	ESTATAL	1	$ 154,189.34		
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	2	$ 91,877.21	$ 80,662.08	87.79%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	11	$7,008,726.76	$1,562,362.60	22.29%
4	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$ 58,107.88	$ 50,129.80	86.27%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	7	$ 783,470.96	$ 165,030.28	21.06%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 99,484.80	$ 82,502.69	82.93%
7	MINISTERIO SAUDE	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN				
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
	Grand Total	**27**	**$8,629,221.83**	**$2,228,621.08**	**25.83%**

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

NO	DONO DO PROJETO	LIQUICA VILA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAG EM EZEKUSAUN ($)
1	ESTATAL	1	$ 176,933.50		
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	$ 47,299.32	$ 37,865.52	80.06%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	16	$3,588,532.25	$1,117,428.28	31.14%
4	MINISTERIO DO INTERIOR				
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	7	$ 642,009.75		
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU				
7	MINISTERIO SAUDE				
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	1	$1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
	Grand Total	**26**	**$5,849,524.82**	**$1,812,569.72**	**30.99%**

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

NO	DONO DO PROJETO	MAUBARA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAG EM EZEKUSAUN ($)
1	ESTATAL	1	$ 56,445.70		
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS				
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	13	$11,191,821.53	$8,156,289.99	72.88%
4	MINISTERIO DO INTERIOR				
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	4	$ 531,446.20	$ 137,915.77	25.95%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU				
7	MINISTERIO SAUDE				
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN				
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	**19**	**$12,054,713.43**	**$8,398,705.76**	**69.67%**

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

Tabela 4. 1 : Dadus Populasaun Munisipiu Liquica

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Bazartete	31,983	9,158	9,039	7,089	6,697
Liquiça	25,334	6,978	7,348	5,672	5,337
Maubara	25,234	7,088	6,802	5,766	5,578

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi Progressu servisu nebe kompanha sira atinji iha fulan neé nia laran, husi lista nebe iha #Anexu B hatudu progressu aktual fulan ida neé ho nia persentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento nebe hetan husi progressu fulan ida neé, ikus liu persentagen aktual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativa husi porsento anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detailho bele hare iha #Anexu B, detallu ba Backup Fotografia #Anexu C1, Detallu ba Backup BoQ #Anexu C2 no Instrusaun servisu bele hare #Anexu D

III. OBSTÁKLU IHA TERENU

3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu

Durante iha Fulan ida nia laran, problema nebe ami enjineiru municipio hasoru mak hanesan :

1. Projeto lao tarde
2. Companhia balun servisu la tuir spesifikasaun
3. Companhia balun servisu la iha Site Engineer
4. Difikulidade ba Ekipa ADN M.Liquica hasoru susar ba Be'e mos

VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu

1. Rekomenda ba Kompanhia sira servisu tuir spesifikasaun nebe iha ona
2. Rekomenda ba Kompanhia sira tenke iha Site Engineer iha terenu

Rekomenda ba ADN.I.P. Nacional liu-liu ba Superior sira hodi hare ba Edificio ADN.I.P.

Note : Assinatura Husi Enjineiru Municipio Liquica

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Liquica					
No	**Deskrisaun**	**Identidade**			
		Naran Kompletu e Asinatura	**Nu. ID Card**	**Pozisaun**	**Fotografia**
1	Enjineiru	Juninho António A. Da Cruz	216	Enjineiru EPAS	
		Marcus Ximenes de Araujo	172	Enjineiru ITI	
		Camilio de Jesus	061	Enjineiru METIC	

2	Enjineira	Nencia F.O. do Rêgo	173	Enjineira VEBD	
3	Motorista	Rui Antonio Gaio	029	Motorista	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO A

Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica - JUNHO 2022

NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESO FISIKU (%)	PROGRESO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	BAZARTETE	LIQUICA	Mina Petro Leste Unip, Lda	RDTL-11004589	$ 499,250.84		100.00%	90.00%	$ 449,325.76	$ 49,925.08	PHO/ABANDONA	Projetu refere la funsiona
2	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Banir Lema	MPW-W-190097	$ 565,452.33	Aug. 14, 2019	100.00%	98.46%	$ 556,717.80	$ 64,406.31	FHO	Progresio Fisiko 100% e hela pagamento retensaun 10%
3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	$ 162,714.83	Aug. 16, 2019	95.68%	86.11%	$ 140,119.76	$ 22,595.07	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
4	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Faturnasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	$ 73,270.51	Sept. 5, 2019	100.00%	97.90%	$ 71,729.53	$ 8,712.25	FHO	Progresu fizikamente 100 % e sei falta pagamento ba retensaun
5	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	$ 23,950.17	Dec. 5, 2019	77.60%	69.84%	$ 16,726.74	$ 7,223.43	ON-GOING	Provezoriamente servisu paradu hela
6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	$ 67,492.69	Nov. 10, 2019	41.01%	36.91%	$ 24,910.52	$ 42,582.17	ON-GOING	
7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	$ 23,179.32	Oct. 22, 2019	79.42%	52.23%	$ 12,106.37	$ 11,072.90	ON-GOING	Provezoriamente servisu paradu hela
8	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	SEGURANCA NO DEFESA	BAZARTETE	LIQUICA	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	$ 58,107.88	Nov. 29, 2019	86.27%	81.96%	$ 47,623.31	$ 10,484.57	ON-GOING	
9	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Naesalobu	MAP-P02019:19532	$ 67,927.04	Dec. 5, 2019	82.29%	94.12%	$ 63,935.34	$ 17,617.77	FHO	Progresu fizikamente remata ona
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	$ 66,557.90	Oct. 23, 2020	73.90%	66.51%	$ 44,268.56	$ 22,289.34	ON-GOING	ongoing
11	New construction of isolation for covid 19 in liquica, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	$ 243,368.08	Oct. 22, 2020	96.86%	87.18%	$ 212,156.22	$ 31,211.86	PHO	Projetu refere hela retensaun (10%) e Fisiku iha Tereno atinji deit 96.86%
12	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	$ 99,484.80	Sept. 9, 2019	92.14%	82.93%	$ 82,502.69	$ 16,982.11	ON-GOING	Falta retensaun
13	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	BAZARTETE	LIQUICA	Sali Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	$ 502,473.28	Sept. 20, 2021	99.75%	87.78%	$ 441,060.32	$ 180,765.72	ON-GOING	ON-GOING
14	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 154,189.34	Aug. 31, 2021	9.33%	0.00%	$ -	$ -	New	Nain mak hare
15	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-NCB-R -21030	$ 149,732.87	Oct. 01, 2021	25.07%	0.00%	$ -	$ -	New	
16	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-RFQ - 21017	$ 88,852.44	Oct. 01, 2021	15.75%	0.00%	$ -	$ -	New	
17	R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000-7+000, liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatuleo Unip Lda	MPW-W-210144	$ 88,425.80	Oct. 01, 2021	41.18%	0.00%	$ -	$ -	New	
18	Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Craeleki Bercoli Unip,Lda	MPW-W-210145	$ 62,024.04	Oct. 01, 2021	30.43%	0.00%	$ -	$ -	New	SEIDAUK REGISTO IHA SISTEMA
19	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	TM Caileba Unip,Lda	MPW-W-210158	$ 158,465.33	Oct. 01, 2021	26.48%	0.00%	$ -	$ -	New	SEIDAUK REGISTO IHA SISTEMA
20	New Construction of Fence Around for Isolation COVID-19 in Liquica Maumeta, Ministerio da Saude Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Biamali Unipessoal Lda	RDTL-MS	$ 65,271.32		74.84%	48.27%	$ 31,508.85		On going	
21	Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	ZYC UNIPESSOAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	$ 58,167.58	11/01/2022	16.64%	0.00%	$ -			
22	Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	U-Rema Unip. Lda.	NCB:15/MEJD/DNA/2021	$ 264,260.83	1/11/2021	17.27%	0.00%	$ -		New	
23	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 9,072.12	15/10/2021	10.86%	0.00%	$ -		New	
24	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Ermeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 86,365.84	15/10/2021	10.06%	0.00%	$ -		New	
25	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 78,250.89	15/10/2021	11.89%	0.00%	$ -		New	
26	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Bogoro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 115,313.76	15/10/2021	6.54%	0.00%	$ -		New	
27	Melhoramento no Suplly Energia Elektricidade husi Sub Stasaun Liquisa ba Portu Tibar (Engineering Procurement Construction - Design, Suplly, Installtion, Testing and Commissioning Extension Transformer Bay Of the Existing 150/20kV Liquica Substation to Suplly Power to Tibar Bay Port)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	BAZARTETE	LIQUICA	China Shandong International Economic And Technical Cooperation Group. LTD	RFP/054/MOP-2021	$ 4,797,600.00	Dec. 16, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
28	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	$ 153,851.88	Dec. 5, 2019	95.77%	81.19%	$ 124,915.14	$ 28,936.74	ON-GOING	Servisu iha Tereno remata tiha ona, sei hein kompanha Amenda kontratu nebe mate tiha ona

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO A

Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica - JUNHO 2022

NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESO FISIKU (%)	PROGRESO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
29	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	$ 1,394,750.00	May 17, 2017	47.12%	47.12%	$ 657,275.92	$ 737,474.08	ON-GOING	
30	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	$ 55,012.05	Aug. 22, 2019	100%	99.91%	$ 54,964.83	$ 5,543.70	PHO	Projetu refere hela retensaun (10%) e Fisiku iha Tereno atinji deit 99.91%
31	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	$ 71,468.49	Aug. 19, 2019	100%	100.00%	$ 71,468.49	$ 7,146.85	FHO	
32	New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	LIQUICA VILA	LIQUICA	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	$ 593,093.80	Jan. 6, 2017	92.32%	67.45%	$ 400,036.22	$ 193,057.58	ON-GOING	
33	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	LIQUICA VILA	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	$ 276,484.00	July 6, 2016	92.77%	83.49%	$ 230,841.25	$ 45,642.75	ON-GOING	
34	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raelli Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	$ 452,362.93	Dec. 20, 2019	80.84%	50.38%	$ 227,897.03	$ 224,465.90	ON-GOING	
35	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Banir Lema Unip,Lda	RDTL 0000	$ 47,299.32	Aug. 18,2021	88.95%	80.06%	$ 37,865.52	$ 9,433.80	ON-GOING	
36	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 176,933.50	Aug. 31, 2021	3.83%	0.00%	$ -	$ -	New	
37	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21025	$ 131,219.62	Oct. 01, 2021	24.28%	0.00%	$ -	$ -	New	
38	R4D Rural Road Spot Improvement Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipalty	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MOP - CD - NCB-R - 21036	$ 123,631.72	Oct. 01, 2021	19.39%	0.00%	$ -	$ -	New	
39	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou - Aibenu Chainage 0+000-7+600, Liquica Municipalty	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	MOP - CD - NCB -R - 21038	$ 238,739.71	Oct. 01, 2021	26.40%	0.00%	$ -	$ -	New	
40	R4D Rural Road Spot Improvement Dato - Loidahar Chainage 0+000-12+300, Liquica Municipalty	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Luqueli Oan Unipessoal Lda	MOP-CD-NCB-R - 21039	$ 188,589.13	Oct. 01, 2021	22.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
41	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 5+000 - 10 +000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Caiulu, Unip Lda	MOP - CD - NCB -R - 21035	$ 162,215.27	Oct. 01, 2021	25.25%	0.00%	$ -	$ -	New	
42	R4D Rural Road Spot Improvement Aibeno-Asumanu-Leorema Chainage 0+000-5+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Vicaroman, Unip Lda	MOP - CD NCB - R - 21034	$ 165,363.43	Oct. 01, 2021	18.49%	0.00%	$ -	$ -	New	
43	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu - Laberlaka Chainage 2+500-5+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Claridade Unip,Lda	MPW-W-210163	$ 167,071.89	Oct. 01, 2021	16.14%	0.00%	$ -	$ -	New	
44	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Craeleki Bercoli, Unip Lda	MPW-W-210143	$ 76,423.05	Oct. 01, 2021	16.14%	0.00%	$ -	$ -	New	
45	Projeitu Konstrusaun foun ESG publico 01 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Roman Furak Unip,Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	$ 167,079.099	Nov. 1, 2021	28.03%	0.00%	$ -	$ -	New	
46	For Roads Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara, Carimbala - Loes (A03)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Chanel Chander Unipessoal Lda	MPW-W-210202	$ 112,505.280	13/12/2021	32.14%	0.00%	$ -	$ -		
47	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Mauboque	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 112,530.010	15/10/2021	12.28%	0.00%	$ -	$ -		
48	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBC 1,2,3 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 99,456.040	15/10/2021	12.35%	0.00%	$ -	$ -		
49	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Loidahar	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 79,735.630	15/10/2021	9.70%	0.00%	$ -	$ -		
50	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Laclolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 89,650.660	15/10/2021	9.97%	0.00%	$ -	$ -		
51	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Tolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 88,407.020	15/10/2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -		
52	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Luculai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 5,151.290	15/10/2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO A

Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica - JUNHO 2022

NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESO FISIKU (%)	PROGRESO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
53	Consultant Services to Supervise EPC Contractor for the Up-Gradation of Liquica 150/20kV Substation to Supply Power to Tibar Bay Port	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	LIQUICA VILA	LIQUICA	PT. Artefak Arkindo (Indonesia) JV with Jazicasru Unipessoal Lda	RFP/054/MOP-2021	$ 620,500.000	Dec. 16, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
54	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Fu Unip,Lda	RDTL - 0000	$ 13,000.00	Jan. 1, 2016	0.00%	0.00%	$ -	$ 13,000.00	New	
55	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	MAUBARA	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	$ 288,760.22	July 6, 2016	83.73%	75.36%	$ 217,606.07	$ 71,154.15	ON-GOING	
56	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	$ 1,901,334.67	Sept. 7, 2017	99.98%	99.98%	$ 1,900,879.16	$ 190,543.43	ON-GOING	
57	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	$ 275,000.00	Dec. 27, 2016	40.00%	38.00%	$ 104,500.00	$ 170,500.00	ON-GOING	
58	Novo Konstrusaun Edificio ESTV Lisadila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	$ 171,850.61	Aug. 16, 2019	89.17%	80. 25%	$ 137,915.77	$ 33,934.84	ON-GOING	
59	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	MAUBARA	LIQUICA	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	$ 170,965.65	Jan. 3, 2019	54.99%	42.53%	$ 72,706.50	$ 98,259.15	ON-GOING	Provizoriamente paradu hela
60	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	MAUBARA	LIQUICA	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	$ 7,693,101.00	May 3, 2017	75.33%	75.33%	$ 5,795,051.15	$ 1,898,049.85	ON-GOING	
61	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-190098	$ 50,702.59	Aug. 28, 2019	95.90%	86.31%	$ 43,761.73	$ 6,940.86	ON-GOING	
62	Konstrusaun Moru Haleu no Posto Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	MAUBARA	LIQUICA	Rafio Unip. Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	$ 56,445.70	July 21, 2021	16.32%	0.00%	$ -	$ -	New	
63	R4D Rural Road Spot Improvement Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Rito - Pu, Unipessoal,Lda	MOP -CD-RFQ - 21013	$ 67,382.23	Oct. 01, 2021	2.07%	0.00%	$ -	$ -	New	
64	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Malibo, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21033	$ 152,622.90	Oct. 01, 2021	10.60%	0.00%	$ -	$ -	New	
65	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia)-Maubaralisa Chainage 0+000-4+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Nheu, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21027	$ 173,484.62	Oct. 01, 2021	41.64%	0.00%	$ -	$ -	New	
66	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 0+000-4+600	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Murak, Unipessoal Lda	MPW-W-210157	$ 153,049.65	Oct. 01, 2021	30.13%	0.00%	$ -	$ -	New	
67	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Meta Loe Crae Bau Unip,Lda	MPW-W-210160	$ 198,698.25	Oct. 01, 2021	11.66%	0.00%	$ -	$ -	New	
68	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo -Gisu Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Nazico Unip Lda	-	$ 114,789.50	Oct. 01, 2021	11.39%	0.00%	$ -	$ -	New	
69	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-210161	$ 213,930.25	Oct. 01, 2021	14.88%	0.00%	$ -	$ -	New	
70	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Gariana	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 117,902.04	Oct. 15, 2021	1.98%	0.00%	$ -	$ -	New	
71	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Tapo Manuhulu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 100,033.33	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
72	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Maubara/Batuvou	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 141,660.22	Oct. 15, 2021	8.72%	0.00%	$ -	$ -	New	
	TOTAL								$ 26,533,460.08				$ 12,272,376.55	46.25%		

PREPARA HUSI,

(Eng. Marcus Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projetu Infrastutura Transporte e Irigasaun, ADN,I.P

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Eng. ba Edificio Publiku Agua e Saneamento, ADN,I.P

(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. Mekanikal e Electrikal ADN,I.P

SERTIFIKA HUSI,

(Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO B

PROGRESSU FISIKU FULAN MAIO MUNICIPIO LIQUICA

					LOKALIZASAUN PROJETO						Junho-22		
NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Komulative Progress (%)
1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema - Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	BAZARTETE	LIQUICA	Mina Petro Leste Unip, Lda	RDTL-11004589	$ 499,250.84	Oct. 1, 2020	100.00%	0.00%	100.00%
2	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Banir Lema	MPW-W-190097	$ 565,452.33	Aug. 14, 2019	98.46%	0.00%	98.46%
3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	$ 162,714.83	Aug. 16, 2019	95.68%	0.00%	95.68%
4	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	$ 73,270.51	Sept. 5, 2019	97.90%	0.00%	97.90%
5	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	$ 23,950.17	Dec. 5, 2019	77.60%	0.00%	77.60%
6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	$ 67,492.69	Nov. 10, 2019	41.01%	0.00%	41.01%
7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	$ 23,179.32	Oct. 22, 2019	79.24%	0.00%	79.24%
8	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	SEGURANCA NO DEFESA	BAZARTETE	LIQUICA	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	$ 58,107.88	Nov. 29, 2019	86.27%	0.00%	86.27%
9	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Naesalobu	MAP-P02019:19532	$ 67,927.04	Dec. 5, 2019	88.01%	0.00%	88.01%
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	FUNDO COVID	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	$ 66,557.90	Oct. 23, 2020	73.90%	0.00%	73.90%
11	New construction of isolation for covid 19 in liquica, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	FUNDO COVID	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	$ 243,368.08	Oct. 22, 2020	96.86%	0.00%	96.86%
12	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM -CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	$ 99,484.80	Sept. 9, 2019	92.14%	0.00%	92.14%
13	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	FLOOD CONTROL	BAZARTETE	LIQUICA	Sali Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	$ 502,473.28	Sept. 20, 2021	99.75%	0.00%	99.75%
14	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 154,189.34	Aug. 31, 2021			
15	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-NCB-R -21030	$ 149,732.87	Oct. 01, 2021	13.08%	11.99%	25.07%
16	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-RFQ - 21017	$ 88,852.44	Oct. 01, 2021	3.29%	12.45%	15.75%
17	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000-7+000, liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatuleo Unip Lda	MPW-W-210144	$ 88,425.80	Oct. 01, 2021	21.34%	19.83%	41.18%
18	Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Craeleki Bercoli Unip,Lda	MPW-W-210145	$ 62,024.04	Oct. 01, 2021	12.71%	17.72%	30.43%
19	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	TM Caileba Unip,Lda	MPW-W-210158	$ 158,465.33	Oct. 01, 2021	15.05%	11.43%	26.48%
20	New Construction of Fence Around for Isolation COVID-19 in Liquica Maumeta, Ministerio da Saude Timor Leste	MINISTERIO DA SAUDE	Fundo Covid	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	Biamali Unipessoal Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233	$ 65,271.32	11/01/2022	74.84%	0.00%	74.84%
21	Supply and installation connection for isolation and laboratorium Building Maumeta Liquica	MINISTERIO DA SAUDE	Fundo Covid	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	ZYC UNIPESSOAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	$ 58,167.58	11/01/2022	16.64%	0.00%	16.64%
22	Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM -BS	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	U-Rema Unip. Lda.	NCB:15/MEJD/DNA/2021	$ 264,260.83	1/11/2021	17.27%	0.00%	17.27%
23	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 9,072.12	15/10/2021	10.86%	0.00%	10.86%
24	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Ermeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 86,365.84	15/10/2021	9.45%	0.62%	10.06%
25	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 78,250.89	15/10/2021	11.89%	0.00%	11.89%
26	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Bogoro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 115,313.76	15/10/2021	6.54%	0.00%	6.54%
27	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	$ 153,851.88	Dec. 5, 2019	95.49%	0.00%	95.49%

28	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	$ 1,394,750.00	May 17, 2017			
29	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	$ 55,012.05	Aug. 22, 2019	99.91%	0.00%	99.91%
30	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	$ 71,468.49	Aug. 19, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
31	New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	$ 593,093.80	Jan. 6, 2017	92.32%	0.00%	92.32%
32	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	$ 276,484.00	July 6, 2016	92.77%	0.00%	92.77%
33	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	$ 452,362.93	Dec. 20, 2019	80.84%	0.00%	80.84%
34	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Banir Lema Unip,Lda	RDTL 0000	$ 47,299.32	Aug. 18,2021	88.95%	0.00%	88.95%
35	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 176,933.50	Aug. 31, 2021			
36	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21025	$ 131,219.62	Oct. 01, 2021	9.35%	14.93%	24.28%
37	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MOP - CD - NCB-R - 21036	$ 123,631.72	Oct. 01, 2021	13.83%	5.56%	19.39%
38	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Metaqou - Aibenu Chainage 0+000-7+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	MOP - CD - NCB -R - 21038	$ 238,739.71	Oct. 01, 2021	23.86%	2.55%	26.40%
39	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Dato - Liodahar Chainage 0+000-12+300, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Luqueli Oan Unipessoal Lda	MOP-CD-NCB-R - 21039	$ 188,589.13	Oct. 01, 2021	11.88%	10.12%	22.00%
40	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 5+000 - 10 +000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Caiulu, Unip Lda	MOP - CD - NCB -R - 21035	$ 162,215.27	Oct. 01, 2021	6.32%	18.93%	25.25%
41	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 0+000 - 5+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Vicaroman, Unip Lda	MOP - CD NCB - R - 21034	$ 165,363.43	Oct. 01, 2021	5.29%	13.20%	18.49%
42	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu - Laberlaka Chainage 2+500-5+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Claridade Unip,Lda	MPW-W-210163	$ 167,071.89	Oct. 01, 2021	7.94%	8.20%	16.14%
43	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Craeleki Bercoli, Unip Lda	MPW-W-210143	$ 76,423.05	Oct. 01, 2021	5.79%	15.18%	20.98%
44	Projeitu Konstrusaun foun ESG publico 01 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM -CD	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Roman Furak Unip,Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	$ 167,079.099	Nov. 1, 2021	26.66%	1.37%	28.03%
45	Roads Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (A03)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Chanel Chander Unipessoal Lda	MPW-W-210202	$ 112,505.280	44543	6.47%	25.68%	32.14%
46	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Mauboque	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 112,530.010	44484	10.42%	1.86%	12.28%
47	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBC 1,2,3 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 99,456.040	44484	11.40%	0.95%	12.35%
48	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Loidahar	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 79,735.630	44484	7.70%	2.00%	9.70%
49	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Laclolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 89,650.660	44484	9.97%	0.00%	9.97%
50	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Tolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 88,407.020	44484	0.00%	0.00%	0.00%
51	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Luculai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 5,151.290	44484	0.00%	0.00%	0.00%
52	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Fu Unip,Lda	RDTL - 0000	$ 13,000.00	Jan. 1, 2016	0.00%	0.00%	0.00%
53	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	$ 288,760.22	July 6, 2016	83.73%	0.00%	83.73%
54	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Montana Diak Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	$ 1,901,334.67	Sept. 7, 2017	99.98%	0.00%	99.98%
55	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	$ 275,000.00	Dec. 27, 2016			
56	Novo Konstrusaun Edificio ESTV Lisadila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	$ 171,850.61	Aug. 16, 2019	89.18%	0.00%	89.18%
57	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	MAUBARA	LIQUICA	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	$ 170,965.65	Jan. 3, 2019	54.99%	0.00%	54.99%
58	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	MAUBARA	LIQUICA	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	$ 7,693,101.00	May 3, 2017			
59	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-190098	$ 50,702.59	Aug. 28, 2019	95.90%	0.00%	95.90%
60	Konstrusaun Moru Haleu no Posto Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Rafio Unip. Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	$ 56,445.70	July 21, 2021			

61	R4D Rural Road Spot Improvement Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Rito - Pu, Unipessoal,Lda	MOP -CD-RFQ - 21013	$ 67,382.23	Oct. 01, 2021	2.07%	0.00%	2.07%
62	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Malibo, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21033	$ 152,622.90	Oct. 01, 2021	10.60%	0.00%	10.60%
63	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Nheu, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21027	$ 173,484.62	Oct. 01, 2021	29.95%	11.69%	41.64%
64	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Murak, Unipessoal Lda	MOP - CD- NCB-R- 21032	$ 153,049.65	Oct. 01, 2021	16.16%	13.97%	30.13%
65	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Meta Loe Crae Bau Unip,Lda	MPW-W-210160	$ 198,698.25	Oct. 01, 2021	11.66%	0.00%	11.66%
66	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo -Gisu Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Nazico Unip Lda	MPW-W-210152	$ 114,789.50	Oct. 01, 2022	11.39%	0.00%	11.39%
67	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-210161	$ 213,930.25	Oct. 01, 2021	8.91%	5.97%	14.88%
68	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Gariana	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 117,902.04	Oct. 15, 2021	1.98%	0.00%	1.98%
69	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Tapo Manuhulu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 100,033.33	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
70	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Maubara/Batuvou	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 141,660.22	Oct. 15, 2021	8.72%	0.00%	8.72%

INSPEKSAUN HUSI,

(Eng. Marcos Ximenes de Araujo)
Engineru ba Projetu Infrastrutura Transporte e Irigasaun ADN,I.P

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Engineru ba Edificio Publiku Agua e Saneamento ADN,I.P

(Eng. Camilo de Jesus)
Engineru ba Projetu Mekanikal

VERIFIKA HUSI,

(Eng. Remigio da C.S.dos Santos)
Engineru Senior ba Projetu Infrastutura Transporte e Irigasaun ADN,I.P

(Arq. Francisco Xavier D D. Jeronimo)
Engineru Senior ba Projetu Edificio Publiko no Be'e Saneamento ADN,I.P

(Eng. Deolindo de Fatima Marques)
Chefe Seksaun Mekanikal e Elektrikal & ITC ADN,I.P

SERTIFIKA HUSI,

(Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P

ANEXO C1 (BZT18)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality
Contractor : Hatuleo Unip.Lda
No. kontratu : MPW-W-210144

Data Inspeksaun : 7/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Libaloa-Fahilebo

Koordinat :


Start Point : Long : 125.43836103 Latetude : - 8.64943384
End Point : Long : 125.4135714 Latetude : - 8.63017393788538

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Line Drain

STA, 3+302-3+498

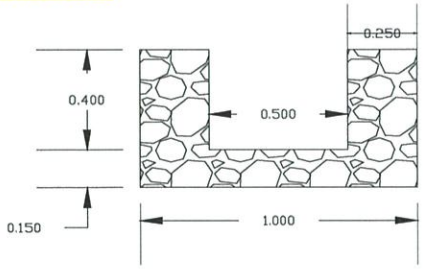


T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	100.00	20.00
0.15	1.00		15
Total			35.00 m³

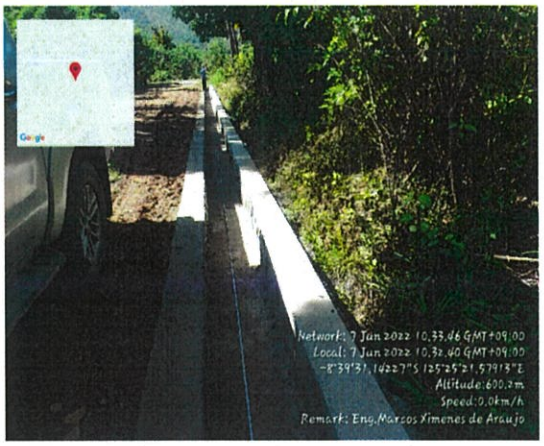


Sketch Item servisu : *Excavation*

STA, 3+302-3+498




T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	100.00	55.00
Total			55.00 m³



Fotografia foti iha terreno wainhira trabalhador sira halo hela Drainagem



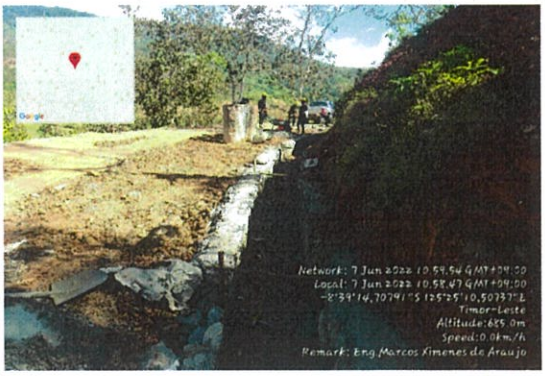

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL


ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (BZT18)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN **KADA PROJETO**

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000-7+000, liquica Municipality

Naran Kompanha : Hatuleo Unip,Lda

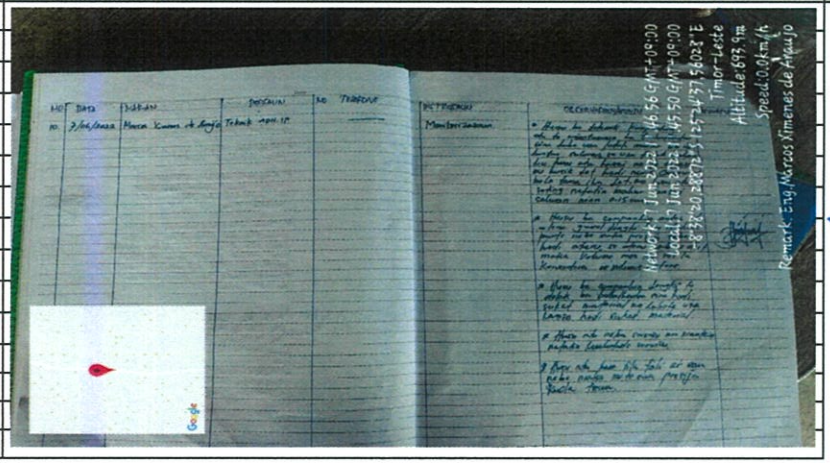No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	7/Junho/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4 5		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

 # ANEXO C2 (BZT18)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality
Companhia : Hatuleo Unip.Lda
No. kontratu :MPW-W-210144

SUMMARY

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP					RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	%	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 1,250.00		$ 650.00	0.74%	$ 650.00	0.74%	$ 150.00	0.17%	$ 500.00	0.57%	$ 650.00	0.74%
R-02	Drainage	$ 121.86										$ -	0.00%
R-03	Earth work	$ 3,188.68		$ 751.72	0.85%	$ 751.72	0.85%			$ 751.72	0.85%	$ 751.72	0.85%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 6,285.96		$ 1,468.93	1.66%	$ 1,468.93	1.66%			$ 1,468.93	1.66%	$ 1,468.93	1.66%
R-08	Structures	$ 26,959.42		$ 10,618.77	12.01%	$ 10,618.77	12.01%	$ 9,958.19	11.26%	$ 3,015.73	3.41%	$ 12,973.92	14.67%
R-11	Routine maintenance	$ 12,699.00		$ 6,223.00	7.04%	$ 6,223.00	7.04%	$ 350.00	0.40%	$ 4,508.00	5.10%	$ 4,858.00	5.49%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										$ -	0.00%
	General items												
G-01	Security	$ 1,200.00		$ 400.00	0.45%	$ 400.00	0.45%	$ 400.00	0.45%			$ 400.00	0.45%
G-02	Project team	$ 14,700.00		$ 6,600.00	7.46%	$ 6,600.00	7.46%	$ 6,600.00	7.46%			$ 6,600.00	7.46%
G-03	Safety and protection	$ 5,886.00		$ 5,726.00	6.48%	$ 5,726.00	6.48%			$ 5,726.00	6.48%	$ 5,726.00	6.48%
G-05	Meetings	$ 100.00		$ 100.00	0.11%	$ 100.00	0.11%			$ 100.00	0.11%	$ 100.00	0.11%
G-06	Ceremonial costs	$ 175.00		$ 100.00	0.11%	$ 100.00	0.11%			$ 100.00	0.11%	$ 100.00	0.11%
G-07	Mineral fees	$ 8,800.55										$ -	0.00%
												$ -	0.00%
A	**Construction cost**	**$ 50,754.92**		**$ 19,712.42**	**22.29%**	**$ 19,712.42**	**22.29%**	**$ 10,458.19**	**11.83%**	**$ 10,244.38**	**11.59%**	**$ 20,702.57**	**23.41%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 5,075.49**		**$ 1,971.24**	**2.23%**	**$ 1,971.24**	**2.23%**	**$ 1,045.82**	**1.18%**	**$ 1,024.44**	**1.16%**	**$ 2,070.26**	**2.34%**
C	**General items**	**$ 30,861.55**		**$ 12,926.00**	**14.62%**	**$ 12,926.00**	**14.62%**	**$ 7,000.00**	**7.92%**	**$ 5,926.00**	**6.70%**	**$ 12,926.00**	**14.62%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 1,733.84**		**$ 692.19**	**0.78%**	**$ 692.19**	**0.78%**	**$ 370.08**	**0.42%**	**$ 343.90**	**0.39%**	**$ 713.98**	**0.81%**
E	**Total**	**$ 88,425.80**		**$ 35,301.85**	***39.92%***	**$ 35,301.85**	***39.92%***	**$ 18,874.08**	**21.34%**	**$ 17,538.72**	***19.83%***	**$ 36,412.80**	***41.18%***

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C.S. dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

ANEXO C1 (BZT17)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality
Contractor : Hatumeta Oan Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD-RFQ - 21017

Data Inspeksaun : 7/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Fahilebo - Fatumasi

Koordinat :


Start Point : Long : 125.3931986 Latetude : - 8.63674152
End Point : Long : 125.3833257 Latetude : - 8.63314678

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Gabion*

Sta, 1+900




T	w	*Distacia*	*Volume*
1.00	2.00	4.00	8.00
Total			8.00 m³

Companhia halo Gabion iha Suco Fatumasi no Sta, 1+900.



Sketch Item servisu : *Gabion*

Sta, 1+900



T	w	*Distacia*	*Volume*
1.00	2.00	4.00	8.00
Total			8.00 m³

Companhia halo Gabion iha Suco Fatumasi no Sta, 1+900.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL


ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (BZT17)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN **KADA**
PROJETO

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality

Naran Kompanha : Hatumeta Oan Unipessoal.Lda

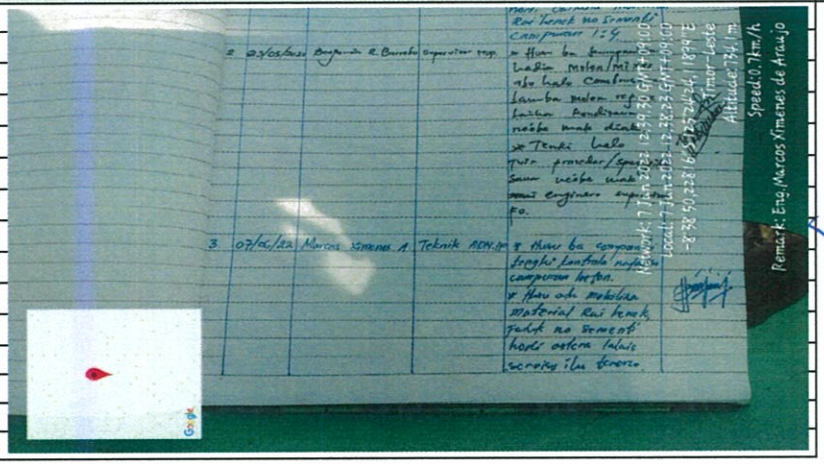No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	7/Junho/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4 5		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (BZT17)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality
Contract No :MOP - CD-RFQ - 21017
Contractor : Hatumeta Oan Unipessoal.Lda

SUMMARY

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 1,400.00					$ 125.00	0.14%	$ 725.00	0.82%	$ 850.00	0.96%
R-02	Drainage	$ 171.01					$ 171.01	0.19%	$ -	0.00%	$ 171.01	0.19%
R-03	Earth work	$ 3,655.46										
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 1,386.00										
R-08	Structures	$ 47,887.70					$ 454.72	0.51%	$ 454.72	0.51%	$ 909.44	1.02%
R-11	Routine maintenance	$ 5,018.80					$ 168.00	0.19%	$ 4,160.80	4.68%	$ 4,328.80	4.87%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
	General items											
G-01	Security	$ 1,380.00					$ 230.00	0.26%	$ 230.00	0.26%	$ 460.00	0.52%
G-02	Project team	$ 7,968.00					$ 1,628.00	1.83%	$ 1,628.00	1.83%	$ 3,256.00	3.66%
G-03	Safety and protection	$ 2,915.80							$ 2,915.80	3.28%	$ 2,915.80	3.28%
G-05	Meetings	$ 100.00							$ 100.00	0.11%	$ 100.00	0.11%
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00							$ 100.00	0.11%	$ 100.00	0.11%
G-07	Mineral fees	$ 8,800.56										
A	**Construction cost**	**$ 59,768.97**					**$ 918.73**	**1.03%**	**$ 5,340.52**	**6.01%**	**$ 6,259.25**	**7.04%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 5,976.90**					**$ 91.87**	**0.10%**	**$ 534.05**	**0.60%**	**$ 625.93**	**0.70%**
C	**General items**	**$ 21,364.36**					**$ 1,858.00**	**2.09%**	**$ 4,973.80**	**5.60%**	**$ 6,831.80**	**7.69%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 1,742.20**					**$ 57.37**	**0.06%**	**$ 216.97**	**0.24%**	**$ 274.34**	**0.31%**
E	**Total**	**$ 88,852.44**					**$ 2,925.98**	**3.29%**	**$ 11,065.34**	**12.45%**	**$ 13,991.31**	**15.75%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C.S.do Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

ANEXO C1 (BZT16)

Naran Projeto :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000

Contractor : Hatumeta Oan Unip.Lda

No. kontratu :MOP - CD-NCB-R -21030

Data Inspeksaun : 7/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Libaloa -Bucumera

Koordinat :


Start Point :	Long :	125.3931986	Latetude	: - 8.63674152
End Point :	Long :	125.3833257	Latetude	: - 8.63314678

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 0+600 - 0+700



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	46.40	9.28
0.15	1.00		6.96
Total			16.24 m³


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halo Line drain iha Suco Libaloa no Sta, 0+600 - 0+700




Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 0+600 - 0+700



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	46.40	51.04
Total			51.04 m³

Excavation Line drain iha Suco Libaloa no Sta, 0+600 - 0+700

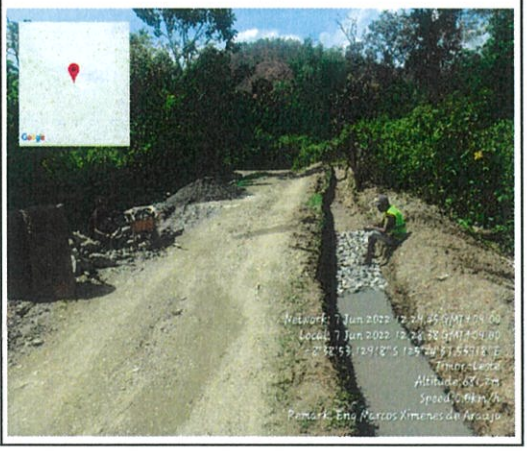

ANEXO C1 (BZT16)

Naran Projeto :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000
Contractor : Hatumeta Oan Unip.Lda
No. kontratu :MOP - CD-NCB-R -21030

Data Inspeksaun : 7/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Libaloa -Bucumera

Koordinat :


Start Point :	Long :	125.3931986	Latetude	: - 8.63674152
End Point :	Long :	125.3833257	Latetude	: - 8.63314678

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Plum Concrete*

Sta, 2+110 - 2+180




T	w	*Distacia*	*Volume*
0.12	4.00	70.00	33.60
Total			**33.60** m³

Companhia halo Line drain iha Suco Libaloa no Sta, 2+110 - 2+180




Sketch Item servisu : *Plum Concrete*

Sta, 2+110 - 2+180



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.12	4.00	70.00	33.60
Total			**33.60** m³

Companhia halo Line drain iha Suco Libaloa no Sta, 2+110 - 2+180

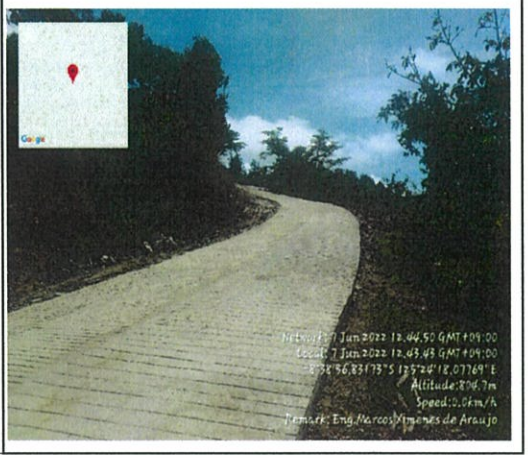

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL


ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (BZT16)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN **KADA PROJETO**

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000

Naran Kompanha : Hatumeta Oan Unipessoal.Lda

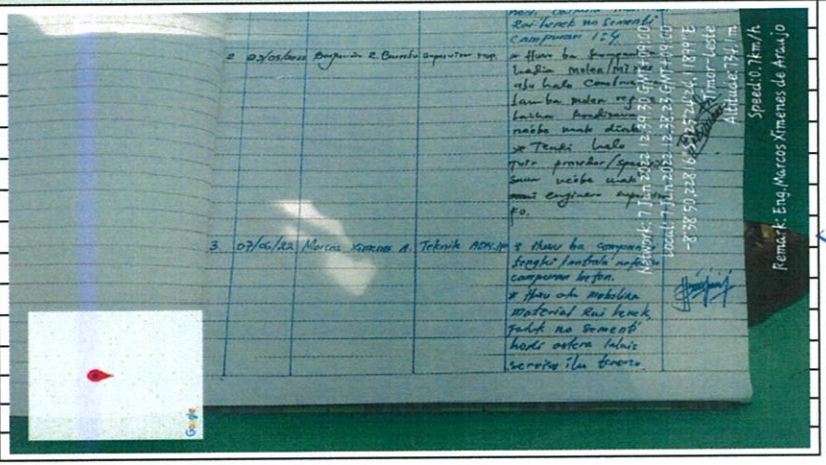No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	7/Junho/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4 5		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (BZT16)

Naran Projeto :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000

Contractor : Hatumeta Oan Unip.Lda

No. kontratu :MOP - CD-NCB-R -21030

SUMMARY												
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 2,000.00					$ 150.00	0.10%	$ 1,250.00	0.83%	$ 1,400.00	0.93%
R-02	Drainage	$ 97.72										
R-03	Earth work	$ 4,936.60					$ 904.71	0.60%	$ 104.63	0.07%	$ 1,009.34	0.67%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 793.80										
R-08	Structures	$ 97,039.43					$ 10,252.06	6.85%	$ 5,525.46	3.69%	$ 15,777.52	10.54%
R-11	Routine maintenance	$ 7,192.50					$ 336.00	0.22%	$ 5,208.00	3.48%	$ 5,544.00	3.70%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
	General items											
G-01	Security	$ 1,380.00					$ 690.00	0.46%		0.00%	$ 690.00	0.46%
G-02	Project team	$ 12,150.00					$ 5,700.00	3.81%		0.00%	$ 5,700.00	3.81%
G-03	Safety and protection	$ 4,103.00							$ 4,103.00	2.74%	$ 4,103.00	2.74%
G-05	Meetings	$ 100.00							$ 100.00	0.07%	$ 100.00	0.07%
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00							$ 100.00	0.07%	$ 100.00	0.07%
G-07	Mineral fees	$ 5,091.88										
A	**Construction cost**	**$ 112,310.04**					**$ 11,642.77**	**7.78%**	**$ 12,088.09**	**8.07%**	**$ 23,730.86**	**15.85%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 11,231.00**					**$ 1,164.28**	**0.78%**	**$ 1,208.81**	**0.81%**	**$ 2,373.09**	**1.58%**
C	**General items**	**$ 23,024.88**					**$ 6,390.00**	**4.27%**	**$ 4,303.00**	**2.87%**	**$ 10,693.00**	**7.14%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 2,931.32**					**$ 383.94**	**0.26%**	**$ 352.00**	**0.24%**	**$ 735.94**	**0.49%**
E	**Total**	**$ 149,732.87**					**$ 19,580.99**	**13.08%**	**$ 17,951.90**	**11.99%**	**$ 37,532.89**	**25.07%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto
Infraestructura,Transporte e irigaaun
Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C. S. dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun,
ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

ANEXO C1 (BZT20)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality

Contractor : TM.Cailebo Unip.Lda

No. kontratu : MPW-W-210158

Data Inspeksaun : 20/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Fahilebo -Bucumera

Koordinat :

Start Point : Long : 125.3958511 Latetude : - 8.634983018


End Point : Long : 125.3828331 Latetude : - 8.640302834

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Plum Concrete*

Sta, 3+400 - 3+500




T	w	*Distacia*	*Volume*
0.12	4.00	100.00	48.00
Total			48.00 m³

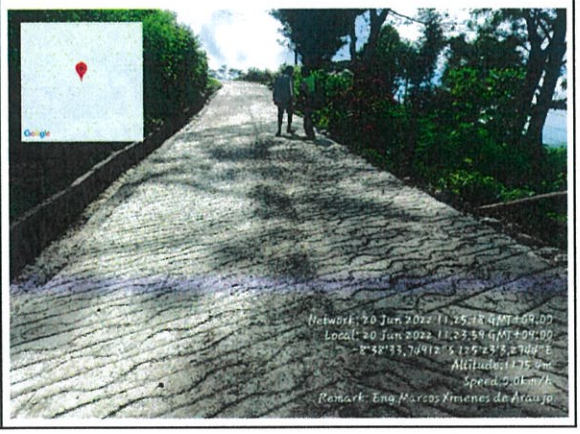


Sketch Item servisu : *Plum Concrete*

Sta, 3+400 - 3+500



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.12	4.00	100.00	48.00
Total			48.00 m³



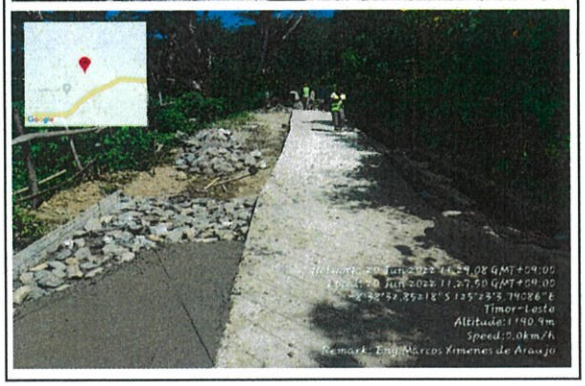

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (BZT20)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN KADA PROJETO

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality

Naran Kompanha : TM Caileba Unip,Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	20/Junho/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Monitorizasaun Projeitu	
					2	Companhia la rai buku tamu iha tereno	
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (BZT20)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality

Contractor : TM.Cailebo Unip.Lda

No. kontratu :MPW-W-210158

SUMMARY												
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 2,500.00					$ 150.00	0.09%	$ 1,750.00	1.10%	$ 1,900.00	1.20%
R-02	Drainage	$ 164.55										
R-03	Earth work	$ 6,714.14					$ 1,336.50	0.84%	$ 100.00	0.06%	$ 1,436.50	0.91%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,216.25										
R-08	Structures	$ 102,616.19					$ 13,855.45	8.74%	$ 5,448.96	3.44%	$ 19,304.41	12.18%
R-11	Routine maintenance	$ 6,427.50					$ 364.00	0.23%	$ 5,267.50	3.32%	$ 5,631.50	3.55%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
	General items											
G-01	Security	$ 1,440.00					$ 600.00	0.38%	$ -	0.00%	$ 600.00	0.38%
G-02	Project team	$ 11,700.00					$ 5,500.00	3.47%	$ -	0.00%	$ 5,500.00	3.47%
G-03	Safety and protection	$ 3,735.00							$ 3,735.00	2.36%	$ 3,735.00	2.36%
G-05	Meetings	$ 100.00							$ 100.00	0.06%	$ 100.00	0.06%
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00							$ 100.00	0.06%	$ 100.00	0.06%
G-07	Mineral fees	$ 4,974.69										
A	**Construction cost**	**$ 120,888.63**					**$ 15,705.95**	**9.91%**	**$ 12,566.46**	**7.93%**	**$ 28,272.41**	**17.84%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 12,088.86**					**$ 1,570.60**	**0.99%**	**$ 1,256.65**	**0.79%**	**$ 2,827.24**	**1.78%**
C	**General items**	**$ 22,149.69**					**$ 6,100.00**	**3.85%**	**$ 3,935.00**	**2.48%**	**$ 10,035.00**	**6.33%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 3,102.54**					**$ 467.53**	**0.30%**	**$ 355.16**	**0.22%**	**$ 822.69**	**0.52%**
E	**Total**	**$ 158,465.33**					**$ 23,844.08**	**15.05%**	**$ 18,113.27**	**11.43%**	**$ 41,957.34**	**26.48%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C. S. dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

ANEXO C1 (LV21)

Back-up Data

Naran Projeto : For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)

No. kontratu : MPW-W210202

Data Inspeksaun : 30/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Watuboro

Koordinat :


Start Point : Long : 125°6'49.92268 Latetude : - 8°39'48.1609
End Point : Long : 125°6'49.87166 Latetude : - 8°39'48.12606

Naran Inspektor : 1.00 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*


Lokaliza iha Pilila



Area :	*Distacia*	*Volume*
1.88	26.00	48.75
Total		48.75 m³


Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Lokaliza iha Pilila



Area :	*Distacia*	*Volume*
1.8750	13.00	24.38
Total		24.38 m³


Lokaliza Carimbala Vatoboro



Area :	*Distacia*	*Volume*
1.875	26.00	48.75
Total		48.75 m³


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Satone Masonry nebe kompanhia implementa iha Pilila ho ninia medida naruk 26 meter

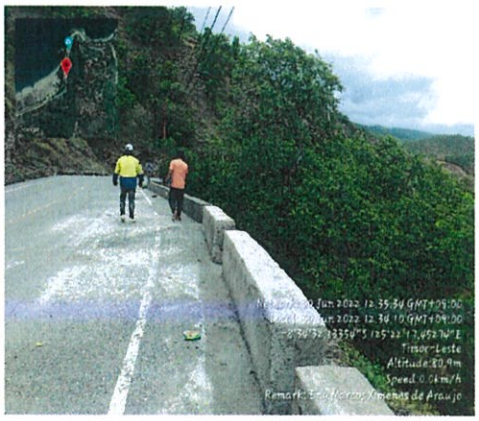

Satone Masonry nebe kompanhia implementa iha Pilila ho ninia medida naruk 26 meter



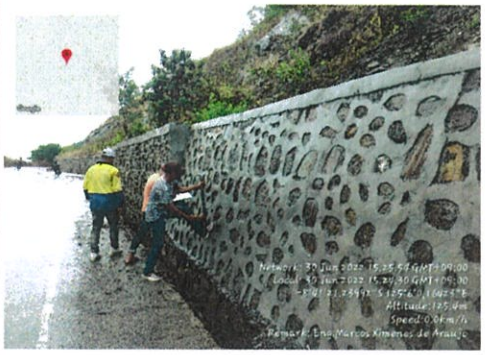

ANEXO C1 (LV21)

Back-up Data

Naran Projeto : For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)

No. kontratu : MPW-W210202

Data Inspeksaun : 30/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Watuboro

Koordinat :

Start Point : Long : 125°6'49.92268 Latetude : - 8°39'48.1609
End Point : Long : 125°6'49.87166 Latetude : - 8°39'48.12606


Naran Inspektor : 1.00 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : ***CLEANING LINE DRAIN***

TIBAR PORTU - KASAIT- PELILA-LIQUICA-MAUBARA-CARIMBALA

Area : 0,4291




Area :	*Distacia*	*Volume*
0.4291	2,861.00	1,227.66
Total		1,227.66 m³

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

TIBAR PORTU - KASAIT- PELILA-LIQUICA-MAUBARA-CARIMBALA


Area : 0,4291



Area :	*Distacia*	*Volume*
0.4291	2,861.00	1,227.66
Total		1,227.66 m³

TIBAR PORTU - KASAIT- PELILA-LIQUICA-MAUBARA-CARIMBALA

Area : 0,4291




Area :	*Distacia*	*Volume*
0.429	2,861.00	1,227.66
Total		1,227.66 m³


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia hamos Line Drain husi Tibar Portu - Pilila - Liquica - Carimala - Loes



Companhia hamos Line Drain husi Tibar Portu - Pilila - Liquica - Carimala - Loes

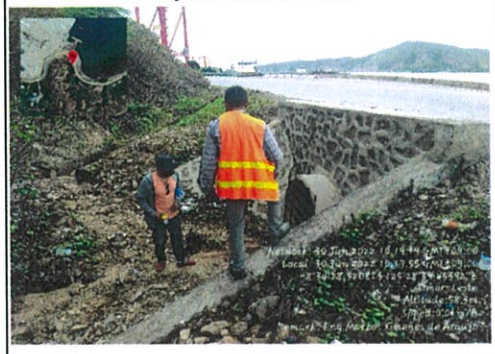

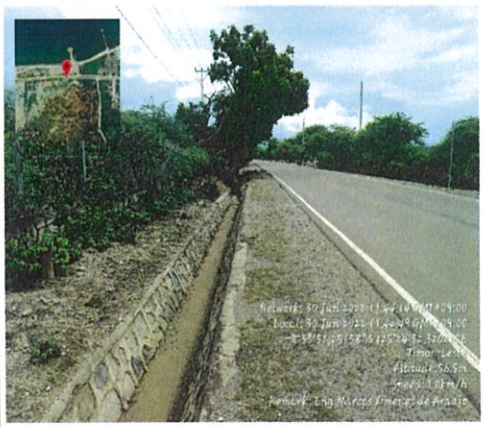

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (LV21)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN KADA PROJETO

Naran projeto : **For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)**

Naran Kompanha : Chantel Chander Unipessoal.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	30/Junho/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Halo Inspeksaun Pagamentu IPC 01	
					2	Companhia la prepara buku tamu	
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV21)

Name of Roads : For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)

Contract No : MPW-W210202

Contractor : Chanel Chander Unipessoal.Lda

SUMMARY

NO	DESCRIPTION	CONTRAC ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
100	GENERAL	$ 2,750.00						$ 1,375.00	1.22%	$ 1,375.00	1.22%
200	EARTH WORK	$ 20,657.90				$ 83.03	0.07%	$ 14,709.67	13.07%	$ 14,792.70	13.15%
400	SURFACE COURSE	$ 26,748.80									
600	DRAINAGE & SLOPE PROTECTION STRUCTURE	$ 37,821.40				$ 6,400.47	5.69%	$ 6,963.87	6.19%	$ 13,364.34	11.88%
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	$ 1,535.80						$ 1,535.80	1.37%	$ 1,535.80	1.37%
800	BIOENGINEERING WORKS	$ 9,480.00									
A	**CONSTRUCTION COST**	**$ 98,993.90**				**$ 6,483.50**	**5.76%**	**$ 24,584.34**	**21.85%**	**$ 31,067.84**	**27.61%**
B	**PROFIT 10% x A**	**$ 9,899.39**				**$ 648.35**	**0.58%**	**$ 2,458.43**	**2.19%**	**$ 3,106.78**	**2.76%**
C	**OVERHEAD**	**$ 1,406.00**					**0.00%**	**$ 1,280.00**	**1.14%**	**$ 1,280.00**	**1.14%**
D	**TAX 2% (A+B+C)**	**$ 2,205.99**				**$ 142.64**	**0.13%**	**$ 566.46**	**0.50%**	**$ 709.09**	**0.63%**
E	**GRAND TOTAL (A+B+C)**	***$ 112,505.28***				***$ 7,274.48***	**6.47%**	***$ 28,889.23***	**25.68%**	***$ 36,163.71***	**32.14%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C.S.dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT19)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000
Contractor : Craeleki Bercoli Unip.Lda
No. kontratu : MPW-W-210145

Data Inspeksaun : 20/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Maumeta - Metagou

Koordinat :

Start Point : Long : 125.34157891 Latetude : - 8.5948749774
End Point : Long : 125.38295813 Latetude : - 8.62965918

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : *CMG* **Sta, 3+200** Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha terreno	
Sketch Item servisu : *CMG* **Sta, 5+150** Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha terreno	
Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha terreno	

ANEXO D (BZT19)

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN KADA PROJETO

Naran projeto : Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000

Naran Kompanha : Craeleki Bercoli Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	20/Junho/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Monitorizasaun iha terreno maibe buku tamu laiha	
					2	Teknik Kompanhia laiha tereno	
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT19)
Back-up Data

Naran Projeto : Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000
Contractor : Craeleki Bercoli Unip.Lda
No.Kontrac : MPW-W-210145

SUMMARY

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 700.00					$ 550.00	0.89%	$ 50.00	0.08%	$ 600.00	0.97%
R-03	Earth work	$ 2,472.64							$ 2,000.00	3.22%	$ 2,000.00	3.22%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 1,997.60										
R-08	Structures	$ 15,124.71					$ 942.75	1.52%	$ 33.94	0.05%	$ 976.69	1.57%
R-11	Routine maintenance	$ 17,562.00					$ 600.00	0.97%	$ 6,221.50	10.03%	$ 6,821.50	11.00%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
	GENERAL ITEM											
G-01	Security	$ 1,500.00					$ 625.00	1.01%			$ 625.00	1.01%
G-02	Project team	$ 11,550.00					$ 4,800.00	7.74%			$ 4,800.00	7.74%
G-03	Safety and protection	$ 2,293.00							$ 1,567.00	2.53%	$ 1,567.00	2.53%
G-05	Meetings	$ 100.00										0.00%
G-06	Ceremonial costs	$ 150.00							$ 75.00	0.12%	$ 75.00	0.12%
G-08	Mineral fees	$ 3,297.24										
		$ 18,890.24					$ 5,425.00					
A	**Construction cost**	**$ 38,106.95**					**$ 2,092.75**	**3.37%**	**$ 8,305.44**	**13.39%**	**$ 10,398.19**	**16.76%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 3,810.70**					**$ 209.28**	**0.34%**	**$ 830.54**	**1.34%**	**$ 1,039.82**	**1.68%**
C	**General items**	**$ 18,890.24**					**$ 5,425.00**	**8.75%**	**$ 1,642.00**	**2.65%**	**$ 7,067.00**	**11.39%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 1,216.16**					**$ 154.54**	**0.25%**	**$ 215.56**	**0.35%**	**$ 370.10**	**0.60%**
E	**Total**	**$ 62,024.04**					**$ 7,881.57**	**12.71%**	**$ 10,993.54**	**17.72%**	**$ 18,875.11**	**30.43%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C.S. dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

ANEXO C1 (LV17)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 0+000 - 5+000, Liquica Municipality

Contractor : Vicaroman Unip.Lda

No. kontratu : MOP - CD NCB - R - 21034



Data Inspeksaun : 20/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Asu-Manu

Koordinat :

Start Point :	Long :	125.3416468	Latetude	: - 8.65444508
End Point :	Long :	125.3469018	Latetude	: - 8.680286396

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

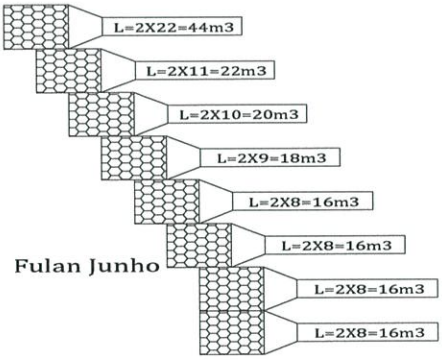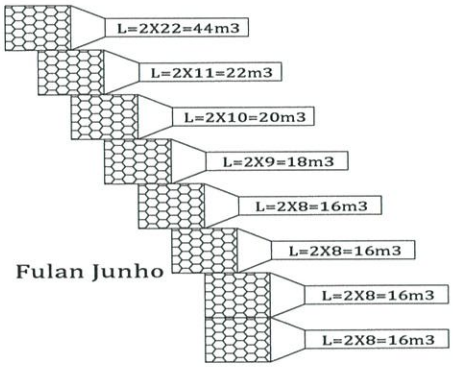Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : *Gabion* **Sta, 0+700**  	
Sketch Item servisu :Gabion **Sta, 4+670**  	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (LV17)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 0+000 - 5+000, Liquica Municipality

Contractor : Vicaroman Unip.Lda

No. kontratu : MOP - CD NCB - R - 21034

Data Inspeksaun : 20/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Asu-Manu

Koordinat :

Start Point : Long : 125.3416468 Latetude : - 8.65444508


End Point : Long : 125.3469018 Latetude : - 8.680286396

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 4+150 - 4+180




t	Area	*Distacia*	*Volume*
1.00	0.38	30.00	11.25
	0.35		10.50
Total			21.75 m³

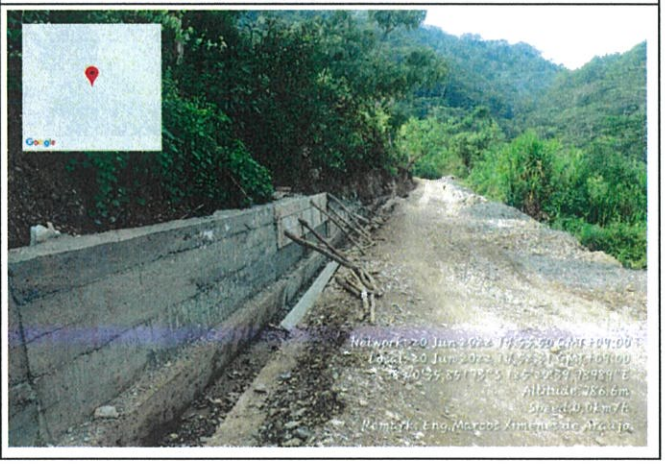


Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 4+150 - 4+180

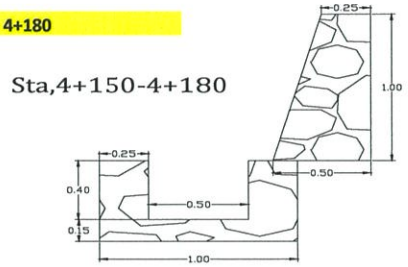

t	Area	*Distacia*	*Volume*
1.00	0.38	30.00	11.25
	0.35		10.50
Total			21.75 m³

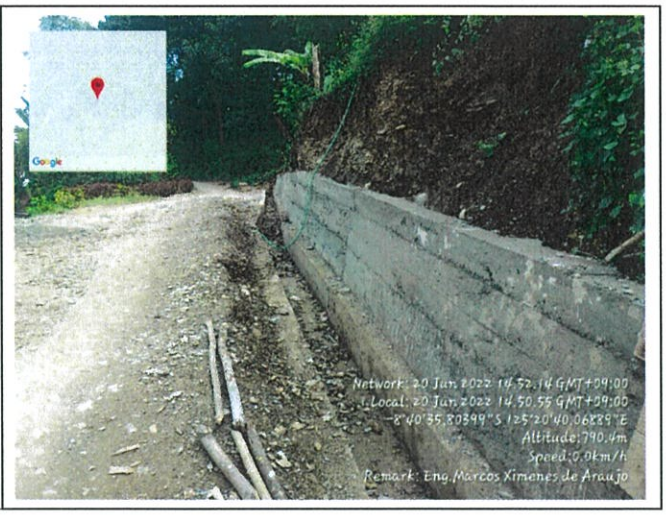

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV17)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leorema Chainage 0+000-5+000)

Kompanha : Vicaroman Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	20/06/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Monitorizasaun ba Terreno laiha ema servisu	
					2	Kompanhia La lori Buku Tamu	
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV17)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leorema Chainage 0+000-5+000)
Contract No : MPW-W-210155
Contractor : Vicaroman Unip.Lda

SUMMARY												
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 1,750.00					$ 250.00	0.15%	$ 350.00	0.21%	$ 600.00	0.36%
R-02	Drainage	$ 37.00										
R-03	Earth work	$ 13,233.46							$ 260.40	0.16%	$ 260.40	0.16%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 8,729.99										
R-08	Structures	$ 82,879.01					$ 4,599.23	2.78%	$ 9,870.53	5.97%	$ 14,469.75	8.75%
R-11	Routine maintenance	$ 8,882.00					$ 200.00	0.12%	$ 250.00	0.15%	$ 450.00	0.27%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
	General Items											
G-01	Security	$ 1,380.00					$ 345.00	0.21%	$ 230.00	0.14%	$ 575.00	0.35%
G-02	Project team	$ 17,520.00					$ 2,670.00	1.61%	$ 2,670.00	1.61%	$ 5,340.00	3.23%
G-03	Safety and protection	$ 6,501.00							$ 6,501.00	3.93%	$ 6,501.00	3.93%
G-05	Meetings	$ 100.00							$ 100.00	0.06%	$ 100.00	0.06%
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00							$ 100.00	0.06%	$ 100.00	0.06%
G-07	Mineral fees	$ 8,290.40										
A	**Construction cost**	**$ 115,761.46**					**$ 5,049.23**	**3.05%**	**$ 10,730.93**	**6.49%**	**$ 15,780.15**	**9.54%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 11,576.15**					**$ 504.92**	**0.31%**	**$ 1,073.09**	**0.65%**	**$ 1,578.02**	**0.95%**
C	**General items**	**$ 33,991.40**					**$ 3,015.00**	**1.82%**	**$ 9,601.00**	**5.81%**	**$ 12,616.00**	**7.63%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 3,226.58**					**$ 171.38**	**0.10%**	**$ 428.10**	**0.26%**	**$ 599.48**	**0.36%**
E	**Total**	**$ 165,363.43**					**$ 8,740.53**	**5.29%**	**$ 21,833.12**	**13.20%**	**$ 30,573.65**	**18.49%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remegio da C. S. dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

ANEXO C1 (LV13)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality
Naran Companhia : Prudencia Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD - NCB-R - 21036

Data Inspeksaun : 20/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Taltabi - Kutulau

Koordinat :


Start Point : Long : 125.3714575 Latetude : - 8.64451919
End Point : Long : 125.3801075 Latetude : - 8.6527164

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Plum Concrete*


Sta, 1+200 - 1+300



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	2.00	100.00	24.00
Total			24.00 m³


Companhia halo Plum Concrete iha no Sta, 1+200 - 1+300



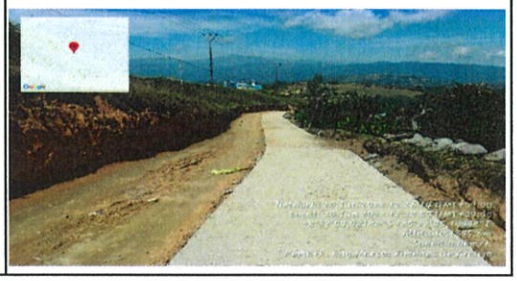


Sketch Item servisu : *Plum Concrete*

Sta, 1+200 - 1+300



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	3.75	100.00	45.00
Total			45.00 m³


Companhia halo Plum Concrete iha no Sta, 1+200 - 1+300

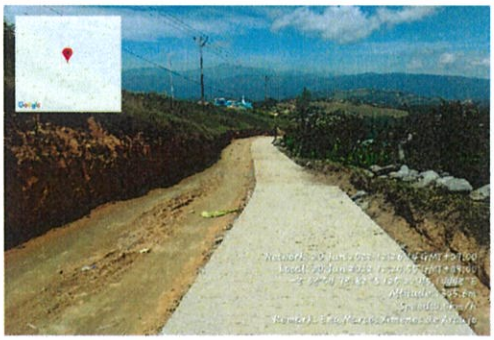



Sketch Item servisu : *Gabion*

Sta, 1+100



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL


ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV13)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality

Kompanha : Prudencia Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	20/Junho/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Monitorizasaun iha Terreno teknik kompanhia laiha	
					2	Husu ba Companha servisu tuir orentasaun nebe fo ona	
					3		
					4		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV13)

Name of Roads :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality
Contract No : MOP - CD - NCB-R - 21036
Contractor : Prudencia Construction Unipessoal.Lda

SUMMARY													
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 1,550.00					$ 250.00	0.20%	$ 350.00	0.28%	$ 600.00	0.49%
R-03	Earth work	$ 6,216.90							$ 140.00	0.11%	$ 140.00	0.11%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,205.60										
R-08	Structures	$ 69,266.99					$ 6,422.76	5.20%	$ 2,913.68	2.36%	$ 9,336.44	7.55%
R-11	Routine maintenance	$ 3,842.00					$ 560.00	0.45%	$ -	0.00%	$ 560.00	0.45%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
	General items											
G-01	Security	$ 15.00					$ 6.25	0.01%	$ -	0.00%	$ 6.25	0.01%
G-02	Project team	$ 21,600.00					$ 8,800.00	7.12%	$ -	0.00%	$ 8,800.00	7.12%
G-03	Safety and protection	$ 2,816.00							$ 2,816.00	2.28%	$ 2,816.00	2.28%
G-05	Meetings	$ 100.00							$ 100.00	0.08%	$ 100.00	0.08%
G-06	Ceremonial costs	$ 150.00							$ 75.00	0.06%	$ 75.00	0.06%
G-07	Mineral fees	$ 4,861.93										
A	Construction cost	$ 83,331.49					$ 7,232.76	5.85%	$ 3,403.68	2.75%	$ 10,636.44	8.60%
B	Contractor Fee (A x 10%)	$ 8,333.15					$ 723.28	0.59%	$ 340.37	0.28%	$ 1,063.64	0.86%
C	General items	$ 29,542.93					$ 8,806.25	7.12%	$ 2,991.00	2.42%	$ 11,797.25	9.54%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	$ 2,424.15					$ 335.25	0.27%	$ 134.70	0.11%	$ 469.95	0.38%
E	Total	$ 123,631.72					$ 17,097.53	13.83%	$ 6,869.75	5.56%	$ 23,967.28	19.39%

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C.S.dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

ANEXO C1 (LV14)
Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)

No. kontratu : MPW-W-210151

Data Inspeksaun : 23/Maio/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Metagou - Aibeno

Koordinat :


Start Point : Long : 125.36544444 Latetude : - 8.66332014
End Point : Long : 125.3416468 Latetude : - 8.65444508

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Plum Concrete

STA, 0+090 - 0+900




t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	2.00	30.00	7.20
Total			7.20

Fotografia terreno hatudo katak companhia halo hela pengecoran Plum Concrete




Sketch Item servisu : *Plum Concrete*


STA, 0+250-0+900




t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	2.00	30.00	7.20
Total			7.20



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	2.00	30.00	7.20
Total			7.20

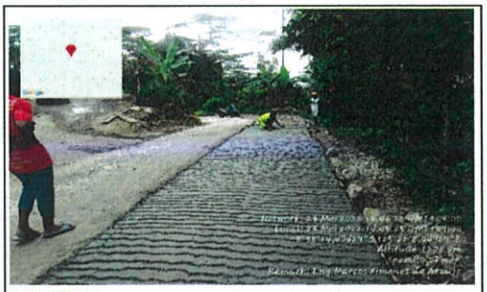

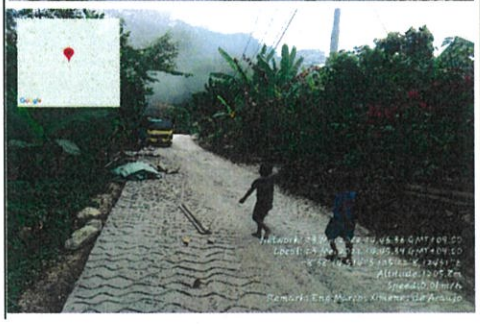

ANEXO C1 (LV14)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)

No. kontratu : MPW-W-210151

Data Inspeksaun : 23/Maio/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Metagou - Aibeno

Koordinat :


Start Point : Long : 125.36544444 Latetude : - 8.66332014
End Point : Long : 125.3416468 Latetude : - 8.65444508

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 0+090 - 0+900



Keterangan :

w1	***0.25***
w2	***0.80***
w3	***1.00***
t1	***1.50***
t2	***0.50***
L	***15.00***

		Distacia	*Volume*
Wall	0.79	15.00	11.81
Foundation	0.50		7.5
	Total		**19.31** m3


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Moru Protesaun nebe halo husi kompanhia



Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 0+250-0+900



Keterangan :

w1	***0.25***
w2	***0.80***
w3	***1.00***
t1	***1.50***
t2	***0.50***
L	***15.00***

		Distacia	*Volume*
Wall	0.79	15.00	11.81
Foundation	0.50		7.5
	Total		**19.31** m3





MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV14)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Metaqou - Aibenu Chainage 0+000-7+600, Liquica Municipality

Kompanha : Metalika Unip.Lda

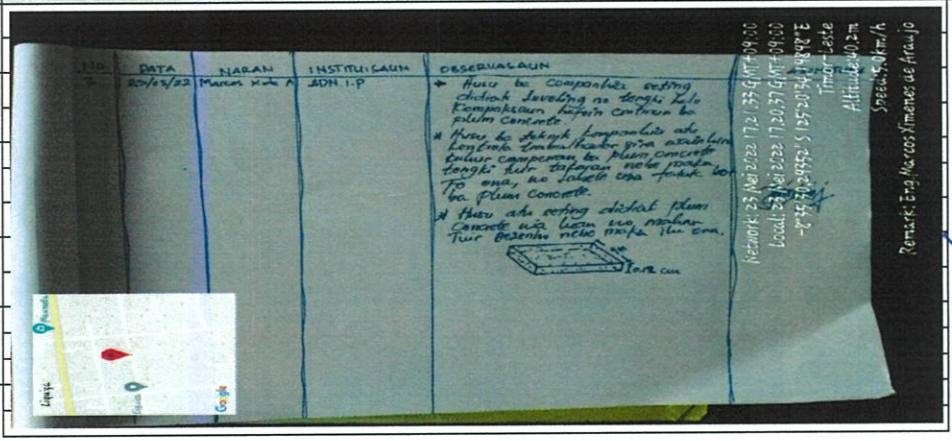No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	23/Maio/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV14)

Naran Projeto :R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)
Contractor : Metalika Unip.Lda
No. kontratu :MPW-W-210151

SUMMARY												
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 3,400.00					$ 250.00	0.10%	$ 1,550.00	0.65%	$ 1,800.00	0.75%
R-02	Drainage	$ 244.30					$ 73.29	0.03%	$ -	0.00%	$ 73.29	0.03%
R-03	Earth work	$ 5,301.97					$ 1,520.00	0.64%	$ 528.41	0.22%	$ 2,048.41	0.86%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 3,356.64							$ 226.80	0.09%	$ 226.80	0.09%
R-08	Structures	$ 159,824.15					$ 37,197.15	15.58%	$ -	0.00%	$ 37,197.15	15.58%
R-11	Routine maintenance	$ 16,538.40					$ 5,924.80	2.48%	$ 737.50	0.31%	$ 6,662.30	2.79%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
GENERAL ITEM												
G-01	Security	$ 1,380.00					$ 575.00	0.24%	$ -	0.00%	$ 575.00	0.24%
G-02	Project team	$ 13,660.00					$ 5,700.00	2.39%	-$ 80.00	-0.03%	$ 5,620.00	2.35%
G-03	Safety and protection	$ 3,062.00							$ 2,646.00	1.11%	$ 2,646.00	1.11%
G-05	Meetings	$ 100.00										
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00					$ 100.00	0.04%	$ 50.00	0.02%	$ 150.00	0.06%
G-07	Mineral fees	$ 7,849.54										
A	**Construction cost**	**$ 188,915.45**					**$ 44,965.24**	**18.83%**	**$ 3,042.71**	**1.27%**	**$ 48,007.96**	**20.11%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 18,891.55**					**$ 4,496.52**	**1.88%**	**$ 304.27**	**0.13%**	**$ 4,800.80**	**2.01%**
C	**General items**	**$ 26,251.54**					**$ 6,375.00**	**2.67%**	**$ 2,616.00**	**1.10%**	**$ 8,991.00**	**3.77%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 4,681.17**					**$ 1,116.74**	**0.47%**	**$ 119.26**	**0.05%**	**$ 1,236.00**	**0.52%**
E	**Total**	**$ 238,739.71**					**$ 56,953.50**	**23.86%**	**$ 6,082.24**	**2.55%**	**$ 63,035.75**	**26.40%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto
Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C.S.dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

ANEXO C1 (LV15)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)

No. kontratu : MPW-W-210150

Data Inspeksaun : 20/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Loidahar

Koordinat :

Start Point : Long : 125°19'36.41779 Latetude : - 8°36'46.93352


End Point : Long : 125°19'36.41779 Latetude : - 8°36'46.93352

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*


Sta, 4+680 - 4+780



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	4.00	100.00	48.00
Total			48.00 m³


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halo Plum Concrete iha Suco Loidahar no Sta, 4+680 - 4+780

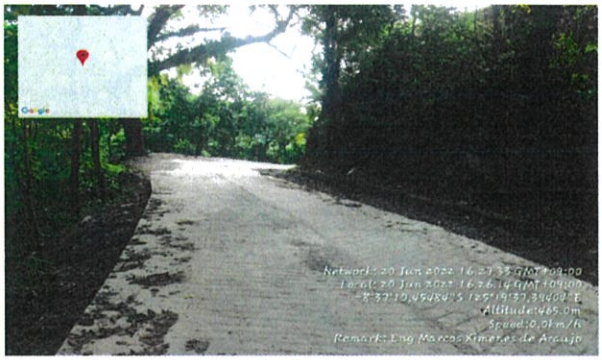


Sketch Item servisu : *Stone Masonry*


Sta, 4+680 - 4+780



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	4.00	100.00	48.00
Total			48.00 m³

Companhia halo Plum Concrete iha Suco Loidahar no Sta, 4+680 - 4+780

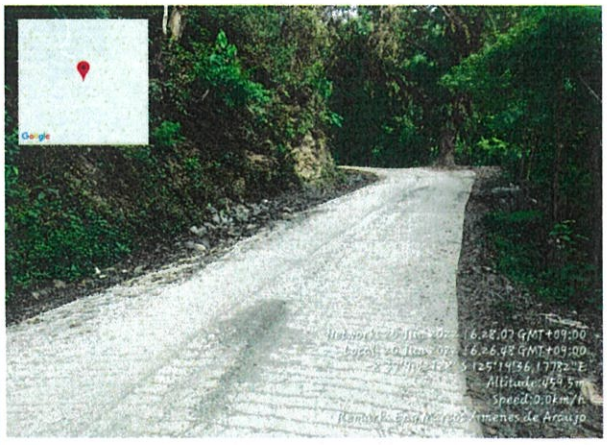



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	4.00	100.00	48.00
Total			48.00 m³



ANEXO C1 (LV15)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)

No. kontratu : MPW-W-210150

Data Inspeksaun : 20/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Loidahar

Koordinat :

Start Point : Long : 125°19'36.41779 Latetude : - 8°36'46.93352


End Point : Long : 125°19'36.41779 Latetude : - 8°36'46.93352

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*


Sta, 4+300 - 4+450



Area	*Distacia*	*Volume*
0.35	100.00	35.00
Total		**35.00 m³**


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halo Line Draen iha Suco Loidahar no Sta, 4+300 - 4+400

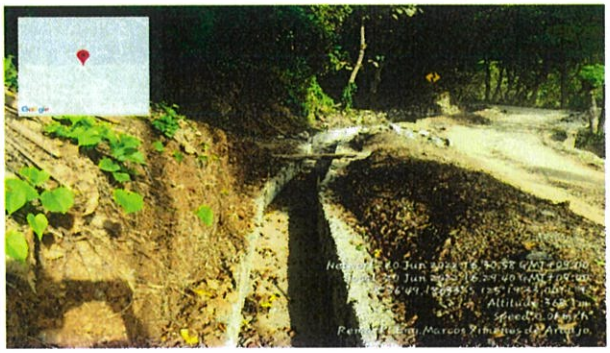


Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 4+300 - 4+450




Area	*Distacia*	*Volume*
0.35	100.00	35.00
Total		**35.00 m³**



Area	*Distacia*	*Volume*
0.35	100.00	35.00
Total		**35.00 m³**

Companhia halo Line Draen iha Suco Loidahar no Sta, 4+300 - 4+400

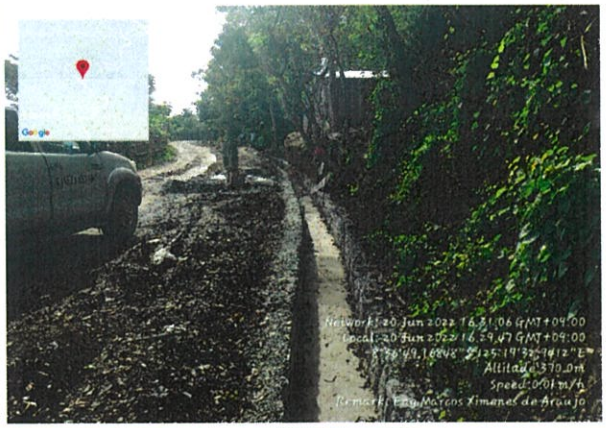



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV15)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)

Kompanha : Luqueli Oan Unip.Lda

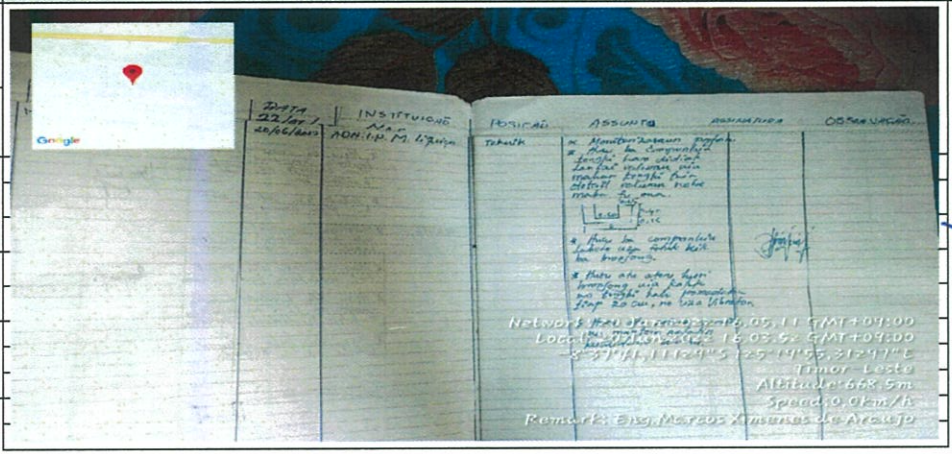No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	20/Junho/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV15)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)
Contract No : MPW-W-210150
Contractor : Luqueli Oan Unipessoal.Lda

SUMMARY

NO	DESCRIPTION	CONTRAC ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 1,300.00				$ 150.00	0.08%	$ 550.00	0.29%	$ 700.00	0.37%
R-02	Drainage	$ 1,905.47									
R-03	Earth work	$ 19,160.19				$ 1,639.44	0.87%	$ 587.95	0.31%	$ 2,227.39	1.18%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 5,007.60									
R-08	Structures	$ 97,539.20				$ 12,624.26	6.69%	$ 10,224.42	5.42%	$ 22,848.67	12.12%
R-11	Routine maintenance	$ 18,278.00				$ 1,720.00	0.91%	$ -	0.00%	$ 1,720.00	0.91%
R-15	Provisional sum	$ 250.00									
	Sub Total	**$ 143,440.46**				**$ 16,133.70**	**8.55%**	**$ 11,362.37**	**6.02%**	**$ 27,496.06**	**14.58%**
	General items										
G-01	Security	$ 1,680.00				$ 1,120.00	0.59%	$ -	0.00%	$ 1,120.00	0.59%
G-02	Project team	$ 9,960.00				$ 3,010.00	1.60%	$ -	0.00%	$ 3,010.00	1.60%
G-03	Safety and protection	$ 6,094.50						$ 6,066.50	3.22%	$ 6,066.50	3.22%
G-05	Meetings	$ 100.00						$ 100.00	0.05%	$ 100.00	0.05%
G-06	Ceremonial costs	$ 175.00				$ 87.50	0.05%	$ 50.00	0.03%	$ 137.50	0.07%
G-07	Mineral fees	$ 9,097.30									
	Sub Total	**$ 27,106.80**				**$ 4,217.50**	**2.24%**	**$ 6,216.50**	**3.30%**	**$ 10,434.00**	**5.53%**
A	CONSTRUCTION COST	$ 143,440.46				$ 16,133.70	8.55%	$ 11,362.37	6.02%	$ 27,496.06	14.58%
B	PROFIT 10% x A	$ 14,344.05				$ 1,613.37	0.86%	$ 1,136.24	0.60%	$ 2,749.61	1.46%
C	OVERHEAD	$ 27,106.80				$ 4,217.50	2.24%	$ 6,216.50	3.30%	$ 10,434.00	5.53%
D	TAX 2% (A+B+C)	$ 3,697.83				$ 439.29	0.23%	$ 374.30	0.20%	$ 813.59	0.43%
E	GRAND TOTAL (A+B+C)	*$ 188,589.13*				*$ 22,403.86*	11.88%	*$ 19,089.40*	10.12%	*$ 41,493.26*	22.00%

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C.S.dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

ANEXO C1 (LV12)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)
Contractor : Goubara Unip.Lda
No. kontratu : MPW-W-210162

Data Inspeksaun : 8/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Berlakuliado-Laberlaka

Koordinat :


Start Point : Long : 125.29724167 Latetude : - 8.60635641
End Point : Long : 125.2952025 Latetude : - 8.62329599714

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Stone Masonry (Line Drain)


1+380 - 1+400



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	100.00	20.00
0.15	1.00		15
Total			35.00 m³


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Fotografia terreno hatudo katak companhia halo hela Saluran

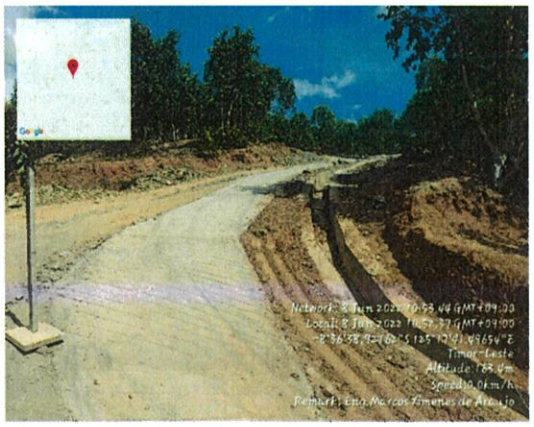


Sketch Item servisu : *Excavation*


1+380 - 1+400



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	100.00	55.00
Total			55.00

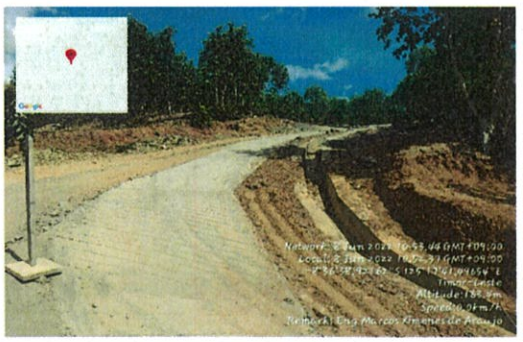

Sketch Item servisu : ***Excavation***



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	2.00	100.00	24.00
Total			24.00 m³



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV12)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)

Kompanha : Goubara Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/Junho/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1		
					2		
					3	Companhia La prepara Buku tamu iha tereno	
					4		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV12)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)

Contractor : Goubara Unip.Lda

No. kontratu :MPW-W-210162

SUMMARY												
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 2,300.00					$ 250.00	0.19%	$ 950.00	0.72%	$ 1,200.00	0.91%
R-02	Drainage	$ 171.01										
R-03	Earth work	$ 4,699.77					$ 157.85	0.12%	$ 952.40	0.73%	$ 1,110.25	0.85%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,653.56										
R-08	Structures	$ 81,840.38					$ 7,519.67	5.73%	$ 12,724.99	9.70%	$ 20,244.66	15.43%
R-10	Dayworks	$ 105.00										
R-11	Routine maintenance	$ 5,957.00					$ 196.00	0.15%	$ 147.00	0.11%	$ 343.00	0.26%
R-15	Provisional sum	$ 775.00										
	General items											
G-01	Security	$ 690.00					$ 345.00	0.26%	$ -	0.00%	$ 345.00	0.26%
G-02	Project team	$ 11,700.00					$ 2,750.00	2.10%	$ 2,750.00	2.10%	$ 5,500.00	4.19%
G-03	Safety and protection	$ 2,949.00										
G-05	Meetings	$ 100.00							$ 100.00	0.08%	$ 100.00	0.08%
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00							$ 100.00	0.08%	$ 100.00	0.08%
G-07	Mineral fees	$ 4,655.79										
A	**Construction cost**	**$ 98,501.72**					**$ 8,123.52**	**6.19%**	**$ 14,774.39**	**11.26%**	**$ 22,897.91**	**17.45%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 9,850.17**					**$ 812.35**	**0.62%**	**$ 1,477.44**	**1.13%**	**$ 2,289.79**	**1.75%**
C	**General items**	**$ 20,294.79**					**$ 3,095.00**	**2.36%**	**$ 2,950.00**	**2.25%**	**$ 6,045.00**	**4.61%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 2,572.93**					**$ 240.62**	**0.18%**	**$ 384.04**	**0.29%**	**$ 624.65**	**0.48%**
E	**Total**	**$ 131,219.62**					**$ 12,271.49**	***9.35%***	**$ 19,585.87**	***14.93%***	**$ 31,857.36**	***24.28%***

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C.S.dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

ANEXO C1 (LV19)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000
Contractor : Craeleki Bercoli Unip.Lda
No. kontratu : MPW-W-210143

Data Inspeksaun : 23/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Gunaba - Lukulai

Koordinat :


Start Point : Long : 125.36314054 Latetude : - 8.65021033
End Point : Long : 125.35645402 Latetude : - 8.640334040

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : ***Plum Concrete***

STA, 1+060 - 1+085




t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	4.00	30.00	14.40
Total			14.40

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch Item servisu : ***Plum Concrete***


STA, 1+060 - 1+085



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	4.00	25.00	12.00
Total			12.00



STA, 1+060 - 1+085



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	4.00	25.00	12.00
Total			12.00



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL


ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXO D (LV19)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN KADA PROJETO

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000

Naran Kompanha : Craeleki Bercoli Unip.Lda

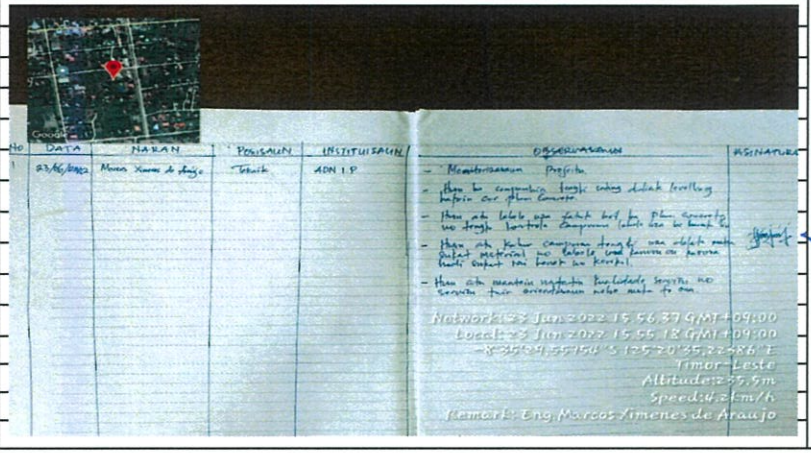No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	23/Junho/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV19)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000
Contract No : MPW-W-210143
Contractor : Craeleki Bercoli, Unip Lda

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	Mobilisation	$ 1,450.00					$ 150.00	**0.20%**	$ 750.00	**0.98%**	$ 900.00	1.18%
R-03	Earth work	$ 7,678.22							$ 200.00	**0.26%**	$ 200.00	0.26%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 1,725.20										
R-08	Structures	$ 37,465.76					$ 905.62	**1.19%**	$ 2,414.98	**3.16%**	$ 3,320.59	4.35%
R-11	Routine maintenance	$ 3,984.00					$ 300.00	**0.39%**	$ 2,856.00	**3.74%**	$ 3,156.00	4.13%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
					GENERAL ITEM							
G-01	Security	$ 1,500.00					$ 375.00	**0.49%**	$ 250.00	**0.33%**	$ 625.00	0.82%
G-02	Project team	$ 11,400.00					$ 2,400.00	**3.14%**	$ 2,400.00	**3.14%**	$ 4,800.00	6.28%
G-03	Safety and protection	$ 1,745.50							$ 1,745.50	**2.28%**	$ 1,745.50	2.28%
G-05	Meetings	$ 100.00							$ 100.00	**0.13%**	$ 100.00	0.13%
G-06	Ceremonial costs	$ 150.00					$ 75.00	**0.10%**	$ 37.50	**0.05%**	$ 112.50	0.15%
G-07	Mineral fees	$ 2,220.57										
A	**Construction cost**	**$ 52,553.18**					**$ 1,355.62**	**1.77%**	**$ 6,220.98**	**8.14%**	**$ 7,576.59**	**9.91%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 5,255.32**					**$ 135.56**	**0.18%**	**$ 622.10**	**0.81%**	**$ 757.66**	**0.99%**
C	**General items**	**$ 17,116.07**					**$ 2,850.00**	**3.73%**	**$ 4,533.00**	**5.93%**	**$ 7,383.00**	**9.66%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%**	**$ 1,498.49**					**$ 86.82**	**0.11%**	**$ 227.52**	**0.30%**	**$ 314.35**	**0.41%**
E	**Total**	**$ 76,423.05**					**$ 4,428.00**	**5.79%**	**$ 11,603.60**	**15.18%**	**$ 16,031.60**	**20.98%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C.S.dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

#ANEXO C2 (LV18)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu - Laberlaka Chaingane Chainage 2+500-5+400
Contractor : Claridade Unip.Lda
No. kontratu : MPW-W-210163

Data Inspeksaun : 8/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Berlakulidu - Laberlaka

Koordinat :


Start Point : Long : 125.29520251 Latetude : - 8.63329600
End Point : Long : 125.30192345 Latetude : - 8.641753681

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : ***Gabios***


STA, 2+200

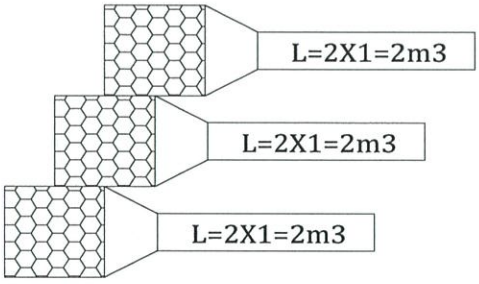



Sketch Item servisu : ***Excavation and disposal - soft soil***

STA, 4+300 - 4+400




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	100.00	55.00
Total			55.00 m³




Sketch Item servisu : ***Stone masonry***

STA, 4+300 - 4+400



t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	100.00	20.00
0.15	1.00		15.00
Total			35.00 m³

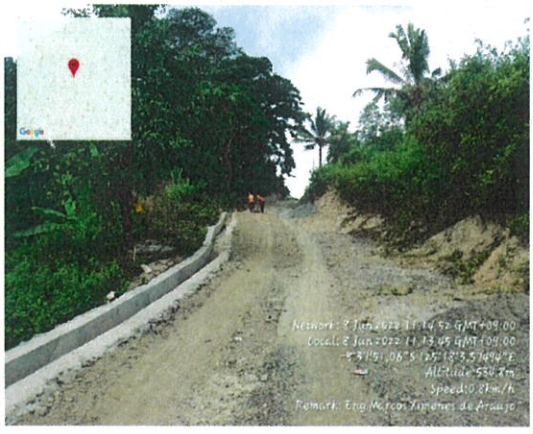

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (LV18)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN KADA PROJETO

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu - Laberlaka Chaingane Chainage 2+500-5+400

Naran Kompanha : Claridade Unipessoal.Lda

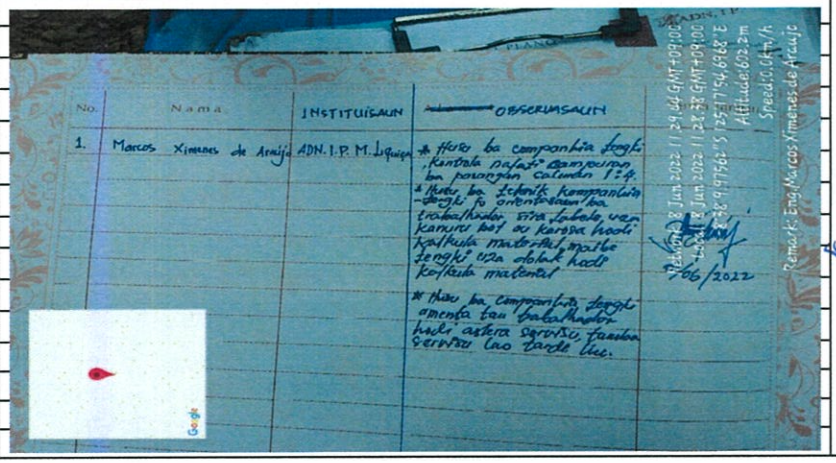No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	08/Abril/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4 5		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (LV18)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu - Laberlaka Chaingane Chainage 2+500-5+400
Contractor : Claridade Unip.Lda
No. kontratu : MPW-W-210163

SUMMARY												
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 2,700.00				$ 1,300.00	0.78%	$ 300.00	0.18%	$ 1,600.00	0.96%
R-02	Drainage	$ 319.00									
R-03	Earth work	$ 6,484.77				$ 801.90	0.48%	$ 1,025.50	0.61%	$ 1,827.40	1.09%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,196.00									
R-08	Structures	$ 109,034.33				$ 5,992.45	3.59%	$ 3,725.64	2.23%	$ 9,718.09	5.82%
R-10	Dayworks	$ 140.00									
R-11	Routine maintenance	$ 5,440.50				$ 273.00	0.16%	$ 4,364.50	2.61%	$ 4,637.50	2.78%
R-15	Provisional sum	$ 1,000.00									
GENERAL ITEM											
G-01	Security	$ 2,760.00				$ 920.00	0.55%			$ 920.00	0.55%
G-02	Project team	$ 12,180.00				$ 2,880.00	1.72%	$ 2,880.00	1.72%	$ 5,760.00	3.45%
G-03	Safety and protection	$ 2,513.00									
G-05	Meetings	$ 100.00						$ 100.00	0.06%	$ 100.00	0.06%
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00						$ 100.00	0.06%	$ 100.00	0.06%
G-07	Mineral fees	$ 5,996.91									
A	**Construction cost**	**$ 127,314.60**				**$ 8,367.35**	**5.01%**	**$ 9,415.64**	**5.64%**	**$ 17,782.99**	**10.64%**
B	Contractor Fee (A x 10%)	$ 12,731.46				$ 836.74	0.50%	$ 941.56	0.56%	$ 1,778.30	1.06%
C	General items	$ 23,749.91				$ 3,800.00	2.27%	$ 3,080.00	1.84%	$ 6,880.00	4.12%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	$ 3,275.92				$ 260.08	0.16%	$ 268.74	0.16%	$ 528.83	0.32%
E	**Total**	**$ 167,071.89**				**$ 13,264.17**	**7.94%**	**$ 13,705.95**	**8.20%**	**$ 26,970.11**	**16.14%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura, Transporte e irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C. S. dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

ANEXO C1 (LV16)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 5+000 - 10 +000, Liquica Municipality

Contractor : Caiulu Unip.Lda

No. kontratu : MOP - CD - NCB -R - 21035

Data Inspeksaun : 20/Junho/2022



Fatin Inspeksaun : Suco Asu-Manu

Koordinat :

Start Point : Long : 125.3469018 Latetude : - 8.680286396

End Point : Long : 125.3739113 Latetude : - 8.684259297

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

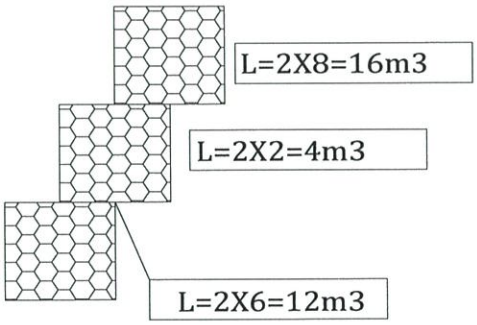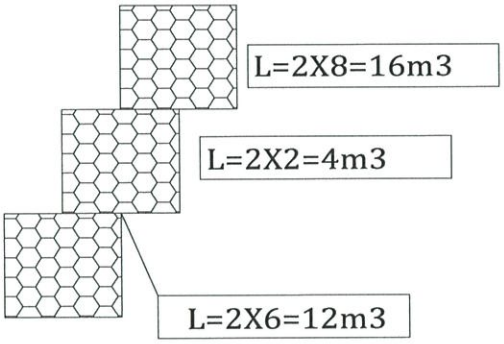Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : *Gabion* **Sta, 1+565 - 1+565** 	
Sketch Item servisu :Gabion **Sta, 1+565 - 1+565** 	

ANEXO C1 (LV16)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 5+000 - 10 +000, Liquica Municipality

Contractor : Caiulu Unip.Lda

No. kontratu : MOP - CD - NCB -R - 21035

Data Inspeksaun : 20/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Asu-Manu

Koordinat :

Start Point : Long : 125.3469018 Latetude : - 8.680286396


End Point : Long : 125.3739113 Latetude : - 8.684259297

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 1+590 - 1+640




Area	*Distacia*	*Volume*
0.35	50.00	17.50
Total		17.50 m³

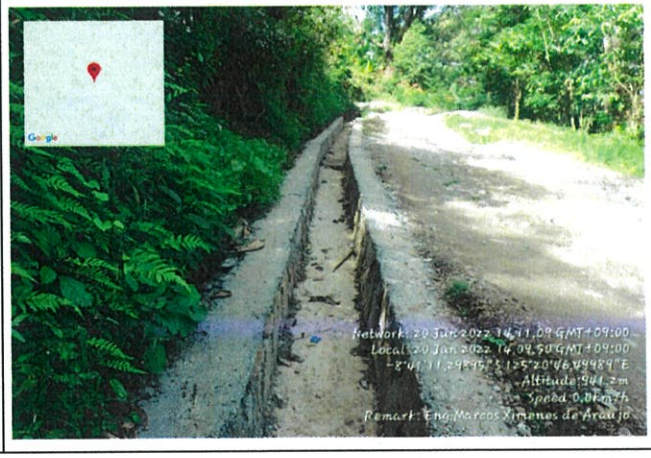


Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 1+590 - 1+640



Area	*Distacia*	*Volume*
0.35	50.00	17.50
Total		17.50 m³

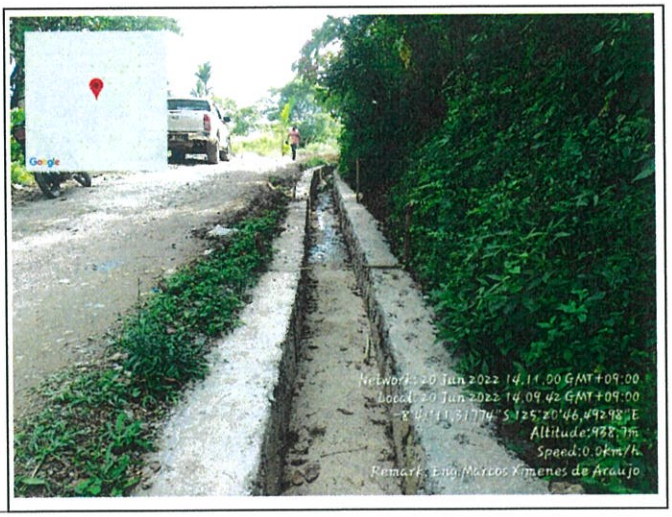

ANEXO C1 (LV16)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 5+000 - 10 +000, Liquica Municipality
Contractor : Caiulu Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD - NCB -R - 21035

Data Inspeksaun : 20/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Asu-Manu

Koordinat :


Start Point :	Long :	125.3469018	Latetude	: - 8.680286396
End Point :	Long :	125.3739113	Latetude	: - 8.684259297

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Excavation*

Sta, 2+200 - 2+294




T	*W*	*Distacia*	*Volume*
0.12	4	94.00	45.12
Total			**45.12** m³

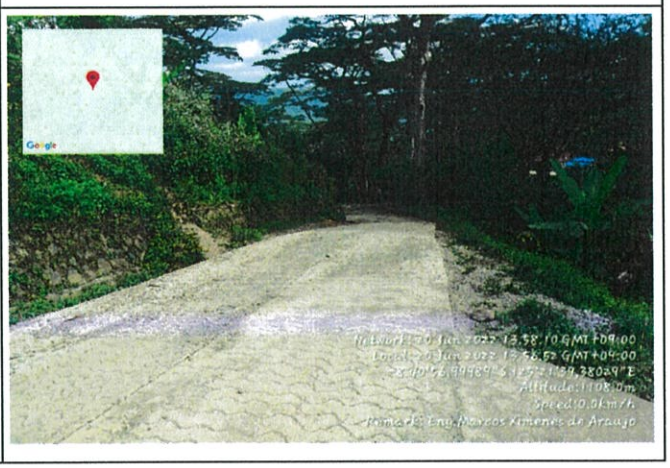

Sketch Item servisu : *Excavation*

Sta, 3+900 - 4+024



T	*W*	*Distacia*	*Volume*
0.12	4	124.00	59.52
Total			**59.52** m³



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV16)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu Chainage 5+000-10+000)

Kompanha : Caiulu Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	20/Junho/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1		
					2	Companhia laiha Prepara Buku tamu iha Tereno	
					3		
					4		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV16)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu Chainage 5+000-10+000)
Contract No : MPW-W-210154
Contractor : Caiulu Unipessoal.Lda

SUMMARY

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 1,700.00				$ 375.00	0.23%	$ 475.00	0.29%	$ 850.00	0.52%
R-02	Drainage	$ 174.10									
R-03	Earth work	$ 11,371.21				$ 215.05	0.13%	$ 1,170.09	0.72%	$ 1,385.14	0.85%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 8,458.48									
R-08	Structures	$ 82,977.14				$ 4,862.44	3.00%	$ 17,787.04	10.97%	$ 22,649.48	13.96%
R-11	Routine maintenance	$ 11,409.50				$ 280.00	0.17%	$ 280.00	0.17%	$ 560.00	0.35%
R-15	Provisional sum	$ 250.00									
	General items										
G-01	Security	$ 1,800.00				$ 450.00	0.28%	$ 300.00	0.18%	$ 750.00	0.46%
G-02	Project team	$ 15,900.00				$ 3,300.00	2.03%	$ 3,300.00	2.03%	$ 6,600.00	4.07%
G-03	Safety and protection	$ 4,618.00						$ 4,618.00	2.85%	$ 4,618.00	2.85%
G-05	Meetings	$ 100.00						$ 100.00	0.06%	$ 100.00	0.06%
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00						$ 100.00	0.06%	$ 100.00	0.06%
G-07	Mineral fees	$ 8,442.11									
A	**Construction cost**	**$ 116,340.43**				**$ 5,732.49**	**3.53%**	**$ 19,712.12**	**12.15%**	**$ 25,444.61**	**15.69%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 11,634.04**				**$ 573.25**	**0.35%**	**$ 1,971.21**	**1.22%**	**$ 2,544.46**	**1.57%**
C	**General items**	**$ 31,060.11**				**$ 3,750.00**	**2.31%**	**$ 8,418.00**	**5.19%**	**$ 12,168.00**	**7.50%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 3,180.69**				**$ 201.11**	**0.12%**	**$ 602.03**	**0.37%**	**$ 803.14**	**0.50%**
E	**Total**	**$ 162,215.27**				**$ 10,256.85**	**6.32%**	**$ 30,703.36**	**18.93%**	**$ 40,960.22**	**25.25%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto
Infraestructura, Transporte e irigaaun

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C.S.dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

ANEXO C1 (MBR12)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality
Contractor : Nheu Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21027

Data Inspeksaun : 28/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Vaviquenia-Maubaralisa

Koordinat :


Start Point : Long : 125.21124422 Latetude : -8.61803763
End Point : Long : 125.2281181 Latetude : -8.632661686

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 3+820 - 3+920




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	100.00	20.00
0.15	1.00		15
Total			35.00 m3



Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 3+820 - 3+920




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	100.00	20.00
0.15	1.00		15
Total			35.00 m3



Sketch Item servisu : Excavation

STA, 3+820 - 3+920



t	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	100.00	55.00
Total			55.00 m3



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR12)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality

Kompanha : Nheu Unip,Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/Junho/2022	Lquica/Maubara	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Halo monitorizasaun iha tereno	
					2	Teknik Kompanhia laiha tereno	
					3		
					4		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (MBR12)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality
Naran Companhia : Nheu Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21027

SUMMARY											
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 3,458.00				$ 250.00	0.14%	$ 800.00	0.46%	$ 1,050.00	0.61%
R-02	Drainage	$ 281.40									
R-03	Earth work	$ 12,812.63				$ 2,921.05	1.68%	$ 6,929.57	3.99%	$ 9,850.62	5.68%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 546.98									
R-08	Structures	$ 103,036.65				$ 36,240.41	20.89%	$ 2,489.20	1.43%	$ 38,729.61	22.32%
R-10	Dayworks	$ 210.00									
R-11	Routine maintenance	$ 6,112.00				$ 720.00	0.42%	$ 1,002.00	0.58%	$ 1,722.00	0.99%
R-15	Provisional sum	$ 500.00									
	General items										
G-01	Security	$ 3,600.00				$ 1,500.00	0.86%			$ 1,500.00	0.86%
G-02	Project team	$ 11,580.00				$ 4,940.00	2.85%			$ 4,940.00	2.85%
G-03	Safety and protection	$ 7,441.55						$ 7,441.55	4.29%	$ 7,441.55	4.29%
G-05	Meetings	$ 100.00						$ 100.00	0.06%	$ 100.00	0.06%
G-06	Ceremonial costs	$ 350.00				$ 350.00				$ 350.00	0.20%
G-07	Mineral fees	$ 7,357.99									
A	**Construction cost**	**$ 126,957.66**				**$ 40,131.46**	**23.13%**	**$ 11,220.77**	**6.47%**	**$ 51,352.23**	**29.60%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 12,695.77**				**$ 4,013.15**	**2.31%**	**$ 1,122.08**	**0.65%**	**$ 5,135.22**	**2.96%**
C	**General items**	**$ 30,429.54**				**$ 6,790.00**	**3.91%**	**$ 7,541.55**	**4.35%**	**$ 14,331.55**	**8.26%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 3,401.66**				**$ 1,018.69**	**0.59%**	**$ 397.69**	**0.23%**	**$ 1,416.38**	**0.82%**
E	**Total**	**$ 173,484.62**				**$ 51,953.30**	**29.95%**	**$ 20,282.08**	**11.69%**	**$ 72,235.38**	**41.64%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C. S. dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

ANEXO C1 (MBR13)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality
Contractor : Murak Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21032

Data Inspeksaun : 28/Junho/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Maubaralisa

Koordinat :


Start Point : Long : 125.22682227 Latetude : -8.644211521
End Point : Long : 125.2382274 Latetude : -8.672448189

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 3+790-3+920




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	130.00	26.00
0.15	1.00		19.5
Total			45.50 m3




Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 3+790-3+920




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	130.00	26.00
0.15	1.00		19.5
Total			45.50 m3

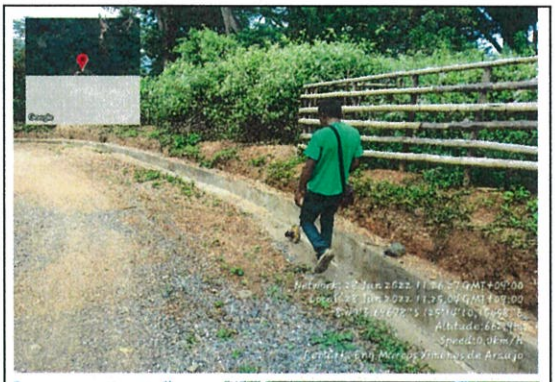


Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 3+790-3+920



t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	130.00	26.00
0.15	1.00		19.5
Total			45.50 m3

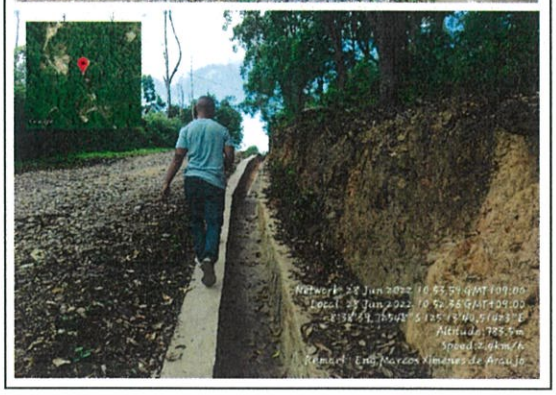

ANEXO C1 (MBR13)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality
Contractor : Murak Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21032

Data Inspeksaun : 11/Maio/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Maubaralisa

Koordinat :


Start Point : Long : 125.22682227 Latetude : -8.644211521
End Point : Long : 125.2382274 Latetude : -8.672448189

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+760-1+785




t	w	*Distacia*	*Volume*
1.00	0.55	25.80	14.19
Total			14.19 m3




Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+760-1+785




t	w	*Distacia*	*Volume*
1.00	0.55	25.80	14.19
Total			14.19 m3

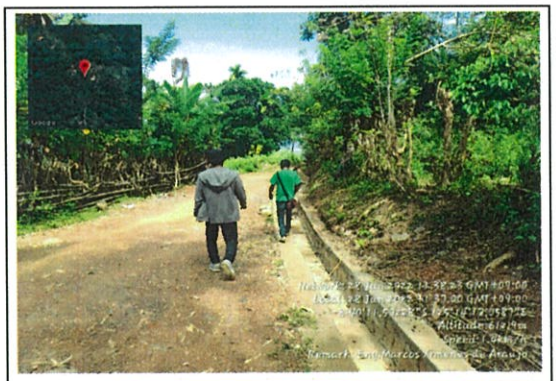


Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+760-1+785



t	w	*Distacia*	*Volume*
1.00	0.55	25.80	14.19
Total			14.19 m3

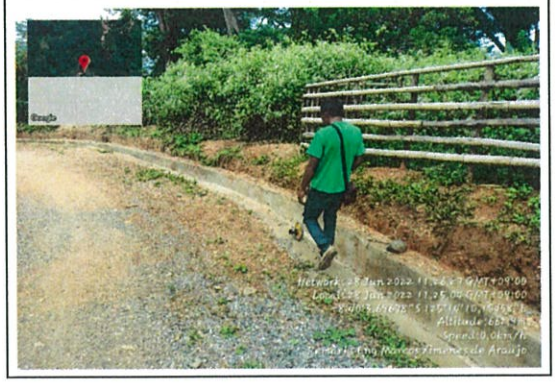

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL


ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR13)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality

Kompanha : Murak Unip,Lda

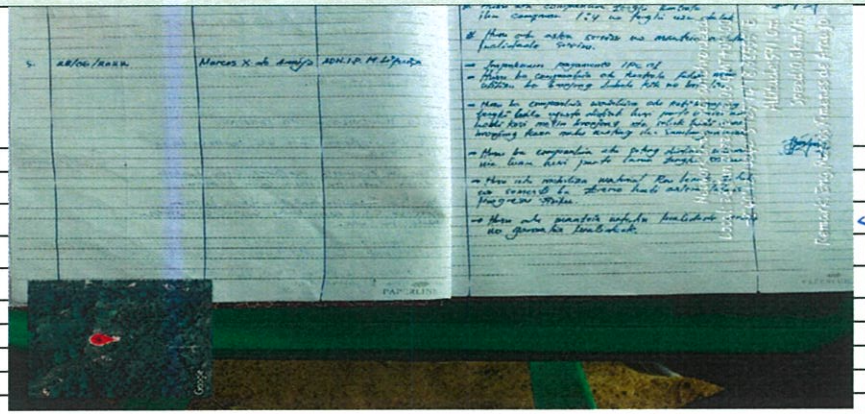No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/Junho/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

#ANEXO C2 (MBR13)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality

Contractor : Murak Unip.Lda

No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21032

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	%	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 3,030.00		$ 850.00	0.56%		$ 550.00	0.36%	$ 300.00	0.20%	$ 850.00	0.56%
R-02	Drainage	$ 25.95										
R-03	Earth work	$ 9,149.46		$ 2,962.94	1.94%		$ 1,921.26	1.26%	$ 1,041.68	0.68%	$ 2,962.94	1.94%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 5,890.13										
R-08	Structures	$ 71,162.98		$ 15,577.63	10.18%		$ 7,227.97	4.72%	$ 8,349.67	5.46%	$ 15,577.63	10.18%
R-10	Dayworks	$ 105.00										
R-11	Routine maintenance	$ 10,808.86		$ 6,131.88	4.01%		$ 1,211.28	0.79%	$ 4,920.60	3.22%	$ 6,131.88	4.01%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
	GENERAL ITEM											
G-01	Security	$ 3,000.00		$ 1,250.00	0.82%		$ 1,250.00	0.82%		0.00%	$ 1,250.00	0.82%
G-02	Project team	$ 23,400.00		$ 12,000.00	7.84%		$ 11,000.00	7.19%	$ 1,000.00	0.65%	$ 12,000.00	7.84%
G-03	Safety and protection	$ 6,131.00		$ 3,633.50	2.37%				$ 3,633.50	2.37%	$ 3,633.50	2.37%
G-05	Meetings	$ 100.00		$ 100.00	0.07%				$ 100.00	0.07%	$ 100.00	0.07%
G-06	Ceremonial costs	$ 300.00		$ 150.00	0.10%				$ 150.00	0.10%	$ 150.00	0.10%
G-07	Mineral fees	$ 6,653.08										
A	**Construction cost**	**$ 100,422.37**		**$ 25,522.45**	**16.68%**		**$ 10,910.51**	**7.13%**	**$ 14,611.94**	**9.55%**	**$ 25,522.45**	**16.68%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 10,042.24**		**$ 2,552.24**	**1.67%**		**$ 1,091.05**	**0.71%**	**$ 1,461.19**	**0.95%**	**$ 2,552.24**	**1.67%**
C	**General items**	**$ 39,584.08**		**$ 17,133.50**	**11.19%**		**$ 12,250.00**	**8.00%**	**$ 4,883.50**	**3.19%**	**$ 17,133.50**	**11.19%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 3,000.97**		**$ 904.16**	**0.59%**		**$ 485.03**	**0.32%**	**$ 419.13**	**0.27%**	**$ 904.16**	**0.59%**
E	**Total**	**$ 153,049.66**		**$ 46,112.36**	**30.13%**		**$ 24,736.59**	**16.16%**	**$ 21,375.77**	**13.97%**	**$ 46,112.36**	**30.13%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C.S. dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

 # ANEXO C1 (MBR16)
Back-up Data

Naran Projeto R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)
Contractor : Luliana Unip,Lda
No. kontratu MPW-W-210160

Data Inspeksau 28/Junho/2022

Fatin Inspeksau Suco Vaviquenia - Maubaralisa


Koordinat :
Start Point : Long : 125.22811811 Latetude : -8.6326617
End Point : Long : 125.21757267 Latetude : -8.649459943

Naran Inspekto 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 3+260 - 3+310




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m3

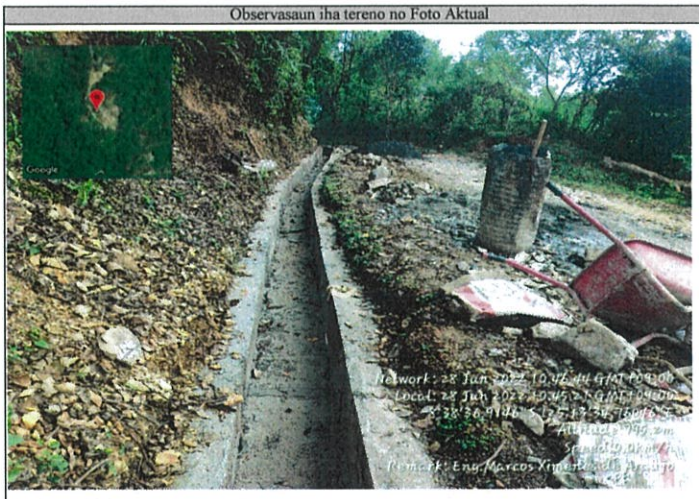


Sketch Item servisu : ***Excavation***

STA, 3+260 - 3+310




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	50.00	55.00
Total			55.00 m3

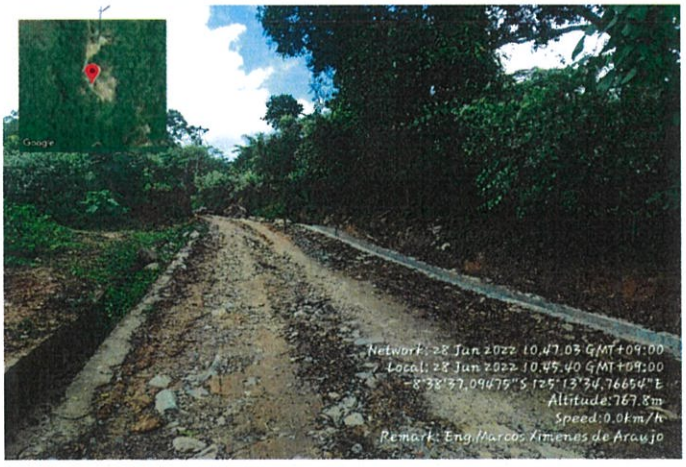

Sketch Item servisu : ***Gabion***

STA, 0 + 600

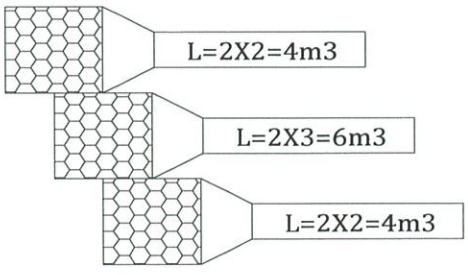



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR16)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)

Kompanha : Luliana Unip,Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/Junho/2022	Lquica/Maubara	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Monitorizasaun Projeitu	
					2	Bukua Tamu laiha atu priense	
					3		
					4		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (MBR16)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)
Contract No : MPW-W-210160
Contractor : Luliana,Unip Lda

SUMMARY

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 4,580.00					$ 725.00	0.34%	$ 825.00	0.39%	$ 1,550.00	0.72%
R-02	Drainage	$ 393.96										
R-03	Earth work	$ 9,548.23					$ 816.82	0.38%	$ 753.34	0.35%	$ 1,570.16	0.73%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,334.15										
R-08	Structures	$ 143,293.67					$ 9,708.04	4.54%	$ 2,102.19	0.98%	$ 11,810.23	5.52%
R-10	Dayworks	$ 140.00										
R-11	Routine maintenance	$ 5,922.00					$ 240.00	0.11%	$ 4,788.00	2.24%	$ 5,028.00	2.35%
R-15	Provisional sum	$ 500.00										
	GENERAL ITEM											
G-01	Security	$ 3,600.00					$ 1,500.00	0.70%		0.00%	$ 1,500.00	0.70%
G-02	Project team	$ 10,300.00					$ 4,380.00	2.05%		0.00%	$ 4,380.00	2.05%
G-03	Safety and protection	$ 3,204.50							$ 3,204.50	1.50%	$ 3,204.50	1.50%
G-05	Meetings	$ 100.00										
G-06	Ceremonial costs	$ 350.00					$ 175.00	0.08%		0.00%	$ 175.00	0.08%
G-07	Mineral fees	$ 8,797.79										
A	**Construction cost**	**$ 166,712.01**					**$ 11,489.85**	**5.37%**	**$ 8,468.53**	**3.96%**	**$ 19,958.38**	**9.33%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 16,671.20**					**$ 1,148.99**	**0.54%**	**$ 846.85**	**0.40%**	**$ 1,995.84**	**0.93%**
C	**General items**	**$ 26,352.29**					**$ 6,055.00**	**2.83%**	**$ 3,204.50**	**1.50%**	**$ 9,259.50**	**4.33%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 4,194.71**					**$ 373.88**	**0.17%**	**$ 250.40**	**0.12%**	**$ 624.27**	**0.29%**
E	**TOTAL**	**$ 213,930.21**					**$ 19,067.72**	**8.91%**	**$ 12,770.28**	**5.97%**	**$ 31,838.00**	**14.88%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Remigio da C.S.dos Santos
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

Municipio / Posto

2022

JUNHO

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	OBS
Liquica Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubura (A03) & Carimbala - Loes (A03) Muncipality Liquica /162	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Pagamentu tesdauk 100%
							Actual																																
	2	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	FHO
							Actual																																
	3	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	PHO
							Actual																																
	4	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquca Municipality	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)	Luquefi Oan Unip.Lda	MPW-W-210150	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu Chainage 5+000-10+000)	Cailu Unip.Lda	MPW-W-210154	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leorema Chainage 0+000-5+000)	Vicaroman Unip.Lda	MPW-W-210155	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)	Metalika Unipessoal, Lda	MPW-W-210151	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700)	Prudencia Construction Unip.Lda	MPW-W-210153	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	10	Manutensaun Kanais Irigasaun Faulara - Liquica	Banir Lema Unip.Lda		LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																	PHO
							Actual																																
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)	Goubara Unip.Lda	MPW-W-210162	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 2+500-5+400)	Claridade Unip.Lda			MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba- Lukulai Chainage 0+000-2+000)	Craeleki Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	14	Road Maintenance Section Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (A03)	Chantel Chander Unip.Lda	MPW-W-210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	15				LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	16	Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica	Roman Furak Unip.Lda	NCB:16/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																
	17	For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubura-Carimabala-Loes (A03)	Chanel Chander Unip.Lda	MPW-W210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
Maubara (MBR)	1	Addt. Ponte liga Maubara	Fu Unip.Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																
	2	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Setvisu iha Tereno 100% ona no hein Pedido Pagamentu
							Actual																																
	3	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																
	4	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabue - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Ekipa ADN.I.P nebe maka toma konta Projeito IMPRESTIMO
							Actual																																
	5	R4D Rural Road Maintenance Berlakuidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500	Luliana Unip.Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	PHO
							Actual																																
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200)	Nheu.Unip.Lda	MPW-W-210164	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-2+000) Liquica Municipality	Rito-Pu Unip.Lda	MPW-W-210146	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 4+800-9+600)	Malibo Unip.Lda	MPW-W-210156	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 0+000-4+800)	Murak Unip.Lda	MPW-W-210157	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	10	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 8+400-12+500)	Meta Loe Crae Bau.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo-Gisu Chainage 0+000-2+000)	Nazico Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	Luliana Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
Bazartete (BZT)	1	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	Banir Lema	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	FHO
							Actual																																
	2	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	FHO
							Actual																																
	4	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-P02019.19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																	
							Actual																																
	5	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Lisquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-K)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																
	6	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																
	7	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan																																	
							Actual																																
	8	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	Naesalobu	MAP-P02019.19532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																	
							Actual																																
	9	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																
	10	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																
	11	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																	
							Actual																																
	12	Emergency Project For Tibar River	Sali-Magu Unip.Lda	RT/067/MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	PHO
							Actual																																
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000)	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	14	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Fatumasi Chainage 0+000-2+300) Liquica Municipality	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210142	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality	Hatuleo Unip.Lda	MPW-W-210144	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	16	Routine Maintenance Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000-10+000	Craeleki Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	17	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 3+000-6+500) Liquica Municipality	TM.Caileba Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
		TOTAL PROJETO ON-GOING																																					

Note:

Plano Periode Inspesaun iha tereinu | Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili | Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu | Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu | Iha Edifisio Municipio Liquica

Prepara Husi :

(Eng.Marcos Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infrastructura, Transportes e Irigasaun Municipio

Sertifika Husi :

(Eng.Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN.I.P

Aprova Husi :

(Eng.Januario Maia Guteres)
Adjunto Director Executivo ADN.I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JUNHO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	OBS
Liquica Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Pagamentu scidauk 100%
							Actual																																
	2	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	FHO
							Actual																																
	3	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	PHO
							Actual																																
	4	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)	Luqueli Oan Unip.Lda	MPW-W-210150	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu Chainage 5+000-10+000)	Cailu Unip.Lda	MPW-W-210154	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leorema Chainage 0+000-5+000)	Vicaroman Unip.Lda	MPW-W-210155	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)	Metalika Unipessoal, Lda	MPW-W-210151	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700)	Prudencia Construction Unip.Lda	MPW-W-210153	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	10	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	Banir Lema Unip.Lda		LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																	PHO
							Actual																																
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)	Goubara Unip Lda	MPW-W-210162	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 2+500-5+400)	Claridade Unip Lda			MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba- Lukulai Chainage 0+000-2+000)	Craeleki Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	14	Road Maintenance Section Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (A03)	Chantel Chander Unip.Lda	MPW-W-210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	15				LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	16	Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica	Roman Furak Unip.Lda	NCB:16/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																
	17	For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimbala-Loes (A03)	Chanel Chander Unip.Lda	MPW-W210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
Maubara (MBR)	1	Addt. Poste liga Maubara	Fu Unip,Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																
	2	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Setrvisu iha Tereno 100% ona no hein Pedido Pagamentu
							Actual																																
	3	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																
	4	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Ekipa ADN.I.P nebe maka toma konta Projeito IMPRESTIMO
							Actual																																
	5	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500	Luliana Unip.Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	PHO
							Actual																																
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200)	Nheu.Unip.Lda	MPW-W-210164	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-2+000) Liquica Municipality	Rito-Pu Unip.Lda	MPW-W-210146	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 4+800-9+600)	Malibo Unip.Lda	MPW-W-210156	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 0+000-4+800)	Murak.Unip.Lda	MPW-W-210157	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	10	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 8+400-12+500)	Meta Loe Crae Bau.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo-Gisu Chainage 0+000-2+000)	Nazico.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	Luliana Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
Bazartete (BZT)	1	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	Banir Lema	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	FHO
							Actual																																
	2	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	FHO
							Actual																																
	4	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																	
							Actual																																
	5	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																
	6	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																
	7	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan																																	
							Actual																																
	8	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	Naesalobu	MAP-P02019:19532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																	
							Actual																																
	9	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																
	10	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																
	11	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																	
							Actual																																
	12	Emergency Project For Tibar River	Sali-Magu Unip.Lda	RT/067/MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	PHO
							Actual																																
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000)	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	14	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Fatumasi Chainage 0+000-2+300) Liquica Municipality	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210142	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality	Hatuleo Unip.Lda	MPW-W-210144	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	16	Routine Maintenance Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000-10+000	Craeleki Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
	17	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 3+000-6+500) Liquica Municipality	TM.Caileba.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																						

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu | Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili | Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu | Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu | Iha Edifício Municipio Liquica

Prepara Husi :

(Eng.Marcos Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infrastructura, Transportes e Irigasaun Municipio

Sertifika Husi :

(Eng.Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN.I.P

Aprova Husi :

(Eng.Januario Maia Guteres)
Adjunto Director Executivo ADN.I.P

#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Data Inspesaun : 14 Junho 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 33. 307''**, Latetude : .....


End Point : Long : **E 125º 20' 30. 962''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

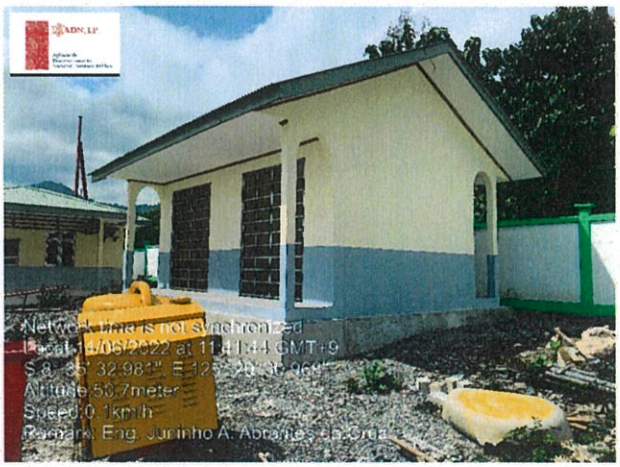Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu Foun Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building iha Liquisa, obra husi Ministeriu Saude husi fundu Covid no kaer husi kompania Zyc Unip. Lda.	

#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu konstrusaun uma ba genset nian kuaze finaliza ona, maibe iha buat kiik ruma neebe kompania presija hadia tutuir fila fali hanesan, *lisplank galvalume 0,42 mm* neebe presija sobu ou hadia halo rapi fila fali hodi labele iha leet ruma, no plesteran balu neebe nakfera fali.	


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP mos kordena ona ho kompania atu bele iha kordenasaun antes instala linha ou item eletrisidade nian ba iha ekipa tekniku Eletrisidade projeitu nain nian no ekipa tekniku Eletrisidade ADN, IP nian atu bele akompania hamutuk.	

#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

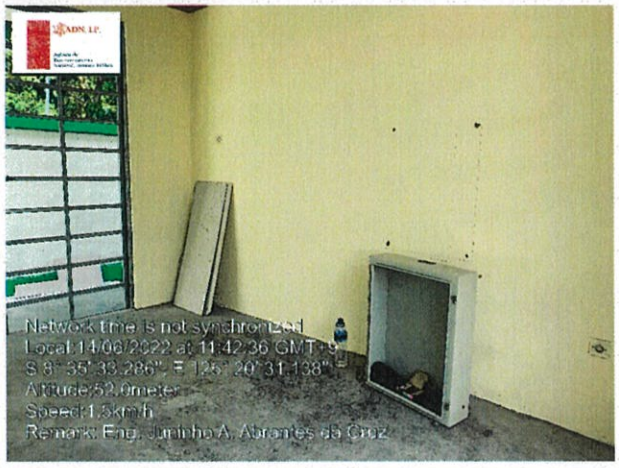Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

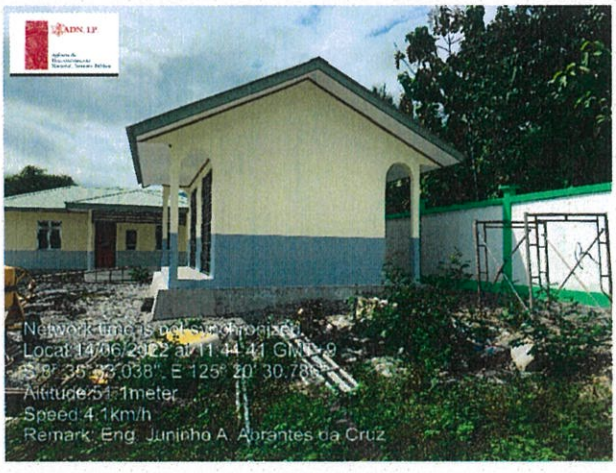Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Project Name : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Location : Liquica Municipality - Timor Leste
Project Owner : Ministry of Health

#ANEXU C2 - (BZT22)			VERIFIED BY A D N , I P										
NO	DESCRIPTION	Amount (USD)	PREVIOUS	% BILLED	THIS BILLING	% BILLED	TO DATE	% BILLED	PROGRESU IHA TERENU				TOTAL %
									FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%	
I	PREPARATION WORKS	$ 4,200.00							$ 2,100.00	3.61%	$ -	0.00%	3.61%
II	NEW INSTALLATION LOW VOLTAGE (LV) LINE	$ 1,044.00							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
III	MAIN CONNECTION TO ISOLATION INCLUDE PROVIDE GENSET	$ 22,726.44							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
IV	CONSTRUCTION HOUSE FOR GENSET	$ 15,040.67							$ 6,525.38	11.22%	$ 812.05	1.40%	12.61%
V	FINAL CLEARING	$ 1,000.00							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
A	GRAND TOTAL	$ 44,011.11							$ 8,625.38	14.83%	$ 812.05	1.40%	16.22%
B	Fee Contractor(10% x A)	$ 4,401.11							$ 862.54	1.48%	$ 81.21	0.14%	1.62%
C	Overhead	$ 4,300.00							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
D	TAX 2% x (A + B + C)	$ 1,054.24							$ 189.76	0.33%	$ 17.87	0.03%	0.36%
E	CONTIGENCY (10% x A)	$ 4,401.11							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
F	TOTAL PROJECT COST (A + B + C + D + E)	$ 58,167.58							$ 9,677.68	16.64%	$ 911.12	1.57%	18.20%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edifício Publiku, Be e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT22)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica

Kompanha : Zyc Unipessoal Lda

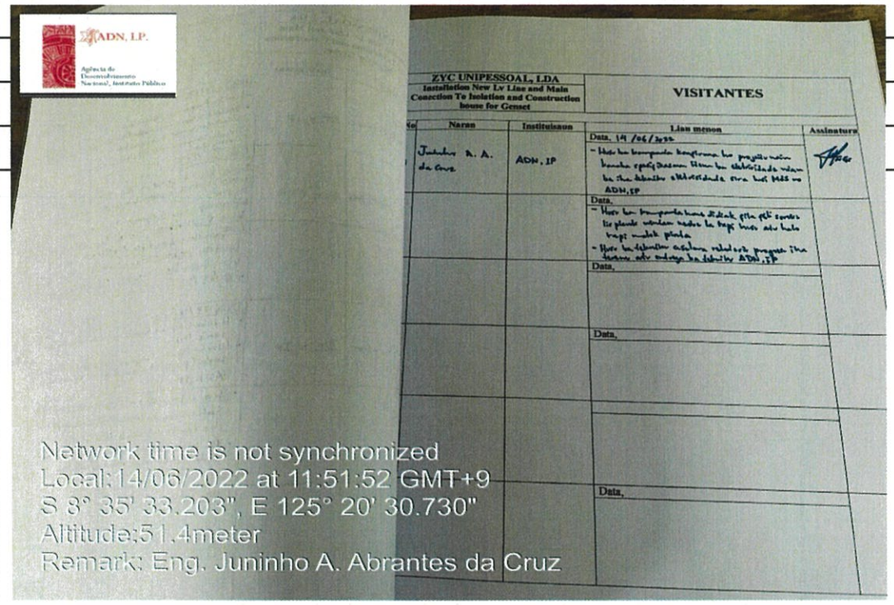No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	14/06/2022	Maumeta, Liquisa	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (BZT23)

Back-up Data

Naran Projeto : Projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica
Kompania : U-Rema Unip. Lda.
No. kontratu : NCB:15/MEJD/DNA/2021

Data Inspesaun : 20 Junho 2022

Fatin Inspesaun : Leorema - Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 40' 43. 435''**, Latetude : .....


End Point : Long : **E 125º 22' 18. 833''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....


4. .....

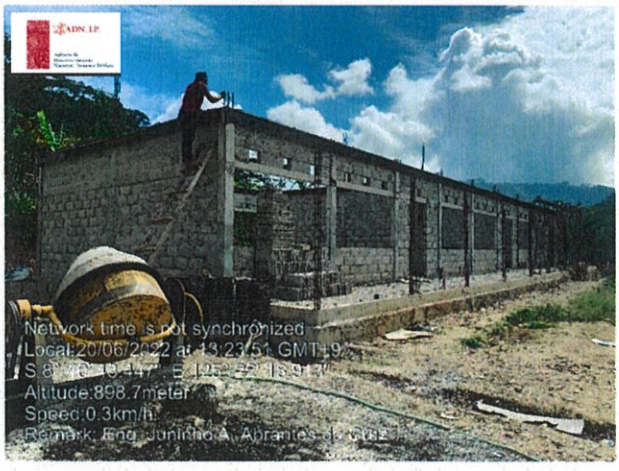Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema lokaliza iha suku Leorema, Bazartete, Munisipiu Liquisa projeitu nee kaer husi kompania U-Rema Unip. Lda.	

#ANEXU C1 – (BZT23)

Back-up Data


Naran Projeto : Projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica
Kompania : U-Rema Unip. Lda.
No. kontratu : NCB:15/MEJD/DNA/2021

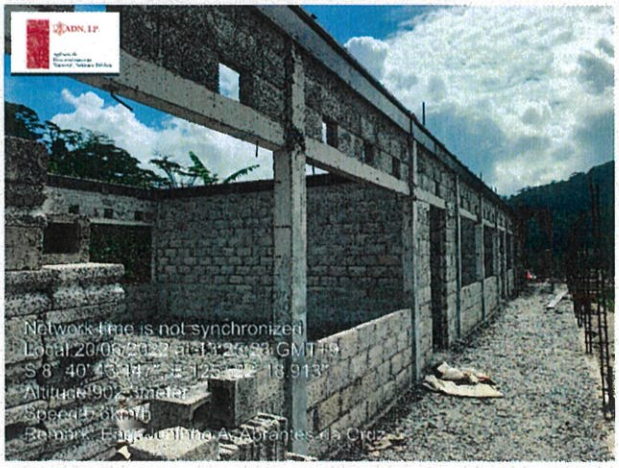Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu konstrusaun refere kompania halo ona too iha preparasaun ba fui betaun *top beam* nian neebe sei halao iha loron tuir mai no karta despaisu hetan ona husi Laboratorium ADN, IP. Atu akompania no foti amostra hodi ba teste iha Lab. ADN, IP.	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba servisu konstrusaun toilet (figura iha sorin) nian mos lao hela no kompania kontinua halo instalasaun ba pipa no *back fill* fila fali atu nunee sei halo fali pemadatan. Ba konstrusaun klase C (unit 2) lao kuaze hanesan no ba *teacher office* foin halao servisu hada batako.	

#ANEXU C1 – (BZT23)

Back-up Data

Naran Projeto : Projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica
Kompania : U-Rema Unip. Lda.
No. kontratu : NCB:15/MEJD/DNA/2021

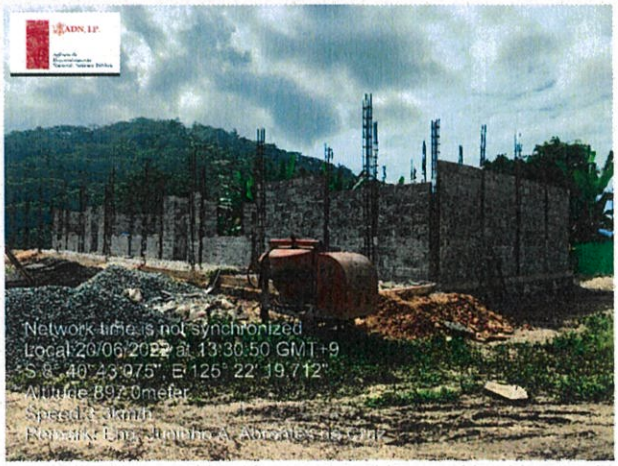Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

#ANEXU C1 – (BZT23)

Back-up Data

Naran Projeto : Projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica
Kompania : U-Rema Unip. Lda.
No. kontratu : NCB:15/MEJD/DNA/2021

Data Inspesaun : 21 Junho 2022

Fatin Inspesaun : Leorema - Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 40' 43. 435''**, Latetude : .....


End Point : Long : **E 125º 22' 18. 833''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

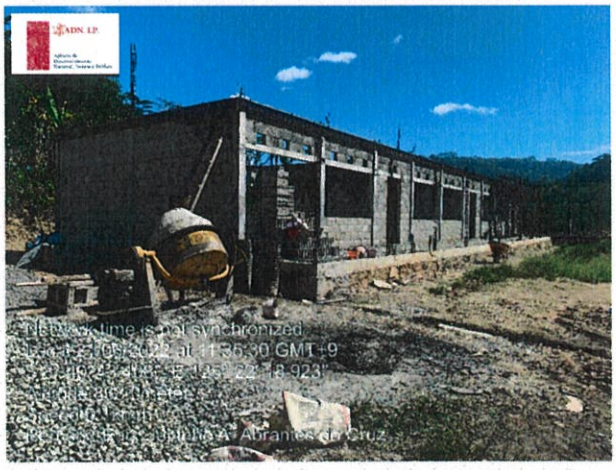Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema lokaliza iha suku Leorema, Bazartete, Munisipiu Liquisa projeitu nee kaer husi kompania U-Rema Unip. Lda.	

#ANEXU C1 – (BZT23)

Back-up Data

Naran Projeto : Projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica
Kompania : U-Rema Unip. Lda.
No. kontratu : NCB:15/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Liquisa kordena ho tekniku Laboratorium ADN, IP hamutuk ho tekniku no Diretor kompania akompania hamutuk no foti amostra ba servisu betaun *top beam* ninian ba konstrusaun klase C ninian.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Rezultadu *slump test* tuir kompozisaun neebe hetan husi Obras Publica nian hetan (8 mm – 9 mm – 12 mm). Tekniku Lab. ADN, IP mos halao *hammer test* ba iha *ground beam* hanesan alternativu ida ba rezultadu teste laboratorium ba amostra refere neebe la passa no sei bazeia ba fali rezultadu *hammer test* ida nee.	

#ANEXU C1 – (BZT23)

Back-up Data

Naran Projeto : Projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica
Kompania : U-Rema Unip. Lda.
No. kontratu : NCB:15/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA TECNICA VOCASIONAL LEOREMA
FATIN PROJEITO : LEOREMA , BAZARTETE
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

# ANEXU C2 - (BZT23)			VERIFIED BY A D N , I P									
NO	WORK DESCRIPTION	AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
			FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	$ 3,035.00	$ 1,517.50	0.57%	$ -	0.00%					$ 1,517.50	0.57%
II	CLASSROOM BUILDING C 2 UNIT (2 X 56653.93)	$ 113,269.89	$ 28,317.47	10.72%	$ 2,265.40	0.86%					$ 30,582.87	11.57%
III	TEACHER OFFICE	$ 77,944.01	$ 7,794.40	2.95%	$ 779.44	0.29%					$ 8,573.84	3.24%
IV	TOILET BUILDING	$ 30,577.69	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	$ 6,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	$ 230,826.59	$ 37,629.37	14.24%	$ 3,044.84	1.15%					$ 40,674.21	15.39%
B	PROFIT 10% X A	$ 23,082.66	$ 3,762.94	1.42%	$ 304.48	0.12%					$ 4,067.42	1.54%
C	OVERHEAD	$ 5,170.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
D	TAX 2% X (A + B + C)	$ 5,181.58	$ 827.85	0.31%	$ 66.99	0.03%					$ 894.83	0.34%
E	CONTIGENCY	$ 4,500.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
F	GRAND TOTAL	$ 264,260.83	$ 42,220.16	15.98%	$ 3,416.31	1.29%					$ 45,636.47	17.27%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edificio Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT23)



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN ESTV LEOREMA

Kompania : U-REMA UNIP. LDA.

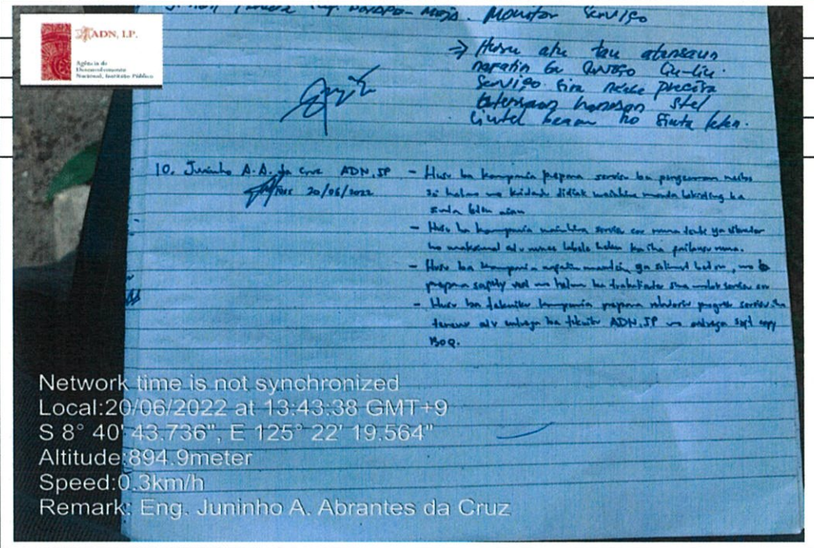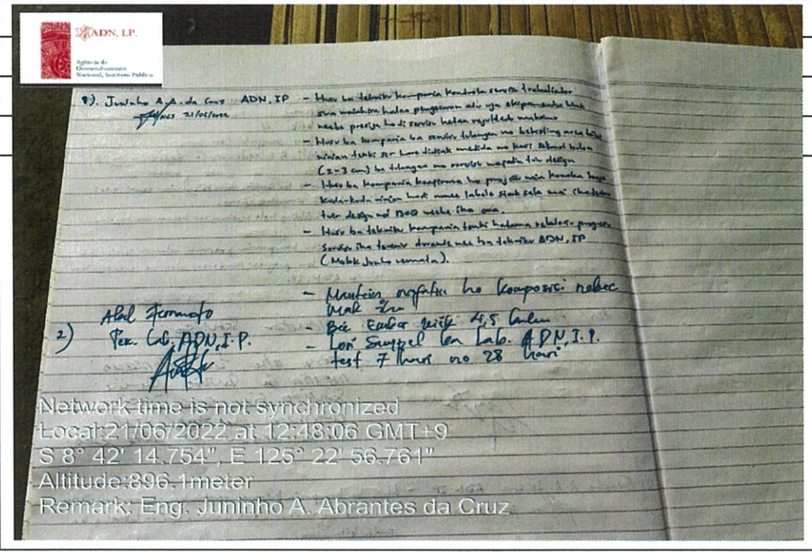No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	20/06/2022	Leorema, Liquisa	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquisa	1 2 3 4 5		
II	21/06/2022	Leorema, Liquisa	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (BZT24)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura Bazartete
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 20 Junho 2022

Fatin Inspesaun : Leorema - Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 39' 21. 442''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 22' 51. 232''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu foun husi MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EPE Baura lokaliza iha suku Leorema, postu Bazartete, Munisipiu Liquisa projeitu nee kaer husi servisu grupu komunitariu.	

#ANEXU C1 – (BZT24)
Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura Bazartete
Kompania :
No. kontratu :


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Reprezentante husi eskola suku refere no reprezentante trabaliador grupu sira hatoo katak servisu konstrusaun refere para kuaze fulan ida resin ona tanba grupu hein hela rezultadu husi projeitu nain konaba orsamentu segundu periodu ninian.	


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tekniku munisipiu ADN, IP mos foo ona instrusaun ba grupu atu nunee bele tenta ba projeitu nain konaba prosesu ida nee no husu tutuir servisu ba grupu ida nee ninian tanba tekniku grupu mos seidauk iha ate agora, tan nee husu ona ba prezidenti ka reprezentante grupu ruma atu justifika ba problema hirak nee.	

#ANEXU C1 – (BZT24)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura Bazartete
Kompania :
No. kontratu :

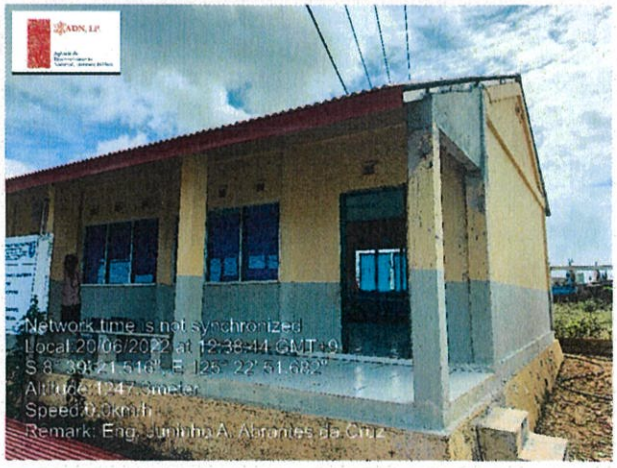Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

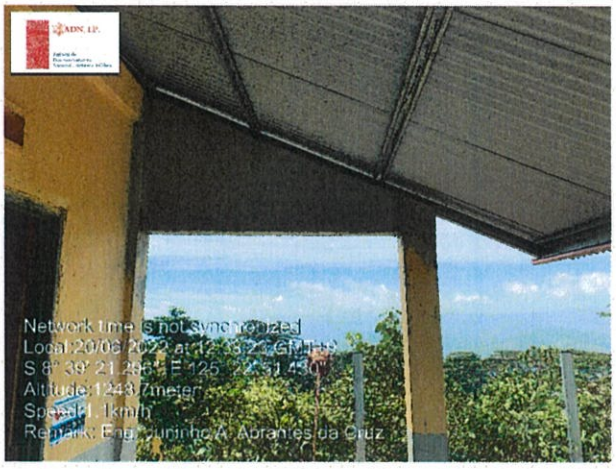Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : REHABILITAÇÃO ESCOLA PRE-ESCOLAR BAURA
FATIN PROJEITO : LEOREMA , BAZARTETE
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

# ANEXU C2 - (BZT24)						VERIFIED BY A D N , I P									
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
						FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$ 1,970.00	$ 985.00	10.86%	$ -	0.00%					$ 985.00	10.86%
II	CLASSROOM BUILDING RF	RF/21	(i)	US$	$ 4,102.12	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			US$	$ 6,072.12	$ 985.00	10.86%	$ -	0.00%					$ 985.00	10.86%
B	CONTIGENCY			US$	$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
C	GRAND TOTAL			US$	$ 9,072.12	$ 985.00	10.86%	$ -	0.00%					$ 985.00	10.86%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edifício Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT24)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE EPE BAURA

GRUPU KOMUNITARIU

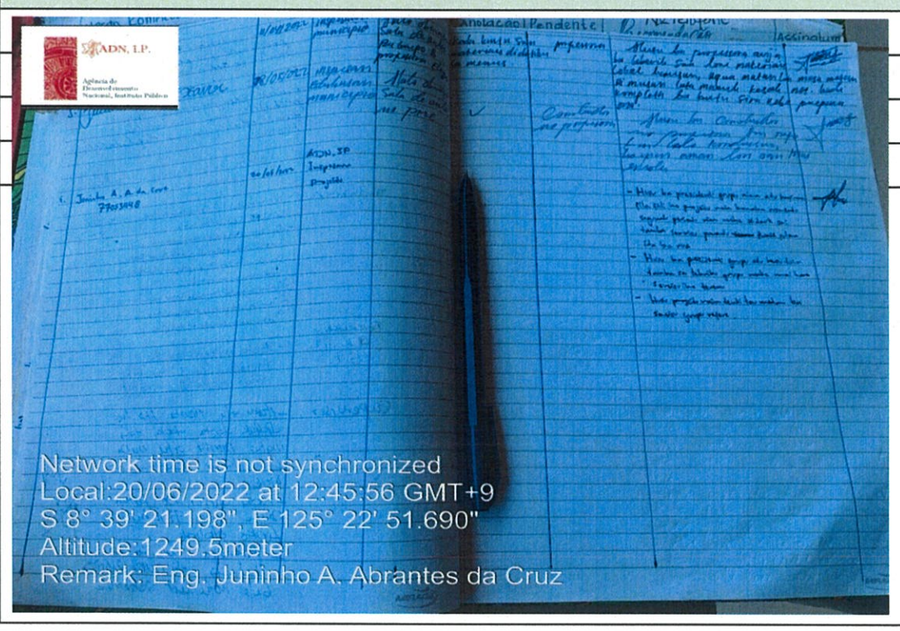No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	20/06/2022	Leorema, Bazartete	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (BZT25)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun EPE Ermeta Fahilebo
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 07 Junho 2022

Fatin Inspesaun : Fahilebo - Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 38' 12. 154''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 24' 35. 457''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu foun husi MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EPE Ermeta Fahilebo iha suku Fahilebo, postu Bazartete, Liquisa projeitu nee kaer husi servisu grupu komunitariu.	

#ANEXU C1 – (BZT25)
Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun EPE Ermeta Fahilebo
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu grupu iha terenu lao ona too iha servisu hada batako tuir diametru standar no ho nia perbandingan pasangan 1:4. Tuir ekipa tekniku Munisipiu ADN, IP nota katak iha parte betaun koluna nian balu neebe grupu fui no la uja forsa vibrator ho maksimu tan nee betaun ba koluna la nakonu ho diak.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tekniku ADN, IP foo ona instrusaun ba problema koluna nian katak hada batako 4 – 5 uluk lai hafoin monta bekisiting no uja vibrator tuir daudaun atu nunee bele hetan rezultadu maksimu, no mos iha problema batako nian balu neebe hada la rapi, grupu hetan ona instrusaun atu halo hadia fila fali.	

#ANEXU C1 – (BZT25)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun EPE Ermeta Fahilebo
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA PRE-ESCOLAR ERMETA FAHILEBO
FATIN PROJEITO : FAHILEBO, BAZARTETE
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

# ANEXU C2 - (BZT25)							VERIFIED BY A D N , I P									
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD		PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	BILLED %	THIS BILLING	BILLED %	TOTAL TO DATE	BILLED %
							FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$	3,075.00	$ 1,537.50	1.78%	$ -	0.00%					$ 1,537.50	1.78%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47	(i)	US$	$	59,793.47	$ 6,621.18	7.67%	$ 531.75	0.62%					$ 7,152.94	8.28%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/23	(i)	US$	$	14,157.37	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			US$	$	77,025.84	$ 8,158.68	9.45%	$ 531.75	0.62%					$ 8,690.44	10.06%
B	OVERHEAD			US$	$	6,340.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
C	CONTIGENCY			US$	$	3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL			US$	$	86,365.84	$ 8,158.68	9.45%	$ 531.75	0.62%					$ 8,690.44	10.06%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edifício Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT25)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE EPE ERMETA FAHILEBO

GRUPU KOMUNITARIU

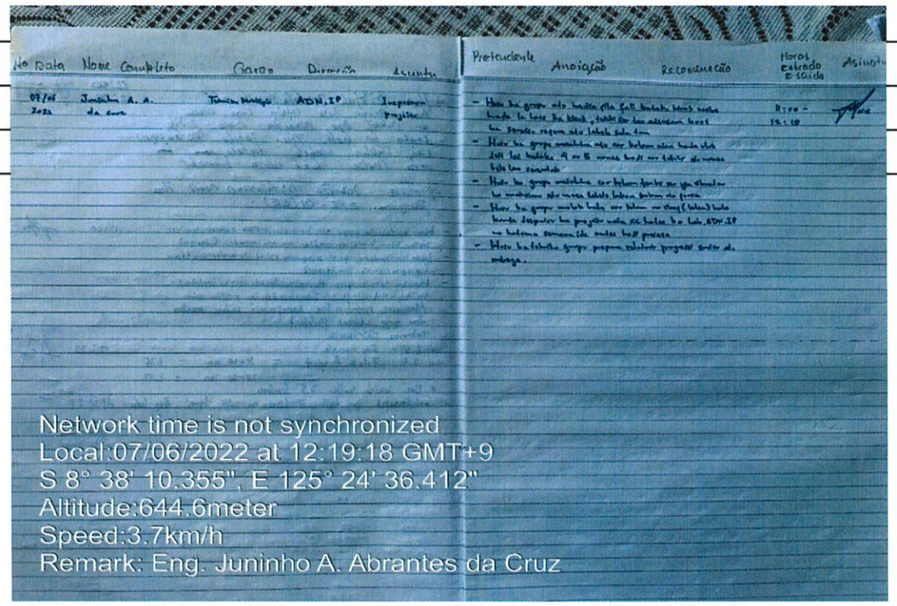No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	7/06/2022	Fahilebo, Liquisa	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquisa	1		
					2		
					3		
					4		
					5		

#ANEXU C1 – (BZT26)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 09 Junho 2022

Fatin Inspesaun : Lauhata - Bazartete, Liquisa

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 34' 19. 391''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 27' 52. 593''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu foun husi MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EPE Cassait iha suku Lauhata, Bazartete, Liquisa projeitu nee kaer husi servisu grupu komunitariu.	

#ANEXU C1 – (BZT26)
Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu grupu refere foin finaliza halo pemadatan tanah kembali ho *stamper*, no grupu mos finaliza ona monta bekisting ba *ground beam*, maibe tekniku munisipiu ADN, IP nota katak grupu seidauk kesi selimut beton (3 cm) ba iha tulangan no foo ona instrusaun ba item nee.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tekniku Munisipiu ADN, IP mos foo ona instrusaun ba reprezentante grupu ninian atu prepara karta despaisu atu entrega ba projeitu nain hodi bele prosesa ba iha ADN, IP Nasional no cc bele ba iha Laboratorium ADN, IP atu bele mai akompania no foti amostra ba servisu betaun nian.	

#ANEXU C1 – (BZT26)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA PRE-ESCOLAR CASSAIT
FATIN PROJEITO : ULMERA , BAZARTETE
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

# ANEXU C2 - (BZT26)						VERIFIED BY A D N , I P									
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
						FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$ 3,075.00	$ 1,537.50	1.96%	$ -	0.00%					$ 1,537.50	1.96%
II	PROVISIONAL SUM FOR DEMOLITION	DM/3		US$	$ 686.50	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
III	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47	(i)	US$	$ 57,955.41	$ 7,766.70	9.93%	$ -	0.00%					$ 7,766.70	9.93%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/19	(i)	US$	$ 7,193.98	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			US$	$ 68,910.89	$ 9,304.20	11.89%	$ -	0.00%					$ 9,304.20	11.89%
B	OVERHEAD			US$	$ 6,340.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
C	CONTIGENCY			US$	$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL			US$	$ 78,250.89	$ 9,304.20	11.89%	$ -	0.00%					$ 9,304.20	11.89%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edificio Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT26)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE EPE CASSAIT

GRUPU KOMUNITARIU

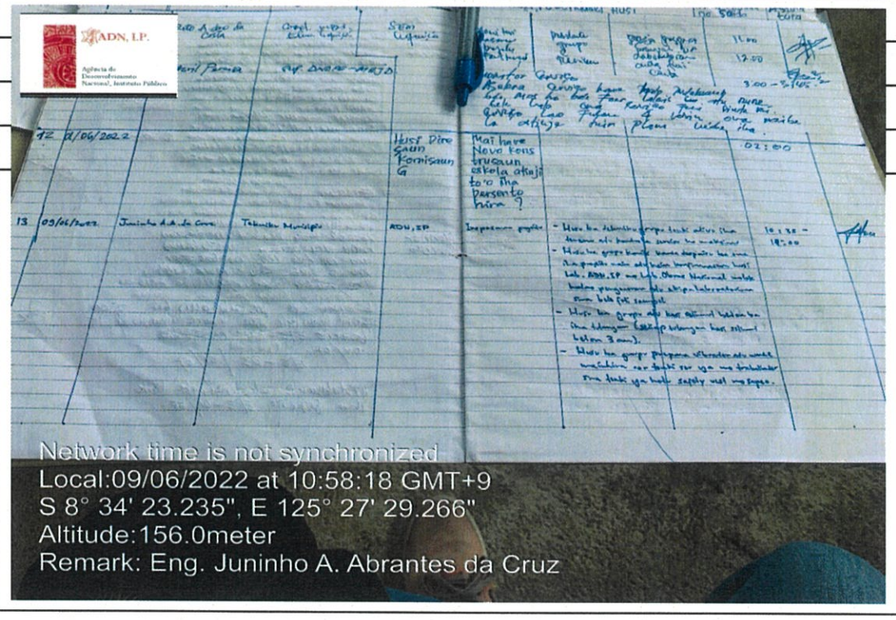No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	9/06/2022	Lauhata, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (BZT27)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE ESG Classe Paralelo Bogoro
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 09 Junho 2022

Fatin Inspesaun : Bogoro – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 36. 980''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 23' 58. 119''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu Foun MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun ESG Classe Paralelo Bogoro, lokaliza iha suku Bogoro, Bazartete, Munisipiu Liquisa, neebe kaer husi servisu Grupu Komunitariu	

#ANEXU C1 – (BZT27)
Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE ESG Classe Paralelo Bogoro
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba konstrusaun toilet *Tb* (figura iha sorin) daudaun nee trabaliador grupu monta/kesi hela besi tulangan ba konstrusaun refere. Tekniku Munisipiu ADN, IP foo ona instrusaun ba trabaliador sira atu kesi besi nee tenki tuir nia design neebe iha ona no diametru neebe iha ona.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba servisu konstrusaun klase Ca ninian (figura iha sorin) besi tulangan ba *ground beam* no *column* nian kesi no hariin tiha ona, no tekniku Munisipiu ADN, IP mos crosscheck tutuir ona atu nunee grupu halo tutuir nia design. Foo ona mos instrusaun ba grupu atu hatama karta despaisu atu nunee Lab. ADN, IP bele mai foti amostra.	

#ANEXU C1 – (BZT27)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE ESG Classe Paralelo Bogoro
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA SECUNDARIA GERAL PARALELO BOGORO
FATIN PROJEITO : MOTAULUN, BAZARTETE
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

# ANEXU C2 - (BZT27)						VERIFIED BY A D N , I P									
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
						FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$ 3,075.00	$ 1,537.50	1.33%	$ -	0.00%					$ 1,537.50	1.33%
II	CLASSROOM BUILDING CA	CA/39	(i)	US$	$ 65,492.93	$ 4,779.80	4.15%	$ 920.09	0.80%					$ 5,699.89	4.94%
III	TOILET BUILDING Tb	TB/39	(i)	US$	$ 24,504.47	$ 1,225.22	1.06%	$ 155.55	0.13%					$ 1,380.77	1.20%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/28	(i)	US$	$ 12,901.36	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			US$	$ 105,973.76	$ 7,542.52	6.54%	$ 1,075.64	0.93%					$ 8,618.16	7.47%
B	OVERHEAD			US$	$ 6,340.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
C	CONTIGENCY			US$	$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL			US$	$ 115,313.76	$ 7,542.52	6.54%	$ 1,075.64	0.93%					$ 8,618.16	7.47%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edificio Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT27)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE ESG CLASSE PARALELO BOGORO

GRUPU KOMUNITARIU

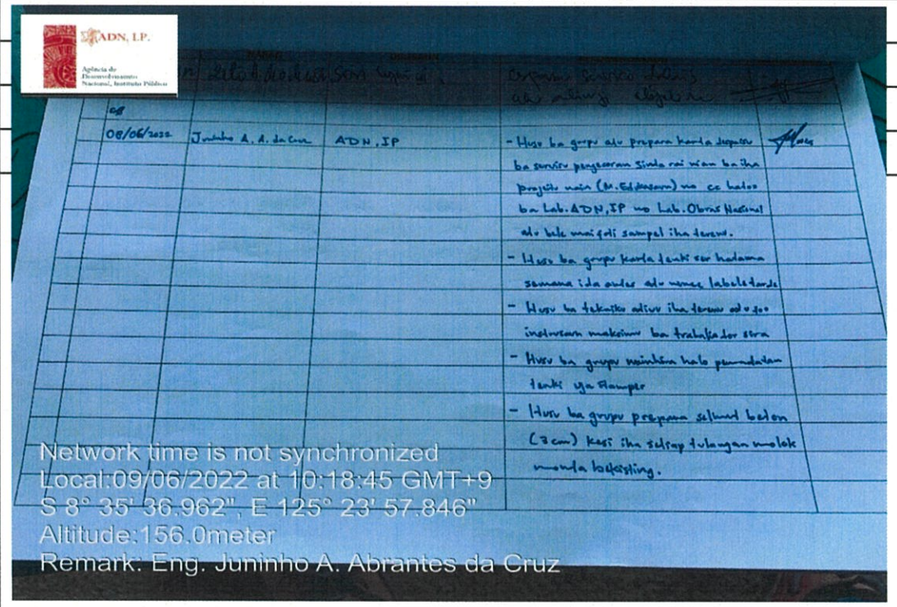No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	9/06/2022	Bogoro, Liquisa	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : 03 Junho 2022

Fatin Inspesaun : Dato, Liquica Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.35'21.273"S, Latetude : .....

End Point : Long : 125.20'1.933"E, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu husi Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu nian ba Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica lokaliza iha suku Dato, Liquisa Vila, Munisipiu Liquisa, neebe kaer husi kompania Roman Furak Unip. Lda.




#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Liquisa kordena ho ekipa tekniku Laboratorium ADN, IP no reprezentante kompania akompania no foti amostra ba servisu betaun top beam no koluna nian ba projeitu refere.	

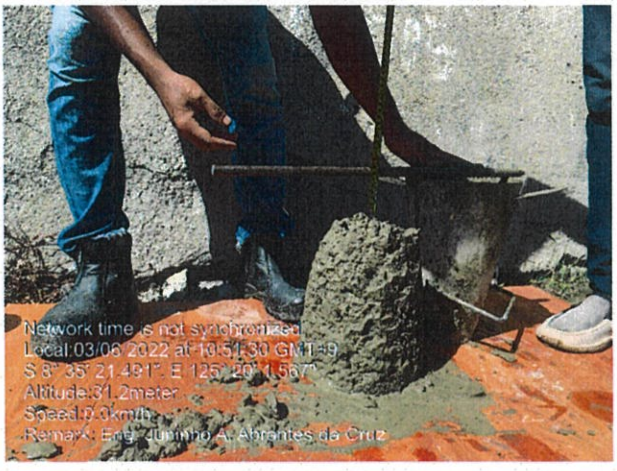
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tuir kompozisaun neebe husi rezultadu teste Laboratorium neebe foti husi ekipa tekniku Obras Publica, ba servisu betaun top beam nian hetan slump test ho medida (8 cm). No ekipa tekniku Lab. ADN, IP foo ona instrusaun ba kompania atu lao tuir lalaok neebe iha ona.	

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

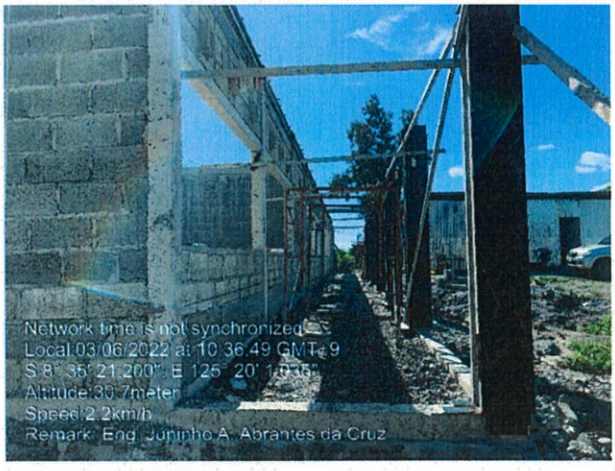Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : 29 Junho 2022

Fatin Inspesaun : Dato, Liquica Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.35'21.273"S, Latetude : .....

End Point : Long : 125.20'1.933"E, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz


2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu husi Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu nian ba Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica lokaliza iha suku Dato, Liquisa Vila, Munisipiu Liquisa, neebe kaer husi kompania Roman Furak Unip. Lda.

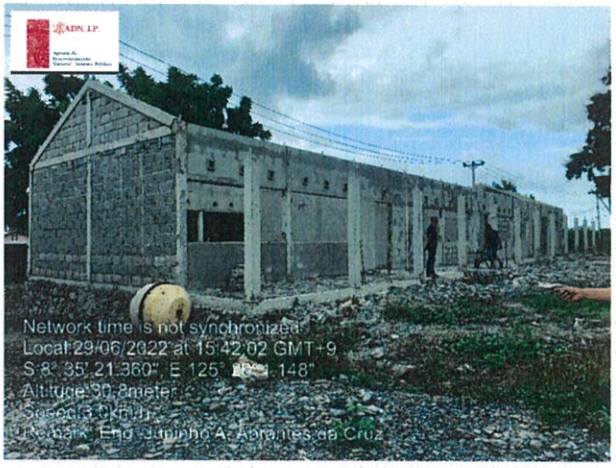

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu ba projeitu refere kompania atinji ona too iha servisu plesteran ba sala klase CB nian no ba sala klase C nian (figura iha sorin) foin finalizia hada batako no agora daudaun kompania halao hela servisu pemadatan tanah kembali ho stamper.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba sala klase CB (figura iha sorin) servisu lao ona too iha plesteran (15 mm) no kompania hahuu daudaun servisu septi tank nian. Kompania mos konfirma ho tekniku ADN, IP konaba soft copy BOQ neebe la han malu ho BOQ orijinal kontratu nian no sei hein konfirmasaun husi projeitu nain.	

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

SUMMARY

Naran Projeitu : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA SECUNDÁRIA GERAL LIQUIÇA
Fatin Projeitu : CAIMEO VILA, SUCO DATO
Projeitu Nain : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

ANEXU C2 - (LV20)			VERIFIED BY A D N , I P									
NO.	WORK DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	PREVIOUS	BILLED (%)	THIS BILLING	BILLED (%)	TO DATE	BILLED (%)	PROGRESU IHA TERENU				BILLED (%)
									Fulan Kotuk	%	Fulan Ida Nee	%	
I	PRELIMINARIES	$ 2,870.00							$ 1,435.00	0.86%	$ -	0.00%	0.86%
II	CLASSROOM BUILDING C	$ 53,423.84							$ 11,219.01	6.71%	$ 534.24	0.32%	7.03%
III	CLASSROOM BUILDING CB	$ 75,136.99							$ 27,049.32	16.19%	$ 1,502.74	0.90%	17.09%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	$ 13,000.00							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	$ 144,430.83							$ 39,703.32	23.76%	$ 2,036.98	1.22%	24.98%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	$ 14,443.08							$ 3,970.33	2.38%	$ 203.70	0.12%	2.50%
C	OVERHEAD	$ 4,930.00							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
D	TAX (2% x (A+B+C))	$ 3,276.08							$ 873.47	0.52%	$ 44.81	0.03%	0.55%
E	CONTIGENCY	$ -							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
F	TOTAL COST (A+B+C+D)	$ 167,079.99							$ 44,547.13	26.66%	$ 2,285.49	1.37%	28.03%

Inspeksaun Husi :

Eng, Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifisiu Publiku Agua Saneamentu, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineer ba Projeitu
Edificio Publiku Agua Saneamento
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ
ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV20)



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran Projeitu: Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica

Kompanha : ROMAN FURAK Unip. Lda.

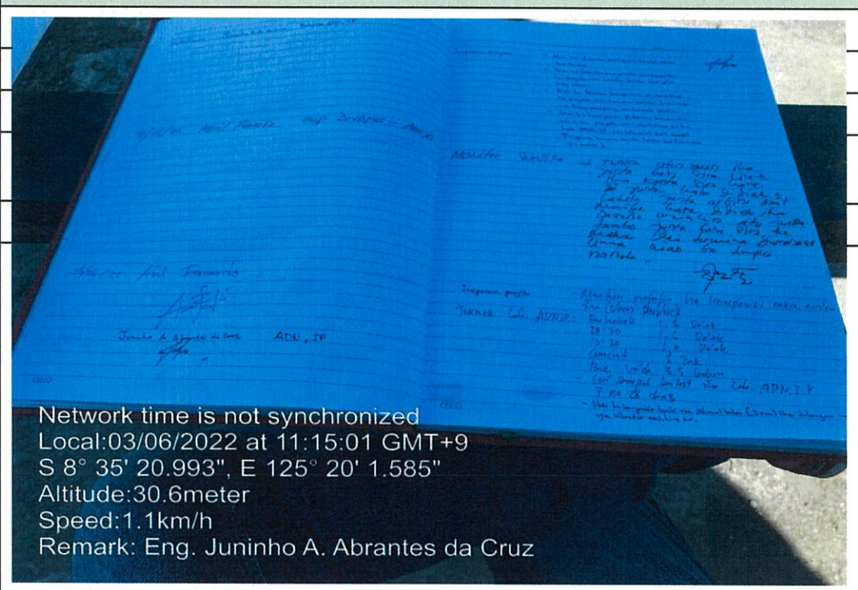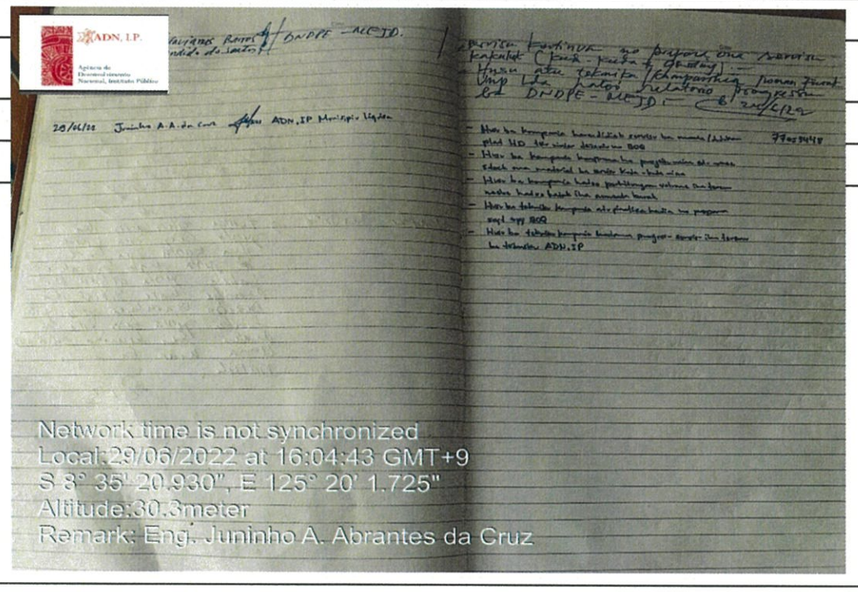No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	3/06/2022	Dato, Liquisa	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquisa	1 2 3 4 5 6		
II	29/06/2022	Dato, Liquisa	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (LV22)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1,2 Mauboque
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 08 Junho 2022

Fatin Inspesaun : Dato – Liquica Vila, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 49. 086''**, Latetude : .....


End Point : Long : **E 125º 18' 51. 269''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

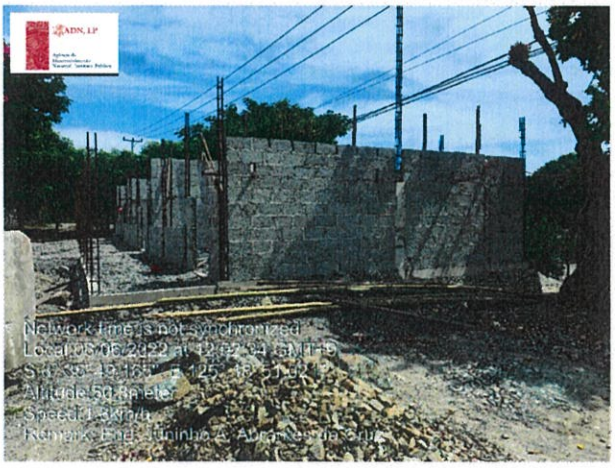
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu husi MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1, 2 Mauboque lokaliza iha suku Dato, Liquisa Vila Munisipiu Liquisa neebe kaer husi servisu Grupu Komunitariu.	

#ANEXU C1 – (LV22)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1,2 Mauboque
Kompania :
No. kontratu :


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu grupu ba Konstrusaun Klase C (figura iha sorin) too ona iha hada batako tuir diametru standar no ho perbandingan pasangan 1:4. Grupu mos finaliza monta besi tulangan no hein monta bekisting molok hakat ba servisu fui betaun ba koluna.	

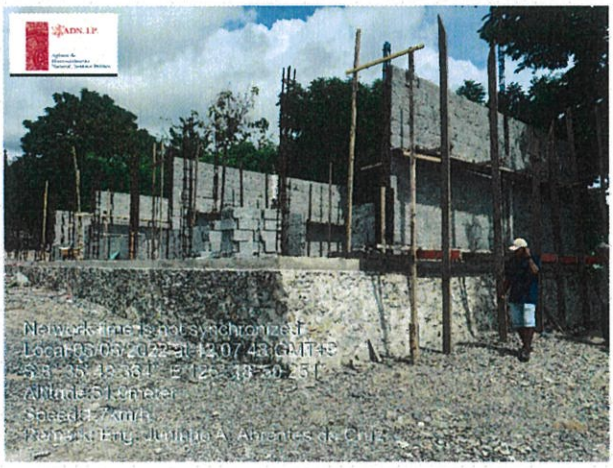Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba servisu Konstrusaun Klase Cdl (figura iha sorin) servisu too ona iha hada batako hanesan ho klase C nian no iha koluna balu neebe grupu fui tiha ona. Ekipa ADN, IP mos foo ona instrusaun ba grupu atu prepara karta despaisu ba pengecoran kolom nian atu nunee bele iha amostra ba item refere.	

#ANEXU C1 – (LV22)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1,2 Mauboque
Kompania :
No. kontratu :

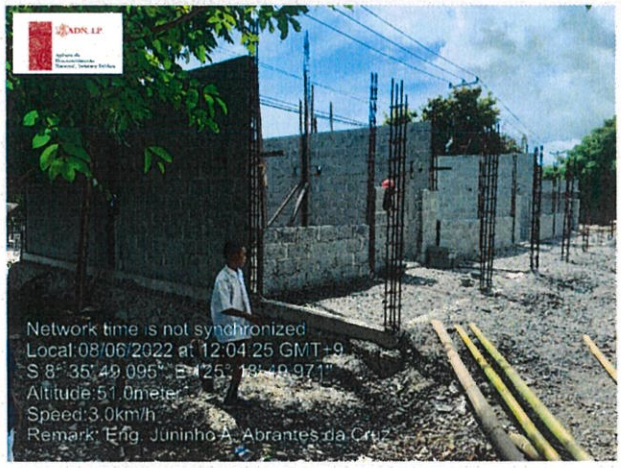Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BÁSICA FILIAL MAUBOQUE
FATIN PROJEITO : DATO, LIQUICA
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

# ANEXU C2 - (LV 22)						VERIFIED BY A D N , I P							
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
						FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$ 3,075.00	$ 1,537.50	1.37%	$ -	0.00%					$ 1,537.50	1.37%
II	PROVISIONAL SUM FOR DEMOLITION	DM/3		US$	$ 590.80	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
III	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	US$	$ 48,285.30	$ 5,586.22	4.96%	$ 1,131.71	1.01%					$ 6,717.93	5.97%
IV	CLASSROOM BUILDING Cdl	C/36	(i)	US$	$ 43,049.04	$ 4,599.69	4.09%	$ 958.99	0.85%					$ 5,558.68	4.94%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/27	(i)	US$	$ 8,189.87	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			US$	$ 103,190.01	$ 11,723.41	10.42%	$ 2,090.71	1.86%					$ 13,814.11	12.28%
B	OVERHEAD			US$	$ 6,340.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
C	CONTIGENCY			US$	$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL			US$	$ 112,530.01	$ 11,723.41	10.42%	$ 2,090.71	1.86%					$ 13,814.11	12.28%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edifício Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV22)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE EBF MAUBOQUE

GRUPU KOMUNITARIU

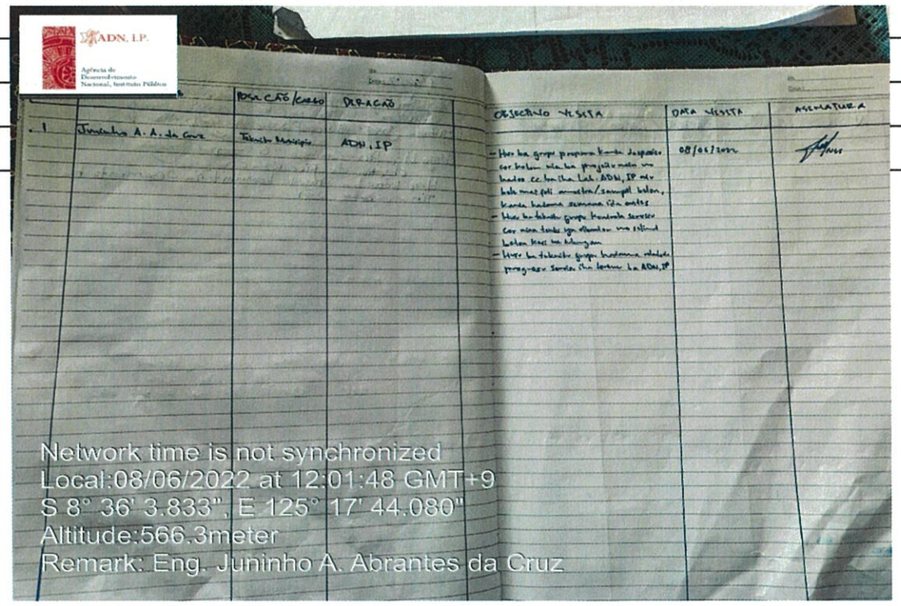No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/06/2022	Dato, Liquisa Vila	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (LV23)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBC 1,2,3 Liquica
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 14 Junho 2022

Fatin Inspesaun : Dato – Liquica Vila, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 32. 592''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 19' 53. 005''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu Foun MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EBC 1, 2, 3 Liquica lokaliza iha suku Dato, Liquisa Vila munisipiu Liquisa, neebe kaer husi servisu Grupu Komunitariu.	

#ANEXU C1 – (LV23)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBC 1,2,3 Liquica
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu grupu refere iha terenu atinji ona servisu pemadatan tanah kembali ba toilet Tb nian (figura iha sorin). Ba servisu pemadatan toilet nian lao tarde ituan tanba grupu sei halo instalasaun ba pipa no mos fui betaun ba *ground beam* nian. Servisu refere uja stamper.	

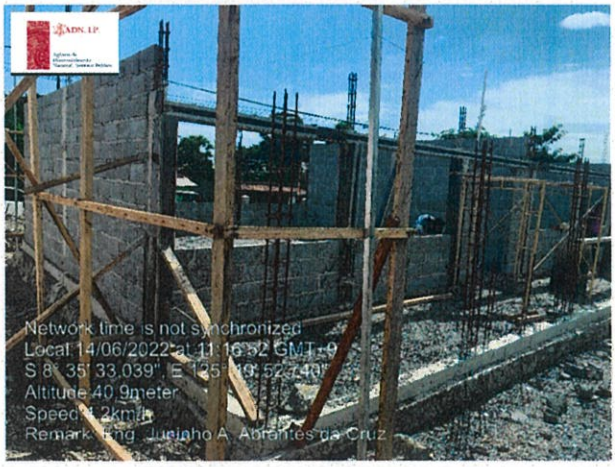Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP foo ona instrusaun ba grupu atu prepara karta despaisu hodi akompania no foti amostra ba betaun nian husi Laboratorium ADN, IP atu bele halao teste no iha rezultadu ba item betaun nian. Ba Konstrusaun Klase C nian (figura iha sorin) lao ona too iha hada batako no dadaun nee monta hela tulanagan no bekisting ba koluna no *lintel beam* nian.	

#ANEXU C1 – (LV23)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBC 1,2,3 Liquica
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA CENTRAL LIQUICA
FATIN PROJEITO : DATO, LIQUICA
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

# ANEXU C2 - (LV23)						VERIFIED BY A D N , I P									
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
						FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$ 3,075.00	$ 1,537.50	1.55%	$ -	0.00%					$ 1,537.50	1.55%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	US$	$ 45,885.30	$ 6,704.34	6.74%	$ 941.86	0.95%					$ 7,646.21	7.69%
III	TOILET BUILDING Tb	C/39	(i)	US$	$ 23,742.51	$ 3,096.78	3.11%	$ -	0.00%					$ 3,096.78	3.11%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/27	(i)	US$	$ 17,413.23	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			US$	$ 90,116.04	$ 11,338.62	11.40%	$ 941.86	0.95%					$ 12,280.48	12.35%
B	OVERHEAD			US$	$ 6,340.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
C	CONTIGENCY			US$	$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL			US$	$ 99,456.04	$ 11,338.62	11.40%	$ 941.86	0.95%					$ 12,280.48	12.35%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edificio Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV23)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE EBC 1,2,3 LIQUICA

GRUPU KOMUNITARIU

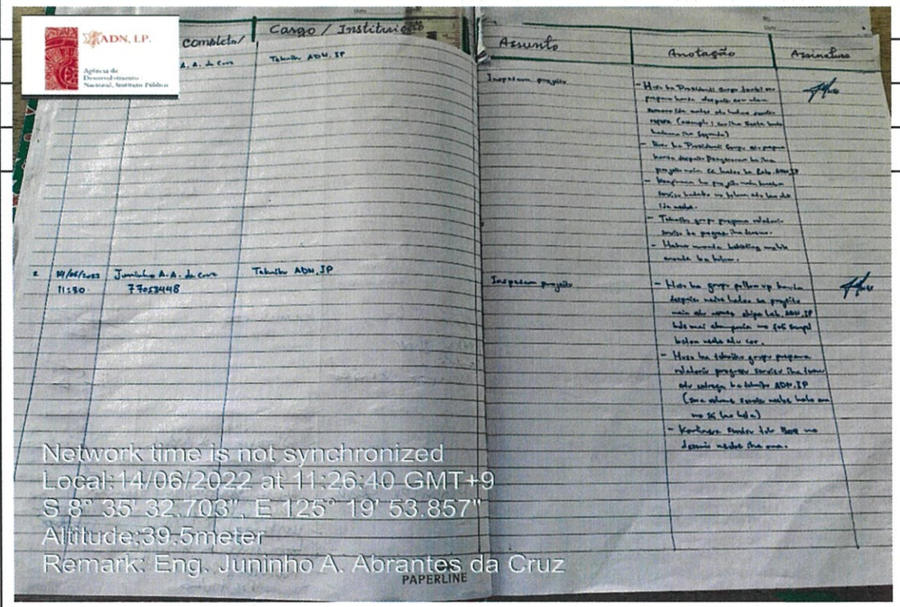No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	14/06/2022	Dato, Liquisa	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (LV24)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EPE Loidahar
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 20 Junho 2022

Fatin Inspesaun : Loidahar - Liquica Vila, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 32. 592''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 19' 53. 005''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu Foun MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EPE Loidahar lokaliza iha suku Loidahar, Liquisa Vila munisipiu Liquisa, neebe kaer husi servisu Grupu Komunitariu.	

#ANEXU C1 – (LV24)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EPE Loidahar
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu grupu iha terenu atinji ona iha pemadatan tanah kembali uja stamper ba Konstrusaun Klase C2 (figura iha sorin), no servisu hada batako ho diametru standar ho perbandingan pasangan 1:4. Maibe ekipa tekniku nota katak grupu nia besi tulangan seidauk kesi tutuir ninia design no foo ona instrusaun atu hadia tutuir.	


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba servisu instalasaun linha pipa nian mos halo ona no sei instala hela molok ateru fila fali rai no halo pemadatan. Tekniku ADN, IP mos foo ona instrusaun ba grupu atu hatama karta despaisu wainhira iha servisu pengecoran nian atu nunee Lab. ADN, IP bele akompania no foti amostra ba item betaun.	

#ANEXU C1 – (LV24)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EPE Loidahar
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

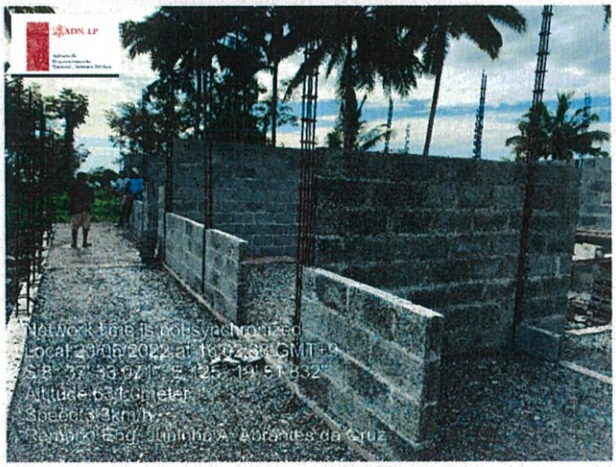

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA PRE-ESCOLAR LOIDAHAR
FATIN PROJEITO : LOIDAHAR, LIQUICA
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

#ANEKSU C2 - (LV24)						PROGRESU IHA TERENU						VERIFIED BY A D N , I P					
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%	TOTAL	%	PREVIOUS BILLING	BILLED %	THIS BILLING	BILLED %	TOTAL BILLED	BILLED %
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$ 3,075.00	$ 1,537.50	1.93%	$ -	0.00%	$ 1,537.50	1.93%						
II	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47	(i)	US$	$ 59,253.63	$ 4,599.24	5.77%	$ 1,597.29	2.00%	$ 6,196.53	7.77%						
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/19	(i)	US$	$ 8,067.00		0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%						
A	CONSTRUCTION COST			US$	$ 70,395.63	$ 6,136.74	7.70%	$ 1,597.29	2.00%	$ 7,734.03	9.70%						
B	OVERHEAD			US$	$ 6,340.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%						
C	CONTIGENCY			US$	$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%						
D	GRAND TOTAL			US$	$ 79,735.63	$ 6,136.74	7.70%	$ 1,597.29	2.00%	$ 7,734.03	9.70%						

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edifício Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV24)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE EPE LOIDAHAR

GRUPU KOMUNITARIU

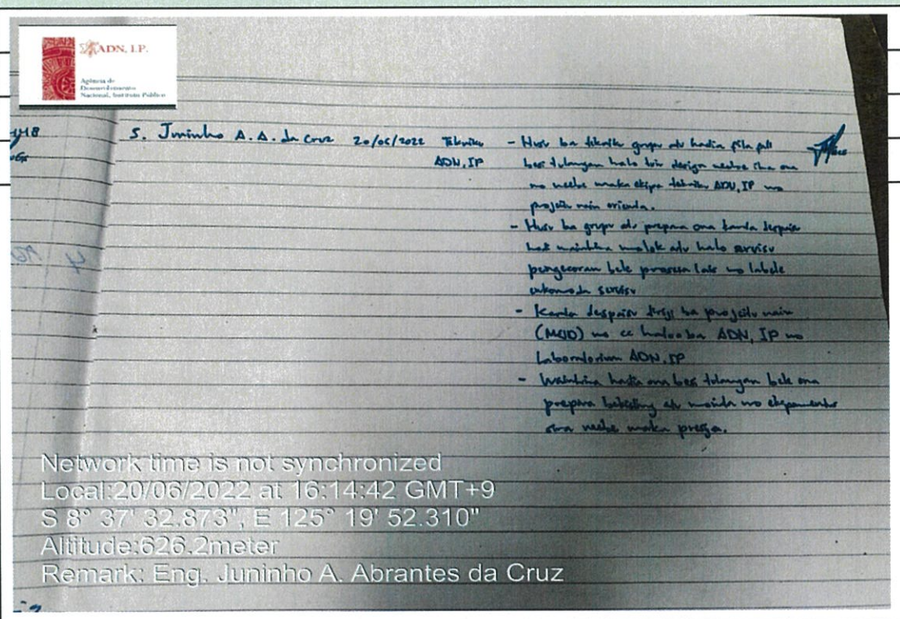No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	20/06/2022	Loidahar, Liquisa Vila	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (LV25)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBF 1,2 Laclolema
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 15 Junho 2022

Fatin Inspesaun : Dato – Liquica Vila, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 37' 11. 666''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 18' 55. 306''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Liquisa halao inspesaun ba projeitu MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1, 2 Laclolema lokaliza iha suku Dato, Liquisa Vila munisipiu Liquisa, neebe kaer husi servisu grupu komunitariu.	

#ANEXU C1 – (LV25)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBF 1,2 Laclolema
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu grupu refere lao tarde ituan no tekniku husi grupu refere ladun ativu iha terenu difikulta trabaliador sira seluk konaba servisu neebe sira atu halao. Servisu ateru fila fali rai lao hela maibe kleur ituan tanba grupu mos aluga deit stamper husi kompania seluk atu uja iha oras hira nia laran deit.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba servisu betaun nian karta despaisu grupu sira informa ba tekniku ADN, IP katak sira hatama ona ba projeitu nain no sira hanoin katak ADN, IP simu ona karta nee maibe seidauk no too iha data neebe sira termina atu cor laiha akompaniamentu husi Lab. ADN, IP tanba koniesimentu ou karta laiha.	

#ANEXU C1 – (LV25)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBF 1,2 Laclolema
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA FILIAL LACLOLEMA
FATIN PROJEITO : DATO, LIQUICA
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

# ANEXU C2 - (LV25)							VERIFIED BY A D N , I P									
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD		PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
							FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$ 3,075.00		$ 1,537.50	1.71%	$ -	0.00%					$ 1,537.50	1.71%
II	PROVISIONAL SUM FOR DEMOLITION	DM/3		US$	$ 687.20		$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
III	CLASSROOM BUILDING Cb	C/39	(i)	US$	$ 67,508.34		$ 7,400.73	8.26%	$ 1.29	0.00%					$ 7,402.02	8.26%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/27	(i)	US$	$ 9,040.12		$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			US$	$ 80,310.66		$ 8,938.23	9.97%	$ 1.29	0.00%					$ 8,939.52	9.97%
B	OVERHEAD			US$	$ 6,340.00		$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
C	CONTIGENCY			US$	$ 3,000.00		$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL			US$	$ 89,650.66		$ 8,938.23	9.97%	$ 1.29	0.00%					$ 8,939.52	9.97%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edifício Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV25)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE EBF 1,2 LACLOLEMA

GRUPU KOMUNITARIU

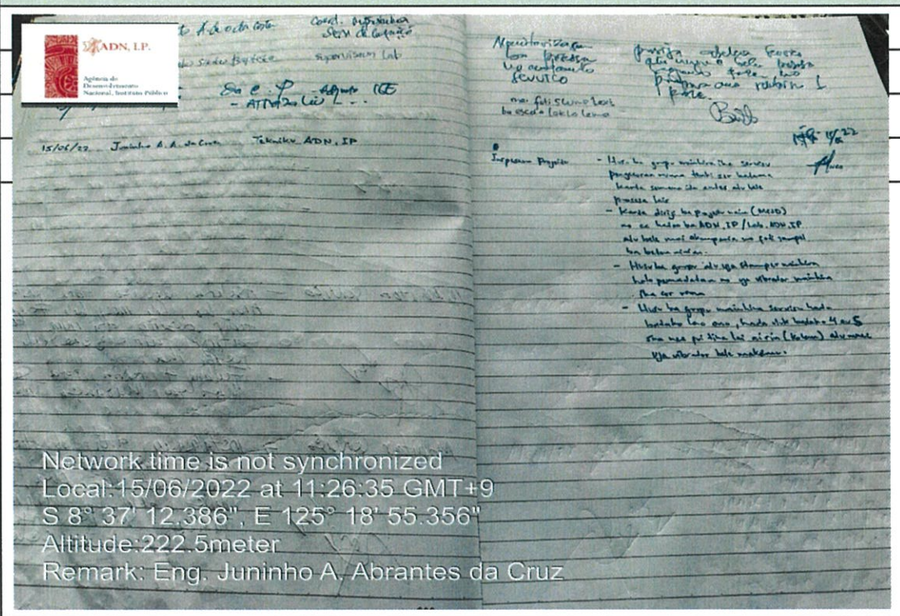No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/06/2022	Dato, Liquisa	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquisa	1 2 3 4 5		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituição Pública

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Juninho António Abrantes da Cruz

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JUNHO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	OBS
Liquiça Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Naroman Monu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loisbahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	3	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Leboikaiko Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Raehi Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loisbahar Chainage 0+000-12+300)	Luqueli Oan Unip.Lda	MPW-W-210150	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu Chainage 5+000-10+000)	Cailu Unip.Lda	MPW-W-210154	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leoremna Chainage 0+000-5+000)	Vicaroman Unip.Lda	MPW-W-210155	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)	Metalika Unipesscoal, Lda	MPW-W-210151	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700)	Prudencia Construction Unip.Lda	MPW-W-210153	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	10	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	Binar Lema Unip.Lda		LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																
							Actual																																
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Berlaksiidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)	Goubara Unip.Lda	MPW-W-210162	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Berlaksiidu-Laberlaka Chainage 2+500-5+400)	Claridade Unip Lda			MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba- Lukulai Chainage 0+000-2+000)	Craelski Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	14	Road Maintenance Section Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (A03)	Chantel Chander Unip.Lda	MPW-W-210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	15				LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	16	Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica	Roman Fursk Unip.Lda	NCB:16/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																On-going
							Actual																																
	17	For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimbala-Loes (A03)	Charel Chander Unip.Lda	MPW-W210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	18	MEJD PIGRIE EBF Mauboque	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Foun
							Actual																																
	19	MEJD PIGRIE EBC 1,2,3 Liquica	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Foun
							Actual																																
	20	MEJD PIGRIE EPE Loisbahar	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Foun
							Actual																																
	21	MEJD PIGRIE EBF 1,2 Laclolenu	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Foun
							Actual																																
	22	MEJD PIGRIE EBF 1,2 Tolenu	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Foun
							Actual																																
	23	MEJD PIGRIE EBF 1,2 Lucului	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Foun
							Actual																																
Maubara (MIB)	1	Addt. Poste liga Maubara	Fu Unip,Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	Montana Diak, Unipesscoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	3	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquica (CA + CB)	Alenu Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Pagamentu Seidauk 100%
							Actual																																
	4	RNIUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBME Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	R4D Rural Road Maintenance Berlaksiidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulenu Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralina Chainage 0+000-12+500	Luliana Unip.Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralina Chainage 0+000-4+200)	Nheu Unip.Lda	MPW-W-210164	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Nunuleta - Darulenu Chainage 0+000-2+000) Liquica Municipality	Rito-Pu Unip.Lda	MPW-W-210146	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lisnadila Chainage 4+800-9+600)	Malibo Unip.Lda	MPW-W-210156	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lisnadila Chainage 0+000-4+800)	Murak Unip.Lda	MPW-W-210157	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	10	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralina Chainage 8+400-12+500)	Meta Loe Crae Bau Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Samurupo-Gusu Chainage 0+000-2+000)	Nazico Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralina Chainage 4+200-8+400)	Luliana Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	13	MEJD PIGRIE EBF Gariana	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Foun
							Actual																																
	14	MEJD PIGRIE EBF 1,2 Tapo Maruhulu	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Foun
							Actual																																
	15	MEJD PIGRIE ESG-Paralelo Maubara	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Foun
							Actual																																
Baucau (BAT)	1	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	Barar Lema	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquica (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																PHO
							Actual																																
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libalou - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019/19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																Paradu
							Actual																																
	5	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ/19/029-Q-IK)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Paradu
							Actual																																
	6	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Iha: Tibar / 162	Culoco Unipesscoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Pagamentu Seidauk 100%
							Actual																																
	7	New Water Supply of Baicos PNTL Liquica	Holuli Unipesscoal, Lda	SSS/054/ME-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan																																PHO
							Actual																																
	8	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	Naenalobu Unip. Lda.	MAP-P02019/19532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																FHO
							Actual																																
	9	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Quenon SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																Pagamento Seidauk 100%
							Actual																																
	10	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Seniru	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																PHO
							Actual																																
	11	Kesalizasaun Be Mos ho Sistema Orsivitasaun Iha Aipelo-Liquisa	Tinocya	022LM/RDTLMPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/02/EXPECIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																PHO
							Actual																																
	12	Emergency Project For Tibar River	Sulo-Magu Unip.Lda	RT/067/MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000)	Hatumeta Oan,Unip.Lda	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	14	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Fatumasi Chainage 0+000-2+300) Liquica Municipality	Hatumeta Oan,Unip.Lda	MPW-W-210142	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Libalou- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality	Hatuleo Unip.Lda	MPW-W-210144	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	16	Routine Maintenance Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000-10+000	Craelski Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	17	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 3+000-6+500) Liquica Municipality	TM.Caileba Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	18	New Construction of Fence Around for Isolation Covid-19 in Liquica Maumeta	Biamali Unip. Lda.	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																On-going
							Actual																																
	19	Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica	Zyc Unip. Lda.	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																On-going
							Actual																																
	20	Projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leoremu - Liquica	U-Rema Unip. Lda.	NCB:15/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																On-going
							Actual																																
	21	MEJD PIGRIE EPE Baura	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Foun
							Actual																																
	22	MEJD PIGRIE EPE Ermeta	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Foun
							Actual																																
	23	MEJD PIGRIE EPE Cassait	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Foun
							Actual																																
	24	MEJD PIGRIE ESG-Paralelo Bogoro	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Foun
							Actual																																
		TOTAL PROJETO ON-GOING																																					

Note:

- Plano Periode Inspesaun Iha tereiru
- Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili
- Inspesaun Pagamentu Anual iha tereiru
- Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereiru

Propara Husi :

(Eng Juninho António Abrantes da Cruz)
Eng. ba Edifício Publico Agua e Sanseamento Municipio Liquica
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo / Validasaun de Qualidade ADN.I.P

Aprova Husi :

(Eng Januario Maia Guterres)
Adjunto Diretor Executivo ADN.I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. **Juninho António Abrantes da Cruz**

Município — **MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS**

2022

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanhia	No. Contrato	Kategoria	Donu do Projeto	Antes	JUNHO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	OBS
Liquiça Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Lees (A03) Municipality Liquica /162	Naramon Mesu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	2	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibesu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+ 350 Rotine Maintenance Dato - Liquica - Loulubar Chainage 0+000 - 12+ 300 Municipality Liquica	Nhnu	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	3	Rural Roads Periodic Gunubu - Lukulu Chainage 0+000 & Metagou - Aibesu Chainage 0+000 - 7+600 Rotine Maintenance Talubi - Kotulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (M2)	Gmibara Unip Lda	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	4	R4D Rural Road Rehabilitation Bolodei - Labulahlo Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Rachi Unip. Lda	RTI/547/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loulubar Chainage 0+000-12+300)	Lugarli Cun Unip Lda	MPW-W-210150	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Aibesu-Asumanu Chainage 5+000-10+000)	Cuila Unip Lda	MPW-W-210154	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Aibesu-Asumanu-Lacoma Chainage 0+000-5+000)	Vaincomsa Unip Lda	MPW-W-210155	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibesu Chainage 0+000-7+600)	Metalau Unipessoal, Lda	MPW-W-210151	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Talubi - Kotulau Chainage 0+000-1+700)	Prudencio Construction Unip Lda	MPW-W-210153	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	10	Manutenasaun Kanuu Irrigasaun Foduru - Liquica	Banir Lorru Unip Lda		LM	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan Actual		
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Burlahulo Laburlahu Chainage 0+000-2+300)	Gmibara Unip Lda	MPW-W-210162	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Burlahulo Laburlahu Chainage 2+300-5+400)	Claridade Unip Lda			MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Gunubu- Lukulu Chainage 0+000-2+000)	Cruzeiro Rosary Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	14	Road Maintenance Section Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Lees (A03)	Chantel Chandler Unip.Lda	MPW-W-210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	15				LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	16	Projeto Konstruasaun Foun ESG Publico 01-Liquica	Ramos Funk Unip Lda	NCB/MJMUDJEDN/A/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		On-going
	17	For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimbala-Lees (A03)	Chantel Chandler Unip.Lda	MPW/W/210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	18	MEJD FKRE EBF Maubaque	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Foun
	19	MEJD FKRE EBC 1,2,3 Liquica	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Foun
	20	MEJD FKRE EPE Loulubar	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Foun
	21	MEJD FKRE EBF 1,2 Lauhlemu	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Foun
	22	MEJD FKRE EBF 1,2 Tolemu	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Foun
	23	MEJD FKRE EBF 1,2 Lusubi	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Foun
Maubara (MDR)	1	Adk Ponte Iga Maubara	Fu Unip,Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	2	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalou and Kaumbala Liquica Municipality Liquica	Montaru Diok, Unipessoal, Lda	2SS/126/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	3	Konstruasaun ESTV Lisadila Maubara-Liquica (CA+ CE)	Abesu Unip. Lda	CID/008/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		On-going
	4	RNSP/ / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Kaumbala Road (Km 40.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km 114.2)	CBMI Construction Co. Ltd Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/0373/MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	5	R4D Rural Road Maintenance Burlahulo - Laburlahu Chainage 0+000 - 5+400 Namleto - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vasiquinie-Maubarlina Chainage 0+000-32+500	Lularu Unip Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Burkau (Vasiquenia - Maubarlina Chainage 0+000-4+ 200)	Nhnu Unip Lda	MPW-W-210164	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Namleto - Darulema Chainage 0+000-2+000) Liquica Municipality	Rito Pu Unip Lda	MPW-W-210146	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Malasera-Lisadila Chainage 4+800-9+600)	Malibo Unip.Lda	MPW-W-210156	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Malasera-Lisadila Chainage 0+000-4+800)	Marak Unip Lda	MPW-W-210157	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	10	R4D Rural Road Spot Improvement Burkau (Vasiquenia - Maubarlina Chainage 8+400-12+500)	Meta Loe Cruz Bau Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Samanpo-Bina Chainage 6+000-2+000)	Nazaro Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Burkau (Vasiquenia - Maubarlina Chainage 4+200-8+400)	Lularu Unip Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	13	MEJD FKRE EBF Gamasa	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Foun
	14	MEJD FKRE EBF 1,2 Tapo Maubada	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Foun
	15	MEJD FKRE ESG-Paulalo Maubara	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Foun
Bazartete (BZT)	1	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Jtn. 0+000 - 7+600 Municipality Liquica (M2)	Runar Lemo	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	2	Konstruasaun ESTV Maumeta - Liquica (CA + CE)	Vida Duak Unip. Lda	CID/009/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		PHO
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libalos - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Futamasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Buzumeru Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Laos Dato	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	4	Konstruasaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-FO2019 19726	LM	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan Actual		Parada
	5	Konstruasaun Foun EBF Hotugau Bazartete, Liquica (162)	Malaba Unip Lda	(RFQ 19/029-Q/R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Parada
	6	Hamos Tanghi Estrutura Temporario Agua Rezultasi Etar Tibar / 162	Culmar Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		Pagamentu Sedauk 100%
	7	New Water Supply of Baucau PNTL Liquica	Holuli Unipessoal, Lda	52S/0545/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan Actual		PHO
	8	Konstruasaun Armogen Foun Matadouro (Rem Servisu)	Nienaloba Unip. Lda.	MAP-PO2019 19332	LM	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan Actual		PHO
	9	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Quesen EQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RDK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan Actual		Pagamentu Sedauk 100%
	10	New construction of isolation for covid 19 in chi hquica, Timor Leste	Seniru	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan Actual		PHO
	11	Konstruasaun Ba Mos ho Sistema Hmoituasaun Pu Aspalo Liquica	Tiruxyu	922LM/SEFTL/MF/IV/AND/DA-RFQ/VIII/2019/SERVICO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan Actual		PHO
	12	Emergency Project For Tibar River	Sulu Magu Unip.Lda	RTO/653/MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Buzumeru Chainage 0+000-3+000)	Hamemeta Oan Unip.Lda	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	14	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Futamasi Chainage 0+000-2+300) Liquica Municipality	Hamemeta Oan Unip.Lda	MPW-W-210142	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Libalos- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality	Batalao Unip Lda	MPW-W-210144	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	16	Routine Maintenance Maumeta-Metagau-Bazartete Chainage 0+000-30+000	Cinelaki Renuli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	17	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Buzumeru Chainage 3+000-6+300) Liquica Municipality	Tld Caldeu Unip Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual		
	18	New Construction of Fence Around for Isolation Covid-19 in Liquica Maumeta	Bumuli Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan Actual		On-going
	19	Supply and Installation Cowsection for Isolation and Laboratorian Building Maumeta Liquica	Zyc Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan Actual		On-going
	20	Projetu Konstruasaun Foun ESTV Leorema - Liquica	U-Rmou Unip Lda	NCB-15/MJED/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		On-going
	21	MEJD FKRE EPE Buara	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Foun
	22	MEJD FKRE EPE Ilimotu	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Foun
	23	MEJD FKRE EPE Cassait	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Foun
	24	MEJD FKRE ESG-Paulalo Bogono	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual		Foun
TOTAL PROJETO ON-GOING									

Note:

Plano Periode inspesaun iha tersiru — Relatoriu avaliasaun mensal iha DJI — Inspesaun Pagamentu Anual iha tersiru — Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tersiru

Prepara Husi :

(Eng Juninho António Abrantes da Cruz)
Eng. ba Edifício Publico Agua e Saneamento Municipio Liquica
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng Emerenciana de Carvalho Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun do Qualidade ADN I.P

Aprova Husi :

(Eng Januario Maia Guterres)
Adjunto Diretor Executivo ADN I.P

ANEXO C1 (MBR – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364

Data Inspesaun : 21 /6/2022

Fatin Inspesaun : Kulau to Maubara - Liquica Municipality

Koordinadas :

Start Point : Long : ....., Latetude : .....

End Point : Long : ....., Latetude : .....

Naran Inspector : 1.Camilio De Jesus

2. .....

3. .....

4. .....

Foto Actual	Obervasaun
	1. Progressu iha tereno laiha mudansa 2. Laiha ona spasu atu kontinua servisu 3. Servisu paradu

ANEXO C1 (MBR – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364

Foto Actual	Obervasaun
	1. Progressu iha tereno laiha mudansa 2. Laiha ona spasu atu kontinua servisu 3. Servisu paradu

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (MBR - 2)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality

Kompanha : Britas Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	22/2/2022	Liquica/ Maubara	Camilio de Jesus	Tek. AND.IP	1	Progressu fisuku iha tereno laiha mudansa	
					2	laiha ona spasu atu kontinua kompleta servisu	
					3	Servisu paradu	
					4		
					5		
II	21/6/2022	Liquica/ Maubara	Camilio de Jesus	Tek. AND.IP	1	Progressu fisuku iha tereno laiha mudansa	
					2	laiha ona spasu atu kontinua kompleta servisu	
					3	Servisu paradu	
					4	Presija kompleta servisu	
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		

ANEXO C1 (LV – 8)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371

Data Inspesaun : 21 /6/2022

Fatin Inspesaun : Liquica Vila - Liquica Municipality

Koordinadas :

Start Point : Long : ....., Latetude : .....

End Point : Long : ....., Latetude : .....

Naran Inspector : 1.Camilio De Jesus

2. .....

3. .....

4. .....

Foto Actual	Obervasaun
	1. Progresu iha Tereno Laiha mudansa 2. Servisu Paradu 3. Presija Hadia no kompleta konstrusaun

ANEXO C1 (LV – 8)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371



Progresu iha Tereno Laiha mudansa

Servisu Paradu

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (LV - 8)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality

Kompanha : Busa Unip Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	22/2/2022	Liquica/ Liquica Villa	Camilio de Jesus	Tek. AND.IP	1	Servisu paradu	
					2	Actividade iha Tereno Laiha	
					3	Laiha ona Spasu atu kontinua servisu	
					5		
II	21/6/2022	Liquica/ Liquica Villa	Camilio de Jesus	Tek. AND.IP	1	Servisu paradu	
					2	Actividade iha Tereno Laiha	
					3	Laiha ona Spasu atu kontinua servisu	
						Presija hadia no Kompleta Servisu	
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		

ANEXO C1 (LV – 7)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399

Data Inspesaun : 20 /06/2022

Fatin Inspesaun : Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality

Koordinadas :

Start Point : Long : ....., Latetude : .....


End Point : Long : ....., Latetude : .....

Naran Inspector : 1.Camilio De Jesus

2. .....

3. .....

4. .....

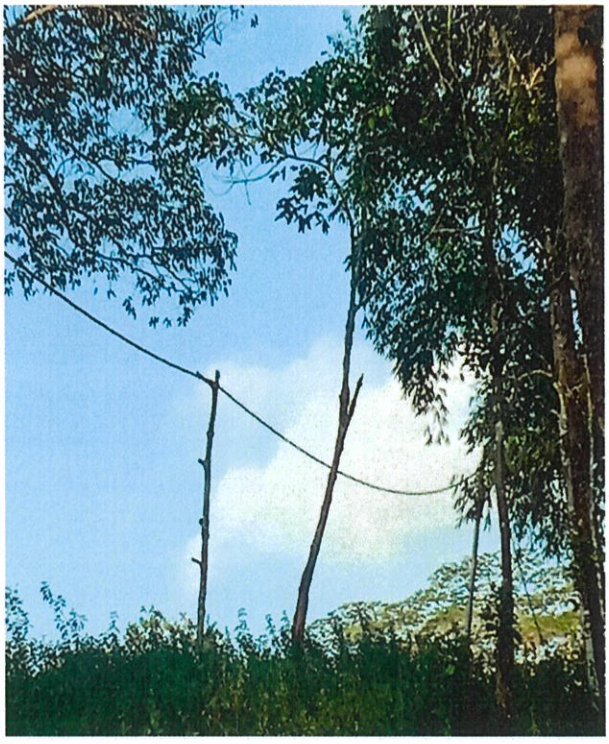
Foto Actual	Obervasaun
	Progresu iha Tereno Ladauk iha mudansa

ANEXO C1 (LV – 7)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399

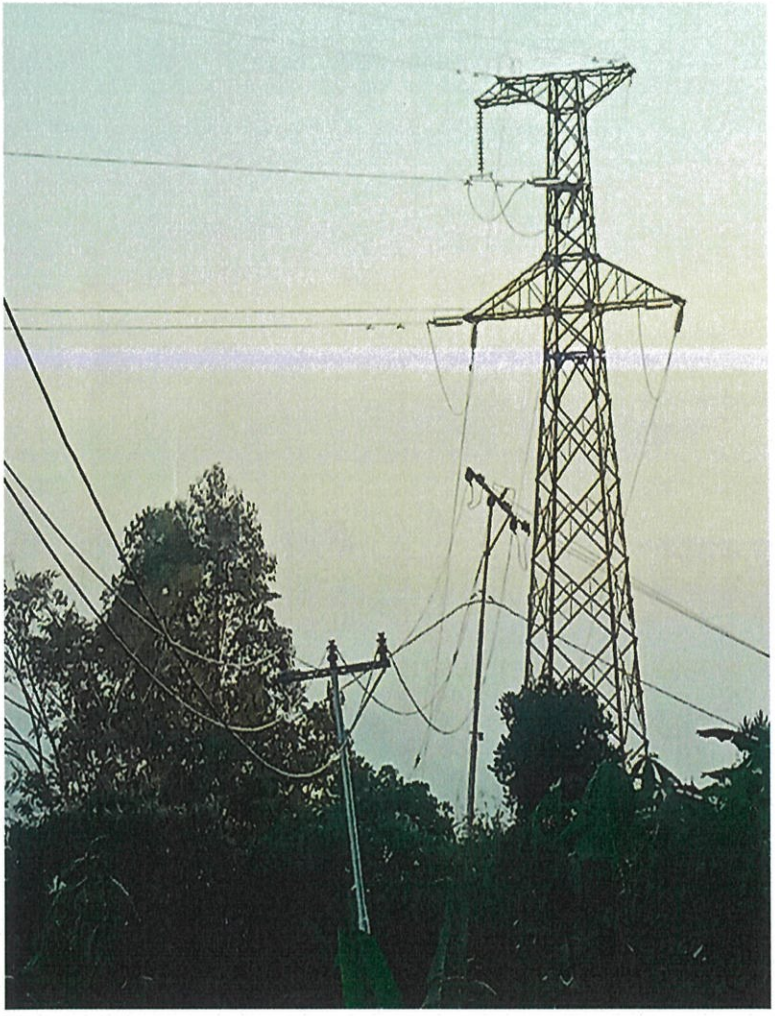Foto Actual	Obervasaun
	Poste Kleuk Presija hadia

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (LV - 7)
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality

Kompanha : Maferdi Unip Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/2/2022	Liquica/ Liquica Villa	Camilio de Jesus	Tek. AND.IP	1	Hadia Treckschoor nebe mak mamar	
					2	hadia poste kleuk	
					3	hadia fiu baixa tensaun nebe mak monu	
					4		
					5		
II	20/6/2022	Liquica/ Liquica Villa	Camilio de Jesus	Tek. AND.IP	1	Hadia Treckschoor nebe mak mamar	
					2	hadia poste kleuk	
					3	hadia fiu baixa tensaun nebe mak monu	
					4	Kompleta servisu	
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Camilio de Jesus

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JUNHO We 1	Th 2	fr 3	Sa 4	Su 5	Mo 6	Tu 7	We 8	Th 9	fr 10	Sa 11	Su 12	Mo 13	Tu 14	We 15	Th 16	fr 17	Sa 18	Su 19	Mo 20	Tu 21	We 22	Th 23	fr 24	Sa 25	Su 26	Mo 27	Tu 28	We 29	Th 30	OBS
Liquica Vila (LV)	7	Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Liquica	Metalika Unipessoal, Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/01	PDIM	ESTATAL	Plan																													
							Actual																															
	8	New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															seldauk Kompleta servisu
							Actual																															
	9	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Paradu
							Actual																															
	10	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															
							Actual																															
	11	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															
							Actual																															
	13	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	Naesalobu	MAP-P02019:19532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																															
							Actual																															
Maubara (MA)	1	Addt. Poste liga Maubara	Fu Unip,Lda	0000	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Projectu refere La existe
							Actual																															
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															Paradu
Bazartete (BA)	1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	Mina petro leste Lda	RDTL-11004589	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															Projectu refere abandona
	3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	4	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																															
							Actual																															
	6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
TOTAL PROJETO ON-GOING																																				

Note:

Plano Periode Inspesaun Iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal Iha Dili

Implementasaun Plano Periode Inspesaun Iha tereinu

Inspesaun Pagamentu Anual Iha tereinu

Prepara Husi :

(Camilio de Jesus)
Tekniku M&E ADN.IP

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN.IP

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia guterres)
Adjuntu Diretor Executivo ADN.IP

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Camilio de Jesus

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JUNHO																										OBS
								We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Liquica Vila (LV)	7	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Liquica	Metalika Unipessoal, Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/01	PDIM	ESTATAL	Plan																													
							Actual																															
	8	New Installation MV, LV Line and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	9	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	10	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															
							Actual																															
	11	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															
							Actual																															
	13	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	Naesalobu	MAP-P02019:19532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																															
							Actual																															
Maubara (MA)	1	Addt. Poste liga Maubara	Fu Unip,Lda	0000	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
Bazartete (BA)	1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	Mina petro leste Lda	RDTL-11004589	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	4	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																															
							Actual																															
	6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
TOTAL PROJETO ON-GOING																																				

Note:

Plano Periode Inspesaun Iha tereinu | **Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili** | **Implementasaun Plano Periode Inspesaun Iha tereinu** | **Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu**

Prepara Husi :

(Camilio de Jesus)
Tekniku M& E ADN.IP

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN.IP

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia guterres)
Adjuntu Director Executivo ADN.IP
