REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

A.D.N. I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

RELATÓRIU MENSÁL IMPLEMENTASAUN PROJETUS MUNISÍPIU LIQUICA

MARÇO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTASAUN PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO LIQUICA MARSU 2022

Prepara Husi :

(Eng.Juninho Antonio A. Da Cruz)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio LIQUICA ADN, I.P

(Eng. Marcus Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,Transporte e Irigasaun, Municipio LIQUICA ADN, I.P

(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. ba Projeto ME Municipio LIQUICA ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, ADN, I.P

(Eng. João Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun, ADN, I.P

(Deolindo de Fatima Marques)
Chefe Seksaun ba Projeto M. E & ITC,ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T, M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO 1

I. INTRODUSAUN. 3

1.1 Enkuadramentu Legal. 3

1.2 Perfil Municipio LIQUICA 3

1.3 Lista Projecto 7

II. PROGRESU FISIKU 18

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan 18

III OBSTÁKLU IHA TERENU 18

3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu 18

VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU 19

4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu 19

INDICE TABELA

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio LIQUICA 5

Tabela 1. 2: Lista Asset ADN,I.P Municipio LIQUICA 5

Tabela 1.3. 1 Projecto Municipio Ermera Por Fundus Financimento 7

Tabela 1.3. 2 Projecto Muncipio LIQUICA Por Sectores 9

Tabela 1.3. 3 Projecto Municipio Ermera Por Ministerios 14

Tabela 4. 1 : Dadus populasaun Munisipiu LIQUICA 18

I. INTRODUSAUN.

1.1 Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Púbico (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análize kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viavél.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Púbico (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimentu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun kualidade ba Projeto sira iha programa Kapital Desenvolvimentu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio LIQUICA





Mapa hatudu pozisaun Administrasaun Munisipal LIQUICA iha luan area 543 km² ho populasaun nain – 63.403 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal LIQUICA iha Postu Administrativu tolu (3) , Sukus 23 no aldeias 134, mak hanesan hatudu iha Tabela 1

Tabela 1: Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.

Bazartete		LIQUICA		Maubara	
sukus	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**
Fahilelo	3	Açumano	4	Gugleur	11
Fatumasi	4	Darulete	4	Guiço	5
Lauhata	5	Dato	10	Lissadila	7
Leorema	10	Hatuquesi	8	Maubaralilssa	5
Maumeta	4	Leotala	5	Vatuboro	5
Metagou	3	Loidahar	4	Vatuvou	10
Motaulun	3	Luculai	4	Vaviquinia	7
Tibar	4	-	-	-	-
Ulmera	9	-	-	-	-
Total	**45**	-	**39**	-	**50**

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 58

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio LIQUICA

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio LIQUICA								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		2				2	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
Total			**3**				**3**	

Tabela 1. 2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio LIQUICA

ASSET ADN,IP MUNICIPIO LIQUICA								
No	**Deskrisaun**	**Total Aset Kada Tinan**					**Total**	**OBS**
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**		
1	Edificio		1					
2	Kareta		1					
3	Desktop HP / Monitor		1					
4	Laptop HP		1					
5	Printer Cannon		1					
6	UPS		1					
7	Armario File		1					
8	Armario Tau hena		3					
9	Meja escritorio		1					
10	Meja han		1					
11	Meja TV (kiik)		1					
12	Kadeira escritorio		6					
13	Kadeira han		4					

14	Sofa		1 Set					
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3		3 Set					
16	Jeleira		1					
17	Water Dispenser		1					Aát
18	TV + Parabola		1 Set					
19	AC		4					
20	Kipas Angin		1					
21	Kompor		1					
22	Kompor Gas		1					
23	Rack sepatu		3					
24	Rack Piring		1					
25	Lampu		11					
26	Water Pump Sanyo		0					

1.3 Lista Projecto

Projeto hotu ne'ebe akumula iha lista neé bazeia ba dadus Projeto nebe sei lao hela no mos Projeto nebe abandona ona iha tinan barak nia laran, Projeto hirak ne'e fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projeto Por Fundus Finansiamento, Tabela 1.3.2 Projeto Por Sector no tabela 1.3.3 Projeto Por Ministerio, no lista detallu kada Projeto bele hare iha #Aneksu A.

Tabela 1.3. 1 Projecto Municipio LIQUICA Por Fundus Financiamento



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM (FUNDO COVID + CD + BS + TP etc..) + PDIM			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EXEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	26	$ 3,831,621.83	$ 2,023,032.82	52.80%
2	LIQUICA VILA	25	$ 5,229,024.82	$ 1,798,117.55	34.39%
3	MAUBARA	19	$ 12,054,713.43	$ 8,272,420.38	68.62%
	Grand Total	70	$ 21,115,360.08	$ 12,093,570.75	57.27%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EXEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	$ 557,358.72	$ 496,949.07	89.16%
2	LIQUICA VILA	4	$ 2,716,690.73	$ 1,516,050.42	55.81%
3	MAUBARA	5	$ 10,171,195.89	$ 8,018,036.38	78.83%
	Grand Total	11	$ 13,445,245.34	$ 10,031,035.87	74.61%

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FUNDO COVID			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EXEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	4	$ 433,364.88	$ 256,424.78	59.17%
2	LIQUICA VILA				
3	MAUBARA				
	Grand Total	**4**	**$ 433,364.88**	**$ 256,424.78**	**59.17%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM -CD			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EXEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	8	$ 1,222,729.07	$ 468,768.51	38.34%
2	LIQUICA VILA	11	$ 1,546,813.46	$ 119,286.47	7.71%
3	MAUBARA	8	$ 1,124,659.99	$ 43,761.73	3.89%
	Grand Total	**27**	**$ 3,894,202.52**	**$ 631,816.71**	**16.22%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EXEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	6	$ 1,012,262.38	$ 660,770.70	65.28%
2	LIQUICA VILA	3	$ 313,656.48	$ 162,780.66	51.90%
3	MAUBARA	1	$ 170,965.65	$ 72,706.50	42.53%
	Grand Total	**10**	**$ 1,496,884.51**	**$ 896,257.86**	**59.87%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	4	$ 289,002.61		
2	LIQUICA VILA	6	$ 474,930.65		
3	MAUBARA	3	$ 359,595.59		
	Grand Total	**13**	**$ 1,123,528.85**		

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EXEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	$ 316,904.17	$ 140,119.76	44.22%
2	LIQUICA VILA	1	$ 176,933.50	$ -	
3	MAUBARA	2	$ 228,296.31	$ 137,915.77	60.41%
	Grand Total	**5**	**$ 722,133.98**	**$ 278,035.53**	**38.50%**

Tabela 1.3. 2 Projecto Muncipio LIQUICA Por Sectores



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	AGRICULTURA	2	$ 91,877.21	$ 67,036.01	72.96%
2	AGUA E SANEAMENTO	3	$ 293,629.77	$ 167,315.56	56.98%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	2	$ 123,438.90	$ -	0.00%
4	EDUKASAUN	18	$ 1,956,926.91	$ 302,946.05	15.48%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	$ 1,670,588.86	$ 1,297,809.30	77.69%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO	1	$ 7,693,101.00	$ 5,795,051.15	75.33%
7	ESTRADAS	24	$ 5,012,524.75	$ 2,009,199.15	40.08%
8	FLOOD CONTROL	1	$ 502,473.28	$ 321,707.56	64.02%
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	9	$ 1,733,015.54	$ 1,066,681.96	61.55%
10	PORTOS	1	$ 1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%
11	SAUDE	2	$ 309,925.98	$ 256,424.78	82.74%
12	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 58,107.88	$ 47,623.31	81.96%
13	TURISMO	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	**70**	**$ 21,115,360.08**	**$ 12,093,570.75**	**57.27%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

NO	SECTOR	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	AGRICULTURA	2	$ 91,877.21	$ 67,036.01	72.96%
2	AGUA E SANEAMENTO	2	$ 122,664.12	$ 94,609.06	77.13%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	2	$ 123,438.90	$ -	
4	EDUKASAUN	7	$ 783,470.96	$ 165,030.28	21.06%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	$ 499,250.84	$ 449,325.76	90.00%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO				
7	ESTRADAS	6	$ 620,770.99	$ 64,558.26	10.40%
8	FLOOD CONTROL	1	$ 502,473.28	$ 321,707.56	64.02%
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	$ 719,641.67	$ 556,717.80	77.36%
10	PORTOS				
11	SAUDE	2	$ 309,925.98	$ 256,424.78	82.74%
12	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 58,107.88	$ 47,623.31	81.96%
13	TURISMO				
	Grand Total	**26**	**$ 3,831,621.83**	**$ 2,023,032.82**	**52.80%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

NO	SECTOR	LIQUICA VILA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO				
3	EDIFICIOS PUBLICOS				
4	EDUKASAUN	7	$ 642,009.75	$ -	
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	$ 869,577.80	$ 630,877.47	72.55%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO				
7	ESTRADAS	9	$1,365,759.10	$ -	
8	FLOOD CONTROL				
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	6	$ 956,928.17	$ 509,964.16	53.29%
10	PORTOS	1	$1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%
11	SAUDE				
12	SEGURANCA NO DEFESA				
13	TURISMO				
	Grand Total	**25**	**$5,229,024.82**	**$1,798,117.55**	**34.39%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

NO	SECTOR	MAUBARA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO	1	$ 170,965.65	$ 72,706.50	42.53%
3	EDIFICIOS PUBLICOS				
4	EDUKASAUN	4	$ 531,446.20	$ 137,915.77	25.95%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	$ 301,760.22	$ 217,606.07	72.11%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO	1	$ 7,693,101.00	$5,795,051.15	75.33%
7	ESTRADAS	9	$ 3,025,994.66	$1,944,640.89	64.26%
8	FLOOD CONTROL				
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	1	$ 56,445.70	$ -	
10	PORTOS				
11	SAUDE				
12	SEGURANCA NO DEFESA				
13	TURISMO	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	**19**	**$ 12,054,713.43**	**$8,272,420.38**	**68.62%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

Tabela 1.3. 3 Projecto Municipio LIQUICA Por Ministerios



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN ($)
1	ESTATAL	3	$ 387,568.54	$ -	
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	3	$ 139,176.53	$ 104,901.53	75.37%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	38	$16,370,980.54	$10,537,396.47	64.37%
4	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$ 58,107.88	$ 47,623.31	81.96%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	$ 1,956,926.91	$ 302,946.05	15.48%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 99,484.80	$ 82,502.69	82.93%
7	MINISTERIO SAUDE	4	$ 433,364.88	$ 256,424.78	59.17%
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	1	$ 1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	**70**	**$21,115,360.08**	**$12,093,570.75**	**57.27%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

NO	DONO DO PROJETO	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN ($)
1	ESTATAL	1	$ 154,189.34	$ -	
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	2	$ 91,877.21	$ 67,036.01	72.96%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	10	$ 2,211,126.76	$1,404,415.75	63.52%
4	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$ 58,107.88	$ 47,623.31	81.96%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	7	$ 783,470.96	$ 165,030.28	21.06%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 99,484.80	$ 82,502.69	82.93%
7	MINISTERIO SAUDE	4	$ 433,364.88	$ 256,424.78	59.17%
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN				
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
	Grand Total	**26**	**$3,831,621.83**	**$ 2,023,032.82**	**52.80%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

NO	DONO DO PROJETO	LIQUICA VILA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAG EM EXEKUSAUN ($)
1	ESTATAL	1	$ 176,933.50	$ -	
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	$ 47,299.32	$ 37,865.52	80.06%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	15	$2,968,032.25	$1,102,976.11	37.16%
4	MINISTERIO DO INTERIOR				
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	7	$ 642,009.75	$ -	
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU				
7	MINISTERIO SAUDE				
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	1	$1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
	Grand Total	**25**	**$5,229,024.82**	**$1,798,117.55**	**34.39%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

NO	DONO DO PROJETO	MAUBARA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN ($)
1	ESTATAL	1	$ 56,445.70	$ -	
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS				
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	13	$11,191,821.53	$8,030,004.61	71.75%
4	MINISTERIO DO INTERIOR				
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	4	$ 531,446.20	$ 137,915.77	25.95%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU				
7	MINISTERIO SAUDE				
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN				
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	**19**	**$12,054,713.43**	**$8,272,420.38**	**68.62%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

Tabela 4. 1 : Dadus Populasaun Munisipiu LIQUICA

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Bazartete	31,983	9,158	9,039	7,089	6,697
Liquiça	25,334	6,978	7,348	5,672	5,337
Maubara	25,234	7,088	6,802	5,766	5,578

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi Progressu servisu nebe kompanha sira atinji iha fulan neé nia laran, husi lista nebe iha #Anexu B hatudu progressu aktual fulan ida neé ho nia persentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento nebe hetan husi progressu fulan ida neé, ikus liu persentagen aktual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativa husi porsento anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detailho bele hare iha #Anexu B, detallu ba Backup Fotografia #Anexu C1, Detallu ba Backup BoQ #Anexu C2 no Instrusaun servisu bele hare #Anexu D

III. OBSTÁKLU IHA TERENU

3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu

Durante iha Fulan ida nia laran, problema nebe ami enjineiru municipio hasoru mak hanesan :

1. Projeto lao tarde
2. Companhia balun servisu la tuir spesifikasaun
3. Companhia balun servisu la iha Site Engineer
4. Difikulidade ba Ekipa ADN M.LIQUICA hasoru susar ba Be'e mos

VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu

1. Rekomenda ba Kompanhia sira servisu tuir spesifikasaun nebe iha ona
2. Rekomenda ba Kompanhia sira tenke iha Site Engineer iha terenu

Rekomenda ba ADN.I.P. Nacional liu-liu ba Superior sira hodi hare ba Edificio ADN.I.P.

Note : Assinatura Husi Enjineiru Municipio LIQUICA

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio LIQUICA					
No	**Deskrisaun**	**Identidade**			
		Naran Kompletu e Asinatura	**Nu. ID Card**	**Pozisaun**	**Fotografia**
1	Enjineiru	Juninho António A. Da Cruz	216	Enjineiru EPAS	
		Marcus Kimenes de Araujo	172	Enjineiru ITI	
		Camilio de Jesus	061	Enjineiru METIC	

2	Enjineira	Nencia F.O. do Rêgo	173	Enjineira VEBD	
3	Motorista	Rui Antonio Gaio	029	Motorista	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO A

Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica - Marsu 2022

NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESIO FISIKU (%)	PROGRESIO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	BAZARTETE	LIQUICA	Mina Petro Leste Unip, Lda	RDTL-11004589	$ 499,250.84		100.00%	90.00%	$ 449,325.76	$ 49,925.08	ABANDONA	
2	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Banir Lema	MPW-W-190097	$ 565,452.33	Aug. 14, 2019	100.00%	98.46%	$ 556,717.80	$ 64,406.31	PHO	Progresio Fisiko 100% e hela pagamento retensaun 10%
3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa ICA + CBI	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	$ 162,714.83	Aug. 16, 2019	95.68%	86.11%	$ 140,119.76	$ 22,595.07	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
4	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	$ 73,270.51	Sept. 5, 2019	100.00%	88.11%	$ 64,558.26	$ 8,712.25	PHO	Progresu fizikamente 100 % e sei falta pagamento ba retensaun
5	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	$ 23,950.17	Dec. 5, 2019	77.60%	69.84%	$ 16,726.74	$ 7,223.43	ON-GOING	Provezorlamente servisu paradu hela
6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-O-R)	$ 67,492.69	Nov. 10, 2019	41.01%	36.91%	$ 24,910.52	$ 42,582.17	ON-GOING	
7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	$ 23,179.32	Oct. 22, 2019	79.24%	52.23%	$ 12,106.37	$ 11,072.90	ON-GOING	Provezorlamente servisu paradu hela
8	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	SEGURANCA NO DEFESA	BAZARTETE	LIQUICA	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	$ 58,107.88	Nov. 29, 2019	86.27%	81.96%	$ 47,623.31	$ 10,484.57	ON-GOING	
9	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisul	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Naesalobu	MAP-P02019:19532	$ 67,927.04	Dec. 5, 2019	82.29	74.06%	$ 50,309.27	$ 17,617.77	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Queson SO Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	$ 66,557.90	Oct. 23, 2020	73.90%	66.51%	$ 44,268.56	$ 22,289.34	ON-GOING	ongoing
11	New construction of isolation for covid 19 in liquica, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	$ 243,368.08	Oct. 22, 2020	96.86%	87.18%	$ 212,156.22	$ 31,211.86	PHO	Projetu refere hela retensaun (10%) e Fisiku iha Tereno atinji deit 96.86%
12	Kanalizasaun Be Mos no Sistema Gravitasaun iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM -CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	$ 99,484.80	Sept. 9, 2019	92.14%	82.93%	$ 82,502.69	$ 16,982.11	ON-GOING	Falta retensaun
13	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	FLOOD CONTROL	BAZARTETE	LIQUICA	Sali Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	$ 502,473.28	Sept. 20, 2021	99.75%	64.02%	$ 321,707.56	$ 180,765.72	ON-GOING	ON-GOING
14	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 154,189.34	Aug. 31, 2021	9.33%	0.00%	$ -	$ -	New	
15	R4D Rural Road Spot Improvemret Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-NCB-R -21030	$ 149,732.87	Oct. 01, 2021	6.61%	0.00%	$ -	$ -	New	
16	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-RFQ - 21017	$ 88,852.44	Oct. 01, 2021	3.29%	0.00%	$ -	$ -	New	
17	R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000-7+000, liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatuleo Unip Lda	MPW-W-210144	$ 88,425.80	Oct. 01, 2021	12.46%	0.00%	$ -	$ -	New	
18	Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Craeleki Bercoli Unip,Lda	MPW-W-210145	$ 62,024.04	Oct. 01, 2021	6.85%	0.00%	$ -	$ -	New	
19	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	TM Calleba Unip,Lda	MPW-W-210158	$ 158,465.33	Oct. 01, 2021	5.21%	0.00%	$ -	$ -	New	
20	New Construction of Fence Around for Isolation COVID-19 in Liquica Maumeta, Ministerio da Saude Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	Biamali Unipessoal Lda	RDTL-MS	$ 65,271.32		20.25%	0.00%	$ -	$ -		
21	Supply and installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	ZYC UNIPESSOAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	$ 58,167.58	11/01/2022	11.30%	0.00%	$ -	$ -		
22	Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	U-Rema Unip. Lda.	NCB:15/MEJD/DNA/2021	$ 264,260.83	1/11/2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
23	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	Grupu Komunitariu	$ 9,072.12	15/10/2021	10.86%	0.00%	$ -	$ -	New	
24	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Ermeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	Grupu Komunitariu	$ 86,365.84	15/10/2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
25	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	Grupu Komunitariu	$ 78,250.89	15/10/2021	9.37%	0.00%	$ -	$ -	New	
26	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Bogoro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	Grupu Komunitariu	$ 115,313.76	15/10/2021	5.24%	0.00%	$ -	$ -	New	
27	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	$ 153,851.88	Dec. 5, 2019	95.77%	81.19%	$ 124,915.14	$ 28,936.74	ON-GOING	Servisu iha Tereno remata tiha ona, sei hein kompanha Amenda kontratu nebe mate tiha ona
28	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	$ 1,394,750.00	May 17, 2017	47.12%	47.12%	$ 657,275.92	$ 737,474.08	ON-GOING	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO A

Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica - Marsu 2022

NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESIO FISIKU (%)	PROGRESIO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
29	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Nheu	MPW-W-RFO-190093	$ 55,012.05	Aug. 22, 2019	100%	99.91%	$ 54,964.83	$ 5,543.70	PHO	Projetu refere hela retensaun (10%) e Fisiku iha Tereno atinji delt 99.91%
30	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taitabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	$ 71,468.49	Aug. 19, 2019	100%	90.00%	$ 64,321.64	$ 7,146.85	PHO	Projetu lda neé Remata ona, no hela Retensaun 10% e pagamento atinji 100%
31	New Installation MV, LV Line and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	$ 593,093.80	Jan. 6, 2017	91.66%	67.45%	$ 400,036.22	$ 193,057.58	ON-GOING	
32	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	$ 276,484.00	July 6, 2016	92.77%	83.49%	$ 230,841.25	$ 45,642.75	ON-GOING	
33	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raeiti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	$ 452,362.93	Dec. 20, 2019	79.93%	50.38%	$ 227,897.03	$ 224,465.90	ON-GOING	
34	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Banir Lema Unip,Lda	RDTL 0000	$ 47,299.32	Aug. 18,2021	88.95%	80.06%	$ 37,865.52	$ 9,433.80	ON-GOING	
35	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 176,933.50	Aug. 31, 2021	3.83%	0.00%	$ -	$ -	New	
36	R4D Rural Road Spot Improvement Beriakuldu-Laberiaka Chainage 0+000-2+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21025	$ 131,219.62	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
37	R4D Rural Road Spot Improvement Taitabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MOP - CD - NCB-R - 21036	$ 123,631.72	Oct. 01, 2021	5.34%	0.00%	$ -	$ -	New	
38	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou - Aibenu Chainage 0+000-7+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	MOP - CD - NCB -R - 21038	$ 238,739.71	Oct. 01, 2021	14.72%	0.00%	$ -	$ -	New	
39	R4D Rural Road Spot Improvement Dato - Loidahar Chainage 0+000-12+300, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Luquell Oan Unipessoal Lda	MOP-CD-NCB-R - 21039	$ 188,589.13	Oct. 01, 2021	3.36%	0.00%	$ -	$ -	New	
40	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 5+000 - 10 +000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Calulu, Unip Lda	MOP - CD - NCB -R - 21035	$ 162,215.27	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
41	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 0+000 - 5+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Vicaroman, Unip Lda	MOP - CD NCB - R - 21034	$ 165,363.43	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
42	R4D Rural Road Spot Improvement Beriakuldu - Laberiaka Chainage 2+500-5+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Claridade Unip,Lda	MPW-W-210163	$ 167,071.89	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
43	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Craeleki Bercoli, Unip Lda	MPW-W-210143	$ 76,423.05	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
44	Projeitu Konstrusaun foun ESG publico 01 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM -CD	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Roman Furak Unip,Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	$ 167,079.099	Nov. 1, 2021	18.23%	0.00%	$ -	$ -	New	
45	Roads Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (A03)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Chanel Chander Unipessoal Lda	MPW-W-210202	$ 112,505.280	13/12/2021	2.40%	0.00%	$ -	$ -	New	
46	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Mauboque	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	Grupu Komunitariu	$ 112,530.010	15/10/2021	9.48%	0.00%	$ -	$ -	New	
47	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBC 1,2,3 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	Grupu Komunitariu	$ 99,456.040	15/10/2021	8.55%	0.00%	$ -	$ -	New	
48	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Loidahar	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	Grupu Komunitariu	$ 79,735.630	15/10/2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
49	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Laciolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	Grupu Komunitariu	$ 89,650.660	15/10/2021	9.25%	0.00%	$ -	$ -	New	
50	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Tolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	Grupu Komunitariu	$ 88,407.020	15/10/2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
51	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Luculai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	Grupu Komunitariu	$ 5,151.290	15/10/2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
52	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Fu Unip,Lda	RDTL - 0000	$ 13,000.00	Jan. 1, 2016	0.00	0.00%	$ -	$ 13,000.00	New	
53	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kuiau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	$ 288,760.22	July 6, 2016	83.73%	75.36%	$ 217,606.07	$ 71,154.15	ON-GOING	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO A

Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica - Marsu 2022

NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESIO FISIKU (%)	PROGRESIO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
54	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	$ 1,901,334.67	Sept. 7, 2017	99.98%	99.98%	$ 1,900,879.16	$ 190,543.43	ON-GOING	
55	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	$ 275,000.00	Dec. 27, 2016	40.00	38.00%	$ 104,500.00	$ 170,500.00	ON-GOING	
56	Novo Konstrusaun Edificio ESTV Lisadila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	$ 171,850.61	Aug. 16, 2019	89.17%	80. 25%	$ 137,915.77	$ 33,934.84	ON-GOING	
57	Rehabilitasaun Sistema be'e mos Iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	MAUBARA	LIQUICA	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	$ 170,965.65	Jan. 3, 2019	54.99%	42.53%	$ 72,706.50	$ 98,259.15	ON-GOING	Provizoriamente paradu hela
58	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	MAUBARA	LIQUICA	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	$ 7,693,101.00	May 3, 2017	75.33%	75.33%	$ 5,795,051.15	$ 1,898,049.85	ON-GOING	
59	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Daruiema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Lullana Unip,Lda	MPW-W-190098	$ 50,702.59	Aug. 28, 2019	95.90%	86.31%	$ 43,761.73	$ 6,940.86	ON-GOING	
60	Konstrusaun Moru Haleu no Posto Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Rafio Unip. Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	$ 56,445.70	July 21, 2021	16.32%	0.00%	$ -	$ -	New	
61	R4D Rural Road Spot Improvement Nunulete - Daruiema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Rito - Pu, Unipessoal,Lda	MOP -CD-RFO - 21013	$ 67,382.23	Oct. 01, 2021	2.07%	0.00%	$ -	$ -	New	
62	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Malibo, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21033	$ 152,622.90	Oct. 01, 2021	3.81%	0.00%	$ -	$ -	New	
63	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Nheu, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21027	$ 173,484.62	Oct. 01, 2021	21.18%	0.00%	$ -	$ -	New	
64	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Murak, Unipessoal Lda	MPW-W-210157	$ 153,049.65	Oct. 01, 2021	5.87%	0.00%	$ -	$ -	New	
65	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500l	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Meta Loe Crae Bau Unip,Lda	MPW-W-210160	$ 198,698.25	Oct. 01, 2021	5.70%	0.00%	$ -	$ -	New	
66	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo -Cisu Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Nazico Unip Lda	-	$ 114,789.50	Oct. 01, 2021	2.18%	0.00%	$ -	$ -	New	
67	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400l	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-210161	$ 213,930.25	Oct. 01, 2021	2.25%	0.00%	$ -	$ -	New	
68	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Gariana	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	Grupu Komunitariu	$ 117,902.04	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
69	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Tapo Manuhulu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	Grupu Komunitariu	$ 100,033.33	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
70	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Maubara/Batuvou	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	Grupu Komunitariu	$ 141,660.22	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
	TOTAL								$ 21,115,360.08				$ 12,093,570.75	57.27%		

PREPARA HUSI,

(Eng. Marcus Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projetu Infrastutura Transporte e Irigasaun, ADN,I.P

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Eng. ba Edificio Publiku Agua e Saneamento, ADN,I.P

(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. Mekanikal e Electrical, ADN,I.P

SERTIFIKA HUSI,

(Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

#ANEXO B

PROGRESSU FISIKU FULAN MARSU MUNICIPIO LIQUICA

					LOKALIZASAUN PROJETO					Mar-22		
NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Commulative Progress (%)
1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema - Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	BAZARTETE	LIQUICA	Mina Petro Leste Unip, Lda	RDTL-11004589	$ 499,250.84			
2	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Banir Lema	MPW-W-190097	$ 565,452.33			
3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	$ 162,714.83			
4	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	$ 73,270.51			
5	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	$ 23,950.17			
6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	$ 67,492.69			
7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	$ 23,179.32			
8	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	SEGURANCA NO DEFESA	BAZARTETE	LIQUICA	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	$ 58,107.88			
9	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Naesalobu	MAP-P02019:19532	$ 67,927.04			
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	FUNDO COVID	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Queson SO Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	$ 66,557.90			
11	New construction of isolation for covid 19 in liquica, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	FUNDO COVID	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	$ 243,368.08			
12	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM -CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	$ 99,484.80			
13	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	FLOOD CONTROL	BAZARTETE	LIQUICA	Sali Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	$ 502,473.28	78.22%	21.52%	99.75%
14	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 154,189.34			
15	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-NCB-R -21030	$ 149,732.87	3.14%	3.46%	6.61%
16	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-RFQ - 21017	$ 88,852.44	0.43%	2.86%	3.29%
17	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000-7+000, liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatuleo Unip Lda	MPW-W-210144	$ 88,425.80	5.01%	7.45%	12.46%
18	Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Craeleki Bercoli Unip,Lda	MPW-W-210145	$ 62,024.04	1.53%	5.32%	6.85%
19	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500l Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	TM Calleba Unip,Lda	MPW-W-210158	$ 158,465.33	0%	5%	5.21%
20	New Construction of Fence Around for Isolation COVID-19 in Liquica Maumeta, Ministerio da Saude Timor Leste	MINISTERIO DA SAUDE	Fundo Covid	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	Biamali Unipessoal Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233	$ 65,271.32	9.50%	10.76%	20.25%
21	Supply and installation connection for isolation and laboratorium Building Maumeta Liquica	MINISTERIO DA SAUDE	Fundo Covid	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	ZYC UNIPESSOAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	$ 58,167.58	6.95%	4.35%	11.30%
22	Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM -BS	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	U-Rema Unip. Lda.	NCB:15/MEJD/DNA/2021	$ 264,260.83			
23	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 9,072.12	0.00%	10.86%	10.86%
24	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Ermeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 86,365.84			
25	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 78,250.89	0.00%	9.37%	9.37%
26	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Bogoro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 115,313.76	0.00%	5.24%	5.24%
27	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	$ 153,851.88	95.77%	0.00%	95.77%
28	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	$ 1,394,750.00			

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

#ANEXO B

PROGRESSU FISIKU FULAN MARSU MUNICIPIO LIQUICA

				LOKALIZASAUN PROJETO					Mar-22		
NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Commulative Progress (%)
29	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	$ 55,012.05			
30	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	$ 71,468.49			
31	New Installation MV, LV Line and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	$ 593,093.80			
32	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	$ 276,484.00			
33	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	$ 452,362.93	76.44%	3.50%	79.93%
34	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Banir Lema Unip,Lda	RDTL 0000	$ 47,299.32			
35	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 176,933.50			
36	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-2+500, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21025	$ 131,219.62			
37	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MOP - CD - NCB-R - 21036	$ 123,631.72	0.00%	5.34%	5.34%
38	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Metaqou - Albenu Chainage 0+000-7+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	MOP - CD - NCB -R - 21038	$ 238,739.71	9.90%	4.82%	14.72%
39	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Dato - Liodahar Chainage 0+000-12+300, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Luquell Oan Unipessoal Lda	MOP-CD-NCB-R - 21039	$ 188,589.13	2.19%	1.17%	3.36%
40	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Albenu - Asumanu - Leurema Chainage 5+000 - 10 +000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Calulu, Unip Lda	MOP - CD - NCB -R - 21035	$ 162,215.27			
41	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Albenu - Asumanu - Leurema Chainage 0+000 - 5+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Vicaroman, Unip Lda	MOP - CD NCB - R - 21034	$ 165,363.43			
42	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuldu - Laberlaka Chainage 2+500-5+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Claridade Unip,Lda	MPW-W-210163	$ 167,071.89			
43	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Craeleki Bercoli, Unip Lda	MPW-W-210143	$ 76,423.05			
44	Projeitu Konstrusaun foun ESG publico 01 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM -CD	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Roman Furak Unip,Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	$ 167,079.099	9.60%	8.63%	18.23%
45	Roads Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (A03)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Chanel Chander Unipessoal Lda	MPW-W-210202	$ 112,505.280	1.01%	1.39%	2.40%
46	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Mauboque	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 112,530.010	0.00%	9.48%	9.48%
47	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBC 1,2,3 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 99,456.040	0.00%	8.55%	8.55%
48	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Loidahar	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 79,735.630			
49	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Laclolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 89,650.660	0.00%	9.25%	9.25%
50	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Tolema	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 88,407.020			
51	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF 1,2 Luculai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 5,151.290			
52	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Fu Unip,Lda	RDTL - 0000	$ 13,000.00			
53	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	$ 288,760.22			
54	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Montana Diak Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	$ 1,901,334.67			
55	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	$ 275,000.00			
56	Novo Konstrusaun Edificio ESTV Lisadila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	$ 171,850.61			
57	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	MAUBARA	LIQUICA	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	$ 170,965.65			
58	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	MAUBARA	LIQUICA	Dongsung Engineering Co.Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	$ 7,693,101.00			
59	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-190098	$ 50,702.59			
60	Konstrusaun Moru Haleu no Posto Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Rafio Unip. Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	$ 56,445.70			
61	R4D Rural Road Spot Improvement Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Rito - Pu, Unipessoal,Lda	MOP -CD-RFQ - 21013	$ 67,382.23	0.00%	2.07%	2.07%

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P

#ANEXO B

PROGRESSU FISIKU FULAN MARSU MUNICIPIO LIQUICA

					LOKALIZASAUN PROJETO					Mar-22		
NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Commulative Progress (%)
62	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Malibo, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21033	$ 152,622.90	0.00%	3.81%	3.81%
63	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Nheu, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21027	$ 173,484.62	11.69%	9.49%	21.18%
64	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Murak, Unipessoal Lda	MOP - CD- NCB-R- 21032	$ 153,049.65	2.49%	3.38%	5.87%
65	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Meta Loe Crae Bau Unip,Lda	MPW-W-210160	$ 198,698.25	1.67%	4.03%	5.70%
66	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo -Gisu Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Nazico Unip Lda	MPW-W-210152	$ 114,789.50	0.00%	2.18%	2.18%
67	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-210161	$ 213,930.25	0.71%	1.55%	2.25%
68	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Garlana	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 117,902.04			
69	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EBF Tapo Manuhulu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 100,033.33			
70	Konstrusaun ka Reabilitasaun ba ESG-Paralelo Maubara/Batuvou	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Grupu Komunitariu	-	$ 141,660.22			

INSPEKSAUN HUSI,

(Eng. Marcus de Araujo Ximenes)
Engineru ba Projetu Infrastrutura Transporte e Irigasaun ADN,I.P

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Engineru ba Edifisio Publiku Agua e Saneamento ADN,I.P

Camilo de Jesus
Engineru ba Projetu Mekanikal e Elektrikal ADN,I.P

VERIFIKA HUSI,

(Eng. Jose Paulo Amaral)
Engineru Senior ba Projetu Infrastutura Transporte e Irigasaun ADN,I.P

(Arq. Francisco Xavier D D. Jeronimo)
Engineru Senior ba Projetu Edificio Publiko no Be'e Saneamento ADN,I.P

(Eng. Deolindo de Fatima Marques)
Chefe Seksaun Mekanikal e Elektrikal & ITC ADN,I.P

MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICACOES

ADN, I.P

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2022

MARCO

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono de Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	ORS
Liquica Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Caimbala - Leon (A03) Municipality Liquica 162	Naroman Modu Dadaun Unip Lda	MPW-W130230	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			Pagamento sesbuk 100%.
							Actual																																				
	2	R4D Rural Road Periodic Maintenance Adeanu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Routine Maintenance Dato - Liquica - Ledalur Chainage 0+000 - 17+300 Municipality Liquica	Nhcv	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			FIO
							Actual																																				
	3	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukalau Chainage 0+000 & Metagou - Adeanu Chainage 0+000 - 5+400 Rutine Maintenance Tallabi - Ledalur Chainage 0+000 - 17+300 Municipality Liquica (LV)	Geobara Unip Lda	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			PHO
							Actual																																				
	4	R4D Rural Road Rehabilitation Behadiri - Lebekalalo Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	16 Raelli Unip Lda	RT 034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Ledalur Chainage 0+000-12+300)	Luquetti Oan Unip Lda	MPW-W-210150	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Adeanu-Asumanu Chainage 5+000-10+000)	Ceiru Unip Lda	MPW-W-210154	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Adeanu-Asumanu Ledalur-Fatumean Chainage 0+000-5+000	Vidaraman Unip Lda	MPW-W-210154	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Adeanu Chainage 0+000-7+000)	Mutalina Unipessoal Lda	MPW-W-210151	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Tallabi - Katulau Chainage 0+000-1+700)	Prudencia Construction Unip Lda	MPW-W-210153	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	10	Manutensaun Kanais Irrigasaun Laulora - Liquica	Banir Lema Unip Lda		LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																			FIO
							Actual																																				
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakudu-Laberlaka Chainage 0+000-2+900)	Goubara Unip Lda	MPW-W-210162	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakudu-Laberlaka Chainage 2+500-5+400)	Claridade Unip Lda			MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba- Lekalau Chainage 0+000-2+000)	Craeleki Bercoli Unip Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	14	Rua (Manutensaun Kodas no Tibar - Liquica - Maubara - Caimbala - Leon (A03)	Chantel Chandler Unip Lda	MPW-W-210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	15				LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																				
	16	Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publiku 01-Liquica	Roman Furak Unip Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																				
	17	Tibar Roads Maintenance Section Tibar Liquica Maubara Caimbala Leon (A03)	Chantel Chandler Unip Lda	MPW-W-210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
Maubara (MBR)	1	Addl. Poste Iha Maubara	Fu Unip Ltda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																				
	2	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalaa and Karumbala Liquica Municipality Liquica	Mordania Diak Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			FIO
							Actual																																				
	3	Konstruksaun ESTV Lesabla Maubara-Liquica (LA + CB)	Aleni Unip Lda	CBD 6/60 PDIM AM-LIQ VIII 2019 03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																				
	4	RNDSP - Road Link No. A01-103 - Upgrading and Maintenance of Maubara - Karumbala Road (Km 49.7 to Km 84.1 and Km 98.1 to Km 62 +and/ Maboe - Maza Ana Road (Km 85.3 to Km 114.2)	CIBMI Construcion Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB 077 MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			Ekipa ADN I.P nebe maka toma konta Projeto IMPRESTIMO
							Actual																																				
	5	R4D Rural Road Maintenance Berlakudu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Numuleta - Daralema Chainage 0+000-1+600 Cassunusa-Mudhat dist Chainage 0+000-12+500	Tutuma Unip Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			PHO
							Actual																																				On Going
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Barkoni (Vasiquena - Muraralisa Chainage 0+000-4+200)	Nhcv Unip Lda	MPW-W-210164	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																				On Going
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Nonuleta - Daralema Chainage 0+000-2+000) Liquica Municipality	Rio Fu Unip Lda	MPW-W-210146	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																				On Going
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Maumeta-Lesabla Chainage 4+800-9+600)	Malibo Unip Lda	MPW-W-210156	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																				On Going
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Maumeta-Lesabla Chainage 0+000-4+800)	Metak Unip Lda	MPW-W-210157	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																				On Going
	10	R4D Rural Road Spot Improvement Barkoni (Vasiquena - Muraralisa Chainage 8+400-12+500)	Meta Loe Crac Baa Unip Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																				On Going
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Sonarap-Atena Chainage 0+000-2+000)	Nazico Unip Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																				On Going
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Barkoni (Vasiquena - Muraralisa Chainage 4+200-8+400)	Tutuma Unip Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																				On Going
Bazartete (BZT)	1	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (BZT)	Banir Lema	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			FIO
							Actual																																				
	2	Konstruksaun ESTV Maumeta - Liquica (CA + CB)	Vida Diak Unip Lda	CBD 6/60 PDIM AM-LIQ VIII 2019 02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																				
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Lauiara - Fatumeto Chainage 0+000 - 7+000 & Fahalebo - Fatumean Chainage 0+000 - 2+500 Routine Maintenance Fahalebo-Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Leco Dato	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			PHO
							Actual																																				
	4	Konstruksaun Moralho Foun Matadoro Tibar	Maneko Unip Lda	RDTL-MAP-PO2019 19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																			
							Actual																																				
	5	Konstruksaun Foun EBE Betsyara Bazartete, Liquica (162)	Micha Unip Lda	(RFQ 19/029-Q-B)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																				
	6	Hamos Tangki Estasaun Tratamentu Agua Rendusaun Iha Tibar - 162	Culoco Unipessoal Lda	Contract No MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																				
	7	New Water Supply of Bairro PNH, Liquica	Hoiulo Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan																																			
							Actual																																				
	8	Konstruksaun Armazen Foun Metadoro (Bem Servisu)	Nassalobo	MAP-PO2017 15532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																			
							Actual																																				
	9	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Quesson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																			
							Actual																																				
	10	New construction of isolation for covid 19 in da liquica, Timor Leste	Serigu	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																			
							Actual																																				
	11	Konaklusaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Ba Aipelo-Liquica	Inocya	022/MURDTL/MPE/AND DA-RFQ/IX/2019/FEDERICO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																			
							Actual																																				
	12	Emergency Project For Tibar River	Sala Maga Unip Lda	RFQ 067 MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahalebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000)	Hatumeta Oan Unip Lda	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	14	R4D Rural Road Spot Improvement Fahalebo-Fatumean Chainage 0+000-2+500) Liquica Municipality	Hatumeta Oan Unip Lda	MPW-W-210142	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Lihulo - Fahalebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality	Hatuleo Unip Lda	MPW-W-210144	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	16	Routine Maintenance Maumeta Metagou Bazartete Chainage 0+000-10+000	Craeleki Bercoli Unip Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
	17	R4D Rural Road Spot Improvement Fahalebo-Bucumera Chainage 0+000-6+500) Liquica Municipality	TM Caileba Unip Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			On Going
							Actual																																				
		TOTAL PROJETO ON-GOING																																								

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu | Relatoriu avaliasaun mensal iha DSB | Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu | Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng Marcos Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infrastructura, Transportes e Irigasaun
Municipio Liquica ADN, I.P

Sertifika Husi

(Eng Emerenciano Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN I.P

Aprova Husi

(Eng Yanuario Maia Guteres)
Adjunto Directol Executivo ADN.I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VI.I GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	**Marcos Ximenes de Araujo**
Municipio	**MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS**

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	MARCO	OBS
Liquica Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		Pagamentu seidauk 100%
							Actual		
	2	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		FHO
							Actual		
	3	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	Goubara Unip.Lda	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		PHO
							Actual		
	4	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)	Luqueli Oan Unip.Lda	MPW-W-210150	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu Chainage 5+000-10+000)	Cailu Unip.Lda	MPW-W-210154	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leorema Chainage 0+000-5+000)	Vicaroman Unip.Lda	MPW-W-210155	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)	Metalika Unipessoal, Lda	MPW-W-210151	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700)	Prudencia Construction Unip.Lda	MPW-W-210153	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	10	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	Banir Lema Unip.Lda		LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan		FHO
							Actual		
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)	Goubara Unip.Lda	MPW-W-210162	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 2+500-5+400)	Claridade Unip.Lda			MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba- Lukulai Chainage 0+000-2+000)	Craeleki Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	14	Road Maintenance Section Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (A03)	Chantel Chander Unip.Lda	MPW-W-210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	15				LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	16	Projeita Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica	Roman Furak Unip.Lda	NCB/16/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan		
							Actual		
	17	For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)	Chanel Chander Unip.Lda	MPW-W210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
Maubara (MBR)	1	Addt. Poste liga Maubara	Fu Unip,Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		
	2	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		PHO
							Actual		
	3	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan		
							Actual		
	4	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		Ekipa ADN.I.P nebe maka toma konta Projeito IMPRESTIMO
							Actual		
	5	R4D Rural Road Maintenance Berlakuidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Numuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500	Luliana Unip.Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		PHO
							Actual		
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200)	Nheu.Unip.Lda	MPW-W-210164	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Numuleta - Darulema Chainage 0+000-2+000) Liquica Municipality	Rito-Pu Unip.Lda	MPW-W-210146	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 4+800-9+600)	Malibo Unip.Lda	MPW-W-210156	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 0+000-4+800)	Murak.Unip.Lda	MPW-W-210157	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	10	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 8+400-12+500)	Meta Loc Crae Bau.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo-Gisu Chainage 0+000-2+000)	Nazico.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	Luliana Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
Bazartete (BZT)	1	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	Banir Lema	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		FHO
							Actual		
	2	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan		
							Actual		
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libalou - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		PHO
							Actual		
	4	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan		
							Actual		
	5	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazarteto, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan		
							Actual		
	6	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		
	7	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan		
							Actual		
	8	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	Naesalobu	MAP-P02019:19532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan		
							Actual		
	9	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan		
							Actual		
	10	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Serizu	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan		
							Actual		
	11	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan		
							Actual		
	12	Emergency Project For Tibar River	Sali-Magu Unip.Lda	RT/067/MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000)	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	14	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Fatumasi Chainage 0+000-2+300) Liquica Municipality	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210142	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Libalou- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality	Hatuleo Unip.Lda	MPW-W-210144	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	16	Routine Maintenance Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000-10+000	Craeleki Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
	17	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 3+000-6+500) Liquica Municipality	TM.Cailobu.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		On Going
							Actual		
TOTAL PROJETO ON-GOING									

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Iha Edifício Município Liquica

Prepara Husi :

(Eng.Marcos Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infrastructura, Transportes e Irigasaun
Municipio Liquica ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng.Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN.I.P

Aprova Husi :

(Eng.Januario Maia Guteres)
Adjunto Director Executivo ADN.I.P

ANEXO C1 (BZT16)

Naran Projeto :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000

Contractor : Hatumeta Oan Unip.Lda

No. kontratu :MOP - CD-NCB-R -21030

Data Inspeksaun : 23/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Libaloa -Bucumera

Koordinat :


Start Point :	Long :	125,3931986	Latetude	: - 8.63674152
End Point :	Long :	125,3833257	Latetude	: - 8.63314678

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*


Sta, 0+600 - 0+680



T	w	*Distacia*	*Volume*
0,40	0,25	53,60	10,72
0,15	1,00		8,04
Total			18,76 m³


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halo Line drain iha Suco Libaloa no Sta, 0+600 - 0+680

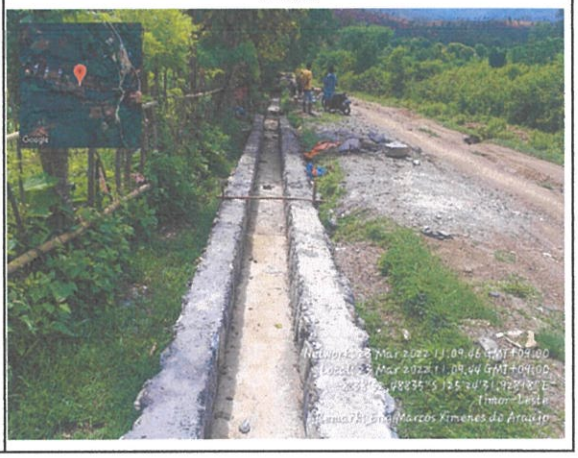

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 2+400 - 2+500



T	w	*Distacia*	*Volume*
0,40	0,25	103,00	20,60
0,15	1,00		15,45
Total			36,05 m³

Companhia halo Line drain iha Suco Libaloa no Sta, 2+400 - 2+500



ANEXO C1 (BZT16)

Naran Projeto :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000
Contractor : Hatumeta Oan Unip.Lda
No. kontratu :MOP - CD-NCB-R -21030

Data Inspeksaun : 23/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Libaloa -Bucumera

Koordinat :


Start Point :	Long :	125,3931986	Latetude	: - 8.63674152
End Point :	Long :	125,3833257	Latetude	: - 8.63314678

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : *Excavation*


Sta, 0+600 - 0+680



T	w	*Distacia*	*Volume*
0,55	1,00	103,00	113,30
Total			**113,30** m³


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halo Line drain iha Suco Libaloa no Sta, 0+600 - 0+680

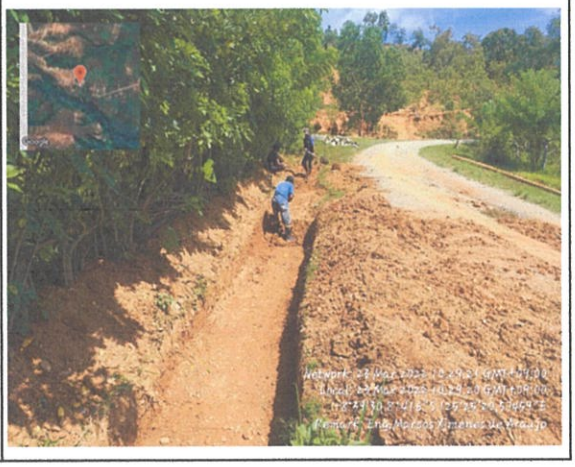


Sketch Item servisu : *Excavation*

Sta, 2+400 - 2+500



T	w	*Distacia*	*Volume*
0,55	1,00	103,00	113,30
Total			**113,30** m³

Companhia halo Line drain iha Suco Libaloa no Sta, 2+400 - 2+500

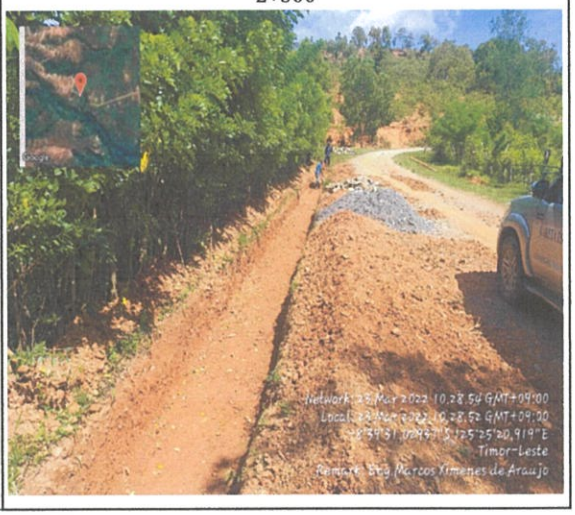

ANEXO C2 (BZT16)

Naran Projeto :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000

Contractor : Hatumeta Oan Unip.Lda

No. kontratu :MOP - CD-NCB-R -21030

SUMMARY												
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 2,000.00							$ 150.00	0.10%	$ 150.00	0.10%
R-02	Drainage	$ 97.72										
R-03	Earth work	$ 4,936.60					$ 340.28	0.23%	$ 113.43	0.08%	$ 453.71	0.30%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 793.80										
R-08	Structures	$ 97,039.43					$ 3,856.02	2.58%	$ 1,285.34	0.86%	$ 5,141.36	3.43%
R-11	Routine maintenance	$ 7,192.50							$ 168.00	0.11%	$ 168.00	0.11%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
	General items											
G-01	Security	$ 1,380.00							$ 345.00	0.23%	$ 345.00	0.23%
G-02	Project team	$ 12,150.00							$ 2,850.00	1.90%	$ 2,850.00	1.90%
G-03	Safety and protection	$ 4,103.00										
G-05	Meetings	$ 100.00										
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00										
G-07	Mineral fees	$ 5,091.88										
A	**Construction cost**	**$ 112,310.04**					**$ 4,196.30**	**2.80%**	**$ 1,716.77**	**1.15%**	**$ 5,913.07**	**3.95%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 11,231.00**					**$ 419.63**	**0.28%**	**$ 171.68**	**0.11%**	**$ 591.31**	**0.39%**
C	**General items**	**$ 23,024.88**					**$ -**	**0.00%**	**$ 3,195.00**	**2.13%**	**$ 3,195.00**	**2.13%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 2,931.32**					**$ 92.32**	**0.06%**	**$ 101.67**	**0.07%**	**$ 193.99**	**0.13%**
E	**Total**	**$ 149,732.87**					**$ 4,708.25**	**3.14%**	**$ 5,185.11**	**3.46%**	**$ 9,893.36**	**6.61%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (BZT16)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN **KADA PROJETO**

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000

Naran Kompanha : Hatumeta Oan Unipessoal.Lda

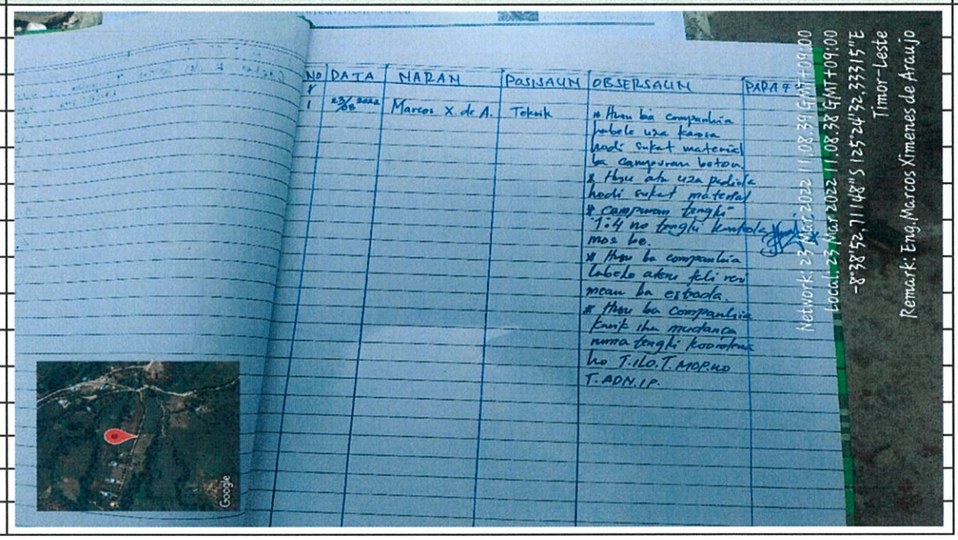No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	23/Marco/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4 5		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

ANEXO C1 (BZT14)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Project For Tibar River
Contractor : Sali-Magu Unip.Lda
No. kontratu : RT/067/MOP-2021

Data Inspeksaun : 31/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Tibar


Koordinat :

Start Point : Long : -8°34'29,372 Latetude : - 125°29'27,612
End Point : Long Latetude

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo (Teknik ADN.IP)


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Cyclop concrete (K-250) 21 Mpa

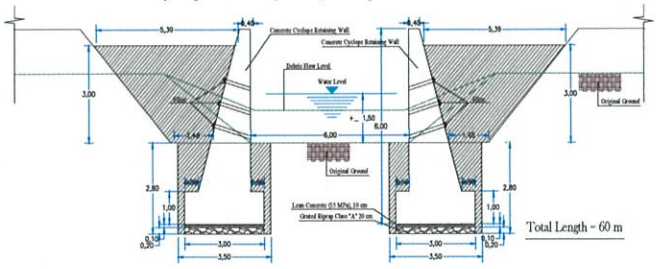


Uptrend Left & Right

T	W1	w2	area	Distacia	Volume
Wall					
5.00	2.00	0.40	6.00	10.00	60.00
Total					60.00

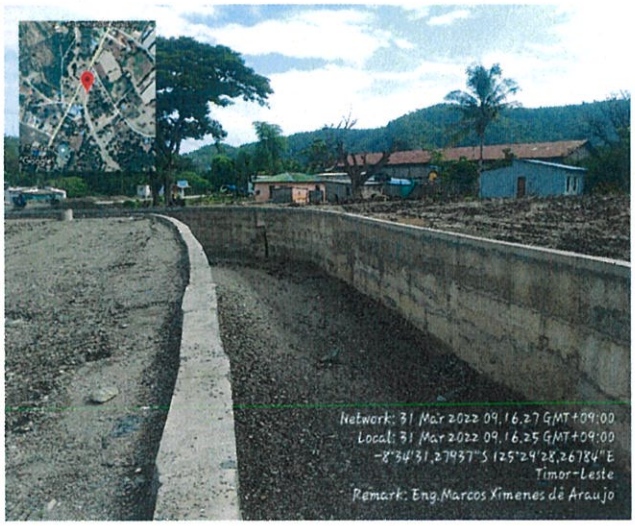

Sketch Item servisu : Cyclop concrete (K-250) 21 Mpa

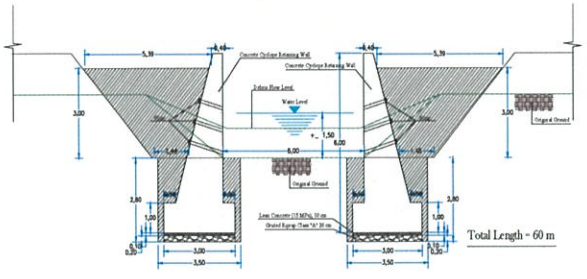

Downtrend Left & Right

T	W1	w2	area	Distacia	Volume
Wall					
5.00	2.00	0.40	6.00	10.00	60.00
Total					60.00



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (BZT14)

Contract Name : Emergency Project For Tibar River
No Contract : RT/067/MOP-2021
Name of Contractor : Sali - Magu Unip.Lda

SUMMARY

NO	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
100	GENERAL REQUIREMENTS	$ 1,790.00	$ -	$ -	$ -	$ 895.00	0.18%	$ 895.00	0.18%	$ 1,790.00	0.36%
200	EARTHWORKS	$ 29,230.77	$ -	$ -	$ -	$ 10,281.38	2.05%	$ 18,949.40	3.77%	$ 29,230.77	5.82%
300	BRIDGE CONSTRUCTION	$ 403,718.04	$ -	$ -	$ -	$ 328,272.56	65.33%	$ 75,445.48	15.02%	$ 403,718.04	80.35%
400	DRAINAGE AND SLOP PROTECTION WORKS	$ 10,802.88	$ -	$ -	$ -	$ 9,815.30	1.95%	-$ 142.87	-0.03%	$ 9,672.43	1.92%
Total - net cost		**$ 445,541.69**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 349,264.23**	**69.51%**	**$ 95,147.01**	**18.94%**	**$ 444,411.24**	**88.44%**
Profit (net cost x %) ; 10%		**$ 44,554.17**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 34,926.42**	**6.95%**	**$ 9,514.70**	**1.89%**	**$ 44,441.12**	**8.84%**
Over Head		**$ 2,525.00**				**$ 1,138.88**	**0.23%**	**$ 1,386.12**	**0.28%**	**$ 2,525.00**	**0.50%**
Tax (net cost + profit + overhead) x 2 %)		**$ 9,801.92**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7,706.59**	**1.53%**	**$ 2,120.96**	**0.42%**	**$ 9,827.55**	**1.96%**
Total gross-cost		***$ 502,422.78***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ 393,036.12***	***78.22%***	***$ 108,168.79***	***21.53%***	**$ 501,204.91**	**99.75%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P. M.Liquica

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL


ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (BA14)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Emergency Project For Tibar River

Kompanha : Sali - Magu Unip.Lda

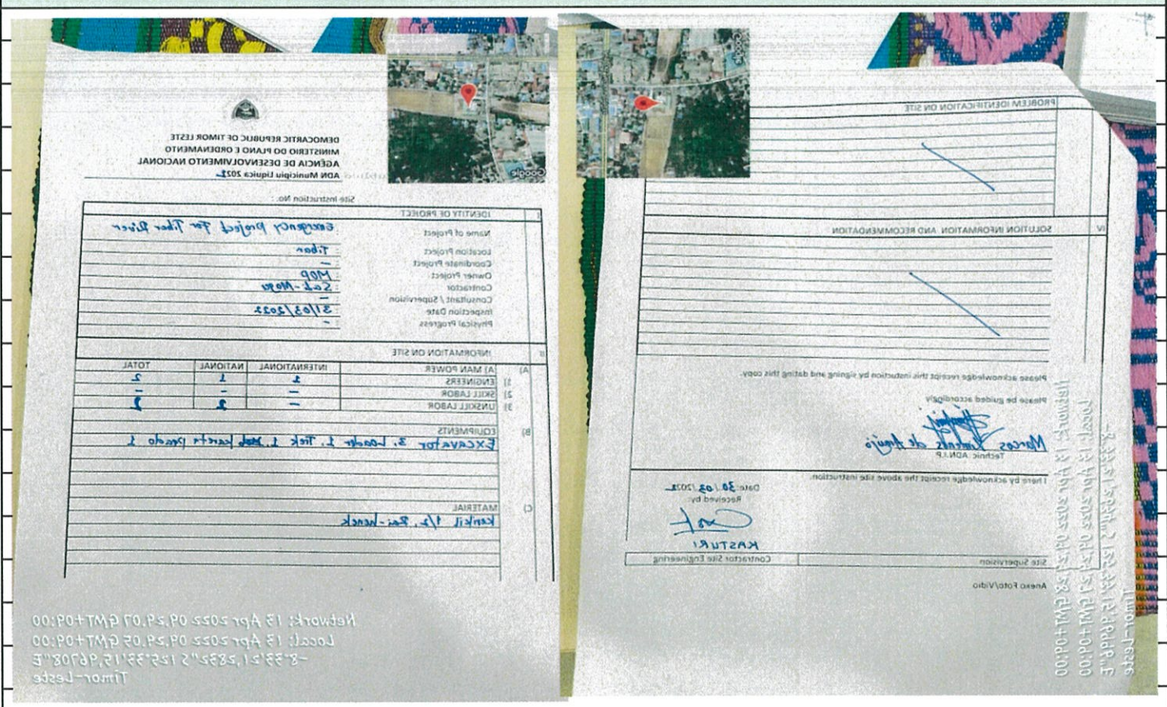No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	31/Marco/2022	Lquica/Bazartete	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

ANEXO C1 (BZT17)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality
Contractor : Hatumeta Oan Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD-RFQ - 21017

Data Inspeksaun : 23/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Fahilebo - Fatumasi

Koordinat :


Start Point : Long : 125.3931986 Latetude : - 8.63674152
End Point : Long : 125.3833257 Latetude : - 8.63314678

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Gabion*

Sta, 1+900




T	w	*Distacia*	*Volume*
1.00	2.00	5.00	10.00
Total			10.00 m³

Companhia halo Gabion iha Suco Fatumasi no Sta, 1+900. Husu ba companhia presija ateru husi bronjong nia kotuk



Sketch Item servisu : *Gabion*

Sta, 1+900



T	w	*Distacia*	*Volume*
1.00	2.00	5.00	10.00
Total			10.00 m³

Companhia halo Gabion iha Suco Fatumasi no Sta, 1+900. Husu ba companhia presija ateru husi bronjong nia kotuk



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (BZT17)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality
Contract No :MOP - CD-RFQ - 21017
Contractor : Hatumeta Oan Unipessoal.Lda

SUMMARY

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 1,400.00							$ 125.00	0.14%	$ 125.00	0.14%
R-02	Drainage	$ 171.01							$ 171.01	0.19%	$ 171.01	0.19%
R-03	Earth work	$ 3,655.46										
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 1,386.00										
R-08	Structures	$ 47,887.70					$ 341.04	0.38%	$ 113.68	0.13%	$ 454.72	0.51%
R-11	Routine maintenance	$ 5,018.80							$ 168.00	0.19%	$ 168.00	0.19%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
	General items											
G-01	Security	$ 1,380.00							$ 230.00	0.26%	$ 230.00	0.26%
G-02	Project team	$ 7,968.00							$ 1,628.00	1.83%	$ 1,628.00	1.83%
G-03	Safety and protection	$ 2,915.80										
G-05	Meetings	$ 100.00										
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00										
G-07	Mineral fees	$ 8,800.56										
A	**Construction cost**	**$ 59,768.97**					**$ 341.04**	**0.38%**	**$ 577.69**	**0.65%**	**$ 918.73**	**1.03%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 5,976.90**					**$ 34.10**	**0.04%**	**$ 57.77**	**0.07%**	**$ 91.87**	**0.10%**
C	**General items**	**$ 21,364.36**					**$ -**	**0.00%**	**$ 1,858.00**	**2.09%**	**$ 1,858.00**	**2.09%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 1,742.20**					**$ 7.50**	**0.01%**	**$ 49.87**	**0.06%**	**$ 57.37**	**0.06%**
E	**Total**	**$ 88,852.44**					**$ 382.65**	**0.43%**	**$ 2,543.33**	**2.86%**	**$ 2,925.98**	**3.29%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paùlo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público


ANEXO D (BZT17)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN **KADA**

PROJETO

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality

Naran Kompanha : Hatumeta Oan Unipessoal.Lda

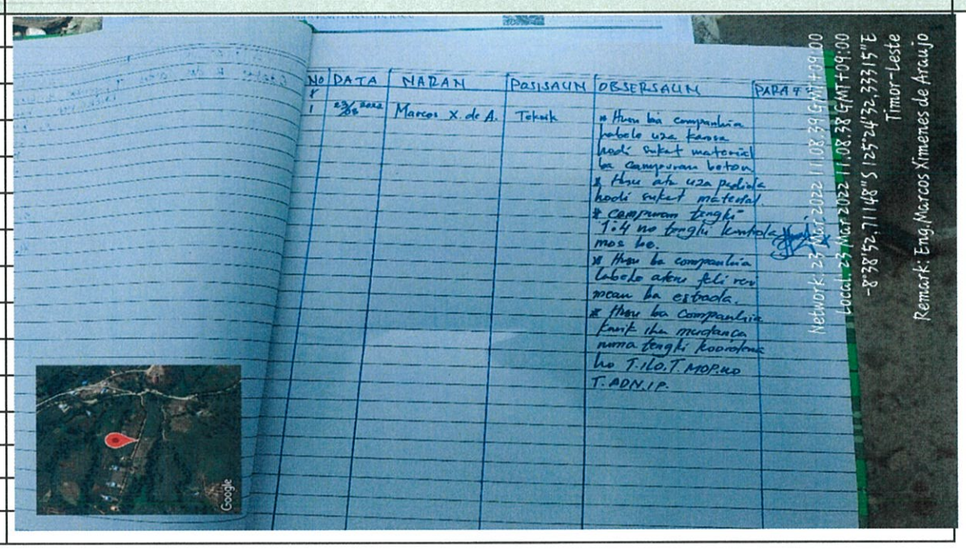No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	23/Marco/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (BZT18)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality

No. kontratu : MPW-W-210144

Data Inspeksaun : 23/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Libaloa-Fahilebo

Koordinat :

Start Point : Long : 125.43836103 Latetude : - 8.64943384

End Point : Long : 125.4135714 Latetude : - 8.63017393788538


Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

2

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Gabion

STA, 3+115

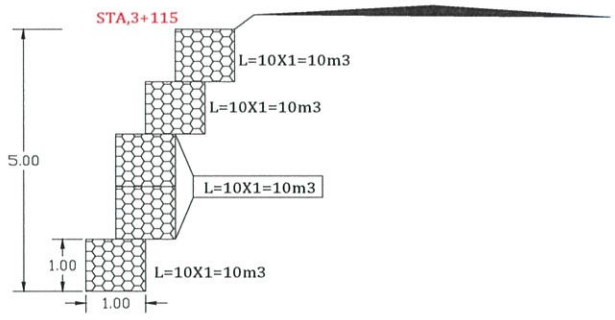


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Fotografia terreno hatudo katak companhia presija ateru no halo kompaksaun husi bronjong nia kotuk.




Sketch Item servisu : *Plum Concrete*


STA, 5+110-5+140




t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	3.75	30.00	13.50
Total			13.50



Fotografia foti iha terreno wainhira trabalhador sira halo hela plum concrete

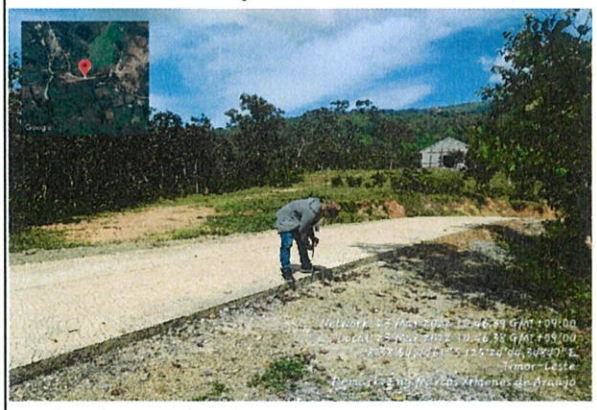

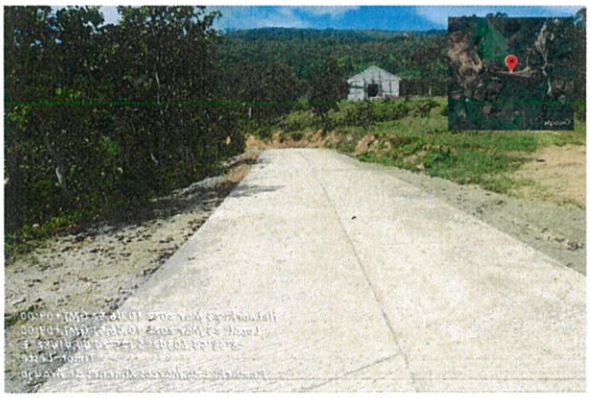

ANEXO C2 (BZT18)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality

No. kontratu :MPW-W-210144

SUMMARY

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 1,250.00							$ 150.00	0.17%	$ 150.00	0.17%
R-02	Drainage	$ 121.86										
R-03	Earth work	$ 3,188.68										
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 6,285.96										
R-08	Structures	$ 26,959.42					$ 3,945.96	4.46%	$ 2,342.80	2.65%	$ 6,288.77	7.11%
R-11	Routine maintenance	$ 12,699.00							$ 200.00	0.23%	$ 200.00	0.23%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
	General items											
G-01	Security	$ 1,200.00							$ 200.00	0.23%	$ 200.00	0.23%
G-02	Project team	$ 14,700.00							$ 3,300.00	3.73%	$ 3,300.00	3.73%
G-03	Safety and protection	$ 5,886.00										
G-05	Meetings	$ 100.00										
G-06	Ceremonial costs	$ 175.00										
G-07	Mineral fees	$ 8,800.55										
A	**Construction cost**	**$ 50,754.92**					**$ 3,945.96**	**4.46%**	**$ 2,692.80**	**3.05%**	**$ 6,638.77**	**7.51%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 5,075.49**					**$ 394.60**	**0.45%**	**$ 269.28**	**0.30%**	**$ 663.88**	**0.75%**
C	**General items**	**$ 30,861.55**					**$ -**	**0.00%**	**$ 3,500.00**	**3.96%**	**$ 3,500.00**	**3.96%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 1,733.84**					**$ 86.81**	**0.10%**	**$ 129.24**	**0.15%**	**$ 216.05**	**0.24%**
E	**Total**	**$ 88,425.80**					**$ 4,427.37**	**5.01%**	**$ 6,591.32**	***7.45%***	**$ 11,018.70**	***12.46%***

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto
Infraestructura,Transporte e irigaaun
Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (BZT18)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN **KADA PROJETO**

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa-Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality

Naran Kompanha : Hatuleo Unipessoal.Lda

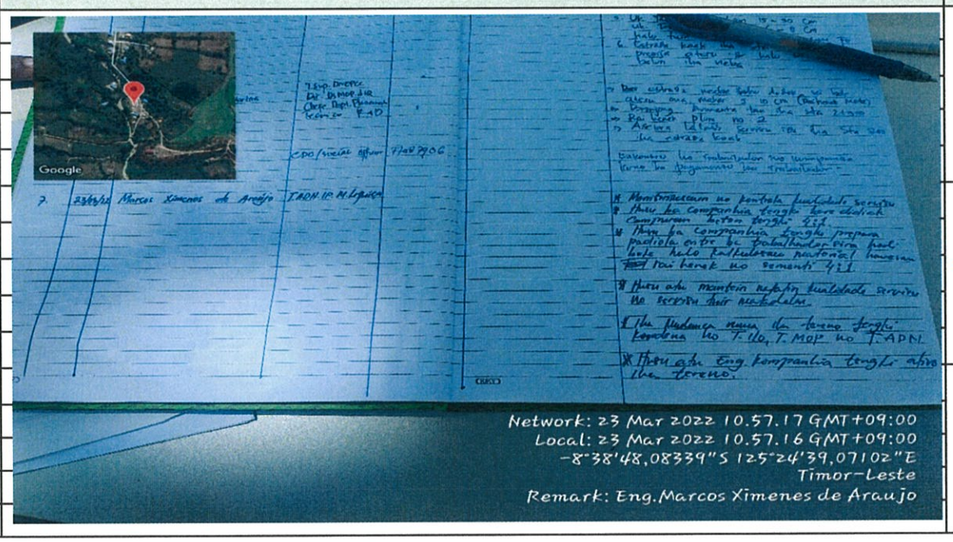No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	23/Marco/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4 5		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

ANEXO C1 (BZT19)
Back-up Data

Naran Projeto : Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000
Contractor : Craeleki Bercoli Unip.Lda
No. kontratu : MPW-W-210145

Data Inspeksaun : 23/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Maumeta - Metagou

Koordinat :


Start Point : Long : 125.34157891 Latetude : - 8.5948749774
End Point : Long : 125.38295813 Latetude : - 8.62965918

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 6+200

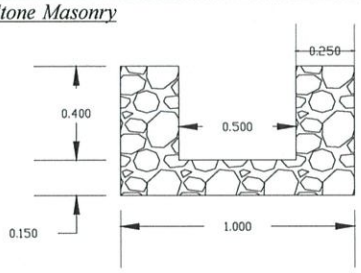


T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	10.00	2.00
0.15	1.00		1.5
Total			3.50 m³

Companhia halo Line drain iha Suco Fatumasi no Sta, 6+200



Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 6+200



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	10.00	2.00
0.15	1.00		1.5
Total			3.50 m³

Companhia halo Line drain iha Suco Fatumasi no Sta, 6+200



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT19)
Back-up Data

Naran Projeto : Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000
Contractor : Craeleki Bercoli Unip.Lda
No.Kontrac : MPW-W-210145

SUMMARY

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 700.00					$ 550.00	0.89%	$ -	0.00%	$ 550.00	0.89%
R-03	Earth work	$ 2,472.64										
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 1,997.60										
R-08	Structures	$ 15,124.71					$ 197.98	0.32%	$ 329.96	0.53%	$ 527.94	0.85%
R-11	Routine maintenance	$ 17,562.00					$ 100.00	0.16%	$ 200.00	0.32%	$ 300.00	0.48%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
	GENERAL ITEM											
G-01	Security	$ 1,500.00							$ 250.00	0.40%	$ 250.00	0.40%
G-02	Project team	$ 11,550.00							$ 2,400.00	3.87%	$ 2,400.00	3.87%
G-03	Safety and protection	$ 2,293.00										
G-05	Meetings	$ 100.00										
G-06	Ceremonial costs	$ 150.00										
G-08	Mineral fees	$ 3,297.24										
		$ 18,890.24										
A	**Construction cost**	**$ 38,106.95**					**$ 847.98**	**1.37%**	**$ 529.96**	**0.85%**	**$ 1,377.94**	**2.22%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 3,810.70**					**$ 84.80**	**0.14%**	**$ 53.00**	**0.09%**	**$ 137.79**	**0.22%**
C	**General items**	**$ 18,890.24**					**$ -**	**0.00%**	**$ 2,650.00**	**4.27%**	**$ 2,650.00**	**4.27%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 1,216.16**					**$ 18.66**	**0.03%**	**$ 64.66**	**0.10%**	**$ 83.31**	**0.13%**
E	**Total**	**$ 62,024.04**					**$ 951.43**	**1.53%**	**$ 3,297.62**	**5.32%**	**$ 4,249.05**	**6.85%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (BZT19)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN **KADA**
PROJETO

Naran projeto : Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000

Naran Kompanha : Craeleki Bercoli Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	23/Marco/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Monitorizasaun iha terreno maibe buku tamu laiha	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (BZT20)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality

Contractor : TM.Cailebo Unip.Lda

No. kontratu : MPW-W-210158

Data Inspeksaun : 23/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Fahilebo -Bucumera

Koordinat :

Start Point : Long : 125.3958511 Latetude : - 8.634983018


End Point : Long : 125.3828331 Latetude : - 8.640302834

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 2+800 - 2+900




T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	100.00	20.00
0.15	1.00		15
Total			35.00 m³



Sketch Item servisu :Gabion

Sta, 3+400 - 3+400

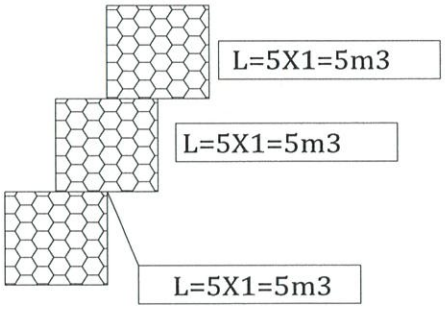



ANEXO C1 (BZT20)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality

Contractor : TM.Cailebo Unip.Lda

No. kontratu : MPW-W-210158

Data Inspeksaun : 9/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Fahilebo -Bucumera

Koordinat :


Start Point :	Long :	125.3958511	Latetude	: - 8.634983018
End Point :	Long :	125.3828331	Latetude	: - 8.640302834

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Excavation*

Sta, 2+800 - 2+900




T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	100.00	55.00
Total			**55.00** m³



Sketch Item servisu : *Excavation*

Sta, 2+800 - 2+900



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	100.00	55.00
Total			**55.00** m³



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (BZT20)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality

Contractor : TM.Cailebo Unip.Lda

No. kontratu :MPW-W-210158

SUMMARY											
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 2,500.00						$ 150.00	0.09%	$ 150.00	0.09%
R-02	Drainage	$ 164.55									
R-03	Earth work	$ 6,714.14						$ 445.50	0.28%	$ 445.50	0.28%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,216.25									
R-08	Structures	$ 102,616.19						$ 3,869.60	2.44%	$ 3,869.60	2.44%
R-11	Routine maintenance	$ 6,427.50						$ 182.00	0.11%	$ 182.00	0.11%
R-15	Provisional sum	$ 250.00									
	General items										
G-01	Security	$ 1,440.00						$ 240.00	0.15%	$ 240.00	0.15%
G-02	Project team	$ 11,700.00						$ 2,750.00	1.74%	$ 2,750.00	1.74%
G-03	Safety and protection	$ 3,735.00									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00									
G-07	Mineral fees	$ 4,974.69									
A	**Construction cost**	**$ 120,888.63**						**$ 4,647.10**	**2.93%**	**$ 4,647.10**	**2.93%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 12,088.86**						**$ 464.71**	**0.29%**	**$ 464.71**	**0.29%**
C	**General items**	**$ 22,149.69**						**$ 2,990.00**	**1.89%**	**$ 2,990.00**	**1.89%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 3,102.54**						**$ 162.04**	**0.10%**	**$ 162.04**	**0.10%**
E	**Total**	**$ 158,465.33**						**$ 8,263.85**	**5.21%**	**$ 8,263.85**	**5.21%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (BZT20)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN KADA PROJETO

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality

Naran Kompanha : TM Caileba Unip,Lda

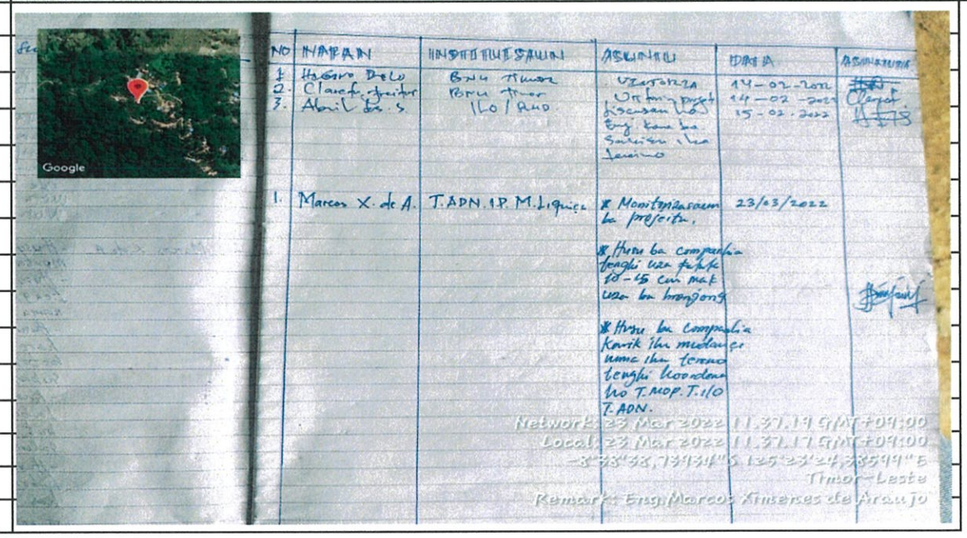No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	23/Marco/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4 5		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

ANEXO C1 (LV1)

Back-up Data

Naran Projeto : Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquica Municipality

No. kontratu : MPW-W-190097

Data Inspeksaun : 24/Marco/2022


Fatin Inspeksaun : Suco Vatuboro

Koordinat :

Start Point : Long : -8°34'5.91 Latetude : 125°29'25.72

End Point : Long : -8°44'28.85 Latetude : 125°8'0.75

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

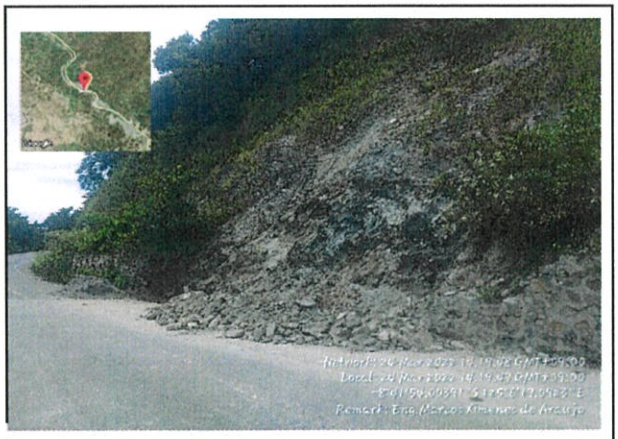Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Excavation/ Landslide Kompanhia kontinua hadia tembok penahan nebe at iha terreno	
Sketch Item servisu : Excavation/ Landslide Kompanhia kontinua hadia tembok penahan nebe at iha terreno	 

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV1)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquica Municipality

Kompanha : Naroman Mosu Dadaun Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	24/03/2022	Lquica/Maubara	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Companhia Laiha Terreno	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (LV1)

Name of Roads : Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquica Municipality

Contract No : MPW-W-190097
Contractor : Naroman Mosu Dadaun Unipessoal. Lda

SUMMARY

NO	DESCRIPTION	KONTRAK ORIGINAL	REJULTADO VERIFIKASAUN A D N.I.P	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.					
				PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING		TO DATE	%
R-01	Demobilization + Demobilization	$ 3,020.02	$ 2,691.64	$ 1,992.00	$ 699.64	$ 2,691.64	$ 2,691.64	1.75%	$ -	0.00%	$ 2,691.64	1.75%
R-02	Soulder Cleaning + Excavation/Landsliders + Gravel Surface Course	$ 87,752.89	$ 75,812.10	$ 28,798.04	$ 36,941.56	$ 65,739.60	$ 59,934.17	38.96%	$ -	0.00%	$ 59,934.17	38.96%
R-03	Lined Drain Cleaning + Cross Drain Cleaning + Stone Massonry Wall	$ 62,401.57	$ 54,124.29	$ 65,739.37	$ -	$ 65,739.37	$ 65,739.37	42.73%	$ -	0.00%	$ 65,739.37	42.73%
R-04	Traffic Sign	$ 677.40	$ 225.00	$ 225.00	$ -	$ 225.00	$ 225.00	0.15%	$ -	0.00%	$ 225.00	0.15%
A	**Total - net cost**	**$ 153,851.88**	**$ 132,853.03**	**$ 96,754.41**	**$ 37,641.20**	**$ 134,395.61**	**$ 128,590.18**	**83.58%**	**$ -**	**0.00%**	**$ 128,590.18**	**83.58%**
B	**Profit 10% * A**		**$ 13,285.30**	**$ 9,675.44**	**$ 3,764.12**	**$ 13,439.56**	**$ 12,859.02**	**8.36%**	**$ -**	**0.00%**	**$ 12,859.02**	**8.36%**
C	**Overhead**		**$ 3,000.00**	**$ 1,500.00**	**$ 1,500.00**	**$ 3,000.00**	**$ 3,000.00**	**1.95%**	**$ -**	**0.00%**	**$ 3,000.00**	**1.95%**
D	**Tax 2%*(A + B + C)**		**$ 2,982.77**	**$ 2,158.60**	**$ 858.11**	**$ 3,016.70**	**$ 2,888.98**	**1.88%**	**$ -**	**0.00%**	**$ 2,888.98**	**1.88%**
E	***Grand Total Cost (A + B + C + D)***	***$ 153,851.88***	**$ 152,121.10**	***$ 110,088.45***	***$ 43,763.43***	***$ 153,851.88***	***$ 147,338.19***	***95.77%***	***$ -***	***0.00%***	***$ 147,338.19***	**95.77%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura, Transporte e irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

ANEXO C1 (LV9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : RT/034/MOP-2019

Data Inspeksaun : 9/Marco/2021

Fatin Inspeksaun : Suco Fatukesi

Koordinat :

Start Point : Long : 125°18'56.74 Latetude : - 8°37' 42.29


End Point : Long : 125°19'30.12 Latetude : - 8°39'12.96

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2 Ach. Francisco da. S. G

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta : 2+400-2+450

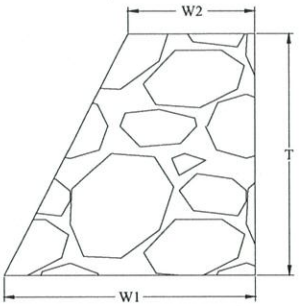


T	*w1*	*w2*	*Distacia*	*Volume*
2.00	0.50	0.30	50.00	40.00
Total				40.00 m³

Moru Protesaun companhia halo hotu ona maibe presija sei halo Mata Sapi.

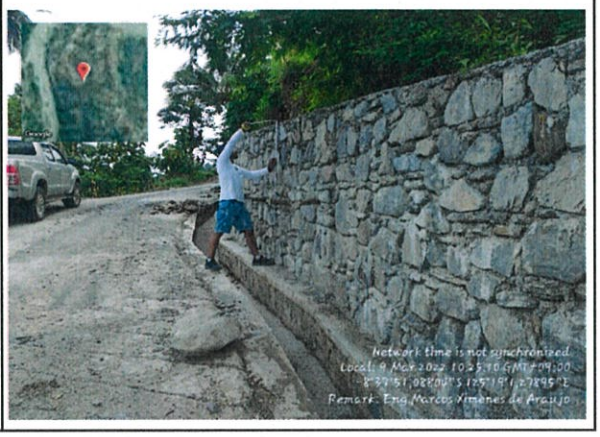

Sketch Item servisu : *Gabion*

Sta : 1+025-1+025

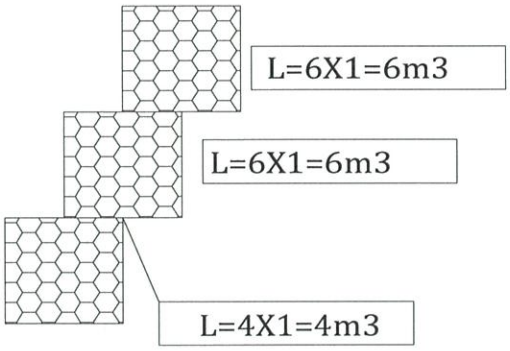

Companhia foin hahu monta Gabion Layer 3 maibe sei kontinua tan layer 2.



ANEXO C1 (LV9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : RT/034/MOP-2019

Data Inspeksaun : 9/Marco/2021

Fatin Inspeksaun : Suco Fatukesi

Koordinat :


Start Point :	Long :	125°18'56.74	Latetude	: - 8°37' 42.29
End Point :	Long :	125°19'30.12	Latetude	: - 8°39'12.96

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2 Ach. Francisco da. S. G

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta : 0+800-0+877




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	77.00	15.40
0.15	1.00		11.55
Total			26.95 m3

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta : 1+160-1+200

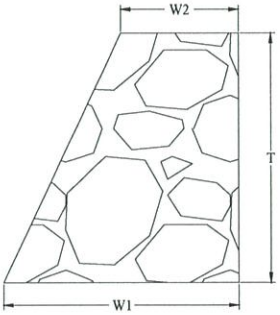

T	*w1*	*w2*	*Distacia*	*Volume*
2.00	0.50	0.30	59.00	47.20
Total				47.20 m³

Moru Protesaun companhia halo hotu ona maibe presija sei halo Mata Sapi.



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV9)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality

Kompanha : 15 Realty Unip.Lda

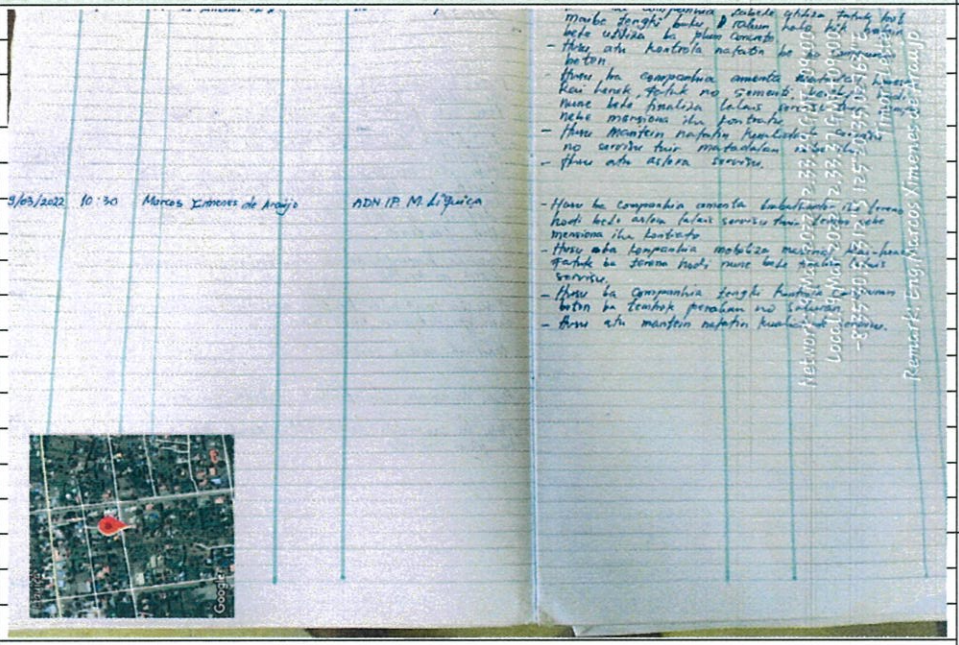No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	9/Marco/2022	Liquica/Liquica Vila	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.IP M.Liquica	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (LV9)

Name of Roads : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

Contract No : RT/034/MOP-2019
Contractor : 15 Realti Unipessoal. Lda

SUMMARY

NO	DESCRIPTION	CONTRAC ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General	$ 4,300.00	$ 1,050.00	$ -	$ 1,050.00	$ 1,050.00	0.23%	$ -	0.00%	$ 1,050.00	0.23%
R-02	Drainage	$ 586.02	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
R-03	Earth work	$ 64,895.01	$ 54,658.11	$ -	$ 54,658.11	$ 54,658.11	12.08%	$ -	0.00%	$ 54,658.11	12.08%
R-04	Sub-base, base and pavement	$ 9,098.62	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
R-05	Structures	$ 252,353.72	$ 131,925.38	$ -	$ 131,925.38	$ 214,408.39	47.40%	$ 14,099.40	3.12%	$ 228,507.79	50.51%
R-06	Dayworks	$ 75.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
R-07	Routine maintenance	$ 5,697.00	$ 1,815.00	$ -	$ 1,815.00	$ 1,590.00	0.35%	$ -	0.00%	$ 1,590.00	0.35%
R-08	Provisional sum	$ 2,490.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
R-09	Security	$ 3,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
R-010	Project team	$ 40,800.00	$ 34,000.00	$ -	$ 34,000.00	$ 31,759.00	7.02%	$ -	0.00%	$ 31,759.00	7.02%
R-011	Safety and protection	$ 9,851.00	$ 8,371.00	$ -	$ 8,371.00	$ 8,079.00	1.79%	$ -	0.00%	$ 8,079.00	1.79%
R-012	Meetings	$ 120.00	$ 120.00	$ -	$ 120.00	$ 120.00	0.03%	$ -	0.00%	$ 120.00	0.03%
R-013	Ceremonial costs	$ 300.00	$ 150.00	$ -	$ 150.00	$ 150.00	0.03%	$ -	0.00%	$ 150.00	0.03%
R-014	Mineral fees	$ 15,977.16	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
Total - net cost		**$ 70,048.16**	**$ 42,641.00**	**$ -**	**$ 42,641.00**	**$ 40,108.00**	**8.87%**	**$ -**	**3.12%**	**$ 40,108.00**	**8.87%**
Construction Cost (R-01+R-02+R-03+R-04+R-05+R-06+R-07)		**$ 339,495.37**	**$ 189,448.50**	**$ -**	**$ 189,448.50**	**$ 271,706.50**	**60.06%**	**$ 14,099.40**	**3.12%**	**$ 285,805.90**	**63.18%**
Contractor Fee (A x 10%)		**$ 33,949.54**	**$ 18,944.85**	**$ -**	**$ 18,944.85**	**$ 27,170.65**	**6.01%**	**$ 1,409.94**	**0.31%**	**$ 28,580.59**	**6.32%**
Tax (net cost + profit + overhead) x 2 %)		**$ 8,869.86**	**$ 5,020.69**	**$ -**	**$ 5,020.69**	**$ 6,779.70**	**1.50%**	**$ 310.19**	**0.07%**	**$ 7,089.89**	**1.57%**
Total gross-cost		***$ 452,362.93***	***$ 256,055.04***	***$ -***	***$ 256,055.04***	***$ 345,764.85***	***76.44%***	***$ 15,819.53***	***3.50%***	***$ 361,584.38***	**79.93%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto
Infraestructura, Transporte e irigaaun

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura, Transportes e

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

ANEXO C1 (LV13)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality

No. kontratu : MOP - CD - NCB-R - 21036

Data Inspeksaun : 16 Marcu de 2022

Fatin Inspeksaun : Suco Taltabi - Kutulau

Koordinat :

Start Point : Long : 125.3714575 Latetude : - 8.64451919


End Point : Long : 125.3801075 Latetude : - 8.6527164

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : *Plum Concrete*

Sta, 1+150 - 1+200



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	2.00	50.00	12.00
Total			12.00 m³


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halo Plum Concrete iha no Sta, 1+150 - 1+200



Sketch Item servisu : *Plum Concrete*

Sta, 1+150 - 1+200



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	2.00	50.00	12.00
Total			12.00 m³

Companhia halo Plum Concrete iha no Sta, 1+150 - 1+200



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV13)

Name of Roads :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality
Contract No : MOP - CD - NCB-R - 21036
Contractor : Prudencia Construction Unipessoal.Lda

SUMMARY											
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 1,550.00						$ 250.00	0.20%	$ 250.00	0.20%
R-03	Earth work	$ 6,216.90									
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,205.60									
R-08	Structures	$ 69,266.99						$ 1,352.16	1.09%	$ 1,352.16	1.09%
R-11	Routine maintenance	$ 3,842.00						$ 280.00	0.23%	$ 280.00	0.23%
R-15	Provisional sum	$ 250.00									
	General items										
G-01	Security	$ 15.00						$ 2.50	0.00%	$ 2.50	0.00%
G-02	Project team	$ 21,600.00						$ 4,400.00	3.56%	$ 4,400.00	3.56%
G-03	Safety and protection	$ 2,816.00									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 150.00									
G-07	Mineral fees	$ 4,861.93									
A	Construction cost	$ 83,331.49						$ 1,882.16	1.52%	$ 1,882.16	1.52%
B	Contractor Fee (A x 10%)	$ 8,333.15						$ 188.22	0.15%	$ 188.22	0.15%
C	General items	$ 29,542.93						$ 4,402.50	3.56%	$ 4,402.50	3.56%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	$ 2,424.15						$ 129.46	0.10%	$ 129.46	0.10%
E	Total	$ 123,631.72						$ 6,602.33	5.34%	$ 6,602.33	5.34%

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura, Transporte e irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng. Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura, Transportes e

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV13)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality

Kompanha : Prudencia Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	16/Marco/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Monitorizasaun iha Terreno teknik kompanhia laiha	
					2	Rekomenda Mandor atu fo hatene ba teknik Companhia tengki iha terreno	
					3	Husu ba Companha servisu tuir orentasaun nebe fo ona	
					4		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (LV14)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)

No. kontratu : MPW-W-210151

Data Inspeksaun : 16/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Metagou

Koordinat :


Start Point : Long : 125.36544444 Latetude : - 8.66332014
End Point : Long : 125.3416468 Latetude : - 8.65444508

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Plum Concrete

STA, 0+090 - 0+900




t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	4.00	100.00	48.00
Total			48.00

Fotografia terreno hatudo katak companhia halo hela pengecoran Plum Concrete




Sketch Item servisu : *Plum Concrete*


STA, 0+250-0+900



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	4.00	100.00	48.00
Total			48.00



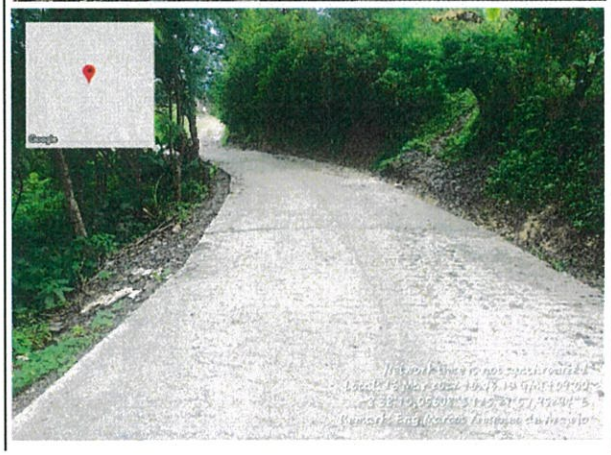



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV14)

Naran Projeto :R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)
Contractor : Metalika Unip.Lda
No. kontratu :MPW-W-210151

SUMMARY												
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 3,400.00							$ 250.00	0.10%	$ 250.00	0.10%
R-02	Drainage	$ 244.30										
R-03	Earth work	$ 5,301.97										
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 3,356.64										
R-08	Structures	$ 159,824.15					$ 21,061.62	8.82%	$ 7,020.54	2.94%	$ 28,082.16	11.76%
R-11	Routine maintenance	$ 16,538.40							$ 196.00	0.08%	$ 196.00	0.08%
R-15	Provisional sum	$ 250.00										
	GENERAL ITEM											
G-01	Security	$ 1,380.00							$ 230.00	0.10%	$ 230.00	0.10%
G-02	Project team	$ 13,660.00							$ 2,850.00	1.19%	$ 2,850.00	1.19%
G-03	Safety and protection	$ 3,062.00										
G-05	Meetings	$ 100.00										
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00										
G-07	Mineral fees	$ 7,849.54										
A	**Construction cost**	**$ 188,915.45**					**$ 21,061.62**	**8.82%**	**$ 7,466.54**	**3.13%**	**$ 28,528.16**	**11.95%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 18,891.55**					**$ 2,106.16**	**0.88%**	**$ 746.65**	**0.31%**	**$ 2,852.82**	**1.19%**
C	**General items**	**$ 26,251.54**					**$ -**	**0.00%**	**$ 3,080.00**	**1.29%**	**$ 3,080.00**	**1.29%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 4,681.17**					**$ 463.36**	**0.19%**	**$ 225.86**	**0.09%**	**$ 689.22**	**0.29%**
E	**Total**	**$ 238,739.71**					**$ 23,631.14**	**9.90%**	**$ 11,519.06**	**4.82%**	**$ 35,150.20**	**14.72%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto
Infraestructura, Transporte e irigaaun Municipio

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Infrastructura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV14)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Metaqou - Aibenu Chainage 0+000-7+600, Liquica Municipality

Kompanha : Metalika Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	16/Marco/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Monitorizasaun iha Terreno teknik kompanhia laiha	
					2	Rekomenda Mandor atu fo hatene ba teknik Companhia tengki iha terreno	
					3	Husu ba Companha servisu tuir orentasaun nebe fo ona	
					4		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (LV15)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)

No. kontratu : MPW-W-210150

Data Inspeksaun : 24/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Loidahar

Koordinat :

Start Point : Long : 125°19'36.41779 Latetude : - 8°36'46.93352


End Point : Long : 125°19'36.41779 Latetude : - 8°36'46.93352

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 3+150 - 3+150

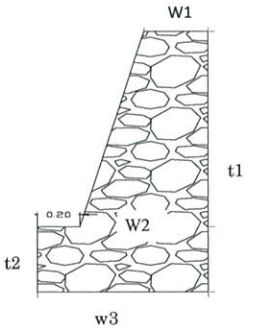

Keterangan :

w1	***0.3***
w2	***0.6***
w3	***0.8***
t1	***1.20***
t2	***0.5***
L	***12***

		Distacia	*Volume*
Wall	0.54	12.00	6.48
Foundation	0.40		4.80
	Total		11.28


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halo Line drain iha Suco Loidahar no Sta, 3+250 - 3+300



Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 3+600 - 3+650

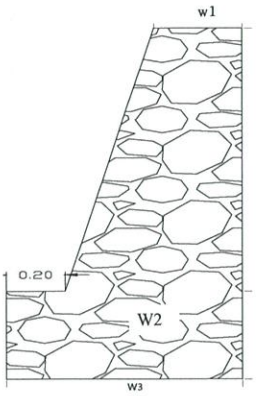

Keterangan :

w1	***0.3***
w2	***0.6***
w3	***0.8***
t1	***1.20***
t2	***0.5***
L	***12***

		Distacia	*Volume*
Wall	0.54	12.00	6.48
Foundation	0.40		4.80
	Total		11.28

Companhia halo Line drain iha Suco Loidahar no Sta, 3+600 - 3+650



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV15)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)
Contract No : MPW-W-210150
Contractor : Luqueli Oan Unipessoal.Lda

SUMMARY

NO	DESCRIPTION	CONTRAC ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 1,300.00						$ 150.00	0.08%	$ 150.00	0.08%
R-02	Drainage	$ 1,905.47									
R-03	Earth work	$ 19,160.19									
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 5,007.60									
R-08	Structures	$ 97,539.20				$ 3,675.00	1.95%			$ 3,675.00	1.95%
R-11	Routine maintenance	$ 18,278.00						$ 140.00	0.07%	$ 140.00	0.07%
R-15	Provisional sum	$ 250.00									
	Sub Total	**$ 143,440.46**				**$ 3,675.00**	**1.95%**	**$ 290.00**	**0.15%**	**$ 3,965.00**	**2.10%**
	General items										
G-01	Security	$ 1,680.00						$ 560.00	0.30%	$ 560.00	0.30%
G-02	Project team	$ 9,960.00						$ 1,290.00	0.68%	$ 1,290.00	0.68%
G-03	Safety and protection	$ 6,094.50									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 175.00									
G-07	Mineral fees	$ 9,097.30									
	Sub Total	**$ 27,106.80**						**$ 1,850.00**	**0.98%**	**$ 1,850.00**	
A	**CONSTRUCTION COST**	**$ 143,440.46**				**$ 3,675.00**	**1.95%**	**$ 290.00**	**0.15%**	**$ 3,965.00**	**2.10%**
B	**PROFIT 10% x A**	**$ 14,344.05**				**$ 367.50**	**0.19%**	**$ 29.00**	**0.02%**	**$ 396.50**	**0.21%**
C	**OVERHEAD**	**$ 27,106.80**					**0.00%**	**$ 1,850.00**	**0.98%**	**$ 1,850.00**	**0.98%**
D	**TAX 2% (A+B+C)**	**$ 3,697.83**				**$ 80.85**	**0.04%**	**$ 43.38**	**0.02%**	**$ 124.23**	**0.07%**
E	**GRAND TOTAL (A+B+C)**	***$ 188,589.13***				***$ 4,123.35***	**2.19%**	***$ 2,212.38***	**1.17%**	***$ 6,335.73***	**3.36%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV15)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)

Kompanha : Luqueli Oan Unip.Lda

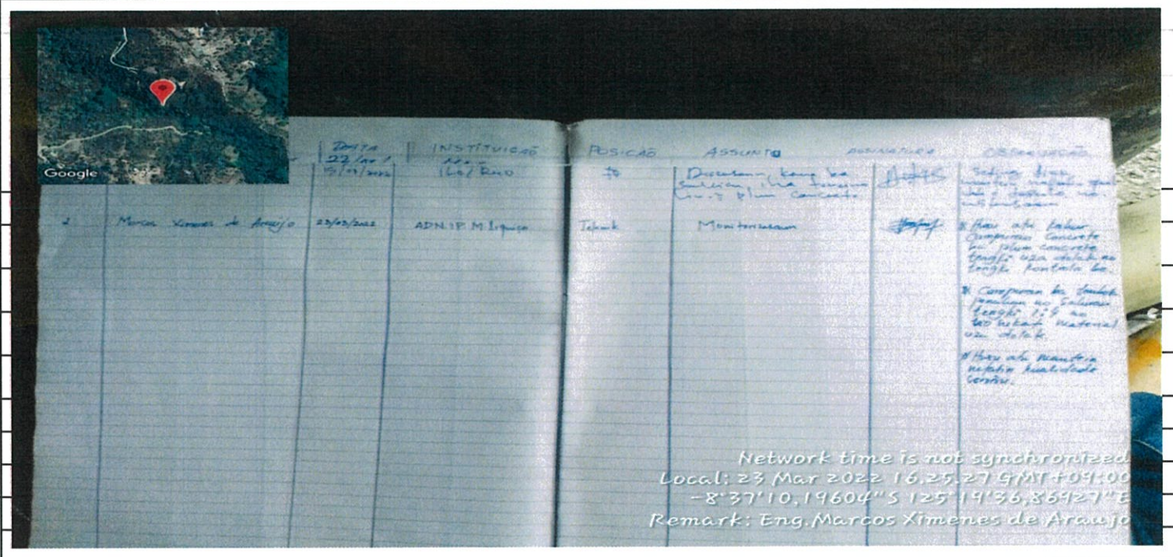No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	23/Marco/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

ANEXO C1 (LV21)

Back-up Data

Naran Projeto : For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)

No. kontratu : MPW-W210202

Data Inspeksaun : 24/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Watuboro

Koordinat :

Start Point : Long : 125°6'49.92268 Latetude : - 8°39'48.1609
End Point : Long : 125°6'49.87166 Latetude : - 8°39'48.12606


Naran Inspektor : 1.00 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Lokaliza iha Karimbala Suco Vatuboro

Marco



Keterangan :

w1 =	***0.90***
w2 =	***0.30***
w3 =	
t1 =	***1.50***
t2 =	
L =	***12.00***

		Distacia	*Volume*
Wall	0.90	12.00	10.80
Foundation	-		0.00
	Total		**10.80** m3


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Satone Masonry nebe kompanhia implementa iha Suco Vatuboro ho ninia medida naruk 12 meter



Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Lokaliza iha Karimbala Suco Vatuboro



Keterangan :

w1 =	***0.90***
w2 =	***0.30***
w3 =	
t1 =	***1.50***
t2 =	
L =	***12.00***

		Distacia	*Volume*
Wall	0.90	12.00	10.80
Foundation	-		0.00
	Total		**10.80** m3

Satone Masonry nebe kompanhia implementa iha Suco Vatuboro ho ninia medida naruk 12 meter





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV21)

Name of Roads : For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)

Contract No : MPW-W210202

Contractor : Chanel Chander Unipessoal.Lda

SUMMARY

NO	DESCRIPTION	CONTRAC ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
100	GENERAL	$ 2,750.00									
200	EARTH WORK	$ 20,657.90				$ 29.17	0.03%	$ 53.86	0.05%	$ 83.03	0.07%
400	SURFACE COURSE	$ 26,748.80									
600	DRAINAGE & SLOPE PROTECTION STRUCTURE	$ 37,821.40				$ 986.71	0.88%	$ 1,338.34	1.19%	$ 2,325.05	2.07%
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	$ 1,535.80									
800	BIOENGINEERING WORKS	$ 9,480.00									
A	**CONSTRUCTION COST**	**$ 98,993.90**				**$ 1,015.89**	**0.90%**	**$ 1,392.19**	**1.24%**	**$ 2,408.08**	**2.14%**
B	**PROFIT 10% x A**	**$ 9,899.39**				**$ 101.59**	**0.09%**	**$ 139.22**	**0.12%**	**$ 240.81**	**0.21%**
C	**OVERHEAD**	**$ 1,670.00**					**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**
D	**TAX 2% (A+B+C)**	**$ 2,211.27**				**$ 22.35**	**0.02%**	**$ 30.63**	**0.03%**	**$ 52.98**	**0.05%**
E	**GRAND TOTAL (A+B+C)**	***$ 112,505.28***				***$ 1,139.82***	**1.01%**	***$ 1,562.04***	**1.39%**	***$ 2,701.86***	**2.40%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura, Transporte e irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL


ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (LV21)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN **KADA**
PROJETO

Naran projeto : For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)

Naran Kompanha : Chanel Chander Unipessoal.Lda

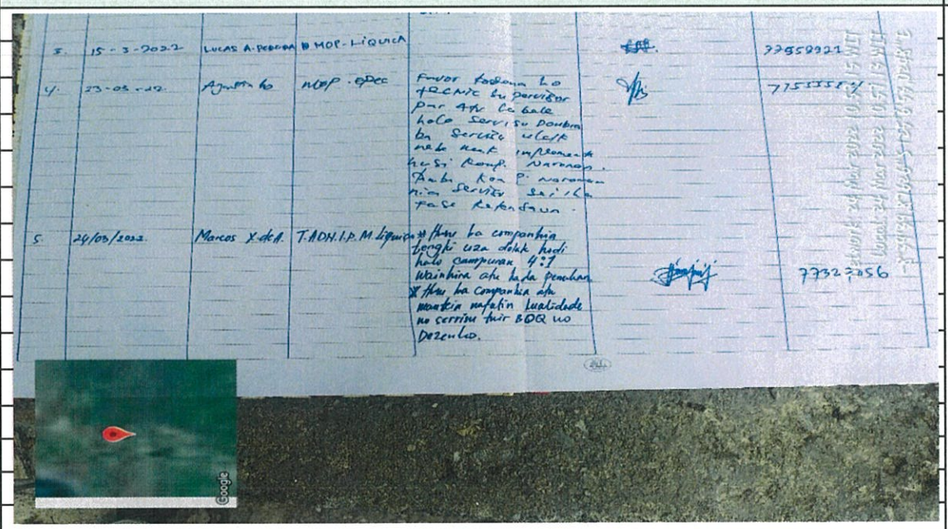No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	24/Marco/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4 5		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

#ANEXO C2 (MBR10)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality
Contractor : Rito-Pu Unip.Lda
No. kontratu : MOP -CD-RFQ - 21013

Data Inspeksaun : 10/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Nunuleta - Darulema

Koordinat :

Start Point : Long : 125.19399353 Latetude : - 8.66031911
End Point : Long : 125.19758718 Latetude : - 8.652363510

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : ***CMG leader*** **STA, 0+000 - 2+000** Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha terreno	
Sketch Item servisu : ***CMG leader*** **STA, 0+000 - 2+000** Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha	
STA, 0+000 - 2+000 Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha terreno	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (MBR10)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality
Contractor : Rito-Pu Unip.Lda
No. kontratu : MOP -CD-RFQ - 21013

SUMMARY										
Itime	**DESCRIPTION**	**CONTRACT ORIGINAL**	**RESULTADO INSPEKSAUN MOP**			**RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP**				
			PREVIOUS BILLING	**THIS BILLING**	**TO DATE**	**PREVIOUS BILDING**	**THIS BILLING**	**%**	**TO DATE**	**%**
R-01	General works	$ 600.00					$ 25.00	0.04%	$ 25.00	0.04%
R-03	Earth work	$ 7,829.12								
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 3,650.40								
R-08	Structures	$ 31,765.38								
R-10	Dayworks	$ 210.00								
R-11	Routine maintenance	$ 4,077.80					$ 252.00	0.37%	$ 252.00	0.37%
R-15	Provisional sum	$ 250.00								
	General items									
G-01	Security	$ 1,680.00					$ 280.00	0.42%	$ 280.00	0.42%
G-02	Project team	$ 6,360.00					$ 780.00	1.16%	$ 780.00	1.16%
G-03	Safety and protection	$ 1,664.00								
G-05	Meetings	$ 100.00								
G-06	Ceremonial costs	$ 100.00								
G-07	Mineral fees	$ 2,936.03								
A	**Construction cost**	**$ 48,382.70**					**$ 277.00**	**0.41%**	**$ 277.00**	**0.41%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 4,838.27**					**$ 27.70**	**0.04%**	**$ 27.70**	**0.04%**
C	**General items**	**$ 12,840.03**					**$ 1,060.00**	**1.57%**	**$ 1,060.00**	**1.57%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 1,321.22**					**$ 27.29**	**0.04%**	**$ 27.29**	**0.04%**
E	**Total**	**$ 67,382.22**					**$ 1,391.99**	**2.07%**	**$ 1,391.99**	**2.07%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Raulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR10)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality

Kompanha : Rito Pu Unip,Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	10/Marco/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Monitorizasaun ba tereno teknik la iha no ema mos la servisu	
					2		
					3		
					4		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (MBR11)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality
Contractor : Murak Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21032

Data Inspeksaun : 24/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Lisadila

Koordinat :


Start Point : Long : 125.23822736 Latetude : -8.672448189
End Point : Long : 125.2291648 Latetude : -8.693159140

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 4+750 - 4+800




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	50.00	27.50
Total			27.50 m3



Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 4+750 - 4+800




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
Total			10.00 m3



Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 4+750 - 4+800



t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
Total			10.00 m3



ANEXO C1 (MBR11)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality
Contractor : Murak Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21032

Data Inspeksaun : 24/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Lisadila

Koordinat :


Start Point : Long : 125.23822736 Latetude : -8.672448189
End Point : Long : 125.2291648 Latetude : -8.693159140

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 4+750 - 4+800




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m3

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 4+750 - 4+800




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m3



Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 4+750 - 4+800



t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m3



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (MBR11)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600, Liquica Municipality
Contractor : Malibo Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21033

SUMMARY										
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 2,600.00								
R-02	Drainage	$ 26.20								
R-03	Earth work	$ 8,447.92					$ 834.35	0.55%	$ 834.35	0.55%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,583.44								
R-08	Structures	$ 87,375.26					$ 2,534.00	1.68%	$ 2,534.00	1.68%
R-10	Dayworks	$ 105.00								
R-11	Routine maintenance	$ 9,862.80					$ 168.00	0.11%	$ 168.00	0.11%
R-15	Provisional sum	$ 250.00								
General item										
G-01	Security	$ 2,100.00					$ 350.00	0.23%	$ 350.00	0.23%
G-02	Project team	$ 12,162.00					$ 1,401.00	0.93%	$ 1,401.00	0.93%
G-03	Safety and protection	$ 4,249.00								
G-05	Meetings	$ 100.00								
G-06	Ceremonial costs	$ 300.00								
G-07	Mineral fees	$ 6,883.92								
A	**Construction cost**	**$ 111,250.62**					**$ 3,536.35**	**2.34%**	**$ 3,536.35**	**2.34%**
B	Contractor Fee (A x 10%)	$ 11,125.06					$ 353.64	0.23%	$ 353.64	0.23%
C	General items	$ 25,794.92					$ 1,751.00	1.16%	$ 1,751.00	1.16%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	$ 2,963.41					$ 112.82	0.07%	$ 112.82	0.07%
E	**Total**	**$ 151,134.01**					**$ 5,753.80**	**3.81%**	**$ 5,753.80**	**3.81%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR11)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600, Liquica Municipality

Kompanha : Malibo Unip,Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	10/Marco/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Monitorizasaun ba tereno teknik la prepara buku tamu	
					2		
					3		
					4		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (MBR12)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality
Contractor : Nheu Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21027

Data Inspeksaun : 10/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Vaviquenia-Maubaralisa

Koordinat :


Start Point : Long : 125.21124422 Latetude : -8.61803763
End Point : Long : 125.2281181 Latetude : -8.632661686

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 0+900-1+033




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	133.00	26.60
0.15	1.00		19.95
Total			46.55 m3



Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 0+925 - 1+050




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	133.00	26.60
0.15	1.00		19.95
Total			46.55 m3



Sketch Item servisu : Excavation

STA, 0+925 - 1+050



t	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	28.00	15.40
Total			15.40 m3



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (MBR12)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality

No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21027

SUMMARY											
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 3,458.00									
R-02	Drainage	$ 281.40									
R-03	Earth work	$ 12,812.63				$ 1,223.67	0.71%	$ 1,362.10	0.79%	$ 2,585.77	1.49%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 546.98									
R-08	Structures	$ 103,036.65				$ 16,855.97	9.72%	$ 10,133.36	5.84%	$ 26,989.33	15.56%
R-10	Dayworks	$ 210.00									
R-11	Routine maintenance	$ 6,112.00						$ 390.00	0.22%	$ 390.00	0.22%
R-15	Provisional sum	$ 500.00									
	General items										
G-01	Security	$ 3,600.00						$ 600.00	0.35%	$ 600.00	0.35%
G-02	Project team	$ 11,580.00						$ 2,470.00	1.42%	$ 2,470.00	1.42%
G-03	Safety and protection	$ 7,441.55									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 350.00									
G-07	Mineral fees	$ 7,357.99									
A	**Construction cost**	**$ 126,957.66**				**$ 18,079.64**	**10.42%**	**$ 11,885.46**	**6.85%**	**$ 29,965.10**	**17.27%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 12,695.77**				**$ 1,807.96**	**1.04%**	**$ 1,188.55**	**0.69%**	**$ 2,996.51**	**1.73%**
C	**General items**	**$ 30,429.54**				**$ -**	**0.00%**	**$ 3,070.00**	**1.77%**	**$ 3,070.00**	**1.77%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 3,401.66**				**$ 397.75**	**0.23%**	**$ 322.88**	**0.19%**	**$ 720.63**	**0.42%**
E	**Total**	**$ 173,484.62**				**$ 20,285.36**	**11.69%**	**$ 16,466.88**	**9.49%**	**$ 36,752.24**	**21.18%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura, Transporte e irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR12)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality

Kompanha : Nheu Unip,Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	10/Marco/2022	Lquica/Maubara	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

ANEXO C1 (MBR13)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality
Contractor : Murak Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21032

Data Inspeksaun : 10/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Maubaralisa

Koordinat :


Start Point : Long : 125.22682227 Latetude : -8.644211521
End Point : Long : 125.2382274 Latetude : -8.672448189

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+250-1+300




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m3



Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+250-1+300




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m3



Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+250-1+300



t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m3



ANEXO C1 (MBR13)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality
Contractor : Murak Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21032

Data Inspeksaun : 10/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Maubaralisa

Koordinat :


Start Point : Long : 125.22682227 Latetude : -8.644211521
End Point : Long : 125.2382274 Latetude : -8.672448189

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+250-1+300




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	50.00	27.50
Total			27.50 m3



Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+250-1+300




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
Total			10.00 m3



Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+250-1+300



t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
Total			10.00 m3



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (MBR13)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality
Contractor : Murak Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21032

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 3,030.00				$ 550.00	0.36%		0.00%	$ 550.00	0.36%
R-02	Drainage	$ 25.95									
R-03	Earth work	$ 9,149.46				$ 258.76	0.17%	$ 86.25	0.06%	$ 345.02	0.23%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 5,890.13									
R-08	Structures	$ 71,162.98				$ 2,521.00	1.65%	$ 840.33	0.55%	$ 3,361.33	2.20%
R-10	Dayworks	$ 105.00									
R-11	Routine maintenance	$ 10,808.86				$ 73.50	0.05%	$ 954.03	0.62%	$ 1,027.53	0.67%
R-15	Provisional sum	$ 250.00									
	GENERAL ITEM										
G-01	Security	$ 3,000.00						$ 250.00	0.16%	$ 250.00	0.16%
G-02	Project team	$ 23,400.00						$ 2,750.00	1.80%	$ 2,750.00	1.80%
G-03	Safety and protection	$ 6,131.00									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 300.00									
G-07	Mineral fees	$ 6,653.07									
A	**Construction cost**	**$ 100,422.37**				**$ 3,403.26**	**2.22%**	**$ 1,880.62**	**1.23%**	**$ 5,283.88**	**3.45%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 10,042.24**				**$ 340.33**	**0.22%**	**$ 188.06**	**0.12%**	**$ 528.39**	**0.35%**
C	**General items**	**$ 39,584.07**				**$ -**	**0.00%**	**$ 3,000.00**	**1.96%**	**$ 3,000.00**	**1.96%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 3,000.97**				**$ 74.87**	**0.05%**	**$ 101.37**	**0.07%**	**$ 176.25**	**0.12%**
E	**Total**	**$ 153,049.65**				**$ 3,818.46**	**2.49%**	**$ 5,170.05**	**3.38%**	**$ 8,988.51**	**5.87%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR13)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality

Kompanha : Murak Unip,Lda

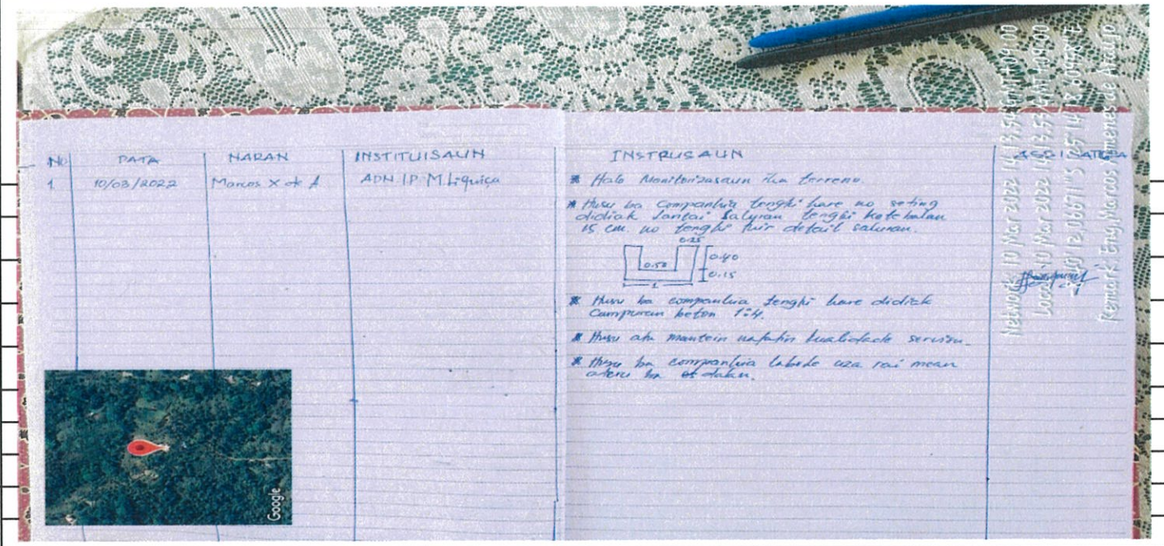No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	10/Marco/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

ANEXO C1 (MBR14)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)
Contractor : Meta Loe Crae Bau Unip,Lda
No. kontratu : MPW-W-210160

Data Inspeksaun : 10/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Vaviquenia - Maubaralisa

Koordinat :


Start Point : Long : 125.21757267 Latetude : -8.649459943
End Point : Long : Latetude :

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+125 - 1+215

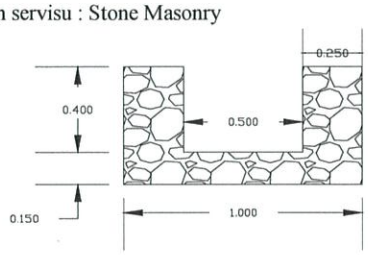




T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	90.00	18.00
0.15	1.00		13.5
Total			31.50 m³

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

STA, 1+215 - 1+250






T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	35.00	7.00
0.15	1.00		5.25
Total			12.25 m³

Sketch Item servisu : *Gabion*

STA,1+320



L=2X8=16m3



ANEXO C1 (MBR14)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)

No. kontratu :

Data Inspeksaun : 10/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Vaviquenia - Maubaralisa

Koordinat :

Start Point : Long : 125.21757267 Latetude : -8.649459943

End Point : Long : Latetude :


Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Excavation

STA, 1+125 - 1+215




T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	90.00	99.00
Total			**99.00** m³




Sketch Item servisu : *Excavation*

STA, 1+215 - 1+250



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	35.00	38.50
Total			**38.50** m³





T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	35.00	38.50
Total			**38.50** m³



ANEXO C2 (MBR14)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)
Contractor : Meta Loe Crae Bau Unip,Lda
No. kontratu : MPW-W-210160

SUMMARY

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
Item	**Description**											
R-01	General works	$ 3,650.00					$ 300.00	0.15%			$ 300.00	0.15%
R-02	Drainage	$ 13.30										
R-03	Earth work	$ 34,566.24					$ 275.86	0.14%	$ 459.77	0.23%	$ 735.63	0.37%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,260.49										
R-08	Structures	$ 103,339.22					$ 2,296.88	1.16%	$ 4,695.17	2.36%	$ 6,992.04	3.52%
R-10	Dayworks	$ 210.00										
R-11	Routine maintenance	$ 8,133.60					$ 84.00	0.04%	$ 434.00	0.22%	$ 518.00	0.26%
R-15	Provisional sum	$ 500.00										
	GENERAL ITEM											
G-01	Security	$ 1,380.00							$ 230.00	0.12%	$ 230.00	0.12%
G-02	Project team	$ 11,790.00							$ 1,470.00	0.74%	$ 1,470.00	0.74%
G-03	Safety and protection	$ 6,206.50										
G-05	Meetings	$ 100.00										
G-06	Ceremonial costs	$ 350.00										
G-07	Mineral fees	$ 7,035.58										
A	**Construction cost**	**$ 152,672.84**					**$ 2,956.73**	**1.49%**	**$5,588.93**	**2.81%**	**$ 8,545.67**	**4.30%**
B	Contractor Fee (A x 10%)	$ 15,267.28					$ 295.67	0.15%	$ 558.89	0.28%	$ 854.57	0.43%
C	General items	$ 26,862.08					$ -	0.00%	$ 1,700.00	0.86%	$ 1,700.00	0.86%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	$ 3,896.04					$ 65.05	0.03%	$ 156.96	0.08%	$ 222.00	0.11%
E	**Total**	**$ 198,698.25**					**$ 3,317.46**	**1.67%**	**$8,004.78**	**4.03%**	**$ 11,322.24**	**5.70%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR14)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)

Kompanha : Meta Loe Crae Bau Unip,Lda

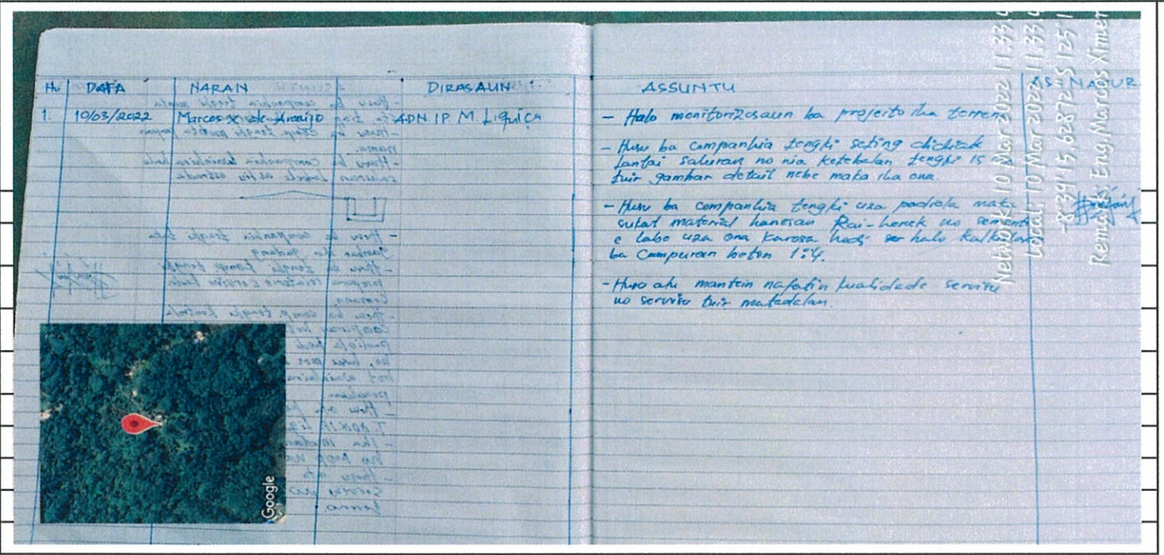No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	10/Marco/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

ANEXO C1 (MBR15)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo -Gisu Chainage 0+000-2+000
Contractor : Nazico Unip,Lda
No. kontratu : MPW-W-210152

Data Inspeksaun : 10/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Samarapo - Gisu

Koordinat :

Start Point : Long : 125.19000270 Latetude : -8.66318779
End Point : Long : 125.19024565 Latetude : -8.673507810

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : CMG STA, 0+000 - 2+000 Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha terreno	
Sketch Item servisu : CMG STA, 0+000 - 2+000 Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha terreno	
Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (MBR15)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo -Gisu Chainage 0+000-2+000
Contractor : Nazico Unip,Lda
No. kontratu : MPW-W-210152

SUMMARY												
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
Item	**Description**											
R-01	General works	$ 2,300.00							$ 250.00	0.22%	$ 250.00	0.22%
R-03	Earth work	$ 6,794.03										
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,082.67										
R-08	Structures	$ 66,321.02										
R-10	Dayworks	$ 210.00										
R-11	Routine maintenance	$ 4,108.00							$ 494.00	0.43%	$ 494.00	0.43%
R-15	Provisional sum	$ 300.00										
GENERAL ITEM												
G-01	Security	$ 1,800.00							$ 300.00	0.26%	$ 300.00	0.26%
G-02	Project team	$ 12,480.00							$ 1,340.00	1.17%	$ 1,340.00	1.17%
G-03	Safety and protection	$ 3,081.00										
G-05	Meetings	$ 100.00										
G-06	Ceremonial costs	$ 300.00										
G-07	Mineral fees	$ 4,450.43										
A	**Construction cost**	**$ 82,115.72**							**$ 744.00**	**0.65%**	**$ 744.00**	**0.65%**
B	Contractor Fee (A x 10%)	$ 8,211.57							$ 74.40	0.06%	$ 74.40	0.06%
C	General items	$ 22,211.43							$ 1,640.00	1.43%	$ 1,640.00	1.43%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	$ 2,250.77							$ 49.17	0.04%	$ 49.17	0.04%
E	**Total**	**$ 114,789.50**							**$2,507.57**	**2.18%**	**$ 2,507.57**	**2.18%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR15)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo -Gisu Chainage 0+000-2+000

Kompanha : Nazico Unip,Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	10/Marco/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Monitorizasaun ba tereno teknik la prepara buku tamu	
					2		
					3		
					4		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (MBR16)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)
Contractor : Luliana Unip,Lda
No. kontratu : MPW-W-210160

Data Inspeksaun : 10/Marco/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Vaviquenia - Maubaralisa

Koordinat :

Start Point :	Long :	125.22811811	Latetude :	-8.632661686
End Point :	Long :	125.21757267	Latetude :	-8.649459943

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : **CMG Leader**

STA, 0+000 - 0+120

Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha terreno



Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha terreno




Sketch Item servisu : **CMG Leader**

STA, 0+000 - 0+120

Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha terreno



Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha terreno

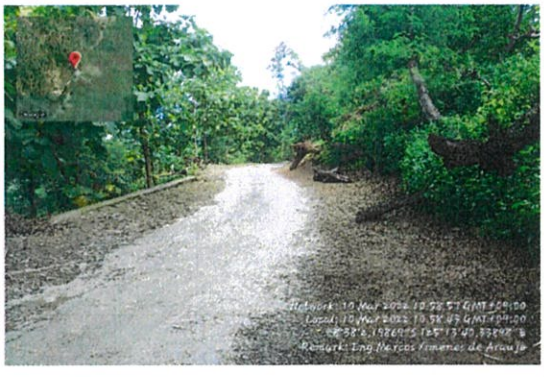

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (MBR16)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)
Contract No : MPW-W-210160
Contractor : Luliana,Unip Lda

SUMMARY

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 4,580.00										
R-02	Drainage	$ 393.96										
R-03	Earth work	$ 9,548.23					$ 104.72	0.05%	$ 293.22	0.14%	$ 397.94	0.19%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,334.15										
R-08	Structures	$ 143,293.67					$ 1,244.62	0.58%			$ 1,244.62	0.58%
R-10	Dayworks	$ 140.00										
R-11	Routine maintenance	$ 5,922.00							$ 120.00	0.06%	$ 120.00	0.06%
R-15	Provisional sum	$ 500.00										
	GENERAL ITEM											
G-01	Security	$ 3,600.00							$ 600.00	0.28%	$ 600.00	0.28%
G-02	Project team	$ 10,300.00							$ 2,190.00	1.02%	$ 2,190.00	1.02%
G-03	Safety and protection	$ 3,204.50										
G-05	Meetings	$ 100.00										
G-06	Ceremonial costs	$ 350.00										
G-07	Mineral fees	$ 8,797.79										
A	**Construction cost**	**$ 166,712.01**					**$ 1,349.34**	**0.63%**	**$ 413.22**	**0.19%**	**$ 1,762.56**	**0.82%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 16,671.20**					**$ 134.93**	**0.06%**	**$ 41.32**	**0.02%**	**$ 176.26**	**0.08%**
C	**General items**	**$ 26,352.29**					**$ -**	**0.00%**	**$ 2,790.00**	**1.30%**	**$ 2,790.00**	**1.30%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 4,194.71**					**$ 29.69**	**0.01%**	**$ 64.89**	**0.03%**	**$ 94.58**	**0.04%**
E	**TOTAL**	**$ 213,930.21**					**$ 1,513.96**	**0.71%**	**$ 3,309.43**	**1.55%**	**$ 4,823.39**	**2.25%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR16)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)

Kompanha : Luliana Unip,Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	10/Marco/2022	Lquica/Maubara	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Halo Supervisaun iha Terreno maibe teknik kompanhia laiha	
					2	Trabalhador servisu iha parte item CMG	
					3		
					4		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Data Inspesaun : 09 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 33. 307''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 20' 30. 962''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun dahuluk ba projeitu Foun Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building iha Liquica, obra husi Ministeriu Saude husi fundu Covid no kaer husi kompania Zyc Unip. Lda.



#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu pengecoran sloof lantai nian remata ona no kompania komesa fali cor ba kolom nian, no balu hotu ona no balu hahuu monta ona bekisting molok cor tuir kompozisaun neebe hasai tiha ona.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Pengecoran ba kolom uma nian lao tuir nafatin kompozisaun neebe foti husi Laboratorium Obras nian tuir design neebe iha: 19,3 Mpa.	

#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Data Inspesaun : 21 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 33. 307''**, Latetude : .....


End Point : Long : **E 125º 20' 30. 962''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

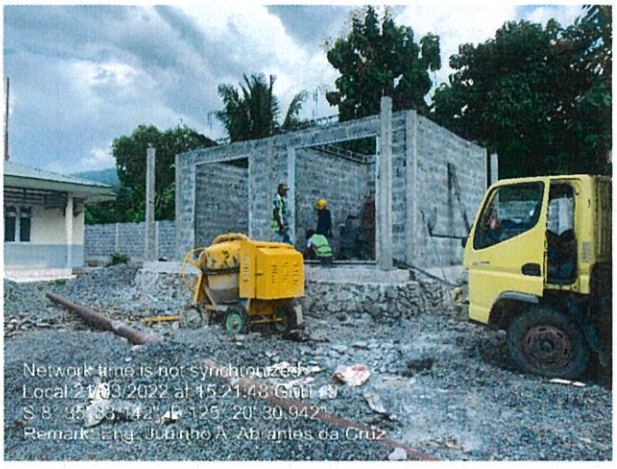Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun dahuluk ba projeitu Foun Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building iha Liquica, obra husi Ministeriu Saude husi fundu Covid no kaer husi kompania Zyc Unip. Lda.	

#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Kompania hahuu ona servisu hada block no finaliza tiha ona pengecoran kolom nian iha semana kotuk, no kontinua ba hada block tuir arahan husi tekniku projeitu nain.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Kompania sei konfirma hela ho projeitu nain konaba design sloof leten neebe la inklui iha dezeniu, maibe kompania hahuu ona monta besi no monta ona bekisting molok hahuu cor ba sloof leten.	

#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Project Name : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Location : Liquica Municipality - Timor Leste
Project Owner : Ministry of Health

#ANEXU C2 - (BZT22)			VERIFIED BY A D N , I P										
NO	DESCRIPTION	Amount (USD)	PREVIOUS	% BILLED	THIS BILLING	% BILLED	TO DATE	% BILLED	PROGRESU IHA TERENU				TOTAL %
									FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%	
I	PREPARATION WORKS	$ 4,200.00							$ 2,100.00	3.61%	$ -	0.00%	3.61%
II	NEW INSTALLATION LOW VOLTAGE (LV) LINE	$ 1,044.00							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
III	MAIN CONNECTION TO ISOLATION INCLUDE PROVIDE GENSET	$ 22,726.44							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
IV	CONSTRUCTION HOUSE FOR GENSET	$ 15,040.67							$ 1,504.07	2.59%	$ 2,256.10	3.88%	6.46%
V	FINAL CLEARING	$ 1,000.00							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
A	**GRAND TOTAL**	**$ 44,011.11**							$ 3,604.07	6.20%	$ 2,256.10	3.88%	10.07%
B	Fee Contractor(10% x A)	$ 4,401.11							$ 360.41	0.62%	$ 225.61	0.39%	1.01%
C	Overhead	$ 4,300.00							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
D	TAX 2% x (A + B + C)	$ 1,054.24							$ 79.29	0.14%	$ 49.63	0.09%	0.22%
E	CONTIGENCY (10% x A)	$ 4,401.11							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
F	TOTAL PROJECT COST (A + B + C + D + E)	$ 58,167.58							$ 4,043.75	6.95%	$ 2,531.33	4.35%	11.30%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edificio Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT22)



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica

Kompanha : Zyc Unipessoal Lda

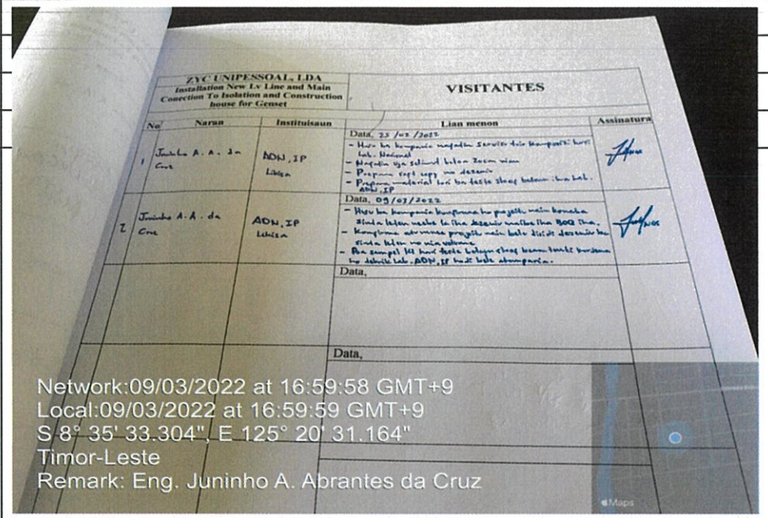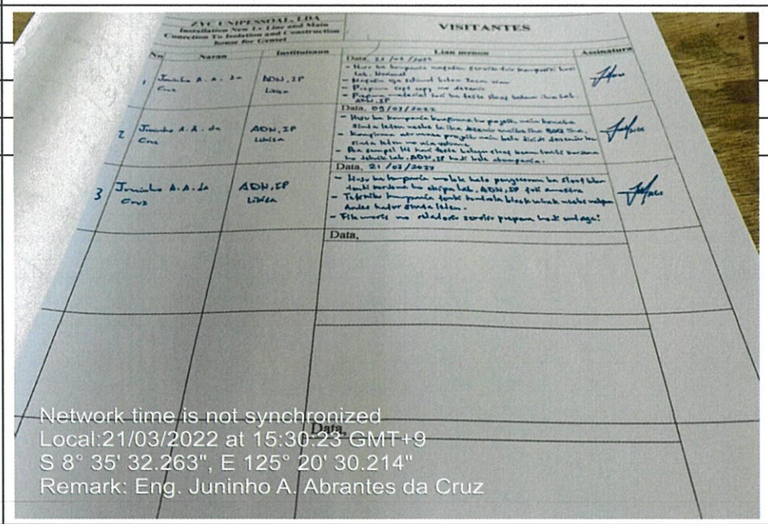No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
III	9/03/2022	Maumeta, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		
IV	21/03/2022	Maumeta, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (BZT23)

Back-up Data

Naran Projeto : Projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica
Kompania : U-Rema Unip. Lda.
No. kontratu : NCB:15/MEJD/DNA/2021

Data Inspesaun : 16 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Leorema - Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 40' 43. 435''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 22' 18. 833''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema lokaliza iha suku Leorema, Bazartete, Munisipiu Likisa projeitu nee kaer husi kompania U-Rema Unip. Lda.	

#ANEXU C1 – (BZT23)

Back-up Data

Naran Projeto : Projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica
Kompania : U-Rema Unip. Lda.
No. kontratu : NCB:15/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tuir informasaun neebe ekipa tekniku sira hetan wainhira halao inspesaun katak projeitu eskola refere lao tarde ituan tanba asesu estrada foin mak diak husi impaktu udan boot neebe sobu estrada asesu ba iha suku Leorema.	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Kompania servisu kee rai ba area eskola nian remata tiha ona, no servisu urugan pasir kembali iha pondasi okos 50mm nian mos remata ona no uza stamper mak halo pemadatan, servisu hada fatuk pondasi (1:3) hahuu lao tiha ona.	

#ANEXU C1 – (BZT23)

Back-up Data

Naran Projeto : Projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica
Kompania : U-Rema Unip. Lda.
No. kontratu : NCB:15/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba servisu iha area sala professor sira nian kee rai no urugan pasir kembali 50mm remata tiha ona, no foin komesa servisu hada fatuk pondasi (1:3) nian.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Kompania presiza aselera deit project sign board atu hatur iha terenu no prepara material hirak neebe atu uza ba amostra betaun nian lori ba iha Laboratorium Obras Nasional atu bele hetan kompozisaun.	

#ANEXU D - (BZT23)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN ESTV LEOREMA

Kompania : U-REMA UNIP. LDA.

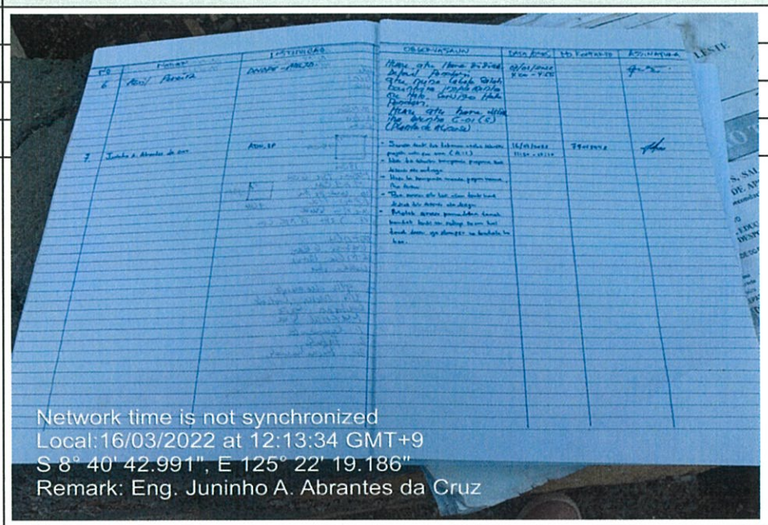No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	16/03/2022	Leorema, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (BZT21)

Back-up Data

Naran Projeto Liquica : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu pengecoran sloof okos nian lao kuaze atu remata ona iha terenu, no kompania kontinua halo pengecoran ba sloof no kolom tuir nafatin kompozisaun neebe husi Laboratorium Obras nian.	


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Kompania kontinua servisu hada block dadaun ona molok servisu sloof no kolom maran liu loron 2 ou 3. Kompania kordena hela ho tekniku projeitu nain konaba design dalan tama portaun nian neebe la kompletu.	

#ANEXU C1 – (BZT21)


Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

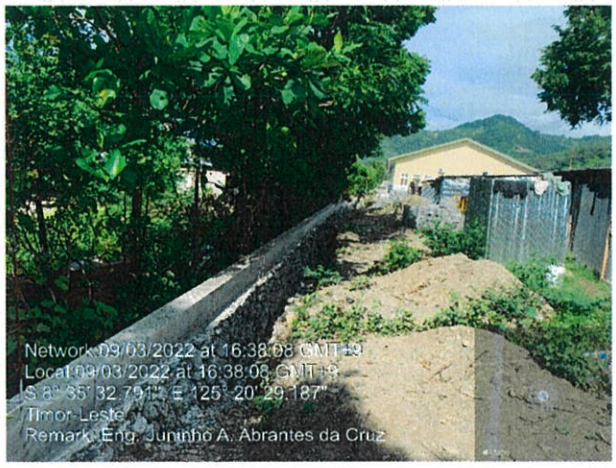

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

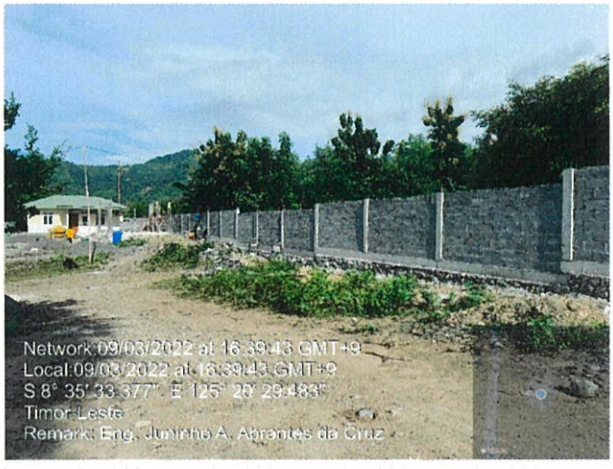

#ANEXU C1 – (BZT21)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Data Inspesaun : 21 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 33. 072''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 20' 28. 881''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu Foun Konstrusaun Moru Haleu ba Isolamentu Covid 19 iha Liquica no kaer husi kompania Biamali Unip. Lda.	

#ANEXU C1 – (BZT21)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tuir inspesaun neebe ekipa tekniku ADN, IP halao iha terenu kompania nia servisu ba hada batako nian kuaze remata ona, hein hela deit servisu monta besi no cor sinta leten nian.	

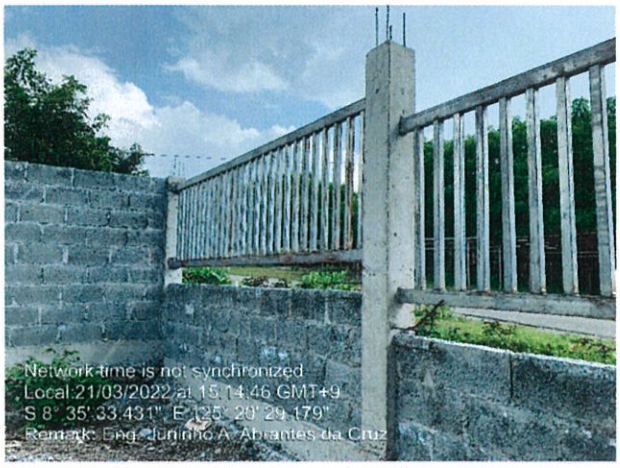
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tuir informasaun husi tekniku kompania katak design ba sloof leten neebe konekta ho besi teralis laiha, no halo ona konfirmasaun ho tekniku husi projeitu nain no bele servisu tuir nafatin no hein deit projeiu nain hadia/halo fali design.	

#ANEXU C1 – (BZT21)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

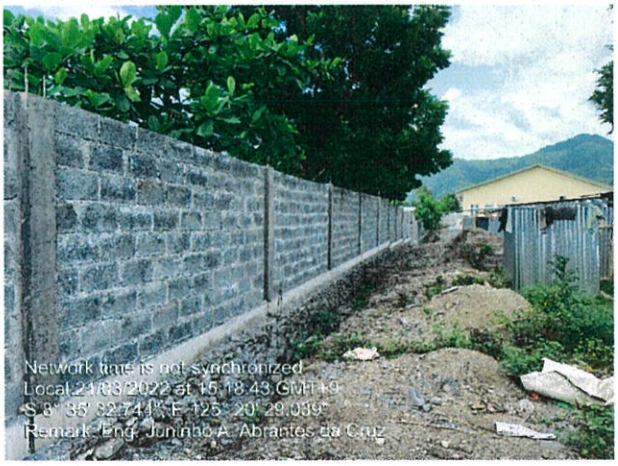

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 – (BZT21)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Data Inspesaun : 09 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 33. 072''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 20' 28. 881''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa ADN, IP munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu Foun Konstrusaun Moru Haleu ba Isolamentu Covid 19 iha Liquica no kaer husi kompania Biamali Unip. Lda.	

#ANEXU D - (BZT21)




MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction of Fence Around for Isolation Covid-19 in Liquica Maumeta

Kompanha : Biamali Unipessoal Lda

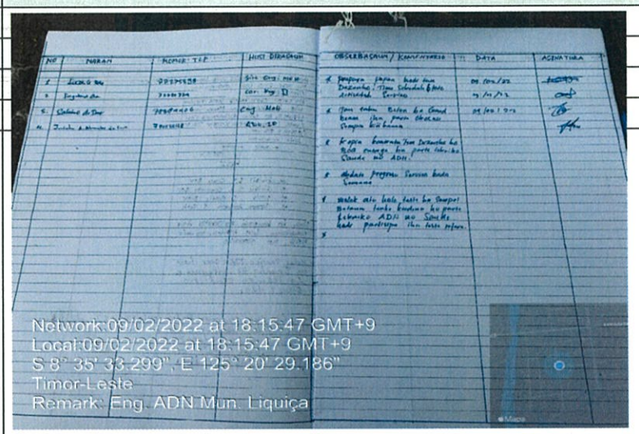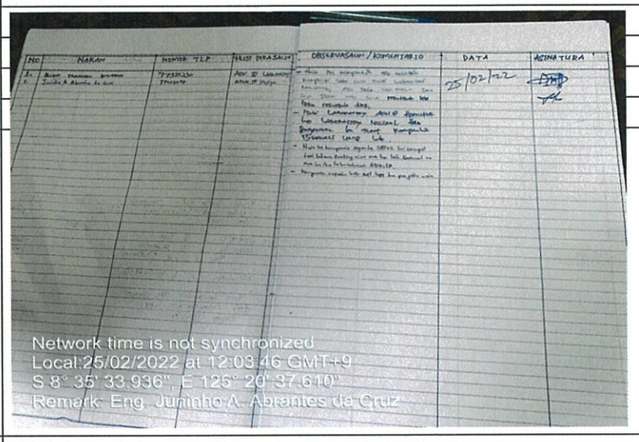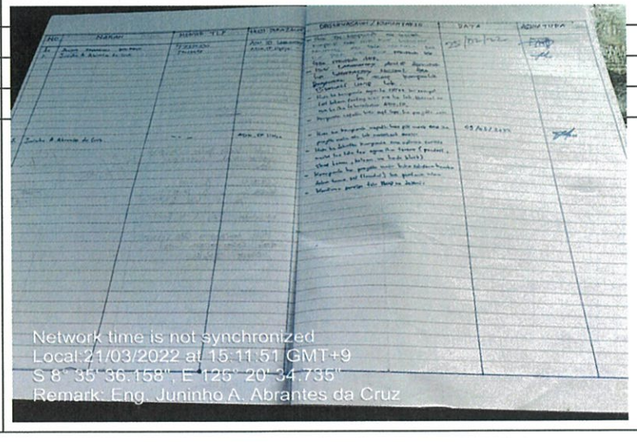No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	9/02/2022	Maumeta, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		
II	25/02/2022	Maumeta, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		
III	21/03/2022	Maumeta, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT TITLE : NEW CONSTRUCTION FENCE AROUND FOR ISOLATION COVID-19
LOCATION : MAUMETA - LIQUICA MUNICIPALITY - TIMOR LESTE
PROJECT OWNER : MINISTRY OF HEALTH

SUMMARY

# ANEXU C2 - (BZT 21)			VERIFIED BY A D N , I P									
No	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
			FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PREPARATION WORKS	$ 2,255.00	$ 1,127.50	1.73%	$ -	0.00%					$ 1,127.50	1.73%
II	FUNDATION WORKS	$ 11,000.46	$ 4,398.51	6.74%	$ 1,101.72	1.69%					$ 5,500.23	8.43%
III	CONCRETE WORKS	$ 15,907.15	$ -	0.00%	$ 1,665.83	2.55%					$ 1,665.83	2.55%
IV	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	$ 15,764.38	$ -	0.00%	$ 3,371.20	5.16%					$ 3,371.20	5.16%
V	OTHER WORKS	$ 1,312.60	$ -	0.00%	$ 118.03	0.18%					$ 118.03	0.18%
VI	PAINTING WORKS	$ 3,380.40	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
VII	FINAL CLEARING	$ 100.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	**GRAND TOTAL**	**$ 49,719.99**	**$ 5,526.01**	**8.47%**	**$ 6,256.77**	**9.59%**					**$ 11,782.78**	**18.05%**
B	**FEE CONTRACTOR (10% x A)**	**$ 4,972.00**	**$ 552.60**	**0.85%**	**$ 625.68**	**0.96%**					**$ 1,178.28**	**1.81%**
C	**OVERHEAD**	**$ 4,425.00**	**$ -**	**0.00%**	**$ -**	**0.00%**					**$ -**	**0.00%**
D	**TAX (2% x(A+B+C)**	**$ 1,182.34**	**$ 121.57**	**0.19%**	**$ 137.65**	**0.21%**					**$ 259.22**	**0.40%**
E	**CONTIGENCY**	**$ 4,972.00**	**$ -**	**0.00%**	**$ -**	**0.00%**					**$ -**	**0.00%**
F	**TOTAL PROJECT COST (A +B + C + D + E)**	**$ 65,271.32**	**$ 6,200.19**	**9.50%**	**$ 7,020.09**	**10.76%**					**$ 13,220.28**	**20.25%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu
Edificio Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU C1 – (BZT24)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura Bazartete
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 16 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Leorema - Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 39' 21. 442''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 22' 51. 232''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....


4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu foun husi MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EPE Baura lokaliza iha Leorema, Bazartete, Munisipiu Likisa projeitu nee kaer husi servisu grupu komunitariu.	

#ANEXU C1 – (BZT24)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura Bazartete
Kompania :
No. kontratu :

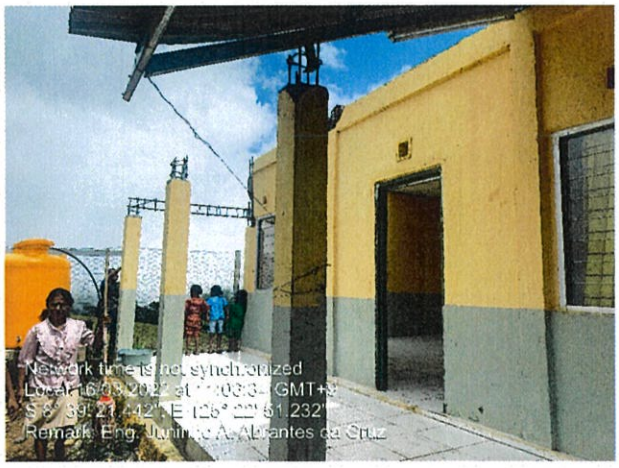Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu grupu komunitariu ba projeitu refere konaba Rehabilitasaun Pre Eskolar neebe hetan estragus husi anin kuaze fulan hirak liu ba, estragus hirak neebe presiza hadia identifika ona iha terenu no ekipa grupu nian komesa halao servisu ona.	


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Prezidenti Grupu nian foo ona instrusaun ba tekniku grupu nian atu prepara material hirak neebe atu uza lori ba projeitu nain atu verifika no hetan konsultasaun husi projeitu nain atu nunee bele aselera servisu.	

#ANEXU C1 – (BZT24)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Baura Bazartete
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

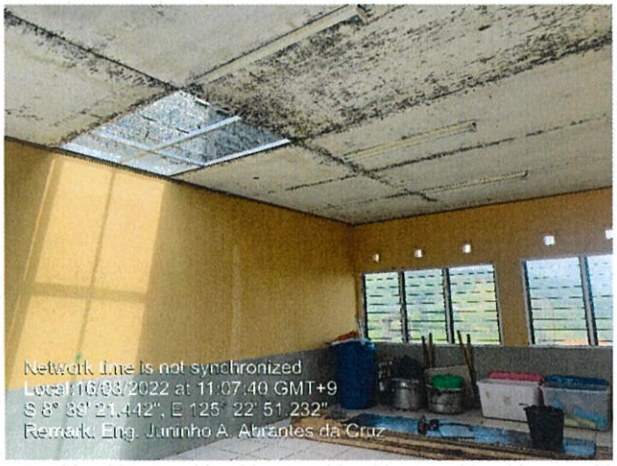

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : REHABILITAÇÃO ESCOLA PRE-ESCOLAR BAURA
FATIN PROJEITO : LEOREMA , BAZARTETE
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

# ANEXU C2 - (BZT24)						VERIFIED BY A D N , I P									
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
						FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$ 1,970.00			$ 985.00	10.86%					$ 985.00	10.86%
II	CLASSROOM BUILDING RF	RF/21	(i)	US$	$ 4,102.12			$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			US$	$ 6,072.12			$ 985.00	10.86%					$ 985.00	10.86%
B	CONTIGENCY			US$	$ 3,000.00			$ -	0.00%					$ -	0.00%
C	GRAND TOTAL			US$	$ 9,072.12			$ 985.00	10.86%					$ 985.00	10.86%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransiseo Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edifício Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT24)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE EPE BAURA

GRUPU KOMUNITARIU

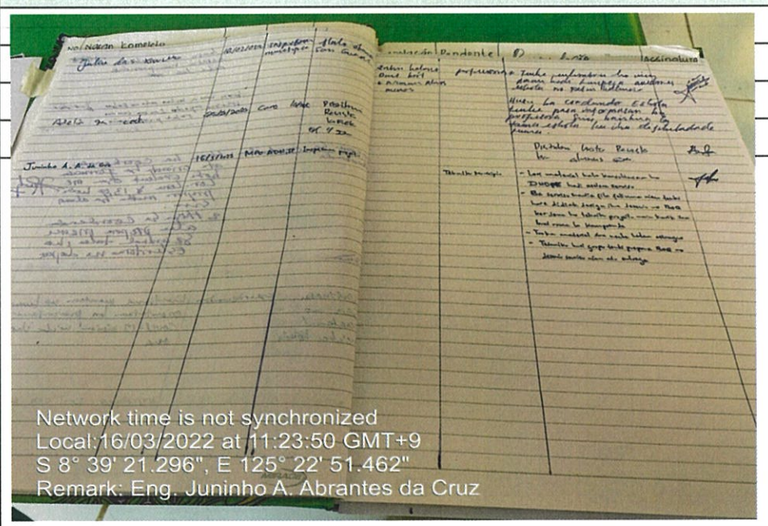No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	16/03/2022	Leorema, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (BZT26)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 15 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Lauhata - Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 34' 19. 391''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 27' 52. 593''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz


2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu foun husi MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EPE Cassait iha Lauhata, Bazartete, Likisa projeitu nee kaer husi servisu grupu komunitariu.

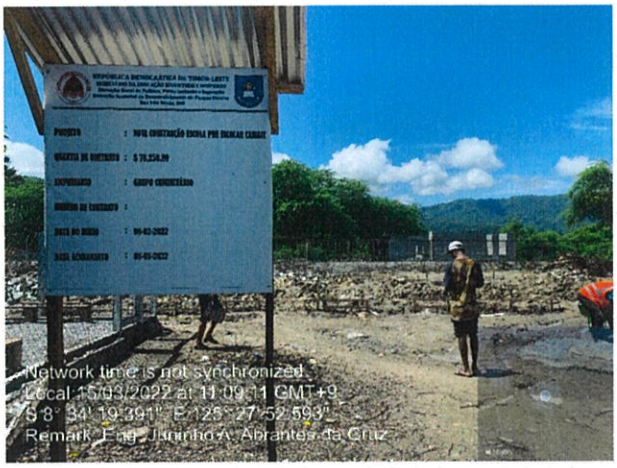

#ANEXU C1 – (BZT26)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait
Kompania :
No. kontratu :

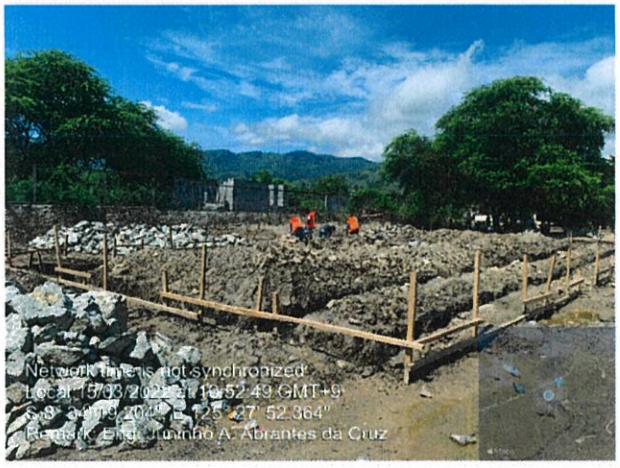Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tuir grupu komunitariu neebe toma konta ba servisu iha terenu ba projeitu nee, katak projeitu nee lao ona kuaze semana ida, no iha ona prezidenti grupu nian no tekniku grupu nian neebe sei hare ba lalaok servisu iha terenu.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu kee rai nian iha terenu remata ona no grupu komesa ona servisu urugan pasir kembali ho medida 5cm. No halo ona pemadatan ba servisu refere.	

#ANEXU C1 – (BZT26)
Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun ba EPE Cassait
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Grupu mos hahuu ona servisu ba hada pondasi nian neebe foin lao hahuu ohin, no tuir instrusaun neebe foo husi ekipa tekniku projeitu nain katak iha mudansa ba medida (aas) ba servisu pondasi nian, informasaun nee hatoo husi prezidenti grupu.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Mudansa ba medida nee iha ona diskusaun entre Prezidenti Grupu nian, tekniku Grupu nian no tekniku Projeitu Nain, tanba iha mudansa ituan ho rai iha terenu kompara ho design neebe iha.	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA PRE-ESCOLAR CASSAIT
FATIN PROJEITO : ULMERA , BAZARTETE
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

# ANEXU C2 - (BZT26)						VERIFIED BY A D N , I P									
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
						FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$ 3,075.00			$ 1,537.50	1.96%					$ 1,537.50	1.96%
II	PROVISIONAL SUM FOR DEMOLITION	DM/3		US$	$ 686.50			$ -	0.00%					$ -	0.00%
III	CLASSROOM BUILDING C2	C2/47	(i)	US$	$ 57,955.41			$ 5,795.54	7.41%					$ 5,795.54	7.41%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/19	(i)	US$	$ 7,193.98			$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			US$	$ 68,910.89			$ 7,333.04	9.37%					$ 7,333.04	9.37%
B	OVERHEAD			US$	$ 6,340.00			$ -	0.00%					$ -	0.00%
C	CONTIGENCY			US$	$ 3,000.00			$ -	0.00%					$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL			US$	$ 78,250.89			$ 7,333.04	9.37%					$ 7,333.04	9.37%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edificio Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT26)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE EPE CASSAIT

GRUPU KOMUNITARIU

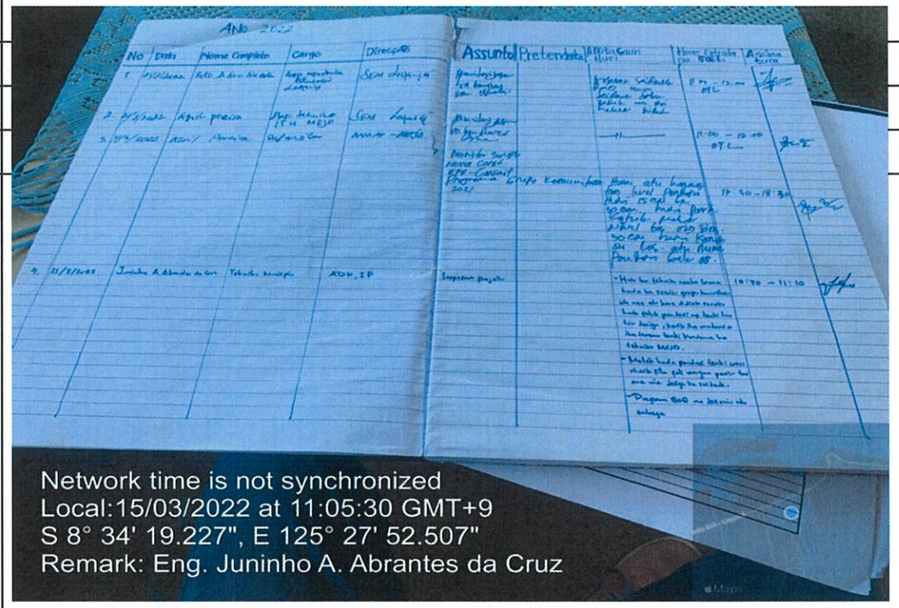No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/03/2022	Lauhata, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (BZT27)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE ESG Classe Paralelo Bogoro
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 15 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Bogoro – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 36. 980''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 23' 58. 119''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu Foun MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun ESG Classe Paralelo Bogoro, lokaliza iha Bogoro, Bazartete, Munisipiu Likisa, neebe kaer husi servisu Grupu Komunitariu	

#ANEXU C1 – (BZT27)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE ESG Classe Paralelo Bogoro
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Wainhira ekipa tekniku ADN, IP halao inspesaun iha terenu ba konstrusaun refere, hahuu ona servisu kuaze besik semana ida, no servisu grupu nian too hela kee rai haleu neebe besik finaliza ona.	

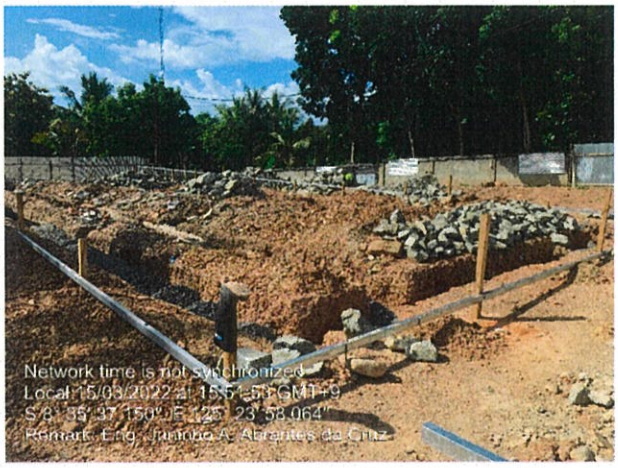Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Material neebe presiza ba servisu tuir mai prepara tiha ona iha terenu no ba servisu urugan pasir kembali 0,5 cm komesa kari haleu ona no rekomenda ona husi ekipa tekniku sira atu uza stamper maka halo pemadatan.	

#ANEXU C1 – (BZT27)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE ESG Classe Paralelo Bogoro
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu lao kuaze ho diak no iha tekniku ida neebe maka hare ba servisu grupu refere, maske iha loron refere nia la marka prezensa tanba lori material ba iha Laboratorium Nasional no prepara Project Sign Board atu koloka iha terenu no dezeniu no time schedule atu taka iha site keet.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA SECUNDARIA GERAL PARALELO BOGORO
FATIN PROJEITO : MOTAULUN, BAZARTETE
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

# ANEXU C2 - (BZT27)						VERIFIED BY A D N , I P									
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
						FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$ 3,075.00			$ 1,537.50	1.33%					$ 1,537.50	1.33%
II	CLASSROOM BUILDING CA	CA/39	(i)	US$	$ 65,492.93			$ 3,274.65	2.84%					$ 3,274.65	2.84%
III	TOILET BUILDING Tb	TB/39	(i)	US$	$ 24,504.47			$ 1,225.22	1.06%					$ 1,225.22	1.06%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/28	(i)	US$	$ 12,901.36			$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			US$	$ 105,973.76			$ 6,037.37	5.24%					$ 6,037.37	5.24%
B	OVERHEAD			US$	$ 6,340.00			$ -	0.00%					$ -	0.00%
C	CONTIGENCY			US$	$ 3,000.00			$ -	0.00%					$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL			US$	$ 115,313.76			$ 6,037.37	5.24%					$ 6,037.37	5.24%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edificio Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT27)



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE ESG CLASSE PARALELO BOGORO

GRUPU KOMUNITARIU

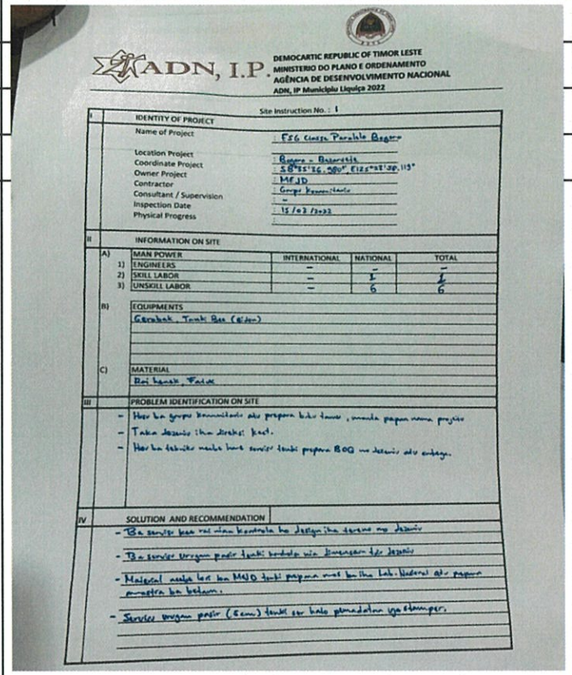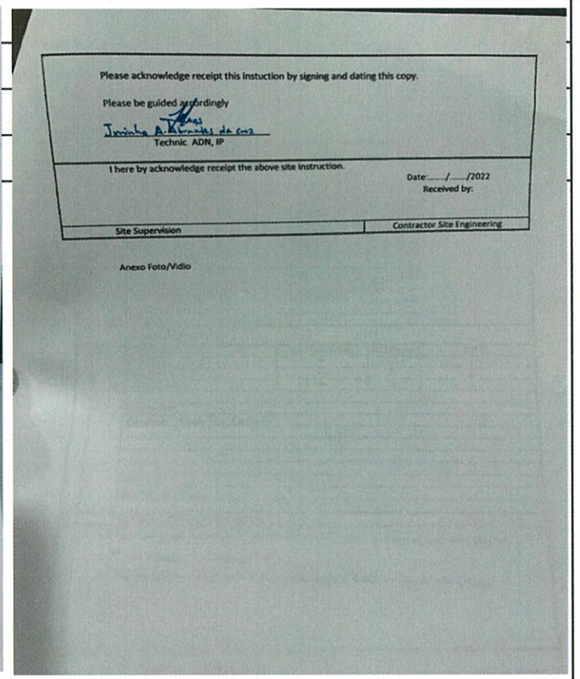No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/03/2022	Bogoro, Liquica	Juninho Antônio Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5	 	

ADN, I.P
DEMOCARTIC REPUBLIC OF TIMOR LESTE
MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL
ADN, IP Municipiu Liquiça 2022

Site Instruction No.: 1

I IDENTITY OF PROJECT
Name of Project: ESG Classe Paralelo Bogoro
Location Project: Bogoro - Beaconstis
Coordinate Project: 8°55'26.580" E125°32'30.115"
Owner Project: MEJD
Contractor: Grupo Komunitariu
Consultant / Supervision: -
Inspection Date: 15/03/2022
Physical Progress: -

II INFORMATION ON SITE

		INTERNATIONAL	NATIONAL	TOTAL
A) MAN POWER				
1)	ENGINEERS	-	-	-
2)	SKILL LABOR	-	1	1
3)	UNSKILL LABOR	-	6	6

B) EQUIPMENTS
Gerabak, Tenki Rai (6'dan)

C) MATERIAL
Rai hamak, Fatuk

III PROBLEM IDENTIFICATION ON SITE
- Hasa ha grupu komunitariu ida prepara hodi tenke, nomeda prepara nomos projeto
- Taka lasaniis iha direksaun kiak.
- Hasa ha tekniku nesesidade hodi servisu tenki prepara 8.00 no lasaniis ida ona.

IV SOLUTION AND RECOMMENDATION
- Ba servisu hasa rai nian kontrola ba Jadiquitho tamba nu lasaniis
- Ba servisu tenke nian presiza tenki kontrola nia lasaniis tan lasaniis
- Material nesesidade hodi ba MEJD tenki prepara nomos ba iha Lab. Material ida prepara amostra ba beibeun.
- Servisu tenke presiza (6 anos) tenki ser kuda prevenisaun iga tamba perigu.

Please acknowledge receipt this instuction by signing and dating this copy.
Please be guided accordingly
Juninho A. Abrantes da Cruz
Technic ADN, IP

I here by acknowledge receipt the above site instruction.
Date:...../...../2022
Received by:

Site Supervision | Contractor Site Engineering

Anexo Foto/Vidio

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : **08 Marsu 2022**

Fatin Inspesaun : Dato, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.35'21.273"S, Latetude : .....

End Point : Long : 125.20'1.933"E, Latetude : .....

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu husi Ministeriu Edukasaun nian Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica lokaliza iha suku Dato, Liquica Vila, Munisipiu Likisa, neebe kaer husi kompania Roman Furak Unip. Lda.



#ANEXU C1 – (LV20)
Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku Munisipiu no Laboratorium ADN, IP kordena ho tekniku Laboratorium Obras Nasional no tekniku projeitu nain akompania servisu ba pengecoran dahuluk ba servisu pengecoran kolom pendek.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Kompozisaun neebe uza hodi halao servisu iha terenu ba item pengecoran kolom pendek refere foti iha Laboratorium Obras Nasional tuir material neebe kompania lori ba hatama hodi halao teste ba amostra betaun nian.	

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tuir ekipa tekniku Laboratorium sira katak ba servisu pengecoran item seluk bele uza kompozisaun neebe hanesan ho ida nee tanba nia mix design betaun nian hanesan.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tuir amostra neebe foti husi kompozisaun refere hetan ona slump test 0, 10 cm. Kontrola masimu ho bee deit hare ba kondisaun material iha terenu maran ka bokon.	

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku Laboratorium ADN, IP mos foti amostra betaun hamutuk 6 (neen) hodi bele lori mai teste iha Laboratorium ADN, IP hodi hatene nia rezultadu.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : 28 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Dato, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.35'21.273"S, Latetude : .....

End Point : Long : 125.20'1.933"E, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu husi Ministeriu Edukasaun nian Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica lokaliza iha suku Dato, Liquica Vila, Munisipiu Likisa, neebe kaer husi kompania Roman Furak Unip. Lda.




#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Kompania servisu ona too iha pemasangan bekisting ba sloof okos nian wainhira remata servisu pengecoran kolom pendek nian, no monta besi ba sloof okos/rai nian no monta besi ba kolom nian tuir design neebe mensiona ka iha ona.	

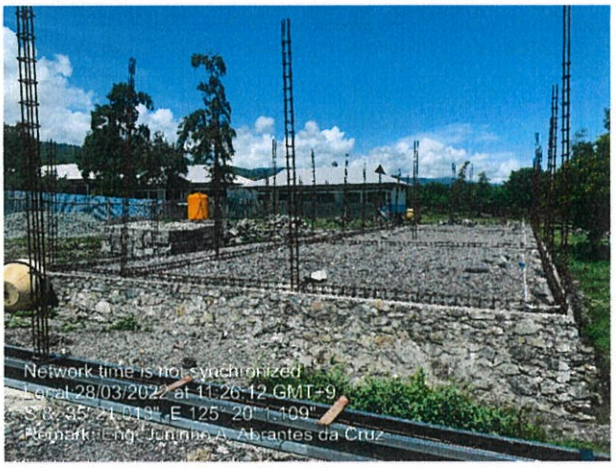Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba servisu monta/kesi besi ba servisu sloof/sinta okos no kolom nian ba area klase aula nian kuaze finaliza ona, no ekipa tekniku sira hare no foo ona instrusaun atu kompania kontrola servisu lao tuir design ba medida kesi no monta besi nian.	

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba area haris fatin nian kompania nia tekniku foo ona instrusaun ba trabaliador sira neebe monta pipa ba bee dalan no item seluk neebe uza pipa iha haris fatin, tuir nia dezeniu neebe espesifika ona no pipa mos hola tuir spec neebe projeitu nain foo ona ba kompania.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Hafoin finaliza monta bekisting no kesi besi ba area haris fatin nian, servisu monta pipa mos lao tiha ona, no pipa boot neebe hakoi iha rai okos mos foo ona instrusaun husi tekniku sira atu nunee wainhira ateru fila fali rai tenki kuidadu ho halo pemadatan atu nunee labele estraga pipa neebe hakoi.	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

SUMMARY

Naran Projeitu : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA SECUNDÁRIA GERAL LIQUIÇA
Fatin Projeitu : CAIMEO VILA, SUCO DATO
Projeitu Nain : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

ANEXU C2 - (LV20)			VERIFIED BY A D N , I P									
NO.	WORK DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	PREVIOUS	BILLED (%)	THIS BILLING	BILLED (%)	TO DATE	BILLED (%)	PROGRESU IHA TERENU				BILLED (%)
									Fulan Kotuk	%	Fulan Ida Nee	%	
I	PRELIMINARIES	$ 2,870.00							$ 1,435.00	0.86%	$ -	0.00%	0.86%
II	CLASSROOM BUILDING C	$ 53,423.84							$ 5,342.38	3.20%	$ 5,342.38	3.20%	6.40%
III	CLASSROOM BUILDING CB	$ 75,136.99							$ 7,513.70	4.50%	$ 7,513.70	4.50%	8.99%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	$ 13,000.00							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	$ 144,430.83							$ 14,291.08	8.55%	$ 12,856.08	7.69%	16.25%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	$ 14,443.08							$ 1,429.11	0.86%	$ 1,285.61	0.77%	1.62%
C	OVERHEAD	$ 4,930.00							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
D	TAX (2% x (A+B+C))	$ 3,276.08							$ 314.40	0.19%	$ 282.83	0.17%	0.36%
E	CONTIGENCY	$ -							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
F	TOTAL COST (A+B+C+D)	$ 167,079.99							$ 16,034.60	9.60%	$ 14,424.53	8.63%	18.23%

Inspeksaun Husi :

Eng, Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifisiu Publiku Agua Saneamentu, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineer ba Projeitu
Edificio Publiku Agua Saneamento
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ
ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV20)



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran Projeitu: Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica

Kompanha : ROMAN FURAK Unip. Lda.

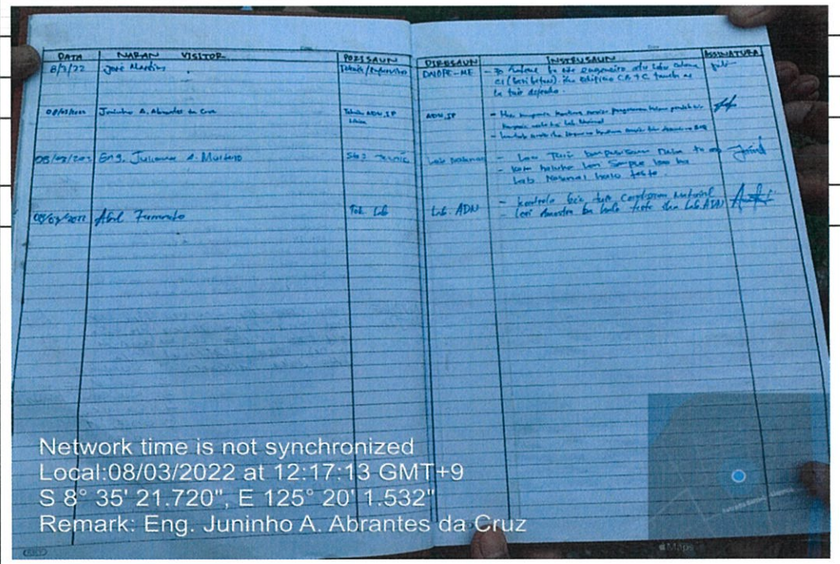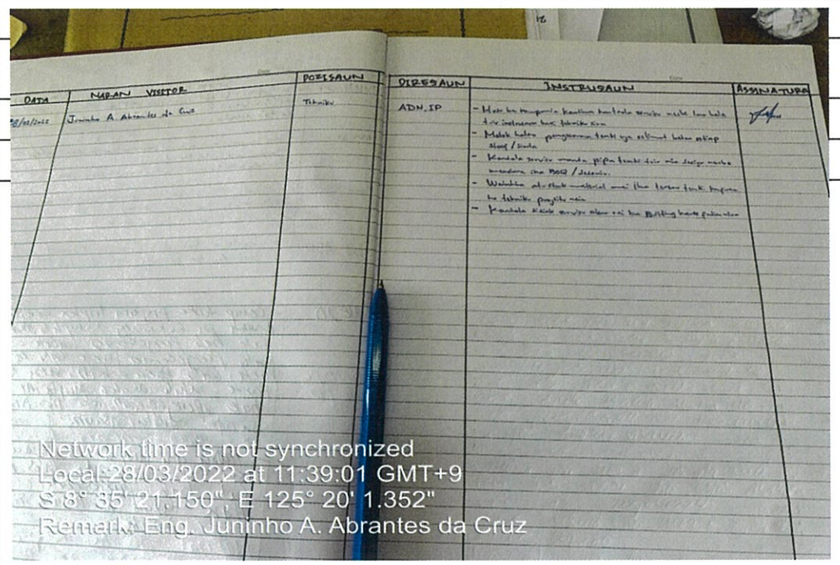No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/03/2022	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquica	1 2 3 4 5 6		
II	28/03/2022	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquica	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (LV22)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1,2 Mauboque
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 14 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Dato – Liquica Vila, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 49. 086''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 18' 51. 269''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu husi MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1,2 Mauboque lokaliza iha Dato, Liquica Vila Munisipiu Liquica neebe kaer husi Grupu Komunitariu.



#ANEXU C1 – (LV22)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1,2 Mauboque
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tuir grupu komunitariu neebe toma konta ba servisu iha terenu ba projeitu nee, katak projeitu nee lao ona kuaze semana ida, no iha ona prezidenti grupu nian no tekniku grupu nian neebe sei hare ba lalaok servisu iha terenu.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu kee rai nian iha terenu remata tiha ona no ba servisu urugan pasir kembali mos remata ona no halo ona pemadatan molok grupu sira halao servisu hada pondasi batu kali.	

#ANEXU C1 – (LV22)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1,2 Mauboque
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu pondasi projeitu refere mos iha mudansa ba medida pondasi nian neebe la hanesan ho nia design tanba kestaun rai iha terenu neebe la hanesan, tan nee diskuti ona ho projeitu nain atu iha aumenta ba medida pondasi nia aas.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

#ANEXU C1 – (LV22)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1,2 Mauboque
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 28 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Dato – Liquica Vila, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 49. 086''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 18' 51. 269''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu husi MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1,2 Mauboque lokaliza iha Dato, Liquica Vila Munisipiu Liquica neebe kaer husi Grupu Komunitariu.



#ANEXU C1 – (LV22)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1,2 Mauboque
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tuir inspesaun neebe ekipa tekniku ADN, IP halao iha loron refere nota katak parte grupu balu servisu loron rohan deit, balu servisu dader, loraik sira la servisu ona, no tekniku grupu ho prezidenti grupu nian mos la marka prezensa.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tuir trabaliador hirak neebe sei servisu iha loron refere hatoo katak servisu lao tarde ituan no iha loron refere trabaliador sira servisu deit ba hada fatuk pondasi no halo klean pondasi +- 0,47cm hodi hatur besi kolom nian.	

#ANEXU C1 – (LV22)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1,2 Mauboque
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BÁSICA FILIAL MAUBOQUE
FATIN PROJEITO : DATO, LIQUICA
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

# ANEXU C2 - (LV 22)						VERIFIED BY A D N , I P									
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
						FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$ 3,075.00			$ 1,537.50	1.37%					$ 1,537.50	1.37%
II	PROVISIONAL SUM FOR DEMOLITION	DM/3		US$	$ 590.80			$ -	0.00%					$ -	0.00%
III	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	US$	$ 48,285.30			$ 4,828.53	4.29%					$ 4,828.53	4.29%
IV	CLASSROOM BUILDING CdI	C/36	(i)	US$	$ 43,049.04			$ 4,304.90	3.83%					$ 4,304.90	3.83%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/27	(i)	US$	$ 8,189.87			$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			US$	$ 103,190.01			$ 10,670.93	9.48%					$ 10,670.93	9.48%
B	OVERHEAD			US$	$ 6,340.00			$ -	0.00%					$ -	0.00%
C	CONTIGENCY			US$	$ 3,000.00			$ -	0.00%					$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL			US$	$ 112,530.01			$ 10,670.93	9.48%					$ 10,670.93	9.48%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edificio Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV22)



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE EBF MAUBOQUE

GRUPU KOMUNITARIU

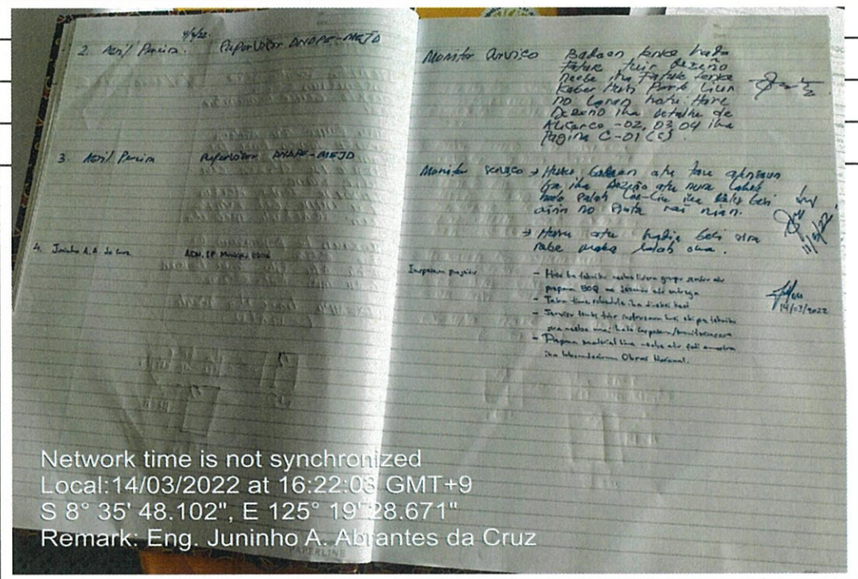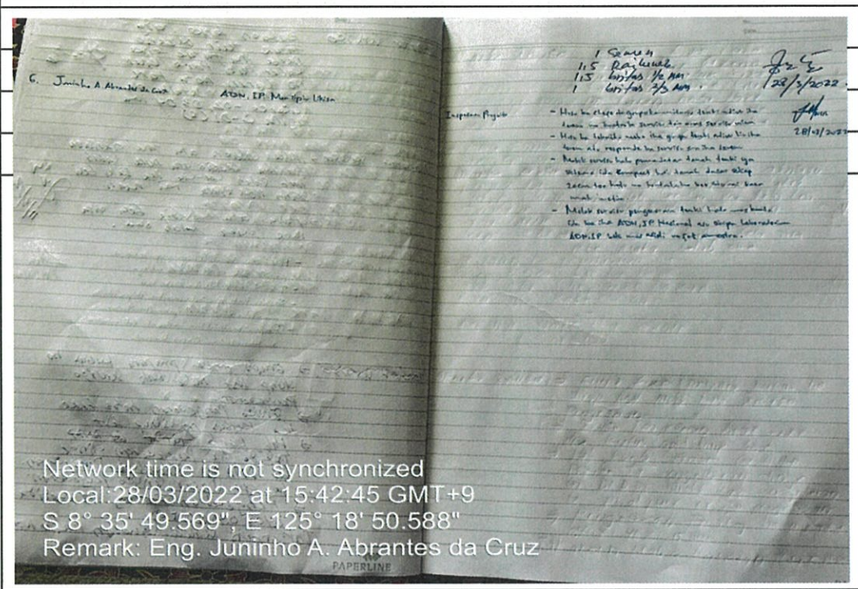No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	14/03/2022	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		
II	28/03/2022	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (LV23)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBC 1,2,3 Liquica
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 14 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Dato – Liquica Vila, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 32. 592''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 19' 53. 005''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu Foun MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EBC 1, 2, 3 Liquica lokaliza iha Dato, Liquica Vila munisipiu Likisa, neebe kaer husi servisu Grupu Komunitariu.




#ANEXU C1 – (LV23)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBC 1,2,3 Liquica
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Wainhira ekipa tekniku ADN, IP halao inspesaun iha terenu ba projeitu refere hatoo katak servisu lao ona durante semana ida ho balu no tama ona ba servisu hada fatuk ba pondasi no pengalian tanah sei lao hela ba sala balu.	

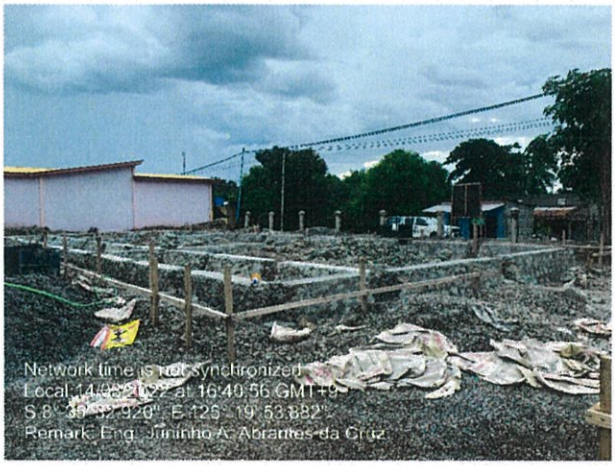Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba klase aula nian kuaze lao ona too iha hada fatuk pondasi wainhira grupu nia servisu ba kee rai no servisu urugan pasir kembali 0,5cm neebe uza pemadatan ho stamper.	

#ANEXU C1 – (LV23)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBC 1,2,3 Liquica
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Iha servisu hada fatuk pondasi ba laran nian mak ladun rapi tanba tuir informasaun katak grupu servisu hada sala tiha la tuir design tan nee sira hadia fali deit la sobu fila fali tan nee iha pondasi balu neebe hare ho matan ladun rapi.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

#ANEXU C1 – (LV23)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBC 1,2,3 Liquica
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 28 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Dato – Liquica Vila, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 32. 592''**, Latetude : .....


End Point : Long : **E 125º 19' 53. 005''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

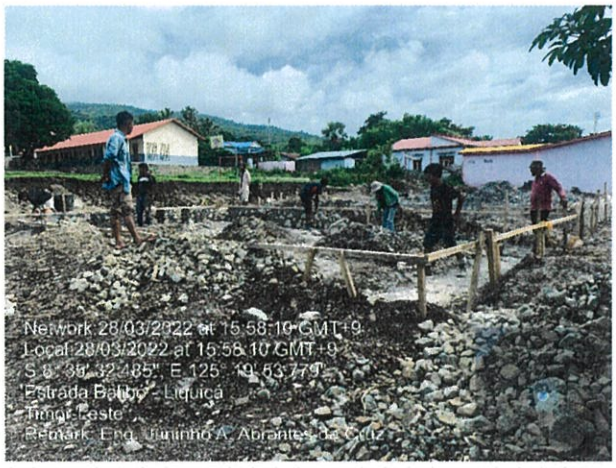Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu Foun MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EBC 1, 2, 3 Liquica lokaliza iha Dato, Liquica Vila munisipiu Likisa, neebe kaer husi servisu Grupu Komunitariu.	

#ANEXU C1 – (LV23)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBC 1,2,3 Liquica
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu grupu nian iha loron refere komesa hada ona fatuk pondasi ba haris fatin nian wainhira grupu finaliza kee rai, servisu pemadatan ba urugan pasir kembali uza stamper nian finaliza.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba area klase aula nian servisu husi grupu sira neebe hadia fila fali pondasi neebe ladun rapi tuir instrusaun husi ekipa tekniku projeitu nain no ADN, IP neebe nota la tuir design, no hadia tutuir ona.	

#ANEXU C1 – (LV23)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBC 1,2,3 Liquica
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba servisu ateru fila fali rai ba area klase aula nian rekomenda ona husi tekniku ADN, IP atu tuir sistema pemadatan kada 0,20 cm husi permukaan tanah uza stamper no kontrola ho bee hodi halo rai metin no rata.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Maibe grupu servisu tuir tiha ona sistema neebe foo husi ekipa tekniku projeitu nain ba pemadatan tanah kembali ba area klase aula nian, no nafatin iha kontrola uza stamper no kontrola ho bee atu bele metin.	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA CENTRAL LIQUICA
FATIN PROJEITO : DATO, LIQUICA
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

# ANEXU C2 - (LV23)						VERIFIED BY A D N , I P									
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
						FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$ 3,075.00			$ 1,537.50	1.55%					$ 1,537.50	1.55%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	US$	$ 45,885.30			$ 4,588.53	4.61%					$ 4,588.53	4.61%
III	TOILET BUILDING Tb	C/39	(i)	US$	$ 23,742.51			$ 2,374.25	2.39%					$ 2,374.25	2.39%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/27	(i)	US$	$ 17,413.23			$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			US$	$ 90,116.04			$ 8,500.28	8.55%					$ 8,500.28	8.55%
B	OVERHEAD			US$	$ 6,340.00			$ -	0.00%					$ -	0.00%
C	CONTIGENCY			US$	$ 3,000.00			$ -	0.00%					$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL			US$	$ 99,456.04			$ 8,500.28	8.55%					$ 8,500.28	8.55%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edificio Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV23)



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE EBC 1,2,3 LIQUICA

GRUPU KOMUNITARIU

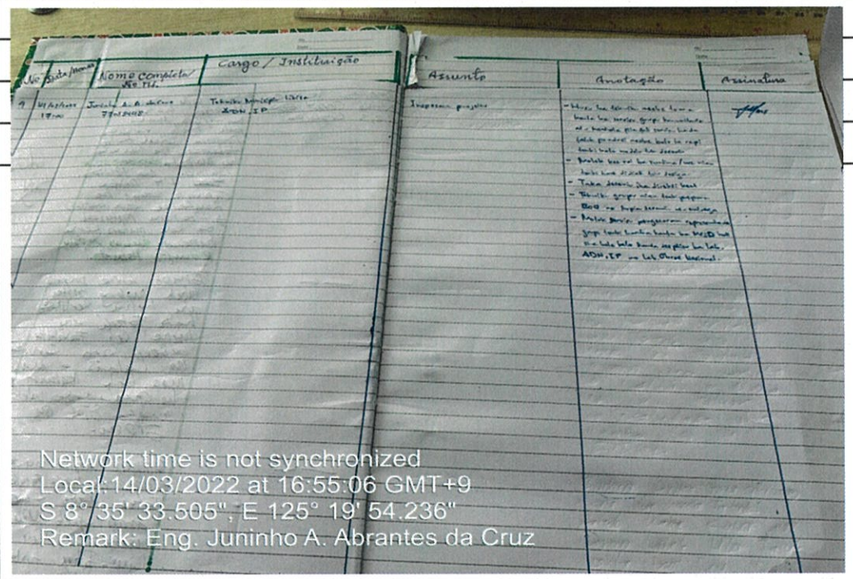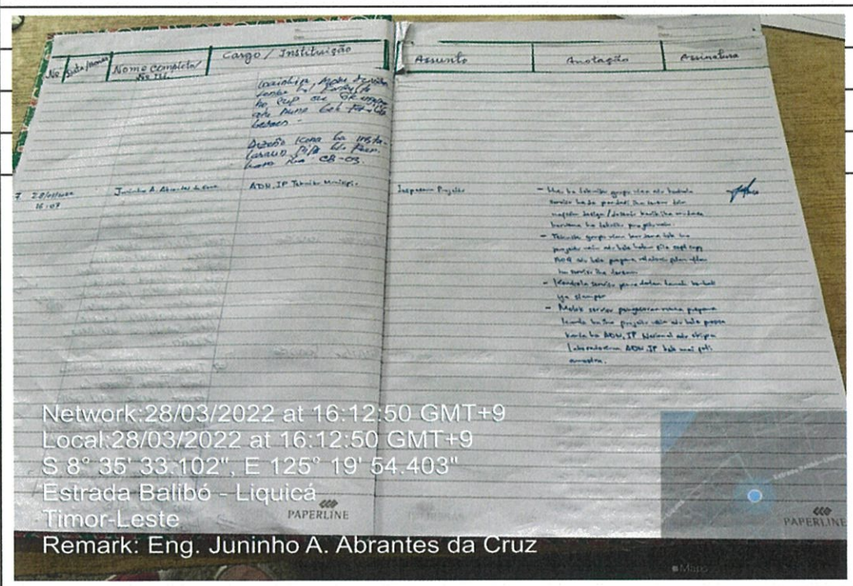No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	14/03/2022	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		
II	28/03/2022	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (LV25)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBF 1,2 Laclolema
Kompania :
No. kontratu :

Data Inspesaun : 09 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Dato – Liquica Vila, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 37' 11. 666''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 18' 55. 306''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu MEJD PKRIE ba Konstrusaun ka Reabilitasaun EBF 1, 2 Laclolema lokaliza iha suku Dato, Liquica Vila munisipiu Likisa, neebe kaer husi servisu grupu komunitariu.	

#ANEXU C1 – (LV25)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBF 1,2 Laclolema
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Wainhira ekipa tekniku ADN, IP halao inspesaun iha terenu, hetan informasaun katak servisu hahuu lao ona kuaze semana ida nia laran, no iha grupu refere konsisti husi Prezidenti Grupu nian, Secretaria no tekniku grupu nian.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu grupu iha terenu ba kee rai ba area klase eskola nian kuaze lao atu hotu ona, no grupu prepara hela atu komesa servisu ba urugan pasir kembali 50mm ba iha pondasi nia okos.	

#ANEXU C1 – (LV25)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Foun MEJD PKRIE EBF 1,2 Laclolema
Kompania :
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA FILIAL LACLOLEMA
FATIN PROJEITO : DATO, LIQUICA
DONO DO PROJEITO : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

# ANEXU C2 - (LV25)						VERIFIED BY A D N , I P									
NO	WORK DESCRIPTION	PAGE NO			AMOUNT USD	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
						FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PRELIMINARIES	PP/3		US$	$ 3,075.00			$ 1,537.50	1.71%					$ 1,537.50	1.71%
II	PROVISIONAL SUM FOR DEMOLITION	DM/3		US$	$ 687.20			$ -	0.00%					$ -	0.00%
III	CLASSROOM BUILDING Cb	C/39	(i)	US$	$ 67,508.34			$ 6,750.83	7.53%					$ 6,750.83	7.53%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORKS	SW/27	(i)	US$	$ 9,040.12			$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			US$	$ 80,310.66			$ 8,288.33	9.25%					$ 8,288.33	9.25%
B	OVERHEAD			US$	$ 6,340.00			$ -	0.00%					$ -	0.00%
C	CONTIGENCY			US$	$ 3,000.00			$ -	0.00%					$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL			US$	$ 89,650.66			$ 8,288.33	9.25%					$ 8,288.33	9.25%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edificio Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV25)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN MEJD PKRIE EBF 1,2 LACLOLEMA

GRUPU KOMUNITARIU

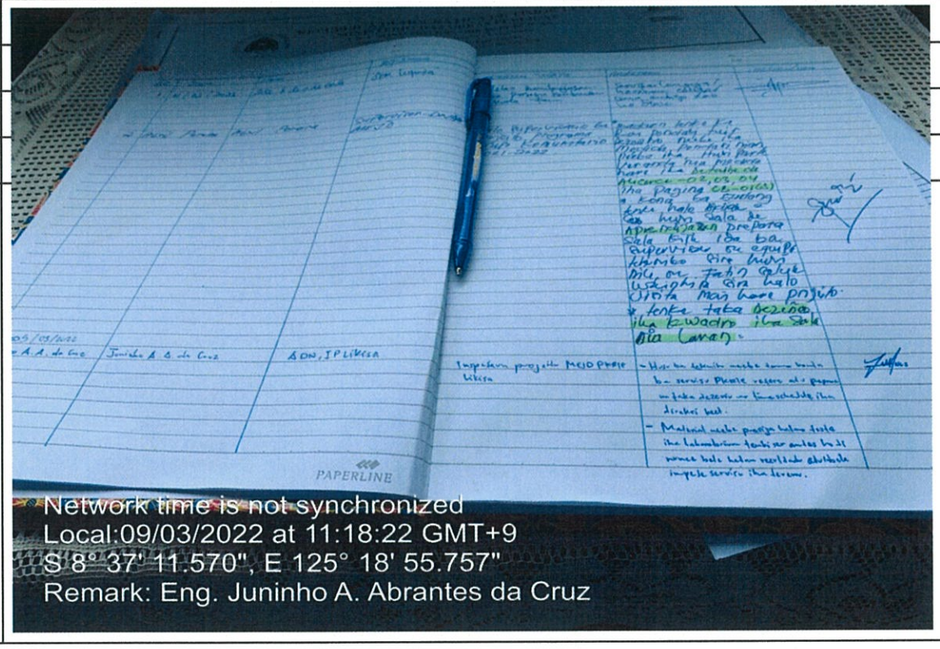No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	9/03/2022	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (MBR5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Novo Konstrusaun Edificio Escola Tecnico Vocational (ESTV) Lissadila**
Kompania : **Aleni Unip. Lda.**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/ADM-LQC/VIII/2019/03**

Data Inspesaun : 24 Marsu 2022

Fatin Inspesaun : Lissadila, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,71070333, Latetude : .....

End Point : Long : 125,2045195, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN, IP Munisipiu Likisa nian halao inspesaun ba projeitu Konstrusaun Foun Edifisiu Escola Tecnico Vocational (ESTV) Lissadila, Maubara, Munisipiu Likisa neebe kaer husi kompania Aleni Unip. Lda. Husi projeitu PDIM 2019 nian.	

#ANEXU C1 – (MBR5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Novo Konstrusaun Edificio Escola Tecnico Vocational (ESTV) Lissadila**
Kompania : **Aleni Unip. Lda.**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/ADM-LQC/VIII/2019/03**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Wainhira tekniku ADN, IP halao inspesaun iha terenu ba projeitu konstrusaun refere laiha ema ruma neebe hein ka servisu iha terenu, no eskola abandona hela, kuaze fulan hira nia laran ekipa ADN, IP tenta liga ba kompania no projeitu nain maibe kompania la hatan no informasaun husi parte projeitu nain mos ladun kompletu.	

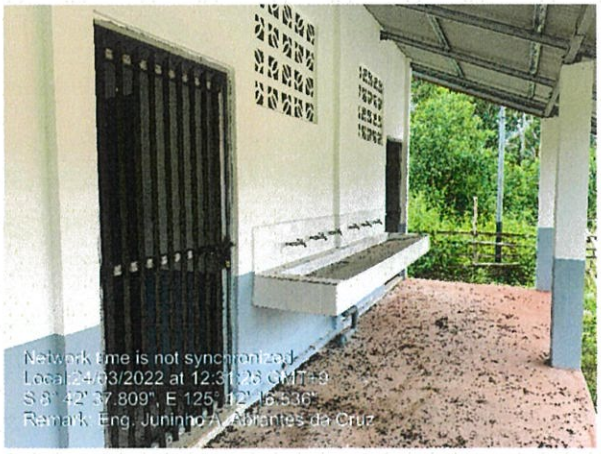Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Progresu servisu ikus nian neebe ADN, IP rekomenda maka nafatin hela iha terenu, no too agora eskola foer nakonu, duut mos moris boot no laiha ema atu hein no hare. Tan nee ADN, IP kordena ona ho projeitu nain atu tau matan no tenta kompania hodi hatan ba servisu hirak neebe sei falta iha terenu.	

#ANEXU C1 – (MBR5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Novo Konstrusaun Edificio Escola Tecnico Vocational (ESTV) Lissadila**
Kompania : **Aleni Unip. Lda.**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/ADM-LQC/VIII/2019/03**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

#ANEXU D - (MBR 5)



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)

Kompanha : Aleni Unip. Lda.

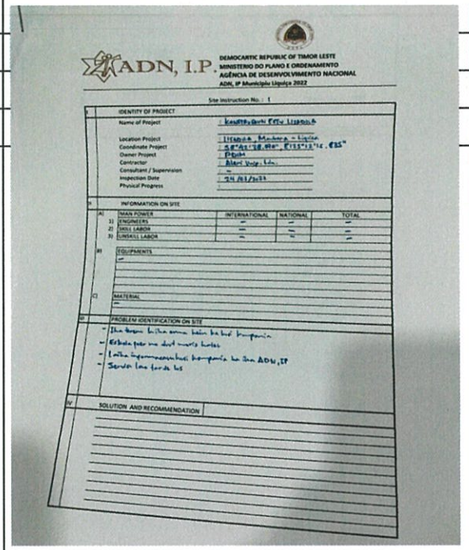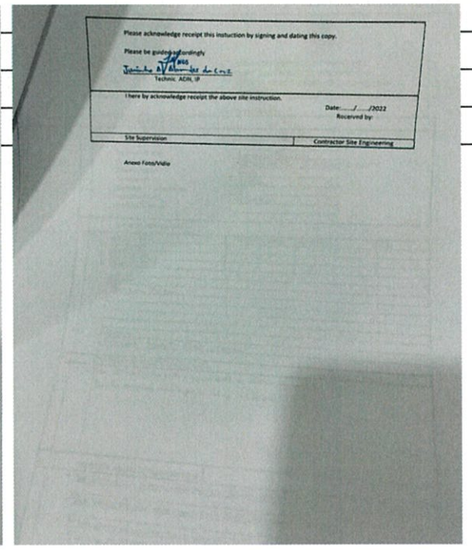No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	24/03/2022	Lisadila, Maubara, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquica	1 2 3 4 5	 	

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VII. GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Juninho António Abrantes da Cruz

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2022

MARCO

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	OBS
Liquica Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	2	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	3	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	4	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Raehi Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)	Luquefi Oan Unip.Lda	MPW-W-210150	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu Chainage 5+000-10+000)	Caiba Unip.Lda	MPW-W-210154	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leorema Chainage 0+000-5+000)	Vicaroman Unip.Lda	MPW-W-210155	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)	Metalika Unipessoal, Lda	MPW-W-210151	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700)	Prudencia Construction Unip.Lda	MPW-W-210153	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	10	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	Banir Lema Unip.Lda		LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan Actual	
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Berlaluidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)	Goubara Unip Lda	MPW-W-210162	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Berlaluidu-Laberlaka Chainage 2+500-5+400)	Claridade Unip Lda			MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba- Lukulai Chainage 0+000-2+000)	Craeleki Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	14	Road Maintenance Section Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (A03)	Chantel Chander Unip.Lda	MPW-W-210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	15				LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	16	Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica	Roman Furak Unip.Lda	NCB:16/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Iha lorcon 2 no 7 fulan nee la ha inspesaun tanba prepara Relatorio no Kalendariu inspesaun finan, lorcon 14 no 21 la ha inspesaun tanba ba hare projeitu PKRIE foun no inspesaun pagamentu.
	17	For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)	Chanel Chander Unip.Lda	MPW-W210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	18	MEJD PKRIE EBF Mauboque	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foun
	19	MEJD PKRIE EBC 1,2,3 Liquica	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foun
	20	MEJD PKRIE EPE Loidahar	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foun
	21	MEJD PKRIE EBF 1,2 Lacloloma	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foun
	22	MEJD PKRIE EBF 1,2 Tolema	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foun
	23	MEJD PKRIE EBF 1,2 Laculai	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foun
Maubara (MBR)	1	Addt. Poste liga Maubara	Fu Unip,Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	2	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	3	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	Alemi Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foin ba inspesaun fali tanba asesu estrada ladiak iha tempu udan.
	4	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	5	R4D Rural Road Maintenance Berlaluidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Numuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500	Luliana Unip.Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200)	Nheu.Unip.Lda	MPW-W-210164	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Numuleta - Darulema Chainage 0+000-2+000) Liquica Municipality	Rito-Pu Unip.Lda	MPW-W-210146	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 4+800-9+600)	Malibo Unip.Lda	MPW-W-210156	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 0+000-4+800)	Murak.Unip.Lda	MPW-W-210157	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	10	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 8+400-12+500)	Mota Loe Crac Bau.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo-Gisu Chainage 0+000-2+000)	Nazico.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	Luliana Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	13	MEJD PKRIE EBF Gariana	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foun
	14	MEJD PKRIE EBF 1,2 Tapo Manubulu	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foun
	15	MEJD PKRIE ESG-Paralelo Maubara	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foun
Bazartete (BZT)	1	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	Banir Lema	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	2	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	PHO
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	4	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan Actual	Paradu
	5	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Paradu
	6	Hamos Tanghi Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	Pagamentu Seidauk 100%
	7	New Water Supply of Bairos FNTL Liquica	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan Actual	Inspesaun pagamentu retensaun 10%
	8	Konstrusaun Armagem Foun Matadouro (Bem Serviso)	Naesalobu	MAP-PI2019:19532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan Actual	Inspesaun pagamentu final 100% no retensaun 10%
	9	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan Actual	Pagamentu Seidauk 100%
	10	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan Actual	PHO
	11	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	Tinocya	022LM/RDTL/MPE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan Actual	PHO
	12	Emergency Project For Tibar River	Sali-Magu Unip.Lda	RT/067/MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000)	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	14	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Fatumasi Chainage 0+000-2+300) Liquica Municipality	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210142	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality	Hatuleo Unip.Lda	MPW-W-210144	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	16	Routine Maintenance Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000-10+000	Craeleki Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	17	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 3+000-6+500) Liquica Municipality	TM.Caileba.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	18	New Construction of Fence Around for Isolation Covid-19 in Liquica Maumeta	Bismali Unip. Lda.	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan Actual	Iha loron 7 no 23 la ha inspesaun tanba iha ADN, IP Nasional asina, prepara no halo foun Relatorio Mensal.
	19	Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica	Zyc Unip. Lda.	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan Actual	Iha loron 7 no 23 la ha inspesaun tanba iha ADN, IP Nasional asina, prepara no halo foun Relatorio Mensal.
	20	Projeitu Konstrusaun Foun ESTV Leorema - Liquica	U-Rema Unip. Lda.	NCB:15/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foin ba halo inspesaun fali tanba asesu estrada ladiak iha tempu udan.
	21	MEJD PKRIE EPE Baura	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foun
	22	MEJD PKRIE EPE Ermeta	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foun
	23	MEJD PKRIE EPE Cassait	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foun
	24	MEJD PKRIE ESG-Paralelo Bogoro	Grupu Komunitariu		LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Foun
TOTAL PROJETO ON-GOING								

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu | Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili | Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu | Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng Juninho António Abrantes da Cruz)
Eng. ba Edifício Publico Agua e Saneamento Municipio Liquica
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng.Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN.I.P

Aprova Husi :

(Eng.Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN.I.P

MINISTÉRIO DO PLANU E ORDENAMENTU

VADN, LP

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. **Juninho António Abrantes da Cruz**

MUNICIPIO LIQUICA NO FOSTOS

2022

MARCO

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompañia	No. Contrato	Kategoria	Donu do Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	OBS
Liquiçá Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section: Tibar - Liquica - Maubara (AH) a & Caimbula - Loco (AH) Municipality Liquica 162	Naruman Mova Diohun Unip. Lda.	MPW-W/190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	2	RAD Rural Road Periodic Maintenance Aibono - Asrununo Chainage 0+000 - 4+360 Reinc Maintenance Date- Liquica - Leishiso Chainage 0+000 - 12+302 Municipality Liquica	Nheu Unip. Lda.	MPW-W-RFQ-190109	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	3	Rural Roads Periodic Gmabo - Lahohi Chainage 0+000 & Metagoe - Aibono Chainage 0+000 - 7+405 Reinc Maintenance Tahobi - Kanbao Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	Grobass Unip. Lda.	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	4	RAD Rural Road Rehabilitation Beladen - Lebokaloko Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Enchi Unip. Lda.	ET/034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	5	RAD Rural Road Spot Improvement Dato-Loidohar Chainage 0+000-12+300)	Lagedi Oen Unip. Lda.	MPW-W-210150	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	6	RAD Rural Road Spot Improvement Aibono-Asrununo Chainage 7+000-10+950)	Csila Unip. Lda.	MPW-W-210154	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	7	RAD Rural Road Spot Improvement Aibono-Asrununo-Lorcassa Chainage 0+000-3+000)	Visaemnau Unip. Lda.	MPW-W-210155	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	8	RAD Rural Road Spot Improvement Metagoa-Aibono Chainage 0+000-7+600)	Metalika Unip. Lda.	MPW-W-210151	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	9	RAD Rural Road Spot Improvement Tahobi - Kanbao Chainage 0+000-1+700)	Prudencia Construction Unip. Lda.	MPW-W-210153	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	10	Manufacturam Kanan Irrigasaun Facilwa - Liquica	Basir Lorsa Unip. Lda		LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																			
							Actual																																			
	11	RAD Rural Road Spot Improvement Berkfuidu-Labobida Chainage 0+000-2+500)	Grobass Unip. Lda.	MPW-W-230102	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	12	RAD Rural Road Spot Improvement Berkfuidu-Labobida Chainage 2+500-5+ 600)	Claridoki Unip. Lda.			MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	13	RAD Rural Road Spot Improvement Gmabo- Lahohi Chainage 0+000-2+000)	Claridoki Berenki Unip. Lda.		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	14	Road Maintenance Section Tibar - Liquica - Maubara - Caimbula - Loco (AH3)	Claridi Chandar Unip. Lda.	MPW-W-210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	15				LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	16	Projetu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica	Rumun Fiesik Unip. Lda	NCB/16/MED/ENA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			Ona-quing
	17	For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Caimbula-Loco (AH3)	Claval Chandar Unip. Lda.	MPW-W-210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	18	MEJD PKRE EDF Mauboque	Grupu Komunitariu		LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			Finu
	19	MEJD PKRE EDC 1,2,3 Liquica	Grupu Komunitariu		LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			Finu
	20	MEJD PKRE EPE Loidohar	Grupu Komunitariu		LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			Finu
	21	MEJD PKRE EDF 1,2 Laclubira	Grupu Komunitariu		LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			Finu
	22	MEJD PKRE EDF 1,2 Tchiana	Grupu Komunitariu		LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			Finu
	23	MEJD PKRE EDF 1,2 Lacolo	Grupu Komunitariu		LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			Finu
Maubara (MBR)	1	Addl. Proto Iqa Maubara	Fu Unip. Lda.		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	2	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Kaimbula Liquica Municipality Liquica	Montana Hak Unip. Lda.	ABE120-NCBPTL-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	3	Konstrusaun ESTV Liadifu Maubara-Liquica (CA + CD)	Alcon Unip. Lda.	CID/160/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			Ona-quing
	4	RSLSIP - Road Link No. AH - 05 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbola Road (Km 49.7 to Km 54.1 and Km.58.1 to Km. 62 (and Alabar - Idois Ais Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CPMU Construction Co. Ltd & Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPW/TC-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	5	RAD Rural Road Maintenance Berkfuidu - Labobida Chainage 0+000 - 5+400 Nomadru - Darolawa Chainage 0+000-1+600 Vaviquana-Maubaubica Chainage 0+000-12+500	Lorlosa Unip. Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	6	RAD Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquana - Maubaubica Chainage 0+000-4+200)	Nheu Unip. Lda.	MPW-W-210164	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	7	RAD Rural Road Spot Improvement Nomadru - Darolawa Chainage 0+000-2+000) Liquica Municipality	Rita-Pu Unip. Lda.	MPW-W-210146	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	8	RAD Rural Road Spot Improvement Malaiseru-Lisodila Chainage 4+800-9+600)	Maibo Unip. Lda.	MPW-W-210156	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	9	RAD Rural Road Spot Improvement Malaiseru-Lisodila Chainage 0+000-4+800)	Mundi Unip. Lda.	MPW-W-210157	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	10	RAD Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquana - Maubaubica Chainage 8+400-12+500)	Metin Lor Cruz Bar Unip. Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	11	RAD Rural Road Spot Improvement Sunaspo-Gim Chainage 0+000-2+000)	Nacitro Unip. Lda.		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	12	RAD Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquana - Maubaubica Chainage 0+200-8+400)	Lorlosa Unip. Lda.		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	13	MEJD PKRE EDF Gariana	Grupu Komunitariu		LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			Finu
	14	MEJD PKRE EDF 1,2 Tapo Maububu	Grupu Komunitariu		LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			Finu
	15	MEJD PKRE ESG Fatuliki Maubara	Grupu Komunitariu		LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			Finu
Bazartete (BZT)	1	Rural Road Rehabilitation Metagoa Bazartete 0+003 - 3+000 & Fatuliki Maintenance Maumeta - Metagoa Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	Basir Lansa Unip. Lda	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	2	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquica (CA + CD)	Vida Didi Unip. Lda.	CID/089/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			PIRO
	3	RAD Rural Road Periodic Maintenance Libobo - Fahibho Chainage 0+000 - 7+000 & Fahibho - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahibho Bazartete Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lop Lasu Ekim Unip. Lda	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	4	Konstrusaun Moradia Foun Malaiseru Tibar	Manolos Unip. Lda.	RFTL-MAP-PO2019/1972/I	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																			
							Actual																																			Paradu
	5	Konstrusaun Foun ERF Hotugau Bazartete, Liquica (162)	Mihiba Unip. Lda.	(RFQ/39/020-Q/R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			Paradu
	6	Hamoi Tangla Estrutura Tratamentu Agua Rezultuan Etu Tibar - 162	Cabeza Unip. Lda.	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			Pagamentu Seidauk 100%
	7	New Waste Supply of Bairro PNTL Liquica	Holidi Unip. Lda.	ISB/004/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan																																			
							Actual																																			PIRO
	8	Konstrusaun Armagen Foun Matebuan (Iman Servisu)	Nasralaba Unip. Lda.	MAP-PO2019.19332	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																			
							Actual																																			Pagamentu Seidauk 100%
	9	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministry of Health, Timor Leste	Qeoran SQ Unip. Lda	MS-DDA-RHL-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																			
							Actual																																			Pagamentu Seidauk 100%
	10	New construction of isolation for covid 19 en eki kpitca, Timor Leste	Simiru Unip. Lda.	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																			
							Actual																																			PIRO
	11	Konklusaun Bc Mvo Iso Sistema Geotreiam Ba Aquila-Liquica	022/LM/RFTL/MPE-AND/EG-EFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	Tatsuya Unip. Lda.	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																			
							Actual																																			PIRO
	12	Emergency Project For Tibar River	Soli-Magu Unip. Lda.	RT-003/MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	13	RAD Rural Road Spot Improvement Fahibho-Bazamera Chainage 0+000-3+000)	Hatamata Ona Unip. Lda.	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	14	RAD Rural Road Spot Improvement Fahibho-Fatumasi Chainage 0+000-2+300) Liquica Municipality	Hotorcris Ona Unip. Lda.	MPW-W-210162	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	15	RAD Rural Road Spot Improvement Libobo- Fahibho Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality	Hotolos Unip. Lda	MPW-W-210164	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	16	Rotina Manitenasaun Maumeta-Metagoa-Bazartete, Chainage 0+000-10+000	Claridoki Berenki Unip. Lda.		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	17	RAD Rural Road Spot Improvement Fahibho-Bazamera Chainage 3+000-4+500) Liquica Municipality	TM Colabu Unip. Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			
							Actual																																			
	18	New Construction of Fence Around for Isolation Covid-19 en Liquica Maumeta	Bisatuli Unip. Lda.	RFTL-MS-C19-ENA-OC-21-233	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																			
							Actual																																			Finu
	19	Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica	Zyc Unip. Lda.	RFTL-MS-C19-ENA-OC-21-228	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																			
							Actual																																			Finu
	20	Projeto Konstrusaun Foun EETV Lourosa - Liquica	Ualimau Unip. Lda.	NCB/15/MEJD/ENA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																			
							Actual																																			Finu

| | | |
