REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

A.D.N. I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN PROJETUS
MUNISÍPIU AINARO

MAIU 2023



Elabora Hosi Eng. Munisípiu

SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTASAUN PROJETU INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO AINARO

MAIO 2023

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro ADN, I.P

(Eng. Romulo J. Marques Henrique)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro ADN, I.P

(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro ADN, I.P

(Eng. Jaulino H. Rodrigues)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro ADN, I.P

(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, ADN, I.P

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, ADN, I.P

(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T, M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO 1
INDICE 2
I. INTRODUSAUN 3
1.1 Enkuadramentu Legal 3
1.2 Perfil Municipio Ainaro 3
1.3. Lista Projectos 6
II. PROGRESU FISIKU 14
2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan 14
III. OBSTÁCLO IHA TERENU 14
3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu 14
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU 15
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu 15

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias 4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro 4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro 5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamentos 6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores 8
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio 11
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro 13

I. INTRODUSAUN

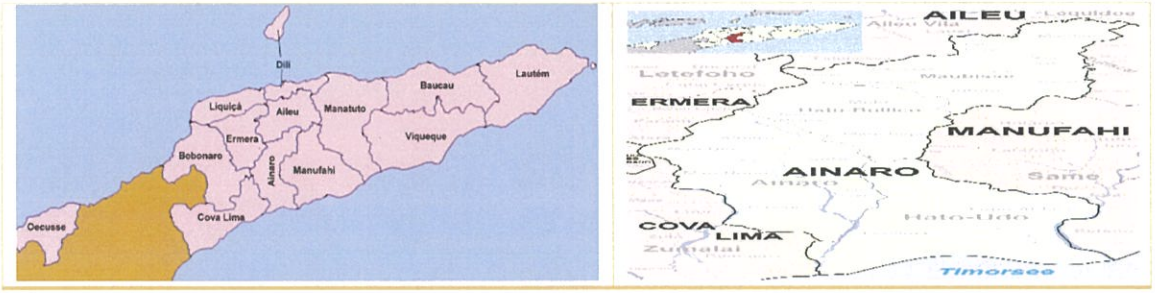
1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional,I.P ou ADN,I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Púbico (IP), ho Misaun ADN,I.P nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análize kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viavél.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Púbico (IP), ADN,I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimentu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvimentu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno caso presiza.

1.2 Perfil Municipio Ainaro



Administrasaun Munisipal Ainaro lokalizadu iha sudoeste paíz no mapa 2. hatudu pozisaun jeográfiku Munisipiu Ainaro ne'ebé ho luan 797 km² ho populasaun nain 59,175 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Ainaro iha Postu Administraativo ha'at, Sukus 21 no Aldeias 131 hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1: Ponto Administrativo, Sukus no Total Aldeias/Sukus

Ainaro		Hatu Builico		Hatu Udo		Maubisse	
Sukus	**Aldeias**	**suku**	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**
Ainaro	7	Mauchiga	7	Foho-Ailico (beikala)	6	Aituto	9
Cassa	5	Mulo	8	Leolima	10	Edi	6
Manutaci	4	Nuno Moge	6	-	-	Fatubessi	6
Mau-Nuno	3	-	-	-	-	Horai-Quic	4
Mau-Ulo	5	-	-	-	-	Liurai	4
Soro	4	-	-	-	2	Manelobas	4
Suro-Craic	4	-	-	-	4	Manetu	7
-	-	-	-	-	-	Maubisse	12
-	-	-	-	-	-	Maulau	10
Total	**32**	**-**	**21**	**-**	**22**	**-**	**62**

Data husi : Livro 3B OJE 2021, Pajina 22

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro							
No	**Deskrisaun**	**Total Membros Kada Tinan**					
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**	**OBS**
1	Engineiro			**4**			**4**	
2	Administrasaun no Financas			**0**			**0**	
3	Motorista			**1**			**1**	
4	Seguransa			**0**			**0**	
	Grand Total			**5**			**5**	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro

ASET ADN,IP MUNICIPIO AINARO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio			1			**1**	Moru hadia, monta tralis
2	Kareta			1			**1**	Kondisaun ladun diák
3	Desktop HP / Monitor			1			**1**	Diak
4	Laptop HP			1			**1**	Todan presija update
5	Printer Cannon			1			**1**	Diak
6	UPS			1			**1**	Aat
7	Armario File			2			**2**	Diak
8	Armario Tau hena			2			**2**	Aat 1
9	Meja escritorio			1			**1**	Diak
10	Meja han			1			**1**	Aat
11	Meja TV (kiik)			1			**1**	Diak
12	Kadeira escritorio			6			**6**	Diak
13	Kadeira han			4			**4**	Att 2
14	Sofa			1 Set			**1**	Diak
15	Springbed +sumasu 4			2 Set			**2**	Diak (sumasu laiha)
16	Jeleira			1			**1**	Diak
17	Water Dispenser			1			**1**	Aat
18	TV + Parabola			1 Set			**1**	Aat
19	Kipas Angin			5			**5**	Aat
20	Kompor			1			**1**	Diak
21	Kompor Gas			1			**1**	Aat
22	Rack sepatu			3			**3**	Aat
23	Rack Piring			1			**1**	Diak
24	Water Pump Sanyo			1			**1**	Aat

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dadus projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + PDIM + LM - BS + LM - TP		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	23	$ 19,379,919.21	59.24%
2	Hatubuilico	12	$ 7,047,176.63	77.99%
3	Hatudo	11	$ 2,758,198.43	20.92%
4	Maubisse	22	$ 6,718,710.92	63.38%
	Grand Total	**68**	**$ 35,904,005.19**	**60.75%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	10	$ 16,968,195.22	61.98%
2	Hatubuilico	2	$ 5,417,567.63	87.48%
3	Hatudo	5	$ 1,770,459.15	13.94%
4	Maubisse	9	$ 5,130,827.23	73.68%
	Grand Total	**26**	**$ 29,287,049.23**	**65.84%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	6	$ 1,553,030.16	27.77%
2	Hatubuilico	7	$ 1,379,650.79	44.93%
3	Hatudo	2	$ 686,368.28	20.86%
4	Maubisse	3	$ 433,853.68	16.23%
	Grand Total	**18**	**$ 4,052,902.91**	**31.21%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	3	$ 450,461.58	63.74%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	$ 84,160.28	87.69%
	Grand Total	**4**	**$ 534,621.86**	**67.51%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo	1	$ 24,446.00	90.00%
4	Maubisse			
	Grand Total	**1**	**$ 24,446.00**	**90.00%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	4	$ 408,232.25	60.41%
2	Hatubuilico	3	$ 249,958.21	54.74%
3	Hatudo	3	$ 276,925.00	59.59%
4	Maubisse	8	$ 1,045,876.54	29.83%
	Grand Total	**18**	**$ 1,980,992.00**	**43.44%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Emergency		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	$ 23,993.19	90.00%
	Grand Total	**1**	**$ 23,993.19**	**90.00%**

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO AINARO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	2	$ 723,536.37	17.29%
2	Edukasaun	19	$ 2,987,137.89	33.89%
3	Eléctricidade	10	$ 7,999,431.74	73.14%
4	Estradas E Pontes	14	$ 16,390,876.84	56.06%
5	Flood Control	2	$ 108,153.47	88.20%
6	Imprestimo	1	$ 4,187,508.61	92.29%
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	14	$ 2,500,306.12	57.78%
8	Pontes	1	$ 273,148.15	12.71%
9	Saude	2	$ 242,372.02	43.02%
10	Turismo	3	$ 491,533.98	18.66%
	Grand Total	**68**	**$ 35,904,005.19**	**60.75%**

NO	SECTOR PROJECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	2	$ 723,536.37	17.29%
2	Edukasaun	5	$ 1,427,800.29	24.04%
3	Eléctricidade	3	$ 2,130,985.59	80.80%
4	Estradas E Pontes	6	$ 13,670,136.67	63.64%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	$ 815,683.40	44.91%
8	Pontes	1	$ 273,148.15	12.71%
9	Saude	2	$ 242,372.02	43.02%
10	Turismo	1	$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	**23**	**$ 19,379,919.21**	**59.24%**

NO	SECTOR PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	3	$ 249,958.21	54.74%
3	Eléctricidade	1	$ 1,230,059.02	71.11%
4	Estradas E Pontes	2	$ 854,631.59	25.74%
5	Flood Control			
6	Imprestimo	1	$ 4,187,508.61	92.29%
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	4	$ 444,741.95	88.70%
8	Pontes			
9	Saude			
10	Turismo	1	$ 80,277.25	6.83%
	Grand Total	**12**	**$ 7,047,176.63**	**77.99%**

NO	SECTOR PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	4	$ 578,502.86	38.08%
3	Eléctricidade	1	$ 384,790.42	22.85%
4	Estradas E Pontes	4	$ 1,482,565.12	13.98%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	2	$ 312,340.03	19.72%
8	Pontes			
9	Saude			
10	Turismo			
	Grand Total	**11**	**$ 2,758,198.43**	**20.92%**

NO	SECTOR PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	7	$ 730,876.53	42.69%
3	Eléctricidade	5	$ 4,253,596.71	74.44%
4	Estradas E Pontes	2	$ 383,543.46	16.18%
5	Flood Control	2	$ 108,153.47	88.20%
6	Imprestimo			
7	Manutensaun No Rehabilitasaun	5	$ 927,540.74	67.09%
8	Pontes			
9	Saude			
10	Turismo	1	$ 315,000.01	
	Grand Total	**22**	**$ 6,718,710.92**	**63.38%**

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	1	$ 84,160.28	87.69%
2	Ministerio Das Obras Publicas	39	$ 30,861,164.82	65.30%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	20	$ 3,011,583.89	34.34%
4	Ministerio Saude	2	$ 242,372.02	43.02%
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	$ 546,598.02	22.89%
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria	1	$ 80,277.25	6.83%
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	2	$ 666,592.18	34.39%
8	Sefope	2	$ 411,256.73	20.97%
	Grand Total	**68**	**$ 35,904,005.19**	**60.75%**

NO	DONO DO PROJECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal			
2	Ministerio Das Obras Publicas	12	$ 16,400,299.98	64.59%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	$ 1,427,800.29	24.04%
4	Ministerio Saude	2	$ 242,372.02	43.02%
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	$ 546,598.02	22.89%
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	2	$ 666,592.18	34.39%
8	Sefope	1	$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	**23**	**$ 19,379,919.21**	**59.24%**

NO	DONO DO PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal			
2	Ministerio Das Obras Publicas	8	$ 6,716,941.17	79.71%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	3	$ 249,958.21	54.74%
4	Ministerio Saude			
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria	1	$ 80,277.25	6.83%
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope			
	Grand Total	**12**	**$ 7,047,176.63**	**77.99%**

NO	DONO DO PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal			
2	Ministerio Das Obras Publicas	6	$ 2,155,249.57	15.53%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	$ 602,948.86	40.18%
4	Ministerio Saude			
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope			
	Grand Total	**11**	**$ 2,758,198.43**	**20.92%**

NO	DONO DO PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	1	$ 84,160.28	87.69%
2	Ministerio Das Obras Publicas	13	$ 5,588,674.10	69.29%
3	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	7	$ 730,876.53	42.69%
4	Ministerio Saude			
5	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
6	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
7	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
8	Sefope	1	$ 315,000.01	0.00%
	Grand Total	**22**	**$ 6,718,710.92**	**63.38%**

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Poduktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Ainaro	16,823	7170	6636	5567	5058
Hato-Udo	10,747	3130	2923	2415	2279
Hato-Builico	13,249	3457	3365	3241	3186
Maubisse	24,672	6378	6309	6222	5764

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu neébe hetan husi progresu fulan ida neé, ikus liu porsentagen actual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detallu bele hareé iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hareé #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu

Obstaclo neébe ami enjineiru hasoru iha terenu mak hanesan tuir mai ne'e :

1. Kompanhia nia tekniku laiha terenu
2. Kompanhia neébe ka'er obra iha Municipio Ainaro iha hotu Dili
3. Teknik husi Projetu nain ladun halo inspesaun ba iha terenu
4. Kondisaun kareta ne'ebe Suporta Ekipa ADN, I.P iha tereno ho kondisaun ne'ebe sei aat

- Obstaclo parte Eletricidade

1. Durante Eng ADN, I.P halo monitorin directur kompahnia nunka iha fatin projeto e delega ema balun mak sempre hein iha fatin projeto.
2. Kompahnia balun mak to agora sedauk hadia konstruk Linha MV & LV nebe mak avaria.
3. Iha kompahnia seluk hein hela karta termo de entrega 10% husi EDTL – EP municipio ate agora sedauk fo ba kompahnia.
4. Seksaun M & E - ADN, I.P sempre hasoru mak kona ba motorist.
5. Seksaun M & E – ADN, I.P labele kontrola masimu projeto electricidade ho edifisio public tamba Eng M & E – ADN, I.P ida kontrola municipio ha'at (4).

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Buka solusaun ba projetu ne'ebe parado
2. Sistema Internet iha Municipio lalao ho diak ho difikulta enjineiru nia servisu
3. Kondisaun Rezidesia Oficial ADN, I.P Municipio Ainaro ne'ebe presija atu hadia:
    - Be'e
    - Moru
    - Tralis Jenela

➢ Recomendação parte Eletricidade

1. Seksaun M & E husu parte rekursu Humanu atu aumenta tan funsionario M & E.
2. Seksaun M & E – ADN, I.P husu ba ITC tenki kria folder sistem keta ida mai iha seksaun M & E – ADN, I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Ainaro

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro						
No	**Deskrisaun**	**Identidade**				
		Naran Kompletu	**Nu. ID Card**	**Pozisaun**	**Fotografia**	**Asinatura**
1	Engineiro	Romulo J. M. Henrique	174	Enjineiru ITI		
		Joaquim de C. Madeira	167	Enjineiru EPAS		
		Claudino Soares Dos Santos	243	Enjineiru EPAS		
		Jaulino H. Rdrigues	237	Enjineiru ITI		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		

2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Lucas Alberto Soares Pereira	195	Motorista		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MAIO)

					Lokalizasaun Projetu											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	78.52%	$ 355,512.32	$ 97,263.04	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	87.87%	$ 334,820.71	$ 46,223.20	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	88.36%	79.52%	$ 1,031,531.81	$ 265,634.51	ON-GOING	
4	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Consorcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	88.00%	$ 110,219.55	$ 15,029.94	PHO	Projetu 100% iha tinan 2016 maibe to agora companhia sedauk husu pagamento retensaun 10%
5	Emergency Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	91.02%	81.92%	$ 3,543,740.61	$ 782,035.89	ON-GOING	
6	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	$ 3,717,215.92	July 1, 2013	93.22%	71.00%	$ 2,639,364.12	$ 1,077,851.80	PHO	
7	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipesoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	49.52%	43.43%	$ 2,162,279.76	$ 2,816,071.23	ON-GOING	
8	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	91.76%	80.75%	$ 147,667.55	$ 35,197.14	ON-GOING	Hela 10%
9	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	$ 489,653.83	April 10, 2019	54.62%	46.82%	$ 229,243.50	$ 260,410.33	ON-GOING	
10	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	84.00%	$ 27,553.61	$ 5,248.26	ON-GOING	
11	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	$ 208,089.56	July 29, 2019	97.82%	87.86%	$ 182,832.44	$ 0.70	PHO	100% falta retensaun 10%
12	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	94.77%	85.29%	$ 25,075.68	$ 4,325.46	PHO	Projetu refere 100% ona tuir volume nebe iha tereno, falta retensaun 10%
13	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	89.59%	$ 86,232.55	$ 10,024.17	PHO	Projetu ferere ramata ona, husu atu hare fila fali dadus pagamento nebe iha.
14	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Lau Sta. 0+000 - 1+200 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	$ 33,889.94	June 18, 2021	48.12%	43.31%	$ 14,678.12	$ 19,211.82	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
15	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	12.71%	$ 34,707.48	$ 238,440.67	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2016
16	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	37.19%	$ 79,200.00	$ 133,770.88	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2015
17	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	$ 600,016.84	July 25, 2016	66.84%	31.84%	$ 191,070.62	$ 408,946.22	PENDENTE	Projeto refere parado 2017
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	78.11%	58.21%	$ 57,367.38	$ 41,187.36	ON-GOING	
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	53.90%	43.66%	$ 45,015.75	$ 58,091.29	ON-GOING	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MAIO)

					Lokalizasaun Projetu											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	74.99%	52.56%	$ 57,981.37	$ 52,332.38	ON-GOING	
21	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	32.64%	22.89%	$ 125,100.22	$ 421,497.80	ON-GOING	
22	New Construction of ESCOLA CAFE building in Ainaro Municipality	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	Ainaro-Vila	Ainaro	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB/133/MEJD-2021	$ 907,735.20	June 1, 2022	4.67%	0.00%	$ -	$ 907,735.20	ON-GOING	
23	New Construction of Entry Gate no Jardim de herois de Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	BETUA CALDA UNIPESSOAL LDA	38/MACLN/X/2021	$ 176,938.35	Jan. 1, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ 176,938.35	ON-GOING	
24	Road Maintenance Project - Zumalai (Covalima) to Jct Cassa Ainaro and Hatu-Udo Sta 0+100 - 12+810	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Expres Distribution Services Unip. Lda	MPW-W-230007	$ 195,631.33	Jan. 11, 2023	65.29%	0.00%	$ -	$ 195,631.33	ON-GOING	
25	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no contratu	$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	90.00%	$ 22,001.40	$ 2,444.60	PHO	
26	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELÉCTRICIDADE	Hatudo	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	$ 384,790.42	Jull,26,2021	32.23%	22.85%	$ 87,913.49	$ 296,876.93	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
27	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	13.75%	$ 39,581.06	$ 248,312.97	PENDENTE	Projeto refere parado 2019
28	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	55.37%	55.37%	$ 54,188.25	$ 43,684.55	ON-GOING	
29	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	78.77%	79.86%	$ 54,587.17	$ 13,769.64	ON-GOING	
30	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	53.99%	50.81%	$ 56,249.32	$ 54,446.07	ON-GOING	
31	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	50.00%	18.32%	$ 55,243.87	$ 246,333.99	ON-GOING	
32	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	$ 411,500.10	08-Mar-22	12.70%	0.00%	$ -	$ 411,500.10	ON-GOING	
33	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	$ 448,953.98	08-Mar-22	29.20%	0.00%	$ -	$ 448,953.98	ON-GOING	
34	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	$ 295,599.61	08-Mar-22	25.83%	20.41%	$ 60,344.67	$ 235,254.94	ON-GOING	
35	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	$ 326,511.43	08-Mar-22	92.16%	44.98%	$ 146,860.44	$ 179,650.99	ON-GOING	
36	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	97.43%	96.68%	$ 156,198.58	$ 5,355.61	ON-GOING	
37	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	79.19%	$ 21,935.23	$ 5,765.84	ON-GOING	Projetu refere ramata ona husu atu hare fila fali dadus pagamento
38	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	92.66%	83.39%	$ 162,743.65	$ 32,407.05	ON-GOING	
39	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	98.74%	88.87%	$ 53,620.66	$ 6,715.33	PHO	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MAIO)

					Lokalizasaun Projetu												
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
40	Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	$ 76,554.69	June 18, 2021	77.79%	70.01%	$ 53,593.69	$ 22,961.00	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
41	Construction Supervision of Road Rehabilitatiom works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	92.29%	$ 3,864,572.08	$ 322,936.53	ON-GOING	
42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Hatubuilico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	79.02%	71.11%	$ 874,731.27	$ 355,327.75	ON-GOING	
43	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	43.26%	45.16%	$ 30,622.04	$ 37,179.22	ON-GOING	
44	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	85.10%	81.08%	$ 81,604.85	$ 19,044.66	ON-GOING	
45	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	54.31%	30.17%	$ 24,589.74	$ 56,917.70	ON-GOING	
46	Rural Road Rehabilitation Hatubuilico - Santuario Nain Feto Ramelau Chainage 0+000 - 2+450 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	Ainaro	Leotilya, Unipessoal Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD22001	$ 778,076.90	July 15, 2022	24.92%	21.38%	$ 166,356.71	$ 611,720.19	ON-GOING	
47	Fornesimento Konstrusaun Uma Laku Ramelau	MINISTERIO TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA	LM-CD	TURISMO	Hatubuilico	Ainaro	DELONG UNIPESSOAL LDA	RFP	$ 80,277.25	Aug. 1, 2022	7.59%	6.83%	$ 5,481.12	$ 74,796.13	ON-GOING	
48	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	100.00%	74.87%	$ 176,861.91	$ 59,362.99	ON-GOING	
49	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	80.64%	70.87%	$ 144,085.67	$ 59,212.83	ON-GOING	
50	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	83.32%	$ 475,776.61	$ 95,267.77	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no presija hadia fali nia konstrusaun
51	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	77.57%	69.81%	$ 458,718.70	$ 198,379.10	ON-GOING	
52	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	90.00%	$ 896,415.58	$ 99,601.73	PHO	Hein 10 % retensaun EDTL Munisipiu maka seidauk entrega
53	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	43.84%	$ 452,656.17	$ 579,755.90	ON-GOING	
54	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	88.54%	$ 882,792.12	$ 114,233.03	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no sei hein kompanha atu submete dokumentus

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MAIO)

					Lokalizasaun Projetu												
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
55	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	87.04%	$ 73,728.12	$ 10,978.14	ON-GOING	Projetu refere ramata ona iha 2019 husu atu hare fila fali dadus pagamento
56	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	$ 84,160.28	July 29, 2019	97.43%	87.69%	$ 73,802.68	$ 10,357.60	ON-GOING	Projetu refere companhia sei hatama pagamento adicional
57	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	$ 34,371.15	June 18, 2021	90.58%	81.52%	$ 28,020.65	$ 6,350.50	ON-GOING	
58	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	70.57%	62.10%	$ 219,207.07	$ 133,793.79	PHO	
59	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	16.64%	$ 8,373.26	$ 41,936.96	ON-GOING	
60	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	28.49%	28.16%	$ 27,909.50	$ 71,184.64	ON-GOING	
61	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	84.08%	84.08%	$ 77,948.39	$ 14,758.21	ON-GOING	
62	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	77.34%	48.05%	$ 41,552.83	$ 44,918.67	ON-GOING	
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	61.76%	72.62%	$ 71,050.84	$ 26,790.45	ON-GOING	
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	26.34%	26.34%	$ 39,491.20	$ 110,425.00	ON-GOING	
65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	49.19%	26.27%	$ 24,940.70	$ 70,010.96	ON-GOING	
66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	38.31%	26.51%	$ 29,133.62	$ 80,761.52	ON-GOING	
67	Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	AILESU UNIPESSOAL LDA	RFQ-CD-MOP-22006	$ 23,993.19	28-Jun-22	100.00%	90.00%	$ 21,593.87	$ 2,399.32	PHO	
68	Rural Road Maintenance and Rehabilitation of Maubise - Urlepha (Access to Edi Manelobas) Chainage 0+000 - 3+000 and Urlepha-Rita Chainage 0+000 - 2+150	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainaro	Balada	RT/004/MOP-2021	$ 349,172.31	May 30, 2022	22.32%	9.74%	$ 34,024.37	$ 315,147.94	ON-GOING	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MAIO)

					Lokalizasaun Projetu											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
69	New Construction of Turismo comunitario Flexa-Maubisse Ainaro Municipalitty	Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu	LM-TP	TURISMO	Maubisse	Ainaro	Formandus Centro CNEFP - Tibar	DNFP/DGFPE/SEFOPE/2002	$ 315,000.01	Feb. 27, 2023	0.00%	0.00%	$ -	$ 315,000.01	ON-GOING	
TOTAL									**$ 36,099,636.52**			**60.33%**	**$ 21,778,273.93**	**$ 13,631,933.85**		

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino Soares Dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Prepara Husi :

(Eng. Romulo J. Marques Henrique)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Mauvino H. Rodrigues)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Silvino D.R.R Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	May-23 Previous Progress (%)	May-23 This Month Progress (%)	May-23 Comulative Progress (%)
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-1	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	0.00%	87.24%
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-2	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	0.00%	97.63%
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-3	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	88.36%	0.00%	88.36%
4	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-4	Ainaro	Consorcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
5	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-5	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	91.02%	0.00%	91.02%
6	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-6	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	$ 3,717,215.92	July 1, 2013	93.22%	0.00%	93.22%
7	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-7	Ainaro	WTJ Contraction Unipesoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	49.52%	0.00%	49.52%
8	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-8	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	91.76%	0.00%	91.76%
9	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-9	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	$ 489,653.83	April 10, 2019	54.62%	0.00%	54.62%
10	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-10	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	0.00%	93.39%
11	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	ANV-11	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	$ 208,089.56	July 29, 2019	97.82%	0.00%	97.82%
12	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	ANV-12	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	94.77%	0.00%	94.77%
13	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	ANV-13	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
14	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-14	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	$ 33,889.94	June 18, 2021	48.12%	0.00%	48.12%
15	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	ANV-15	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	0.00%	64.84%
16	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	ANV-16	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	0.00%	41.32%

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	May-23 Previous Progress (%)	May-23 This Month Progress (%)	May-23 Comulative Progress (%)
17	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-17	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	$ 600,016.84	July 25, 2016	66.84%	0.00%	66.84%
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	ANV-18	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	74.13%	3.98%	78.11%
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	ANV-19	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	50.53%	3.38%	53.90%
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	ANV-20	Ainaro	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	71.41%	3.58%	74.99%
21	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	ANV-21	Ainaro	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	27.95%	4.69%	32.64%
22	New Construction of ESCOLA CAFE building in Ainaro Municipality	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	FI	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	Ainaro-Vila	ANV-22	Ainaro	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB/133/MEJD-2021	$ 907,735.20	June 1, 2022		4.67%	4.67%
23	New Construction of Entry Gate no Jardim de herois de Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	ANV-23	Ainaro	BETUA CALDA UNIPESSOAL LDA	38/MACLN/X/2021	$ 176,938.35	Jan. 1, 2021		0.00%	0.00%
24	Road Maintenance Project - Zumalai (Covalima) to Jct Cassa Ainaro and Hatu-Udo Sta 0+100 - 12+810	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	ANV-24	Ainaro	Expres Distribution Services Unip. Lda	MPW-W-230007	$ 195,631.33	Jan. 11, 2023		65.29%	65.29%
25	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-1	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no contratu	$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
26	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	HA-2	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	$ 384,790.42	Jull,26,2021	32.23%	0.00%	32.23%
27	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-3	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	0.00%	15.00%
28	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-4	Ainaro	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	55.37%	0.00%	55.37%
29	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-5	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	78.77%	0.00%	78.77%
30	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-6	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	47.75%	6.24%	53.99%
31	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	HA-7	Ainaro	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	31.78%	18.22%	50.00%
32	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-8	Ainaro	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	$ 411,500.10	08-Mar-22	12.70%	0.00%	12.70%

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	May-23 Previous Progress (%)	May-23 This Month Progress (%)	May-23 Comulative Progress (%)
33	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-9	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	$ 448,953.98	08-Mar-22	29.20%	0.00%	29.20%
34	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-10	Ainaro	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	$ 295,599.61	08-Mar-22	25.83%	0.00%	25.83%
35	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-11	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	$ 326,511.43	08-Mar-22	92.16%	0.00%	92.16%
36	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-1	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	97.43%	0.00%	97.43%
37	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-2	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
38	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-3	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	92.66%	0.00%	92.66%
39	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-4	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	94.96%	3.78%	98.74%
40	Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	HTB-5	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	$ 76,554.69	June 18, 2021	77.79%	0.00%	77.79%
41	Construction Supervision of Road Rehabilitatiom works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	HTB-6	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	0.00%	92.29%
42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2-Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	HTB-7	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	79.02%	0.00%	79.02%
43	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-8	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	40.95%	2.31%	43.26%
44	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-9	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	85.10%	0.00%	85.10%
45	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-10	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	54.31%	0.00%	54.31%
46	Rural Road Rehabilitation Hatubuilico - Santuario Nain Feto Ramelau Chainage 0+000 - 2+450 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	HTB-11	Ainaro	Leotilya, Unipessoal Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD22001	$ 778,076.90	July 15, 2022	24.92%	0.00%	24.92%
47	Fornesimento Konstrusaun Uma Laku Ramelau	MINISTERIO TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA	LM-CD	TURISMO	Hatubuilico	HTB-12	Ainaro	DELONG UNIPESSOAL LDA	RFP	$ 80,277.25	Aug. 1, 2022	7.59%	0.00%	7.59%
48	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-1	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	100.00%	0.00%	100.00%

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	May-23		
												Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
49	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-2	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	80.64%	0.00%	80.64%
50	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-3	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	0.00%	93.00%
51	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-4	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	77.57%	0.00%	77.57%
52	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-5	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
53	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-6	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	0.00%	48.72%
54	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-7	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	0.00%	98.38%
55	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-8	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
56	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-9	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	$ 98,821.63	July 29, 2019	97.43%	0.00%	97.43%
57	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	MBS-10	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	$ 34,371.15	June 18, 2021	90.58%	0.00%	90.58%
58	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-11	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	70.57%	0.00%	70.57%
59	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-12	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	0.00%	40.00%
60	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-13	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	28.49%	0.00%	28.49%
61	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-14	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	84.08%	0.00%	84.08%
62	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-15	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	77.34%	0.00%	77.34%
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-16	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	61.76%	0.00%	61.76%
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-17	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	26.34%	0.00%	26.34%

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

												May-23		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-18	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	39.81%	9.38%	49.19%
66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-19	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	34.21%	4.10%	38.31%
67	Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-20	Ainaro	AILESU UNIPESSOAL LDA	RFQ-CD-MOP-22006	$ 23,993.19	28-Jun-22	100.00%	0.00%	100.00%
68	Rural Road Maintenance and Rehabilitation of Maubise - Urlepha (Access to Edi Manelobas) Chainage 0+000 - 3+000 and Urlepha-Rita Chainage 0+000 - 2+150	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	MBS-21	Ainaro	Balada Unipessoal Lda	RT/004/MOP-2021	$ 349,172.31	May 30, 2022	22.32%	0.00%	22.32%
69	New Construction of Turismo comunitario Flexa-Maubisse Ainaro Municipalitty	Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu	LM-TP	TURISMO	Maubisse	MBS-22	Ainaro	Formandus Centro CNEFP - Tibar	DNFP/DGFPE/SEFOPE/2002	$ 315,000.01	Feb. 27, 2023		0.00%	0.00%

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino Soares Dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Romulo J. Marques Henrique)
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Jaulino H. Rodrigues)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

(Deolindo de F. Marques)
Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Naran Projetu : Nova Construcao Escola Cafe Ainaro
Lokalidade : Ainaro
Projetu nain : Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	AMOUNT		PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		UP TO DATE	
				Amount	Percent %	Amount	Percent %	Amount	Percent %
I	PRELIMINARIES	US$	5,310.93	$ -	0.00%	$ 1,327.73	0.15%	$ 1,327.73	0.15%
II	2 STORY BUILDING CBCA 2 UNIT	US$	401,450.56	$ -	0.00%	$ 36,483.11	4.02%	$ 36,483.11	4.02%
III	TEACHER HOUSE 2 UNIT	US$	212,492.34	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
IV	SECURITY POST	US$	15,481.97	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
V	FENCES	US$	55,615.91	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
VI	SITE WORKS	US$	90,500.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
A	**CONSTRUCTION COST**	**US$**	**780,851.71**	**-**	**0.00%**	**37,810.84**	**4.17%**	**$ 37,810.84**	**4.17%**
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	US$	78,085.17	-	0.00%	3,781.08	0.42%	$ 3,781.08	0.42%
C	OVERHEAD	US$	21,195.67					$ -	0.00%
D	TAX 2% x (A+B+C))	US$	17,602.65	-	0.00%	831.84	0.09%	$ 831.84	0.09%
E	CONTIGENCY	US$	10,000.00					$ -	0.00%
F	**GRAND TOTAL**	**US$**	**907,735.20**	**-**	**0.00%**	**42,423.76**	**4.67%**	**$ 42,423.76**	**4.67%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X'D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran Projetu: Nova Construcao Escola Cafe Ainaro
Lokalidade :Ainaro
Projetu nain :Ministério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	12/05/2023	Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1		
					2		

ANEXU-ANV-22

Back-up Data

Naran Projeto : AinaroMinistério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL
Nova Construcao Escola Cafe

Data Inspesaun : 12/05/2023

Fatin Inspesaun : MAU-ULO / Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long S Latetude: E.

End Point : Long : …… Latetude: …….

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa TEkniku ADN, IP halo Inpesaun iah Tereno, hodi kontrola Progreso fisiku, no kualidade implemetnasaun rojeito husi Comp. Roman Junior, projeito refere kontinuasaun hela fui airin ba Classrom Building C1, no C2.	

 # ANEXU-ANV-22 #

Back-up Data

Naran Projeto : AinaroMinistério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL
Nova Construcao Escola Cafe

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa TEkniku ADN, IP halo Inpesaun iah Tereno, hodi kontrola Progreso fisiku, no kualidade implemetnasaun rojeito husi Comp. Roman Junior, projeito refere kontinuasaun hela fui airin ba Classrom Building C1, no C2.	 

 # ANEXU-ANV-22 #

Back-up Data

Naran Projeto : AinaroMinistério da Educação, Juventude e Desporto, MEJD - TL
Nova Construcao Escola Cafe

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





Ekipa TEkniku ADN, IP halo Inpesaun iah Tereno, hodi kontrola Progreso fisiku, no kualidade implemetnasaun rojeito husi Comp. Roman Junior, projeito refere kontinuasaun hela fui airin ba Classrom Building C1, no C2.

.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL LUAN CADOI
LOCATION : SUCO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO
AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MOUNTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$ 3,575.00	$ 1,975.00	2.00%	$ 525.00	0.53%	$ 2,500.00	2.54%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 49,729.55	$ 47,488.31	48.18%	$ -	0.00%	$ 47,488.31	48.18%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US$ 25,016.07	$ 22,288.88	22.62%	$ 2,000.37	2.03%	$ 24,289.25	24.65%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$ 10,894.12	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 89,214.74**	**$ 71,752.19**	**72.80%**	**$ 2,525.37**	**2.56%**	**$ 74,277.56**	**75.37%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 1,310.00	1.33%	$ 1,392.50	1.41%	$ 2,702.50	2.74%
	GRAND TOTAL		**US$ 98,554.74**	**$ 73,062.19**	**74.13%**	**$ 3,917.87**	**3.98%**	**$ 76,980.06**	**78.11%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé
Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade,
ADN, I.P

 # ANEXU-ANV-22 #

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Data Inspesaun : 22/05/2023

Fatin Inspesaun : LUAN CADOI / Ainaro

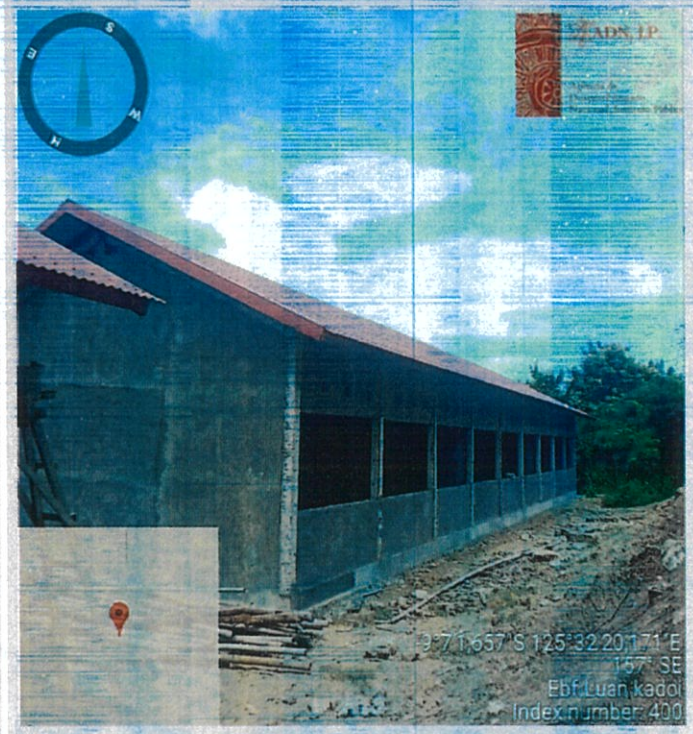
Koordinadas :

Start Point : Long :-9'9,176'S Latetude: 125, 32'9,042 E.

End Point : Long : …… Latetude: …….

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Ekipa TEkniku ADN, IP halo Inpesaun iah Tereno, hodi kontrola Progreso fisiku, no kualidade implemetnasaun rojeito husi grupu komunitario, progresso fisiku atinje ona ha kakuluk. No Grupu sira kontinua hela servisu.	

ANEXU-ANV-22

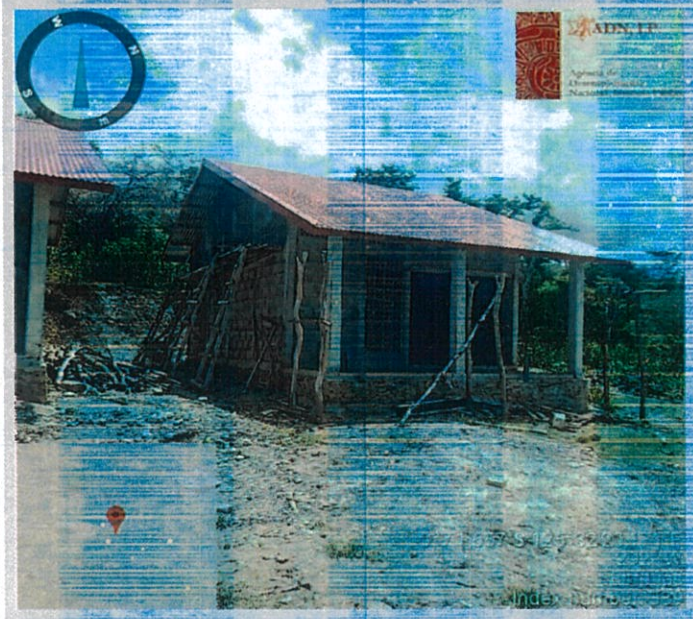
Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Sketch & Foto Desenho

Ekipa TEkniku ADN, IP halo Inpesaun iah Tereno, hodi kontrola Progreso fisiku, no kualidade implemetnasaun rojeito husi grupu komunitario, progresso fisiku atinje ona ha kakuluk. No Grupu sira kontinua hela servisu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME :KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA ESCOLA BASICA FILIAL LIAS

LOCATION : SUCO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$ 3,575.00	$ 2,275.00	2.21%	$ -	0.00%	$ 2,275.00	2.21%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 50,185.26	$ 34,820.87	33.77%	$ 704.71	0.68%	$ 35,525.58	34.46%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US$ 25,178.89	$ 12,653.99	12.27%	$ 2,780.18	2.70%	$ 15,434.17	14.97%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$ 14,827.89	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 93,767.04**	**$ 49,749.86**	**48.25%**	**$ -**	**3.38%**	**$ 53,234.75**	**51.63%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 2,345.00	2.27%			$ 2,345.00	2.27%
	GRAND TOTAL		**US$ 103,107.04**	**$ 52,094.86**	**50.53%**	**$ 3,484.89**	**3.38%**	**$ 55,579.75**	**53.90%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Data Inspesaun : 22/05/2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : -9°6'42,882"S Latetude: 125 °32'2.67"E

End Point : Long : ……, Latetude: ……

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

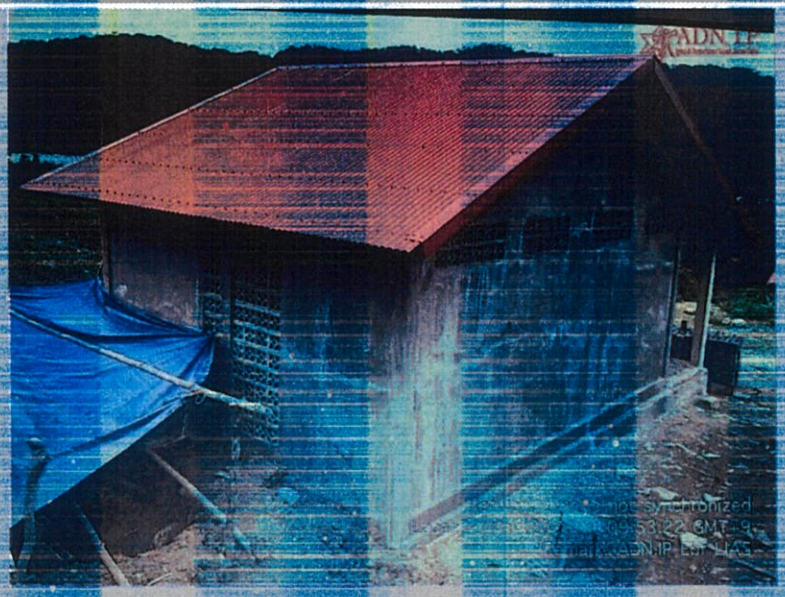
: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu .	
Ekipa teknico ADN. IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico iha tereno, fo orientasaun ba GK atu mantein Qualidade. E servisu refere atinji ona iha monta azuleju no pinta. . .	

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa teknico ADN. IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico iha tereno, fo orientasaun ba GK atu mantein Qualidade. E servisu refere atinji ona iha monta azuleju no pinta. . . .	 

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	22/05/2023	Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1	Husu ba Grupu atu monta keramik ho diak, hodi bele garantia qualidade de servisu	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA ESCOLA SECUNDARIA GERAL FERNANDO LASAMA DE ARAUJO AINARO
LOCATION : SUCO AINARO VILA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	VERIFIED BY AND. IP			PREVIOUS SETEMBRO		THIS BILLING		UP TO DATE	
		Page No		Amount	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$	3,075.00	$ 1,800.00	1.68%				
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$	56,061.73	$ 47,729.51	43.27%	$ -	0.00%	$ 47,729.51	43.27%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US$	30,953.49	$ 26,769.95	24.27%	$ 3,954.22	3.58%	$ 30,724.17	27.85%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$	10,883.53						
	CONSTRUCTION COST		**US$**	**100,973.75**	**76,299.47**	**69.21%**	**$ 3,954.22**	**3.58%**	**$ 80,253.69**	72.80%
	CONTIGENCY		US$	3,000.00	$ -	0.00%			$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$	6,340.00	$ 2,222.00	2.20%			**$ 2,222.00**	2.20%
	GRAND TOTAL		**US$**	**110,313.75**	**$ 78,521.47**	**71.41%**	**$ 3,954.22**	**3.58%**	**$ 82,475.69**	**75.00%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifica husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Data Inspesaun : 11/05/2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long 8,9976S Latetude: 125,505,6E

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa teknico ADN. IP halo inspeksaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico iha tereno. GK sia servisu progresso atinge ona ba Nahe Karamik, Cellling, no pinta ona 3 sala de aulas.	

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

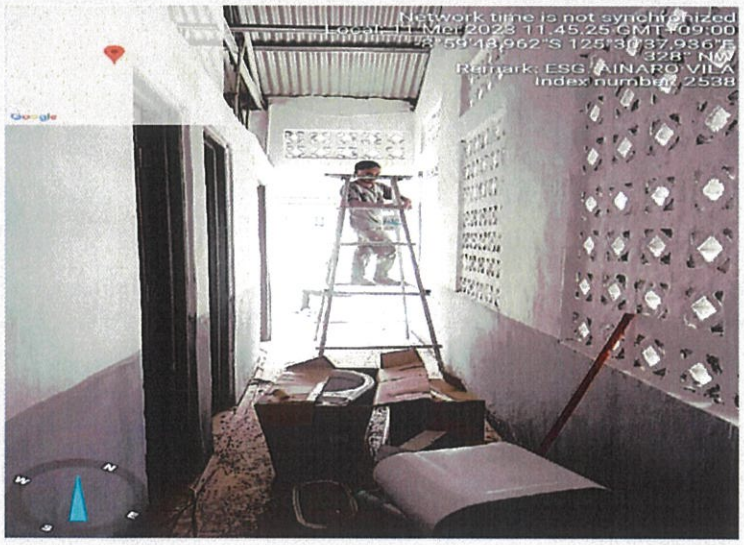
Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa teknico ADN. IP halo inspeksaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico iha tereno. GK sia servisu progresso atinge ona ba Nahe Karamik, Cellling, no pinta ona 3 sala de aulas.	 

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa teknico ADN. IP halo inspeksaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico iha tereno. GK sia servisu progresso atinge ona ba Nahe Karamik, Cellling, no pinta ona 3 sala de aulas.	
.	
.	


MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN KA REHABILITASAUN BA ESCOLA SECUNDARIA GERAL FERNANDO LASAMA DE ARAUJO AINARO

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	11/05/2023	Ainaro Villa	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1	Ekipa AND. IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola kualidade de Implementasaun iha tereno, atinje ona ba monta keramik, e Grupu agora monta mos kerammik ba Wastafel iha Haris fatin nian.	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Project Name : **New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro**
Contract No. : **RDTL/29/MSSI/DGAF/X/2021**
Loaction : **Ainaro Vila, Ainaro Municipality, Timor-Leste**

NO	SUMMARY		PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		UP TO DATE	
	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	AMOUNT (USD)	PERCENTAGE (%)	AMOUNT (USD)	PERCENTAGE (%)	AMOUNT (USD)	PERCENTAGE (%)
A	**OFFICE BUILDING**							
1	PREPARATION WORKS	$ 14,915.67	$ 9,041.61	1.65%	$ -	0.00%	$ 9,041.61	1.65%
2	EARTH WORKS	$ 13,584.96	$ 13,584.96	2.49%	$ -	0.00%	$ 13,584.96	2.49%
3	MASONRY WORKS	$ 56,144.28	$ 28,966.97	5.30%	$ -	0.00%	$ 28,966.97	5.30%
4	CONCRETE WORKS	$ 50,863.89	$ 35,911.05	6.57%	$ 2,198.02	0.40%	$ 38,109.07	6.97%
5	ROOFING WORKS	$ 32,805.38	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
6	CEILING WORKS	$ 21,285.46	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
7	CARPENTERY WORKS	$ 22,850.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
8	ELECTRICAL WORKS	$ 13,270.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
9	SANITATION WORKS	$ 12,382.50	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
10	PAINTING WORKS	$ 8,205.65	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
SUB-TOTAL			**$ 87,504.59**	**16.01%**	**$ 2,198.02**	**0.40%**	**$ 89,702.61**	**16.41%**
B	**WAREHOUSE**							
1	EARTH WORKS	$ 5,311.77	$ 5,311.77	0.97%	$ -	0.00%	$ 5,311.77	0.97%
2	MASONRY WORKS	$ 14,333.87	$ 9,635.18	1.76%	$ 4,206.55	0.77%	$ 13,841.73	2.53%
3	CONCRETE WORKS	$ 34,136.60	$ 32,263.16	5.90%	$ -	0.00%	$ 32,263.16	5.90%
4	ROOFING WORKS	$ 23,008.23		0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
5	CARPENTERY WORKS	$ 6,008.18		0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
6	ELECTRICAL WORKS	$ 2,635.00		0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
7	PAINTING WORKS	$ 2,760.19		0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
SUB-TOTAL			**$ 47,210.11**	**8.64%**	**$ 4,206.55**	**0.77%**	**$ 51,416.66**	**9.41%**
C	**LANDSCAPING WORKS**							
1	PARK AND OFFICE PLATFORM WORKS	$ 69,230.90	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
2	PARK ELECTRICAL WORKS	$ 4,070.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
3	FENCE WORKS	$ 52,405.65	$ -	0.00%	$ 16,291.03	2.98%	$ 16,291.03	2.98%
4	SECURITY POST	$ 14,018.31	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
SUB-TOTAL			**$ -**	**0.00%**	**$ 16,291.03**	**2.98%**	**$ 16,291.03**	**2.98%**
I	COST CONSTRUCTION	**$ 474,226.49**	**$ 134,714.70**	**24.65%**	**$ 22,695.60**	**4.15%**	**$ 157,410.30**	**28.80%**
II	CONTRACTOR FEE & OVERHEAD 10% x I	$ 47,422.65	$ 13,471.47	2.46%	$ 2,269.56	0.42%	$ 15,741.03	2.88%
III	OVERHEAD	$ 5,000.00	1,575.00	0.29%	$ 175.00	0.03%	$ 1,750.00	0.32%
IV	TAX 2% x (I+II+III)	$ 10,532.98	$ 2,995.22	0.55%	$ 502.80	0.09%	$ 3,498.03	0.64%
V	CONTINGENCY 2% x I	$ 9,484.53	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
A	**CONTRACT PRICE**	**$ 546,666.66**	**$ 152,756.40**	**27.95%**	**$ 25,642.96**	**4.69%**	**$ 178,399.36**	**32.64%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Data Inspesaun : 4-05-2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : .....S, Latetude: ....."E.

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa Teknico ADN, IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico ba projeito refere. Kompanha agora servisu hela ba item excavation ba Landscaping nia.	

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Ekipa Teknico ADN, IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico ba projeito refere.
Kompanha agora servisu hela ba item excavation ba Landscaping nia

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa Teknico ADN, IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico ba projeito refere. Kompanha agora servisu hela ba item excavation ba Landscaping nia.	

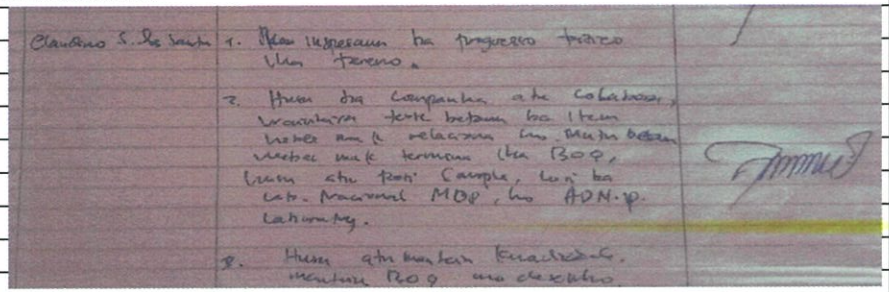
MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Kompanha : Atramor Unipessoal Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	4/05/2023	Ainaro Villa	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1	Husu ba Site Eng. Kompanha nafatin servisu no hare didiak item servisu nebe iha BOQ hodi orienta badaen sira servisu.	
					2		
					3		
					4		
					5		
					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXU- HA - 6

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Data Inspesaun : 31-05-2023

Fatin Inspesaun : Hato-udo Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : .....S, Latetude: ....."E.

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa TEknik ADN, IP halo INspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisiku hotu ona, falta deit Item servisu ba Site Work ho Contigency mak sedauk submete mai ADN, IP veifika.	

ANEXU- HA - 6

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa TEknik ADN, IP halo INspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisiku hotu ona, falta deit Item servisu ba Site Work ho Contigency mak sedauk submete mai ADN, IP veifika.	 

.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	31/05/2023	Hato-udo / Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tech AND.IP	1	Husu ba grupu atu mantein nfatain servisu, e prepara Contagem fisiku ba item SITE WORK ho Contigency, hodi Submete ba Parte Verifikasaun husi AND, IP, I Husu mos ba grupu hare monta kuadro Hakerek iha sala Laran.	
					2	Akipa AND, IP husu ba GK atu aselera servisu	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO PROTOTIPO CA + TB, EBF HUTSEO
LOCATION : HATU UDO, MUNICIPIO AINARO

MAIN SUMMARY

ANEXU- HA - 7

NO	ITEM DESCRIPTION	PAGE NO	AMOUNT	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	$ 2,982.93	$ 1,632.93	1.48%	$ -	0.00%	$ 1,632.93	1.48%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	CA/39	$ 63,158.05	$ 36,681.36	33.14%	$ 6,912.27	6.24%	$ 43,593.63	39.38%
								$ -	0.00%
III	BUILDING Tb	TB/39	$ 25,465.79	$ 12,328.52	11.14%	$ -	0.00%	$ 12,328.52	11.14%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORK		$ 9,748.62	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
A	**Total Construction Cost**		**$ 101,355.39**	**$ 50,642.81**	**45.75%**	**$ 6,912.27**	**6.24%**	**$ 57,555.08**	**51.99%**
B	Overhead		$ 6,340.00	$ 2,210.00	2.00%	$ -	0.00%	$ 2,210.00	2.00%
C	Contigency		$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
D	**Grand Total**		**$ 110,695.39**	**$ 52,852.81**	**47.75%**	**$ 6,912.27**	**6.24%**	**$ 59,765.08**	**53.99%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Data Inspesaun : 22-05-2023

Fatin Inspesaun : Hut-seo / Hato-udo - vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -9''9'7'902'S Latetude: 125'34''55,668 E

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

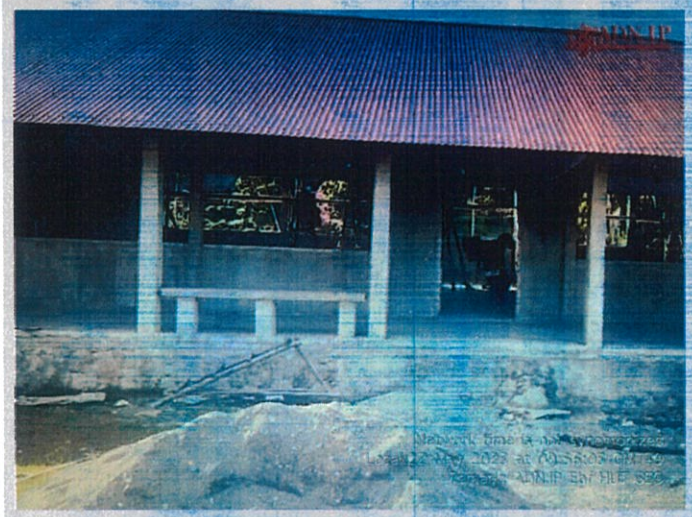
: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa tekniku ADN. IP halo inspesaun ba progresso fisiku iha tereno, Tekniku husi ADN. IP mos observa fisiku iha tereno. Atinge on aba kakuluk.	

ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Sketch Item servisu	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa tekniku ADN. IP halo inspesaun ba progresso fisiku iha tereno, Tekniku husi ADN. IP mos observa fisiku iha tereno. Atinge on aba kakuluk.	 

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	22/05/2023	Hut-seo/Hato-udo Vila	Joaquim Madeira & Claudino Soares dos Santos	Teknico AND. IP	1	Husu ba Grupu atu aselerasa servisu, hyusu ba Engineeiro atu mantein iha tereno hodi fo orientasaun ba badaen sira hodi executa servisu tuir b of q no desenho.	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECTO : PROJETU KONSTRUSAUN FOUN BA ESTV HATU-UDO , AINARO
LOCATION : SUCO LEO LIMA,
POSTO ADMINISTRATIVO : HATO UDO VILA ,
MUNICIPIO : AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$ 1,752.92	$ 1,040.42	0.34%	$ -	0.00%	$ 1,040.42	0.34%
II	CLASSROOM BUILDING C (2 UNITS)	C/39 (i)	US$ 124,045.06	$ 47,754.82	15.83%	$ 24,140.27	8.00%	$ 71,895.09	24%
III	TEACHER OFFICE	CB/50	US$ 88,628.36	$ 24,605.08	8.16%	$ 22,579.40	7.49%	$ 47,184.48	15.65%
IV	LABORATORY COMPUTER (IT)	LB	US$ 40,059.64	$ 15,577.78	5.17%	$ 7,953.69	2.64%	$ 23,531.47	7.80%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$ $ 10,500.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 264,985.98**	**$ 88,978.10**	**29.50%**	**$ 54,673.36**	**18.13%**	**$ 143,651.47**	**47.63%**
	CONTRACTOR FEE (10% X A)		**US$ 26,498.60**	**8,897.81**	1.72%	**$ -**	**0.00%**	**$ 8,897.81**	**1.72%**
	OVERHEAD		**US$ 4,180.00**	**$ 525.00**	0.17%	**$ 275.00**	**0.09%**	$ 800.00	0.27%
	TAX (2%X (A+B+C))		**US$ 5,913.29**	**1,968.02**	0.38%	**$ -**	**0.00%**	$ 1,968.02	0.38%
	CONTIGENCY		US$ **9,000.00**	$ -	0.00%	$ -	**0.00%**	$ -	0.00%
	GRAND TOTAL		**US$ 301,577.87**	**$ 100,368.93**	**31.78%**	**$ 54,948.36**	**18.22%**	**$ 155,317.29**	**50.00%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X. D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Data Inspesaun : 03-05-2023

Fatin Inspesaun : Betula/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long : 8'55'42606'S Latetude: 36'23'274 E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa Teknico ADN, IP municipio Ainaro, halo inspesaun ba progresso fisiku iha tereno, Progresso fisiku ba projeto refere remata ona, maibe GK sedauk executa ba Item Site Work, no Contigency.	

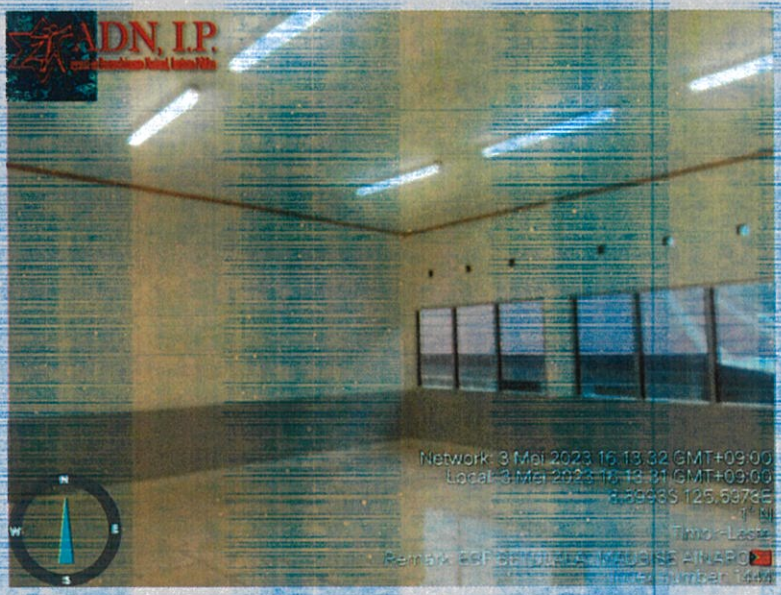
ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



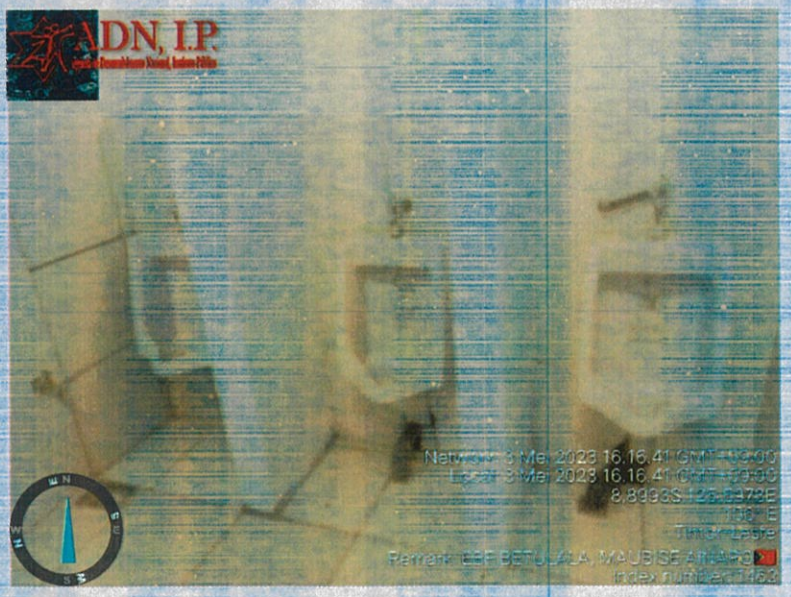
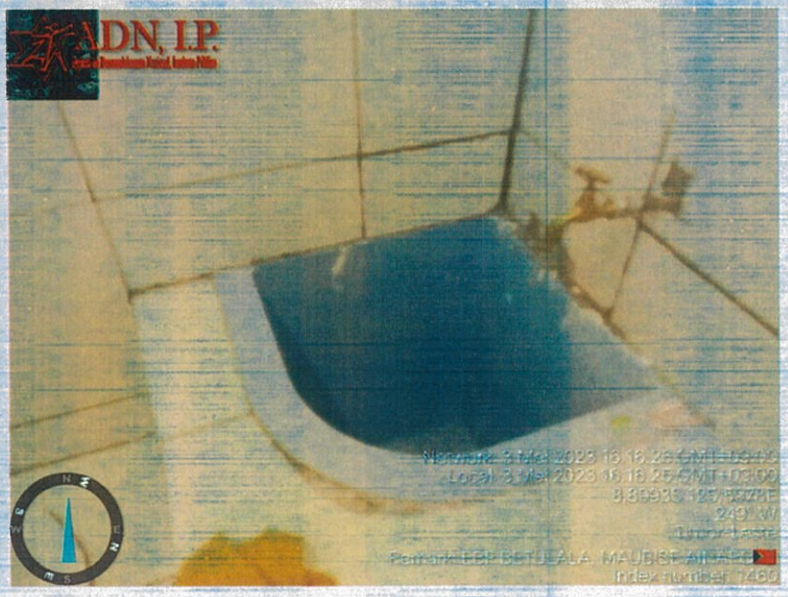
Ekipa Teknico ADN, IP municipio Ainaro, halo inspesaun ba progresso fisiku iha tereno, Progresso fisiku ba projeito refere remata ona, maibe GK sedauk executa ba Item Site Work, no Contigency.



ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa Teknico ADN, IP municipio Ainaro, halo inspesaun ba progresso fisiku iha tereno, Progresso fisiku ba projeito refere remata ona, maibe GK sedauk executa ba Item Site Work, no Contigency.	 


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	3/05/2023	Maubessi/ Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Tecnico AND.IP	1		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

LOCATION : SUCO MANETU, POSTO ADMINISTRATIVO MAUBISSE , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US$ 3,079.26	$ 1,355.26	1.43%	$ -	0.00%	$ 1,355.26	1.43%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 71,553.70	$ 35,033.18	36.90%	$ 8,909.10	9.38%	$ 43,942.28	46.28%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US$ 10,978.70	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 85,611.66**	**$ 36,388.44**	**38.32%**	**$ 8,909.10**	**9.38%**	**$ 45,297.54**	**47.71%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 1,410.00	1.48%	$ -	0.00%	$ 1,410.00	1.48%
	GRAND TOTAL		**US$ 94,951.66**	**$ 37,798.44**	**39.81%**	**$ 8,909.10**	**9.38%**	**$ 46,707.54**	**49.19%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construcao Escola Basica Filial Russulau Suco Manetu, Posto Administrativo Maubisse , Municipio Ainaro

Data Inspesaun : 17/05/2023

Fatin Inspesaun : Russulau/Maubisse

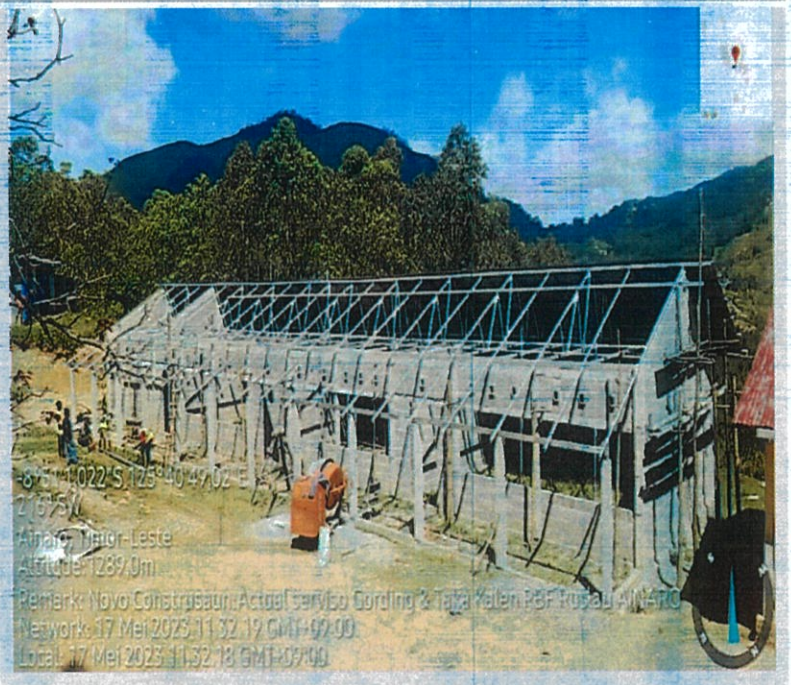
Koordinadas :

Start Point : Long, 8,8341SLatetude: End 125,5842E

Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa Tekniku ADN, IP. Halo inspesaun progresso fisiku ba projeito refere atinje ona ba roofing e grupu submete ona pedido pagamento ba Owner.	

ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construcao Escola Basica Filial Russulau Suco Manetu, Posto Administrativo Maubisse , Municipio Ainaro

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa Tekniku ADN, IP. Halo inspesaun progresso fisiku ba projeito refere atinje ona ba roofing e grupu submete ona pedido pagamento ba Owner.	 


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto :Nova Construcao Escola Basica Filial Russulau Suco Manetu, Posto Administrativo Maubisse , Municipio Ainaro

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	17/05/2023	Maubisse/ Ainaro	Joaquim Madeira & Claudino S. Santos	Teknico AND.IP	1	Husu ba GK atu aselera servisu, no mantein kualidade no BOQ.	
					2		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI
LOCATION : MAULAU, MAUBISSE, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$ 3,575.00	$ 1,600.00	1.46%	$ -	0.00%	$ 1,600.00	1.46%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 51,213.93	$ 24,646.38	22.43%	$ 4,506.79	4.10%	$ 29,153.18	26.53%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US$ 260,811.65	$ 10,038.16	9.13%	$ -	0.00%	$ 10,038.16	9.13%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$ 20,088.04	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 335,688.62**	**$ 36,284.54**	**33.02%**	**$ 4,506.79**	**4.10%**	**$ 40,791.34**	**37.12%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 1,310.00	1.19%	$ -	0.00%	$ 1,310.00	1.19%
	GRAND TOTAL		**US$ 345,028.62**	**$ 37,594.54**	**34.21%**	**$ 4,506.79**	**4.10%**	**$ 42,101.34**	**38.31%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
Município Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé
Saneamentu, Município Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun
de Qualidade,
ADN, I.P

#ANEXU-MBS-17#
Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Data Inspesaun : 17/05/2023

Fatin Inspesaun : Lumluli/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long -8'471,122 S: Latetude: 125'41'11'238'E

End Point : Long : -8'471,122 S, Latetude: 125'41'11'238'E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa tekniku ADN.IP halo inspesaun iha tereno, ADN. IP observa GK halao hela servisu ba Finising ba 3 sala de Aulas,	

#ANEXU-MBS-17#
Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Sketch & Foto Desenho

Ekipa tekniku ADN.IP halo inspesaun iha tereno, ADN. IP observa GK halao hela servisu ba fui sinta leten, no monta batako ba haris fatin.

Observasaun uha tereno no foto aktual





#ANEXU-MBS-17#
Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Sketch & Foto Desenho

Observasaun uha tereno no foto aktual

Ekipa tekniku ADN.IP halo inspesaun iha tereno, ADN. IP observa GK halao hela servisu ba fui sinta leten, no monta batako ba haris fatin.





ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Data Inspesaun : 26/05/2023

Fatin Inspesaun : Bermoli/ Maubessi

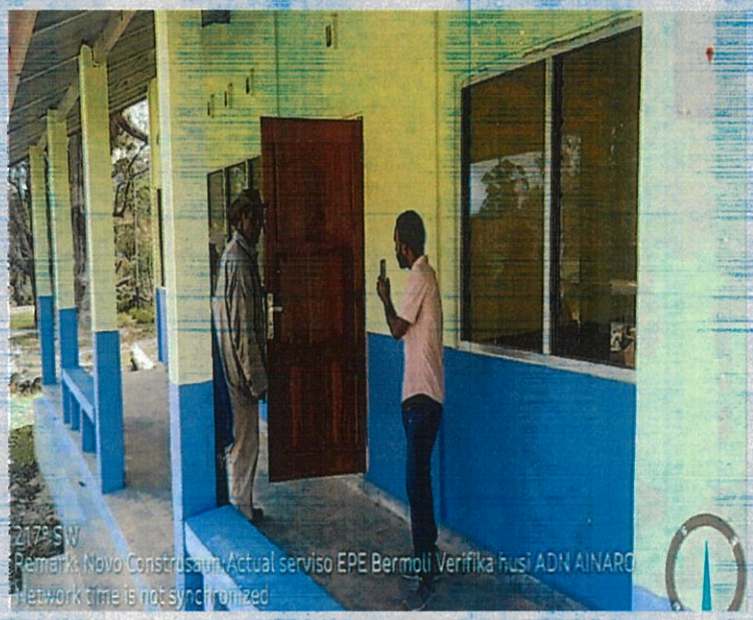
Koordinadas :

Start Point : Long -84834'638''S: Latetude: 125'39'26.238' E

End Point : Long : -84834'638''S, Latetude: 125'39'26.238' E

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba progresso fisico iha tereno, hodi kontrola maibe GK sira sedauk kontinua servisu tamba hein hela pedido pagamento nebee mak Tecnico ADN, IP sei halo hela verifikasaun ba dokumentos pagamento nebee tama ona.	bservasaun iha tereno no Foto Aktual 

ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

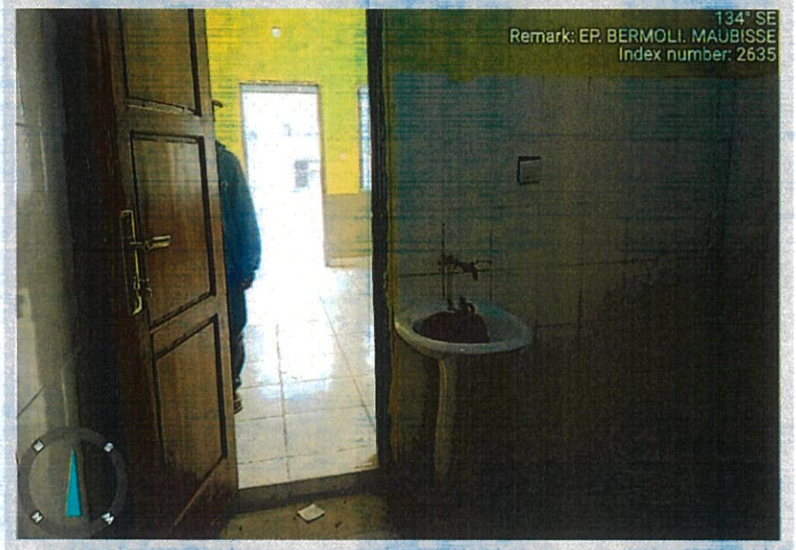
Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Sketch & Foto Desenho

Ekipa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba progresso fisico iha tereno, hodi kontrola maibe GK sira sedauk kontinua servisu tamba hein hela pedido pagamento nebee mak Tecnico ADN, IP sei halo hela verifikasaun ba dokumentos pagamento nebee tama ona.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Sketch & Foto Desenho

Ekipa TEchnico ADN. IP halo inspeksaun ba progresso fisico iha tereno, hodi kontrola maibe GK sira sedauk kontinua servisu tamba hein hela pedido pagamento nebee mak Tecnico ADN, IP sei halo hela verifikasaun ba dokumentos pagamento nebee tama ona.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA FILIAL TUCARO
LOCATION : HATUBUILICO, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US$ 3,329.26	$ 2,241.76	3.31%	$ -	0.00%	$ 2,241.76	3.31%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 50,948.05	$ 23,071.42	34.03%	$ 1,566.89	2.31%	$ 24,638.30	36.34%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US$ 4,183.95						
	CONSTRUCTION COST		**US$ 58,461.26**	**$ 25,313.18**	**37.33%**	**$ 1,566.89**	**2.31%**	**$ 26,880.06**	**39.65%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00						
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 2,452.50	3.62%	$ -	0.00%	$ 2,452.50	3.62%
	GRAND TOTAL		**US$ 67,801.26**	**$ 27,765.68**	**40.95%**	**$ 1,566.89**	**2.31%**	**$ 29,332.56**	**43.26%**

(Prepara husi

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino S. dos Santos)
Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika husi

(Arq. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade
ADN, I.P

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	29/05/2023	Hato builico/AINARO	Joaquim Madeira Claudino Soares dos Santos	Teknico	1	Ekipa Tecnioco AND IP halo Inspesaun iha tereno, GK servisu hela ba item Celling, monta hela rangka Plafon, no balun mos prepara hela atu monta Cusen ba odamatan ho janela	

ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Data Inspesaun : 29-05-2023

Fatin Inspesaun : Tukaro, Hatu builiko

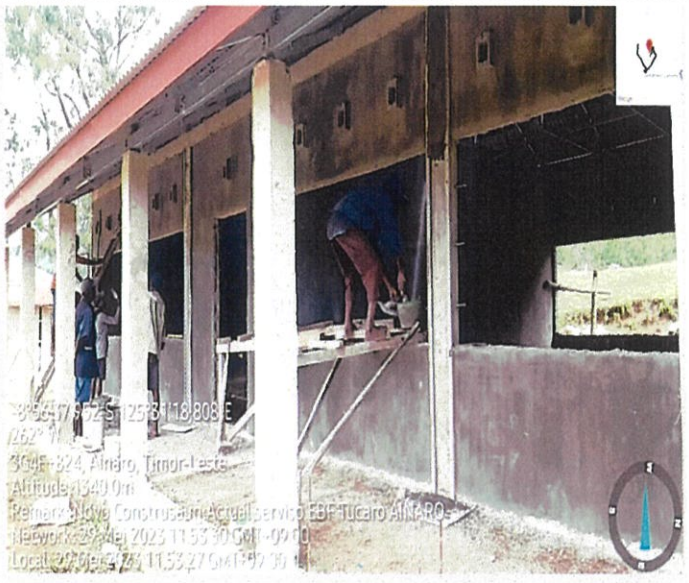
Koordinadas :

Start Point : Long : -856''37.974''S 125'31'18''702 ÉLatetude: ……

End Point : Long : …….. Latetude: ……

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa Tecnico ADN, IP municipio Ainaro halo Inspeksun ba projeito refere hein deit monta Cusen ba odamatan ho Janela, e agora dadaun GK monta hela Rangka Plafon.	

ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa Tecnico ADN, IP municipio Ainaro halo Inspeksun ba projeito refere hein deit monta Cusen ba odamatan ho Janela, e agora dadaun GK monta hela Rangka Plafon.	 

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL


ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Kompanha :Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun
I	29/05/2023	Hato builico/Ainaro	Joaquim Madeira Claudino S. dos Santos	Teknico AND. IP

No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
1	Husu ba Grupu atu mantein hodi hein resultado ba pedidu pagamento, hodi bele kontinua fila fali servisu.	
2		
3		

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construcao Prototipo Ca, Ebf Tatiri Lases Hatu Builico, Municipio Ainaro

Data Inspesaun : 29-05-2023

Fatin Inspesaun : Tatiris Lases

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8'55'45 S** Latetude: **125'34''39,546 E**

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa Tecnico ADN, IP Municpio Ainaro halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisiku, e agora dadauk atinje ona ba Item Taka kalen no ateru uma laran.	

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construcao Prototipo Ca, Ebf Tatiri Lases Hatu Builico, Municipio Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Ekipa Tecnico ADN, IP Municpio Ainaro halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisiku, e agora dadauk atinje ona ba Item Taka kalen no ateru uma laran.



ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Data Inspesaun : 03-05-2023

Fatin Inspesaun : Ernaro

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8'55'45 S** Latetude: **125'34''39,546 E**

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa Tecnico ADN, IP Municpio Ainaro halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisiku, e agora dadauk atinje ona ba Item Painting, Keramik Monta mor remata on ba sala de Aula.	

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Ekipa Tecnico ADN, IP Municpio Ainaro halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisiku, e agora dadauk atinje ona ba Item Painting, Keramik Monta mor remata on ba sala de Aula.

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Data Inspesaun : 03-05-2023

Fatin Inspesaun : Ernaro

Koordinadas :

Start Point : Long : **-8'55'45 S** Latetude: **125'34''39,546 E**

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Ekipa Tecnico ADN, IP Municpio Ainaro halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisiku, e agora dadauk atinje ona ba Item Painting, Keramik Monta mor remata on ba sala de Aula.	

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa Tecnico ADN, IP Municpio Ainaro halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisiku, e agora dadauk atinje ona ba Item Painting, Keramik Monta mor remata on ba sala de Aula.	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	3/04/2023	Hato builico/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu ba grupo mantein nafatin hamos servisu ikus nian no kordena ho projeito nain kona ba iten sira nebe maka seidauk ezekuta hanesan kontigenci no site work.	
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

2023

Naran Eng.	**Joaquim de C. Madeira**
	Claudino Soares dos Santos
Municipio	**MUNICIPIO AINARO NO POSTOS**

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	May-23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	OBS
AINARO VILA (ANV)	1	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		Retensaun 10%
							Actual		
	2	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	Simbissa Unip.Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan		Retensaun 10%
							Actual		
	3	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan		Retensaun 10%
							Actual		
	4	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	PDIM	ESTATAL	Plan		On going
							Actual		
	5	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO AINARO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan		On going
							Actual		
	6	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan		On going
							Actual		
	7	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan		On going
							Actual		
	8	New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro	Atramor Unip Lda		LM	MSSI	Plan		On going
							Actual		
	9	NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19,AT SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE	ADIJULCOJAM UNIPESSOAL Lda	RDTL-MS-19-DNA-RBK-21-0986	LM	SAUDE	Plan		Retensaun 10%
							Actual		
	10								Projeito 100% ona
HATUDO (HA)	1	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC HATO-UDO VILA)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan		On going
							Actual		
	2	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan		On going
							Actual		
	3	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBF. FATU-META))	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan		On going / La ba inspesaun tamba kondisaun dalan kois no aat.
							Actual		
	4	Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-udo, Ainaro	LEOLICO LDA	NCB/02/DNA/2021	LM	EDUCAÇÃO	Plan		On going
							Actual		
HATUBULICO (HTB)	1	Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan		On going
							Actual		
	2	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan		On going
							Actual		
	3	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan		On going
							Actual		
MAUBISSE (MUS)	1								
	2	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		Falta Retensaun 10%
							Actual		
	3								On going
	4	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet, Cuzina no Armagem no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (BERMOLI MAULAU)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan		On going
							Actual		
	5	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Lumluli)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan		On going
							Actual		
	6	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manclobas Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Maneloba)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan		On going
							Actual		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

2023

Naran Eng.	Joaquim de C. Madeira
	Claudino Soares dos Santos
Municipio	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	May-23																									OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	7	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Russulau)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															On going
							Actual																																
	8	Construção de Salas de Aulas 6 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Manetu)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															La baa vizita tamba kondisaun dalan ladiak.
							Actual																																
	9	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Rileco Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															Projeito refere fisiku hotunona, e hein deit pagamento ba Contigency ho Site Work
							Actual																																
	10	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Aituto Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Betulala)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																															On going
							Actual																																

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Procesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Bee Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edifício Publiku no Bee Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng.Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN, I.P

ANEXU C1 (ANV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Lau Sta. 0+000 - 1+200 Ainaro Municipality**

No. kontratu : **MPW-W-210064**

Data Inspesaun : 03/05/2022

Fatin Inspesaun : Mau Nunu – Mau Ulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -9º0'17,574''S Latetude: 125º29'48,294''E

End Point : Long : -9º0'48,138''S Latetude: 125º28'39,018''E

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno
Servico iha tereno Parado hela	

ANEXU C1 (ANV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Lau Sta. 0+000 - 1+200 Ainaro Municipality**

No. kontratu : **MPW-W-210064**

Servico iha tereno Parado hela



ANEXU C1 (ANV-09)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro.**

No. kontratu : **35/MACLNSEACLN/X/2019**

Data Inspesaun : 04/05/2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º0'59,904''S Latetude: 125º30'12,588''E

End Point : Long : - 9º1'59,496''S Latetude: 125º30'10,206''E

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Laiha aktivisades servisu iha tereno	

ANEXU C1 (ANV-09)

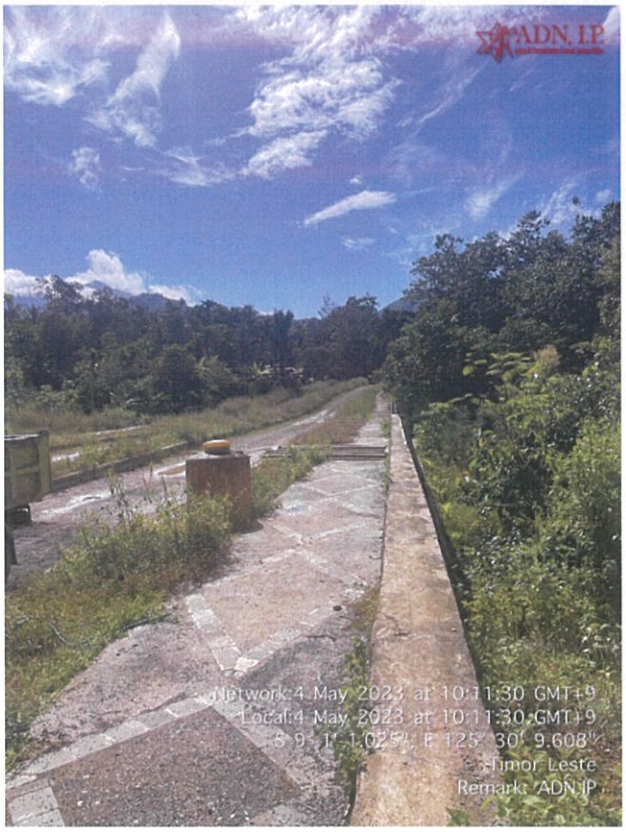
Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro.**

No. kontratu : **35/MACLNSEACLN/X/2019**

Laiha aktifidade servisu iha tereno

Kondisaun iha Tereno



ANEXU C1 (ANV-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro.**

No. kontratu : **NCB/087/MOPTC-2016**

Data Inspesaun : 03/05/2023

Fatin Inspesaun : Mau Lo – Mau Nunu

Koordinadas :

Start Point : Long : -9º2'45,223''S Latetude: 125º31'17,356 ''E

End Point : Long : -9º0'59,325''S, Latetude: 125º29'12,324''E

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servico iha Tereno parado hela	

ANEXU C1 (ANV-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro.**

No. kontratu : **NCB/087/MOPTC-2016**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servico iha Tereno parado hela	
Servico iha Tereno parado hela	

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro**

No. kontratu : **SSS/141/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : 31/05/2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º0'15,612''S Latetude: 125º30'39,876''E

End Point : Long : - 9º3'51,231''S Latetude: 125º30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere atizi ona 100% iha tinan 2020	 **Kondisaun Estrada Sarai – Ainaro Vila**

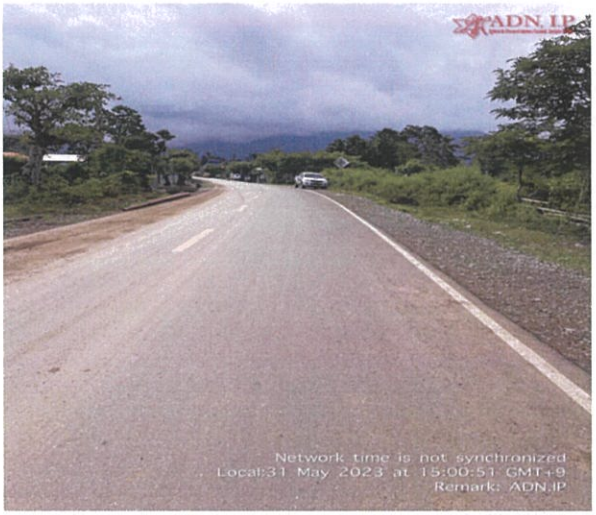
ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro**

No. kontratu : **SSS/141/MOPTC-2017**

Projetu Refere atizi ona 100% iha tinan 2020



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu Refere atizi ona 100% iha tinan 2020



ANEXU C1 (ANV-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.**
No. kontratu : **SSS/142/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : 31/05/2023

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

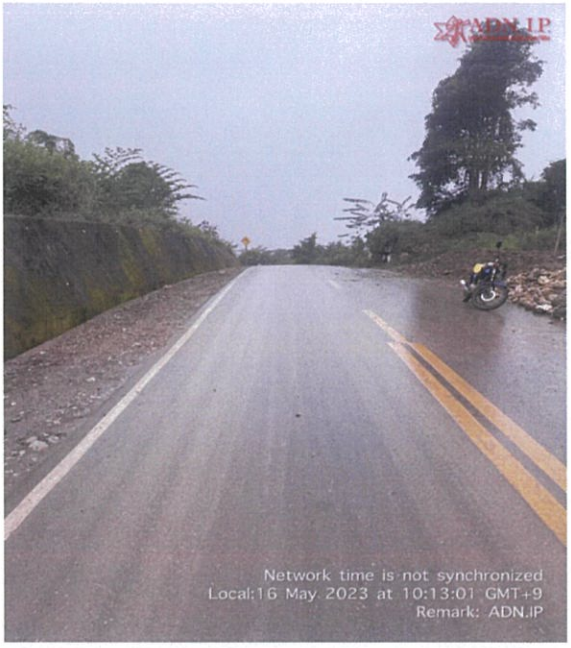
Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º0'15,612''S Latetude: 125º30'39,876''E

End Point : Long : - 9º3'51,231''S Latetude: 125º30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

: 2. Jaulino H. Rodrigues

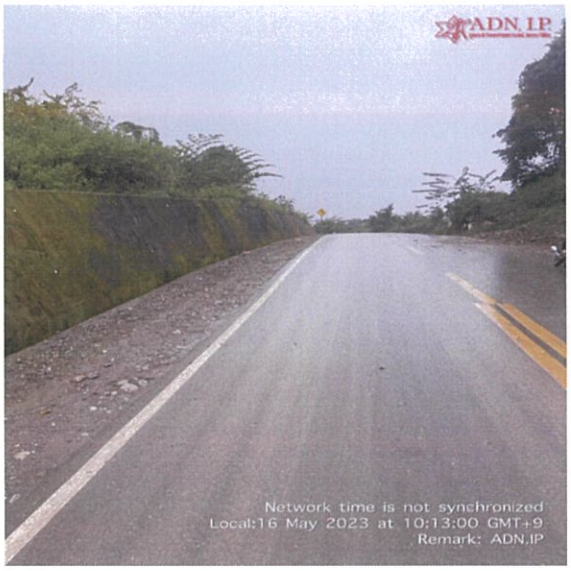
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Laiha aktividade servisu iha tereno	

ANEXU C1 (ANV-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.**
No. kontratu : **SSS/142/MOPTC-2017**

Laiha aktividade servisu iha tereno



ANEXU C1 (HA-31)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Maintenance Project - Zumalai (Covalima) to JCT Cassa Ainaro and Hatu-Udo**

No. kontratu : **MPW-W-230007**

Data Inspesaun : 16/05/2023

Fatin Inspesaun : Foho Ailiko - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°27'26.46"E, Latetude: 9°10'35.71"S

End Point : Long : 125°41'14.27"E, Latetude: 9° 5'31.88"S

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere kontinua Kontinua servico Embankment	

ANEXU C1 (HA-31)
Back-up Data

Naran Projeto : **Road Maintenance Project - Zumalai (Covalima) to JCT Cassa Ainaro and Hatu-Udo**

No. kontratu : **MPW-W-230007**

Projetu refere kontinua Kontinua servico Embankment



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere kontinua Kontinua servico Embankment



ANEXU C1 (HA-31)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Maintenance Project - Zumalai (Covalima) to JCT Cassa Ainaro and Hatu-Udo**

No. kontratu : **MPW-W-230007**

Data Inspesaun : 31/05/2023

Fatin Inspesaun : Foho Ailiko - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°27'26.46"E, Latetude: 9°10'35.71"S

End Point : Long : 125°41'14.27"E, Latetude: 9° 5'31.88"S

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere kontinua Kontinua servico Embankment	

ANEXU C1 (HA-31)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Maintenance Project - Zumalai (Covalima) to JCT Cassa Ainaro and Hatu-Udo**

No. kontratu : **MPW-W-230007**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere kontinua Kontinua servico Embankment	
Projetu refere kontinua Kontinua servico Embankment	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Públic

Contract No. : MPW-W-230007
Contract Name : Road Maintenance Project - Zumalai (Covalima) to JCT Cassa Ainaro and Hatu-Udo
Contractor : EDS Express Distribution Services Diverses Unip. Lda.

CONTRACT				SUMMARY					
				PREVIOUS		THIS BILL		UP TO DATE BILL	
Bill No.	Item Description	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage
100	GENERAL REQUIREMENT	$ 5,600.00	2.86%	$ -	0.00%	$ 2,800.00	1.43%	$ 2,800.00	1.43%
200	EARTHWORK	$ 112,788.56	57.65%	$ -	0.00%	$ 108,930.16	55.68%	$ 108,930.16	55.68%
300	SUB BASE AND BASE COURSE	$ 21,840.00	11.16%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
500	BRIDGE CONSTRUCTION	$ 24,200.00	12.37%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUCTURE	$ 8,340.00	4.26%	$ -	0.00%	$ 2,112.00	1.08%	$ 2,112.00	1.08%
A	TOTAL CONSTRUCTION COST	$ 172,768.56	88.31%	$ -	0.00%	$ 113,842.16	58.19%	$ 113,842.16	58.19%
B	PROFIT AND OVERHEAD 10% X A	$ 17,276.86	8.83%	$ -	0.00%	$ 11,384.22	5.82%	$ 11,384.22	5.82%
C	OVERHEAD	$ 1,750.00	0.89%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
D	TAX 2% X (A+B+C)	$ 3,835.91	1.96%	$ -	0.00%	$ 2,504.53	1.28%	$ 2,504.53	1.28%
E	GRAND TOTAL (A+B+C+D)	$ 195,631.33	100.00%	$ -	0.00%	$ 127,730.91	65.29%	$ 127,730.91	65.29%

Inspesaun Husi :

(Eng. Jaulino H. Rodrigues
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C.S.dos Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU C1 (HA-24)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13).**

No. kontratu : **NCB/219/MOPTC-2016**

Data Inspesaun : 31/05/2023

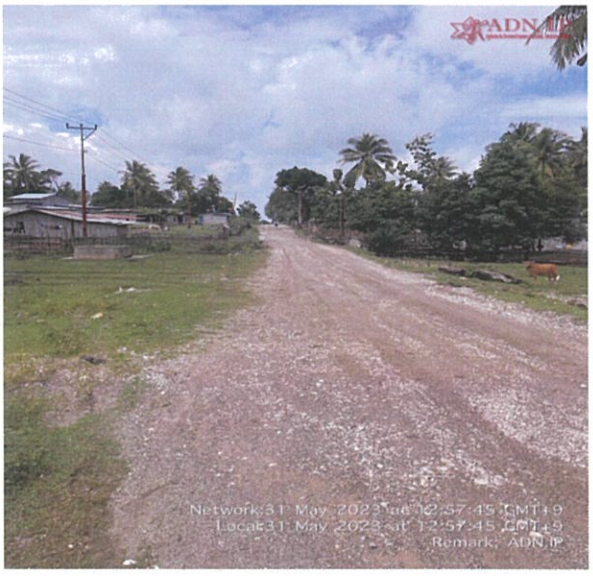
Fatin Inspesaun : Casa – Hatu Udo

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°8'13,374''S, Latetude: 125°32'36,181''E

End Point : Long : - 9°6'3,84''S, Latetude: 125°40'54,588''E

Naran Inspector : 1. Eng. Jaulino H. Rodrigues

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data Companhia sedauk halo servisu iha tereno	 Kondisaun Estrada nebe Parado

ANEXU C1 (HTB-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162

No. kontratu : MPW-190091

Data Inspesaun : 04/05/2023

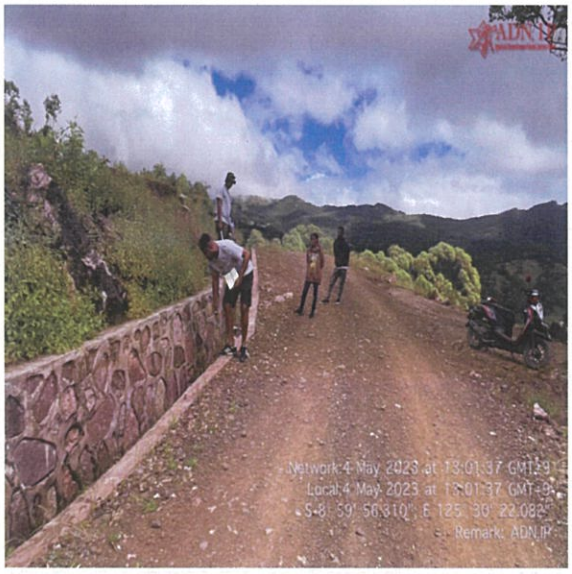
Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'27,798''S Latetude: 125°31'54,408''E

End Point : Long : -8°54'43,776''S Latetude: 125°31'56,1''E

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ispeksaun Pagamento Stone Masonry	

Kondisaun Estrada Suco Liurai - Fatubolico

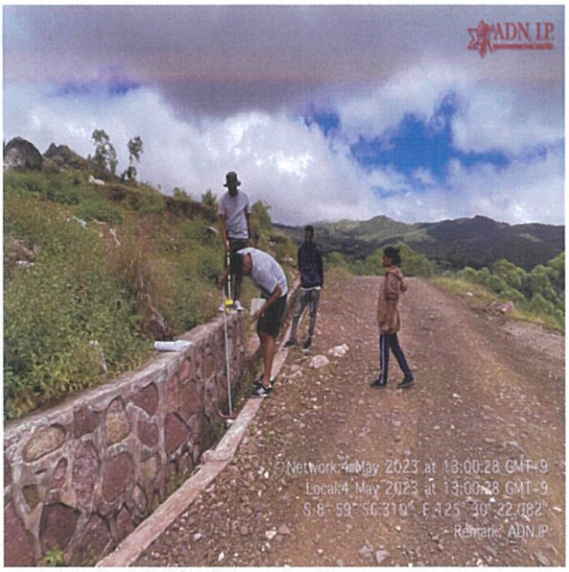
ANEXU C1 (HTB-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162

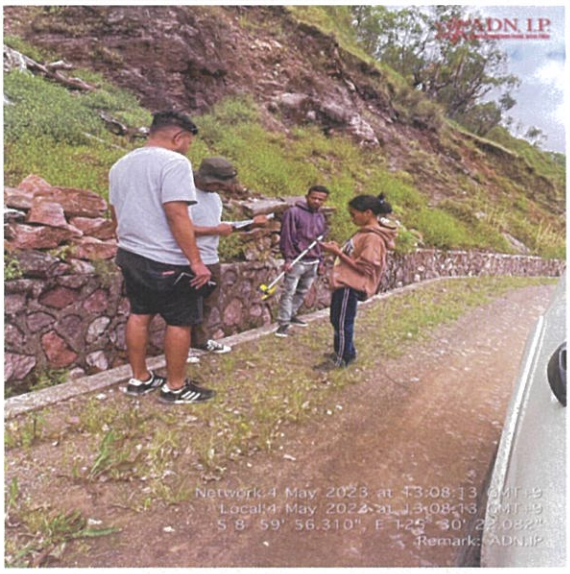
No. kontratu : MPW-190091

Ispeksaun Pagamento Stone Masonry



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ispeksaun Pagamento Stone Masonry

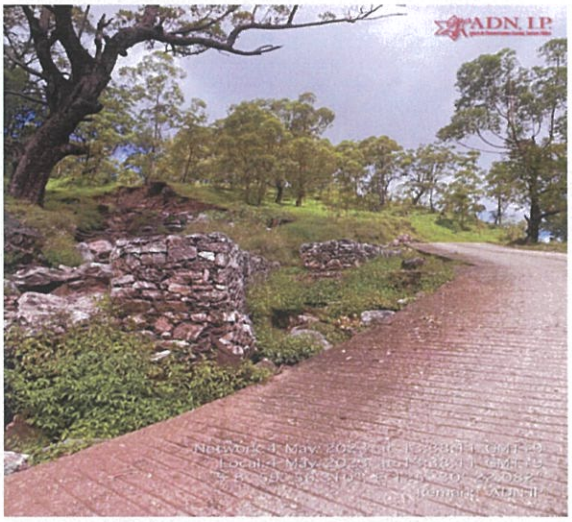


ANEXU C1 (HTB-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162

No. kontratu : MPW-190091

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ispeksaun Pagamento Gabion	
Ispeksaun Pagamento Gabion	

ANEXU C1 (HTB-35)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162

No. kontratu : MPW-190094

Data Inspesaun : 04/05/2023

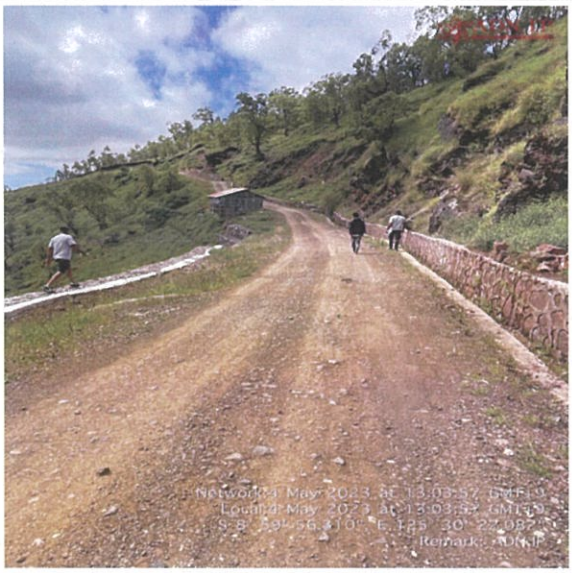
Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'9,42''S Latetude: 125°32'14,91''E

End Point : Long : -8°52'43,776''S Latetude: 125°31'56,1''E

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu parado hela	

ANEXU C1 (HTB-35)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162

No. kontratu : MPW-190094

Projetu parado hela



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu parado hela



ANEXU C1 (MBS-64)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainaro**

No. kontratu : **RFQ-CD-MOP-22006**

Data Inspesaun : 30/05/2023

Fatin Inspesaun : Fleixa Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9 109383 Latetude: 125'664008

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

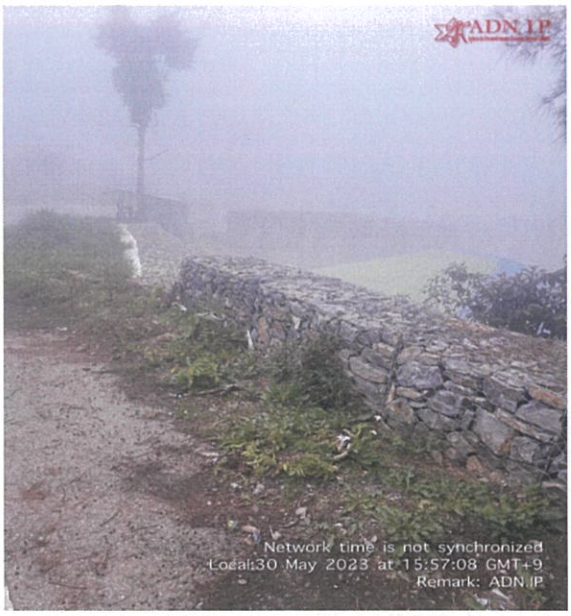
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno
Projeito refere hela 10 %	

ANEXU C1 (MBS-64)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainaro**

No. kontratu : **RFQ-CD-MOP-22006**



ANEXU C1 (MBS-45)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/021/MOP-2019**

Data Inspesaun :**30/05/2023**

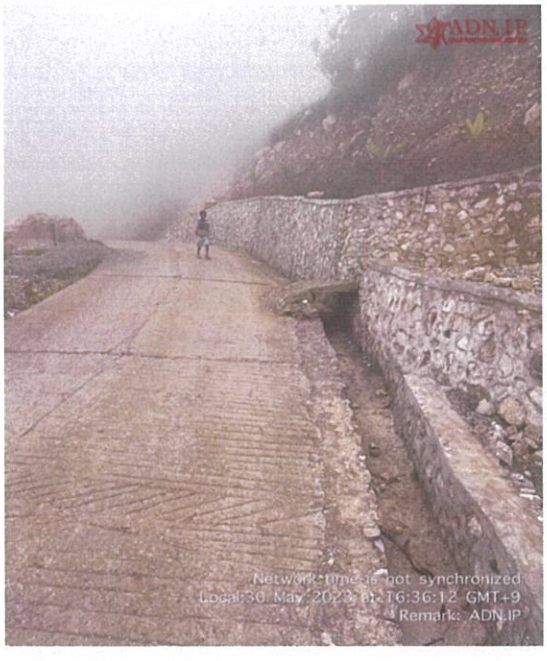
Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8º56'4,044''S, Latetude: 125º35'48,432''E

End Point : Long : - 8º56'19,926''S, Latetude: 125º35'12,066''E

Naran Inspector : **1. Jaulino H. Rodrigues**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere sei parado sei tamba sei halo confirmasaun ho owner ba item servisu iha tereno	

ANEXU C1 (MBS-45)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/021/MOP-2019**

Projetu refere sei parado



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere sei parado



ANEXU C1 (MBS-46)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/022/MOP-2019**

Data Inspesaun :**30/05/2023**

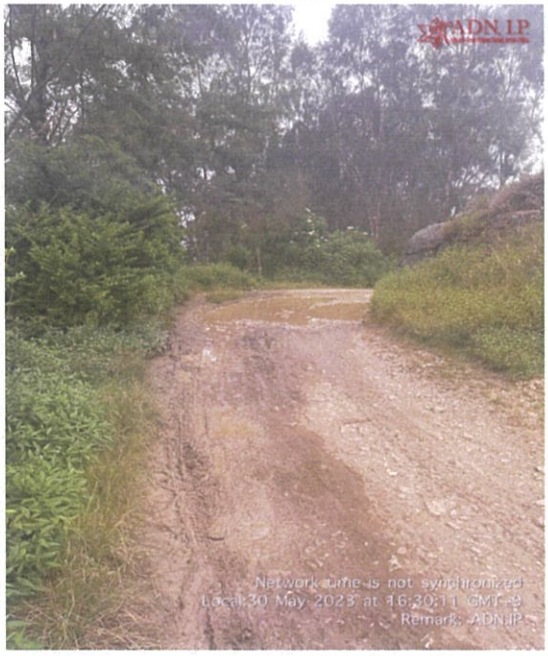
Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'4,044''S, Latetude: 125°35'48,432''E

End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

Naran Inspector : **1. Jaulino H. Rodrigues**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Serevico iha tereno Remata ona	

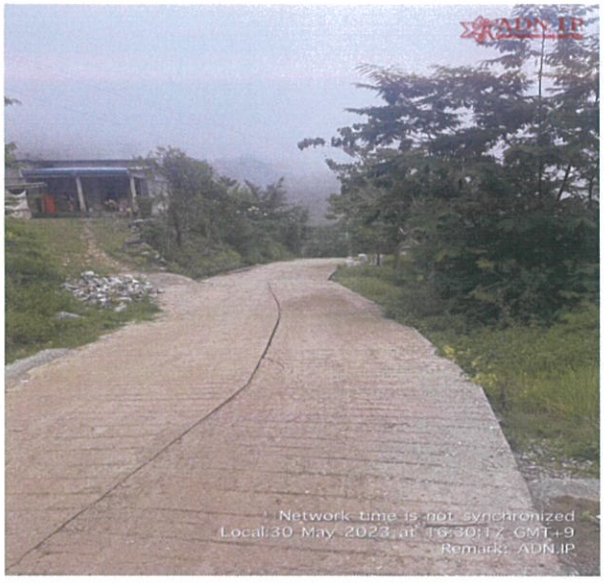
ANEXU C1 (MBS-46)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/022/MOP-2019**

Serevico iha tereno Remata ona



Sketch & Foto Desenho	Saluran Tipe 2

Serevico iha tereno Remata ona



Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **MPW-W-210065**

Data Inspesaun : 30/05/2023

Fatin Inspesaun : Lesuati Mausiga

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servico iha tereno parado hela	

Back-up Data

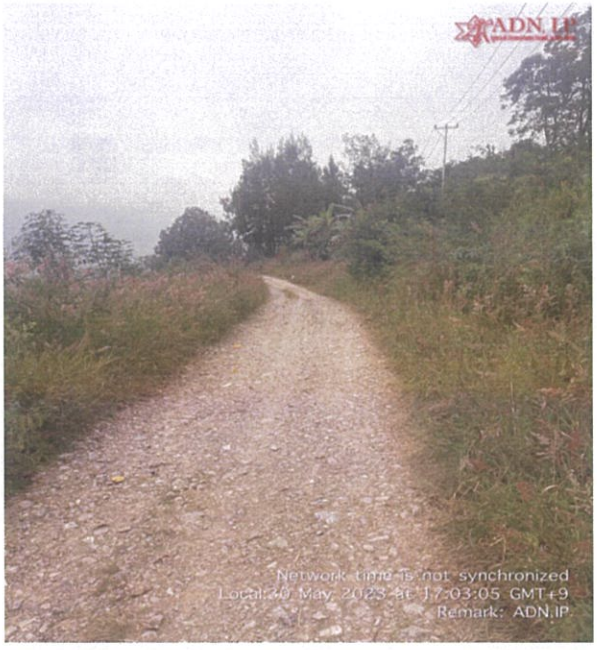
Naran Projeto : **Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **MPW-W-210065**

Servico iha tereno parado hela



Servico iha tereno parado hela



ANEXU C1 (HA-32)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/008/MOP-2021**

Data Inspesaun : 31/05/2023

Fatin Inspesaun : Foho Ailico - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°39'39.12"E, Latetude: 9° 8'48.83"S

End Point : Long : 125°39'19.15"E, Latetude: 9° 9'47.85"S

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projeito refere Parado hela	

ANEXU C1 (HA-32)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/008/MOP-2021**

Projeito refere Parado hela



ANEXU C1 (HA-29)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/005/MOP-2021**

Data Inspesaun : 16/05/2023

Fatin Inspesaun : Foho Ailico - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°39'50.32"E, Latetude: 9° 6'33.41"S

End Point : Long : 125°39'38.96"E, Latetude: 9° 7'18.82"S

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servico ih tereno padado hela	

ANEXU C1 (HA-29)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/005/MOP-2021**



Servico ih tereno padado hela



ANEXU C1 (HA-30)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/006/MOP-2021**

Data Inspesaun : 31/05/2023

Fatin Inspesaun : Foho Ailico - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°39'38.96"E, Latetude: 9° 7'18.82"S

End Point : Long : 125°39'49.62"E, Latetude: 9° 7'49.69"S

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servico ih tereno padado hela	

ANEXU C1 (HA-30)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/006/MOP-2021**

Servico ih tereno padado hela



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico ih tereno padado hela



ANEXU C1 (HA-31)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/007/MOP-2021**

Data Inspesaun : 31/05/2022

Fatin Inspesaun : Foho Ailiko - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°39'49.62"E, Latetude: 9° 7'49.69"S

End Point : Long : 125°39'39.12"E, Latetude: 9° 8'48.83"S

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servico ih tereno padado hela	

ANEXU C1 (HA-31)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico-Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/007/MOP-2021**

Servico ih tereno padado hela



ANEXU C1 (HA-30)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/006/MOP-2021**

Data Inspesaun : 16/05/2023

Fatin Inspesaun : Foho Ailico - Bobe

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°39'38.96"E, Latetude: 9° 7'18.82"S

End Point : Long : 125°39'49.62"E, Latetude: 9° 7'49.69"S

Naran Inspector : 1. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servico ih tereno padado hela	

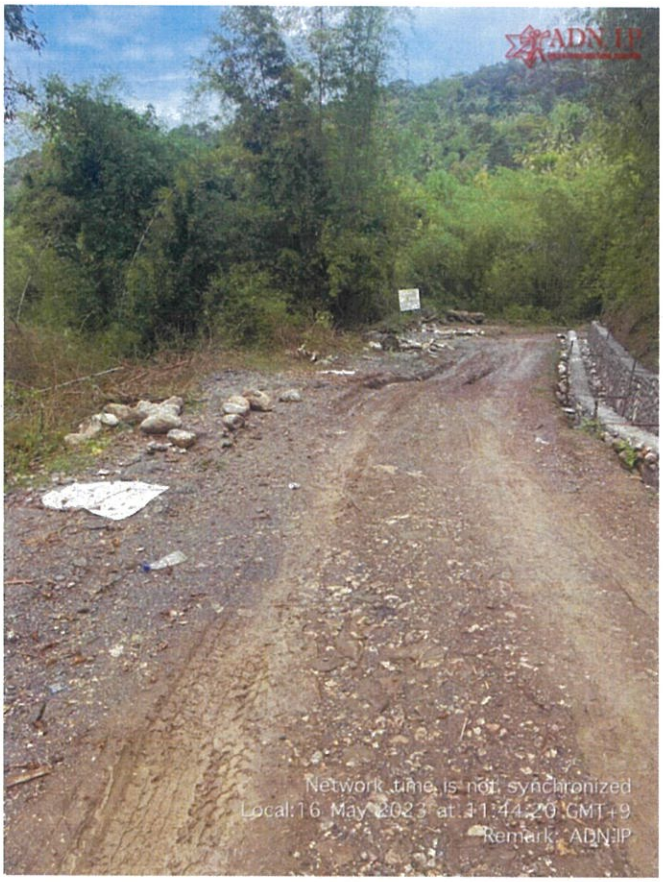
ANEXU C1 (HA-30)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RT/006/MOP-2021**

Servico ih tereno padado hela



MINISTERIO DO PLANO E DOS RECURSOS ESTATAIS, I.P.

ADN, I.P.

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Silvino Domingos Rita Rebelo Soares

Municipio MUNICIPIO AINARO NO POSTOS

2023

MAIO

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS
AINARO VILA (ANV)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	11	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	Simbissa	389/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	13	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	LM-TP	SEFOPE	Plan																																	
							Actual																																	
	16	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2014	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																	
	18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	21	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	LM-CD	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	Plan																																	
							Actual																																	
HATÚDO (HA)	25	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	26	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	27	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	28	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	LM-CD	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
HATUBUILICO (HTB)	39	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	40	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	41	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	42	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	44	Fornesimento Konstrusaun Uma Laku Ramelau	DELONG UNIPESSOAL LDA	RFP	LM-CD	MINISTERIO TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																	
							Actual																																	
MAUBISSE (MBS)	47	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	48	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libutu - Ainaro Municipality	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	49	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	50	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	51	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	57	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	

58	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	
						Actual	
59	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MEJD PKRIE EBF BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	
						Actual	
60	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	
						Actual	
61	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	
						Actual	
62	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	
						Actual	
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan	
						Actual	
TOTAL PROJETO ON-GOING							

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Procesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Silvino D. R. Rebelo Soares)
Eng. Electricidade - ADN - I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN - I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN - I.P
