REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

A.D.N, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

RELATÓRIU MENSÁL IMPLEMENTASAUN PROJETUS MUNISÍPIU LIQUICA

FEVEREIRO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTASAUN PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO LIQUISA FEVEREIRO 2022

Prepara Husi :

(Eng.Juninho Antonio A. Da Cruz)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Liquisa ADN, I.P

(Eng. Marcus Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,Transporte e Irigasaun, Municipio Liquisa ADN, I.P

(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. ba Projeto ME Municipio Liquisa ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, ADN, I.P

(Eng. João Paulo Amaral)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun, ADN, I.P

(Deolindo de Fátima Marques)
Chefe Seksaun ba Projeto M. E & ITC,ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T, M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO 1

I. INTRODUSAUN. 3

1.1 Enkuadramentu Legal. 3

1.2 Perfil Municipio Liquisa 3

1.3 Lista Projecto 7

II. PROGRESU FISIKU 18

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan 18

III OBSTÁKLU IHA TERENU 18

3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu 18

VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU 19

4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu 19

INDICE TABELA

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquisa 5

Tabela 1. 2: Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquisa 5

Tabela 1.3. 1 Projecto Municipio Ermera Por Fundus Financimento 7

Tabela 1.3. 2 Projecto Muncipio Liquisa Por Sectores 10

Tabela 1.3. 3 Projecto Municipio Ermera Por Ministerios 14

Tabela 4. 1 : Dadus populasaun Munisipiu Liquisa 18

I. INTRODUSAUN.

1.1 Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Púbico (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análize kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viavél.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Púbico (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimentu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvimentu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio Liquisa



Mapa hatudu pozisaun Administrasaun Munisipal Liquisa iha luan area 543 km² ho populasaun nain – 63.403 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Liquisa iha Postu Administrativu tolu (3) , Sukus 23 no aldeias 134, mak hanesan hatudu iha Tabela 1

Tabela 1: Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.

Bazartete		Liquisa		Maubara	
sukus	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**
Fahilelo	3	Açumano	4	Gugleur	11
Fatumasi	4	Darulete	4	Guiço	5
Lauhata	5	Dato	10	Lissadila	7
Leorema	10	Hatuquesi	8	Maubaralilssa	5
Maumeta	4	Leotala	5	Vatuboro	5
Metagou	3	Loidahar	4	Vatuvou	10
Motaulun	3	Luculai	4	Vaviquinia	7
Tibar	4	-	-	-	-
Ulmera	9	-	-	-	-
Total	**45**	-	**39**	-	**50**

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 58

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquisa

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Liquisa								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		2				2	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
Total			**3**				**3**	

Tabela 1. 2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquisa

ASSET ADN,IP MUNICIPIO LIQUISA								
No	**Deskrisaun**	**Total Aset Kada Tinan**					**Total**	**OBS**
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**		
1	Edificio		1					
2	Kareta		1					
3	Desktop HP / Monitor		1					
4	Laptop HP		1					
5	Printer Cannon		1					
6	UPS		1					
7	Armario File		1					
8	Armario Tau hena		3					
9	Meja escritorio		1					
10	Meja han		1					
11	Meja TV (kiik)		1					
12	Kadeira escritorio		6					
13	Kadeira han		4					

14	Sofa		1 Set					
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3		3 Set					
16	Jeleira		1					
17	Water Dispenser		1					Aát
18	TV + Parabola		1 Set					
19	AC		4					
20	Kipas Angin		1					
21	Kompor		1					
22	Kompor Gas		1					
23	Rack sepatu		3					
24	Rack Piring		1					
25	Lampu		11					
26	Water Pump Sanyo		0					

1.3 Lista Projecto

Projeto hotu ne'ebe akumula iha lista neé bazeia ba dadus Projeto nebe sei lao hela no mos Projeto nebe abandona ona iha tinan barak nia laran, Projeto hirak ne'e fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projeto Por Fundus Finansiamento, Tabela 1.3.2 Projeto Por Sector no tabela 1.3.3 Projeto Por Ministerio, no lista detalhu kada Projeto bele hare iha #Aneksu A.

Tabela 1.3. 1 Projecto Municipio Liquisa Por Fundus Financiamento

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM (FUNDO COVID + CD + BS + etc..) + PDIM			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EXEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	21	$ 3,278,358.39	$ 2,023,032.82	61.71%
2	LIQUISA VILA	19	$ 4,754,094.17	$ 1,798,117.55	37.82%
3	MAUBARA	16	$ 11,695,117.84	$ 8,082,332.46	69.11%
	Grand Total	**56**	**$19,727,570.40**	**$11,903,482.83**	**60.34%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EXEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	$ 557,358.72	$ 496,949.07	89.16%
2	LIQUISA VILA	4	$ 2,716,690.73	$1,516,050.42	55.81%
3	MAUBARA	5	$10,171,195.89	$7,827,948.46	76.96%
	Grand Total	**11**	**$13,445,245.34**	**$9,840,947.95**	**73.19%**

Dados Detallu Kada Projeto #Anexu A

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FUNDO COVID			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EXEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	4	$ 433,364.88	$256,424.78	59.17%
2	LIQUISA VILA				
3	MAUBARA				
	Grand Total	**4**	**$ 433,364.88**	**$256,424.78**	**59.17%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM -CD			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EXEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	8	$ 1,222,729.07	$ 468,768.51	38.34%
2	LIQUISA VILA	11	$ 1,546,813.46	$ 119,286.47	7.71%
3	MAUBARA	8	$ 1,124,659.99	$ 43,761.73	3.89%
	Grand Total	**27**	**$ 3,894,202.52**	**$ 631,816.71**	**16.22%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EXEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	5	$ 748,001.55	$660,770.70	88.34%
2	LIQUISA VILA	3	$ 313,656.48	$162,780.66	51.90%
3	MAUBARA	1	$ 170,965.65	$ 72,706.50	42.53%
	Grand Total	**9**	**$1,232,623.68**	**$896,257.86**	**72.71%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EXEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	BAZARTETE	2	$ 316,904.17	$140,119.76	44.22%
2	LIQUISA VILA	1	$ 176,933.50		
3	MAUBARA	2	$ 228,296.31	$137,915.77	60.41%
	Grand Total	**5**	**$ 722,133.98**	**$278,035.53**	**38.50%**

Dados Detalho Kada Projeto #anexu A

Tabela 1.3. 2 Projecto Muncipio Liquisa Por Sectores



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	AGRICULTURA	2	$ 91,877.21	$ 67,036.01	72.96%
2	AGUA E SANEAMENTO	3	$ 293,629.77	$ 167,315.56	56.98%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	2	$ 123,438.90		
4	EDUKASAUN	4	$ 569,137.23	$ 302,946.05	53.23%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	$ 1,670,588.86	$ 1,297,809.30	77.69%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO	1	$ 7,693,101.00	$ 5,795,051.15	75.33%
7	ESTRADAS	24	$ 5,012,524.75	$ 1,819,111.23	36.29%
8	FLOOD CONTROL	1	$ 502,473.28	$ 321,707.56	64.02%
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	9	$ 1,733,015.54	$ 1,066,681.96	61.55%
10	PORTOS	1	$ 1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%
11	SAUDE	2	$ 309,925.98	$ 256,424.78	82.74%
12	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 58,107.88	$ 47,623.31	81.96%
13	TURISMO	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	**56**	**$19,727,570.40**	**$11,903,482.83**	**60.34%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

NO	SECTOR	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	AGRICULTURA	2	$ 91,877.21	$ 67,036.01	72.96%
2	AGUA E SANEAMENTO	2	$ 122,664.12	$ 94,609.06	77.13%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	2	$ 123,438.90		
4	EDUKASAUN	2	$ 230,207.52	$ 165,030.28	71.69%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	$ 499,250.84	$ 449,325.76	90.00%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO				
7	ESTRADAS	6	$ 620,770.99	$ 64,558.26	10.40%
8	FLOOD CONTROL	1	$ 502,473.28	$ 321,707.56	64.02%
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	$ 719,641.67	$ 556,717.80	77.36%
10	PORTOS				
11	SAUDE	2	$ 309,925.98	$ 256,424.78	82.74%
12	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 58,107.88	$ 47,623.31	81.96%
13	TURISMO				
	Grand Total	**21**	**$ 3,278,358.39**	**$ 2,023,032.82**	**61.71%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

NO	SECTOR	LIQUISA VILA			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO				
3	EDIFICIOS PUBLICOS				
4	EDUKASAUN	1	$ 167,079.10		
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	$ 869,577.80	$ 630,877.47	72.55%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO				
7	ESTRADAS	9	$ 1,365,759.10		
8	FLOOD CONTROL				
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	6	$ 956,928.17	$ 509,964.16	53.29%
10	PORTOS	1	$ 1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%
11	SAUDE				
12	SEGURANCA NO DEFESA				
13	TURISMO				
	Grand Total	**19**	**$ 4,754,094.17**	**$ 1,798,117.55**	**37.82%**

Dados Detalho Kada Projeto #anexu A

NO	SECTOR	MAUBARA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EZEKUSAUN ($)
1	AGRICULTURA				
2	AGUA E SANEAMENTO	1	$ 170,965.65	$ 72,706.50	42.53%
3	EDIFICIOS PUBLICOS				
4	EDUKASAUN	1	$ 171,850.61	$ 137,915.77	80.25%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	$ 301,760.22	$ 217,606.07	72.11%
6	ESTRADA- IMPRESTIMO	1	$7,693,101.00	$ 5,795,051.15	75.33%
7	ESTRADAS	9	$ 3,025,994.66	$ 1,754,552.97	57.98%
8	FLOOD CONTROL				
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	1	$ 56,445.70	$ -	
10	PORTOS				
11	SAUDE				
12	SEGURANCA NO DEFESA				
13	TURISMO	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	**16**	**$ 11,695,117.84**	**$ 8,082,332.46**	**69.11%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

Tabela 1.3. 3 Projecto Municipio Liquisa Por Ministerios



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	DONO DO PROJETO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN ($)
1	ESTATAL	3	$ 387,568.54		
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	3	$ 139,176.53	$ 104,901.53	75.37%
3	MINISTERIO DA SAUDE	2	$ 123,438.90		
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	38	$16,370,980.54	$10,347,308.55	63.21%
5	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$ 58,107.88	$ 47,623.31	81.96%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	4	$ 569,137.23	$ 302,946.05	53.23%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 99,484.80	$ 82,502.69	82.93%
8	MINISTERIO SAUDE	2	$ 309,925.98	$ 256,424.78	82.74%
9	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	1	$ 1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%
10	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	**56**	**$19,727,570.40**	**$11,903,482.83**	**60.34%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

NO	DONO DO PROJETO	BAZARTETE			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN ($)
1	ESTATAL	1	$ 154,189.34		
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	2	$ 91,877.21	$ 67,036.01	72.96%
3	MINISTERIO DA SAUDE	2	$ 123,438.90		
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	10	$2,211,126.76	$1,404,415.75	63.52%
5	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$ 58,107.88	$ 47,623.31	81.96%
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	$ 230,207.52	$ 165,030.28	71.69%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 99,484.80	$ 82,502.69	82.93%
8	MINISTERIO SAUDE	2	$ 309,925.98	$ 256,424.78	82.74%
9	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN				
10	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
	Grand Total	**21**	**$3,278,358.39**	**$2,023,032.82**	**61.71%**

NO	DONO DO PROJETO	LIQUISA VILA			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAG EM EXEKUSAUN ($)
1	ESTATAL	1	$ 176,933.50		
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	$ 47,299.32	$ 37,865.52	80.06%
3	MINISTERIO DA SAUDE				
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	15	$2,968,032.25	$1,102,976.11	37.16%
5	MINISTERIO DO INTERIOR				
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	$ 167,079.10		
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU				
8	MINISTERIO SAUDE				
9	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	1	$1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%
10	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA				
	Grand Total	**19**	**$4,754,094.17**	**$1,798,117.55**	**37.82%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

NO	DONO DO PROJETO	MAUBARA			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU ($)	MONTANTE EZEKUSAUN ($)	PERCENTAGEM EXEKUSAUN ($)
1	ESTATAL	1	$ 56,445.70		
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS				
3	MINISTERIO DA SAUDE				
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	13	$11,191,821.53	$7,839,916.69	70.05%
5	MINISTERIO DO INTERIOR				
6	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	$ 171,850.61	$ 137,915.77	80.25%
7	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU				
8	MINISTERIO SAUDE				
9	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN				
10	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%
	Grand Total	**16**	**$11,695,117.84**	**$8,082,332.46**	**69.11%**

Dados Detallu Kada Projeto #anexu A

Tabela 4. 1 : Dadus Populasaun Munisipiu Liquisa

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Bazartete	31,983	9,158	9,039	7,089	6,697
Liquiça	25,334	6,978	7,348	5,672	5,337
Maubara	25,234	7,088	6,802	5,766	5,578

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi Progressu servisu nebe kompanha sira atinji iha fulan neé nia laran, husi lista nebe iha #Anexu B hatudu progressu aktual fulan ida neé ho nia persentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento nebe hetan husi progressu fulan ida neé, ikus liu persentagen aktual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativa husi porsento anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detailho bele hare iha #Anexu B, detailhu ba Backup Fotografia #Anexu C1, detalho ba Backup BoQ #Anexu C2 no Instrusaun servisu bele hare #Anexu D

III. OBSTÁKLU IHA TERENU

3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu

Durante iha Fulan ida nia laran, problema nebe ami enjineiru municipio hasoru mak hanesan :

1. Projetu lao tarde
2. Companhia balun servisu la tuir spesifikasaun
3. Companhia balun servisu la iha Site Engineer
4. Difikulidade ba Ekipa ADN M.Liquisa hasoru susar ba Be'e mos

VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu

1. Rekomenda ba Kompanhia sira servisu tuir spesifikasaun nebe iha ona
2. Rekomenda ba Kompanhia sira tenke iha Site Engineer iha terenu

Rekomenda ba ADN.I.P. Nacional liu-liu ba Superior sira hodi hare ba Edificio ADN.I.P.

Note : Assinatura Husi Enjineiru Municipio Liquisa

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Liquisa					
No	**Deskrisaun**	**Identidade**			
		Naran Kompletu e Asinatura	**Nu. ID Card**	**Pozisaun**	**Fotografia**
1	Enjineiru	Juninho António A. Da Cruz	216	Enjineiru EPAS	
		Marcus Ximenes de Araujo	172	Enjineiru ITI	
		Camilio de Jesus	061	Enjineiru METIC	

2	Enjineira	Nencia F.O. do Rêgo	173	Enjineira VEBD	
3	Motorista	Rui Antonio Gaio	029	Motorista	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO A

Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica - Fevereiro 2022

NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESO FISIKU (%)	PROGRESO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJETO	OBSERVASAUN
1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	BAZARTETE	LIQUICA	Mina Petro Leste Unip, Lda	RDTL-11004589	$ 499,250.84		100.00%	90.00%	$ 449,325.76	$ 49,925.08	ABANDONA	
2	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Banir Lema	MPW-W-190097	$ 565,452.33	Aug. 14, 2019	98.46%	98.46%	$ 556,717.80	$ 8,734.53	FHO	Progresio Fisiko 100% e hela pagamento retensaun 10%
3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIO/VIII/2019/02	$ 162,714.83	Aug. 16, 2019	95.68%	86.11%	$ 140,119.76	$ 22,595.07	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
4	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	$ 73,270.51	Sept. 5, 2019	100.00%	88.11%	$ 64,558.26	$ 8,712.25	PHO	Progresu fizikamente 100 % e sei falta pagamento ba retensaun
5	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	$ 23,950.17	Dec. 5, 2019	77.60%	69.84%	$ 16,726.74	$ 7,223.43	ON-GOING	Provezorlamente servisu paradu hela
6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-O-R)	$ 67,492.69	Nov. 10, 2019	41.01%	36.91%	$ 24,910.52	$ 42,582.17	ON-GOING	
7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	$ 23,179.32	Oct. 22, 2019	79.24%	52.23%	$ 12,106.37	$ 11,072.90	ON-GOING	Provezorlamente servisu paradu hela
8	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	SEGURANCA NO DEFESA	BAZARTETE	LIQUICA	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	$ 58,107.88	Nov. 29, 2019	86.27%	81.96%	$ 47,623.31	$ 10,484.57	ON-GOING	
9	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Naesalobu	MAP-P02019:19532	$ 67,927.04	Dec. 5, 2019	82.29	74.06%	$ 50,309.27	$ 17,617.77	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	$ 66,557.90	Oct. 23, 2020	73.90%	66.51%	$ 44,268.56	$ 22,289.34	ON-GOING	ON-GOING
11	New construction of isolation for covid 19 in liquica, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	$ 243,368.08	Oct. 22, 2020	96.86%	87.18%	$ 212,156.22	$ 31,211.86	PHO	Projetu refere hela retensaun (10%) e Fisiku iha Tereno atinji deit 96.86%
12	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM -CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	$ 99,484.80	Sept. 9, 2019	92.14%	82.93%	$ 82,502.69	$ 16,982.11	ON-GOING	Falta retensaun
13	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	FLOOD CONTROL	BAZARTETE	LIQUICA	Sali Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	$ 502,473.28	Sept. 20, 2021	78.22%	64.02%	$ 321,707.56	$ 180,765.72	ON-GOING	ON-GOING
14	Konstrusaun Edifisio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 154,189.34	Aug. 31, 2021	9.33%	0.00%	$ -	$ -	New	
15	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-NCB-R -21030	$ 149,732.87	Oct. 01, 2021	3.14%	0.00%	$ -	$ -	New	
16	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-RFQ - 21017	$ 88,852.44	Oct. 01, 2021	0.43%	0.00%	$ -	$ -	New	
17	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000-7+000, liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatuleo Unip Lda	MPW-W-210144	$ 88,425.80	Oct. 01, 2021	5.01%	0.00%	$ -	$ -	New	
18	Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Craeleki Bercoli Unip,Lda	MPW-W-210145	$ 62,024.04	Oct. 01, 2021	1.53%	0.00%	$ -	$ -	New	
19	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	TM Caileba Unip,Lda	MPW-W-210158	$ 158,465.33	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
20	New Construction of Fence Around for Isolation COVID-19 in Liquica Maumeta, Ministerio da Saude Timor Leste	MINISTERIO DA SAUDE	Fundo Covid	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	Biamali Unipessoal Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233	$ 65,271.32	11/01/2022	9.50%	0.00%	$ -	$ -	New	
21	Supply and installation connection for isolation and laboratorium Building Maumeta Liquica	MINISTERIO DA SAUDE	Fundo Covid	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	ZYC UNIPESSOAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	$ 58,167.58	11/01/2022	6.95%	0.00%	$ -	$ -	New	
22	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	$ 153,851.88	Dec. 5, 2019	95.77%	81.19%	$ 124,915.14	$ 28,936.74	ON-GOING	Servisu iha Tereno remata tiha ona, sei hein kompanha Amenda kontratu nebe mate tiha ona
23	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	$ 1,394,750.00	May 17, 2017	47.12%	47.12%	$ 657,275.92	$ 737,474.08	ON-GOING	
24	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	$ 55,012.05	Aug. 22, 2019	99.91%	99.91%	$ 54,964.83	$ 47.22	FHO	Projetu refere hela retensaun (10%) e Fisiku iha Tereno atinji deit 99.91%

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO A

Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica - Fevereiro 2022

NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESO FISIKU (%)	PROGRESO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJETO	OBSERVASAUN
25	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	$ 71,468.49	Aug. 19, 2019	100%	90.00%	$ 64,321.64	$ 7,146.85	PHO	Projetu ida neé Remata ona, no hela Retensaun 10% e pagamento atinji 100%
26	New Installation MV, LV Line and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	$ 593,093.80	Jan. 6, 2017	92.32%	67.45%	$ 400,036.22	$ 193,057.58	ON-GOING	
27	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	$ 276,484.00	July 6, 2016	92.77%	83.49%	$ 230,841.25	$ 45,642.75	ON-GOING	
28	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	$ 452,362.93	Dec. 20, 2019	76.44%	50.38%	$ 227,897.03	$ 224,465.90	ON-GOING	
29	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Banir Lema Unip,Lda	RDTL 0000	$ 47,299.32	Aug. 18,2021	88.95%	80.06%	$ 37,865.52	$ 9,433.80	ON-GOING	
30	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 176,933.50	Aug. 31, 2021	3.83%	0.00%	$ -	$ -	New	
31	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21025	$ 131,219.62	Oct. 01, 2021	1.16%	0.00%	$ -	$ -	New	
32	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MOP - CD - NCB-R - 21036	$ 123,631.72	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
33	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou - Aibenu Chainage 0+000-7+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	MOP - CD - NCB -R - 21038	$ 238,739.71	Oct. 01, 2021	9.90%	0.00%	$ -	$ -	New	
34	R4D Rural Road Spot Improvement Dato - Liodahar Chainage 0+000-12+300, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Luqueli Oan Unipessoal Lda	MOP-CD-NCB-R - 21039	$ 188,589.13	Oct. 01, 2021	2.19%	0.00%	$ -	$ -	New	
35	R4D Rural Road Spot Improvement Aibeno - Asumanu - Leorema Chainage 5+000 - 10 +000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Caiulu, Unip Lda	MOP - CD - NCB -R - 21035	$ 162,215.27	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
36	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Aibeno - Asumanu - Leorema Chainage 0+000 - 5+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Vicaroman, Unip Lda	MOP - CD NCB - R - 21034	$ 165,363.43	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
37	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu - Laberlaka Chainage 2+500-5+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Claridade Unip,Lda	MPW-W-210163	$ 167,071.89	Oct. 01, 2021	0.93%	0.00%	$ -	$ -	New	
38	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Craeleki Bercoli, Unip Lda	MPW-W-210143	$ 76,423.05	Oct. 01, 2021	0.37%	0.00%	$ -	$ -	New	
39	Projeitu Konstrusaun foun ESG publico 01 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM -CD	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Roman Furak Unip,Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	$ 167,079.10	Nov. 1, 2021	9.60%	0.00%	$ -	$ -	New	
40	Roads Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (A03)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Chantel Chander Unipessoal Lda	MPW-W-210202	$ 112,505.28	13/12/2021	1.01%				New	
41	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Fu Unip,Lda	RDTL - 0000	$ 13,000.00	Jan. 1, 2016	0.00	0.00%	$ -	$ 13,000.00		
42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	$ 288,760.22	July 6, 2016	83.73%	75.36%	$ 217,606.07	$ 71,154.15	ON-GOING	
43	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	$ 1,901,334.67	Sept. 7, 2017	99.98%	89.98%	$ 1,710,791.24	$ 190,543.43	ON-GOING	
44	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	$ 275,000.00	Dec. 27, 2016	40.00	38.00%	$ 104,500.00	$ 170,500.00	ON-GOING	
45	Novo Konstrusaun Edificio ESTV Lisadila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	$ 171,850.61	Aug. 16, 2019	89.17%	80. 25%	$ 137,915.77	$ 33,934.84	ON-GOING	
46	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	MAUBARA	LIQUICA	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	$ 170,965.65	Jan. 3, 2019	54.99%	42.53%	$ 72,706.50	$ 98,259.15	ON-GOING	Provizoriamente paradu hela
47	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	MAUBARA	LIQUICA	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	$ 7,693,101.00	May 3, 2017	75.33%	75.33%	$ 5,795,051.15	$ 1,898,049.85	ON-GOING	

#ANEXO A

Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica - Fevereiro 2022

NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESO FISIKU (%)	PROGRESO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJETO	OBSERVASAUN
48	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-190098	$ 50,702.59	Aug. 28, 2019	95.90%	86.31%	$ 43,761.73	$ 6,940.86	ON-GOING	
49	Konstrusaun Moru Haleu no Posto Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Rafio Unip. Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	$ 56,445.70	July 21, 2021	16.32%	0.00%	$ -	$ -	New	
50	R4D Rural Road Spot Improvement Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Rito - Pu, Unipessoal,Lda	MOP -CD-RFQ - 21013	$ 67,382.23	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
51	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Malibo, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21033	$ 152,622.90	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
52	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Nheu, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21027	$ 173,484.62	Oct. 01, 2021	11.69%	0.00%	$ -	$ -	New	
53	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Murak, Unipessoal Lda	MPW-W-210157	$ 153,049.65	Oct. 01, 2021	2.49%	0.00%	$ -	$ -	New	
54	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Meta Loe Crae Bau Unip,Lda	MPW-W-210160	$ 198,698.25	Oct. 01, 2021	1.67%	0.00%	$ -	$ -	New	
55	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo -Gisu Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Nazico Unip Lda	MPW-W-210152	$ 114,789.50	Oct. 01, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ -	New	
56	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-210161	$ 213,930.25	Oct. 01, 2021	0.71%	0.00%	$ -	$ -	New	
	TOTAL								$ 19,727,570.40				$ 11,903,482.83	60.34%		

PREPARA HUSI,

(Eng. Marcus Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projetu Infrastutura Transporte e Irigasaun, ADN,I.P

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Eng. ba Edificio Publiku Agua e Saneamento, ADN,I.P

(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. Mekanikal Electrikal ADN,I.P

SERTIFIKA HUSI,

(Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO B

PROGRESSU FISIKU FULAN FEVEREIRO MUNICIPIO LIQUICA

					LOKALIZASAUN PROJETO					Feb-22		
NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Commulative Progress (%)
1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema - Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	BAZARTETE	LIQUICA	Mina Petro Leste Unip, Lda	RDTL-11004589	$ 499,250.84			
2	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Banir Lema	MPW-W-190097	$ 565,452.33	98.46%	0.00%	98.46%
3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	$ 162,714.83			
4	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	$ 73,270.51			
5	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	$ 23,950.17			
6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUKASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	$ 67,492.69			
7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	$ 23,179.32			
8	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	SEGURANCA NO DEFESA	BAZARTETE	LIQUICA	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	$ 58,107.88			
9	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE	LIQUICA	Naesalobu	MAP-P02019:19532	$ 67,927.04			
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	FUNDO COVID	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Queson SO Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	$ 66,557.90			
11	New construction of isolation for covid 19 in liquica, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	FUNDO COVID	SAUDE	BAZARTETE	LIQUICA	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	$ 243,368.08			
12	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM -CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	$ 99,484.80			
13	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	FLOOD CONTROL	BAZARTETE	LIQUICA	Sali Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	$ 502,473.28	73.02%	5.20%	78.22%
14	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE	LIQUICA	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 154,189.34			
15	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-NCB-R -21030	$ 149,732.87		3.14%	3.14%
16	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-RFQ - 21017	$ 88,852.44		0.43%	0.43%
17	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000-7+000, liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Hatuleo Unip Lda	MPW-W-210144	$ 88,425.80		5.01%	5.01%
18	Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	Craeleki Bercoli Unip,Lda	MPW-W-210145	$ 62,024.04		1.53%	1.53%
19	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE	LIQUICA	TM Calleba Unip,Lda	MPW-W-210158	$ 158,465.33			
20	New Construction of Fence Around for Isolation COVID-19 in Liquica Maumeta, Ministerio da Saude Timor Leste	MINISTERIO DA SAUDE	Fundo Covid	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	Biamali Unipessoal Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233	$ 65,271.32		9.50%	9.50%
21	Supply and Installation connection for Isolation and laboratorium Building Maumeta Liquica	MINISTERIO DA SAUDE	Fundo Covid	EDIFICIOS PUBLICOS	BAZARTETE	LIQUICA	ZYC UNIPESSOAL LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	$ 58,167.58		6.95%	6.95%
22	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	$ 153,851.88	95.23%	0.54%	95.77%
23	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA	LIQUICA	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	$ 1,394,750.00			
24	R4D Rural Road Periodic Maintenance Albenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loldahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	$ 55,012.05	99.91%	0.00%	99.91%

25	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Albenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taitabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	$ 71,468.49	100.00%	0.00%	100.00%
26	New Installation MV, LV Line and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	$ 593,093.80	91.66%	0.66%	92.32%
27	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	$ 276,484.00			
28	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	$ 452,362.93			
29	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Banir Lema Unip,Lda	RDTL 0000	$ 47,299.32			
30	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 176,933.50			
31	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-2+500, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Goubara, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21025	$ 131,219.62		1.16%	1.16%
32	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Taitabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MOP - CD - NCB-R - 21036	$ 123,631.72			
33	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Metaqou - Albenu Chainage 0+000-7+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	MOP - CD - NCB -R - 21038	$ 238,739.71		9.90%	9.90%
34	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Dato - Liodahar Chainage 0+000-12+300, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Luqueii Oan Unipessoal Lda	MOP-CD-NCB-R - 21039	$ 188,589.13	1.46%	0.73%	2.19%
35	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Albenu - Asumanu - Leurema Chainage 5+000 - 10 +000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Caiulu, Unip Lda	MOP - CD - NCB -R - 21035	$ 162,215.27			
36	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Albenu - Asumanu - Leurema Chainage 0+000 - 5+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Vicaroman, Unip Lda	MOP - CD NCB - R - 21034	$ 165,363.43			
37	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu - Laberlaka Chainage 2+500-5+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Claridade Unip,Lda	MPW-W-210163	$ 167,071.89		0.93%	0.93%
38	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Craeleki Bercoli, Unip Lda	MPW-W-210143	$ 76,423.05		0.37%	0.37%
39	Projeitu Konstrusaun foun ESG publico 01 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM -CD	EDUKASAUN	LIQUICA VILA	LIQUICA	Roman Furak Unip,Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	$ 167,079.099	5.28%	4.32%	9.60%
40	Roads Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (A03)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	LIQUICA VILA	LIQUICA	Chanel Chander Unipessoal Lda	MPW-W-210202	$ 112,505.280		1.01%	1.01%
41	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Fu Unip,Lda	RDTL - 0000	$ 13,000.00			
42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	$ 288,760.22			
43	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Montana Dlak Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	$ 1,901,334.67			
44	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	$ 275,000.00			
45	Novo Konstrusaun Edificio ESTV Lisadila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	$ 171,850.61			
46	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	MAUBARA	LIQUICA	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	$ 170,965.65			
47	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	MAUBARA	LIQUICA	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	$ 7,693,101.00			
48	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-190098	$ 50,702.59			
49	Konstrusaun Moru Haleu no Posto Siguransa ba Edificio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	MAUBARA	LIQUICA	Rafio Unip. Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	$ 56,445.70			
50	R4D Rural Road Spot Improvement Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Rito - Pu, Unipessoal,Lda	MOP -CD-RFQ - 21013	$ 67,382.23			
51	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Malibo, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21033	$ 152,622.90			
52	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Nheu, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21027	$ 173,484.62		11.69%	11.69%
53	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA	LIQUICA	Murak, Unipessoal Lda	MOP - CD- NCB-R- 21032	$ 153,049.65		2.49%	2.49%
54	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA/ MBR14	LIQUICA	Meta Loe Crae Bau Unip,Lda	MPW-W-210160	$ 198,698.25		1.67%	1.67%

55	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo -Cisu Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA/ MBR15	LIQUICA	Nazico Unip Lda	MPW-W-210152	$ 114,789.50			
56	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA/ MBR16	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-210161	$ 213,930.25		0.71%	0.71%

INSPEKSAUN HUSI,

(Eng. Marcos de Araujo Ximenes)
Engineru ba Projetu Infrastrutura Transporte
e Irigasaun ADN,I.P

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Engineru ba Edificio Publiku Agua e
Saneamento ADN,I.P

Camilo de Jesus
Engineru ba Projetu Mekanikal
e Elektrikal ADN,I.P

VERIFIKA HUSI,

(Eng. Joao Paulo Amaral)
Engineru Senior ba Projetu Infrastutura Transporte e Irigasaun ADN,I.P

(Arq. Francisco Xavier D D. Jeronimo)
Engineru Senior ba Projetu Edificio Publiko
no Bee Saneamento ADN,I.P

(Eng. Deolindo de Fatima Marques)
Chefe Seksaun Mekanikal
e Elektrikal & ITC ADN,I.P

SERTIFIKA HUSI,

(Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun
de Qualidade, ADN,I.P

#ANEXU C1 – (BZT10)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste
Kompania : Queson SQ Unip. Lda.
No. kontratu : MS-DNA-RBK-20-178

Data Inspesaun : 09 Fevereiru 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 33. 253''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 20' 31. 637''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz


2. .....

3. .....

4. .....


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Projeitu Konstrusaun Laboratorium ba Covid-19 iha Liquica, obra husi Ministeriu Saude no kaer husi kompania Queson SQ Lda. Nia tempu ba Retensaun nian liu tiha ona tan nee ekipa tekniku sira mai halo inspesaun ba projeitu refere.

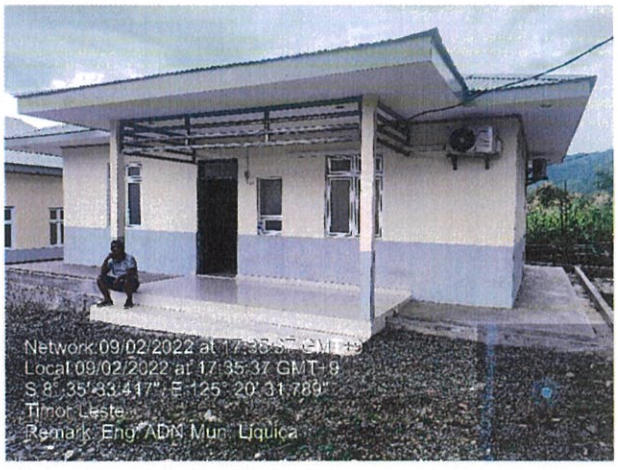

#ANEXU C1 – (BZT10)
Back-up Data


Naran Projeto : New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste
Kompania : Queson SQ Unip. Lda.
No. kontratu : MS-DNA-RBK-20-178

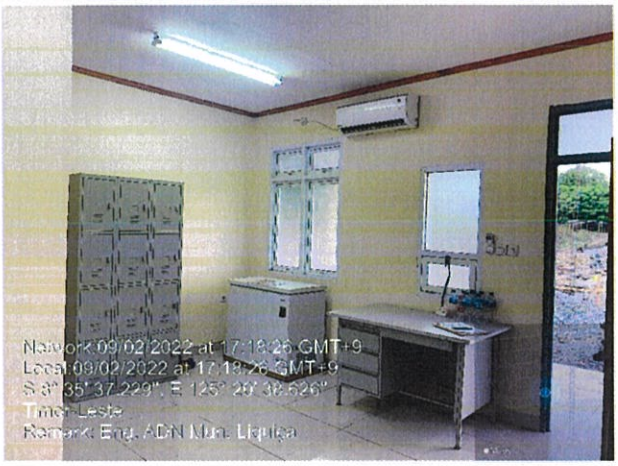
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projeitu refere seidauk halao pagamentu final ba 100% nian tanba sei iha servisu balu neebe kompania seidauk foti desizaun atu hadia ka buka solusaun iha terenu, maibe tanba tempu retensaun nian liu ona, projeitu nain no ekipa sira halo deit inspesaun.	

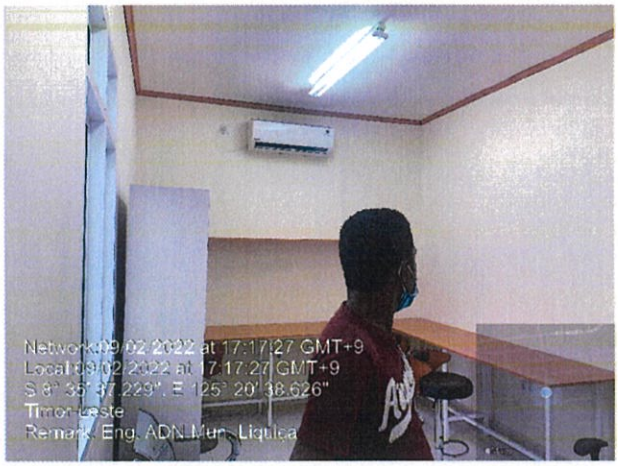Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Iha buat balu neebe kompania presija hadia molok tama ba FHO, no antes ida nee kompania mos tenki buka maneira oinsa hodi bele buka tempu hamutuk ho Laboratorium ADN, IP atu halo hammer test ba servisu betaun sira.	

#ANEXU C1 – (BZT10)
Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste
Kompania : Queson SQ Unip. Lda.
No. kontratu : MS-DNA-RBK-20-178

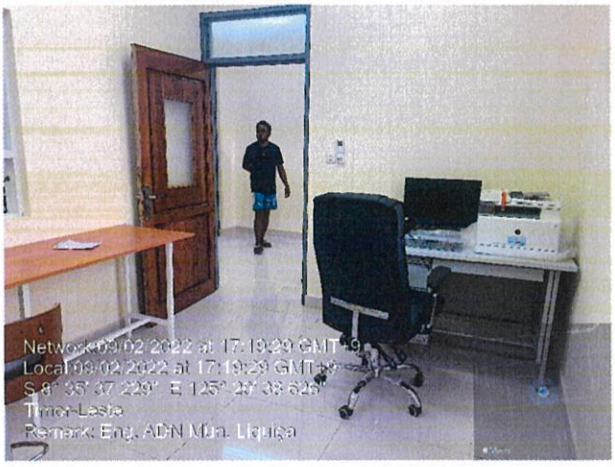Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu kiik seluk neebe kompania presija hadia mak hanesan; tinta uma, accessories odamatan balu neebe seidauk implementa, lis plafon, lantai apron no prepara breakdown ba item provisional sum atu submete.	

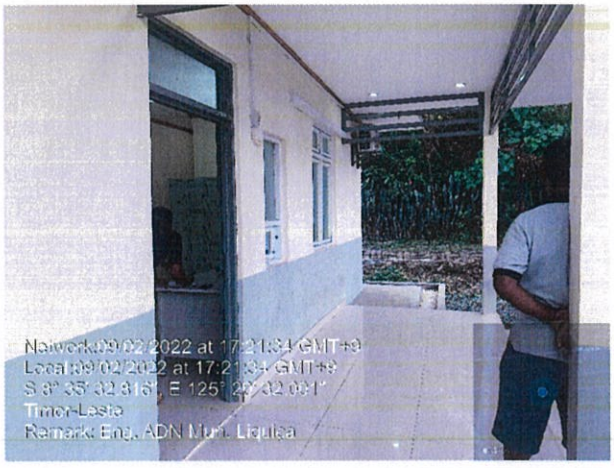Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

#ANEXU D - (BZT10)


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste

Kompanha : Queson SQ Unipessoal Lda

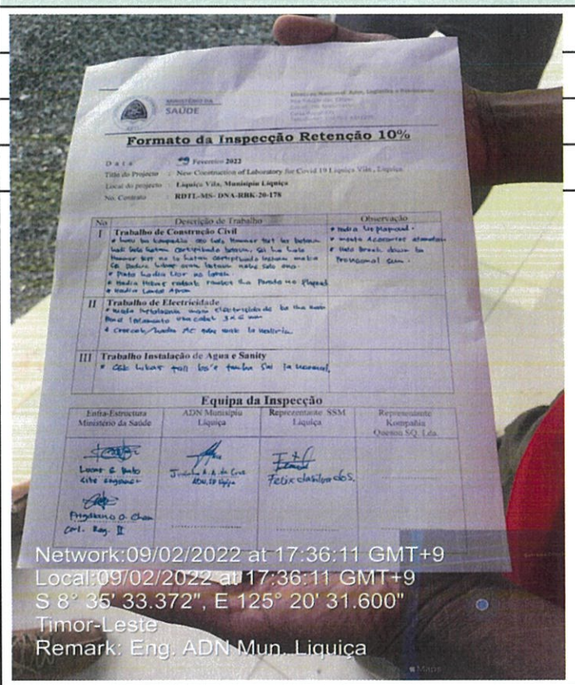No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	9/02/2022	Maumeta, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (BZT21)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Data Inspesaun : 09 Fevereiru 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 33. 072''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 20' 28. 881''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa ADN, IP munisipiu Likisa halao inspesaun dahuluk ba projeitu Foun Konstrusaun Moru Haleu ba Isolamentu Covid 19 iha Liquica, obra husi Ministeriu Saude husi fundu Covid no kaer husi kompania Biamali Unip. Lda.	

#ANEXU C1 – (BZT21)
Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Wainhira ekipa ADN, IP Likisa halao inspesaun projeitu refere halao tiha ona kuaze semana rua, tanba seidauk iha informasaun no kompania mos foin hatoo sira nia pedidu inspesaun no hatama sira nia kopia kontratu ekipa foin bele lao ba hare projeitu refere.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Durante nee ekipa tekniku husi projeitu nain mak halao hela monitorizasaun ba servisu, no dadaun nee servisu hada pondasi kuaze remata ona no komesa ona ba servisu monta besi ba sloof nian.	

#ANEXU C1 – (BZT21)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

#ANEXU C1 – (BZT21)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Data Inspesaun : 17 Fevereiru 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 33. 072''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 20' 28. 881''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa ADN, IP munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu Foun Konstrusaun Moru Haleu ba Isolamentu Covid 19 iha Liquica, obra husi Ministeriu Saude husi fundu Covid no kaer husi kompania Biamali Unip. Lda.	

#ANEXU C1 – (BZT21)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tanba kompania foin hatama karta teste ba iha Laboratorium Nasional no sei hein rezultadu husi amostra betaun sloof nian, tekniku kompania akompania deit badain sira servisu kontinua monta bekisting no tahu beton iha terenu.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

#ANEXU C1 – (BZT21)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 – (BZT21)
Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Data Inspesaun : 25 Fevereiru 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 33. 072''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 20' 28. 881''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz


2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Ekipa ADN, IP munisipiu Likisa no tekniku Laboratorium ADN, IP hamutuk ho tekniku projeitu nain no tekniku Laboratorium Nasional akompania foti amostra betaun sloof nian ba projeitu Foun Konstrusaun Moru Haleu ba Isolamentu Covid 19 iha Liquica no kaer husi kompania Biamali Unip. Lda.

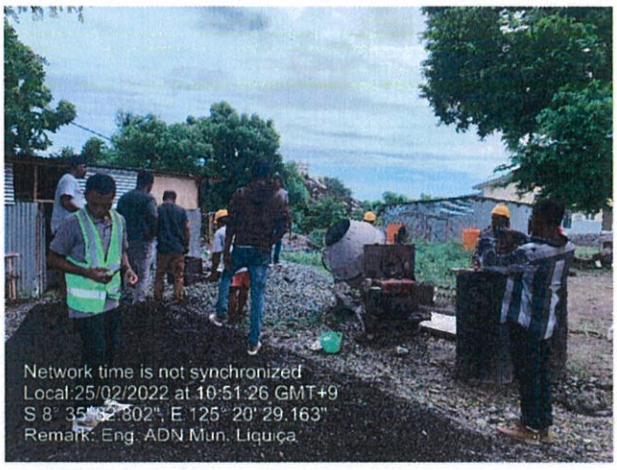

#ANEXU C1 – (BZT21)
Back-up Data

Naran Projeto Liquica : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Komposisi ba amostra betaun sloof nian teste husi Laboratorium Nasional no ekipa tekniku Laboratorium ADN, IP foti ona amostra ba loron 7, 14 no 28 nian atu bele hetan rezultadu.	

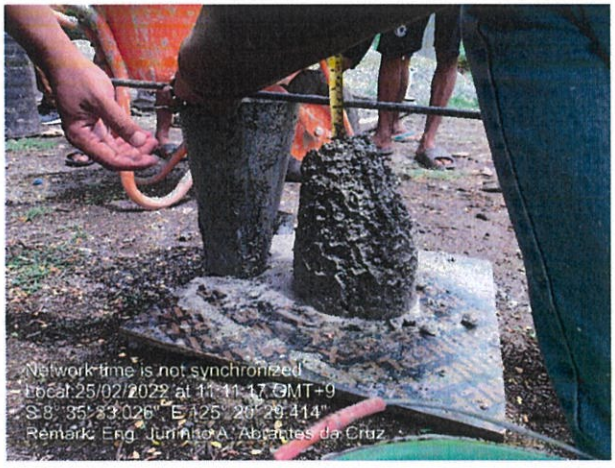Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Rezultadu neebe hetan iha terenu ba slump test nian maka 6 – 7 cm. Husi campuran neebe tuir komposisi Laboratorium Nasional nian. Tanba ho kondisaun udan kompania tenki kontrola deit kuantidade bee nian.	

#ANEXU C1 – (BZT21)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

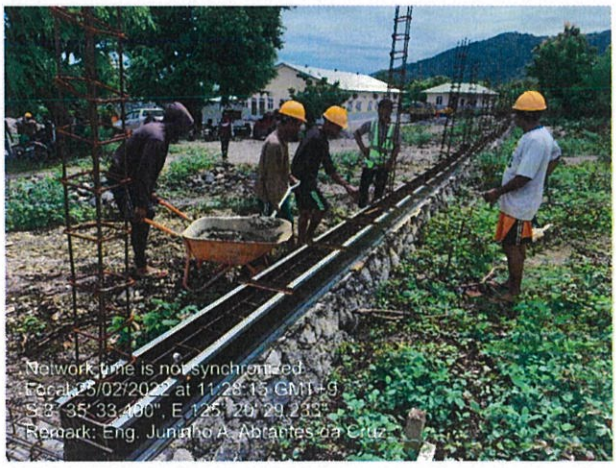Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tuir orden servisu husi ekipa Laboratorium sira hatoo ba kompania katak iha loron Segunda kompania sei lori hikas amostra sira neebe iha terenu atu ba hatama iha Laboratorium ida-idak nian atu too loron bele hasai rezultadu.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

#ANEXU C1 – (BZT21)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica
Kompania : Biamali Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT TITLE : NEW CONSTRUCTION FENCE AROUND FOR ISOLATION COVID-19
LOCATION : MAUMETA - LIQUICA MUNICIPALITY - TIMOR LESTE
PROJECT OWNER : MINISTRY OF HEALTH

SUMMARY

# ANEXU C2 - (BZT 21)			VERIFIED BY A D N , I P									
No	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	PROGRESU IHA TERENU				PREVIOUS BILLING	%	THIS BILLING	%	TOTAL TO DATE	%
			FULAN KOTUK	%	FULAN NEE	%						
I	PREPARATION WORKS	$ 2,255.00	$ -	0.00%	$ 1,127.50	1.73%					$ 1,127.50	1.73%
II	FUNDATION WORKS	$ 11,000.46	$ -	0.00%	$ 4,398.51	6.74%					$ 4,398.51	6.74%
III	CONCRETE WORKS	$ 15,907.15	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
IV	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	$ 15,764.38	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
V	OTHER WORKS	$ 1,312.60	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
VI	PAINTING WORKS	$ 3,380.40	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
VII	FINAL CLEARING	$ 100.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%					$ -	0.00%
A	**GRAND TOTAL**	**$ 49,719.99**	**$ -**	**0.00%**	**$ 5,526.01**	**8.47%**					**$ 5,526.01**	**8.47%**
B	**FEE CONTRACTOR (10% x A)**	**$ 4,972.00**	**$ -**	**0.00%**	**$ 552.60**	**0.85%**					**$ 552.60**	**0.85%**
C	**OVERHEAD**	**$ 4,425.00**	**$ -**	**0.00%**	**$ -**	**0.00%**					**$ -**	**0.00%**
D	**TAX (2% x(A+B+C)**	**$ 1,182.34**	**$ -**	**0.00%**	**$ 121.57**	**0.19%**					**$ 121.57**	**0.19%**
E	**CONTIGENCY**	**$ 4,972.00**	**$ -**	**0.00%**	**$ -**	**0.00%**					**$ -**	**0.00%**
F	**TOTAL PROJECT COST (A +B + C + D + E)**	**$ 65,271.32**	**$ -**	**0.00%**	**$ 6,200.19**	**9.50%**					**$ 6,200.19**	**9.50%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu
Edificio Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT21)



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction of Fence Around for Isolation Covid-19 in Liquica Maumeta

Kompanha : Biamali Unipessoal Lda

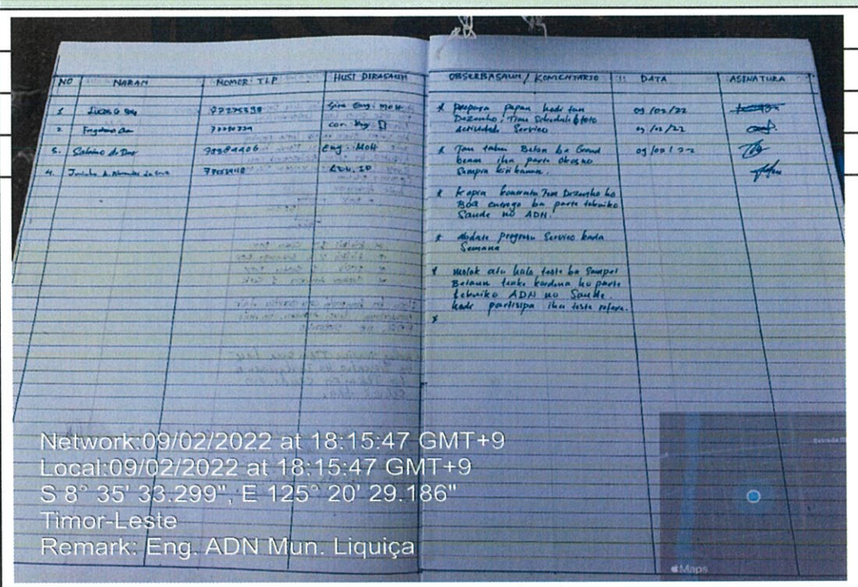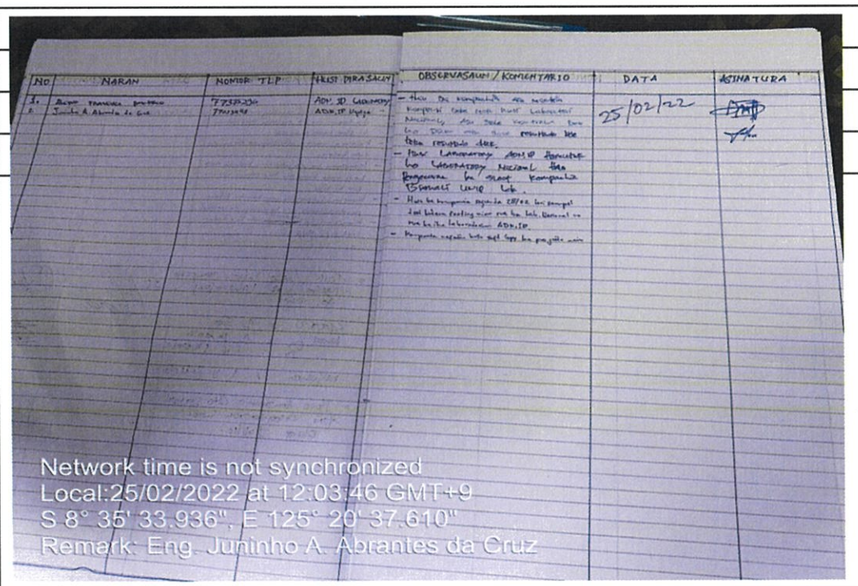No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	9/02/2022	Maumeta, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		
II	25/02/2022	Maumeta, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Data Inspesaun : 09 Fevereiru 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 33. 307''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 20' 30. 962''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun dahuluk ba projeitu Foun Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building iha Liquica, obra husi Ministeriu Saude husi fundu Covid no kaer husi kompania Zyc Unip. Lda.



#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Wainhira ekipa ADN, IP Likisa halao inspesaun projeitu refere halao tiha ona kuaze semana ida ho balu, tanba seidauk iha informasaun no kompania mos foin hatoo sira nia pedidu inspesaun no hatama sira nia kopia kontratu ekipa foin bele lao ba hare projeitu refere.	


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba servisu pemadatan nian tanba kompania bou ka fakar sae deit rai fila fali ekipa tekniku ADN, IP haruka ona kompania atu hasai fila fali rai no halo pemadatan kada 20cm husi tanah dasar mak sae ba.	

#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

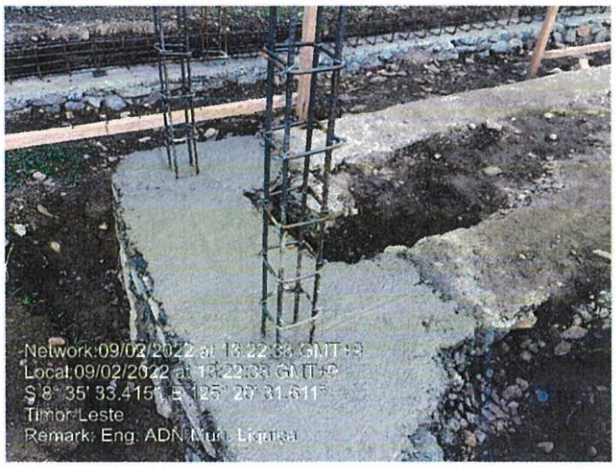

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Data Inspesaun : 15 Fevereiru 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 33. 307''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 20' 30. 962''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekipa ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu Foun Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building iha Liquica, obra husi Ministeriu Saude husi fundu Covid no kaer husi kompania Zyc Unip. Lda.



#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Kompania servisu ona pemadatan tanah tuir instrusaun neebe ekipa tekniku husi ADN, IP no tekniku projeitu nain hatoo, atu halo servisu pemadatan kada 20cm husi tanah dasar bangunan uja stamper no kontrolu bee.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ba servisu kesi besi sloof beam no kolom nian mos kuaze hotu ona, no kompania nafatin kontrolu nia diametru no tuir nafatin design neebe iha ona iha dezeniu.	

#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Data Inspesaun : 17 Fevereiru 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 33. 307''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 20' 30. 962''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa ADN, IP Munisipiu Likisa halao inspesaun ba projeitu Foun Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building iha Liquica, obra husi Ministeriu Saude husi fundu Covid no kaer husi kompania Zyc Unip. Lda.	

#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Kompania servisu hotu ona pemadatan tanah nian, no kompania kontinua ba servisu monta bekisting ba sloof beam nian no prepara kesi selimut beton (2cm) ba iha besi sloof molok halao pengecoran.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Iha terenu kompania mos prepara ona stock ba servisu odamatan nian tuir design iha dezeniu uja besi hollow 30x30, no wainhira kompania sei hein rezultadu teste betaun ba amostra sloof nian kompania kontinua hela servisu besi odamtan nian.	

#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Data Inspesaun : 25 Fevereiru 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta – Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 33. 307''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 20' 30. 962''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....


4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Ekipa ADN, IP Munisipiu Likisa kordena ho tekniku Laboratorium ADN, IP ho tekniku projeitu nain no tekniku Laboratorium Nasional halao servisu pengecoran sloof ba projeitu Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building iha Liquica kaer husi kompania Zyc Unip. Lda.	

#ANEXU C1 – (BZT22)

Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

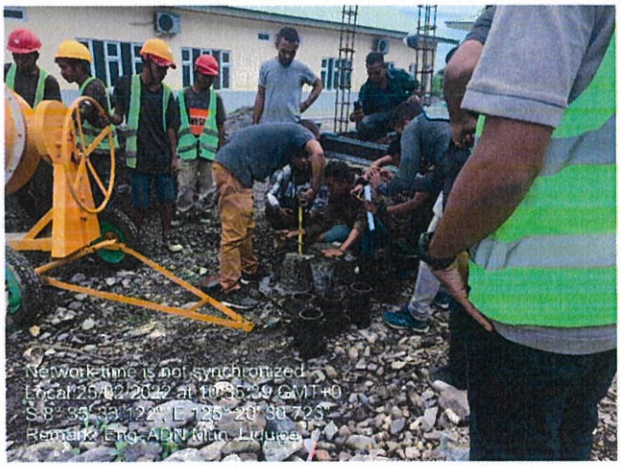Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tanba iha muda husi orariu ituan husi kompania no karta neebe kompania hatoo mai iha ADN, IP tarde, ekipa Laboratorium ADN, IP seidauk hetan despasiu ba servisu pengecoran ida nee no kordena ona ho ekipa Laboratorium Nasional atu akompania deit sira foti amostra.	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tanba komposisi campuran beton nee hasai husi Laboratorium Nasional, ekipa tekniku Laboratorium ADN, IP mos sei akompania wainhira amostra ba sloof nian halo teste iha Laboratorium Nasional tuir loron neebe termina ona atu halao teste, ba loron 7, 14 no 28.	

#ANEXU C1 – (BZT22)


Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

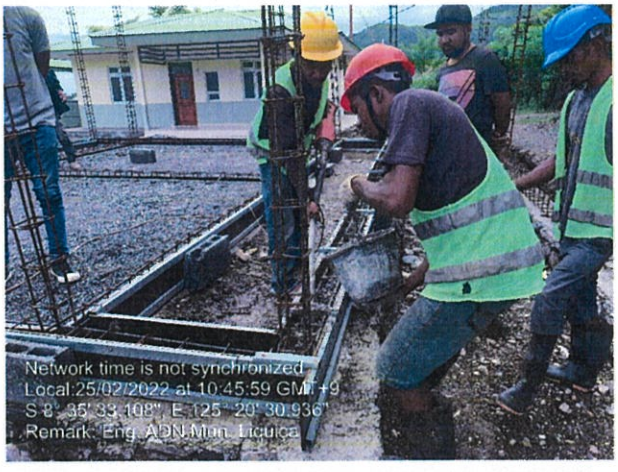


#ANEXU C1 – (BZT22)


Back-up Data

Naran Projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Kompania : Zyc Unip. Lda.
No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

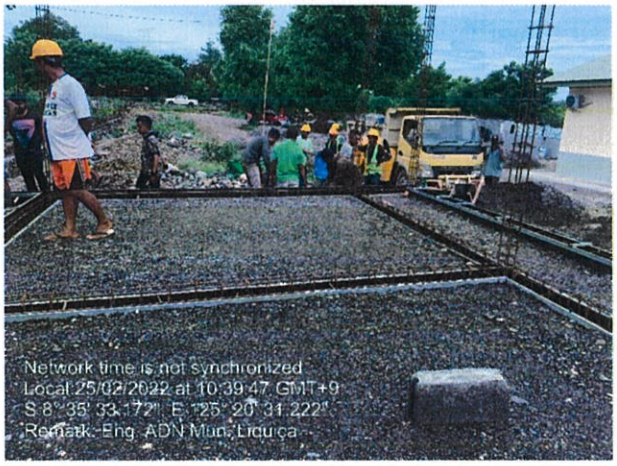

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

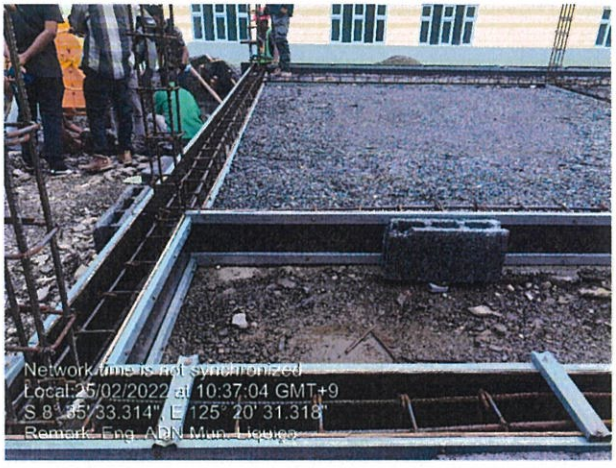

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Project Name : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica
Location : Liquica Municipality - Timor Leste
Project Owner : Ministry of Health

#ANEXU C2 - (BZT22)				VERIFIED BY A D N , I P							
NO	DESCRIPTION	Amount (USD)		PREVIOUS	% BILLED	THIS BILLING	% BILLED	TO DATE	% BILLED	PROGRESU IHA TERENU	% BILLED
I	PREPARATION WORKS	$	4,200.00							$ 2,100.00	3.61%
II	NEW INSTALLATION LOW VOLTAGE (LV) LINE	$	1,044.00							$ -	0.00%
III	MAIN CONNECTION TO ISOLATION INCLUDE PROVIDE GENSET	$	22,726.44							$ -	0.00%
IV	CONSTRUCTION HOUSE FOR GENSET	$	15,040.67							$ 1,504.07	2.59%
V	FINAL CLEARING	$	1,000.00							$ -	0.00%
A	GRAND TOTAL	$	44,011.11							$ 3,604.07	6.20%
B	Fee Contractor(10% x A)	$	4,401.11							$ 360.41	0.62%
C	Overhead	$	4,300.00							$ -	0.00%
D	TAX 2% x (A + B + C)	$	1,054.24							$ 79.29	0.14%
E	CONTIGENCY (10% x A)	$	4,401.11							$ -	0.00%
F	TOTAL PROJECT COST (A + B + C + D + E)	$	58,167.58							$ 4,043.75	6.95%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edificio Publiku, Be'e e Saneamentu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P.

#ANEXU D - (BZT22)



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Supply and Installation Connection for Isolation and Laboratorium Building Maumeta Liquica

Kompanha : Zyc Unipessoal Lda

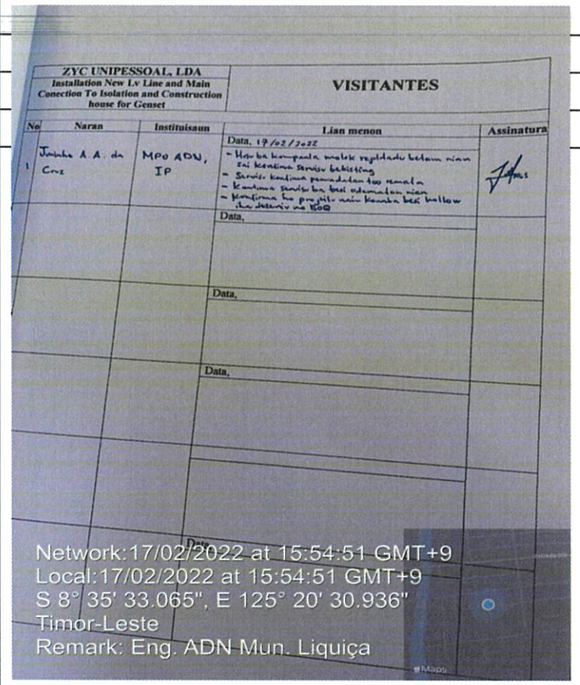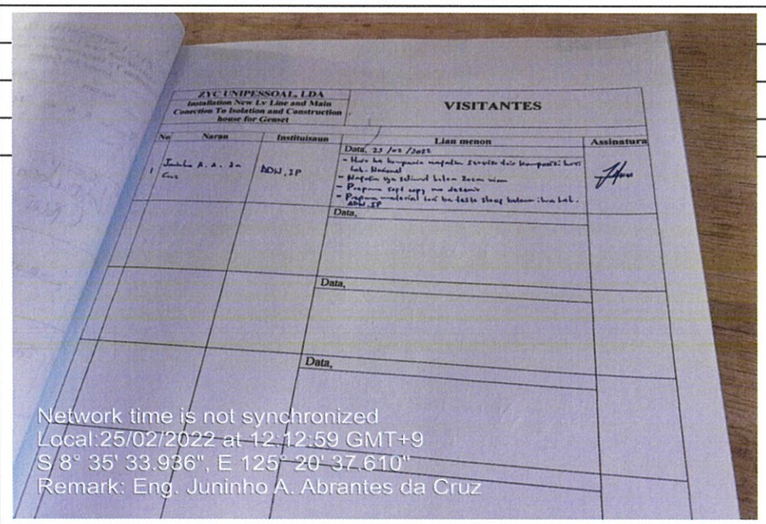No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	17/02/2022	Maumeta, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		
II	25/02/2022	Maumeta, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Likisa	1 2 3 4 5		

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : 03 Fevereiro 2022

Fatin Inspesaun : Dato, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.35'21.273"S, Latetude : .....


End Point : Long : 125.20'1.933"E, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

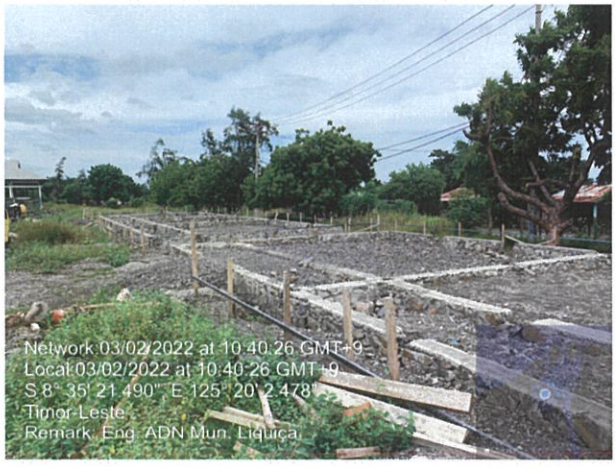Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Tuir badain hirak neebe mak iha terenu servisu paradu hela durante nee tanba iha problema kiikoan ida husi parte kompania nian, no oras nee daudaun kompania no projeitu nain tenta hela atu buka solusaun hamutuk.	

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : 23 Fevereiro 2022

Fatin Inspesaun : Dato, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.35'21.273"S, Latetude : .....

End Point : Long : 125.20'1.933"E, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu iha terenu hahuu fali ona no kompania hahuu fila fali stock material ba servisu kontinuasaun nian iha terenu no hetan aprovasaun ona husi projeitu nain.	

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Material besi neebe uja ba sloof design iha BoQ maka besi ulir diametru 12mm no kompania stock ona iha terenu no komesa kesi ona ho diametru/jarak kada 15cm.	


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Servisu ba pemadatan tanah halo kada 20cm husi tanah dasar mos atu besik finaliza ona tanba durante servisu seluk paradu iha badain balu mak servisu kontinua iha terenu.	

#ANEXU C1 – (LV20)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica**
Kompania : **Roman Furak Unip. Lda.**
No. kontratu : **NCB:16/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Fatin ba pembuangan haris fatin/WC nian mos servisu ona no kompania stock ona pipa neebe sei uja ba pembuangan husi rai okos ba haris fatin nian.	

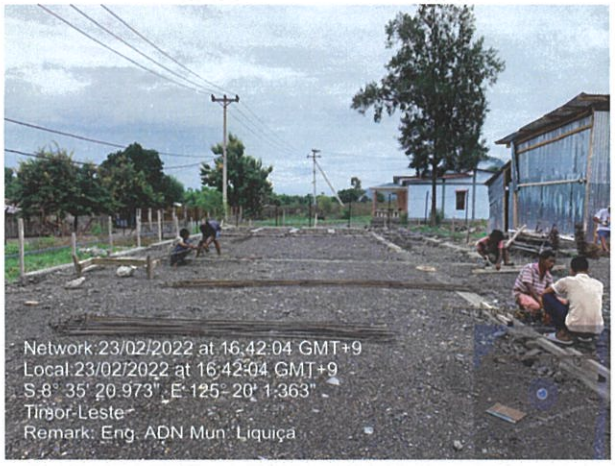Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

SUMMARY

Naran Projeitu : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA SECUNDÁRIA GERAL LIQUIÇA
Fatin Projeitu : CAIMEO VILA, SUCO DATO
Projeitu Nain : MINISTERÍO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

ANEXU C2 - (LV20)			VERIFIED BY A D N , I P										
NO.	WORK DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	PREVIOUS	BILLED (%)	THIS BILLING	BILLED (%)	TO DATE	BILLED (%)	PROGRESU IHA TERENU				BILLED (%)
									Fulan Kotuk	%	Fulan Ida Nee	%	
I	PRELIMINARIES	$ 2,870.00							$ 1,435.00	0.86%	$ -	0.00%	0.86%
II	CLASSROOM BUILDING C	$ 53,423.84							$ 2,671.19	1.60%	$ 2,671.19	1.60%	3.20%
III	CLASSROOM BUILDING CB	$ 75,136.99							$ 3,756.85	2.25%	$ 3,756.85	2.25%	4.50%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	$ 13,000.00							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
A	CONSTRUCTION COST	$ 144,430.83							$ 7,863.04	4.71%	$ 6,428.04	3.85%	8.55%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	$ 14,443.08							$ 786.30	0.47%	$ 642.80	0.38%	0.86%
C	OVERHEAD	$ 4,930.00							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
D	TAX (2% x (A+B+C))	$ 3,276.08							$ 172.99	0.10%	$ 141.42	0.08%	0.19%
E	CONTIGENCY	$ -							$ -	0.00%	$ -	0.00%	0.00%
F	TOTAL COST (A+B+C+D)	$ 167,079.99							$ 8,822.33	5.28%	$ 7,212.26	4.32%	9.60%

Inspeksaun Husi :

Eng, Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifisiu Publiku Agua Saneamentu, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineer ba Projeitu
Edificio Publiku Agua Saneamento
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ
ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV20)



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran Projeitu: Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica

Kompanha : ROMAN FURAK Unip. Lda.

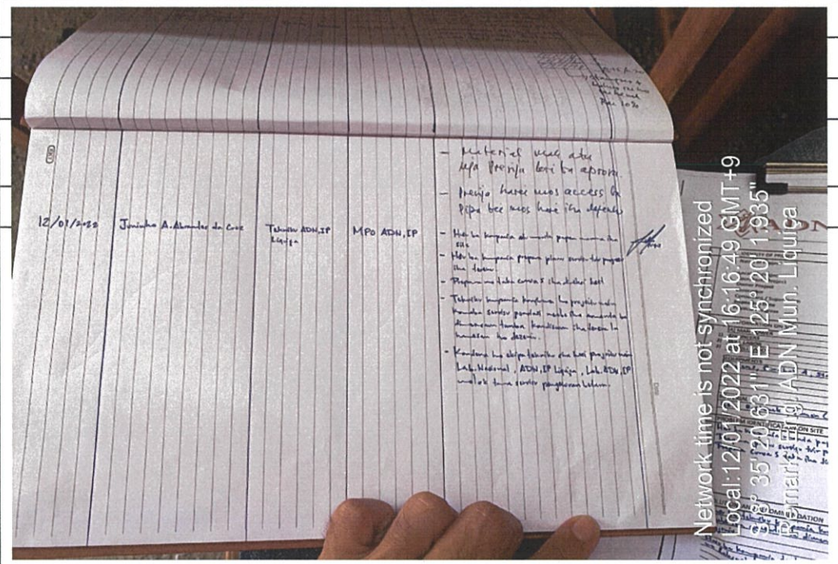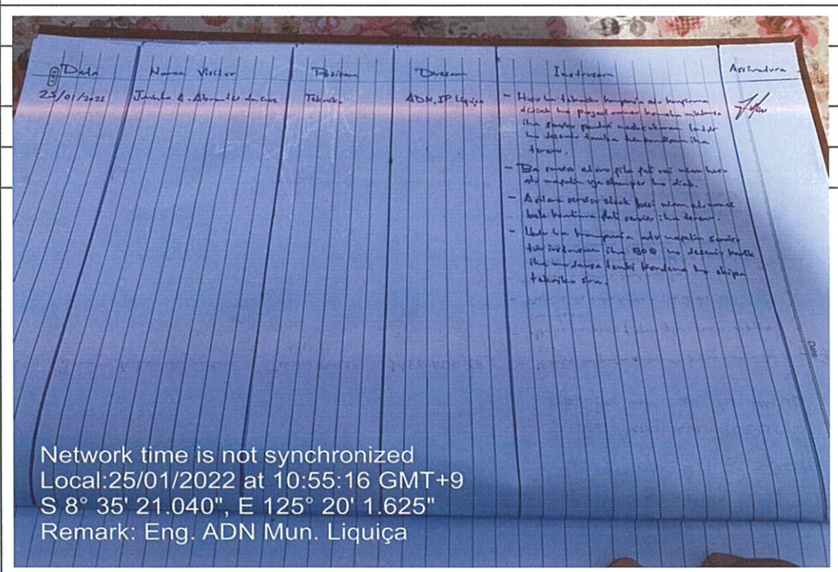No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	12/01/2022	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquica	1 2 3 4 5 6		
II	25/01/2022	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquica	1 2 3 4 5		

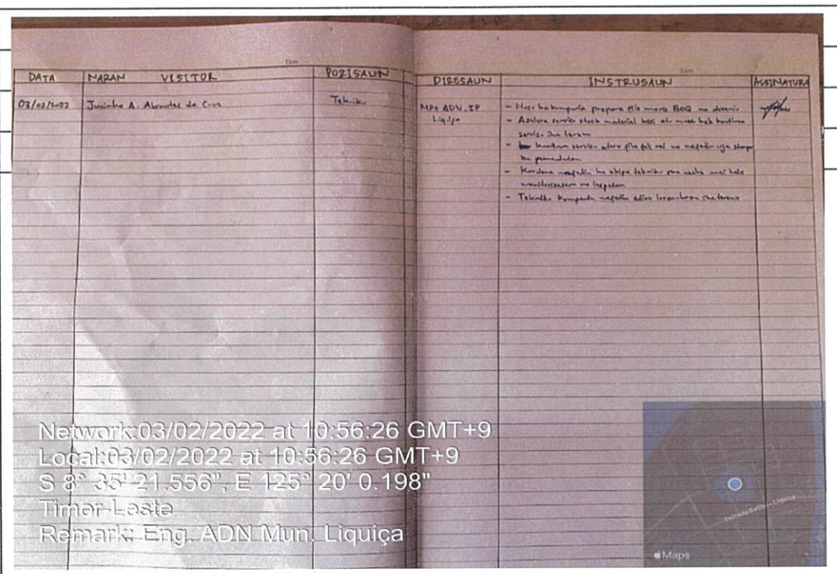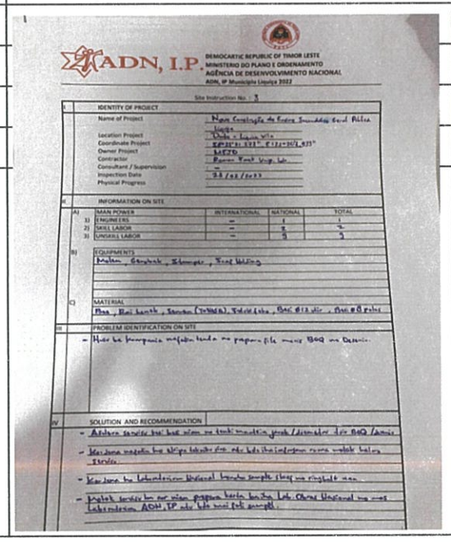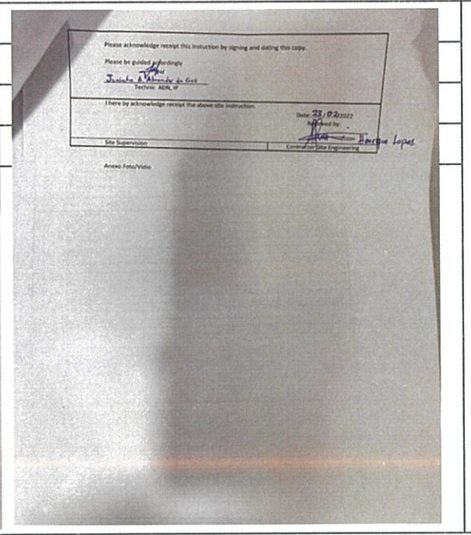III	3/02/2022	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquica	1 2 3 4 5		
IV	23/02/2022	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN, IP Liquica	1 2 3 4 5	 	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	**Juninho António Abrantes da Cruz**
Municipio	**MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS**

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Fevereiro 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	OBS
Liquica Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda.	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	2	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	Nheu Unip. Lda.	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	3	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	Goubara Unip. Lda.	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	4	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Raelti Unip. Lda.	RT/034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)	Luqueli Oan Unip. Lda.	MPW-W-210150	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu Chainage 5+000-10+000)	Cailu Unip. Lda.	MPW-W-210154	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leorema Chainage 0+000-5+000)	Vicaroman Unip. Lda.	MPW-W-210155	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)	Metalika Unip. Lda.	MPW-W-210151	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700)	Prudencia Construction Unip. Lda.	MPW-W-210153	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	10	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	Banir Lema Unip. Lda.		LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																													
							Actual																													
	10	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)	Goubara Unip. Lda.	MPW-W-210162	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 2+500-5+400)	Claridade Unip. Lda.			MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba- Lukulai Chainage 0+000-2+000)	Craeleki Bercoli Unip. Lda.		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	13				LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	14	Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica	Ronan Furak Unip. Lda.	NCB:16/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													Iha loron 2 fulan nee la ba inspesaun tanba sei iha Nasional foti planu no lista projeitu, iha loron 7-9-14-16-21 fulan nee la ba inspesaun tanba projeitu paradu hela no kontinua fali servisu iha loron 23 fulan nee
							Actual																													
Maubara (MBR)	1	Addt. Poste liga Maubara	Fu Unip. Lda.		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	2	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	Montana Diak Unip. Lda.	SSS/126/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	3	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	Aleni Unip. Lda.	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													La halao inspesaun iha fulan nee tanba asesu estrada ladiak
							Actual																													
	4	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	5	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500	Luliana Unip. Lda.	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200)	Nheu Unip. Lda.	MPW-W-210164	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-2+000) Liquica Municipality	Rito-Pu Unip. Lda.	MPW-W-210146	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 4+800-9+600)	Malibo Unip. Lda.	MPW-W-210156	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 0+000-4+800)	Murak Unip. Lda.	MPW-W-210157	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	10	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 8+400-12+500)	Meta Loe Crae Bau Unip. Lda.		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo-Gisu Chainage 0+000-2+000)	Nazico Unip. Lda.		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	Luliana Unip. Lda.		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	1	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	Banir Lema Unip. Lda.	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	2	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda.	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													PHO
							Actual																													
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Laco Dato Unip. Lda.	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	4	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda.	RDTL-MAP-PO2019:19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																													Parado
							Actual																													
	5	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip. Lda.	(RFQ:19/029-Q-R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																													Parado
							Actual																													
	6	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unip. Lda.	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Parado
							Actual																													

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Juninho António Abrantes da Cruz

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Fevereiro 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	OBS
BAZARTETE (BZT)	7	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	Holuli Unip. Lda.	SSS/054/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan																													PHO
							Actual																													
	8	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	Naesalobu Unip. Lda.	MAP-P02019:19532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																													Pagamentu seidauk 100%
							Actual																													
	9	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unip. Lda.	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													Pagamentu seidauk 100%
							Actual																													
	10	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Senizu Unip. Lda.	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													PHO
							Actual																													
	11	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	Tinocya Unip. Lda.	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																													PHO
							Actual																													
	12	Emergency Project For Tibar River	Sali-Magu Unip. Lda.	RT/067/MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000)	Hatumeta Oan Unip. Lda.	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	14	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Fatumasi Chainage 0+000-2+300) Liquica Municipality	Hatumeta Oan Unip. Lda.	MPW-W-210142	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality	Hatuleo Unip. Lda.	MPW-W-210144	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	16	Routine Maintenance Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000-10+000	Craeleki Bercoli Unip. Lda.		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	17	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 3+000-6+500) Liquica Municipality	TM.Caileba Unip. Lda.		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													
							Actual																													
	18	New Construction Fence Around for Isolation Covid 19 in Maumeta Liquica	Biamali Unip. Lda.	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-233	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													Foun
							Actual																													
	19	Installation New LV Line and Main Connection to Isolation and Laboratorium Building	Zyc Unip. Lda.	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-228	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													Foun
							Actual																													
TOTAL PROJETO ON-GOING																																				

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu | Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili | Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu | Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng. Juninho António Abrantes da Cruz)
Eng. ba Projeto Edificio Publico Agua e Saneamento ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN, I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN, I.P

ANEXO C1 (BZT2)

Back-up Data

Naran Projeto	:	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica
No. kontratu	:	MPW-W-190097

Data Inspeksaun : 15/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Maumeta-Metagou

Koordinat :

Start Point :	Long :	125°20"29,76	Latetude	: - 8°35"42,414
End Point :	Long :	125°22'58,65	Latetude	: - 8°37'47,591

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Lokaliza iha Suco Maumeta - Metagou Inspeksaun ba Pagamentu Retensaun 10% iha terreno no buat hotu diak,iha parte balun mak at maibe ADN.I.P M.Liquica rekomenda ona ba kompanhia hodi hadia ona.	

Sketch Item servisu : Lokaliza iha Suco Maumeta - Metagou Inspeksaun ba Pagamentu Retensaun 10% iha terreno no buat hotu diak,iha parte balun mak at hanesan anexo iha fotografia ne'e hatudu katak plum concrete nakfera hela maibe ADN.I.P M.Liquica rekomenda ona ba kompanhia hodi hadia ona, no fotografia anexo.	 

Name of Roads :Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0 + 000 - 3 + 000 & Periodic Maintanance Maumeta - Metagou Sta 0 + 000 - 7 + 000 in Liquica Municipality

Contract No : MPW-W-190097
Contractor : Banirlema Unipessoal. Lda

#ANEXU C2 - (BZT2)				SUMMARY						
NO	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT	REVISED CONTRACT	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.			
				PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	TO DATE	%
1	General	$ 23,568.19	$ 2,550.00	$ 1,450.00	$ 1,100.00	$ 2,550.00	$ 1,450.00	$ 1,100.00	$ 2,550.00	0.45%
2	Drainage	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
3	Earth work	$ 37,430.41	$ 36,360.40	$ 14,594.32	$ 18,321.84	$ 32,916.17	$ 14,594.32	$ 17,190.64	$ 31,784.96	5.62%
4	Sub-base, base and pavement	$ 8,051.93	$ 4,025.96	$ -	$ 4,019.17	$ 4,019.17	$ -	$ 4,019.17	$ 4,019.17	0.71%
5	Bituminous Pavement	$ 27,691.20	$ 2,564.00	$ -	$ 453.19	$ 453.19	$ -	$ 453.19	$ 453.19	0.08%
6	Structures	$ 343,331.13	$ 398,502.49	$ 242,197.33	$ 155,998.69	$ 398,196.01	$ 242,197.32	$ 155,957.16	$ 398,154.48	70.41%
7	Day Works	$ 660.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
8	Routine maintenance	$ 14,730.00	$ 12,270.00	$ 9,890.00	$ 2,380.00	$ 12,270.00	$ 9,890.00	$ 2,380.00	$ 12,270.00	2.17%
9	General Experenses	$ 5,698.00	$ 5,698.00	$ 5,233.00	$ 370.00	$ 5,603.00	$ 5,233.00	$ 370.00	$ 5,603.00	0.99%
10	Provisional Sum	$ 810.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
Total - net cost		**$ 461,970.86**	**$ 461,970.86**	**$ 273,364.65**	**$ 182,642.88**	**$ 456,007.54**	**$ 273,364.64**	**$ 181,470.16**	**$ 436,961.80**	**80.44%**
Profit (net cost x %) ; 10%		**$ 46,197.09**	**$ 46,197.09**	**$ 27,336.47**	**$ 18,264.29**	**$ 45,600.75**	**$ 27,336.46**	**$ 18,147.02**	**$ 45,483.48**	**8.04%**
Overheads (supervision and risk) net cost x % ; 10%		**$ 46,197.09**	**$ 46,197.09**	**$ 27,336.47**	**$ 18,264.29**	**$ 45,600.75**	**$ 27,336.46**	**$ 18,147.02**	**$ 45,483.48**	**8.04%**
Tax (net cost + profit + overhead) x 2 %)		**$ 11,087.30**	**$ 11,087.30**	**$ 6,560.75**	**$ 4,383.43**	**$ 10,944.18**	**$ 6,560.75**	**$ 4,355.28**	**$ 10,916.04**	**1.93%**
Total gross-cost		***$ 565,452.33***	***$ 565,452.33***	***$ 334,598.33***	***$ 223,554.89***	**$ 558,153.22**	***$ 334,598.32***	***$ 222,119.48***	**$ 556,717.80**	**98.46%**

Inspeksaun Husi :

Eng.Marcos Ximenes de Araujo
Eng, ba Projetu Infraestrutura,Transporte e Irigasaun, ADN.I.P M.Liquica

Verifica Husi,

Eng. Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Sertifika Husi,

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade ADN, I.P

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (BZT2)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN KADA PROJETO

Naran projeto : Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0 + 000 - 3 + 000 & Periodic Maintanance Maumeta - Metagou Sta 0 + 000 - 7 + 000 in Liquica Municipality

Naran Kompanha : Banir Lema.Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/Fev/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Inspeksaun ba Pagamentu Retensaun 10% iha terreno no buat hotu diak,iha parte balun mak at maibe ADN.I.P M.Liquica rekomenda ona ba kompanhia hodi hadia ona.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (BZT14)

Back-up Data

Naran Projeto : Emergency Project For Tibar River
Contractor : Sali-Magu Unip.Lda
No. kontratu : RT/067/MOP-2021

Data Inspeksaun : 9/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Tibar


Koordinat :

Start Point : Long : -8°34'29,372 Latetude : - 125°29'27,612
End Point : Long Latetude

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo (Teknik ADN.IP)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Sketch Item servisu : Cyclop concrete (K-250) 21 Mpa

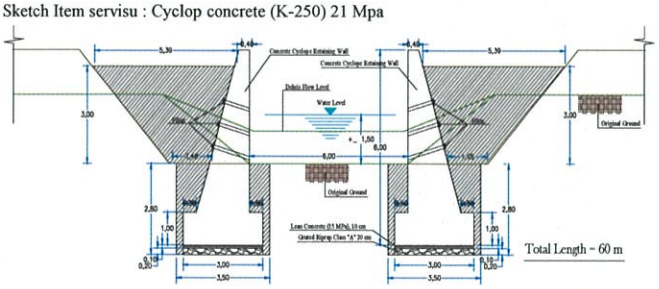


Uptrend Left & Right

T	*W1*	*w2*	*area*	*Distacia*	*Volume*
Wall					
5.00	2.00	0.40	6.00	10.00	60.00
Total					60.00



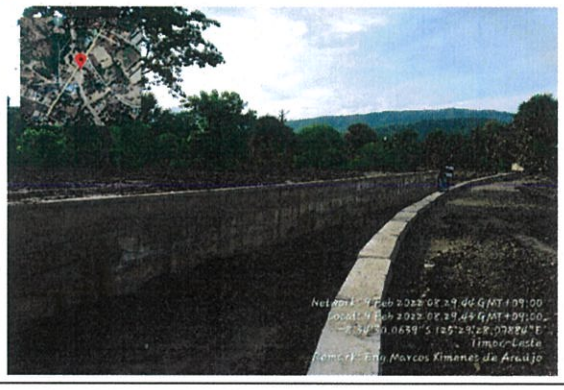

Sketch Item servisu : Cyclop concrete (K-250) 21 Mpa

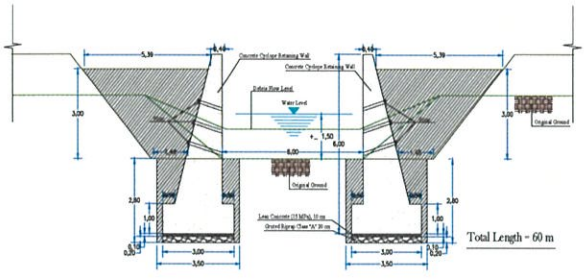

Downtrend Left & Right

T	*W1*	*w2*	*area*	*Distacia*	*Volume*
Wall					
5.00	2.00	0.40	6.00	10.00	60.00
Total					60.00





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (BZT14)

Contract Name : Emergency Project For Tibar River
No Contract : RT/067/MOP-2021
Name of Contractor : Sali - Magu Unip.Lda

SUMMARY

NO	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
100	GENERAL REQUIREMENTS	$ 1,790.00	$ -	$ -	$ -	$ 895.00	0.18%	$ -	0.00%	$ 895.00	0.18%
200	EARTHWORKS	$ 29,230.77	$ -	$ -	$ -	$ 10,281.38	2.05%	$ -	0.00%	$ 10,281.38	2.05%
300	BRIDGE CONSTRUCTION	$ 403,718.04	$ -	$ -	$ -	$ 305,000.08	60.70%	$ 23,272.48	4.63%	$ 328,272.56	65.33%
400	DRAINAGE AND SLOP PROTECTION WORKS	$ 10,802.88	$ -	$ -	$ -	$ 9,815.30	1.95%	$ -	0.00%	$ 9,815.30	1.95%
Total - net cost		**$ 445,541.69**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 325,991.75**	**64.88%**	**$ 23,272.48**	**4.63%**	**$ 349,264.23**	**69.51%**
Profit (net cost x %) ; 10%		**$ 44,554.17**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 32,599.18**	**6.49%**	**$ 2,327.25**	**0.46%**	**$ 34,926.42**	**6.95%**
Over Head		**$ 2,525.00**				**$ 1,138.88**	**0.23%**	**$ -**	**0.00%**	**$ 1,138.88**	**0.23%**
Tax (net cost + profit + overhead) x 2 %)		**$ 9,801.92**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7,194.60**	**1.43%**	**$ 511.99**	**0.10%**	**$ 7,706.59**	**1.53%**
Total gross-cost		***$ 502,422.78***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ 366,924.40***	***73.02%***	***$ 26,111.72***	***5.20%***	**$ 393,036.12**	**78.22%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P. M.Liquica

Verifika Husi :

Eng.Jaoa Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (BA14)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Emergency Project For Tibar River

Kompanha : Sali - Magu Unip.Lda

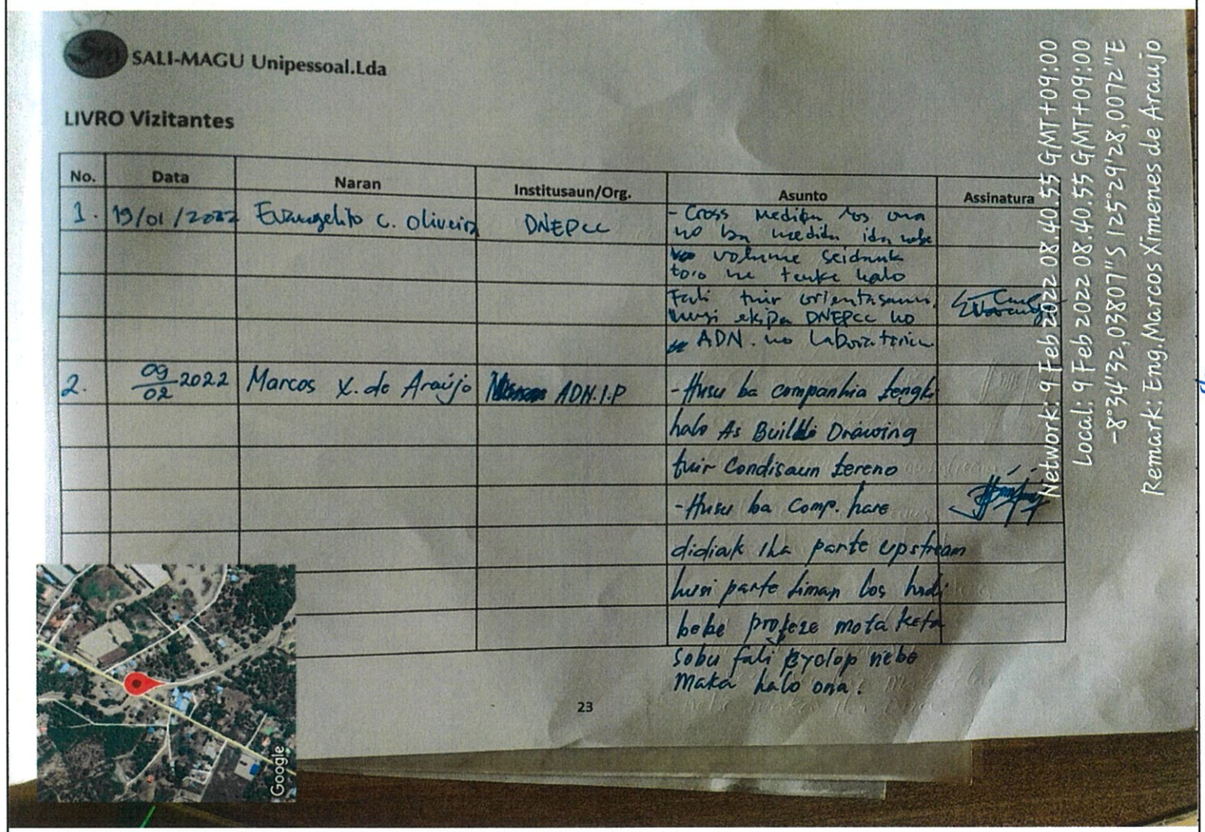No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	2/09/2022	Lquica/Bazartete	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

SALI-MAGU Unipessoal.Lda

LIVRO Vizitantes

No.	Data	Naran	Institusaun/Org.	Asunto	Assinatura
1.	13/01/2022	Evangelito C. Oliveira	DNEPCC	- Coss mediku nos una no los mediku ida nebe Nos volunte seidauk to'o ne tenke kalo Fali tuir orientasaun, husi ekipa DNEPCC no ADN. no Laboratorio.	
2.	09/02/2022	Marcos X. de Araujo	ADN.I.P	- Husu ba companhia lenghe halo As Built Drawing tuir condisaun terreno - Husu ba Comp. hare didiak iha parte upstream lusu parte liman los hodi bele proteze mota kefa sobu fali pyrolop nebe maka halo ona.	

Network: 9 Feb 2022 08.40.55 GMT+09:00
Local: 9 Feb 2022 08.40.55 GMT+09:00
-8°34'32.03807"S 125°29'28.0072"E
Remark: Eng.Marcos Ximenes de Araujo

ANEXO C1 (BZT16)

Naran Projeto :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000

Contractor : Hatumeta Oan Unip.Lda

No. kontratu :MOP - CD-NCB-R -21030

Data Inspeksaun : 9/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Libaloa -Bucumera

Koordinat :


Start Point :	Long :	125.3931986	Latetude	: - 8.63674152
End Point :	Long :	125.3833257	Latetude	: - 8.63314678

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 0+600 - 0+680



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	53.60	10.72
0.15	1.00		8.04
Total			18.76 m³


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halo Line drain iha Suco Libaloa no Sta, 0+600 - 0+680




Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 2+400 - 2+500



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	103.00	20.60
0.15	1.00		15.45
Total			36.05 m³

Companhia halo Line drain iha Suco Libaloa no Sta, 2+400 - 2+500

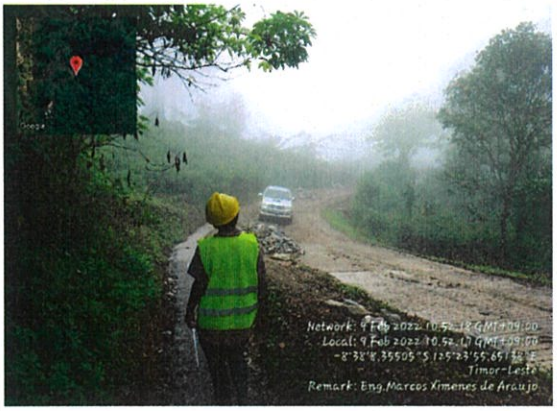

ANEXO C1 (BZT16)

Naran Projeto :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000
Contractor : Hatumeta Oan Unip.Lda
No. kontratu :MOP - CD-NCB-R -21030

Data Inspeksaun : 9/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Libaloa -Bucumera

Koordinat :


Start Point :	Long :	125.3931986	Latetude	: - 8.63674152
End Point :	Long :	125.3833257	Latetude	: - 8.63314678

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : *Excavation*

Sta, 0+600 - 0+680



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	103.00	113.30
Total			113.30 m³


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halo Line drain iha Suco Libaloa no Sta, 0+600 - 0+680




Sketch Item servisu : *Excavation*

Sta, 2+400 - 2+500



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	103.00	113.30
Total			113.30 m³

Companhia halo Line drain iha Suco Libaloa no Sta, 2+400 - 2+500

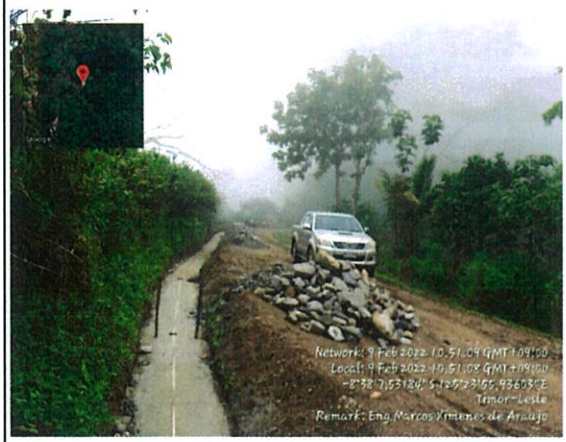

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (BZT16)

Naran Projeto :R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000

Contractor : Hatumeta Oan Unip.Lda

No. kontratu :MOP - CD-NCB-R -21030

SUMMARY											
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 2,000.00									
R-02	Drainage	$ 97.72									
R-03	Earth work	$ 4,936.60						$ 340.28	0.23%	$ 340.28	0.23%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 793.80									
R-08	Structures	$ 97,039.43						$ 3,856.02	2.58%	$ 3,856.02	2.58%
R-11	Routine maintenance	$ 7,192.50									
R-15	Provisional sum	$ 250.00									
	General items										
G-01	Security	$ 1,380.00									
G-02	Project team	$ 12,150.00									
G-03	Safety and protection	$ 4,103.00									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00									
G-07	Mineral fees	$ 5,091.88									
A	**Construction cost**	**$ 112,310.04**						**$ 4,196.30**		**$ 4,196.30**	**2.80%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 11,231.00**						**$ 419.63**		**$ 419.63**	**0.28%**
C	**General items**	**$ 23,024.88**						**$ -**		**$ -**	**0.00%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 2,931.32**						**$ 92.32**		**$ 92.32**	**0.06%**
E	**Total**	**$ 149,732.87**						**$ 4,708.25**		**$ 4,708.25**	**3.14%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto
Infraestructura,Transporte e irigaaun
Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Infrastructura,Transportes e Irigasaun,
ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXO D (BZT16)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN **KADA**
PROJETO

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000

Naran Kompanha : Hatumeta Oan Unipessoal.Lda

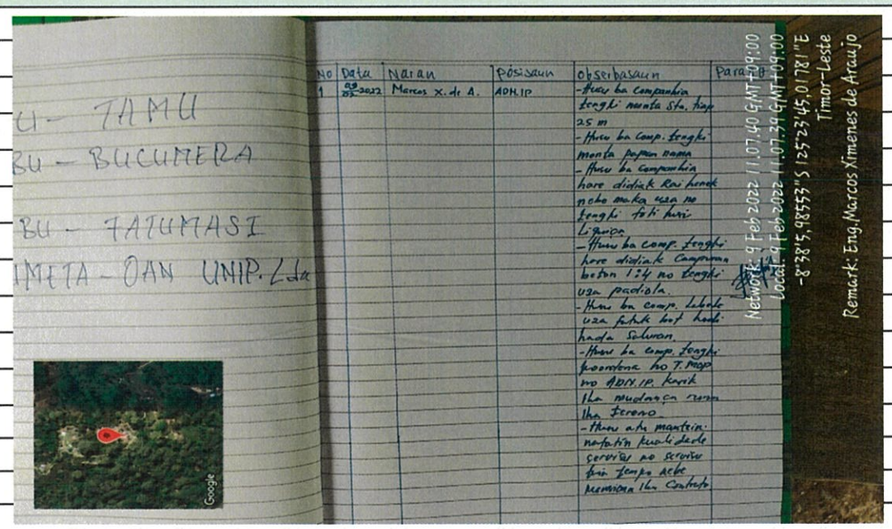No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	9/Fev/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4 5	TL - TAMU BU - BUCUMERA BU - TATUMASI HATUMETA - OAN UNIP. Lda No Data Naran Pozisaun Observasaun Parte 1 9/2/2022 Marcos X. de A. ADN.IP -Hasu ba Kompanhia Hatama tasi ba Kompanhia Hatama tasi ba Kompanhia Hatama tasi

ANEXO C1 (BZT17)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality
Contractor : Hatumeta Oan Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD-RFQ - 21017

Data Inspeksaun : 15/02/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Fahilebo - Fatumasi

Koordinat :


Start Point : Long : 125.3931986 Latetude : - 8.63674152
End Point : Long : 125.3833257 Latetude : - 8.63314678

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Gabion*

Sta, 1+900




T	w	*Distacia*	*Volume*
1.00	1.00	4.00	4.00
Total			**4.00** m³

Companhia halo Gabion iha Suco Fatumasi no Sta, 1+900. Husu ba companhia presija ateru husi bronjong nia kotuk




Sketch Item servisu : *Gabion*

Sta, 1+900



T	w	*Distacia*	*Volume*
1.00	1.00	4.00	4.00
Total			**4.00** m³

Companhia halo Gabion iha Suco Fatumasi no Sta, 1+900. Husu ba companhia presija ateru husi bronjong nia kotuk

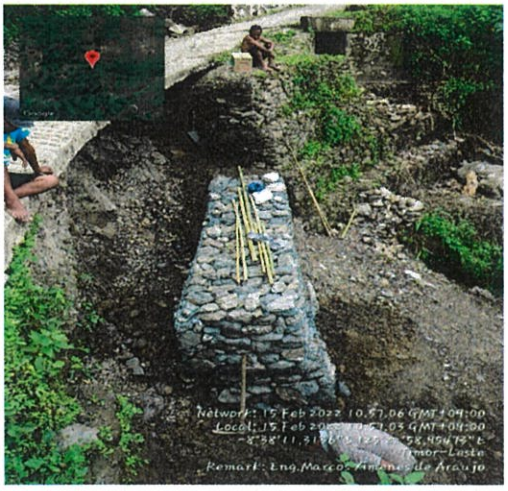

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (BZT17)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality
Contract No :MOP - CD-RFQ - 21017
Contractor : Hatumeta Oan Unipessoal.Lda

SUMMARY											
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 1,400.00									
R-02	Drainage	$ 171.01									
R-03	Earth work	$ 3,655.46									
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 1,386.00									
R-08	Structures	$ 47,887.70						$ 341.04	0.38%	$ 341.04	0.38%
R-11	Routine maintenance	$ 5,018.80									
R-15	Provisional sum	$ 250.00									
	General items										
G-01	Security	$ 1,380.00									
G-02	Project team	$ 7,968.00									
G-03	Safety and protection	$ 2,915.80									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00									
G-07	Mineral fees	$ 8,800.56									
A	**Construction cost**	**$ 59,768.97**						**$ 341.04**		**$ 341.04**	**0.38%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 5,976.90**						**$ 34.10**		**$ 34.10**	**0.04%**
C	**General items**	**$ 21,364.36**						**$ -**		**$ -**	**0.00%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 1,742.20**						**$ 7.50**		**$ 7.50**	**0.01%**
E	**Total**	**$ 88,852.44**						**$ 382.65**		**$ 382.65**	**0.43%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público


ANEXO D (BZT17)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN **KADA**

PROJETO

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000-2+300 Liquica Municipality

Naran Kompanha : Hatumeta Oan Unipessoal.Lda

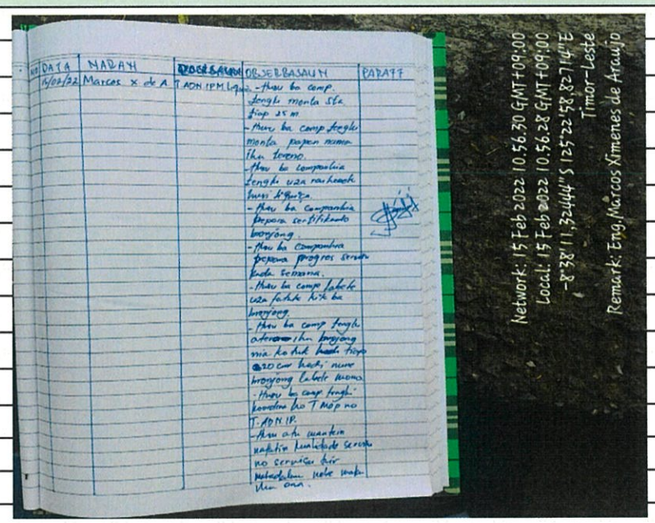No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/Fev/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (BZT18)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality

No. kontratu : MPW-W-210144

Data Inspeksaun : 9/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Libaloa-Fahilebo

Koordinat :


Start Point : Long : 125.43836103 Latetude : - 8.64943384
End Point : Long : 125.4135714 Latetude : - 8.63017393788538

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Gabion

STA, 3+115

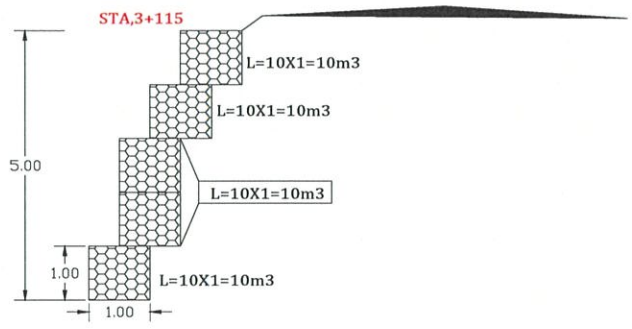


Fotografia terreno hatudo katak companhia presija ateru no halo kompaksaun husi bronjong nia kotuk.




Sketch Item servisu : *Plum Concrete*

STA, 5+110-5+140




t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	1.85	30.00	6.66
Total			6.66



Fotografia foti iha terreno wainhira trabalhador sira halo hela plum concrete



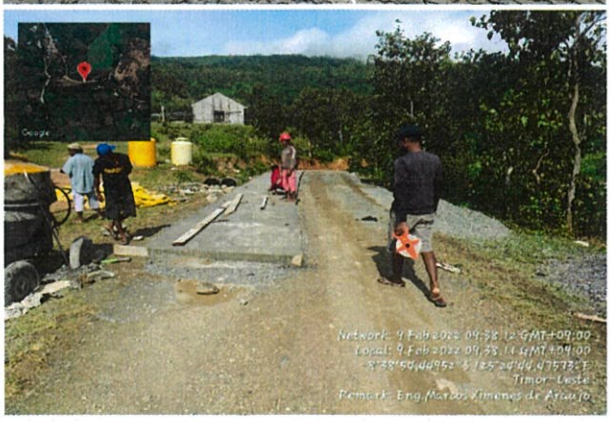

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (BZT18)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality

No. kontratu :MPW-W-210144

SUMMARY											
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 1,250.00									
R-02	Drainage	$ 121.86									
R-03	Earth work	$ 3,188.68									
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 6,285.96									
R-08	Structures	$ 26,959.42						$ 3,945.96	4.46%	$ 3,945.96	4.46%
R-11	Routine maintenance	$ 12,699.00									
R-15	Provisional sum	$ 250.00									
	General items										
G-01	Security	$ 1,200.00									
G-02	Project team	$ 14,700.00									
G-03	Safety and protection	$ 5,886.00									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 175.00									
G-07	Mineral fees	$ 8,800.55									
A	**Construction cost**	**$ 50,754.92**						**$ 3,945.96**	**4.46%**	**$ 3,945.96**	**4.46%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 5,075.49**						**$ 394.60**	**0.45%**	**$ 394.60**	**0.45%**
C	**General items**	**$ 30,861.55**						**$ -**	**0.00%**	**$ -**	**0.00%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 1,733.84**						**$ 86.81**	**0.10%**	**$ 86.81**	**0.10%**
E	**Total**	**$ 88,425.80**						**$ 4,427.37**	***5.01%***	**$ 4,427.37**	***5.01%***

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXO D (BZT18)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN **KADA**
PROJETO

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa-Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality

Naran Kompanha : Hatuleo Unipessoal.Lda

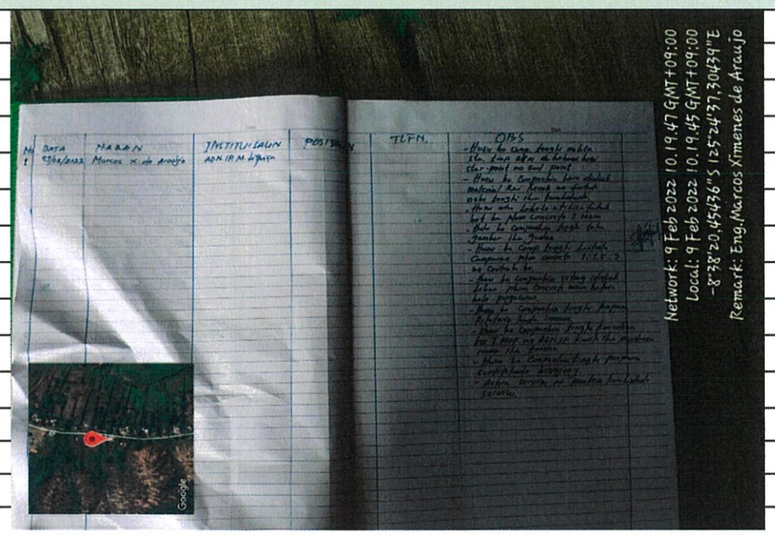No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	9/Fev/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (BZT19)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000
Contractor : Craeleki Bercoli Unip.Lda
No. kontratu : MPW-W-210145

Data Inspeksaun : 21/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Maumeta - Metagou

Koordinat :


Start Point : Long : 125.34157891 Latetude : - 8.5948749774
End Point : Long : 125.38295813 Latetude : - 8.62965918

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 6+200

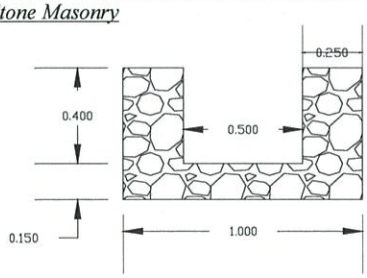


T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	10.00	2.00
0.15	1.00		1.5
Total			3.50 m³

Companhia halo Line drain iha Suco Fatumasi no Sta, 6+200



Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 6+200

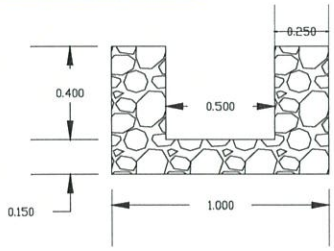

T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	10.00	2.00
0.15	1.00		1.5
Total			3.50 m³

Companhia halo Line drain iha Suco Fatumasi no Sta, 6+200



ANEXO C1 (BZT19)
Back-up Data

Naran Projeto : Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000
Contractor : Craeleki Bercoli Unip.Lda
No. kontratu : MPW-W-210145

Data Inspeksaun : 21/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Maumeta - Metagou

Koordinat :

Start Point : Long : 125.34157891 Latetude : - 8.5948749774
End Point : Long : 125.38295813 Latetude : - 8.62965918

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : ***CMG leader*** **STA, 3+250 - 4+870** Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos iha terreno	
Sketch Item servisu : ***CMG leader*** **STA, 3+250 - 4+870** Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos iha terreno	
STA, 1+150 - 2+110 Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos iha terreno	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT19)
Back-up Data

Naran Projeto : Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000
Contractor : Craeleki Bercoli Unip.Lda
No.Kontrac : MPW-W-210145

SUMMARY											
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 700.00						$ 550.00	0.89%	$ 550.00	0.89%
R-03	Earth work	$ 2,472.64									
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 1,997.60									
R-08	Structures	$ 15,124.71						$ 197.98	0.32%	$ 197.98	0.32%
R-11	Routine maintenance	$ 17,562.00						$ 100.00	0.16%	$ 100.00	0.16%
R-15	Provisional sum	$ 250.00									
GENERAL ITEM											
G-01	Security	$ 1,500.00									
G-02	Project team	$ 11,550.00									
G-03	Safety and protection	$ 2,293.00									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 150.00									
G-08	Mineral fees	$ 3,297.24									
		$ 18,890.24									
A	**Construction cost**	**$ 38,106.95**						**$ 847.98**	**1.37%**	**$ 847.98**	**1.37%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 3,810.70**						**$ 84.80**	**0.14%**	**$ 84.80**	**0.14%**
C	**General items**	**$ 18,890.24**						**$ -**	**0.00%**	**$ -**	**0.00%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 1,216.16**						**$ 18.66**	**0.03%**	**$ 18.66**	**0.03%**
E	**Total**	**$ 62,024.04**						**$ 951.43**	**1.53%**	**$ 951.43**	**1.53%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Jaoa Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Infrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

ANEXO D (BZT19)

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN **KADA**

PROJETO

Naran projeto : Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000

Naran Kompanha : Craeleki Bercoli Unip.Lda

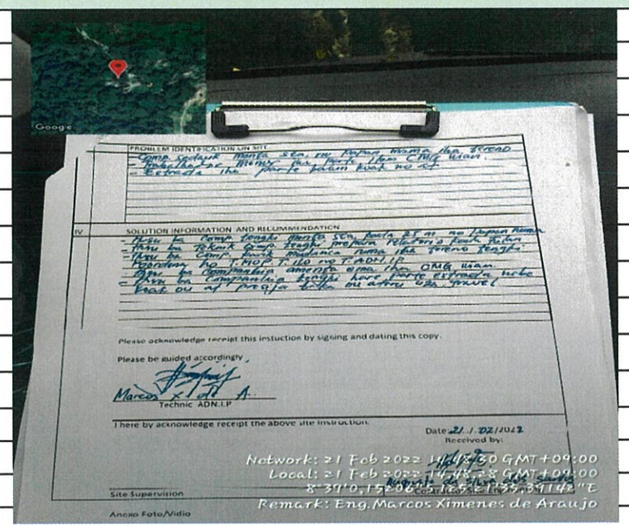No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	21/Fev/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (LV1)

Back-up Data

Naran Projeto : Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquica Municipality

No. kontratu : MPW-W-190097

Data Inspeksaun : 22/02/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Vatuboro

Koordinat :


Start Point : Long : -8°34'5.91 Latetude : 125°29'25.72

End Point : Long : -8°44'28.85 Latetude : 125°8'0.75

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Excavation/ Landslide



r : 5.6 Y : $\sqrt{(5.6^2-2.8^2)}$

x : 2.8 4.85


7.84

P : 24.30


190.512 m³

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Kompanhia kontinua suru sai rai nebe monu ba estrada laran iha parte karimbala

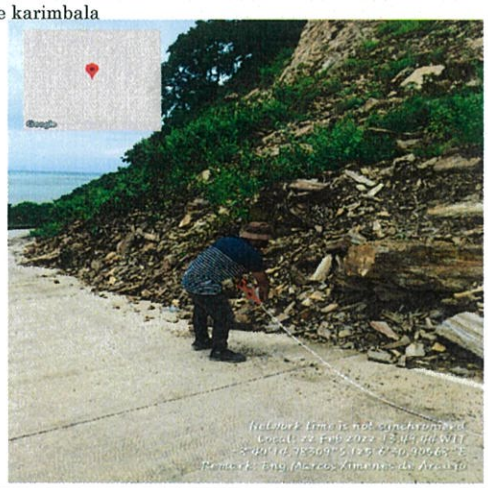

Sketch Item servisu : Excavation/ Landslide




r : 5.6 Y : $\sqrt{(5.6^2-2.8^2)}$


x : 2.8 4.85

7.84

P : 24.30

190.512 m³

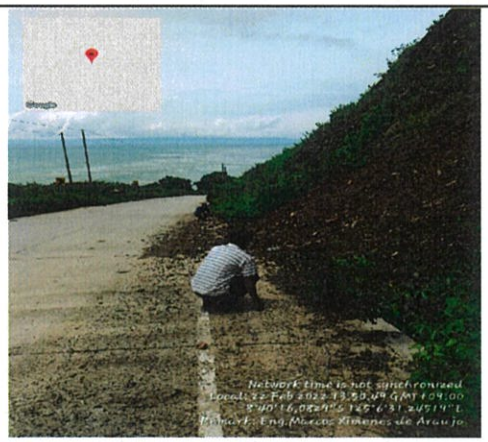



r : 5.6 Y : $\sqrt{(5.6^2-2.8^2)}$

x : 2.8 4.85

7.84

P : 24.30

190.512 m³



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (LV1)

Name of Roads : Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquica Municipality

Contract No : MPW-W-190097
Contractor : Naroman Mosu Dadaun Unipessoal. Lda

SUMMARY

NO	DESCRIPTION	KONTRAK ORIGINAL	REJULTADO VERIFIKASAUN A D N.I.P	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.					
				PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING		TO DATE	%
R-01	Demobilization + Demobilization	$ 3,020.02	$ 2,691.64	$ 1,992.00	$ 699.64	$ 2,691.64	$ 2,691.64	1.75%	$ -	0.00%	$ 2,691.64	1.75%
R-02	Soulder Cleaning + Excavation/Landsliders + Gravel Surface Course	$ 87,752.89	$ 75,812.10	$ 28,798.04	$ 36,941.56	$ 65,739.60	$ 59,195.55	38.48%	$ 738.62	0.49%	$ 59,934.17	38.96%
R-03	Lined Drain Cleaning + Cross Drain Cleaning + Stone Massonry Wall	$ 62,401.57	$ 54,124.29	$ 65,739.37	$ -	$ 65,739.37	$ 65,739.37	42.73%	$ -	0.00%	$ 65,739.37	42.73%
R-04	Traffic Sign	$ 677.40	$ 225.00	$ 225.00	$ -	$ 225.00	$ 225.00	0.15%	$ -	0.00%	$ 225.00	0.15%
A	**Total - net cost**	**$ 153,851.88**	**$ 132,853.03**	**$ 96,754.41**	**$ 37,641.20**	**$ 134,395.61**	**$ 127,851.57**	**83.10%**	**$ 738.62**	**0.49%**	**$ 128,590.18**	**83.58%**
B	**Profit 10% * A**		**$ 13,285.30**	**$ 9,675.44**	**$ 3,764.12**	**$ 13,439.56**	**$ 12,785.16**	**8.31%**	**$ 73.86**	**0.05%**	**$ 12,859.02**	**8.36%**
C	**Overhead**		**$ 3,000.00**	**$ 1,500.00**	**$ 1,500.00**	**$ 3,000.00**	**$ 3,000.00**	**1.95%**	**$ -**	**0.00%**	**$ 3,000.00**	**1.95%**
D	**Tax 2%*(A + B + C)**		**$ 2,982.77**	**$ 2,158.60**	**$ 858.11**	**$ 3,016.70**	**$ 2,872.73**	**1.87%**	**$ 16.25**	**0.01%**	**$ 2,888.98**	**1.88%**
E	***Grand Total Cost (A + B + C + D)***	***$ 153,851.88***	**$ 152,121.10**	***$ 110,088.45***	***$ 43,763.43***	***$ 153,851.88***	***$ 146,509.46***	***95.23%***	***$ 828.73***	***0.54%***	***$ 147,338.19***	**95.77%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura, Transporte e irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV1)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquica Municipality

Kompanha : Naroman Mosu Dadaun Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	22/02/2022	Lquica/Maubara	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Halo Monitorizasaun iha terreno no kompanhia la prepra buku tamu	
					2	Halo Monitorizasaun iha terreno kona ba rai monu iha parte karimbala	
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (LV3)

Back-up Data

Naran Projeto	:	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica
No. kontratu	:	MPW-W-190097

Data Inspeksaun : 25/Fev/2022



Fatin Inspeksaun : Suco Dato – Loidahar Roads & Aibenu – Asumanu

Koordinat :

Start Point :	Long :	125°19'25.493	Latetude	: -8°35'49.028
End Point :	Long :	125°20'49.833	Latetude	: - 8°40'34.406

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : Lokaliza iha Suco Maumeta - Metagou Inspeksaun ba Pagamentu Retensaun 10% iha terreno no buat hotu diak.	

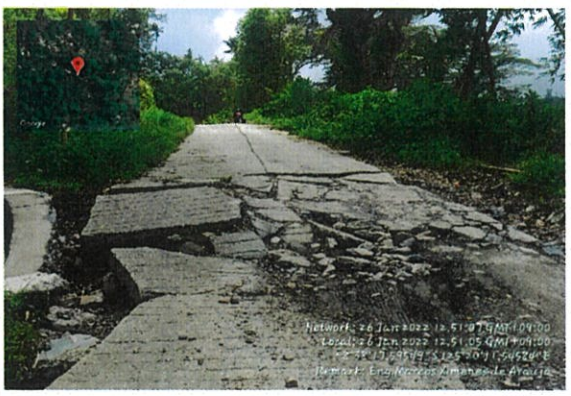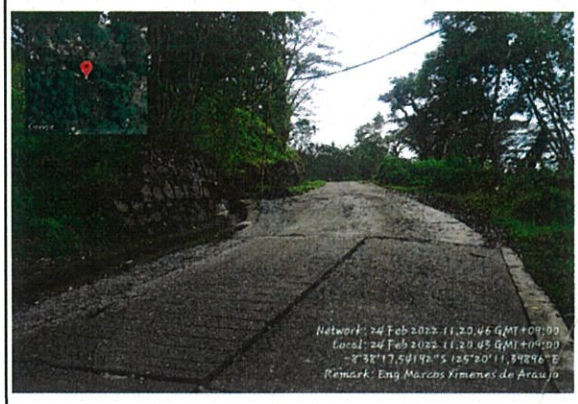Sketch Item servisu : Lokaliza iha Suco Maumeta - Metagou Inspeksaun ba Pagamentu Retensaun 10% iha terreno no buat hotu diak,iha parte balun mak at hanesan anexo iha fotografia ne'e hatudu katak plum concrete nakfera hela maibe ADN.I.P M.Liquica rekomenda ona ba kompanhia hodi hadia ona, no fotografia anexo.	 

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (LV3)

Road Name : R4D Rural Roads Periodik Maintenance Aibeno - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300, Routine Maintenance Dato - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300
Location : Liquiça
Contractor : Nheu Unip.Lda

SUMMARY

ITEM	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT	VARIATION ORDER AMOUNT US $		REVISED CONTRACT	A D N VERIFICA	RESULTADU INSPEKSAUN MOP			ADN PROGRESS				
		AMOUNT US $	DEDUCTIVE	ADDITIVE	AMOUNT US $	AMOUNT US $	PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	TO DATE	%
R-01	General works	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ 480.00	$ 2,000.00	$ -	$ 2,000.00	$ 2,000.00	3.64%	$ -	$ 2,000.00	3.64%
R-02	Drainage	$ 2,500.00	$ (1,000.00)	$ -	$ 1,500.00	$ 71.06	$ 1,500.00	$ -	$ 1,500.00	$ 1,500.00	2.73%	$ -	$ 1,500.00	2.73%
R-03	Earth work	$ 1,108.18	$ (40.56)	$ -	$ 1,067.62	$ 1,209.54	$ 1,027.36	$ 6.30	$ 1,033.66	$ 1,027.36	1.87%	$ 6.30	$ 1,033.66	1.88%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 855.27	$ -	$ -	$ 855.27	$ 1,064.43	$ -	$ 855.27	$ 855.27	$ -	0.00%	$ 855.27	$ 855.27	1.55%
R-08	Structures	$ 15,612.40	$ (1,476.91)	$ 3,807.47	$ 17,942.96	$ 13,425.96	$ 13,902.27	$ 4,040.82	$ 17,943.09	$ 13,902.27	25.27%	$ 4,040.66	$ 17,942.93	32.62%
R-11	Routine maintenance	$ 17,862.14	$ (850.00)	$ -	$ 17,012.14	$ 30,106.70	$ 11,016.00	$ 6,008.14	$ 17,024.14	$ 11,016.00	20.02%	$ 5,996.14	$ 17,012.14	30.92%
R-13	General Expenses	$ 4,806.50	$ (240.00)	$ -	$ 4,566.50	$ -	$ 3,570.50	$ 996.00	$ 4,566.50	$ 3,570.50	6.49%	$ 996.00	$ 4,566.50	8.30%
R-15	Provisional sum	$ 200.00	$ (200.00)	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	0.00%
A	**Construction Cost**	**$ 44,944.48**	**$ (3,807.47)**	**$ 3,807.47**	**$ 44,944.49**	**$ 46,557.69**	**$ 33,016.13**	**$ 11,906.53**	**$ 44,922.65**	**$ 33,016.13**	**60.02%**	**$ 11,894.37**	**$ 44,910.50**	**81.64%**
B	**Profit (10% x A)**	**$ 4,494.45**			**$ 4,494.45**	**$ 4,655.77**	**$ 3,301.61**	**$ 1,190.65**	**$ 4,492.27**	**$ 3,301.61**	**6.00%**	**$ 1,189.44**	**$ 4,491.05**	**8.16%**
C	**Over head (10% x A)**	**$ 4,494.45**			**$ 4,494.45**	**$ 4,044.00**	**$ 3,301.61**	**$ 1,190.65**	**$ 4,492.27**	**$ 3,296.11**	**5.99%**	**$ 1,189.44**	**$ 4,485.55**	**8.15%**
D	**Tax 2% x (A + B + C)**	**$ 1,078.67**			**$ 1,078.67**	**$ 1,105.15**	**$ 792.39**	**$ 285.76**	**$ 1,078.14**	**$ 792.28**	**1.44%**	**$ 285.46**	**$ 1,077.74**	**1.96%**
E	**Grand Total (A + B + C + D)**	**$ 55,012.05**			**$ 55,012.05**	**$ 56,362.61**	**$ 40,411.74**	**$ 14,573.59**	**$ 54,985.33**	**$ 40,406.13**	**73.45%**	**$ 14,558.71**	**$ 54,964.83**	**99.91%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Roads Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000-4+300 Rutine Maintence Dato -Lequica-Loidahar Chainage 0+000-12+300

Kompanha : Nheu Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/03/2021	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik AND M.Liquica	1	**Servisu iha tereno 100% ona no hela retensaun 10% e Projeitu refere PHO ona no kondisaun iha tereno buat hotu diak**	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (LV12)
Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)
Contractor : Goubara Unip.Lda
No. kontratu : MPW-W-210162

Data Inspeksaun : 18/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Berlakuliado-Laberlaka

Koordinat :


Start Point : Long : 125.29724167 Latetude : - 8.60635641
End Point : Long : 125.2952025 Latetude : - 8.62329599714

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Stone Masonry (Line Drain)

STA, 0+670 - 0+720




T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m³

Fotografia terreno hatudo katak companhia halo hela Saluran




Sketch Item servisu : *Stone Masonry (Line Drain)*

STA, 1+380-1+400

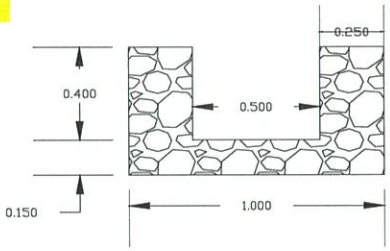

t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	1.85	20.00	4.44
Total			4.44



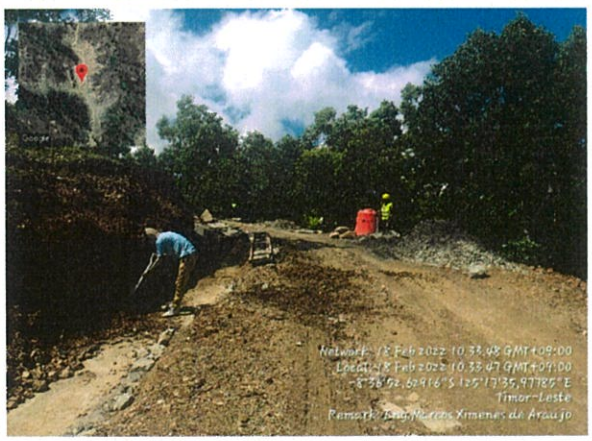

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV12)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)

Contractor : Goubara Unip.Lda

No. kontratu :MPW-W-210162

SUMMARY											
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 2,300.00									
R-02	Drainage	$ 171.01									
R-03	Earth work	$ 4,699.77									
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,653.56									
R-08	Structures	$ 81,840.38						$ 1,358.65	1.04%	$ 1,358.65	1.04%
R-10	Dayworks	$ 105.00									
R-11	Routine maintenance	$ 5,957.00									
R-15	Provisional sum	$ 775.00									
	General items										
G-01	Security	$ 690.00									
G-02	Project team	$ 11,700.00									
G-03	Safety and protection	$ 2,949.00									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00									
G-07	Mineral fees	$ 4,655.79									
A	**Construction cost**	**$ 98,501.72**						**$ 1,358.65**	**1.04%**	**$ 1,358.65**	**1.04%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 9,850.17**						**$ 135.86**	**0.10%**	**$ 135.86**	**0.10%**
C	**General items**	**$ 20,294.79**						**$ -**	**0.00%**	**$ -**	**0.00%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 2,572.93**						**$ 29.89**	**0.02%**	**$ 29.89**	**0.02%**
E	**Total**	**$ 131,219.62**						**$ 1,524.40**	***1.16%***	**$ 1,524.40**	***1.16%***

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura, Transporte e irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura, Transportes e

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (LV12)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN **KADA PROJETO**

Naran projeto :R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)

Naran Kompanha : Goubara Unipessoal.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	18/Fev/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Halo monitorizasaun iha terreno no companhia seidauk prepara buku tamu,maibe AND.I.P M.Liquica Rekomenda ona ba companhia tengki prepra buku tamu.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (LV14)
Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)

No. kontratu : MPW-W-210151

Data Inspeksaun : 9/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Metagou

Koordinat :


Start Point : Long : 125.36544444 Latetude : - 8.66332014
End Point : Long : 125.3416468 Latetude : - 8.65444508

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Plum Concrete

STA, 0+090 - 0+756




t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	1.85	450.00	99.90
Total			99.90

Fotografia terreno hatudo katak companhia halo hela pengecoran Plum Concrete



Sketch Item servisu : *Plum Concrete*


STA, 5+110-5+140



t	L	*Distacia*	*Volume*
0.12	1.85	450.00	99.90
Total			99.90







MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV14)

Naran Projeto :R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)
Contractor : Metalika Unip.Lda
No. kontratu :MPW-W-210151

SUMMARY											
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 3,400.00									
R-02	Drainage	$ 244.30									
R-03	Earth work	$ 5,301.97									
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 3,356.64									
R-08	Structures	$ 159,824.15						$ 21,061.62	8.82%	$ 21,061.62	8.82%
R-11	Routine maintenance	$ 16,538.40									
R-15	Provisional sum	$ 250.00									
	GENERAL ITEM										
G-01	Security	$ 1,380.00									
G-02	Project team	$ 13,660.00									
G-03	Safety and protection	$ 3,062.00									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00									
G-07	Mineral fees	$ 7,849.54									
A	**Construction cost**	**$ 188,915.45**						**$ 21,061.62**	**8.82%**	**$ 21,061.62**	**8.82%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 18,891.55**						**$ 2,106.16**	**0.88%**	**$ 2,106.16**	**0.88%**
C	**General items**	**$ 26,251.54**						**$ -**	**0.00%**	**$ -**	**0.00%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 4,681.17**						**$ 463.36**	**0.19%**	**$ 463.36**	**0.19%**
E	**Total**	**$ 238,739.71**						**$ 23,631.14**	**9.90%**	**$ 23,631.14**	**9.90%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto
Infraestructura, Transporte e irigaaun Municipio

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV14)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)

Kompanha : Metalika Unip.Lda

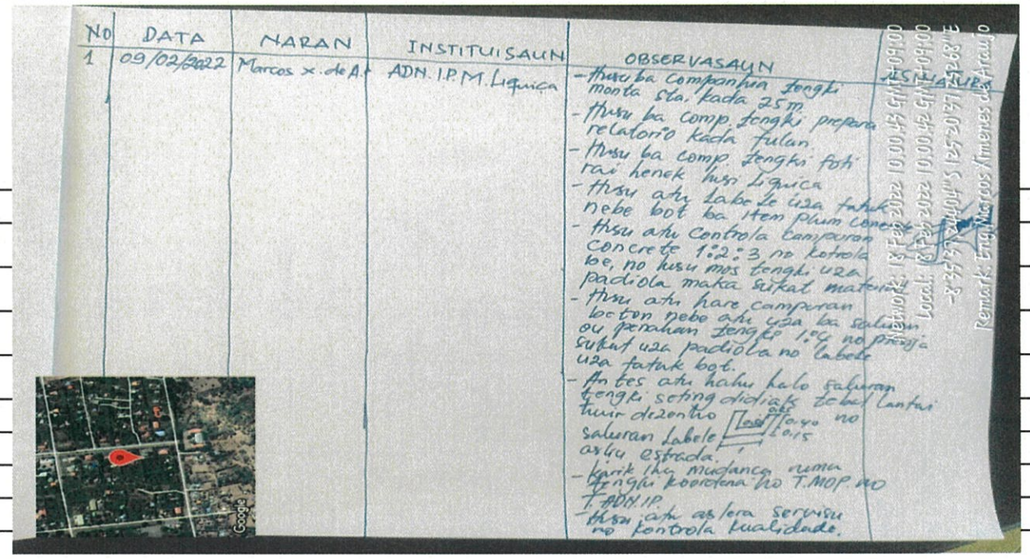No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	9/Fev/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (LV15)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)

No. kontratu : MPW-W-210150

Data Inspeksaun : 26/01/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Loidahar

Koordinat :

Start Point : Long : 125°19'36.41779 Latetude : - 8°36'46.93352


End Point : Long : 125°19'36.41779 Latetude : - 8°36'46.93352

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 3+250 - 3+300

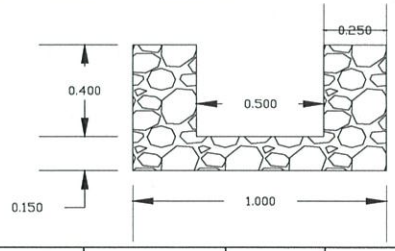


T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m³

Companhia halo Line drain iha Suco Loidahar no Sta, 3+250 - 3+300



Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Sta, 3+600 - 3+650



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m³

Companhia halo Line drain iha Suco Loidahar no Sta, 3+600 - 3+650



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV15)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)
Contract No : MPW-W-210150
Contractor : Luqueli Oan Unipessoal.Lda

SUMMARY

NO	DESCRIPTION	CONTRAC ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 1,300.00									
R-02	Drainage	$ 1,905.47									
R-03	Earth work	$ 19,160.19									
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 5,007.60									
R-08	Structures	$ 97,539.20				$ 2,450.00	1.30%	$ 1,225.00	0.65%	$ 3,675.00	1.95%
R-11	Routine maintenance	$ 18,278.00									
R-15	Provisional sum	$ 250.00									
	Sub Total	**$ 143,440.46**				**$ 2,450.00**	**1.30%**	**$ 1,225.00**	**0.65%**	**$ 3,675.00**	**1.95%**
	General items										
G-01	Security	$ 1,680.00									
G-02	Project team	$ 9,960.00									
G-03	Safety and protection	$ 6,094.50									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 175.00									
G-07	Mineral fees	$ 9,097.30									
	Sub Total	**$ 27,106.80**									
A	**CONSTRUCTION COST**	**$ 143,440.46**				**$ 2,450.00**	**1.30%**	**$ 1,225.00**	**0.65%**	**$ 3,675.00**	**1.95%**
B	**PROFIT 10% x A**	**$ 14,344.05**				**$ 245.00**	**0.13%**	**$ 122.50**	**0.06%**	**$ 367.50**	**0.19%**
C	**OVERHEAD**	**$ 27,106.80**					**0.00%**		**0.00%**		**0.00%**
D	**TAX 2% (A+B+C)**	**$ 3,697.83**				**$ 53.90**	**0.03%**	**$ 26.95**	**0.01%**	**$ 80.85**	**0.04%**
E	**GRAND TOTAL (A+B+C)**	***$ 188,589.13***				***$ 2,748.90***	**1.46%**	***$ 1,374.45***	**0.73%**	***$ 4,123.35***	**2.19%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura, Transporte e irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (LV15)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)

Kompanha : Luqueli Oan Unip.Lda

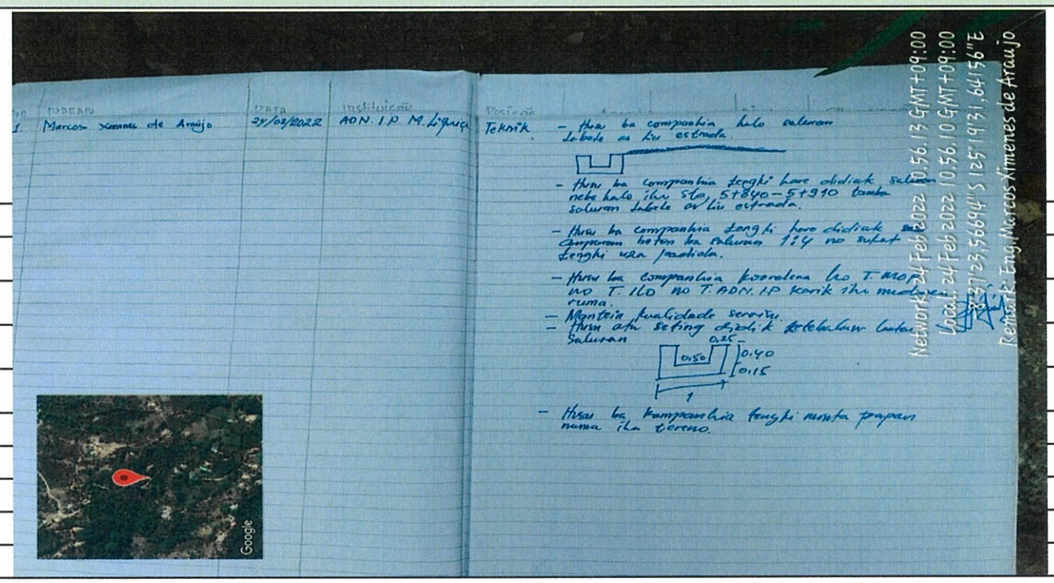No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	24/Fev/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

#ANEXO C2 (LV18)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu - Laberlaka Chaingane Chainage 2+500-5+400
Contractor : Claridade Unip.Lda
No. kontratu : MPW-W-210163

Data Inspeksaun : 18/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Berlakulidu - Laberlaka

Koordinat :

Start Point : Long : 125.29520251 Latetude : - 8.63329600
End Point : Long : 125.30192345 Latetude : - 8.641753681

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : ***CMG leader*** **STA, 0+000 - 2+120** Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha terreno	
Sketch Item servisu : ***CMG leader*** **STA, 0+000 - 2+220** Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha	
STA, 0+000 - 2+420 Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos no taka dalan koak iha terreno	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (LV18)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu - Laberlaka Chaingane Chainage 2+500-5+400
Contractor : Claridade Unip.Lda
No. kontratu : MPW-W-210163

SUMMARY										
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 2,700.00					$ 1,300.00	0.78%	$ 1,300.00	0.78%
R-02	Drainage	$ 319.00								
R-03	Earth work	$ 6,484.77								
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,196.00								
R-08	Structures	$ 109,034.33								
R-10	Dayworks	$ 140.00								
R-11	Routine maintenance	$ 5,440.50					$ 91.00	0.05%	$ 91.00	0.05%
R-15	Provisional sum	$ 1,000.00								
GENERAL ITEM										
G-01	Security	$ 2,760.00								
G-02	Project team	$ 12,180.00								
G-03	Safety and protection	$ 2,513.00								
G-05	Meetings	$ 100.00								
G-06	Ceremonial costs	$ 200.00								
G-07	Mineral fees	$ 5,996.91								
A	**Construction cost**	**$ 127,314.60**					**$ 1,391.00**	**0.83%**	**$ 1,391.00**	**0.83%**
B	Contractor Fee (A x 10%)	$ 12,731.46					$ 139.10	0.08%	$ 139.10	0.08%
C	General items	$ 23,749.91					$ -	0.00%	$ -	0.00%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	$ 3,275.92					$ 30.60	0.02%	$ 30.60	0.02%
E	**Total**	**$ 167,071.89**					**$ 1,560.70**	**0.93%**	**$ 1,560.70**	**0.93%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura, Transporte e irigaaun Municipio Liquica, ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura, Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade, ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.



Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (LV18)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN KADA PROJETO

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu - Laberlaka Chaingane Chainage 2+500-5+400

Naran Kompanha : Claridade Unipessoal.Lda

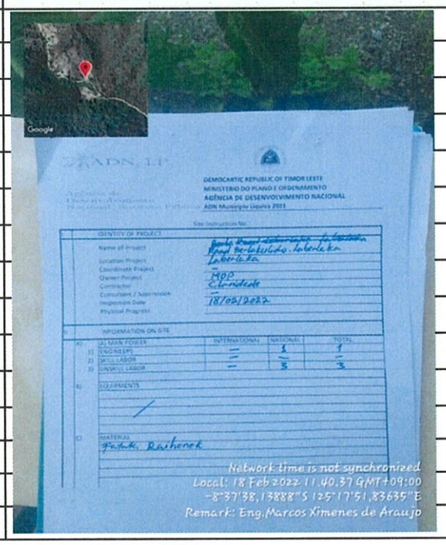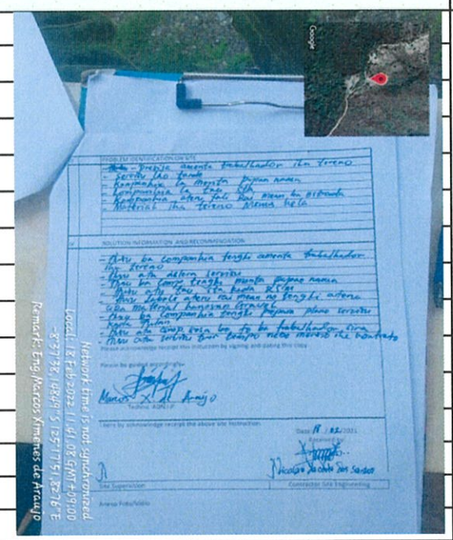No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	18/Fev/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4 5	 	
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

ANEXO C1 (LV19)
Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000
Contractor : Craeleki Bercoli Unip.Lda
No. kontratu : MPW-W-210143

Data Inspeksaun : 21/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Maumeta - Metagou

Koordinat :

Start Point : Long : 125.36314054 Latetude : - 8.65021033
End Point : Long : 125.35645402 Latetude : - 8.640334040

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu : ***CMG leader*** **STA, 0+000 - 1+870** Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos iha terreno	
Sketch Item servisu : ***CMG leader*** **STA, 0+000 - 1+870** Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos iha terreno	
STA, 0+000 - 1+870 Servisu Item CMG Leader nebe kompanhia kontinua hamos iha terreno	

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV19)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000
Contract No : MPW-W-210143
Contractor : Craeleki Bercoli, Unip Lda

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	Mobilisation	$ 1,450.00						$ 150.00	**0.20%**	$ 150.00	0.20%
R-03	Earth work	$ 7,678.22									
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 1,725.20									
R-08	Structures	$ 37,465.76									
R-11	Routine maintenance	$ 3,984.00						$ 100.00	**0.13%**	$ 100.00	0.13%
R-15	Provisional sum	$ 250.00									
	GENERAL ITEM										
G-01	Security	$ 1,500.00									
G-02	Project team	$ 11,400.00									
G-03	Safety and protection	$ 1,745.50									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 150.00									
G-07	Mineral fees	$ 2,220.57									
A	**Construction cost**	**$ 52,553.18**						**$ 250.00**	**0.33%**	**$ 250.00**	**0.33%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 5,255.32**						**$ 25.00**	**0.03%**	**$ 25.00**	**0.03%**
C	**General items**	**$ 17,116.07**						**$ -**	**0.00%**	**$ -**	**0.00%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%**	**$ 1,498.49**						**$ 5.50**	**0.01%**	**$ 5.50**	**0.01%**
E	**Total**	**$ 76,423.05**						**$ 280.50**	**0.37%**	**$ 280.50**	**0.37%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (LV19)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN KADA PROJETO

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000

Naran Kompanha : Craeleki Bercoli Unip.Lda

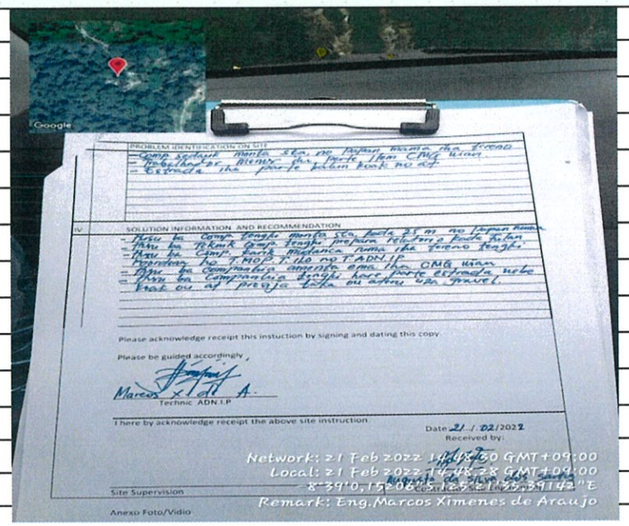No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	21/Fev/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (LV21)

Back-up Data

Naran Projeto : For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)

No. kontratu : MPW-W210202

Data Inspeksaun : 22/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Watuboro

Koordinat :

Start Point : Long : 125°6'49.92268 Latetude : - 8°39'48.1609


End Point : Long : 125°6'49.87166 Latetude : - 8°39'48.12606

Naran Inspektor : 1.00 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Lokaliza iha Karimbala Suco Vatuboro



Keterangan :

w1 =	***0.30***
w2 =	***0.90***
w3 =	***1.10***
t1 =	***1.50***
t2 =	***0.50***
L =	***13.00***


		Distacia	*Volume*
Wall	0.90	13.00	11.70
Foundation	0.55		7.15
	Total		18.85 m3

Project Board nebe kompanhia monta iha lokasi Star Point nebe lokaliza iha Tibar



Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

Lokaliza iha Karimbala Suco Vatuboro



Keterangan :

w1 =	***0.30***
w2 =	***0.90***
w3 =	***1.10***
t1 =	***1.50***
t2 =	***0.50***
L =	***13.00***

		Distacia	*Volume*
Wall	0.90	13.00	11.70
Foundation	0.55		7.15
	Total		18.85 m3

Satone Masonry nebe kompanhia implementa iha Suco Vatuboro ho ninia medida naruk 13 meter



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV21)

Name of Roads : For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)

Contract No : MPW-W210202

Contractor : Chanel Chander Unipessoal.Lda

SUMMARY

NO	DESCRIPTION	CONTRAC ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.					
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	%	THIS BILLING	%	TO DATE	%
100	GENERAL	$ 2,750.00									
200	EARTH WORK	$ 20,657.90						$ 29.17	0.03%	$ 29.17	0.03%
400	SURFACE COURSE	$ 26,748.80									
600	DRAINAGE & SLOPE PROTECTION STRUCTURE	$ 37,821.40						$ 986.71	0.88%	$ 986.71	0.88%
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	$ 1,535.80									
800	BIOENGINEERING WORKS	$ 9,480.00									
A	**CONSTRUCTION COST**	**$ 98,993.90**						**$ 1,015.89**	**0.90%**	**$ 1,015.89**	**0.90%**
B	**PROFIT 10% x A**	**$ 9,899.39**						**$ 101.59**	**0.09%**	**$ 101.59**	**0.09%**
C	**OVERHEAD**	**$ 1,670.00**							**0.00%**		**0.00%**
D	**TAX 2% (A+B+C)**	**$ 2,211.27**						**$ 22.35**	**0.02%**	**$ 22.35**	**0.02%**
E	**GRAND TOTAL (A+B+C)**	***$ 112,505.28***						***$ 1,139.82***	**1.01%**	***$ 1,139.82***	**1.01%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (LV21)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN KADA PROJETO

Naran projeto : For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)

Naran Kompanha : Chanel Chander Unipessoal.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	22/Fev/2022	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1	Companhia la Prepara buku tamu iha terreno no AND.I.P M.Liquica rekomenda ona ba kompanhia hodi prepara buku tamu.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXO C1 (MBR12)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality
Contractor : Nheu Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21027

Data Inspeksaun : 8/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Vaviquenia-Maubaralisa

Koordinat :


Start Point : Long : 125.21124422 Latetude : -8.61803763
End Point : Long : 125.2281181 Latetude : -8.632661686

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Excavation

STA, 0+850-0+870




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	28.00	15.40
Total			15.40 m3




Sketch Item servisu : Excavation

STA, 0+925 - 1+050



t	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	131.70	72.44
Total			72.44 m3

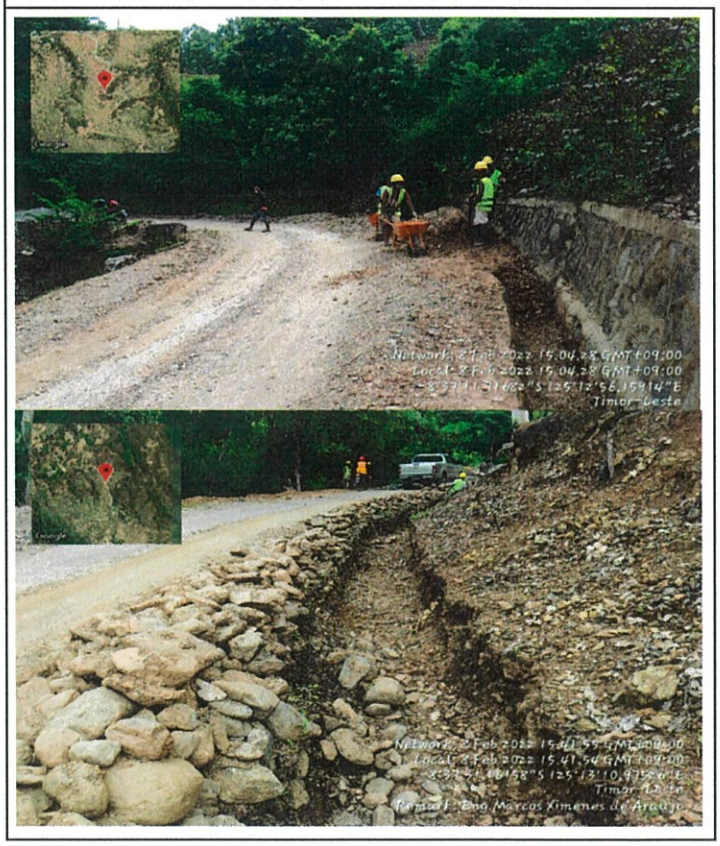

#ANEXO C2 (MBR12)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality

No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21027

SUMMARY										
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 3,458.00								
R-02	Drainage	$ 281.40								
R-03	Earth work	$ 12,812.63					$ 1,223.67	0.71%	$ 1,223.67	0.71%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 546.98								
R-08	Structures	$ 103,036.65					$ 16,855.97	9.72%	$ 16,855.97	9.72%
R-10	Dayworks	$ 210.00								
R-11	Routine maintenance	$ 6,112.00								
R-15	Provisional sum	$ 500.00								
	General items									
G-01	Security	$ 3,600.00								
G-02	Project team	$ 11,580.00								
G-03	Safety and protection	$ 7,441.55								
G-05	Meetings	$ 100.00								
G-06	Ceremonial costs	$ 350.00								
G-07	Mineral fees	$ 7,357.99								
A	**Construction cost**	**$ 126,957.66**					**$ 18,079.64**		**$ 18,079.64**	**10.42%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 12,695.77**					**$ 1,807.96**		**$ 1,807.96**	**1.04%**
C	**General items**	**$ 30,429.54**					**$ -**		**$ -**	**0.00%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 3,401.66**					**$ 397.75**		**$ 397.75**	**0.23%**
E	**Total**	**$ 173,484.62**					**$ 20,285.36**		**$ 20,285.36**	**11.69%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR12)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality

Kompanha : Nheu Unip,Lda

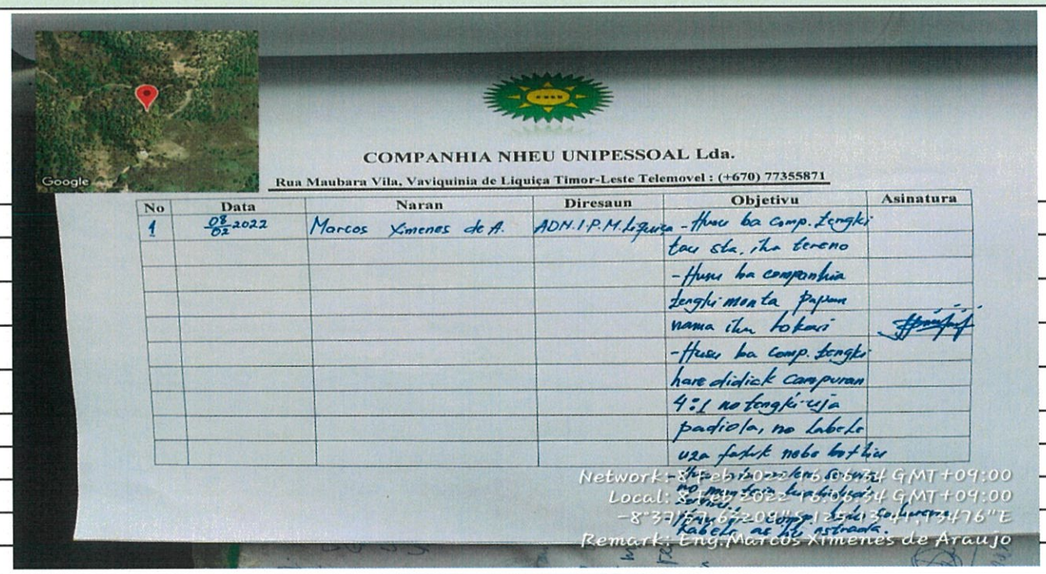No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/Fev/2022	Lquica/Maubara	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

ANEXO C1 (MBR13)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality
Contractor : Murak Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21032

Data Inspeksaun : 17/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Maubaralisa

Koordinat :


Start Point : Long : 125.22682227 Latetude : -8.644211521
End Point : Long : 125.2382274 Latetude : -8.672448189

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 0+050




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m3




Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+768-1+871




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	100.00	20.00
0.15	1.00		15
Total			35.00 m3

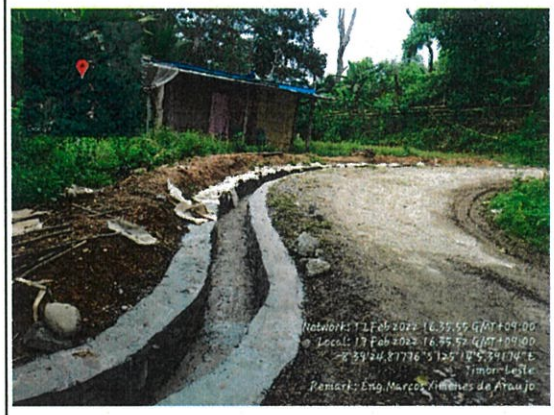

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+768-1+871



t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	100.00	20.00
0.15	1.00		15
Total			35.00 m3



ANEXO C1 (MBR13)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality
Contractor : Murak Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21032

Data Inspeksaun : 17/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Maubaralisa

Koordinat :


Start Point : Long : 125.22682227 Latetude : -8.644211521
End Point : Long : 125.2382274 Latetude : -8.672448189

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 0+050




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	50.00	27.50
Total			27.50 m3



Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+768-1+871




t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	100.00	20.00
Total			20.00 m3




Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 1+768-1+871



t	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	100.00	20.00
Total			20.00 m3

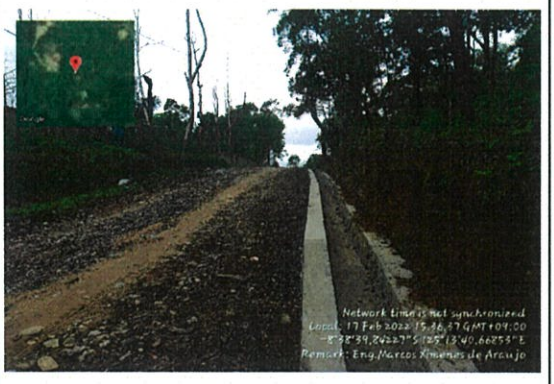

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (MBR13)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality
Contractor : Murak Unip.Lda
No. kontratu : MOP - CD- NCB-R- 21032

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 3,030.00					$ 550.00	0.36%	$ 550.00	0.36%
R-02	Drainage	$ 25.95								
R-03	Earth work	$ 9,149.46					$ 258.76	0.17%	$ 258.76	0.17%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 5,890.13								
R-08	Structures	$ 71,162.98					$ 2,521.00	1.65%	$ 2,521.00	1.65%
R-10	Dayworks	$ 105.00								
R-11	Routine maintenance	$ 10,808.86					$ 73.50	0.05%	$ 73.50	0.05%
R-15	Provisional sum	$ 250.00								
	GENERAL ITEM									
G-01	Security	$ 3,000.00								
G-02	Project team	$ 23,400.00								
G-03	Safety and protection	$ 6,131.00								
G-05	Meetings	$ 100.00								
G-06	Ceremonial costs	$ 300.00								
G-07	Mineral fees	$ 6,653.07								
A	**Construction cost**	**$ 100,422.37**					**$ 3,403.26**		**$ 3,403.26**	**2.22%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 10,042.24**					**$ 340.33**		**$ 340.33**	**0.22%**
C	**General items**	**$ 39,584.07**					**$ -**		**$ -**	**0.00%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 3,000.97**					**$ 74.87**		**$ 74.87**	**0.05%**
E	**Total**	**$ 153,049.65**					**$ 3,818.46**		**$ 3,818.46**	**2.49%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR13)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality

Kompanha : Murak Unip,Lda

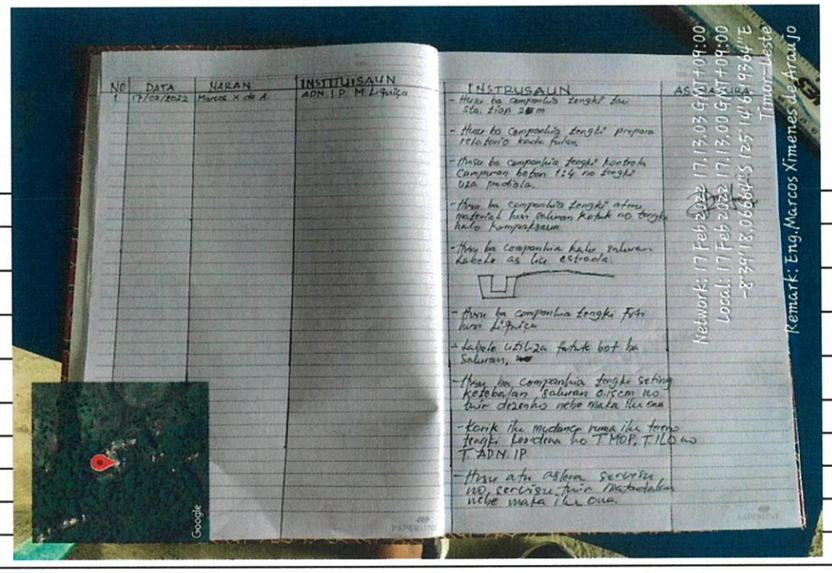No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	17/Fev/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

ANEXO C1 (MBR14)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)
Contractor : Meta Loe Crae Bau Unip,Lda
No. kontratu : MPW-W-210160

Data Inspeksaun : 8/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Vaviquenia - Maubaralisa

Koordinat :


Start Point : Long : 125.21757267 Latetude : -8.649459943
End Point : Long : Latetude :

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 0+000 - 0+060




T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	60.00	12.00
0.15	1.00		9
Total			21.00 m³




Sketch Item servisu : *Stone Masonry*

STA, 0+000 - 0+060



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	60.00	12.00
0.15	1.00		9
Total			21.00 m³





T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	60.00	12.00
0.15	1.00		9
Total			21.00 m³



ANEXO C1 (MBR14)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)

No. kontratu :

Data Inspeksaun : 8/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Vaviquenia - Maubaralisa

Koordinat :

Start Point : Long : 125.21757267 Latetude : -8.649459943

End Point : Long : Latetude :


Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo

2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Excavation

STA, 0+000 - 0+060




T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	60.00	66.00
Total			**66.00** m³




Sketch Item servisu : *Excavation*

STA, 0+000 - 0+060




T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	60.00	66.00
Total			**66.00** m³





T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	103.00	113.30
Total			**113.30** m³

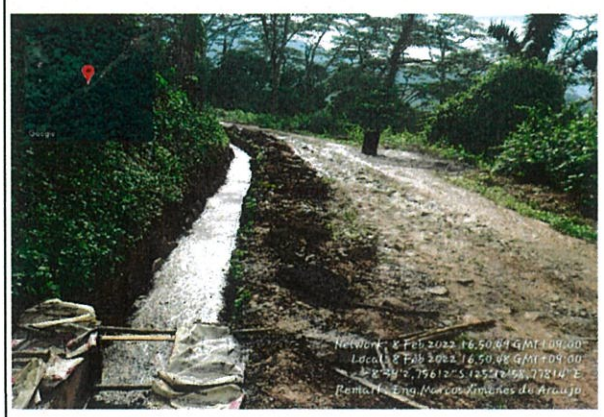

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (MBR14)

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)
Contractor : Meta Loe Crae Bau Unip,Lda
No. kontratu : MPW-W-210160

SUMMARY											
Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
Item	**Description**										
R-01	General works	$ 3,650.00						$ 300.00	0.15%	$ 300.00	0.15%
R-02	Drainage	$ 13.30									
R-03	Earth work	$ 34,566.24						$ 275.86	0.14%	$ 275.86	0.14%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,260.49									
R-08	Structures	$ 103,339.22						$ 2,296.88	1.16%	$ 2,296.88	1.16%
R-10	Dayworks	$ 210.00									
R-11	Routine maintenance	$ 8,133.60						$ 84.00	0.04%	$ 84.00	0.04%
R-15	Provisional sum	$ 500.00									
GENERAL ITEM											
G-01	Security	$ 1,380.00									
G-02	Project team	$ 11,790.00									
G-03	Safety and protection	$ 6,206.50									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 350.00									
G-07	Mineral fees	$ 7,035.58									
A	**Construction cost**	**$ 152,672.84**						**$ 2,956.73**	**1.49%**	**$ 2,956.73**	**1.49%**
B	Contractor Fee (A x 10%)	$ 15,267.28						$ 295.67	0.15%	$ 295.67	0.15%
C	General items	$ 26,862.08						$ -	0.00%	$ -	0.00%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	$ 3,896.04						$ 65.05	0.03%	$ 65.05	0.03%
E	**Total**	**$ 198,698.25**						**$ 3,317.46**	**1.67%**	**$ 3,317.46**	**1.67%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR14)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)

Kompanha : Meta Loe Crae Bau Unip,Lda

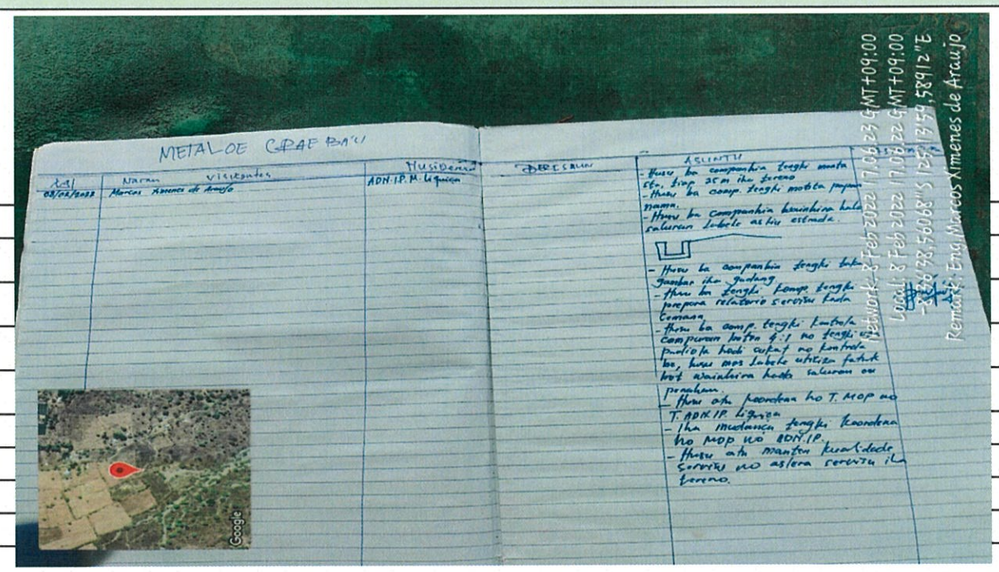No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/Fev/2022	Lquica/Liquica Villa	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

ANEXO C1 (MBR16)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)
Contractor : Luliana Unip,Lda
No. kontratu : MPW-W-210160

Data Inspeksaun : 8/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Vaviquenia - Maubaralisa

Koordinat :


Start Point : Long : 125.22811811 Latetude : -8.632661686
End Point : Long : 125.21757267 Latetude : -8.649459943

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Stone Masonry

STA, 2+100 - 2+150




T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m³

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch Item servisu : *Stone Masonry*


STA, 2+100 - 2+150



T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m³







T	w	*Distacia*	*Volume*
0.40	0.25	50.00	10.00
0.15	1.00		7.5
Total			17.50 m³

ANEXO C1 (MBR16)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)
Contractor : Luliana Unip,Lda
No. kontratu : MPW-W-210160

Data Inspeksaun : 8/Fev/2022

Fatin Inspeksaun : Suco Vaviquenia - Maubaralisa

Koordinat :


Start Point : Long : 125.21757267 Latetude : -8.649459943
End Point : Long : Latetude :

Naran Inspektor : 1 Eng. Marcos Ximenes de Araujo
2

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu : Excavation

STA, 2+100 - 2+150






T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	50.00	27.50
Total			**27.50** m³


Sketch Item servisu : *Excavation*


STA, 2+100 - 2+150





T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	50.00	27.50
Total			**27.50** m³



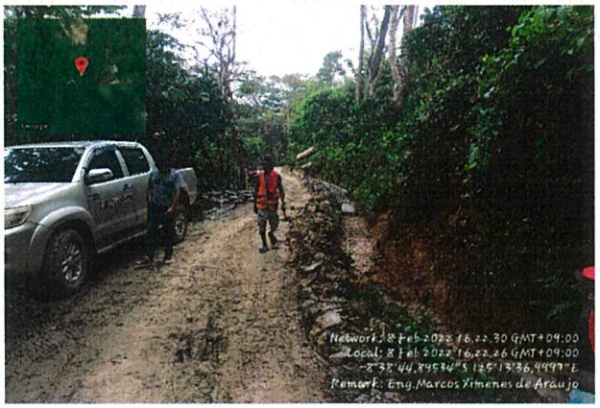

T	w	*Distacia*	*Volume*
0.55	1.00	50.00	27.50
Total			**27.50** m³

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (MBR16)

Name of Roads : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)
Contract No : MPW-W-210160
Contractor : Luliana,Unip Lda

SUMMARY

Itime	DESCRIPTION	CONTRACT ORIGINAL	RESULTADO INSPEKSAUN MOP				RESULTADO INSPEKSAUN ADN.IP				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	%	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General works	$ 4,580.00									
R-02	Drainage	$ 393.96									
R-03	Earth work	$ 9,548.23						$ 104.72	0.05%	$ 104.72	0.05%
R-05	Sub-base, base and pavement	$ 2,334.15									
R-08	Structures	$ 143,293.67						$ 1,244.62	0.58%	$ 1,244.62	0.58%
R-10	Dayworks	$ 140.00									
R-11	Routine maintenance	$ 5,922.00									
R-15	Provisional sum	$ 500.00									
	GENERAL ITEM										
G-01	Security	$ 3,600.00									
G-02	Project team	$ 10,300.00									
G-03	Safety and protection	$ 3,204.50									
G-05	Meetings	$ 100.00									
G-06	Ceremonial costs	$ 350.00									
G-07	Mineral fees	$ 8,797.79									
A	**Construction cost**	**$ 166,712.01**						**$ 1,349.34**	**0.63%**	**$ 1,349.34**	**0.63%**
B	**Contractor Fee (A x 10%)**	**$ 16,671.20**						**$ 134.93**	**0.06%**	**$ 134.93**	**0.06%**
C	**General items**	**$ 26,352.29**						**$ -**	**0.00%**	**$ -**	**0.00%**
D	**Construction tax (A+B+C x 2%)**	**$ 4,194.71**						**$ 29.69**	**0.01%**	**$ 29.69**	**0.01%**
E	**TOTAL**	**$ 213,930.21**						**$ 1,513.96**	**0.71%**	**$ 1,513.96**	**0.71%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Marcos Ximenes de Araujo
Engineiro ba Projecto Infraestructura,Transporte e irigaaun Municipio Liquica,ADN I.P.

Verifika Husi :

Eng.Joao Paulo Amaral
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade,ADN I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO D (MBR16)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)

Kompanha : Luliana Unip,Lda

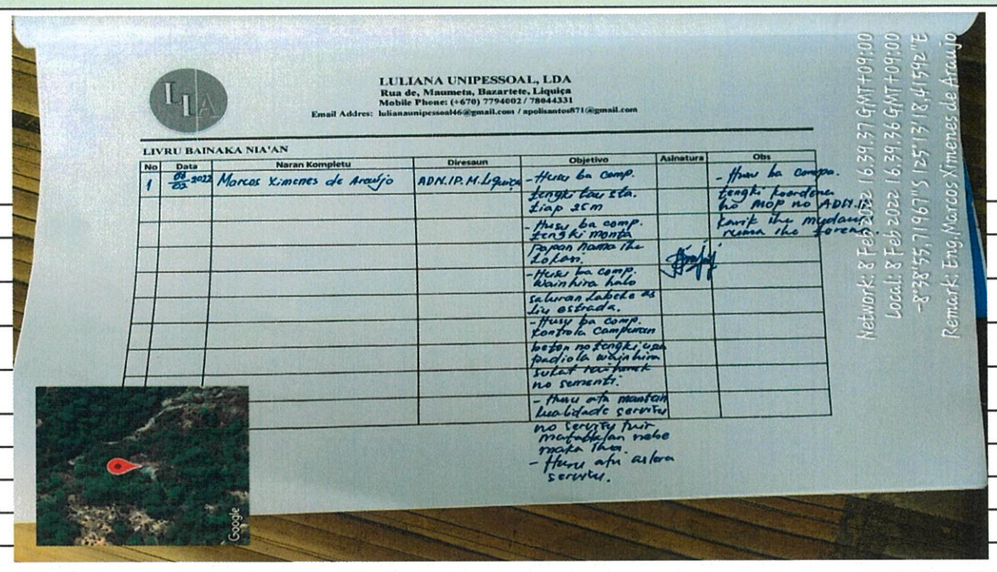No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/Fev/2022	Lquica/Maubara	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik ADN.I.P M.Liquica	1 2 3 4		
II					1 2 3 4 5		
III					1 2 3 4 5		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO B

Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica

NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESIO FISIKU (%)	SISTEMA	PROGRESIO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN	Fevereiro-2022		
																		Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Komulativ Progress (%)
1	New Installation MV_LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	BAZARTETE/ BZT1	LIQUICA	Mina Petro Leste Unip, Lda	RDTL-11004589	$ 499,250.84		100.00%	LAIHA PAGAMENTO	90.00%	$ 449,325.76	$ 49,925.08	ABANDONA				
2	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenanee Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE/ BZT2	LIQUICA	Banir Lema	MPW-W-190097	$ 565,452.33	Aug. 14, 2019	100.00%	TETAP	88.61%	$ 501,046.02	$ 64,406.31	PHO	Progresio Fisiko 100% e hela pagamento retensaun 10%	98.46%	0.00%	98.46%
3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	BAZARTETE/ BZT3	LIQUICA	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	$ 162,714.83	Aug. 16, 2019	95.68%	SELU DESEMBER	86.11%	$ 140,119.76	$ 22,595.07	ON-GOING	Progresu fiziikamente remata ona no hein retensaun			
4	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE/ BZT4	LIQUICA	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	$ 73,270.51	Sept. 5, 2019	100.00%	TETAP	88.11%	$ 64,558.26	$ 8,712.25	PHO	Progresu fiziikamente 100 % e nei falta pagamento ba retensaun			
5	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE/ BZT5	LIQUICA	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	$ 23,950.17	Dec. 5, 2019	77.60%	TETAP	69.84%	$ 16,726.74	$ 7,223.43	ON-GOING	Provezoriamente servisu paradu hela			
6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUKASAUN	BAZARTETE/ BZT6	LIQUICA	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	$ 67,492.69	Nov. 10, 2019	41.01%	SELU DESEMBER	36.91%	$ 24,910.52	$ 42,582.17	ON-GOING				
7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE/ BZT7	LIQUICA	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	$ 23,170.32	Oct. 22, 2019	79.24%	TETAP	52.23%	$ 12,106.37	$ 11,072.90	ON-GOING	Provezoriamente servisu paradu hela			
8	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	SEGURANCA NO DEFESA	BAZARTETE/ BZT8	LIQUICA	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	$ 58,107.88	Nov. 29, 2019	86.27%	SELU NOVEMBRO	81.96%	$ 47,623.31	$ 10,484.57	ON-GOING				
9	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	AGRICULTURA	BAZARTETE/ BZT9	LIQUICA	Naesalobu	MAP-P02019:19532	$ 67,927.04	Dec. 5, 2019	82.29	TETAP	74.06%	$ 50,309.27	$ 17,617.77	ON-GOING	Progresu fiziikamente remata ona			
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE/ BZT10	LIQUICA	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	$ 66,557.90	Oct. 23, 2020	73.90%	PAGAMENTU DESEMBER	66.51%	$ 44,268.56	$ 22,289.34	ON-GOING	ongoing			
11	New construction of isolation for covid 19 in liquica, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid	SAUDE	BAZARTETE/ BZT11	LIQUICA	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	$ 243,368.08	Oct. 22, 2020	96.86%	PAGAMENTU DESEMBER	87.18%	$ 212,156.22	$ 31,211.86	PHO	Projetu refere hela retensaun (10%) e Fisiku iha Tereno atinji deit 96.86%			
12	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM -CD	AGUA E SANEAMENTO	BAZARTETE/ BZT12	LIQUICA	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	$ 99,484.80	Sept. 9, 2019	92.14%	TETAP	82.93%	$ 82,502.69	$ 16,982.11	ON-GOING	Falta retensaun			
13	Bor River Normalisation & Landslide Clearing Works Of Tibar - Gleno Emergency Project	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	FLOOD CONTROL	BAZARTETE/ BZT13	LIQUICA	Shabryca Const. Unip.Lda	MPW-W-SS-SP 210011	FHO								Pagamento retensaun Desembro 2021 e oan rota fila tuir de Estado			
14	Emergency Project For Tibar River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	FLOOD CONTROL	BAZARTETE/ BZT14	LIQUICA	Sali Magu Unipessoal Lda	RT/067/MOP-2021	$ 502,473.28	Sept. 20, 2021	72.76%	LAIHA PAGAMENTO	64.02%	$ 321,707.56	$ 180,765.72	ON-GOING	ON-GOING	73.03%	5.20%	78.22%
15	Konstruasun Edificio Posto Administrativo Bazartete & Moru Haleu	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	BAZARTETE/ BZT15	LIQUICA	Aquarius Construction Unip,Lda	02/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 154,189.34	Aug. 31, 2021	9.33%	LAIHA PAGAMENTO	0.00%	$ -	$ -	New				
16	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo - Bucumera Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE/ BZT16	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-NCB-R -21030	$ 149,732.87	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New			3.14%	3.14%
17	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Fahilebo -Fatumasi Chainage 0+000-3+300 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE/ BZT17	LIQUICA	Hatumeta Oan, Unip.Lda	MOP - CD-RFQ - 21017	$ 88,852.44	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New			0.43%	0.43%
18	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000-7+000, liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE/ BZT18	LIQUICA	Hatuleo Unip.Lda	MPW-W-210144	$ 88,425.80	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New			5.01%	5.01%
19	Routine Maintenance Maumeta- Metagou - Bazartete Chainage 0+000+10+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE/ BZT19	LIQUICA	Craeleki Bercoli Unip,Lda	MPW-W-210145	$ 62,024.04	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New	SEIDAUK REGISTO IHA SISTEMA		1.53%	1.53%
20	R4D Rural Road Spot Improvesent Fahilebo - Bucumera Chainage 3+000+6+500) Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	BAZARTETE/ BZT20	LIQUICA	TM Caileba Unip,Lda	MPW-W-210158	$ 158,465.33	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New	SEIDAUK REGISTO IHA SISTEMA			
21	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA/ LV1	LIQUICA	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	$ 153,851.88	Dec. 5, 2019	95.23%	OK ona	81.19%	$ 124,915.14	$ 28,936.74	ON-GOING	Servisu iha Tereno remata tiha ona, sei hein kompanha Amenda kontratu nebe mate tiha ona	95.23%	0.54%	95.77%
22	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	LIQUICA VILA/ LV2	LIQUICA	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	$ 1,394,750.00	May 17, 2017	47.12%	TETAP	47.12%	$ 657,275.92	$ 737,474.08	ON-GOING				
23	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA/ LV3	LIQUICA	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	$ 55,012.05	Aug. 22, 2019	100%	TETAP	89.92%	$ 49,468.35	$ 5,543.70	PHO	Projetu refere hela retensaun (10%) e Fisiku iha Tereno atinji deit 99.91%			
24	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA/ LV4	LIQUICA	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	$ 71,468.49	Aug. 19, 2019	100%	TETAP	90.00%	$ 64,321.64	$ 7,146.85	PHO	Projetu ida nee Remata ona, no hela Retensaun 10% e pagamento atinji 100%	99.91%	0.00%	99.91%
25	New Gabion Works Flood Control Mota Ealkselara-Aldeia Estalun Suku Loidahar Liquica	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM -CD	FLOOD CONTROL	LIQUICA VILA/ LV5	LIQUICA	HL Fica	013LM/2DTL/MPIE/A.D.N/DII./VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt	FHO								pagamento retensaun desember 2021 e Fisiku iha Tereno atinji deit 98.92%			
26	Konstruasun Edificio Posto Administrativo Liquica	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	LIQUICA VILA/ LV6	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/01	FHO								pagamento retensaun desembor 2021 e Fisiku iha Tereno atinji deit 96.02% e oan rota fila hat nebe estado			

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO B

Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica

NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESIO FISIKU (%)	SISTEMA	PROGRESIO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN	Fevereiro-2022		
27	New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA/ LV7	LIQUICA	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	$ 593,093.80	Jan. 6, 2017	91.66%	TETAP	67.45%	$ 400,036.22	$ 193,057.58	ON-GOING				
28	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	LIQUICA VILA/ LV8	LIQUICA	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	$ 276,484.00	July 6, 2016	92.77%	TETAP	83.49%	$ 230,841.25	$ 45,642.75	ON-GOING				
29	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA/ LV9	LIQUICA	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	$ 452,362.93	Dec. 20, 2019	76.44%	TETAP	50.38%	$ 227,897.03	$ 224,465.90	ON-GOING				
30	Manutennsaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA/ LV10	LIQUICA	Banir Lema Unip,Lda	RDTL 0000	$ 47,299.32	Aug. 18,2021	88.95%	SELU DESEMBER	80.06%	$ 37,865.52	$ 9,433.80	ON-GOING				
31	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Pecina no Moru	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	LIQUICA VILA/ LV11	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	$ 176,933.50	Aug. 31, 2021	3.83%	SEIDAUK IHA PAGAMENTO	0.00%	$ -	$ -	New				
32	R4D Rural Road Spot Improvemnt Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA/ LV12	LIQUICA	Goubara, Unip Lda	MOP - CD - NCB-R - 21025	$ 131,219.62	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New			1.16%	1.16%
33	R4D Rural Road Spot Improvemnt Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA/ LV13	LIQUICA	PRUDENCIA CONSTRUCTION, Unip LDA	MOP - CD - NCB-R - 21036	$ 123,631.72	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New				
34	R4D Rural Road Spot Improvemnt Metaqou - Aibenu Chainage 0+000-7+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA/ LV14	LIQUICA	Metalika Unipessoal, Lda	MOP - CD - NCB -R - 21038	$ 238,739.71	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New			9.90%	9.90%
35	R4D Rural Road Spot Improvemnt Dato - Liodahar Chainage 0+000-12+300, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA/ LV15	LIQUICA	Luqueli Oan Unipessoal Lda	MOP-CD-NCB-R - 21039	$ 188,589.13	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New		1.46%	0.73%	2.19%
36	R4D Rural Road Spot Improvemnt Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 5+000 - 10 +000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA/ LV16	LIQUICA	Caiulu, Unip Lda	MOP - CD - NCB -R - 21035	$ 162,215.27	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New				
37	R4D Rural Road Spot Improvemnt Aibenu - Asumanu - Leurema Chainage 0+000 - 5+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA/ LV17	LIQUICA	Vicaroman, Unip Lda	MOP - CD NCB - R - 21034	$ 165,363.43	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New				
38	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu - Laberlaka Chaingane Chainage 2+500-5+400	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA/ LV19	LIQUICA	Claridade Unip,Lda	MPW-W-210163	$ 167,071.89	Oct.1,2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New	SEIDAUK REGISTO IHA SISTEMA		0.93%	0.93%
39	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba - Lukulai Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	LIQUICA VILA/ LV20	LIQUICA	Craeleki Bercoli, Unip Lda	MPW-W-210143	$ 76,423.05	Oct.1,2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New	SEIDAUK REGISTO IHA SISTEMA		0.37%	0.37%
40	Projeita Konstrusaun foun ESG publico 01 Liquica	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM -CD	EDUKASAUN	LIQUICA VILA/ LV21	LIQUICA	Roman Furak Unip,Lda	NCB 16/MEJD/DNA/2021	$ 167,079.099	Nov. 1, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New				
41	For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADA	LIQUICA VILA/ LV22	LIQUICA	Chanel Chander Unip.Lda	MPW-W210202	$ 112,505.280	13/12/2021	0.00%	SIEDAUK IHA PAGAMENTU	0.00%		$ 112,505.28	New			1.01%	1.01%
41	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA/ MBR1	LIQUICA	Fu Unip,Lda	RDTL - 0000	$ 13,000.00	Jan. 1, 2016	0.00	SEIDAUK IHA PAGAMENTO	0.00%	$ -	$ 13,000.00	New				
42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	MAUBARA/ MBR2	LIQUICA	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	$ 288,760.22	July 6, 2016	83.73%	TETAP	75.36%	$ 217,606.07	$ 71,154.15	ON-GOING				
43	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	MAUBARA/ MBR3	LIQUICA	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	$ 1,901,334.67	Sept. 7, 2017	99.98%	TETAP	89.98%	$ 1,710,791.24	$ 190,543.43	ON-GOING				
44	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	MAUBARA/ MBR4	LIQUICA	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	$ 275,000.00	Dec. 27, 2016	40.00	TETAP	38.00%	$ 104,500.00	$ 170,500.00	ON-GOING				
45	Novo Konstrusaun Edificio ESTV Lisadila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	MAUBARA/ MBR5	LIQUICA	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	$ 171,850.61	Aug. 16, 2019	89.17%	SELU NOVEMBRO	80. 25%	$ 137,915.77	$ 33,934.84	ON-GOING				
46	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	MAUBARA/ MBR6	LIQUICA	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	$ 170,965.65	Jan. 3, 2019	54.99%	TETAP	42.53%	$ 72,706.50	$ 98,259.15	ON-GOING	Proviseriamente paradu hela			

#ANEXO B

Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica

NU	NARAN PROJETU	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESIO FISIKU (%)	SISTEMA	PROGRESIO PAGAMENTO (%)	PAGAMENTO ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN	Fevereiro-2022		
47	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	MAUBARA/ MBR7	LIQUICA	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	$ 6,222,977.00	May 3, 2017	75.33%	TETAP	75.33%	$ 5,795,051.15	$ 1,898,049.85	ON-GOING				
48	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Numuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA/ MBR8	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-190098	$ 50,702.59	Aug. 28, 2019	95.90%	TETAP	86.31%	$ 43,761.73	$ 6,940.86	ON-GOING				
49	Konstrusaun Mora Haleu no Posto Siguransa ba Edifisio Posto Administrativo Maubara	ESTATAL	PDIM	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	MAUBARA/ MBR9	LIQUICA	Rafio Unip. Lda	01/AML/SMA-PDIM/VIII/2021	$ 56,445.70	July 21, 2021	16.32%	LAIHA PAGAMENTO	0.00%	$ -	$ -	New				
50	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Nunulete - Darulema Chainage 0+000-2+000, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA/ MBR10	LIQUICA	Rito - Pu, Unipessoal,Lda	MOP -CD-RFQ - 21013	$ 67,382.23	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New				
51	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera -Lissadila Chainage 4+800-9+600, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA/ MBR11	LIQUICA	Malibo, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21033	$ 152,622.90	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New				
52	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Barkau (VaVIQUENIA) - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA/ MBR12	LIQUICA	Nheu, Unipessoal LDA	MOP - CD- NCB-R- 21027	$ 173,484.62	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New			11.69%	11.69%
53	R4D Rural Road Spot Improvemrnt Malaisera - Lissadila Chainage 0+000-4+800, Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA/ MBR13	LIQUICA	Murak, Unipessoal Lda	MOP - CD- NCB-R- 21032	$ 153,049.65	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New			2.49%	2.49%
54	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa, Chainage 8+400-12+500)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA/ MBR14	LIQUICA	Meta Loe Crae Bau Unip,Lda	MPW-W-210160	$ 198,698.25	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New	SEIDAUK REGISTO IHA SISTEMA		1.67%	1.67%
55	R4D Rural Road Spot Improvement Samaropo -Giru Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA/ MBR15	LIQUICA	Nazico Unip Lda	MPW-W-210152	$ 114,789.50	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New	SEIDAUK REGISTO IHA SISTEMA			
56	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquina - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	MAUBARA/ MBR16	LIQUICA	Luliana Unip,Lda	MPW-W-210160	$ 213,930.25	Oct. 01, 2021	0.00%		0.00%	$ -	$ -	New	SEIDAUK REGISTO IHA SISTEMA		0.71%	0.71%

PREPARA HUSI,

(Eng. Marcos Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projetu Infrastutura Transporte e Irigasaun, ADN,I.P

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Eng. ba Edifisio Publiku Agua e Saneamento, ADN,I.P

(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. Mechanical Electricidade ADN,I.P

SERTIFIKA HUSI,

(Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERSO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	OBS
Liquica Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Pagamentu seidauk 100%
							Actual																													
	2	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														PHO
							Actual																													
	3	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														PHO
							Actual																													
	4	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)	Luqueli Oan Unip.Lda	MPW-W-210150	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu Chainage 5+000-10+000)	Cailu Unip.Lda	MPW-W-210154	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leorema Chainage 0+000-5+000)	Vicaromnan Unip.Lda	MPW-W-210155	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)	Metalika Unipessoal, Lda	MPW-W-210151	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700)	Prudencia Construction Unip.Lda	MPW-W-210153	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	10	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	Banir Lema Unip.Lda		LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																														Pagamentu Seidauk 100%
							Actual																													
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)	Goubara Unip Lda	MPW-W-210162	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 2+500-5+400)	Claridade Unip Lda			MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba- Lukulai Chainage 0+000-2+000)	Craeleki Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	14	Road Maintenance Section Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (A03)	Chantel Chander Unip.Lda	MPW-W-210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	15				LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																													
	16	Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica	Roman Furak Unip.Lda	NCB:16/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														
							Actual																													
Maubara (MBR)	1	Addt. Poste liga Maubara	Fu Unip,Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																													
	2	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Setrvisu iha Tereno 100% ona no hein Pedido Pagamentu
							Actual																													
	3	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														
							Actual																													
	4	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Inspeksaun Hamutuk ho Ekipa nebe tomakonta Projeito IMPRESTIMO
							Actual																													
	5	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500	Luliana Unip.Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														PHO
							Actual																													
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200)	Nheu.Unip.Lda	MPW-W-210164	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-2+000) Liquica Municipality	Rito-Pu Unip.Lda	MPW-W-210146	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 4+800-9+600)	Malibo Unip.Lda	MPW-W-210156	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 0+000-4+800)	Murak.Unip.Lda	MPW-W-210157	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	10	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 8+400-12+500)	Meta Loe Crae Bau.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo-Gisu Chainage 0+000-2+000)	Nazico.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	Luliana Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
Bazartete (BZT)	1	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	Banir Lema	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														PHO
							Actual																													
	2	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														
							Actual																													
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														PHO
							Actual																													
	4	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																														
							Actual																													
	5	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														
							Actual																													
	6	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																													
	7	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan																														
							Actual																													
	8	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	Naesalobu	MAP-P02019:19532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																														
							Actual																													
	9	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																														
							Actual																													
	10	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																														
							Actual																													
	11	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																														
							Actual																													
	12	Emergency Project For Tibar River	Sali-Magu Unip.Lda	RT/067/MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000)	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	14	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Fatumasi Chainage 0+000-2+300) Liquica Municipality	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210142	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality	Hatuleo Unip.Lda	MPW-W-210144	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	16	Routine Maintenance Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000-10+000	Craeleki Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
	17	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 3+000-6+500) Liquica Municipality	TM.Caileba.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going
							Actual																													
		TOTAL PROJETO ON-GOING																																		

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu | Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili | Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu | Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng.Marcos Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infrastructura, Transportes e Irigasaun ADN,

Sertifika Husi :

(Eng.Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN.I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2022

FEVEREIRO

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	OBS
Liquica Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Pagamentu seidauk 100%
							Actual																														
	2	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PHO
							Actual																														
	3	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PHO
							Actual																														
	4	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Dato-Loidahar Chainage 0+000-12+300)	Luqueli Oan Unip.Lda	MPW-W-210150	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu Chainage 5+000-10+000)	Cailu Unip.Lda	MPW-W-210154	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Aibenu-Asumanu-Leorema Chainage 0+000-5+000)	Vicaroman Unip.Lda	MPW-W-210155	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Metagou-Aibenu Chainage 0+000-7+600)	Metalika Unipessoal, Lda	MPW-W-210151	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Taltabi - Kutulau Chainage 0+000-1+700)	Prudencia Construction Unip.Lda	MPW-W-210153	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	10	Manutensaun Kanais Irrigasaun Faulara - Liquica	Banir Lema Unip.Lda		LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																															Pagamentu Seidauk 100%
							Actual																														
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 0+000-2+500)	Goubara Unip Lda	MPW-W-210162	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Berlakuidu-Laberlaka Chainage 2+500-5+400)	Claridade Unip Lda			MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Gunaba- Lukulai Chainage 0+000-2+000)	Craeleki Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	14	Road Maintenance Section Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes (A03)	Chantel Chander Unip.Lda	MPW-W-210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	15				LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																														
	16	Projeitu Konstrusaun Foun ESG Publico 01-Liquica	Roman Furak Unip.Lda	NCB:16/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																														
	17	For Roads Maintenance Section Tibar-Liquica-Maubara-Carimabala-Loes (A03)	Chanel Chander Unip.Lda	MPW-W210202	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
Maubara (MBR)	1	Addt. Poste liga Maubara	Fu Unip,Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																														
	2	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Setrvisu iha Tereno 100% ona no hein Pedido Pagamentu
							Actual																														
	3	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																														
	4	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Ekipa ADN.I.P nebe maka toma konta Projeito IMPRESTIMO
							Actual																														
	5	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500	Luliana Unip.Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PHO
							Actual																														
	6	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 0+000-4+200)	Nheu.Unip.Lda	MPW-W-210164	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-2+000) Liquica Municipality	Rito-Pu Unip.Lda	MPW-W-210146	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 4+800-9+600)	Malibo Unip.Lda	MPW-W-210156	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Malaisera-Lissadila Chainage 0+000-4+800)	Murak.Unip.Lda	MPW-W-210157	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	10	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 8+400-12+500)	Meta Loc Crac Bau.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	11	R4D Rural Road Spot Improvement Samarapo-Gisu Chainage 0+000-2+000)	Nazico.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	12	R4D Rural Road Spot Improvement Barkau (Vaviquenia - Maubaralisa Chainage 4+200-8+400)	Luliana Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
Bazartete (BZT)	1	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	Banir Lema	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PHO
							Actual																														
	2	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																														
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PHO
							Actual																														
	4	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																															
							Actual																														
	5	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																														
	6	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																														
	7	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan																															
							Actual																														
	8	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	Naesalobu	MAP-P02019:19532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																															
							Actual																														
	9	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															
							Actual																														
	10	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															
							Actual																														
	11	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																															
							Actual																														
	12	Emergency Project For Tibar River	Sali-Magu Unip.Lda	RT/067/MOP-2021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	13	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 0+000-3+000)	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210159	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	14	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Fatumasi Chainage 0+000-2+300) Liquica Municipality	Hatumeta Oan.Unip.Lda	MPW-W-210142	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Libaloa- Fahilebo Chainage 0+000-7+000) Liquica Municipality	Hatuleo Unip.Lda	MPW-W-210144	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	16	Routine Maintenance Maumeta-Metagou-Bazartete Chainage 0+000-10+000	Craeleki Bercoli Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
	17	R4D Rural Road Spot Improvement Fahilebo-Bucumera Chainage 3+000-6+500) Liquica Municipality	TM.Caileba.Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going
							Actual																														
TOTAL PROJETO ON-GOING																																				

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng.Marcos Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projeto Infrastructura, Transportes e Irigasaun ADN, I.P
M.Liquica

Sertifika Husi :

(Eng.Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de

Aprova Husi :

(Eng.Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN.I.P

ANEXO C1 (LV – 7)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399

Data Inspesaun : 28 /02/2022

Fatin Inspesaun : Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality

Koordinadas :

Start Point : Long : ....., Latetude : .....

End Point : Long : ....., Latetude : .....

Naran Inspector : 1.Camilio De Jesus

2. .....

3. .....

4. .....

Foto Actual	Obervasaun
	Progresu iha Tereno Linha Baixa tensaun 21 unidade (Poste) Presisa hadia

ANEXO C1 (LV – 7)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399

Foto Actual	Obervasaun
	Poste Kleuk Presija hadia

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (LV - 7)
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality

Kompanha : Maferdi Unip Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/2/2022	Liquica/ Liquica Villa	Camilio de Jesus	Tek. AND.IP	1	Hadia Treckschoor nebe mak mamar	
					2	hadia poste kleuk	
					3	hadia fiu baixa tensaun nebe mak monu	
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LV - 7)

Date of Insp : 28 February 2022
Location : Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality
Company : Maferdi Unip. Lda

Project Name : New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality

SUMMARY

CONTRACT					Result of Inspection (ADN.IP)					
					PREVIOUS BILLING		THIS BILLING (Progres Actual)		AMOUNT TO DATE	PERCENTAGE UP TO DATE
NO	WORK DESCRIPTION	Amount	PERCENTAGE		Amount	PERCENTAGE	Amount	PERCENTAGE	Amount	PERCENTAGE
A	PREPARATION WORK	$ 19,895.46	3.35%		$ 19,895.46	3.35%	$ -	0.00%	$ 19,895.46	3.35%
B	INSTALLATION MV LINE	$ 315,981.97	53.28%		$ 310,588.90	52.37%	$ 291.20	0.05%	$ 310,880.10	52.42%
C	INSTALLATION OF TRANSFORMER	$ 39,182.48	6.61%		$ 39,484.88	6.66%	$ -	0.00%	$ 39,484.88	6.66%
D	EXTENTION LV LINE	$ 99,283.90	16.74%		$ 100,683.89	16.98%	$ 21,474.55	3.62%	$ 122,158.44	20.60%
E	HOME CONECTION	$ 118,750.00	20.02%		$ 72,960.00	12.30%	-$ 17,860.00	-3.01%	$ 55,100.00	9.29%
F	GRAND TOTAL				$ 543,613.13	91.66%	**$ 3,905.75**	**0.66%**	$ 547,518.88	92.32%
G	TOTAL CONTRACT	$ 593,093.80	100.00%							

Inspeksaun husi:

Camilio de Jesus
Enginherio M.E Municipio Liquica ADN,I.P

Verifika Husi :

Deolindo de Fatima Marques
Chefi Seksaun Projeito M.E & ITC
ADN,I.P

Sertifika Husi:

Eng. Emerenciana da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade
ADN,I.P

ANEXO C1 (LV – 8)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371

Data Inspesaun : 22 /2/2022

Fatin Inspesaun : Liquica Vila - Liquica Municipality

Koordinadas :

Start Point : Long : ....., Latetude : .....

End Point : Long : ....., Latetude : .....

Naran Inspector : 1.Camilio De Jesus

2. .....

3. .....

4. .....

Foto Actual	Obervasaun
	1. Progresu iha Tereno Laiha mudansa 2. Servisu Paradu

ANEXO C1 (LV – 8)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371



3. Progresu iha Tereno Laiha mudansa
4. Servisu Paradu

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (LV - 8)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality

Kompanha : Busa Unip Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	22/2/2022	Liquica/ Liquica Villa	Camilio de Jesus	Tek. AND.IP	1	Servisu paradu	
					2	Actividade iha Tereno Laiha	
					3	Laiha ona Spasu atu kontinua servisu	
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		

ANEXO C1 (MBR – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364

Data Inspesaun : 22 /2/2022

Fatin Inspesaun : Kulau to Maubara - Liquica Municipality

Koordinadas :

Start Point : Long : ....., Latetude : .....

End Point : Long : ....., Latetude : .....

Naran Inspector : 1.Camilio De Jesus

2. .....

3. .....

4. .....


Foto Actual	Obervasaun
	1. Progressu iha tereno laiha mudansa 2. Laiha ona spasu atu kontinua servisu 3. Servisu paradu

ANEXO C1 (MBR – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364

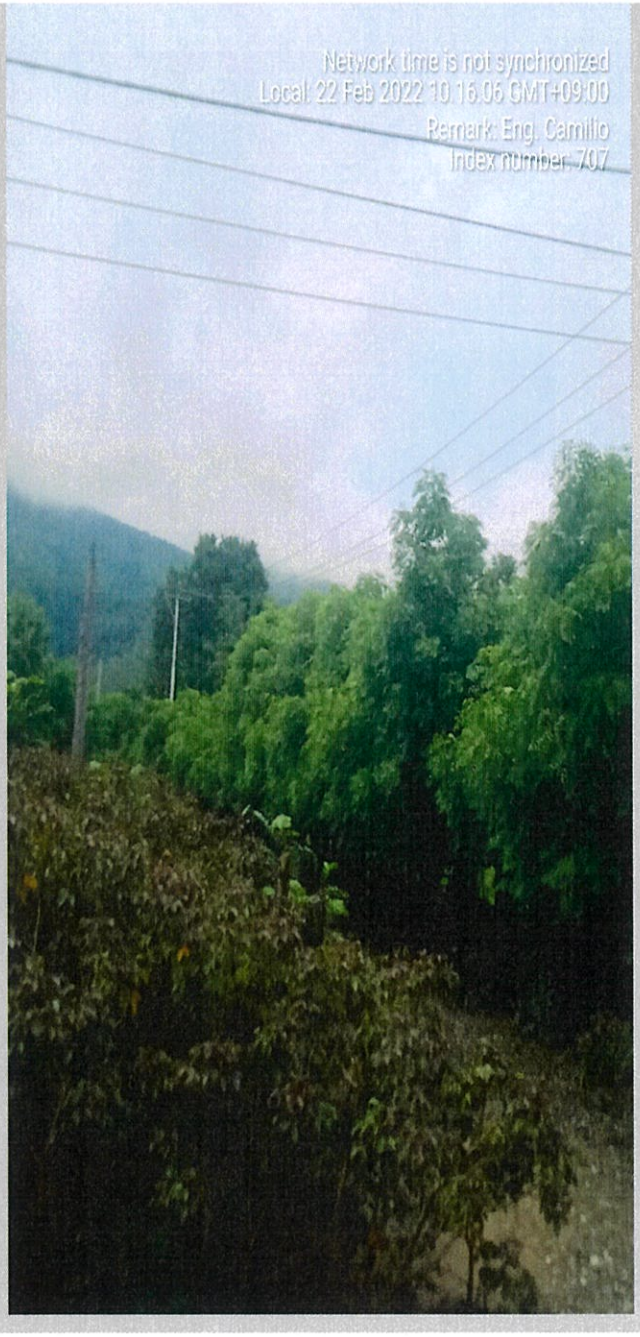Foto Actual	Obervasaun
	1. Progressu iha tereno laiha mudansa 2. Laiha ona spasu atu kontinua servisu 3. Servisu paradu

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.


Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO D (M - 2)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality

Kompanha : Britas Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	22/2/2022	Liquica/ Maubara	Camilio de Jesus	Tek. AND.IP	1	Progressu fisuku iha tereno laiha mudansa	
					2	laiha ona spasu atu kontinua kompleta servisu	
					3	Servisu paradu	
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Camilio de Jesus

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																													OBS
								Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Liquica Vila (LV)	8	New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	9	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
	11	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	PDIM	ESTATAL	Plan																														
							Actual																														
MAUBARA (MBR)	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														
							Actual																														
BAZARTETE (BZT)	3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														
							Actual																														
	6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	LM-BS	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														
							Actual																														
	10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	Fundo Covid	MINISTERIO SAUDE	Plan																														
							Actual																														
	8	New construction of isolation for covid 19 in liquica, Timor Leste	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	Fundo Covid	MINISTERIO SAUDE	Plan																														
							Actual																														
TOTAL PROJETO ON-GOING																																				

Note:

Plano Periode Inspesaun Iha Tereinu | Relatoriu avaliasuan mensal Iha Dili | Implementasaun Plano Periode Inspesaun Iha Tereinu | Inspesaun Pagamentu Anual Iha Tereinu

Prepara Husi :

(Camilio de Jesus)
Tekniku M& E ADN.IP

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN.IP

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia guterres)
Adjuntu Director Executivo ADN.IP

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Camilio de Jesus
Municipio	MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	FEVEREIRO																														OBS
								Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
Liquica Vila (LV)	8	New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	9	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
	11	Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio, Jardim, Picina no Moru	Metalika Unipessoal, Lda	01/SMA-AML/PDIM VIII/2021	PDIM	ESTATAL	Plan																															
							Actual																															
MAUBARA (MBR)	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															
							Actual																															
BAZARTETE (BZT)	3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	LM-BS	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															
							Actual																															
	10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	Fundo Covid	MINISTERIO SAUDE	Plan																															
							Actual																															
	8	New construction of isolation for covid 19 in liquica, Timor Leste	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	Fundo Covid	MINISTERIO SAUDE	Plan																															
							Actual																															
TOTAL PROJETO ON-GOING																																						

Note:

Plano Periode Inspesaun Iha Tereinu | Relatoriu avaliasuan mensal Iha Dili | Implementasaun Plano Periode Inspesaun Iha Tereinu | Inspesaun Pagamentu Anual Iha Tereinu

Prepara Husi :

(Eng. Camilio de Jesus)
Tekniku M& E ADN.IP

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN.IP

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T.M.,Eng)
Director Executivo ADN.IP
