REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público


A.D.N. I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

RELATÓRIU TERSEIRU TRIMESTRÁL IMPLEMENTASAUN PROJETUS INFRAESTRUTURAS

JULHO, AGOSTO, SETEMBRO 2022



Mapa Sub-Distrito Iha Timor Leste, 2022

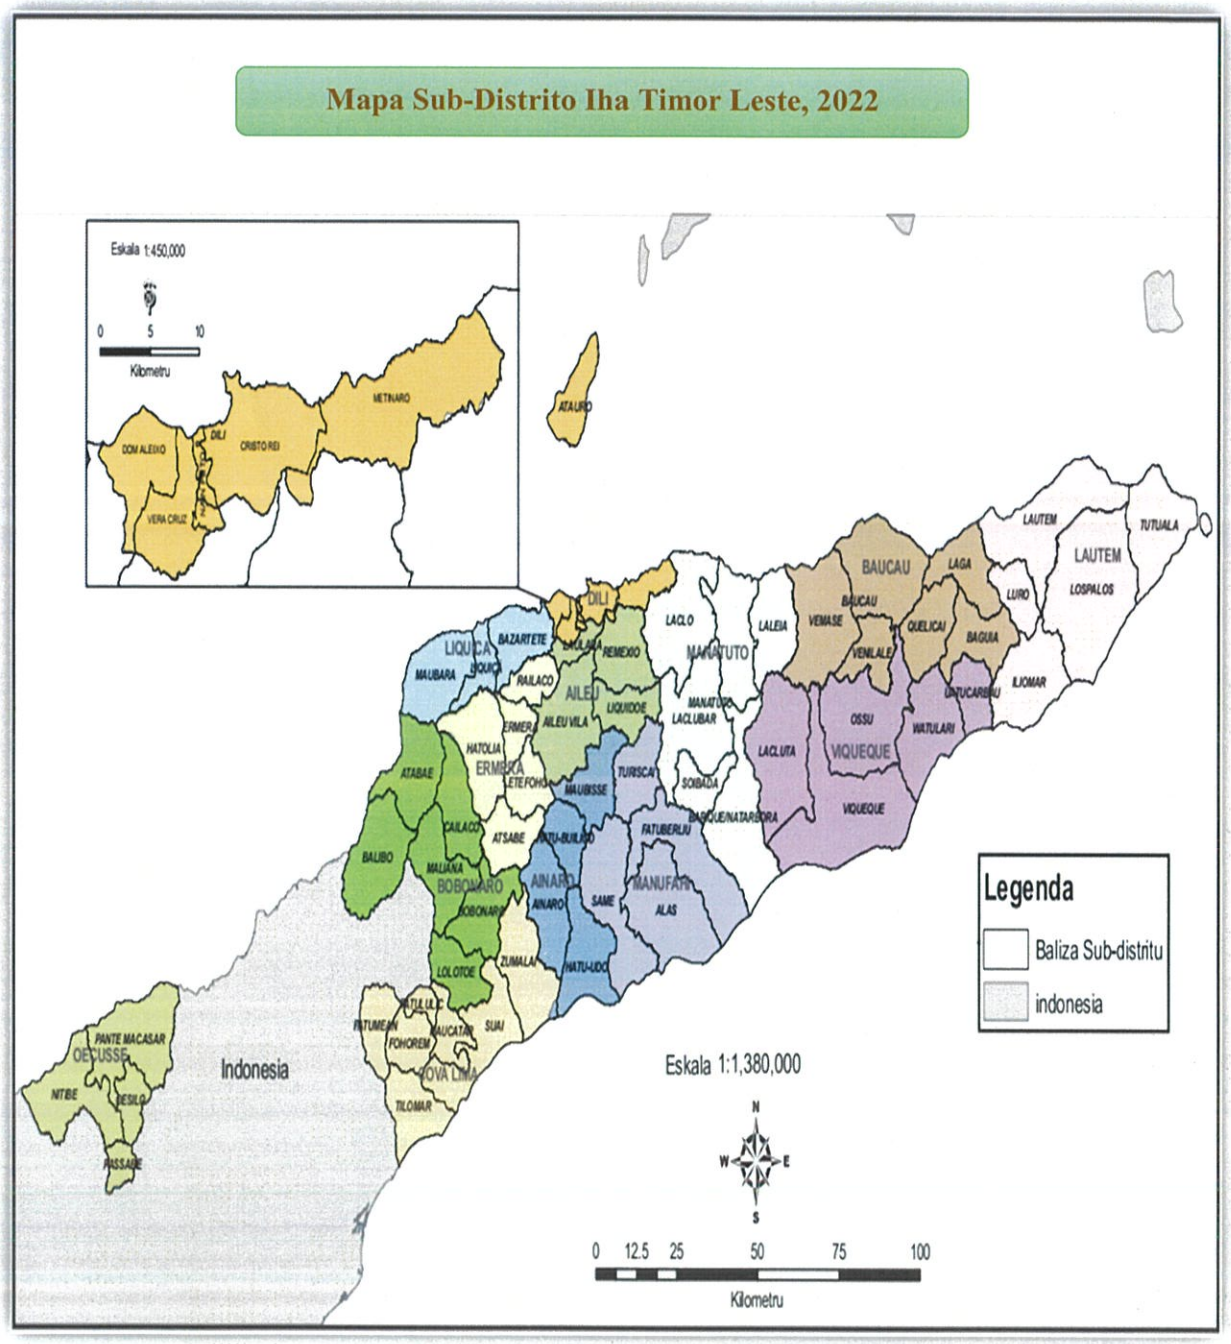

TERMU NO ABRAVIASAUN

RDTL	República Democrática de Timor-Leste
MPO	Ministério Do Plano E Ordenamento
ADN, I.P.	Agência Desenvolvimento Nasional, Instituto Publico
DE	Diretor Executivo
DA	Diretor Adjunto
GADE	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo
UGA	Unidade Gestão Administrativa
UAP	Unidade de Avaliação de Projetos
UCVQ	Unidade Controlo e Validação de Qualidade
UEDC	Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências
FI	Fundo das Infraestruturas
LM-CD	Liña Ministerial-Capital Desenvolvimento
LM-BS	Liña Ministerial-Bens de Serviços
LM-TP	Liña Ministerial-Transferensia Pública
PDIM	Programa Desenvolvimento Integrado Municipál

ADN, I.P.

FOLHA VALIDADE

SUMÁRIO
RELATÓRIO TERCEIRO TRIMESTRAL IMPLEMENTASAUN PROJETUS INFRAESTRUTURAS
2022

Prepara Husi :

(Miguel Marques Monteiro de Jesus, S.T., M. Eng.)
Assesor Nasional – ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Susana Sinala do Rego Amaral, S.T.)
Chefe Ekipa Validasaun Baze de Dadus – ADN, I.P.

Sertifika (I) Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas, S.T., M.T.)
Koordenadora UCVQ – ADN, I.P.

Sertifika (II) Husi :

(Melenia da Costa Baros, B. EC., S.T.)
Koordenadora UAP – ADN, I.P.

Approva Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, ST, M. Eng.)
Diretor Executivo – ADN, I.P.

Lista Kontributór

Diretor Ezekutivo Agência Desenvolvimento Nasional, I.P.
Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M. Eng.
Adjunto Diretor Agência Desenvolvimento Nasional, I.P.
Januario Maia Guterres, S.T.

Konpilador
Miguel Marques Monteiro de Jesus
Ekipa de Validação e Base de Dados
Susana Sinala do Rego Amaral
Johanes Hornai
Nencia F. O. Rego
Ana Maria L. Da Costa Gurerres
Olivia Soares
João Paulo Amaral
Tifania Guterres Ornai
Engeñeiros Inspesaun no Monitorizasaun
Emerenciana da Costa M. F.
Deolindo F. Marques
Merinho Cuco L. de Araujo
Rui Lopes
Manuel Bany da S. C. de Carvalho
Joaquim de C. Madeira
Claodino Soares dos Santos
Jaulino H. Rodrigues
Jacob da Costa Camoes
Agustinho Aranda
Jerry Gil M. Pereira
Leonito Pereira
Ambrosio Martins Nuno
Salvador Martins
Zulkarnaen Depari
Jose Aparicio S. Soares
Noe Menezes Madeira
Moises Angelico Marques Freitas
Madelino Deonizo José Magno
Domingos Soares Martins
Prezenzio Legorio do Carmo Dias Ximenes
Bosco Dinis de Sousa
João Q. do Rego
Manuel Estrela Soares
Pedro de Lourdes Alves
Julmira Soares Sampaio
Egidio Gonsalves
João Quintão do Rego
Rosalia de Fatima
Eduardo do Santos
Ezequiel R. De Oliveira
Tito Edgar F. N. de Jesus
Antonio Mendonça Faria da Silva
Jaimito Manuel Quintão
Julio Jacob Soares
Geovanio M. X. Carlos Aleixo
Inocencio dos Reis Costa Maia
Deamantino Henrique Lopes
Elnino Junior Araujo Mota
Quico Adelino Junior
Marcus Ximenes de Araújo
Luduvina Maria H. Guterres
Antonia de Fatima Morais
Juninho António Abrantes da Cruz
José R. Carlos Gusmão
Aleixo da C. Andrade
Augusta da Costa Ferreira
Domingos da Costa e Silva
Fabiano F.M. madeira
Fidelis Mardiano da Costa
Romulo J. M. Henrique
Majorico Cele Tali
Celvio J. Alves
Bebiano C. de Jesus Lopes
Roberto Maria Martins
Camilio Maia
Adonis Julio Fernades
Camilio de Jesus
Silvino Ribeiro
Dezeña, Setting ho Publikasaun
David da Silva

PREÁMBULU



Uluk nanain molok hato'o objetivu husi publikasaun *relatóriu 3º trimestrál*, ha'u-nia saudasaun no hakru'uk ba ita-boot sira hotu.

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, I.P.) nu'udar instituisaun governu nian ida ne'ebé tutela iha Ministeriu Planu no Ordenamentu (MPO) bazeia ba Decreto-Lei N.º 60 /2020 de 25 de Novembro, ho nia funsaun prinsipál mak atu halo verifikasaun no Sertifikasaun ba servisu infraestutura Estadu nian liuliu obra konstrusaun sivíl. Nu'udar Instituisaun Importante Governu nian, ADN, I.P. iha responsabilidade bo'ot atu garante katak Verifikasaun no Sertifikasaun ba implementasaun projetu sira ne'ebé governu hari'i iha duni kualidade no fó benefísiu ba povu nia moris di'ak, hodi asegura nafatin dezenvolvimentu Timor-Leste ne'ebé inkluzivu no sustentável.

Nu'udar Diretór Ezekutivu asumi responsabilidade boot hodi fó orientasaun servisu ba kargu xefia sira hotu-hotu atu garante nafatin funsionamentu instituisaun nian inklui elabora planu atividade anuál, plurianuál no mós relatóriu atividade bazeia ba rezultadu serbisu loroloron iha terenu tuir dekretu lei ne'ebé atribui ba.

Deseja katak ho relatóriu ida ne'e bele reprezenta hanesan evidénsia reál hodi sukat rezultadu atinjimentu, dezafiu no mós karik presiza rekomendasaun atu mellora serbisu hotu-hotu tuir responsabilidade ne'ebé ida-idak asumi ba.

Ha'u agradese ba ekipa elaborasaun nia inisiativa ho vontade tomak inklui fontes informasaun sira ne'ebé kontribui husi tékniku sira, maski relatóriu ida ne'e la dauk perfeitu maibé ba oin ho defeitu ne'ebé hasoru sai hanesan lisaun ida ne'ebé fó biban atu prodús di'ak liu tan relatóriu tuir mai.

Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M. Eng.
Diretor Exekutivo – ADN, I.P.

Tabela Konteúdo

I.	INTRODUSAUN	1
1.1	Enkuadramentu Legal	1
1.2	Estrutura da Agência Desenvolvimento Naional, I.P.	2
1.3.	Competensias Orgaun ADN, I.P.	3
1.4.	Flow-Prosesu Fluxograma Pedido Verifikasaun Dokumentus iha ADN, I.P.	6
1.5.	Flow-Prosesu Fluxograma Pedido Sertifikasaun Pagamentu Iha ADN, I.P.	6
II.	SUMARIO	8
2.1.	Bens e Móveis ou Patrimonio ADN, I.P.	8
2.2.	Bens e Móveis ou Patrimonio – Ekipamentus no Mesuramentu ADN, I.P.	8
2.3.	Força de Trabalho Funsionario ADN, I.P. Funções no Unidades	9
2.4.	Projetos 13 Municipio por Fontes Finansiamento	15
2.5.	Projetos 13 Municipio por Setores	19
2.6.	Projetos 13 Municipio por Ministerio	22
2.9.	Prefil Pagamentu Komulativu Segundo Trimestral	22
III.	OBSTÁCLO	28
3.1	Obstaklu hosi Parte Companhia	28
3.2	Obstaku hosi Parte ADN, I.P.	28
IV.	REKOMENDASAUN	30
4.1.	Rekomendasaun ba Parte Companhia, ADN, I.P. no Ministeria Relevantes	30

ANEKSU

A. Detalha Progresu fisiku Infrastruturas Segundo Trimestral 2022
B. Lista Ekipamentus no Mesuramentu Laboratorio ADN, I.P.
C. Lista Ekipamentus no Mesuramentu Mecânica e Elétrica
D. Checklist Completidade & Validasaun Dokumentus Teknika
E. Perfil Fungsionarios ADN, I.P.

I. INTRODUSAUN

1.1. Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN, I.P. hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revolgasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P. hanesan Insituto Púbico (IP), ho Misaun ADN, I.P. nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (Infrastruturas) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análize kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viavél.

Depois de Dekertu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P. hanesan Insituto Púbico (IP), ADN, I.P. nia knar principal iha 3 mak hanesan :

1. Halo avaliasaun previa ba projeitu Kapital Desenvolvimentu nian.
2. Halo inspesaun no sertifikasaun ba projetu Kapital Desenvolvimentu
3. Elabora standarizasaun tekniku ne'ebe relasiona ho Desenvolvimento Innfraestruturas
4. Kontinua jere no finansia projeto PDIM no LM em curso hosi tinan anterior.

Tuir Decreto Exekusaun Orsamentu 2021, ADN, I.P. mos iha papel atu halo avaliasaun previa, inspesaun no sertifikasaun ba projetos ne'ebe finansia liu husi orsamentu bens de servicos no transferensia publica ne'ebe nia kusto boot liu $ 50,000 (Exeptu projeto husi BTL, EP no EDTL, EP)


Vizaun

ADN, I.P. garantia kualidade prestasaun serbisu husi ninian funsionarios no adapta nia estrutura interna hodi responde (hatán) ho forma ne'ebé efikáz liu, hasoru dezafius (sasidik oioin).

Misaun

Funsionarios no membros assosiados hotu ne'ebe iha ona akordo serbisu ho ADN, I.P. hatene nia responsabilidade sei obdese ba politikas no prosedimento ne'ebe regula ona durante ezerse nia funsaun iha ADN, I.P.

1.2. Estrutura da Agência Desenvolvimento Nasional, I. P.

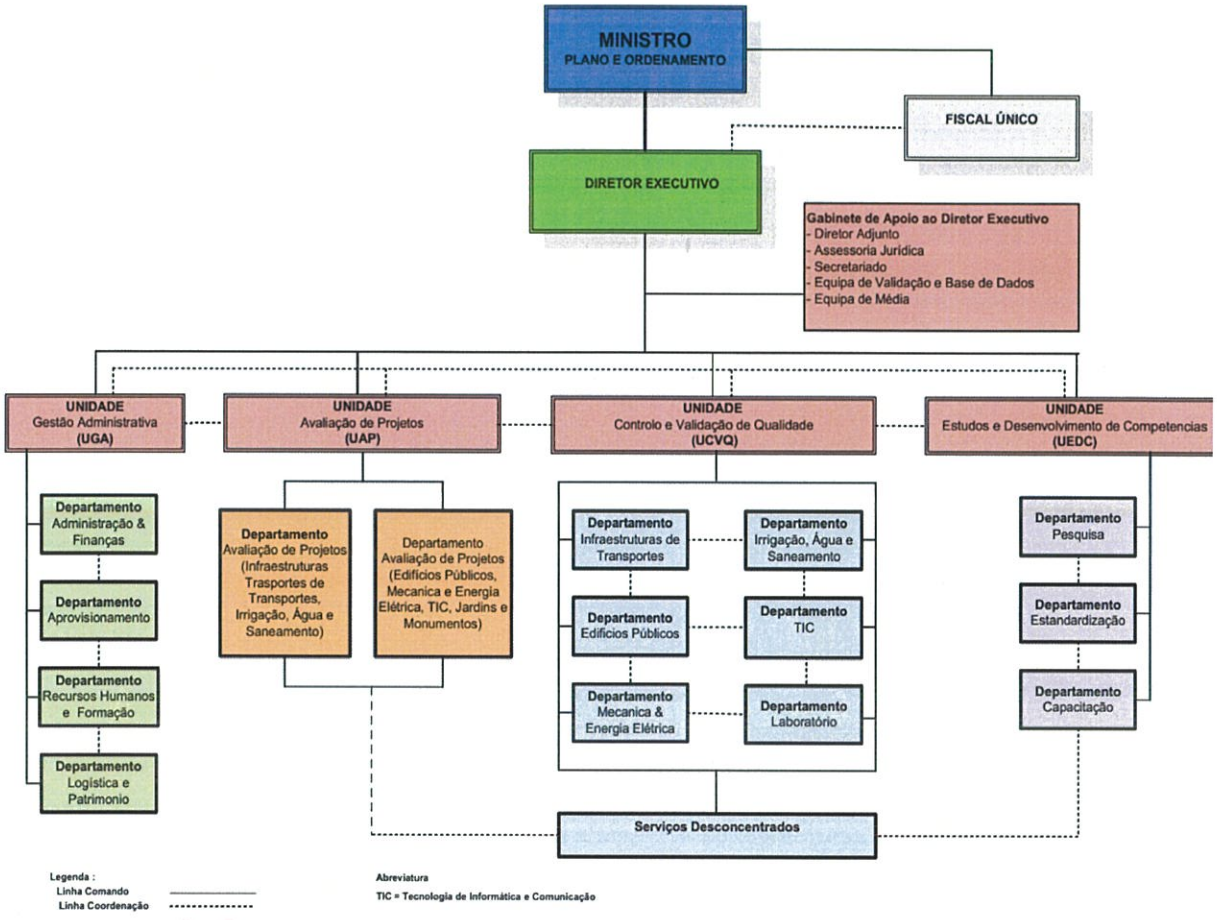

Bazeia ba decreto lei No. 60/2020, 25 Novembro Estatuta Agência ba Desenvolvimento Nacional, I.P. Capitulo II seksaun I artigo 7 ho 8; Estrutura Organica ADN, I.P. komposto husi :

a. Ministro Plano e Ordenamento (MPO)
b. Fiscal Unico (FU)
c. Diretor Executivo (DE)
d. Adjunto Diretor Executivo (ADE)
e. Gabinete de Apoio ao Diretor Executivo (GADE)
f. Unidade de Gestão Administrativa (UGA)
g. Unidade de Avaliação de Projetos (UAP)
h. Unidade de Controlo e Validação de Qualidade (UCVQ)
i. Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências (UEDC)

1.3. Competensias Orgaun ADN, I.P.

1. Kompete ba Diretór Ezekutivu :

a) Reprezenta ADN, I.P. ho entidade sira hotu públiku no privadu, nasionál no estranjeiru;
b) Dirije, kordena no orienta servisu sira hotu no atividade sira hotu, fó ordem no instrusaun sira konforme nesesidade servisu hodi asegura servisu nia funsionamentu di'ak;
c) Kordena elaborasaun no propoin ba tutela planu atividade sira anuál no plurianuál;
d) Kordena elaborasaun no submete relatóriu atividade sira ba apresiasaun husi tutela;
e) Kordena elaborasaun husi regulamentu internu, estrutura no organizasaun ADN, I.P. nian no kuadro pesoál hodi propoin aprovasaun husi tutela;
f) Aprova ordem ba kompras, responsabiliza ba kompromisu sira hotu, despeza no pagamentus tuir lei nomós ho respeitu ba limite orsamentu nian katak aprova ona ba ADN, I.P.;
g) Akompaña ezekusaun no gestaun husi orsamentu no haloos dezviu ruma relasiona ho previsoens;
h) Asegura katak kobransa reseita nomós realizasaun despeza sira hotu regulár;
i) Autoriza atu hahú prosedimentu aprovizionamentu sira no adjudikasaun husi kontratu públiku sira, tuir valór no bazeia ba lei;
j) Asina kontratu servisu ho traballadór sira hotu ne'ebé katak laiha vínkulu ho funsaun públika;
k) Dirije, avalia no hala'o podér disiplinár relasiona ho traballadór sira iha ADN, I.P. no koordena ho Komisaun Funsaun Públika;
l) Aprova no asina pareser tekniku ne'ebé relasiona ho atribuisoens ADN, I.P. nian;
m) Aprova validasaun husi projetu no obras hodi halo pagamentu, haktuir atribuisoens ADN, I.P. nian;
n) Hetan koñesimentu no foti medidas hodi rezolve keixas relasiona ho servisu ADN, I.P. nian;
o) Deside kona-ba reklamasaun sira husi ADN, I.P. nia servisus relasiona ho ADN, I.P. nia kompetènsias;
p) Promove kordenasaun ho orgaun sira seluk iha Governu nomós ho parseiru dezenvolvimentu nasionál no estranjeiru sira hodi asegura kumprimentu ba objetivus dezenvolvimentu nasionál nian.
q) Reprezenta ADN, I.P. liuhusi asinatura husi kontratu no akordu sira hotu nomós pratika atu sira seluk katak nesesáriu hodi ADN, I.P. hala'o ninia kna'ar;
r) Hala'o funsaun sira seluk tuir Ministru nia instrusoens.

2. Unidade de Gestão Administrativa

1. Unidade de Gestão Administrativa, ho abreviatura UGA, mak servisu ADN, I.P. nian ne'ebé responsavel ba servisu administrativu, finanseiru, rekursus humanus nomós aprovizionamentu no lojístika.
2. Kompete ba UGA hodi :
   a) Fó apoiu tékniku no administrativu ba servisu sira hotu iha ADN, I.P.;
   b) Jere rekursus finanseirus, humanus no materiais husi ADN, I.P.;

c) Promove formasaun no kapasitasaun husi kuadro pesoál administrativu ADN, I.P. nian;
d) Verifika legalidade husi despeza, promove ninia pagamentu nomós asegura ninia rejistu;
e) Tau matan ba kumprimentu husi leis, regulamentus no norma sira seluk ne'ebé mak relasiona ho administrasaun no finansas;
f) Avalia nesesidade finanseiru sira iha ADN, I.P. no aprezenta orsamentu bazeia ba nesesidades;
g) Fó apoiu relasiona ho ekipamentu, manutensaun no inovasaun iha área teknolojia informátiku;
h) Emite relatóriu finanseiru kona-ba reseita no despeza ADN, I.P. nian;
i) Hala'o kna'ar seluk bazeia ba Diretór Ezekutivu nia instrusoens.

3. Desizaun sira ne'ebé mak koordenadór UGA nian halo sujeitu ba rekursu ierárkiku nesesáriu hato'o ba Diretor Ezekutivu.

3. Unidade de Avaliação de Projetos

1. Unidade de Avaliação de Projetos, ho abreviatura UAP, mak servisu ADN, I.P. nian ne'ebé responsavel ba avaliasaun husi projetu públiku sira relasiona ho arkitetura no enjeñaria husi pontu de vista tékniku no finanseiru.
2. Kompete ba UAP hodi:
   a) Emite pareser vinkulativu kona-ba projetu molok submete ba prosesu aprovizionamentu relasiona ho atividade ne'ebé hatuur iha alíneas a) no b), númeru 2 husi artigu 4;
   b) Pronunsia kona-ba projetu sira ne'ebé relasiona ho arkitetura no enjeñaria katak la hatuur iha alinea anteriór hafoin pedidu husi entidade kompetente;
   c) Hala'o avaliasaun detalladu kona-ba kualidade projetu nian, nomós atu verifika aspektu tékniku hotu-hotu, nu'udar ezemplu aspektu jeolójiku no idrolójiku sira, haktuir norma no regulamentu sira ne'ebé mak bele aplika;
   d) Hala'o avaliasaun detalladu hodi asegura viabilidade projetu nian, ho estimativa husi kustu no kuantidade sira nomós verifika aspetu finanseiru hotu-hotu;
   e) Avalia no aprova, husi ponto de vista tékniku no finanseiru, razoabilidade husi estudu sira relasiona ho viabilidade husi projetu no obra sira hatu'ur iha númeru 2, artigu 4.
3. Desizaun sira ne'ebé mak koordenadór UAP nian halo sujeitu ba rekursu ierárkiku nesesáriu hato'o ba Diretor Ezekutivu.

4. Unidade de Controlo e Validação de Qualidade

1. Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ho abreviatura UCVQ, mak servisu ADN, I.P. nian ne'ebé responsavel ba servisu sira ne'ebé katak halo kontrolu husi evolusaun no implementasaun obras konstrusaun sivíl nian no validasaun respektivu.
2. Kompete ba UCVQ hodi:
   a) Kontrola no inspesiona beibeik kona-ba evolusaun no progresu obras konstrusaun nian;
   b) Verifika ezekusaun obras nian, nu'udar ezemplu kualidade husi matérial no ekipamentu sira ne'ebé mak utiliza, haktuir kontratu nomós haktuir norma no regulamentu sira ne'ebé mak bele aplika;
   c) Hala'o inspesaun husi obras kuando nesesáriu, hodi bele determina progresu físiku respektivu no, konsekuentemente, hodi bele valida valór servisu nian mak ezekuta ona;

d) Kontrola no avalia proposta alterasaun no ajustamentu sira mak nesesáriu durante faze konstrusaun nia laran;
e) Emite autorizasaun ba pagamentu sira bazeia ba progresu ezekusaun projetu nian nomós bazeia ba kualidade ne'ebé mak ezijidu;
f) Sertifika kualidade konstrusaun, Infraestrutura ka obras tipu seluk;


3. Desizaun sira ne'ebé mak koordenadór UCVQ nian halo sujeitu ba rekursu ierárkiku nesesáriu hato'o ba Diretor Ezekutivu.

5. Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências

1. Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências, ho abreviatura UEDC, mak servisu ADN, I.P. nian ne'ebé responsavel ba estudus no investigasaun iha área projetus no iha área obras konstrusaun no projetu sira seluk ho interese estratéjiku, nomós responsavel ba dezenvolvimentu husi kapasidades iha áreas arkitetura, projetu no enjeñaria.
2. Kompete ba UEDC :
   a) Realiza no promove estudus investigasaun no dezenvolvimentu teknolójiku relasiona ho obras konstrusaun sivíl no indústria materiais nian, sasán no produtu sira seluk ba konstrusaun no área sira seluk relasiona ho konstrusaun;
   b) Realiza estudus kona-ba normalizasaun no regulamentasaun tékniku no elabora dokumentu sira refere, ho kolaborasaun husi entidade sira seluk kompetente;
   c) Omologa kualidade materiais nian, sasán no produtu sira seluk ba konstrusaun nomós elementu, prosesu no empreendimentu sira ba konstrusaun;
   d) Hala'o ensaius, emite pareser sira no responde ba konsultas, nomós realiza ezame no perísia sira kona-ba UEDC nia atividade;
   e) Elabora ka propoin adosaun padraun no norma espesiál sira ba sertifikasaun kualidade, ho kolaborasaun husi entidade kompetente sira seluk;
   f) Promove dezenvolvimentu ba formasaun no kapasitasaun husi traballadór sira Estadu nian iha áreas arkitetura, enjeñaria no fiskalizasaun obras, nomós fó valor ba kualifikasaun profisionál respektivu, ho koordenasaun husi entidade sira ne'ebé mak relevante.
3. Desizaun sira ne'ebé mak koordenadór UEDC nian halo sujeitu ba rekursu ierárkiku nesesáriu hato'o ba Diretor Ezekutivu.

1.4. Flow- Prosesu Fluxograma Pedido Verifikasaun Dokumentus iha ADN, I.P.


Funsaun prinsipal fluxograma ba Pedido verifikasaun dokumentus hodi fornese informasaun jeral relasiona ho prosesu verifikasaun faseadamente husi prosesu ida ba prosesu sira seluk, ho nune hafasil servisu atendementu ninian nomos simplifika prosedimentus atu bele fasilita entendementu relasiona ho verifikasaun dokumentus infrastruras fiziku.

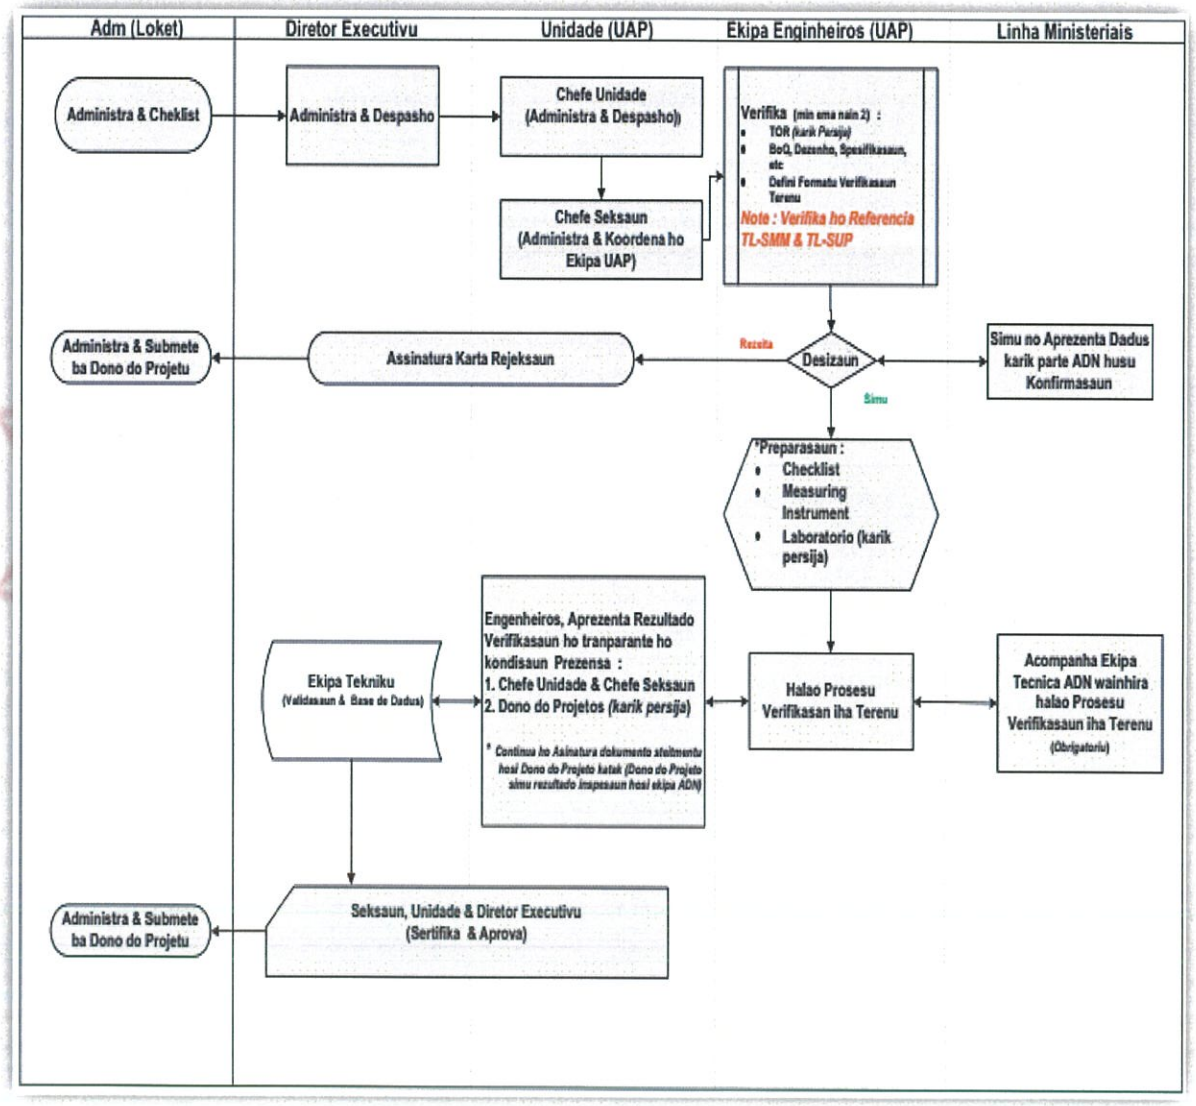

Fluxograma 1.4. Pedido Verifikasaun Dokumentus iha ADN, I.P.

1.5. Flow – Prosesu Fluxograma Pedido Sertifikasaun Pagamento iha ADN, I.P.

Funsaun prinsipal fluxograma ba pedido sertifikasaun pedido dokumentus pagamentu hodi fornese informasaun jeral relasiona ho prosesu sertifikasaun dokumentus faseadamente husi prosesu ida ba prosesu sira seluk, ho nune hafasil servisu atendementu ninian nomos simplifika prosedimentus atu bele fasilita entendementu ba prosesu sertifikasaun pagamentus projetus infrastruturas molok hala'o pagamentu.

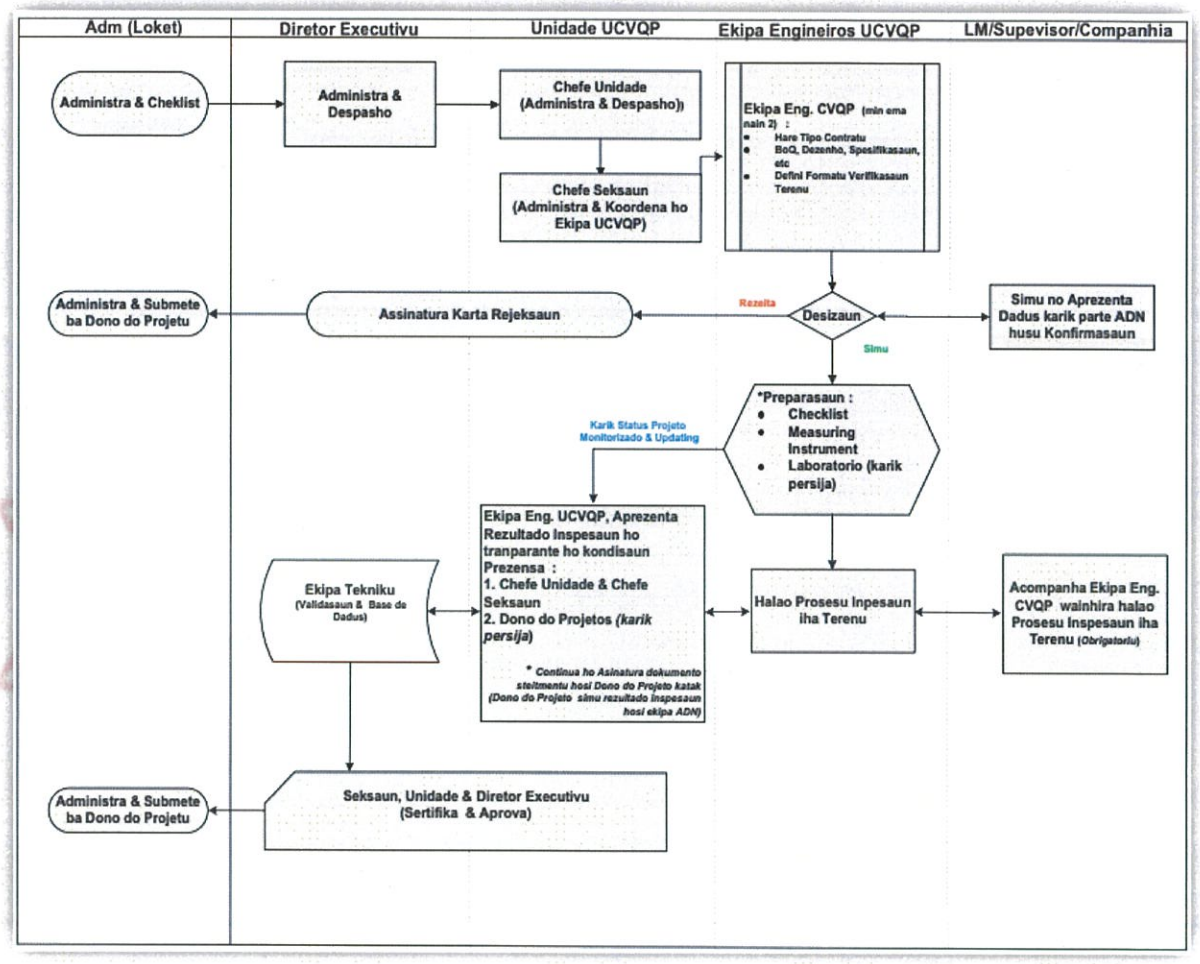

Fluxograma 1.5. Pedido Sertifikasaun Dokumentus Pagamento iha ADN, I.P.

II. SUMÁRIO

2.1. Bens e Móveis ou Patrimonio ADN, I.P.

Bens e Móveis ou Patrimonio ADN, I.P. ba tipo A-C kofre ba eskritorio prinsipal ADN, I.P. iha Dili nomos ba 12 municipios iha teritorio tomak ne'ebe defini ba tipo A ba bens e móveis (Veículo, Makina, Ekipamentus Eletronica no Elétrica), tipo B ba bens e móveis hanesan (Mobiliario Armario, Meza e Kadeira) no tipo C ba bens e móveis (Escritorio, Armagem no Residensia)

Nu	Tipo A	Kuantidade	Tipo B	Qty	Tipo C	Kuantidade
1	Veiculo *(Toyota & Mitsubishi)*	32	Meja Executivo	15	Ecritorio	3
2	Motocikleta	42	Meja Partisan	100	Residensia	12
3	Desktop Computer	75	Meja Secretariado	43	Armagem	4
4	Laptop	50	Sofa	1	Laboratorio	1
5	Projector Screen	3	Kadeira Executivu	112		
6	Server Compouting	1	Kadeira Secretariado	126		
7	Television (TV)	1	Armario Aluminium	68		
8	Makina fotokopia	10	Armario Baja	16		
9	UPS	43	Armario Ai	12		
10	AC	56	Gaveta	115		
11	Lampu	321				
12	Handcam	4				
13	Printer	32				
Total		**670**		**608**		**20**

Tabela 2.1. Bens e Móveis ou Patrimonio ADN, I.P.

2.2. Bens e Móveis ou Patrimonio – Ekipamentus Labóratorio no Mesuramentu ADN, I.P.

Bens e Móveis ou Patrimonio – Ekipamentus Labóratorio no Mesuramentu ADN, I.P. relasiona ho ekipamentus testes no mesuramentu ba inspesaun projetus ninian ne'ebe fahe ba kategoria 3 mak hanesan : ekipamentus teste ne'ebe lokaliza iha laboratório nasional ADN, I.P. e maioria ba testing ba material konstrusaun sivil, material testing ne'ebe lokaliza ou fahe ba Serviços descocentrados (*Engeñeiros ADN, I.P. Municipios*) nomos ekipamentus testing no mesuramantu ba mecânica e elétrica ne'ebe lokaliza iha Departamento no engiñeiro mecânica e elétrica ninian eskritorio.

UCVQ		
Laboratório	**Serviços Desconcentrados - (Eng.12 Municipius)**	**Mecânica no Elétrica**
100	**96**	**18**
214		
TOTAL		

Tabela 2.2. Bens e Móveis ou Patrimonio – Ekipamentus Labóratorio no Mesuramentu ADN, I.P.

2.3. Força de Trabalho Fungsionario ADN, I.P. – Funções no Unidades

Forsa trabalho haktuir iha tabela 2.3.1. iha kraik Eskreve detalho relasionamente numeru ba Jenero, numeru funsoens orgaun no Numeru kada Unidades iha ADN, I.P. ninian.

NU	NARAN	POSISAUN	MANE	FETO	DE & DA	CORDENADOR	CHEFE DEP./SEC.	ENGENEIROS ESPESIALIZADO	ADM/FINANSA/ARQV/ LOGISTIKA	ASESOR/A NASIONAL	ASESOR INTERNASIONAL
I	**Diretor Executivo - ADN, I.P.**										
1	Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M. Eng.	Diretor Executivo ADN, I.P.	✓		✓						
II	**Gabinete Apoio ao Diretor Executivo (GADE) - ADN, I.P.**										
II.1.	**Diretor Adjunto - ADN, I.P.**										
1	Januario Maia Guterres, S.T.	Diretor Adjunto	✓		✓						
2	DR. Manuel Moita da Silva Júnior	Assesor Jurídico	✓								✓
II.2.	**Secretariado Unidade Apoio ao Diretor Exekutivo - ADN, I.P.**										
1	Joedia Marni Tavares	Secretaria e Asisstente Administrasaun Diretor Executivo		✓					✓		
2	Marfa Zita Cristovão do Carmo Vieira, Lic. CSH.	Secretaria e Asisstente Administrasaun Diretor Executivo		✓					✓		
3	Engracia Fernandes Brito Amaral, S.S.	Secretaria e Asisstente Administrasaun Diretor Executivo		✓					✓		
4	Basilio Da Conceição Silva	Motoristas & Administrasaun Unidade ao Apoio Diretor Exekutivo	✓						✓		
5	Mateus da Silva	Motoristas & Administrasaun Unidade ao Apoio Diretor Exekutivo	✓						✓		
II.3.	**Equipa de Validação e Base de Dados -ADN, I.P.**										
1	Susana Sinala do Rego Amaral, S.T.	Chefe Equipa - VBD		✓			✓			✓	
2	Fernão Antonio Lopes Nobre Mouzinho, L.Inf, M. Eng.	Assesor GIS	✓							✓	
3	Ana Maria Lourdes da Costa Guterres, B.ETT.	Eng. Equipa - VBD (Mecânica e Elétrica)		✓				✓			
4	Johanes Hornay, S.T.	Eng. Equipa - VBD (Edifício Publicas)	✓					✓			
5	João Paulo Amaral, S.T.	Eng. Equipa - VBD (Pontes, Estrada e Seias)	✓					✓			
6	Olivia Soares, B.EC.	En. Equipa - VBD (Pontes, Estrada e Seias)		✓				✓			
7	Nencia Filomena Oliveira do Rego, S.Kom.	Eng. Equipa - VBD (TIC)		✓				✓			
8	Tifânia Clotária Guterres Ornai, Lic. Eng.	Eng. Equipa - VBD (Kompiladora Dadus Projetus e GIS)		✓				✓			
II.4	**Equipa de Mídia - ADN, I.P.**										
1	Samuel Soares	Assesor Nacional da Mídia	✓							✓	
2	David da Silva	Designer de Mídia	✓						✓		
3	Franzela Pinto	Assitente Mídia		✓					✓		
III	**Unidade Gestão Administrativa (UGA) - ADN, I.P.**										
III.1.	**Departamento Administração & Finanças - ADN, I.P.**										
1	Nelson Soares Pinto, L. Ec.	Koordenador- UGA	✓			✓					
2	Epi Orleães, Lic. Educ., M.M.	Public Finance Management, Gender & Social Inclusion Advisor		✓						✓	
3	Amélia da Costa, L. Ec.	Chefe Departamento - Adm & Finanças		✓			✓				
4	Angela Merisia Egong Correia, S.E.	Oficial Finanças		✓					✓		
5	Abelito da Costa, L.Agrn.	Oficial Finanças	✓						✓		
6	Ferdiana Maia Duarte, Lic. Eco.	Oficial Contabilidade		✓					✓		
7	Elizabeth do Nascimento Cabral, L. CS	adm & Financas Official		✓					✓		
8	Aquilino Soares Ferreira, Lic. AP	Planeiamento Oficial	✓						✓		

NU	NARAN	POSISAUN	MANE	FETO	DE & DA	CORDENADOR	CHEFE DEP./SEC.	ENGENEIROS EPESIALIZADO	ADM/FINANSA/AROV/ LOGISTIKA	ASSESOR/A NASIONAL	ASESOR INTERNASIONAL
9	Sonyta Mariana Elisabeth Da Silva Henuk, S.I.P.	Oficial Administrasaun		✓					✓		
10	Elisabeth Felizarda Ximenes, S.T.	Oficial Administrasaun		✓					✓		
11	Nelson Teotonio Barros Fernandes Magno, Lic. CSH.	Oficial Administrasaun	✓						✓		
12	Edivijes Soares Lobo	Assitente Official Administrasaun		✓					✓		
13	Ana Eusebia Ximenes, Lic. Eco	Official Administrasaun		✓					✓		
14	Carlos Mendonça Calapes	Assitente Official Administrasaun	✓						✓		
III.2.	**Departamento Aprovizionamento - ADN, I.P.**										
1	Jose Antonio Filomeno Gago Exposto, Lic. Eco.	Official Aprovizionamento	✓				✓				
2	Sertorio Martins	Official Aprovizionamento	✓						✓		
3	Lidia da Cruz Monteiro, B. Educ.	Assistente Official Aprovisonamento		✓					✓		
4	Maria Auxiladora Aleixo dos Santos, Lic. Eco.	Official Aprovizionamento		✓					✓		
III.3.	**Departamento Recursos Humanos e Formação - ADN, I.P.**										
1	Tomas Magno do Carmo, S.E., M. Eco.	Acting & Assessor Nacional Recursos Humanos e Formação	✓							✓	
2	Isabel Gomes Lopes, Lic. Eco.	Assesora Politicas Publicas		✓						✓	
3	Gicella Jong Gonçalves, Lic. Eco.	Official Recursos Humanos		✓					✓		
4	Angela Beatriz Mita Freitas, Lic. Buss.	Official Rekursu Humanos		✓					✓		
5	Eufragio Fabiano Fernandes Xavier, Lic, Buss	Official Rekursu Humanos	✓						✓		
III.4.	**Departamento Logistica e Patrimonio - ADN, I.P.**										
1	Jose Amaral, S.I.P.	Chefe Dept. Logística e Patrimonio	✓				✓				
2	Sandra Ribeiro Belo, Lic. Eco.	Assistente Administracao da Logística e Patrimonio		✓					✓		
3	Marcelino Soares do Carmo, S.T.	Assistente da Logística e Patrimonio	✓						✓		
4	Sergio Gomes	Assistente da Logística e Patrimonio	✓						✓		
5	Arcenio Magno Do Rego	Mecânico de Automóveis	✓						✓		
6	Jony Maia da Silva dos Santos	Motoristas Bobonaro	✓						✓		
7	João Pedro Cortereal	Motoristas Aileu	✓						✓		
8	Silveiro da Costa	Motoristas Manufahi	✓						✓		
9	Bernado Da Cruz Amaral Perreira	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	✓						✓		
10	Manuel Antonio Soriano	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	✓						✓		
11	Bendito Mendes Bento	Motoristas Viqueque	✓						✓		
12	Domingos Da Costa	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	✓						✓		
13	Agostinho Amaral	Motoristas Covalima	✓						✓		
14	Rui Antonio Gaio	Motoristas Liquisa	✓						✓		
15	Gilroy Marcal da Cunha Braz	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	✓						✓		
16	Rafael Joaquim Mousaco Galucho	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	✓						✓		
17	Timoteo Da Silva Morais	Motoristas Manatuto	✓						✓		
18	Joel Barreto Abrantes	Motoristas Dili (Laboratório)	✓						✓		
19	Delio Abel Manuel Perreira	Motoristas Lautem	✓						✓		
20	Anacleto de Sousa Belo	Motoristas Baucau	✓						✓		
21	Salvador Ruas Amaral	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	✓						✓		
22	Siltonio Pinto de Araujo	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	✓						✓		
23	Rosario Saores de Deus	Motorista Ermera	✓						✓		
24	Lucas Alberto Soares Pereira	Motoristas Ainaro	✓						✓		

NU	NARAN	POSISAUN	MANE	FETO	DE & DA	CORDENADOR	CHEFE DEP./SEC.	ENGENÉIROS ESPESIALIZADO	ADM/FINANSA/AROV/ LOGISTIKA	ASSESOR/A NASIONAL	ASESOR INTERNASIONAL
IV	**Unidade de Avaliação de Projetos (UAP) - ADN, I.P.**										
IV.1.	**Secretariado UAP - ADN, I.P.**										
1	Melenia da Costa Barros, B. EC., S.T.	Koordenadora - UAP		✓		✓					
2	Miguel Marques Monteiro de Jesus, S.T., M. Eng.	Assesor Nacional Mecânica e Elétrica (UAP & UCVQ)	✓							✓	
3	Joanito Doutel Pereira, B. Eng.	Assessor Nacional Water & Irrigation (UAP no UCVQ)	✓							✓	
4	Rosaria Elizabeth Aniceto Cardoso Amaral, B.S, M.S.	Assesora Nacional Project Management (UAP no UCVQ)		✓						✓	
5	Maryanti Kota dos Santos, Lic. Eco.	Official Administração - UAP		✓					✓		
6	Fidelia Auxiliadora da Conceicao Freitas, Lic. Eco.	Asistente Administração - UAP		✓					✓		
IV.2.	**Departamento Avaliação de Projetos Infrestruturas Transportes, Irrigação, Agua e Saneamento (ITIAS) - ADN, I.P.**										
1	Rogerio Marçal Pires, B. EC., Lic. Eng.	Eng. Senior - ITIAS	✓				✓				
2	Daniel Arcanjo Alves, S.T.	Eng. ITIAS	✓					✓			
3	Martinho da Costa Graciano, B. EC., Lic. Eng.	Eng. ITIAS	✓					✓			
4	Mario Gusmao Mendeita da Cruz Nunes Silva, S.T.	Eng. ITIAS	✓					✓			
5	Anjelita Maria de Jesus Cardoso, S.T.	Eng. ITIAS		✓				✓			
6	Olivio Marcos da Silva Correia, S.T.	Eng. ITIAS	✓					✓			
IV.3.	**Departamento Avaliação de Projetos Edificio Públicos, Mecanica e Energia Electrica, TIC, Jardins e Monumentos (EMETIJM) - ADN, I.P.**										
1	Amorin Soriano Menezes, ST	Eng. Senior - EMETIJM	✓				✓				
2	Arlindo Sarmento Monteiro, S.T.	Eng. EMETIJM	✓					✓			
3	Paulino Abrantes Correia, B. EC.	Eng. EMETIJM	✓					✓			
4	Oscar Monteiro Gomes, S.T.	Eng. EMETIJM	✓					✓			
5	Maria Melania Mendonça Oca, S.T.	Eng. EMETIJM		✓				✓			
6	Angelica da Costa, B. ETT.	Eng. EMETIJM		✓				✓			
7	Jonas das Dores Henriques Gomes, S. Kom.	Eng. EMETIJM	✓					✓			
V	**Unidade Controlo e Validação de Qualidade (UCVQ) - ADN, I.P.**										
V.1.	**Secretariado UCVQ - ADN, I.P.**										
1	Emerenciana da Costa Maia Freitas, S.T., M.T.	Koordenadora - UCVQ		✓		✓					
2	Santoso, S.T.	Assesor Internasional Estrutura (UCVQ & UAP)	✓								✓
3	Aleixo Amaral do Carmo, S.T.	Assesor Nasional Pontes Estradas (UCVQ & UAP)	✓							✓	
4	Francisco Incio Filho Dos Reis Corsino, Lic. EC, M. Eng.	Assesor Nasional UCVQ	✓							✓	
5	Joaninha da Costa	Official Administrasaun		✓					✓		
6	Brijita Joanila Fernandes	Secretaria Diretor Adjunto		✓					✓		
7	João Marcos Napoleão Gracia	Assistente Official Administrasaun	✓						✓		
V.2.	**Departamento Infraestruturas de Transportes e Irigasaun - ITI**										
1	Remigio da Conceição Soares dos Santos, S.T.	Eng Senior - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓				✓				
2	Aniceto da Costa, B. EC, Lic. Eng.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	✓					✓			
3	Manuel Bany da Silva Cristovão de Carvalho, S.T.	Eng. Ainaro - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
4	Jaulino Henriques Rodrigues, S.T.	Eng. Ainaro - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
5	Jacob da Costa Camões, Lic. Eng.	Eng. Baucau - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
6	Leonito Pereira, S.T.	Eng. Baucau - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
7	Jose Aparicio Sanches Soares, B.EC.	Eng Bobonaro - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
8	Noe Menezes Madeira, B. Eng.	Eng Bobonaro - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
9	Salvador Martins, S,T,	Eng. Viqueque - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
10	Camilio Maia, B. EC.	Eng. Viqueque - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			

NU	NARAN	POSISAUN	MANE	FETO	DE & DA	CORDENADOR	CHEFE DEP./SEC.	ENGENEIROS EPESIALIZADO	ADM/FINANSA/ARQV/ LOGISTIKA	ASSESOR/A NASIONAL	ASESOR INTERNASIONAL
11	Domingos Soares Martins, B. EC.	Eng. Covalima - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
12	Bosco Dinis de Sousa, S.T.	Eng. Covalima - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
13	Joao Quintao do Rego, S.T.	Eng. Dili - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
14	Eduardo dos Santos, S.T.	Eng. Dili - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
15	Antonio Mendonça Faria Da Silva, Lic. Eng.	Eng. Ermera - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
16	Julio Jacob Soares, Lic. Eng.	Eng. Ermera - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
17	Marcus Ximenes de Araujo, S.T.	Eng Liquisa - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
18	Luduvina Maria Helena Guterres, Lic. EC.	Eng Liquisa - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun		✓				✓			
19	Geovanio Mateus Xavier Carlos Aleixo, B.EC.	Eng Lautem - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
20	Elnino Junior Araújo Mota, L. Eng. Civ.	Eng Lautem - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
21	Deomentino Henrique Lopes, Lic. Eng.	Eng. Lautem - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
22	Augusta da Costa Ferreira, B.EC.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor)		✓				✓			
23	Jose Roberto Carlos Gusmao, Lic. Eng.	Eng.Manututo (Seksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	✓					✓			
24	Domingos da Costa Ximenes e Silva, B. EC.	Eng.Manututo (Seksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	✓					✓			
25	Romulo João Marques Henrique, S.T.	Eng Manufahi (Seksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	✓					✓			
26	Majorico Cele Tali, Lic. Tech.	Eng Manufahi (Seksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	✓					✓			
27	Celvio Justino Alves, B.EC, Lic. Eng.	Eng Aileu - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
28	Roberto Maria Martins, Lic. Eng.	Eng.Viqueque - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
29	Vidal Guterres, B.EC, Lic. Eng.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor)	✓					✓			
30	Tito Edgar Fatima Napoleão de Jesus, S.T.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor)	✓					✓			
31	Terresa Gomes, S.T.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor)		✓				✓			
32	Lourdes Pereira, S.T.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor)		✓				✓			
33	Rui Lopes, Lic. Eng.	Eng. Aileu - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
V.3.	**Departamento Edificios Públicos no Be'e Mos - EPBM**										
1	Francisco Xavier de Jeronimo, S.T.	Eng Senior - Edificio Publicas no Be'e Mos	✓				✓				
2	Ir. Musalam Bin Umar Bassarewan	Assesor Nasional Edificio Publicas (UCVQ & UAP)	✓							✓	
3	Julmira Soares Sampaio, B. EC.	Eng. Edificio Dili - Konsultan ba Edifisio Publiko, Agua e Saneamento		✓				✓			
4	Egidio Gonçalves, S.T.	Eng. Edificio Dili - Konsultan ba Edifisio Publiko, Agua e Saneamento	✓					✓			
5	Aleixo da Costa Andrade, S.T.	Eng. Manututo - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
6	Fabiano Fitalis Maria Madeira, S.T.	Eng. Manututo - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
7	Bebiano Crecêncio De Jesus Lopes, S.T.	Eng.Viqueque - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
8	Fidelis Mardiano da Costa, Lic. Eng.	Eng.Manufahi Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
9	Merinho Cuco Lopes de Araujo, S.T.	Eng. Aileu - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
10	Joaquim de Carvalho Madeira, S.T.	Eng. Ainaro Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
11	Claodino Soares Dos Santos, B. Eng.	Eng. Ainaro Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
12	Agostinho Aranda, S.T.	Eng. Baucau Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
13	Jerry Gil Maia Pereira, L. Eng.	Eng. Baucau Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
14	Zulkarnaen Depari, S.T.	Eng. Bobonaro - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
15	Moises Angelico Marques Freitas, S.T.	Eng. Bobonaro - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
16	Madelino Deonizio Jose Magno, Lic. Eng.	Eng. Covalima - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
17	Prezencio Legorio Carmo Dias Ximenes, Lic. Eng.	Eng. Covalima - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
18	Manuel Estrela Soares de Oliveira, S.T.	Eng. Dili - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
19	Pedro de Lourdes Alves, S.T.	Eng. Dili - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
20	Jaimito Manuel Quintao, S.T.	Eng. Ermera - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			

NU	NARAN	POSISAUN	MANE	FETO	DE & DA	CORDENADOR	CHEFE DEP./SECC.	ENGENEIROS EPESIALIZADO	ADM/FINANSA/AROV/ LOGISTIKA	ASSESOR/A NASIONAL	ASESOR INTERNASIONAL
21	Juninho Antonio Abrantes da Cruz, B. Eng.	Eng. Liquisa - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
22	Antonia de Fatima Morais Soares, S. Ds.	Eng. Liquisa - Edifisiu no Be'e mos		✓				✓			
23	Inocencio dos Reis Costa Maria, Lic. Eng.	Eng. Lautem -Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
24	Quico Adelino Junior, S.T.	Eng. Lautem -Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
25	Rosalia de Fatima, Lic. Eng.	Eng. Dili -Edifisiu no Be'e mos		✓				✓			
V.4.	**Departamento Mecânica & Energia Eléctrica**										
1	Deolindo de Fatima Marques, B.ETT	Eng Senior - Mecânica e Energia	✓				✓				
2	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares, S.T.	Eng. Mecânica e Eletrica	✓					✓			
3	Camilio de Jesus, B.ETT.	Eng. Mecânica e Eletrica	✓					✓			
4	Adonis Julio Fernandes, B.ETT.	Eng. Mecânica e Eletrica	✓					✓			
V.5.	**Departamento Tecnogia da Infomação e Comunicação - TIC**										
1	Romualdo Duarte Guterres	Assesor Nacional TIC (UAP, UCVQ, e UGA)	✓							✓	
2	Ezequiel Ricardo de Oliveira, S.T.	Eng. Senior - Official ICT (UCVQ, UAP e UGA)	✓					✓			
V.6.	**Departamento Laboratório**										
1	Jony Rodrigues Varela, S.T.	Eng. Senior Laboratorio	✓				✓				
2	Eng. Agus Widianto	Assesor Internasional (Laboratorio & UEDC)	✓								✓
3	Angelina Amaral, S.T.	Eng. Laboratório - Manufahi, Aileu e Manatuto		✓				✓			
4	Lizete Magno de Jesus, Lic. Eng.	Eng. Laboratório Baucau, Viqueque e Lautem		✓				✓			
5	Guido Carceres Tilman, Lic. Tec.	Eng. Laboratório - Maliana, Covalima e Ainaro	✓					✓			
6	Abel Soares da Silva, Lic. Eng.	Eng. Laboratório - Maliana, Covalima e Ainaro	✓					✓			
7	Alcino Francisco Paicheco, Lic. Eng.	Eng. Laboratório - Baucau, Viqueque e Lautem	✓					✓			
8	Barbara Carmelinda Gusmao, S.T.	Eng. Laboratório - Manufahi, Aileu e Manatuto		✓				✓			
9	Abel Fernando, S.T.	Eng. Laboratório - Dili, Liquisa e Ermera	✓					✓			
VI	**Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências - UEDC**										
VI.1.	**Secretariado UEDC - ADN, I.P.**										
1	Valentina Violet Correia Bianco, S.T.	Koordenadora - UEDC		✓		✓					
2	Maria José Rosário de Jesus, B. B.	Official Administração - UEDC		✓					✓		
VI.2	**Departamento Pesquisa**										
1	Jose Fernando Liu Soares, S.T.	Eng. Senior Pesquisa	✓				✓				
2	Joaquim da Silva Pinto, B. EC., Lic Eng.	Eng. Pesquisa	✓					✓			
3	Hindun Nofitri da Conceição Isya, B.S. MSE.	Eng. Pesquisa		✓				✓			
VI.3.		**Departamento Estandardização**									
1	Demistocles Graciliano Ximenes Fernandes Cabral, S.T.	Eng. Senior - Estandardização	✓				✓				
2	Marcelino Amaral, B. EC.	Eng. Estandardização	✓					✓			
VI.4.	**Departamento Capacitação**										
1	To be Name	Chefe Dept. Capacitação									
2	To be Name	Eng. Dept. Capacitação									

Tabela 2.3.1. Força de Trabalho Haktuir Funsaun no Unidades

Tabela 2.3.1. Deskrisaun detalho ba perfil fungsionarios ADN, I.P. terceiro trimestal relasionamente ho Unidades ho Funsaun ne'ebe ADN, I.P. atribui ba kada funsionario tuir ida-idak nia abilidade akademica no esperensia sevisu.

	FUNGSIONARIO ADN, I.P.		TOTAL
	MANE	FETO	172
	125	47	




Tabela 2.3.2. Força de Trabalho ho Numeru Jeneru

Tabela 2.3.2. Deskrisaun detalho perfil fungsionarios ADN, I.P. terseiro trimestal relasionamente ho statutu jenero, ne'ebe iha tabela no grafiku indika katak, total fungsionarios hamutuk 172 pesoas (Mane 125 pesoas no Feto 47 pesoas), ne'ebe koloka ba Unidades/Departamento tuir ida-idak ninian kompetensias.

Nu	Funsoens	Total
1	Diretor Executivo & Direor Adjunto	2
2	Coordenador/a	4
3	Chefe Dep./Sec.	12
4	Engeneiro Espesializado	86
5	Adm/Finansa/Aprovisionamento/Logistica	53
6	Assesor/a Nasional	12
7	Assesor Internasional	3
Grand Total		**172**

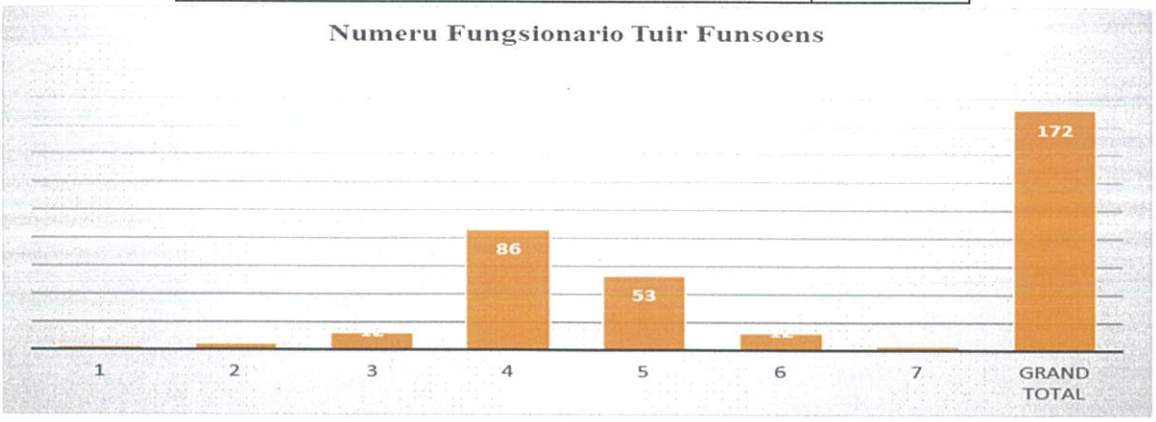


Tabela 2.3.3. Força de Trabalho Haktuir Funsaun no Knar

Tabela 2.3.3. Deskrisaun detalho ba perfil fungsionarios ADN, I.P. terseira trimestal relasionamente ho ninian funsoens, husi dadus iha leten indika katak separa funsoens servisu prinsipal fahe ba funsaun 7 (hitu) mak hanesan Diretor Exekutivu no Adjunto (ema nain 2), Koordenadores (ema nain 4), Chefe Dep/Sec (ema nain 12), Engiñeiro Espesializado (ema nain 86), Adm/Finansa/Aprovisionamento/Lojistica (ema nain 53), Assesor Nasional (ema nain 12), no Assesor Internasional (ema nain 3).

Nu	Unidades	Total
1	DE+DA+GADE	19
2	UGA	47
3	UAP	19
4	UCVQ	80
5	UEDC	7
Grand Total		172

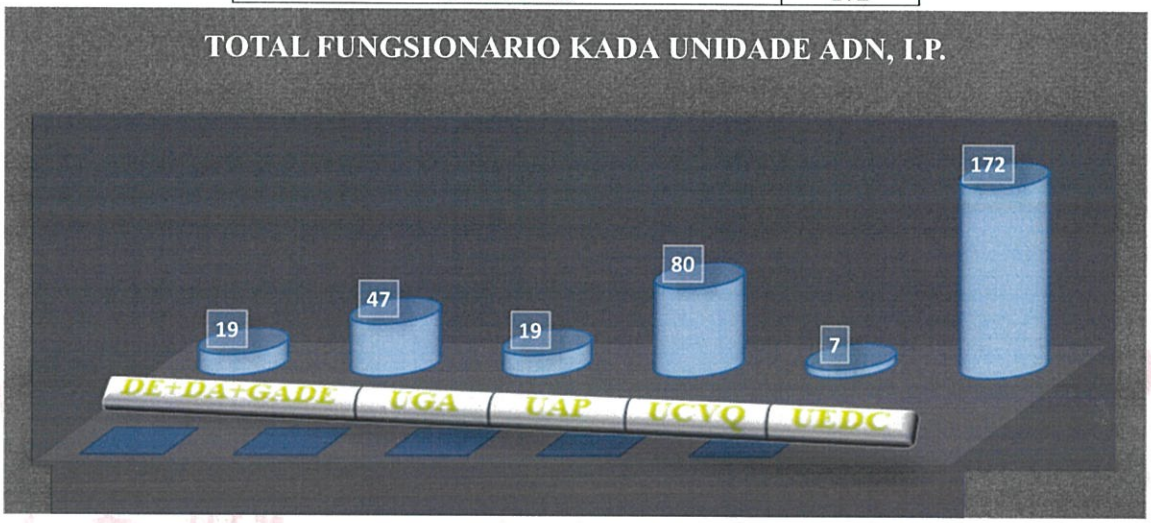


Tabela 2.3. 4. Força de Trabalho Haktuir Unidades

Tabela 2.3.4. Deskrisaun detalho ba perfil fungsionarios ADN, I.P. terseiro trimestal relasionamente ho aloka kada Unidades, husi dadus iha leten indika katak kada unidades servisu prinsipal fahe ba Unidade 4 (ha'at) mak hanesan, Diretor Exekutivu/Adjunto no GADE (ema nain 19), UGA (ema nain 47), UAP (ema nain 19), UCVQ (ema nain 80), no UEDC (ema nain 7).

2.4. Projetos 13 Municipios ho Fontes Finansiamento

Projetos 13 Municipios ho Fontes Finansiamento kompostu hosi Fundus das Infrastruturas (FI), Linha Ministerial-Capital Desenvolvimento (LM-CD), Programa Desenvolvimentu Integrado Munisipal (PDIM), Linha Ministerial-Bens Servisu (LM-BS) Linha Ministerial Transferensia Publica (LM-TP), Fundo Covid-19 no Emergensia. Detalho exekusaun pagamento ho total projetus, husi Fulan Jullu-Setembro deskreve iha tabela no grafiku 2.4.a-c iha kraik.

NO	MUNICIPIO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	54	$ 56,429,089.51	$ 32,965,375.62	58.42%
2	Ainaro	77	$ 97,626,530.77	$ 82,175,245.51	84.17%
3	Baucau	85	$ 144,271,981.61	$ 98,347,684.54	68.17%
4	Bobonaro	95	$ 57,542,257.78	$ 31,326,073.58	54.44%
5	Covalima	70	$ 132,232,088.69	$ 108,718,897.13	82.22%
6	Dili	222	$ 120,251,525.62	$ 54,332,992.24	45.18%
7	Ermera	57	$ 26,372,465.34	$ 15,320,046.83	58.09%
8	Lautem	57	$ 41,399,276.68	$ 28,897,379.26	69.80%
9	Liquica	73	$ 26,687,460.08	$ 12,635,565.27	47.35%
10	Manatuto	63	$ 140,080,038.04	$ 113,786,240.86	81.23%
11	Manufahi	73	$ 25,770,351.83	$ 16,187,564.06	62.81%
12	Nasional	33	$ 157,280,197.21	$ 108,145,375.42	68.76%
13	Oe-cusse	4	$ 2,353,321.65	$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional	4	$ 85,431,329.14	$ 50,211,552.86	58.77%
15	Viqueque	57	$ 65,690,314.87	$ 33,107,840.32	50.40%
	Grand Total	1024	$ 1,179,418,228.82	$ 788,010,401.35	66.81%

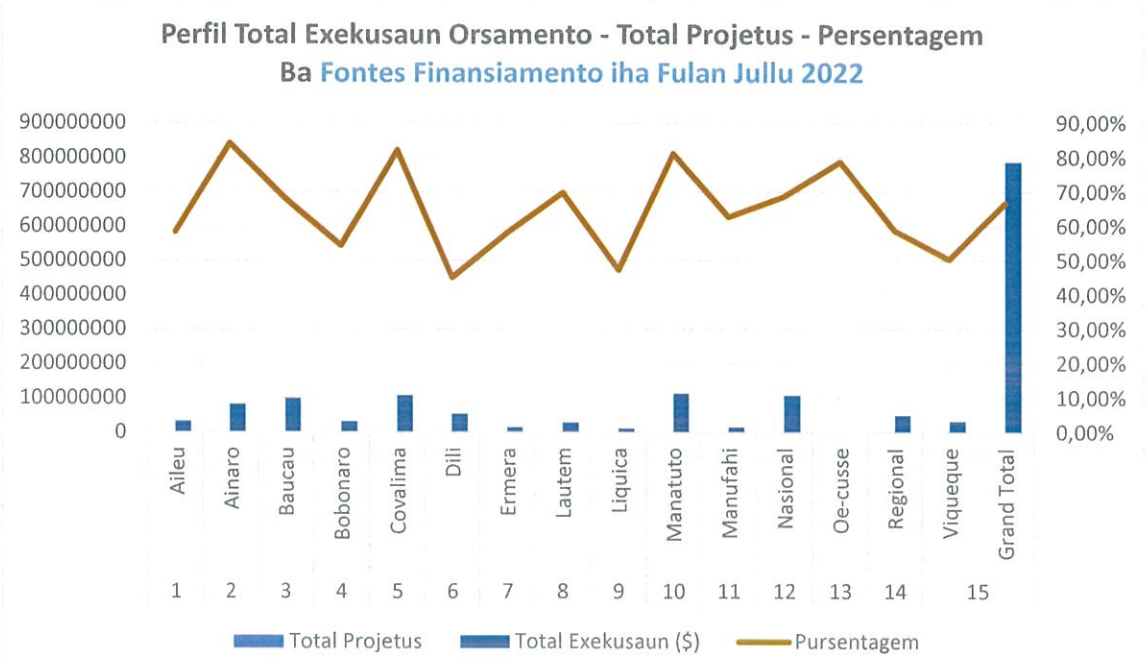


Tabela no Grafiku 2.4.a. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu - Fontes Finansiamento Jullu 2022

Fulan jullu terceiro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.4.a. ho total projetus iha 13 munisipios nomos kategoria projetus Nasional/Regional hamutuk 1024 ho emite sertifikado pagamentu montante $ 788,010,401.35 ekivalen 66.81 % husi total kontratus $

1,179,418,228.82 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Municipio Manatuto ho montante $ 113,786,240.86 (63 projetus) no Persentagem exekusaun bo'ot liu iha Municipio Ainaro ho persentagen 84.17 % (77 projetus).

NO	MUNICIPIO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	67	$ 60,017,820.98	$ 35,245,262.60	58.72%
2	Ainaro	77	$ 97,626,530.77	$ 82,245,133.35	84.24%
3	Baucau	85	$ 144,271,981.61	$ 100,492,096.95	69.65%
4	Bobonaro	95	$ 57,261,153.17	$ 31,894,286.26	55.70%
5	Covalima	71	$ 132,914,107.65	$ 108,842,869.55	81.89%
6	Dili	253	$ 126,469,996.60	$ 56,111,301.84	44.37%
7	Ermera	59	$ 27,160,957.48	$ 15,431,413.72	56.81%
8	Lautem	64	$ 43,821,529.01	$ 28,818,839.80	65.76%
9	Liquica	74	$ 28,426,329.68	$ 13,255,545.16	46.63%
10	Manatuto	63	$ 140,080,038.04	$ 114,139,055.07	81.48%
11	Manufahi	75	$ 25,976,201.95	$ 16,735,330.17	64.43%
12	Nasional	35	$ 158,022,871.64	$ 108,208,108.56	68.48%
13	Oe-cusse	4	$ 2,353,321.65	$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional	4	$ 85,431,329.14	$ 49,085,855.96	57.46%
15	Viqueque	68	$ 69,991,442.96	$ 31,970,920.56	45.68%
	Grand Total	**1094**	**$ 1,199,825,612.33**	**$ 794,328,587.40**	**66.20%**

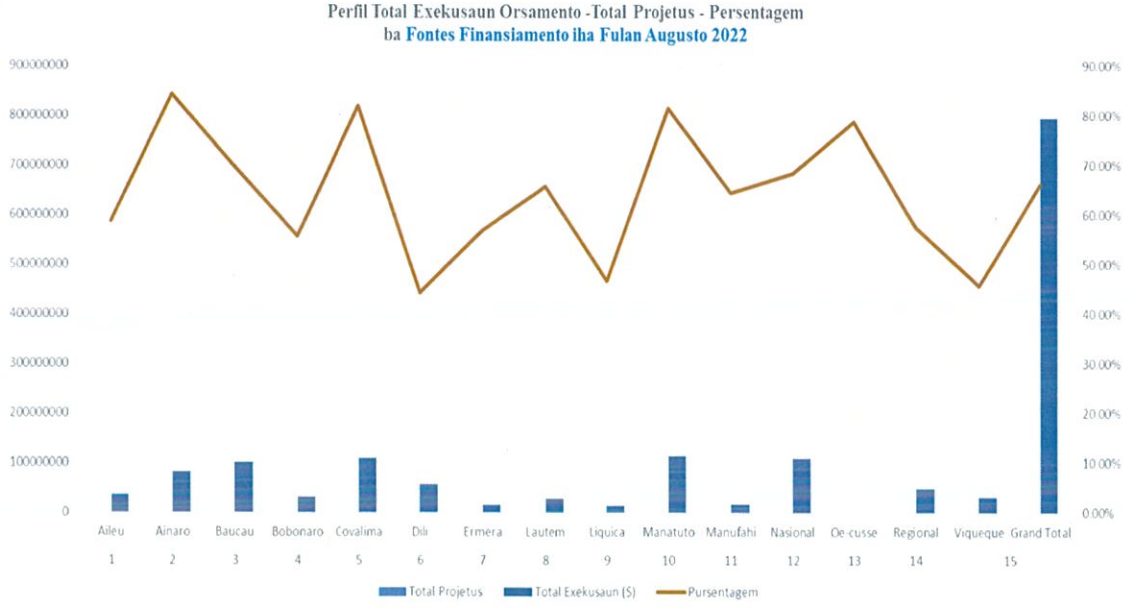


Tabela no Grafiku 2.4.b. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu - Fontes Finansiamento Augostu 2022

Fulan augostu terceiro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.4.b. ho total projetus iha 13 munisipios nomos kategoria projetus Nasional/Regional hamutuk 1094 ho emite sertifikado pagamentu montante $ 794,328,587.40 ekivalen 66.20 % husi total kontratus $ 1,199,825,612.33 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Municipio Covalima ho montante $ 108,842,869.55 (71 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha Municipio Ainaro ho persentagen 84.24 % (77 projetus).

NO	MUNICIPIO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	67	$ 60,017,820.98	$ 36,395,939.33	60.64%
2	Ainaro	78	$ 97,650,523.96	$ 82,502,554.78	84.49%
3	Baucau	92	$ 148,127,502.35	$ 101,503,996.00	68.52%
4	Bobonaro	97	$ 58,166,960.83	$ 32,467,324.55	55.82%
5	Covalima	73	$ 132,967,711.86	$ 109,619,323.05	82.44%
6	Dili	255	$ 126,411,497.91	$ 59,130,438.39	46.78%
7	Ermera	59	$ 27,160,957.48	$ 16,252,462.34	59.84%
8	Lautem	64	$ 43,821,529.01	$ 29,129,103.77	66.47%
9	Liquica	75	$ 28,651,702.68	$ 13,678,950.20	47.74%
10	Manatuto	63	$ 140,080,038.04	$ 114,509,175.69	81.75%
11	Manufahi	76	$ 29,937,860.73	$ 17,155,637.61	57.30%
12	Nasional	35	$ 158,022,871.64	$ 108,666,286.59	68.77%
13	Oe-cusse	4	$ 2,353,321.65	$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional	4	$ 85,431,329.14	$ 50,077,257.10	58.62%
15	Viqueque	68	$ 70,304,468.96	$ 33,475,376.87	47.61%
	Grand Total	1110	$ 1,209,106,097.22	$ 806,416,394.12	66.70%

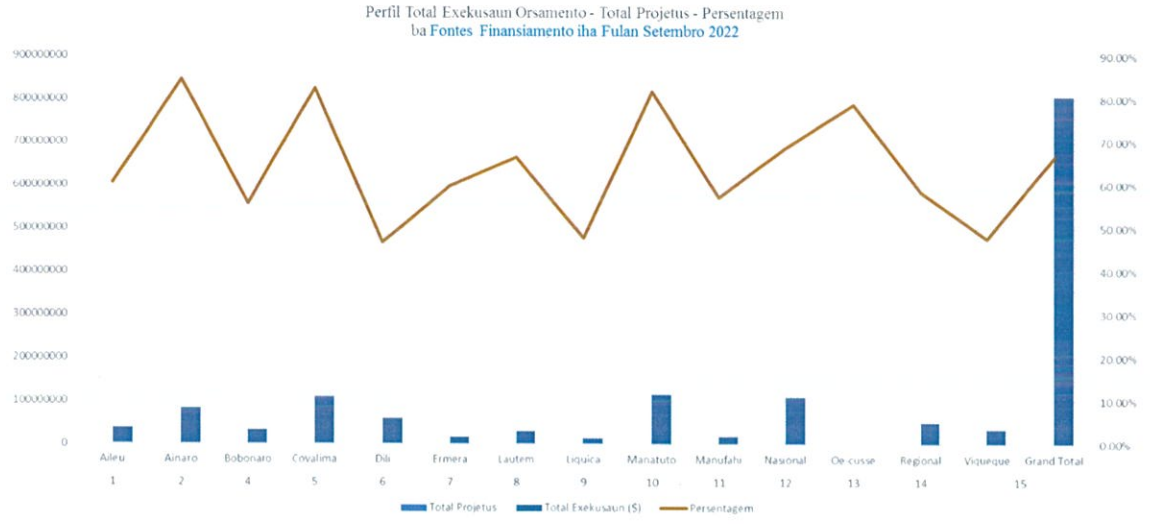


Tabela no grafiku 2.4.c. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu - Fontes Finansiamento Setembro 2022

Fulan setembro terceiro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.4.c. ho total projetus iha 13 munisipios nomos kategoria projetus Nasional/Regional hamutuk 1110 ho emite sertifikado pagamentu montante $ 806,416,394.12 ekivalen 66.70 % husi total kontratus $ 1,209,106,097.22 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Municipio Covalima ho montante $ 109,619,323.05 (73 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha Municipio Ainaro ho persentagen 84.49 % (78 projetus).

2.5. Projetos 13 Municipio por Setores

Projetos iha 13 Municipios ba kada setores projetus hamutuk 23 setores, ho detalho exekusaun pagamento kada setores no total projetus, husi Fulan Jullu-Setembro eskreve iha tabela no grafiku 2.5.a-c iha kraik.

NO	SECTOR PROJECTO	Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	3	$ 73,530,992.54	$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	11	$ 6,968,249.42	$ 4,829,695.98	69.31%
3	AGUA E SANEAMENTO	43	$ 13,353,663.56	$ 7,245,746.96	54.26%
4	COMERCIO	1	$ 153,942.39	$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5	$ 27,142,490.50	$ 17,837,760.26	65.72%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	170	$ 53,339,161.95	$ 20,640,160.41	38.70%
7	EDUKASAUN	187	$ 22,677,152.38	$ 2,960,466.27	13.05%
8	ELÉCTRICIDADE	92	$ 146,947,676.73	$ 97,191,444.18	66.14%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO	4	$ 4,573,145.72	$ 4,084,250.86	89.31%
10	ESTRADAS E PONTES	259	$ 305,265,521.91	$ 182,622,739.01	59.82%
11	FLOOD CONTROL	18	$ 5,265,692.31	$ 1,741,521.97	33.07%
12	IMPRESTIMO	21	$ 436,343,381.19	$ 333,041,580.89	76.33%
13	IRIGASAUN	1	$ 32,319.72	$ 32,319.72	100.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	10	$ 5,388,229.15	$ 3,544,230.44	65.78%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	91	$ 19,325,074.86	$ 12,488,777.90	64.62%
16	PONTES	10	$ 20,365,426.52	$ 15,620,471.17	76.70%
17	PORTOS	3	$ 2,241,460.87	$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	10	$ 3,498,406.35	$ 1,731,026.52	49.48%
19	SAUDE	57	$ 9,811,812.58	$ 5,880,039.16	59.93%
20	SEGURANCA NO DEFESA	7	$ 14,258,717.45	$ 1,778,792.38	12.48%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	2	$ 5,291,216.00	$ 3,613,443.84	68.29%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	7	$ 1,645,809.66	$ 1,331,973.64	80.93%
23	TURISMO	12	$ 1,998,685.06	$ 837,220.46	41.89%
	Grand Total	**1024**	**$ 1,179,418,228.82**	**$ 788,010,401.35**	**66.81%**

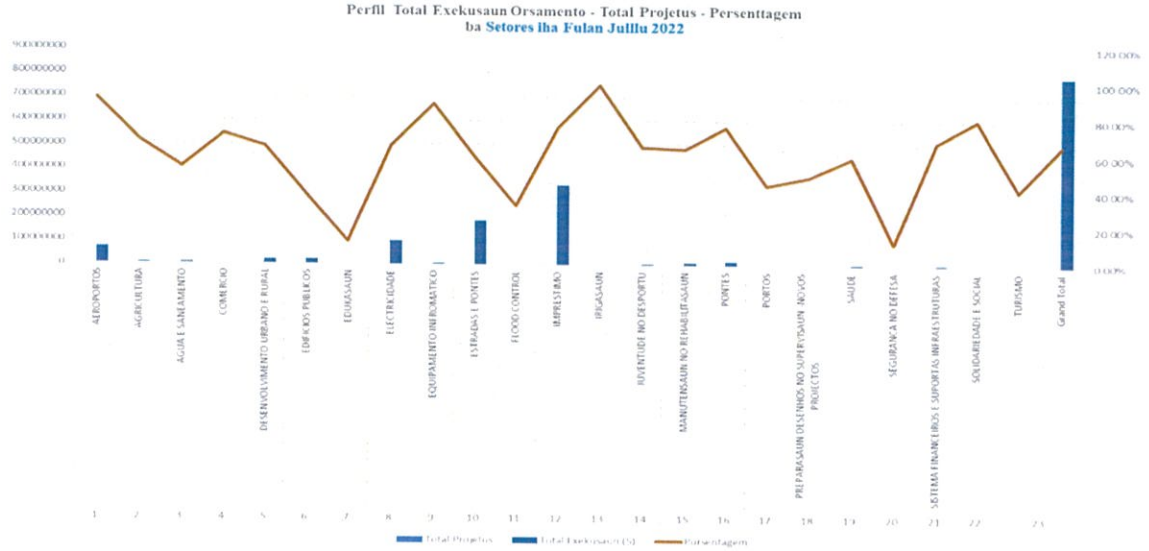


Tabela no Grafiku 2.5. a Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Setores Jullu 2022

Fulan jullu terceiro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.5.a. ho total 23 setores iha 13 munisipios hamutuk 1024 ho emite sertifikado pagamentu montante $ 788,010,401.35 ekivalen 66.81 % husi total kontratus $ 1,179,418,228.82 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Sector Imprestimu ho montante $ 333,041,580.81 (21 projetus) no Persentage exekusaun bo'ot liu iha sector Irigasaun ho persentagen 100 % (1 projetus).

NO	SECTOR PROJECTO	Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	3	$ 73,530,992.54	$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	12	$ 7,958,624.42	$ 4,668,125.27	58.65%
3	AGUA E SANEAMENTO	44	$ 13,388,528.38	$ 7,247,597.17	54.13%
4	COMERCIO	1	$ 153,942.39	$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL	5	$ 212,050.00	$ -	0.00%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	7	$ 27,885,164.93	$ 17,881,275.25	64.12%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	156	$ 52,457,769.17	$ 20,629,306.46	39.33%
8	EDUKASAUN	209	$ 25,320,928.68	$ 2,978,060.22	11.76%
9	ELÉCTRICIDADE	92	$ 146,947,676.73	$ 97,688,138.55	66.48%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO	4	$ 4,573,145.72	$ 4,084,250.86	89.31%
11	ESTRADAS E PONTES	302	$ 339,465,350.54	$ 203,423,906.44	59.92%
12	FLOOD CONTROL	27	$ 7,264,450.51	$ 1,977,931.58	27.23%
13	IMPRESTIMO	19	$ 416,184,195.20	$ 317,282,605.59	76.24%
14	IRIGASAUN	1	$ 32,319.72	$ 32,319.72	100.00%
15	JUVENTUDE NO DESPORTU	10	$ 5,388,229.15	$ 3,544,230.44	65.78%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	92	$ 20,059,566.25	$ 12,595,289.83	62.79%
17	PONTES	11	$ 20,389,419.71	$ 15,620,471.17	76.61%
18	PORTOS	3	$ 2,241,460.87	$ 997,063.60	44.48%
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	10	$ 3,518,731.35	$ 2,089,912.20	59.39%
20	SAUDE	58	$ 9,963,392.27	$ 6,049,221.86	60.71%
21	SEGURANCA NO DEFESA	7	$ 13,953,963.08	$ 1,778,792.38	12.75%
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	2	$ 5,291,216.00	$ 3,613,443.84	68.29%
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	7	$ 1,645,809.66	$ 1,331,973.64	80.93%
24	TURISMO	12	$ 1,998,685.06	$ 837,220.46	41.89%
	Grand Total	1094	$ 1,199,825,612.33	$ 794,328,587.40	66.20%

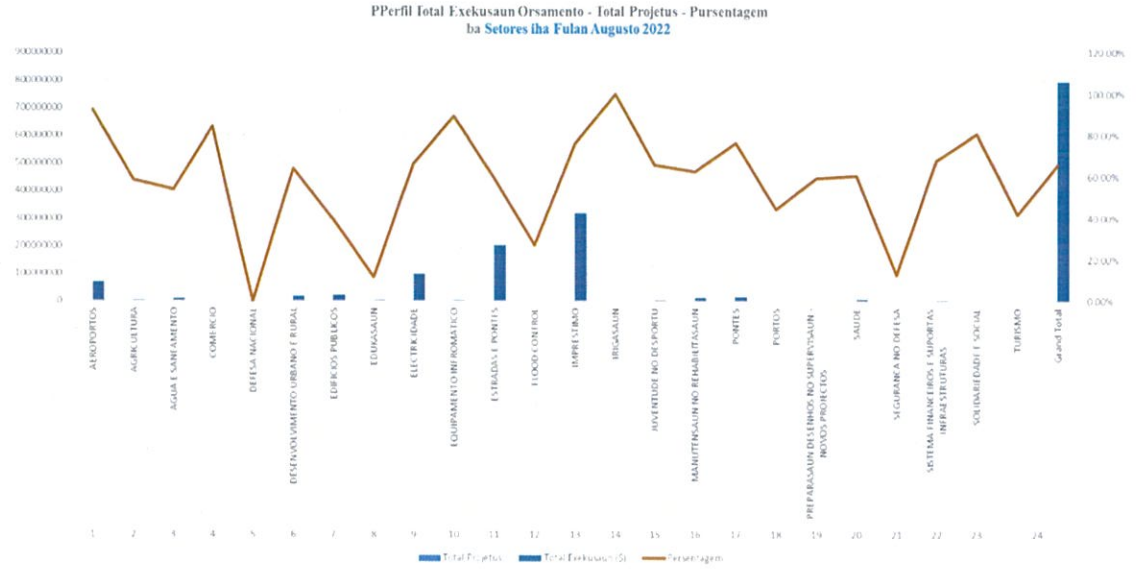


Tabela no grafiku 2.5. b. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Setores Augostu 2022

Fulan augostu terceiro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.5.b. ho total 23 setores iha 13 munisipios hamutuk 1094 ho emite sertifikado pagamentu montante $ 794,328,587.40 ekivalen 66.20 % husi total kontratus $ 1,199,825,612.33 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Sector Imprestimu ho montante $ 317,282,605.59 (19 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha sector Irigasaun ho persentagen 100 % (1 projetus)

NO	SECTOR PROJECTO	Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	3	$ 73,530,992.54	$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	12	$ 7,958,624.42	$ 5,169,448.73	64.95%
3	AGUA E SANEAMENTO	44	$ 13,388,528.38	$ 7,514,523.38	56.13%
4	COMERCIO	1	$ 153,942.39	$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL	5	$ 212,050.00	$ -	0.00%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	7	$ 27,885,164.93	$ 18,038,500.19	64.69%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	153	$ 51,954,490.22	$ 20,892,216.11	40.21%
8	EDUKASAUN	210	$ 29,282,587.46	$ 5,616,138.76	19.18%
9	ELÉCTRICIDADE	92	$ 146,947,676.73	$ 98,133,865.16	66.78%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO	4	$ 4,573,145.72	$ 4,084,250.86	89.31%
11	ESTRADAS E PONTES	313	$ 344,280,283.15	$ 207,015,025.60	60.13%
12	FLOOD CONTROL	28	$ 7,288,443.70	$ 2,462,189.03	33.78%
13	IMPRESTIMO	19	$ 416,184,195.20	$ 319,519,804.20	76.77%
14	IRIGASAUN	1	$ 32,319.72	$ 32,319.72	100.00%
15	JUVENTUDE NO DESPORTU	10	$ 5,388,229.15	$ 3,566,368.17	66.19%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	91	$ 19,609,412.93	$ 12,683,980.98	64.68%
17	PONTES	11	$ 20,389,419.71	$ 15,620,471.17	76.61%
18	PORTOS	3	$ 2,241,460.87	$ 997,063.60	44.48%
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	10	$ 3,518,731.35	$ 2,179,383.45	61.94%
20	SAUDE	64	$ 11,171,351.85	$ 7,213,037.63	64.57%
21	SEGURANCA NO DEFESA	7	$ 13,953,963.08	$ 1,880,416.06	13.48%
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	2	$ 5,291,216.00	$ 3,613,443.84	68.29%
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	7	$ 1,645,809.66	$ 1,331,973.64	80.93%
24	TURISMO	13	$ 2,224,058.06	$ 874,522.97	39.32%
	Grand Total	**1110**	**$ 1,209,106,097.22**	**$ 806,416,394.12**	**66.70%**

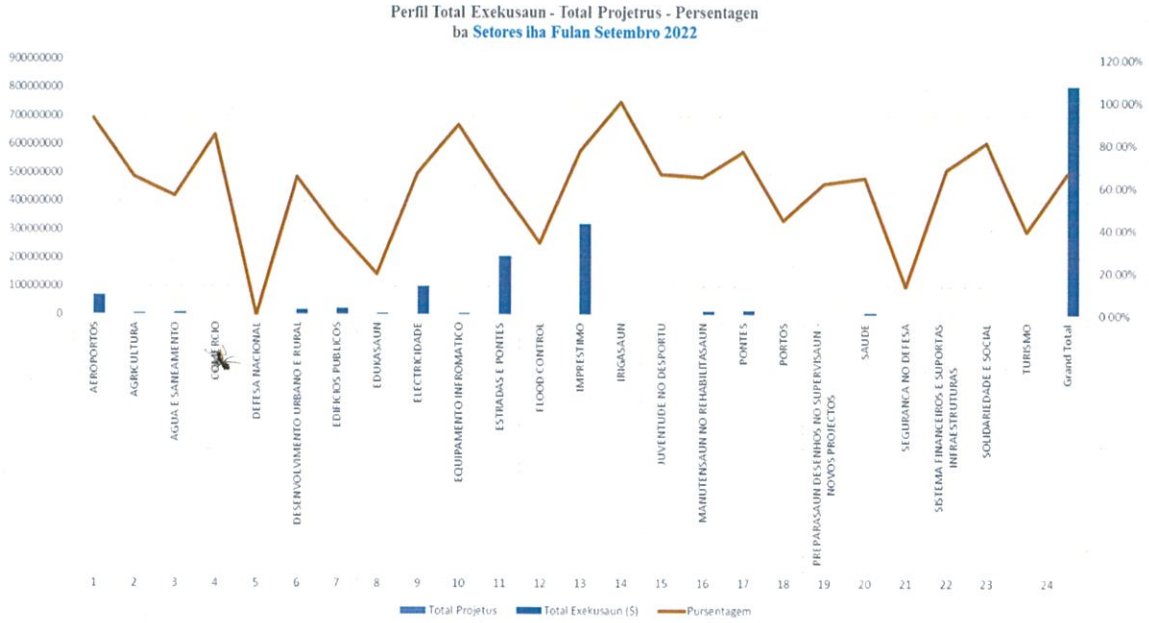


Tabela no Grafiku 2.5. c. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Setores Setembro 2022

Fulan setembro terceiro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.5.c. ho total 23 setores iha 13 munisipios hamutuk 1110 ho emite sertifikado pagamentu montante $ 806,416,394.12 ekivalen 66.70 % husi total kontratus $ 1,209,106,097.22 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Sector Imprestimu ho montante $ 319,519,804.20 (19 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha sector Irigasaun ho persentagen 100 % (1 projetus).

2.6. Projetos 13 Municipio por Ministerio

Projetos iha 13 Municipios, implementador ou dono projetus hamutuk 36 Ministerio, ho detalho exekusaun pagamento kada Ministerio no total projetus, husi Fulan Jullu-Setembro eskreve iha tabela no grafiku 2.6.a-c iha kraik.

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC	1	$ 256,843.00	$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega	2	$ 134,670.96	$ 85,243.25	63.30%
3	CFP	1	$ 35,500.00	$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRENSA	1	$ 97,498.81	$ 83,740.72	85.89%
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	$ 292,653.74	$ -	0.00%
6	ESTATAL	37	$ 4,472,818.35	$ 2,306,282.76	51.56%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	11	$ 14,232,230.92	$ 7,871,882.61	55.31%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	1	$ 63,076.61	$ 51,792.75	82.11%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	$ 145,269.48	$ 62,378.72	42.94%
10	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	15	$ 7,327,640.67	$ 5,124,408.76	69.93%
11	MINISTERIO DA DEFESA	10	$ 5,085,259.07	$ 2,650,306.44	52.12%
12	MINISTERIO DA JUSTICA	9	$ 1,132,235.19	$ 367,411.02	32.45%
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2	$ 158,889.74	$ 21,615.42	13.60%
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	521	$ 948,569,997.27	$ 651,761,014.96	68.71%
15	MINISTERIO DO INTERIOR	7	$ 11,693,682.23	$ 569,483.64	4.87%
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	234	$ 28,398,258.03	$ 3,496,379.43	12.31%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	2	$ 482,583.06	$ 173,860.49	36.03%
18	MINISTERIO FINANCAS	5	$ 6,638,605.10	$ 4,385,024.29	66.05%
19	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus	1	$ 119,578.85	$ 92,618.05	77.45%
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	12	$ 3,991,501.52	$ 1,148,744.24	28.78%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	17	$ 5,404,293.87	$ 1,709,999.41	31.64%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS	2	$ 23,850,768.60	$ 17,389,186.52	72.91%
23	MINISTERIO SAUDE	73	$ 13,059,294.21	$ 7,716,578.95	59.09%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	6	$ 2,694,349.02	$ 787,417.68	29.22%
25	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	8	$ 74,837,902.10	$ 68,317,313.34	91.29%
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	12	$ 1,867,187.55	$ 711,426.11	38.10%
27	PARLAMENTU NASIONAL	2	$ 69,221.96	$ 27,033.43	39.05%
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA	2	$ 1,266,687.38	$ 960,952.45	75.86%
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE	1	$ 37,605.25	$ 33,844.72	90.00%
30	SAMES	1	$ 69,792.94	$ 29,956.90	42.92%
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	$ 412,212.00	$ 76,000.00	18.44%
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	8	$ 5,321,672.26	$ 3,492,458.12	65.63%
33	SEFOPE	4	$ 946,006.97	$ 713,700.51	75.44%
34	TRADE INVEST	1	$ 37,582.90	$ 18,900.89	50.29%
35	TRIBUNAL RECUSSO	4	$ 12,092,434.96	$ 3,742,742.83	30.95%
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	7	$ 4,122,424.25	$ 1,819,551.91	44.14%
	Grand Total	**1024**	**$ 1,179,418,228.82**	**$ 788,010,401.35**	**66.81%**

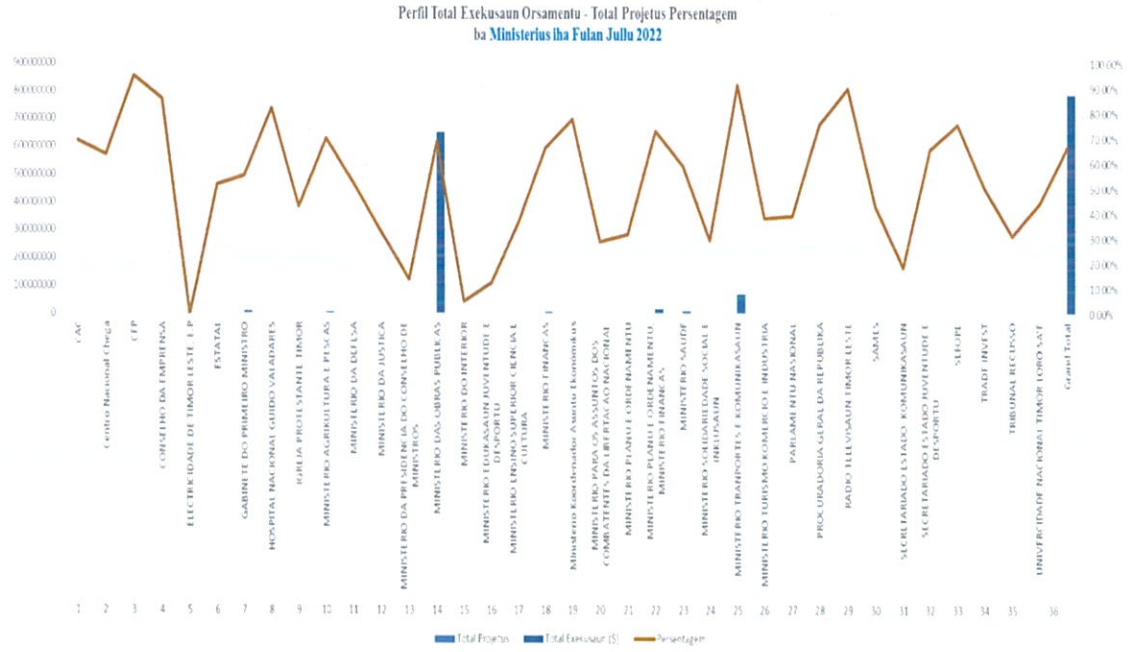


Tabela no Grafiku 2.6.a Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Ministerio Jullu 2022

Fulan jullu terceiro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.6.a. ho total 36 Ministerio iha 13 munisipios hamutuk 1024 ho emite sertifikado pagamentu montante $ 788,010,401.35 ekivalen 66.81 % husi total kontratus $ 1,179,418,228.82 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Ministerio das Obras Publicas ho montante $ 651,761,014.96 (521 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha CFP ho persentagen 95.00 % (1 projetus).

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC	1	$ 256,843.00	$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega	2	$ 134,670.96	$ 85,243.25	63.30%
3	CFP	1	$ 35,500.00	$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRENSA	1	$ 97,498.81	$ 83,740.72	85.89%
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	$ 292,653.74	$ -	0.00%
6	ESTATAL	43	$ 4,917,942.57	$ 2,312,208.66	47.02%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	12	$ 14,487,230.67	$ 7,871,882.61	54.34%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	1	$ 63,076.61	$ 51,792.75	82.11%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	$ 145,269.48	$ -	0.00%
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	1	$ 512,279.04	$ -	
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	16	$ 8,318,015.67	$ 4,949,814.47	59.51%
12	MINISTERIO DA DEFESA	15	$ 4,992,554.70	$ 2,650,306.44	53.09%
13	MINISTERIO DA JUSTICA	9	$ 1,132,235.19	$ 367,411.02	32.45%
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2	$ 158,889.74	$ 21,615.42	13.60%
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	571	$ 965,644,127.52	$ 657,987,850.19	68.14%
16	MINISTERIO DO INTERIOR	7	$ 11,693,682.23	$ 569,483.64	4.87%
17	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	236	$ 28,657,777.86	$ 3,321,590.18	11.59%
18	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	2	$ 482,583.06	$ 173,860.49	36.03%
19	MINISTERIO FINANCAS	5	$ 6,638,605.10	$ 4,429,361.13	66.72%
20	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus	1	$ 119,578.85	$ 92,618.05	77.45%
21	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	12	$ 3,991,501.52	$ 1,148,744.24	28.78%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	18	$ 5,936,143.80	$ 1,642,626.75	27.67%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS	2	$ 23,850,768.60	$ 17,389,186.52	72.91%
24	MINISTERIO SAUDE	75	$ 13,280,279.57	$ 8,185,542.92	61.64%
25	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	6	$ 2,694,349.02	$ 745,822.12	27.68%
26	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	8	$ 74,837,902.10	$ 68,317,313.34	91.29%
27	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	12	$ 1,867,187.55	$ 742,848.95	39.78%
28	PARLAMENTU NASIONAL	2	$ 69,221.96	$ 27,033.43	39.05%
29	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA	2	$ 1,266,687.38	$ 960,952.45	75.86%
30	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE	1	$ 37,605.25	$ 33,844.72	90.00%
31	SAMES	1	$ 69,792.94	$ 29,956.90	42.92%
32	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	$ 412,212.00	$ 76,000.00	18.44%
33	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	8	$ 5,321,672.26	$ 3,492,458.12	65.63%
34	SEFOPE	5	$ 1,156,831.47	$ 713,700.51	61.69%
35	TRADE INVEST	1	$ 37,582.90	$ 18,900.89	50.29%
36	TRIBUNAL RECUSSO	4	$ 12,092,434.96	$ 3,742,742.83	30.95%
37	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	7	$ 4,122,424.25	$ 1,880,983.65	45.63%
	Grand Total	1094	$ 1,199,825,612.33	$ 794,328,587.40	66.20%

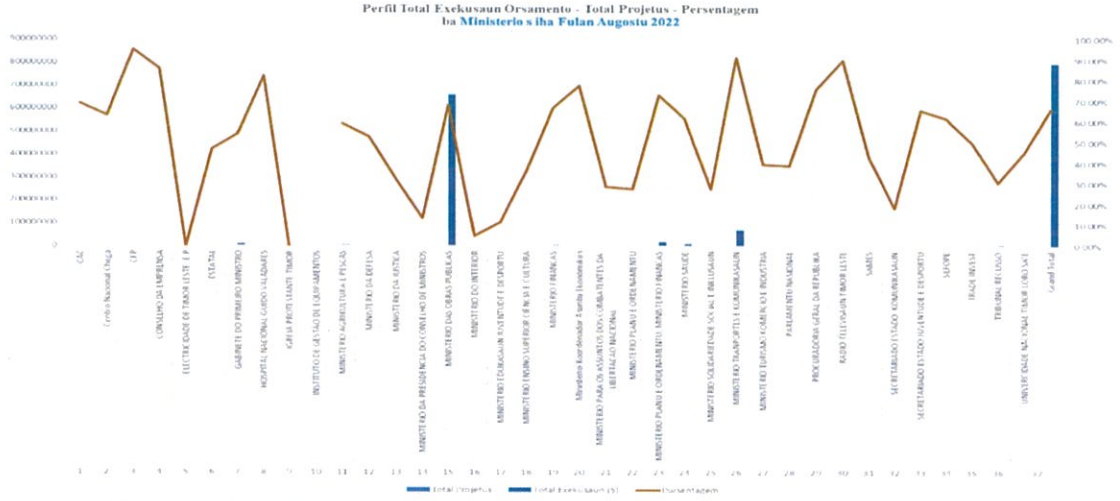


Tabela no Grafiku 2.6.b. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Ministerio Augostu 2022

Fulan augostu terseiro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.6.b. ho total 37 Ministerio iha 13 munisipios hamutuk 1094 ho emite sertifikado pagamentu montante $ 794,328,5870.40 ekivalen 66.20 % husi total kontratus $ 1,199,825,612.33 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Ministerio das Obras Publicas ho montante $ 657,987,850.19 (571 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha CFP ho persentagen 95.00 % (1 projetus).

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC	1	$ 256,843.00	$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega	3	$ 190,090.64	$ 85,243.25	44.84%
3	CFP	1	$ 35,500.00	$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRENSA	1	$ 97,498.81	$ 83,740.72	85.89%
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	$ 292,653.74	$ -	0.00%
6	ESTATAL	43	$ 4,917,942.57	$ 2,477,598.35	50.38%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	12	$ 14,487,230.67	$ 7,871,882.61	54.34%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	3	$ 182,074.26	$ 150,824.94	82.84%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	$ 145,269.48	$ -	0.00%
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	1	$ 512,279.04	$ -	0.00%
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	16	$ 8,318,015.67	$ 5,451,137.93	65.53%
12	MINISTERIO DA DEFESA	15	$ 4,992,554.70	$ 2,966,287.14	59.41%
13	MINISTERIO DA JUSTICA	8	$ 899,319.17	$ 444,673.29	49.45%
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2	$ 158,889.74	$ 21,615.42	13.60%
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	583	$ 970,483,053.32	$ 665,475,560.94	68.57%
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA	1	$ 3,961,658.78	$ -	0.00%
17	MINISTERIO DO INTERIOR	7	$ 11,693,682.23	$ 588,376.29	5.03%
18	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	236	$ 28,970,803.86	$ 6,046,462.77	20.87%
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	2	$ 482,583.06	$ 263,331.74	54.57%
20	MINISTERIO FINANCAS	5	$ 6,638,605.10	$ 4,429,361.13	66.72%
21	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus	1	$ 119,578.85	$ 92,618.05	77.45%
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	12	$ 3,991,501.52	$ 1,164,636.32	29.18%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	18	$ 5,936,143.80	$ 1,759,795.04	29.65%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS	2	$ 23,850,768.60	$ 17,389,186.52	72.91%
25	MINISTERIO SAUDE	75	$ 13,280,279.57	$ 8,376,553.11	63.08%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	6	$ 2,694,349.02	$ 745,822.12	27.68%
27	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	8	$ 74,837,902.10	$ 68,317,313.34	91.29%
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	13	$ 2,092,560.55	$ 764,259.38	36.52%
29	PARLAMENTU NASIONAL	2	$ 69,221.96	$ 27,033.43	39.05%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA	2	$ 1,266,687.38	$ 1,015,299.68	80.15%
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE	1	$ 37,605.25	$ 33,844.72	90.00%
32	SAMES	1	$ 69,792.94	$ 29,956.90	42.92%
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	$ 412,212.00	$ 76,000.00	18.44%
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	8	$ 5,321,672.26	$ 3,514,595.85	66.04%
35	SEFOPE	5	$ 1,156,831.47	$ 753,757.16	65.16%
36	TRADE INVEST	1	$ 37,582.90	$ 18,900.89	50.29%
37	TRIBUNAL RECUSSO	4	$ 12,092,434.96	$ 3,742,742.83	30.95%
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	7	$ 4,122,424.25	$ 2,026,832.22	49.17%
	Grand Total	**1110**	**$ 1,209,106,097.22**	**$ 806,416,394.12**	**66.70%**


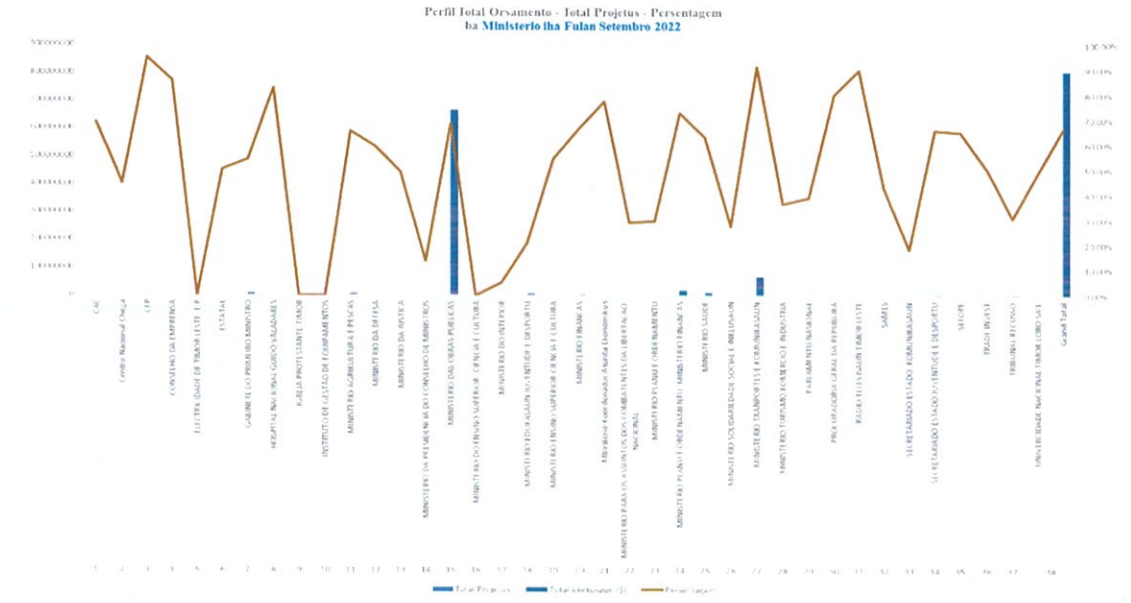



Tabela no Grafiku 2.6.c. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Ministerio Setembro 2022

Fulan Setembro terceiro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.6.c. ho total 38 Ministerio iha 13 munisipios hamutuk 1110 ho emite sertifikado pagamentu montante $ 806,475,394.12 ekivalen 66.70 % husi total kontratus $ 1,209,106,097.22 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Ministerio das Obras Publicas ho montante $ 665,475,560.94 (583 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha CFP ho persentagen 95.00 % (1 projetus)


2.7. Prefil Pagamentu Komulativu Segundo Trimestral (Jullu, Augostu no Setembro) 2022

Deskripsaun ($)	Jullu 2022			Augostu 2022		
	Fundus Finansiamento	Sectores	Ministerios	Fundus Finansiamento	Sectores	Ministerios
Montante Kontratu	$ 1,179,418,228.82	$ 1,179,418,228.82	$ 1,179,418,228.82	$ 1,199,825,612.33	$ 1,199,825,612.33	$ 1,199,825,612.33
Pagamentu Komulativu $	$ 788,010,401.35	$ 788,010,401.35	$ 788,010,401.35	$ 794,328,587.40	$ 794,328,587.40	$ 794,328,587.40

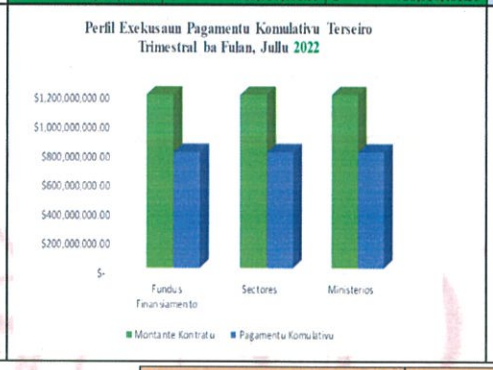

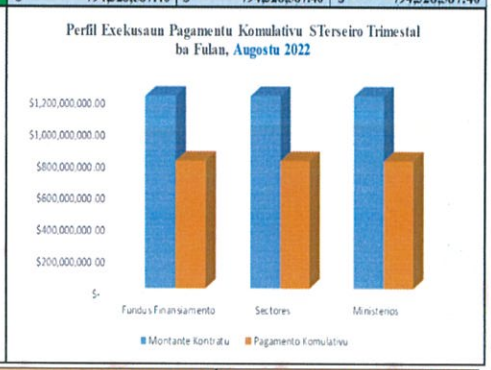

$ 1,209,106,097.22	$ 1,209,106,097.22	$ 1,209,106,097.22
$ 806,416,394.12	$ 806,416,394.12	$ 806,416,394.12

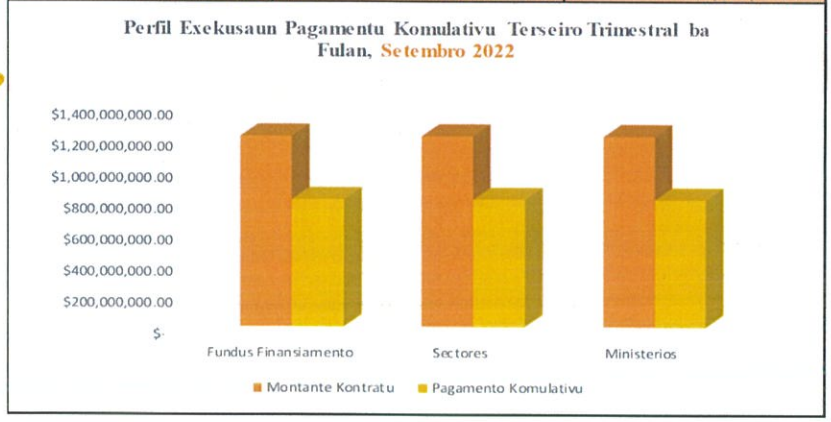

Prefil Exekusaun Pagamentu Fulan Setembro sai indikador ba Exekusaun Terseiro Trimestral, relasiona ho implementasaun Projetus 2022

Tabela no Grafiku 2.7. Profil Exekusaun Orsamentu Terceiro Trimestral 2022

Tabela no grafiku 2.7. indika katak, ate fim Terceiro Trimestral ba implementasaun projetus ano fiskal 2022 husi total projetus 1110 ne'ebe implementa iha teritorio RDTL tomak exekutado ho Pagamentu Komulativu $ 806,416,394.12 (66.70 %) husi total kontratu $ 1,209,106,097.22

III. OBSTAKLU

3.1. Obstaklu hosi parte Companhias

1. Kompania/empreza sira infrenta problema iha rekursu finanseiru nune'e fo inpaktu ba serbisu konstrusaun nian hodi difikulta progress serbisu iha terenu.
2. Supervisor husi Ministerio releventes la iha terreno, no kontrator sira dalaruma servisu la halo tuir espesifikasaun tekniku iha kontrato.
3. Kontrator laiha iha site/terenu ou kontaktu liu hosi telefonika maibe dala barak lai foti ou lakohi hit telefone.
4. Mudansa Schedule la tuir kontratu ho razaun pagamentu tarde, situasaun nebe'e ita hotu la espera ho covid-19 nebe'e invade Timor-Leste fulan hirak liu ba sai difikuldade mos ba kompania/empreza sira la halo serbisu tuir planu refere.
5. Projeito obra barak abandona ou parado iha tinan barak nia laran
6. Projeito Lao la tuir tempo ne'ebe termina iha kontratu
7. Companhia la kumpri rekomendasaun no sujestaun ba defeitus sira nebe parte ADN, I.P. rekomenda ba.

3.2. Obstaku hosi Parte ADN, I.P.

1. Kondisaun Kareta Nian nebe ladun diak (Sempre Manutensaun Hela Deit) hodi halo Projetu balu nebe tama ona ba Faze Retensaun la konsege halao inspesaun abril - junho tamba Kondisaun estrada ba Projetu refere Kondisaun Grave.
2. Ho Volume Servisu ne'ebe barak Planu Inspeksaun kada fulan dala Tolu (3) ba visita Projetu sente todan ou la kobre hotu.
3. Engenheiros la sufisiente atu monitoriza projeto ho quantidade barak tanba ho distansia nebe'e do'ok. Liu-liu iha parte Mecanica e Eletrica.
4. Fasilidade la sufisiente apoiu servisu diariamente hanesan laptop hodi halo back up data no update ba folder system.
5. Motorista menus difikulta atividades servisu.
6. Iha parte Mecanica e Eletrica ekipa engineiro nunka hasoru tekniku husi kompania no parte kompania sempre delega tekniku neébe ba hein iha terenu, maibe tekniku neé rasik laiha konesimentu klean ho orbra refere.
7. Kuantidade transporte ne'ebe la sufisiente hodi halo monitorizasaun ba projetu iha terenu tuir plano ne'ebe iha.
8. Departamento Mecanica e Eletrica labele kontrola masimu projeto electricidade ho instalasaun eletrica ba edifisio publica tanba engineiros ida kontrola municipio ha'at (4).
9. Ho kuantidade projeto neébe barak no ho distansia neébe doók Enginheiro la sufisiente hodi kobre.
10. Velocidade Internet iha Municipio lao ladun diak hodi nune'e susar tebes atu asesu no submete dokumentos ruma via email liu- iu Drop box.
11. Enginheiro infrenta problema wainhira atu input data konsultan design ba Sistema drop box tamba folder nebe prepara ona responde liu ba servisu kontraktor nian.

12. Kapasidade folder system la to'o atu guarda/save dados inspeksaun tomak ne'ebe barak.
13. Kondisaun eskritorio no Residensia ADN, I.P. municipio la halo rehabilitasaun no manutensaun periodika.

ADN, I.P.

IV. REKOMENDASAUN

4.1. Rekomendasaun ba Parte Companhia, ADN, I.P. no Ministerio Relevantes

1. Husu Superior ADN, I.P. atu bele hato'o ba projetu nain konaba projetu hirak ne'ebe maka abandona no parado husi kompania/empreza ne'ebe iha responsabilidade ba projetu ne'e rasik atu bele foti medidas ruma hanesan Blacklist ou Penalidade ba kompania.
2. ADN, I.P. Municipio husu ba Dono Projectu refere, ba oin kompania/empreza ne'ebe maka laiha responsabilidade no abandona projetu/obra ne'ebe sira halo, husu Guverno labele fo tan oportunidade ba kompana hirak ne'e hodi konkore iha prosesu aprovisionamentu ba prozetu hira ne'ebe tuir mai.
3. Ba Superior ADN, I.P. atu kordena ho Ministerio relevantes sira hodi nune'e bele fo penalidade ba kompanhia sira neébe servisu paradu sem informasaun.
4. Rekomenda ba Kompanhia atu orienta nia tekniku hodi standby iha tereno
5. Kondisaun Rezidesia Oficial ADN, I.P. Municipio balun ne'ebe presija atu hadia : Be'e, Moru no Tralis Janela etc.
6. Rekomenda ba Ministerio relevante hodi orienta nia Engineiro sira hodi halo supervisaun maximo iha tereno
7. Rekomenda mos ba seksaun ITC atu aumenta fasilidade Laptop ba iha Munisipiu tamba tekniku nain hat assesu dropbox iha laptop ida deit, hodi nune'e susar atu fahe servisu.
8. Rekomenda ba superior sira atu prepara printer nebe bele print kertas A3 no A4 hodi nune'e bele fasilita servisu iha Municipio.
9. Sujere ba Superior karik bele planu Inspeksaun kada fulan dala tolu (3) ba visita projetu sente todan ou la kobre
10. Husu atu aumenta tan rekursu humano (engineiro mecanica e eletrica) iha Departamento Mecanica e Eletrica.
11. Husu ba ekipa base de dadus atu kria folder iha Sistema drop box nebe bele relata imformasaun kona ba servisu konsultan design nian

Aneksu A

Detalha Progresu fisiku Infrastruturas
Terceiro Trimestral 2022

Julho

Projeto 13 Municipios Por Fundos Finansiamento

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	FI				LM-CD			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	$ 48,277,505.03	$ 29,905,551.70	61.95%	19	$ 4,490,679.95	$ 1,509,377.98	33.61%
2	Ainaro	29	$ 91,212,374.94	$ 79,785,061.66	87.47%	17	$ 3,008,653.96	$ 969,681.15	32.23%
3	Baucau	24	$ 133,969,033.60	$ 95,625,785.13	71.38%	17	$ 4,861,686.43	$ 1,561,889.13	32.13%
4	Bobonaro	38	$ 46,870,970.75	$ 27,384,066.17	58.42%	17	$ 5,228,423.12	$ 1,955,966.70	37.41%
5	Covalima	32	$ 124,964,902.44	$ 105,671,799.11	84.56%	11	$ 2,643,602.32	$ 898,260.26	33.98%
6	Dili	57	$ 77,546,013.10	$ 36,550,994.30	47.13%	71	$ 18,736,048.43	$ 8,233,784.46	43.95%
7	Ermera	21	$ 21,217,836.65	$ 13,848,477.69	65.27%	7	$ 1,356,638.14	$ 347,354.13	25.60%
8	Lautem	14	$ 32,905,711.12	$ 25,857,993.16	78.58%	17	$ 4,916,952.07	$ 2,243,403.89	45.63%
9	Liquica	14	$ 19,017,345.34	$ 10,265,984.27	53.98%	25	$ 3,314,058.24	$ 445,362.27	13.44%
10	Manatuto	13	$ 131,516,647.81	$ 110,831,852.61	84.27%	18	$ 4,268,931.05	$ 1,168,855.42	27.38%
11	Manufahi	23	$ 17,989,052.93	$ 12,541,157.40	69.72%	19	$ 3,101,275.15	$ 1,440,791.34	46.46%
12	Nasional	23	$ 107,780,701.29	$ 77,471,030.59	71.88%	4	$ 48,413,480.98	$ 30,088,834.65	62.15%
13	Oe-cusse	4	$ 2,353,321.65	$ 1,852,567.85	78.72%				
14	Regional	2	$ 32,032,062.14	$ 12,363,098.14	38.60%	1	$ 53,025,601.00	$ 37,586,889.12	70.88%
15	Viqueque	24	$ 59,413,345.74	$ 31,408,644.37	52.86%	10	$ 3,838,970.62	$ 1,085,422.61	28.27%
	Grand Total	**332**	**$ 947,066,824.53**	**$ 671,364,064.15**	**70.89%**	**253**	**$ 161,205,001.46**	**$ 89,535,873.10**	**55.54%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	PDIM				LM-BS			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					4	$ 1,568,065.11	$ 893,031.51	56.95%
2	Ainaro	8	$ 931,596.86	$ 664,237.60	71.30%	3	$ 565,845.40	$ 527,769.63	93.27%
3	Baucau	8	$ 863,550.68	$ 387,406.75	44.86%	6	$ 1,107,575.09	$ 443,414.69	40.03%
4	Bobonaro	8	$ 746,047.73	$ 509,771.16	68.33%	4	$ 860,900.42	$ 574,695.17	66.76%
5	Covalima	3	$ 592,720.70	$ 558,300.67	94.19%	3	$ 575,995.90	$ 255,350.34	44.33%
6	Dili	7	$ 1,054,664.27	$ 875,375.74	83.00%	48	$ 4,653,538.45	$ 3,021,019.27	64.92%
7	Ermera	5	$ 845,470.49	$ 729,472.08	86.28%	2	$ 365,450.73	$ 87,439.28	23.93%
8	Lautem	2	$ 397,338.85	$ -	0.00%	6	$ 1,103,542.01	$ 541,687.21	49.09%
9	Liquica	5	$ 722,133.98	$ 278,035.53	38.50%	11	$ 1,574,555.51	$ 917,189.25	58.25%
10	Manatuto	12	$ 1,596,152.81	$ 1,065,378.40	66.75%	6	$ 1,160,391.31	$ 446,513.42	38.48%
11	Manufahi	8	$ 1,245,072.87	$ 895,841.76	71.95%	5	$ 1,464,659.68	$ 1,024,526.15	69.95%
12	Nasional					6	$ 1,086,014.94	$ 585,510.18	53.91%
13	Oe-cusse								
14	Regional					1	$ 373,666.00	$ 261,565.60	70.00%
15	Viqueque	2	$ 355,840.92	$ 301,722.65	84.79%	3	$ 300,989.41	$ 140,346.67	46.63%
	Grand Total	**68**	**$ 9,350,590.16**	**$ 6,265,542.34**	**67.01%**	**108**	**$ 16,761,189.96**	**$ 9,720,058.37**	**57.99%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	LM-TP				Fundo Covid-19			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	$ 1,617,454.43	$ 291,034.08	17.99%	3	$ 475,384.99	$ 366,380.35	77.07%
2	Ainaro	17	$ 1,665,991.99	$ 107,982.98	6.48%	3	$ 242,067.62	$ 120,512.49	49.78%
3	Baucau	29	$ 3,000,775.19	$ -	0.00%	1	$ 469,360.62	$ 329,188.84	70.14%
4	Bobonaro	23	$ 3,106,600.00	$ 331,098.10	10.66%	5	$ 729,315.76	$ 570,476.28	78.22%
5	Covalima	17	$ 2,921,378.69	$ 941,722.09	32.24%	4	$ 533,488.64	$ 393,464.66	73.75%
6	Dili	24	$ 11,248,554.33	$ 3,985,794.37	35.43%	6	$ 1,979,610.19	$ 813,555.95	41.10%
7	Ermera	20	$ 2,252,742.01	$ 104,743.16	4.65%	2	$ 334,327.32	$ 202,560.49	60.59%
8	Lautem	16	$ 1,702,312.60	$ -	0.00%	2	$ 373,420.03	$ 254,295.00	68.10%
9	Liquica	13	$ 1,123,528.85	$ -	0.00%	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%
10	Manatuto	10	$ 872,256.79	$ -	0.00%	4	$ 665,658.27	$ 273,641.01	41.11%
11	Manufahi	15	$ 1,586,878.39	$ -	0.00%	3	$ 383,412.81	$ 285,247.41	74.40%
12	Nasional								
13	Oe-cusse								
14	Regional								
15	Viqueque	18	$ 1,781,168.18	$ 171,704.03	9.64%				
	Grand Total	**216**	**$ 32,879,641.45**	**$ 5,934,078.81**	**18.05%**	**37**	**$ 6,619,411.13**	**$ 3,897,256.11**	**58.88%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	Emergency				TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					54	$ 56,429,089.51	$ 32,965,375.62	58.42%
2	Ainaro					77	$ 97,626,530.77	$ 82,175,245.51	84.17%
3	Baucau					85	$ 144,271,981.61	$ 98,347,684.54	68.17%
4	Bobonaro					95	$ 57,542,257.78	$ 31,326,073.58	54.44%
5	Covalima					70	$ 132,232,088.69	$ 108,718,897.13	82.22%
6	Dili	9	$ 5,033,096.85	$ 852,468.15	16.94%	222	$ 120,251,525.62	$ 54,332,992.24	45.18%
7	Ermera					57	$ 26,372,465.34	$ 15,320,046.83	58.09%
8	Lautem					57	$ 41,399,276.68	$ 28,897,379.26	69.80%
9	Liquica	1	$ 502,473.28	$ 441,060.32	87.78%	73	$ 26,687,460.08	$ 12,635,565.27	47.35%
10	Manatuto					63	$ 140,080,038.04	$ 113,786,240.86	81.23%
11	Manufahi					73	$ 25,770,351.83	$ 16,187,564.06	62.81%
12	Nasional					33	$ 157,280,197.21	$ 108,145,375.42	68.76%
13	Oe-cusse					4	$ 2,353,321.65	$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional					4	$ 85,431,329.14	$ 50,211,552.86	58.77%
15	Viqueque					57	$ 65,690,314.87	$ 33,107,840.32	50.40%
	Grand Total	**10**	**$ 5,535,570.13**	**$ 1,293,528.47**	**23.37%**	**1024**	**$ 1,179,418,228.82**	**$ 788,010,401.35**	**66.81%**

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T, M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Julho

Projeto 13 Municipios Por Sectór

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Aileu				Ainaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	1	$ 827,410.00	$ 74,466.90	9.00%				
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	4	$ 1,079,346.48	$ 472,990.32	43.82%	6	$ 940,813.03	$ 251,007.13	26.68%
7	EDUKASAUN	13	$ 1,313,542.97	$ 74,029.80	5.64%	19	$ 2,292,232.62	$ 365,176.57	15.93%
8	ELÉCTRICIDADE	3	$ 1,001,069.36	$ 760,462.94	75.97%	10	$ 7,999,431.74	$ 5,711,400.08	71.40%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS E PONTES	16	$ 18,509,629.40	$ 14,621,582.31	78.99%	14	$ 19,599,149.60	$ 12,140,905.41	61.95%
11	FLOOD CONTROL					1	$ 84,160.28	$ 73,802.68	87.69%
12	IMPRESTIMO	4	$ 30,387,163.09	$ 15,045,148.91	49.51%	3	$ 59,201,316.40	$ 58,556,522.00	98.91%
13	IRIGASAUN					1	$ 32,319.72	$ 32,319.72	100.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	$ 1,320,533.03	$ 747,673.66	56.62%	17	$ 3,237,083.74	$ 2,003,677.86	61.90%
16	PONTES					2	$ 3,869,397.22	$ 2,837,687.37	73.34%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	2	$ 1,025,800.00	$ 552,821.25	53.89%				
19	SAUDE	3	$ 494,193.39	$ 304,001.63	61.51%	3	$ 274,369.70	$ 116,514.14	42.47%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	$ 166,490.33	$ 95,193.62	57.18%				
23	TURISMO	1	$ 303,911.46	$ 217,004.28	71.40%	1	$ 96,256.72	$ 86,232.55	89.59%
	Grand Total	**54**	**$ 56,429,089.51**	**$ 32,965,375.62**	**58.42%**	**77**	**$ 97,626,530.77**	**$ 82,175,245.51**	**84.17%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	1	$ 316,447.42	$ 284,307.87	89.84%	2	$ 373,662.01	$ 108,424.87	29.02%
3	AGUA E SANEAMENTO					3	$ 511,112.23	$ 443,532.84	86.78%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	13	$ 1,999,417.79	$ 592,767.00	29.65%	3	$ 770,809.57	$ 357,234.37	46.35%
7	EDUKASAUN	31	$ 3,743,421.04	$ 624,596.30	16.69%	21	$ 2,409,512.03	$ 30,076.20	1.25%
8	ELÉCTRICIDADE	10	$ 3,110,591.49	$ 2,637,512.89	84.79%	8	$ 2,152,484.95	$ 1,606,554.18	74.64%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS E PONTES	17	$ 22,189,429.73	$ 11,204,746.64	50.50%	32	$ 22,542,525.63	$ 9,867,173.62	43.77%
11	FLOOD CONTROL					2	$ 437,194.54	$ 36,987.35	8.46%
12	IMPRESTIMO	4	$ 109,889,602.64	$ 80,781,958.04	73.51%	1	$ 20,748,566.21	$ 15,892,652.52	76.60%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	8	$ 2,553,710.88	$ 1,892,606.96	74.11%	5	$ 1,317,219.88	$ 666,238.28	50.58%
16	PONTES					1	$ 2,860,755.63	$ 581,091.24	20.31%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	1	$ 469,360.62	$ 329,188.84	70.14%	16	$ 2,536,031.77	$ 1,675,820.15	66.08%
20	SEGURANCA NO DEFESA					1	$ 882,383.33	$ 60,287.96	6.83%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
	Grand Total	**85**	**$ 144,271,981.61**	**$ 98,347,684.54**	**68.17%**	**95**	**$ 57,542,257.78**	**$ 31,326,073.58**	**54.44%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Covalima				Dili			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	2	$ 72,430,992.54	$ 67,247,696.91	92.84%				
2	AGRICULTURA					1	$ 273,270.70	$ 191,289.49	70.00%
3	AGUA E SANEAMENTO	1	$ 264,381.80	$ 264,381.80	100.00%	16	$ 2,028,400.35	$ 1,187,062.57	58.52%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					1	$ 781,121.90	$ 222,619.74	28.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	9	$ 2,585,789.57	$ 1,536,415.91	59.42%	61	$ 33,449,967.08	$ 14,390,526.77	43.02%
7	EDUKASAUN	18	$ 2,722,556.08	$ 171,935.57	6.32%	21	$ 2,880,441.85	$ 704,316.03	24.45%
8	ELÉCTRICIDADE	5	$ 2,730,729.02	$ 1,670,874.34	61.19%	21	$ 7,103,218.29	$ 4,385,763.75	61.74%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO					2	$ 1,209,890.98	$ 990,409.50	81.86%
10	ESTRADAS E PONTES	19	$ 39,207,818.72	$ 27,723,140.84	70.71%	36	$ 48,855,603.46	$ 26,540,627.26	54.32%
11	FLOOD CONTROL	3	$ 1,338,610.18	$ 206,078.51	15.39%	8	$ 2,351,678.72	$ 759,119.83	32.28%
12	IMPRESTIMO								
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					7	$ 1,364,930.47	$ 801,724.36	58.74%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	$ 1,507,681.83	$ 989,680.74	65.64%	22	$ 2,494,823.18	$ 1,636,129.71	65.58%
16	PONTES	2	$ 8,755,658.60	$ 8,368,537.76	95.58%	2	$ 238,814.51	$ 81,142.40	33.98%
17	PORTOS					2	$ 846,710.87	$ 339,787.68	40.13%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					6	$ 1,569,898.35	$ 496,275.67	31.61%
19	SAUDE	4	$ 687,870.35	$ 540,154.75	78.53%	8	$ 2,113,445.85	$ 810,485.81	38.35%
20	SEGURANCA NO DEFESA					3	$ 11,581,904.47	$ 174,219.47	1.50%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	$ 449,600.23	$ 350,256.56	77.90%
23	TURISMO					4	$ 657,804.36	$ 271,235.64	41.23%
	Grand Total	**70**	**$ 132,232,088.69**	**$ 108,718,897.13**	**82.22%**	**222**	**$ 120,251,525.62**	**$ 54,332,992.24**	**45.18%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	4	$ 448,959.83	$ 146,375.20	32.60%	3	$ 815,564.95	$ 286,056.46	35.07%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	25	$ 3,229,127.78	$ 104,743.16	3.24%	8	$ 2,714,339.43	$ 1,157,724.78	42.65%
7	EDUKASAUN	1	$ 368,226.28	$ 317,237.31	86.15%	18	$ 2,166,673.93	$ 57,143.15	2.64%
8	ELÉCTRICIDADE	9	$ 6,825,025.51	$ 5,362,124.31	78.57%	2	$ 1,026,193.79	$ 718,131.88	69.98%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS E PONTES	10	$ 14,089,732.30	$ 8,273,990.94	58.72%	19	$ 33,198,180.78	$ 25,621,069.31	77.18%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO								
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	$ 388,544.22	$ 364,344.79	93.77%	3	$ 601,385.25	$ 370,106.35	61.54%
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	6	$ 1,022,849.42	$ 751,231.12	73.44%	2	$ 373,420.03	$ 254,295.00	68.10%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	$ 417,933.73	$ 362,176.33	86.66%
23	TURISMO					1	$ 85,584.79	$ 70,676.00	82.58%
	Grand Total	**57**	**$ 26,372,465.34**	**$ 15,320,046.83**	**58.09%**	**57**	**$ 41,399,276.68**	**$ 28,897,379.26**	**69.80%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Liquica				Manatuto			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	2	$ 91,877.21	$ 80,662.08	87.79%	1	$ 370,511.25	$ 58,645.87	15.83%
3	AGUA E SANEAMENTO	3	$ 293,629.77	$ 167,315.56	56.98%	1	$ 162,377.94	$ 67,961.57	41.85%
4	COMERCIO					1	$ 153,942.39	$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	2	$ 210,635.04	$ -	0.00%	9	$ 1,430,360.48	$ 421,619.99	29.48%
7	EDUKASAUN	18	$ 1,956,926.91	$ 302,946.05	15.48%	12	$ 1,236,740.28	$ 313,009.29	25.31%
8	ELÉCTRICIDADE	7	$ 7,088,688.86	$ 1,356,756.80	19.14%	2	$ 1,076,003.44	$ 845,364.30	78.57%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS E PONTES	25	$ 5,166,524.75	$ 2,184,514.45	42.28%	19	$ 13,075,209.38	$ 8,474,491.95	64.81%
11	FLOOD CONTROL	1	$ 502,473.28	$ 441,060.32	87.78%	1	$ 242,560.14	$ 154,455.92	63.68%
12	IMPRESTIMO	1	$ 7,693,101.00	$ 5,921,336.53	76.97%	4	$ 115,112,106.35	$ 97,802,583.81	84.96%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					1	$ 2,362,976.44	$ 1,795,843.89	76.00%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	$ 1,522,380.50	$ 1,081,134.13	71.02%	2	$ 157,560.52	$ 66,113.10	41.96%
16	PONTES					1	$ 3,553,954.20	$ 3,053,097.27	85.91%
17	PORTOS	1	$ 1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%				
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%	7	$ 840,178.96	$ 533,503.08	63.50%
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 58,107.88	$ 50,129.80	86.27%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%	2	$ 305,556.27	$ 87,571.99	28.66%
	Grand Total	**73**	**$ 26,687,460.08**	**$ 12,635,565.27**	**47.35%**	**63**	**$ 140,080,038.04**	**$ 113,786,240.86**	**81.23%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					1	$ 1,100,000.00	$ 600,000.00	54.55%
2	AGRICULTURA					1	$ 69,978.38	$ 64,579.46	92.28%
3	AGUA E SANEAMENTO	5	$ 444,587.79	$ 184,573.83	41.52%	6	$ 7,557,238.90	$ 4,424,020.23	58.54%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					4	$ 26,361,368.60	$ 17,615,140.52	66.82%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	3	$ 610,160.22	$ 405,808.45	66.51%	2	$ 622,806.05	$ 246,754.86	39.62%
7	EDUKASAUN	15	$ 1,586,878.39	$ -					
8	ELÉCTRICIDADE	6	$ 3,946,641.94	$ 3,004,275.07	76.12%	1	$ 46,872,339.00	$ 29,682,899.05	63.33%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO					2	$ 3,363,254.74	$ 3,093,841.36	91.99%
10	ESTRADAS E PONTES	23	$ 13,931,378.20	$ 9,030,809.23	64.82%	6	$ 1,668,071.49	$ 518,950.88	31.11%
11	FLOOD CONTROL	2	$ 309,015.17	$ 70,017.36	22.66%				
12	IMPRESTIMO					2	$ 61,279,463.36	$ 46,678,280.94	76.17%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	$ 23,697.55	$ 21,127.51	89.15%	1	$ 1,636,624.69	$ 925,534.68	56.55%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	11	$ 3,615,130.78	$ 2,516,679.93	69.62%				
16	PONTES	1	$ 328,755.98	$ 153,014.54	46.54%				
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					2	$ 902,708.00	$ 681,929.60	75.54%
19	SAUDE	2	$ 312,000.61	$ 276,911.01	88.75%	1	$ 254,727.00	$ -	0.00%
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 76,149.37	$ -	0.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					2	$ 5,291,216.00	$ 3,613,443.84	68.29%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	$ 536,957.37	$ 524,347.13	97.65%	1	$ 74,828.00	$ -	0.00%
23	TURISMO	1	$ 48,998.46	$ -	0.00%	1	$ 225,573.00	$ -	0.00%
	Grand Total	**73**	**$ 25,770,351.83**	**$ 16,187,564.06**	**62.81%**	**33**	**$ 157,280,197.21**	**$ 108,145,375.42**	**68.76%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO								
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS								
7	EDUKASAUN								
8	ELÉCTRICIDADE	3	$ 693,149.25	$ 358,412.70	51.71%	1	$ 53,025,601.00	$ 37,586,889.12	70.88%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS E PONTES					1	$ 373,666.00	$ 261,565.60	70.00%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO					2	$ 32,032,062.14	$ 12,363,098.14	38.60%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN								
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE								
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 1,660,172.40	$ 1,494,155.15	90.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
	Grand Total	**4**	**$ 2,353,321.65**	**$ 1,852,567.85**	**78.72%**	**4**	**$ 85,431,329.14**	**$ 50,211,552.86**	**58.77%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Viqueque				Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					3	$ 73,530,992.54	$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	3	$ 5,472,502.45	$ 4,041,786.34	73.86%	11	$ 6,968,249.42	$ 4,829,695.98	69.31%
3	AGUA E SANEAMENTO					43	$ 13,353,663.56	$ 7,245,746.96	54.26%
4	COMERCIO					1	$ 153,942.39	$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					5	$ 27,142,490.50	$ 17,837,760.26	65.72%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	25	$ 3,695,589.43	$ 702,567.67	19.01%	170	$ 53,339,161.95	$ 20,640,160.41	38.70%
7	EDUKASAUN					187	$ 22,677,152.38	$ 2,960,466.27	13.05%
8	ELÉCTRICIDADE	4	$ 2,296,509.09	$ 1,504,022.77	65.49%	92	$ 146,947,676.73	$ 97,191,444.18	66.14%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO					4	$ 4,573,145.72	$ 4,084,250.86	89.31%
10	ESTRADAS E PONTES	22	$ 52,858,602.47	$ 26,159,170.57	49.49%	259	$ 305,265,521.91	$ 182,622,739.01	59.82%
11	FLOOD CONTROL					18	$ 5,265,692.31	$ 1,741,521.97	33.07%
12	IMPRESTIMO					21	$ 436,343,381.19	$ 333,041,580.89	76.33%
13	IRIGASAUN					1	$ 32,319.72	$ 32,319.72	100.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					10	$ 5,388,229.15	$ 3,544,230.44	65.78%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	$ 609,021.05	$ 154,392.39	25.35%	91	$ 19,325,074.86	$ 12,488,777.90	64.62%
16	PONTES	1	$ 758,090.38	$ 545,900.59	72.01%	10	$ 20,365,426.52	$ 15,620,471.17	76.70%
17	PORTOS					3	$ 2,241,460.87	$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					10	$ 3,498,406.35	$ 1,731,026.52	49.48%
19	SAUDE					57	$ 9,811,812.58	$ 5,880,039.16	59.93%
20	SEGURANCA NO DEFESA					7	$ 14,258,717.45	$ 1,778,792.38	12.48%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					2	$ 5,291,216.00	$ 3,613,443.84	68.29%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					7	$ 1,645,809.66	$ 1,331,973.64	80.93%
23	TURISMO					12	$ 1,998,685.06	$ 837,220.46	41.89%
	Grand Total	**57**	**$ 65,690,314.87**	**$ 33,107,840.32**	**50.40%**	**1024**	**$ 1,179,418,228.82**	**$ 788,010,401.35**	**66.81%**

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T, M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Julho

Projeto 13 Municipios Por Ministério

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Aileu				Ainaro			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL					3	$ 260,605.35	$ 211,872.50	81.30%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS					1	$ 32,319.72	$ 32,319.72	100.00%
11	MINISTERIO DA DEFESA								
12	MINISTERIO DA JUSTICA	1	$ 200,000.00	$ 178,371.29	89.19%				
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	30	$ 52,596,604.88	$ 31,634,894.72	60.15%	44	$ 93,392,278.87	$ 80,998,947.82	86.73%
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	14	$ 1,484,622.27	$ 74,029.80	4.99%	20	$ 2,316,678.62	$ 387,177.97	16.71%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	$ 475,000.00	$ 167,261.25	35.21%				
18	MINISTERIO FINANCAS								
19	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	$ 118,769.70	$ 61,804.39	52.04%	1	$ 489,653.83	$ 229,243.50	46.82%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	$ 7,700.00	$ 6,930.00	90.00%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
23	MINISTERIO SAUDE	4	$ 775,330.57	$ 557,025.10	71.84%	5	$ 484,439.64	$ 222,521.45	45.93%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	$ 474,850.63	$ 74,984.79	15.79%	1	$ 546,598.02	$ -	0.00%
25	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE	1	$ 303,911.46	$ 217,004.28	71.40%	1	$ 96,256.72	$ 86,232.55	89.59%
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**54**	**$ 56,429,089.51**	**$ 32,965,375.62**	**58.42%**	**77**	**$ 97,626,530.77**	**$ 82,175,245.51**	**84.17%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL	7	$ 798,108.36	$ 328,508.66	41.16%	1	$ 15,508.35	$ 9,975.03	64.32%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					1	$ 564,695.97	$ 221,586.70	39.24%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	$ 316,447.42	$ 284,307.87	89.84%	2	$ 373,662.01	$ 108,424.87	29.02%
11	MINISTERIO DA DEFESA					1	$ 882,383.33	$ 60,287.96	6.83%
12	MINISTERIO DA JUSTICA								
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	$ 137,763,172.77	$ 96,534,678.76	70.07%	52	$ 50,721,563.99	$ 29,142,679.11	57.46%
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	31	$ 3,743,421.04	$ 624,596.30	16.69%	22	$ 2,541,904.03	$ 109,511.40	4.31%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANCAS					1	$ 190,605.25	$ 125,672.64	65.93%
19	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	2	$ 782,313.77	$ 112,848.70	14.42%				
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	$ 220,190.97	$ 213,875.07	97.13%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
23	MINISTERIO SAUDE	2	$ 748,725.31	$ 402,304.35	53.73%	14	$ 2,031,743.88	$ 1,334,060.80	65.66%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 50,000.00	$ 30,483.00	60.97%				
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES	1	$ 69,792.94	$ 29,956.90	42.92%				
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**85**	**$ 144,271,981.61**	**$ 98,347,684.54**	**68.17%**	**95**	**$ 57,542,257.78**	**$ 31,326,073.58**	**54.44%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Covalima				Dili			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC					1	$ 256,843.00	$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega					2	$ 134,670.96	$ 85,243.25	63.30%
3	CFP					1	$ 35,500.00	$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRENSA					1	$ 97,498.81	$ 83,740.72	85.89%
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL					8	$ 568,677.26	$ 333,402.33	58.63%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	$ 1,196,660.00	$ 941,722.09	78.70%	7	$ 9,107,620.21	$ 3,614,732.46	39.69%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					1	$ 63,076.61	$ 51,792.75	82.11%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	$ 260,523.18	$ 206,078.51	79.10%	2	$ 292,519.73	$ 209,738.52	71.70%
11	MINISTERIO DA DEFESA					8	$ 2,542,703.34	$ 1,095,863.33	43.10%
12	MINISTERIO DA JUSTICA	1	$ 149,292.80	$ 92,120.77	61.70%	5	$ 593,610.53	$ 92,258.11	15.54%
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	$ 158,889.74	$ 21,615.42	13.60%
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	35	$ 53,279,975.17	$ 38,752,233.68	72.73%	100	$ 64,974,398.42	$ 36,238,554.76	55.77%
15	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$ 337,328.10	$ -	0.00%	3	$ 10,861,982.32	$ 250,277.24	2.30%
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	19	$ 2,905,884.88	$ 171,935.57	5.92%	22	$ 3,290,741.76	$ 946,409.39	28.76%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					1	$ 7,583.06	$ 6,599.24	87.03%
18	MINISTERIO FINANCAS								
19	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus					1	$ 119,578.85	$ 92,618.05	77.45%
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					3	$ 1,434,737.07	$ 551,605.33	38.45%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 264,381.80	$ 264,381.80	100.00%	7	$ 1,056,679.87	$ 418,214.98	39.58%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
23	MINISTERIO SAUDE	8	$ 1,373,959.16	$ 1,018,902.23	74.16%	13	$ 3,394,018.46	$ 1,690,328.27	49.80%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	$ 449,600.23	$ 350,256.56	77.90%
25	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	2	$ 72,430,992.54	$ 67,247,696.91	92.84%	4	$ 943,633.56	$ 365,720.51	38.76%
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 33,091.06	$ 23,825.57	72.00%	4	$ 756,542.64	$ 294,507.14	38.93%
27	PARLAMENTU NASIONAL					2	$ 69,221.96	$ 27,033.43	39.05%
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA					1	$ 556,612.74	$ 499,422.83	89.73%
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE					1	$ 37,605.25	$ 33,844.72	90.00%
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	$ 412,212.00	$ 76,000.00	18.44%
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					6	$ 1,322,071.13	$ 771,079.55	58.32%
33	SEFOPE					1	$ 460,254.00	$ 339,787.68	73.83%
34	TRADE INVEST					1	$ 37,582.90	$ 18,900.89	50.29%
35	TRIBUNAL RECUSSO					4	$ 12,092,434.96	$ 3,742,742.83	30.95%
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E					7	$ 4,122,424.25	$ 1,819,551.91	44.14%
	Grand Total	**70**	**$ 132,232,088.69**	**$ 108,718,897.13**	**82.22%**	**222**	**$ 120,251,525.62**	**$ 54,332,992.24**	**45.18%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL	1	$ 66,560.00	$ -		2	$ 397,338.85	$ -	0.00%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS								
11	MINISTERIO DA DEFESA								
12	MINISTERIO DA JUSTICA	1	$ 160,056.02	$ -	0.00%				
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	25	$ 21,752,261.86	$ 14,146,835.24	65.04%	27	$ 35,641,324.77	$ 26,995,364.00	75.74%
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	23	$ 3,012,002.58	$ 337,916.48	11.22%	19	$ 2,474,390.58	$ 57,143.15	2.31%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANCAS					1	$ 56,783.85	$ 45,907.81	80.85%
19	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	$ 358,735.46	$ 84,063.99	23.43%				
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					2	$ 962,218.72	$ 498,140.87	51.77%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
23	MINISTERIO SAUDE	6	$ 1,022,849.42	$ 751,231.12	73.44%	3	$ 653,626.75	$ 406,441.48	62.18%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	$ 417,933.73	$ 362,176.33	86.66%
25	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA					1	$ 710,074.64	$ 461,529.62	65.00%
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE					1	$ 85,584.79	$ 70,676.00	82.58%
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**57**	**$ 26,372,465.34**	**$ 15,320,046.83**	**58.09%**	**57**	**$ 41,399,276.68**	**$ 28,897,379.26**	**69.80%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Liquica				Manatuto			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL	3	$ 387,568.54	$ -	0.00%	4	$ 567,521.53	$ 317,298.93	55.91%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	3	$ 139,176.53	$ 118,527.60	85.16%	1	$ 370,511.25	$ 58,645.87	15.83%
11	MINISTERIO DA DEFESA								
12	MINISTERIO DA JUSTICA					1	$ 29,275.84	$ 4,660.85	15.92%
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	41	$ 21,943,080.54	$ 11,031,749.58	50.27%	30	$ 133,379,771.97	$ 110,464,067.92	82.82%
15	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$ 58,107.88	$ 50,129.80	86.27%				
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	$ 1,956,926.91	$ 302,946.05	15.48%	13	$ 1,303,638.79	$ 313,009.29	24.01%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANCAS								
19	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					1	$ 408,460.73	$ 106,266.80	26.02%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 99,484.80	$ 82,502.69	82.93%	1	$ 277,330.43	$ -	0.00%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
23	MINISTERIO SAUDE	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%	9	$ 1,175,863.67	$ 596,732.36	50.75%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	1	$ 1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%				
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%	2	$ 204,687.39	$ 129,714.95	63.37%
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	$ 2,362,976.44	$ 1,795,843.89	76.00%
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**73**	**$ 26,687,460.08**	**$ 12,635,565.27**	**47.35%**	**63**	**$ 140,080,038.04**	**$ 113,786,240.86**	**81.23%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	$ 292,653.74	$ -	0.00%				
6	ESTATAL	5	$ 575,943.14	$ 556,747.80	96.67%	1	$ 479,146.05	$ 246,754.86	51.50%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					2	$ 3,363,254.74	$ 3,093,841.36	91.99%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS					1	$ 69,978.38	$ 64,579.46	92.28%
11	MINISTERIO DA DEFESA								
12	MINISTERIO DA JUSTICA								
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	45	$ 22,267,567.90	$ 14,948,096.80	67.13%	16	$ 118,211,294.75	$ 81,939,460.70	69.32%
15	MINISTERIO DO INTERIOR	2	$ 436,263.93	$ 269,076.60	61.68%				
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	15	$ 1,586,878.39	$ -	0.00%				
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANCAS					3	$ 6,391,216.00	$ 4,213,443.84	65.93%
19	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	$ 48,998.46	$ -	0.00%	1	$ 74,828.00	$ -	0.00%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					2	$ 2,510,600.00	$ 225,954.00	9.00%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS					2	$ 23,850,768.60	$ 17,389,186.52	72.91%
23	MINISTERIO SAUDE	3	$ 383,412.81	$ 285,247.41	74.40%	1	$ 254,727.00	$ -	0.00%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN					1	$ 68,526.00	$ 46,620.00	68.03%
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 178,633.46	$ 128,395.45	71.88%	2	$ 369,233.00	$ -	0.00%
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	$ 1,636,624.69	$ 925,534.68	56.55%
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**73**	**$ 25,770,351.83**	**$ 16,187,564.06**	**62.81%**	**33**	**$ 157,280,197.21**	**$ 108,145,375.42**	**68.76%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL								
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS								
11	MINISTERIO DA DEFESA	1	$ 1,660,172.40	$ 1,494,155.15	90.00%				
12	MINISTERIO DA JUSTICA								
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	$ 693,149.25	$ 358,412.70	51.71%	4	$ 85,431,329.14	$ 50,211,552.86	58.77%
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU								
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANCAS								
19	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU								
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
23	MINISTERIO SAUDE								
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**4**	**$ 2,353,321.65**	**$ 1,852,567.85**	**78.72%**	**4**	**$ 85,431,329.14**	**$ 50,211,552.86**	**58.77%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Viqueque				GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC					1	$ 256,843.00	$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega					2	$ 134,670.96	$ 85,243.25	63.30%
3	CFP					1	$ 35,500.00	$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRENSA					1	$ 97,498.81	$ 83,740.72	85.89%
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P					1	$ 292,653.74	$ -	0.00%
6	ESTATAL	2	$ 355,840.92	$ 301,722.65	84.79%	37	$ 4,472,818.35	$ 2,306,282.76	51.56%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					11	$ 14,232,230.92	$ 7,871,882.61	55.31%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					1	$ 63,076.61	$ 51,792.75	82.11%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	$ 145,269.48	$ 62,378.72	42.94%	1	$ 145,269.48	$ 62,378.72	42.94%
10	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	3	$ 5,472,502.45	$ 4,041,786.34	73.86%	15	$ 7,327,640.67	$ 5,124,408.76	69.93%
11	MINISTERIO DA DEFESA					10	$ 5,085,259.07	$ 2,650,306.44	52.12%
12	MINISTERIO DA JUSTICA					9	$ 1,132,235.19	$ 367,411.02	32.45%
13	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	$ 158,889.74	$ 21,615.42	13.60%
14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	29	$ 56,522,222.99	$ 28,363,486.31	50.18%	521	$ 948,569,997.27	$ 651,761,014.96	68.71%
15	MINISTERIO DO INTERIOR					7	$ 11,693,682.23	$ 569,483.64	4.87%
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	$ 1,781,168.18	$ 171,704.03	9.64%	234	$ 28,398,258.03	$ 3,496,379.43	12.31%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					2	$ 482,583.06	$ 173,860.49	36.03%
18	MINISTERIO FINANCAS					5	$ 6,638,605.10	$ 4,385,024.29	66.05%
19	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus					1	$ 119,578.85	$ 92,618.05	77.45%
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	$ 275,004.50	$ 2,911.53	1.06%	12	$ 3,991,501.52	$ 1,148,744.24	28.78%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 5,707.28	$ -	0.00%	17	$ 5,404,293.87	$ 1,709,999.41	31.64%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS					2	$ 23,850,768.60	$ 17,389,186.52	72.91%
23	MINISTERIO SAUDE	1	$ 327,232.66	$ 163,850.75	50.07%	73	$ 13,059,294.21	$ 7,716,578.95	59.09%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	$ 805,366.41	$ -		6	$ 2,694,349.02	$ 787,417.68	29.22%
25	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN					8	$ 74,837,902.10	$ 68,317,313.34	91.29%
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA					12	$ 1,867,187.55	$ 711,426.11	38.10%
27	PARLAMENTU NASIONAL					2	$ 69,221.96	$ 27,033.43	39.05%
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA					2	$ 1,266,687.38	$ 960,952.45	75.86%
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE					1	$ 37,605.25	$ 33,844.72	90.00%
30	SAMES					1	$ 69,792.94	$ 29,956.90	42.92%
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	$ 412,212.00	$ 76,000.00	18.44%
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					8	$ 5,321,672.26	$ 3,492,458.12	65.63%
33	SEFOPE					4	$ 946,006.97	$ 713,700.51	75.44%
34	TRADE INVEST					1	$ 37,582.90	$ 18,900.89	50.29%
35	TRIBUNAL RECUSSO					4	$ 12,092,434.96	$ 3,742,742.83	30.95%
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E					7	$ 4,122,424.25	$ 1,819,551.91	44.14%
	Grand Total	**57**	**$ 65,690,314.87**	**$ 33,107,840.32**	**50.40%**	**1024**	**$ 1,179,418,228.82**	**$ 788,010,401.35**	**66.81%**

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Cletária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T, M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Agosto

Projeto 13 Municipios Por Fundos Finansiamento

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	FI				LM-CD			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	21	$ 51,421,112.28	$ 32,421,458.03	63.05%	19	$ 4,490,679.95	$ 1,407,342.96	31.34%
2	Ainaro	29	$ 91,212,374.94	$ 79,836,616.87	87.53%	17	$ 3,008,653.96	$ 1,009,764.21	33.56%
3	Baucau	24	$ 133,969,033.60	$ 97,009,689.51	72.41%	17	$ 4,861,686.43	$ 2,322,397.16	47.77%
4	Bobonaro	37	$ 46,589,866.14	$ 27,384,066.17	58.78%	18	$ 5,228,423.12	$ 2,345,107.00	44.85%
5	Covalima	32	$ 125,305,153.33	$ 105,741,718.30	84.39%	12	$ 2,985,370.39	$ 885,236.68	29.65%
6	Dili	63	$ 79,503,224.61	$ 37,593,808.76	47.29%	76	$ 20,104,078.07	$ 8,728,223.90	43.42%
7	Ermera	21	$ 21,217,838.65	$ 13,848,477.69	65.27%	9	$ 2,145,128.28	$ 376,564.02	17.55%
8	Lautem	14	$ 32,905,711.12	$ 25,869,420.44	78.62%	24	$ 7,339,204.40	$ 2,153,437.15	29.34%
9	Liquica	15	$ 20,756,214.94	$ 10,344,580.95	49.84%	25	$ 3,314,058.24	$ 854,188.12	25.77%
10	Manatuto	13	$ 131,516,647.81	$ 110,878,720.69	84.31%	18	$ 4,268,931.05	$ 1,341,734.81	31.43%
11	Manufahi	23	$ 17,989,052.93	$ 12,610,572.98	70.10%	19	$ 3,101,275.15	$ 1,658,739.63	53.49%
12	Nasional	24	$ 107,991,525.79	$ 77,490,248.74	71.76%	5	$ 48,945,330.91	$ 30,132,349.64	61.56%
13	Oe-cusse	4	$ 2,353,321.65	$ 1,852,567.85	78.72%				
14	Regional	2	$ 32,032,062.14	$ 11,237,401.24	35.08%	1	$ 53,025,601.00	$ 37,586,889.12	70.88%
15	Viqueque	24	$ 59,413,345.74	$ 30,812,133.11	51.86%	19	$ 7,880,578.88	$ 787,842.96	10.00%
	Grand Total	**346**	**$ 954,176,485.67**	**$ 674,931,481.33**	**70.73%**	**279**	**$ 170,698,999.83**	**$ 91,589,817.36**	**53.66%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	PDIM				LM-BS			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	6	$ 445,124.22	$ -		4	$ 1,568,065.11	$ 893,031.51	56.95%
2	Ainaro	8	$ 931,596.86	$ 664,237.60	71.30%	3	$ 565,845.40	$ 527,769.63	93.27%
3	Baucau	8	$ 863,550.68	$ 387,406.75	44.86%	6	$ 1,107,575.09	$ 443,414.69	40.03%
4	Bobonaro	8	$ 746,047.73	$ 538,881.51	72.23%	4	$ 860,900.42	$ 665,256.80	77.27%
5	Covalima	3	$ 592,720.70	$ 558,300.67	94.19%	3	$ 575,995.90	$ 255,350.34	44.33%
6	Dili	7	$ 1,054,664.27	$ 884,006.15	83.82%	56	$ 5,206,211.49	$ 3,079,453.14	59.15%
7	Ermera	5	$ 845,470.49	$ 729,472.08	86.28%	2	$ 365,450.73	$ 87,439.28	23.93%
8	Lautem	2	$ 397,338.85	$ -	0.00%	6	$ 1,103,542.01	$ 541,687.21	49.09%
9	Liquica	5	$ 722,133.98	$ 293,604.39	40.66%	11	$ 1,574,555.51	$ 1,034,177.75	65.68%
10	Manatuto	12	$ 1,596,152.81	$ 1,107,533.26	69.39%	6	$ 1,160,391.31	$ 446,513.42	38.48%
11	Manufahi	10	$ 1,450,922.99	$ 1,101,691.87	75.93%	5	$ 1,464,659.68	$ 1,024,526.15	69.95%
12	Nasional					6	$ 1,086,014.94	$ 585,510.18	53.91%
13	Oe-cusse								
14	Regional					1	$ 373,666.00	$ 261,565.60	70.00%
15	Viqueque	2	$ 355,840.92	$ 292,976.54	82.33%	3	$ 300,989.41	$ 77,967.95	25.90%
	Grand Total	**76**	**$ 10,001,564.50**	**$ 6,558,110.82**	**65.57%**	**116**	**$ 17,313,863.00**	**$ 9,923,663.65**	**57.32%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	LM-TP				Fundo Covid-19			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	$ 1,617,454.43	$ 217,004.28	13.42%	3	$ 475,384.99	$ 306,425.82	64.46%
2	Ainaro	17	$ 1,665,991.99	$ 86,232.55	5.18%	3	$ 242,067.62	$ 120,512.49	49.78%
3	Baucau	29	$ 3,000,775.19	$ -	0.00%	1	$ 469,360.62	$ 329,188.84	70.14%
4	Bobonaro	23	$ 3,106,600.00	$ 331,098.10	10.66%	5	$ 729,315.76	$ 629,876.68	86.37%
5	Covalima	17	$ 2,921,378.69	$ 941,722.09	32.24%	4	$ 533,488.64	$ 460,541.47	86.33%
6	Dili	24	$ 11,248,554.33	$ 3,985,794.37	35.43%	6	$ 1,979,610.19	$ 916,039.37	46.27%
7	Ermera	20	$ 2,252,742.01	$ 104,743.16	4.65%	2	$ 334,327.32	$ 284,717.49	85.16%
8	Lautem	16	$ 1,702,312.60	$ -	0.00%	2	$ 373,420.03	$ 254,295.00	68.10%
9	Liquica	13	$ 1,123,528.85	$ -	0.00%	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%
10	Manatuto	10	$ 872,256.79	$ -	0.00%	4	$ 665,658.27	$ 364,552.89	54.77%
11	Manufahi	15	$ 1,586,878.39	$ -	0.00%	3	$ 383,412.81	$ 339,799.54	88.62%
12	Nasional								
13	Oe-cusse								
14	Regional								
15	Viqueque	20	$ 2,040,688.01	$ -	0.00%				
	Grand Total	**218**	**$ 33,139,161.28**	**$ 5,666,594.55**	**17.10%**	**37**	**$ 6,619,411.13**	**$ 4,293,883.22**	**64.87%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	Emergency				TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					67	$ 60,017,820.98	$ 35,245,262.60	58.72%
2	Ainaro					77	$ 97,626,530.77	$ 82,245,133.35	84.24%
3	Baucau					85	$ 144,271,981.61	$ 100,492,096.95	69.65%
4	Bobonaro					95	$ 57,261,153.17	$ 31,894,286.26	55.70%
5	Covalima					71	$ 132,914,107.65	$ 108,842,869.55	81.89%
6	Dili	21	$ 7,373,653.64	$ 923,976.15	12.53%	253	$ 126,469,996.60	$ 56,111,301.84	44.37%
7	Ermera					59	$ 27,160,957.48	$ 15,431,413.72	56.81%
8	Lautem					64	$ 43,821,529.01	$ 28,818,839.80	65.76%
9	Liquica	1	$ 502,473.28	$ 441,060.32	87.78%	74	$ 28,426,329.68	$ 13,255,545.16	46.63%
10	Manatuto					63	$ 140,080,038.04	$ 114,139,055.07	81.48%
11	Manufahi					75	$ 25,976,201.95	$ 16,735,330.17	64.43%
12	Nasional					35	$ 158,022,871.64	$ 108,208,108.56	68.48%
13	Oe-cusse					4	$ 2,353,321.65	$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional					4	$ 85,431,329.14	$ 49,085,855.96	57.46%
15	Viqueque					68	$ 69,991,442.96	$ 31,970,920.56	45.68%
	Grand Total	**22**	**$ 7,876,126.92**	**$ 1,365,036.47**	**17.33%**	**1094**	**$ 1,199,825,612.33**	**$ 794,328,587.40**	**66.20%**

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T, M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Agosto

Projeto 13 Municipios Por Sectór

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Aileu				Ainaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	2	$ 862,274.82	$ 74,466.90	8.64%				
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	6	$ 1,352,303.90	$ 431,394.76	31.90%	6	$ 940,813.03	$ 251,007.13	26.68%
8	EDUKASAUN	13	$ 1,313,542.97	$ -	0.00%	19	$ 2,292,232.62	$ 343,426.14	14.98%
9	ELÉCTRICIDADE	3	$ 1,001,069.36	$ 760,462.94	75.97%	10	$ 7,999,431.74	$ 5,762,955.29	72.04%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	22	$ 20,163,896.81	$ 14,554,999.76	72.18%	14	$ 19,599,149.60	$ 12,179,829.70	62.14%
12	FLOOD CONTROL	3	$ 137,301.98	$ -		1	$ 84,160.28	$ 73,802.68	87.69%
13	IMPRESTIMO	4	$ 31,371,351.03	$ 17,643,926.16	56.24%	3	$ 59,201,316.40	$ 58,556,522.00	98.91%
14	IRIGASAUN					1	$ 32,319.72	$ 32,319.72	100.00%
15	JUVENTUDE NO DESPORTU								
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	$ 1,320,533.03	$ 747,673.66	56.62%	17	$ 3,237,083.74	$ 2,004,836.63	61.93%
17	PONTES					2	$ 3,869,397.22	$ 2,837,687.37	73.34%
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	2	$ 1,025,800.00	$ 552,821.25	53.89%				
20	SAUDE	3	$ 494,193.39	$ 167,319.27	33.86%	3	$ 274,369.70	$ 116,514.14	42.47%
21	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 505,151.90	$ -	0.00%				
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	$ 166,490.33	$ 95,193.62	57.18%				
24	TURISMO	1	$ 303,911.46	$ 217,004.28	71.40%	1	$ 96,256.72	$ 86,232.55	89.59%
	Grand Total	**67**	**$ 60,017,820.98**	**$ 35,245,262.60**	**58.72%**	**77**	**$ 97,626,530.77**	**$ 82,245,133.35**	**84.24%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	1	$ 316,447.42	$ 315,897.63	99.83%	2	$ 373,662.01	$ 110,780.51	29.65%
3	AGUA E SANEAMENTO					3	$ 511,112.23	$ 443,532.84	86.78%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	13	$ 1,999,417.79	$ 592,767.00	29.65%	3	$ 770,809.57	$ 401,571.21	52.10%
8	EDUKASAUN	31	$ 3,743,421.04	$ 624,596.30	16.69%	21	$ 2,409,512.03	$ 30,076.20	1.25%
9	ELÉCTRICIDADE	10	$ 3,110,591.49	$ 2,637,512.89	84.79%	8	$ 2,152,484.95	$ 1,606,554.18	74.64%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	17	$ 22,189,429.73	$ 13,132,661.34	59.18%	32	$ 22,261,421.02	$ 10,192,185.25	45.78%
12	FLOOD CONTROL					2	$ 437,194.54	$ 36,987.35	8.46%
13	IMPRESTIMO	4	$ 109,889,602.64	$ 80,966,865.99	73.68%	1	$ 20,748,566.21	$ 15,892,652.52	76.60%
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU								
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	8	$ 2,553,710.88	$ 1,892,606.96	74.11%	5	$ 1,317,219.88	$ 712,463.07	54.09%
17	PONTES					1	$ 2,860,755.63	$ 581,091.24	20.31%
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
20	SAUDE	1	$ 469,360.62	$ 329,188.84	70.14%	16	$ 2,536,031.77	$ 1,826,103.93	72.01%
21	SEGURANCA NO DEFESA					1	$ 882,383.33	$ 60,287.96	6.83%
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
24	TURISMO								
	Grand Total	**85**	**$ 144,271,981.61**	**$ 100,492,096.95**	**69.65%**	**95**	**$ 57,261,153.17**	**$ 31,894,286.26**	**55.70%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Covalima				Dili			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	2	$ 72,430,992.54	$ 67,247,696.91	92.84%				
2	AGRICULTURA					2	$ 1,263,645.70	$ 191,289.49	15.14%
3	AGUA E SANEAMENTO	1	$ 264,381.80	$ 264,381.80	100.00%	16	$ 2,028,400.35	$ 1,183,342.33	58.34%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL					5	$ 212,050.00	$ -	0.00%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					1	$ 781,121.90	$ 222,619.74	28.50%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	9	$ 2,585,789.57	$ 1,536,415.91	59.42%	65	$ 34,679,873.35	$ 14,592,521.37	42.08%
8	EDUKASAUN	18	$ 2,722,556.08	$ 171,935.57	6.32%	21	$ 2,880,441.85	$ 763,104.06	26.49%
9	ELÉCTRICIDADE	5	$ 2,730,729.02	$ 1,670,874.34	61.19%	21	$ 7,103,218.29	$ 4,752,306.23	66.90%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO					2	$ 1,209,890.98	$ 990,409.50	81.86%
11	ESTRADAS E PONTES	20	$ 39,889,837.68	$ 27,822,494.39	69.75%	52	$ 51,600,145.46	$ 27,288,407.24	52.88%
12	FLOOD CONTROL	3	$ 1,338,610.18	$ 193,054.93	14.42%	12	$ 4,007,284.82	$ 802,702.91	20.03%
13	IMPRESTIMO								
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU					7	$ 1,364,930.47	$ 801,724.36	58.74%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	$ 1,507,681.83	$ 960,246.38	63.69%	22	$ 2,494,823.18	$ 1,640,585.70	65.76%
17	PONTES	2	$ 8,755,658.60	$ 8,368,537.76	95.58%	3	$ 262,807.70	$ 81,142.40	30.88%
18	PORTOS					2	$ 846,710.87	$ 339,787.68	40.13%
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					6	$ 1,590,223.35	$ 855,161.35	53.78%
20	SAUDE	4	$ 687,870.35	$ 607,231.56	88.28%	9	$ 2,265,025.54	$ 810,485.81	35.78%
21	SEGURANCA NO DEFESA					2	$ 10,771,998.20	$ 174,219.47	1.62%
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	$ 449,600.23	$ 350,256.56	77.90%
24	TURISMO					4	$ 657,804.36	$ 271,235.64	41.23%
	Grand Total	**71**	**$ 132,914,107.65**	**$ 108,842,869.55**	**81.89%**	**253**	**$ 126,469,996.60**	**$ 56,111,301.84**	**44.37%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	4	$ 448,959.83	$ 146,375.20	32.60%	3	$ 815,564.95	$ 286,056.46	35.07%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	3	$ 585,351.48	$ 84,063.99	14.36%	8	$ 2,714,339.43	$ 1,046,837.13	38.57%
8	EDUKASAUN	23	$ 3,012,002.58	$ 337,916.48	11.22%	18	$ 2,166,673.93	$ 57,143.15	2.64%
9	ELÉCTRICIDADE	9	$ 6,825,025.51	$ 5,362,124.31	78.57%	2	$ 1,026,193.79	$ 718,131.88	69.98%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	11	$ 14,143,733.05	$ 8,303,200.83	58.71%	26	$ 35,620,433.11	$ 25,653,417.50	72.02%
12	FLOOD CONTROL								
13	IMPRESTIMO								
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU								
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	3	$ 1,123,035.61	$ 364,344.79	32.44%	3	$ 601,385.25	$ 370,106.35	61.54%
17	PONTES								
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
20	SAUDE	6	$ 1,022,849.42	$ 833,388.12	81.48%	2	$ 373,420.03	$ 254,295.00	68.10%
21	SEGURANCA NO DEFESA								
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	$ 417,933.73	$ 362,176.33	86.66%
24	TURISMO					1	$ 85,584.79	$ 70,676.00	82.58%
	Grand Total	**59**	**$ 27,160,957.48**	**$ 15,431,413.72**	**56.81%**	**64**	**$ 43,821,529.01**	**$ 28,818,839.80**	**65.76%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Liquica				Manatuto			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	2	$ 91,877.21	$ 80,662.08	87.79%	1	$ 370,511.25	$ 58,645.87	15.83%
3	AGUA E SANEAMENTO	3	$ 293,629.77	$ 167,315.56	56.98%	1	$ 162,377.94	$ 67,961.57	41.85%
4	COMERCIO					1	$ 153,942.39	$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	2	$ 210,635.04	$ -	0.00%	9	$ 1,430,360.48	$ 512,226.00	35.81%
8	EDUKASAUN	18	$ 1,956,926.91	$ 318,514.91	16.28%	12	$ 1,236,740.28	$ 331,347.41	26.79%
9	ELÉCTRICIDADE	7	$ 7,088,688.86	$ 1,435,353.48	20.25%	2	$ 1,076,003.44	$ 845,364.30	78.57%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	26	$ 6,905,394.35	$ 2,695,637.64	39.04%	19	$ 13,075,209.38	$ 8,647,371.34	66.14%
12	FLOOD CONTROL	1	$ 502,473.28	$ 441,060.32	87.78%	1	$ 242,560.14	$ 154,455.92	63.68%
13	IMPRESTIMO	1	$ 7,693,101.00	$ 5,921,336.53	76.97%	4	$ 115,112,106.35	$ 97,849,451.89	85.00%
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU					1	$ 2,362,976.44	$ 1,795,843.89	76.00%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	$ 1,522,380.50	$ 1,095,825.29	71.98%	2	$ 157,560.52	$ 66,113.10	41.96%
17	PONTES					1	$ 3,553,954.20	$ 3,053,097.27	85.91%
18	PORTOS	1	$ 1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%				
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
20	SAUDE	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%	7	$ 840,178.96	$ 539,850.55	64.25%
21	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 58,107.88	$ 50,129.80	86.27%				
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
24	TURISMO	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%	2	$ 305,556.27	$ 87,571.99	28.66%
	Grand Total	**74**	**$ 28,426,329.68**	**$ 13,255,545.16**	**46.63%**	**63**	**$ 140,080,038.04**	**$ 114,139,055.07**	**81.48%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					1	$ 1,100,000.00	$ 600,000.00	54.55%
2	AGRICULTURA					1	$ 69,978.38	$ 64,579.46	92.28%
3	AGUA E SANEAMENTO	5	$ 444,587.79	$ 184,573.83	41.52%	6	$ 7,557,238.90	$ 4,429,590.68	58.61%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					6	$ 27,104,043.03	$ 17,658,655.51	65.15%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	3	$ 610,160.22	$ 460,360.58	75.45%	2	$ 622,806.05	$ 260,402.56	41.81%
8	EDUKASAUN	15	$ 1,586,878.39	$ -	0.00%				
9	ELÉCTRICIDADE	6	$ 3,946,641.94	$ 3,004,275.07	76.12%	1	$ 46,872,339.00	$ 29,682,899.05	63.33%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO					2	$ 3,363,254.74	$ 3,093,841.36	91.99%
11	ESTRADAS E PONTES	23	$ 13,931,378.20	$ 9,248,757.52	66.39%	7	$ 14,632,558.98	$ 11,347,303.68	77.55%
12	FLOOD CONTROL	4	$ 514,865.29	$ 275,867.47	53.58%				
13	IMPRESTIMO					1	$ 48,314,975.87	$ 35,849,928.14	74.20%
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	$ 23,697.55	$ 21,127.51	89.15%	1	$ 1,636,624.69	$ 925,534.68	56.55%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	11	$ 3,615,130.78	$ 2,586,095.51	71.54%				
17	PONTES	1	$ 328,755.98	$ 153,014.54	46.54%				
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					2	$ 902,708.00	$ 681,929.60	75.54%
20	SAUDE	2	$ 312,000.61	$ 276,911.01	88.75%	1	$ 254,727.00	$ -	0.00%
21	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 76,149.37	$ -	0.00%				
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					2	$ 5,291,216.00	$ 3,613,443.84	68.29%
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	$ 536,957.37	$ 524,347.13	97.65%	1	$ 74,828.00	$ -	0.00%
24	TURISMO	1	$ 48,998.46	$ -	0.00%	1	$ 225,573.00	$ -	0.00%
	Grand Total	**75**	**$ 25,976,201.95**	**$ 16,735,330.17**	**64.43%**	**35**	**$ 158,022,871.64**	**$ 108,208,108.56**	**68.48%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO								
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS								
8	EDUKASAUN								
9	ELÉCTRICIDADE	3	$ 693,149.25	$ 358,412.70	51.71%	1	$ 53,025,601.00	$ 37,586,889.12	70.88%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES					2	$ 8,552,552.44	$ 6,897,044.48	80.64%
12	FLOOD CONTROL								
13	IMPRESTIMO					1	$ 23,853,175.70	$ 4,601,922.36	19.29%
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU								
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN								
17	PONTES								
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
20	SAUDE								
21	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 1,660,172.40	$ 1,494,155.15	90.00%				
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
24	TURISMO								
	Grand Total	**4**	**$ 2,353,321.65**	**$ 1,852,567.85**	**78.72%**	**4**	**$ 85,431,329.14**	**$ 49,085,855.96**	**57.46%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Viqueque				Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					3	$ 73,530,992.54	$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	3	$ 5,472,502.45	$ 3,846,270.23	70.28%	12	$ 7,958,624.42	$ 4,668,125.27	58.65%
3	AGUA E SANEAMENTO					44	$ 13,388,528.38	$ 7,247,597.17	54.13%
4	COMERCIO					1	$ 153,942.39	$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL					5	$ 212,050.00	$ -	0.00%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					7	$ 27,885,164.93	$ 17,881,275.25	64.12%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	27	$ 3,955,109.26	$ 459,738.82	11.62%	156	$ 52,457,769.17	$ 20,629,306.46	39.33%
8	EDUKASAUN					209	$ 25,320,928.68	$ 2,978,060.22	11.76%
9	ELÉCTRICIDADE	4	$ 2,296,509.09	$ 1,504,022.77	65.49%	92	$ 146,947,676.73	$ 97,688,138.55	66.48%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO					4	$ 4,573,145.72	$ 4,084,250.86	89.31%
11	ESTRADAS E PONTES	31	$ 56,900,210.73	$ 25,460,595.77	44.75%	302	$ 339,465,350.54	$ 203,423,906.44	59.92%
12	FLOOD CONTROL					27	$ 7,264,450.51	$ 1,977,931.58	27.23%
13	IMPRESTIMO					19	$ 416,184,195.20	$ 317,282,605.59	76.24%
14	IRIGASAUN					1	$ 32,319.72	$ 32,319.72	100.00%
15	JUVENTUDE NO DESPORTU					10	$ 5,388,229.15	$ 3,544,230.44	65.78%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	$ 609,021.05	$ 154,392.39	25.35%	92	$ 20,059,566.25	$ 12,595,289.83	62.79%
17	PONTES	1	$ 758,090.38	$ 545,900.59	72.01%	11	$ 20,389,419.71	$ 15,620,471.17	76.61%
18	PORTOS					3	$ 2,241,460.87	$ 997,063.60	44.48%
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					10	$ 3,518,731.35	$ 2,089,912.20	59.39%
20	SAUDE					58	$ 9,963,392.27	$ 6,049,221.86	60.71%
21	SEGURANCA NO DEFESA					7	$ 13,953,963.08	$ 1,778,792.38	12.75%
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					2	$ 5,291,216.00	$ 3,613,443.84	68.29%
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					7	$ 1,645,809.66	$ 1,331,973.64	80.93%
24	TURISMO					12	$ 1,998,685.06	$ 837,220.46	41.89%
	Grand Total	**68**	**$ 69,991,442.96**	**$ 31,970,920.56**	**45.68%**	**1094**	**$ 1,199,825,612.33**	**$ 794,328,587.40**	**66.20%**

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T, M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Agosto

Projeto 13 Municipios Por Ministério

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Aileu				Ainaro			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL	6	$ 445,124.22	$ -	0.00%	3	$ 260,605.35	$ 211,872.50	81.30%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS					1	$ 32,319.72	$ 32,319.72	100.00%
12	MINISTERIO DA DEFESA	1	$ 505,151.90	$ -	0.00%				
13	MINISTERIO DA JUSTICA	1	$ 200,000.00	$ 178,371.29	89.19%				
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	36	$ 55,235,060.23	$ 34,167,089.42	61.86%	44	$ 93,392,278.87	$ 81,090,586.09	86.83%
16	MINISTERIO DO INTERIOR								
17	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	14	$ 1,484,622.27	$ -	0.00%	20	$ 2,316,678.62	$ 365,427.54	15.77%
18	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	$ 475,000.00	$ 167,261.25	35.21%				
19	MINISTERIO FINANCAS								
20	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
21	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	$ 118,769.70	$ 61,804.39	52.04%	1	$ 489,653.83	$ 229,243.50	46.82%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	$ 7,700.00	$ 6,930.00	90.00%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
24	MINISTERIO SAUDE	4	$ 775,330.57	$ 420,342.74	54.21%	5	$ 484,439.64	$ 222,521.45	45.93%
25	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	$ 474,850.63	$ 33,389.23	7.03%	1	$ 546,598.02	$ -	0.00%
26	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN								
27	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
28	PARLAMENTU NASIONAL								
29	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
30	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
31	SAMES								
32	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
33	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
34	SEFOPE	1	$ 303,911.46	$ 217,004.28	71.40%	1	$ 96,256.72	$ 86,232.55	89.59%
35	TRADE INVEST								
36	TRIBUNAL RECUSSO								
37	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**67**	**$ 60,017,820.98**	**$ 35,245,262.60**	**58.72%**	**77**	**$ 97,626,530.77**	**$ 82,245,133.35**	**84.24%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL	7	$ 798,108.36	$ 328,508.66	41.16%	1	$ 15,508.35	$ 9,975.03	64.32%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					1	$ 564,695.97	$ 221,586.70	39.24%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	$ 316,447.42	$ 315,897.63	99.83%	2	$ 373,662.01	$ 110,780.51	29.65%
12	MINISTERIO DA DEFESA					1	$ 882,383.33	$ 60,287.96	6.83%
13	MINISTERIO DA JUSTICA								
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	$ 137,763,172.77	$ 98,647,501.41	71.61%	52	$ 50,440,459.38	$ 29,513,915.53	58.51%
16	MINISTERIO DO INTERIOR								
17	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	31	$ 3,743,421.04	$ 624,596.30	16.69%	22	$ 2,541,904.03	$ 109,511.40	4.31%
18	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
19	MINISTERIO FINANCAS					1	$ 190,605.25	$ 170,009.48	89.19%
20	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
21	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	2	$ 782,313.77	$ 112,848.70	14.42%				
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	$ 220,190.97	$ 213,875.07	97.13%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
24	MINISTERIO SAUDE	2	$ 748,725.31	$ 402,304.35	53.73%	14	$ 2,031,743.88	$ 1,484,344.58	73.06%
25	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
26	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN								
27	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 50,000.00	$ 30,483.00	60.97%				
28	PARLAMENTU NASIONAL								
29	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
30	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
31	SAMES	1	$ 69,792.94	$ 29,956.90	42.92%				
32	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
33	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
34	SEFOPE								
35	TRADE INVEST								
36	TRIBUNAL RECUSSO								
37	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**85**	**$ 144,271,981.61**	**$ 100,492,096.95**	**69.65%**	**95**	**$ 57,261,153.17**	**$ 31,894,286.26**	**55.70%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Covalima				Dili			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC					1	$ 256,843.00	$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega					2	$ 134,670.96	$ 85,243.25	63.30%
3	CFP					1	$ 35,500.00	$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRENSA					1	$ 97,498.81	$ 83,740.72	85.89%
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL					8	$ 568,677.26	$ 342,032.74	60.15%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	$ 1,196,660.00	$ 941,722.09	78.70%	8	$ 9,362,619.96	$ 3,614,732.46	38.61%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					1	$ 63,076.61	$ 51,792.75	82.11%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS					1	$ 512,279.04	$ -	0.00%
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	$ 260,523.18	$ 193,054.93	74.10%	3	$ 1,282,894.73	$ 209,738.52	16.35%
12	MINISTERIO DA DEFESA					12	$ 1,944,847.07	$ 1,095,863.33	56.35%
13	MINISTERIO DA JUSTICA	1	$ 149,292.80	$ 92,120.77	61.70%	5	$ 593,610.53	$ 92,258.11	15.54%
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	$ 158,889.74	$ 21,615.42	13.60%
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	36	$ 53,961,994.13	$ 38,822,152.87	71.94%	122	$ 69,812,086.52	$ 37,727,349.44	54.04%
16	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$ 337,328.10	$ -	0.00%	3	$ 10,861,982.32	$ 250,277.24	2.30%
17	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	19	$ 2,905,884.88	$ 171,935.57	5.92%	22	$ 3,290,741.76	$ 1,005,197.42	30.55%
18	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					1	$ 7,583.06	$ 6,599.24	87.03%
19	MINISTERIO FINANCAS								
20	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus					1	$ 119,578.85	$ 92,618.05	77.45%
21	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					3	$ 1,434,737.07	$ 551,605.33	38.45%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 264,381.80	$ 264,381.80	100.00%	7	$ 1,056,679.87	$ 418,214.98	39.58%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
24	MINISTERIO SAUDE	8	$ 1,373,959.16	$ 1,085,979.03	79.04%	15	$ 3,615,003.82	$ 1,850,993.01	51.20%
25	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	$ 449,600.23	$ 350,256.56	77.90%
26	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	2	$ 72,430,992.54	$ 67,247,696.91	92.84%	4	$ 943,633.56	$ 365,720.51	38.76%
27	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 33,091.06	$ 23,825.57	72.00%	4	$ 756,542.64	$ 294,507.14	38.93%
28	PARLAMENTU NASIONAL					2	$ 69,221.96	$ 27,033.43	39.05%
29	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA					1	$ 556,612.74	$ 499,422.83	89.73%
30	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE					1	$ 37,605.25	$ 33,844.72	90.00%
31	SAMES								
32	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	$ 412,212.00	$ 76,000.00	18.44%
33	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					6	$ 1,322,071.13	$ 771,079.55	58.32%
34	SEFOPE					1	$ 460,254.00	$ 339,787.68	73.83%
35	TRADE INVEST					1	$ 37,582.90	$ 18,900.89	50.29%
36	TRIBUNAL RECUSSO					4	$ 12,092,434.96	$ 3,742,742.83	30.95%
37	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E					7	$ 4,122,424.25	$ 1,880,983.65	45.63%
	Grand Total	**71**	**$ 132,914,107.65**	**$ 108,842,869.55**	**81.89%**	**253**	**$ 126,469,996.60**	**$ 56,111,301.84**	**44.37%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL	1	$ 66,560.00	$ -		2	$ 397,338.85	$ -	0.00%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS								
12	MINISTERIO DA DEFESA								
13	MINISTERIO DA JUSTICA	1	$ 160,056.02	$ -	0.00%				
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	27	$ 22,540,754.00	$ 14,176,045.13	62.89%	34	$ 38,063,577.10	$ 27,027,712.19	71.01%
16	MINISTERIO DO INTERIOR								
17	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	23	$ 3,012,002.58	$ 337,916.48	11.22%	19	$ 2,474,390.58	$ 57,143.15	2.31%
18	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
19	MINISTERIO FINANCAS					1	$ 56,783.85	$ 45,907.81	80.85%
20	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
21	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	$ 358,735.46	$ 84,063.99	23.43%				
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					2	$ 962,218.72	$ 387,253.22	40.25%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
24	MINISTERIO SAUDE	6	$ 1,022,849.42	$ 833,388.12	81.48%	3	$ 653,626.75	$ 406,441.48	62.18%
25	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	$ 417,933.73	$ 362,176.33	86.66%
26	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN								
27	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
28	PARLAMENTU NASIONAL								
29	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA					1	$ 710,074.64	$ 461,529.62	65.00%
30	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
31	SAMES								
32	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
33	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
34	SEFOPE					1	$ 85,584.79	$ 70,676.00	82.58%
35	TRADE INVEST								
36	TRIBUNAL RECUSSO								
37	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**59**	**$ 27,160,957.48**	**$ 15,431,413.72**	**56.81%**	**64**	**$ 43,821,529.01**	**$ 28,818,839.80**	**65.76%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Liquica				Manatuto			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL	3	$ 387,568.54	$ -	0.00%	4	$ 567,521.53	$ 323,340.53	56.97%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	3	$ 139,176.53	$ 118,527.60	85.16%	1	$ 370,511.25	$ 58,645.87	15.83%
12	MINISTERIO DA DEFESA								
13	MINISTERIO DA JUSTICA					1	$ 29,275.84	$ 4,660.85	15.92%
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	42	$ 23,681,950.14	$ 11,636,160.61	49.14%	30	$ 133,379,771.97	$ 110,683,815.39	82.98%
16	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$ 58,107.88	$ 50,129.80	86.27%				
17	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	$ 1,956,926.91	$ 318,514.91	16.28%	13	$ 1,303,638.79	$ 331,347.41	25.42%
18	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
19	MINISTERIO FINANCAS								
20	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
21	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					1	$ 408,460.73	$ 106,266.80	26.02%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 99,484.80	$ 82,502.69	82.93%	1	$ 277,330.43	$ -	0.00%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
24	MINISTERIO SAUDE	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%	9	$ 1,175,863.67	$ 687,644.24	58.48%
25	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
26	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	1	$ 1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%				
27	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 275,000.00	$ 104,500.00	38.00%	2	$ 204,687.39	$ 147,490.09	72.06%
28	PARLAMENTU NASIONAL								
29	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
30	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
31	SAMES								
32	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
33	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	$ 2,362,976.44	$ 1,795,843.89	76.00%
34	SEFOPE								
35	TRADE INVEST								
36	TRIBUNAL RECUSSO								
37	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**74**	**$ 28,426,329.68**	**$ 13,255,545.16**	**46.63%**	**63**	**$ 140,080,038.04**	**$ 114,139,055.07**	**81.48%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	$ 292,653.74	$ -	0.00%				
6	ESTATAL	5	$ 575,943.14	$ 556,747.80	96.67%	1	$ 479,146.05	$ 246,754.86	51.50%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					2	$ 3,363,254.74	$ 3,093,841.36	91.99%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS					1	$ 69,978.38	$ 64,579.46	92.28%
12	MINISTERIO DA DEFESA								
13	MINISTERIO DA JUSTICA								
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	47	$ 22,473,418.02	$ 15,441,310.78	68.71%	16	$ 118,211,294.75	$ 81,945,031.15	69.32%
16	MINISTERIO DO INTERIOR	2	$ 436,263.93	$ 269,076.60	61.68%				
17	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	15	$ 1,586,878.39	$ -	0.00%				
18	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
19	MINISTERIO FINANCAS					3	$ 6,391,216.00	$ 4,213,443.84	65.93%
20	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
21	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	$ 48,998.46	$ -	0.00%	1	$ 74,828.00	$ -	0.00%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					3	$ 3,042,449.93	$ 269,468.99	8.86%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS					2	$ 23,850,768.60	$ 17,389,186.52	72.91%
24	MINISTERIO SAUDE	3	$ 383,412.81	$ 339,799.54	88.62%	1	$ 254,727.00	$ -	
25	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
26	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN					1	$ 68,526.00	$ 46,620.00	
27	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 178,633.46	$ 128,395.45	71.88%	2	$ 369,233.00	$ 13,647.70	3.70%
28	PARLAMENTU NASIONAL								
29	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
30	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
31	SAMES								
32	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
33	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	$ 1,636,624.69	$ 925,534.68	
34	SEFOPE					1	$ 210,824.50	$ -	
35	TRADE INVEST								
36	TRIBUNAL RECUSSO								
37	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**75**	**$ 25,976,201.95**	**$ 16,735,330.17**	**64.43%**	**35**	**$ 158,022,871.64**	**$ 108,208,108.56**	**68.48%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL								
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS								
12	MINISTERIO DA DEFESA	1	$ 1,660,172.40	$ 1,494,155.15	90.00%				
13	MINISTERIO DA JUSTICA								
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	$ 693,149.25	$ 358,412.70	51.71%	4	$ 85,431,329.14	$ 49,085,855.96	57.46%
16	MINISTERIO DO INTERIOR								
17	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU								
18	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
19	MINISTERIO FINANCAS								
20	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
21	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU								
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
24	MINISTERIO SAUDE								
25	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
26	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN								
27	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
28	PARLAMENTU NASIONAL								
29	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
30	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
31	SAMES								
32	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
33	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
34	SEFOPE								
35	TRADE INVEST								
36	TRIBUNAL RECUSSO								
37	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**4**	**$ 2,353,321.65**	**$ 1,852,567.85**	**78.72%**	**4**	**$ 85,431,329.14**	**$ 49,085,855.96**	**57.46%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Viqueque				GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC					1	$ 256,843.00	$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega					2	$ 134,670.96	$ 85,243.25	63.30%
3	CFP					1	$ 35,500.00	$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRENSA					1	$ 97,498.81	$ 83,740.72	85.89%
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P					1	$ 292,653.74	$ -	0.00%
6	ESTATAL	2	$ 355,840.92	$ 292,976.54	82.33%	43	$ 4,917,942.57	$ 2,312,208.66	47.02%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					12	$ 14,487,230.67	$ 7,871,882.61	54.34%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					1	$ 63,076.61	$ 51,792.75	82.11%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	$ 145,269.48	$ -	0.00%	1	$ 145,269.48	$ -	0.00%
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS					1	$ 512,279.04	$ -	
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	3	$ 5,472,502.45	$ 3,846,270.23	70.28%	16	$ 8,318,015.67	$ 4,949,814.47	59.51%
12	MINISTERIO DA DEFESA					15	$ 4,992,554.70	$ 2,650,306.44	53.09%
13	MINISTERIO DA JUSTICA					9	$ 1,132,235.19	$ 367,411.02	32.45%
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	$ 158,889.74	$ 21,615.42	13.60%
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	38	$ 60,563,831.25	$ 27,664,911.52	45.68%	571	$ 965,644,127.52	$ 657,987,850.19	68.14%
16	MINISTERIO DO INTERIOR					7	$ 11,693,682.23	$ 569,483.64	4.87%
17	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	20	$ 2,040,688.01	$ -	0.00%	236	$ 28,657,777.86	$ 3,321,590.18	11.59%
18	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					2	$ 482,583.06	$ 173,860.49	36.03%
19	MINISTERIO FINANCAS					5	$ 6,638,605.10	$ 4,429,361.13	66.72%
20	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus					1	$ 119,578.85	$ 92,618.05	77.45%
21	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	$ 275,004.50	$ 2,911.53	1.06%	12	$ 3,991,501.52	$ 1,148,744.24	28.78%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 5,707.28	$ -	0.00%	18	$ 5,936,143.80	$ 1,642,626.75	27.67%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS					2	$ 23,850,768.60	$ 17,389,186.52	72.91%
24	MINISTERIO SAUDE	1	$ 327,232.66	$ 163,850.75	50.07%	75	$ 13,280,279.57	$ 8,185,542.92	61.64%
25	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	$ 805,366.41	$ -		6	$ 2,694,349.02	$ 745,822.12	27.68%
26	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN					8	$ 74,837,902.10	$ 68,317,313.34	91.29%
27	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA					12	$ 1,867,187.55	$ 742,848.95	39.78%
28	PARLAMENTU NASIONAL					2	$ 69,221.96	$ 27,033.43	39.05%
29	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA					2	$ 1,266,687.38	$ 960,952.45	75.86%
30	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE					1	$ 37,605.25	$ 33,844.72	90.00%
31	SAMES					1	$ 69,792.94	$ 29,956.90	42.92%
32	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	$ 412,212.00	$ 76,000.00	18.44%
33	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					8	$ 5,321,672.26	$ 3,492,458.12	65.63%
34	SEFOPE					5	$ 1,156,831.47	$ 713,700.51	61.69%
35	TRADE INVEST					1	$ 37,582.90	$ 18,900.89	50.29%
36	TRIBUNAL RECUSSO					4	$ 12,092,434.96	$ 3,742,742.83	30.95%
37	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E					7	$ 4,122,424.25	$ 1,880,983.65	45.63%
	Grand Total	**68**	**$ 69,991,442.96**	**$ 31,970,920.56**	**45.68%**	**1094**	**$ 1,199,825,612.33**	**$ 794,328,587.40**	**66.20%**

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T, M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Setembro

Projeto 13 Municipios Por Fundos Finansiamento

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	FI				LM-CD			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	21	$ 51,421,112.28	$ 33,044,241.14	64.26%	19	$ 4,490,679.95	$ 1,620,271.18	36.08%
2	Ainaro	29	$ 91,212,374.94	$ 79,881,185.79	87.58%	17	$ 3,008,653.96	$ 1,029,791.55	34.23%
3	Baucau	31	$ 137,824,554.34	$ 97,804,401.51	70.96%	17	$ 4,861,686.43	$ 2,322,397.16	47.77%
4	Bobonaro	30	$ 44,138,160.45	$ 27,468,658.79	62.23%	27	$ 8,585,936.47	$ 2,561,979.86	29.84%
5	Covalima	32	$ 125,305,153.33	$ 105,741,718.30	84.39%	14	$ 3,038,974.60	$ 1,264,428.82	41.61%
6	Dili	64	$ 79,850,016.94	$ 39,379,150.99	49.32%	76	$ 19,926,581.73	$ 9,264,148.66	46.49%
7	Ermera	21	$ 21,217,838.65	$ 14,234,522.11	67.09%	9	$ 2,145,128.28	$ 473,836.10	22.09%
8	Lautem	14	$ 32,905,711.12	$ 25,869,420.44	78.62%	24	$ 7,339,204.40	$ 2,267,311.45	30.89%
9	Liquica	16	$ 20,981,587.94	$ 10,530,713.99	50.19%	25	$ 3,314,058.24	$ 990,902.01	29.90%
10	Manatuto	13	$ 131,516,647.81	$ 110,878,720.69	84.31%	18	$ 4,268,931.05	$ 1,625,535.46	38.08%
11	Manufahi	24	$ 21,950,711.71	$ 12,610,572.98	57.45%	19	$ 3,101,275.15	$ 1,720,843.04	55.49%
12	Nasional	24	$ 107,991,525.79	$ 77,797,231.60	72.04%	5	$ 48,945,330.91	$ 30,132,349.64	61.56%
13	Oe-cusse	4	$ 2,353,321.65	$ 1,852,567.85	78.72%				
14	Regional	2	$ 32,032,062.14	$ 12,228,802.38	38.18%	1	$ 53,025,601.00	$ 37,586,889.12	70.88%
15	Viqueque	33	$ 63,454,954.00	$ 31,696,482.03	49.95%	10	$ 3,838,970.62	$ 1,321,156.30	34.41%
	Grand Total	**358**	**$ 964,155,733.09**	**$ 681,018,390.59**	**70.63%**	**281**	**$ 169,891,012.79**	**$ 94,181,840.35**	**55.44%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	PDIM				LM-BS			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	6	$ 445,124.22	$ -	0.00%	4	$ 1,568,065.11	$ 982,502.76	62.66%
2	Ainaro	8	$ 931,596.86	$ 664,237.60	71.30%	3	$ 565,845.40	$ 527,769.63	93.27%
3	Baucau	8	$ 863,550.68	$ 387,406.75	44.86%	6	$ 1,107,575.09	$ 579,592.05	52.33%
4	Bobonaro	8	$ 746,047.73	$ 545,507.88	73.12%	4	$ 860,900.42	$ 665,256.80	77.27%
5	Covalima	3	$ 592,720.70	$ 558,300.67	94.19%	3	$ 575,995.90	$ 255,350.34	44.33%
6	Dili	7	$ 1,054,664.27	$ 884,006.15	83.82%	57	$ 5,286,216.93	$ 3,258,024.65	61.63%
7	Ermera	5	$ 845,470.49	$ 729,472.08	86.28%	2	$ 365,450.73	$ 87,439.28	23.93%
8	Lautem	2	$ 397,338.85	$ -	0.00%	6	$ 1,103,542.01	$ 541,687.21	49.09%
9	Liquica	5	$ 722,133.98	$ 293,604.39	40.66%	11	$ 1,574,555.51	$ 1,091,208.43	69.30%
10	Manatuto	12	$ 1,596,152.81	$ 1,121,727.78	70.28%	6	$ 1,160,391.31	$ 446,513.42	38.48%
11	Manufahi	10	$ 1,450,922.99	$ 1,120,584.52	77.23%	5	$ 1,464,659.68	$ 1,024,526.15	69.95%
12	Nasional					6	$ 1,086,014.94	$ 736,705.35	67.84%
13	Oe-cusse								
14	Regional					1	$ 373,666.00	$ 261,565.60	70.00%
15	Viqueque	2	$ 355,840.92	$ 292,976.54	82.33%	3	$ 300,989.41	$ 77,967.95	25.90%
	Grand Total	**76**	**$ 10,001,564.50**	**$ 6,597,824.36**	**65.97%**	**117**	**$ 17,393,868.44**	**$ 10,536,109.62**	**60.57%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	LM-TP				Fundo Covid-19			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	$ 1,617,454.43	$ 442,498.43	27.36%	3	$ 475,384.99	$ 306,425.82	64.46%
2	Ainaro	17	$ 1,665,991.99	$ 279,057.72	16.75%	3	$ 242,067.62	$ 120,512.49	49.78%
3	Baucau	29	$ 3,000,775.19	$ 81,009.69	2.70%	1	$ 469,360.62	$ 329,188.84	70.14%
4	Bobonaro	23	$ 3,106,600.00	$ 596,044.54	19.19%	5	$ 729,315.76	$ 629,876.68	86.37%
5	Covalima	17	$ 2,921,378.69	$ 1,332,496.43	45.61%	4	$ 533,488.64	$ 467,028.49	87.54%
6	Dili	24	$ 11,248,554.33	$ 4,311,345.95	38.33%	7	$ 2,018,602.40	$ 1,109,785.84	54.98%
7	Ermera	20	$ 2,252,742.01	$ 442,475.28	19.64%	2	$ 334,327.32	$ 284,717.49	85.16%
8	Lautem	16	$ 1,702,312.60	$ 196,389.67	11.54%	2	$ 373,420.03	$ 254,295.00	68.10%
9	Liquica	13	$ 1,123,528.85	$ 43,527.43	3.87%	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%
10	Manatuto	10	$ 872,256.79	$ 72,125.45	8.27%	4	$ 665,658.27	$ 364,552.89	54.77%
11	Manufahi	15	$ 1,586,878.39	$ 339,311.38	21.38%	3	$ 383,412.81	$ 339,799.54	88.62%
12	Nasional								
13	Oe-cusse								
14	Regional								
15	Viqueque	20	$ 2,353,714.01	$ 86,794.05	3.69%				
	Grand Total	**218**	**$ 33,452,187.28**	**$ 8,223,076.02**	**24.58%**	**38**	**$ 6,658,403.34**	**$ 4,494,116.71**	**67.50%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	Emergency				TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					67	$ 60,017,820.98	$ 36,395,939.33	60.64%
2	Ainaro	1	$ 23,993.19	$ -	0.00%	78	$ 97,650,523.96	$ 82,502,554.78	84.49%
3	Baucau					92	$ 148,127,502.35	$ 101,503,996.00	68.52%
4	Bobonaro					97	$ 58,166,960.83	$ 32,467,324.55	55.82%
5	Covalima					73	$ 132,967,711.86	$ 109,619,323.05	82.44%
6	Dili	20	$ 7,026,861.31	$ 923,976.15	13.15%	255	$ 126,411,497.91	$ 59,130,438.39	46.78%
7	Ermera					59	$ 27,160,957.48	$ 16,252,462.34	59.84%
8	Lautem					64	$ 43,821,529.01	$ 29,129,103.77	66.47%
9	Liquica	1	$ 502,473.28	$ 441,060.32	87.78%	75	$ 28,651,702.68	$ 13,678,950.20	47.74%
10	Manatuto					63	$ 140,080,038.04	$ 114,509,175.69	81.75%
11	Manufahi					76	$ 29,937,860.73	$ 17,155,637.61	57.30%
12	Nasional					35	$ 158,022,871.64	$ 108,666,286.59	68.77%
13	Oe-cusse					4	$ 2,353,321.65	$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional					4	$ 85,431,329.14	$ 50,077,257.10	58.62%
15	Viqueque					68	$ 70,304,468.96	$ 33,475,376.87	47.61%
	Grand Total	**22**	**$ 7,553,327.78**	**$ 1,365,036.47**	**18.07%**	**1110**	**$ 1,209,106,097.22**	**$ 806,416,394.12**	**66.70%**

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T, M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Setembro

Projeto 13 Municipios Por Sectór

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Aileu				Ainaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	2	$ 862,274.82	$ 74,466.90	8.64%				
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	6	$ 1,352,303.90	$ 431,394.76	31.90%	6	$ 940,813.03	$ 251,007.13	26.68%
8	EDUKASAUN	13	$ 1,313,542.97	$ 225,494.15	17.17%	19	$ 2,292,232.62	$ 536,251.31	23.39%
9	ELÉCTRICIDADE	3	$ 1,001,069.36	$ 760,462.94	75.97%	10	$ 7,999,431.74	$ 5,762,955.29	72.04%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	22	$ 20,163,896.81	$ 14,750,141.03	73.15%	14	$ 19,599,149.60	$ 12,219,584.83	62.35%
12	FLOOD CONTROL	3	$ 137,301.98	$ -		2	$ 108,153.47	$ 73,802.68	68.24%
13	IMPRESTIMO	4	$ 31,371,351.03	$ 18,176,615.16	57.94%	3	$ 59,201,316.40	$ 58,556,522.00	98.91%
14	IRIGASAUN					1	$ 32,319.72	$ 32,319.72	100.00%
15	JUVENTUDE NO DESPORTU								
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	$ 1,320,533.03	$ 855,554.72	64.79%	17	$ 3,237,083.74	$ 2,029,677.76	62.70%
17	PONTES					2	$ 3,869,397.22	$ 2,837,687.37	73.34%
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	2	$ 1,025,800.00	$ 642,292.50	62.61%				
20	SAUDE	3	$ 494,193.39	$ 167,319.27	33.86%	3	$ 274,369.70	$ 116,514.14	42.47%
21	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 505,151.90	$ -	0.00%				
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	$ 166,490.33	$ 95,193.62	57.18%				
24	TURISMO	1	$ 303,911.46	$ 217,004.28	71.40%	1	$ 96,256.72	$ 86,232.55	89.59%
	Grand Total	**67**	**$ 60,017,820.98**	**$ 36,395,939.33**	**60.64%**	**78**	**$ 97,650,523.96**	**$ 82,502,554.78**	**84.49%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	1	$ 316,447.42	$ 315,897.63	99.83%	2	$ 373,662.01	$ 226,029.69	60.49%
3	AGUA E SANEAMENTO					3	$ 511,112.23	$ 443,532.84	86.78%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	13	$ 1,999,417.79	$ 592,767.00	29.65%	3	$ 770,809.57	$ 401,571.21	52.10%
8	EDUKASAUN	31	$ 3,743,421.04	$ 705,605.99	18.85%	21	$ 2,409,512.03	$ 295,022.64	12.24%
9	ELÉCTRICIDADE	10	$ 3,110,591.49	$ 2,637,512.89	84.79%	8	$ 2,152,484.95	$ 1,666,236.37	77.41%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	24	$ 26,044,950.47	$ 13,214,264.87	50.74%	34	$ 23,167,228.68	$ 10,192,185.25	43.99%
12	FLOOD CONTROL					2	$ 437,194.54	$ 61,897.78	14.16%
13	IMPRESTIMO	4	$ 109,889,602.64	$ 81,679,974.46	74.33%	1	$ 20,748,566.21	$ 15,892,652.52	76.60%
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU								
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	8	$ 2,553,710.88	$ 2,028,784.32	79.44%	5	$ 1,317,219.88	$ 712,463.07	54.09%
17	PONTES					1	$ 2,860,755.63	$ 581,091.24	20.31%
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
20	SAUDE	1	$ 469,360.62	$ 329,188.84	70.14%	16	$ 2,536,031.77	$ 1,832,730.30	72.27%
21	SEGURANCA NO DEFESA					1	$ 882,383.33	$ 161,911.64	18.35%
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
24	TURISMO								
	Grand Total	**92**	**$ 148,127,502.35**	**$ 101,503,996.00**	**68.52%**	**97**	**$ 58,166,960.83**	**$ 32,467,324.55**	**55.82%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Covalima				Dili			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	2	$ 72,430,992.54	$ 67,247,696.91	92.84%				
2	AGRICULTURA					2	$ 1,263,645.70	$ 191,289.49	15.14%
3	AGUA E SANEAMENTO	1	$ 264,381.80	$ 264,381.80	100.00%	16	$ 2,028,400.35	$ 1,183,342.33	58.34%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL					5	$ 212,050.00	$ -	0.00%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					1	$ 781,121.90	$ 339,788.03	43.50%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	9	$ 2,585,789.57	$ 1,542,902.93	59.67%	62	$ 33,863,568.40	$ 14,523,520.38	42.89%
8	EDUKASAUN	18	$ 2,722,556.08	$ 562,709.91	20.67%	21	$ 2,880,441.85	$ 1,088,655.64	37.79%
9	ELÉCTRICIDADE	5	$ 2,730,729.02	$ 1,670,874.34	61.19%	21	$ 7,103,218.29	$ 4,752,306.23	66.90%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO					2	$ 1,209,890.98	$ 990,409.50	81.86%
11	ESTRADAS E PONTES	22	$ 39,943,441.89	$ 27,903,993.28	69.86%	52	$ 51,600,145.46	$ 28,966,635.57	56.14%
12	FLOOD CONTROL	3	$ 1,338,610.18	$ 490,748.18	36.66%	12	$ 4,007,284.82	$ 964,356.68	24.07%
13	IMPRESTIMO								
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU					7	$ 1,364,930.47	$ 823,862.09	60.36%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	$ 1,507,681.83	$ 960,246.38	63.69%	21	$ 2,044,669.86	$ 1,266,794.14	61.96%
17	PONTES	2	$ 8,755,658.60	$ 8,368,537.76	95.58%	3	$ 262,807.70	$ 81,142.40	30.88%
18	PORTOS					2	$ 846,710.87	$ 339,787.68	40.13%
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					6	$ 1,590,223.35	$ 855,161.35	53.78%
20	SAUDE	4	$ 687,870.35	$ 607,231.56	88.28%	15	$ 3,472,985.12	$ 1,967,675.21	56.66%
21	SEGURANCA NO DEFESA					2	$ 10,771,998.20	$ 174,219.47	1.62%
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	$ 449,600.23	$ 350,256.56	77.90%
24	TURISMO					4	$ 657,804.36	$ 271,235.64	41.23%
	Grand Total	**73**	**$ 132,967,711.86**	**$ 109,619,323.05**	**82.44%**	**255**	**$ 126,411,497.91**	**$ 59,130,438.39**	**46.78%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	4	$ 448,959.83	$ 146,375.20	32.60%	3	$ 815,564.95	$ 286,056.46	35.07%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	3	$ 585,351.48	$ 84,063.99	14.36%	8	$ 2,714,339.43	$ 1,101,184.36	40.57%
8	EDUKASAUN	23	$ 3,012,002.58	$ 772,920.68	25.66%	18	$ 2,166,673.93	$ 253,532.82	11.70%
9	ELÉCTRICIDADE	9	$ 6,825,025.51	$ 5,748,168.73	84.22%	2	$ 1,026,193.79	$ 718,131.88	69.98%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	11	$ 14,143,733.05	$ 8,303,200.83	58.71%	26	$ 35,620,433.11	$ 25,712,944.57	72.19%
12	FLOOD CONTROL								
13	IMPRESTIMO								
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU								
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	3	$ 1,123,035.61	$ 364,344.79	32.44%	3	$ 601,385.25	$ 370,106.35	61.54%
17	PONTES								
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
20	SAUDE	6	$ 1,022,849.42	$ 833,388.12	81.48%	2	$ 373,420.03	$ 254,295.00	68.10%
21	SEGURANCA NO DEFESA								
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	$ 417,933.73	$ 362,176.33	86.66%
24	TURISMO					1	$ 85,584.79	$ 70,676.00	82.58%
	Grand Total	**59**	**$ 27,160,957.48**	**$ 16,252,462.34**	**59.84%**	**64**	**$ 43,821,529.01**	**$ 29,129,103.77**	**66.47%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Liquica				Manatuto			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	2	$ 91,877.21	$ 80,662.08	87.79%	1	$ 370,511.25	$ 58,645.87	15.83%
3	AGUA E SANEAMENTO	3	$ 293,629.77	$ 167,315.56	56.98%	1	$ 162,377.94	$ 67,961.57	41.85%
4	COMERCIO					1	$ 153,942.39	$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	2	$ 210,635.04	$ -	0.00%	9	$ 1,430,360.48	$ 526,420.52	36.80%
8	EDUKASAUN	18	$ 1,956,926.91	$ 433,161.38	22.13%	12	$ 1,236,740.28	$ 403,472.86	32.62%
9	ELÉCTRICIDADE	7	$ 7,088,688.86	$ 1,435,353.48	20.25%	2	$ 1,076,003.44	$ 845,364.30	78.57%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	26	$ 6,905,394.35	$ 2,818,263.17	40.81%	19	$ 13,075,209.38	$ 8,931,171.99	68.31%
12	FLOOD CONTROL	1	$ 502,473.28	$ 441,060.32	87.78%	1	$ 242,560.14	$ 154,455.92	63.68%
13	IMPRESTIMO	1	$ 7,693,101.00	$ 5,921,336.53	76.97%	4	$ 115,112,106.35	$ 97,849,451.89	85.00%
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU					1	$ 2,362,976.44	$ 1,795,843.89	76.00%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	$ 1,522,380.50	$ 1,260,547.90	82.80%	2	$ 157,560.52	$ 66,113.10	41.96%
17	PONTES					1	$ 3,553,954.20	$ 3,053,097.27	85.91%
18	PORTOS	1	$ 1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%				
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
20	SAUDE	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%	7	$ 840,178.96	$ 539,850.55	64.25%
21	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 58,107.88	$ 50,129.80	86.27%				
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
24	TURISMO	2	$ 500,373.00	$ 125,910.43	25.16%	2	$ 305,556.27	$ 87,571.99	28.66%
	Grand Total	**75**	**$ 28,651,702.68**	**$ 13,678,950.20**	**47.74%**	**63**	**$ 140,080,038.04**	**$ 114,509,175.69**	**81.75%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					1	$ 1,100,000.00	$ 600,000.00	54.55%
2	AGRICULTURA					1	$ 69,978.38	$ 64,579.46	92.28%
3	AGUA E SANEAMENTO	5	$ 444,587.79	$ 184,573.83	41.52%	6	$ 7,557,238.90	$ 4,696,516.89	62.15%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					6	$ 27,104,043.03	$ 17,698,712.16	65.30%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	3	$ 610,160.22	$ 479,253.23	78.55%	2	$ 622,806.05	$ 411,597.73	66.09%
8	EDUKASAUN	16	$ 5,548,537.17	$ 339,311.38					
9	ELÉCTRICIDADE	6	$ 3,946,641.94	$ 3,004,275.07	76.12%	1	$ 46,872,339.00	$ 29,682,899.05	63.33%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO					2	$ 3,363,254.74	$ 3,093,841.36	91.99%
11	ESTRADAS E PONTES	23	$ 13,931,378.20	$ 9,290,796.65	66.69%	7	$ 14,632,558.98	$ 11,347,303.68	77.55%
12	FLOOD CONTROL	4	$ 514,865.29	$ 275,867.47	53.58%				
13	IMPRESTIMO					1	$ 48,314,975.87	$ 35,849,928.14	74.20%
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	$ 23,697.55	$ 21,127.51	89.15%	1	$ 1,636,624.69	$ 925,534.68	56.55%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	11	$ 3,615,130.78	$ 2,590,267.71	71.65%				
17	PONTES	1	$ 328,755.98	$ 153,014.54	46.54%		-		
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					2	$ 902,708.00	$ 681,929.60	75.54%
20	SAUDE	2	$ 312,000.61	$ 276,911.01	88.75%	1	$ 254,727.00	$ -	0.00%
21	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 76,149.37	$ -	0.00%				
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					2	$ 5,291,216.00	$ 3,613,443.84	68.29%
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	$ 536,957.37	$ 524,347.13	97.65%	1	$ 74,828.00	$ -	0.00%
24	TURISMO	1	$ 48,998.46	$ 15,892.08	32.43%	1	$ 225,573.00	$ -	0.00%
	Grand Total	**76**	**$ 29,937,860.73**	**$ 17,155,637.61**	**57.30%**	**35**	**$ 158,022,871.64**	**$ 108,666,286.59**	**68.77%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO								
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS								
8	EDUKASAUN								
9	ELÉCTRICIDADE	3	$ 693,149.25	$ 358,412.70	51.71%	1	$ 53,025,601.00	$ 37,586,889.12	70.88%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES					2	$ 8,552,552.44	$ 6,897,044.48	80.64%
12	FLOOD CONTROL								
13	IMPRESTIMO					1	$ 23,853,175.70	$ 5,593,323.50	23.45%
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU								
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN								
17	PONTES								
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
20	SAUDE								
21	SEGURANCA NO DEFESA	1	$ 1,660,172.40	$ 1,494,155.15	90.00%				
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
24	TURISMO								
	Grand Total	**4**	**$ 2,353,321.65**	**$ 1,852,567.85**	**78.72%**	**4**	**$ 85,431,329.14**	**$ 50,077,257.10**	**58.62%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Viqueque				Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU KOMULATIVO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					3	$ 73,530,992.54	$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	3	$ 5,472,502.45	$ 4,232,344.51	77.34%	12	$ 7,958,624.42	$ 5,169,448.73	64.95%
3	AGUA E SANEAMENTO					44	$ 13,388,528.38	$ 7,514,523.38	56.13%
4	COMERCIO					1	$ 153,942.39	$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL					5	$ 212,050.00	$ -	0.00%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					7	$ 27,885,164.93	$ 18,038,500.19	64.69%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	27	$ 4,268,135.26	$ 546,532.87	12.80%	153	$ 51,954,490.22	$ 20,892,216.11	40.21%
8	EDUKASAUN					210	$ 29,282,587.46	$ 5,616,138.76	19.18%
9	ELÉCTRICIDADE	4	$ 2,296,509.09	$ 1,504,022.77	65.49%	92	$ 146,947,676.73	$ 98,133,865.16	66.78%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO					4	$ 4,573,145.72	$ 4,084,250.86	89.31%
11	ESTRADAS E PONTES	31	$ 56,900,210.73	$ 26,467,495.40	46.52%	313	$ 344,280,283.15	$ 207,015,025.60	60.13%
12	FLOOD CONTROL					28	$ 7,288,443.70	$ 2,462,189.03	33.78%
13	IMPRESTIMO					19	$ 416,184,195.20	$ 319,519,804.20	76.77%
14	IRIGASAUN					1	$ 32,319.72	$ 32,319.72	100.00%
15	JUVENTUDE NO DESPORTU					10	$ 5,388,229.15	$ 3,566,368.17	66.19%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	$ 609,021.05	$ 179,080.74	29.40%	91	$ 19,609,412.93	$ 12,683,980.98	64.68%
17	PONTES	1	$ 758,090.38	$ 545,900.59	72.01%	11	$ 20,389,419.71	$ 15,620,471.17	76.61%
18	PORTOS					3	$ 2,241,460.87	$ 997,063.60	44.48%
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					10	$ 3,518,731.35	$ 2,179,383.45	61.94%
20	SAUDE					64	$ 11,171,351.85	$ 7,213,037.63	64.57%
21	SEGURANCA NO DEFESA					7	$ 13,953,963.08	$ 1,880,416.06	13.48%
22	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					2	$ 5,291,216.00	$ 3,613,443.84	68.29%
23	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					7	$ 1,645,809.66	$ 1,331,973.64	80.93%
24	TURISMO					13	$ 2,224,058.06	$ 874,522.97	39.32%
	Grand Total	**68**	**$ 70,304,468.96**	**$ 33,475,376.87**	**47.61%**	**1110**	**$ 1,209,106,097.22**	**$ 806,416,394.12**	**66.70%**

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T, M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Setembro

Projeto 13 Municipios Por Ministério

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Aileu				Ainaro			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL	6	$ 445,124.22	$ -	0.00%	3	$ 260,605.35	$ 211,872.50	81.30%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS					1	$ 32,319.72	$ 32,319.72	100.00%
12	MINISTERIO DA DEFESA	1	$ 505,151.90	$ -	0.00%				
13	MINISTERIO DA JUSTICA	1	$ 200,000.00	$ 178,371.29	89.19%				
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	36	$ 55,235,060.23	$ 35,002,800.75	63.37%	45	$ 93,416,272.06	$ 81,155,182.35	86.87%
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO DO INTERIOR								
18	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	14	$ 1,484,622.27	$ 225,494.15	15.19%	20	$ 2,316,678.62	$ 558,252.71	24.10%
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	$ 475,000.00	$ 256,732.50	54.05%				
20	MINISTERIO FINANCAS								
21	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	$ 118,769.70	$ 61,804.39	52.04%	1	$ 489,653.83	$ 229,243.50	46.82%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	$ 7,700.00	$ 6,930.00	90.00%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
25	MINISTERIO SAUDE	4	$ 775,330.57	$ 420,342.74	54.21%	5	$ 484,439.64	$ 222,521.45	45.93%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	$ 474,850.63	$ 33,389.23	7.03%	1	$ 546,598.02	$ -	0.00%
27	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
35	SEFOPE	1	$ 303,911.46	$ 217,004.28	71.40%	1	$ 96,256.72	$ 86,232.55	89.59%
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSSO								
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**67**	**$ 60,017,820.98**	**$ 36,395,939.33**	**60.64%**	**78**	**$ 97,650,523.96**	**$ 82,502,554.78**	**84.49%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL	7	$ 798,108.36	$ 328,508.66	41.16%	1	$ 15,508.35	$ 9,975.03	64.32%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					1	$ 564,695.97	$ 221,586.70	39.24%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	$ 316,447.42	$ 315,897.63	99.83%	2	$ 373,662.01	$ 226,029.69	60.49%
12	MINISTERIO DA DEFESA					1	$ 882,383.33	$ 161,911.64	18.35%
13	MINISTERIO DA JUSTICA								
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	47	$ 141,618,693.51	$ 99,578,390.77	70.31%	54	$ 51,346,267.04	$ 29,598,508.15	57.64%
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO DO INTERIOR								
18	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	31	$ 3,743,421.04	$ 705,605.99	18.85%	22	$ 2,541,904.03	$ 374,457.84	14.73%
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
20	MINISTERIO FINANCAS					1	$ 190,605.25	$ 170,009.48	89.19%
21	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	2	$ 782,313.77	$ 112,848.70	14.42%				
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	$ 220,190.97	$ 213,875.07	97.13%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
25	MINISTERIO SAUDE	2	$ 748,725.31	$ 402,304.35	53.73%	14	$ 2,031,743.88	$ 1,490,970.95	73.38%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
27	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 50,000.00	$ 30,483.00	60.97%				
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
32	SAMES	1	$ 69,792.94	$ 29,956.90	42.92%				
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
35	SEFOPE								
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSSO								
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**92**	**$ 148,127,502.35**	**$ 101,503,996.00**	**68.52%**	**97**	**$ 58,166,960.83**	**$ 32,467,324.55**	**55.82%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Covalima				Dili			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC					1	$ 256,843.00	$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega					3	$ 190,090.64	$ 85,243.25	44.84%
3	CFP					1	$ 35,500.00	$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRENSA					1	$ 97,498.81	$ 83,740.72	85.89%
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL					8	$ 568,677.26	$ 342,032.74	60.15%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	$ 1,196,660.00	$ 941,722.09	78.70%	8	$ 9,362,619.96	$ 3,614,732.46	38.61%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					3	$ 182,074.26	$ 150,824.94	82.84%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS					1	$ 512,279.04		
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	$ 260,523.18	$ 193,054.93	74.10%	3	$ 1,282,894.73	$ 209,738.52	16.35%
12	MINISTERIO DA DEFESA					12	$ 1,944,847.07	$ 1,310,220.35	67.37%
13	MINISTERIO DA JUSTICA	1	$ 149,292.80	$ 92,120.77	61.70%	4	$ 360,694.51	$ 169,520.38	47.00%
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	$ 158,889.74	$ 21,615.42	13.60%
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	38	$ 54,015,598.34	$ 39,201,345.01	72.57%	122	$ 69,812,086.52	$ 39,567,231.54	56.68%
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$ 337,328.10	$ -	0.00%	3	$ 10,861,982.32	$ 250,277.24	2.30%
18	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	19	$ 2,905,884.88	$ 562,709.91	19.36%	22	$ 3,290,741.76	$ 1,330,749.00	40.44%
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					1	$ 7,583.06	$ 6,599.24	87.03%
20	MINISTERIO FINANCAS								
21	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus					1	$ 119,578.85	$ 92,618.05	77.45%
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					3	$ 1,434,737.07	$ 551,605.33	38.45%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 264,381.80	$ 264,381.80	100.00%	7	$ 1,056,679.87	$ 535,383.27	50.67%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
25	MINISTERIO SAUDE	8	$ 1,373,959.16	$ 1,092,466.05	79.51%	15	$ 3,615,003.82	$ 2,028,889.81	56.12%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	$ 449,600.23	$ 350,256.56	77.90%
27	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	2	$ 72,430,992.54	$ 67,247,696.91	92.84%	4	$ 943,633.56	$ 365,720.51	38.76%
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 33,091.06	$ 23,825.57	72.00%	4	$ 756,542.64	$ 294,507.14	38.93%
29	PARLAMENTU NASIONAL					2	$ 69,221.96	$ 27,033.43	39.05%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA					1	$ 556,612.74	$ 499,422.83	89.73%
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE					1	$ 37,605.25	$ 33,844.72	90.00%
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	$ 412,212.00	$ 76,000.00	18.44%
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					6	$ 1,322,071.13	$ 793,217.28	60.00%
35	SEFOPE					1	$ 460,254.00	$ 339,787.68	73.83%
36	TRADE INVEST					1	$ 37,582.90	$ 18,900.89	50.29%
37	TRIBUNAL RECUSSO					4	$ 12,092,434.96	$ 3,742,742.83	30.95%
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E					7	$ 4,122,424.25	$ 2,026,832.22	49.17%
	Grand Total	**73**	**$ 132,967,711.86**	**$ 109,619,323.05**	**82.44%**	**255**	**$ 126,411,497.91**	**$ 59,130,438.39**	**46.78%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL	1	$ 66,560.00	$ -		2	$ 397,338.85	$ -	0.00%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS								
12	MINISTERIO DA DEFESA								
13	MINISTERIO DA JUSTICA	1	$ 160,056.02	$ -	0.00%				
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	27	$ 22,540,754.00	$ 14,562,089.55	64.60%	34	$ 38,063,577.10	$ 27,087,239.26	71.16%
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO DO INTERIOR								
18	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	23	$ 3,012,002.58	$ 772,920.68	25.66%	19	$ 2,474,390.58	$ 253,532.82	10.25%
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
20	MINISTERIO FINANCAS					1	$ 56,783.85	$ 45,907.81	80.85%
21	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	$ 358,735.46	$ 84,063.99	23.43%				
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					2	$ 962,218.72	$ 387,253.22	40.25%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
25	MINISTERIO SAUDE	6	$ 1,022,849.42	$ 833,388.12	81.48%	3	$ 653,626.75	$ 406,441.48	62.18%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	$ 417,933.73	$ 362,176.33	86.66%
27	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA					1	$ 710,074.64	$ 515,876.85	72.65%
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
35	SEFOPE					1	$ 85,584.79	$ 70,676.00	82.58%
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSSO								
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**59**	**$ 27,160,957.48**	**$ 16,252,462.34**	**59.84%**	**64**	**$ 43,821,529.01**	**$ 29,129,103.77**	**66.47%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Liquica				Manatuto			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL	3	$ 387,568.54	$ -	0.00%	4	$ 567,521.53	$ 337,535.05	59.48%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	3	$ 139,176.53	$ 118,527.60	85.16%	1	$ 370,511.25	$ 58,645.87	15.83%
12	MINISTERIO DA DEFESA								
13	MINISTERIO DA JUSTICA					1	$ 29,275.84	$ 4,660.85	15.92%
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	42	$ 23,681,950.14	$ 11,923,508.75	50.35%	30	$ 133,379,771.97	$ 110,967,616.04	83.20%
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$ 58,107.88	$ 50,129.80	86.27%				
18	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	$ 1,956,926.91	$ 433,161.38	22.13%	13	$ 1,303,638.79	$ 403,472.86	30.95%
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
20	MINISTERIO FINANCAS								
21	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					1	$ 408,460.73	$ 106,266.80	26.02%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 99,484.80	$ 82,502.69	82.93%	1	$ 277,330.43	$ -	0.00%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
25	MINISTERIO SAUDE	4	$ 433,364.88	$ 287,933.63	66.44%	9	$ 1,175,863.67	$ 687,644.24	58.48%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
27	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	1	$ 1,394,750.00	$ 657,275.92	47.12%				
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	$ 500,373.00	$ 125,910.43	25.16%	2	$ 204,687.39	$ 147,490.09	72.06%
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	$ 2,362,976.44	$ 1,795,843.89	76.00%
35	SEFOPE								
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSSO								
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**75**	**$ 28,651,702.68**	**$ 13,678,950.20**	**47.74%**	**63**	**$ 140,080,038.04**	**$ 114,509,175.69**	**81.75%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	$ 292,653.74		0.00%				
6	ESTATAL	5	$ 575,943.14	$ 556,747.80	96.67%	1	$ 479,146.05	$ 397,950.03	83.05%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					2	$ 3,363,254.74	$ 3,093,841.36	91.99%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS					1	$ 69,978.38	$ 64,579.46	92.28%
12	MINISTERIO DA DEFESA								
13	MINISTERIO DA JUSTICA								
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	47	$ 22,473,418.02	$ 15,487,522.11	68.91%	16	$ 118,211,294.75	$ 82,211,957.36	69.55%
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA	1	$ 3,961,658.78						
17	MINISTERIO DO INTERIOR	2	$ 436,263.93	$ 287,969.25	66.01%				
18	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	15	$ 1,586,878.39	$ 339,311.38	21.38%				
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
20	MINISTERIO FINANCAS					3	$ 6,391,216.00	$ 4,213,443.84	65.93%
21	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	$ 48,998.46	$ 15,892.08	32.43%	1	$ 74,828.00		0.00%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					3	$ 3,042,449.93	$ 269,468.99	8.86%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS					2	$ 23,850,768.60	$ 17,389,186.52	72.91%
25	MINISTERIO SAUDE	3	$ 383,412.81	$ 339,799.54	88.62%	1	$ 254,727.00		
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
27	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN					1	$ 68,526.00	$ 46,620.00	
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$ 178,633.46	$ 128,395.45	71.88%	2	$ 369,233.00	$ 13,647.70	3.70%
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	$ 1,636,624.69	$ 925,534.68	
35	SEFOPE					1	$ 210,824.50	$ 40,056.65	
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSSO								
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**76**	**$ 29,937,860.73**	**$ 17,155,637.61**	**57.30%**	**35**	**$ 158,022,871.64**	**$ 108,666,286.59**	**68.77%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL								
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS								
12	MINISTERIO DA DEFESA	1	$ 1,660,172.40	$ 1,494,155.15	90.00%				
13	MINISTERIO DA JUSTICA								
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	$ 693,149.25	$ 358,412.70	51.71%	4	$ 85,431,329.14	$ 50,077,257.10	58.62%
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO DO INTERIOR								
18	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU								
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
20	MINISTERIO FINANCAS								
21	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus								
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU								
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
25	MINISTERIO SAUDE								
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
27	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
35	SEFOPE								
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSSO								
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	**4**	**$ 2,353,321.65**	**$ 1,852,567.85**	**78.72%**	**4**	**$ 85,431,329.14**	**$ 50,077,257.10**	**58.62%**

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Viqueque				GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PAGAMENTU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC					1	$ 256,843.00	$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega					3	$ 190,090.64	$ 85,243.25	44.84%
3	CFP					1	$ 35,500.00	$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRENSA					1	$ 97,498.81	$ 83,740.72	85.89%
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P					1	$ 292,653.74	$ -	0.00%
6	ESTATAL	2	$ 355,840.92	$ 292,976.54	82.33%	43	$ 4,917,942.57	$ 2,477,598.35	50.38%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					12	$ 14,487,230.67	$ 7,871,882.61	54.34%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					3	$ 182,074.26	$ 150,824.94	82.84%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	$ 145,269.48	$ -	0.00%	1	$ 145,269.48	$ -	0.00%
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS					1	$ 512,279.04	$ -	0.00%
11	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	3	$ 5,472,502.45	$ 4,232,344.51	77.34%	16	$ 8,318,015.67	$ 5,451,137.93	65.53%
12	MINISTERIO DA DEFESA					15	$ 4,992,554.70	$ 2,966,287.14	59.41%
13	MINISTERIO DA JUSTICA					8	$ 899,319.17	$ 444,673.29	49.45%
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	$ 158,889.74	$ 21,615.42	13.60%
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	38	$ 60,563,831.25	$ 28,696,499.50	47.38%	583	$ 970,483,053.32	$ 665,475,560.94	68.57%
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA					1	$ 3,961,658.78	$ -	0.00%
17	MINISTERIO DO INTERIOR					7	$ 11,693,682.23	$ 588,376.29	5.03%
18	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	20	$ 2,353,714.01	$ 86,794.05	3.69%	236	$ 28,970,803.86	$ 6,046,462.77	20.87%
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					2	$ 482,583.06	$ 263,331.74	54.57%
20	MINISTERIO FINANCAS					5	$ 6,638,605.10	$ 4,429,361.13	66.72%
21	MInisterio Koordenador Asuntu Ekonómikus					1	$ 119,578.85	$ 92,618.05	77.45%
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	$ 275,004.50	$ 2,911.53	1.06%	12	$ 3,991,501.52	$ 1,164,636.32	29.18%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$ 5,707.28	$ -	0.00%	18	$ 5,936,143.80	$ 1,759,795.04	29.65%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS					2	$ 23,850,768.60	$ 17,389,186.52	72.91%
25	MINISTERIO SAUDE	1	$ 327,232.66	$ 163,850.75	50.07%	75	$ 13,280,279.57	$ 8,376,553.11	63.08%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	$ 805,366.41	$ -		6	$ 2,694,349.02	$ 745,822.12	27.68%
27	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN					8	$ 74,837,902.10	$ 68,317,313.34	91.29%
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA					13	$ 2,092,560.55	$ 764,259.38	36.52%
29	PARLAMENTU NASIONAL					2	$ 69,221.96	$ 27,033.43	39.05%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA					2	$ 1,266,687.38	$ 1,015,299.68	80.15%
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE					1	$ 37,605.25	$ 33,844.72	90.00%
32	SAMES					1	$ 69,792.94	$ 29,956.90	42.92%
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	$ 412,212.00	$ 76,000.00	18.44%
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					8	$ 5,321,672.26	$ 3,514,595.85	66.04%
35	SEFOPE					5	$ 1,156,831.47	$ 753,757.16	65.16%
36	TRADE INVEST					1	$ 37,582.90	$ 18,900.89	50.29%
37	TRIBUNAL RECUSSO					4	$ 12,092,434.96	$ 3,742,742.83	30.95%
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E					7	$ 4,122,424.25	$ 2,026,832.22	49.17%
	Grand Total	**68**	**$ 70,304,468.96**	**$ 33,475,376.87**	**47.61%**	**1110**	**$ 1,209,106,097.22**	**$ 806,416,394.12**	**66.70%**

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Ciotária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T, M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Aneksu B

Lista Ekipamentus no Mesuramentu Laboratorio ADN, I.P.

LISTA INVENTARISASI LABORATORY EQUIPMENT ADN, I.P.


NO EQUIPAMENTOS NEBE SUPORTA SERVISU LABORATORI ADN, I.P.

2013 – 2022

LISTA INVENTARISASI LABORATORY EQUIPMENT ADN, I.P.

2013 - 2022


NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
1	CORE DRILL BETON HUSGVARNA & MATA BOX			1 SET	1	-	COMPLETO
2	PRD REFUSAL DENSITY			1 SET	1	-	COMPLETO
3	SIEVE ANALYSIS			84	77	7	COMPLETO SARINGAN NEBE MAK A'AT NO. 3,=1, 1 ½=1, ½=1 ¾=2, 200=1, 12=1


NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
4	TERMOMETER AIR KACA			2 PCS	2	-	COMPLETO
5	TERMOMETER ASPHALT OTOMATIS			2 PCS	2	-	COMPLETO
6	THERMOMETER ASPHALT			13	6	3	RUA A'AT IHA LAB IDA A'AT IHA MUNICIPIO NO RESTU SEI IHA MUNICIPIO (SEI CHECK IHA MUNICIPIO)

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
7	OVEN			2 UNIT	-	2	COMPLETO IDA LAKAN MAIS LA MANAS IDA LA LAKAN
8	PICNOMETER TANAH 50 ML			2 PCS	2	-	COMPLETO
9	PICNOMETER TANAH 100 ML			2 PCS	2	-	COMPLETO

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
10	PICNOMETER TANAH 100 ML			2 PCS	-	2	COMPLETO (Rahun)
11	TIMBANGAN ELETRIC			2 UNIT	2	-	COMPLETO IDA NIA AIN MAK TOHAR
12	MOL PROCTOR MODIFIT			3+3 UNIT	6	-	COMPLETO PARFUJU MAK DOL

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
13	MOLD PROCTOR STANDAR			3 +1UNIT	4	-	COMPLETO
14	MOLD CBR			3 + 3UNIT	6	-	COMPLETO 3 PARFUJU MAK DOL
15	MIXER CONCRETE FOUN			1 UNIT	1	-	COMPLETO


NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
16	KERTAS FILTER EXTRASI			2 SET	-	-	UJA HOTU
17	BOTLE CHATELIAR			1 PCS	1	-	COMPLETO
18	AIR ENTERTIMEN						?
19	ARMARI BESI			4 UNIT	4	-	COMPLETO

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
20	CYLINDER CAPPING 6´´ Bot ho kiik			2 SET	2	-	COMPLETO
21	AUTOMATIC COMPACTION ASPHALT			1 SET	1	-	COMPLETO A'at
22	FILTER PAPER ASPHALT			5 BOX	-	-	BOX 4 HOTU FALTA BOX 1

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
23	CYLINDER MOLD 15 X 30 CM			12 PCS	12	-	COMPLETO PARFUJU BALU MAK LA IHA
24	TRIPLE BEAM SCALE CAPACITY 2610r		RDTL – 10998/2020 – 10999/2020	3	3	-	COMPLETO IDA A'AT TAMBA NABEN IDA NIA 500 GR MAK LA IHA
25	HIDRAN 3 KG			5 PCS	-	-	UJA 3 FALTA 2
26	ALAT P3K			3 PCS	-	-	UJA HOTU

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
27	TCE 50 LTR			50 LTR	-	-	UJA HOTU
28	TOTAL STATION PRIME LESS			1 SET	1	-	COMPLETO fALTA CAS HO BATRIA MK LAKON
29	CETAKAN 15 X 15 X 75			2 PCS	2	-	COMPLETO
30	KUBUS 15 X 15 X 15 CM			12 PCS	12	-	COMPLETO PARFUJU BALU LA IHA BALU DOL

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
31	DYNAMIC CONE PENETROMETER / DCP			3 SET	3	-	COMPLETO
32	CONCRETE HAMMER (SCHMIDT HAMMER)		RDTL – 10856/2013 – 10868/2020	13	12		FALTA 1 (IDA)
33	POCKET PENETROMETER			8 SET	8		COMPLETO
34	SLUMP TEST SET+SCOOP MATERIAL			13 SET	13	-	BESI IDA LAKON, BESI IDA SEI IHA KOMPANHIA CHETLY NO PLAT IDA SEI IHA KOMPANHIA LIGELINA


NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
35	SIEVE SHAKER			4 SET	3	1	COMPLETO IDA A'AT TOLU LA LAKAN
36	SPEEDY MOISTURE TESTER		RDTL- 10870/2013 – 10884/2020	15 SET	15	-	COMPLETO CARVIT HOTU
37	SOFTENING POINT TEST		RDTL – 10888/2020 – 10887/2020	2 SET	1	1	COMPLETO IDA KONDISAUN A'AT HO GAS HOTU
38	FLASH AND FIRE POINT BY CLEVELAND OPEN CUP		RDTL – 10886/2020 – 10885/2020	2 SET	2	-	COMPLETO IDA KONDISAUN A'AT (GAS HOTU)

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
39	SAND CONE TEST			2 SET	2	-	COMPLETO PASIR HOTU, MARETA NO KANURU MAK A'AT
40	CORE DRILLING MACHINE INCLUDED DIAMOND BIT		RDTL – 10889/2020 – 10890/2020	2 UNIT	2	-	IDA A'AT IDA RODA MAK LA DIAK `NO BE'E SAI LA DUN DIAK
41	REBAR DETECTION SYSTEM + CONCRETE COVER METER		RDTL – 10897/2020 – 10906/2020	3 UNIT	3	-	COMPLETO
42	REFLUX EXTRATOR TEST		RDTL- 10894/2020	2 SET	2	-	COMPLETO PEMANAS LA DIAK NO KONDISAUN A'AT

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
43	CURRENT METER		RDTL – 10896/2020	1 SET	1		COMPLETO
44	HANDELD GPS		RDTL -10897/2020 – 10906/2020	10	10	-	COMPLETO
45	SINGLE RANGE METRIC ELECTRONIC BALANCE			1	1	-	COMPLETO NIA CAS MAK LA IHA
46	BENGKLEMAN BEAM			1 SET	1	-	COMPLETO


NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
47	PENETRATION TEST			2 SET	2	-	COMPLETO
48	DUCTILITY MACHINE			1	1	-	COMPLETO
49	WATERBATH – 1450 WATT			1 SET	1	-	COMPLETO DOBRALISA HO REDI MAK A'AT (KONDISAUN A'AT)
50	THING WALL DIAMON 3 INCH RESETTABLEK TYPE DILENGKAPI EXPANDING ADAPTER (KIIK)			4 BH	4	-	COMPLETO


NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
51	THIN WALL DIAMOND (BOOT)			3 BH	1	2	COMPLETO
52	MARSHALL TEST		RDTL- 12502/2020	1 SET	1	-	COMPLETO NIA PARFUJU NO BESI KAIT MAK DOL (KONDISAUN A'AT)
53	CENTRIFUGAL EXTRACTOR TEST SET			1 SET	-	1	A´AT TAMBA AKONTESE AHI HAN LAB
54	VACUUM STAND (GMM)			1 SET	1	-	COMPLETO KRAN TORNEIRA A'AT NO NIA OLI MESIN MAK HOTU (MANUTENSAUN)

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
55	COMPRESSION MACHINE			1 UNIT	1	-	COMPLETO JARUM DEAL MAK LA DIAK NO OLI HYDROLIT MAK MENUS (MANUTENSAUN)
56	TIME OF SETTING OF HIDRAULIKC CEMENT BY VICAT NEEDLE		RDTL – 12507/2020	4 SET	4	-	COMPLETO
57	UNIT WEIGHT (ALAT PENAKAR BULK DENSITY TEST) YIELD BUCKET 2.8 LTRS YIELD BUCKET 9.3 LTRS			1 SET	1	-	COMPLETO (Boot 1 & kiik 1)
58	SOIL SODIUM & SAUNITY TEST			1 SET	1		COMPLETO UJA HOTU

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
59	SETTING TIME BY PENETRATION RESISTANCE			1 SET	1	-	COMPLETO
60	CYLINDER SPECIMENT CAPPING SET			1 UNIT	1	-	COMPLETO (Diameter 15 ida & Diameter 10 ida)
61	CONCRETE BEAM MOLD			4 PCS	4	-	COMPLETO


NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
62	HYDRAULIC CONCRETE BEAM TESTING MACHINE		RDTL - 12493/2020	1 UNIT	1	-	COMPLETO
63	ABRASSION MACHINE		RDTL – 12491/2020	1 SET	1	-	COMPLETO BAUT TUTUPAN MAK DOL (MANUTENSAUN)
64	HYDROMETER ANALYSIS TEST SET		RDTL – 11000/2020	1 SET	1	-	COMPLETO (BAHAN KIMIA HOTU SODIUM HEXA IHA 2014)
65	SAND EQUIVALENT TEST SET			1 SET	1	-	COMPLETO


NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
66	SAMPLE EJECTOR 6´´		RDTL - 12492/2020	1 SET	1	-	COMPLETO (MANUTENSAUN)
67	CENT O GRAM BALANCE 311 G CAP X 0.01 GR SENSITIVITY			1 UNIT	1	-	COMPLETO
68	DESSICATOR			1 UNIT	1	-	COMPLETO
69	DIGITAL BALANCE 6000 G		RDTL – 404245159/2020	1 UNIT	1	-	COMPLETO

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
70	ADJUSTABLE WRENCH (KUNCI INGGRIS BOOT &KIIK)			2 UNIT	2	-	COMPLETO
71	FLAKINESS GAGUE		RDTL - 12499/2020	1 SET	1	-	COMPLETO
72	ELONGATION INDEX		RDTL - 12500/2020	1 SET	1	-	COMPLETO
73	METER DORONG			2 PC	1	1	IDA (1) CONDISAUN A´AT ENTREGA ONA BA LOGISTIC

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
74	SAMPLE SPLITER (FA) FINE AGGREGATE ¼ * 32		RDTL - 12498/2014	1 SET	-	1	STEING LISTH (A´AT)
75	SAMPLE SPLITER (CA) COARSE AGGREGATE SAMPLE SPLITER ''1''		RDTL - 12496/2014	1 SET	1	-	COMPLETO
76	SAMPLE SPLITER ''1/2''		RDTL - 12497/2014	1 SET	1	-	COMPLETO
77	CAT PILOX			1 DOS	-	-	UJA HOTU


NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
78	FARDA LAB			4 UNIT	3	-	FALTA IDA (1)
79	MASKER, KACA MATA, RAMBU-RAMBU			4 SET	-	-	A´AT HOTU / UJA HOTU
80	SINGLE RANGE ELECTRONIC BALANCE 5000 G			1 UNIT	1	-	COMPLETO

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
81	CALIBRATION ANVIL			1 UNIT	1	-	COMPLETO
82	CBR LAB TEST SET		RDTL – 12505/2020	1 SET	1	-	COMPLETO MANUTENSAUN
83	GELAS UKUR 1000 ML			3 SET (6)	5	1	COMPLETO IDA MAK RAHUN
84	GELAS UKUR 100 ML			1 UNIT	1	-	COMPLETO

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
85	GELAS UKUR 500 ML			1	1	-	COMPLETO
86	ARMARI BESI			4 UNIT	4	-	COMPLETO (DOUBLE LIST)
87	GELAS UKUR 1000 ML			3 SET (6)	5	1	COMPLETO IDA MAK RAHUN
88	CBR ON SITE			1 SET			KOMPLETO NO KONDISAUN DIAK

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
89	METRO 10 M x 33 FT			2	-	-	LAKON
90	METRO 3M			1	1	-	COMPLETO
91	BRIKET TEST			1 SET			KONDISAUN LA DUN DIAK

92	KERUCUT CONE & TAMPER			1 SET			KONDISAUN DIAK
93	KERANJANG KAWAT SAMPLE BASKET			1 SET			KONDISAUN DIAK
94	WADAH PEMBESAR SAMPLE TANAH			4			KONDISAUN DIAK
95	LIQUIT LIMIT DEVICE			1 SET			KONDISAUN DIAK

96	MORTAR MIXER			1 SET			KONDISAUN DIAK
97	KOMPOR+ TABUNG GAS 12 KG			1 SET			KONDISAUN DIAK
98	ACRILYC TEMPAT SAMPEL TULANGAN			1			KONDISAUN DIAK
99	MEJA LABORATORIUM 530 x 75 x 85 CM			2			KONDISAUN DIAK

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A´AT	
100	MEJA LABORATORIUM 240 x 120 x 85 CM			2			KONDISAUN DIAK

Aneksu C

Lista Ekipamentus no Mesuramentu Mecânica e Elétrica

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	**Naran Ekipamentus or Mesuramento**	**Funsaun**	**Qty (unit)**	**Kondisaun**
1	Digital AVO Meter 	Sukat: - Voltajen (Voltagen) - Korrente Eletrica (Corrente) - Rejistencia (Resistencia)	1	Diak
2	Ultrasonic Thickness Gauga 	Sukat mahar (Daimeter) husi Poste eletricidade no material besi seluk	3	Diak
3	Clamp meter/tang amper(AC/DC) 	Sukat Arus Beban	2	Diak
4	Hypsometer 	Atu sukat Distancia Horijontal no vertikal	2	Diak
5	Film/Coating Thickness Gauge 	Sukat mahar (Daimeter) husi tinta (Galvanize) poste nian	2	Diak

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	**Naran Ekipamentus or Mesuramento**	**Funsaun**	**Qty (unit)**	**Kondisaun**
6	Digital Insulation Resistance Tester & Multitester 	Sukat Rejistencia Isolasi husi Fiu	2	Diak
7	Power Analyser 	Sukat ka Analiza Daya (W, VA, Whr), Power Factor, Voltajen no Arus	2	Diak
8	Earth Tester 	Atu sukat Rejistencia husi ligasaun Grounding	2	Diak
9	High Voltage Insulation Tester 	Sukat Isolasi Voltajen Alta Tensaun nian	1	Diak

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	**Naran Ekipamentus or Mesuramento**	**Funsaun**	**Qty (unit)**	**Kondisaun**
10	Megger 	Sukat Rejistencia Instalasaun fasa R - S - T, N & G, wainhira atu hatama Enerjia	2	Diak
11	Toolkit Box	Fatin atu Guarda ekipamentu alat ukur	2	Diak
12	Measure Tape 50 m 	Sukat Distancia	1	Diak
13	Measure Taoe 5m 	Sukat Distancia	1	Diak
14	Measure wheel 	Sukat Distancia	1	Diak

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	**Naran Ekipamentus or Mesuramento**	**Funsaun**	**Qty (unit)**	**Kondisaun**
15	Handy Talky (HT) 	Uja ba komunikasaun	2	Diak
16	Caliper 	Sukat mahar (Diameter) husi Poste eletricidade no material besi seluk	1	Diak
17	GPS 	Rekolha pontu kordinado fatin projetu	1	Diak
18	binoculars/Terompong 	Hare koneksaun no asesores iha poste tutun	2	Diak

Aneksu D

Checklist Completidade & Validasaun Dokumentus Teknika

Fund :	CHECKLIST No. 1 (Public Buillding)			Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:			
Objective:	Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verifiction Date:		
Stage:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:		
Project Location:	a) District:	b) Sub-district:	c) Village:		

		Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
A	**DRAWING**		Aprezentasaun dezenho hotu-hotu ho formatu meter (m)		
	Architectural Drawing				
	1	Cover Page			
	2	Table of Contents			
	3	Point of Coordinates, or Site Plan	Validation of the Project Site & Status of the Land.		
	4	Topography			
	5	Layout	Benefits, and Objective of the Building.		
	6	3D View *(Optional)*			
	7	Floor Plan			
	8	Existing Plan & New Plan (*for building rehabilitation only)*			
	9	Building Front View			
	10	Building Rear View			
	11	Building Left/Right View			
	12	Section (Tranverse and Longitudinal)			
	13	Roof Plan (Top View)			
	14	Roof Frame			
	15	Ceiling Plan			
	16	Ceiling Frame			
	17	Ceiling Details			
	18	Door/Window Plan			
	19	Door/Window Details			
	20	Tile Plan			
	21	Architectural Details *(for ornaments and other architectural works)*			
	22	Architechtural Details for Doors & Windows			
	23	Access for Disability			
	Structural Drawing				
	1	Foundation Plan			
	2	Sloof / Ground Beam Plan			
	3	Column Plan			
	4	Beam/Top Beam Plan			
	5	Slab Plan			
	6	Structural Section *(for more than 1 storey building)*			
	7	Foundation Details	Reinforced Concrete Schedule.		
	8	Sloof/Ground Beam Details	Reinforced Concrete Schedule.		
	9	Column Details	Reinforced Concrete Schedule.		
	10	Top Beam Details	Reinforced Concrete Schedule.		
	11	Slab Details	Reinforced Concrete Schedule.		
	12	Stairs Details	Reinforced Concrete Schedule.		

Fund :			CHECKLIST No. 1 (Public Buillding)		Verified by:	Validated by:
Program:			Project Name:			
Objective:			Items/checklist necessary for verification by UAP team	Verifiction Date:		
Stage:			Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)	Project Owner:		
Project Location:			a) District:	b) Sub-district:	c) Village:	

			Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
		13	Roof Details (Truss Details)			
		14	Other Structural Details If Needed	Reinforced Concrete Schedule.		
B	STRUCTURAL ANALYSIS					
	1		Soil Investigation Report *(For more than 1 storey building)*	Sondir, or Boring.		
	2		Structural Analysis Using Software (STAAD, SAP2K, ETABS, etc)			
		2,1	Design Criteria	General Description of Structure, Structure System, Design Standard and References, Material Property, Load and Load Combinations, Modelling and Structural Analysis.		
		2,3	Structural Member Design	Truss design if there is construction, Reinforced Concrete Beam Design, Reinforced Concrete Column Design, Foundation Analysis Design, and Concrete Slab Design.		
C	BILL OF QUANTITY (BoQ)					
		1	Bill of Quantity (BoQ)	BoQ, Overhead.		
		2	Time Schedule (S Curve)			
		3	Unit Price Analysis			
		4	Basic Price	Reference of Local Material/Quarry & Manufacturing Resource & Cos		
		5	Back Up Quantity			
		6	Technical Specification			
D	MECHANICAL AND ELECTRICAL					
	1		Layout			
		1,1	Lighting	Safety, comfort & Function.		
		1,2	Socked Outlets	Safety, comfort & Function.		
		1,3	Other Material M/E	Safety, comfort & Function.		
	2		Single Diagram Line			
		2,1	Schedule Diagram Main Panels	Description, Connected Load, Phase, CB/MCB, Cable, Current RST &		
		2,2	Schedule Diagram Sub Panels	Description, Connected Load, Phase, CB/MCB, Cable, Current RST & Load		
		2,3	Lighting Calculation Summary	Service Area, WLH, Working Plan, Vertical Distance, Lux, Room, etc (*see ADN, I.P. Format*)		
		2,4	Demand & Connected Load Summary	Description, Connected Load, Current, Demand Factor & Demand Load.		
		2,5	Panel Details, MDP & SDP	Technical Specification.		
	3		System Protection	Details & Specification of Arester, Grounding, Lightning Protection, et		
	4		Main Power Supply 220/380 V & 20 KV	Low Voltage/Average Voltage , and Approval by EDTL, I.P.		
	5		Standard, Reference, Consideration & Literature	Related to the Referred Works.		
E	TIC					
	1		Local Are Network, Metropolitan Area Network, Wide Area Network			

Fund :	CHECKLIST No. 1 (Public Buillding)		Verified by:	Validated by:
Program:	Project Name:			
Objective:	Items/checklist necessary for verification by UAP team	Verifiction Date:		
Stage:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)	Project Owner:		
Project Location:	a) District: b) Sub-district:	c) Village:		

			Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
	1,1		General Requirement	Study and Assesment, Data, Voice, Data Center, Security System and Software.		
	1,2		Specific Requirement	Layout of Data, Voice, Security System, software Specification, Technical Specification, and Bill of Quantity.		
	2		Sofware Application and Design			
	2,1		User Requirement	Describe Plans and Needs of the Project Owner.		
	2,2		System Requirement Study	Initial Assessment by the Project Owner Regarding System Requirement Study Corresponding to the Owner's User Requirement.		
	2,3		Detailed Specification	Cost of Each Line Item Described in the System Requirement Study.		
F	PLUMBING AND SANITATION					
	1		Pipe Installation Plan			
		1,1	Clean Water Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.		
		1,2	Waste Water Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.		
	2		Detailed Drawing			
		2,1	Toilet/WC	Outlet, Dimension, Inclined Pipe Installation & Construction Drawing and Absorption.		
		2,2	Septic Tank and Infiltration	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.		
		2,3	Floor Drain	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.		
		2,4	Urinoir	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.		
		2,5	Wastafel	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.		
		2,6	Kitchen Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.		
		2,7	Drain Detail	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.		
		2,8	Rain Water Detail	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.		
		2,9	Vent Pipe Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.		
		2,1	Isometric Waste Pipe	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.		
		2,1	Isometric Clean Water Pipe	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.		
G			All hard copy, and electronic copy files (excel file for cost estimates, backup quantity & AutoCad for drawing).			

Fund :	CHECKLIST No. 2 (Bridge)			Verified by	Validated by
Program	Project Name				
Objective	Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verifiction Date		
Stage	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents		Project Owner		
Project Location	a) District :	b) Sub district :	c) Village:		

			Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
A	Drawing					
	1		Cover Page	Owner's logo, Project Name, Designer, Location, etc.		
	2		Approval Sheet	Signatures (Designer & Owner).		
	3		Table of Contents	Drawing list.		
	4		Standard Drawings	Typical drawings of bridge.		
	5		Structural Notes	Load standards, and Material used.		
	6		General Notes	Load standards, and Material used.		
	7		Location Map	Position of the bridge including the coordinates point.		
	8		Lagends and Abbreviations			
	9		Topography	Contour lines, and Bench Marks (BM).		
	10		Plan, Elevation and Details	Bridge layout, elevations, and section drawings of bridge.		
	11		Foundation Plan & Details of Bridge	Type, Dimensions, Layout, and Depth.		
	12		Sub Structure Plan & Details of Bridge	Layout, Dimensions, Reinforcement Details & Bar Bending Schedu		
	13		Super Structure Plan & Details of Bridge	Dimensions, reinforcement details & bar bending schedule.		
	14		Drainage Plan & Details of Bridge	Layout, dimensions, reinforcement details & bar bending schedule.		
	15		Construction Method	Method of works to be used in constructing the bridge.		
	16		Bridge Accessories	Guide Post, Bridge Ilumination, Railings, etc.		
	17		Access Road Plan	Cross section, Elevation, Foundation and Pavement Details.		
	18		River Training Plan & Details	Layout, Sections, Details.		
	19		3D Views (Optional)			
B			**Cost Estimation**	Owner's approval.		
	1		Back Up Quantity Computation	Signatures (Designer & Owner).		
	2		Unit Price Analysis	Signatures (Designer & Owner).		
		2,1	Reference of Local Material/Quarry	Quarry map, Capacity, and Distance to the Project Site.		
		2,2	Reference of Manufacture Resource & Cost	Reference of Imported Materials Basic Price, and Delivery Cost.		
		2,3	Transportation Rate	From Supply Point to the Project Site.		
	3		Overhead			

Fund :			CHECKLIST No. 2 (Bridge)			Verified by	Validated by
Program			Project Name				
Objective			Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verifiction Date		
Stage			Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents		Project Owner		
Project Location			a) District :	b) Sub district :	c) Village:		

Item for Verification				Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
C			Time Chedule (S-Curve)	Signatures (Designer & Owner).		
D			Design Report	Design Criteria, Studies Conducted, Design Result, etc.		
E			Bidding Documents			
F			Technical Specification			
G			All hard copy, and electronic copy files (excel file for cost estimates, backup quantity & AutoCad for drawing).			

Fund:			CHECKLIST No. 3 (Roads– New and Rehabilitation)			Verified by:	Validated by:
Program:				Project Name:			
Objective:			Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verifiction Date:		
Stage:			Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:		
Project Location:			a) District:	b) Sub–district:	c) Village:		

			Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
A			Drawing			
1			Cover Page			
2			Approval Sheet			
3			Table of Content			
4			Standard Drawing			
	4,1		Location Map	Status of the Land		
	4,2		Legend & Abbreviations			
	4,3		General Notes			
	4,4		Typical Roadway Cross Sections			
	4,5		Standard Drawing of Road Geometric Design			
	4,6		Typical Drawing of Drainage and Slope Protection Structures			
	4,7		Standard Drawing & Detail of Miscellaneous Structures			
5			Schedule			
	5,1		Schedule of Drainage & Slope Protection Structures			
	5,2		Schedule of Miscellaneous Structures			
	5,3		Schedule of Intersections			
6			Plan & Profile			
7			Cross Sections			
8			Drainage Cross Sections			
9			Structures			
	9,1		General notes			
	9,2		Detailed Drawing of structures			
10			Bio Engineering			
	10,1		Bio Engineering Schedule			
	10,2		Bio Engineering Details			
11			Intersection Details			
12			Road Marking Plan			
13			Other Plan and Details			
14			Appendix			

Fund:	CHECKLIST No. 3 (Roads- New and Rehabilitation)		Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:		
Objective:	Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verifiction Date:	
Stage:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:	
Project Location:	a) District:	b) Sub-district:	c) Village:	

			Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
	B		**Cost Estimation**			
	1		Back-Up Quantity Computation			
	2		Unit Price Analysis			
		2,1	Reference Price of Local Material/Quarry			
		2,2	Reference Price of Material Import or Fabrication			
		2,3	Transportation Rate			
	3		Overhead			
	C		Time Schedule (S-Curve)			
	D		Technical Specification			
	E		Design report			
	F		Bidding documents			
	G		All hard copy, and electronic copy files (excel file for cost estimates, backup quantity & AutoCad for drawing).			

Fund :	CHECKLIST No. 4 (FS, DED, SC, AS & Geotechnical Investigation)			Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:			
Objective:	Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verifiction Date:		
Stage:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:		
Project Location:	a) District:	b) Sub-district:	c) Village:		

			Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
A			**TOR Feasibility Study**			
			TOR should follow MPS FS Guidelines			
	1		Objective of Project			
	2		Background			
	3		Scope of Works			
		3,1	General Requirement of FS			
		3,2	Specific Request			
		3,3	Cooperation			
		3,4	Responsibility of the Government			
		3,5	Services and Facilities provided by the Employer			
	4		Assignment of Experts			
		4,1	Period of FS			
		4,2	Assignment of Experts			
	5		Reports and documents			
		5,1	Reports to be submitted	Inception Report, Monthly Progress Report, Draft Final Report, and Final Report.		
		5,2	Contents of Reports			
		5,3	Reports copy number and submission date			
		5,4	Attachment to study report	Cheklist for Survey / Investigation and Study; Sample table of rough cost estimate, Location map; etc.		
	6		Outline of Project			
B			**TOR Detailed Engineering Design**			
	1		Introduction			
		1,1	Definitions	Name of Activity, Project Owner, Management of Activities, Procurement Process & Design Consultant.		
		1,2	Background			
		1,3	Objective			
		1,4	Scope of Service			
		1,5	Project Location	Location map (with coordinates, if necessary) & Status of the Land.		
	2		Scope of Works			
	3		Responsibilities of Design Consultant			
	4		Design Cost			
	5		Output of Design Activities			
		5,1	Inception Report			
		5,2	Interimn Report			
		5,3	Draft Final Report			
		5,4	Final Report			
	6		Principle			
	7		Design Criteria			
		7,1	General Criteria			
		7,2	Specific Criteria			
	8		Design Process			
	9		Design Input			
		9,1	Information			
		9,2	Personnel	Key experts and their experiences.		
		9,3	Person-Month Requirement	Table of the person month requirement.		
		9,4	Facilities Provided by the Government			
		9,5	Facilities Provided by the Consultant			
	10		Payment	Schedule of payment to be paid for the Design Consultant.		
	11		Work Program			
	12		Cost Estimation	Submited.		

Fund :	CHECKLIST No. 4 (FS, DED, SC, AS & Geotechnical Investigation)		Verified by:	Validated by:
Program:	Project Name:			
Objective:	Items/checklist necessary for verification by UAP team	Verifiction Date:		
Stage:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)	Project Owner:		
Project Location:	a) District: b) Sub-district:	c) Village:		

			Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
C	TOR Supervision Consultant					
	1		Introduction			
		1,1	Definitions	Name of Activity, Project Owner, Management of Activities, Procurement Process, and Supervision Consultant.		
		1,2	Background			
		1,3	Objective			
		1,4	Scope of Service			
		1,5	Project Location	Location map & Site plan.		
	2		Scope of Works			
	3		Responsibilities of Supervision Consultant			
	4		Construction Supervision Cost			
	5		Output of Construction Supervision Activities			
		5,1	Inception Report			
		5,2	Daily Record			
		5,3	Daily Report			
		5,4	Weekly Report			
		5,5	Monthly Report			
		5,6	Time Schedule			
		5,7	Construction Progress Reports			
		5,8	Shop Drawings			
		5,9	Document of Design Changes			
		5.10.	Document of Quality Control			
		5.11.	Document of Extra Items or Extra Claims			
		5.12.	Minutes of Site Meeting			
		5.13.	Photographs			
		5.14.	As-built drawings			
		5.15.	Manuals			
		5.16.	Record of Comissioning			
		5.17.	Construction Supervision Completion Report			
	6		Principles			
	7		Construction Supervision Criteria			
		7,1	General Criteria			
		7,2	Objective Criteria			
		7,3	Functional Criteria			
		7,4	Procedure Criteria			
		7,5	Technical Criteria			
	8		Construction Supervision Process			
		8,1	Preparation			
		8,2	Implementation			
		8,3	Consultation			
		8,4	Reports			
		8,5	Document			
	9		Construction Supervision Input			
		9,1	Information			
		9,2	Personnel	Key experts and their experiences.		
		9,3	Person-Month of Consulting Services	Table of the person month requirement.		
		9,4	Facilities Provided by the Government of Timor-Leste			
		9,5	Facilities Provided by the Supervision Consultant			
	10		Work Program			
	11		Payment	The type of payment fo Supervision Consultant (time or progress based).		
	12		Cost Estimation	Submited.		

Fund :				CHECKLIST No. 4 (FS, DED, SC, AS & Geotechnical Investigation)		Verified by:	Validated by:
Program:				Project Name:			
Objective:				Items/checklist necessary for verification by UAP team	Verifiction Date:		
Stage:				Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)	Project Owner:		
Project Location:				a) District: b) Sub-district:	c) Village:		

Item for Verification				Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
D			T.O.R_Advisory Service			
	1		Introduction			
		1,1	Background	A background of the project.		
		1,2	Project Location	Map.		
		1,3	Objective			
		1,4	Project Scope	A description of the project scope.		
	2		The Services			
		2,1	Assessment			
		2.1.1	Legal	Legal due dilligence.		
		2.1.2	Technical	Technical due dilligence.		
		2.1.3	Financial	Financial due dilligence.		
		2.1.4	Environmental and Social {(E & S) If needed}	E&S Scoping.		
		2,2	Findings and Recommendation	Legal, Technical, Financial, and E&S findings and recommendations (subject to the project type).		
		2.2.1	Present Findings and/or Recommendation	Minutes of Meeting reflecting recommendation, comments, and decision from the client.		
		2.2.2	Reports			
	3		Report Outputs/Deliverables			
		3,1	Report to be Submitted	Interimn Report, and Final Report.		
		3,2	Contents of Report	Legal framework and regulatory requirements. Financial Model, Financial Projections, Internal Rate of Return (IRR) etc-subject to the project type. Development Plan, Design, Cost estimate etc. E&S risks and impacts and their corresponding mitigation measures (e.g. Resettlement action plan , IEE, EIA, SIA, or ESIA, E&S Management Plan). Summary of the Legal, Technical, Financial, E&S Findings, Conclusions, and Recommendations.		
		3,3	Reports Copy Number and Submission Date			
		3,4	Attachment to Study Report	Project Information, Photographs, Project Scope in Details, Services in Details, Staffing in details with target timetable commencement and completion date, Case Studies (if required), Work Program and Indicative Timetable, etc.		
	4		Principle			
		4,1	Work Program			
		4,2	Indicative Timetable or Schedule	Schedule per each deliveries.		
		4,3	Personnel Required	Appropriate educational degree, relevant training and adequate years of experience.		
		4,4	Remuneration	Table of the person month requirement.		
		4,5	Ownership of Information and Confidentiality			
E			**TOR Geotechnical Investigation (Stand Alone)**			
	1		Introduction			
		1,1	Background			
		1,2	Project Location	Location map (with coordinates, if necessary) & Status of the Land.		
		1,3	Objective	A description of project objectives.		
		1,4	Project Scope	A description of the project scope.		
	2		Scope of Work			
		2,1	Subsurface Soil Exploration Work	Sondir Testing or Boreholes; Results of the field work and laboratory tests, report with conclusions on the geotechnical properties of the soil strata underlying the site in relation to the usage of the site and any recommendations for further action if needed.		

Fund :	CHECKLIST No. 4 (FS, DED, SC, AS & Geotechnical Investigation)		Verified by:	Validated by:
Program:	Project Name:			
Objective:	Items/checklist necessary for verification by UAP team	Verifiction Date:		
Stage:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)	Project Owner:		
Project Location:	a) District: b) Sub-district:	c) Village:		

			Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
		2,2	Reports and Documents			
	3		Deliverables			
		3,1	Report to be Submitted	Inception Report, Interimn Report, and Final Report.		
		3,2	Contents of Report	Site/location (soil morphology and site geology), procedure or methodology used in investigation , ground investigations-work carried out, field works/ tests with tests results, ground conditions, geotechnical characteristics/sections (description of the soil stratigraphy based on the boreholes, if required), hydrological conditions, geotechnical considerations, recommendations based on the investigation.		
		3,3	Reports Copy Number and Submission Date			
		3,4	Attachment to Study Report	Photograph, Plots of location, Diagram, Test Certificates, etc.		
	4		Principle			
		4,1	Work Program			
		4,2	Indicative Timetable	Schedule per each deliveries.		
		4,3	Personnel Required	Educational degree, relevant training and adequate years of experience.		
		4,4	Remuneration	Table of the person month requirement.		
		4,5	Ownership of Information and Confidentiality			
	5		Duration	Total number of working days, from commencement to completion.		
	6		File (Hard copies and Electronic Copies)	Submitted.		

Fund :	CHECKLIST No. 5 (Clean Water and Irrigation)		Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:		
Objective:	Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verifiction Date:	
Stage:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:	
Project Location:	a) District:	b) Sub-district:	c) Village:	

			Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
A			**Clean Water – Gravitation**			
	1		Clean Water Data /Water Source with Debit			
	2		Population Data of the Referred Location			
	3		Clean Water Debit Plan for the Referred Location			
	4		Water Source Coordinates and Community Area Coordinates			
	5		General Map (Google Map)			
	6		Topography (Hand Level, and Total Station)			
	7		Long Section /Profile			
	8		Installation Plan based on the Survey Data			
	9		Captering; Section and Detail			
	10		Reservoir, Section and Detail			
	11		Bpt Placement (if needed)			
	12		Public Faucet Placement			
	13		Hydraulic Analysis			
	14		Community Map			
B			**Clean Water – Drilling**	Atribution from the Relevant Line Ministries.		
	1		Drill Location Plan			
	2		Referred Water Location Coordinates			
	3		Public Location (Require Authorization Letter from the Land and Property)			
	4		License Issuance Letter / Authroization from I.P.G			
	5		Debit Plan Needed			
	6		Electrical Resistivity Test Data/ Survey.			
	7		Hydraulic Analysis			
	8		Population Data of the Referred Location			
	9		Clean Water Debit Plan for the Referred Location			
	10		Water Source Coordinates and Community Area Coordinates			
C			**Irrigation**	Atribution from the Relevant Line Ministries.		
	1		Coordinates of the Referred Location			
	2		Water Source Data ; Debit			
	3		Agricultural Area (Ha)			
	4		Debit Plan needed			
	5		General Map (Google Map)			
	6		Topography Survey (Hand Level, or Total Station)			
	7		Long Section / Profile			
	8		Cross Section			
	9		Distribution Map / Principal Line			
	10		Hydraulic Analysis			
	11		Population Data (Farmers)			

Fund :	CHECKLIST No. 5 (Clean Water and Irrigation)		Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:		
Objective:	Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verifiction Date:	
Stage:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:	
Project Location:	a) District:	b) Sub-district:	c) Village:	

			Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
	12		General Layout of the Agricultural Area			
	13		Primary Line Plan			
	14		Secondary Line Plan			
	15		Tertiary Line Plan			
	16		Specification for Utililities Prepared in the Design			
	17		All hard copy, and electronic copy files (excel file for cost estimates, backup quantity & AutoCad for drawing).			

Aneksu E

Perfil Fungsionarios ADN, I.P.

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
I	**Diretor Executivo - ADN, I.P.**			
1	Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M. Eng.	Escritorio Diretor Executivo	Diretor Executivo ADN, I.P.	
II	**Gabinete Apoio ao Diretor Executivo (GADE) - ADN, I.P.**			
II.1.	**Diretor Adjunto - ADN, I.P.**			
1	Januario Maia Guterres, S.T.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Diretor Adjunto	
2	DR. Manuel Moita da Silva Júnior	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Assesor Jurídico	
II.2.	**Secretariado Unidade Apoio ao Diretor Exekutivo - ADN, I.P.**			
1	Joedia Marni Tavares	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Secretaria e Asisstente Administrasaun Diretor Executivo	
2	Marfa Zita Cristovão do Carmo Vieira, Lic. CSH.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Secretaria e Asisstente Administrasaun Diretor Executivo	
3	Engracia Fernandes Brito Amaral, S.S.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Secretaria e Asisstente Administrasaun Diretor Executivo	
4	Basilio Da Conceição Silva	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Motoristas & Administrasaun Unidade ao Apoio Diretor Exekutivo	
5	Mateus da Silva	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Motoristas & Administrasaun Unidade ao Apoio Diretor Exekutivo	
II.3.	**Equipa de Validação e Base de Dados -ADN, I.P.**			
1	Susana Sinala do Rego Amaral, S.T.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Chefe Equipa - VBD	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
2	Fernão Antonio Lopes Nobre Mouzinho, L.Inf, M. Eng.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Assesor GIS	
3	Ana Maria Lourdes da Costa Guterres, B.ETT.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (Mecânica e Elétrica)	
4	Johanes Hornay, S.T.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (Edificio Publicas)	
5	João Paulo Amaral, S.T.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (Pontes, Estrada e Seias)	
6	Olivia Soares, B.EC.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	En. Equipa - VBD (Pontes, Estrada e Seias)	
7	Nencia Filomena Oliveira do Rego, S.Kom.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (TIC)	
8	Tifânia Clotária Guterres Ornai, Lic. Eng.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (Kompiladora Dadus Projetus e GIS-Geographic Information System)	
II.4	**Equipa de Mídia - ADN, I.P.**			
1	Samuel Soares	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Assesor Nacional da Mídia	
2	David da Silva	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Designer de Mídia	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022				
NU	**NARAN**	**UNIDADE/DEPT.**	**POSISAUN**	**FOTOGRAFIA**
3	Franzela Pinto	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Assitente Mídia	
III	**Unidade Gestão Administrativa (UGA) - ADN, I.P.**			
III.1.	**Departamento Administração & Finanças - ADN, I.P.**			
1	Nelson Soares Pinto, L. Ec.	UGA - Administração & Finanças	Koordenador- UGA	
2	Epi Orleães, Lic. Educ., M.M.	UGA - Administração & Finanças	Public Finance Management and Gender & Social Inclusion Advisor	
3	Amélia da Costa, L. Ec.	UGA - Administração & Finanças	Chefe Departamento - Adm & Finanças	
4	Angela Merisia Egong Correia, S.E.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Finanças	
5	Abelito da Costa, L.Agrn.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Finanças	
6	Ferdiana Maia Duarte, Lic. Eco.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Contabilidade	
7	Elizabeth do Nascimento Cabral, L. CS	UGA - Administração & Finanças	adm & Financas Official	
8	Aquilino Soares Ferreira, Lic. AP	UGA - Administração & Finanças	Planeiamento Oficial	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022				
NU	**NARAN**	**UNIDADE/DEPT.**	**POSISAUN**	**FOTOGRAFIA**
9	Sonyta Mariana Elisabeth Da Silva Henuk, S.I.P.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Administrasaun	
10	Elisabeth Felizarda Ximenes, S.T.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Administrasaun	
11	Nelson Teotonio Barros Fernandes Magno, Lic. CSH.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Administrasaun	
12	Edivijes Soares Lobo	UGA - Administração & Finanças	Assitente Official Administrasaun	
13	Ana Eusebia Ximenes, Lic. Eco	UGA - Administração & Finanças	Official Administrasaun	
14	Carlos Mendonça Calapes	UGA - Administração & Finanças	Assitente Official Administrasaun	
III.2.	**Departamento Aprovizionamento - ADN, I.P.**			
1	Jose Antonio Filomeno Gago Exposto, Lic. Eco.	UGA - Aprovizionamento	Official Aprovizionamento	
2	Sertorio Martins	UGA - Aprovizionamento	Official Aprovizionamento	
3	Lidia da Cruz Monteiro, B. Educ.	UGA - Aprovizionamento	Assistente Official Aprovisonamento	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022				
NU	**NARAN**	**UNIDADE/DEPT.**	**POSISAUN**	**FOTOGRAFIA**
4	Maria Auxiladora Aleixo dos Santos, Lic. Eco.	UGA - Aprovizionamento	Official Aprovizionamento	
III.3.	**Departamento Recursos Humanos e Formação - ADN, I.P.**			
1	Tomas Magno do Carmo, S.E., M. Eco.	UGA - Recursos Humanos e Formação	Acting & Assessor Nacional Recursos Humanos e Formação	
2	Isabel Gomes Lopes, Lic. Eco.	UGA - Recursos Humanos e Formação	Assesora Politicas Publicas	
3	Gicella Jong Gonçalves, Lic. Eco.	UGA - Recursos Humanos e Formação	Official Recursos Humanos	
4	Angela Beatriz Mita Freitas, Lic. Buss.	UGA - Recursos Humanos e Formação	Official rekursu Humanos	
5	Eufragio Fabiano Fernandes Xavier, Lic, Buss	UGA - Recursos Humanos e Formação	Official rekursu Humanos	
III.4.	**Departamento Logística e Patrimonio - ADN, I.P.**			
1	Jose Amaral, S.I.P.	UGA - Logística e Patrimonio	Chefe Dept. Logística e Patrimonio	
2	Sandra Ribeiro Belo, Lic. Eco.	UGA - Logística e Patrimonio	Assistente Administracao da Logística e Patrimonio	
3	Marcelino Soares do Carmo, S.T.	UGA - Logística e Patrimonio	Assistente da Logística e Patrimonio	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
4	Sergio Gomes	UGA - Logística e Patrimonio	Assistente da Logística e Patrimonio	
5	Arcenio Magno Do Rego	UGA - Logística e Patrimonio	Mecânico de Automóveis	
6	Jony Maia da Silva dos Santos	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Bobonaro	
7	João Pedro Cortereal	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Aileu	
8	Silveiro da Costa	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Manufahi	
9	Bernado Da Cruz Amaral Perreira	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
10	Manuel Antonio Soriano	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
11	Bendito Mendes Bento	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Viqueque	
12	Domingos Da Costa	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
13	Agostinho Amaral	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Covalima	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
14	Rui Antonio Gaio	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Liquisa	
15	Gilroy Marcal da Cunha Braz	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
16	Rafael Joaquim Mousaco Galucho	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
17	Timoteo Da Silva Morais	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Manatuto	
18	Joel Barreto Abrantes	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Laboratório)	
19	Delio Abel Manuel Perreira	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Lautem	
20	Anacleto de Sousa Belo	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Baucau	
21	Salvador Ruas Amaral	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
22	Siltonio Pinto de Araujo	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
23	Rosario Saores de Deus	UGA - Logística e Patrimonio	Motorista Ermera	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022				
NU	**NARAN**	**UNIDADE/DEPT.**	**POSISAUN**	**FOTOGRAFIA**
24	Lucas Alberto Soares Pereira	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Ainaro	
IV	**Unidade de Avaliação de Projetos (UAP) - ADN, I.P.**			
IV.1.	**Secretariado UAP - ADN, I.P.**			
1	Melenia da Costa Barros, B. EC., S.T.	UAP	Koordenadora - UAP	
2	Miguel Marques Monteiro de Jesus, S.T., M. Eng.	UAP	Assesor Nacional Mecânica e Elétrica (UAP & UCVQ)	
3	Joanito Doutel Pereira, B. Eng.	UAP	Assessor Nacional Water & Irrigation (UAP no UCVQ)	
4	Rosaria Elizabeth Aniceto Cardoso Amaral, B.S, M.S.	UAP	Assesora Nacional Project Management (UAP no UCVQ)	
5	Maryanti Kota dos Santos, Lic. Eco.	UAP	Official Administração - UAP	
6	Fidelia Auxiliadora da Conceicao Freitas, Lic. Eco.	UAP	Asistente Administração - UAP	
IV.2.	**Departamento Avaliação de Projetos Infrestruturas Transportes, Irrigação, Agua e Saneamento (ITIAS) - ADN, I.P.**			
1	Rogerio Marçal Pires, B. EC., Lic. Eng.	UAP-ITIAS	Eng. Senior - ITIAS	
2	Daniel Arcanjo Alves, S.T.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022				
NU	**NARAN**	**UNIDADE/DEPT.**	**POSISAUN**	**FOTOGRAFIA**
3	Martinho da Costa Graciano, B. EC., Lic. Eng.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	
4	Mario Gusmao Mendeita da Cruz Nunes Silva, S.T.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	
5	Anjelita Maria de Jesus Cardoso, S.T.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	
6	Olivio Marcos da Silva Correia, S.T.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	
IV.3.	**Departamento Avaliação de Projetos Edificio Públicos, Mecanica e Energia Electrica, TIC, Jardins e Monumentos (EMETIJM) - ADN, I.P.**			
1	Amorin Soriano Menezes, ST	UAP-EMETIJM	Eng. Senior - EMETIJM	
2	Arlindo Sarmento Monteiro, S.T.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
3	Paulino Abrantes Correia, B. EC.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
4	Oscar Monteiro Gomes, S.T.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
5	Maria Melania Mendonça Oca, S.T.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022				
NU	**NARAN**	**UNIDADE/DEPT.**	**POSISAUN**	**FOTOGRAFIA**
6	Angelica da Costa, B. ETT.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
7	Jonas das Dores Henriques Gomes, S. Kom.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
V	**Unidade Controlo e Validação de Qualidade (UCVQ) - ADN, I.P.**			
V.1.	**Secretariado UCVQ - ADN, I.P.**			
1	Emerenciana da Costa Maia Freitas, S.T., M.T.	UCVQ	Koordenadora - UCVQ	
2	Santoso, S.T.	UCVQ	Assesor Internasional Estrutura (UCVQ & UAP)	
3	Aleixo Amaral do Carmo, S.T.	UCVQ	Assesor Nasional Pontes Estradas (UCVQ & UAP)	
4	Francisco Incio Filho Dos Reis Corsino, Lic. EC, M. Eng.	UCVQ	Assesor Nasional UCVQ	
5	Joaninha da Costa	UCVQ	Official Administrasaun	
6	Brijita Joanila Fernandes	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Secretaria Diretor Adjunto	
7	João Marcos Napoleão Gracia	UCVQ	Assistente Official Administrasaun	
V.2.	**Departamento Infraestruturas de Transportes e Irigasaun - ITI**			

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
1	Remigio da Conceição Soares dos Santos, S.T.	UCVQ-ITI	Eng Senior - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
2	Aniceto da Costa, B. EC, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
3	Manuel Bany da Silva Cristovão de Carvalho, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Ainaro - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
4	Jaulino Henriques Rodrigues, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Ainaro - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
5	Jacob da Costa Camões, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Baucau - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
6	Leonito Pereira, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Baucau - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
7	Jose Aparicio Sanches Soares, B.EC.	UCVQ-ITI	Eng Bobonaro - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
8	Noe Menezes Madeira, B. Eng.	UCVQ-ITI	Eng Bobonaro - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
9	Salvador Martins, S,T,	UCVQ-ITI	Eng. Viqueque - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
10	Camilio Maia, B. EC.	UCVQ-ITI	Eng. Viqueque - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
11	Domingos Soares Martins, B. EC.	UCVQ-ITI	Eng. Covalima - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
12	Bosco Dinis de Sousa, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Covalima - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
13	Joao Quintao do Rego, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Dili - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
14	Eduardo dos Santos, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Dili - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
15	Antonio Mendonça Faria Da Silva, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Ermera - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
16	Julio Jacob Soares, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Ermera - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
17	Marcus Ximenes de Araujo, S.T.	UCVQ-ITI	Eng Liquisa - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
18	Luduvina Maria Helena Guterres, Lic. EC.	UCVQ-ITI	Eng Liquisa - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
19	Geovanio Mateus Xavier Carlos Aleixo, B.EC.	UCVQ-ITI	Eng Lautem - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
20	Elnino Junior Araújo Mota, L. Eng. Civ.	UCVQ-ITI	Eng Lautem - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
21	Deomentino Henrique Lopes, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Lautem - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
22	Augusta da Costa Ferreira, B.EC.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
23	Jose Roberto Carlos Gusmao, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng.Manututo (Seksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	
24	Domingos da Costa Ximenes e Silva, B. EC.	UCVQ-ITI	Eng.Manututo (Seksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	
25	Romulo João Marques Henrique, S.T.	UCVQ-ITI	Eng Manufahi (Seksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	
26	Majorico Cele Tali, Lic. Tech.	UCVQ-ITI	Eng Manufahi (Seksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	
27	Celvio Justino Alves, B.EC, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng Aileu - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
28	Roberto Maria Martins, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng.Viqueque - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
29	Vidal Guterres, B.EC, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
30	Tito Edgar Fatima Napoleão de Jesus, S.T.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
31	Terresa Gomes, S.T.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
32	Lourdes Pereira, S.T.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
33	Rui Lopes, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Aileu - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
V.3.	**Departamento Edificios Públicos no Be'e Mos - EPBM**			
1	Francisco Xavier de Jeronimo, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng Senior - Edificio Publicas no Be'e Mos	
2	Ir. Musalam Bin Umar Bassarewan	UCVQ-EPBM	Assesor Nasional Edificio Publicas (UCVQ & UAP)	
3	Julmira Soares Sampaio, B. EC.	UCVQ-EPBM	Eng. Edificio Dili - Konsultan ba Edifisio Publiko, Agua e Saneamento	
4	Egidio Gonçalves, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Edificio Dili - Konsultan ba Edifisio Publiko, Agua e Saneamento	
5	Aleixo da Costa Andrade, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Manututo - Edifisiu no Be'e mos	
6	Fabiano Fitalis Maria Madeira, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Manututo - Edifisiu no Be'e mos	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
7	Bebiano Crecêncio De Jesus Lopes, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng.Viqueque - Edifisiu no Be'e mos	
8	Fidelis Mardiano da Costa, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng.Manufahi Edifisiu no Be'e mos	
9	Merinho Cuco Lopes de Araujo, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Aileu - Edifisiu no Be'e mos	
10	Joaquim de Carvalho Madeira, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Ainaro Edifisiu no Be'e mos	
11	Claodino Soares Dos Santos, B. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Ainaro Edifisiu no Be'e mos	
12	Agostinho Aranda, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Baucau Edifisiu no Be'e mos	
13	Jerry Gil Maia Pereira, L. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Baucau Edifisiu no Be'e mos	
14	Zulkarnaen Depari, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Bobonaro - Edifisiu no Be'e mos	
15	Moises Angelico Marques Freitas, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Bobonaro - Edifisiu no Be'e mos	
16	Madelino Deonizio Jose Magno, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Covalima - Edifisiu no Be'e mos	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022				
NU	**NARAN**	**UNIDADE/DEPT.**	**POSISAUN**	**FOTOGRAFIA**
17	Prezencio Legorio Carmo Dias Ximenes, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Covalima - Edifisiu no Be'e mos	
18	Manuel Estrela Soares de Oliveira, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Dili - Edifisiu no Be'e mos	
19	Pedro de Lourdes Alves, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Dili - Edifisiu no Be'e mos	
20	Jaimito Manuel Quintao, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Ermera - Edifisiu no Be'e mos	
21	Juninho Antonio Abrantes da Cruz, B. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Liquisa - Edifisiu no Be'e mos	
22	Antonia de Fatima Morais Soares, S. Ds.	UCVQ-EPBM	Eng. Liquisa - Edifisiu no Be'e mos	
23	Inocencio dos Reis Costa Maria, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Lautem -Edifisiu no Be'e mos	
24	Quico Adelino Junior, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Lautem -Edifisiu no Be'e mos	
25	Rosalia de Fatima, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Dili -Edifisiu no Be'e mos	
V.4.	**Departamento Mecânica & Energia Eléctrica**			

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
1	Deolindo de Fatima Marques, B.ETT	UCVQ-M & E	Eng Senior - Mecânica e Energia	
2	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares, S.T.	UCVQ-M & E	Eng. Mecânica e Eletrica	
3	Camilio de Jesus, B.ETT.	UCVQ-M & E	Eng. Mecânica e Eletrica	
4	Adonis Julio Fernandes, B.ETT.	UCVQ-M & E	Eng. Mecânica e Eletrica	
V.5.	**Departamento Tecnogia da Infomação e Comunicação - TIC**			
1	Romualdo Duarte Guterres	UCVQ- TIC	Assesor Nacional TIC (UAP, UCVQ, e UGA)	
2	Ezequiel Ricardo de Oliveira, S.T.	UCVQ- TIC	Eng. Senior - Official ICT (UCVQ, UAP e UGA)	
V.6.	**Departamento Laboratório**			
1	Jony Rodrigues Varela, S.T.	UCVQ - Laboratório	Eng. Senior Laboratorio	
2	Eng. Agus Widianto	UCVQ - Laboratório	Assesor Internasional (Laboratorio & UEDC)	
3	Angelina Amaral, S.T.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Manufahi, Aileu e Manatuto	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
4	Lizete Magno de Jesus, Lic. Eng.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório Baucau, Viqueque e Lautem	
5	Guido Carceres Tilman, Lic. Tec.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Maliana, Covalima e Ainaro	
6	Abel Soares da Silva, Lic. Eng.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Maliana, Covalima e Ainaro	
7	Alcino Francisco Paicheco, Lic. Eng.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Baucau, Viqueque e Lautem	
8	Barbara Carmelinda Gusmao, S.T.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Manufahi, Aileu e Manatuto	
9	Abel Fernando, S.T.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Dili, Liquisa e Ermera	
VI	**Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências - UEDC**			
VI.1.	**Secretariado UEDC - ADN, I.P.**			
1	Valentina Violet Correia Bianco, S.T.	UEDC	Koordenadora - UEDC	
2	Maria José Rosário de Jesus, B. B.	UEDC	Official Administração - UEDC	
VI.2	**Departamento Pesquisa**			
1	Jose Fernando Liu Soares, S.T.	UEDC - Pesquisa	Eng. Senior Pesquisa	

PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
2	Joaquim da Silva Pinto, B. EC., Lic Eng.	UEDC - Pesquisa	Eng. Pesquisa	
3	Hindun Nofitri da Conceição Isya, B.S. MSE.	UEDC - Pesquisa	Eng. Pesquisa	
VI.3.	**Departamento Estandardização**			
1	Demistocles Graciliano Ximenes Fernandes Cabral, S.T.	UEDC - Estandardização	Eng. Senior - Estandardização	
2	Marcelino Amaral, B. EC.	UEDC - Estandardização	Eng. Estandardização	
VI.4.	**Departamento Capacitação**			
1	To be Name	UEDC - Capacitação	Chefe Dept. Capacitação	
2	To be Name	UEDC - Capacitação	Eng. Dept. Capacitação	
