REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

A.D.N. I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

RELATÓRIU MENSÁL IMPLEMENTASAUN PROJETUS MUNISÍPIU AINARO

MAIO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTASAUN PROJETU INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO AINARO

MAIO 2022

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro ADN, I.P

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro ADN, I.P

(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, ADN, I.P

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, ADN, I.P

(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T, M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO 1

INDICE 2

I. INTRODUSAUN 3

1.1 Enkuadramentu Legal 3

1.2 Perfil Municipio Ainaro 3

1.3. Lista Projectos 6

II. PROGRESU FISIKU 14

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan 14

III. OBSTÁCLO IHA TERENU 14

3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu 14

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU 15

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu 15

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias 4

Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro 4

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro 5

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamentos 6

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores 8

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio 11

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro 13

I. INTRODUSAUN

1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional,I.P ou ADN,I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Púbico (IP), ho Misaun ADN,I.P nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análize kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viavél.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Púbico (IP), ADN,I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimentu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvimentu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno caso presiza.

1.2 Perfil Municipio Ainaro





Administrasaun Munisipal Ainaro lokalizadu iha sudoeste paíz no mapa 2. hatudu pozisaun jeográfiku Munisipiu Ainaro ne'ebé ho luan 797 km² ho populasaun nain 59,175 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Ainaro iha Postu Administraativo ha'at, Sukus 21 no Aldeias 131 hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1: Ponto Administrativo, Sukus no Total Aldeias/Sukus

Ainaro		Hatu Builico		Hatu Udo		Maubisse	
Sukus	**Aldeias**	**suku**	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**
Ainaro	7	Mauchiga	7	Foho-Ailico (beikala)	6	Aituto	9
Cassa	5	Mulo	8	Leolima	10	Edi	6
Manutaci	4	Nuno Moge	6	-	-	Fatubessi	6
Mau-Nuno	3	-	-	-	-	Horai-Quic	4
Mau-Ulo	5	-	-	-	-	Liurai	4
Soro	4	-	-	-	2	Manelobas	4
Suro-Craic	4	-	-	-	4	Manetu	7
-	-	-	-	-	-	Maubisse	12
-	-	-	-	-	-	Maulau	10
Total	**32**	**-**	**21**	**-**	**22**	**-**	**62**

Data husi : Livro 3B OJE 2021, Pajina 22

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro								
No	**Deskrisaun**	**Total Membros Kada Tinan**						
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**	**OBS**
1	Engineiro		**2**				**2**	
2	Administrasaun no Financas		**0**				**0**	
3	Motorista		**1**				**1**	
4	Seguransa		**0**				**0**	
	Grand Total		**3**				**3**	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro

ASET ADN,IP MUNICIPIO AINARO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1				1	Moru hadia, monta tralis
2	Kareta		1				1	Kondisaun ladun diák
3	Desktop HP / Monitor		1				1	Diak
4	Laptop HP		1				1	Todan presija update
5	Printer Cannon		1				1	Diak
6	UPS		1				1	Aat
7	Armario File		2				2	Diak
8	Armario Tau hena		2				2	Aat 1
9	Meja escritorio		1				1	Diak
10	Meja han		1				1	Aat
11	Meja TV (kiik)		1				1	Diak
12	Kadeira escritorio		6				6	Diak
13	Kadeira han		4				4	Att 2
14	Sofa		1 Set				1	Diak
15	Springbed +sumasu 4		2 Set				2	Diak (sumasu laiha)
16	Jeleira		1				1	Diak
17	Water Dispenser		1				1	Aat
18	TV + Parabola		1 Set				1	Aat
19	Kipas Angin		5				5	Aat
20	Kompor		1				1	Diak
21	Kompor Gas		1				1	Aat
22	Rack sepatu		3				3	Aat
23	Rack Piring		1				1	Diak
24	Water Pump Sanyo		1				1	Aat

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dadus projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + PDIM + LM - BS + LM - TP + Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	27	$ 26,239,266.40	62.06%
2	Hatubuilico	12	$ 61,202,630.27	97.63%
3	Hatudo	9	$ 1,547,226.03	19.54%
4	Maubisse	25	$ 7,169,504.30	65.11%
	Grand Total	**73**	**$ 96,158,627.00**	**84.24%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	11	$ 23,879,713.14	65.41%
2	Hatubuilico	4	$ 60,431,375.42	98.24%
3	Hatudo	1	$ 287,894.03	13.75%
4	Maubisse	9	$ 5,130,827.23	69.94%
	Grand Total	**25**	**$ 89,729,809.82**	**87.61%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	$ 1,376,091.81	21.14%
2	Hatubuilico	5	$ 521,296.64	73.96%
3	Hatudo	3	$ 718,688.00	4.50%
4	Maubisse	4	$ 392,577.51	66.47%
	Grand Total	**17**	**$ 3,008,653.96**	**32.23%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	$ 473,161.58	50.73%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	3	$ 473,096.63	94.43%
	Grand Total	**8**	**$ 946,258.21**	**72.58%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo	2	$ 263,719.00	87.35%
4	Maubisse	1	$ 302,126.40	98.44%
	Grand Total	**3**	**$ 565,845.40**	**93.27%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	4	$ 408,232.25	21.12%
2	Hatubuilico	3	$ 249,958.21	0.00%
3	Hatudo	3	$ 276,925.00	0.00%
4	Maubisse	7	$ 730,876.53	0.00%
	Grand Total	**17**	**$ 1,665,991.99**	**5.18%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	2	$ 102,067.62	45.19%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	$ 140,000.00	53.14%
	Grand Total	**3**	**$ 242,067.62**	**49.78%**

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO AINARO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	6	$ 940,813.03	26.68%
2	Edukasaun	19	$ 2,292,232.62	14.98%
3	Eletrifikasaun Nasional	10	$ 7,999,431.74	68.39%
4	Estradas	10	$ 18,116,584.48	62.29%
5	Flood Control	1	$ 98,821.63	97.48%
6	Imprestimo	3	$ 59,201,316.40	98.89%
7	Irigasaun	1	$ 32,319.72	100.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	17	$ 3,237,083.74	60.05%
9	Pontes	2	$ 3,869,397.22	73.34%
10	Saude	3	$ 274,369.70	42.47%
11	Turismo	1	$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	**73**	**$ 96,158,627.00**	**84.24%**

NO	SECTOR PROJECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	4	$ 639,367.96	6.03%
2	Edukasaun	4	$ 520,065.09	25.21%
3	Eletrifikasaun Nasional	3	$ 2,130,985.59	72.44%
4	Estradas	7	$ 17,893,140.72	62.57%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	$ 815,683.40	40.90%
9	Pontes	2	$ 3,869,397.22	73.34%
10	Saude	3	$ 274,369.70	42.47%
11	Turismo	1	$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	**27**	**$ 26,239,266.40**	**62.06%**

NO	SECTOR PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	3	$ 249,958.21	0.00%
3	Eletrifikasaun Nasional	1	$ 1,230,059.02	66.92%
4	Estradas	1	$ 76,554.69	33.40%
5	Flood Control			
6	Imprestimo	3	$ 59,201,316.40	98.89%
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	4	$ 444,741.95	80.94%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
	Grand Total	**12**	**$ 61,202,630.27**	**97.63%**

NO	SECTOR PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	4	$ 578,502.86	0.00%
3	Eletrifikasaun Nasional	1	$ 384,790.42	0.00%
4	Estradas			
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun	1	$ 32,319.72	100.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	$ 551,613.03	48.94%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
	Grand Total	**9**	**$ 1,547,226.03**	**19.54%**

NO	SECTOR PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	2	$ 301,445.07	70.48%
2	Edukasaun	8	$ 943,706.46	22.50%
3	Eletrifikasaun Nasional	5	$ 4,253,596.71	72.98%
4	Estradas	2	$ 146,889.07	42.44%
5	Flood Control	1	$ 98,821.63	97.48%
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	7	$ 1,425,045.36	68.79%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
	Grand Total	**25**	**$ 7,169,504.30**	**65.11%**

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	3	$ 275,266.70	85.15%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	$ 32,319.72	100.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	40	$ 91,909,713.75	86.86%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	20	$ 2,316,678.62	15.77%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	5	$ 484,439.64	45.93%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	$ 546,598.02	0.00%
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	$ 489,653.83	46.82%
9	Sefope	1	$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	**73**	**$ 96,158,627.00**	**84.24%**

NO	DONO DO PROJECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	1	$ 15,000.00	0.00%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	14	$ 24,219,553.10	64.75%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	4	$ 520,065.09	25.21%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	4	$ 344,439.64	43.01%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	$ 546,598.02	0.00%
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	$ 489,653.83	46.82%
9	Sefope	1	$ 96,256.72	89.59%
	Grand Total	**27**	**$ 26,239,266.40**	**62.06%**

NO	DONO DO PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	9	$ 60,952,672.06	98.03%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	3	$ 249,958.21	0.00%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
	Grand Total	**12**	**$ 61,202,630.27**	**97.63%**

NO	DONO DO PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	$ 32,319.72	100.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	3	$ 911,957.45	27.19%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	$ 602,948.86	3.65%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
	Grand Total	**9**	**$ 1,547,226.03**	**19.54%**

NO	DONO DO PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatal	2	$ 260,266.70	90.06%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	14	$ 5,825,531.14	71.18%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	8	$ 943,706.46	22.50%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude	1	$ 140,000.00	53.14%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
9	Sefope			
	Grand Total	**25**	**$ 7,169,504.30**	**65.11%**

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Poduktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Ainaro	16,823	7170	6636	5567	5058
Hato-Udo	10,747	3130	2923	2415	2279
Hato-Builico	13,249	3457	3365	3241	3186
Maubisse	24,672	6378	6309	6222	5764

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu neébe hetan husi progresu fulan ida neé, ikus liu porsentagen actual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detallu bele hareé iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hareé #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu

Obstaclo neébe ami enjineiru hasoru iha terenu mak hanesan tuir mai ne'e :

1. Kompanhia nia tekniku laiha terenu
2. Kompanhia neébe ka'er obra iha Municipio Ainaro iha hotu Dili
3. Teknik husi Projetu nain ladun halo inspesaun ba iha terenu
4. Kondisaun kareta ne'ebe Suporta Ekipa AND, I.P iha tereno ho kondisaun ne'ebe sei aat

- Obstaclo parte Eletricidade

1. Durante Eng ADN, I.P halo monitorin directur kompahnia nunka iha fatin projeto e delega ema balun mak sempre hein iha fatin projeto.
2. Kompahnia balun mak to agora sedauk hadia konstruk Linha MV & LV nebe mak avaria.
3. Iha kompahnia seluk hein hela karta termo de entrega 10% husi EDTL – EP municipio ate agora sedauk fo ba kompahnia.
4. Seksaun M & E - ADN, I.P sempre hasoru mak kona ba motorist.
5. Seksaun M & E – ADN, I.P labele kontrola masimu projeto electricidade ho edifisio public tamba Eng M & E – ADN, I.P ida kontrola municipio ha'at (4).

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Buka solusaun ba projetu ne'ebe parado
2. Sistema Internet iha Municipio lalao ho diak ho difikulta enjineiru nia servisu
3. Kondisaun Rezidesia Oficial AND, I.P Municipio Ainaro ne'ebe presija atu hadia:
    - Be'e
    - Moru
    - Tralis Jenela

➢ Recomendação parte Eletricidade

1. Seksaun M & E husu parte rekursu Humanu atu aumenta tan funsionario M & E.
2. Seksaun M & E – ADN, I.P husu ba ITC tenki kria folder sistem keta ida mai iha seksaun M & E – ADN, I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Ainaro

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro						
No	**Deskrisaun**	**Identidade**				
		Naran Kompletu	**Nu. ID Card**	**Pozisaun**	**Fotografia**	**Asinatura**
1	Engineiro	Manuel Bany da S. C. de Carvalho	115	Enjineiru ITI		
		Joaquim de C. Madeira	167	Enjineiru EPAS		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		
2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Lucas Alberto Soares Pereira	195	Motorista		

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MAIO)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	78.52%	$ 355,512.32	$ 97,263.04	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	87.87%	$ 334,820.71	$ 46,223.20	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	73.10%	65.79%	$ 853,430.72	$ 443,735.60	ON-GOING	
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	$ 4,223,004.05	July 1, 2013	100.00%	89.74%	$ 3,789,830.06	$ 433,173.99	FHO	Projetu ramata ona ho nia fisiku 100%.
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Consorcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	88.00%	$ 110,219.55	$ 15,029.94	PHO	Projetu 100% iha tinan 2016 maibe to agora companhia sedauk husu pagamento retensaun 10%
6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	69.02%	62.12%	$ 2,687,116.69	$ 1,638,659.81	ON-GOING	
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	$ 3,717,215.92	July 1, 2013	86.60%	71.00%	$ 2,639,364.12	$ 1,077,851.80	PHO	
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipesoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	41.51%	34.96%	$ 1,740,596.03	$ 3,237,754.96	ON-GOING	
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	$ 3,596,249.07	July 1, 2013	86.49%	77.94%	$ 2,802,979.89	$ 793,269.18	PHO	
10	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	87.28%	76.81%	$ 140,453.21	$ 42,411.48	ON-GOING	
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	$ 489,653.83	April 10, 2019	52.62%	46.82%	$ 229,243.50	$ 260,410.33	ON-GOING	
12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	82.18%	$ 26,956.99	$ 5,844.88	ON-GOING	
13	Rehabilitasaun Edificio Administrasaun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	$ 15,000.00	Sept. 19, 2016	0.00%	0.00%	$ -	$ 15,000.00	ON-GOING	Projetu refere remata ona iha 2021 husu atu hare fila fali dadus pagamento (Retensaun)
14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/II/2018	$ 7,700.00	Feb. 12, 2018	100.00%	90.00%	$ 6,930.00	$ 770.00	PHO	Projetu refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedauk hatama pagamento
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	$ 208,089.56	July 29, 2019	70.00%	63.00%	$ 131,088.50	$ 0.70	ON-GOING	Projetu refere sei parado
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	86.20%	77.58%	$ 22,808.96	$ 6,592.18	ON-GOING	Projetu refere 100% ona tuir volume nebe iha tereno
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	89.59%	$ 86,232.55	$ 10,024.17	PHO	Projetu ferere ramata ona, husu atu hare fila fali dadus pagamento nebe iha.
18	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	$ 33,889.94	June 18, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ 33,889.94	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chavido Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	87.43%	12.71%	$ 34,707.48	$ 238,440.67	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2016

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MAIO)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	37.19%	$ 79,200.00	$ 133,770.88	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2015
21	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	$ 600,016.84	July 25, 2016	45.31%	27.70%	$ 166,229.49	$ 433,787.35	PENDENTE	Projeto refere parado 2017
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	20.93%	0.00%	$ -	$ 98,554.74	ON-GOING	
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	22.72%	0.00%	$ -	$ 103,107.04	ON-GOING	
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	24.01%	0.00%	$ -	$ 110,313.75	ON-GOING	
25	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	11.88%	0.00%	$ -	$ 546,598.02	ON-GOING	
26	New Construction of Laboratory for Covid-19, at Sentru Internamentu Ainaro Villa, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Adijulcojam Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-21-098C	$ 70,069.94	14-Mar-21	50.13%	45.12%	$ 31,615.53	$ 38,454.41	ON-GOING	
27	Rehabilitasaun CHC ba Izolamento Ainaro Villa relasiona covid19	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Marcalas Trading Solution, Unip Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-20-212	$ 31,997.68	Nov. 1, 2021	50.37%	45.33%	$ 14,505.18	$ 17,492.50	ON-GOING	
28	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no contratu	$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	90.00%	$ 22,001.40	$ 2,444.60	PHO	Projetu refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedauk hatama pagamento
29	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	$ 239,273.00	Sept. 25, 2019	88.78%	87.08%	$ 208,360.75	$ 30,912.25	ON-GOING	
30	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	$ 384,790.42	Jull,26,2021	0.00%	0.00%	$ -	$ 384,790.42	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
31	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	13.75%	$ 39,581.06	$ 248,312.97	PENDENTE	Projeto refere parado 2019
32	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere-Ainaro	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	Ainaro	Berdato Unip Lda		$ 32,319.72	23.8, 2021	100.00%	100.00%	$ 32,319.72	$ -	PHO	
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ 97,872.80	ON-GOING	
34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	29.99%	0.00%	$ -	$ 68,356.81	ON-GOING	
35	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	24.90%	0.00%	$ -	$ 110,695.39	ON-GOING	
36	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ 301,577.86	ON-GOING	
37	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	99.16%	86.20%	$ 139,264.98	$ 22,289.21	ON-GOING	
38	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	79.19%	$ 21,935.23	$ 5,765.84	ON-GOING	Projetu refere ramata ona husu atu hare fila fali dadus pagamento
39	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	84.46%	76.02%	$ 148,346.12	$ 46,804.58	ON-GOING	
40	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	92.83%	83.55%	$ 50,409.48	$ 9,926.51	ON-GOING	

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MAIO)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
41	Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	$ 76,554.69	June 18, 2021	37.11%	33.40%	$ 25,570.78	$ 50,983.91	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
42	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	$ 28,138,737.00	Nov. 20, 2014	100.00%	99.22%	$ 27,919,968.96	$ 218,768.04	PHO	
43	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	$ 26,875,070.79	Nov. 20, 2014	100.00%	99.62%	$ 26,771,980.96	$ 103,089.83	PHO	
44	Construction Supervision of Road Rehabilitatiom works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	92.29%	$ 3,864,572.08	$ 322,936.53	ON-GOING	
45	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	69.40%	66.92%	$ 823,176.06	$ 406,882.96	ON-GOING	
46	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	26.82%	0.00%	$ -	$ 67,801.26	ON-GOING	
47	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	31.42%	0.00%	$ -	$ 100,649.51	ON-GOING	
48	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	26.66%	0.00%	$ -	$ 81,507.44	ON-GOING	
49	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	79.95%	60.75%	$ 143,498.67	$ 92,726.23	ON-GOING	
50	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	66.94%	49.43%	$ 100,497.36	$ 102,801.14	ON-GOING	
51	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	83.32%	$ 475,776.61	$ 95,267.77	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no presija hadia fali nia konstrusaun
52	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	67.52%	60.35%	$ 396,577.37	$ 260,520.43	ON-GOING	
53	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	90.00%	$ 896,415.58	$ 99,601.73	PHO	Hein 10 % retensaun EDTL Munisipiu maka seidauk entrega
54	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	43.84%	$ 452,656.17	$ 579,755.90	ON-GOING	
55	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	88.54%	$ 882,792.12	$ 114,233.03	ON-GOING	Projetu nia labele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no sei hein kompanha atu submete dokumentus
56	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	$ 195,378.22	Aug. 16, 2019	98.33%	98.25%	$ 191,961.64	$ 3,416.58	ON-GOING	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MAIO)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
57	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	87.04%	$ 73,728.12	$ 10,978.14	ON-GOING	Projetu refere ramata ona iha 2019 husu atu hare fila fali dadus pagamento
58	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urlephha Star 0+000 - 3+000 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Delong Unip. Lda	MPW-190087	$ 302,126.40	Aug. 16, 2019	100.00%	98.44%	$ 297,407.48	$ 4,718.92	ON-GOING	
59	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	$ 98,821.63	July 29, 2019	100.00%	97.48%	$ 96,332.33	$ 2,489.30	ON-GOING	Projetu refere companhia sei hatama pagamento adicional
60	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	$ 212,829.93	July 29, 2019	99.77%	99.77%	$ 212,337.64	$ 492.29	PHO	
61	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	$ 161,445.07	Aug. 16, 2019	100.00%	85.52%	$ 138,069.82	$ 23,375.25	ON-GOING	
62	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	$ 112,517.92	June 18, 2021	63.13%	55.41%	$ 62,340.76	$ 50,177.16	ON-GOING	
63	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	$ 34,371.15	June 18, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ 34,371.15	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
64	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	53.62%	47.18%	$ 166,561.25	$ 186,439.61	PENDENTE	
65	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	13.17%	$ 6,624.47	$ 43,685.75	ON-GOING	Projetu refere sei parado iha tinan 2019
66	New Construction for ICU Building in Referal Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	$ 140,000.00	29-Apr-21	63.07%	53.14%	$ 74,391.78	$ 65,608.22	ON-GOING	
67	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	14.00%	0.00%	$ -	$ 99,094.14	ON-GOING	
68	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	29.72%	0.00%	$ -	$ 92,706.60	ON-GOING	
69	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	28.39%	0.00%	$ -	$ 86,471.50	ON-GOING	
70	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	20.50%	0.00%	$ -	$ 97,841.29	ON-GOING	
71	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	$ -	$ 149,916.20	ON-GOING	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL MAIO)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
72	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	20.76%	0.00%	$ -	$ 94,951.66	ON-GOING	
73	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	14.94%	0.00%	$ -	$ 109,895.14	ON-GOING	
TOTAL									$ 96,158,627.00			84.26%	$ 81,019,298.23	$ 15,062,328.41		

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Prepara Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Silvino D.R.R. Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controle e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											May-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	0.00%	87.24%
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	0.00%	97.63%
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	73.10%	0.00%	73.10%
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	$ 4,223,004.05	July 1, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Consorcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	69.02%	0.00%	69.02%
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	$ 3,717,215.92	July 1, 2013	86.60%	0.00%	86.60%
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipesoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	41.51%	0.00%	41.51%
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	$ 3,596,249.07	July 1, 2013	86.49%	0.00%	86.49%
10	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	87.28%	0.00%	87.28%
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	$ 489,653.83	April 10, 2019	52.62%	0.00%	52.62%
12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	0.00%	93.39%
13	Rehabilitasaun Edificio Administrasaun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	$ 15,000.00	Sept. 19, 2016	0.00%	0.00%	0.00%
14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/II/2018	$ 7,700.00	Feb. 12, 2018	100.00%	0.00%	100.00%
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	$ 208,089.56	July 29, 2019	70.00%	0.00%	70.00%

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	May-22 Previous Progress (%)	May-22 This Month Progress (%)	May-22 Comulative Progress (%)
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	86.20%	0.00%	86.20%
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
18	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	$ 33,889.94	June 18, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	0.00%	64.84%
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	0.00%	41.32%
21	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	$ 600,016.84	July 25, 2016	45.31%	0.00%	45.31%
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	16.94%	3.99%	20.93%
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	12.93%	9.78%	22.72%
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	19.43%	4.58%	24.01%
25	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	11.88%	0.00%	11.88%
26	New Construction of Laboratory for Covid-19, at Sentru Internamentu Ainaro Villa, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Adijulcojam Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-21-098C	$ 70,069.94	14-Mar-21	0.00%	50.13%	50.13%
27	Rehabilitasaun CHC ba Izolamento Ainaro Villa relasiona covid19	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Marcalas Trading Solution, Unip Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-20-212	$ 31,997.68	Nov. 1, 2021	0.00%	50.37%	50.37%
28	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no contratu	$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
29	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	$ 239,273.00	Sept. 25, 2019	88.78%	0.00%	88.78%
30	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	$ 384,790.42	Jull,26,2021	0.00%	0.00%	0.00%

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	May-22		
											Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
31	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	0.00%	15.00%
32	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere-Ainaro	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	Ainaro	Berdato Unip Lda		$ 32,319.72	23.8, 2021	100.00%	0.00%	100.00%
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	22.58%	7.41%	29.99%
35	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	16.30%	8.60%	24.90%
36	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
37	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	99.16%	0.00%	99.16%
38	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
39	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	84.46%	0.00%	84.46%
40	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	92.83%	0.00%	92.83%
41	Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	$ 76,554.69	June 18, 2021	37.11%	0.00%	37.11%
42	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	$ 28,138,737.00	Nov. 20, 2014	99.12%	0.00%	99.12%

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	May-22		
											Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
43	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	$ 26,875,070.79	Nov. 20, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
44	Construction Supervision of Road Rehabilitatiom works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
45	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	69.40%	0.00%	69.40%
46	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	22.90%	3.91%	26.82%
47	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	22.81%	8.60%	31.42%
48	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	22.86%	3.80%	26.66%
49	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	79.95%	0.00%	79.95%
50	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	66.94%	0.00%	66.94%
51	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	0.00%	93.00%
52	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	67.52%	0.00%	67.52%
53	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
54	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	0.00%	48.72%

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

											May-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
55	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	0.00%	98.38%
56	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	$ 195,378.22	Aug. 16, 2019	98.33%	0.00%	98.33%
57	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
58	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urlephha Star 0+000 - 3+000 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Delong Unip. Lda	MPW-190087	$ 302,126.40	Aug. 16, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
59	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	$ 98,821.63	July 29, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
60	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	$ 212,829.93	July 29, 2019	99.77%	0.00%	99.77%
61	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	$ 161,445.07	Aug. 16, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
62	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	$ 112,517.92	June 18, 2021	63.13%	0.00%	63.13%
63	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	$ 34,371.15	June 18, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
64	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	53.62%	0.00%	53.62%
65	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	0.00%	40.00%
66	New Construction for ICU Building in Referal Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	$ 140,000.00	29-Apr-21	63.07%	0.00%	63.07%
67	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	12.47%	1.54%	14.00%
68	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	21.46%	8.26%	29.72%
69	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	21.72%	6.67%	28.39%

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU ($)	DATA KONTRATU	May-22 Previous Progress (%)	May-22 This Month Progress (%)	May-22 Comulative Progress (%)
70	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	19.19%	1.30%	20.50%
71	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
72	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	13.63%	7.13%	20.76%
73	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	12.32%	2.61%	14.94%

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifisio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifisio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P

(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainaro ADN, I.P

(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projetu M.E & ITC, ADN, I.P

ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro**

No. kontratu : **SSS/295/MOPTC-2016**

Data Inspesaun : 24-05-2022

Fatin Inspesaun :Faulata Casa, Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long : -9227,834S, Latetude: 125,3035868E

End Point : Long : -953588S Latetude: 125.3147646E

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Sketch & Foto Desenho
Tanki nebe fo bee ba torneira publika atu fahe bee ba komunidade sira iha faulata. (Projeito abandona iha 2019 ate agora).	

ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro**

No. kontratu : **SSS/295/MOPTC-2016**

Tangki fo bee ba torneira publika agora dau daun diak hela maibe torneira balu maka ladiak.





ANEXU C1 (ANV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro**

No. kontratu : **SSS/295/MOPTC-2016**

Torneira public nebe komunidade sira uza ba kuru bee mos no fase ropa agora daudaun bee mai ho diak, kada bes la mai tamba komunidade sira uza bee nee ho nia horario kada loron, e kanu balu mos kuak kada bes bee la mai.





ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
No. kontratu : **389/KDM-AINARO/VII/2019**

Data Inspesaun : 24-05-2022

Fatin Inspesaun :Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8°59'47.2"S, Latetude: 125°30'26.8"E.

End Point : Long : ....., Latetude: .....

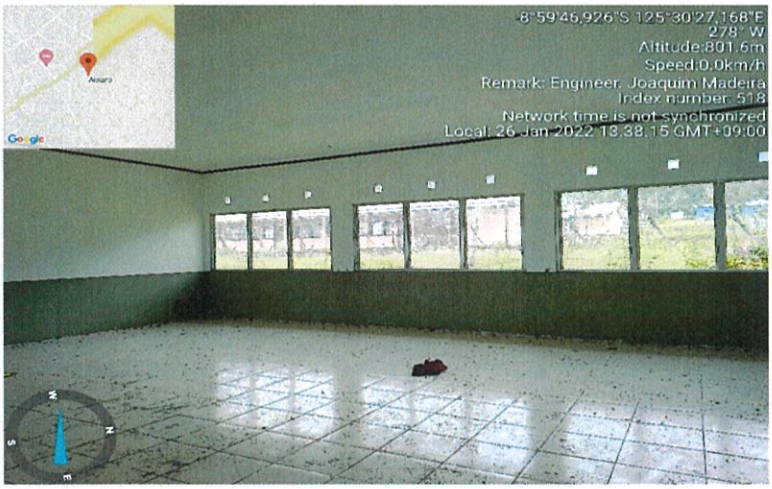
Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito ida nee fisiko to ona iha servisu kakuluk nian. **(Projeito ida nee parado iha 2020 ate agora 2021). Laiha informasaun ate agora.**	

ANEXU C1 (ANV-15)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
No. kontratu : **389/KDM-AINARO/VII/2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu **Pinta didin lolon ho plamir para preparasaun ba pinta aiben.**	
Servisu Iha parte laran mos kuaze plafon ho keramik mos hotu ona. (Projeito ida nee parado)	

ANEXU C1 (ANV-15)

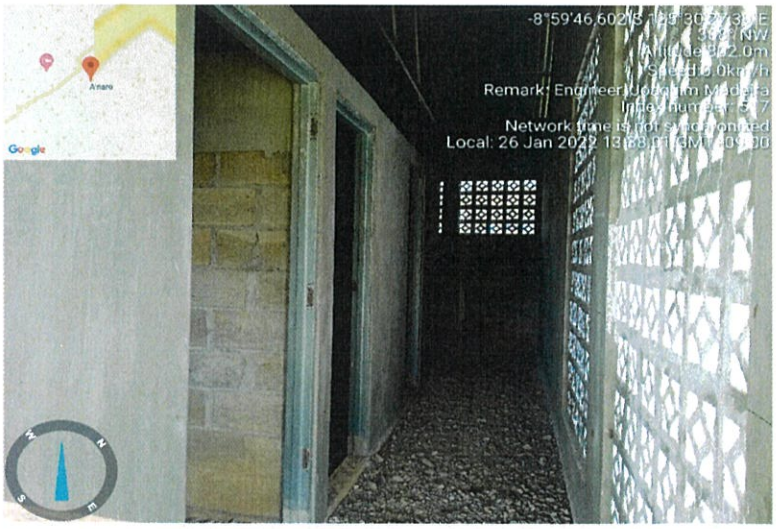
Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)**
No. kontratu : **389/KDM-AINARO/VII/2019**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu bee nian mos hotu ona nia istalasaun mos tuir desenho nebe mak iha terreno.



Servisu atero veranda mos hotu ona hein deit fui betaun. (Projeito ida nee parado)



ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Data Inspesaun :**24-05-2022**

Fatin Inspesaun :Ainaro

Koordinadas :

Start Point : Long : **8.9941S**, Latetude: **125.5010E**

End Point : Long : ....., Latetude: .....

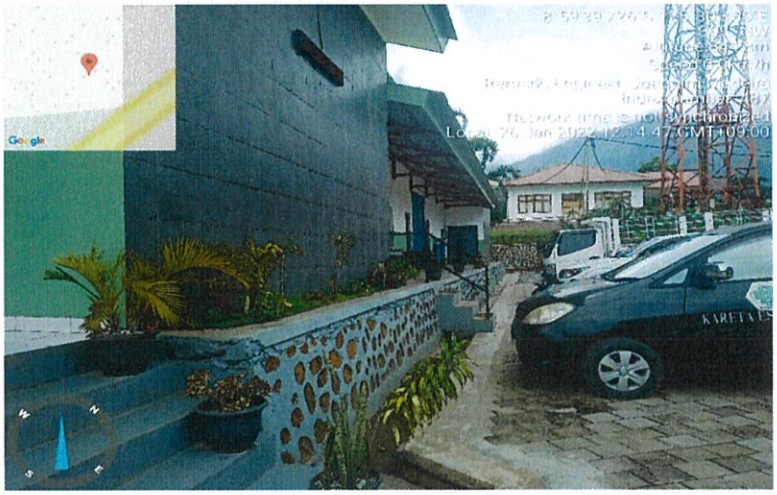
Naran Inspector : **1. Joaquim de C. Madeira**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere nia fisiko final ona maibe nia osan resto seidauk selu hotu ho rajaun sira projeito nain atu altera fali ba halo Baleta no garagem para kareta ho motor. **(Parado ate agora)**	

ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere nia fisiko final ona maibe nia osan resto seidauk selu hotu ho rajaun sira projeito nain atu altera fali ba halo Baleta no garagem para kareta ho motor.	 

ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

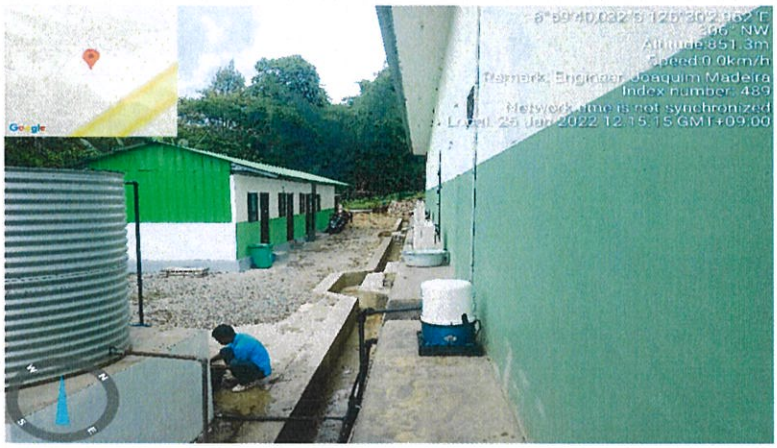
Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final ona maibe nia osan resto seidauk selu hotu ho rajaun sira projeito nain atu altera fali ba halo Baleta no garagem para kareta ho motor.

Observasaun iha tereno no Foto





ANEXU C1 (ANV-16)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro**
No. kontratu : **434/KDM-AINARO/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere nia fisiko final ona maibe nia osan resto seidauk selu hotu ho rajaun sira projeito nain atu altera fali ba halo Baleta no garagem para kareta ho motor.



ANEXU C1 (ANV-27)

Back-up Data

Naran Projeto : **NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19,AT SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE**

Data Inspesaun : 26-05-2022

Fatin Inspesaun :Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8°59'47.2"S, Latetude: 125°30'26.8"E.

End Point : Long : ....., Latetude: .....

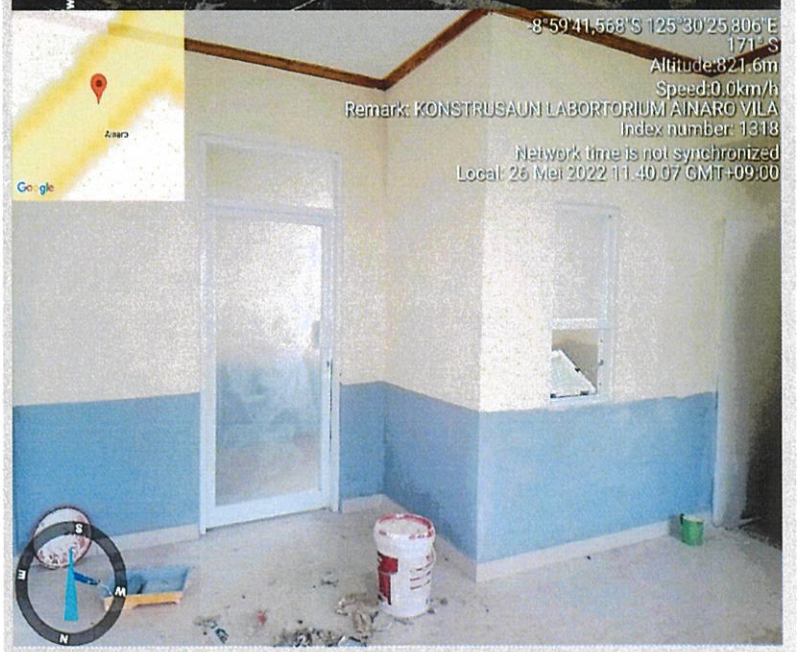
Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Parte oin edificio labortorium quase hotu ona.	

ANEXU C1 (ANV-27)

Back-up Data

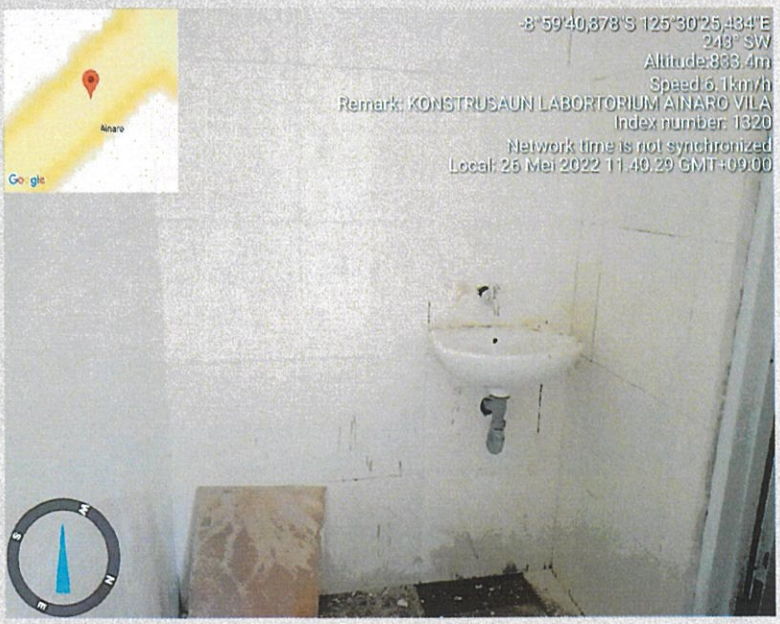
Naran Projeto : **NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19,AT SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE**

Parte oin no interior komesa servisu hela plafon no pinta.	 

ANEXU C1 (ANV-27)

Back-up Data

Naran Projeto : **NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19,AT SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Parte sorin kuana no haris fatin mos quase hotu ona no kontinuasaun pinta no hadia keramik.	 

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

Agência de Desenvolvimento Nacional

PROJECT TITLE : NEW CONSTRUCTION LABORATORIUM BUILDING ,RELASIONA BA COVID 19,TIMOR LESTE SENTRTU INTERNAMENTI AINARO VILA

LOCATION : SENTRTU INTERNAMENTI AINARO VILA

PROJECT OWNER : MINISTRA OF HEALTH

ORIGINAL CONTRACT			PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		PERCENT DATE TO DATE	
NO	DESCRIPTION	TOTAL PRICE	TOTAL PRICE	PERCENT(%)	TOTAL PRICE	PERCENT(%)	TOTAL PRICE	PERCENT(%)
I	*PREPARATION WORK*	*$ 2,760.00*	$ -	0.00%	$ 2,260.00	3.23%	$ 2,260.00	3.23%
II	*FOUNDATION WORKS*	*$ 3,990.31*	$ -	0.00%	$ 2,852.38	4.07%	$ 2,852.38	4.07%
III	*CONCRETE WORKS*	*$ 8,968.64*	$ -	0.00%	$ 8,968.64	12.80%	$ 8,968.64	12.80%
IV	*WALL INSTALLATION AND PLESTERING*	*$ 3,932.64*	$ -	0.00%	$ 2,875.32	4.10%	$ 2,875.32	4.10%
V	*CARPENTER WORKS*	*$ 3,090.00*	$ -	0.00%	$ 3,090.00	4.41%	$ 3,090.00	4.41%
VI	*ROOFING WORKS*	*$ 8,407.15*	$ -	0.00%	$ 8,407.15	12.00%	$ 8,407.15	12.00%
VII	*CEILING WORKS*	*$ 2,196.46*	$ -	0.00%	$ 439.29	0.63%	$ 439.29	0.63%
VIII	*FLOOR TILE WORKS*	*$ 2,097.74*	$ -	0.00%	$ 419.55	0.60%	$ 419.55	0.60%
IX	*ELECTRICAL WORKS*	*$ 4,703.00*	$ -	0.00%	0	0.00%	$ -	0.00%
X	*SANITASI WORKS*	*$ 3,712.46*	$ -	0.00%	$ 742.49	1.06%	$ 742.49	1.06%
XI	*PAINTING WORKS*	*$ 2,106.46*	$ -	0.00%	$ 526.61	0.75%	$ 526.61	0.75%
XII	*PROVISIONAL SUM FOR FURNITURE*	*$ 10,000.00*	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
XIII	*FINAL CLEARING*	*$ 206.95*	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
A	**CONSTRUCTION COST**	***$ 56,171.80***	**$ -**	**0.00%**	***$ 30,581.44***	**43.64%**	**$ 30,581.44**	**43.64%**
B	CONTRACTOR FEE (10% X A)	$ 5,617.18	$ -	0.00%	$ 3,058.14	4.36%	$ 3,058.14	4.36%
C	OVERHEAD	$ 1,400.00	$ -	0.00%	$ 800.00	1.14%	$ 800.00	1.14%
D	CONSTRUCTION TAX (2% X (A+B+C))	$ 1,263.78	$ -	0.00%	$ 688.79	0.98%	$ 688.79	0.98%
E	CONTIGENCY	$ 5,617.18	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
F	**GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)**	**$ 70,069.94**	**$ -**	**0.00%**	**$ 35,128.37**	**50.13%**	**$ 35,128.37**	**50.13%**

Prepared By :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Teknik ADN, I.P Municipio Ainaro

Verified By :

(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Engineiro Senior ba Edifício Publico e Agua Saneamento ADN, I.P

Verified By :

(Eng. Emerciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN, I.P.

ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.

Data Inspesaun : 06-05-2022

Fatin Inspesaun : Ainaro vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°5930366 "S, Latetude: 125,3019,0666E

End Point : Long Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira





Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Parte kotuk nian	Parte oin sala izolamento

ANEXU C1 (ANV-26)

Back-up Data

Naran Projeto SERVIS REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE.





Sala oin izolamento nian no kotuk.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

Agência de Desenvolvimento Nacional

Project Owner : Ministry of Health
Project Name : Rehabilitation CHC Ainaro Vila Building
Location : Ainaro Municipality , Timor-Leste

SUMMARY

ORGINAL CONCRAC				PROGRESS WORK					
NO	WORK DESCRIPTION	Amount (USD)	WEIGHT %	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		UP TO DATE	
				$ AMOUNT	WEIGHT %	$ AMOUNT	WEIGHT %	$ AMOUNT	WEIGHT %
I	PREPARATION WORKS	$ 4,101.80	12.82%			$ 3,571.81	11.16%	$ 3,571.81	11.16%
II	FUNDATION WORKS	$ 405.38	1.27%			$ 405.38	1.27%	$ 405.38	1.27%
III	CONCRETE WORKS	$ 545.30	1.70%			$ 115.50	0.36%	$ 115.50	0.36%
IV	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	$ 1,453.20	4.54%			$ 617.61	1.93%	$ 617.61	1.93%
V	CARPENTER WORKS	$ 1,180.00	3.69%			$ -	0.00%	$ -	0.00%
VI	ROOFING WORKS	$ 2,031.40	6.35%			$ -	0.00%	$ -	0.00%
VII	CEILING WORKS	$ 4,519.30	14.12%			$ -	0.00%	$ -	0.00%
VIII	FLOOR TILE WORKS	$ 5,066.82	15.83%			$ 4,031.82	12.60%	$ 4,031.82	12.60%
IX	ELECTRICAL WORKS	$ 2,986.70	9.33%			$ -	0.00%	$ -	0.00%
X	SANITATION WORKS	$ 3,096.00	9.68%			$ 3,096.00	9.68%	$ 3,096.00	9.68%
XI	PAINTING WORKS	$ 2,932.54	9.16%			$ 2,526.29	7.90%	$ 2,526.29	7.90%
XII	FINAL CLEARING	$ 200.00	0.63%			$ -	0.00%	$ -	0.00%
A	**Total Construction Cost**	**$ 28,518.43**	**89.13%**			$ 14,364.40	44.89%	$ 14,364.40	44.89%
B	**Contractor Fee (10% x A)**	**$ 2,851.84**	**8.91%**			$ 1,436.44	4.49%	$ 1,436.44	4.49%
C	**TAX (2% x (A+B))**	**$ 627.41**	**1.96%**			$ 316.02	0.99%	$ 316.02	0.99%
D	**Grand Total**	**$ 31,997.68**	**100%**			**$ 16,116.86**	**50.37%**	**$ 16,116.86**	**50.37%**

Prepared By :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Teknik ADN, I.P Municipio Ainaro

Verified By :

(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Engineiro Senior Edificio Publico e Agua Saneamento ADN, I.P

Verified By :

(Eng. Emerciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN, I.P.

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi**
No. kontratu : **02/GAB.AM.AIN/VII/2015**

Data Inspesaun :**24-05-2022**

Fatin Inspesaun :Manutasi/ AINARO

Koordinadas :

Start Point : Long : -85852344S Latetude: 125.312712E

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : **1. Joaquim de C. Madeira**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito nee nia servisu to ona iha kakuluk maibe ate agora kompanhia la halo aktividade servisu konstrusaun hanesan bai bain.(ABANDONA ATE AGORA LAIHA INFORMASAUN IDA)	

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi**
No. kontratu : **02/GAB.AM.AIN/VII/2015**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito nee nia servisu to ona iha kakuluk maibe ate agora kompanhia la halo aktividade servisu konstrusaun hanesan bai bain.(PARADO ATE AGORA)	 

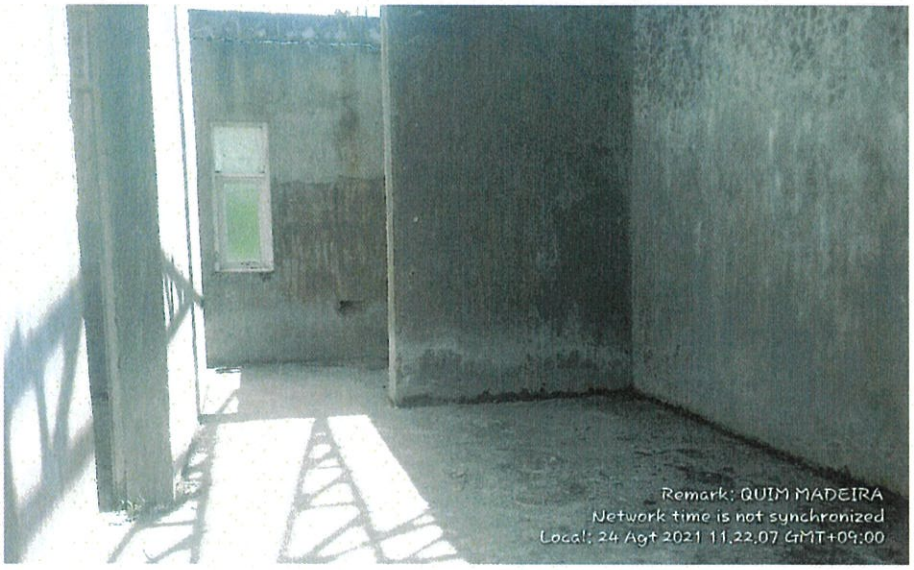
Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi**
No. kontratu : **02/GAB.AM.AIN/VII/2015**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	
Konstrusaun Uma dotor to ona iha nia kuda kuda maibe ate agora la halo aktividade.	
Servisu laran nian reboka hotu ona maibe la kontinuasaun.	

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi**
No. kontratu : **02/GAB.AM.AIN/VII/2015**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Parte laran nian uma dotor la halo aktividade servisu	 

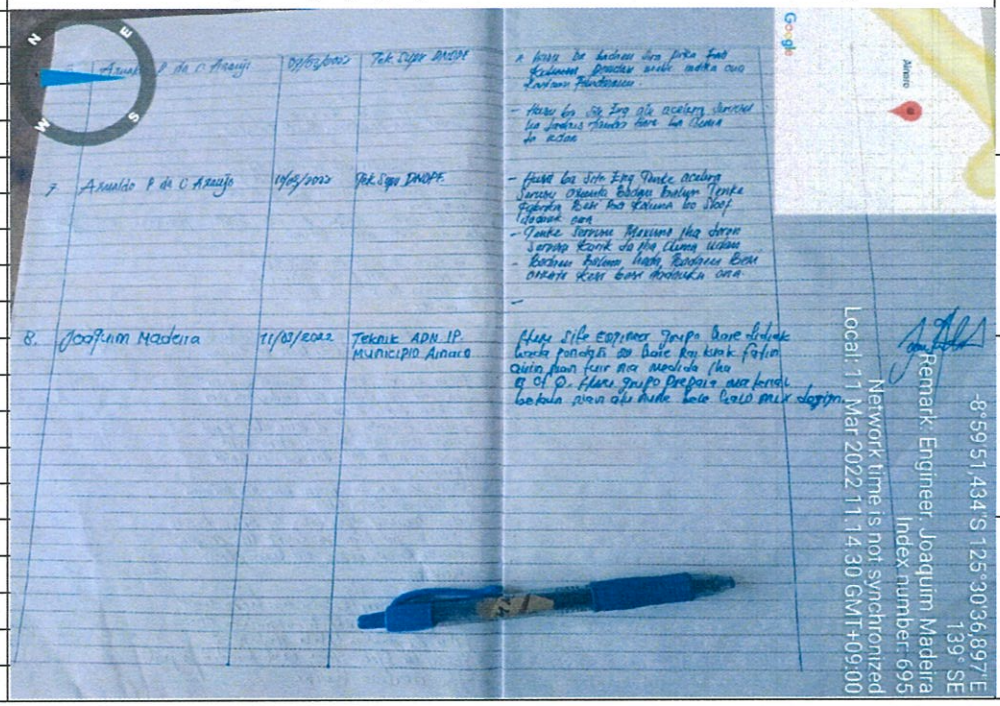
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG. FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO AINARO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	6/05/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu site engineering grupo hare didiak hada pondasi hare rai kuak fatin airin nian tuir nia medida iha b of q, husu grupo prepara material atu une bele halo mix design.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA SECUNDARIA GERAL
LOCATION : SUCO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO
AINARO

ANEXU-ANV-24#

SUMMARY

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH AMOUNT	PREVIOUS MONTH PERCENT %	THIS MONTH AMOUNT	THIS MONTH PERCENT %	UP TO DATE AMOUNT	UP TO DATE PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$ 3,075.00	$ 1,800.00	1.68%	$ -	0.00%	$ 1,800.00	1.68%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 56,061.73	$ 17,323.39	15.70%	$ 2,722.52	2.47%	$ 20,045.91	18.17%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US$ 30,953.49	$ 831.22	0.75%	$ 2,325.68	2.11%	$ 3,156.89	2.86%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$ 10,883.53	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 100,973.75**	**$ 19,954.61**	**18.14%**	**$ 5,048.20**	**4.58%**	**$ 25,002.81**	**22.71%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	**$ 1,310.00**	1.30%	$ -	0.00%	$ 1,310.00	1.30%
	GRAND TOTAL		**US$ 110,313.75**	**21,264.61**	**19.43%**	**$ 5,048.20**	**4.58%**	**$ 26,312.81**	**24.01%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU-ANV-24#
Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG. FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO AINARO)

Data Inspesaun :06-05-2022

Fatin Inspesaun :Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : ....., Latetude: .....

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Servisu hada bloco 40 x 20 x 10 no monta kaixa airin nian orentasaun tuir desenho no B OF Q nebe iha	

ANEXU-ANV-24#
Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG. FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO AINARO)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Servisu hada bloco 40 x 20 x 10 orentasaun tuir desenho no B OF Q nebe iha	 

ANEXU-ANV-24#
Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG. FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO AINARO)

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu hada bloco 40 x 20 x 10 orentasaun tuir desenho no B OF Q nebe iha



Servisu hada pondasi haris fatin nian.



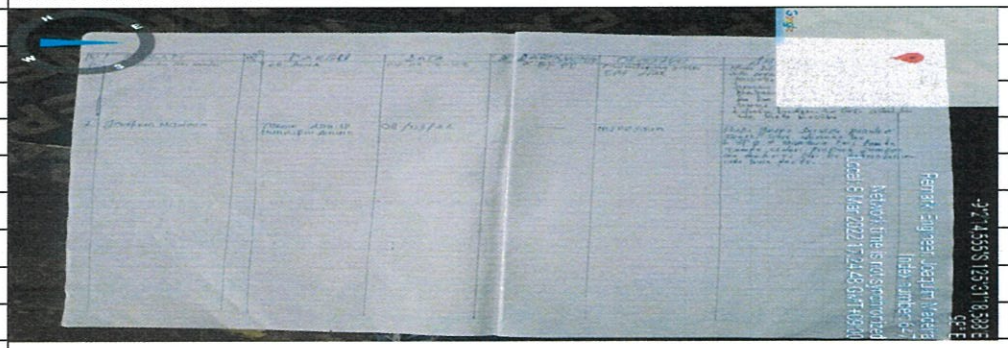
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	12/05/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu grupo servisu pondasi tengki hare desenho ho b of q e acelera lais tamba tempo udan, prepara material lais lori ba labortorium hodi teste.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL LIAS
LOCATION : SUCO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

 # ANEXU-ANV-23 #

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOU MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$ 3,575.00	$ 2,050.00	1.99%	$ -	0.00%	$ 2,050.00	1.99%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 50,185.26	$ 9,973.48	9.67%	$ 7,201.00	6.98%	$ 17,174.49	16.66%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US$ 25,178.89	$ -	0.00%	$ 2,887.47	2.80%	$ 2,887.47	2.80%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$ 14,827.89	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 93,767.04**	**$ 12,023.48**	**11.66%**	**$ 10,088.48**	**9.78%**	**$ 22,111.96**	**21.45%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 1,310.00	1.27%	$ -	0.00%	$ 1,310.00	1.27%
	GRAND TOTAL		**US$ 103,107.04**	**$ 13,333.48**	**12.93%**	**$ 10,088.48**	**9.78%**	**$ 23,421.96**	**22.72%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Data Inspesaun : 12/05/2022

Fatin Inspesaun :Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : ....., Latetude: .....

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu . Projeito refere servisu hada bloco 40 x 20 x 10 tuir planta e b of q nebe aprovado.	

ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

. Projeito refere servisu hada bloco 40 x 20 x10 tuir planta e b of q nebe aprovado.





ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere servisu hada bloco 40 x 20 x 10 tuir planta e b of q nebe aprovado.



Projeito refere servisu hada pondasi sintina tuir planta e b of q nebe aprovado.



.

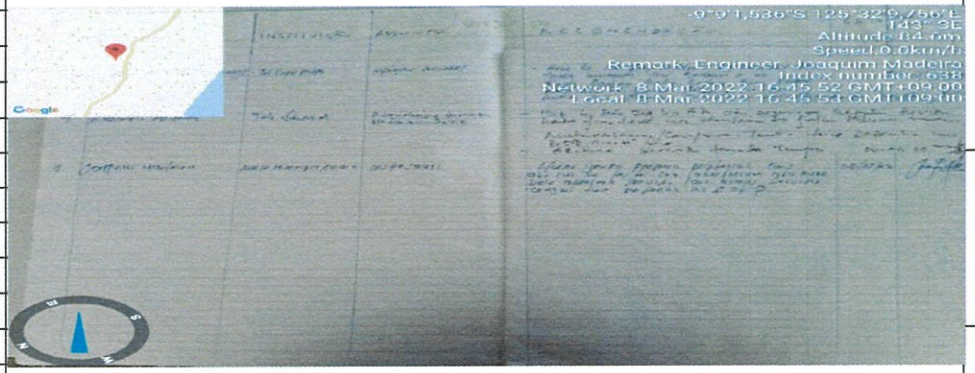
MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	12/05/2022	Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	**Husu ba grupu prepara material lais atu lori ba teste iha labortorium atu nune bele asselera servisu lais, nomos servisu tenki tuir desenho ho b of q.**	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL LUAN CADOI
LOCATION : SUCO CASA, POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

 # ANEXU-ANV-22 #

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MOUNTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$ 3,575.00	$ 1,975.00	2.00%				
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 49,729.55	$ 13,413.18	13.61%	$ 2,010.71	2.04%	$ 15,423.89	15.65%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US$ 25,016.07	$ -	0.00%	$ 1,917.22	1.95%	$ 1,917.22	1.95%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$ 10,894.12	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 89,214.74**	**$ 15,388.18**	**15.61%**	**$ 3,927.93**	**3.99%**	**$ 19,316.11**	**19.60%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 1,310.00	1.33%	$ -	0.00%	$ 1,310.00	1.33%
	GRAND TOTAL		**US$ 98,554.74**	**$ 16,698.18**	**16.94%**	**$ 3,927.93**	**3.99%**	**$ 20,626.11**	**20.93%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

 # ANEXU-ANV-22 #

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Data Inspesaun : 12/05/2022

Fatin Inspesaun :.....

Koordinadas :

Start Point : Long : ....., Latetude: .....

End Point : Long : ..... Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Sketch & Foto Desenho
Projeito refere hada bloco 40 x 20 x10 sala de aulas 3 kuase hada besik hotu ona e tuir desenho nebe maka approvado, no komesa kee.	

 # ANEXU-ANV-22 #

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Projeito refere hada bloco 40 x 20 x 10 sala de aulas 3 kuase hada besik hotu ona e tuir desenho nebe maka approvado, no komesa kee.





 # ANEXU-ANV-22 #

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)

Projeito refere hada pondasi sintina nian nebe maka approvado, no komesa kee fali haris fatin nian no ateru.





ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Data Inspesaun : 06-05-2022

Fatin Inspesaun :Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : .....S, Latetude: ....."E.

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere hada fondasi no fui mos airin. Foot Plate (Parado hela)	

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere hada fondasi no fui mos airin. Foot Plate (Parado hela)	 

ANEXU - ANV- 25

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere hada fondasi no fui mos airin. Foot Plate (Parado hela)





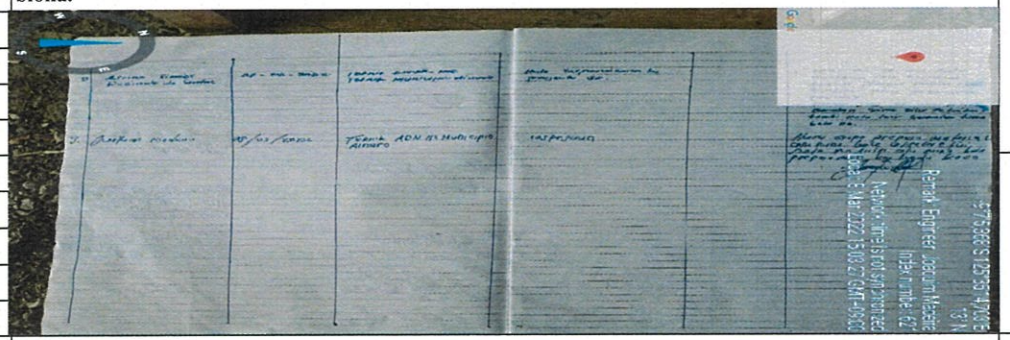

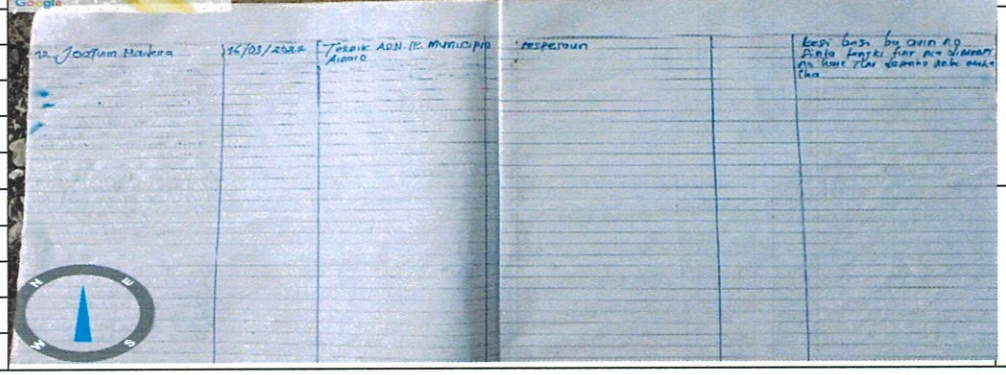
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	2/05/2022	Hato-udo / Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu grupo prepara material atu nune bele acelera fui sinta no airin atu nune bele preparasaun ba hada bloku.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III	12/05/2022	Hato-udo / Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Kesi besi airin no sinta tenki tuir nia dimensi no hare tuir desenho nebe maka iha.	
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO CENTRAL HATO UDO VILA
LOCATION : EBC HATU UDO VILLA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

 # ANEXU- HA - 6 #

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	THIS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCEN%	AMOUNT	PERCENT%	AMOUNT	PERCENT%
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US$ 3,079.26	$ 1,804.26	2.64%	$ -	0.00%	$ 1,804.26	2.64%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 51,384.19	$ 12,323.73	18.03%	$ 5,062.72	7.41%	$ 17,386.46	25.43%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US$ 4,553.36	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 59,016.81**	**$ 14,127.99**	**20.67%**	**$ 5,062.72**	**7.41%**	**$ 19,190.72**	**28.07%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 1,310.00	1.92%	$ -	0.00%	$ 1,310.00	1.92%
	GRAND TOTAL		**US$ 68,356.81**	**$ 15,437.99**	**22.58%**	**$ 5,062.72**	**7.41%**	**$ 20,500.72**	**29.99%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Contrôlo e Validasaun de Qualidade,

ANEXU- HA - 6

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Data Inspesaun : 12-05-2022

Fatin Inspesaun :Hato-udo Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : …….S, Latetude: ……."E.

End Point : Long : ……, Latetude: ……

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere bloco hada quase hotu ona, e gora preparasaun material fui arin no ateru laran.	

ANEXU- HA - 6

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima ~~Posto Administrativo de~~ Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere pondasi hada hotu ona, e gora preparasaun material ba fui arin.	 

ANEXU- HA - 6

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere hada bloco no fui arin.





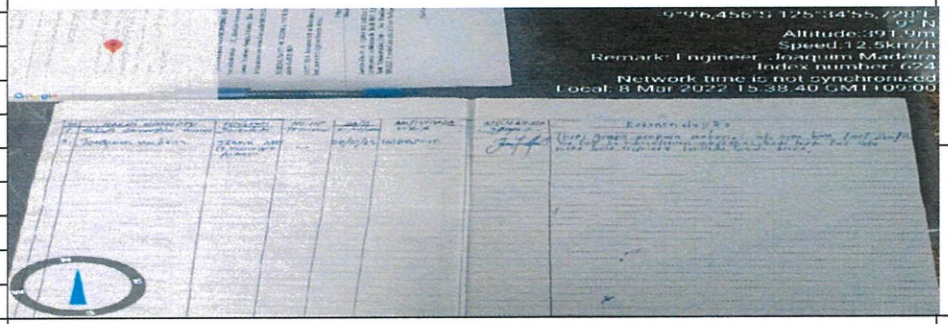
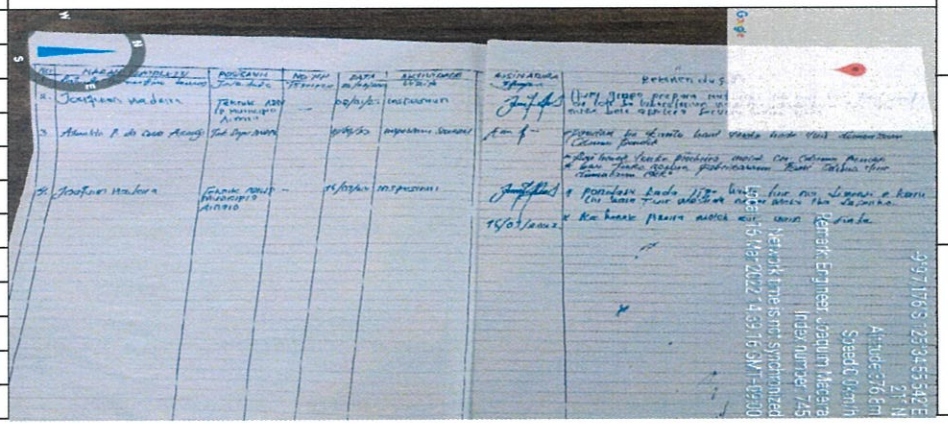
MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	2/05/2022	Hut-seo/Hato-udo Vila	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu grupo prepara material atu nune bele tes sampel ou lori ba labortorium hodi teste lais atu nune bele asselera servisu hada balaku nian.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	12/05/2022	Hut-seo/Hato-udo Vila	Joaquim Madeira	Teknico	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1	Pondasi hada tipe tuir nia dimensi e klaru liu hare tuir medida nebe iha desenho.	
					2	Raihenek finera molok cor airin ho sinta.	
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO PROTOTIPO CA + TB, EBF HUTSEO
LOCATION : HATU UDO, MUNICIPIO AINARO

MAIN SUMMARY

 # ANEXU- HA - 7 #

NO	ITEM DESCRIPTION	PAGE NO	AMOUNT	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	$ 2,982.93	$ 1,632.93	1.48%	$ -	0.00%	$ 1,632.93	1.48%
								$ -	0.00%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	CA/39	$ 63,158.05	$ 14,195.08	12.82%	$ 6,564.88	5.93%	$ 20,759.96	18.75%
								$ -	0.00%
III	BUILDING Tb	TB/39	$ 25,465.79			2956.496	2.67%	$ 2,956.50	2.67%
								$ -	0.00%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORK		$ 9,748.62					$ -	0.00%
								$ -	0.00%
A	**Total Construction Cost**		**$ 101,355.39**	**$ 15,828.01**	**14.30%**	**$ 9,521.37**	**8.60%**	**$ 25,349.39**	**22.90%**
B	Overhead		$ 6,340.00	$ 2,210.00	2.00%	$ -	0.00%	$ 2,210.00	2.00%
C	Contigency		$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
D	**Grand Total**		**$ 110,695.39**	**$ 18,038.01**	**16.30%**	**$ 9,521.37**	**8.60%**	**$ 27,559.39**	**24.90%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,

ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Data Inspesaun : 12-05-2022

Fatin Inspesaun :Hut-seo / Hato-udo - vila

Koordinadas :

Start Point : Long : ....., Latetude: .....

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere iha fase hada bloco. 40 x 20 x 10	Sketch & Foto Desenho 

ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Sketch Item servisu

Projeito refere iha fase hada bloco 40 x 20 x 10. No ateru uma laran.





ANEXU- HA - 7

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)

Servisu hada pondasi sintina nian no hada bloco ba sala de aulas.





MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

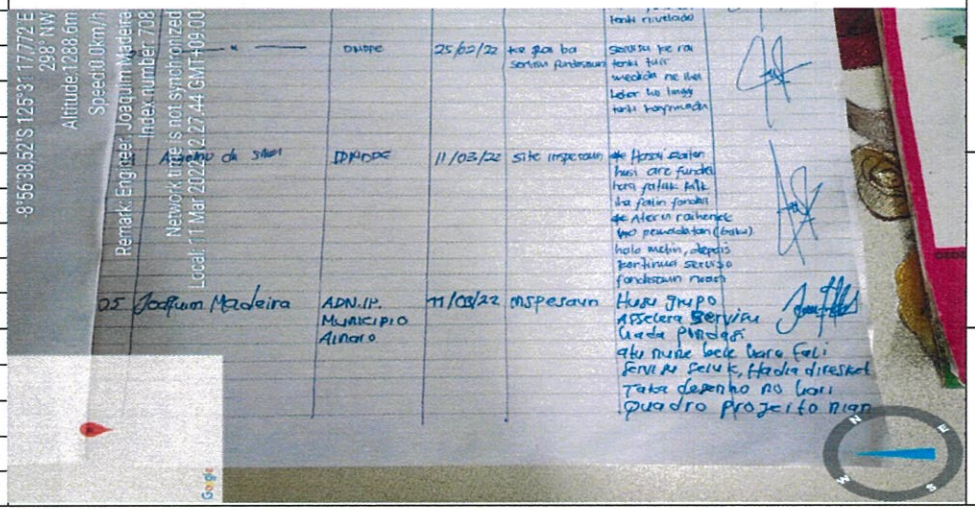
ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	6/05/2022	Hato builico/A INARO	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu grupo asselera servisu hada pondasi atu nune bele hare fali servisu seluk, hadia direskeet taka desenho iha direskeet no hari quadro projeito.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II	23/05/2022	to builico/A INAI	Joaquim Madeira	Teknico	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA FILIAL TUCARO
LOCATION : HATUBUILICO, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

 # ANEXU# HTB-10#

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US$ 3,329.26	**$ 1,479.26**	**2.18%**	$ -	0.00%	$ 1,479.26	2.18%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 50,948.05	**$ 12,939.19**	**19.08%**	$ 2,654.36	3.91%	$ 15,593.55	23.00%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US$ 4,183.95	**$ -**	**$ -**	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 58,461.26**	**$ 14,418.45**	**21.27%**	**$ 2,654.36**	**3.91%**	**$ 17,072.81**	**25.18%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 1,110.00	1.64%	$ -	0.00%	$ 1,110.00	1.64%
	GRAND TOTAL		**US$ 67,801.26**	**$ 15,528.45**	**22.90%**	**$ 2,654.36**	**3.91%**	**$ 18,182.81**	**26.82%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Data Inspesaun : 06-05-2022

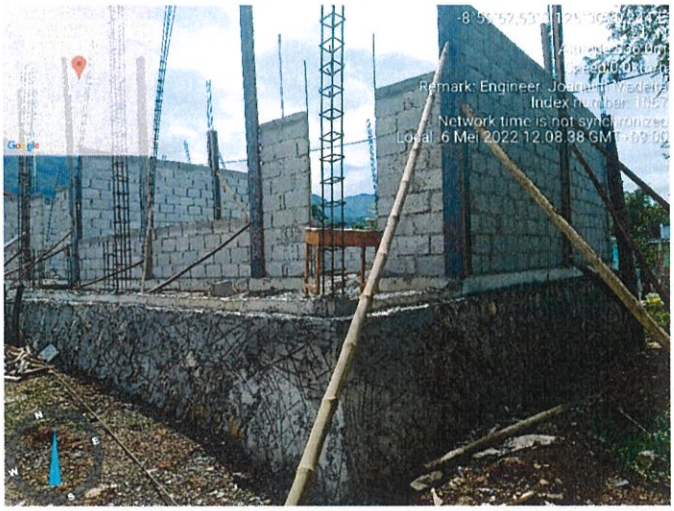
Fatin Inspesaun :Tukaro,Hatu builiko

Koordinadas :

Start Point : Long : ....., Latetude: .....

End Point : Long : ..... Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Sketch & Foto Desenho
Projeito refere hada bloco quase hotu ona e tuir medida no desenho nebe maka iha.	

ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Projeito refere hada bloco quase hotu ona e tuir medida no desenho nebe maka iha.





ANEXU# HTB-10#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)

Projeito refere hada bloco quase hotu ona e tuir medida no desenho nebe maka iha.





MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

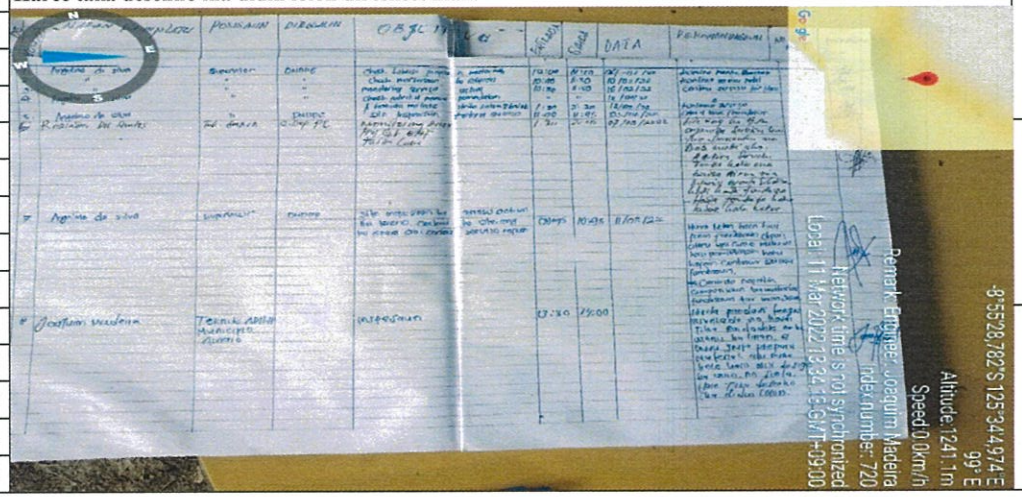
ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	6/05/2022	Hato builico/Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Hada fondasi tenki nivelado no hasai tiha rai dodok nebe monu baa laran e husu ba grupo prepara material atu nune bele halo mix design ba airin no sinta.	
					2	Haree taka desenho iha didin lolon direskeet nian.	
					3		
					4		
					5		
II	23/05/2022	Hato builico/Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO PROTOTIPO CA, EBF TATIRI LASES
LOCATION : HATU BUILICO, MUNICIPIO AINARO

MAIN SUMMARY

 # ANEXU# HTB-12#

NO	ITEM DESCRIPTION	PAGE NO	AMOUNT	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	$ 2,982.93	$ 1,632.93	2.00%	$ -	0.00%	$ 1,632.93	2.00%
								$ -	0.00%
II	CLASSROOM BUILDING Ca	CA/39	$ 62,623.84	$ 15,692.31	19.25%	$ 3,096.71	3.80%	$ 18,789.02	23.05%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITE WORK		$ 6,560.68	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
A	**Total Construction Cost**		**$ 72,167.44**	**$ 17,325.24**	**21.26%**	**$ 3,096.71**	**3.80%**	**$ 20,421.95**	**25.06%**
B	Overhead		$ 6,340.00	$ 1,310.00	1.61%	$ -	0.00%	$ 1,310.00	1.61%
C	Contigency		$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
D	**Grand Total**		**$ 81,507.44**	**$ 18,635.24**	**22.86%**	**$ 3,096.71**	**3.80%**	**$ 21,731.95**	**26.66%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,

ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Data Inspesaun : 06-05-2022

Fatin Inspesaun :Tatiris Lases

Koordinadas :

Start Point : Long : ....., Latetude: .....

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere fui sinta okos no tuir mix design nebe maka prepara husi obras publicas.	

ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Projeito refere fui sinta okos no tuir mix design nebe maka prepara husi obras publicas.





ANEXU# HTB-12#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)

Projeito refere fui sinta okos no tuir mix design nebe maka prepara husi obras publicas.





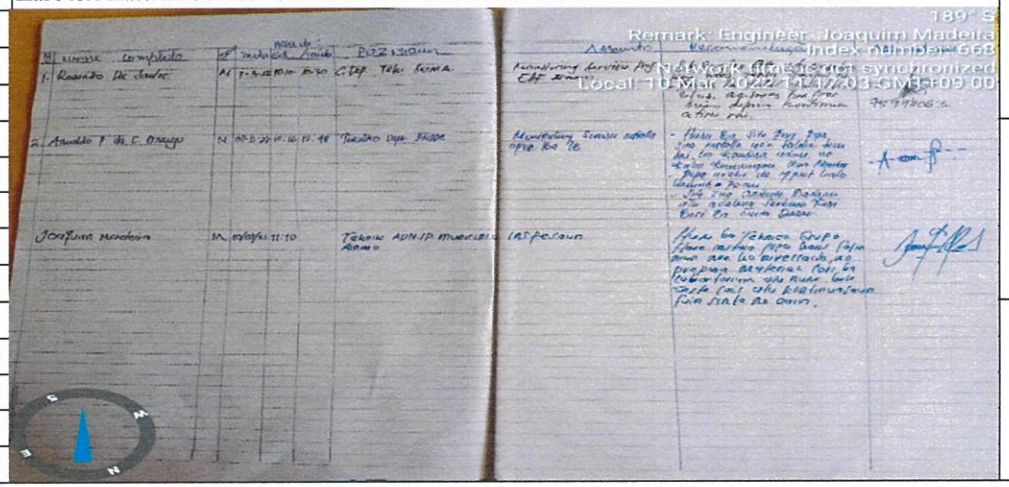
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	6/05/2022	Hato builico/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu ba teknico grupo hare instala kanu ou pvc haris fatin nian nee ho nivelado.	
					2	Hare lori material ba labortorium atu nune bele teste lais atu kontinuasaun fui sinta ho airin.	
					3		
					4		
					5		
II	23/05/2022	Hato builico/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA ERNARO
LOCATION : SUCO NUN MOGE, POSTO ADMINISTRATIVO HATU BUILICO, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

 # ANEXU# HTB-11#

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOU MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
II	DEMOLITION	DM/3	US$ 200.00	$ 200.00	0.21%	$ -	0.00%	$ 200.00	0.21%
III	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 50,798.26	$ 12,582.70	13.38%	$ 4,104.08	4.36%	$ 16,686.78	17.74%
IV	TOILET BUILDING TB	CB/50	US$ 25,500.85	$ 7,369.98	7.83%	$ 3,990.67	4.24%	$ 11,360.65	12.08%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$ 11,235.41	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 87,734.51**	**$ 20,152.68**	**21.42%**	**$ 8,094.75**	**8.60%**	**$ 28,247.43**	**30.03%**
	CONTIGENCY		US$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 1,310.00	1.39%	$ -	0.00%	$ 1,310.00	1.39%
	GRAND TOTAL		**US$ 94,074.51**	**$ 21,462.68**	**22.81%**	**$ 8,094.75**	**8.60%**	**$ 29,557.43**	**31.42%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X/D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Data Inspesaun :06-06-2022

Fatin Inspesaun :Ernaro

Koordinadas :

Start Point : Long : ....., Latetude: .....

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere hada bloco quase hotu ona e agora hein deit preparasaun material betaun nia hodi fui airin ho sinta leten.	

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Projeito refere hada bloco quase hotu ona e agora hein deit preparasaun material betaun nia hodi fui airin ho sinta leten.





ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Projeito refere hada bloco quase hotu ona e agora hein deit preparasaun material betaun nia hodi fui airin ho sinta leten.





MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

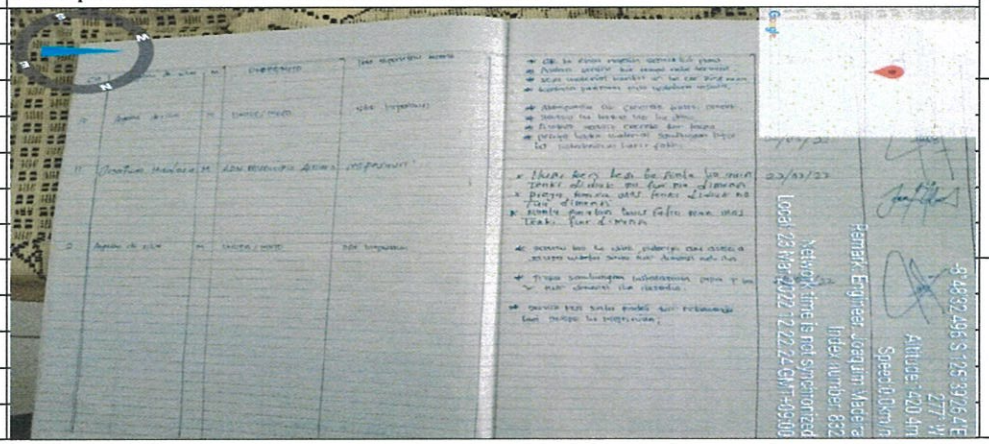
ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	18/05/2022	Maubessi/Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu kesi besi ba sinta ho airin tenki didiak no tuir nia dimensi.	
					2	Prega kaixa mos didiak tenki tuir nia dimensi.	
					3	Monta paralon haris fatin nian mos tenki tuir nia dimensi.	
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI
LOCATION : POSTU ADMINISTRATIVO MAUBISSE, SUCO MANLAU, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

 # ANEXU# MBS-21#

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		THIS MONTH	
				AMOUNTH	PERCENT %	AMOUNTH	PERCENT %	AMOUNTH	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US$ 3,079.26	$ 1,354.26	1.57%	$ -	0.00%	$ 1,354.26	1.57%
II	CLASSROOM BUILDING C2	C/39 (i)	US$ 61,149.43	$ 16,214.77	18.75%	$ 5,767.18	6.67%	$ 21,981.95	25.42%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US$ 12,902.81	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 77,131.50**	**17,569.03**	**20.32%**	**5,767.18**	**6.67%**	**$ 23,336.21**	**26.99%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 1,210.00	1.40%	$ -	0.00%	$ 1,210.00	1.40%
	GRAND TOTAL		**US$ 86,471.50**	**18,779.03**	**21.7%**	**5,767.18**	**6.67%**	**$ 24,546.21**	**28.39%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arq. Fransisco X. D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,

ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Data Inspesaun :18-05-2022

Fatin Inspesaun :Bermoli/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long :, Latetude:

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere hada bloco hotu ona e agora hein preparasaun material betaun nian ba fui sinta leten.	

ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Projeito refere hada bloco hotu ona e agora hein preparasaun material betaun nian ba fui sinta leten.





ANEXU# MBS-21#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFISIO PRE ESCOLAR 7 DE DESEMBRO BERMOLI

Projeito refere hada bloco hotu ona e agora hein preparasaun material betaun nian ba fui sinta leten.



Seftick Tank mos hada hotu ona hein instala pvc.



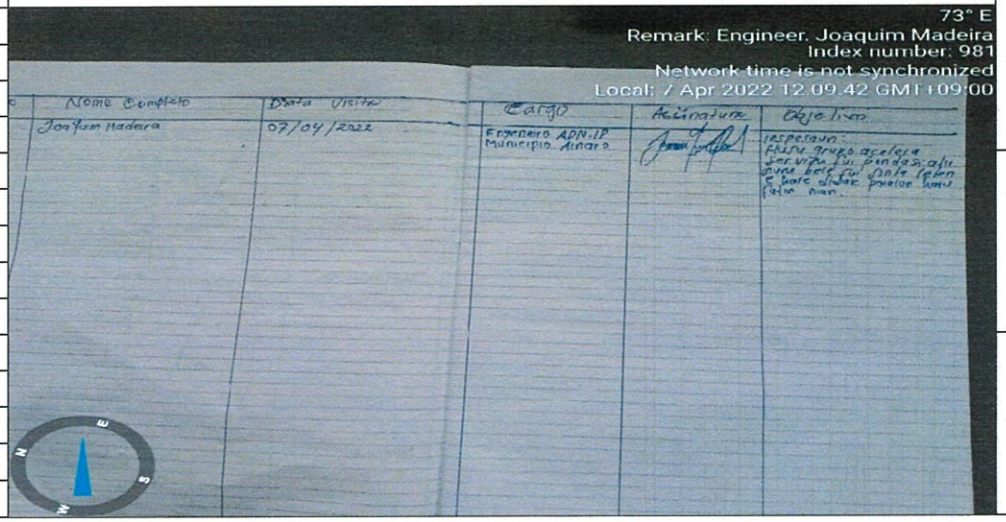
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	18/05/2022	Maubessi/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu grupo aceleraservisu pondasi nune bele fui sinta leten e mos hare didiak paralon haris fatin nian	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI
LOCATION : MAULAU, MAUBISSE, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

#ANEXU-MBS-17#

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$ 3,575.00	$ 1,600.00	1.46%	$ -	0.00%	$ 1,600.00	1.46%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 51,213.93	$ 8,413.13	7.66%	$ 2,873.11	2.61%	$ 11,286.23	10.27%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US$ 25,678.16	$ 2,220.04	2.02%	$ -	0.00%	$ 2,220.04	2.02%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$ 20,088.04	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 100,555.14**	**$ 12,233.17**	**11.13%**	**$ 2,873.11**	**2.61%**	**$ 15,106.28**	**13.75%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 1,310.00	1.19%	$ -	0.00%	$ 1,310.00	1.19%
	GRAND TOTAL		**US$ 109,895.14**	**$ 13,543.17**	**12.32%**	**$ 2,873.11**	**2.61%**	**$ 16,416.28**	**14.94%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,

#ANEXU-MBS-17#
Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Data Inspesaun **:18- 05 - 2022**

Fatin Inspesaun :Lumluli/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long :, Latetude:

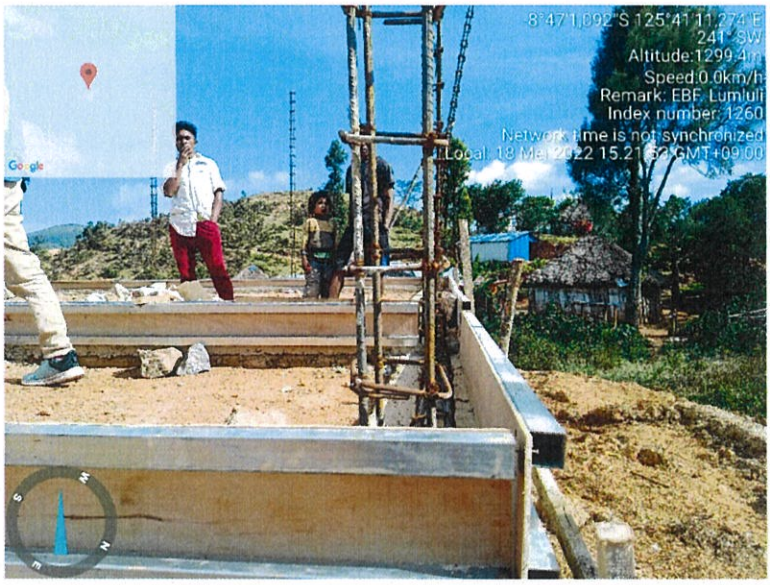
End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector **: 1. Joaquim de C. Madeira**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Servisu refere monta kaixa para atu prepara ba fui betaun sinta okos nian.	 

#ANEXU-MBS-17#
Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Servisu refere monta kaixa para atu prepara ba fui betaun sinta okos nian.	Observasaun iha tereno no Foto  

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

#ANEXU-MBS-17#
Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA BASICA FILIAL LUMLULI

Servisu kee rai kuak pusu nian ou septik tanck.



Servisu refere monta kaixa para atu prepara ba fui betaun sinta okos nian.



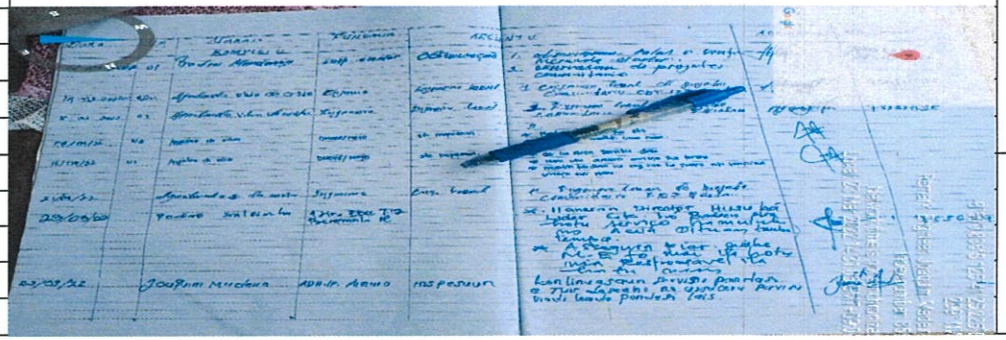
MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	18/05/2022	Maubessi/Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Kontinuasaun servisu pondasi tuir desenho no asselera servisu hodi hada pondasi lais.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU
LOCATION : SUCO MANETU, POSTO ADMINISTRATIVO MAUBISSE , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

 # ANEXU# MBS-24#

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US$ 3,079.26	$ 1,354.26	1.43%	$ -	0.00%	$ 1,354.26	1.43%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 71,553.70	$ 10,177.56	10.72%	$ 6,767.87	7.13%	$ 16,945.44	17.85%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US$ 10,978.70	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 85,611.66**	**$ 11,531.82**	**12.14%**	**$ 6,767.87**	**7.13%**	**$ 18,299.70**	**19.27%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 1,410.00	1.48%	$ -	0.00%	$ 1,410.00	1.48%
	GRAND TOTAL		**US$ 94,951.66**	**$ 12,941.82**	**13.63%**	**$ 6,767.87**	**7.13%**	**$ 19,709.70**	**20.76%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,

ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Data Inspesaun : 18/05/2022

Fatin Inspesaun :Ruslau/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projeito refere fondasi hada hotu ona e preparasaun para fui sinta okos nian.	

ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Projeito refere fondasi hada hotu ona e preparasaun para fui sinta okos nian.	 

ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Projeito refere fondasi hada hotu ona e preparasaun para fui sinta okos nian.	 

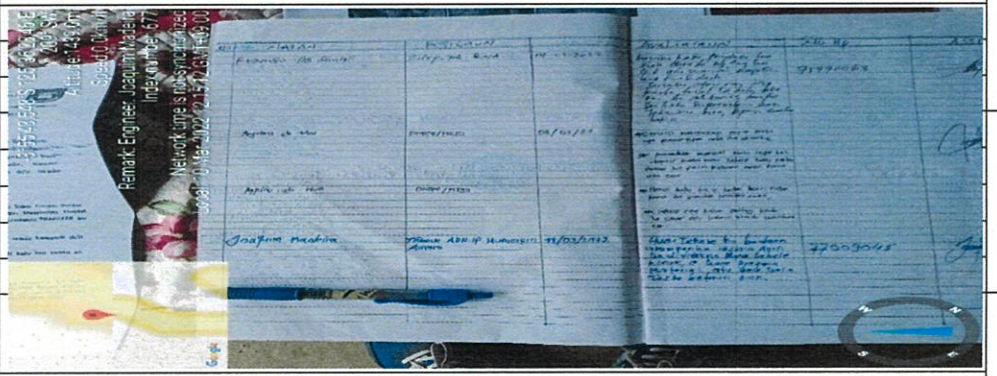
MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto :NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	17/05/2022	Maubessi/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu teknico ho badaen akompanha instala ou hari airin ho didiak hare labele kleuk,	
					2	Hare prepara material para teste betaun nian.	
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA
LOKASI : SUCO AITUTU, POSTO ADMINISTRATIVO MAUBISSE VILA MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

 # ANEXU# MBS-22#

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES WORKS	PP/3	US$ 3,079.26	$ 1,354.26	1.38%			$ 1,354.26	1.38%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 71,306.28	$ 16,316.07	16.68%	$ 1,275.56	1.30%	$ 17,591.63	17.98%
III	PROVISIONAL SUM for SITEWORKS	SW/24 (i)	US$ 14,115.75	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 88,501.29**	**17,670.33**	**18.06%**	**$ 1,275.56**	**1.30%**	**$ 18,945.89**	**19.36%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	$ 1,110.00	1.13%	$ -	0.00%	$ 1,110.00	1.13%
	GRAND TOTAL		**US$ 97,841.29**	**18,780.33**	**19.19%**	**$ 1,275.56**	**1.30%**	**$ 20,055.89**	**20.50%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Data Inspesaun : 17-05-2022

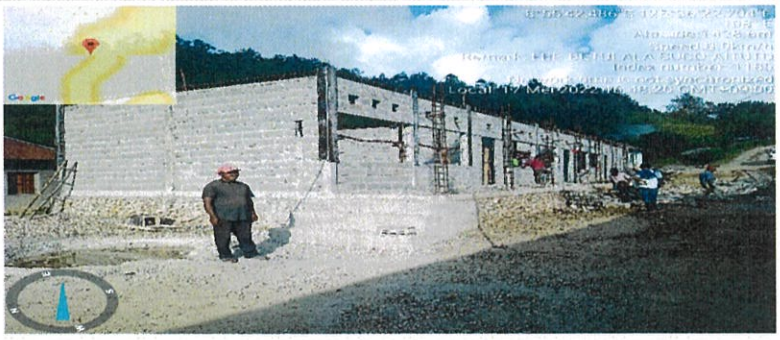
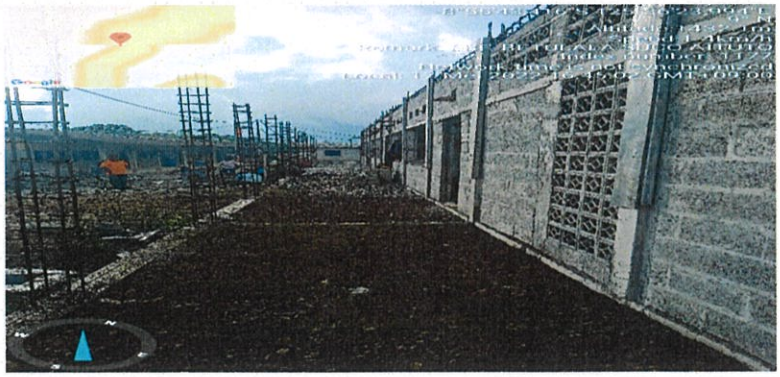
Fatin Inspesaun :Betula/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere bloku hada hotu ona e agora preparasaun ba fui sinta leten.	 

ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Projeito refere bloku hada hotu ona e agora preparasaun ba fui sinta leten.	
	

ANEXU# MBS-22#

Back-up Data

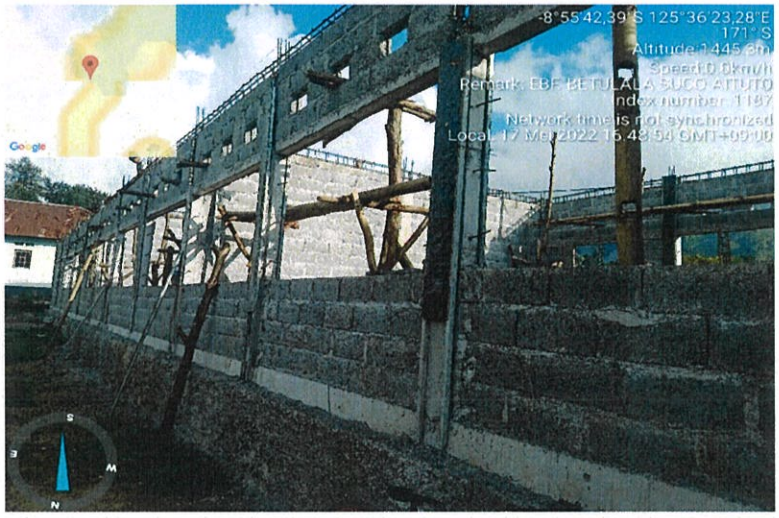
Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL BETULALA

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeito refere bloku hada hotu ona e agora preparasaun ba fui sinta leten.





MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

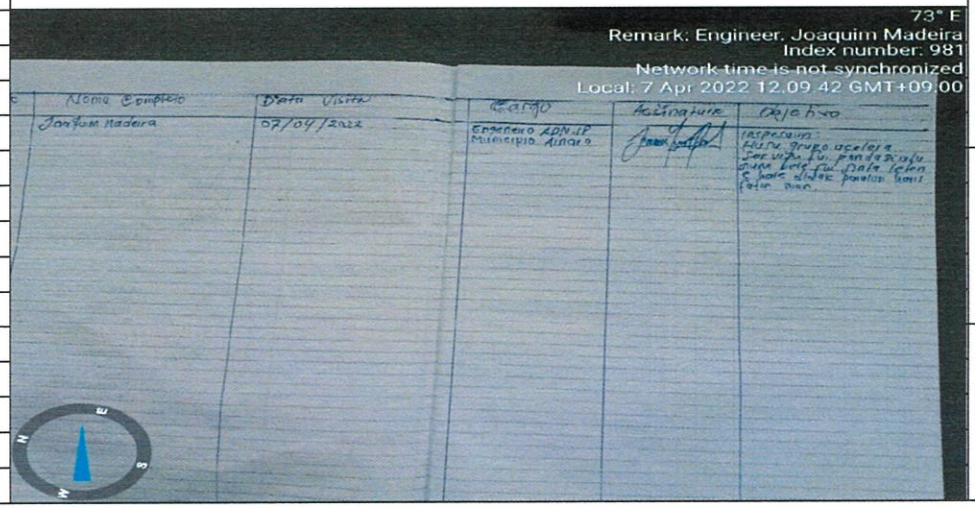
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA FILIAL MAUBISSE

SUCO MANELOBAS, MUNICIPIO AINARO

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	18/05/2022	Maubisse/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu grupo aceleraservisu pondasi nune bele fui sinta leten e mos hare didiak paralon haris fatin nian	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA FILIAL MAUBISSE
LOCATION : SUCO MANELOBAS, MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

 # ANEXU-MBS-11#

	MAIN SUMMARY	Page No	Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
				AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$ 3,575.00	$ 1,600.00	1.61%	$ -	0.00%	$ 1,600.00	1.61%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39 (i)	US$ 50,802.08	$ 8,334.49	8.41%	$ 1,523.34	1.54%	$ 9,857.82	9.95%
III	TOILET BUILDING TB	CB/50	US$ 25,374.31	$ 852.62	0.86%	$ -	0.00%	$ 852.62	0.86%
IV	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$ 10,002.75	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$ 89,754.14**	**10,787.11**	**10.89%**	**1,523.34**	**1.54%**	**$ 12,310.44**	**12.42%**
	CONTIGENCY		US$ 3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$ 6,340.00	**$ 1,567.50**	**1.58%**	$ -	0.00%	$ 1,567.50	1.58%
	GRAND TOTAL		**US$ 99,094.14**	**$ 12,354.61**	**12.47%**	**$ 1,523.34**	**1.54%**	**$ 13,877.94**	**14.00%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,

ANEXU-MBS-11#

Back-up Data

Naran Projeto NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA FILIAL MAUBISSE SUCO MANELOBAS, MUNICIPIO AINARO

Data Inspesaun : 18/05/2022

Fatin Inspesaun :Mane lobas/ Maubesi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long : Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim De C. Madeira

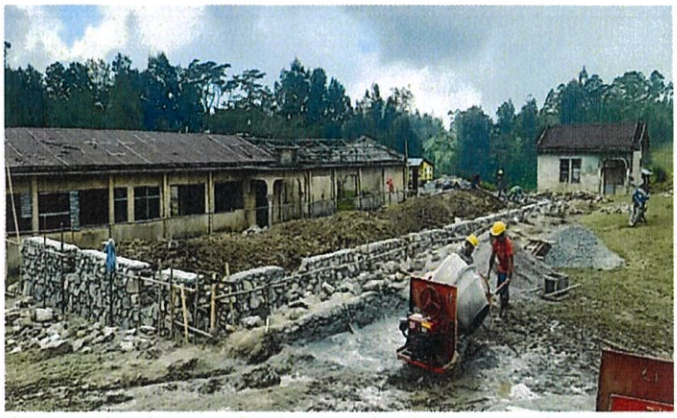
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Sketch & Foto Desenho
Servisu Hada pondasi ba 3 aulas de sala hotu ona e agora preparasaun ba hada bloku 40 x 20 x 10 medida tuir desenho ho b of q nebe iha.	 

ANEXU-MBS-11#

Back-up Data

Naran Projeto NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA FILIAL MAUBISSE SUCO MANELOBAS, MUNICIPIO AINARO

Servisu Hada pondasi ba 3 aulas de sala hotu ona e agora preparasaun ba hada bloku 40 x 20 x 10 medida tuir desenho ho b of q nebe iha.





ANEXU-MBS-11#

Back-up Data

Naran Projeto NOVA CONSTRUCAO ESCOLA ESCOLA FILIAL MAUBISSE SUCO MANELOBAS, MUNICIPIO AINARO

Servisu Hada pondasi ba haris fatin hotu ona e agora preparasaun ba fui sinta okos nian.



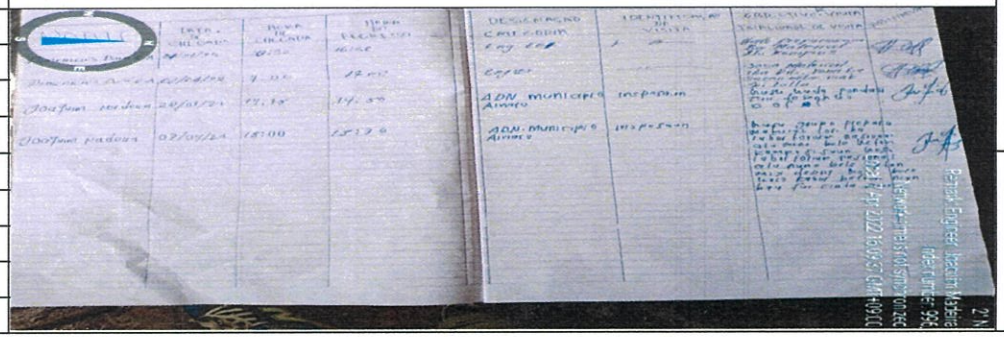
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Kompanha : Grupo Komunitari

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	24/05/2022	Maubisse/ Ainaro	Joaquim Madeira	Teknico	1	Husu grupo prepara material lori ba labortorium nasional atu nune bele hetan komposisaun husi labortorium hodi halo mix design ba fui sinta no airin nian.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENATO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO
LOCATION : SUCO AINARO , POSTO ADMINISTRATIVO AINARO VILA , MUNICIPIO AINARO

SUMMARY

 # ANEXU-MBS-12#

	MAIN SUMMARY	Page No		Amount	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH		UP TO DATE	
					AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %	AMOUNT	PERCENT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	US$	-	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
II	CLASSROOM BUILDING Cb	CB/50	US$	69,396.76	$ 16,236.41	19.49%	$ 6,880.66	8.26%	$ 23,117.08	27.76%
III	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORK	SW/24 (i)	US$	10,890.58	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	CONSTRUCTION COST		**US$**	**80,287.34**	**16,236.41**	**19.49%**	**$ 6,880.66**	**8.26%**	**$ 23,117.08**	**27.76%**
	CONTIGENCY		US$	3,000.00	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	OVERHEAD		US$	-	$ 1,635.00	1.96%	$ -	0.00%	$ 1,635.00	1.96%
	GRAND TOTAL		**US$**	**83,287.34**	**$ 17,871.41**	**21.46%**	**$ 6,880.66**	**8.26%**	**$ 24,752.08**	**29.72%**

Inspesaun Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

ANEXU-MBS-12#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Data Inspesaun **:24/05/2022**

Fatin Inspesaun :Rileco / Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long :, Latetude: End Point : Long : ……,

Latetude: ……

Naran Inspector **: 1. Joaquim de C. Madeira**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Servisu refere hada bloku 40 x 20 x10 hotu ona agora preparasaun ba fui sinta leten nian.	 

ANEXU-MBS-12#
Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Servisu refere hada bloku 40 x 20 x10 hotu ona agora preparasaun ba fui sinta leten nian.	 

ANEXU-MBS-12#
Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RILECO

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu refere hada bloku 40 x 20 x10 hotu ona agora preparasaun ba fui sinta leten nian.





ANEXU C1 (ANV-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14.**
No. kontratu : **SSS/3003/MOPTC-2016**

Data Inspesaun : 12/05/2021

Fatin Inspesaun : Cassa

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º5'42''S Latetude: 125º31'32,052''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere atizi ona 100% iha tinan 2016, maibe companhia sedauk husu pagamento 10% ate a data.	

ANEXU C1 (ANV-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14.**
No. kontratu : **SSS/3003/MOPTC-2016**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere atizi ona 100% iha tinan 2016	
Projetu refere atizi ona 100% iha tinan 2016, maibe companhia sedauk husu pagamento 10% ate a data.	

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.**
No. kontratu : **SSS/142/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : 12/05/2022

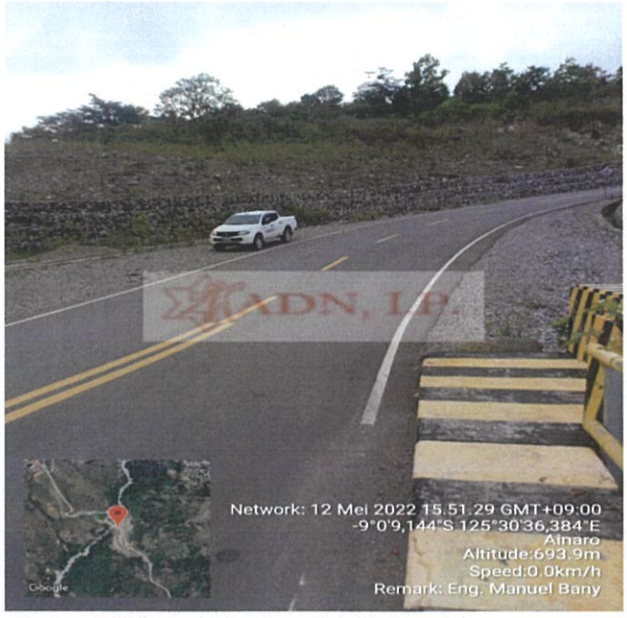
Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º0'15,612''S Latetude: 125º30'39,876''E

End Point : Long : - 9º3'51,231''S Latetude: 125º30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Compahia Komesa halo pemadatan ba estrada nebe hetan estragos iha dia 22-02-2022	

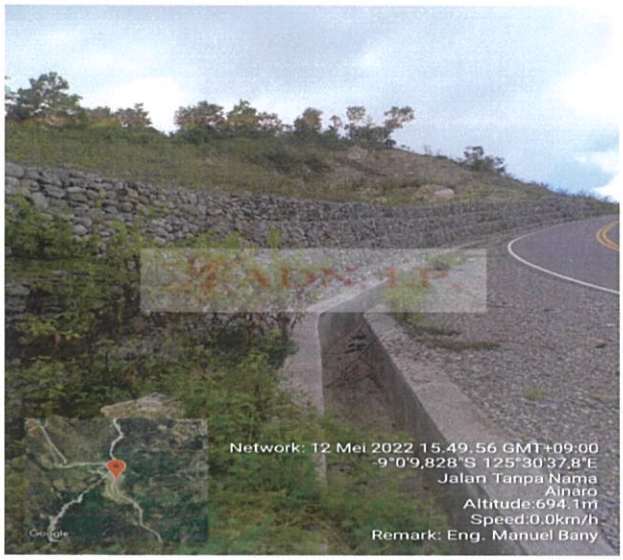
Kondisaun Estrada Sarai

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.**
No. kontratu : **SSS/142/MOPTC-2017**

Compahia Komesa halo pemadatan ba estrada nebe hetan estragos iha dia 22-02-2022



Kondisaun Estrada Sarai

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Compahia Komesa halo pemadatan ba estrada nebe hetan estragos iha dia 22-02-2022	

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.**
No. kontratu : **SSS/142/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : 17/05/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º0'15,612''S Latetude: 125º30'39,876''E

End Point : Long : - 9º3'51,231''S Latetude: 125º30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

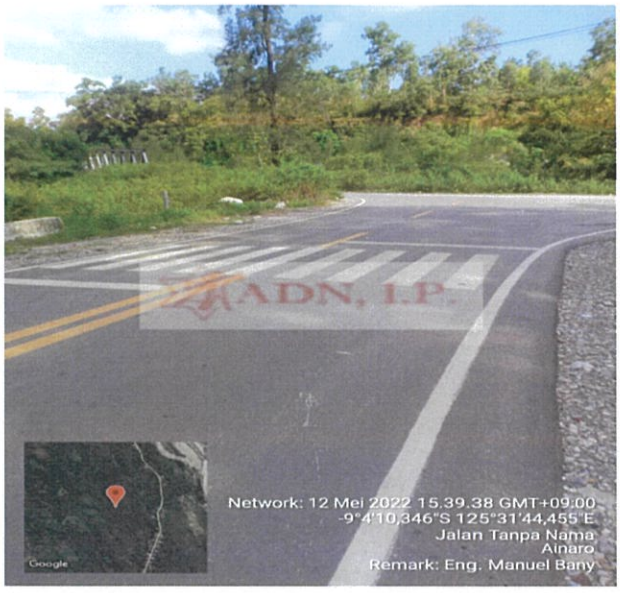
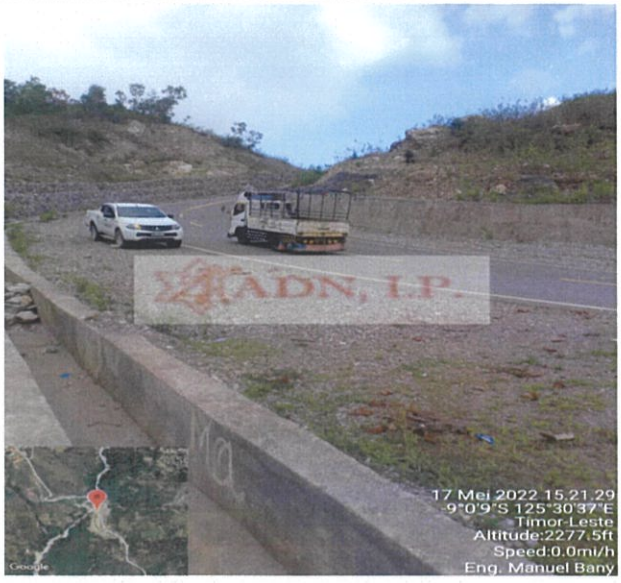
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere sei parado tamba compahia kordena ho owner ba item servisu nebe sei halo iha tereno.	

Kondisaun Estrada Sarai

ANEXU C1 (ANV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III.**
No. kontratu : **SSS/142/MOPTC-2017**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere sei parado tamba compahia kordena ho owner ba item servisu nebe sei halo iha tereno.	
Projetu refere sei parado tamba compahia kordena ho owner ba item servisu nebe sei halo iha tereno.	

ANEXU C1 (ANV-9)

Back-up Data

Naran Projeto : **Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **SSS/005/MOPTC-2013**

Data Inspesaun : 17/05/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila - Sarai

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º0'15,612''S Latetude: 125º30'39,876''E

End Point : Long : - 9º3'51,231''S Latetude: 125º30'37,065''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere sei parado tamba sei hein confirmasaun ho owner ba item servisu balun iha tereno	 **Kondisaun Estrada Sarai**

ANEXU C1 (ANV-9)

Back-up Data

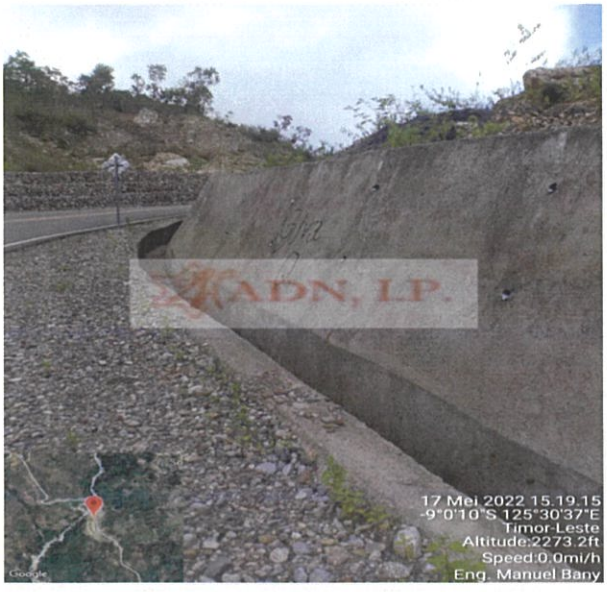
Naran Projeto : **Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality**

No. kontratu : **SSS/005/MOPTC-2013**

Projetu refere sei parado tamba hetan estragus iha dia 22-02-2022.



Projetu refere sei parado tamba hetan estragus iha dia 22-02-2022.



ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro.**

No. kontratu : **35/MACLNSEACLN/X/2019**

Data Inspesaun : 11/05/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º0'59,904''S Latetude: 125º30'12,588''E

End Point : Long : - 9º1'59,496''S Latetude: 125º30'10,206''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Laiha aktivisades servisu iha tereno	

Kondisaun iha Tereno

ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro.**

No. kontratu : **35/MACLNSEACLN/X/2019**

Laiha aktifidade servisu iha tereno



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Laiha aktifidade servisu iha tereno



ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro.**

No. kontratu : **35/MACLNSEACLN/X/2019**

Data Inspesaun : 18/05/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º0'59,904''S Latetude: 125º30'12,588''E

End Point : Long : - 9º1'59,496''S Latetude: 125º30'10,206''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Laiha aktivisades servisu iha tereno	

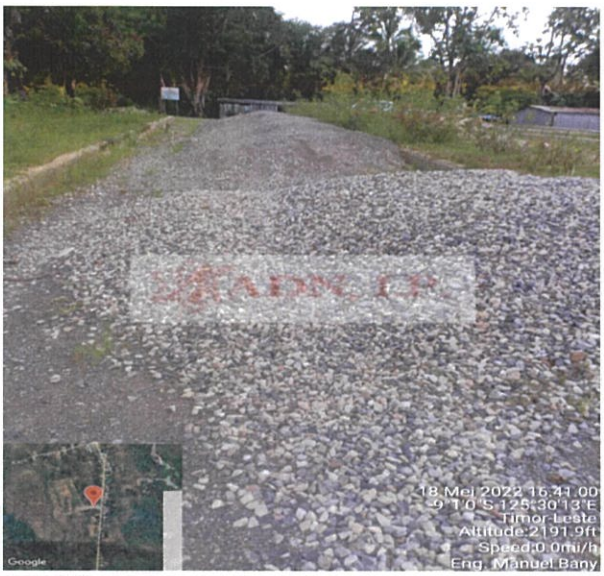
Kondisaun iha Tereno

ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro.**

No. kontratu : **35/MACLNSEACLN/X/2019**

Laiha aktifidade servisu iha tereno	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Laiha aktifidade servisu iha tereno	

ANEXU C1 (ANV-12)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162**

No. kontratu : **MPW-190082**

Data Inspesaun : 03/05/2022

Fatin Inspesaun : Mau Nunu – Mau Ulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -9º0'17,574''S Latetude: 125º29'48,294''E

End Point : Long : -9º0'48,138''S Latetude: 125º28'39,018''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S. C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno
Projetu refere tama ona iha fase Retensaun 10%	 **Kondisaun Manutensaun Obra nebe kaer husi Companhia Haburas Sarai. Unip Lda**

ANEXU C1 (ANV-12)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162**

No. kontratu : **MPW-190082**

Projetu refere tama ona iha fase Retensaun 10%



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno

Projetu refere tama ona iha fase Retensaun 10%



ANEXU C1 (ANV-19)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro-Maununu & Mau Ulu Lau**
No. kontratu : **MPW-190082**

Data Inspesaun : 03/05/2022

Fatin Inspesaun : Mau Nunu – Mau Ulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -9º0'17,574''S Latetude: 125º29'48,294''E

End Point : Long : -9º0'48,138''S Latetude: 125º28'39,018''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S. C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno
Manutensaun (Hamos Duut) husi Maulo – Mau Nunu. Kaer husi companhia Azra	

ANEXU C1 (ANV-19)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro-Maununu & Mau Ulu Lau**
No. kontratu : **MPW-190082**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno
Manutensaun (Hamos Duut) husi Maulo – Mau Nunu	
Manutensaun (Hamos Duut) husi Maulo – Mau Nunu	

ANEXU C1 (HA-4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13).**

No. kontratu : **Marino Enterprises, Lda**

Data Inspesaun : 12/05/2022

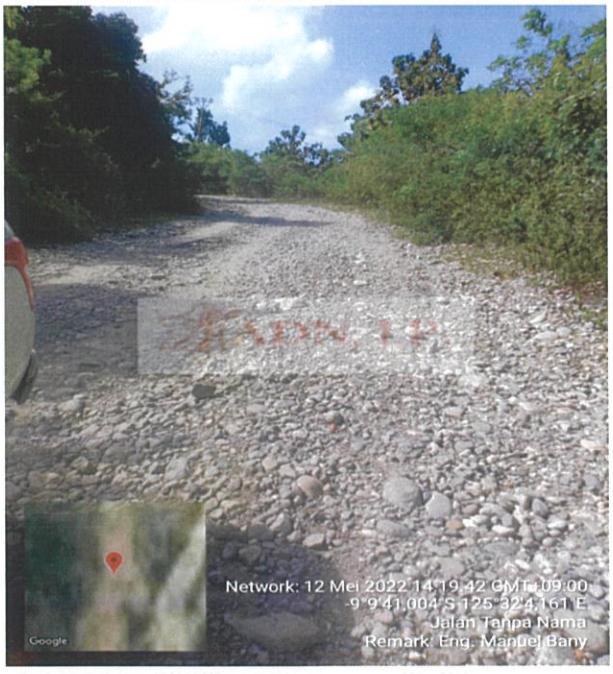
Fatin Inspesaun : Casa – Hatu Udo

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9º8'13,374''S, Latetude: 125º32'36,181''E

End Point : Long : - 9º6'3,84''S, Latetude: 125º40'54,588''E

Naran Inspector : 1. Eng. Manuel Bany da S.C de Carvalho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data Companhia sedauk halo servisu iha tereno	

Kondisaun Estrada Cassa – Hatudo

ANEXU C1 (HA-4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13).**

No. kontratu : **Marino Enterprises, Lda**

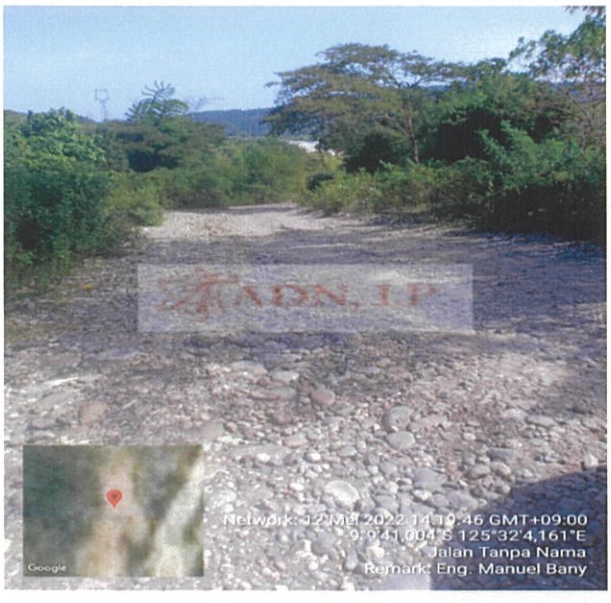
Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data

Companhia sedauk halo servisu iha tereno



Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data

Companhia sedauk halo servisu iha tereno



Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro.**

No. kontratu : **NCB/030/MOP-2020**

Data Inspesaun : 12/05/2021

Fatin Inspesaun : Cassa

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9 821.914 Latetude: 125'3234.949

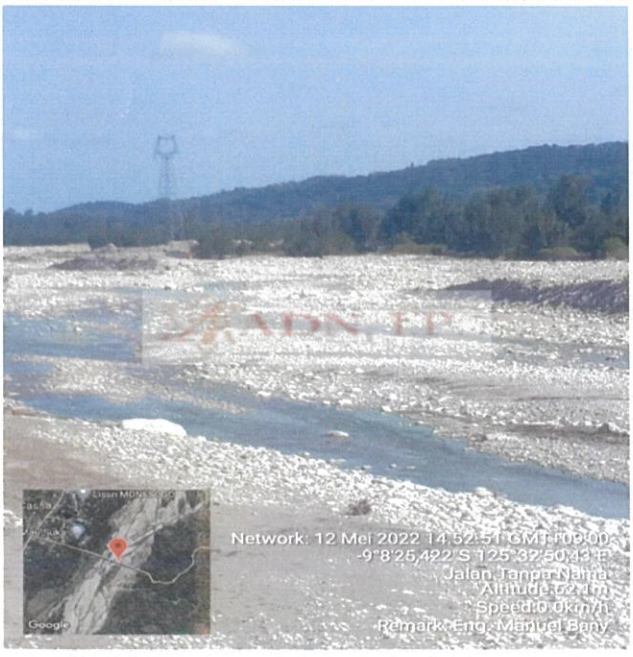
Naran Inspector : 1. Eng. Manuel Bany

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Dalan asesu ba fatin projetu komunidade taka tamba liu husi irigasaun nebe komunidade uja lori halai natar	 Compahia halo hela servisu manutensaun

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro.**

No. kontratu : **NCB/030/MOP-2020**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Normalisaun nebe compahia halo atu asegura servisu ba Torre hetan estragos husi mota	
Normalisaun nebe compahia halo atu asegura servisu ba Torre hetan estragos husi mota	

ANEXU C1 (HTB-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162

No. kontratu : MPW-190104

Data Inspesaun : 10/05/2022

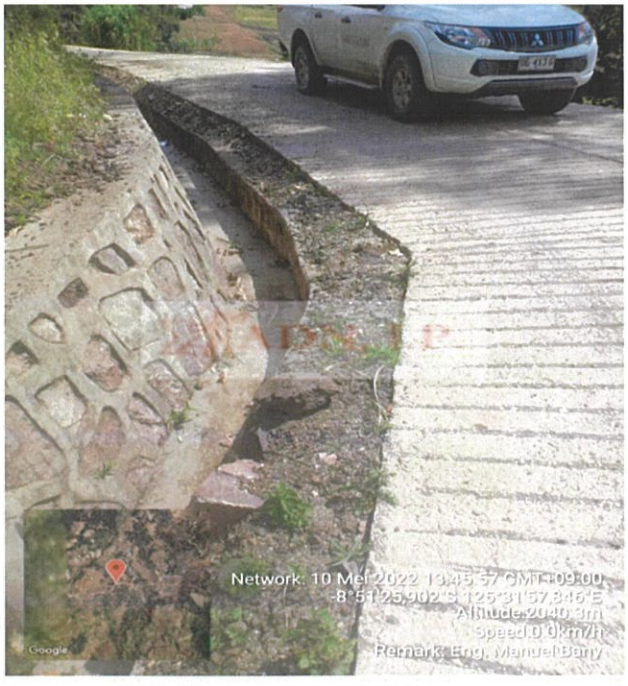
Fatin Inspesaun : Maubisse - Liurai

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'15,906''S Latetude: 125°35'56,839''E

End Point : Long : -8°51'9,714''S Latetude: 125°35'2,79''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

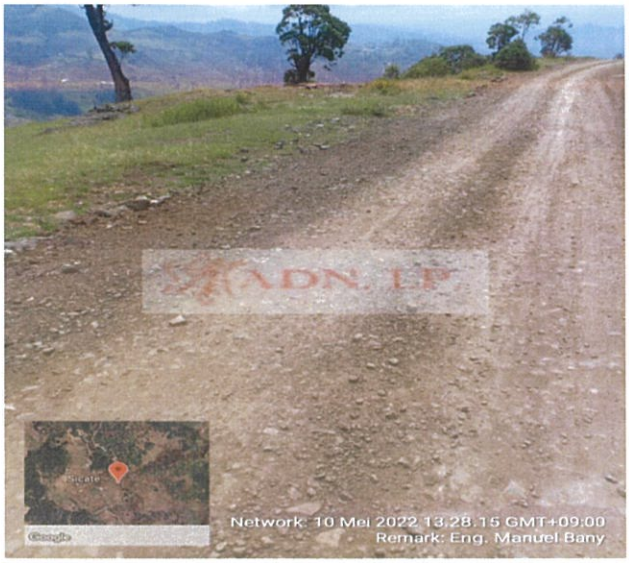
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere sei parado tamba situasaun iklima (udan) halo compahia parado hela servisu iha tereno	

ANEXU C1 (HTB-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162

No. kontratu : MPW-190104

Projetu refere sei parado tamba situasaun iklima (udan) halo compahia parado hela servisu iha tereno	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere sei parado tamba situasaun iklima (udan) halo compahia parado hela servisu iha tereno	

ANEXU C1 (HTB-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162

No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Data Inspesaun : 10/05/2022

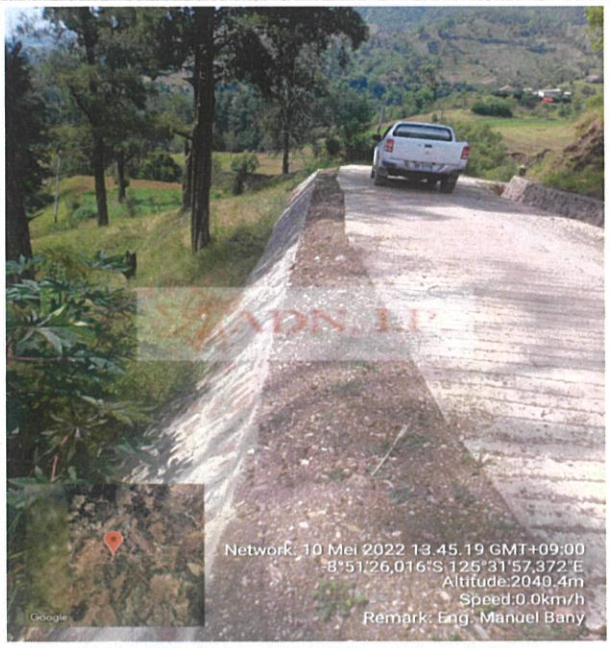
Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8º51'9,42''S Latetude: 125º32'14,91''E

End Point : Long : -8º52'43,776''S Latetude: 125º31'56,1''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

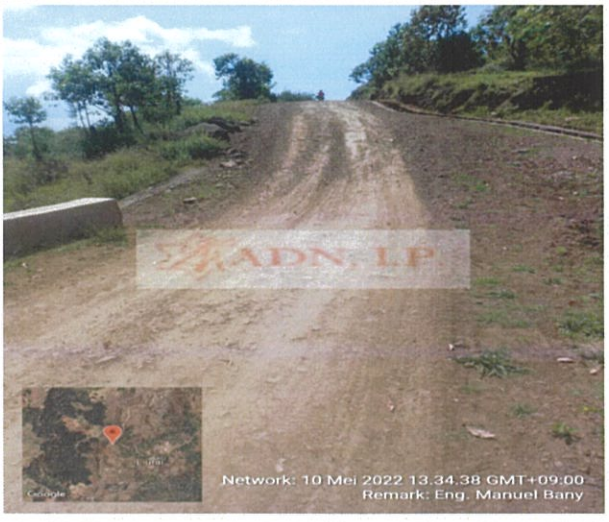
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu sei parado tamba sei kordena ho owner ba servisu iha tereno	

ANEXU C1 (HTB-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162

No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Laiha aktividades servisu iha tereno	
Laiha aktividades servisu iha tereno	

ANEXU C1 (HTB-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162

No. kontratu : MPW-190091

Data Inspesaun : 10/05/2022

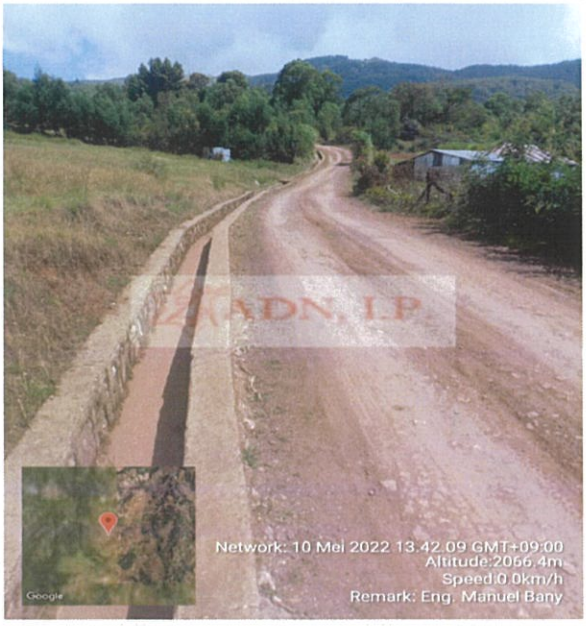
Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°49'55,188''S Latetude: 125°32'30,108''E

End Point : Long : -8°51'9,42''S Latetude: 125°32'14,91''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Laiha aktividade servisu nebe compahia halao iha tereno	

ANEXU C1 (HTB-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162

No. kontratu : MPW-190091

Laiha aktividade servisu nebe compahia halao iha tereno	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Laiha aktividade servisu nebe compahia halao iha tereno	

ANEXU C1 (HTB-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality

No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Data Inspesaun : 10/05/2022

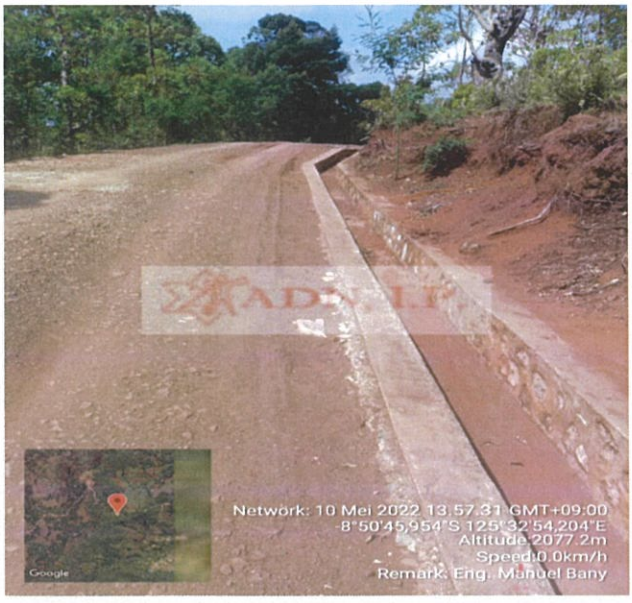
Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8º51'27,798''S Latetude: 125º31'54,408''E

End Point : Long : -8º54'43,776''S Latetude: 125º31'56,1''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Companhia halao hela servisu Routine maintenance iha tereno	

ANEXU C1 (HTB-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality

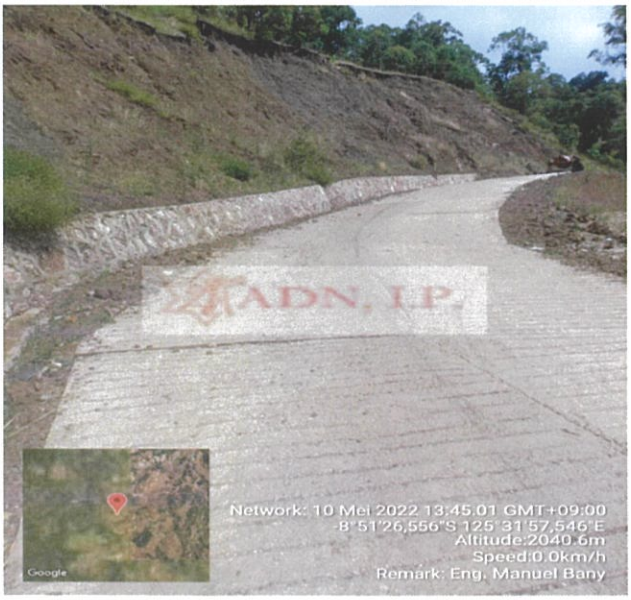
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Companhia halao hela servisu Stone masonry (penahan) iha tereno



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Companhia halao hela servisu Plum Concrete iha tereno (0.20*4*100)



ANEXU C1 (MBS-1)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RT/021/MOP-2019**

Data Inspesaun :26/04/2022

Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°56'4,044''S, Latetude: 125°35'48,432''E

End Point : Long : - 8°56'19,926''S, Latetude: 125°35'12,066''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Compahia halao hela servisu ba moru protesaun ba estrada rural	

ANEXU C1 (MBS-1)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RT/021/MOP-2019**

Compahia halao hela servisu ba moru protesaun ba estrada rural	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Compahia halao hela servisu ba moru protesaun ba estrada rural	

ANEXU C1 (MBS-8)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162.**

No. kontratu : **MPW-190076**

Data Inspesaun : 24/05/2022

Fatin Inspesaun : Mausiga - Lesuati

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8º56'19,926''S, Latetude: 125º35'12,066''E

End Point : Long : - 8º56'34,906''S, Latetude: 125º32'46,032''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere tama hela iha fase Retensaun 10%	

ANEXU C1 (MBS-8)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162.**

No. kontratu : **MPW-190076**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere tama hela iha fase Retensaun 10%	
Projetu refere tama hela iha fase Retensaun 10%	

ANEXU C1 (MBS-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162**

No. kontratu : **MPW-190087**

Data Inspesaun : 13/05/2022

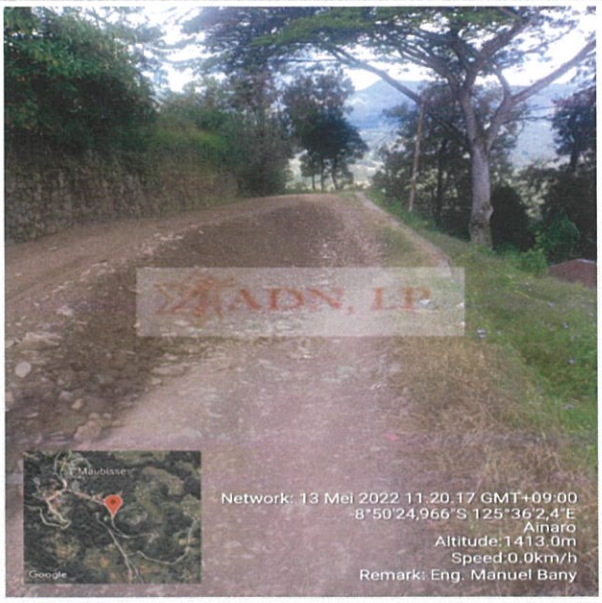
Fatin Inspesaun : Maubise - Urlepha

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8º50'22,65''S, Latetude: 125º36'2,232''E

End Point : Long : - 8º50'13,632''S, Latetude: 125º36'43,416''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C.de Carvalho

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projetu refere hela retensaun 10%	

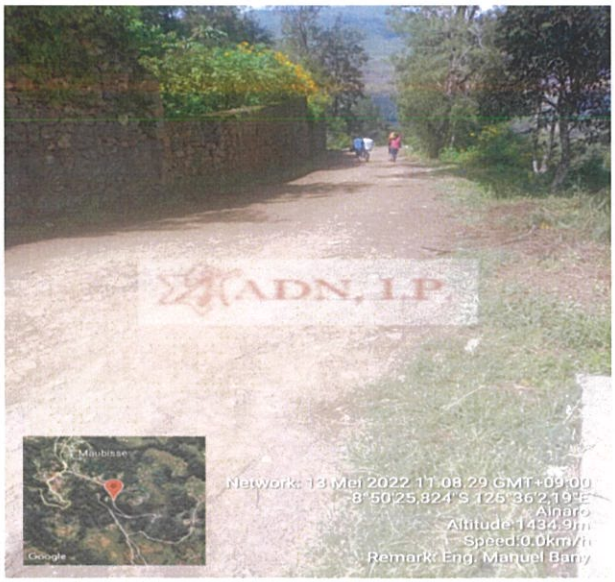
ANEXU C1 (MBS-10)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162**

No. kontratu : **MPW-190087**

Projetu refere hela retensaun 10%



Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projetu refere hela retensaun 10%



ANEXU C1 (MBS-15)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200
No. kontratu : MPW-W-210066

Data Inspesaun : 10/05/2022

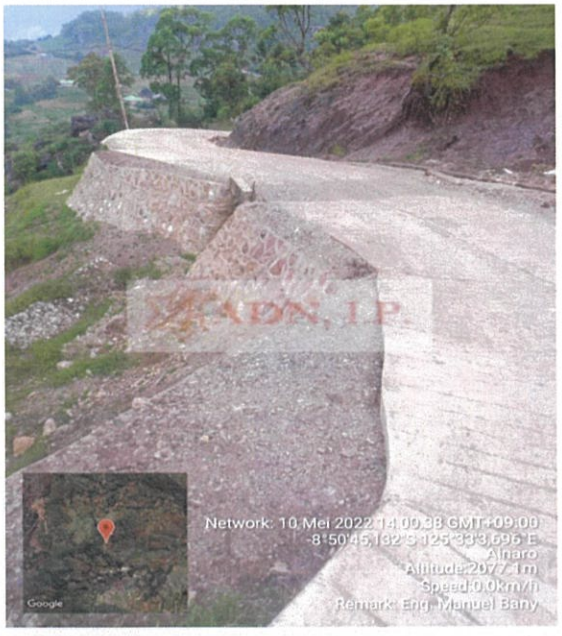
Fatin Inspesaun : Maubisse - Liurai

Koordinadas :

Start Point : Long : -8º51'15,906''S Latetude: 125º35'56,839''E

End Point : Long : -8º51'9,714''S Latetude: 125º35'2,79''E

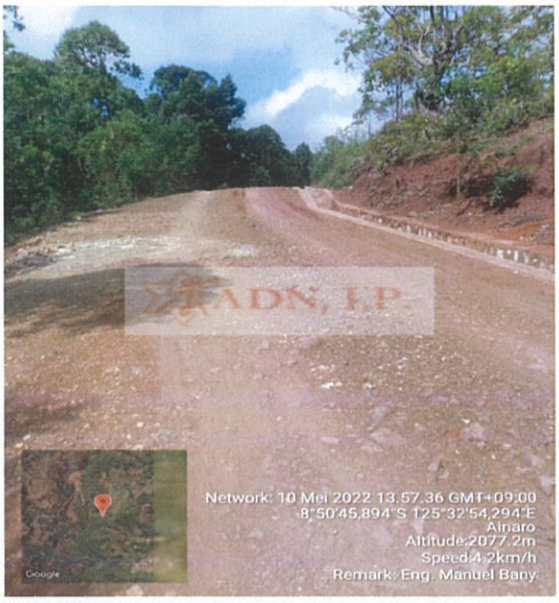
Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Kondisaun Estrada Maubisse – Hatubolico companhia halao servisu iha tereno ba item Stone Masonry	

ANEXU C1 (MBS-15)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200
No. kontratu : MPW-W-210066

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Companhia halao servisu iha tereno ba item Plum Concrete (0.20*4*150)	
Companhia halao servisu iha tereno ba item Gravel	

#ANEXU C1 (ANV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366**

Data Inspesaun : 17/5/2022

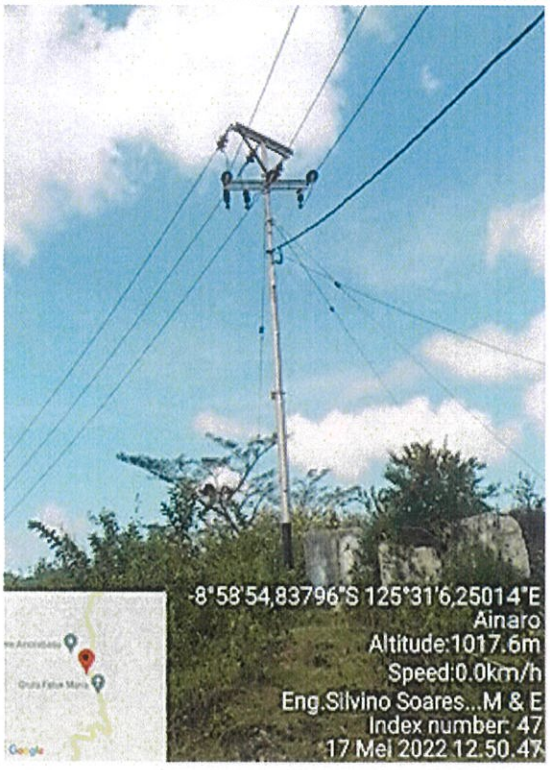
Fatin Inspesaun : Ainaro – Fatuk Maria

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,58.56.76, Latetude: 125,31.74.76

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

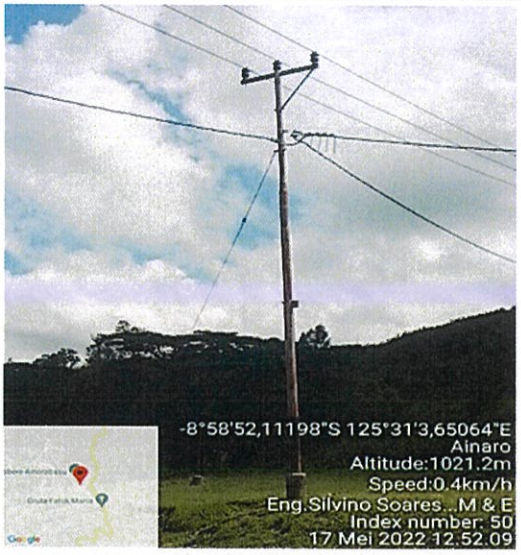
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ..... Laiha Ona Espaso Hodi Kontinua Obra	

#ANEXU C1 (ANV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality

Kompanha : Laxana Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	17/5/2022	AINARO / AINARO VILA	SILVINO D. R. R. SOARES	TEKNIKO M & E, ADN - I.P	1	Pinta Airing Nebe Mak Tinta Sai Hotu Tena	
					2	Tesi Ai Nebe Mak Besik Ba Linha MV & LV	
					3	Halos Airing 9m Nebe Mak Halis	
					4	Stika Schoor Nebe Mak Mamar e Troka Schoor Nebe Mak Kotu	
					5	Muda Tiang 9M ida besik skola (kona uma skola)	
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

#ANEXU C1 (ANV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417**

Data Inspesaun : 17/5/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila – Mau Ulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,58.56.76, Latetude: 125,31.74.76

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ..... Laiha Ona Espaso Hodi Kontinua Obra	

#ANEXU C1 (ANV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Mau - Ulo1, Mau - Ulo2 - Ainaro Municipality

Kompanha : Mantilo Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	17/5/2022	AINARO / AINARO VILA	SILVINO D. R. R. SOARES	TEKNIKO M & E, ADN - I.P	1	Pinta Airing Nebe Mak Tinta Sai Hotu Tena	
					2	Tesi Ai Nebe Mak Besik Ba Linha MV & LV	
					3	Halos Airing 9m Nebe Mak Halis	
					4	Stika Schoor Nebe Mak Mamar e Troka Schoor Nebe Mak Kotu	
					5	Muda Tiang 9M ida besik skola (kona uma skola)	
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

#ANEXU C1 (ANV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415**

Data Inspesaun : 17/5/2022

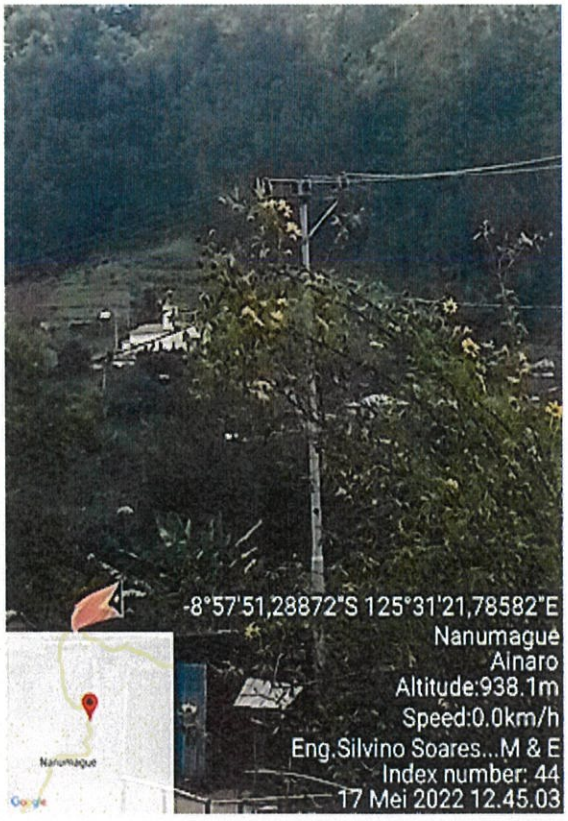
Fatin Inspesaun : Ainaro - Hatubuilico

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,54.61.98, Latetude: 125,31.12.62

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ..... Laiha Aktividade Iha Tereno	

#ANEXU C1 (ANV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……	

#ANEXU C1 (ANV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..…..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatubuilico - Ainaro Municipality

Kompanha : Terolau Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	17/5/2022	AINARO / AINARO VILA	SILVINO D. R. R. SOARES	TEKNIKO M & E, ADN - I.P	1	Pinta Airing Nebe Mak Tinta Sai Hotu Tena	
					2	Tesi Ai Nebe Mak Besik Ba Linha MV & LV	
					3	Halos Airing 9m Nebe Mak Halis	
					4	Stika Schoor Nebe Mak Mamar e Troka Schoor Nebe Mak Kotu	
					5	Muda Tiang 9M ida besik skola (kona uma skola)	
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

#ANEXU C1 (HTB-11)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423

Data Inspesaun : 17/5/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro – Mausiga

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,55.51.01, Latetude: 125.36.21.45

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

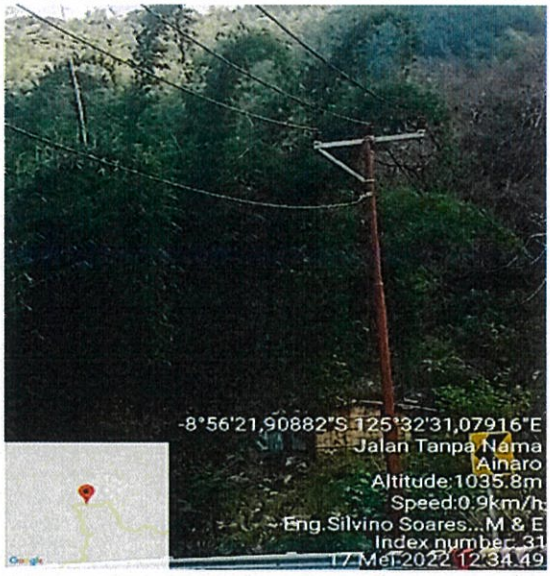
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ..... Laiha Aktividade Iha Tereno	

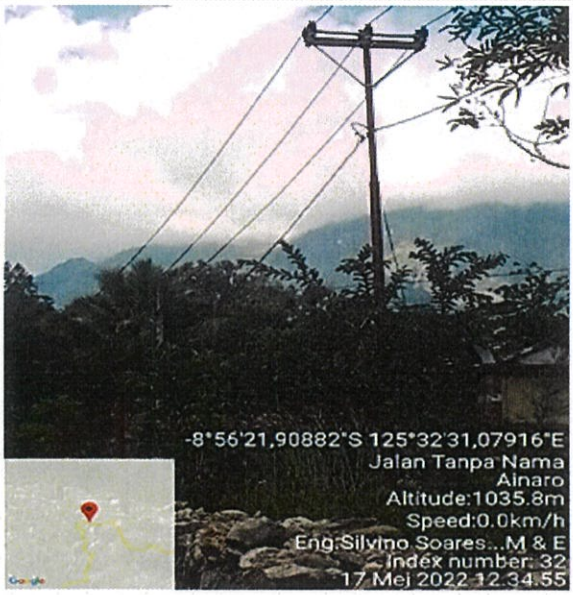
#ANEXU C1 (HTB-11)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……	

#ANEXU C1 (HTB-11)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality

Kompanha : Se-Mauhin Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	17/5/2022	AINARO / HATUBUILICO	SILVINO D. R. R. SOARES	TEKNIKO M & E, ADN - I.P	1	Pinta Airing Nebe Mak Tinta Sai Hotu Tena	
					2	Tesi Ai Nebe Mak Besik Ba Linha MV & LV	
					3	Halos Airing 9m ho 12m Nebe Mak Halis	
					4	Stika Schoor Nebe Mak Mamar e Troka Schoor Nebe Mak Kotu	
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

#ANEXU C1 (MBS-4)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323**

Data Inspesaun : 17/5/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro - Maubisse

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,52.18.55, Latetude: 125,35.20.41

End Point : Long : ....., Latetude: .....

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

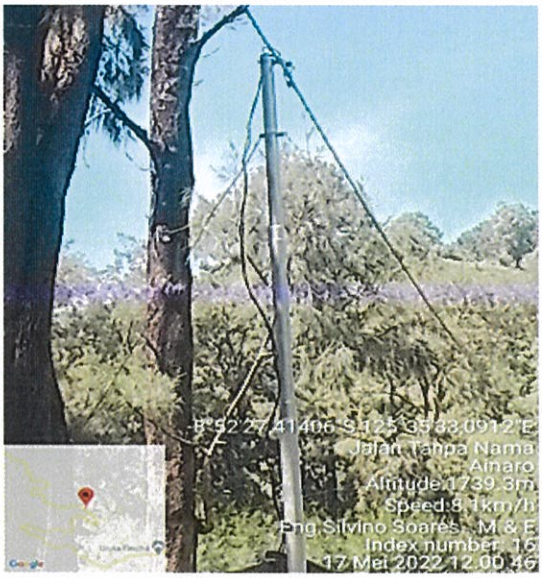
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ..... Espaso Laiha Ona Hodi Kontinua Obra	

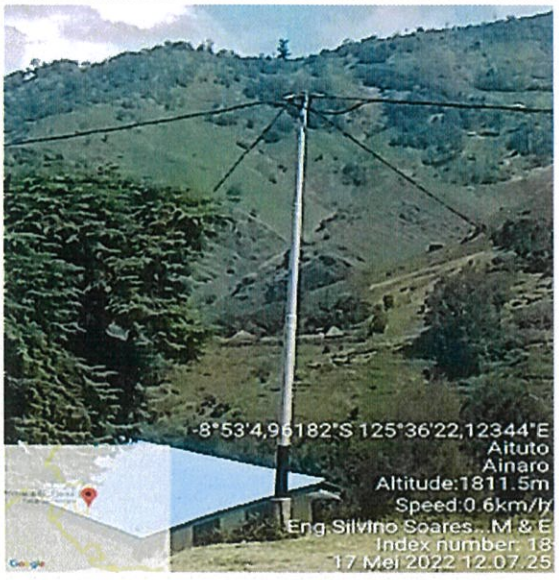
#ANEXU C1 (MBS-4)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality

Kompanha : Lotas Unip., Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	17/5/2022	AINARO / MAUBISSE	SILVINO D. R. R. SOARES	TEKNIKO M & E ADN - I.P	1	Tenki Halo Los Airing Antes Atu Cor e Tenki Uja Besi 6mm	
					2	Pinta Ulang Airing Nebe Mak Tinta Sai Hotu Ona	
					3	Tesi Ai Nebe Mak Besik Ba Linha MV & Linha LV	
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

#ANEXU C1 (MBS-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351**

Data Inspesaun : 18/5/2022

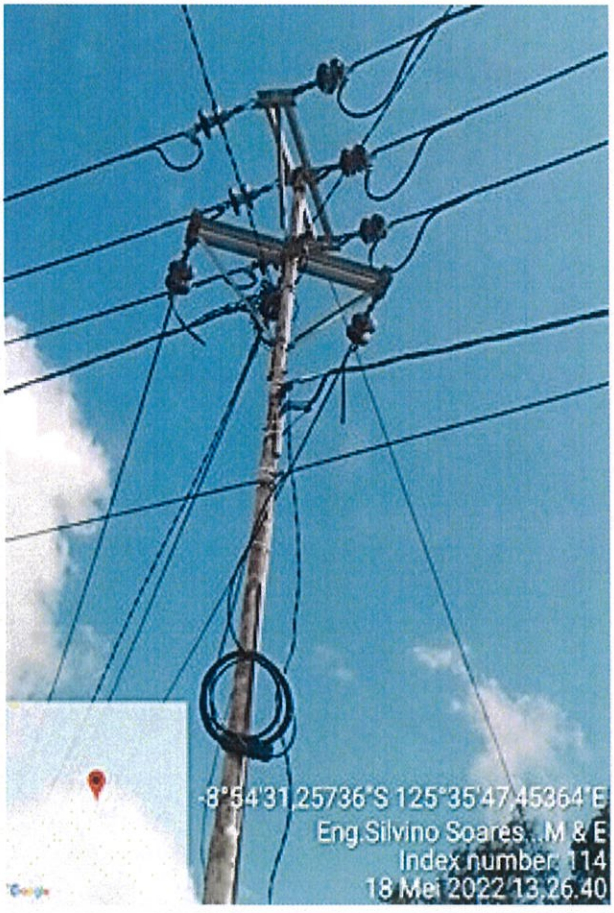
Fatin Inspesaun : Ainaro – Simpang Tiga Flexia

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,53.78, Latetude: 125,36.14.46

End Point : Long : -8,55.50.89, Latetude: 125,36.21.31

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu …… Hela Retensaun 10% Maibe EDTL,I.P Municipio Mak Sedauk Halo Karta Termo de Entrega	

#ANEXU C1 (MBS-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	
	


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality

Kompanha : Petaju Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	18/5/2022	Ainaro / Maubisse	Silvino D. R. R. Soares	Teknik Electricidade	1	Tenki Hadia Schoor kotu pin Kleuk	
					2	Troka Pin Nakfera	
					3	Tenki Monta Strut Arm ladauk	
					4	Tenki Pinta Fali Airing Nebe Mak Tinta Sai Hotu Ona	
					5	Tenki Halos Airing Kleuk	
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

#ANEXU C1 (MBS-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401**

Data Inspesaun : 25/5/2022

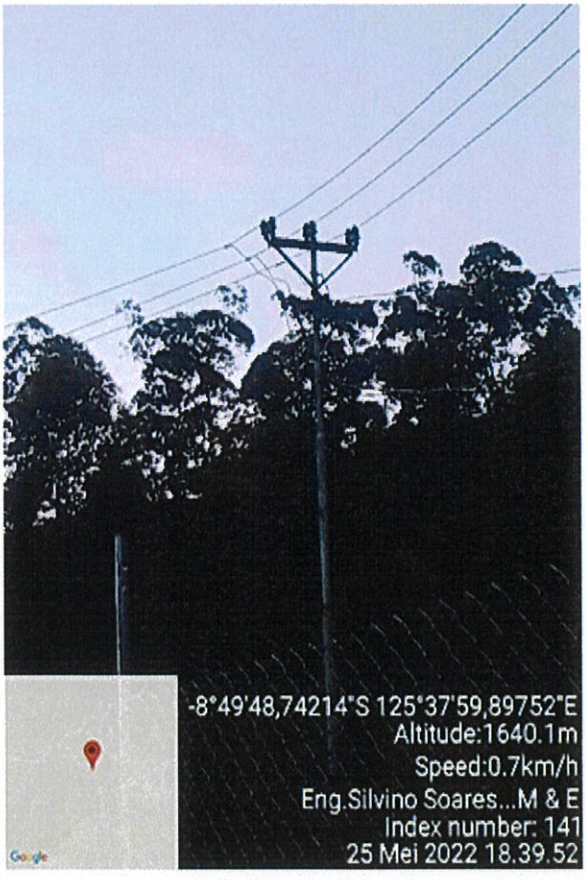
Fatin Inspesaun : Ainaro - Maubisse

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,49.48.14, Latetude: 125,37.59.44

End Point : Long : -8,50.53.88, Latetude: 125,39.66.84

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

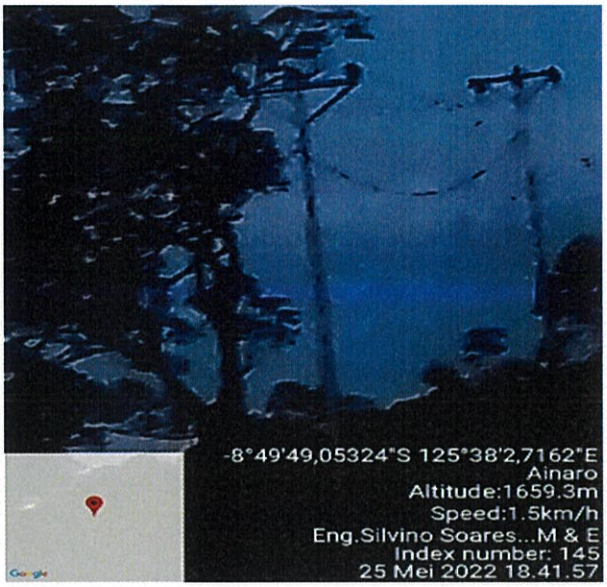
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu …… Aktividade Iha Tereno Laiha e Tenki Hadia Konstruksaun	

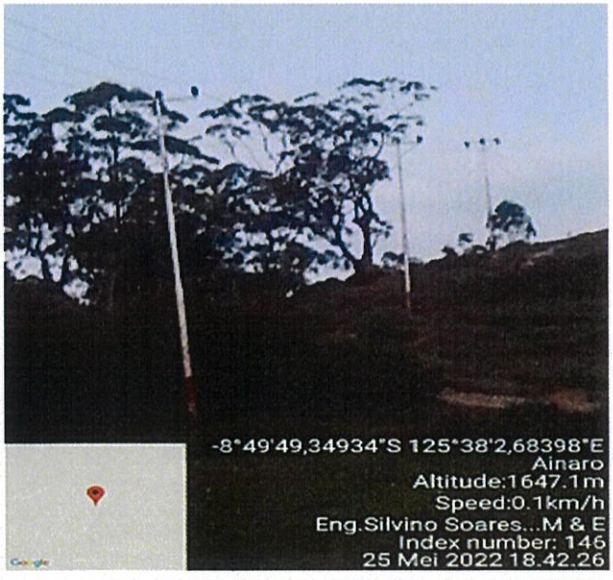
#ANEXU C1 (MBS-6)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……	


MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco E

Kompanha : Ria Tu Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	25/5/2022	Ainaro / Maubisse	Silvino D. R. R. Soares	Eng. Electricidade	1	Tenki halo los aring mak foin cor	
					2	Bainhira atu cor tenki uja besi 6mm e tenki ke'e tun ± 30cm	
					3	Tenki hadia fiu nebe mak monu e troka aring nebe mak tohar	
					4	Tenki tesi ai nebe mak besik ba linha MV line ho LV line	
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

#ANEXU C1 (MBS-7)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318**

Data Inspesaun : 17/5/2022

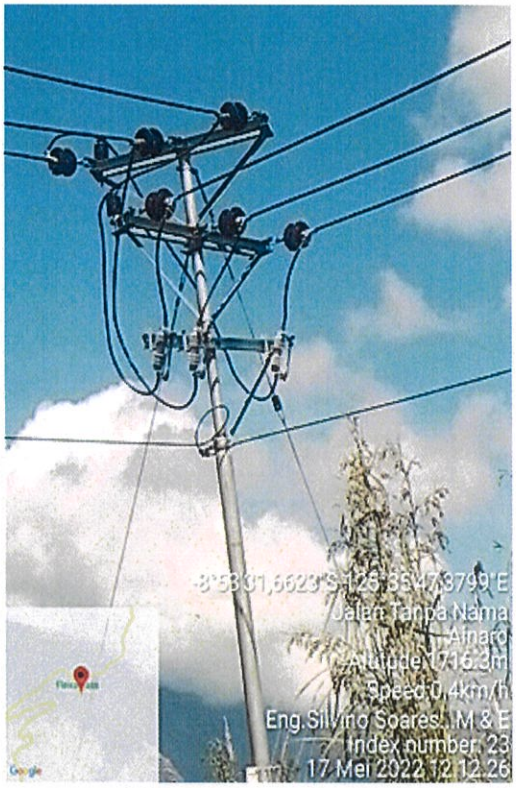
Fatin Inspesaun : Ainaro - Feleixa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,53.30.19, Latetude: 125,35.46.92

End Point : Long : -8,55.56.04, Latetude: 125,33.35.92

Naran Inspector : 1. Silvino D. R. Rebelo Soares

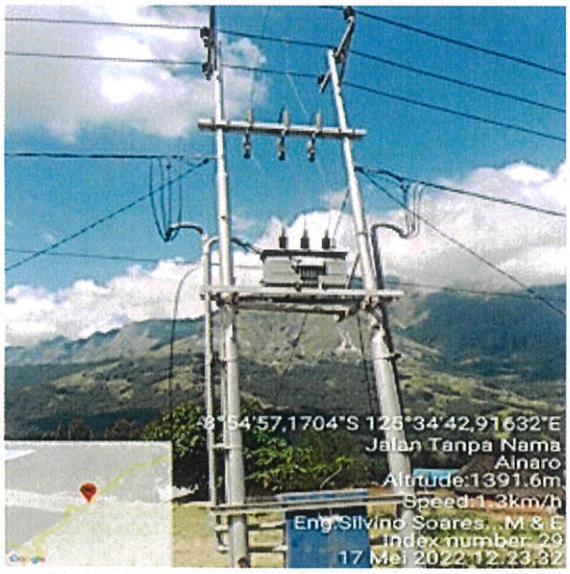
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	

#ANEXU C1 (MBS-7)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality.**

No. kontratu : **RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	
	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality

Kompanha : Tuto Deni Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	17/5/2022	Ainaro / Maubisse	Silvino D. R. R. Soares	Teknik Electricidade	1	Hadia Pin Pos Nebe Mak Kleuk	
					2	Hadia Schoor Nebe Mak Mamar	
					3	Halos Poste Nebe Mak Halis	
					4	Troka Schoor Nebe Mak Kotu	
					5	Tenki Muda Ba Konstruksaun TM5	
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO TL. GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

2022

Naran Eng.	**Silvino Domingos Rita Rebelo Soares**
Municipio	**MUNICIPIO AINARO NO POSTOS**

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	MAIO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS
AINARO VILA (ANV)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	10	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	Gos	71/GAM-AIN MAE/II/2018	PDIM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																
							Actual																																
	15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	Simbissa	389/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
HATUBUILICO (HTB)	35	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
MAUBISSE (MBS)	38	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	39	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libutu - Ainaro Municipality	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	40	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	41	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	47	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																
							Actual																																
	48	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	63	New Construction for ICU Building in Referal Hospital Maubisse, Timor-Leste	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	Fundo Covid-19	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	67	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	68	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	69	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	70	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Procesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Silvino D.R. Rebelo Soares)
Eng. Electricidade - ADN - I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN - I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN - I.P

MINISTERIO DO PLANU & ORDENAMENTU TERRITORIU

ADN, I.P
Agensia Desenvolvimentu Nasional Infraestrutura Publika

Naran Eng.	**Silvino Domingos Rita Rebelo Soares**
Municipio	**MUNICIPIO AINARO NO POSTOS**

PLANU INSPESAUN

2022

MAIO

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS
AINARO VILA (ANV)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Ciloko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	10	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	Gos	71/GAM-AIN MAE/II/2018	PDIM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																
							Actual																																
	15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	Simbissa	389/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
HATUBULICO (HTB)	35	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	38	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	39	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	40	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	41	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
MAUBISSE (MBS)	42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	47	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																
							Actual																																
	48	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	63	New Construction for ICU Building in Referal Hospital Maubisse, Timor-Leste	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	Fundo Covid-19	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	67	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	68	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	69	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	70	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
		TOTAL PROJETO ON-GOING																																					

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Procesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Silvino D. R. Rebelo Soares)
Eng. Electricidade - ADN - I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN - I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN - I.P

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO TERRITORIAL

ADN, I.P.

Naran Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho

Municipio MUNICIPIO AINARO NO POSTOS

PLANU INSPESAUN

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	May 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS
AINARO VILA (ANV)	5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	Consorcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Projetu refere 100% iha 2016 maibe companhia sedauk husu retensaun 10% ate a data
							Actual																																
	6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		On Going
							Actual																																
	8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy	WTJ Contraction Unipesoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Projetu refere sei parado tamba afeita husi Kalamidade 04/04/2021
							Actual																																
	9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																		
	11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	Balada Unip Lda	35/MAC.LNSEACLN/X/2019	LM	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																																		Projeito refere sei parado tamba sei konfirma ho owner konaba item adicional
							Actual																																
	12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Hela retensaun 10%
							Actual																																
	19	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklima (Udan) halo compahia labele halo servisu normal iha tereno
							Actual																																
	20	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Projetu refere parado iha tinan 2016 ate a data
							Actual																																
	22	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Projetu refere parado iha tinan 2018 ate a data
							Actual																																
HATUDO (HA)	3	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	Yoku Unip Lda	NCB/030/MOP-2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklima (Udan) halo compahia labele halo servisu normal iha tereno
							Actual																																
	4	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
							Actual																																
HATUBULICO (HTB)	1	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	Gos Unip Lda	MPW-190104	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Hela retensaun 10%
							Actual																																
	2	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Hela retensaun 10%
							Actual																																
	3	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	Betua Calda Unip Lda	MPW-190094	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Projetu refere ADN I.P Halo tia ona pagamento Retensaun (10%) iha tinan 2019. Husu atu here fila fali dadus pagamento
							Actual																																
	4	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	Ailesu Unip Lda	MPW-190091	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Hela retensaun 10%
							Actual																																
	5	Spot Improvement Liuirai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	Betua Calda Unip Lda	MPW-W-210062	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		On Going
							Actual																																

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO

ADN, I.P

Naran Eng.	Manuel Bany da S. C. de Carvalho
Municipio	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS

PLANU INSPESAUN

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	May 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS
MAUBISSE (MBS)	1	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																	
	2	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklima (Udan) halo compahia labele halo servisu normal iha tereno
							Actual																																	
	8	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	Leotylia Enterprises	MPW-190076	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklima (Udan) halo compahia labele halo servisu normal iha tereno
							Actual																																	
	10	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	Delong Unip Lda	MPW-190087	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Hela retensaun 10%
							Actual																																	
	15	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	Leotylia Enterprises	MPW-W-210066	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	On Going
							Actual																																	
	16	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklima (Udan) halo compahia labele halo servisu normal iha tereno
							Actual																																	
	18	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data
							Actual																																	
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Procesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projetu Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng.Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN,I.P

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Joaquim de C. Madeira

Municipio MUNICIPIO AINARO NO POSTOS

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	MAIO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS
AINARO VILA (ANV)	1	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		ABANDONA
							Actual																																	
	2	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	Simbissa Unip.Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		ABANDONA
							Actual																																	
	3	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																		ABANDONA
							Actual																																	
	4	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	PDIM	ESTATAL	Plan																																		ABANDONA
							Actual																																	
	5	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG. FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO AINARO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																		LAO HELA
							Actual																																	
	6	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																		LAO HELA
							Actual																																	
	7	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																		LAO HELA
							Actual																																	
	8	New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro	Atramor Unip Lda		LM	MSSI	Plan																																		PARADO
							Actual																																	
							Plan																																	
							Actual																																	
							Plan																																	
							Actual																																	
HATUDO (HA)	1	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																		LAO HELA
							Actual																																	
	2	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																		LAO HELA
							Actual																																	
	3	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBF. FATU-META))	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																		SEI DAUK BA INSPESAUN PROJEITO REFERETAMBA IHA MOTA SORIN NO UDAN HALO MOTA BOOT E BA LADIAK
							Actual																																	
							Plan																																	
							Actual																																	
							Plan																																	
							Actual																																	
HATUBULICO (HTB)	1	Rehabilitasaun Pousada Hatobuilico	Levi Construction Unip.Lda	073/GMTAC/x/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																		ABANDONA
							Actual																																	
	2	Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																		LAO HELA
							Actual																																	
	3	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																		LAO HELA
							Actual																																	
	4	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																		LAO HELA
							Actual																																	
							Plan																																	
							Actual																																	
							Plan																																	
							Actual																																	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Joaquim de C. Madeira

Municipio MUNICIPIO AINARO NO POSTOS

2022

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	MAIO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS
MAUBISSE (MBS)	1	Rehabilitation of Pousada Maubisse-Municipio Ainaro	Guerry II Unip.Lda	RDTL-74/GMTAC/X/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																	ABANDONA
							Actual																																	
	2						Plan																																	
							Actual																																	
	3	Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Maubisse	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																PROJEITO REFERE FINAL ONA MAS KOMPANHIA SEDAUK HATAMA DOKUMENTUS PAGAMENTO 100%
							Actual																																	
	4	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PROJEITO REFERE FINAL ONA MAS KOMPANHIA SEDAUK HATAMA DOKUMENTUS PAGAMENTO 100%
							Actual																																	
	5	Konstrusaun ICU Room Maubesse	El Constructio Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																PROJEITO REFERE FINAL ONA MAS KOMPANHIA SEDAUK HATAMA DOKUMENTUS PAGAMENTO 100%
							Actual																																	
	6	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet, Cuzina no Armagem no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (BERMOLI MAULAU)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																LAO HELA
							Actual																																	
	7	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Lumluli)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																LAO HELA
							Actual																																	
	8	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manelobas Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Maneloba)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																LAO HELA
							Actual																																	
	9	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Russulau)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																LAO HELA
							Actual																																	
	10	Construção de Salas de Aulas 6 + Toilet no Suco Manetu Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Manetu)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																SEIDAUK BA INSPESAUN TAMBA UDAN HELA DEIT DALAN KOIS NO AAT.
							Actual																																	
	11	**Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Rileco Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro**	**Grupo Komunitario**	**023/DNDPE-MEJD/I/2022**	**PKRIE**	**EDUCAÇÃO**	Plan																																LAO HELA
							Actual																																	
	12	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Aituto Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Betulala)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																LAO HELA
							Actual																																	
							Plan																																	
							Actual																																	
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Procesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Ainaro
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng.Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN, I.P
