REPÚBLIKA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Dezenvolvimento Nacional, Instituto Público

A.D.N, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

RELATORIU MENSAL IMPLEMENTASAUN PROJETUS MUNISIPIU LIQUISA

AGOSTU 2021



SUMÁRIO

RELATÓRIO
IMPLEMENTASAUN PROJETU INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO LIQUICA AGOSTU 2021

Prepara Husi :

(Eng.Juninho Antonio A. Da Cruz)
Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Liquica ADN, I.P

(Eng. Marcus Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projetu Infraestrutura,Transporte e Irigasaun, Municipio Liquica ADN, I.P

Verifika Husi :

(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, ADN, I.P

(Eng. Aniceto da Costa)
Eng. Senior ba Projetu Infraestrutura Transporte e Irigasaun, ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T, M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO 1

I. INTRODUSAUN. 3

1.1 Enkuadramentu Legal. 3

1.2 Perfil Municipio Liquisa 3

1.3 Lista Projecto 7

II. PROGRESU FISIKU 19

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan 19

III OBSTÁKLU IHA TERENU 19

3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu 19

VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU 20

4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu 20

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias 4

Tabela 1. 1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquisa 5

Tabela 1. 2: Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquica 5

Tabela 1.3. 1 Projecto Municipio Ermera Por Fundus Financimento 7

Tabela 1.3. 2 Projecto Muncipio Liquica Por Sectores 10

Tabela 1.3. 3 Projecto Municipio Ermera Por Ministerios 16

Tabela 4. 1 : Dadus populasaun Munisipiu Liquica 19

I. INTRODUSAUN.

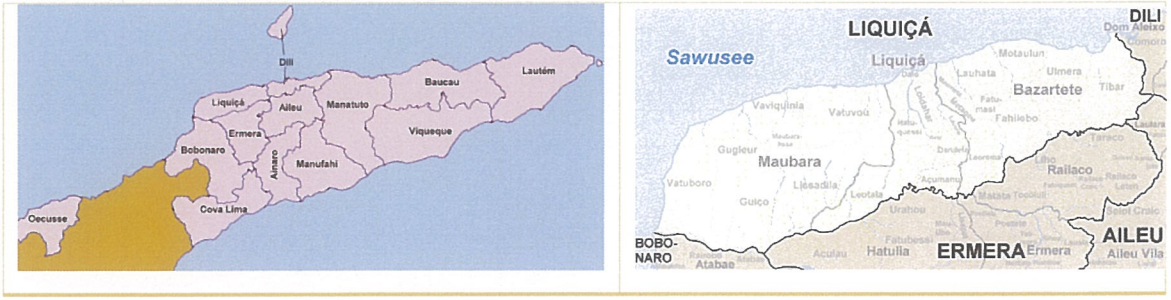
1.1 Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Púbico (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análize kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viavél.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Púbico (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvimentu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvimentu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 PERFIL MUNICIPIO LIQUISA



Mapa hatudu pozisaun Administrasaun Munisipal Liquisa iha luan area 543 km² ho populasaun nain – 63.403 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Liquisa iha Postu Administrativu tolu (3) , Sukus 23 no aldeias 134, mak hanesan hatudu iha Tabela 1

Tabela 2 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.

Bazartete		Liquisa		Maubara	
sukus	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**	**Sukus**	**Aldeias**
Fahilelo	3	Açumano	4	Gugleur	11
Fatumasi	4	Darulete	4	Guiço	5
Lauhata	5	Dato	10	Lissadila	7
Leorema	10	Hatuquesi	8	Maubaralilssa	5
Maumeta	4	Leotala	5	Vatuboro	5
Metagou	3	Loidahar	4	Vatuvou	10
Motaulun	3	Luculai	4	Vaviquinia	7
Tibar	4	-	-	-	-
Ulmera	9	-	-	-	-
Total	**45**	-	**39**	-	**50**

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 58

Tabela 1. 3 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Liquisa

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Liquisa								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	5					5	
2	Administrasaun no Financas	0					0	
3	Motorista	1					1	
4	Seguransa	0					0	
Total		6					6	

Tabela 1. 4: Lista Asset ADN,I.P Municipio Liquica

ASET ADN,IP MUNICIPIO LIQUICA								
No	**Deskrisaun**	**Total Aset Kada Tinan**					**Total**	**OBS**
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**		
1	Edificio	1						
2	Kareta	1						
3	Desktop HP / Monitor	1						
4	Laptop HP	1						
5	Printer Cannon	1						
6	UPS	1						
7	Armario File	2						
8	Armario Tau hena	3						
9	Meja escritorio	1						
10	Meja han	1						
11	Meja TV (kiik)	1						
12	Kadeira escritorio	6						
13	Kadeira han	4						
14	Sofa	1 Set						

15	Springbed +sumasu 4+sprei 3	3 Set						
16	Jeleira	1						
17	Water Dispenser	1						
18	TV + Parabola	1 Set						
19	AC	4						
20	Kipas Angin	4						
21	Kompor	1						
22	Kompor Gas	1						
23	Rack sepatu	3						
24	Rack Piring	1						
25	Lampu	11						
26	Water Pump Sanyo	1						

1.3 LISTA PROJECTO

Projetu hotu ne'ebe akumula iha lista neé bazeia ba dadus projetu nebe sei lao hela no mos projetu nebe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak ne'e fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu PorFundus Finansiamento, Tabela 1.3.2 Projetu Por Sector no tabela 1.3.3 Projetu Por Ministerio, no lista detalhu kada projetu bele hare iha #Aneksu A.

Tabela 1.3. 1 Projecto Municipio Ermera Por Fundus Financimento



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Por Fundus FI

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	Bazartete	2	$557,358.72	84.36%
2	Liquica Vila	4	$2,716,690.73	53.73%
3	Maubara	4	$2,478,094.89	73.78%
4	Maubara	2	$26,971,543.21	56.10%
5	Maubara Lisa			
	Grand Total	**12**	**$32,723,687.55**	**57.72%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	Bazartete	2	$309,925.98	36.31%
2	Liquica Vila			
3	Maubara			
4	Maubara			
5	Maubara Lisa			
	Grand Total	**2**	**$309,925.98**	**36.31%**

Por Fundus LM

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	Bazartete	1	$68,711.28	0%
2	Liquica Vila			
3	Maubara			
4	Maubara	2	$221,668.24	46.85%
5	Maubara Lisa			
	Grand Total	**3**	**$290,379.52**	**35.76%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM - BS		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	Bazartete	5	$748,001.55	79.99%
2	Liquica Vila	1	$153,851.88	64.40%
3	Maubara			
4	Maubara			
5	Maubara Lisa			
	Grand Total	**6**	**$901,853.43**	**77.33%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM - CD		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	Bazartete			
2	Liquica Vila	3	$438,455.64	85.08%
3	Maubara			
4	Maubara			
5	Maubara Lisa			
	Grand Total	**3**	**$438,455.64**	**85.08%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM -CD		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	Bazartete	2	$172,755.31	85.13%
2	Liquica Vila			
3	Maubara			
4	Maubara			
5	Maubara Lisa			
	Grand Total	**2**	**$172,755.31**	**85.13%**

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	Bazartete	1	$162,714.83	76.75%
2	Liquica Vila	1	$173,225.03	51.49%
3	Maubara			
4	Maubara			
5	Maubara Lisa	1	$171,850.61	58.59%
	Grand Total	**3**	**$507,790.47**	**61.99%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM + PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	Bazartete	13	$2,019,467.67	71.95%
2	Liquica Vila	9	$3,482,223.28	58.04%
3	Maubara	4	$2,478,094.89	73.78%
4	Maubara	4	$27,193,211.45	56.02%
5	Maubara Lisa	1	$171,850.61	58.59%
	Grand Total	**31**	**$35,344,847.90**	**58.39%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu

Tabela 1.3. 2 Projecto Muncipio Liquica Por Sectores

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL
ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

NO	SECTOR PROJECTO	Bazartete		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	2	$91,877.21	72.96%
2	AGUA E SANEAMENTO	2	$122,664.12	77.13%
3	EDIFICIOS PUBLICOS			
4	EDUKASAUN	2	$230,207.52	62.14%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	$499,250.84	90.00%
6	ESTRADA			
7	ESTRADA- IMPRESTIMO			
8	ESTRADAS	1	$73,270.51	88.11%
9	FLOOD CONTROL	1	$68,711.28	0.00%
10	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	1	$565,452.33	88.61%
11	PORTOS			
12	SAUDE	2	$309,925.98	36.31%
13	SEGURANCA NO DEFESA	1	$58,107.88	35.87%
14	TURISMO			
	Grand Total	**13**	**$2,019,467.67**	**71.95%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu

NO	SECTOR PROJECTO	Liquica Vila		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	AGUA E SANEAMENTO			
3	EDIFICIOS PUBLICOS	1	$173,225.03	51.49%
4	EDUKASAUN			
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	$869,577.80	72.55%
6	ESTRADA			
7	ESTRADA- IMPRESTIMO			
8	ESTRADAS			
9	FLOOD CONTROL	1	$311,975.10	83.10%
10	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	4	$732,695.35	52.48%
11	PORTOS	1	$1,394,750.00	47.12%
12	SAUDE			
13	SEGURANCA NO DEFESA			
14	TURISMO			
	Grand Total	**9**	**$3,482,223.28**	**58.04%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

NO	SECTOR PROJECTO	Maubara		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	AGUA E SANEAMENTO			
3	EDIFICIOS PUBLICOS			
4	EDUKASAUN			
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	$301,760.22	72.11%
6	ESTRADA			
7	ESTRADA- IMPRESTIMO			
8	ESTRADAS	1	$1,901,334.67	79.22%
9	FLOOD CONTROL			
10	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
11	PORTOS			
12	SAUDE			
13	SEGURANCA NO DEFESA			
14	TURISMO	1	$275,000.00	38.00%
	Grand Total	**4**	**$2,478,094.89**	**73.78%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

NO	SECTOR PROJECTO	Maubara		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	AGUA E SANEAMENTO	1	$170,965.65	42.53%
3	EDIFICIOS PUBLICOS			
4	EDUKASAUN			
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
6	ESTRADA	1	$50,702.59	61.41%
7	ESTRADA- IMPRESTIMO	2	$26,971,543.21	56.10%
8	ESTRADAS			
9	FLOOD CONTROL			
10	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
11	PORTOS			
12	SAUDE			
13	SEGURANCA NO DEFESA			
14	TURISMO			
	Grand Total	**4**	**$27,193,211.45**	**56.02%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

NO	SECTOR PROJECTO	Maubara Lisa		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	AGUA E SANEAMENTO			
3	EDIFICIOS PUBLICOS			
4	EDUKASAUN	1	$171,850.61	58.59%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
6	ESTRADA			
7	ESTRADA- IMPRESTIMO			
8	ESTRADAS			
9	FLOOD CONTROL			
10	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
11	PORTOS			
12	SAUDE			
13	SEGURANCA NO DEFESA			
14	TURISMO			
	Grand Total	**1**	**$171,850.61**	**58.59%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO LIQUICA		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	2	$91,877.21	72.96%
2	AGUA E SANEAMENTO	3	$293,629.77	56.98%
3	EDIFICIOS PUBLICOS	1	$173,225.03	51.49%
4	EDUKASAUN	3	$402,058.13	60.62%
5	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	$1,670,588.86	77.69%
6	ESTRADA	1	$50,702.59	61.41%
7	ESTRADA- IMPRESTIMO	2	$26,971,543.21	56.10%
8	ESTRADAS	2	$1,974,605.18	79.55%
9	FLOOD CONTROL	2	$380,686.38	68.10%
10	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	$1,298,147.68	68.22%
11	PORTOS	1	$1,394,750.00	47.12%
12	SAUDE	2	$309,925.98	36.31%
13	SEGURANCA NO DEFESA	1	$58,107.88	35.87%
14	TURISMO	1	$275,000.00	38.00%
	Grand Total	**31**	**$35,344,847.90**	**58.39%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

Tabela 1.3. 3 Projecto Municipio Ermera Por Ministerios

NO	DONO DO PROJETU	Bazartete		
		TOTAL PROJECTU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	2	$91,877.21	72.96%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	$1,229,864.28	83.51%
4	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$58,107.88	35.87%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	$230,207.52	62.14%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$99,484.80	82.93%
7	MINISTERIO SAUDE	2	$309,925.98	36.31%
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN			
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
	Grand Total	**13**	**$2,019,467.67**	**71.95%**

NO	DONO DO PROJETU	Liquica Vila		
		TOTAL PROJECTU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	$173,225.03	51.49%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	6	$1,602,273.15	63.37%
4	MINISTERIO DO INTERIOR			
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	$311,975.10	83.10%
7	MINISTERIO SAUDE			
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	1	$1,394,750.00	47.12%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
	Grand Total	**9**	**$3,482,223.28**	**58.04%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

NO	DONO DO PROJETU	Maubara		
		TOTAL PROJECTU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGE N EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	$2,203,094.89	78.25%
4	MINISTERIO DO INTERIOR			
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
7	MINISTERIO SAUDE			
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN			
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$275,000.00	38.00%
	Grand Total	**4**	**$2,478,094.89**	**73.78%**

NO	DONO DO PROJETU	Maubara		
		TOTAL PROJECTU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGE N EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	4	$27,193,211.45	56.02%
4	MINISTERIO DO INTERIOR			
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
7	MINISTERIO SAUDE			
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN			
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
	Grand Total	**4**	**$27,193,211.45**	**56.02%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

NO	DONO DO PROJETU	Maubara Lisa		
		TOTAL PROJECTU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGE N EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS			
4	MINISTERIO DO INTERIOR			
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	$171,850.61	58.59%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
7	MINISTERIO SAUDE			
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN			
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
	Grand Total	**1**	**$171,850.61**	**58.59%**

NO	DONO DO PROJETU	TOTAL MUNICIPIO LIQUICA		
		TOTAL PROJECTU	MONTANTE KONTRATU ($)	PERSENTAGE N EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	$173,225.03	51.49%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	2	$91,877.21	72.96%
3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	18	$32,228,443.77	58.96%
4	MINISTERIO DO INTERIOR	1	$58,107.88	35.87%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	3	$402,058.13	60.62%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	2	$411,459.90	83.06%
7	MINISTERIO SAUDE	2	$309,925.98	36.31%
8	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	1	$1,394,750.00	47.12%
9	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	$275,000.00	38.00%
	Grand Total	**31**	**$35,344,847.90**	**58.39%**

Dados Detalho kada Projetu #anexu A

Tabela 4. 1 : Dadus populasaun Munisipiu Liquica

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2021				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Bazartete	31,517	8,971	8,847	7,044	6,655
Liquiça	24,968	6,840	7,192	5,633	5,303
Maubara	24,809	6,921	6,639	5,719	5,529

Fontes : Projeksaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direcção Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi Progressu servisu nebe kompanha sira atinji iha fulan ne,e nia laran, husi lista nebe iha #Aneksu B hatudu progressu aktual fulan ida ne;e ho nia porsentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento nebe hetan husi progressu fulan ida ne,e, ikus liu persentagen aktual fulan ida ne,e hatudu progressu fisiku komulativa husi porsento anterior no fulan ida ne,e nian, lista kompletu ba detailho bele hare iha #Aneksu B, detailhu ba Backup Fotografia #Aneksu C1, detalho ba Backup BoQ #Aneksu C2 no Instrusaun servisu bele hare #Aneksu D

III OBSTÁKLU IHA TERENU

3.1 Obstáclo Servisu Iha Terenu

Durante iha Fulani da nia laran, problema nebe ami enjineiru municipio hasoru mak hanesan :

1. Kapasidade linha internet iha Municipio lao ladun diak ,no difikulta dados nebe prepara ona iha Dropbox maibe iha Nacional la acesso.
2. Projeitu lao tarde
3. Companhia balun servisu la tuir spesifikasaun
4. Companhia balun servisu la iha Site Engineer
5. Difikulidade ba Ekipa ADN M.Liquica hasoru susar ba Be'e mos

VI. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu iha Terenu

1. Husu Atu hadia linha internet iha Municpio no dala barak liu ami utiliza Telemovel hodi Acesso ba Internet.
2. Husu ba Kompanhia sira atu aslera servisu hodi nune servisu tuir tempo nebe mensiona iha kontrato
3. Rekomenda ba Kompanhia sira servisu tuir spesifikasaun nebe iha ona
4. Rekomenda ba Kompanhia sira tenke iha Site Engineer iha terenu

Rekomenda ba ADN.I.P. Nacional liu-liu ba Superior sira hodi hare ba Edificipio ADN.I.P.

Note : Assinatura Husi Enjineiru Municipio Liquica

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Bobonaro / Maliana					
No	**Deskrisaun**	**Identidade**			
		Naran Kompletu e Asinatura	**Nu. ID Card**	**Pozisaun**	**Fotografia**
1	Enjineiru	Juninho António A. Da Cruz	216	Enjineiru EPAS	
		Marcus Ximenes de Araujo		Enjineiru ITI	

		Camilio de Jesus	061	Enjineiru METIC	
2	Enjineira	Ana Maria L. D.C. Guterres	039	Enjineira VEBD	
3	Motorista	Rui Antonio Gaio		Motorista	

#ANEXU C1 –(LV1) Back-up Data

Naran Projeto : Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquica Municipality

No. kontratu : **MPW - W - 190250**

Data Inspesaun : 04/08/2021

Fatin Inspesaun : Liquica – Maubara - Loes

Koordinadas :

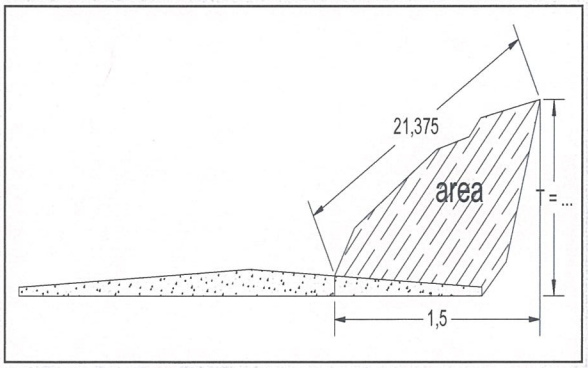
Start Point : Long : 125°29'25.72 Latetude : -8°34'5.91

End Point : Long : 125°8'0.75 Latetude : -8°44'28.85


Naran Inspector : 1. Eng Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item *Excavation/Landsliders*



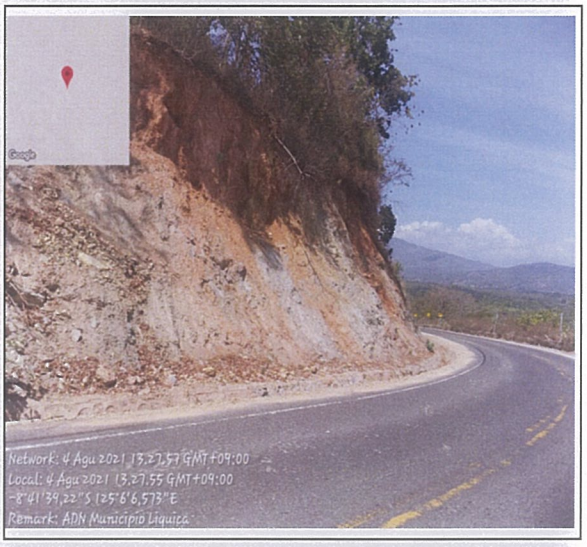Servisu iha Terreno Remata ona no hein Pedido Pagamento.
Volume kada item Sura iha File Back Up data Excel nebe Anexo iha Folder :



#ANEXU C1 –(LV1) Back-up Data

Naran Projeto : Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquica Municipality

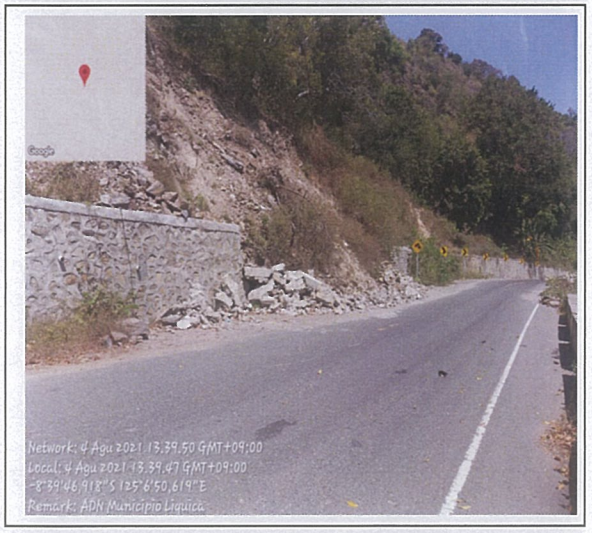
No. kontratu : **MPW - W - 190250**



Servisu iha Terreno Remata ona no hein Pedido Pagamento.
Fotografia ne hatudo katak iha Item Stone Masonry nebe komapnhia halo ona iha Tinan kotuk at fali ona tamba impakto husi Kalamidadeiha dia 4/4/2021 no AND kontaktu ona Companhia hodi hadia iha tempo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .....



Servisu iha Terreno Remata ona no hein Pedido Pagamento.
Fotografia ne hatudo katak iha Item Stone Masonry nebe komapnhia halo ona iha Tinan kotuk at fali ona tamba impakto husi Kalamidadeiha dia 4/4/2021 no AND kontaktu ona Companhia hodi hadia iha tempo retensaun nia laran.

#ANEXU C1 –(LV1) Back-up Data

Naran Projeto : Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquica Municipality

No. kontratu : **MPW - W - 190250**



Servisu iha Terreno Remata ona no hein Pedido Pagamento.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .....



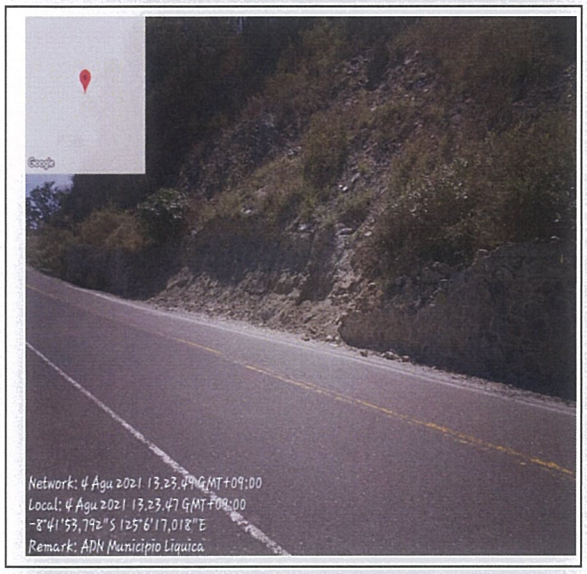
Servisu iha Terreno Remata ona no hein Pedido Pagamento.

#ANEXU C1 –(LV1)

Back-up Data

Naran Projeto : Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquica Municipality


No. kontratu : **MPW - W - 190250**



Servisu iha Terreno Remata ona no hein Pedido Pagamento.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

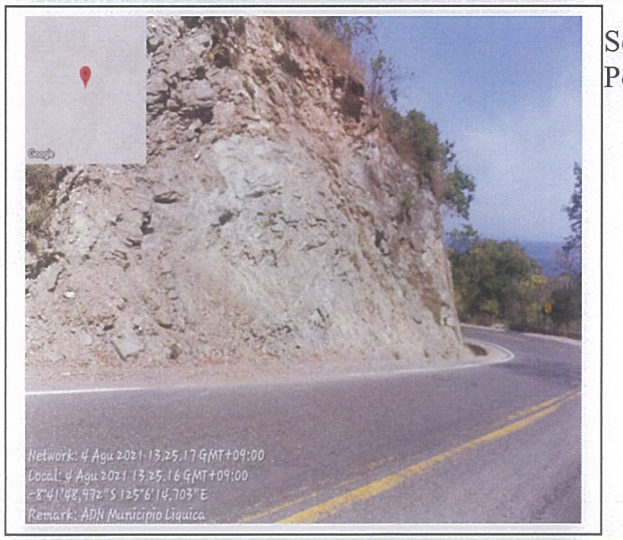Sketch Item servisu .....



Servisu iha Terreno Remata ona no hein Pedido Pagamento


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

#ANEXU C1 –(LV1) Back-up Data

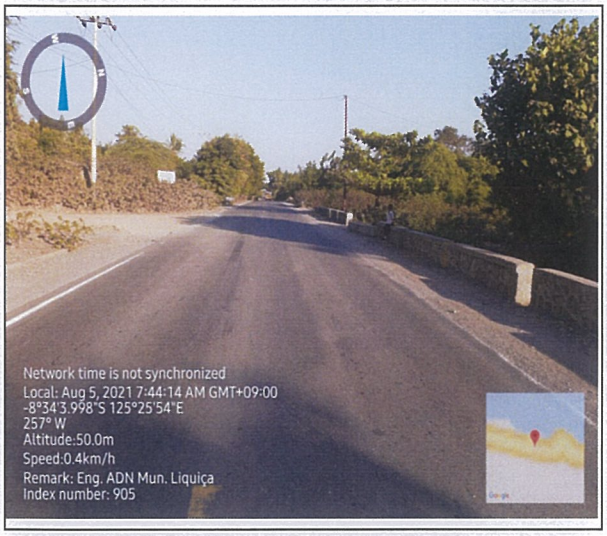Naran Projeto : Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquica Municipality

No. kontratu : **MPW - W - 190250**


Sketch Item servisu .....



Servisu iha Terreno Remata ona no hein Pedido Pagamento

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

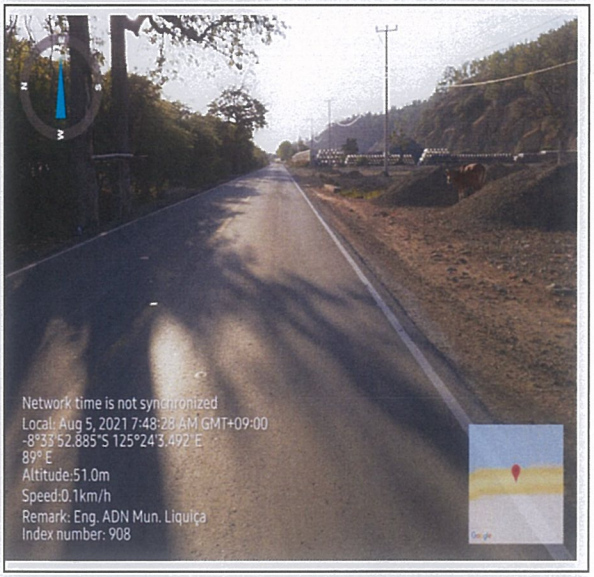Sketch Item servisu .....



Servisu iha Terreno Remata ona no hein Pedido Pagamento

#ANEXU C1 –(LV1) Back-up Data

Naran Projeto : Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquica Municipality

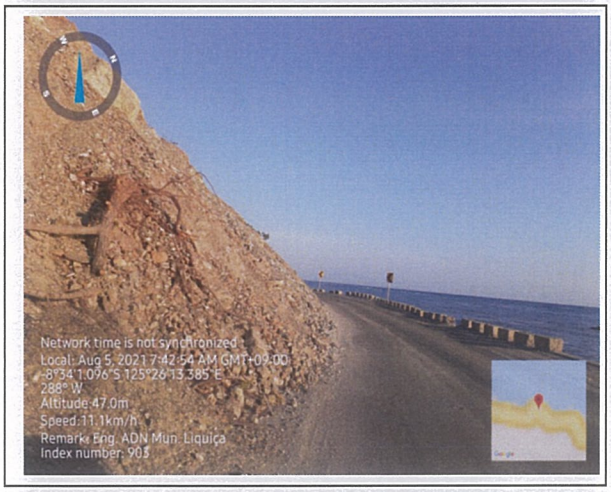
No. kontratu : **MPW - W - 190250**



Servisu iha Terreno Remata ona no heinPedido Pagamento

Sketch & Foto Desenho | Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .....



Iha Area ne Presija Atu suru sai fali Rai nebe monu mai Estrada laran,Husi AND kontaktu ba Companhia maibe sedauk fo resposta.

ANEXO C1 (LV3)
Back-up Data

Naran Projeto : **Aibeno – Asumanu, Dato - Loidahar**

No. kontratu : **MPW-W-RFQ-190013**

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Dato-Loidadahar & Aibenu - Asumanu

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°19'25.493 Latetude : -8°35'49.028

End Point : Long : 125°20'49.833 Latetude : -8°40'34.406

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo


Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Hela Retensaun,Maibe Pagamento Atinzi deit 99,91%


ANEXO C1 (LV3)

Back-up Data

Naran Projeto : **Aibeno – Asumanu, Dato - Loidahar**

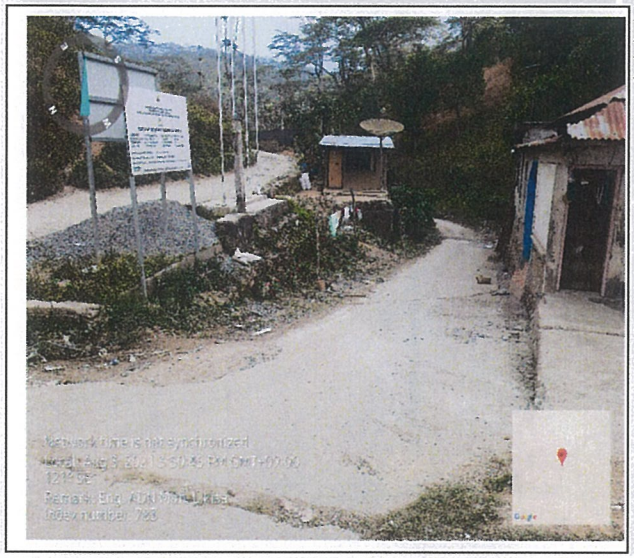No. kontratu : **MPW-W-RFQ-190013**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Hela Retensaun,Maibe Pagamento Atinzi deit 99,91%

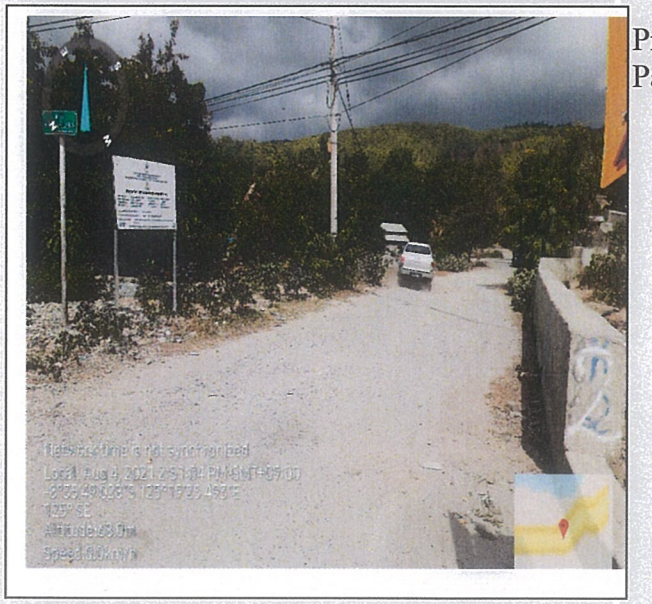Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Hela Retensaun,Maibe Pagamento Atinzi deit 99,91%

ANEXO C1 (LV3)
Back-up Data

Naran Projeto : **Aibeno – Asumanu, Dato - Loidahar**

No. kontratu : **MPW-W-RFQ-190013**


Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Hela Retensaun,Maibe Pagamento Atinzi deit 99,91%

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Hela Retensaun,Maibe Pagamento Atinzi deit 99,91%

ANEXO C1 (LV3)
Back-up Data

Naran Projeto : **Aibeno – Asumanu, Dato - Loidahar**

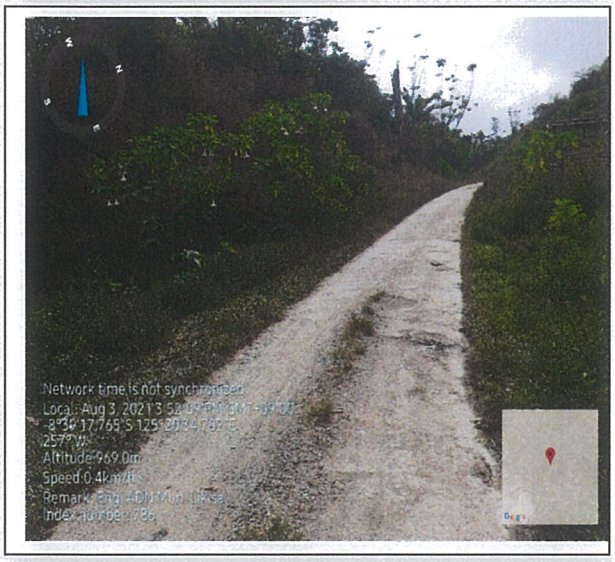No. kontratu : **MPW-W-RFQ-190013**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Hela Retensaun,Maibe Pagamento Atinzi deit 99,91%


Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Hela Retensaun,Maibe Pagamento Atinzi deit 99,91%

ANEXO C1 (LV3)

Back-up Data

Naran Projeto : **Aibeno – Asumanu, Dato - Loidahar**

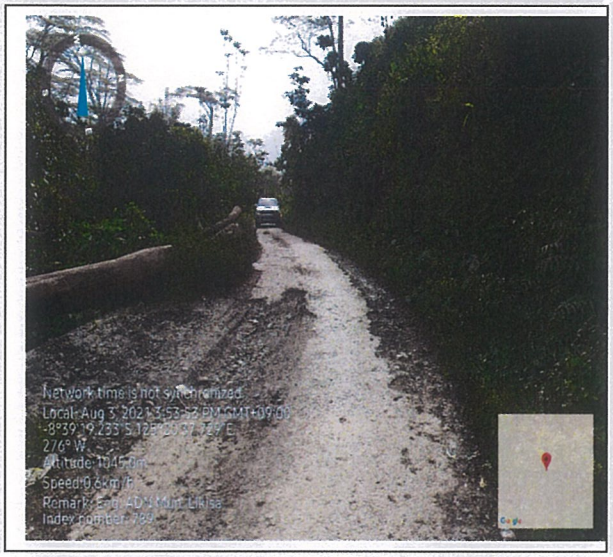No. kontratu : **MPW-W-RFQ-190013**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Hela Retensaun,Maibe Pagamento Atinzi deit 99,91%

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Hela Retensaun,Maibe Pagamento Atinzi deit 99,91%

ANEXO C1 (LV4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Gunaba-Lukulai, Metagou-Aibeno, Taltabi-Kutulau**

No. kontratu : **MPW-W-190096**

Data Inspesaun : 03/06/2021

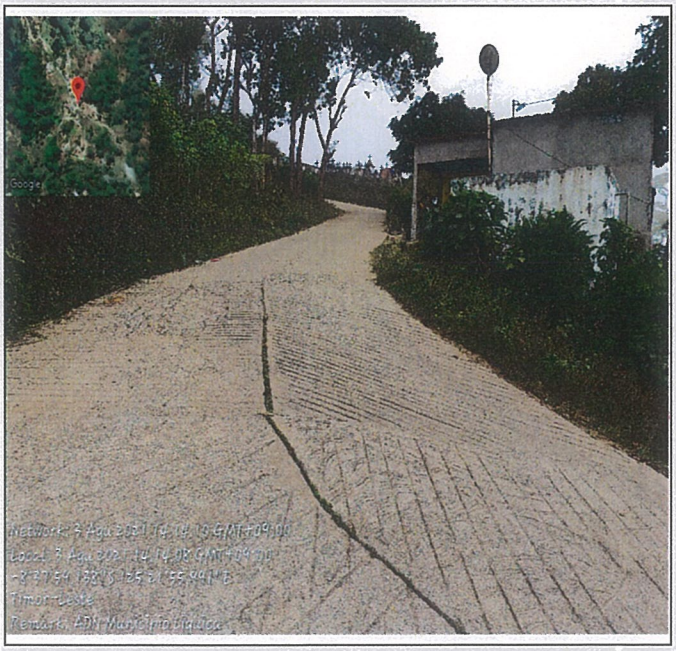
Fatin Inspesaun : Liquica – Gunaba-Likulai, Metagou-Aibeno, Taltabi-Kutulau

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°21'55.6 Latetude : -8°37'59.53

End Point : Long : 125°20'29.93 Latetude : - 8°39'16.0

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona, no hela Retensaun 10% e Pagamento Atinzi ona 100%.

ANEXO C1 (LV4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Gunaba-Lukulai, Metagou-Aibeno, Taltabi-Kutulau**

No. kontratu : **MPW-W-190096**


Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona, no hela Retensaun 10% e Pagamento Atinzi ona 100%.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona, no hela Retensaun 10% e Pagamento Atinzi ona 100%.

ANEXO C1 (LV4)
Back-up Data

Naran Projeto : **Gunaba-Lukulai, Metagou-Aibeno, Taltabi-Kutulau**

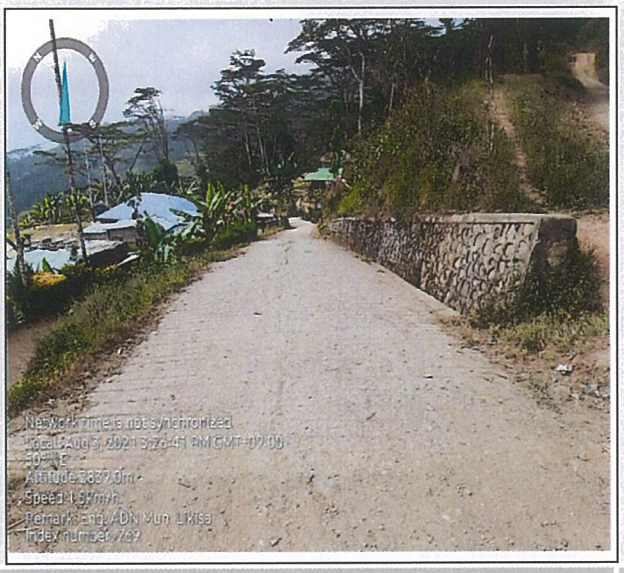No. kontratu : **MPW-W-190096**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona, no hela Retensaun 10% e Pagamento Atinzi ona 100%.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona, no hela Retensaun 10% e Pagamento Atinzi ona 100%.

ANEXO C1 (LV4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Gunaba-Lukulai, Metagou-Aibeno, Taltabi-Kutulau**

No. kontratu : **MPW-W-190096**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona, no hela Retensaun 10% e Pagamento Atinzi ona 100%.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona, no hela Retensaun 10% e Pagamento Atinzi ona 100%.


ANEXO C1 (LV4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Gunaba-Lukulai, Metagou-Aibeno, Taltabi-Kutulau**

No. kontratu : **MPW-W-190096**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona, no hela Retensaun 10% e Pagamento Atinzi ona 100%.

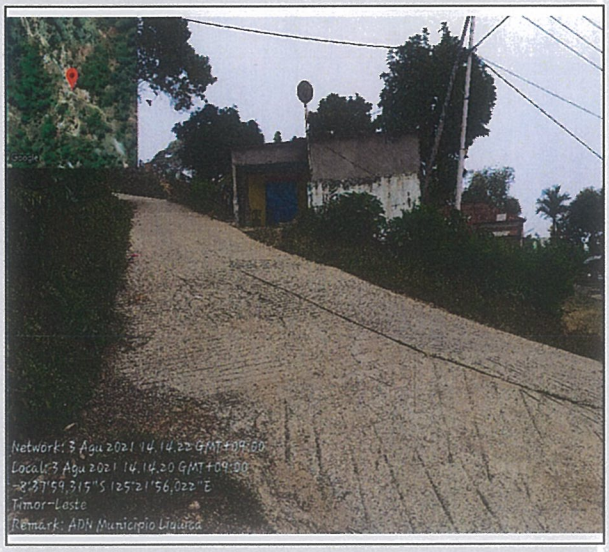Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona, no hela Retensaun 10% e Pagamento Atinzi ona 100%.

ANEXO C1 (LV4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Gunaba-Lukulai, Metagou-Aibeno, Taltabi-Kutulau**

No. kontratu : **MPW-W-190096**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona, no hela Retensaun 10% e Pagamento Atinzi ona 100%.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona, no hela Retensaun 10% e Pagamento Atinzi ona 100%.

ANEXO C1 (LV5)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquisa**

No. kontratu : 013LM/RDTL/MPIE/A.D.N/DIL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt

Data Inspesaun : 6/08/2021

Fatin Inspesaun : Liquica Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°19'49.18 Latetude : -8°36'1.43

End Point : Long : 125°19'37'79 Latetude : -8°35'47.86

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona no Hela Retensaun 10%.Maibe Pagamento Atinzi deit 98,92%

ANEXO C1 (LV5)
Back-up Data

Naran Projeto : **New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquisa**

No. kontratu : 013LM/RDTL/MPIE/A.D.N/DIL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona no Hela Retensaun 10%.Maibe Pagamento Atinzi deit 98,92%
Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona no Hela Retensaun 10%.Maibe Pagamento Atinzi deit 98,92%

ANEXO C1 (LV5)
Back-up Data

Naran Projeto : **New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquisa**

No. kontratu : 013LM/RDTL/MPIE/A.D.N/DIL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona no Hela Retensaun 10%.Maibe Pagamento Atinzi deit 98,92%

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona no Hela Retensaun 10%.Maibe Pagamento Atinzi deit 98,92%

ANEXO C1 (LV5)
Back-up Data

Naran Projeto : **New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquisa**

No. kontratu : 013LM/RDTL/MPIE/A.D.N/DIL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona no Hela Retensaun 10%.Maibe Pagamento Atinzi deit 98,92%

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona no Hela Retensaun 10%.Maibe Pagamento Atinzi deit 98,92%

ANEXO C1 (LV5)
Back-up Data

Naran Projeto : **New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquisa**

No. kontratu : 013LM/RDTL/MPIE/A.D.N/DIL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona no Hela Retensaun 10%.Maibe Pagamento Atinzi deit 98,92%

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona no Hela Retensaun 10%.Maibe Pagamento Atinzi deit 98,92%

ANEXO C1 (LV5)
Back-up Data

Naran Projeto : **New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquisa**

No. kontratu : 013LM/RDTL/MPIE/A.D.N/DIL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt

Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
Sketch Item servisu ..... 	Projeito Ida ne Remata ona no Hela Retensaun 10%.Maibe Pagamento Atinzi deit 98,92%
Observasaun iha tereno no Foto Aktual	Sketch & Foto Desenho
	Projeito Ida ne Remata ona no Hela Retensaun 10%.Maibe Pagamento Atinzi deit 98,92%

#ANEXU C1 – (LV6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Liquica**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/AM-LIQ/VII/2019/01**

Data Inspesaun : **04 Agostu 2021**

Fatin Inspesaun : Dato, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.36'3.484"S, Latetude : .....

End Point : Long : 125.18'37.962"E, Latetude : .....

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Progresu servisu iha terenu remata ona no uja ona husi autoridade munisipiu, kompania ba projeitu refere foin entrega pedido ba pagamentu final no sei halao inspesaun konjuntu ho tekniku Eletrisidade ADN no tekniku KDD. 

#ANEXU C1 – (LV6)

Back-up Data

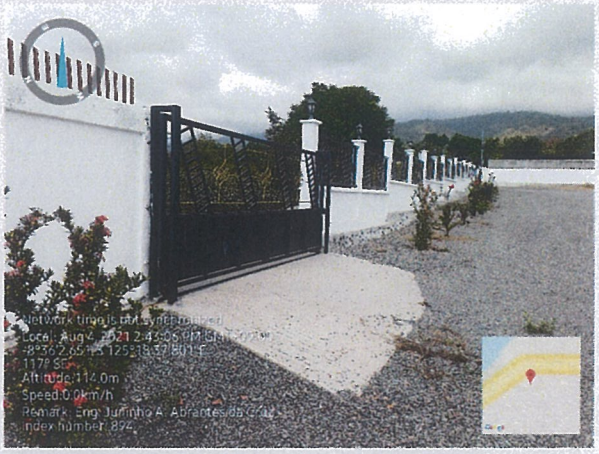
Naran Projeto : **Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Liquica**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/AM-LIQ/VII/2019/01**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Progresu Pagamentu ikus atinji ona **62,02%.** 
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……	

#ANEXU C1 – (LV6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Liquica**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/AM-LIQ/VII/2019/01**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

#ANEXU C1 – (LV6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Liquica**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/AM-LIQ/VII/2019/01**

Data Inspesaun : **05 Agostu 2021**

Fatin Inspesaun : Dato, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.36'3.484"S, Latetude : .....

End Point : Long : 125.18'37.962"E, Latetude : .....

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2. . .....

3. . .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Inspesaun final koordena hamutuk ho tekniku Eletrisidade ADN no tekniku KDD hamutuk ho tekniku kompania, durante inspesaun deteta katak sei iha problema hirak ho item servisu eletrisidade. 
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

#ANEXU C1 – (LV6)
Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Liquica**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/AM-LIQ/VII/2019/01**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Ba servisu uma nian sei falta servisu ba janela vidru nako nian neebe nia besi seidauk monta ho rajaun tanba badain neebe atu monta besi nee ba tiha Indonesia, maibe hatoo ona ba kompania atu nunee bele buka dalan oinsa hodi nunee bele finaliza tiha servisu item nee. 
Sketch Item servisu ……	Ba eletrisidade nian seidauk bele identifika loloos problema neebe infrenta tanba tekniku eletrisidade kompania la marka prezensa hodi klarifika diagrama ba servisu linha eletrisidade nian. 

#ANEXU C1 – (LV6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Liquica**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/AM-LIQ/VII/2019/01**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Lampu iha sala balu neebe la lakan tanba problema eletrisidade no kipas angin balu neebe aat tiha ona neebe hatoo ona ba kompania atu troka. 
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

#ANEXU C1 – (LV6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Liquica**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/AM-LIQ/VII/2019/01**

Data Inspesaun : **18 Agostu 2021**

Fatin Inspesaun : Dato, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.36'3.484"S, Latetude : .....

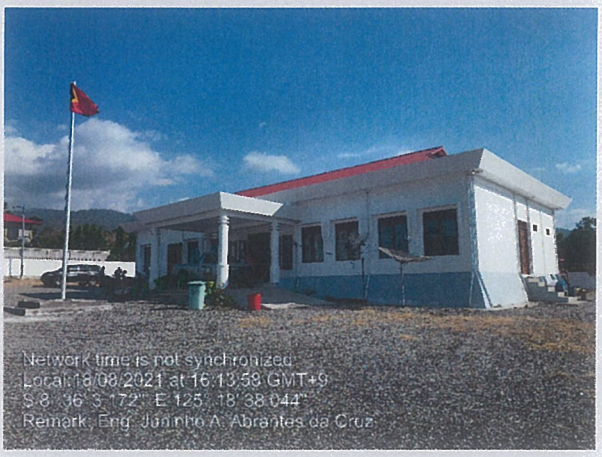
End Point : Long : 125.18'37.962"E, Latetude : .....

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Inspesaun final koordena hamutuk ho tekniku Eletrisidade ADN hamutuk ho tekniku kompania sira, durante inspesaun deteta katak problema item servisu eletrisidade nian mai husi linha eletrisidade neebe fraku. 

#ANEXU C1 – (LV6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Liquica**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/AM-LIQ/VII/2019/01**

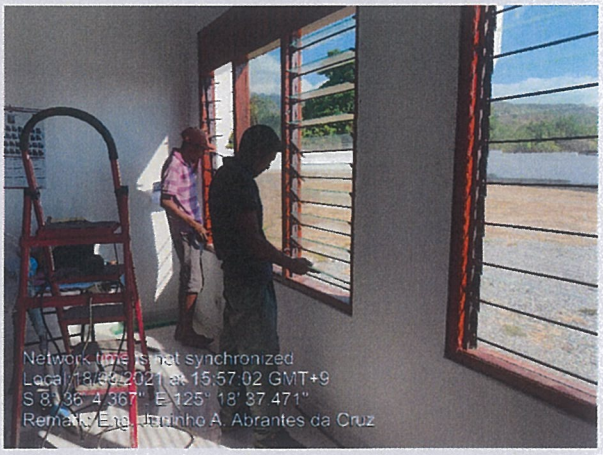
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Tuir tekniku eletrisidade ADN nia observasaun katak kompania tenke instala 3 phase ba edifisiu tanba mono phase beban la seimbang. 

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……	Kompania tenke koko atu muda phase ida ba phase seluk hodi hetan solusaun karik phase ida beban makas liu. 

#ANEXU C1 – (LV6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Liquica**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/AM-LIQ/VII/2019/01**


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..….	Badain sira monta ona teralis ba vidro nako nian. 

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Tan problema linha fraku halo ahi sira lakan tarde/kleur no balu la lakan. 

#ANEXU C1 – (LV6)

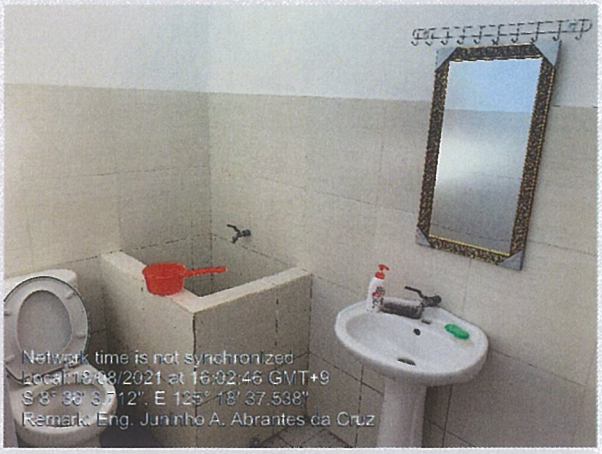Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Liquica**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/AM-LIQ/VII/2019/01**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..…..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

#ANEXU C1-(LV9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**

Data Inspesaun : 19/08/2021


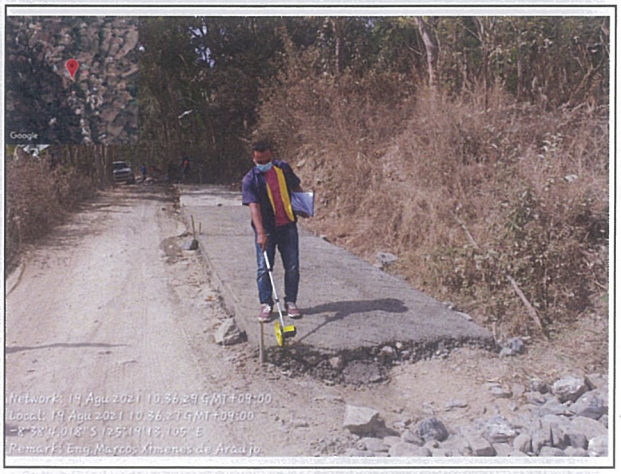
Fatin Inspesaun : Fatukesi

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°18'56.74 Latetude : -8°37' 42.29

End Point : Long : 125°19'30.12 Latetude : -8°39'12.96

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu *Plum Concrete* Sta, 1+750 -1+800  	Modelu Sura Volume iha Excel nebe anexo ona iha system folder 

#ANEXU C1-(LV9)

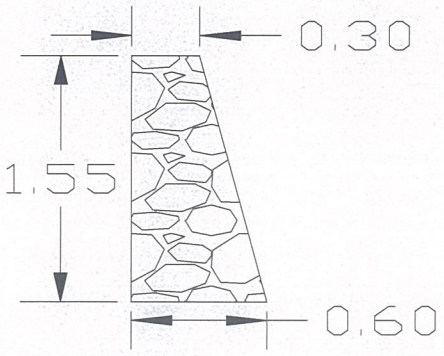
Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu *Retainig wall*





#ANEXU C1-(LV9)


Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu *Plum Concrete*








#ANEXU C1-(LV9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu *Plum Concrete*. 	

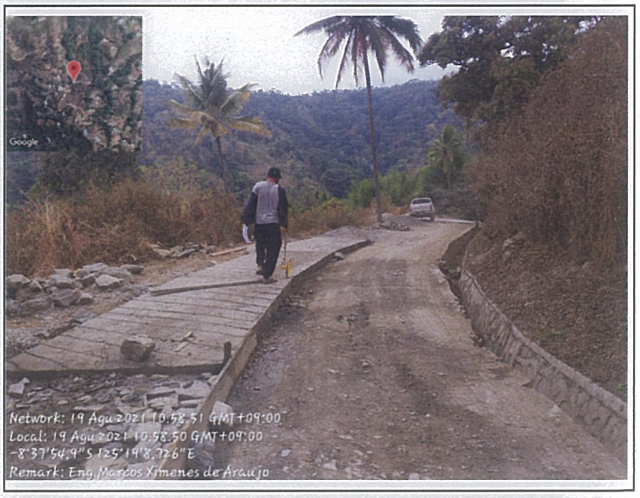Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu *Plum Concrete* 	

#ANEXU C1-(LV9)


Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Sketch Item servisu *Plum Concrete*





Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu *Plum Concrete*





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Name of Roads : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

Contract No : RT/034/MOP-2019
Contractor : 15 Realti Unipessoal. Lda

#ANEXU C2 -(LV9)		SUMMARY								
NO	DESCRIPTION	0	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.				
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	%	TO DATE	%
R-01	General	$ 4,300.00	$ 1,050.00	$ -	$ 1,050.00	$ 1,050.00	$ -	0.00%	$ 1,050.00	0.23%
R-02	Drainage	$ 586.02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%
R-03	Earth work	$ 64,895.01	$ 54,658.11	$ -	$ 54,658.11	$ 54,658.11	$ -	0.00%	$ 54,658.11	12.08%
R-04	Sub-base, base and pavement	$ 9,098.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%
R-05	Structures	$ 252,353.72	$ 131,925.38	$ -	$ 131,925.38	$ 131,925.38	$ 7,134.82	1.58%	$ 139,060.21	30.74%
R-06	Dayworks	$ 75.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%
R-07	Routine maintenance	$ 5,697.00	$ 1,815.00	$ -	$ 1,815.00	$ 1,590.00	$ -	0.00%	$ 1,590.00	0.35%
R-08	Provisional sum	$ 2,490.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%
R-09	Security	$ 3,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%
R-010	Project team	$ 40,800.00	$ 34,000.00	$ -	$ 34,000.00	$ 31,759.00	$ -	0.00%	$ 31,759.00	7.02%
R-011	Safety and protection	$ 9,851.00	$ 8,371.00	$ -	$ 8,371.00	$ 8,079.00	$ -	0.00%	$ 8,079.00	1.79%
R-012	Meetings	$ 120.00	$ 120.00	$ -	$ 120.00	$ 120.00	$ -	0.00%	$ 120.00	0.03%
R-013	Ceremonial costs	$ 300.00	$ 150.00	$ -	$ 150.00	$ 150.00	$ -	0.00%	$ 150.00	0.03%
R-014	Mineral fees	$ 15,977.16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%
Total - net cost		**$ 70,048.16**	**$ 42,641.00**	**$ -**	**$ 42,641.00**	**$ 40,108.00**	**$ -**	**1.58%**	**$ 40,108.00**	**8.87%**
Construction Cost (R-01+R-02+R-03+R-04+R-05+R-06+R-07)		**$ 339,495.37**	**$ 189,448.50**	**$ -**	**$ 189,448.50**	**$ 189,223.50**	**$ 7,134.82**	**1.58%**	**$ 196,358.32**	**43.41%**
Contractor Fee (A x 10%)		**$ 33,949.54**	**$ 18,944.85**	**$ -**	**$ 18,944.85**	**$ 18,922.35**	**$ 713.48**	**0.16%**	**$ 19,635.83**	**4.34%**
Tax (net cost + profit + overhead) x 2 %)		**$ 8,869.86**	**$ 5,020.69**	**$ -**	**$ 5,020.69**	**$ 4,965.08**	**$ 156.97**	**0.03%**	**$ 5,122.04**	**1.13%**
Total gross-cost		***$ 452,362.93***	***$ 256,055.04***	***$ -***	***$ 256,055.04***	***$ 253,218.93***	***$ 8,005.27***	***1.77%***	***$ 261,224.20***	**57.75%**

Inspeksaun Husi :

Eng.Marcos Ximenes de Araujo
Eng. ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun ADN,I.P

Verifica Husi,

Eng. Aniceto da Costa
Eng. Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun ADN,I.P

Certifika Husi,

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade

#ANEXU C1 – (LV9) Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Fatukesi

Koordinadas :


Start Point : Long : 125°18'56.74 Latetude : -8°37' 42.29

End Point : Long : 125°19'30.12 Latetude : -8°39'12.96

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu *Plum Concrete*



Sta, 1+110 – 3+850

Volume : 1884.6 x 0.12 x 4 = 904.608 m³






#ANEXU C1 – (LV9) Back-up Data

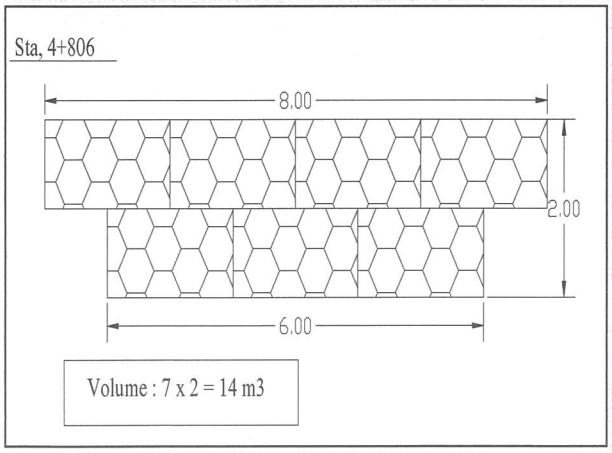Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .....






#ANEXU C1 – (LV9) Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu *Plum Concrete*





Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual


#ANEXU C1 – (LV9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**


Sketch Item servisu *Plum Concrete*.





Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu *Plum Concrete*






#ANEXU C1 – (LV9) Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality


No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..…..	





Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	





#ANEXU C1-(LV9) Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Fatukesi


Koordinadas :

Start Point : Long : 125°18'56.74 Latetude : -8°37' 42.29

End Point : Long : 125°19'30.12 Latetude : -8°39'12.96

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu *Plum Concrete*	Modelu Sura Volume iha Excel nebe anexo ona iha system folder





#ANEXU C1-(LV9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu *Plum Concrete*	


#ANEXU C1-(LV9) Back-up Data

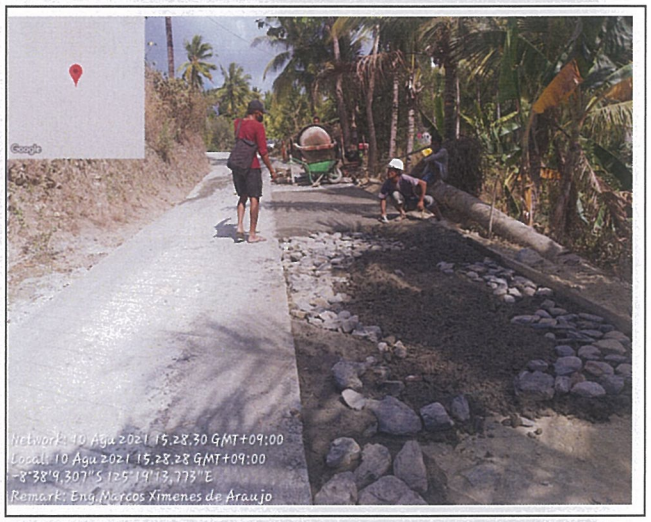
Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu *Plum Concrete*





Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual


#ANEXU C1-(LV9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**


Sketch Item servisu *Plum Concrete*.





Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu *Plum Concrete*





#ANEXU C1-(LV9)


Back-up Data

Naran Projeto : R4D-Rural Road Rehabilitation Bebadiri-Lebokalako Chainge 0+000-5+000 Liquica Municipality

No. kontratu : **RT/034/MOP-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Sketch Item servisu *Plum Concrete*





Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu *Plum Concrete*





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXUC1- (MBR3) Back-up Data

Naran Projeto : **Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica**

No. kontratu : SSS/126/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 4/08/2021

Fatin Inspesaun : Maubara

Koordinadas :

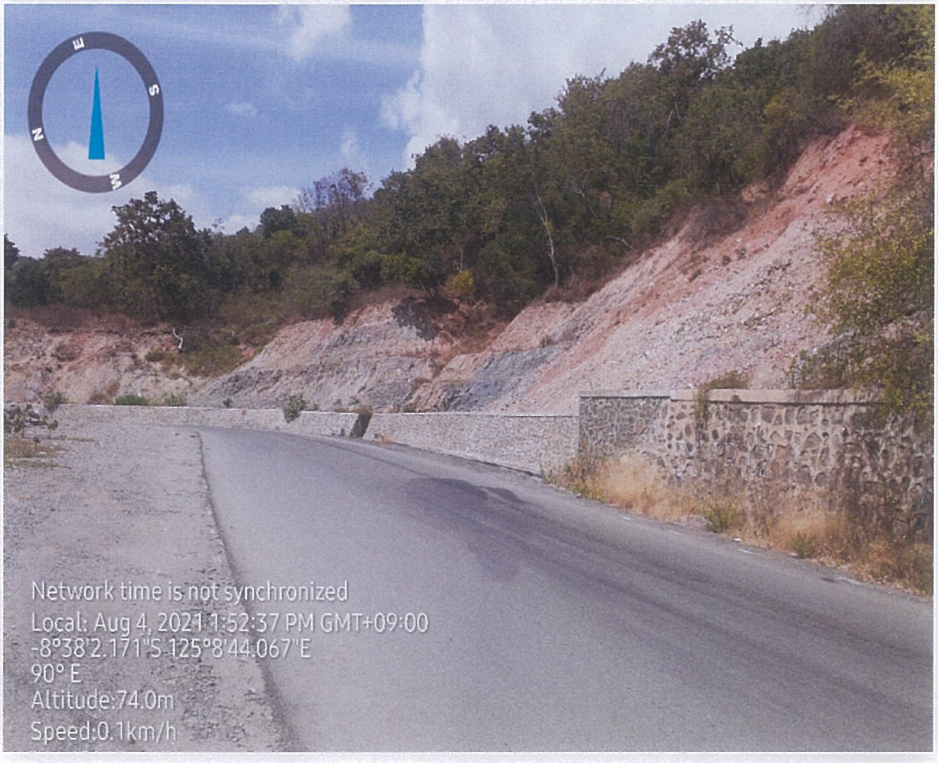
Start Point : Long : 125°15604334 Latetude : - 8°62817278

End Point : Long 125°14640444 Latetude : - 8°63377012

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

2. Eng.Juninho A.Abrantes da Cruz

Sketch & Foto Desenho



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Pagamento ida ne fizikamente iha Terreno 100% ona,Maibe foin lalais Akontese Kalamidade iha Teretorio Timor Laran Tomak iha dia 04 de Abril de 2021 fo mos impaktu ba konstrusaun ida ne,ho nune iha Item balun Presija ADN Rezolve ho Companhia.

(Location 2–Tibalau 1) Sta, 0+000 – 0+293

#ANEXUC1- (MBR2) Back-up Data

Naran Projeto : **Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica**

No. kontratu : SSS/126/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 4/08/2021

Fatin Inspesaun : Maubara

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°15604334 Latetude : - 8°62817278

End Point : Long 125°14640444 Latetude : - 8°63377012

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

2. Eng.Juninho A.Abrantes da Cruz

Sketch & Foto Desenho



Pagamento ida ne fizikamente iha Terreno 100% ona,Maibe foin lalais Akontese Kalamidade iha Teretorio Timor Laran Tomak iha dia 04 de Abril de 2021 fo mos impaktu ba konstrusaun ida ne,ho nune iha Item balun Presija ADN Rezolve ho Companhia.

(Location 2–Tibalau 1) Sta, 0+000 – 0+293

#ANEXUC1- (MBR2) Back-up Data

Naran Projeto : **Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica**

No. kontratu : SSS/126/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 4/08/2021

Fatin Inspesaun : Maubara

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°15604334 Latetude : - 8°62817278

End Point : Long 125°14640444 Latetude : - 8°63377012

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

2. Eng.Juninho A.Abrantes da Cruz

Sketch & Foto Desenho



(Location 2–Tibalau 1) Sta, 0+000 – 0+293

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Pagamento ida ne fizikamente iha Terreno 100% ona,Maibe foin lalais Akontese Kalamidade iha Teretorio Timor Laran Tomak iha dia 04 de Abril de 2021 fo mos impaktu ba konstrusaun ida ne,ho nune iha Item balun Presija ADN Rezolve ho Companhia.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXUC1- (MBR3) Back-up Data

Naran Projeto : **Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica**

No. kontratu : SSS/126/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 4/08/2021

Fatin Inspesaun : Maubara

Koordinadas :

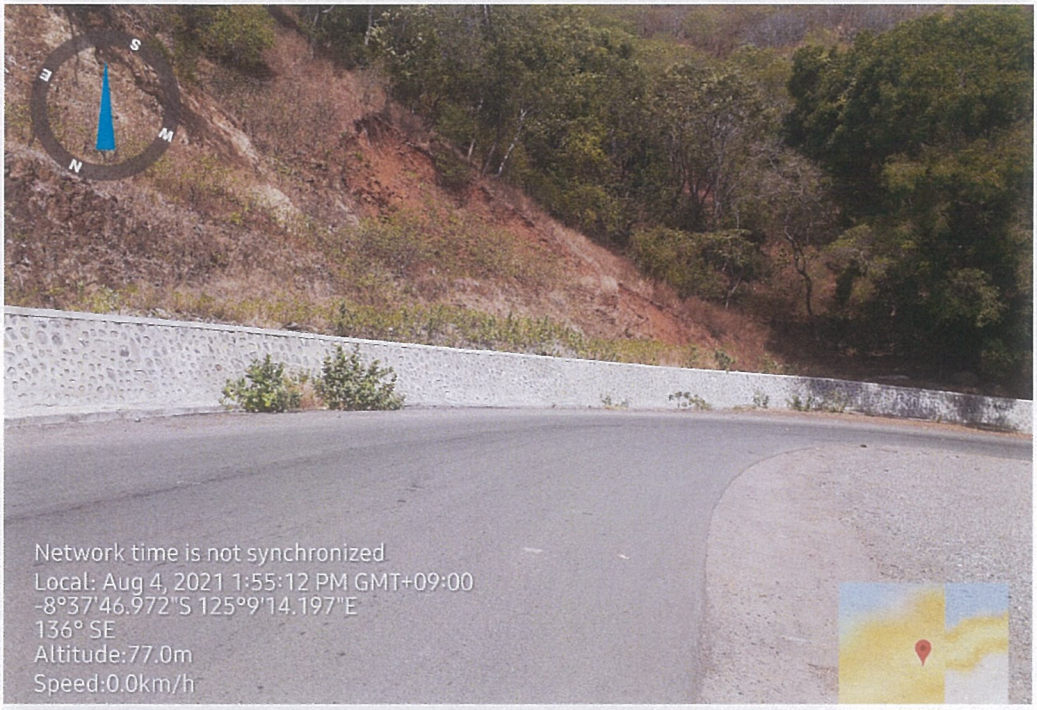
Start Point : Long : 125°15604334 Latetude : - 8°62817278

End Point : Long 125°14640444 Latetude : - 8°63377012

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

2. Eng.Juninho A.Abrantes da Cruz

Sketch & Foto Desenho



(Location 3 –Tibalau 2) Sta, 0+000 – 0+625

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Pagamento ida ne fizikamente iha Terreno 100% ona,Maibe foin lalais Akontese Kalamidade iha Teretorio Timor Laran Tomak iha dia 04 de Abril de 2021 fo mos impaktu ba konstrusaun ida ne,ho nune iha Item balun Presija ADN Rezolve ho Companhia.

#ANEXUC1- (MBR3) Back-up Data

Naran Projeto : **Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica**

No. kontratu : SSS/126/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 4/08/2021

Fatin Inspesaun : Maubara

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°15604334 Latetude : - 8°62817278

End Point : Long 125°14640444 Latetude : - 8°63377012

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

2. Eng.Juninho A.Abrantes da Cruz

Sketch & Foto Desenho



(Location 3 –Tibalau 2) Sta, 0+000 – 0+625

Pagamento ida ne fizikamente iha Terreno 100% ona,Maibe foin lalais Akontese Kalamidade iha Teretorio Timor Laran Tomak iha dia 04 de Abril de 2021 fo mos impaktu ba konstrusaun ida ne,ho nune iha Item balun Presija ADN Rezolve ho Companhia.

#ANEXUC1- (MBR3) Back-up Data

Naran Projeto : **Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica**

No. kontratu : SSS/126/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 4/08/2021

Fatin Inspesaun : Maubara

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°15604334 Latetude : - 8°62817278

End Point : Long 125°14640444 Latetude : - 8°63377012

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

2. Eng.Juninho A.Abrantes da Cruz

Sketch & Foto Desenho



(Location 3 –Tibalau 2) Sta, 0+000 – 0+625

Pagamento ida ne fizikamente iha Terreno 100% ona,Maibe foin lalais Akontese Kalamidade iha Teretorio Timor Laran Tomak iha dia 04 de Abril de 2021 fo mos impaktu ba konstrusaun ida ne,ho nune iha Iten balun Presija ADN Rezolve ho Companhia.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXUC1- (MBR3) Back-up Data

Naran Projeto : **Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica**

No. kontratu : SSS/126/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 4/08/2021

Fatin Inspesaun : Maubara

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°15604334 Latetude : - 8°62817278

End Point : Long 125°14640444 Latetude : - 8°63377012

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

2. Eng.Juninho A.Abrantes da Cruz

Sketch & Foto Desenho



(Location 3 –Tibalau 2) Sta, 0+000 – 0+625

Pagamento ida ne fizikamente iha Terreno 100% ona,Maibe foin lalais Akontese Kalamidade iha Teretorio Timor Laran Tomak iha dia 04 de Abril de 2021 fo mos impaktu ba konstrusaun ida ne,ho nune iha Item balun Presija ADN Rezolve ho Companhia.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXUC1- (MBR3) Back-up Data

Naran Projeto : **Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica**

No. kontratu : SSS/126/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 4/08/2021

Fatin Inspesaun : Maubara

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°15604334 Latetude : - 8°62817278

End Point : Long 125°14640444 Latetude : - 8°63377012

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

2. Eng.Juninho A.Abrantes da Cruz

Sketch & Foto Desenho



(Location 3 –Tibalau 2) Sta, 0+000 – 0+625

Pagamento ida ne fizikamente iha Terreno 100% ona,Maibe foin lalais Akontese Kalamidade iha Teretorio Timor Laran Tomak iha dia 04 de Abril de 2021 fo mos impaktu ba konstrusaun ida ne,ho nune iha Item balun Presija ADN Rezolve ho Companhia.

#ANEXUC1- (MBR3) Back-up Data

Naran Projeto : **Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica**

No. kontratu : SSS/126/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 4/08/2021

Fatin Inspesaun : Maubara

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°15604334 Latetude : - 8°62817278

End Point : Long 125°14640444 Latetude : - 8°63377012

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

2. Eng.Juninho A.Abrantes da Cruz

Sketch & Foto Desenho



(Location 1 –Karimbala) Sta, 0+000 – 0+041

Pagamento ida ne fizikamente iha Terreno 100% ona,Maibe foin lalais Akontese Kalamidade iha Teretoric Timor Laran Tomak iha dia 04 de Abril de 2021 fo mos impaktu ba konstrusaun ida ne,ho nune iha Iten balun Presija ADN Rezolve ho Companhia.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXUC1- (MBR3) Back-up Data

Naran Projeto : **Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica**

No. kontratu : SSS/126/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 4/08/2021

Fatin Inspesaun : Maubara

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°15604334 Latetude : - 8°62817278

End Point : Long 125°14640444 Latetude : - 8°63377012

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

2. Eng.Juninho A.Abrantes da Cruz

Sketch & Foto Desenho



(Location 1 –Karimbala) Sta, 0+000 – 0+041

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Pagamento ida ne fizikamente iha Terreno 100% ona,Maibe foin lalais Akontese Kalamidade iha Teretorio Timor Laran Tomak iha dia 04 de Abril de 2021 fo mos impaktu ba konstrusaun ida ne,ho nune iha Item balun Presija ADN Rezolve ho Companhia.

#ANEXU C1 – (MBR5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Novo Konstrusaun Edificio Escola Tecnico Vocational (ESTV) Lissadila**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/ADM-LQC/VIII/2019/03**

Data Inspesaun : **04 Agostu 2021**

Fatin Inspesaun : Lissadila, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,71070333, Latetude : .....

End Point : Long : 125,2045195, Latetude : .....

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Projeitu refere iha terenu kuaze remata ona no dadaun la iha ona servisu atual iha terenu so hein deit EDTL atu dada linha eletrisidade, no iha item balu mak seidauk implementa iha terenu (asesories class no lampu balu). 

#ANEXU C1 – (MBR5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Novo Konstrusaun Edificio Escola Tecnico Vocational (ESTV) Lissadila**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/ADM-LQC/VIII/2019/03**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Progresu pagamentu ikus foin atinji **65,10%.** 

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……	

#ANEXU C1 – (MBR5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Novo Konstrusaun Edificio Escola Tecnico Vocational (ESTV) Lissadila**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/ADM-LQC/VIII/2019/03**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..…..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

#ANEXU C1 – (MBR5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Novo Konstrusaun Edificio Escola Tecnico Vocational (ESTV) Lissadila**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/ADM-LQC/VIII/2019/03**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..…..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Ba drainajen nian kompania order ona tanki bee, maibe too agora seidauk too iha terenu tan nee sei hein atu bele instala ba bee nian. 

#ANEXU C1 – (MBR9) Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500

No. kontratu : **MPW-W-190098**

Data Inspesaun : 04/08/2021

Fatin Inspesaun : Maubaralisa

Koordinadas :

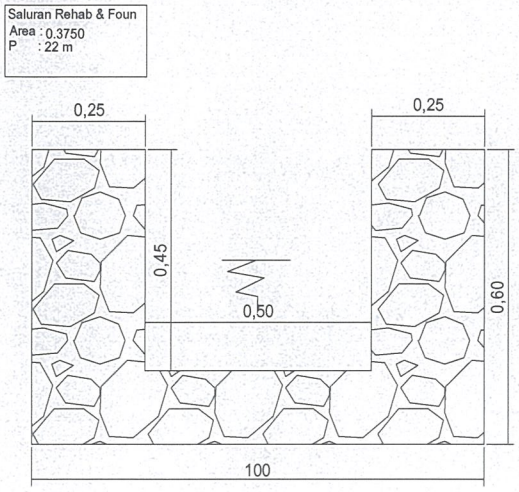
Start Point : Long : 125°12'40.48 Latetude : -8°37'4.94

End Point : Long : 125°11'24.01 Latetude : -8°39'47.48

Naran Inspector : 1. Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Stone Masonry (Line dranage)



Servisu iha Terreno Remata ona iha fulan kotuk no agora hein Pedido Pagamento hodi prepara sertifikado Pagamento ba projeito ida ne no pagamento ida ne foin atinzi 68,24%.


Quantidade volume nian sura ona iha file excel nebe anexo ona iha Back up Data inclui Sketch ba Item servisu.



#ANEXU C1 – (MBR9) Back-up Data

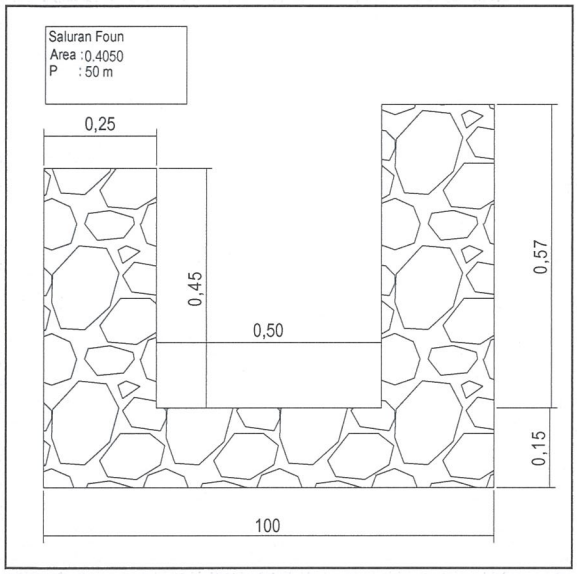Naran Projeto : R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500

No. kontratu : **MPW-W-190098**




Servisu iha Terreno Remata ona iha fulan kotuk no agora hein Pedido Pagamento hodi prepara sertifikado Pagamento ba projeito ida ne no pagamento ida ne foin atinzi 68,24%.




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

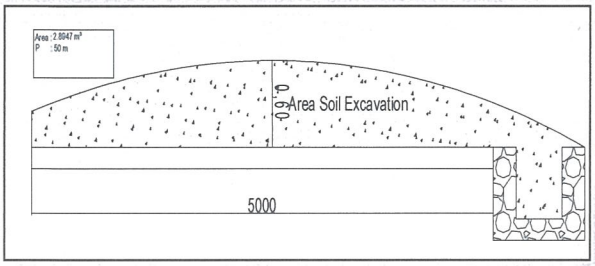Sketch Item servisu *Soil Excavation*



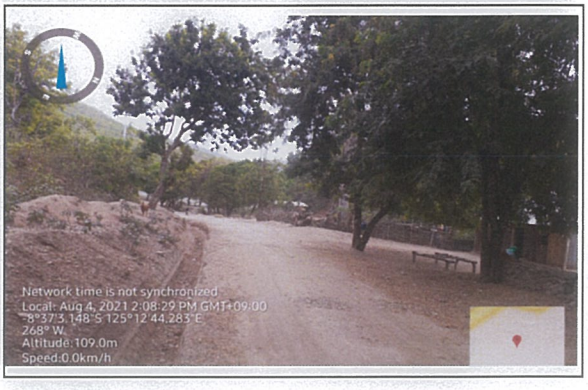Servisu iha Terreno Remata ona iha fulan kotuk no agora hein Pedido Pagamento hodi prepara sertifikado Pagamento ba projeito ida ne no pagamento ida ne foin atinzi 68,24%.



#ANEXU C1 – (MBR9) Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500

No. kontratu : **MPW-W-190098**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	Servisu iha Terreno Remata ona iha fulan kotuk no agora hein Pedido Pagamento hodi prepara sertifikado Pagamento ba projeito ida ne no pagamento ida ne foin atinzi 68,24%.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	Servisu iha Terreno Remata ona iha fulan kotuk no agora hein Pedido Pagamento hodi prepara sertifikado Pagamento ba projeito ida ne no pagamento ida ne foin atinzi 68,24%.

#ANEXU C1 – (MBR9) Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500

No. kontratu : **MPW-W-190098**

Sketch Item servisu .....



Servisu iha Terreno Remata ona iha fulan kotuk no agora hein Pedido Pagamento hodi prepara sertifikado Pagamento ba projeito ida ne no pagamento ida ne foin atinzi 68,24%.

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .....



Servisu iha Terreno Remata ona iha fulan kotuk no agora hein Pedido Pagamento hodi prepara sertifikado Pagamento ba projeito ida ne no pagamento ida ne foin atinzi 68,24%.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Name of Roads : **R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500**

Contract No : **MPW-W-190098**
Contractor : **Luliana Unipessoal. Lda**

#ANEXU C2 – (MBR9)			SUMMARY						
NO	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.			
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	TO DATE	%
R-01	General	$ 280.00	$ -	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	$ -	$ 280.00	0.55%
R-02	Drainage	$ 95.90	$ -	$ 41.10	$ 41.10	$ 41.10	$ -	$ 41.10	0.08%
R-03	Earth work	$ 828.10	$ -	$ 625.26	$ 625.26	$ 625.26	$ 39.24	$ 664.50	1.31%
R-04	Structures	$ 9,389.90	$ -	$ 6,799.67	$ 6,799.67	$ 6,730.89	$ 2,290.98	$ 9,021.87	17.79%
R-05	Routine maintenance	$ 25,432.29	$ -	$ 17,438.25	$ 17,438.25	$ 17,438.25	$ -	$ 17,438.25	34.39%
R-06	General expenses	$ 4,470.00	$ -	$ 4,015.00	$ 4,015.00	$ 3,151.00	$ -	$ 3,151.00	6.21%
R-07	Sub-base, base and pavement	$ 927.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
Total - net cost		**$ 41,423.69**	**$ -**	**$ 29,199.27**	**$ 29,199.27**	**$ 28,266.50**	**$ 2,330.22**	**$ 30,596.71**	**60.35%**
Profit (net cost x %) ; 10%		**$ 4,142.37**	**$ -**	**$ 2,919.93**	**$ 2,919.93**	**$ 2,826.65**	**$ 233.02**	**$ 3,059.67**	**6.03%**
Overheads (supervision and risk) net cost x % ; 10%		**$ 4,142.37**	**$ -**	**$ 2,919.93**	**$ 2,919.93**	**$ 2,826.65**	**$ 233.02**	**$ 3,059.67**	**6.03%**
Tax (net cost + profit + overhead) x 2 %)		**$ 994.17**	**$ -**	**$ 700.78**	**$ 700.78**	**$ 678.40**	**$ 55.93**	**$ 734.32**	**1.45%**
Total gross-cost		***$ 50,702.59***	***$ -***	***$ 35,739.91***	**$ 35,739.91**	***$ 34,598.19***	***$ 2,852.19***	**$ 37,450.38**	**73.86%**

Inspeksaun Husi :

Eng.Marcos Ximenes de Araujo
Eng. ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun ADN,I.P

Verifica Husi,

Eng. Aniceto da Costa
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun ADN,I.P

Sertifika Husi,

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT2)
Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica**

No. kontratu : MPW-W-190097

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°20"29,76 Latetude : - 8°35"42,414

End Point : Long 125°22'58,65 Latetude : - 8°37'47,591

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 98,46% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexco:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT2)
Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica**

No. kontratu : MPW-W-190097

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°20"29,76 Latetude : - 8°35"42,414

End Point : Long 125°22'58,65 Latetude : - 8°37'47,591

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 98,46% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu, Anexco:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT2)
Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica**

No. kontratu : MPW-W-190097

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°20"29,76 Latetude : - 8°35"42,414

End Point : Long 125°22'58,65 Latetude : - 8°37'47,591

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 98,46% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexco:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT2)
Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica**

No. kontratu : MPW-W-190097

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°20"29,76 Latetude : - 8°35"42,414

End Point : Long 125°22'58,65 Latetude : - 8°37'47,591

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 98,46% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexco

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT2)
Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica**

No. kontratu : MPW-W-190097

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°20"29,76 Latetude : - 8°35"42,414

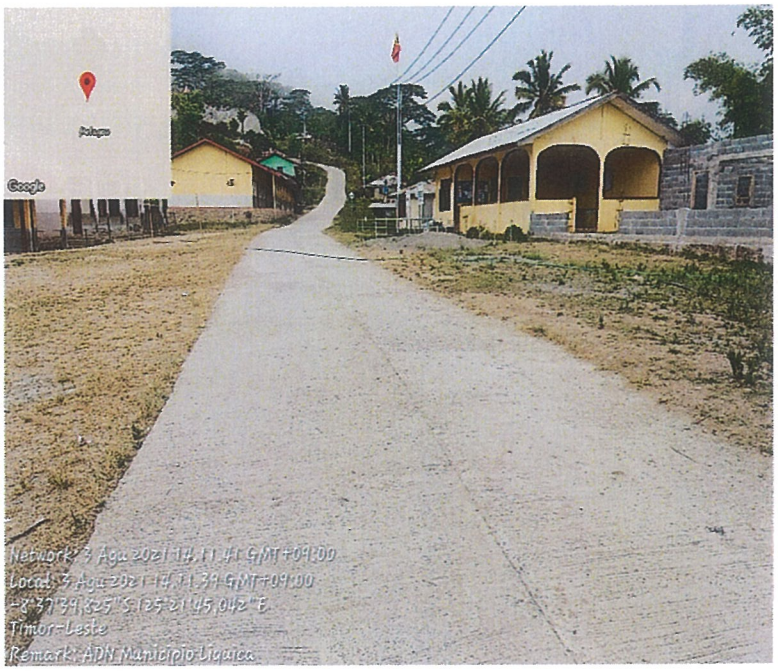
End Point : Long 125°22'58,65 Latetude : - 8°37'47,591

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 98,46% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexco:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT2)
Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica**

No. kontratu : MPW-W-190097

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°20"29,76 Latetude : - 8°35"42,414

End Point : Long 125°22'58,65 Latetude : - 8°37'47,591

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 98,46% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexco:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT2)
Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica**

No. kontratu : MPW-W-190097

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°20"29,76 Latetude : - 8°35"42,414

End Point : Long 125°22'58,65 Latetude : - 8°37'47,591

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 98,46% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexco:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT2)
Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica**

No. kontratu : MPW-W-190097

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°20"29,76 Latetude : - 8°35"42,414

End Point : Long 125°22'58,65 Latetude : - 8°37'47,591

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 98,46% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexco:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT2)
Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica**

No. kontratu : MPW-W-190097

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°20"29,76 Latetude : - 8°35"42,414

End Point : Long 125°22'58,65 Latetude : - 8°37'47,591

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 98,46% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexco:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT2)
Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica**

No. kontratu : MPW-W-190097

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°20"29,76 Latetude : - 8°35"42,414

End Point : Long 125°22'58,65 Latetude : - 8°37'47,591

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 98,46% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexco:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT2)
Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica**

No. kontratu : MPW-W-190097

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°20"29,76 Latetude : - 8°35"42,414

End Point : Long 125°22'58,65 Latetude : - 8°37'47,591

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 98,46% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexco:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (BZT6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Foun EBF Hatugara**
No. kontratu : **(RFQ : 19/029-Q-R)**

Data Inspesaun : 25 Agostu 2021

Fatin Inspesaun : Hatugara, Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 36' 17.782''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 22' 0.494''**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....


4. .....


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Projeitu refere fizikamente lao tarde loos, iha problema barak iha terenu mak infrenta; hanesan Site Engineer la iha, badain hela nain 2 mak servisu, material iha terenu menus no kompania nia prezensa menus tebes. 

ANEXU C1 (BZT6)

Back-up Data

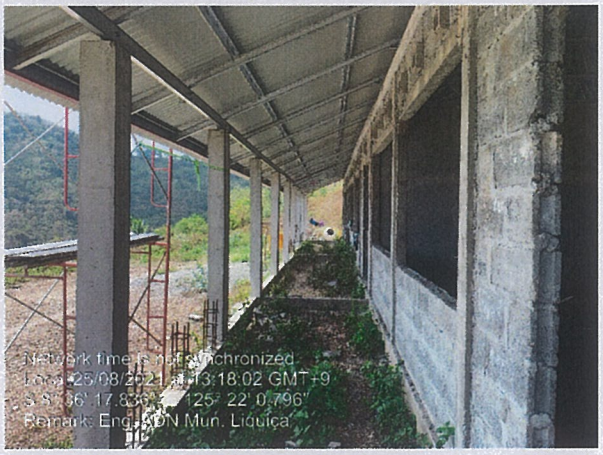Naran Projeto : **Konstrusaun Foun EBF Hatugara**
No. kontratu : **(RFQ : 19/029-Q-R)**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

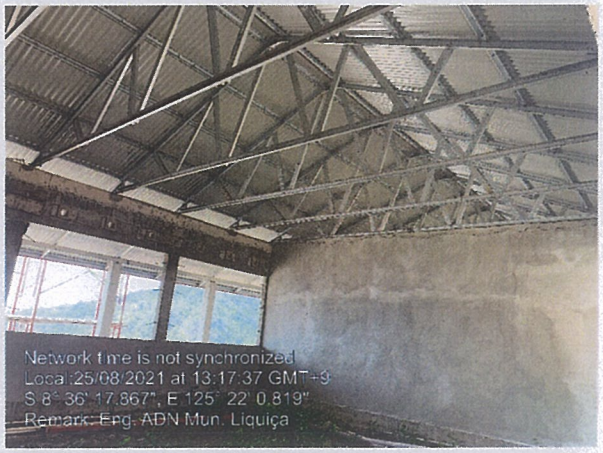Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

ANEXU C1 (BZT6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Foun EBF Hatugara**
No. kontratu : **(RFQ : 19/029-Q-R)**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

ANEXU C1 (BZT6)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Foun EBF Hatugara**
No. kontratu : **(RFQ : 19/029-Q-R)**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..….	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	



#ANEXU C1-(BZT3) Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02**

Data Inspesaun : 10 Agostu 2021

Fatin Inspesaun : Maumeta, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : S 8º35'26.471'', Latetude : .....

End Point : Long : E 125º 20'58.069'', Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

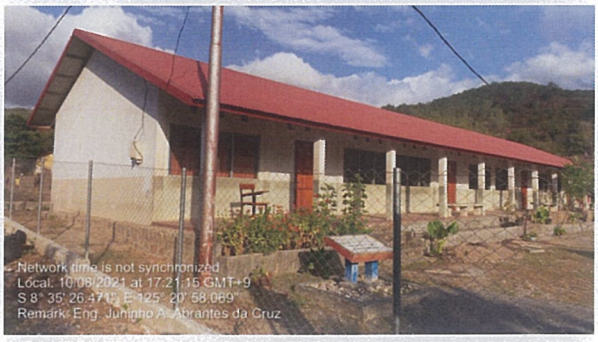
4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Progresu projeitu refere remata tiha ona no uja tiha ona husi autoridade lokal. Tuir informasaun husi autoridade sira katak servisu ba item balu neebe la realiza iha parte estrutura muda ba fali servisu redi haleu. 

#ANEXU C1-(BZT3) Back-up Data


Naran Projeto : **Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Progresu pagamentu atinji ona **76,75%** no kompania tenta atu finaliza prosesu ba pedido pagamentu ikus nian. 

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……	

#ANEXU C1-(BZT3) Back-up Data

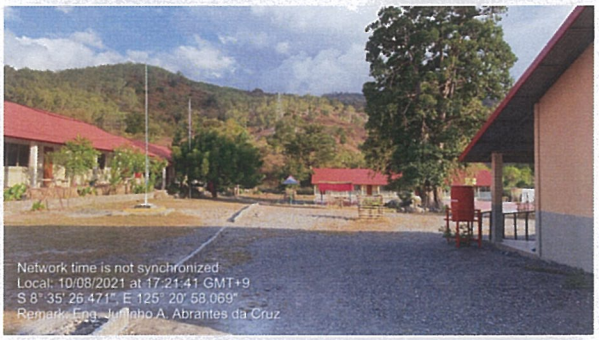Naran Projeto : **Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)**
No. kontratu : **CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..…..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

ANEXO C1 (BZT4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Libaloa-Fahilebo, Fahilebo-Bucumera, Fahilebo-Fatumasi**

No. kontratu : MPW-W-190111

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : 125°22'59.782 Latetude : - 8°37'59,079

End Point : Long : 125°26'18.016 Latetude : - 8°35'57.97

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 97,90% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu, Foto Anexo:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXO C1 (BZT4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Libaloa-Fahilebo, Fahilebo-Bucumera, Fahilebo-Fatumasi**

No. kontratu : MPW-W-190111

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°35"57.97 Latetude : - 8°37'59,079

End Point : Long : 125°26'18.016 Latetude : 125°22'59.782

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho **Observasaun iha tereno no Foto Aktual**

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 97,90% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexo:



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Libaloa-Fahilebo, Fahilebo-Bucumera, Fahilebo-Fatumasi**

No. kontratu : MPW-W-190111

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°35"57.97 Latetude : - 8°37'59,079

End Point : Long : 125°26'18.016 Latetude : 125°22'59.782

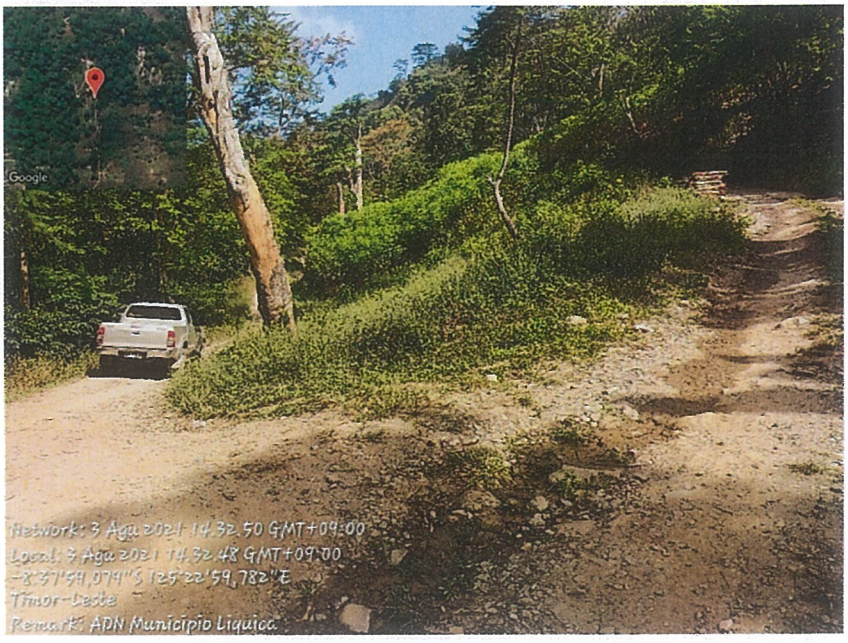
Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 97,90% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu

Anexo:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Libaloa-Fahilebo, Fahilebo-Bucumera, Fahilebo-Fatumasi**

No. kontratu : MPW-W-190111

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°35"57.97 Latetude : - 8°37'59,079

End Point : Long : 125°26'18.016 Latetude : 125°22'59.782

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

2. Eng.Juninho A.Abrantes da Cruz

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 97,90% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexo:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT4)
Back-up Data

Naran Projeto : **Libaloa-Fahilebo, Fahilebo-Bucumera, Fahilebo-Fatumasi**

No. kontratu : MPW-W-190111

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°35"57.97 Latetude : - 8°37'59,079

End Point : Long : 125°26'18.016 Latetude : 125°22'59.782

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 97,90% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexo:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXO C1 (BZT4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Libaloa-Fahilebo, Fahilebo-Bucumera, Fahilebo-Fatumasi**

No. kontratu : MPW-W-190111

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°35"57.97 Latetude : - 8°37'59,079

End Point : Long : 125°26'18.016 Latetude : 125°22'59.782

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 97,90% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexo:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT4)
Back-up Data

Naran Projeto : **Libaloa-Fahilebo, Fahilebo-Bucumera, Fahilebo-Fatumasi**

No. kontratu : MPW-W-190111

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°35"57.97 Latetude : - 8°37'59,079

End Point : Long : 125°26'18.016 Latetude : 125°22'59.782

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho **Observasaun iha tereno no Foto Aktual**

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 97,90% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexo:



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT4)

Back-up Data

Naran Projeto : **Libaloa-Fahilebo, Fahilebo-Bucumera, Fahilebo-Fatumasi**

No. kontratu : MPW-W-190111

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°35"57.97 Latetude : - 8°37'59,079

End Point : Long : 125°26'18.016 Latetude : 125°22'59.782

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 97,90% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexo:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT4)
Back-up Data

Naran Projeto : **Libaloa-Fahilebo, Fahilebo-Bucumera, Fahilebo-Fatumasi**

No. kontratu : MPW-W-190111

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°35"57.97 Latetude : - 8°37'59,079

End Point : Long : 125°26'18.016 Latetude : 125°22'59.782

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 97,90% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun diak hotu Anexo:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT4)
Back-up Data

Naran Projeto : **Libaloa-Fahilebo, Fahilebo-Bucumera, Fahilebo-Fatumasi**

No. kontratu : MPW-W-190111

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°35"57.97 Latetude : - 8°37'59,079

End Point : Long : 125°26'18.016 Latetude : 125°22'59.782

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 97,90% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun nebe at no presija atu hadia fali Anexo:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

ANEXO C1 (BZT4)
Back-up Data

Naran Projeto : **Libaloa-Fahilebo, Fahilebo-Bucumera, Fahilebo-Fatumasi**

No. kontratu : MPW-W-190111

Data Inspesaun : 03/08/2021

Fatin Inspesaun : Bazartete

Koordinadas :

Start Point : Long : - 8°35"57.97 Latetude : - 8°37'59,079

End Point : Long : 125°26'18.016 Latetude : 125°22'59.782

Naran Inspector : 1. Eng.Marcos Ximenes de Araujo

Sketch & Foto Desenho

Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 97,90% no Konstrusaun refere iha tereno kondisaun nebe at no presija atu hadia fali Anexo:

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (BZT5)
Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Moralha Foun Matadouro Tibar**
No. kontratu : **RDTL-MAP-PO2019:19726**

Data Inspesaun : **17 Agostu 2021**

Fatin Inspesaun : Matadouro, Tibar, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 3.605''**, Latetude : .....

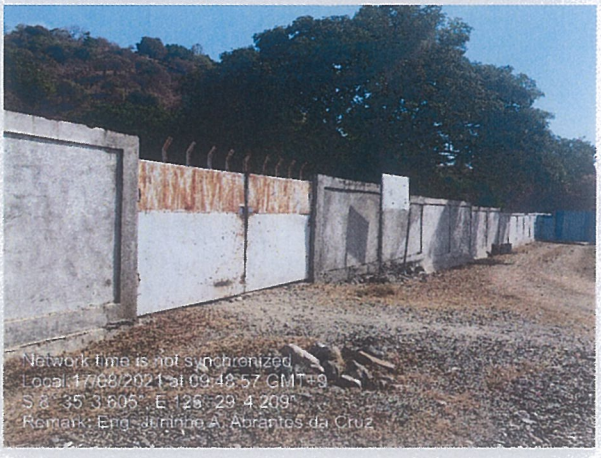
End Point : Long : **E 125º 29' 4.209''**, Latetude : .....

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2. .....


3. .....


4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Provezoriamente servisu iha terenu paradu hela no la iha aktividade ruma husi autoridade sira tan nee seidauk iha informasaun klaru husi terenu. Pagamentu ikus atinji deit **77,60%.** 

ANEXU C1 (BZT5)
Back-up Data

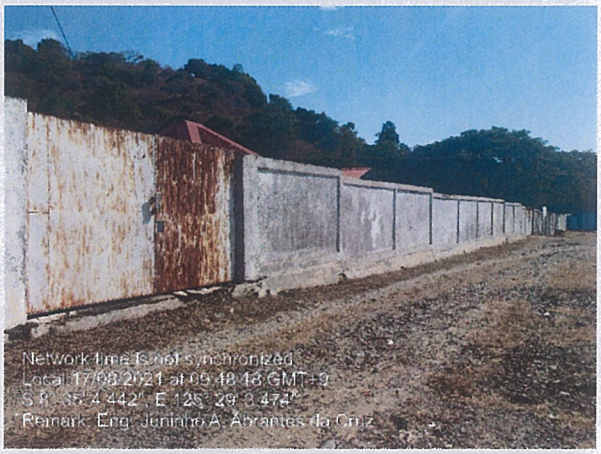Naran Projeto : **Konstrusaun Moralha Foun Matadouro Tibar**
No. kontratu : **RDTL-MAP-PO2019:19726**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

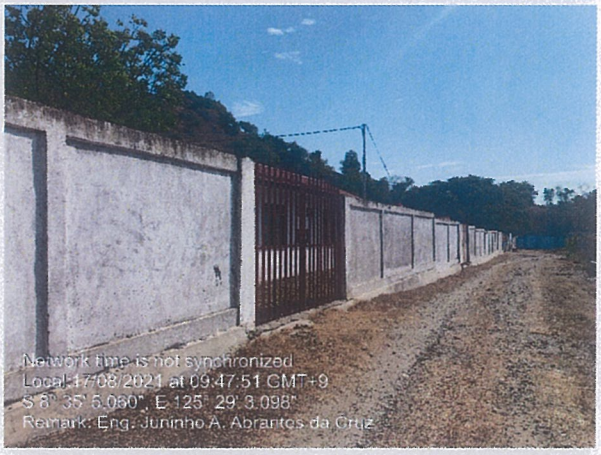Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……	

ANEXU C1 (BZT5)
Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Moralha Foun Matadouro Tibar**
No. kontratu : **RDTL-MAP-PO2019:19726**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..…..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

#ANEXU C1-(BZT7) Back-up Data

Naran Projeto : **Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar**
No. kontratu : **MOP-W-190184**

Data Inspesaun : **12 Agostu 2021**

Fatin Inspesaun : Tibar, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 34' 30.252''**, Latetude : .....

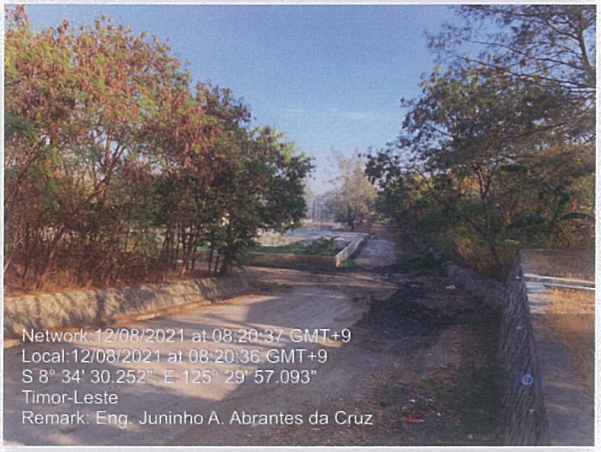
End Point : Long : **E 125º 29' 57.093''**, Latetude : .....

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Iha momentu ba hasai dokumentasaun iha terenu la iha autoridade lokal/seguransa ruma iha fatin refere atu bele passa informasaun ka loke portaun hodi bele tama ba laran. 

#ANEXU C1-(BZT7) Back-up Data

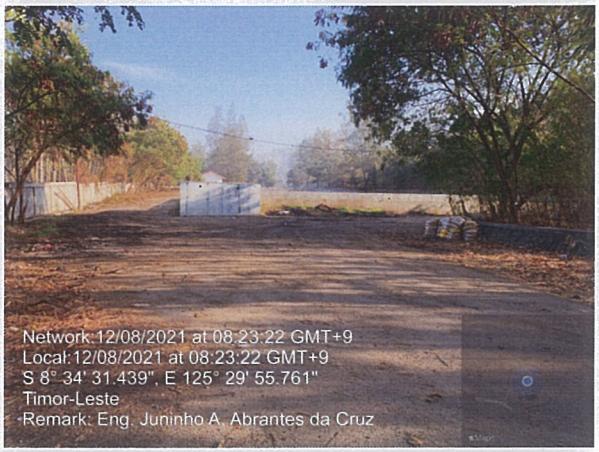
Naran Projeto : **Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar**
No. kontratu : **MOP-W-190184**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Bele hasai deit dokumentasaun husi portaun liur tanba portaun save metin. Tuir nia progresu pagamentu ikus update nee atinji **79,42%.** 

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

#ANEXU C1-(BZT7) Back-up Data

Naran Projeto : **Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar**
No. kontratu : **MOP-W-190184**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..…..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

#ANEXU C1-(BZT7) Back-up Data

Naran Projeto : **Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar**
No. kontratu : **MOP-W-190184**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..…..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

#ANEXU C1- (BZT8) Back-up Data

Naran Projeto : **New Water Supply of Bairos PNTL Liquica**
No. kontratu : **SSS/054/MI-2019**

Data Inspesaun : **17 Agostu 2021**

Fatin Inspesaun : Maumeta, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 30.750''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 20' 50.964''**, Latetude : .....

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Bee seidauk bele utiliza husi autoridade sira tanba kompania seidauk bele foo fiar ba autoridade lokal sira konaba kontrola panel kontrolu bee nian, tanba kompania lakoi foti risku estragus ba panel no maki bee nian. 

#ANEXU C1- (BZT8) Back-up Data

Naran Projeto : **New Water Supply of Bairos PNTL Liquica**
No. kontratu : **SSS/054/MI-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Too ohin loron kompania lori fila tiha chave ba kontrola panel bee nian no sei hein konfirmasaun ho projeitu nain konaba problema ida nee. 

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

#ANEXU C1-(BZT8) Back-up Data

Naran Projeto : **New Water Supply of Bairos PNTL Liquica**
No. kontratu : **SSS/054/MI-2019**

Data Inspesaun : **11 Agostu 2021**

Fatin Inspesaun : Maumeta, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 30.750''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 20' 50.964''**, Latetude : .....

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Progresu atual iha terenu remata ona no iha inspesaun final nee hare ba item rua deit neebe sei falta, hare ba panel no perfurasaun bee (troka maki bee nian tanba uluk uja la tuir spec) agora dadaun uja ona marka Grundfos neebe tuir spec iha BoQ. 

#ANEXU C1-(BZT8) Back-up Data

Naran Projeto : **New Water Supply of Bairos PNTL Liquica**
No. kontratu : **SSS/054/MI-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Iha inspesaun nee iha mos partisipasaun husi projeitu nain, tekniku Ministerio Interior, Gabinete Ministerio Interior, PNTL Municipal Liquica, autoridade lokal no husi kompania rasik. 

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……	

#ANEXU C1-(BZT8) Back-up Data

Naran Projeto : **New Water Supply of Bairos PNTL Liquica**
No. kontratu : **SSS/054/MI-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Bazeia ba rezultadu bee sai mai husi maki bee nian moos hela no la meer, maibe tanba iha keixa husi autoridade lokal sira neebe uja bee dehan katak bee dalaruma sei meer no merak, husi ekipa inspesaun hotu desidi ona katak sei observa tan lai kualidade bee nian durante semana ida ou rua hafoin bele foti desizaun final. 

#ANEXU C1-(BZT8) Back-up Data

Naran Projeto : **New Water Supply of Bairos PNTL Liquica**
No. kontratu : **SSS/054/MI-2019**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Tekniku kompania no tekniku Ministerio foo ona instrusaun ba autoridade lokal sira oinsa atu kontrola ba maki nee liu husi panel no atu kontrola volume bee wainhira tenke taka ka atu halo orariu hodi kontrola kuantidade bee no labele estraga maki bee. 

ANEXU C1 (BZT9)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Armajen Foun Matadoro-Tibar**
No. kontratu : **RDTL-MAP-PO2019:19532**

Data Inspesaun : 03 Agostu 2021

Fatin Inspesaun : Matadouru, Tibar, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **8.35'4.56"S**, Latetude : .....

End Point : Long : **125.28'59.582"E**, Latetude : .....

Naran Inspector : 1. Juninho António Abrantes da Cruz

2. .....

3. .....

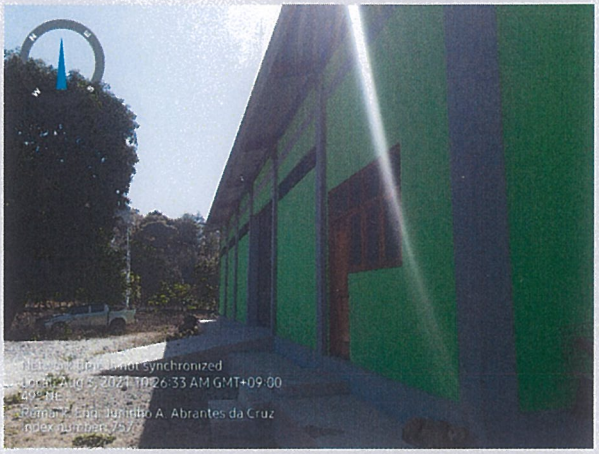
4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	Progresu atual remata ona no pagamentu atinji deit **82,29%** tanba iha item balu mak seidauk implementa husi kompania no sei hein konfirmasaun ho projeitu nain. 
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ANEXU C1 (BZT9)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Armajen Foun Matadoro-Tibar**
No. kontratu : **RDTL-MAP-PO2019:19532**

	Tanba la iha dadus ativu no dezeniu neebe kompania bele implementa tuir iha terenu tuir item neebe sei falta, kompania sei tenta buka solusaun ho projeitu nain atu tetu ba servisu refere.
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	
	

#ANEXU C1 – (BZT11)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Isolation for Covid-19 at Chi-Liquica**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-20-163**

Data Inspesaun : **25 Agostu 2021**

Fatin Inspesaun : Maumeta, Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **8.35'32.954"S**, Latetude : .....

End Point : Long : **125.20'30.416"E**, Latetude : .....

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2. .....

3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	Progresu atual husi projeitu refere iha terenu kuaze lao normal no iha orientasaun husi tekniku Saude, no servisu neebe lao hela mak hanesan; monta keramik, instalasaun eletrisidade, monta lisplank, servisu pintura no monta AC. 

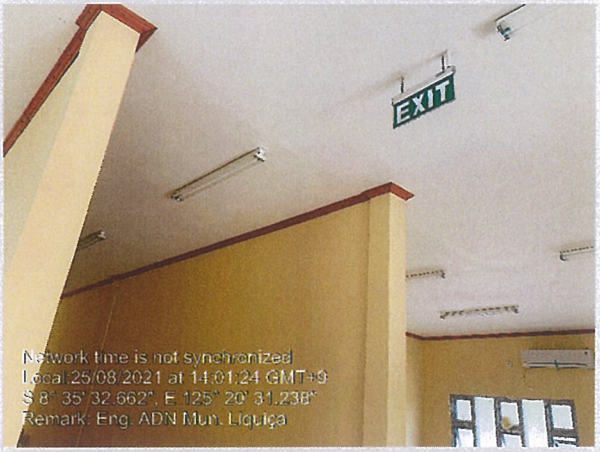
#ANEXU C1 – (BZT11)
Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Isolation for Covid-19 at Chi-Liquica**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-20-163**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	Servisu pintura uma laran layer 2 tiha ona no iha liur kuaze seidauk hotu; instalasaun AC hein deit atu dada linha eletrisidade husi EDTL hafoin koko. 
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	Odamatan, janela, ventilasaun servisu hotu ona, hein hamoos ikus. 

#ANEXU C1 – (BZT11)
Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Isolation for Covid-19 at Chi-Liquica**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-20-163**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..….	Servisu eletrisidade mos hein dada linha husi EDTL hafoin bele koko dala ida. 

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

#ANEXU C1 – (BZT11)
Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Isolation for Covid-19 at Chi-Liquica**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-20-163**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Servisu lisplank nian mos kuaze atu remata ona, hein vernice ikus. 
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Fizikamente foer iha terenu kuaze atinji 85% no kompania promete sei remata iha semana ida ou rua tan. 

#ANEXU C1 – (BZT11)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Isolation for Covid-19 at Chi-Liquica**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-20-163**

Data Inspesaun : **06 Agostu 2021**

Fatin Inspesaun : Maumeta, Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **8.35'32.954"S**, Latetude : .....

End Point : Long : **125.20'30.416"E**, Latetude : .....

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2. .....

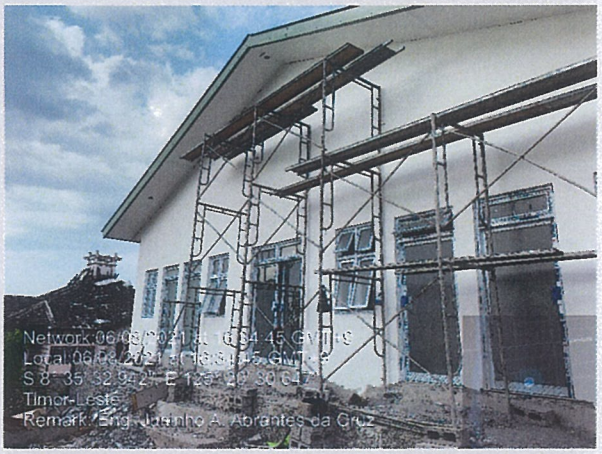
3. .....

4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	Progresu atual husi projeitu refere iha terenu kuaze lao normal no iha orientasaun husi tekniku Saude, no servisu neebe lao hela mak hanesan; plamir, monta keramik, instalasaun eletrisidade no monta asesoris odamatan. 
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual


#ANEXU C1 – (BZT11)
Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Isolation for Covid-19 at Chi-Liquica**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-20-163**

	Servisu ba plamir nian kuaze atu remata ona no sei hela deit parte balu neebe sei kasar atu plamir halo didiak fila fali. 
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	Servisu ba plafon nian, Gibsum mos besik remata ona, hein monta no instala tiha lai linha eletrisidade hafoin halo kaber no monta lis plafon. 


#ANEXU C1 – (BZT11)
Back-up Data

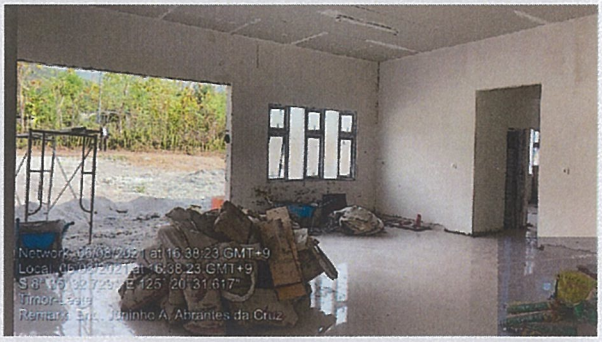Naran Projeto : **New Construction of Isolation for Covid-19 at Chi-Liquica**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-20-163**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Servisu keramik nian mos kuaze atu remata ona, falta plint keramik mak kuaze seidauk maibe lao hela, no ba haris fatin nian mos hanesan. 
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Toilet, floor drain, drain pipe, wastafel sira nee monta tiha ona iha haris fatin hein instalasaun bee no drainajen tama hodi nunee bele koko item sira nee lao ho diak ka falta buat balu. 

#ANEXU C1 – (BZT11)
Back-up Data

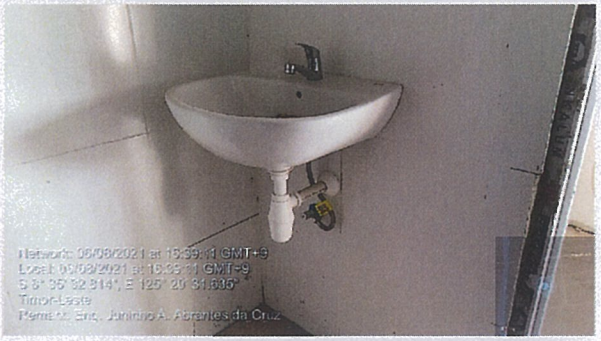Naran Projeto : **New Construction of Isolation for Covid-19 at Chi-Liquica**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-20-163**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Wastafel nia pozisaun mak iha mudansa ituan tanba nia pipa/paralon tabele sai liu hodi nunee rekomenda husi tekniku Saude nian atu tanam tiha paralon sira nee hodi labele feio. 
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Iha tempu refere iha mos vijita husi Sra. Ministra Saude nian no nia ekipa atu hare kondisaun atual iha terenu ba servisu projeitu refere. 

#ANEXU C1 – BZT11

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Isolation for Covid-19 at Chi-Liquica**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-20-163**

Data Inspesaun : **11 Agostu 2021**

Fatin Inspesaun : Maumeta, Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **8.35'32.954"S**, Latetude : .....

End Point : Long : **125.20'30.416"E**, Latetude : .....

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2. .....

3. .....

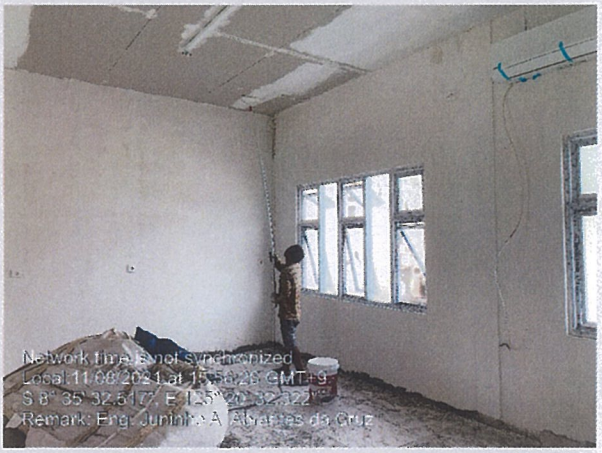
4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	Progresu atual husi projeitu refere iha terenu kuaze lao normal no iha orientasaun husi tekniku Saude, no servisu neebe lao hela mak hanesan; plamir, monta keramik, instalasaun eletrisidade, monta lisplank, monta asesoris odamatan no monta AC. 

#ANEXU C1 – BZT11

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction of Isolation for Covid-19 at Chi-Liquica**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-20-163**


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	Servisu ba plafon nian komesa ona pinta tutuir, tinta mutin no uja tinta Vinilex. 
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
	AC iha sala nian komesa monta ona, ba 2 pk nian iha unit 7 no dadaun monta ona 5. 

#ANEXU C1 – BZT11

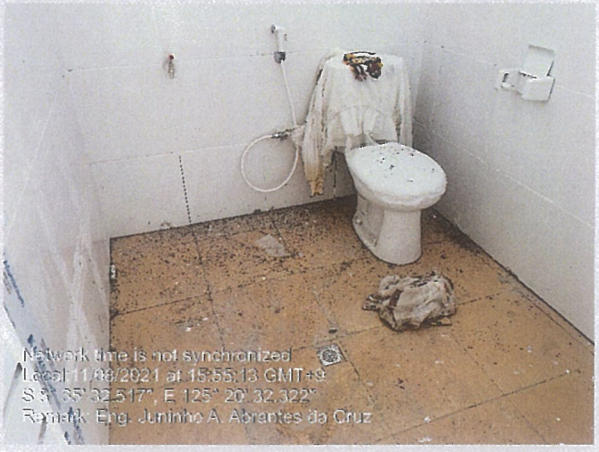Back-up Data



Naran Projeto : **New Construction of Isolation for Covid-19 at Chi-Liquica**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-20-163**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Toilet, floor drain, drain pipe, wastafel sira nee monta tiha ona iha haris fatin hein instalasaun bee no drainajen tama hodi nunee bele koko item sira nee lao ho diak ka falta buat balu. 

#ANEXU C1 – BZT11
Back-up Data

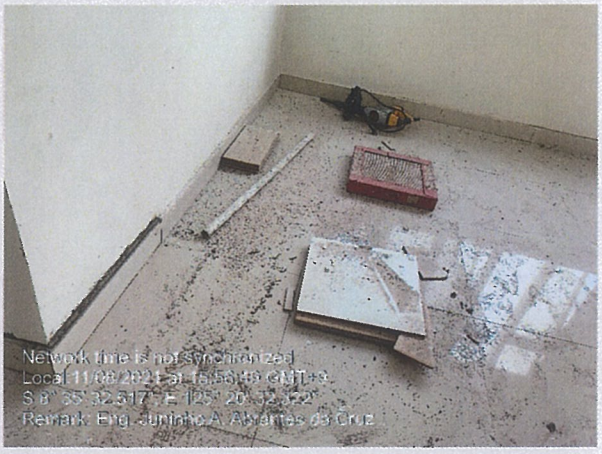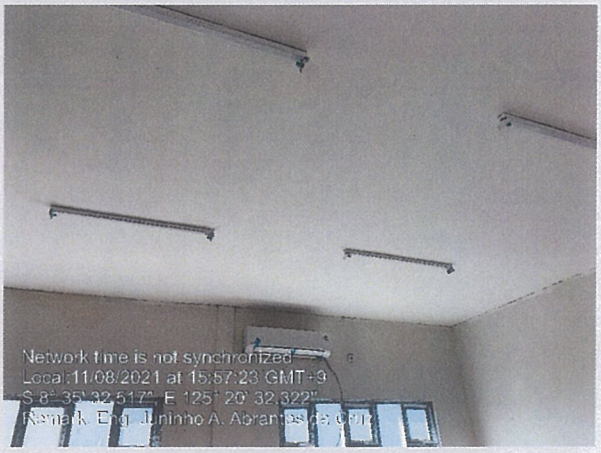Naran Projeto : **New Construction of Isolation for Covid-19 at Chi-Liquica**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-NCB-20-163**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Servisu monta keramik no plint keramik ba sala no haris fatin kuaze hotu ona. 
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	Servisu monta lampu philips nian lao tiha ona no hein instala deit lampu. 

ANEXU C1 (BZT12)

Back-up Data

Naran Projeto : **Kanalizasaun Bee Mos ho Sistema Gravitasaun iha Aipelo-Liquica**
No. kontratu : **022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIODEPARTMENT**

Data Inspesaun : **12 Agostu 2021**

Fatin Inspesaun : Aipelo, Bazartete, Liquica

Koordinadas :

Start Point : Long : **S 8º 35' 21.235''**, Latetude : .....

End Point : Long : **E 125º 23' 43.750''**, Latetude : .....

Naran Inspector : **1. Juninho António Abrantes da Cruz**

2. .....

3. .....


4. .....

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	Tuir informasaun ikus nian hateten katak obra refere atinji deit **92,14%** no iha problema ho prosesu retensaun tanba iha komunidade balu mak halo abuzu poder ba obra refere. 

ANEXU C1 (BZT12)

Back-up Data

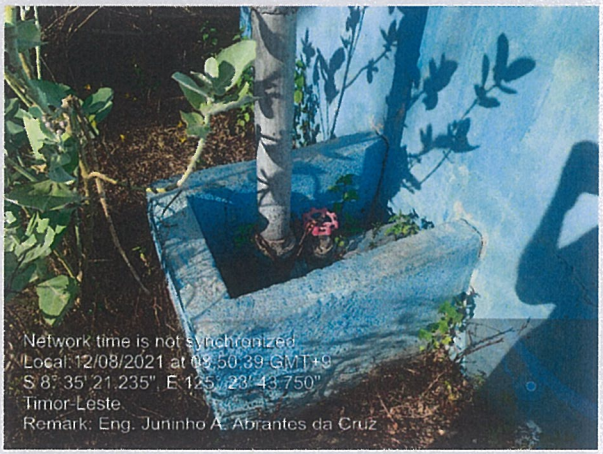Naran Projeto : **Kanalizasaun Bee Mos ho Sistema Gravitasaun iha Aipelo-Liquica**
No. kontratu : **022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIODEPARTMENT**


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……	Kanalizasaun bee nian mos oras nee mate hela tanba linha eletrisidade/trafo neebe dada listrik ba panel hetan estragus husi anin boot fulan rua kotuk liu ba. 

ANEXU C1 (BZT12)

Back-up Data

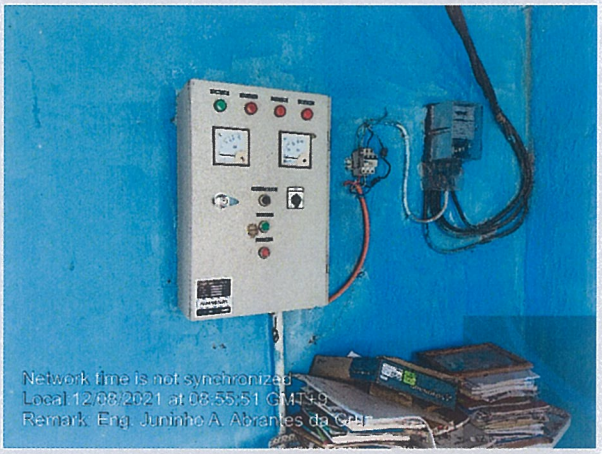Naran Projeto : **Kanalizasaun Bee Mos ho Sistema Gravitasaun iha Aipelo-Liquica**
No. kontratu : **022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIODEPARTMENT**

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..…..	Tuir komunidade lokal sira hatoo too agora seidauk iha atendimentu ba problema atual iha terenu. 

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu ……..	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO A
Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica

NU	NARAN PROJ.	DONO PROJETO	KAT. PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONT.	MONT. KONT. ($)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGAMENTO (%)	PAGA. ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Liquica Vila	Liquica	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	$ 153,851.88	Dec. 5, 2019	80.41%	64.40%	$ 99,079.60	$ 54,772.28	ON-GOING	
2	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	Liquica Vila	Liquica	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	$ 1,394,750.00	May 17, 2017	47.12	47.12%	$ 657,275.92	$ 737,474.08	ON-GOING	
3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Liquica Vila	Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	$ 55,012.05	Aug. 22, 2019	100.00	89.92%	$ 49,468.35	$ 5,543.70	PHO	
4	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Liquica Vila	Liquica	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	$ 71,468.49	Aug. 19, 2019	100.00	90.00%	$ 64,321.64	$ 7,146.85	ON-GOING	
5	New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM - CD	FLOOD CONTROL	Liquica Vila	Liquica	HL Fica	013LM/RDTL/MPIE/A.D.N/DIL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt	$ 311,975.10	Aug. 21, 2019	100.00	83.10%	$ 259,264.36	$ 52,710.74	ON-GOING	
6	Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Liquica	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Liquica Vila	Liquica	Metalika Unipessoal, Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/01	$ 173,225.03	July 22, 2019	90.97%	55.82%	$ 89,201.54	$ 70,606.19	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
7	New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Liquica Vila	Liquica	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	$ 593,093.80	Jan. 6, 2017	74.94	67.45%	$ 400,036.22	$ 193,057.58	ON-GOING	
8	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Liquica Vila	Liquica	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	$ 276,484.00	July 6, 2016	92.77	83.49%	$ 230,841.25	$ 45,642.75	ON-GOING	
9	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Liquica Vila	Liquica	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	$ 452,362.93	Dec. 20, 2019	57.57%	37.94%	$ 171,631.12	$ 280,731.81	ON-GOING	
10	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubara	Liquica	Fu Unip,Lda	0000	$ 13,000.00	Jan. 1, 2016	0.00	0.00%	$ -	$ 13,000.00	ON-GOING	
11	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubara	Liquica	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	$ 288,760.22	July 6, 2016	83.73	75.36%	$ 217,606.07	$ 71,154.15	ON-GOING	
12	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Maubara	Liquica	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	$ 1,901,334.67	Sept. 7, 2017	88.02	79.22%	$ 1,506,224.85	$ 395,109.82	ON-GOING	
13	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	Maubara	Liquica	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	$ 275,000.00	Dec. 27, 2016	40.00	38.00%	$ 104,500.00	$ 170,500.00	ON-GOING	
14	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubara Lisa	Liquica	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	$ 171,850.61	Aug. 16, 2019	73.50%	58.59%	$ 100,689.88	$ 71,160.73	ON-GOING	
15	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	AGUA E SANEAMENTO	Maubara	Liquica	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	$ 170,965.65	Jan. 3, 2019	54.99%	42.53%	$ 72,706.50	$ 98,259.15	ON-GOING	Provizoriamente paradu hela
16	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	Maubara	Liquica	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	$ 20,748,566.21	Nov. 21, 2016	59.69	53.73%	$ 11,147,173.38	$ 9,601,392.83	ON-GOING	
17	Consultant Supervision Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota Ain Roads, and Baucau - Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	Maubara	Liquica	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	$ 6,222,977.00	May 3, 2017	64.01	64.01%	$ 3,983,440.68	$ 2,239,536.32	ON-GOING	
18	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADA	Maubara	Liquica	Luliana Unip,Lda	MPW-W-190098	$ 50,702.59	Aug. 28, 2019	73.86%	61.41%	$ 31,138.37	$ 19,564.22	ON-GOING	
19	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Bazartete	Liquica	Mina petro leste Lda	RDTL-11004589	$ 499,250.84	Oct. 22, 2010	100.00	90.00%	$ 449,325.76	$ 49,925.08	**ABANDONA**	
20	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Bazartete	Liquica	Banir Lema	MPW-W-190097	$ 565,452.33	Aug. 14, 2019	100.00%	88.61%	$ 501,046.02	$ 64,406.31	ON-GOING	

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXO A
Lista Geral Projetu On-going Municipio Liquica

NU	NARAN PROJ.	DONO PROJETO	KAT. PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNICIPIO	NARAN COMPANHA	NUMERO KONT.	MONT. KONT. ($)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGAMENTO (%)	PAGA. ($)	BALANSU ($)	STATUS PROJECT	OBSERVASAUN
21	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Bazartete	Liquica	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	$ 162,714.83	Aug. 16, 2019	85.28%	76.75%	$ 124,884.78	$ 37,830.05	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
22	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM -CD	ESTRADAS	Bazartete	Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	$ 73,270.51	Sept. 5, 2019	100.00%	88.11%	$ 64,558.26	$ 8,712.25	PHO	
23	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM - BS	AGRICULTURA	Bazartete	Liquica	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	$ 23,950.17	Dec. 5, 2019	77.60%	69.84%	$ 16,726.74	$ 7,223.43	ON-GOING	Provezoriamente servisu paradu hela
24	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM - BS	EDUKASAUN	Bazartete	Liquica	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	$ 67,492.69	Nov. 10, 2019	29.90%	26.91%	$ 18,163.22	$ 49,329.47	ON-GOING	
25	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - BS	AGUA E SANEAMENTO	Bazartete	Liquica	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	$ 23,179.32	Oct. 22, 2019	79.24%	52.23%	$ 12,106.37	$ 11,072.90	ON-GOING	Provezoriamente servisu paradu hela
26	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	SEGURANCA NO DEFESA	Bazartete	Liquica	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	$ 58,107.88	Nov. 29, 2019	38%	35.87%	$ 20,842.57	$ 37,265.31	ON-GOING	
27	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM - BS	AGRICULTURA	Bazartete	Liquica	Naesalobu	MAP-P02019:19532	$ 67,927.04	Dec. 5, 2019	82.29	74.06%	$ 50,309.27	$ 17,617.77	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona
28	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Bazartete	Liquica	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	$ 66,557.90	Oct. 23, 2020	64.60	58.14%	$ 38,698.37	$ 27,859.53	ON-GOING	Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
29	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-20	SAUDE	Bazartete	Liquica	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	$ 243,368.08	Oct. 22, 2020	**50.86%**	30.34%	$ 73,849.61	$ 169,518.47	ON-GOING	
30	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM -CD	AGUA E SANEAMENTO	Bazartete	Liquica	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	$ 99,484.80	Sept. 9, 2019	92.14%	82.93%	$ 82,502.69	$ 16,982.11	ON-GOING	Falta retensaun
31	For River Normalization & Landslide Clearing Works Of Tibar - Gleno Emergency Project	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	FLOOD CONTROL	Bazartete	Liquica	Shabryca Const. Unip,Lda	MPW-W-SS-EP 210011	$ 68,711.28	May 28, 2021	0%	0%	$ -	$ -	ON-GOING	
	TOTAL								**$ 35,344,847.90**				**$ 20,637,613.39**	**58.39%**		

Prepara Husi,

(Eng. Marcus Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projetu Infrastutura Transporte e Irigasaun, ADN,I.P

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Eng. ba Edificio Publiku Agua e Saneamento, ADN,I.P

(Eng. Camilio de Jesus)
Eng. Mechanical Electricidade ADN,I.P

Sertifika Husi

(Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNICIPIO LIQUICA

					LOKALIZASAUN PROJETU					Aug-21		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN KOMPANHA	NUMERO KONTRATU	DATA KONTRATU	Progresu Actual Fulan ida neé	Montante Actual Fulan ida neé	%Actual Fulan ida neé
1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Liquica Vila	Liquica	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	Dec. 5, 2019	8.96%		80.41%
2	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	PORTOS	Liquica Vila	Liquica	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	May 17, 2017			
3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Liquica Vila	Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	Aug. 22, 2019	0.00%	$ -	100%
4	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Liquica Vila	Liquica	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	Aug. 19, 2019	0.00%	$ -	100%
5	New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM - CD	FLOOD CONTROL	Liquica Vila	Liquica	HL Fica	013LM/RDTL/MPIE/A.D.N/DIL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt	Aug. 21, 2019	0.00%	$ -	100%
6	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Liquica	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Liquica Vila	Liquica	Metalika Unipessoal, Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/01	July 22, 2019	33.75%	$ 54,783.51	90.97%
7	New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Liquica Vila	Liquica	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	Jan. 6, 2017			
8	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Liquica Vila	Liquica	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	July 6, 2016			
9	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Liquica Vila	Liquica	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	Dec. 20, 2019	1.77%	$ 8,005.27	57.75%
10	Addt. Poste liga Maubara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubara	Liquica	Fu Unip,Lda	0000	Jan. 1, 2016			
11	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubara	Liquica	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	July 6, 2016			
12	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Maubara	Liquica	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	Sept. 7, 2017	0.00%	$ -	88.02%

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNICIPIO LIQUICA

					LOKALIZASAUN PROJETU					Aug-21		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN KOMPANHA	NUMERO KONTRATU	DATA KONTRATU	Progresu Actual Fulan ida neé	Montante Actual Fulan ida neé	%Actual Fulan ida neé
13	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	FI	TURISMO	Maubara	Liquica	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	Dec. 27, 2016			
14	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubara Lisa	Liquica	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	Aug. 16, 2019	8.40%	$ 14,435.45	73.500%
15	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - BS	AGUA E SANEAMENTO	Maubara	Liquica	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	Jan. 3, 2019	0.00%	$ -	54.99%
16	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADA- IMPRESTIMO	Maubara	Liquica	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	Nov. 21, 2016			
17	Consultant Supervision Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota Ain Roads, and Baucau - Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADA- IMPRESTIMO	Maubara	Liquica	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	May 3, 2017			
18	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000 - 1+600 Vaviquinia - Maubaralisa Chainage 0+000 - 12+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADA	Maubara	Liquica	Luliana Unip,Lda	MPW-W-190098	**Aug. 28, 2019**	5.63%	$ 2,106.71	73.86%
19	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Bazartete	Liquica	Mina petro leste Lda	RDTL-11004589	Oct. 22, 2010			
20	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Bazartete	Liquica	Banir Lema	MPW-W-190097	Aug. 14, 2019	0.00%	$ -	100%
21	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Bazartete	Liquica	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	Aug. 16, 2019	0.00%	$ -	85.28%
22	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - CD	ESTRADAS	Bazartete	Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	Sept. 5, 2019	0.00%	$ -	100%
23	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM - BS	AGRICULTURA	Bazartete	Liquica	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	Dec. 5, 2019	0.00%	$ -	77.60%

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

#ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNICIPIO LIQUICA

					LOKALIZASAUN PROJETU					Aug-21		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN KOMPANHA	NUMERO KONTRATU	DATA KONTRATU	Progresu Actual Fulan ida neé	Montante Actual Fulan ida neé	%Actual Fulan ida neé
24	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM - BS	EDUKASAUN	Bazartete	Liquica	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	Nov. 10, 2019	0.00%	$ -	**29.90%**
25	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM - BS	AGUA E SANEAMENTO	Bazartete	Liquica	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	Oct. 22, 2019	0.00%	$ -	79.42%
26	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	MINISTERIO DO INTERIOR	FI	SEGURANCA NO DEFESA	Bazartete	Liquica	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	Nov. 29, 2019	0.00%	$ -	38.00%
27	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM - BS	AGRICULTURA	Bazartete	Liquica	Naesalobu	MAP-P02019:19532	Dec. 5, 2019	0.00%	$ -	82.29%
28	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM - Fundu Covid	SAUDE	Bazartete	Liquica	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	Oct. 23, 2020	0.00%	$ -	64.60%
29	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM - Fundu Covid	SAUDE	Bazartete	Liquica	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	Oct. 22, 2020	17.14%	$ 41,719.58	**50.86%**
30	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM - CD	AGUA E SANEAMENTO	Bazartete	Liquica	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	Sept. 9, 2019	0.00%	$ -	92.14%
31	For River Normalization & Landslide Clearing Works Of Tibar - Gleno Emergency Project	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	FLOOD CONTROL	Bazartete	Liquica	Shabryca Const. Unip,Lda	MPW-W-SS-EP 210011	May 28, 2021			

INSPEKSAUN HUSI

(Eng. Marcus de Araujo Ximenes)
Engineru ba Projetu Infrastutura Transporte e Irigasaun ADN,I.P

(Eng. Juninho Antonio A. da Cruz)
Engineru ba Edificio Publiku Agua e Saneamento ADN,I.P

VERIFIKA HUSI

(Eng. Aniceto da Costa)
Engineru Senoir ba Projetu Infrastutura Transporte e Irigasaun ADN,I.P

(Arq. Francisco Xavier D D. Jeronimo)
Engineru Senior ba Projetu Edificio Publiko no Be'e Saneamento ADN,I.P

APROVA HUSI

(Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacão de Qualidade, ADN,I.P

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Name of Roads : Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquica Municipality

Contract No : MPW-W-190097
Contractor : Naroman Mosu Dadaun Unipessoal. Lda

SUMMARY

NO	DESCRIPTION	CONTRACT	REJULTADO VERIFIKASAUN A D N	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.				
				PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING		TO DATE	%
R-01	Demobilization + Demobilization	$ 3,020.02	$ 2,691.64	$ 1,992.00	$ 785.00	$ 2,777.00	$ 1,992.00	$ -	0.00%	$ 1,992.00	1.29%
R-02	Soulder Cleaning + Excavation/Landsliders + Gravel Surface Course	$ 87,752.89	$ 75,812.10	$ 30,357.41	$ 53,691.87	$ 84,705.03	$ 28,798.04	$ 12,141.94	7.98%	$ 40,939.98	26.61%
R-03	Lined Drain Cleaning + Cross Drain Cleaning + Stone Massonry Wall	$ 62,401.57	$ 54,124.29	$ 34,682.11	$ 23,488.23	$ 58,170.35	$ 65,739.37	$ -	0.00%	$ 65,739.37	42.73%
R-04	Traffic Sign	$ 677.40	$ 225.00	$ 362.25	$ 270.96	$ 633.21	$ 225.00	$ -	0.00%	$ 225.00	0.15%
A	**Total - net cost**	**$ 153,851.88**	**$ 132,853.03**	**$ 67,393.77**	**$ 78,236.06**	**$ 146,285.58**	**$ 96,754.41**	**$ 12,141.94**	**7.98%**	**$ 108,896.34**	**70.78%**
B	**Profit 10% * A**		**$ 13,285.30**				**$ 9,675.44**	**$ 1,214.19**	**0.80%**	**$ 10,889.63**	**7.08%**
C	**Overhead**		**$ 3,000.00**				**$ 1,500.00**	**$ -**	**0.00%**	**$ 1,500.00**	**0.97%**
D	**Tax 2%*(A + B + C)**		**$ 2,982.77**				**$ 2,158.60**	**$ 267.12**	**0.18%**	**$ 2,425.72**	**1.58%**
E	***Grand Total Cost (A + B + C + D)***	***$ 153,851.88***	**$ 152,121.10**	***$ 67,393.77***	***$ 78,236.06***	***$ 146,285.58***	***$ 110,088.45***	***$ 13,623.25***	***8.96%***	***$ 123,711.70***	**80.41%**

Inspeksaun Husi :

Eng.Marcos Ximenes de Araujo
Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transporte e Irigasaun, ADN,I.P

Verifica Husi,

Eng. Aniceto da Costa
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun, ADN, I.P

Sertifika Husi,

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e ***Validação da Qualidade ADN,I.P***

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Naran Projeitu : Konstrusaun Posto Administrativo Liquica Vila, Municipiu Liquica
Projeitu Nain : MAE
Lokalizasaun : Liquica Vila

#ANEXU C2 - (LV6)			SUMMARY											
NO.	DESCRIPTION	CONTRACT DATA	VARIATION ORDER					A D N VERIFIED						PROGRESS TO DATE (%)
		AMOUNT (US$)	ADDITION (+)	DEDUCTION (-)	TOTAL	REVISED CONTRACT	%	PREVIOUS	% BILLED	THIS BILLING		TOTAL TO DATE		
			AMOUNT (US$)	AMOUNT (US$)	AMOUNT (US$)	AMOUNT (US$)		AMOUNT		AMOUNT		AMOUNT		
1	KONSTRUSAUN POSTO													
I	Pekerjaan Awal	$ 2,454.20	$ -	$ -	$ -	$ 2,454.20	1.42%	$ 2,454.20	1.54%	$ -	0.00%	$ 2,454.20	1.54%	
II	Pekerjaan Pondasi	$ 5,021.19	$ 1,322.60	$ 73.65	$ 1,248.95	$ 6,270.14	3.62%	$ 4,947.54	3.10%	$ 1,322.60	0.76%	$ 6,270.14	3.92%	
III	Pekerjaan Beton	$ 10,890.04	$ -	$ 2,341.38	$ (2,341.38)	$ 8,548.66	4.94%	$ 6,641.38	4.16%	$ (2,287.10)	-1.32%	$ 4,354.29	2.72%	
IV	Pekerjaan Dinding	$ 10,927.58	$ -	$ 450.00	$ (450.00)	$ 10,927.58	6.31%	$ 10,820.38	6.77%	$ 107.20	0.06%	$ 10,927.58	6.84%	
V	Pemasangan Pintu, Jendela Dan Ventilasi	$ 8,800.00	$ 1,425.00	$ -	$ 1,425.00	$ 9,775.00	5.64%	$ 5,700.00	3.57%	$ 4,075.00	2.35%	$ 9,775.00	6.12%	
VI	Pekerjaan Atap	$ 15,594.28	$ -	$ -	$ -	$ 15,594.28	9.00%	$ 10,281.50	6.43%	$ 5,312.78	3.07%	$ 15,594.28	9.76%	
VII	Pekerjaan Plafon	$ 6,572.17	$ -	$ -	$ -	$ 6,572.17	3.79%	$ -	0.00%	$ 6,572.17	3.79%	$ 6,572.17	4.11%	
VIII	Pekerjaan Lantai	$ 8,060.96	$ -	$ 37.37	$ (37.37)	$ 8,060.96	4.65%	$ 2,571.61	1.61%	$ 5,489.35	3.17%	$ 8,060.96	5.04%	
IX	Instalasi Listrik	$ 3,147.73	$ 154.80	$ -	$ 154.80	$ 3,265.16	1.88%	$ 1,083.58	0.68%	$ 1,817.94	1.05%	$ 2,901.52	1.82%	
X	Pekerjaan Sanitasi	$ 4,382.42	$ -	$ -	$ -	$ 4,382.42	2.53%	$ 520.52	0.33%	$ 3,833.44	2.21%	$ 4,353.96	2.72%	
XI	Pekerjaan Pengecatan	$ 5,219.99	$ -	$ -	$ -	$ 5,219.99	3.01%	$ 2,610.00	1.63%	$ 2,610.00	1.51%	$ 5,219.99	3.27%	
XII	Pekerjaan Akhir (Site Clearing)	$ 150.00	$ -	$ -	$ -	$ 150.00	0.09%	$ -	0.00%	$ 150.00	0.09%	$ 150.00	0.09%	
	TOTAL A	**$ 81,220.56**	**$ 2,902.40**	**$ 2,902.40**	**$ (0.00)**	**$ 81,220.56**	**46.89%**	**$ 47,630.73**	**29.81%**	**$ 29,003.37**	**16.74%**	**$ 76,634.09**	**47.95%**	
2	KONSTRUSAUN MORU HALEU POSTU													
I	Servisu Rai no Ateru	$ 943.63	$ -	$ 79.48	$ (79.48)	$ 864.15	0.50%	$ 864.15	0.54%	$ -	0.00%	$ 864.15	0.54%	
II	Servisu Hada no reboka	$ 22,535.78	$ 2,242.07	$ 849.56	$ 1,392.50	$ 23,928.29	13.81%	$ 19,738.46	12.35%	$ 4,189.83	2.42%	$ 23,928.29	14.97%	
III	Servisu Betaun	$ 12,434.42	$ 1,120.93	$ 2,193.42	$ (1,072.49)	$ 11,361.93	6.56%	$ 9,383.77	5.87%	$ 1,978.16	1.14%	$ 11,361.93	7.11%	
IV	Servisu Instalasaun	$ 1,525.75	$ -	$ 90.00	$ (90.00)	$ 1,435.75	0.83%	$ -	0.00%	$ 1,327.22	0.77%	$ 1,327.22	0.83%	
V	Servisu Pintura	$ 3,243.72	$ -	$ 150.53	$ (150.53)	$ 3,093.18	1.79%	$ -	0.00%	$ 3,093.18	1.79%	$ 3,093.18	1.94%	
VI	Servisu Ikus	$ 150.00	$ -	$ -	$ -	$ 150.00	0.09%	$ -	0.00%	$ 150.00	0.09%	$ 150.00	0.09%	
VII	Servisu External	$ 17,150.00	$ -	$ -	$ -	$ 17,150.00	9.90%	$ 10,718.75	6.71%	$ 6,431.25	3.71%	$ 17,150.00	10.73%	
	TOTAL B	**$ 57,983.30**	**$ 3,363.00**	**$ 3,362.99**	**$ 0.00**	**$ 57,983.30**	**33.47%**	**$ 40,705.13**	**25.47%**	**$ 17,169.64**	**9.91%**	**$ 57,874.77**	**36.22%**	
3	INSTALASAUN LINHA ELETRISIDADE													
I	Servisu Instalasaun Linha Eletrisidade		$ 11,958.38	$ -	$ 11,958.38	$ 11,958.38	6.90%	$ -	0.00%	$ 5,939.88	3.43%	$ 5,939.88	3.72%	
	TOTAL C	**$ -**	**$ 11,958.38**	**$ -**	**$ 11,958.38**	**$ 11,958.38**	**6.90%**	**$ -**	**0.00%**	**$ 5,939.88**	**3.43%**	**$ 5,939.88**	**3.72%**	
A	CONTRUCTION COST (TOTAL (A+B+C))	$ 139,203.86				$ 151,162.24	87.26%	$ 88,335.86	55.28%	$ 52,112.88	30.08%	$ 140,448.74	81.08%	
B	CONTRACTOR FEE (10% X A)	$ 13,920.39				$ 15,116.22	8.73%	$ 8,833.59	5.53%	$ 5,211.29	3.01%	$ 14,044.87	8.79%	
C	OVERHEAD	$ 3,550.00				$ 3,550.00	2.05%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
D	TAX (2% X (A + B + C))	$ 3,133.48				$ 3,396.57	1.96%	$ 1,943.39	1.22%	$ 1,146.48	0.66%	$ 3,089.87	1.93%	
E	GRAND TOTAL (A + B + C + D)	$ 159,807.73				$ 173,225.03	100.00%	$ 99,112.83	62.02%	$ 58,470.66	33.75%	$ 157,583.49	90.97%	

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho Antonio Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P.

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineer ba Projeitu
Edificio Publiku Agua Saneamento
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ
ADN, I.P.

#ANEXU D - (LV6)

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

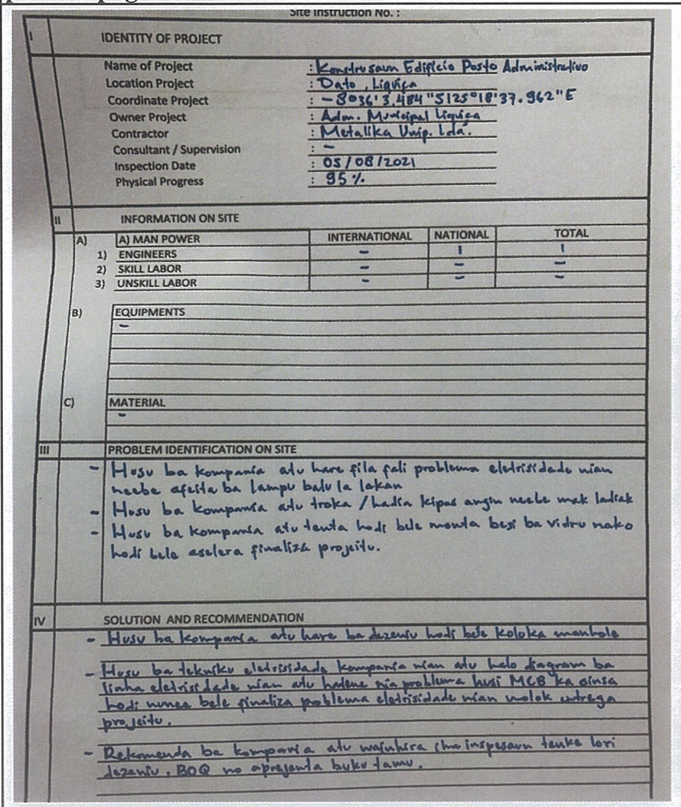
ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN EDIFISIU POSTU ADMINISTRATIVU LIQUICA

Kompanha : METALIKA UNIP. LDA.

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	5/08/2021	Dato, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN Liquica	1	Husu kompania tenta atu buka solusaun oinsa atu monta ona besi ba vidru nako	
					2	Tenke cek fila fali ho dezeniu konaba servisu ba manhole nian koloka ka lae iha dezeniu	
					3	Atu hare liu-liu ba iha servisu eletrisidade nian neebe sei iha failansu; halo lampu balu la lakan	
					4	Atu hare kordena mos ho tekniku eletrisidade kompania nian neebe hare ba instalasaun linha eletrisidade atu nunee bele buka solusaun hodi rezolve tiha problema eletrisidade nian	
					5	Atu hare mos ho kipas angin neebe balu aat tiha ona no balu halai la forsa	
					6	Rekomenda ba kompania atu finaliza lais ba item hirak neebe iha problema atu nunee bele hakat ba prosesu pagamentu final	



Site Instruction No. :

I IDENTITY OF PROJECT

Name of Project	: Konstrusaun Edifício Posto Administrativo
Location Project	: Dato, Liquica
Coordinate Project	: -8°36'3.484"S125°18'37.962"E
Owner Project	: Adm. Municipal Liquica
Contractor	: Metalika Unip. Lda.
Consultant / Supervision	: -
Inspection Date	: 05/08/2021
Physical Progress	: 95 %

II INFORMATION ON SITE

A)

A) MAN POWER	INTERNATIONAL	NATIONAL	TOTAL
1) ENGINEERS	-	1	1
2) SKILL LABOR	-	-	-
3) UNSKILL LABOR	-	-	-

B) EQUIPMENTS
-

C) MATERIAL
-

III PROBLEM IDENTIFICATION ON SITE
- Husu ba kompania atu hare fila fali problema eletrisidade nian neebe afeita ba lampu balu la lakan
- Husu ba kompania atu troka / hadia kipas angin neebe mak laktak
- Husu ba kompania atu tenta hodi bele monta besi ba vidru nako hodi bele aselera finaliza projetu.

IV SOLUTION AND RECOMMENDATION
- Husu ba kompania atu hare ba dezeniu hodi bele koloka manhole
- Husu ba tekniku eletrisidade kompania nian atu halo diagram ba linha eletrisidade nian atu hadene nia problema hanesan MCB ka oinsa hodi nunee bele finaliza problema eletrisidade nian molok entrega projetu.
- Rekomenda ba kompania atu watinhira (hu inspesaun tenke lori dezeniu, BOQ no aprogenta buku tamu.

Please acknowledge receipt this instuction by signing and dating this copy.

Please be guided accordingly

Juninho A. Abrantes da Cruz
Tekniku ADN

I here by acknowledge receipt the above site instruction.

Date: 05/08/2021
Received by:
Tito Xavier

Site Supervision | Contractor Site Engineering

Anexo Foto/Vidio

II	**18/08/2021**	**Dato, Liquica**	**Juninho António Abrantes da Cruz**	**Tekniku ADN Liquica**	**1**	**Kompania tenke instala 3 phase ba edifisiu tanba mono phase beban la seimbang**	
					2	**Kompania tenke koko atu muda phase ida ba phase seluk hodi hetan solusaun karik phase ida beban makas liu**	
					3		
					4		
					5		
III					**1**		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					**1**		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					**1**		
					2		
					3		
					4		
					5		

#ANEXU D – (LV9)

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

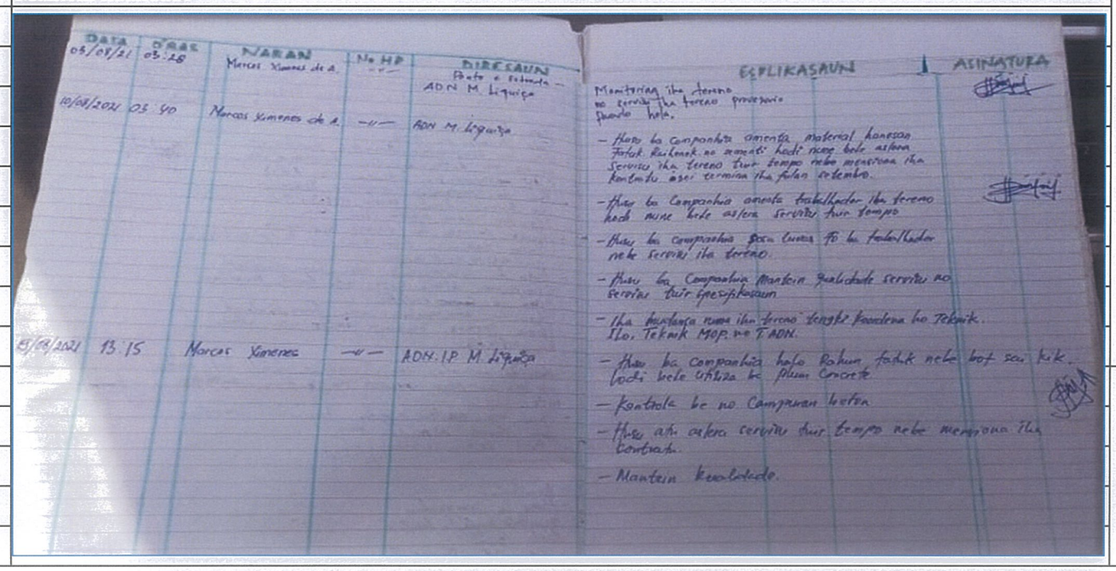
ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality

Kompanha : 15 Realty Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/03/2021	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik AND M.Liquica	1	Husu ba Companhia kontrola campuran beton wainhira halo pengecoran no tuir spesifikasaun 1:2:3	
					2	Husu ba Companhia prepara denzenho,Boq no Time Schedule taka iha diriksikit companhia nian.	
					3	Recomenda ba companhia amenta tan trabalhodor iha lokasi hodi nune bele finaliza lalais obra tuir tempo nebe mensiona iha kontrato	
					4	Husu ba Companhia amenta material hanesan fatuk,rahenek no sementi iha lokasi	
					5	Husu ba Companhia Aslera servisu no mantein qualidade	
II	8/10/2021	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik AND M.Liquica	1	Husu ba Companhia Sosa Luvas fahe ba Trabalhador	
					2	Husu Companhia Amenta material Fatuk,Raihenek,Sementi no Kerikil hodi nune hodi nune bele aslera lalais servisu	
					3	Husu ba Compnahia labele uza fatuk nebe bot, wainhira uza tengki halo rahun	
					4	Husu ba Companhia material qualidade servisu no servisu tuir spesifikasaun	
					5	Rekomenda Companhia karik iha mudansa ruma tengki kooredena ho Teknik Ilo,Teknik MOP no Teknik ADN	
III	19/08/2021	Liquica	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik AND M.Liquica	1	Husu ba Companhia halo rahun fatuk nebe bot sai kik, hodi bele utiliza ba Plum Concrete	
					2	Kontrola be ba Campuran Beton	
					3	Husu Atu aslera servisu tuir tempo nebe mensiona iha kontratu	
					4	Mantein kualidade	
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

#ANEXU D -(MBR3)

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality de Liquica

Kompanha : Montana Diak Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	8/04/2021	Lquica/Maubara	Marcos Ximenes de Araujo	Teknik AND M.Liquica	1	**Pagamento ida ne fizikamente iha Terreno 100% ona,Maibe foin lalais Akontese Kalamidade iha Teretorio Timor Laran Tomak iha dia 04 de Abril de 2021 fo mos impaktu ba construsaun ida ne,ho nune iha Item balun Presija ADN Rezolve ho Companhia**	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Project Name : Novo Konstrusaun Escola Tecnico Vocational (ES-TECVOC) Lissadila
Location : Lissadila - Liquica Municipality - Timor Leste
Project Owner : MAE, Ministeriu Edukasaun

#ANEXU C2 - (MBR5)		SUMMARY							
NO	DESCRIPTION	CONTRACT DATA		ADN VERIFIED					
				PREVIOUS	% BILLED	THIS BILLING	% BILLED	TOTAL TO DATE	PROGRESS TO DATE
		AMOUNT	PERCENT	AMOUNT		AMOUNT		AMOUNT	
I	PRELIMINARIES	$ 2,750.00	1.60%	$ 2,625.00	1.53%	$ (400.00)	-0.23%	*$ 2,225.00*	1.29%
II	CLASSROOM BUILDING CA							$ -	
A	GROUND WORK	$ 2,979.61	1.73%	$ 2,979.61	1.73%	$ -	0.00%	*$ 2,979.61*	1.73%
B	CONCRETE WORK	$ 13,475.27	7.84%	$ 13,400.27	7.80%	$ 75.00	0.04%	*$ 13,475.27*	7.84%
C	STONE MASONRY & MASONRY BLOCK WORK	$ 6,522.68	3.80%	$ 6,522.68	3.80%	$ -	0.00%	*$ 6,522.68*	3.80%
D	STEEL ROOF STRUCTURE & CEILING	$ 14,999.20	8.73%	$ 9,297.14	5.41%	$ 2,431.46	1.41%	*$ 11,728.60*	6.82%
E	JOINERY FIXTURES	$ 678.70	0.39%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
F	ROOFING	$ 6,426.47	3.74%	$ 4,306.31	2.51%	$ 591.75	0.34%	*$ 4,898.06*	2.85%
G	WINDOWS	$ 3,474.00	2.02%	$ 1,737.00	1.01%	$ -	0.00%	*$ 1,737.00*	1.01%
H	DOOR & HARDWARE	$ 1,580.00	0.92%	$ 395.00	0.23%	$ -	0.00%	*$ 395.00*	0.23%
I	FINISHES	$ 7,321.26	4.26%	$ 2,225.96	1.30%	$ -	0.00%	*$ 2,225.96*	1.30%
J	PAINTING	$ 1,931.50	1.12%	$ -	0.00%	$ 964.68	0.56%	*$ 964.68*	0.56%
K	ELETRICAL INSTALATION	$ 2,535.00	1.48%	$ 1,010.00	0.59%	$ -	0.00%	*$ 1,010.00*	0.59%
III	CLASSROOM BUILDING CB								
A	GROUND WORK	$ 2,968.47	1.73%	$ 2,968.47	1.73%	$ -	0.00%	*$ 2,968.47*	1.73%
B	CONCRETE WORK	$ 15,864.06	9.23%	$ 15,864.06	9.23%	$ -	0.00%	*$ 15,864.06*	9.23%
C	STONE MASONRY & MASONRY BLOCK WORK	$ 8,528.57	4.96%	$ 8,528.57	4.96%	$ -	0.00%	*$ 8,528.57*	4.96%
D	STEEL ROOF STRUCTURE & CEILING	$ 12,546.58	7.30%	$ 10,160.86	5.91%	$ 2,211.72	1.29%	*$ 12,372.58*	7.20%
E	JOINERY FIXTURES	$ 554.30	0.32%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
F	ROOFING	$ 6,413.39	3.73%	$ 6,413.39	3.73%	$ -	0.00%	*$ 6,413.39*	3.73%
G	WINDOWS	$ 2,895.00	1.68%	$ 1,447.50	0.84%	$ -	0.00%	*$ 1,447.50*	0.84%
H	DOOR & HARDWARE	$ 3,651.00	2.12%	$ 912.75	0.53%	$ -	0.00%	*$ 912.75*	0.53%
I	FINISHES	$ 8,770.73	5.10%	$ 2,484.68	1.45%	$ 6,046.05	3.52%	*$ 8,530.73*	4.96%
J	PAINTING	$ 1,893.36	1.10%	$ -	0.00%	$ 946.68	0.55%	*$ 946.68*	0.55%
K	PLUMBING & DRAINAGE	$ 6,480.00	3.77%	$ 2,425.00	1.41%	$ -	0.00%	*$ 2,425.00*	1.41%
L	ELETRICAL INSTALATION	$ 2,615.00	1.52%	$ 1,070.50	0.62%	$ -	0.00%	*$ 1,070.50*	0.62%
IV	SITE WORKS	$ 9,108.95	5.30%	$ 2,937.94	1.71%	$ -	0.00%	*$ 2,937.94*	1.71%
A	CONTRUCTION COST	$ 146,963.11	85.52%	$ 99,712.69	58.02%	$ 12,867.34	7.49%	*$ 112,580.04*	65.51%
B	Fee Contractor(10% x A)	$ 14,696.31	8.55%	$ 9,971.27	5.80%	$ 1,286.73	0.75%	*$ 11,258.00*	6.55%
C	Overhead	$ 2,900.00	1.69%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
D	TAX 2% x (A + B + C)	$ 3,291.19	1.92%	$ 2,193.68	1.28%	$ 283.08	0.16%	*$ 2,476.76*	1.44%
E	CONTIGENCY	$ 4,000.00	2.33%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
F	TOTAL PROJECT COST (A + B + C + D + E)	$ 171,850.61	100.00%	$ 111,877.64	65.10%	$ 14,437.16	8.40%	*$ 126,314.80*	73.50%

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edifício Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P.

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineer ba Projeitu Edifício Publiku Agua Saneamento ADN, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ ADN, I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

Name of Roads : **R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500**

Contract No : **MPW-W-190098**
Contractor : **Luliana Unipessoal. Lda**

#ANEXU C2 - (MBR9)			SUMMARY						
NO	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT	RESULTADO INSPEKSAUN MOP			RESULTADO INSPEKSAUN ADN.			
			PREVIOUS BILLING	THIS BILLING	TO DATE	PREVIOUS BILDING	THIS BILLING	TO DATE	%
R-01	General	$ 280.00	$ -	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	$ -	$ 280.00	0.55%
R-02	Drainage	$ 95.90	$ -	$ 41.10	$ 41.10	$ 41.10	$ -	$ 41.10	0.08%
R-03	Earth work	$ 828.10	$ -	$ 625.26	$ 625.26	$ 625.26	$ 39.24	$ 664.50	1.31%
R-04	Structures	$ 9,389.90	$ -	$ 6,799.67	$ 6,799.67	$ 6,730.89	$ 2,290.98	$ 9,021.87	17.79%
R-05	Routine maintenance	$ 25,432.29	$ -	$ 17,438.25	$ 17,438.25	$ 17,438.25	$ -	$ 17,438.25	34.39%
R-06	General expenses	$ 4,470.00	$ -	$ 4,015.00	$ 4,015.00	$ 3,151.00	$ -	$ 3,151.00	6.21%
R-07	Sub-base, base and pavement	$ 927.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
Total - net cost		**$ 41,423.69**	**$ -**	**$ 29,199.27**	**$ 29,199.27**	**$ 28,266.50**	**$ 2,330.22**	**$ 30,596.71**	**60.35%**
Profit (net cost x %) ; 10%		**$ 4,142.37**	**$ -**	**$ 2,919.93**	**$ 2,919.93**	**$ 2,826.65**	**$ 233.02**	**$ 3,059.67**	**6.03%**
Overheads (supervision and risk) net cost x % ; 10%		**$ 4,142.37**	**$ -**	**$ 2,919.93**	**$ 2,919.93**	**$ 2,826.65**	**$ 233.02**	**$ 3,059.67**	**6.03%**
Tax (net cost + profit + overhead) x 2 %)		**$ 994.17**	**$ -**	**$ 700.78**	**$ 700.78**	**$ 678.40**	**$ 55.93**	**$ 734.32**	**1.45%**
Total gross-cost		***$ 50,702.59***	***$ -***	***$ 35,739.91***	**$ 35,739.91**	***$ 34,598.19***	***$ 2,852.19***	**$ 37,450.38**	**73.86%**

Inspeksaun Husi :

Eng.Marcos Ximenes de Araujo
Eng. ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun ADN,I.P

Verifica Husi,

Eng. Aniceto da Costa
Enginheiro Senior ba Projeito Insfrastructura,Transportes e Irigasaun ADN,I.P

Sertifika Husi,

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da

#ANEXU D - (BZT6)

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : KONSTRUSAUN FOUN EBF HATUGARA

Kompanha : MILCHA NAUPAI UNIP. LDA.

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	25/08/2021	Hatugara, Bazartete, Liquica	Juninho Antônio Abrantes da Cruz	Tekniku ADN Liquica	1	Husu ba kompania atu tau Site Engineer iha terenu	
					2	Husu ba kompania atu lori material/hare presija material iha terenu	
					3	Husu ba Diretor Kompania tenke ba hasoru Diretor DNIE-ME atu bele resolve problema obra lao tarde	
					4	Rekomenda ba kompania atu aumenta badain iha terenu tan hela nain 2 deit mak sei servisu	
					5	Kompania tenke marka prezensa iha terenu hela deit hodi bele hare obra refere bele lao ho diak	
II					1		
					2		
					3		
					4		

Site Instruction No. :

I IDENTITY OF PROJECT

Name of Project	: Konstrusaun Foun EBF Hatugara
Location Project	: Hatugara, Bazartete, Liquiça
Coordinate Project	:
Owner Project	: MEdukasaun
Contractor	: Milcha Naupai Unip.Lda.
Consultant / Supervision	: -
Inspection Date	: 25/08/2021
Physical Progress	:

II INFORMATION ON SITE

A)

A) MAN POWER	INTERNATIONAL	NATIONAL	TOTAL
1) ENGINEERS	-	-	-
2) SKILL LABOR	-	-	-
3) UNSKILL LABOR	-	2	2

B) EQUIPMENTS
-

C) MATERIAL
-

III PROBLEM IDENTIFICATION ON SITE
- Tekniku kompania la iha
- Material iha terenu la iha ona atu bele kontinua servisu
- Badain hela nain 2 iha terenu
- Kompania la marka prezensa iha terenu atu hare servisu no badain sira iha terenu

IV SOLUTION AND RECOMMENDATION
- Husu ba kompania atu tau Site Engineer iha terenu
- Husu ba kompania atu lori material / hare presija material iha terenu
- Husu ba Diretor kompania tenke ba hasoru Diretor DNIE - ME atu bele resolve problema

Please acknowledge receipt this instuction by signing and dating this copy.

Please be guided accordingly

Juninho A. Abrantes da Cruz
Tekniku ADN

I here by acknowledge receipt the above site instruction.

Date:...../...../2021
Received by:

Site Supervision	Contractor Site Engineering

Anexo Foto/Vidio

#ANEXU D - (BZT8)

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

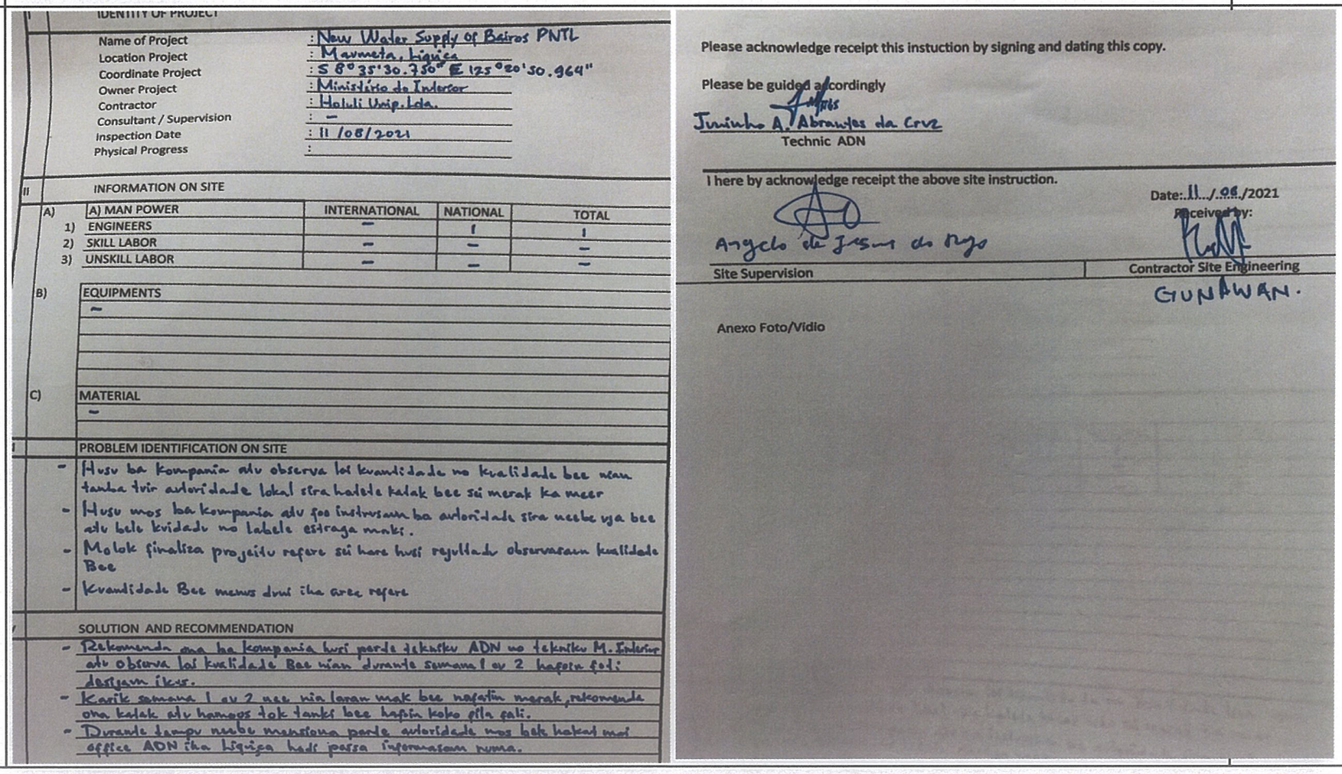
ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NEW WATER SUPPLY BAIROS PNTL LIQUICA

Kompanha : HOLULI UNIP. LDA.

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	11/08/2021	Maumeta, Liquica	Juninho A. Abrantes da Cruz	Tekniku Munisipiu Liquica	1	Husu ba kompania atu kontrola nafatin kuantidade no kualidade bee tuir instrusaun husi tekniku ADN no Ministerio	
					2	Foo ona instrusaun atu observa lai kuantidade/kualidade bee durante semana 1 ou 2 tanba tuir keixa no problema anterior katak bee meer no merak husi autoridade lokal sira	
					3	Rekomenda ba kompania karik durante periodu nee mak bee sei merak tenke hamoos tiha lai tanki bee nian atu nunee bele identifika problema refere	
					4	Hatoo mos ba kompania no autoridade lokal atu kontrola bee liu husi panel atu nunee labele estraga maki bee nian	
					5	Husi rezultadu inspesaun nee ekipa tekniku ADN, tekniku Ministerio Interior, Gabinete Ministerio Interior no PNTL Municipal Liquica nian desidi hamutuk katak sei observa lai lalaok bee nee oinsa ba oin molok bele rekomenda pedido no entrega projeitu.	



I IDENTITY OF PROJECT

Name of Project	: New Water Supply of Bairos PNTL
Location Project	: Maumeta, Liquica
Coordinate Project	: S 8°35'30.750" E 125°20'50.964"
Owner Project	: Ministério do Interior
Contractor	: Holuli Unip. Lda.
Consultant / Supervision	: -
Inspection Date	: 11/08/2021
Physical Progress	:

II INFORMATION ON SITE

A)

A) MAN POWER	INTERNATIONAL	NATIONAL	TOTAL
1) ENGINEERS	-	1	1
2) SKILL LABOR	-	-	-
3) UNSKILL LABOR	-	-	-

B) EQUIPMENTS
-

C) MATERIAL
-

PROBLEM IDENTIFICATION ON SITE
- Husu ba kompania atu observa lai kuantidade no kualidade bee nean tanba tuir autoridade lokal sira hatete katak bee sei merak ka meer
- Husu mos ba kompania atu foo instrusaun ba autoridade sira nesbe nia bee atu bele kridadu no labele estraga maki.
- Molok finaliza projeitu rafare sii hare husi rezultadu observasaun kualidade Bee
- Kuantidade Bee menus deit iha area rafare

SOLUTION AND RECOMMENDATION
- Rekomenda ona ba kompania husi parte tekniku ADN no tekniku M. Interior atu observa lai kualidade Bee nian durante semana 1 ou 2 hafoin fo'i destasan ikus.
- Karik semana 1 ou 2 nee nia laran mak bee nafatin merak, rekomenda ona katak atu hamoos tok tanki bee hapin kotu fila fali.
- Durante tempu nebe manotona parte autoridade mos bele hakarak mai office ADN iha Liquica hodi fassa informasaun numa.

Please acknowledge receipt this instuction by signing and dating this copy.

Please be guided accordingly

Juninho A. Abrantes da Cruz
Technic ADN

I here by acknowledge receipt the above site instruction.

Date: 11../..08../2021
Received by:

Angelo de Jesus do Rego
Site Supervision

GUNAWAN.
Contractor Site Engineering

Anexo Foto/Vidio

II	17/08/2021	Maumeta, Liquica	Juninho A. Abrantes da Cruz	Tekniku Munisipiu Liquica	1	Husu ba kompania karik lakoi entrega chave panel ba autoridade atu uja sasan nee, tenke iha justifikasaun ho projeitu nain atu nunee bele buka solusaun oinsa autoridade sira bele uja ona bee husi obra refere.	
					2		
					3		
					4		
					5		
III	19/08/2021	Edifikasaun ADN Nasional	Juninho A. Abrantes da Cruz	Tekniku Munisipiu Liquica	1	Ekipa husi kompania mai enkontru hamutuk ho Diretor Nasional Edifikasaun nian konaba problema ba kontrola bee nian iha terenu	
					2	Rekomenda ba kompania atu kordena ho projeitu nain atu buka solusaun ba problema refere, atu projeitu nain bele tau ema ou foo fiar ba autoridade minimal nain 3 atu kontrola panel nee tuir nia orariu atu bele kuidadu diak panel no maki bee nian.	
					3	Husu ba kompania atu prepara breakdown ba item Ls iha BoQ (ba item perfurasaun bee nian)	
					4	Husu ba kompania atu prepara sertifikadu bee nian husi SAS Liquica atu bele iha justifikasaun klaru	
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

#ANEXU C2 - (BZT11)				SUMMARY						
PROJECT TITLE	: NEW CONSTRUCTION FOR ISOLATION ROOM			ADN VERIFIED						
LOCATION	: CHI-LIQUICA									
No	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	WEIGHT	PREVIOUS	WEIGHT	THIS BILLING	WEIGHT	TO DATE		WEIGHT
				AMOUNT		AMOUNT		AMOUNT	BALANCE	
I	*PREPARATION WORKS*	$ 6,240.66	2.56%	$ 5,568.16	2.29%	$ -	0.00%	$ 5,568.16	$ 672.50	2.29%
II	*FUNDATION WORKS*	$ 596.66	0.25%	$ 596.66	0.25%	$ -	0.00%	$ 596.66	$ -	0.25%
III	*CONCRETE WORKS*	$ 32,800.12	13.48%	$ 30,330.04	12.46%	$ -	0.00%	$ 30,330.04	$ 2,470.08	12.46%
IV	*WALL INSTALLATION AND PLESTERING*	$ 22,421.27	9.21%	$ 17,463.59	7.18%	$ 4,957.68	2.04%	$ 22,421.27	$ -	9.21%
V	*CARPENTER WORKS*	$ 23,924.00	9.83%	$ 7,177.20	2.95%	$ 16,746.80	6.88%	$ 23,924.00	$ -	9.83%
VI	*ROOFING WORKS*	$ 24,850.15	10.21%	$ 6,788.31	2.79%	$ 8,622.16	3.54%	$ 15,410.47	$ 9,439.68	6.33%
VII	*CEILING WORKS*	$ 10,559.12	4.34%	$ -	0.00%	$ 3,748.16	1.54%	$ 3,748.16	$ 6,810.96	1.54%
VIII	*FLOOR TILE WORKS*	$ 12,860.75	5.28%	$ 2,157.94	0.89%	$ -	0.00%	$ 2,157.94	$ 10,702.81	0.89%
IX	*ELECTRICAL WORKS*	$ 21,970.99	9.03%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	$ 21,970.99	0.00%
X	*SANITASI WORKS*	$ 13,899.39	5.71%	$ 3,051.00	1.25%	$ -	0.00%	$ 3,051.00	$ 10,848.40	1.25%
XI	*PAINTING WORKS*	$ 6,216.86	2.55%	$ -	0.00%	$ 3,108.43	1.28%	$ 3,108.43	$ 3,108.43	1.28%
XII	*FURNITURE*	$ 14,574.00	5.99%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	$ 14,574.00	0.00%
XIII	*FINAL CLEARING*	$ 210.00	0.09%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	$ 210.00	0.00%
A	***CONTRUCTION COST***	***$ 191,123.97***	***78.53%***	***$ 73,132.90***	***30.05%***	***$ 37,183.23***	***15.28%***	***$ 110,316.13***	***$ 80,807.84***	**45.33%**
B	***FEE CONTRACTOR (10% x A)***	***$ 19,112.40***	***7.85%***	***$ 7,313.29***	***3.01%***	***$ 3,718.32***	***1.53%***	***$ 11,031.61***	***$ 8,080.78***	**3.51%**
C	***OVERHEAD***	***$ 3,750.00***	***1.54%***	***$ -***	***0.00%***	***$ -***	***0.00%***	***$ -***	***$ 3,750.00***	**0.00%**
D	***TAX (2% x(A+B+C)***	***$ 4,279.73***	***1.76%***	***$ 1,608.92***	***0.66%***	***$ 818.03***	***0.34%***	***$ 2,426.95***	***$ 1,852.77***	**0.77%**
E	***CONTIGENCY***	***$ 25,101.98***	***10.31%***	***$ -***	***0.00%***	***$ -***	***0.00%***	***$ -***	***$ 25,101.98***	**0.00%**
F	**TOTAL PROJECT COST (A +B + C + D + E)**	***$ 243,368.08***	***100.00%***	***$ 82,055.12***	***33.72%***	***$ 41,719.58***	***17.14%***	***$ 123,774.70***	***$ 119,593.38***	**50.86%**

Inspeksaun Husi :

Eng. Juninho António Abrantes da Cruz
Engineru ba Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Verifika Husi :

Arch. Fransisco Xavier de Deus Jeronimo
Senior Engineriu ba Projeitu Edificio Publiku Agua Saneamento, ADN, I.P

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Koordenadora UCVQ, ADN, I.P

#ANEXU D - (BZT11)

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction of Isolation for Covid-19 at Chi-Liquica

Kompanha : Senizu Unip. Lda.

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	6/08/2021	Maumeta, Bazartete, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN Liquica	1	Husu ba kompania atu hare didiak servisu lis plafon molok monta	
					2	Atu hare didiak servisu monta keramik no plint keramik tuir dezeniu	
					3	Wainhira instala eletrisidade tenke kordena ho tekniku eletrisidade ADN no tekniku eletrisidade Saude nian atu nunee karik iha mudansa ruma bele kordena hamutuk	
					4	Rekomenda ba kompania atu wainhira order kurtina tenke tuir nia marka no spec iha BOQ	
					5	Kompania tenke troka tiha dezeniu neebe aat ona iha direksi keet no tau ho time schedule (updated)	
					6	Kompania tenke prepara no iha planu servisu	

I IDENTITY OF PROJECT

Name of Project	: Unna Isolamentu Covid-19
Location Project	: Liquica Vila
Coordinate Project	: -8°35'32.954"S 125.20'30.416"E
Owner Project	: Ministério Saúde
Contractor	: Senizu Unip.lda.
Consultant / Supervision	: -
Inspection Date	: 06/08/2021
Physical Progress	: 70%

II INFORMATION ON SITE

A)	A) MAN POWER	INTERNATIONAL	NATIONAL	TOTAL
1)	ENGINEERS	-	1	1
2)	SKILL LABOR	-		
3)	UNSKILL LABOR	-		

B) EQUIPMENTS
Tuuki Bot, Corobak, keramik 60x60 ; keramik 40x40, lis plafond Molen

C) MATERIAL
Block, kartikil, rai henek, kalen, Tinta Vinilex

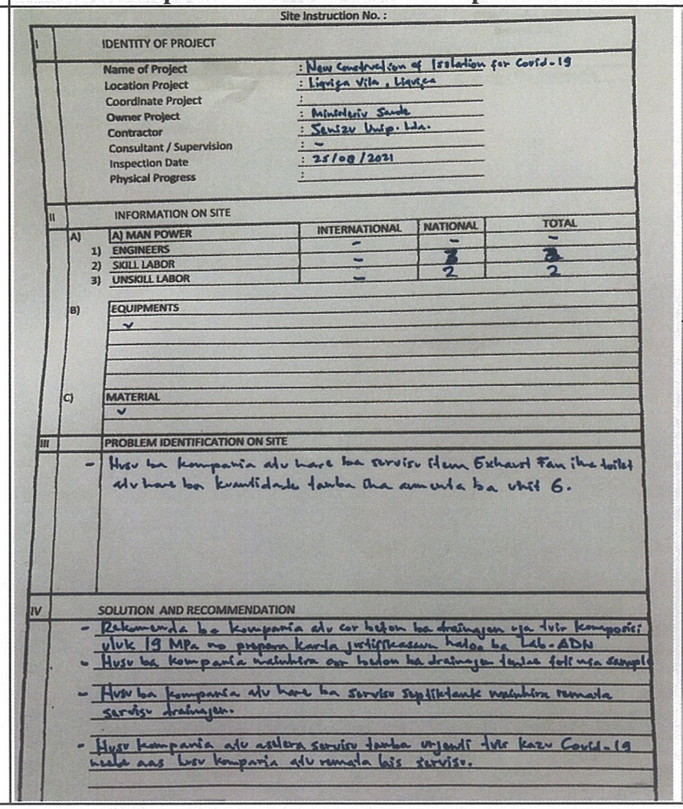
III PROBLEM IDENTIFICATION ON SITE
- Husu ba kompania atu hare didiak servisu lis plafon molok monta
- Husu ba kompania atu prepara planu servisu kada semana
- Husu ba kompania atu troka/taka fan dezeniu no Cuvtain (updated) iha direksi keet.
- Aselera servisu molok periodu kontratu remata.

IV SOLUTION AND RECOMMENDATION
- Husu ba kompania atu hare didiak servisu monta keramik no plint tenke tuir dezeniu
- Husu ba kompania wainhira instala eletrisidade tenke kordena ho tekniku eletrisidade ADN no MDS.
- Rekomenda ba kompania atu order kurtina marka (Curtain rail Toso) tuir nia spec iha BOQ

Please acknowledge receipt this instuction by signing and dating this copy.
Please be guided accordingly
Juninho A. Abrantes da Cruz
Tekniku ADN

I here by acknowledge receipt the above site instruction.
Date: 06../08./2021
Received by:
Lucas G. Belo
Site Supervision
Contractor Site Engineering

Anexo Foto/Vidio

II	11/08/2021	Maumeta, Bazartete, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN Liquica	1	Husu ba kompania atu hare didiak instalasaun AC no husu atu kordena ho tekniku eletrisidade molok instala	
					2	Atu hare didiak servisu monta lisplank no tenke tuir spec iha BoQ (5cm)	
					3	Foo ona instrusaun ba kompania atu wainhira pinta parede tenke pinta ho diak no labele halo foer fali servisu seluk	
					4	Kompania tenke troka tiha dezeniu neebe aat ona iha direksi keet	
					5	Husu kompania atu prepara planu servisu atu nunee bele kordena diak ho linha tekniku ADN no projeitu nain	
III	25/08/2021	Maumeta, Bazartete, Liquica	Juninho António Abrantes da Cruz	Tekniku ADN Liquica	1	Rekomenda ona ba kompania atu cor beton ba drainajen nian uja deit komposisi lantai 19 Mpa	
					2	Husu ba kompania atu halo karta justifikasaun hatoo ba iha Laboratorium ADN IP	
					3	Husu ba kompania atu hare ba servisu exhaust fan nian iha BoQ unit 2 deit maibe iha terenu uja 8	
					4	Husu ba kompania atu hare ba servisu septiktank nian wainhira remata ona servisu drainajen	
					5		

Site Instruction No. :

I IDENTITY OF PROJECT

Name of Project	: New Construction of Isolation for Covid-19
Location Project	: Liquiça Vila, Liquiça
Coordinate Project	:
Owner Project	: Ministeriu Saude
Contractor	: Sanizu Unip. Lda.
Consultant / Supervision	: -
Inspection Date	: 25/08/2021
Physical Progress	:

II INFORMATION ON SITE

		INTERNATIONAL	NATIONAL	TOTAL
A)	A) MAN POWER	-	-	-
1)	ENGINEERS	-	1	1
2)	SKILL LABOR	-	2	2
3)	UNSKILL LABOR	-	-	-

B) EQUIPMENTS

C) MATERIAL

III PROBLEM IDENTIFICATION ON SITE

- Husu ba kompania atu hare ba servisu Exhaust Fan iha toilet atu hare ba kuantidade tanba iha amounta ba unit 6.

IV SOLUTION AND RECOMMENDATION

- Rekomenda ba kompania atu cor beton ba drainajen uja tuir komposisi ulun 19 MPa no propon karta justifikasaun hatoo ba Lab-ADN
- Husu ba kompania atu halo ba beton ba drainajen tanba foli uja sample
- Husu ba kompania atu hare ba servisu Septiktank wainhira remata servisu drainajen.
- Husu kompania atu asiera servisu tanba urgandi tuir kazu Covid-19 mesak aas husu kompania atu remata lais servisu.

Please acknowledge receipt this instuction by signing and dating this copy.

Please be guided accordingly

Juninho A. Abrantes da Cruz
Tekniku ADN

I here by acknowledge receipt the above site instruction.

Date:...../...../2021
Received by:

Lucas G Baixo | 1
Site Supervision MdS | Contractor Site Engineering

Anexo Foto/Vidio

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2021

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Augusto 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS
Liquica Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																		Projeitu Refere remata ona no hein pedido Pagamentu
	2	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																																		Kona ba Projeitu ida ne MPS maka manda lista mai ADN no ADN komfima fali ho MPS kona ba projeitu ida ne tamaba ADN cek iha Sistema Pagamentu ADN nian laiha,Signifika katak Pagamentu laos ADN maka halo.
							Actual																																		
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																		Projeito Ida ne Hela Retensaun,Maibe Pagamento Atinzi deit 99,91%
	4	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																		Projeito Ida ne Remata ona, no hela Retensaun 10% e Pagamento Atinzi ona 100%.
	5	New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquisa	HL Fica	013LM/RDTL/MPIE/A.D.N/DIL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																		
							Actual																																		Projeito Ida ne Remata ona no Hela Retensaun 10%.Maibe Pagamento Atinzi deit 98,92%
	6	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Liquica	Metalika Unipessoal, Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/01	PDIM	ESTATAL	Plan																																		
							Actual																																		
	7	New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual																																		
	8	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual																																		
	9	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																		
Maubara (MA)	1	Addt. Poste liga Maubara	Fu Unip,Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		AND Munipio Liquica Buka hela imformasaun kona ba Projeito ida ne maibe seidauk iha Imformasaun ruma
							Actual																																		
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual																																		
	3	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																		Pagamento ida ne fizikamente iha Terreno 100% ona,Maibe foin lalais Akontese Kalamidade iha Teretorio Timor Laran Tomak iha dia 04 de Abril de 2021 fo mos impaktu ba konstrusaun ida ne,ho nune iha Item balun Presija ADN Rezolve ho Companhia. Iha Item Concrete Precast Lined Drain 25 Mpa nebe uluk ADN selu ona,maibe rezultado teste la to 25Mpa tan ne ADN halo dedaksaun ona no presija rejolve fali ho Companhia.
	4	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	FI	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																	
							Actual																																		
	5	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																		
							Actual																																		
	6	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																		
	7	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																		ona ba Projeitu ida ne ADN M.Liquica halao inpeksaun konjunta hamutuk ho ADN Nacional nebe toma konta ba projeitu refere
	8	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																		ona ba Projeitu ida ne ADN M.Liquica halao inpeksaun konjunta hamutuk ho ADN Nacional nebe toma konta ba projeitu refere
	9	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500	Luliana Unip.Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		
							Actual																																		Servisu iha Terreno Remata ona no hein Pedido Pagamento nebe sedauk submete mai AND

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	**Marcos Ximenes de Araujo**
Municipio	**MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS**

2021

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Augusto 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS
Bazartete (BA)	1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	Mina petro leste Lda	RDTL-11004589	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual																																	
	2	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	Banir Lema	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 98,46%
	3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	4	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	Projeito Ida ne Hela Retensaun 10%,Maibe Pagamento Atinzi deit 97,90%
	5	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																	
							Actual																																	
	6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	8	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan																																	
							Actual																																	
	9	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	Naesalobu	MAP-P02019:19532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																	
							Actual																																	
	10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																	
	11	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																	
	12	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																	
							Actual																																	
		TOTAL PROJETO ON-GOING																																					

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu | Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili | Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu | Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng. Marcos Ximenes de Araujo)
Eng. ba Projetu Infrastrutura, Transporte e Irigasaun, Municipio LiquicaADN,I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,ADN,I.P

Aprova Husi :

(Mariano R. Monteiro da Cruz, S.T.M.,Eng)
Director Executivo ADN,I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Juninho António Abrantes da Cruz

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2021

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Agosto 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS
Liquica Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																																Kona ba Projeitu ida ne MPS maka manda lista mai ADN no ADN komfima fali ho MPS kona ba projeitu ida ne tamaba ADN cek iha Sistema Pagamentu ADN nian laiha,Signifika katak Pagamentu laos ADN maka halo.
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquisa	HL Fica	013LM/RDTL/MPIE/A.D.N/DIL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																
							Actual																																
	6	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Liquica	Metalika Unipessoal, Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/01	PDIM	ESTATAL	Plan																																Progresu fizikamente remata ona
							Actual																																
	7	New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual																																
	8	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual																																
	9	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
Maubara (MA)	1	Addt. Poste liga Maubara	Fu Unip,Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual																																
	3	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	FI	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																Enjineiru Nasional ba Konsultan mak sei toma konta ba projeitu ida nee
							Actual																																
	5	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Progresu remata ona no hein pedido pagamentu
							Actual																																
	6	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Obra refere tama ona iha kategoria servisu Empresa Publika (EP)
							Actual																																
	7	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	8	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	9	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500	Luliana Unip.Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Juninho António Abrantes da Cruz

Municipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2021

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	OBS
Bazartete (BA)	1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	Mina petro leste Lda	RDTL-11004589	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual		
	2	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	Banir Lema	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		
	3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan		Progresu fizikamente remata ona
							Actual		
	4	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		
	5	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan		Provezoriamente servisu paradu hela
							Actual		
	6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan		Servisu lao tarde
							Actual		
	7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		Provezoriamente servisu paradu hela
							Actual		
	8	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan		Progresu remata ona no hein pedido pagamentu
							Actual		
	9	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	Naesalobu	MAP-P02019:19532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan		Progresu fizikamente remata ona
							Actual		
	10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan		Progresu fizikamente remata ona
							Actual		
	11	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan		On-going
							Actual		
	12	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan		Falta retensaun (PHO)
							Actual		
	13	For River Normalization & Landslide Clearing Works Of Tibar - Gleno Emergency Project	Shabryca Const. Unip.Lda	MPW-W-SS-EP : 210011	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		
TOTAL PROJETO ON-GOING									

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu | **Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili** | **Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu** | **Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu**

Prepara Husi :

(Eng. Juninho António Abrantes da Cruz)
Eng, ba Projetu Infraestrutura, Transporte e

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun

Aprova Husi :

(Mariano R. Monteiro da Cruz, S.T.M.,Eng)
Director Executivo,ADN,I.P

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Marcos Ximenes de Araujo

Munisipio MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS

2021

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Augusto 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS
Liquica Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Locs (A03) Municipality Liquica /162	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		■							■							■									■						
							Actual																																	
	2	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																																Kona ba Projeitu ida ne MPS maka manda lista mai ADN no ADN komfima fali ho MPS kona ba projeitu ida ne tamaba ADN cek iha Sistema Pagamentu ADN nian laiha.Signifika katak Pagamentu laos ADN maka halo.
							Actual																																
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan			■						■							■							■						
							Actual																																
	4	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taltabi - Kutulau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan			■						■							■							■						
							Actual																																
	5	New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquisa	HL Fica	013LM/RDTL/MPIE/A.D.N/DIL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan					■							■							■							■					
							Actual																																
	6	Konstrusaun Edifício Posto Administrativo Liquica	Metalika Unipessoal, Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/01	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	7	New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loctela 1 to Loctela 2 - Liquica Municipality	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual																																
	8	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatulcho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	Busa Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual																																
	9	R4D Rural Road Rehabiliation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan			■						■							■							■						
							Actual																																
Maubara (MA)	1	Addt. Poste liga Maubara	Fu Unip,Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan				■						■							■														
							Actual																																
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual																																
	3	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		■							■							■								■							
							Actual																																
	4	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	FI	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																
							Actual																																
	5	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	6	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		■							■							■							■						
							Actual																																
	8	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Locs (A03) Municipality Liquica /162	Dongsung Engineering Co.Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		■							■							■							■						
							Actual																																
	9	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunulcta - Darulcma Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500	Luliana Unip.Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan				■						■							■							■						
							Actual																																
Bazartete (BA)	1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	Mina petro leste Lda	RDTL-11004589	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual																																
	2	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	Banir Lema	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan			■						■							■							■						
							Actual																																
	3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	4	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan			■						■							■							■						
							Actual																																
	5	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																
							Actual																																
	6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																

| | | |

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL

ADN, I.P.
Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

2021

Naran Eng.	**Juninho António Abrantes da Cruz**
Municipio	**MUNICIPIO LIQUICA NO POSTOS**

Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanha	No. Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	OBS
Liquica Vila (LV)	1	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Naroman Mosu Dadaun Unip. Lda	MPW-W190250	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		
	2	Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on BDFOT Basis	EGT ENGENHARIA IN JV with FASE - Estudos e Projectos, S.A.	REP/007/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO TRANPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan		Kona ba Projeitu ida ne MPS maka manda lista mai ADN no ADN komfima fali ho MPS kona ba projeitu ida ne tamaba ADN cek iha Sistema Pagamentu ADN nian laiha,Signifika katak Pagamentu laos ADN maka halo.
	3	R4D Rural Road Periodic Maintenance Aibenu - Asumanu Chainage 0+000 - 4+300 Rutine Maintenance Dato - Liquica - Loidahar Chainage 0+000 - 12+300 Municipality Liquica	Nheu	MPW-W-RFQ-190093	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		
	4	Rural Roads Periodic Gunaba - Lukulai Chainage 0+000 & Metagou - Aibenu Chainage 0+000 - 7+600 Rutine Maintenance Taitabi - Kutuiau Chainage 0+000 - 1+700 Municipality Liquica (162)	Goubara Unip Lda	MPW-W-190096	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		
	5	New Gabion Works Flood Control Mota Kaikaslara-Aldeia Cotalara Suku Loidahar Liquisa	HL Fica	013LM/RDTL/MPIE/A.D.N/DIL/VIII/2019/Roads & Bridges Departemnt	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan		
							Actual		
	6	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Liquica	Metalika Unipessoal, Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/01	PDIM	ESTATAL	Plan		Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
							Actual		
	7	New Installation MV, LV LIne and House Connection From Loetela 1 to Loetela 2 - Liquica Municipality	Maferdi, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000399	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual		
	8	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	Busa.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000371	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual		
	9	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Raelti Unip. Lda	RT/034/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		
Maubara (MA)	1	Addt. Poste liga Maubara	Fu Unip,Lda		FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	Britas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000364	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
							Actual		
	3	Road and Drainage Rehabilitation Project Emergency Road at Tibalau and Karimbala Liquica Municipality Liquica	Montana Diak, Unipessoal, Lda	SSS/126/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		
	4	Consulting services for study master plan and detailed design for ecotourism of Lagoa Maubara	Bernabad Arquitectura SLP	RFP/147/MTAC/2016	FI	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan		Enjineiru Nasional ba Konsultan mak sei toma konta ba projeitu ida nee
							Actual		
	5	Konstrusaun ESTV Lisadila Maubara-Liquisa (CA + CB)	Aleni Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/03	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan		
							Actual		
	6	Rehabilitasaun Sistema be'e mos iha aldeia Pandevou ho Mau-Uno,Sucu Guico /162	Oceania Const Unip.Lda	NCB-MOP-190051	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		Provezoriamente paradu hela
							Actual		
	7	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Construction Co. Lda Jv Chongqing Roads Engineering	ICB/077/MPWTC-2015	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		
	8	Road and Bridge Maintenance Section : Tibar - Liquica - Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Municipality Liquica /162	Dongsung Engineering Co,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.Ltd.	RFP/038/MOPTC/2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		
	9	R4D Rural Road Maintenance Berlakulidu - Laberlaka Chainage 0+000 - 5+400 Nunuleta - Darulema Chainage 0+000-1+600 Vaviquinia-Maubaralisa Chainage 0+000-12+500	Luliana Unip.Lda	MPW-W-190098	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan		
							Actual		

Bazartete (BA)	1	New Installation MV,LV Line and House Connection for Bazartete Vila to Leorema -Bazartete Sub District-Liquica District	Mina petro leste Lda	RDTL-11004589	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	Lista ne tama iha unidade Eletrisidade
	2	Rural Road Rehabilitation Metagou Bazartete 0+000 - 3+000 & Periodic Maintenance Maumeta - Metagou Sta. 0+000 - 7+000 Municipality Liquica (162)	Banir Lema	MPW-W-190097	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	3	Konstrusaun ESTV Maumeta - Liquisa (CA + CB)	Vida Diak Unip. Lda	CID/600/PDIM/AM-LIQ/VIII/2019/02	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
	4	R4D Rural Road Periodic Maintenance Libaloa - Fahilebo Chainage 0+000 - 7+000 & Fahilebo - Fatumasi Chainage 0+000 - 2+300 Routine Maintenance Fahilebo Bucumera Chainage 0+000 - 6+500 Municipality Liquica	Lep Laco Dato	MPW-W-190111	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	
	5	Konstrusaun Moralha Foun Matadoro Tibar	Manoko Unip. Lda	RDTL-MAP-PO2019:19726	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan Actual	Provezoriamente servisu paradu hela
	6	Konstrusaun Foun EBF Hotugara Bazartete, Liquica (162)	Milcha Unip Lda	(RFQ:19/029-Q-R)	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual	
	7	Hamos Tangki Estasaun Tratamento Agua Residuais Etar Tibar / 162	Culoco Unipessoal Lda	Contract No.MOP-W-190184	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual	Provezoriamente servisu paradu hela
	8	New Water Supply of Bairos PNTL Liquica	Holuli Unipessoal, Lda	SSS/054/MI-2019	FI	MINISTERIO DO INTERIOR	Plan Actual	
	9	Konstrusaun Armagen Foun Matadouro (Bem Servisu)	Naesalobu	MAP-P02019:19532	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan Actual	Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
	10	New Construction of Laboratory for Covid 19 in Liquica Ministery of Health, Timor Leste	Queson SQ Unipessoal Lda	MS-DNA-RBK-20-178	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan Actual	Progresu fizikamente remata ona no hein retensaun
	11	New construction of isolation for covid 19 in chi liquica, Timor Leste	Senizu	MS-DNA-NCB-20-163	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan Actual	
	12	Kanalizasaun Be Mos ho Sistema Gravitasaun Iha Aipelo-Liquisa	Tinocya	022LM/RDTL/MPIE/AND/DA-RFQ/IX/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan Actual	Falta retensaun
		TOTAL PROJETO ON-GOING						

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu | Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili | Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu | Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Prepara Husi :

(Juninho Antônio Abrantes da Cruz)
Eng. Munisipiu Liquica

Sertifika Husi

(Emerenciana da Costa Maria Feitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade

Aprova Husi :

(Mariano R. Monteiro da Cruz, S.T.M. Eng)
Director Executivo
