



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU KUARTU
TRIMESTRÁL IMPLEMENTASAUN
PROJETUS INFRAESTRUTURAS

OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO

2022



TERMU NO ABRASIASAUN

RDTL	República Democrática de Timor-Leste
MPO	Ministério Do Plano E Ordenamento
ADN, I.P.	Agência Desenvolvimento Nasional, Instituto Publico
DE	Diretor Executivo
DA	Diretor Adjunto
GADE	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo
UGA	Unidade Gestão Administrativa
UAP	Unidade de Avaliação de Projetos
UCVQ	Unidade Controlo e Validação de Qualidade
UEDC	Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências
FI	Fundo das Infraestruturas
LM-CD	Liña Ministerial-Capital Desenvolvimento
LM-BS	Liña Ministerial-Bens de Serviços
LM-TP	Liña Ministerial-Transferencia Pública
PDIM	Programa Desenvolvimento Integrado Municipál

FOLHA VALIDADE

SUMÁRIO

RELATÓRIO QUATRO TRIMESTRAL IMPLEMENTAÇÃO PROJETOS INFRAESTRUTURAS 2022

Prepara Husi :

(Miguel Marques Monteiro de Jesus, S.T., M. Eng.)

Assesor Nacional – ADN, I.P.

for Verifika Husi :

(Susana Sinala do Rego Amaral, S.T.)

Chefe Ekipa Validasaun Baze de Dadus – ADN, I.P.

Sertifika (I) Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas, S.T., M.T.)

Koordenadora UCVQ – ADN, I.P.

Sertifika (II) Husi :

(Melenia da Costa Barros, B. EC., S.T.)

Koordenadora UAP – ADN, I.P.

Approva Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, ST, M. Eng.)

Diretor Executivo – ADN, I.P.

Lista Kontributór

Diretor Ezekutivo Agência Desenvolvimento Nasional, I.P.

Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M. Eng.

Adjunto Diretor Agência Desenvolvimento Nasional, I.P.

Januario Maia Guterres, S.T.

Konpilador

Miguel Marques Monteiro de Jesus

Ekipa de Validação e Base de Dados

Susana Sinala do Rego Amaral

Johanes Hornai

Nencia F. O. Rego

Ana Maria L. Da Costa Gurerres

Olivia Soares

João Paulo Amaral

Tifania Guterres Ornai

Engeñeiros Inspesaun no Monitorizasaun

Emerenciana da Costa M. F.

Deolindo F. Marques

Merinho Cuco L. de Araujo

Rui Lopes

Manuel Bany da S. C. de Carvalho

Joaquim de C. Madeira

Claodino Soares dos Santos

Jaulino H. Rodrigues

Jacob da Costa Camoes

Agustinho Aranda

Jerry Gil M. Pereira

Leonito Pereira

Ambrosio Martins Nuno

Salvador Martins

Zulkarnaen Depari

Jose Aparicio S. Soares

Noe Menezes Madeira

Moises Angelico Marques Freitas

Madelino Deonizo José Magno

Domingos Soares Martins

Prezenzio Legorio do Carmo Dias Ximenes

Bosco Dinis de Sousa

João Q. do Rego

Manuel Estrela Soares

Pedro de Lourdes Alves

Julmira Soares Sampaio

Egidio Gonsalves

João Quintão do Rego

Rosalia de Fatima

Eduardo do Santos

Ezequiel R. De Oliveira

Tito Edgar F. N. de Jesus

Antonio Mendonça Faria da Silva

Jaimito Manuel Quintão

Julio Jacob Soares

Geovanio M. X. Carlos Aleixo

Inocencio dos Reis Costa Maia

Deamantino Henrique Lopes

Elnino Junior Araujo Mota

Quico Adelino Junior

Marcus Ximenes de Araújo

Luduvina Maria H. Guterres

Antonia de Fatima Moraes

Juninho António Abrantes da Cruz

José R. Carlos Gusmão

Aleixo da C. Andrade

Augusta da Costa Ferreira

Domingos da Costa e Silva

Fabiano F.M. madeira

Fidelis Mardiano da Costa

Romulo J. M. Henrique

Majorico Cele Tali

Celvio J. Alves

Bebiano C. de Jesus Lopes

Roberto Maria Martins

Camilio Maia

Adonis Julio Fernades

Camilio de Jesus

Silvino Ribeiro

Dezeña, Setting ho Publikasaun

David da Silva

PREÁMBULU



Uluk nanain molok hatu'o objetivu husi publikasaun *relatóriu 3º trimestrál*, ha'u-nia saudasaun no hakru'uk ba ita-boot sira hotu.

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, I.P.) nu'udar instituisaun governu nian ida ne'ebé tutela iha Ministeriu Planu no Ordenamentu (MPO) bazeia ba Decreto-Lei N.º 60 /2020 de 25 de Novembro, ho nia funsaun prinsipál mak atu halo verifikasaun no Sertifikasaun ba servisu infraestutura Estadu nian liuliu obra konstrusaun sivil. Nu'udar Instituisaun Importante Governu nian, ADN, I.P. iha responsabilidade bo'ot atu garante katak Verifikasaun no Sertifikasaun ba implementasaun projektu sira ne'ebé governu hari'i iha duni kualidade no fó benefisiu ba povu nia moris di'ak, hodi aseguara nafatin dezenvolvimentu Timor-Leste ne'ebé inkluzivu no sustentável.

Nu'udar Diretór Ezekutivu asumi responsabilidade boot hodi fó orientasaun servisu ba kargu xefia sira hotu-hotu atu garante nafatin funsionamentu instituisaun nian inklui elabora planu atividade anuál, plurianuál no mós relatóriu atividade bazeia ba rezultadu serbisu loroloron iha terenu tuir deketu lei ne'ebé atribui ba.

Deseja katak ho relatóriu ida ne'e bele representa hanesan evidénsia réal hodi sukat rezultadu atinjimentu, dezafiu no mós karik prezisa rekomendasaun atu mellora serbisu hotu-hotu tuir responsabilidade ne'ebé ida-idak asumi ba.

Ha'u agradece ba ekipa elaborasaun nia inisiativa ho vontade tomak inklui fontes informasaun sira ne'ebé kontribui husi tékniku sira, maski relatóriu ida ne'e la dauk perfektu maibé ba oin ho defeitu ne'ebé hasoru sai hanesan lisaun ida ne'ebé fó biban atu prodús di'ak liu tan relatóriu tuir mai.

Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M. Eng.
Diretor Exekutivo – ADN, I.P.

Tabela Konteúdo

I.	INTRODUSAUN	1
1.1	Enkuadramentu Legal	1
1.2	Estrutura da Agência Desenvolvimento Naional, I.P.	2
1.3.	Competensias Orgaun ADN, I.P.	3
1.4.	Flow-Prosesu Fluxograma Pedido Verifikasaun Dokumentus iha ADN, I.P.	6
1.5.	Flow-Prosesu Fluxograma Pedido Sertifikasaun Pagamentu Iha ADN, I.P.	6
II.	SUMARIO	8
2.1.	Bens e Móveis ou Patrimonio ADN, I.P.	8
2.2.	Bens e Móveis ou Patrimonio – Ekipamentus no Mesuramentu ADN, I.P.	8
2.3.	Força de Trabalho Funsionario ADN, I.P. Funções no Unidades	9
2.4.	Projetos 13 Municipio por Fontes Finansiamiento	15
2.5.	Projetos 13 Municipio por Setores	19
2.6.	Projetos 13 Municipio por Ministerio	22
2.9.	Prefil Pagamentu Komulativu Segundo Trimestral	26
III.	OBSTÁCLO	27
3.1	Obstaklu hosi Parte Companhia	27
3.2	Obstaku hosi Parte ADN, I.P.	27
IV.	REKOMENDASAUN	29
4.1.	Rekomendasaun ba Parte Companhia, ADN, I.P. no Ministeria Relevantes	29
ANEKSU		
A.	Detalha Progresu fisiku Infrastruturas Segundo Trimestral 2022	
B.	Lista Ekipamentus no Mesuramentu Laboratorio ADN, I.P.	
C.	Lista Ekipamentus no Mesuramentu Mecânica e Elétrica	
D.	Checklist Completidade & Validasaun Dokumentus Teknika	
E.	Perfil Fungsionarios ADN, I.P.	

I. INTRODUSAUN

1.1. Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN, I.P. hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revolgasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P. hanesan Insituto Público (IP), ho Misaun ADN, I.P. nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (Infraestruturas) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefisiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekertu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P. hanesan Insituto Público (IP), ADN, I.P. nia knar principal iha 3 mak hanesan :

1. Halo avaliasaun previa ba projeitu Kapital Desenvolvimento nian.
2. Halo inspesaun no sertifikasaun ba projetu Kapital Desenvolvimento
3. Elabora standarizasaun tekniku ne'ebe relasiona ho Desenvolvimento Innfraestruturas
4. Kontinua jere no finansia projeto PDIM no LM em curso hosi tinan anterior.

Tuir Decreto Exekusaun Orsamentu 2021, ADN, I.P. mos iha papel atu halo avaliasaun previa, inspesaun no sertifikasaun ba projetos ne'ebe finansia liu husi orsamentu bens de servicos no transferensia publica ne'ebe nia kusto boot liu \$ 50,000 (Exeptu projeto husi BTL, EP no EDTL, EP)


Vizaun

ADN, I.P. garantia kualidade prestasaun serbisu husi ninian funsionarios no adapta nia estrutura interna hodi responde (hatán) ho forma ne'ebé efikáz liu, hasoru dezafius (sasidik oioin).

Misaun

Funsionarios no membros associados hotu ne'ebe iha ona akordo serbisu ho ADN, I.P. hatene nia responsabilidade sei obdese ba politikas no prosedimento ne'ebe regula ona durante ezerse nia funsaun iha ADN, I.P.

1.2. Estrutura da Agência Desenvolvimento Nacional, I. P.

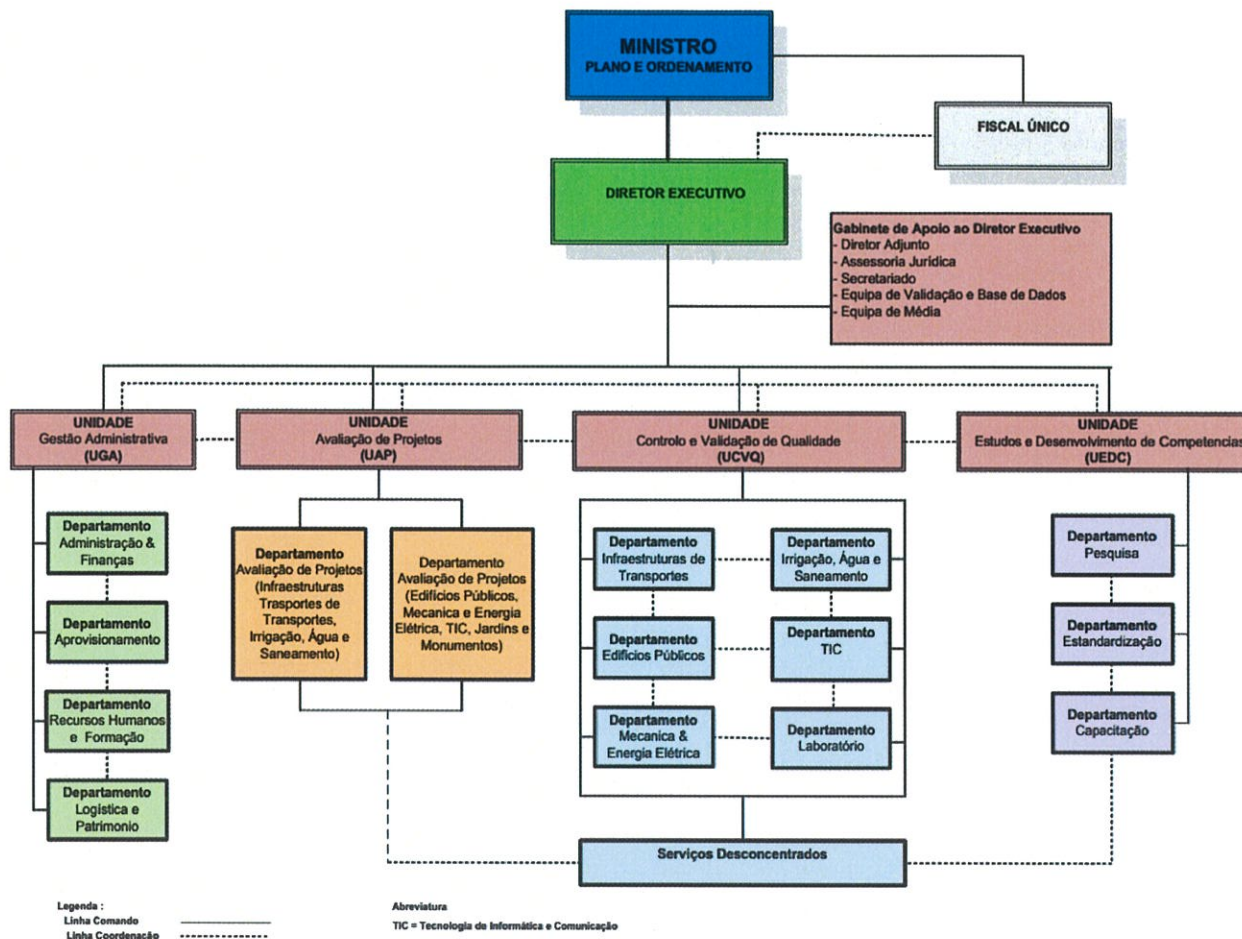

Bazeia ba decreto lei No. 60/2020, 25 Novembro Estatuta Agência ba Desenvolvimento Nacional, I.P. Capítulo II seksaun I artigo 7 ho 8; Estrutura Organica ADN, I.P. komposto husi :

- Ministro Plano e Ordenamento (MPO)
- Fiscal Unico (FU)
- Diretor Executivo (DE)
- Adjunto Diretor Executivo (ADE)
- Gabinete de Apoio ao Diretor Executivo (GADE)
- Unidade de Gestão Administrativa (UGA)
- Unidade de Avaliação de Projetos (UAP)
- Unidade de Controlo e Validação de Qualidade (UCVQ)
- Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências (UEDC)

1.3. Competencias Orgaun ADN, I.P.

1. Kompete ba Diretór Ezekutivu :

- a) Representa ADN, I.P. ho entidade sira hotu públiku no privadu, nasional no estranjeiru;
- b) Dirije, kordena no orienta servisu sira hotu no atividade sira hotu, fó ordem no instrusaun sira conforme nesesidade servisu hodi asegura servisu nia funksionamentu di'ak;
- c) Kordena elaborasaun no propoin ba tutela planu atividade sira anuál no plurianuál;
- d) Kordena elaborasaun no submete relatóriu atividade sira ba apresiasaun husi tutela;
- e) Kordena elaborasaun husi regulamentu internu, estrutura no organizasaun ADN, I.P. nian no quadro pesoál hodi propoin aprovasaun husi tutela;
- f) Aprova ordem ba kompras, responsabiliza ba kompromisu sira hotu, despeza no pagamentus tuir lei nomós ho respeito ba limite orsamentu nian katak aprova ona ba ADN, I.P.;
- g) Akompaña ezekeusaun no gestaun husi orsamentu no haloos dezviu ruma relasiona ho previsoens;
- h) Asegura katak kobransa rescita nomós realizasaun despeza sira hotu regulár;
- i) Autoriza atu hahú prosedimentu aprovizionamentu sira no adjudikasaun husi kontratu públiku sira, tuir valór no bazeia ba lei;
- j) Asina kontratu servisu ho traballadór sira hotu ne'ebé katak laiha vinkulu ho funsaun públika;
- k) Dirije, avalia no hala'o poder disiplinár relasiona ho traballadór sira iha ADN, I.P. no kordena ho Komisaun Funsan Públika;
- l) Aprova no asina pareser tekniku ne'ebé relasiona ho atribuisoens ADN, I.P. nian;
- m) Aprova validasaun husi projetu no obras hodi halo pagamentu, haktuir atribuisoens ADN, I.P. nian;
- n) Hetan koñesimentu no foti medidas hodi rezolve keixas relasiona ho servisu ADN, I.P. nian;
- o) Deside kona-ba reklamasaun sira husi ADN, I.P. nia servisu relasiona ho ADN, I.P. nia kompeténsias;
- p) Promove kordenasaun ho orgaun sira seluk iha Governu nomós ho parseiru dezvoltamentu nasional no estranjeiru sira hodi asegura kumprimentu ba objetivus dezvoltamentu nasional nian.
- q) Representa ADN, I.P. liuhusi asinatura husi kontratu no akordu sira hotu nomós pratika atu sira seluk katak nesesáriu hodi ADN, I.P. hala'o ninia kna'ar;
- r) Hala'o funsaun sira seluk tuir Ministru nia instrusoens.

2. Unidade de Gestão Administrativa

1. Unidade de Gestão Administrativa, ho abreviatura UGA, mak servisu ADN, I.P. nian ne'ebé responsavel ba servisu administrativu, finanseiru, rekursus humanus nomós aprovizionamentu no lojístika.
2. Kompete ba UGA hodi :
 - a) Fó apoiu tékniku no administrativu ba servisu sira hotu iha ADN, I.P.;
 - b) Jere rekursus finanseirus, humanus no materiais husi ADN, I.P.;
 - c) Promove formasaun no kapasitasaun husi quadro pesoál administrativu ADN, I.P. nian;

- d) Verifika legalidade husi despesa, promove ninia pagamentu nomós aseguira ninia rejistu;
 - e) Tau matan ba kumprimentu husi leis, regulamentus no norma sira seluk ne'ebé mak relasiona ho administrasaun no finansas;
 - f) Avalia nesesidade financeiru sira iha ADN, I.P. no apresenta orsamentu bazeia ba nesesidades;
 - g) Fó apoiu relasiona ho ekipamentu, manutensaun no inovasaun iha área teknolojia informátiku;
 - h) Emite relatóriu financeiru kona-ba reseita no despesa ADN, I.P. nian;
 - i) Hala'o kna'ar seluk bazeia ba Diretor Ezekutivu nia instrusoens.
3. Desizaun sira ne'ebé mak koordinador UGA nian halo sujeitu ba rekursu ierarkiku nesesáriu hato'o ba Diretor Ezekutivu.

3. Unidade de Avaliação de Projetos

- 1. Unidade de Avaliação de Projetos, ho abreviatura UAP, mak servisu ADN, I.P. nian ne'ebé responsavel ba avaliaun husi projetu públiku sira relasiona ho arkitetura no enjeñaria husi pontu de vista tékniku no financeiru.
- 2. Kompetente ba UAP hodi:
 - a) Emite parecer vinculativu kona-ba projetu molok submete ba prosesu aprovizionamentu relasiona ho atividade ne'ebé hatuur iha alíneas a) no b), número 2 husi artigu 4;
 - b) Pronuncia kona-ba projetu sira ne'ebé relasiona ho arkitetura no enjeñaria katak la hatuur iha alinea anteriór hafoin pedido husi entidade competente;
 - c) Hala'o avaliaun detalladu kona-ba qualidade projetu nian, nomós atu verifika aspektu tékniku hotu-hotu, nu'udar ezemplu aspektu jeolójiku no idrolójiku sira, haktuir norma no regulamentu sira ne'ebé mak bele aplika;
 - d) Hala'o avaliaun detalladu hodi aseguira viabilidade projetu nian, ho estimativa husi kustu no kuantidade sira nomós verifika aspetu financeiru hotu-hotu;
 - e) Avalia no aprova, husi ponto de vista tékniku no financeiru, razoabilidade husi estudu sira relasiona ho viabilidade husi projetu no obra sira hatu'ur iha número 2, artigu 4.
- 3. Desizaun sira ne'ebé mak koordinador UAP nian halo sujeitu ba rekursu ierarkiku nesesáriu hato'o ba Diretor Ezekutivu.

4. Unidade de Controlo e Validação de Qualidade

- 1. Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ho abreviatura UCVQ, mak servisu ADN, I.P. nian ne'ebé responsavel ba servisu sira ne'ebé katak halo kontrolu husi evolusaun no implementasaun obras konstrusaun sivil nian no validasaun respetivu.
- 2. Kompetente ba UCVQ hodi:
 - a) Kontrola no inspecciona beibeik kona-ba evolusaun no progresu obras konstrusaun nian;
 - b) Verifika ezekeusaun obras nian, nu'udar ezemplu qualidade husi material no ekipamentu sira ne'ebé mak utiliza, haktuir kontratu nomós haktuir norma no regulamentu sira ne'ebé mak bele aplika;
 - c) Hala'o inspesaun husi obras kuando nesesáriu, hodi bele determina progresu fisiku respetivu no, konsekuentemente, hodi bele valida valor servisu nian mak ezekeuta ona;
 - d) Kontrola no avalia proposta alterasaun no ajustamentu sira mak nesesáriu durante faze konstrusaun nia laran;


- e) Emite autorizasaun ba pagamentu sira bazeia ba progresu ezekusaun projetu nian nomós bazeia ba kualidade ne'ebé mak ezijidu;
- f) Sertifika kualidade konstrusaun, Infraestrutura ka obras tipu seluk;
- 3. Desizaun sira ne'ebé mak koordinadór UCVQ nian halo sujeitu ba rekursu ierárkiku nesesáriu ható'o ba Diretor Ezekutivu.

5. Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências

- 1. Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências, ho abreviatura UEDC, mak servisu ADN, I.P. nian ne'ebé responsavel ba estudus no investigasaun iha área projetus no iha área obras konstrusaun no projetu sira seluk ho interese estratéjiku, nomós responsavel ba dezvoltamentu husi kapasidades iha áreas arkitetura, projetu no enjeñaria.
- 2. Kompetêba UEDC :
 - a) Realiza no promove estudus investigasaun no dezvoltamentu teknolójiku relasiona ho obras konstrusaun sivil no indústria materiais nian, sasán no produktu sira seluk ba konstrusaun no área sira seluk relasiona ho konstrusaun;
 - b) Realiza estudus kona-ba normalizasaun no regulamentasaun tékniku no elabora dokumentu sira refere, ho kolaborasaun husi entidade sira seluk kompetente;
 - c) Omologa kualidade materiais nian, sasán no produktu sira seluk ba konstrusaun nomós elementu, prosesu no empreendimentu sira ba konstrusaun;
 - d) Hala'o ensaius, emite pareser sira no responde ba konsultas, nomós realiza ezame no perísia sira kona-ba UEDC nia atividade;
 - e) Elabora ka propoin adosaun padraun no norma espesial sira ba sertifikasaun kualidade, ho kolaborasaun husi entidade kompetente sira seluk;
 - f) Promove dezvoltamentu ba formasaun no kapasitasaun husi traballadór sira Estadu nian iha áreas arkitetura, enjeñaria no fiskalizasaun obras, nomós fó valor ba kualifikasaun profisional respetivu, ho koordinasaun husi entidade sira ne'ebé mak relevante.
- 3. Desizaun sira ne'ebé mak koordinadór UEDC nian halo sujeitu ba rekursu ierárkiku nesesáriu ható'o ba Diretor Ezekutivu.

1.4. Flow- Prosesu Fluxograma Pedido Verifikasaun Dokumentus iha ADN, I.P.

Funsaun prinsipal fluxograma ba Pedido verifikasaun dokumentus hodi fornese informasaun jeral relasiona ho prosesu verifikasaun faseadamente husi prosesu ida ba prosesu sira seluk, ho nune hafasil servisu atendentu ninian nomos simplifika prosedimentus atu bele facilita entendentu relasiona ho verifikasaun dokumentus infrastras fiziku.

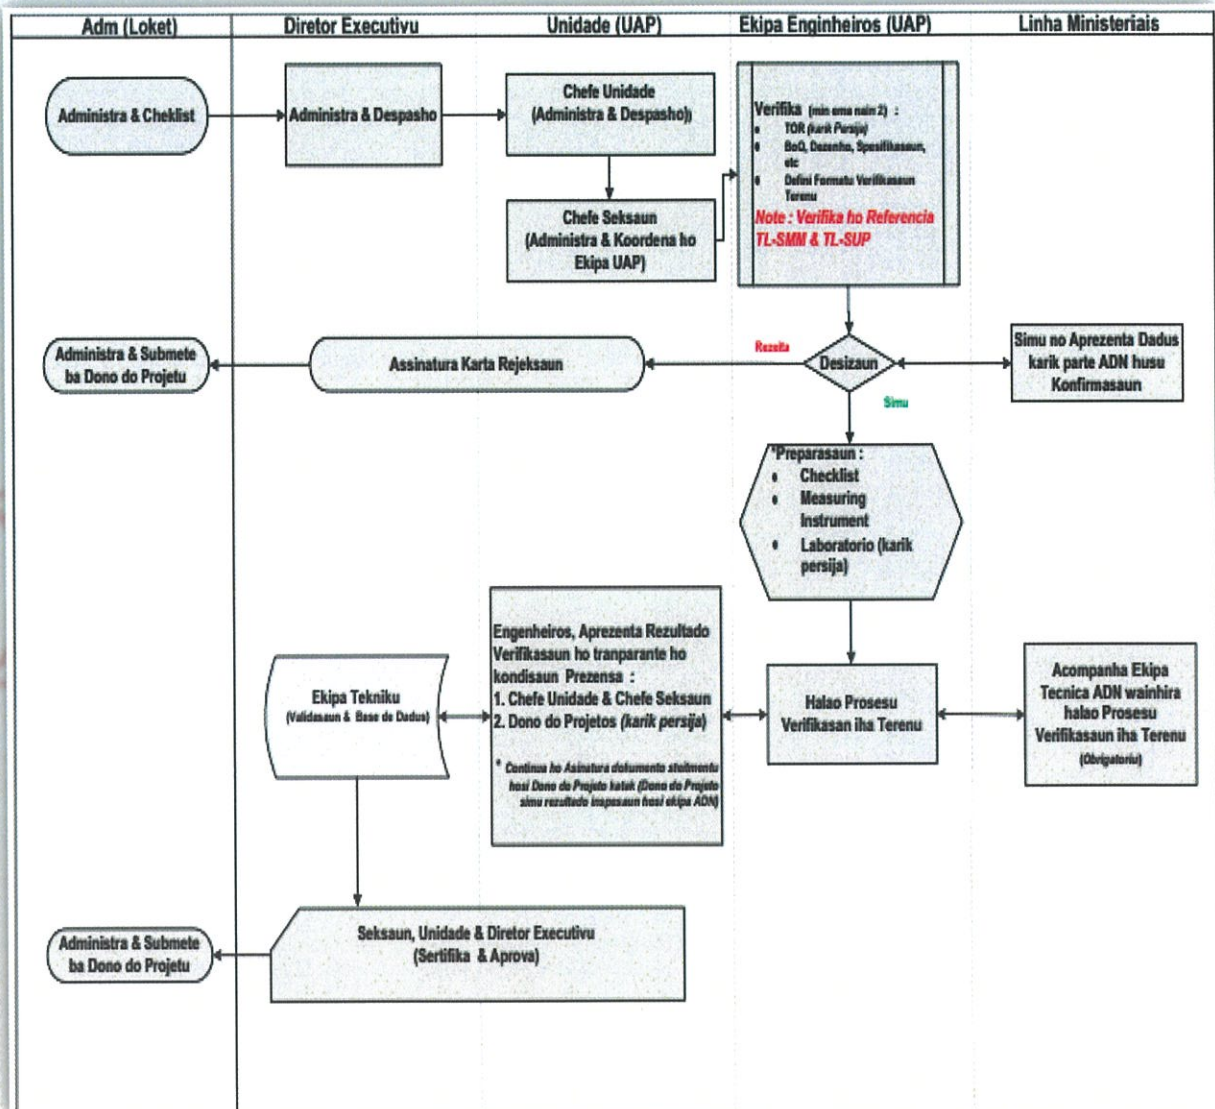


Fluxograma 1.4. Pedido Verifikasaun Dokumentus iha ADN, I.P.

1.5. Flow – Prosesu Fluxograma Pedido Sertifikasaun Pagamento iha ADN, I.P.

Funsaun prinsipal fluxograma ba pedido sertifikasaun pedido dokumentus pagamentu hodi fornese informasaun jeral relasiona ho prosesu sertifikasaun dokumentus faseadamente husi

prosesu ida ba prosesu sira seluk, ho nune hafasil servisu atendentu ninian nomos simplifika prosedimentus atu bele facilita entendentu ba prosesu sertifikasaun pagamentus projetus infraestruturas molok hala'o pagamentu.

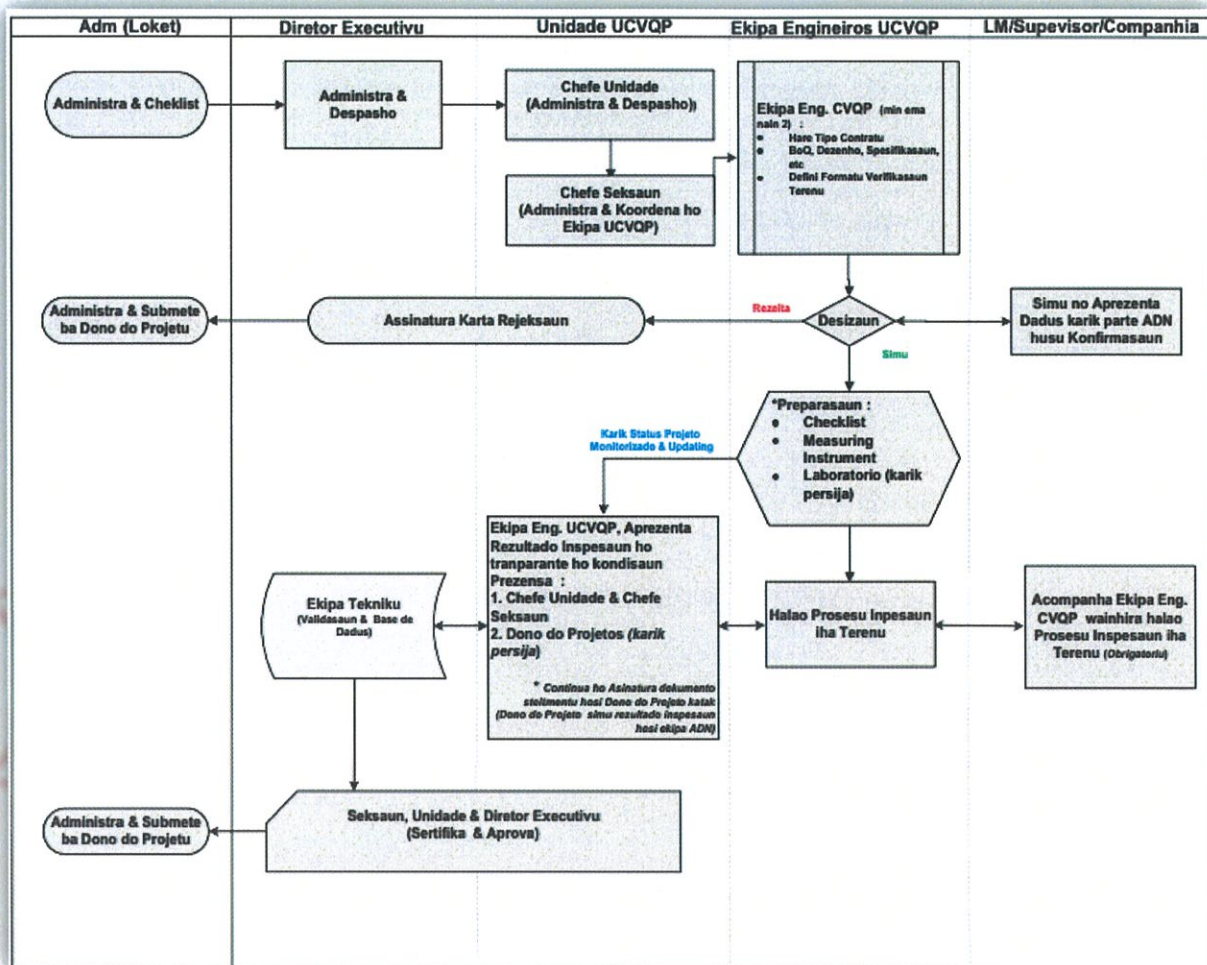

Fluxograma 1.5. Pedido Sertifikasaun Dokumentus Pagamento iha ADN, I.P.

II. SUMÁRIO

2.1. Bens e Móveis ou Patrimônio ADN, I.P.

Bens e Móveis ou Patrimônio ADN, I.P. ba tipo A-C kofre ba eskritorio prinsipal ADN, I.P. iha Dili nomos ba 12 municipios iha teritorio tomak ne'ebe defini ba tipo A ba bens e móveis (Veículo, Makina, Ekipamentus Eletronica no Elétrica), tipo B ba bens e móveis hanesan (Mobiliario Armario, Meza e Kadeira) no tipo C ba bens e móveis (Escritorio, Armagem no Residencia)

Nu	Tipo A	Kuantidade	Tipo B	Qty	Tipo C	Kuantidade
1	Veiculo (<i>Toyota & Mitsubishi</i>)	32	Meja Executivo	15	Escritorio	3
2	Motocikleta	42	Meja Partisan	100	Residencia	12
3	Desktop Computer	75	Meja Secretariado	43	Armagem	4
4	Laptop	50	Sofa	1	Laboratorio	1
5	Projector Screen	3	Kadeira Executivu	112		
6	Server Compouting	1	Kadeira Secretariado	126		
7	Television (TV)	1	Armario Aluminium	68		
8	Makina fotokopia	10	Armario Baja	16		
9	UPS	43	Armario Ai	12		
10	AC	56	Gaveta	115		
11	Lampu	321				
12	Handcam	4				
13	Printer	32				
Total		670		608		20

Tabela 2.1. Bens e Móveis ou Patrimônio ADN, I.P.

2.2. Bens e Móveis ou Patrimônio – Ekipamentus Laboratório no Mesuramentu ADN, I.P.

Bens e Móveis ou Patrimônio – Ekipamentus Laboratório no Mesuramentu ADN, I.P. relaciona ho ekipamentus testes no mesuramentu ba inspesaun projetus ninian ne'ebe fahe ba kategoria 3 mak hanesan : ekipamentus teste ne'ebe lokaliza iha laboratório nasional ADN, I.P. e maioria ba testing material konstrusaun sivil, material testing ne'ebe lokaliza ou fahe ba Serviços descentrados (*Engenheiros ADN, I.P. Municipios*) nomos ekipamentus testing no mesuramentu ba mecânica e elétrica ne'ebe lokaliza iha Departamento no engenheiro mecânica e elétrica ninian eskritorio.

UCVQ		
Laboratório	Serviços Desconcentrados - (Eng.12 Municipios)	Mecânica no Elétrica
100	96	18
214		
TOTAL		

Tabela 2.2. Bens e Móveis ou Patrimônio – Ekipamentus Laboratório no Mesuramentu ADN, I.P.

2.3. Força de Trabalho Funcionario ADN, I.P. – Funções no Unidades

Forsa trabalho haktuir iha tabela 2.3.1. iha kraik Eskreve detalho relasionamente numeru ba Jenero, numeru funsoens orgaun no Numeru kada Unidades iha ADN, I.P. ninian.

NU	NARAN	POSISAUN	MANE	FETO	DE & DA	CORDENADOR	CHEFE DEP./SEC.	ENGENHEIROS ESPECIALIZADO	ADM/FINANSA/AROV/ LOGISTICA	ASSESOR/A NACIONAL	ASSESOR INTERNACIONAL
I	Diretor Executivo - ADN, I.P.										
1	Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M. Eng.	Diretor Executivo ADN, I.P.	✓	✓							
II	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo (GADE) - ADN, I.P.										
II.1.	Diretor Adjunto - ADN, I.P.										
1	Januario Maia Guterres, S.T.	Diretor Adjunto	✓	✓							
2	DR. Manuel Moita da Silva Júnior	Assesor Jurídico	✓								✓
II.2.	Secretariado Unidade Apoio ao Diretor Exekutivo - ADN, I.P.										
1	Joedã Marni Tavares	Secretaria e Asistente Administraun Diretor Executivo		✓					✓		
2	María Zita Cristovão do Carmo Vieira, Lic. CSH.	Secretaria e Asistente Administraun Diretor Executivo		✓					✓		
3	Engracia Fernandes Brito Amaral, S.S.	Secretaria e Asistente Administraun Diretor Executivo		✓					✓		
4	Basílio Da Conceição Silva	Motoristas & Administraun Unidade ao Apoio Diretor Exekutivo	✓						✓		
5	Mateus da Silva	Motoristas & Administraun Unidade ao Apoio Diretor Exekutivo	✓						✓		
II.3.	Equipa de Validação e Base de Dados -ADN, I.P.										
1	Susana Sinala do Rego Amaral, S.T.	Chefe Equipa - VBD		✓			✓				
2	Fernão Antonio Lopes Nobre Mouzinho, L.Inf, M. Eng.	Assesor GIS	✓							✓	
3	Ana Maria Lourdes da Costa Guterres, B.ETT.	Eng. Equipa - VBD (Mecânica e Elétrica)		✓				✓			
4	Johanes Hornay, S.T.	Eng. Equipa - VBD (Edifício Publicas)	✓					✓			
5	João Paulo Amaral, S.T.	Eng. Equipa - VBD (Pontes, Estrada e Seias)	✓					✓			
6	Olivia Soares, B.EC.	En. Equipa - VBD (Pontes, Estrada e Seias)		✓				✓			
7	Nencia Filomena Oliveira do Rego, S.Kom.	Eng. Equipa - VBD (TIC)		✓				✓			
8	Tifânia Clotária Guterres Omai, Lic. Eng.	Eng. Equipa - VBD (Kompiladora Dadus Projetus e GIS)		✓				✓			
II.4	Equipa de Mídia - ADN, I.P.										
1	Samuel Soares	Assesor Nacional da Mídia	✓							✓	
2	David da Silva	Designer de Mídia	✓						✓		
3	Franzela Pinto	Assistente Mídia		✓					✓		
III	Unidade Gestão Administrativa (UGA) - ADN, I.P.										
III.1.	Departamento Administração & Finanças - ADN, I.P.										
1	Nelson Soares Pinto, L. Ec.	Koordenador- UGA	✓			✓					
2	Epi Orlêães, Lic. Educ., M.M.	Public Finance Management, Gender & Social Inclusion Advisor		✓						✓	
3	Amélia da Costa, L. Ec.	Chefe Departamento - Adm & Finanças		✓			✓				
4	Angela Merisia Egong Correia, S.E.	Oficial Finanças		✓					✓		
5	Abelito da Costa, L.Agm.	Oficial Finanças	✓						✓		
6	Ferdiana Maia Duarte, Lic. Eco.	Oficial Contabilidade		✓					✓		
7	Elizabeth do Nascimento Cabral, L. CS	adm & Financas Oficial		✓					✓		
8	Aquilino Soares Ferreira, Lic. AP	Planejamento Oficial	✓						✓		

NU	NARAN	POSISAUN	MANE	FETO	DE & DA	CORRENADOR	CHEFE DEP. SEC.	ENGENHEIROS ESPECIALIZADO	ADM/FINANSA/AROV/LOGISTICA	ASSESSOR/A NACIONAL	ASSESSOR INTERNACIONAL
9	Sonyta Mariana Elisabeth Da Silva Henuk, S.I.P.	Oficial Administraaun		✓					✓		
10	Elisabeth Feizarda Ximenes, S.T.	Oficial Administraaun		✓					✓		
11	Nelson Teotónio Barros Fernandes Magno, Lic. CSH.	Oficial Administraaun	✓						✓		
12	Edivijes Soares Lobo	Assistente Oficial Administraaun		✓					✓		
13	Ana Eusebia Ximenes, Lic. Eco	Oficial Administraaun		✓					✓		
14	Carlos Mendonça Calapes	Assistente Oficial Administraaun	✓						✓		
III.2. Departamento Aprovezimento - ADN, I.P.											
1	Jose Antonio Filomeno Gago Exposto, Lic. Eco.	Oficial Aprovezimento	✓				✓				
2	Sertorio Martins	Oficial Aprovezimento	✓						✓		
3	Lidia da Cruz Monteiro, B. Educ.	Assistente Oficial Aprovezimento		✓					✓		
4	Maria Auxiladora Aleixo dos Santos, Lic. Eco.	Oficial Aprovezimento		✓					✓		
III.3. Departamento Recursos Humanos e Formação - ADN, I.P.											
1	Tomas Magno do Carmo, S.E., M. Eco.	Acting & Assessor Nacional Recursos Humanos e Formação	✓							✓	
2	Isabel Gomes Lopes, Lic. Eco.	Assesora Políticas Publicas		✓						✓	
3	Gicella Jong Gonçalves, Lic. Eco.	Oficial Recursos Humanos		✓					✓		
4	Angela Beatriz Mita Freitas, Lic. Buss.	Oficial Rekursu Humanos		✓					✓		
III.4. Departamento Logística e Patrimonio - ADN, I.P.											
1	Jose Amaral, S.I.P.	Chefe Dept. Logística e Patrimonio	✓				✓				
2	Sandra Ribeiro Belo, Lic. Eco.	Assistente Administracao da Logística e Patrimonio		✓					✓		
3	Marcelino Soares do Carmo, S.T.	Assistente da Logística e Patrimonio	✓						✓		
4	Sergio Gomes	Assistente da Logística e Patrimonio	✓						✓		
5	Arcenio Magno Do Rego	Mecânico de Automóveis	✓						✓		
6	Jony Maia da Silva dos Santos	Motoristas Bobonaro	✓						✓		
7	João Pedro Cortereal	Motoristas Aileu	✓						✓		
8	Silveiro da Costa	Motoristas Manufahi	✓						✓		
9	Bernado Da Cruz Amaral Perreira	Motoristas Dili (Operacional - Nacional)	✓						✓		
10	Manuel Antonio Soriano	Motoristas Dili (Operacional - Nacional)	✓						✓		
11	Bendito Mendes Bento	Motoristas Viqueque	✓						✓		
12	Domingos Da Costa	Motoristas Dili (Operacional - Nacional)	✓						✓		
13	Agostinho Amaral	Motoristas Covalima	✓						✓		
14	Rui Antonio Gaio	Motoristas Liquisa	✓						✓		
15	Gilroy Marcal da Cunha Braz	Motoristas Dili (Operacional - Nacional)	✓						✓		
16	Rafael Joaquim Mousaco Galucho	Motoristas Dili (Operacional - Nacional)	✓						✓		
17	Timoteo Da Silva Morais	Motoristas Manatuto	✓						✓		
18	Joel Barreto Abrantes	Motoristas Dili (Laboratório)	✓						✓		
19	Delio Abel Manuel Perreira	Motoristas Lautem	✓						✓		
20	Anacleto de Sousa Belo	Motoristas Baucau	✓						✓		
21	Salvador Ruas Amaral	Motoristas Dili (Operacional - Nacional)	✓						✓		
22	Siltonio Pinto de Araujo	Motoristas Dili (Operacional - Nacional)	✓						✓		
23	Rosario Soares de Deus	Motorista Ermera	✓						✓		
24	Lucas Alberto Soares Pereira	Motoristas Ainaro	✓						✓		

NT	NARAN	POSICION	MANE	FETO	DE & DA	CORDENADOR	CHEFE DE SEC.	ENGENHEIROS ESPECIALIZADOS	ADM/FINANSA/ARQV/LOGISTICA	ASSESOR/A NACIONAL	ASSESOR INTERNACIONAL
IV Unidade de Avaliação de Projetos (UAP) - ADN, I.P.											
IV.1. Secretariado UAP - ADN, I.P.											
1	Melenia da Costa Barros, B. EC., S.T.	Koordenadora - UAP		✓		✓					
2	Miguel Marques Monteiro de Jesus, S.T., M. Eng.	Assesor Nacional Mecânica e Elétrica (UAP & UCVQ)	✓							✓	
3	Joanito Doutel Pereira, B. Eng.	Assesor Nacional Water & Irrigation (UAP no UCVQ)	✓							✓	
4	Rosaria Elizabeth Aniceto Cardoso Amaral, B.S, M.S.	Assesora Nacional Project Management (UAP no UCVQ)		✓						✓	
5	Maryanti Kota dos Santos, Lic. Eco.	Official Administração - UAP		✓					✓		
6	Fidelia Auxiliadora da Conceicao Freitas, Lic. Eco.	Assistente Administração - UAP		✓					✓		
IV.2. Departamento Avaliação de Projetos Infraestruturas Transportes, Irrigação, Água e Saneamento (ITIAS) - ADN, I.P.											
1	Rogério Marçal Pires, B. EC., Lic. Eng.	Eng. Senior - ITIAS	✓				✓				
2	Daniel Arcanjo Alves, S.T.	Eng. ITIAS	✓					✓			
3	Martinho da Costa Graciano, B. EC., Lic. Eng.	Eng. ITIAS	✓					✓			
4	Mario Gusmao Mendeita da Cruz Nunes Silva, S.T.	Eng. ITIAS	✓					✓			
5	Anjelita Maria de Jesus Cardoso, S.T.	Eng. ITIAS		✓				✓			
6	Olívio Marcos da Silva Correia, S.T.	Eng. ITIAS	✓					✓			
IV.3. Departamento Avaliação de Projetos Edifício Públicos, Mecânica e Energia Eléctrica, TIC, Jardins e Monumentos (EMETIJM) - ADN, I.P.											
1	Amorin Soriano Menezes, ST	Eng. Senior - EMETIJM	✓				✓				
2	Arlindo Sarmento Monteiro, S.T.	Eng. EMETIJM	✓					✓			
3	Paulino Abrantes Correia, B. EC.	Eng. EMETIJM	✓					✓			
4	Oscar Monteiro Gomes, S.T.	Eng. EMETIJM	✓					✓			
5	Maria Melania Mendonça Oca, S.T.	Eng. EMETIJM		✓				✓			
6	Angelica da Costa, B. ETT.	Eng. EMETIJM		✓				✓			
7	Jonas das Dores Henriques Gomes, S. Kom.	Eng. EMETIJM	✓					✓			
V Unidade Controlo e Validação de Qualidade (UCVQ) - ADN, I.P.											
V.1. Secretariado UCVQ - ADN, I.P.											
1	Emerenciana da Costa Maia Freitas, S.T., M.T.	Koordenadora - UCVQ		✓		✓					
2	Santoso, S.T.	Assesor Internacional Estrutura (UCVQ & UAP)	✓								✓
3	Aleixo Amaral do Carmo, S.T.	Assesor Nacional Pontes Estradas (UCVQ & UAP)	✓							✓	
4	Francisco Incio Filho Dos Reis Corsino, Lic. EC, M. Eng.	Assesor Nacional UCVQ	✓							✓	
5	Joaninha da Costa	Official Administrasaun		✓					✓		
6	Brijita Joanila Fernandes	Secretaria Diretor Adjunto		✓					✓		
7	João Marcos Napoleão Gracia	Assistente Official Administrasaun	✓						✓		
V.2. Departamento Infraestruturas de Transportes e Irigasaun - ITI											
1	Remigio da Conceição Soares dos Santos, S.T.	Eng Senior - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	✓				✓				
2	Aniceto da Costa, B. EC, Lic. Eng.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	✓					✓			
3	Manuel Bany da Silva Cristovão de Carvalho, S.T.	Eng. Ainaro - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
4	Jaulino Henriques Rodrigues, S.T.	Eng. Ainaro - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
5	Jacob da Costa Camões, Lic. Eng.	Eng. Baucau - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
6	Leonito Pereira, S.T.	Eng. Baucau - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
7	Jose Aparicio Sanches Soares, B.EC.	Eng Bobonaro - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
8	Noe Menezes Madeira, B. Eng.	Eng Bobonaro - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
9	Salvador Martins, S.T,	Eng. Viqueque - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
10	Camilo Maia, B. EC.	Eng. Viqueque - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			

NU	NARAN	POSISAUN	MANE	PRTO	DE & DA	CORDEADOR	CITIBE DEP. SEC.	ENGENHEIROS ESPECIALIZADO	ADM/FINANSA/AROV/LOGISTICA	ASSESSOR/A NACIONAL	ASSESSOR INTERNACIONAL
11	Domingos Soares Martins, B. EC.	Eng. Covalima - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
12	Bosco Dinis de Sousa, S.T.	Eng. Covalima - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
13	Joao Quintao do Rego, S.T.	Eng. Dili - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
14	Eduardo dos Santos, S.T.	Eng. Dili - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
15	Antonio Mendonça Faria Da Silva, Lic. Eng.	Eng. Ermera - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
16	Julio Jacob Soares, Lic. Eng.	Eng. Ermera - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
17	Marcus Ximenes de Araujo, S.T.	Eng. Liquisa - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
18	Luduvina Maria Helena Guterres, Lic. EC.	Eng. Liquisa - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun		✓				✓			
19	Geovanio Mateus Xavier Carlos Aleixo, B.EC.	Eng. Lautem - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
20	Elnino Junior Araújo Mota, L. Eng. Civ.	Eng. Lautem - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
21	Deomentino Henrique Lopes, Lic. Eng.	Eng. Lautem - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
22	Augusta da Costa Ferreira, B.EC.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor)		✓				✓			
23	Jose Roberto Carlos Gusmao, Lic. Eng.	Eng. Manututo (Siksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	✓					✓			
24	Domingos da Costa Ximenes e Silva, B. EC.	Eng. Manututo (Siksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	✓					✓			
25	Romulo João Marques Henrique, S.T.	Eng. Manufahi (Siksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	✓					✓			
26	Majorico Cele Tali, Lic. Tech.	Eng. Manufahi (Siksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	✓					✓			
27	Celvio Justino Alves, B.EC, Lic. Eng.	Eng. Aileu - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
28	Roberto Maria Martins, Lic. Eng.	Eng. Viqueque - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
29	Vidal Guterres, B.EC, Lic. Eng.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor)	✓					✓			
30	Tito Edgar Fatima Napoleão de Jesus, S.T.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor)	✓					✓			
31	Terresa Gomes, S.T.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor)		✓				✓			
32	Lourdes Pereira, S.T.	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor)		✓				✓			
33	Rui Lopes, Lic. Eng.	Eng. Aileu - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	✓					✓			
V.3. Departamento Edifícios Públicos no Be'e Mos - EPBM											
1	Francisco Xavier de Jeronimo, S.T.	Eng. Senior - Edifício Publicas no Be'e Mos	✓				✓				
2	Ir. Musalam Bin Umar Bassarewan	Assesor Nacional Edifício Publicas (UCVQ & UAP)	✓							✓	
3	Julmira Soares Sampaio, B. EC.	Eng. Edifício Dili - Konsultan ba Edifisio Publiko, Agua e Saneamento		✓				✓			
4	Egídio Gonçalves, S.T.	Eng. Edifício Dili - Konsultan ba Edifisio Publiko, Agua e Saneamento	✓					✓			
5	Aleixo da Costa Andrade, S.T.	Eng. Manututo - Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
6	Fabiano Fitalis Maria Madeira, S.T.	Eng. Manututo - Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
7	Bebiano Crecêncio De Jesus Lopes, S.T.	Eng. Viqueque - Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
8	Fidelis Mardiano da Costa, Lic. Eng.	Eng. Manufahi Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
9	Merinho Cuco Lopes de Araújo, S.T.	Eng. Aileu - Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
10	Joaquim de Carvalho Madeira, S.T.	Eng. Ainaro Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
11	Cláudio Soares Dos Santos, B. Eng.	Eng. Ainaro Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
12	Agostinho Aranda, S.T.	Eng. Baucau Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
13	Jerry Gil Maia Pereira, L. Eng.	Eng. Baucau Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
14	Zulkarnaen Depari, S.T.	Eng. Bobonaro - Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
15	Moises Angelico Marques Freitas, S.T.	Eng. Bobonaro - Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
16	Madelino Deonizio Jose Magno, Lic. Eng.	Eng. Covalima - Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
17	Prezencio Legorio Carmo Dias Ximenes, Lic. Eng.	Eng. Covalima - Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
18	Manuel Estrela Soares de Oliveira, S.T.	Eng. Dili - Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
19	Pedro de Lourdes Alves, S.T.	Eng. Dili - Edifisio no Be'e mos	✓					✓			
20	Jaimito Manuel Quintao, S.T.	Eng. Ermera - Edifisio no Be'e mos	✓					✓			

Nº	NARAN	POSISAUN	MANE	FETO	DE & DA	COORDENADOR	CHEFE DEP-SEC.	ENGENHEIROS ESPECIALIZADOS	ADM/FINANSA/AROV/LOGISTICA	ASSESSOR/A NACIONAL	ASSESSOR INTERNACIONAL
21	Juninho Antonio Abrantes da Cruz, B. Eng.	Eng. Liquisa - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
22	Antonia de Fatima Moraes Soares, S. Ds.	Eng. Liquisa - Edifisiu no Be'e mos		✓				✓			
23	Inocencio dos Reis Costa Maria, Lic. Eng.	Eng. Lautem - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
24	Quico Adelino Junior, S.T.	Eng. Lautem - Edifisiu no Be'e mos	✓					✓			
25	Rosalia de Fatima, Lic. Eng.	Eng. Dili - Edifisiu no Be'e mos		✓				✓			
V.4. Departamento Mecânica & Energia Eléctrica											
1	Deolindo de Fatima Marques, B.ETT	Eng Senior - Mecânica e Energia	✓				✓				
2	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares, S.T.	Eng. Mecânica e Eletrica	✓					✓			
3	Camilo de Jesus, B.ETT.	Eng. Mecânica e Eletrica	✓					✓			
4	Adonis Julio Fernandes, B.ETT.	Eng. Mecânica e Eletrica	✓					✓			
V.5. Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC											
1	Romualdo Duarte Guterres	Assesor Nacional TIC (UAP, UCVQ, e UGA)	✓							✓	
2	Ezequiel Ricardo de Oliveira, S.T.	Eng. Senior - Official ICT (UCVQ, UAP e UGA)	✓					✓			
V.6. Departamento Laboratório											
1	Jony Rodrigues Varela, S.T.	Eng. Senior Laboratorio	✓				✓				
2	Angelina Amaral, S.T.	Eng. Laboratório - Manufahi, Aileu e Manatuto		✓				✓			
3	Lizete Magno de Jesus, Lic. Eng.	Eng. Laboratório Baucau, Viqueque e Lautem		✓				✓			
4	Guido Carceres Tilman, Lic. Tec.	Eng. Laboratório - Maliana, Covalima e Ainaro	✓					✓			
5	Abel Soares da Silva, Lic. Eng.	Eng. Laboratório - Maliana, Covalima e Ainaro	✓					✓			
6	Alcino Francisco Paicheco, Lic. Eng.	Eng. Laboratório - Baucau, Viqueque e Lautem	✓					✓			
7	Barbara Carmelinda Gusmao, S.T.	Eng. Laboratório - Manufahi, Aileu e Manatuto		✓				✓			
8	Abel Fernando, S.T.	Eng. Laboratório - Dili, Liquisa e Ermera	✓					✓			
VI Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências - UEDC											
VI.1. Secretariado UEDC - ADN, I.P.											
1	Valentina Violet Correia Bianco, S.T.	Koordenadora - UEDC		✓		✓					
2	Maria José Rosário de Jesus, B. B.	Official Administração - UEDC		✓					✓		
VI.2 Departamento Pesquisa											
1	Jose Fernando Liu Soares, S.T.	Eng. Senior Pesquisa	✓				✓				
2	Joaquim da Silva Pinto, B. EC., Lic Eng.	Eng. Pesquisa	✓					✓			
3	Hindun Nofitri da Conceição Isya, B.S. MSE.	Eng. Pesquisa		✓				✓			
VI.3. Departamento Estandardização											
1	Demistocles Graciliano Ximenes Fernandes Cabral, S.T.	Eng. Senior - Estandardização	✓				✓				
2	Marcelino Amaral, B. EC.	Eng. Estandardização	✓					✓			
VI.4. Departamento Capacitação											
1	To be Name	Chefe Dept. Capacitação									
2	To be Name	Eng. Dept. Capacitação									

Tabela 2.3.1. Força de Trabalho Haktuir Funsau no Unidades

Tabela 2.3.1. Deskrisaun detalho ba perfil funcionarios ADN, I.P. quatro trimestal relasionamente ho Unidades ho Funsau ne'ebe ADN, I.P. atribui ba kada funcionario tuir ida-idak nia abilidade academica no esperensia sevisu.

	FUNGSIONARIO ADN, I.P.		TOTAL
	MANE	FETO	170
	123	47	

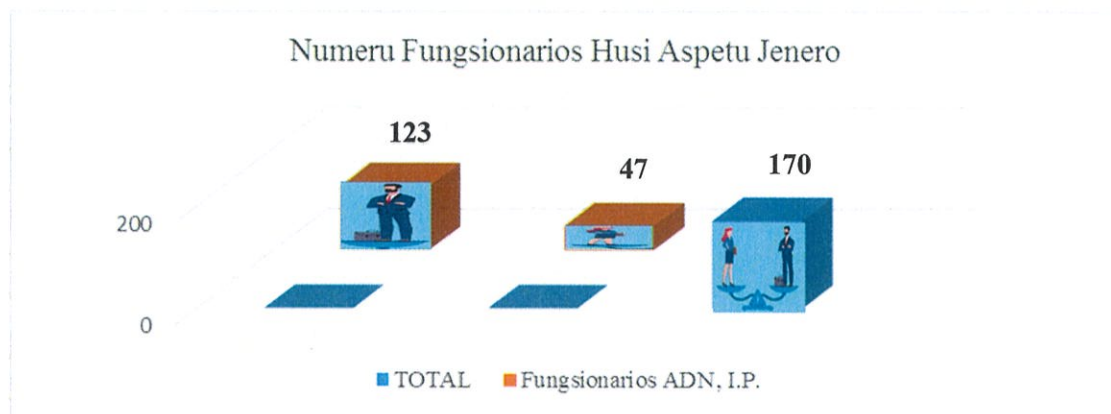


Tabela 2.3.2. Deskrisaun detalho perfil fungsionarios ADN, I.P. quatro trimestal relasionamente ho statutu jenero, ne'ebe iha tabela no grafiku indika katak, total fungsionarios hamutuk 170 pesoas (Mane 123 pesoas no Feto 47 pesoas), ne'ebe koloka ba Unidades/Departamento tuir ida-idak ninian kompetencias.

Nu	Funsoens	Total
1	Diretor Executivo & Direor Adjunto	2
2	Coordenador/a	4
3	Chefe Dep./Sec.	12
4	Engeneiro Especializado	86
5	Adm/Finansa/Aprovisionamento/Logistica	52
6	Assesor/a Nasional	12
7	Assesor Internacional	2
Grand Total		170

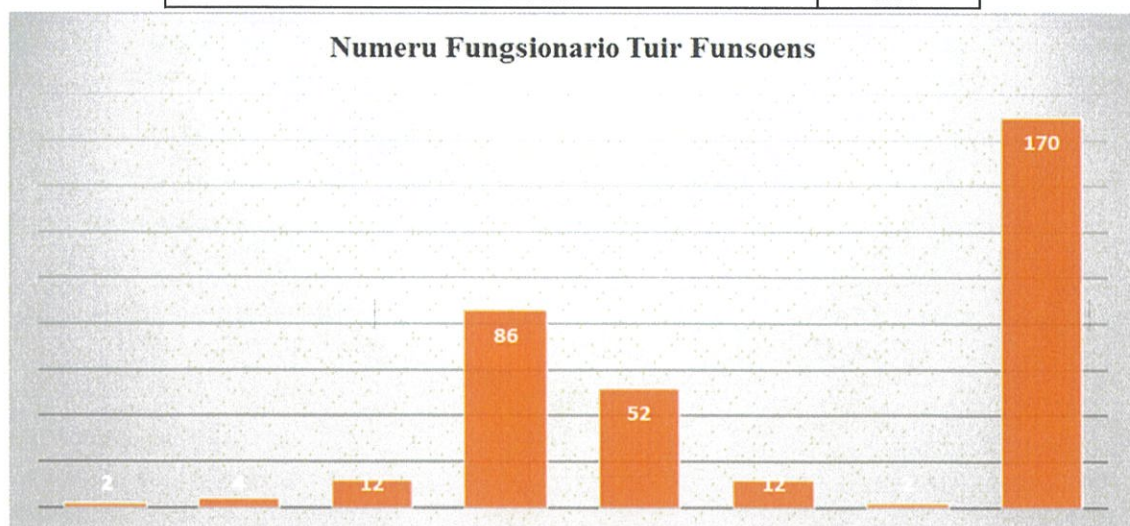


Tabela 2.3.3. Força de Trabalho Haktuir Funsau no Knar

Tabela 2.3.3. Deskrisaun detalho ba perfil funsionarios ADN, I.P. quatro trimestal relasionamente ho ninian funsoens, husi dadus iha leten indika katak separa funsoens servisu prinsipal fahe ba funsaun 7 (hitu) mak hanesan Diretor Exekutivu no Adjunto (ema nain 2), Koordinadores (ema nain 4), Chefe Dep/Sec (ema nain 12), Engiñeiro Especializado (ema nain 86), Adm/Finansa/Aprovisionamento/Lojistica (ema nain 52), Assesor Nasional (ema nain 12), no Assesor Internasional (ema nain 2).

Nu	Unidades	Total
1	DE+DA+GADE	19
2	UGA	46
3	UAP	19
4	UCVQ	79
5	UEDC	7
Grand Total		170

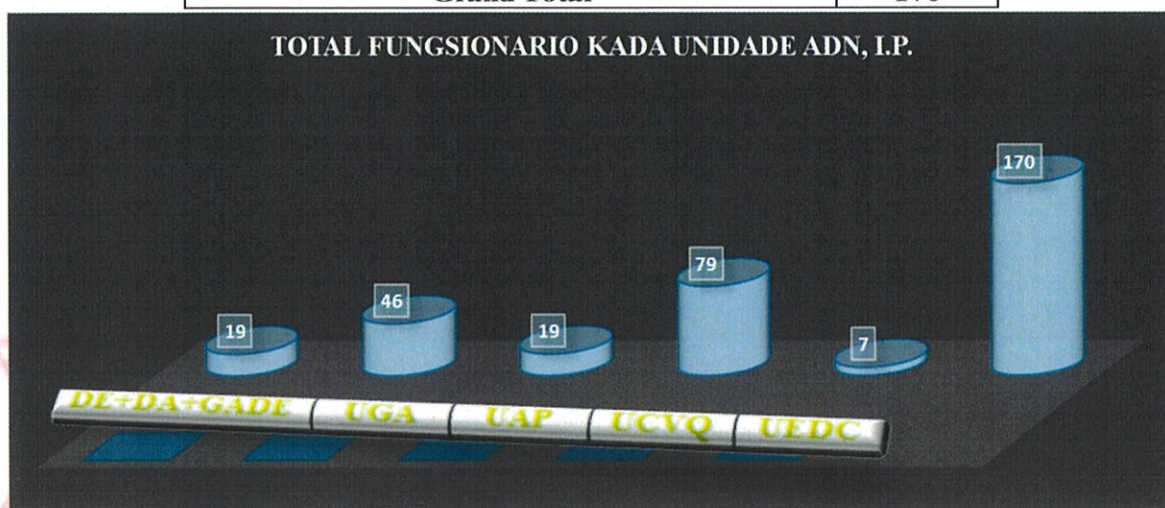


Tabela 2.3. 4. Força de Trabalho Haktuir Unidades

Tabela 2.3.4. Deskrisaun detalho ba perfil funsionarios ADN, I.P. quatro trimestal relasionamente ho aloka kada Unidades, husi dadus iha leten indika katak kada unidades servisu prinsipal fahe ba Unidade 4 (ha'at) mak hanesan, Diretor Exekutivu/Adjunto no GADE (ema nain 19), UGA (ema nain 46), UAP (ema nain 19), UCVQ (ema nain 79), no UEDC (ema nain 7).

2.4. Projetos 13 Municipios ho Fontes Financiamento

Projetos 13 Municipios ho Fontes Financiamento kompostu hosi Fundus das Infraestruturas (FI), Linha Ministerial-Capital Desenvolvimento (LM-CD), Programa Desenvolvimento Integrado Munisipal (PDIM), Linha Ministerial-Bens Servisu (LM-BS) Linha Ministerial Transferensia Publica (LM-TP), Fundo Covid-19 no Emergencia. Detalho exekusaun pagamento ho total projetus, husi Fulan Outubro-Dezembro deskreve iha tabela no grafiku 2.4.a-c iha kraik.

NO	MUNICIPIO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	67	\$ 60,709,750.02	\$ 36,568,863.86	60.24%
2	Ainaro	78	\$ 97,650,523.96	\$ 82,684,985.60	84.67%
3	Baucau	92	\$ 148,127,502.35	\$ 102,020,512.59	68.87%
4	Bobonaro	97	\$ 58,166,960.83	\$ 32,467,324.55	55.82%
5	Covalima	74	\$ 133,310,278.42	\$ 110,291,451.04	82.73%
6	Dili	255	\$ 126,259,257.47	\$ 60,829,858.23	48.18%
7	Ermera	61	\$ 27,553,970.61	\$ 16,683,253.84	60.55%
8	Lautem	64	\$ 43,821,802.01	\$ 29,667,024.54	67.70%
9	Liquica	79	\$ 29,141,742.49	\$ 12,559,449.00	43.10%
10	Manatuto	63	\$ 140,080,038.04	\$ 114,649,336.59	81.85%
11	Manufahi	76	\$ 30,036,734.73	\$ 17,234,483.05	57.38%
12	Nasional	35	\$ 157,917,042.64	\$ 109,210,233.59	69.16%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional	4	\$ 85,431,329.14	\$ 50,077,257.10	58.62%
15	Viqueque	71	\$ 70,630,341.81	\$ 33,678,726.05	47.68%
Grand Total		1120	\$ 1,211,190,596.17	\$ 810,475,327.48	66.92%

**Perfil Total Exekusaun Orsamento - Total Projetus - Persentagem
Ba Fontes Finansiamento Iha Fulan Outubro 2022**

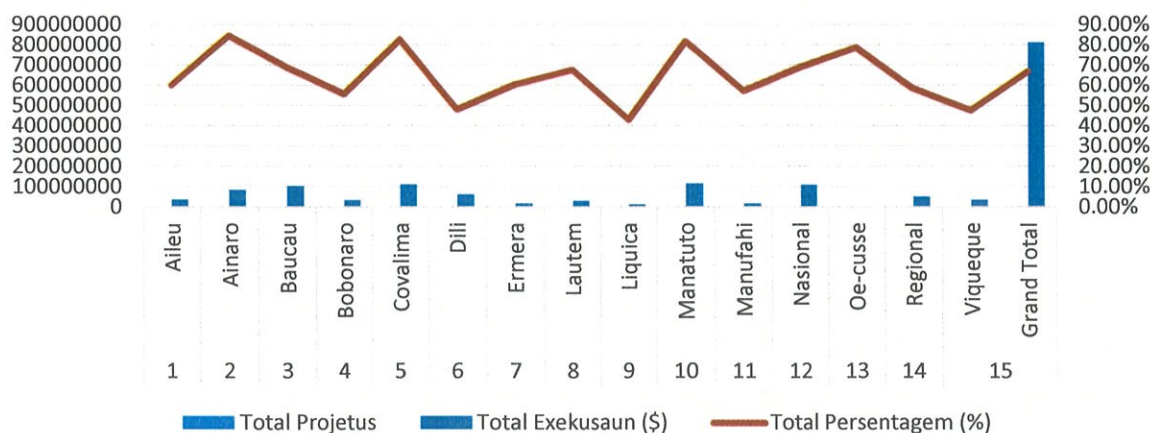


Tabela no Grafiku 2.4.a. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu - Fontes Finansiamento Outubro 2022

Fulan outubro quatro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.4.a. ho total projetus iha 13 munisipios nomos kategoria projetus Nasional/Regional hamutuk 1120 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 810,475,327.48 ekivalen 66.92 % husi total kontratus \$ 1,211,190,596.17 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha

Município Manatuto ho montante \$ 114,649,336.59 (63 projetos) no Persentase exekusaun bo'ot liu iha Município Ainaro ho persentase 84.67 % (78 projetos).

NO	MUNICIPIO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMANTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	67	\$ 60,709,750.02	\$ 36,763,044.80	60.56%
2	Ainaro	80	\$ 98,777,773.17	\$ 82,824,886.33	83.85%
3	Baucau	92	\$ 148,049,115.41	\$ 104,851,471.41	70.82%
4	Bobonaro	105	\$ 60,464,521.14	\$ 36,936,917.23	61.09%
5	Covalima	75	\$ 133,791,978.38	\$ 110,985,977.86	82.95%
6	Dili	258	\$ 127,354,640.87	\$ 63,840,928.02	50.13%
7	Ermera	61	\$ 27,553,970.61	\$ 17,163,784.74	62.29%
8	Lautem	64	\$ 43,821,802.01	\$ 30,756,752.00	70.19%
9	Liquica	77	\$ 29,834,259.61	\$ 14,675,623.21	49.19%
10	Manatuto	63	\$ 140,080,038.04	\$ 117,075,332.93	83.58%
11	Manufahi	77	\$ 30,086,425.19	\$ 17,417,451.88	57.89%
12	Nasional	38	\$ 158,323,210.88	\$ 109,322,345.26	69.05%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional	4	\$ 85,431,329.14	\$ 50,077,257.10	58.62%
15	Viqueque	71	\$ 70,968,799.31	\$ 34,857,695.72	49.12%
Grand Total		1136	\$ 1,217,600,935.43	\$ 829,402,036.34	68.12%

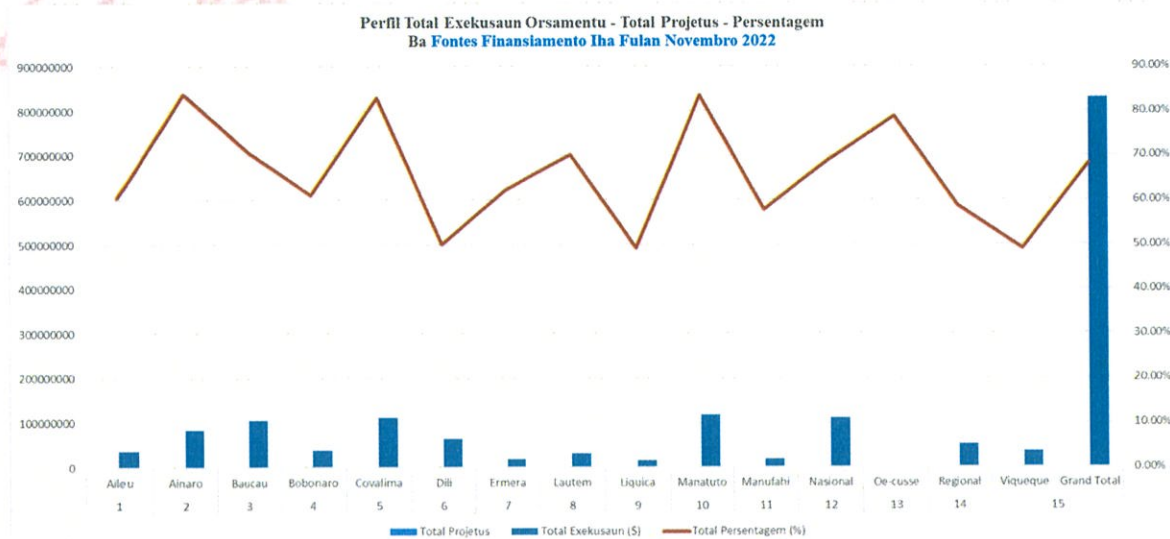


Tabela no Grafiku 2.4.b. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu - Fontes Financiamento Novembro 2022

Fulan novembro quatro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.4.b. ho total projetos iha 13 munisipios nomos kategoria projetos Nasional/Regional hamutuk 1136 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 829,402,036.34 ekivalen 68.12 % husi total kontratus \$ 1,217,600,935.43 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha

Município Manatuto ho montante \$ 117,075,332.93 (63 projetos) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha Município Ainaro ho persentagen 83.85 % (80 projetos).

NO	MUNICIPIO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	67	\$ 60,769,608.70	\$ 41,600,939.38	68.46%
2	Ainaro	81	\$ 98,858,050.42	\$ 83,959,633.00	84.93%
3	Baucau	92	\$ 148,403,306.60	\$ 112,138,994.29	75.56%
4	Bobonaro	113	\$ 61,032,344.38	\$ 38,545,404.40	63.16%
5	Covalima	76	\$ 133,821,946.88	\$ 112,782,750.54	84.28%
6	Dili	275	\$ 134,793,357.55	\$ 70,547,599.97	52.34%
7	Ermera	61	\$ 27,553,970.61	\$ 18,273,153.52	66.32%
8	Lautem	64	\$ 43,821,802.01	\$ 31,569,938.62	72.04%
9	Liquica	79	\$ 30,257,162.33	\$ 17,291,736.42	57.15%
10	Manatuto	63	\$ 140,107,038.04	\$ 118,286,107.71	84.43%
11	Manufahi	77	\$ 30,107,486.30	\$ 18,692,773.79	62.09%
12	Nasional	40	\$ 159,234,833.93	\$ 110,170,987.83	69.19%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional	4	\$ 85,431,329.14	\$ 51,084,636.97	59.80%
15	Viqueque	72	\$ 71,183,995.60	\$ 37,410,553.57	52.55%
Grand Total		1168	\$ 1,227,729,554.14	\$ 864,207,777.86	70.39%

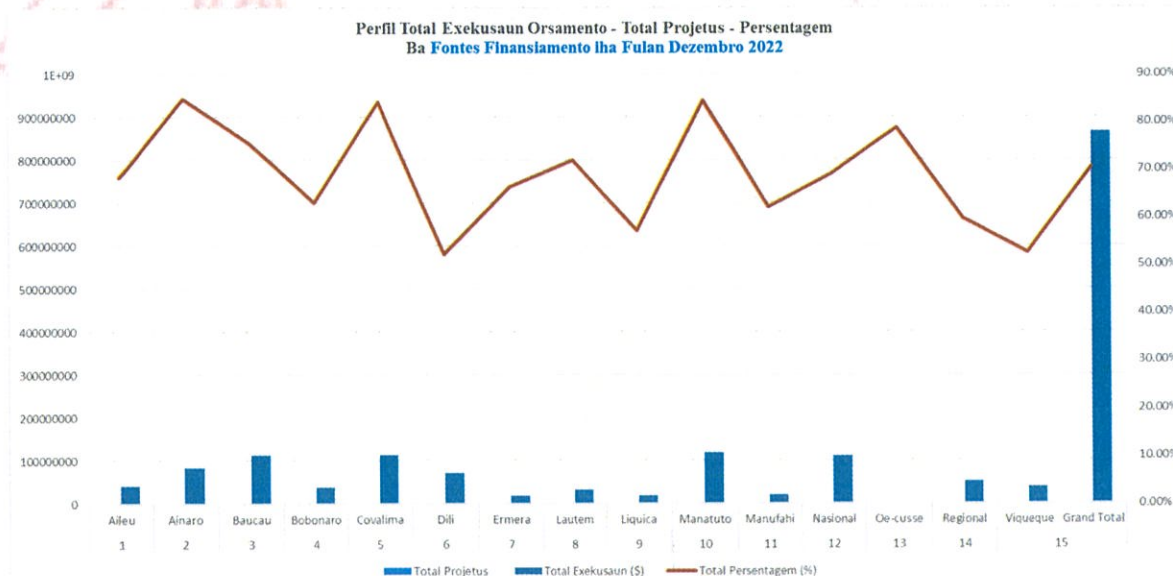


Tabela no grafiku 2.4.c. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu - Fontes Financiamento Dezembro 2022

Fulan dezembro quatro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.4.c. ho total projetos iha 13 munisipios nomos kategoria projetos Nasional/Regional hamutuk 1168 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 864,207,777.86 ekivalen 70.39 % husi total kontratus \$ 1,227,729,554.14 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha

Município Manatuto ho montante \$ 118,286,107,71 (63 projetos) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha Município Ainaro ho persentagen 84.93 % (81 projetos).

2.5. Projetos 13 Município por Setores

Projetos iha 13 Municípios ba kada setores projetos hamutuk 23 setores, ho detalho exekusaun pagamento kada setores no total projetos, husi Fulan Outubro-Dezembro eskreve iha tabela no grafiku 2.5.a-c iha kraik.

NO	SECTOR PROJECTO	Total 13 Municípios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	12	\$ 7,958,624.42	\$ 5,155,822.66	64.78%
3	AGUA E SANEAMENTO	44	\$ 13,388,528.38	\$ 7,672,083.87	57.30%
4	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	\$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL	5	\$ 212,050.00		0.00%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	7	\$ 27,885,164.93	\$ 18,110,299.93	64.95%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	156	\$ 51,827,855.44	\$ 21,481,091.10	41.45%
8	EDUKASAUN	210	\$ 29,381,461.46	\$ 6,679,280.01	22.73%
9	ELÉCTRICIDADE	93	\$ 147,437,716.54	\$ 98,454,971.53	66.78%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO	4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,084,250.86	89.31%
11	ESTRADAS E PONTES	329	\$ 366,046,973.16	\$ 223,626,763.70	61.09%
12	FLOOD CONTROL	29	\$ 6,941,651.37	\$ 3,198,724.77	46.08%
13	IMPRESTIMO	19	\$ 416,876,124.24	\$ 319,506,158.07	76.64%
14	IRIGASAUN	1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
15	JUVENTUDE NO DESPORTU	10	\$ 5,388,229.15	\$ 3,566,368.17	66.19%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	93	\$ 19,632,664.74	\$ 12,285,938.09	62.58%
17	PORTOS	3	\$ 2,241,460.87	\$ 1,160,585.24	51.78%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	10	\$ 3,518,731.35	\$ 2,179,383.45	61.94%
19	SAUDE	62	\$ 11,047,912.95	\$ 7,325,725.85	66.31%
20	SEGURANCA NO DEFESA	7	\$ 13,953,963.08	\$ 1,877,909.57	13.46%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	2	\$ 5,291,216.00	\$ 3,915,113.84	73.99%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	7	\$ 1,645,809.66	\$ 1,331,973.64	80.93%
23	TURISMO	13	\$ 2,224,058.06	\$ 853,112.54	38.36%
Grand Total		1120	\$ 1,211,190,696.17	\$ 810,476,327.48	66.92%

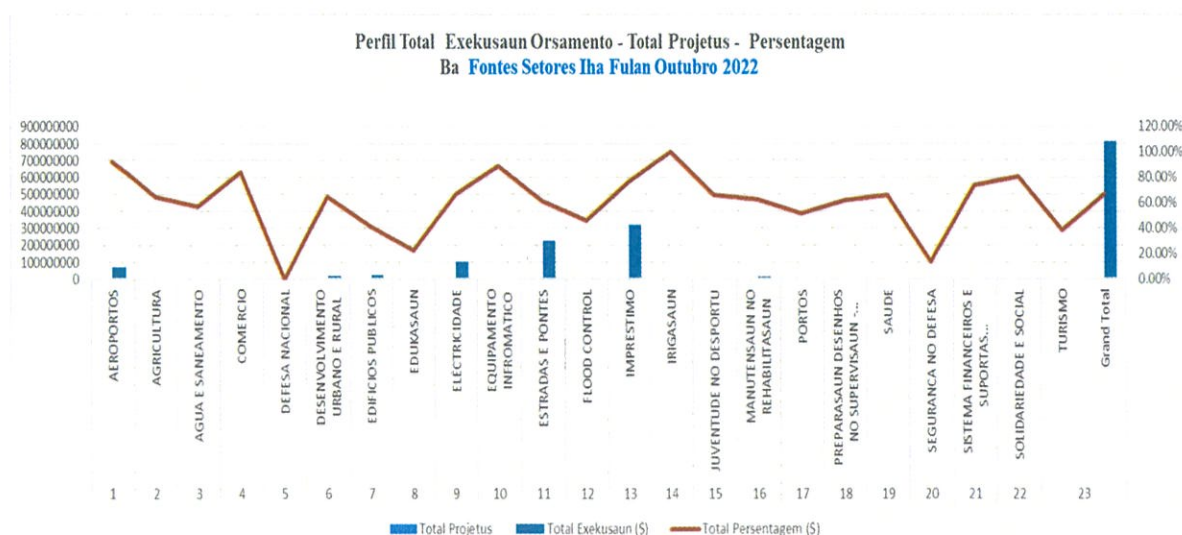


Tabela no Grafiku 2.5. a Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Setores Outubro 2022

Fulan outubro quatro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.5.a. ho total 23 setores iha 13 munisipios hamutuk 1120 ho emite certificado pagamentu montante \$ 810,475,327.48 ekivalen 66.92 % husi total kontratus \$ 1,211,190,596.17 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Sector Imprestimu ho montante \$ 319,506,158.07 (19 projetus) no Percentage exekusaun bo'ot liu iha sector Irigasaun ho persentagen 100 % (1 projetus).

NO	SECTOR PROJECTO	Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	14	\$ 8,053,691.31	\$ 5,172,847.65	64.23%
3	AGUA E SANEAMENTO	44	\$ 13,388,528.38	\$ 7,672,083.87	57.30%
4	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	\$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL	6	\$ 291,250.00	\$ 50,806.00	17.44%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	8	\$ 28,892,964.93	\$ 18,382,405.93	63.62%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	156	\$ 52,406,869.08	\$ 22,362,041.32	42.67%
8	EDUKASAUN	213	\$ 30,610,619.25	\$ 8,650,585.68	28.26%
9	ELÉCTRICIDADE	93	\$ 147,437,716.54	\$ 98,875,547.63	67.06%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO	5	\$ 4,610,055.72	\$ 4,115,624.36	89.27%
11	ESTRADAS E PONTES	335	\$ 376,227,472.85	\$ 237,932,556.58	63.24%
12	FLOOD CONTROL	28	\$ 7,495,651.49	\$ 4,312,207.18	57.53%
13	IMPRESTIMO	18	\$ 409,183,023.24	\$ 318,712,497.09	77.89%
14	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA	1	\$ 173,608.24	\$ 49,478.35	28.50%
15	IRIGASAUN	1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
16	JUVENTUDE NO DESPORTU	10	\$ 5,388,229.15	\$ 3,566,368.17	66.19%
17	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	90	\$ 18,969,666.77	\$ 12,365,912.55	65.19%
18	PORTOS	3	\$ 2,241,460.87	\$ 1,160,585.24	51.78%
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS	10	\$ 3,518,731.35	\$ 2,179,383.45	61.94%
20	SAUDE	66	\$ 11,251,498.28	\$ 7,632,143.42	67.83%
21	SEGURANCA NASIONAL	3	\$ 685,704.41	\$ 50,129.80	7.31%
22	SEGURANCA NO DEFESA	6	\$ 13,895,855.20	\$ 1,830,286.26	13.17%
23	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	2	\$ 5,291,216.00	\$ 3,915,113.84	73.99%
24	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	7	\$ 1,645,809.66	\$ 1,331,973.64	80.93%
25	TURISMO	13	\$ 2,224,058.06	\$ 1,071,687.74	48.19%
Grand Total		1136	\$ 1,217,600,935.43	\$ 829,402,036.34	68.12%

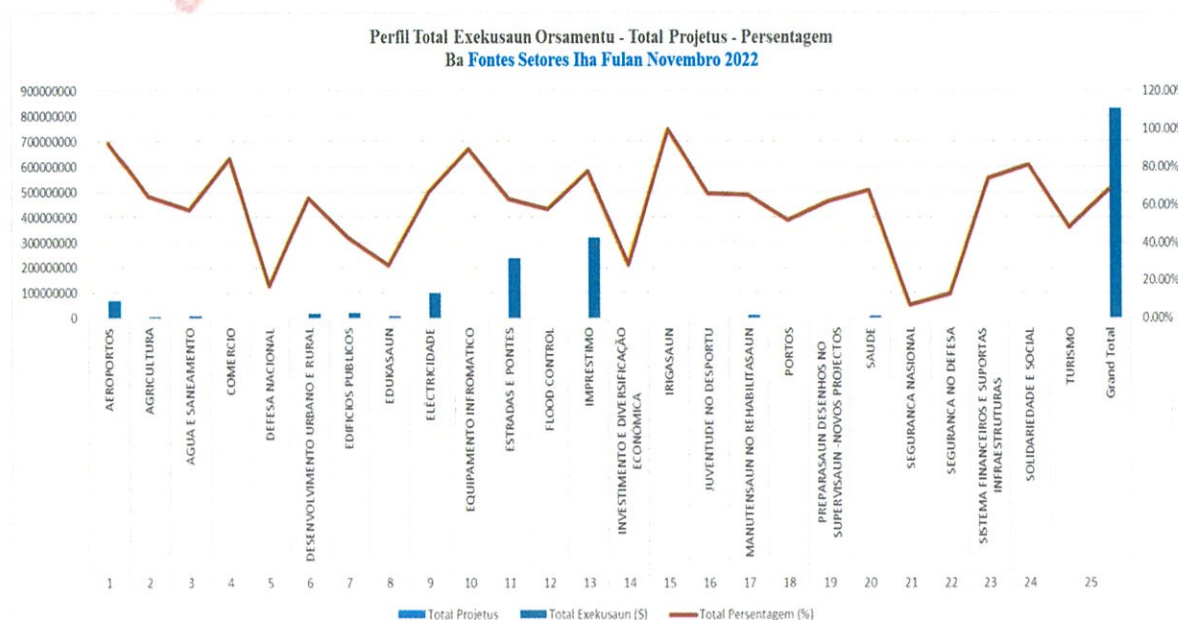


Tabela no grafiku 2.5. b. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Setores Novembro 2022

Fulan novembro quatro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.5.b. ho total 25 setores iha 13 munisipios hamutuk 1136 ho emite certificado pagamentu montante \$ 829,402,036.34 ekivalen 68.12 % husi total kontratus \$ 1,217,600,935.43 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Sector Imprestimu ho montante \$ 318,712,497.09 (18 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha sector Irigasaun ho persentagen 100 % (1 projetus)

NO	SECTOR PROJECTO	Total 13 Municípios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	14	\$ 8,053,691.31	\$ 5,176,802.56	64.28%
3	AGUA E SANEAMENTO	45	\$ 13,406,107.38	\$ 7,704,864.73	57.47%
4	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	\$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL	7	\$ 363,500.00	\$ 108,300.00	29.79%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	9	\$ 29,210,160.71	\$ 18,759,093.86	64.22%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	170	\$ 56,221,219.36	\$ 26,971,930.47	47.97%
8	EDUKASAUN	214	\$ 30,966,248.71	\$ 11,324,436.71	36.57%
9	ELÉCTRICIDADE	93	\$ 147,437,716.54	\$ 100,092,727.52	67.89%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO	5	\$ 4,610,055.72	\$ 4,115,624.36	89.27%
11	ESTRADAS E PONTES	339	\$ 378,722,492.64	\$ 248,835,946.31	65.70%
12	FLOOD CONTROL	31	\$ 8,837,057.12	\$ 6,109,071.36	69.13%
13	IGUALDADE DE GENERO E INCLUSAO SOCIAL	1	\$ 1,385,389.88	\$ 51,712.75	3.73%
14	IMPRESTIMO	18	\$ 409,183,023.24	\$ 329,812,626.79	80.60%
15	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA	1	\$ 173,608.24	\$ 49,478.35	28.50%
16	IRIGASAUN	1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
17	JUVENTUDE NO DESPORTU	10	\$ 5,388,229.15	\$ 3,598,334.78	66.78%
18	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	91	\$ 18,995,220.43	\$ 12,737,809.80	67.06%
19	PORTOS	3	\$ 2,241,460.87	\$ 1,160,585.24	51.78%
20	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	10	\$ 3,518,731.35	\$ 2,179,383.45	61.94%
21	SAUDE	69	\$ 11,428,136.35	\$ 8,918,655.02	78.04%
22	SEGURANCA NASIONAL	3	\$ 685,704.41	\$ 50,129.80	7.31%
23	SEGURANCA NO DEFESA	6	\$ 13,895,855.20	\$ 1,962,319.18	14.12%
24	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	3	\$ 5,321,184.50	\$ 4,016,485.17	75.48%
25	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	7	\$ 1,645,809.66	\$ 1,354,597.82	82.31%
26	TURISMO	14	\$ 2,321,696.72	\$ 1,107,091.24	47.68%
Grand Total		1168	\$ 1,227,729,554.14	\$ 864,207,777.88	70.39%

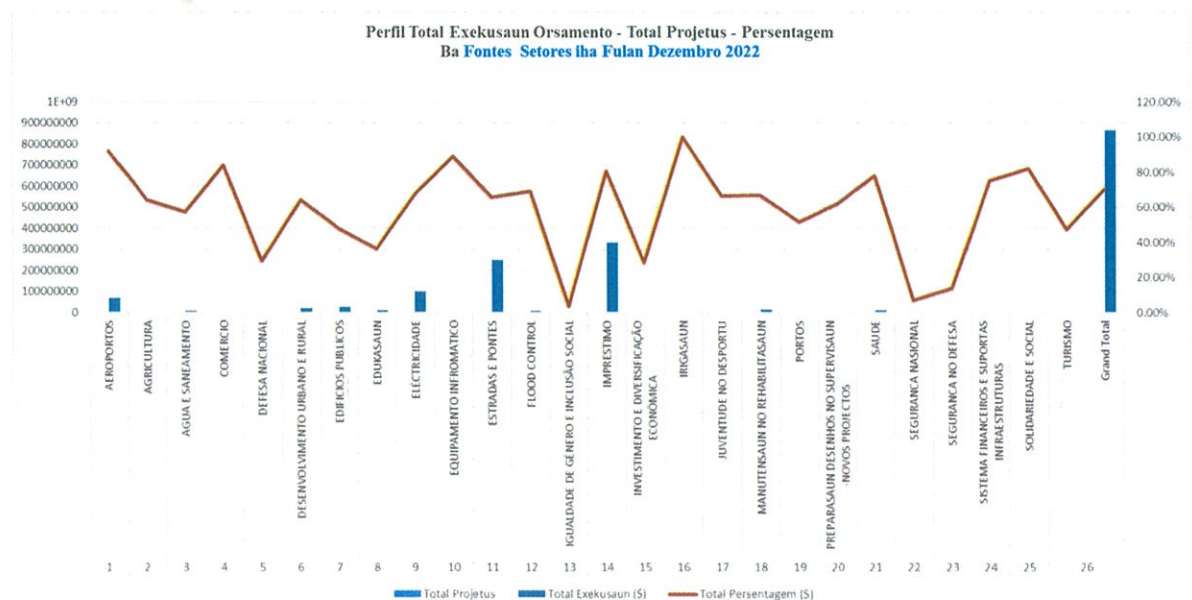


Tabela no Grafiku 2.5. c. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Setores Dezembro 2022

Fulan dezembro quatro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.5.c. ho total 26 setores iha 13 munisipios hamutuk 1168 ho emite certificado pagamentu montante \$ 864,207,777.86 ekivalen 70.39 % husi total kontratus \$ 1,227,729,554.14 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Sector Imprestimu ho montante \$ 329,812,626.79 (19 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha sector Irigasaun ho persentagen 100 % (1 projetus).

2.6. Projetos 13 Municipio por Ministerio

Projetos iha 13 Municipios, implementador ou dono projetus hamutuk 38 Ministerio, ho detalho exekusaun pagamento kada Ministerio no total projetus, husi Fulan Outubro-Dezembro eskreve iha tabela no grafiku 2.6.a-c iha kraik.

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NASIONAL, INSTITUTO PUBLICO	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	100.00%
2	CAC	1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
3	Centro Nacional Chega	3	\$ 190,090.64	\$ 119,464.90	62.85%
4	CFP	1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
5	CONSELHO DA EMPRESA	1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	\$ 292,653.74	\$ -	0.00%
7	ESTATAL	44	\$ 4,917,942.57	\$ 2,513,580.22	51.11%
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	12	\$ 14,487,230.67	\$ 7,871,882.61	54.34%
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	3	\$ 182,074.26	\$ 150,824.94	82.84%
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	1	\$ 512,279.04	\$ -	0.00%
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	16	\$ 8,318,015.67	\$ 5,437,511.86	65.37%
13	MINISTERIO DA DEFESA	15	\$ 4,992,554.70	\$ 2,966,287.14	59.41%
14	MINISTERIO DA JUSTICA	8	\$ 899,319.17	\$ 444,673.29	49.45%
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	588	\$ 972,459,905.47	\$ 667,313,415.24	68.62%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA	1	\$ 3,961,658.78	\$ -	0.00%
18	MINISTERIO DO INTERIOR	7	\$ 11,693,682.23	\$ 585,669.80	5.01%
19	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	236	\$ 28,756,651.86	\$ 7,253,480.13	25.22%
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	2	\$ 482,583.06	\$ 263,331.74	54.57%
21	MINISTERIO FINANÇAS	7	\$ 30,489,373.70	\$ 22,120,217.65	72.55%
22	Ministerio Coordenador Asuntu Ekonómikus	1	\$ 119,578.85	\$ 92,618.05	77.45%
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	12	\$ 3,991,501.52	\$ 1,164,636.32	29.18%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	20	\$ 6,172,782.65	\$ 1,961,939.85	31.78%
25	MINISTERIO SAUDE	75	\$ 13,280,279.57	\$ 8,528,979.89	64.22%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	6	\$ 2,694,349.02	\$ 895,135.76	33.22%
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	9	\$ 74,921,262.05	\$ 68,491,359.28	91.42%
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	13	\$ 2,092,560.55	\$ 742,848.95	35.50%
29	PARLAMENTU NASIONAL	2	\$ 69,221.96	\$ 27,033.43	39.05%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	2	\$ 1,266,687.38	\$ 1,015,299.68	80.15%
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE	1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
32	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ 29,956.90	42.92%
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	8	\$ 5,321,672.26	\$ 3,514,595.85	66.04%
35	SEFOPE	5	\$ 1,156,831.47	\$ 753,757.16	65.16%
36	TRADE INVEST	1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
37	TRIBUNAL RECUSSO	4	\$ 12,092,434.96	\$ 3,742,742.83	30.95%
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	7	\$ 4,122,424.25	\$ 2,026,832.22	49.17%
Grand Total		1120	\$ 1,211,190,598.17	\$ 810,475,327.48	66.92%

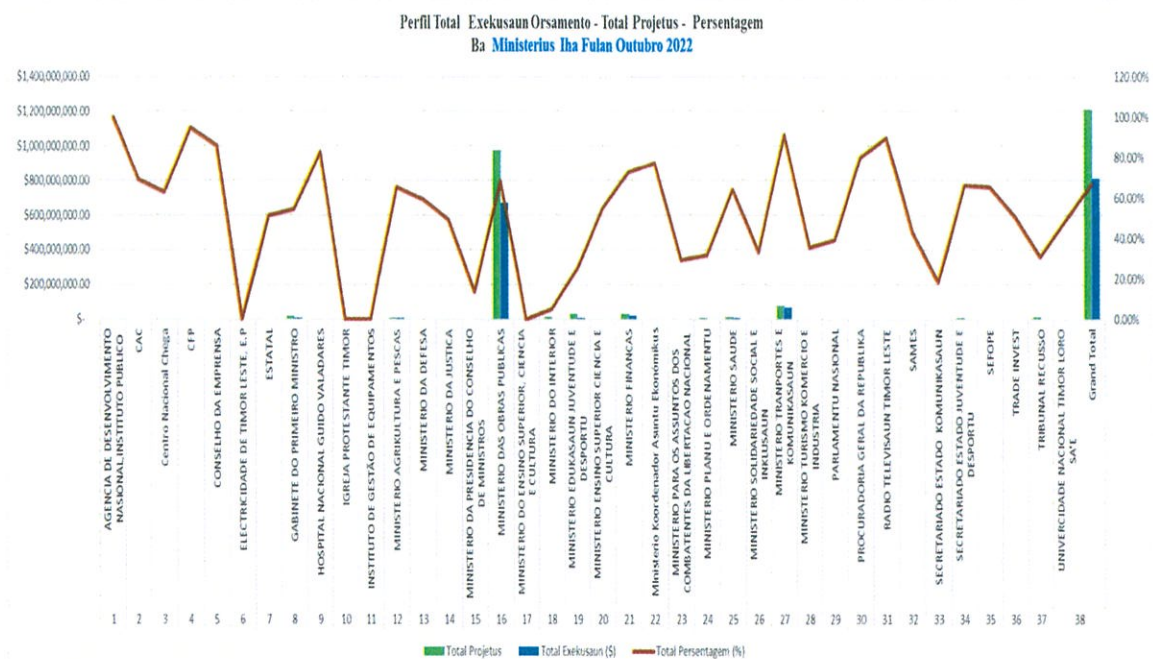


Tabela no Grafiku 2.6.a Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Ministerio Outubro 2022

Fulan outubro quatro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.6.a. ho total 38 Ministerio iha 13 munisipios hamutuk 1120 ho emite certificado pagamentu montante \$ 810,475,327.48 ekivalen 66.92 % husi total kontratus \$ 1,211,190,596.17 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Ministerio das Obras Publicas ho montante \$ 667,313.415.24 (588 projetus) no Percentagen exekusaun bo'ot liu iha ADN,I.P. ho percentagen 100 % (1 projetus).

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	100.00%
2	Centro Nacional Chega	1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
3	CFP	3	\$ 190,090.64	\$ 119,464.90	62.85%
4	CONSELHO DA EMPRENSA	1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
6	ESTATAL	1	\$ 292,653.74	\$ -	0.00%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	43	\$ 4,917,942.57	\$ 2,557,874.41	52.01%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	12	\$ 14,487,230.67	\$ 7,871,882.61	54.34%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	3	\$ 182,074.26	\$ 150,824.94	82.84%
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
11	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	1	\$ 512,279.04	\$ -	0.00%
12	MINISTERIO DA DEFESA	19	\$ 8,566,442.56	\$ 5,483,675.25	64.01%
13	MINISTERIO DA JUSTICA	16	\$ 5,071,754.70	\$ 3,017,093.14	59.49%
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	8	\$ 899,319.17	\$ 516,704.14	57.46%
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA	592	\$ 975,048,941.35	\$ 682,535,987.40	70.00%
17	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 3,961,658.78	\$ -	0.00%
18	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	9	\$ 12,321,278.76	\$ 596,827.15	4.84%
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	239	\$ 30,324,267.15	\$ 9,558,898.47	31.52%
20	MINISTERIO FINANÇAS	2	\$ 482,583.06	\$ 263,331.74	54.57%
21	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonómikus	5	\$ 6,638,605.10	\$ 4,731,031.13	71.27%
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 119,578.85	\$ 110,325.82	92.26%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	12	\$ 3,991,501.52	\$ 1,465,014.12	36.70%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS	23	\$ 31,068,261.25	\$ 19,654,605.87	63.26%
25	MINISTERIO SAUDE	77	\$ 13,360,426.00	\$ 8,884,455.95	66.50%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	6	\$ 2,694,349.02	\$ 895,135.76	33.22%
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	9	\$ 74,921,262.05	\$ 68,491,359.28	91.42%
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	14	\$ 2,266,168.79	\$ 792,327.30	34.96%
29	PARLAMENTU NASIONAL	2	\$ 69,221.96	\$ 27,033.43	39.05%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	2	\$ 1,266,687.38	\$ 1,015,299.68	80.15%
31	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE	1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
32	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ 29,956.90	42.92%
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	8	\$ 5,321,672.26	\$ 3,514,595.85	66.04%
35	SEFOPE	5	\$ 1,156,831.47	\$ 753,757.16	65.16%
36	TRADE INVEST	1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
37	TRIBUNAL RECUSSO	4	\$ 12,092,434.96	\$ 3,890,689.93	32.17%
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	7	\$ 4,122,424.25	\$ 2,026,832.22	49.17%
Grand Total		1136	\$ 1,217,600,935.43	\$ 829,402,036.34	68.12%

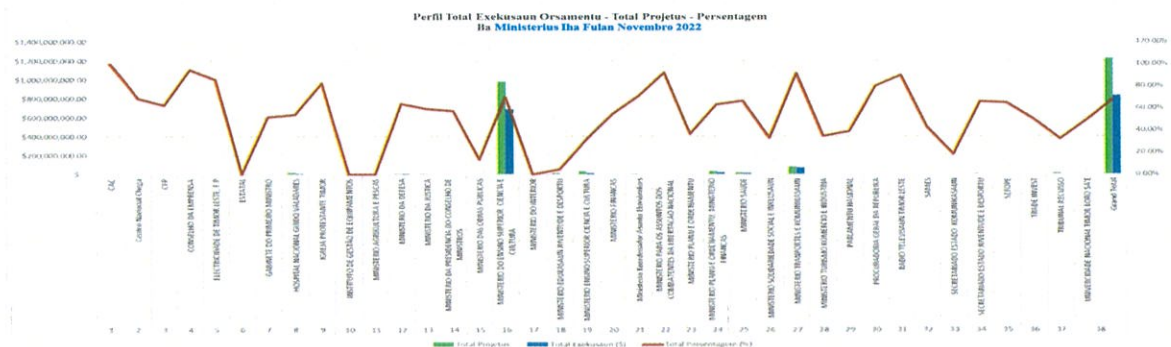


Tabela no Grafiku 2.6.b. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Ministerio Novembro 2022

Fulan novembro quatro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.6.b. ho total 38 Ministerio iha 13 munisipios hamutuk 1136 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 829,402,036.34 ekivalen 68.12 % husi total kontratus \$ 1,217,600,935.43 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Ministerio Insinu Superior Siensia e

Cultura ho montante \$ 682,535,987.40 (592 projetos) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha CAC ho persentagen 100 % (1 projetos).

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NASIONAL, INSTITUTO PUBLICO	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	100.00%
2	CAC	1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
3	Centro Nacional Chega	3	\$ 190,090.64	\$ 144,229.27	75.87%
4	CFP	1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
5	CONSELHO DA EMPRESA	1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	\$ 292,653.74	\$ -	0.00%
7	ESTATAL	45	\$ 5,235,063.28	\$ 2,729,901.14	52.15%
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	13	\$ 16,480,693.27	\$ 8,345,210.57	50.64%
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	4	\$ 218,099.53	\$ 188,720.06	86.53%
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	1	\$ 512,279.04	\$ 165,783.88	32.36%
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	19	\$ 8,566,442.56	\$ 5,526,129.14	64.51%
13	MINISTERIO DA DEFESA	18	\$ 5,333,582.72	\$ 3,295,464.01	61.79%
14	MINISTERIO DA JUSTICA	8	\$ 899,319.17	\$ 617,825.33	68.70%
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	599	\$ 978,247,382.90	\$ 707,084,290.54	72.28%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA	1	\$ 3,961,658.78	\$ -	0.00%
18	MINISTERIO DO INTERIOR	9	\$ 12,321,278.76	\$ 715,322.37	5.81%
19	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	241	\$ 30,895,092.90	\$ 12,856,768.29	41.61%
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	3	\$ 729,392.36	\$ 321,666.49	44.10%
21	MINISTERIO FINANCAS	12	\$ 7,155,642.72	\$ 5,141,607.39	71.85%
22	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus	1	\$ 119,578.85	\$ 110,325.82	92.26%
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	15	\$ 5,920,864.26	\$ 2,742,832.89	46.32%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	24	\$ 31,121,963.57	\$ 20,011,889.85	64.30%
25	MINISTERIO SAUDE	78	\$ 13,450,090.55	\$ 10,589,228.63	78.73%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	6	\$ 2,694,349.02	\$ 1,215,833.82	45.13%
27	MINISTERIO TRANSPORTE E KOMUNIKASAUN	10	\$ 75,643,307.08	\$ 69,099,241.61	91.35%
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	15	\$ 2,346,446.04	\$ 792,214.18	33.76%
29	PARLAMENTU NASIONAL	2	\$ 69,221.96	\$ 27,033.43	39.05%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	2	\$ 1,266,687.38	\$ 1,097,520.98	86.64%
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE	1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
32	SAMES	3	\$ 181,808.94	\$ 116,706.00	64.19%
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	8	\$ 5,321,672.26	\$ 3,546,562.46	66.64%
35	SEFOPE	5	\$ 1,156,831.47	\$ 753,757.16	65.16%
36	TRADE INVEST	1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
37	TRIBUNAL RECUSSO	4	\$ 12,092,434.96	\$ 3,913,047.81	32.36%
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	7	\$ 4,122,424.25	\$ 2,611,612.95	63.35%
Grand Total		1168	\$ 1,227,729,654.14	\$ 864,207,777.86	70.39%

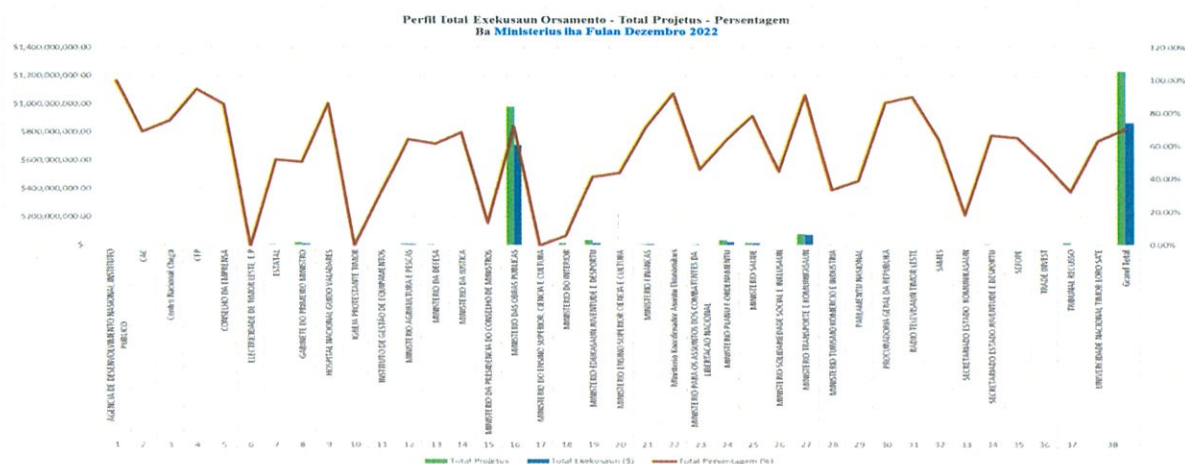


Tabela no Grafiku 2.6.c. Perfil Exekusaun Pagamentu Komulativu – Ministerio Dezembro 2022

Fulan dezembro quatro trimestral hanesan indika tabela no grafiku 2.6.c. ho total 38 Ministerio iha 13 munisipios hamutuk 1168 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 864,207,777.86 ekivalen 70.39 % husi total kontratus \$ 1,227,729.554.14 Observasaun hosi grafiku katak exekusaun pagamentu bo'ot liu iha Ministerio das Obras Publicas ho montante \$ 707,084,290.54 (599 projetus) no Persentagen exekusaun bo'ot liu iha ADN, I.P. ho persentagen 100 % (1 projetus)

2.7. Perfil Pagamentu Komulativu Quatro Trimestral (Outubro, Novembro no Dezembro) 2022

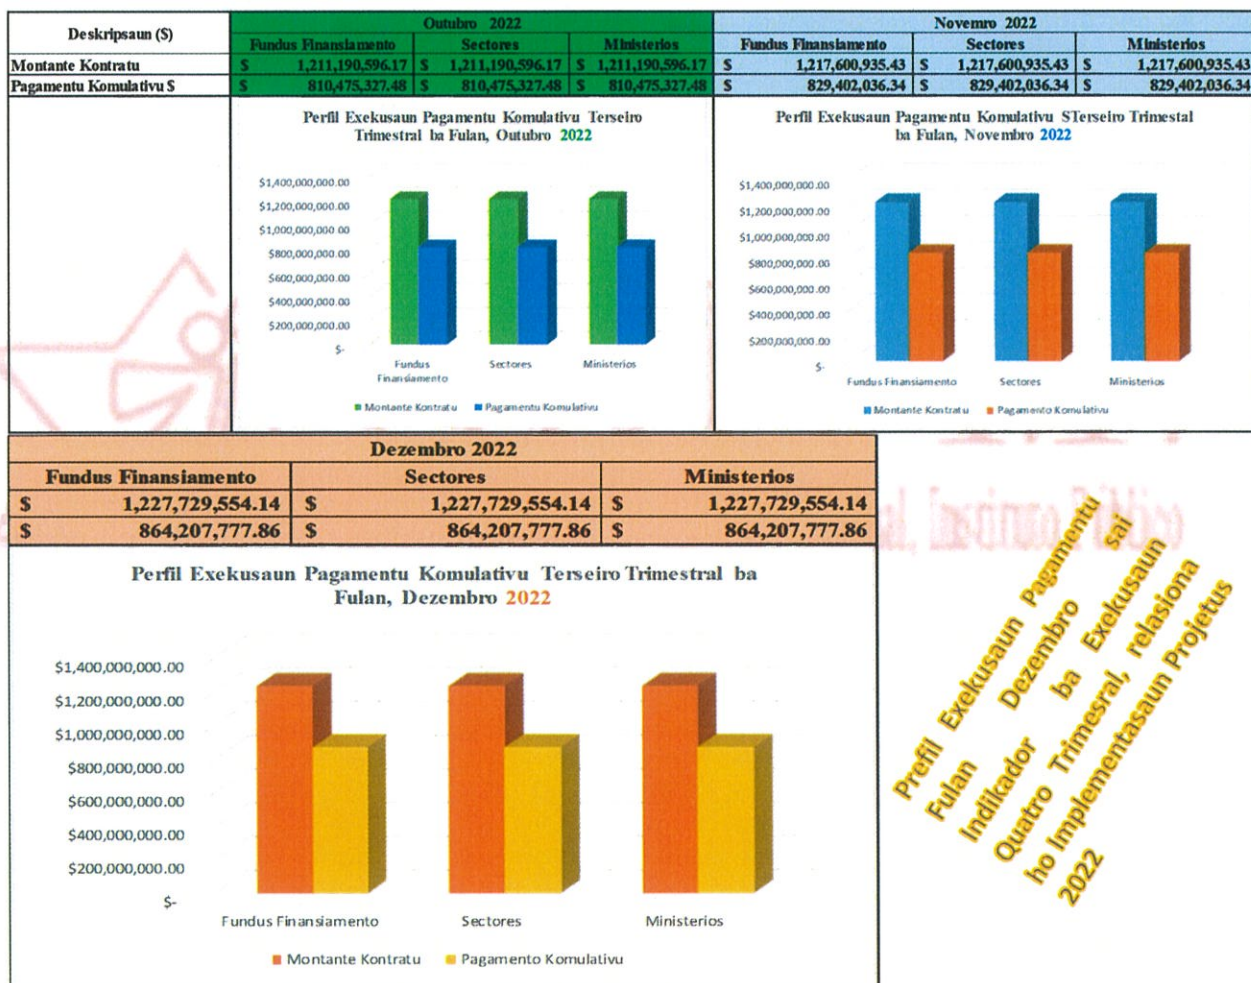


Tabela no Grafiku 2.7. Perfil Exekusaun Orsamentu Quatro Trimestral 2022

Tabela no grafiku 2.7. indika katak, ate fim Quatro Trimestral ba implementasaun projetus ano fiskal 2022 husi total projetus 1168 ne'be implementa iha teritorio RDTL tomak exekutado ho Pagamentu Komulativu \$ 864,207,777.86 (70.39 %) husi total kontratu \$ 1,227,729,554.14

III. OBSTAKLU

3.1. Obstaklu hosi parte Companhias

1. Kompañia/empreza sira infrenta problema iha rekursu finanseiru nune'e fo inpaktu ba serbisu konstrusaun nian hodi difikulta progress serbisu iha terenu.
2. Supervisor husi Ministerio relevantes la iha terreno, no kontrator sira dalaruma servisu la halo tuir spesifikasaun tekniku iha kontrato.
3. Kontrator laiha iha site/terenu ou kontaktu liu hosi telefonika maibe dala barak lai foti ou lakohi hit telefone.
4. Mudansa Schedule la tuir kontratu ho razaun pagamentu tarde, situasaun nebe'e ita hotu la espera ho covid-19 nebe'e invade Timor-Leste fulan hirak liu ba sai difikuldade mos ba kompania/empreza sira la halo serbisu tuir planu refere.
5. Projeito obra barak abandona ou parado iha tinan barak nia laran
6. Projeito Lao la tuir tempo ne'ebe termina iha kontratu
7. Companhia la kumpri rekomendasaun no sujestaun ba defeitus sira nebe parte ADN, I.P. rekomenda ba.

3.2. Obstaku hosi Parte ADN, I.P.

1. Kondisaun Kareta Nian nebe ladun diak (Sempre Manutensaun Hela Deit) hodi halo Projeitu balu nebe tama ona ba Faze Retensaun la konsege halao inspesaun abril - junho tamba Kondisaun estrada ba Projeitu refere Kondisaun Grave.
2. Ho Volume Servisu ne'ebe barak Planu Inspeksaun kada fulan dala Tolu (3) ba visita Projeitu sente todan ou la kobre hotu.
3. Engenheiros la suficiente atu monitoriza projeto ho quantidade barak tanba ho distansia nebe'e do'ok. Liu-liu iha parte Mecanica e Eletrica.
4. Fasilidade la suficiente apoiu servisu diariamente hanesan laptop hodi halo back up data no update ba folder system.
5. Motorista menus difikulta atividades servisu.
6. Iha parte Mecanica e Eletrica ekipa engineiro nunka hasoru tekniku husi kompania no parte kompania sempre delega tekniku ne'ebe ba hein iha terenu, maibe tekniku ne'e rasik laiha konesimentu klean ho orbra refere.
7. Kuantidade transporte ne'ebe la suficiente hodi halo monitorizasaun ba projeto iha terenu tuir plano ne'ebe iha.
8. Departamento Mecanica e Eletrica la bele kontrola masimu projeto electricidade ho instalasaun eletrica ba edifisio publica tanba engineiros ida kontrola municipio ha'at (4).
9. Ho kuantidade projeto ne'ebe barak no ho distansia ne'ebe do'ok Engenheiro la suficiente hodi kobre.
10. Velocidade Internet iha Municipio lao ladun diak hodi nune'e susar tebes atu asesu no submete documentos ruma via email liu- iu Drop box.
11. Engenheiro infrenta problema wainhira atu input data konsultan design ba Sistema drop box tamba folder nebe prepara ona responde liu ba servisu kontraktor nian.

12. Kapasidade folder system la to'o atu guarda/save dados inspeksaun tomak ne'ebe barak.
13. Kondisaun eskritorio no Residencia ADN, I.P. municipio la halo rehabilitasaun no manutensaun periodika.

IV. REKOMENDASAUN

4.1. Rekomendasaun ba Parte Companhia, ADN, I.P. no Ministerio Relevantes

1. Husu Superior ADN, I.P. atu bele hatu'o ba projetu nain konaba projetu hirak ne'ebe maka abandona no parado husi kompania/empreza ne'ebe iha responsabilidade ba projetu ne'e rasik atu bele foti medidas ruma hanesan Blacklist ou Penalidade ba kompania.
2. ADN, I.P. Municipio husu ba Dono Projectu refere, ba oin kompania/empreza ne'ebe maka laiha responsabilidade no abandona projetu/obra ne'ebe sira halo, husu Guverno labele fo tan oportunidade ba kompana hirak ne'e hodi konkore iha prosesu aprovisionamentu ba prozetu hira ne'ebe tuir mai.
3. Ba Superior ADN, I.P. atu kordena ho Ministerio relevantes sira hodi nune'e bele fo penalidade ba kompania sira ne'ebe servisu paradu sem informasaun.
4. Rekomenda ba Companhia atu orienta nia tekniku hodi standby iha tereno
5. Kondisaun Rezidencia Oficial ADN, I.P. Municipio balun ne'ebe presija atu hadia : Be'e, Moru no Tralis Janela etc.
6. Rekomenda ba Ministerio relevante hodi orienta nia Engenheiro sira hodi halo supervisaun maximo iha tereno
7. Rekomenda mos ba seksaun ITC atu aumenta facilidade Laptop ba iha Munisipiu tamba tekniku nain hat assesu dropbox iha laptop ida deit, hodi nune'e susar atu fahe servisu.
8. Rekomenda ba superior sira atu prepara printer nebe bele print kertas A3 no A4 hodi nune'e bele fasilita servisu iha Municipio.
9. Sujere ba Superior karik bele planu Inspeksaun kada fulan dala tolu (3) ba visita projetu sente todan ou la kobre
10. Husu atu aumenta tan rekursu humano (engenheiro mecanica e eletrica) iha Departamento Mecanica e Eletrica.
11. Husu ba ekipa base de dados atu kria folder iha Sistema drop box nebe bele relata informasaun kona ba servisu konsultan design nian

Aneksu A

Detalha Progresu fisiku Infrastruturas Quatro Trimestral 2022

Outubro

**Projeto 13 Municípios
Por Fundos
Financiamento**



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	FI				LM-CD			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	21	\$ 52,113,041.32	\$ 33,044,241.14	63.41%	19	\$ 4,490,679.95	\$ 1,651,720.52	36.78%
2	Ainaro	29	\$ 91,212,374.94	\$ 79,948,169.07	87.65%	17	\$ 3,008,653.96	\$ 1,087,340.34	36.14%
3	Baucau	31	\$ 137,824,554.34	\$ 97,893,866.51	71.03%	17	\$ 4,861,686.43	\$ 2,353,150.12	48.40%
4	Bobonaro	31	\$ 44,488,110.19	\$ 27,468,658.79	61.74%	26	\$ 8,235,986.73	\$ 2,561,979.86	31.11%
5	Covalima	32	\$ 125,305,153.33	\$ 106,413,846.29	84.92%	15	\$ 3,381,541.16	\$ 1,264,428.82	37.39%
6	Dili	64	\$ 79,850,016.94	\$ 39,507,913.48	49.48%	76	\$ 19,774,341.29	\$ 10,610,688.70	53.66%
7	Ermera	21	\$ 21,217,838.65	\$ 14,525,895.01	68.46%	10	\$ 2,536,341.41	\$ 473,836.10	18.68%
8	Lautem	14	\$ 32,905,711.12	\$ 25,869,420.44	78.62%	24	\$ 7,339,477.40	\$ 2,576,137.24	35.10%
9	Liquica	17	\$ 21,471,627.75	\$ 10,496,914.12	48.89%	29	\$ 3,894,202.52	\$ 631,816.71	16.22%
10	Manatuto	13	\$ 131,516,647.81	\$ 110,901,894.94	84.33%	18	\$ 4,268,931.05	\$ 1,625,535.46	38.08%
11	Manufahi	24	\$ 21,950,711.71	\$ 12,610,572.98	57.45%	19	\$ 3,101,275.15	\$ 1,783,649.53	57.51%
12	Nasional	24	\$ 107,991,525.79	\$ 78,258,854.56	72.47%	5	\$ 48,839,501.91	\$ 30,214,673.68	61.87%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%				
14	Regional	2	\$ 32,032,062.14	\$ 12,228,802.38	38.18%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
15	Viqueque	24	\$ 59,413,345.74	\$ 31,696,482.03	53.35%	21	\$ 8,475,258.01	\$ 1,470,469.94	17.35%
Grand Total		351	\$ 961,646,043.42	\$ 682,718,099.59	70.99%	297	\$ 175,233,477.97	\$ 95,892,316.14	54.72%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	PDIM				LM-BS			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	6	\$ 445,124.22	\$ -	0.00%	4	\$ 1,568,065.11	\$ 982,502.76	62.66%
2	Ainaro	8	\$ 931,596.86	\$ 664,237.60	71.30%	3	\$ 565,845.40	\$ 527,769.63	93.27%
3	Baucau	8	\$ 863,550.68	\$ 387,406.75	44.86%	6	\$ 1,107,575.09	\$ 579,592.05	52.33%
4	Bobonaro	8	\$ 746,047.73	\$ 545,507.88	73.12%	4	\$ 860,900.42	\$ 665,256.80	77.27%
5	Covalima	3	\$ 592,720.70	\$ 558,300.67	94.19%	3	\$ 575,995.90	\$ 255,350.34	44.33%
6	Dili	7	\$ 1,054,664.27	\$ 884,006.15	83.82%	57	\$ 5,286,216.93	\$ 3,387,282.79	64.08%
7	Ermera	5	\$ 845,470.49	\$ 764,831.78	90.46%	3	\$ 367,250.73	\$ 89,239.28	24.30%
8	Lautem	2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%	6	\$ 1,103,542.01	\$ 541,687.21	49.09%
9	Liquica	6	\$ 722,133.98	\$ 278,035.53	38.50%	10	\$ 1,496,884.51	\$ 896,257.86	59.87%
10	Manatuto	12	\$ 1,596,152.81	\$ 1,163,062.73	72.87%	6	\$ 1,160,391.31	\$ 446,513.42	38.48%
11	Manufahi	10	\$ 1,450,922.99	\$ 1,120,584.52	77.23%	5	\$ 1,464,659.68	\$ 1,024,526.15	69.95%
12	Nasional					6	\$ 1,086,014.94	\$ 736,705.35	67.84%
13	Oe-cusse								
14	Regional					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
15	Viqueque	2	\$ 355,840.92	\$ 292,976.54	82.33%	3	\$ 300,989.41	\$ 77,967.95	25.90%
Grand Total		77	\$ 10,001,564.50	\$ 6,658,950.15	66.58%	117	\$ 17,317,997.44	\$ 10,472,217.19	60.47%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	LM-TP				Fundo Covid-19			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	\$ 1,617,454.43	\$ 583,973.62	36.10%	3	\$ 475,384.99	\$ 306,425.82	64.46%
2	Ainaro	17	\$ 1,685,991.99	\$ 307,740.51	18.47%	3	\$ 242,067.62	\$ 149,728.45	61.85%
3	Baucau	29	\$ 3,000,775.19	\$ 477,308.32	15.91%	1	\$ 469,360.62	\$ 329,188.84	70.14%
4	Bobonaro	23	\$ 3,106,600.00	\$ 596,044.54	19.19%	5	\$ 729,315.76	\$ 629,876.68	86.37%
5	Covalima	17	\$ 2,921,378.69	\$ 1,332,496.43	45.61%	4	\$ 533,488.64	\$ 467,028.49	87.54%
6	Dili	24	\$ 11,248,554.33	\$ 4,364,673.97	38.80%	7	\$ 2,018,602.40	\$ 1,151,316.99	57.04%
7	Ermera	20	\$ 2,252,742.01	\$ 544,734.18	24.18%	2	\$ 334,327.32	\$ 284,717.49	85.16%
8	Lautem	16	\$ 1,702,312.60	\$ 418,766.82	24.60%	2	\$ 373,420.03	\$ 261,012.83	69.90%
9	Liquica	13	\$ 1,123,528.85	\$ -	0.00%	4	\$ 433,364.88	\$ 256,424.78	59.17%
10	Manatuto	10	\$ 872,256.79	\$ 147,777.15	16.94%	4	\$ 665,658.27	\$ 364,552.89	54.77%
11	Manufahi	15	\$ 1,685,752.39	\$ 339,311.38	20.13%	3	\$ 383,412.81	\$ 355,838.49	92.81%
12	Nasional								
13	Oe-cusse								
14	Regional								
15	Viqueque	20	\$ 2,040,688.01	\$ 140,829.59	6.90%				
	Grand Total	218	\$ 33,238,035.28	\$ 9,253,656.51	27.84%	38	\$ 6,658,403.34	\$ 4,556,111.75	68.43%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	Emergency				TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					67	\$ 60,709,750.02	\$ 36,568,863.86	60.24%
2	Ainaro	1	\$ 23,993.19	\$ -	0.00%	78	\$ 97,650,523.96	\$ 82,684,985.60	84.67%
3	Baucau					92	\$ 148,127,502.35	\$ 102,020,512.59	68.87%
4	Bobonaro					97	\$ 58,166,960.83	\$ 32,467,324.55	55.82%
5	Covalima					74	\$ 133,310,278.42	\$ 110,291,451.04	82.73%
6	Dili	20	\$ 7,026,861.31	\$ 923,976.15	13.15%	255	\$ 126,259,257.47	\$ 60,829,858.23	48.18%
7	Ermera					61	\$ 27,553,970.61	\$ 16,683,253.84	60.55%
8	Lautem					64	\$ 43,821,802.01	\$ 29,667,024.54	67.70%
9	Liquica					79	\$ 29,141,742.49	\$ 12,559,449.00	43.10%
10	Manatuto					63	\$ 140,080,038.04	\$ 114,649,336.59	81.85%
11	Manufahi					76	\$ 30,036,734.73	\$ 17,234,483.05	57.38%
12	Nasional					35	\$ 157,917,042.64	\$ 109,210,233.59	69.16%
13	Oe-cusse					4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional					4	\$ 85,431,329.14	\$ 50,077,257.10	58.62%
15	Viqueque	1	\$ 44,219.72	\$ -	0.00%	71	\$ 70,630,341.81	\$ 33,678,726.05	47.68%
Grand Total		22	\$ 7,095,074.22	\$ 923,976.15	13.02%	1120	\$ 1,211,190,596.17	\$ 810,475,327.48	66.92%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ormai)
Ekpa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Assistente Executivo-GADE,
ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P.

Outubro

**Projeto 13 Municipios
Por Sector**



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Aileu				Ainaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	2	\$ 862,274.82	\$ 74,466.90	8.64%				
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	6	\$ 1,352,303.90	\$ 431,394.76	31.90%	6	\$ 940,813.03	\$ 280,223.09	29.79%
8	EDUKASAUN	13	\$ 1,313,542.97	\$ 366,969.34	27.94%	19	\$ 2,292,232.62	\$ 602,774.07	26.30%
9	ELÉCTRICIDADE	3	\$ 1,001,069.36	\$ 760,462.94	75.97%	10	\$ 7,999,431.74	\$ 5,762,955.29	72.04%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	22	\$ 20,163,896.81	\$ 14,781,590.37	73.31%	16	\$ 23,468,546.82	\$ 15,143,367.68	64.53%
12	FLOOD CONTROL	3	\$ 137,301.98	\$ -		2	\$ 108,153.47	\$ 73,802.68	68.24%
13	IMPRESTIMO	4	\$ 32,063,280.07	\$ 18,176,615.16	56.69%	3	\$ 59,201,316.40	\$ 58,556,522.00	98.91%
14	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
15	JUVENTUDE NO DESPORTU								
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	\$ 1,320,533.03	\$ 855,554.72	64.79%	17	\$ 3,237,083.74	\$ 2,030,274.38	62.72%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	2	\$ 1,025,800.00	\$ 642,292.50	62.61%				
19	SAUDE	3	\$ 494,193.39	\$ 167,319.27	33.86%	3	\$ 274,369.70	\$ 116,514.14	42.47%
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 505,151.90	\$ -	0.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	\$ 95,193.62	57.18%				
23	TURISMO	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
	Grand Total	67	\$ 60,709,750.02	\$ 36,568,863.86	60.24%	78	\$ 97,650,523.96	\$ 82,684,985.60	84.67%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	1	\$ 316,447.42	\$ 315,897.63	99.83%	2	\$ 373,662.01	\$ 226,029.69	60.49%
3	AGUA E SANEAMENTO					3	\$ 511,112.23	\$ 443,532.84	86.78%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	13	\$ 1,999,417.79	\$ 592,767.00	29.65%	3	\$ 770,809.57	\$ 401,571.21	52.10%
8	EDUKASAUN	31	\$ 3,743,421.04	\$ 1,101,904.62	29.44%	21	\$ 2,409,512.03	\$ 295,022.64	12.24%
9	ELÉCTRICIDADE	10	\$ 3,110,591.49	\$ 2,637,512.89	84.79%	8	\$ 2,152,484.95	\$ 1,666,236.37	77.41%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	24	\$ 26,044,950.47	\$ 13,245,017.83	50.85%	37	\$ 26,563,959.87	\$ 10,979,850.06	41.33%
12	FLOOD CONTROL					2	\$ 437,194.54	\$ 61,897.78	14.16%
13	IMPRESTIMO	4	\$ 109,889,602.64	\$ 81,769,439.46	74.41%	1	\$ 20,748,566.21	\$ 15,892,652.52	76.60%
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU								
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	8	\$ 2,553,710.88	\$ 2,028,784.32	79.44%	3	\$ 781,244.32	\$ 505,889.50	64.75%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	1	\$ 469,360.62	\$ 329,188.84	70.14%	16	\$ 2,536,031.77	\$ 1,832,730.30	72.27%
20	SEGURANCA NO DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 161,911.64	18.35%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
Grand Total		92	\$ 148,127,502.35	\$ 102,020,512.59	68.87%	97	\$ 58,166,960.83	\$ 32,467,324.55	55.82%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Covalima				Dili			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%				
2	AGRICULTURA					2	\$ 1,263,645.70	\$ 191,289.49	15.14%
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	16	\$ 2,028,400.35	\$ 1,203,875.29	59.35%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL					5	\$ 212,050.00		0.00%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					1	\$ 781,121.90	\$ 339,788.03	43.50%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	9	\$ 2,585,789.57	\$ 1,542,902.93	59.67%	63	\$ 33,900,516.91	\$ 14,652,515.54	43.22%
8	EDUKASAUN	18	\$ 2,722,556.08	\$ 562,709.91	20.67%	21	\$ 2,880,441.85	\$ 1,221,777.07	42.42%
9	ELÉCTRICIDADE	5	\$ 2,730,729.02	\$ 1,670,874.34	61.19%	21	\$ 7,103,218.29	\$ 4,752,306.23	66.90%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO					2	\$ 1,209,890.98	\$ 990,409.50	81.86%
11	ESTRADAS E PONTES	25	\$ 49,041,667.05	\$ 36,944,659.03	75.33%	54	\$ 51,673,764.21	\$ 29,355,665.08	56.81%
12	FLOOD CONTROL	3	\$ 1,338,610.18	\$ 490,748.18	36.66%	11	\$ 3,660,492.49	\$ 1,820,245.18	49.73%
13	IMPRESTIMO								
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU					7	\$ 1,364,930.47	\$ 823,862.09	60.36%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	\$ 1,507,681.83	\$ 960,246.38	63.69%	22	\$ 2,391,462.19	\$ 1,266,794.14	52.97%
17	PORTOS					2	\$ 846,710.87	\$ 503,309.32	59.44%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					6	\$ 1,590,223.35	\$ 855,161.35	53.78%
19	SAUDE	4	\$ 687,870.35	\$ 607,231.56	88.28%	15	\$ 3,472,985.12	\$ 2,057,148.25	59.23%
20	SEGURANCA NO DEFESA					2	\$ 10,771,998.20	\$ 174,219.47	1.62%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
23	TURISMO					4	\$ 657,804.36	\$ 271,235.64	41.23%
	Grand Total	74	\$ 133,310,278.42	\$ 110,291,451.04	82.73%	255	\$ 126,259,257.47	\$ 60,829,858.23	48.18%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	4	\$ 448,959.83	\$ 146,375.20	32.60%	3	\$ 815,564.95	\$ 286,056.46	35.07%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 585,351.48	\$ 84,063.99	14.36%	8	\$ 2,714,339.43	\$ 1,316,497.04	48.50%
8	EDUKASAUN	23	\$ 3,012,002.58	\$ 910,539.28	30.23%	18	\$ 2,166,673.93	\$ 475,909.97	21.97%
9	ELÉCTRICIDADE	9	\$ 6,825,025.51	\$ 5,788,150.06	84.81%	2	\$ 1,026,193.79	\$ 718,131.88	69.98%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	12	\$ 14,534,946.18	\$ 8,554,592.40	58.86%	26	\$ 35,620,706.11	\$ 25,806,457.68	72.45%
12	FLOOD CONTROL								
13	IMPRESTIMO								
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU								
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	4	\$ 1,124,835.61	\$ 366,144.79	32.55%	3	\$ 601,385.25	\$ 370,106.35	61.54%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 833,388.12	81.48%	2	\$ 373,420.03	\$ 261,012.83	69.90%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
23	TURISMO					1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
	Grand Total	61	\$ 27,553,970.61	\$ 16,683,253.84	60.55%	64	\$ 43,821,802.01	\$ 29,667,024.54	67.70%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Liquida				Manatuto			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	2	\$ 91,877.21	\$ 67,036.01	72.96%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
3	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 293,629.77	\$ 167,315.56	56.98%	1	\$ 162,377.94	\$ 67,961.57	41.85%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 123,438.90	\$ -	0.00%	9	\$ 1,430,360.48	\$ 538,422.53	37.64%
8	EDUKASAUN	18	\$ 1,956,926.91	\$ 302,946.05	15.48%	12	\$ 1,236,740.28	\$ 499,415.68	40.38%
9	ELÉCTRICIDADE	8	\$ 7,578,728.67	\$ 1,716,478.52	22.65%	2	\$ 1,076,003.44	\$ 845,364.30	78.57%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	26	\$ 6,905,394.35	\$ 2,056,408.18	29.78%	20	\$ 16,629,163.58	\$ 11,984,269.26	72.07%
12	FLOOD CONTROL	3	\$ 502,473.28	\$ 321,707.56	64.02%	1	\$ 242,560.14	\$ 154,455.92	63.68%
13	IMPRESTIMO	1	\$ 7,693,101.00	\$ 5,795,051.15	75.33%	4	\$ 115,112,106.35	\$ 97,872,626.14	85.02%
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	9	\$ 1,733,015.54	\$ 1,066,681.96	61.55%	2	\$ 157,560.52	\$ 66,113.10	41.96%
17	PORTOS	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	2	\$ 309,925.98	\$ 256,424.78	82.74%	7	\$ 840,178.96	\$ 548,892.37	65.33%
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO	2	\$ 500,373.00	\$ 104,500.00	20.88%	2	\$ 305,556.27	\$ 87,571.99	28.66%
Grand Total		79	\$ 29,141,742.49	\$ 12,559,449.00	43.10%	63	\$ 140,080,038.04	\$ 114,649,336.59	81.85%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					1	\$ 1,100,000.00	\$ 600,000.00	54.55%
2	AGRICULTURA					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
3	AGUA E SANEAMENTO	5	\$ 444,587.79	\$ 184,573.83	41.52%	6	\$ 7,557,238.90	\$ 4,833,544.42	63.96%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					6	\$ 27,104,043.03	\$ 17,770,511.90	65.56%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 610,160.22	\$ 479,253.23	78.55%	2	\$ 622,806.05	\$ 411,597.73	66.09%
8	EDUKASAUN	16	\$ 5,647,411.17	\$ 339,311.38					
9	ELÉCTRICIDADE	6	\$ 3,946,641.94	\$ 3,004,275.07	76.12%	1	\$ 46,872,339.00	\$ 29,682,899.05	63.33%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO					2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	91.99%
11	ESTRADAS E PONTES	24	\$ 14,260,134.18	\$ 9,506,617.68	66.67%	7	\$ 14,526,729.98	\$ 11,357,827.98	78.19%
12	FLOOD CONTROL	4	\$ 514,865.29	\$ 275,867.47	53.58%				
13	IMPRESTIMO					1	\$ 48,314,975.87	\$ 35,849,928.14	74.20%
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 23,697.55	\$ 21,127.51	89.15%	1	\$ 1,636,624.69	\$ 925,534.68	56.55%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	11	\$ 3,615,130.78	\$ 2,590,267.71	71.65%				
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					2	\$ 902,708.00	\$ 681,929.60	75.54%
19	SAUDE	2	\$ 312,000.61	\$ 292,949.96	93.89%	1	\$ 254,727.00	\$ 22,925.43	9.00%
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 76,149.37	\$ -	0.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					2	\$ 5,291,216.00	\$ 3,915,113.84	73.99%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 536,957.37	\$ 524,347.13	97.65%	1	\$ 74,828.00		0.00%
23	TURISMO	1	\$ 48,998.46	\$ 15,892.08	32.43%	1	\$ 225,573.00		0.00%
Grand Total		76	\$ 30,036,734.73	\$ 17,234,483.05	57.38%	35	\$ 157,917,042.64	\$ 109,210,233.59	69.16%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO								
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS								
8	EDUKASAUN								
9	ELÉCTRICIDADE	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES					2	\$ 8,552,552.44	\$ 6,897,044.48	80.64%
12	FLOOD CONTROL								
13	IMPRESTIMO					1	\$ 23,853,175.70	\$ 5,593,323.50	23.45%
14	IRIGASAUN								
15	JUVENTUDE NO DESPORTU								
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE								
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
Grand Total		4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 50,077,257.10	58.62%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROYECTO	Viqueque				Total 13 Municipios			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	3	\$ 5,472,502.45	\$ 4,232,344.51	77.34%	12	\$ 7,958,624.42	\$ 5,155,822.66	64.78%
3	AGUA E SANEAMENTO					44	\$ 13,388,528.38	\$ 7,672,083.87	57.30%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL					5	\$ 212,050.00		0.00%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					7	\$ 27,885,164.93	\$ 18,110,299.93	64.95%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	28	\$ 4,191,748.11	\$ 749,882.05	17.89%	156	\$ 51,827,855.44	\$ 21,481,091.10	41.45%
8	EDUKASAUN					210	\$ 29,381,461.46	\$ 6,679,280.01	22.73%
9	ELÉCTRICIDADE	4	\$ 2,296,509.09	\$ 1,504,022.77	65.49%	93	\$ 147,437,716.54	\$ 98,454,971.53	66.78%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO					4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,084,250.86	89.31%
11	ESTRADAS E PONTES	34	\$ 58,060,561.11	\$ 27,013,395.99	46.53%	329	\$ 366,046,973.16	\$ 223,626,763.70	61.09%
12	FLOOD CONTROL					29	\$ 6,941,651.37	\$ 3,198,724.77	46.08%
13	IMPRESTIMO					19	\$ 416,876,124.24	\$ 319,506,158.07	76.64%
14	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
15	JUVENTUDE NO DESPORTU					10	\$ 5,388,229.15	\$ 3,566,368.17	66.19%
16	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	\$ 179,080.74	29.40%	93	\$ 19,632,664.74	\$ 12,285,938.09	62.58%
17	PORTOS					3	\$ 2,241,460.87	\$ 1,160,585.24	51.78%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROYECTOS					10	\$ 3,518,731.35	\$ 2,179,383.45	61.94%
19	SAUDE					62	\$ 11,047,912.95	\$ 7,325,725.85	66.31%
20	SEGURANCA NO DEFESA					7	\$ 13,953,963.08	\$ 1,877,909.57	13.46%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					2	\$ 5,291,216.00	\$ 3,915,113.84	73.99%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					7	\$ 1,645,809.66	\$ 1,331,973.64	80.93%
23	TURISMO					13	\$ 2,224,058.06	\$ 853,112.54	38.36%
	Grand Total	71	\$ 70,630,341.81	\$ 33,678,726.05	47.68%	1120	\$ 1,211,190,596.17	\$ 810,475,327.48	66.92%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotânia Guterres Ormai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Assistente Executivo-GADE,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T, M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Outubro

**Projeto 13 Municípios
Por Ministério**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Aileu				Ainaro			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL INSTITUTO PUBLICO								
2	CAC								
3	Centro Nacional Chega								
4	CFP								
5	CONSELHO DA EMPRESA								
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	6	\$ 445,124.22	\$ -	0.00%	3	\$ 260,605.35	\$ 211,872.50	81.30%
7	ESTATAL								
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
13	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 505,151.90	\$ -	0.00%				
14	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	\$ 178,371.29	89.19%				
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	36	\$ 55,926,989.27	\$ 35,034,250.09	62.64%	45	\$ 93,416,272.06	\$ 81,241,874.45	86.97%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO DO INTERIOR								
19	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	14	\$ 1,484,622.27	\$ 366,969.34	24.72%	20	\$ 2,316,678.62	\$ 624,775.47	26.97%
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	\$ 256,732.50	54.05%				
21	MINISTERIO FINANÇAS								
22	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus								
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	\$ 61,804.39	52.04%	1	\$ 489,653.83	\$ 229,243.50	46.82%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 7,700.00	\$ 6,930.00	90.00%
25	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 775,330.57	\$ 420,342.74	54.21%	5	\$ 484,439.64	\$ 251,737.41	
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	\$ 33,389.23	7.03%	1	\$ 546,598.02	\$ -	0.00%
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
35	SEFOPE	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECURSU								
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		67	\$ 60,709,750.02	\$ 36,568,863.86	60.24%	78	\$ 97,650,523.96	\$ 82,684,985.60	84.67%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Baucau			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	Bobonaro			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
		MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PAGAMENTU (\$)			MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL, INSTITUTO PUBLICO									
2	CAC									
3	Centro Nacional Chega									
4	CFP									
5	CONSELHO DA EMPRESA									
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P									
7	ESTATAL	7	\$ 798,108.36	\$ 328,508.66	41.16%	1	\$ 15,508.35	\$ 9,975.03	\$ 9,975.03	64.32%
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					1	\$ 564,695.97	\$ 221,586.70	\$ 221,586.70	39.24%
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES									
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR									
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS									
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 316,447.42	\$ 315,897.63	99.83%	2	\$ 373,662.01	\$ 226,029.69	\$ 226,029.69	60.49%
13	MINISTERIO DA DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 161,911.64	\$ 161,911.64	18.35%
14	MINISTERIO DA JUSTICA									
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS									
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	47	\$ 141,618,693.51	\$ 99,698,608.73	70.40%	54	\$ 51,346,267.04	\$ 29,598,508.15	\$ 29,598,508.15	57.64%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA									
18	MINISTERIO DO INTERIOR									
19	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	31	\$ 3,743,421.04	\$ 1,101,904.62	29.44%	22	\$ 2,541,904.03	\$ 374,457.84	\$ 374,457.84	14.73%
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA									
21	MINISTERIO FINANÇAS					1	\$ 190,605.25	\$ 170,009.48	\$ 170,009.48	89.19%
22	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus									
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	2	\$ 782,313.77	\$ 112,848.70	14.42%					
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 220,190.97	\$ 213,875.07	\$ 213,875.07	97.13%
25	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 748,725.31	\$ 402,304.35	53.73%	14	\$ 2,031,743.88	\$ 1,490,970.95	\$ 1,490,970.95	73.38%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN									
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN									
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 50,000.00	\$ 30,483.00	60.97%					
29	PARLAMENTU NASIONAL									
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA									
31	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE	1	\$ 69,792.94	\$ 29,956.90	42.92%					
32	SAMES									
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN									
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU									
35	SEFOPE									
36	TRADE INVEST									
37	TRIBUNAL RECUSSO									
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE									
Grand Total		92	\$ 148,127,502.35	\$ 102,020,512.59	68.87%	97	\$ 58,166,960.83	\$ 32,467,324.55	\$ 32,467,324.55	55.82%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Covallima				Dili			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NASIONAL, INSTITUTO PUBLICO								
2	CAC					1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
3	Centro Nacional Chega					3	\$ 190,090.64	\$ 119,464.90	62.85%
4	GFP					1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
5	CONSELHO DA EMPRESA					1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
7	ESTATAL					8	\$ 568,677.26	\$ 366,012.60	64.36%
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	\$ 1,196,660.00	\$ 941,722.09	78.70%	8	\$ 9,362,619.96	\$ 3,614,732.46	38.61%
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					3	\$ 182,074.26	\$ 150,824.94	82.84%
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS					1	\$ 512,279.04		
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 260,523.18	\$ 193,054.93	74.10%	3	\$ 1,282,894.73	\$ 209,738.52	16.35%
13	MINISTERIO DA DEFESA					12	\$ 1,944,847.07	\$ 1,310,220.35	67.37%
14	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 149,292.80	\$ 92,120.77	61.70%	4	\$ 360,694.51	\$ 169,520.38	47.00%
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	39	\$ 54,358,164.90	\$ 39,873,473.00	73.35%	122	\$ 69,659,846.08	\$ 40,806,938.20	58.58%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 337,328.10	\$ -	0.00%	3	\$ 10,861,982.32	\$ 250,277.24	2.30%
19	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	19	\$ 2,905,884.88	\$ 562,709.91	19.36%	22	\$ 3,290,741.76	\$ 1,463,870.43	44.48%
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					1	\$ 7,583.06	\$ 6,599.24	87.03%
21	MINISTERIO FINANÇAS								
22	Ministerio Koordinator Asuntui Ekonómikus					1	\$ 119,578.85	\$ 92,618.05	77.45%
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					3	\$ 1,434,737.07	\$ 551,605.33	38.45%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	7	\$ 1,056,679.87	\$ 540,256.23	51.13%
25	MINISTERIO SAUDE	8	\$ 1,373,959.16	\$ 1,092,466.05	79.51%	15	\$ 3,615,003.82	\$ 2,128,885.45	58.90%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%	4	\$ 943,633.56	\$ 529,242.15	56.09%
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 33,091.06	\$ 23,825.57	72.00%	4	\$ 756,542.64	\$ 294,507.14	38.93%
29	PARLAMENTU NASIONAL					2	\$ 69,221.96	\$ 27,033.43	39.05%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					1	\$ 556,612.74	\$ 499,422.83	89.73%
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE					1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					6	\$ 1,322,071.13	\$ 793,217.28	60.00%
35	SEFOPE					1	\$ 460,254.00	\$ 339,787.68	73.83%
36	TRADE INVEST					1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
37	TRIBUNAL RECUSSO					4	\$ 12,092,434.96	\$ 3,742,742.83	30.95%
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE					7	\$ 4,122,424.25	\$ 2,026,832.22	49.17%
	Grand Total	74	\$ 133,310,278.42	\$ 110,291,451.04	82.73%	255	\$ 126,259,257.47	\$ 60,829,858.23	48.18%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NASIONAL, INSTITUTO PUBLICO	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	100.00%				
2	CAC								
3	Centro Nacional Chega								
4	CFP								
5	CONSELHO DA EMPRESA								
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	\$ 66,560.00	\$ -	0.00%	2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%
7	ESTATAL								
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								
13	MINISTERIO DA DEFESA								
14	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 160,056.02	\$ -	0.00%				
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	28	\$ 22,331,967.13	\$ 14,853,462.45	64.77%	34	\$ 38,063,850.10	\$ 27,180,752.37	71.41%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO DO INTERIOR								
19	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	23	\$ 3,012,002.58	\$ 910,539.28	30.23%	19	\$ 2,474,390.58	\$ 565,750.54	22.86%
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
21	MINISTERIO FINANÇAS					1	\$ 56,783.85	\$ 45,907.81	80.85%
22	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus								
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 358,735.46	\$ 84,063.99	23.43%				
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					2	\$ 962,218.72	\$ 512,725.33	53.29%
25	MINISTERIO SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 833,388.12	81.48%	3	\$ 653,626.75	\$ 413,159.31	63.21%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					1	\$ 710,074.64	\$ 515,876.85	72.65%
31	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
35	SEFOPE								
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSSO								
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
	Grand Total	61	\$ 27,553,970.61	\$ 16,683,253.84	60.55%	64	\$ 43,821,802.01	\$ 29,667,024.54	67.70%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Liquida			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Manatuto			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL, INSTITUTO PUBLICO								
2	CAC								
3	Centro Nacional Chega								
4	CFP								
5	CONSELHO DA EMPRESA								
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
7	ESTATAL	4	\$ 387,568.54	\$ -	0.00%	4	\$ 567,521.53	\$ 349,537.06	61.59%
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$ 139,176.53	\$ 104,901.53	75.37%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
13	MINISTERIO DA DEFESA								
14	MINISTERIO DA JUSTICA								
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	44	\$ 24,171,989.95	\$ 11,003,274.72	45.52%	30	\$ 133,379,771.97	\$ 110,980,790.29	83.21%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
19	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	\$ 1,956,926.91	\$ 302,946.05	15.48%	13	\$ 1,303,638.79	\$ 489,415.68	38.31%
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
21	MINISTERIO FINANCAS								
22	Ministerio Koordinator Asunttu Ekonomikus								
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					1	\$ 408,460.73	\$ 106,266.80	26.02%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	2	\$ 99,484.80	\$ 82,502.69	82.93%	1	\$ 277,330.43	\$ -	0.00%
25	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 433,364.88	\$ 256,424.78	59.17%	9	\$ 1,175,863.67	\$ 686,686.06	59.25%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 500,373.00	\$ 104,500.00	20.88%	2	\$ 204,687.39	\$ 147,490.09	72.06%
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
31	RADIO TELEVISAU TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
35	SEFOPE								
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSO								
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
Grand Total		79	\$ 29,141,742.49	\$ 12,559,449.00	43.10%	63	\$ 140,080,038.04	\$ 114,649,336.59	81.85%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NASIONAL, INSTITUTO PUBLICO								
2	CAC								
3	Centro Nacional Chega								
4	CFP								
5	CONSELHO DA EMPRESA								
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	\$ 292,653.74		0.00%				
7	ESTATAL	5	\$ 575,943.14	\$ 556,747.80	96.67%	1	\$ 479,146.05	\$ 337,950.03	83.05%
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	91.99%
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
13	MINISTERIO DA DEFESA								
14	MINISTERIO DA JUSTICA								
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	47	\$ 22,473,418.02	\$ 15,550,328.60	69.19%	15	\$ 118,022,105.80	\$ 82,348,984.89	69.77%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA	1	\$ 3,961,658.78						
18	MINISTERIO DO INTERIOR	2	\$ 436,263.93	\$ 287,969.25	66.01%				
19	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	15	\$ 1,685,752.39	\$ 339,311.38	20.13%				
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
21	MINISTERIO FINANÇAS					5	\$ 30,241,984.60	\$ 21,904,300.36	72.43%
22	Ministerio Koordinator Asuntú Ekonómikus								
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 48,998.46	\$ 15,892.08	32.43%	1	\$ 74,828.00	\$ -	0.00%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					3	\$ 3,042,449.93	\$ 341,268.73	11.22%
25	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 383,412.81	\$ 355,838.49	92.81%	1	\$ 254,727.00	\$ 22,925.43	9.00%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 178,633.46	\$ 128,395.45	71.88%	2	\$ 151,885.95	\$ 57,144.30	37.62%
29	PARLAMENTU NASIONAL					2	\$ 369,233.00	\$ 13,647.70	3.70%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	\$ 1,636,624.69	\$ 925,534.68	56.55%
35	SEFOPE					1	\$ 210,824.50	\$ 40,056.65	19.00%
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSSO								
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		76	\$ 30,036,734.73	\$ 17,234,483.05	57.38%	35	\$ 157,917,042.64	\$ 109,210,233.59	69.16%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NASIONAL INSTITUTO PUBLICO								
2	CAC								
3	Centro Nacional Chega								
4	CFP								
5	CONSELHO DA EMPRENSA								
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
7	ESTATAL								
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								
13	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 1.660,172.40	\$ 1.494.155.15	90.00%				
14	MINISTERIO DA JUSTICA								
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 50,077,257.10	58.62%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO DO INTERIOR								
19	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU								
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
21	MINISTERIO FINANÇAS								
22	Ministerio Koordinator Asuntlu Ekonomikus								
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU								
25	MINISTERIO SAUDE								
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
31	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
35	SEFOPE								
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSO								
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
	Grand Total	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	76.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 50,077,257.10	58.62%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Viqueque				PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	GRAND TOTAL			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)				TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NASIONAL, INSTITUTO PUBLICO						1	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	100.00%
2	CAC						1	1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
3	Centro Nacional Chega						3	3	\$ 190,090.64	\$ 119,464.90	62.85%
4	CNP						1	1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
5	CONSELHO DA EMPRESA						1	1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P						1	1	\$ 292,653.74	\$ -	0.00%
7	ESTATAL	2	\$ 355,840.92	\$ 292,976.54		82.33%	44	44	\$ 4,917,942.57	\$ 2,513,580.22	51.11%
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO						12	12	\$ 14,487,230.67	\$ 7,871,882.61	54.34%
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES						3	3	\$ 182,074.26	\$ 150,824.94	82.84%
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -		0.00%	1	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS						1	1	\$ 512,279.04	\$ -	0.00%
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	3	\$ 5,472,502.45	\$ 4,232,344.51		77.34%	16	16	\$ 8,318,015.67	\$ 5,437,511.86	65.37%
13	MINISTERIO DA DEFESA						15	15	\$ 4,992,554.70	\$ 2,966,287.14	59.41%
14	MINISTERIO DA JUSTICA						8	8	\$ 899,319.17	\$ 444,673.29	49.45%
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS						2	2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	\$ 60,966,091.25	\$ 28,696,499.50		47.07%	588	588	\$ 972,459,905.47	\$ 667,313,415.24	68.62%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA						1	1	\$ 3,961,658.78	\$ -	0.00%
18	MINISTERIO DO INTERIOR						7	7	\$ 11,693,682.23	\$ 585,869.80	5.01%
19	MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	20	\$ 2,040,688.01	\$ 140,829.59		6.90%	236	236	\$ 28,756,651.86	\$ 7,253,480.13	25.22%
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA						2	2	\$ 482,583.06	\$ 263,331.74	54.57%
21	MINISTERIO FINANÇAS						7	7	\$ 30,489,373.70	\$ 22,120,217.65	72.55%
22	Ministerio Koordinator Asuntlo Ekonomikus						1	1	\$ 119,578.85	\$ 92,618.05	77.45%
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 275,004.50	\$ 2,911.53		1.06%	12	12	\$ 3,991,501.52	\$ 1,164,636.32	29.18%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTO	2	\$ 242,346.13	\$ -		0.00%	20	20	\$ 6,172,782.65	\$ 1,961,939.85	31.78%
25	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 327,232.66	\$ 163,850.75		50.07%	75	75	\$ 13,280,279.57	\$ 8,528,979.89	64.22%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	\$ 805,366.41	\$ 149,313.64		18.54%	6	6	\$ 2,694,349.02	\$ 895,135.76	33.22%
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN						9	9	\$ 74,921,262.05	\$ 68,491,359.28	91.42%
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA						13	13	\$ 2,092,560.55	\$ 742,848.95	35.50%
29	PARLAMENTU NASIONAL						2	2	\$ 69,221.96	\$ 27,033.43	39.05%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA						2	2	\$ 1,266,687.38	\$ 1,015,299.68	80.15%
31	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE						1	1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
32	SAMES						1	1	\$ 69,792.94	\$ 29,956.90	42.92%
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN						2	2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU						8	8	\$ 5,321,672.26	\$ 3,514,595.85	66.04%
35	SEFOPE						5	5	\$ 1,156,831.47	\$ 753,757.16	65.16%
36	TRADE INVEST						1	1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
37	TRIBUNAL RECUSSO						4	4	\$ 12,092,434.96	\$ 3,742,742.83	30.95%
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE						7	7	\$ 4,122,424.25	\$ 2,026,832.22	49.17%
	Grand Total	71	\$ 70,630,341.81	\$ 33,676,726.05		47.68%	1120		\$ 1,211,190,596.17	\$ 810,475,327.48	66.92%

Prepara Husi :

Sertika Husi :

Approva Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Omai)
Ekipa Validasaun d Baze de Dados,
ADN, I.P

(Eng. Susana S. R. Amaral)
Assistente Executivo-GADE,
ADN, I.P

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Novembro

**Projeto 13 Municipios
Por Fundos
Financiamento**



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	FI				LM-CD			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	21	\$ 52,113,041.32	\$ 33,170,087.14	63.65%	19	\$ 4,490,679.95	\$ 1,720,055.46	38.30%
2	Ainaro	29	\$ 91,212,374.94	\$ 79,948,169.07	87.65%	19	\$ 4,135,903.17	\$ 1,143,709.63	27.65%
3	Baucau	31	\$ 137,746,167.40	\$ 99,844,792.15	72.48%	17	\$ 4,861,686.43	\$ 2,615,153.36	53.79%
4	Bobonaro	39	\$ 47,840,551.50	\$ 30,793,351.06	64.37%	24	\$ 6,805,334.91	\$ 3,183,535.15	46.78%
5	Covalima	32	\$ 125,305,153.33	\$ 106,975,766.30	85.37%	16	\$ 3,863,241.12	\$ 1,264,428.82	32.73%
6	Dili	64	\$ 79,850,016.94	\$ 40,184,744.43	50.33%	76	\$ 19,776,341.29	\$ 11,103,264.54	56.14%
7	Ermera	21	\$ 21,217,838.65	\$ 14,756,696.95	69.55%	10	\$ 2,536,341.41	\$ 584,524.14	23.05%
8	Lautem	14	\$ 32,905,711.12	\$ 26,593,757.78	80.82%	24	\$ 7,339,477.40	\$ 2,863,356.69	39.01%
9	Liquica	18	\$ 22,164,144.87	\$ 11,244,397.95	50.73%	25	\$ 3,314,058.24	\$ 1,057,377.28	31.91%
10	Manatuto	13	\$ 131,516,647.81	\$ 113,065,040.88	85.97%	18	\$ 4,268,931.05	\$ 1,797,606.10	42.11%
11	Manufahi	24	\$ 21,950,711.71	\$ 12,610,572.98	57.45%	19	\$ 3,101,275.15	\$ 1,829,606.94	59.00%
12	Nasional	25	\$ 108,165,134.03	\$ 78,308,332.91	72.40%	5	\$ 48,839,501.91	\$ 30,214,673.68	61.87%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%				
14	Regional	2	\$ 32,032,062.14	\$ 12,228,802.38	38.18%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
15	Viqueque	24	\$ 59,413,345.74	\$ 32,593,073.76	54.86%	23	\$ 9,073,235.34	\$ 1,470,469.94	16.21%
Grand Total		361	\$ 965,786,223.15	\$ 694,170,153.59	71.88%	296	\$ 175,431,608.37	\$ 98,434,650.85	56.11%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	PDIM				LM-BS			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	6	\$ 445,124.22	\$ -	0.00%	4	\$ 1,568,065.11	\$ 982,502.76	62.66%
2	Ainaro	8	\$ 931,596.86	\$ 664,237.60	71.30%	3	\$ 565,845.40	\$ 527,769.63	93.27%
3	Baucau	8	\$ 863,550.68	\$ 393,950.98	45.62%	6	\$ 1,107,575.09	\$ 677,004.11	61.12%
4	Bobonaro	8	\$ 746,047.73	\$ 557,410.77	74.72%	4	\$ 860,900.42	\$ 768,255.38	89.24%
5	Covalima	3	\$ 592,720.70	\$ 576,717.27	97.30%	3	\$ 575,995.90	\$ 255,350.34	44.33%
6	Dili	7	\$ 1,054,664.27	\$ 898,320.43	85.18%	58	\$ 5,323,126.93	\$ 3,558,136.19	66.84%
7	Ermera	5	\$ 845,470.49	\$ 764,831.78	90.46%	3	\$ 367,250.73	\$ 89,239.28	24.30%
8	Lautem	2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%	6	\$ 1,103,542.01	\$ 541,687.21	49.09%
9	Liquica	5	\$ 722,133.98	\$ 293,604.39	40.66%	11	\$ 1,574,555.51	\$ 1,134,715.47	72.07%
10	Manatuto	12	\$ 1,596,152.81	\$ 1,163,062.73	72.87%	6	\$ 1,160,391.31	\$ 446,513.42	38.48%
11	Manufahi	10	\$ 1,450,922.99	\$ 1,130,417.18	77.91%	5	\$ 1,464,659.68	\$ 1,024,526.15	69.95%
12	Nasional					8	\$ 1,318,574.94	\$ 799,338.67	60.62%
13	Oe-cusse								
14	Regional					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
15	Viqueque	2	\$ 355,840.92	\$ 322,956.45	90.76%	3	\$ 300,989.41	\$ 77,967.95	25.90%
Grand Total		76	\$ 10,001,564.50	\$ 6,765,509.58	67.64%	121	\$ 17,665,138.44	\$ 11,144,572.16	63.09%



MINISTÉRIO DO PLANO
E O R D E N A M E N T O
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	LM-TP				Fundo Covid-19			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	\$ 1,617,454.43	\$ 583,973.62	36.10%	3	\$ 475,384.99	\$ 306,425.82	64.46%
2	Ainaro	17	\$ 1,665,991.99	\$ 332,330.25	19.95%	3	\$ 242,067.62	\$ 208,670.15	86.20%
3	Baucau	29	\$ 3,000,775.19	\$ 991,381.97	33.04%	1	\$ 469,360.62	\$ 329,188.84	70.14%
4	Bobonaro	23	\$ 3,106,600.00	\$ 1,004,488.19	32.33%	6	\$ 759,771.73	\$ 629,876.68	82.90%
5	Covalima	17	\$ 2,921,378.69	\$ 1,446,686.64	49.52%	4	\$ 533,488.64	\$ 467,028.49	87.54%
6	Dili	24	\$ 11,248,554.33	\$ 4,364,673.97	38.80%	7	\$ 2,018,602.40	\$ 1,156,558.77	57.30%
7	Ermera	20	\$ 2,252,742.01	\$ 683,775.10	30.35%	2	\$ 334,327.32	\$ 284,717.49	85.16%
8	Lautem	16	\$ 1,702,312.60	\$ 496,937.49	29.19%	2	\$ 373,420.03	\$ 261,012.83	69.90%
9	Liquica	13	\$ 1,123,528.85	\$ 190,936.38	16.99%	4	\$ 433,364.88	\$ 313,531.42	72.35%
10	Manatuto	10	\$ 872,256.79	\$ 170,899.41	19.59%	4	\$ 665,658.27	\$ 432,210.39	64.93%
11	Manufahi	15	\$ 1,685,752.39	\$ 422,892.46	25.09%	4	\$ 433,103.27	\$ 399,436.17	92.23%
12	Nasional								
13	Oe-cusse								
14	Regional								
15	Viqueque	18	\$ 1,781,168.18	\$ 393,227.62	22.08%				
Grand Total		216	\$ 32,978,515.45	\$ 11,082,203.10	33.60%	40	\$ 6,738,549.77	\$ 4,788,657.05	71.06%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	Emergency				TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					67	\$ 60,709,750.02	\$ 36,763,044.80	60.56%
2	Ainaro	1	\$ 23,993.19	\$ -	0.00%	80	\$ 98,777,773.17	\$ 82,824,886.33	83.85%
3	Baucau					92	\$ 148,049,115.41	\$ 104,851,471.41	70.82%
4	Bobonaro	1	\$ 345,314.85	\$ -		105	\$ 60,464,521.14	\$ 36,936,917.23	61.09%
5	Covalima					75	\$ 133,791,978.38	\$ 110,985,977.86	82.95%
6	Dili	22	\$ 8,083,334.71	\$ 2,575,229.69	31.86%	258	\$ 127,354,640.87	\$ 63,840,928.02	50.13%
7	Ermera					61	\$ 27,553,970.61	\$ 17,163,784.74	62.29%
8	Lautem					64	\$ 43,821,802.01	\$ 30,756,752.00	70.19%
9	Liquica	1	\$ 502,473.28	\$ 441,060.32	87.78%	77	\$ 29,834,259.61	\$ 14,675,623.21	49.19%
10	Manatuto					63	\$ 140,080,038.04	\$ 117,075,332.93	83.58%
11	Manufahi					77	\$ 30,086,425.19	\$ 17,417,451.88	57.89%
12	Nasional					38	\$ 158,323,210.88	\$ 109,322,345.26	69.05%
13	Oe-cusse					4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional					4	\$ 85,431,329.14	\$ 50,077,257.10	58.62%
15	Viqueque	1	\$ 44,219.72	\$ -		71	\$ 70,968,799.31	\$ 34,857,695.72	49.12%
	Grand Total	26	\$ 8,999,335.75	\$ 3,016,290.01	33.52%	1136	\$ 1,217,600,935.43	\$ 829,402,036.34	68.12%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Serifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Assistente Executivo-GADE,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Novembro

**Projeto 13 Municípios
Por Setor**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROYECTO	Aileu				Ainaro			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMIENTO	2	\$ 862,274.82	\$ 74,466.90	8.64%				
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	6	\$ 1,352,303.90	\$ 499,729.70	36.95%	6	\$ 940,813.03	\$ 326,109.58	34.66%
8	EDUKASAUN	13	\$ 1,313,542.97	\$ 366,969.34	27.94%	19	\$ 2,292,232.62	\$ 627,363.81	27.37%
9	ELÉCTRICIDADE	3	\$ 1,001,069.36	\$ 760,462.94	75.97%	10	\$ 7,999,431.74	\$ 5,762,955.29	72.04%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	22	\$ 20,163,896.81	\$ 14,781,590.37	73.31%	18	\$ 24,595,796.03	\$ 15,199,736.97	61.80%
12	FLOOD CONTROL	3	\$ 137,301.98	\$ -		2	\$ 108,153.47	\$ 73,802.68	68.24%
13	IMPRESTIMO	4	\$ 32,063,280.07	\$ 18,302,461.16	57.08%	3	\$ 59,201,316.40	\$ 58,556,522.00	98.91%
14	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA								
15	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
16	JUVENTUDE NO DESPORTU								
17	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	\$ 1,320,533.03	\$ 855,554.72	64.79%	17	\$ 3,237,083.74	\$ 2,030,274.38	62.72%
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROYECTOS	2	\$ 1,025,800.00	\$ 642,292.50	62.61%				
20	SAUDE	3	\$ 494,193.39	\$ 167,319.27	33.86%	3	\$ 274,369.70	\$ 129,569.35	47.22%
21	SEGURANCA NASIONAL								
22	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 505,151.90	\$ -	0.00%				
23	SISTEMA FINANCEIROS E SUORTAS INFRAESTRUTURAS								
24	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	\$ 95,193.62	57.18%				
25	TURISMO	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
	Grand Total	67	\$ 60,709,750.02	\$ 36,763,044.80	60.56%	80	\$ 98,777,773.17	\$ 82,824,886.33	83.85%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	1	\$ 316,447.42	\$ 315,897.63	99.83%	4	\$ 468,728.90	\$ 226,029.69	48.22%
3	AGUA E SANEAMENTO					3	\$ 511,112.23	\$ 443,532.84	86.78%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					1	\$ 1,007,800.00	\$ 272,106.00	
7	EDIFICIOS PUBLICOS	13	\$ 1,999,417.79	\$ 592,767.00	29.65%	3	\$ 770,809.57	\$ 401,571.21	52.10%
8	EDUKASAUN	31	\$ 3,743,421.04	\$ 1,622,522.50	43.34%	23	\$ 2,946,152.70	\$ 874,882.30	29.70%
9	ELÉCTRICIDADE	10	\$ 3,110,591.49	\$ 2,637,512.89	84.79%	8	\$ 2,152,484.95	\$ 1,666,236.37	77.41%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	24	\$ 25,966,563.53	\$ 13,577,333.16	52.29%	37	\$ 26,563,960.12	\$ 13,513,851.24	50.87%
12	FLOOD CONTROL					2	\$ 437,194.54	\$ 61,897.78	14.16%
13	IMPRESTIMO	4	\$ 109,889,602.64	\$ 83,617,027.60	76.09%	1	\$ 20,748,566.21	\$ 16,829,655.23	81.11%
14	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA								
15	IRIGASAUN								
16	JUVENTUDE NO DESPORTU								
17	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	8	\$ 2,553,710.88	\$ 2,159,221.79	84.55%	3	\$ 781,244.32	\$ 570,112.50	72.97%
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS								
20	SAUDE	1	\$ 469,360.62	\$ 329,188.84	70.14%	17	\$ 2,566,487.74	\$ 1,915,130.43	74.62%
21	SEGURANCA NASIONAL					2	\$ 627,596.53	\$ -	0.00%
22	SEGURANCA NO DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 161,911.64	18.35%
23	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
24	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
25	TURISMO								
	Grand Total	92	\$ 148,049,115.41	\$ 104,851,471.41	70.82%	105	\$ 60,464,521.14	\$ 36,936,917.23	61.09%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Covallima				Dili			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%				
2	AGRICULTURA					2	\$ 1,263,645.70	\$ 191,289.49	15.14%
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	16	\$ 2,028,400.35	\$ 1,203,875.29	59.35%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL					5	\$ 212,050.00	\$ 20,710.00	9.77%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					1	\$ 781,121.90	\$ 339,788.03	43.50%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	9	\$ 2,585,789.57	\$ 1,542,902.93	59.67%	63	\$ 33,900,516.91	\$ 14,872,857.34	43.87%
8	EDUKASAUN	18	\$ 2,722,556.08	\$ 676,900.12	24.86%	21	\$ 2,880,441.85	\$ 1,221,777.07	42.42%
9	ELÉCTRICIDADE	5	\$ 2,730,729.02	\$ 1,670,874.34	61.19%	21	\$ 7,103,218.29	\$ 4,752,306.23	66.90%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO					3	\$ 1,246,800.98	\$ 1,021,783.00	81.95%
11	ESTRADAS E PONTES	26	\$ 49,523,367.01	\$ 37,405,326.22	75.53%	54	\$ 51,675,764.21	\$ 30,459,788.57	58.94%
12	FLOOD CONTROL	3	\$ 1,338,610.18	\$ 592,001.00	44.23%	13	\$ 4,716,965.89	\$ 3,144,349.67	66.66%
13	IMPRESTIMO								
14	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA								
15	IRIGASAUN								
16	JUVENTUDE NO DESPORTU					7	\$ 1,364,930.47	\$ 823,862.09	60.36%
17	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	\$ 1,507,681.83	\$ 960,246.38	63.69%	22	\$ 2,391,462.19	\$ 1,266,794.14	52.97%
18	PORTOS					2	\$ 846,710.87	\$ 503,309.32	59.44%
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS					6	\$ 1,590,223.35	\$ 855,161.35	53.78%
20	SAUDE	4	\$ 687,870.35	\$ 625,648.16	90.95%	15	\$ 3,472,985.12	\$ 2,148,989.56	61.88%
21	SEGURANCA NASIONAL								
22	SEGURANCA NO DEFESA					2	\$ 10,771,998.20	\$ 174,219.47	1.62%
23	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
24	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
25	TURISMO					4	\$ 657,804.36	\$ 489,810.84	74.46%
	Grand Total	75	\$ 133,791,978.38	\$ 110,985,977.86	82.95%	258	\$ 127,354,640.87	\$ 63,840,928.02	50.13%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	4	\$ 448,959.83	\$ 146,375.20	32.60%	3	\$ 815,564.95	\$ 286,056.46	35.07%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 585,351.48	\$ 237,897.44	40.64%	8	\$ 2,714,339.43	\$ 1,316,497.04	48.50%
8	EDUKASAUN	23	\$ 3,012,002.58	\$ 1,006,434.79	33.41%	18	\$ 2,166,673.93	\$ 727,735.02	33.59%
9	ELÉCTRICIDADE	9	\$ 6,825,025.51	\$ 5,788,150.06	84.81%	2	\$ 1,026,193.79	\$ 718,131.88	69.98%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	12	\$ 14,534,946.18	\$ 8,785,394.34	60.44%	26	\$ 35,620,706.11	\$ 26,587,220.49	74.64%
12	FLOOD CONTROL								
13	IMPRESTIMO								
14	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA								
15	IRIGASAUN								
16	JUVENTUDE NO DESPORTU								
17	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	4	\$ 1,124,835.61	\$ 366,144.79	32.55%	3	\$ 601,385.25	\$ 427,245.95	71.04%
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS								
20	SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 833,388.12	81.48%	2	\$ 373,420.03	\$ 261,012.83	69.90%
21	SEGURANCA NASIONAL								
22	SEGURANCA NO DEFESA								
23	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
24	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
25	TURISMO					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
						1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
	Grand Total	61	\$ 27,553,970.61	\$ 17,163,784.74	62.29%	64	\$ 43,821,802.01	\$ 30,756,752.00	70.19%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Líquida				Manatuto			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	2	\$ 91,877.21	\$ 80,662.08	87.79%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
3	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 293,629.77	\$ 167,315.56	56.98%	1	\$ 162,377.94	\$ 67,961.57	41.85%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 210,635.04	\$ -	0.00%	9	\$ 1,430,360.48	\$ 619,459.73	43.31%
8	EDUKASAUN	19	\$ 2,649,444.03	\$ 580,570.33	21.91%	12	\$ 1,236,740.28	\$ 522,537.94	42.25%
9	ELÉCTRICIDADE	8	\$ 7,578,728.67	\$ 2,137,054.62	28.20%	2	\$ 1,076,003.44	\$ 845,364.30	78.57%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	29	\$ 15,553,331.56	\$ 9,716,655.22	62.47%	20	\$ 16,629,163.58	\$ 12,215,152.82	73.46%
12	FLOOD CONTROL					1	\$ 242,560.14	\$ 154,455.92	63.68%
13	IMPRESTIMO					4	\$ 115,112,106.35	\$ 99,963,579.46	86.84%
14	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA								
15	IRIGASAUN								
16	JUVENTUDE NO DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
17	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	6	\$ 1,070,017.57	\$ 867,928.26	81.11%	2	\$ 157,560.52	\$ 66,113.10	41.96%
18	PORTOS	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS								
20	SAUDE	4	\$ 433,364.88	\$ 313,531.42	72.35%	7	\$ 840,178.96	\$ 548,892.37	65.33%
21	SEGURANCA NASIONAL	1	\$ 58,107.88	\$ 50,129.80	86.27%				
22	SEGURANCA NO DEFESA								
23	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
24	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
25	TURISMO	2	\$ 500,373.00	\$ 104,500.00	20.88%	2	\$ 305,556.27	\$ 87,571.99	28.66%
	Grand Total	77	\$ 29,834,259.61	\$ 14,675,623.21	49.19%	63	\$ 140,080,038.04	\$ 117,075,332.93	83.58%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					1	\$ 1,100,000.00	\$ 600,000.00	54.55%
2	AGRICULTURA					1	\$ 69,978.38	\$ 67,978.38	97.14%
3	AGUA E SANEAMENTO	5	\$ 444,587.79	\$ 184,573.83	41.52%	6	\$ 7,557,238.90	\$ 4,833,544.42	63.96%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL					1	\$ 79,200.00	\$ 30,096.00	38.00%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					6	\$ 27,104,043.03	\$ 17,770,511.90	65.56%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 610,160.22	\$ 479,253.23	78.55%	3	\$ 776,166.05	\$ 440,736.13	56.78%
8	EDUKASAUN	16	\$ 5,647,411.17	\$ 422,892.46					
9	ELÉCTRICIDADE	6	\$ 3,946,641.94	\$ 3,004,275.07	76.12%	1	\$ 46,872,339.00	\$ 29,682,899.05	63.33%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO					2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	91.99%
11	ESTRADAS E PONTES	24	\$ 14,260,134.18	\$ 9,552,575.09	66.99%	7	\$ 14,526,729.98	\$ 11,357,827.98	78.19%
12	FLOOD CONTROL	4	\$ 514,865.29	\$ 285,700.13	55.49%				
13	IMPRESTIMO					1	\$ 48,314,975.87	\$ 35,849,928.14	74.20%
14	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA					1	\$ 173,608.24	\$ 49,478.35	28.50%
15	IRIGASAUN								
16	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 23,697.55	\$ 21,127.51	89.15%	1	\$ 1,636,624.69	\$ 925,534.68	56.55%
17	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	11	\$ 3,615,130.78	\$ 2,590,267.71	71.65%				
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS					2	\$ 902,708.00	\$ 681,929.60	75.54%
20	SAUDE	3	\$ 361,691.07	\$ 336,547.64	93.05%	1	\$ 254,727.00	\$ 22,925.43	9.00%
21	SEGURANCA NASIONAL								
22	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 76,149.37	\$ -	0.00%				
23	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					2	\$ 5,291,216.00	\$ 3,915,113.84	73.99%
24	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 536,957.37	\$ 524,347.13	97.65%	1	\$ 74,828.00	\$ -	0.00%
25	TURISMO	1	\$ 48,998.46	\$ 15,892.08	32.43%	1	\$ 225,573.00	\$ -	0.00%
	Grand Total	77	\$ 30,086,425.19	\$ 17,417,451.88	57.89%	38	\$ 158,323,210.88	\$ 109,322,345.26	69.05%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO								
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS								
8	EDUKASAUN								
9	ELÉCTRICIDADE	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES					2	\$ 8,552,552.44	\$ 6,897,044.48	80.64%
12	FLOOD CONTROL								
13	IMPRESTIMO					1	\$ 23,853,175.70	\$ 5,593,323.50	23.45%
14	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA								
15	IRIGASAUN								
16	JUVENTUDE NO DESPORTU								
17	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN								
18	PORTOS								
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS								
20	SAUDE								
21	SEGURANCA NASIONAL								
22	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%				
23	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
24	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
25	TURISMO								
Grand Total		4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 50,077,257.10	58.62%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Viqueque				Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	3	\$ 5,472,502.45	\$ 4,232,344.51	77.34%	14	\$ 8,053,691.31	\$ 5,172,847.65	64.23%
3	AGUA E SANEAMENTO					44	\$ 13,388,528.38	\$ 7,672,083.87	57.30%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL					6	\$ 291,250.00	\$ 50,806.00	17.44%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					8	\$ 28,892,964.93	\$ 18,382,405.93	63.62%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	28	\$ 4,530,205.61	\$ 1,032,259.99	22.79%	156	\$ 52,406,869.08	\$ 22,362,041.32	42.67%
8	EDUKASAUN					213	\$ 30,610,619.25	\$ 8,650,585.68	28.26%
9	ELÉCTRICIDADE	4	\$ 2,296,509.09	\$ 1,504,022.77	65.49%	93	\$ 147,437,716.54	\$ 98,875,547.63	67.06%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO					5	\$ 4,610,055.72	\$ 4,115,624.36	89.27%
11	ESTRADAS E PONTES	34	\$ 58,060,561.11	\$ 27,883,059.63	48.02%	335	\$ 376,227,472.85	\$ 237,932,556.58	63.24%
12	FLOOD CONTROL					28	\$ 7,495,651.49	\$ 4,312,207.18	57.53%
13	IMPRESTIMO					18	\$ 409,183,023.24	\$ 318,712,497.09	77.89%
14	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA					1	\$ 173,608.24	\$ 49,478.35	28.50%
15	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
16	JUVENTUDE NO DESPORTU					10	\$ 5,388,229.15	\$ 3,566,368.17	66.19%
17	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	\$ 206,008.83	33.83%	90	\$ 18,969,666.77	\$ 12,365,912.55	65.19%
18	PORTOS					3	\$ 2,241,460.87	\$ 1,160,585.24	51.78%
19	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS					10	\$ 3,518,731.35	\$ 2,179,383.45	61.94%
20	SAUDE					66	\$ 11,251,498.28	\$ 7,632,143.42	67.83%
21	SEGURANCA NASIONAL					3	\$ 685,704.41	\$ 50,129.80	7.31%
22	SEGURANCA NO DEFESA					6	\$ 13,895,855.20	\$ 1,830,286.26	13.17%
23	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					2	\$ 5,291,216.00	\$ 3,915,113.84	73.99%
24	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					7	\$ 1,645,809.66	\$ 1,331,973.64	80.93%
25	TURISMO					13	\$ 2,224,058.06	\$ 1,071,687.74	48.19%
	Grand Total	71	\$ 70,968,799.31	\$ 34,857,695.72	49.12%	1136	\$ 1,217,600,935.43	\$ 829,402,036.34	68.12%

Prepara Husi :

Sanifika Husi :

Aprova Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Omai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Assistente Executivo-GADE,
ADN, I.P

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Novembro

**Projeto 13 Municipios
Por Ministério**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Alieu			Ainaro				
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL								
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	6	\$ 445,124.22	\$ -	0.00%	3	\$ 260,605.35	\$ 211,872.50	81.30%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								
12	MINISTERIO DA DEFESA								
13	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 505,151.90	\$ -	0.00%				
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	1	\$ 200,000.00	\$ 178,371.29	89.19%				
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS								
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA	36	\$ 55,926,989.27	\$ 35,160,096.09	62.87%	47	\$ 94,543,521.27	\$ 81,298,243.74	85.99%
17	MINISTERIO DO INTERIOR								
18	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU								
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	14	\$ 1,484,622.27	\$ 435,304.28	29.32%	20	\$ 2,316,678.62	\$ 649,365.21	28.03%
20	MINISTERIO FINANÇAS	1	\$ 475,000.00	\$ 256,732.50	54.05%				
21	Ministerio Koordinator Asuntlu Ekonomikus								
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 118,769.70	\$ 61,804.39	52.04%	1	\$ 489,653.83	\$ 229,243.50	46.82%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS					1	\$ 7,700.00	\$ 6,930.00	90.00%
25	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 775,330.57	\$ 420,342.74	54.21%	5	\$ 484,439.64	\$ 310,679.11	64.13%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	\$ 33,389.23	7.03%	1	\$ 546,598.02	\$ -	0.00%
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIU E INDUSTRIA								
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
31	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
35	SEFOPE	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSSO								
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		67	\$ 60,709,750.02	\$ 36,763,044.80	60.56%	80	\$ 98,777,773.17	\$ 82,824,886.33	83.85%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Baucau			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Bobonaro			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL								
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	7	\$ 798,108.36	\$ 328,508.66	41.16%	1	\$ 15,508.35	\$ 9,975.03	64.32%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					1	\$ 564,695.97	\$ 221,586.70	39.24%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								
12	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 316,447.42	\$ 315,897.63	99.83%	4	\$ 468,728.90	\$ 226,029.69	48.22%
13	MINISTERIO DA JUSTICA					1	\$ 882,383.33	\$ 161,911.64	18.35%
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS								
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA	47	\$ 141,540,306.57	\$ 102,008,949.67	72.07%	54	\$ 51,346,267.29	\$ 33,204,232.28	64.67%
17	MINISTERIO DO INTERIOR								
18	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU					2	\$ 627,596.53	\$ -	0.00%
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	31	\$ 3,743,421.04	\$ 1,622,522.50	43.34%	24	\$ 3,078,544.70	\$ 954,317.50	31.00%
20	MINISTERIO FINANÇAS								
21	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonómikus					1	\$ 190,605.25	\$ 170,009.48	89.19%
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	2	\$ 782,313.77	\$ 112,848.70	14.42%				
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 1,227,990.97	\$ 485,981.07	39.58%
25	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 748,725.31	\$ 402,304.35	53.73%	15	\$ 2,062,199.85	\$ 1,502,873.84	72.88%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 50,000.00	\$ 30,483.00	60.97%				
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
31	RADIO TELEVISAU TIMOR LESTE								
32	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ 29,956.90	42.92%				
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
35	SEFOPE								
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSSO								
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	92	\$ 148,049,115.41	\$ 104,851,471.41	70.82%	105	\$ 60,464,521.14	\$ 36,936,917.23	61.09%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Ermera			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Lautem			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	100.00%				
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
6	ESTATAL								
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	\$ 66,560.00	\$ -	0.00%	2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
11	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								
12	MINISTERIO DA DEFESA								
13	MINISTERIO DA JUSTICA								
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	1	\$ 160,056.02	\$ 72,030.85	45.00%				
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS								
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA	28	\$ 22,931,967.13	\$ 15,084,264.39	65.78%	34	\$ 38,063,850.10	\$ 28,018,654.78	73.61%
17	MINISTERIO DO INTERIOR								
18	MINISTERIO EDUKASAUJ JUVENTUDE E DESPORTU								
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	23	\$ 3,012,002.58	\$ 1,006,434.79	33.41%	19	\$ 2,474,390.58	\$ 817,575.59	33.04%
20	MINISTERIO FINANÇAS								
21	Ministerio Koordinator Asuntiu Ekonómikus					1	\$ 56,783.85	\$ 45,907.81	80.85%
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 358,735.46	\$ 165,866.59	46.24%				
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 962,218.72	\$ 512,725.33	53.29%
25	MINISTERIO SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 833,388.12	81.48%	3	\$ 653,626.75	\$ 413,159.31	63.21%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUJ								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					1	\$ 710,074.64	\$ 515,876.85	72.65%
31	RADIO TELEVISAUJ TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUJ								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
35	SEFOPE					1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSSO								
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		61	\$ 27,553,970.61	\$ 17,163,784.74	62.29%	64	\$ 43,821,802.01	\$ 30,756,752.00	70.19%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Manufahi				PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	Nasional			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
		MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)			TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC										
2	Centro Nacional Chega										
3	CFP										
4	CONSELHO DA EMPRESA										
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P										
6	ESTATAL	1	\$ 292.653.74	\$	-	0.00%					
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	5	\$ 575.943.14	\$	556.747.80	96.67%	1	\$ 479.146.05	\$	397.950.03	83.05%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES						2	\$ 3.363.254.74	\$	3.093.841.36	91.99%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR										
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS										
11	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS										
12	MINISTERIO DA DEFESA						2	\$ 223.338.38	\$	97.116.78	43.48%
13	MINISTERIO DA JUSTICA						1	\$ 79.200.00	\$	30.096.00	38.00%
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS										
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS										
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA	47	\$ 22.473.418.02	\$	15.606.118.67	69.44%	15	\$ 118.022.105.80	\$	82.346.984.89	69.77%
17	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 3.961.658.78	\$	-	0.00%					
18	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 436.263.93	\$	287.969.25	66.01%					
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	15	\$ 1.685.752.39	\$	422.892.46	25.09%					
20	MINISTERIO FINANCAS										
21	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonómikus						3	\$ 6.391.216.00	\$	4.515.113.84	70.65%
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL										
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 48.998.46	\$	15.892.08	32.43%	1	\$ 74.828.00	\$	-	0.00%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS						5	\$ 26.893.218.53	\$	17.730.455.25	65.93%
25	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 433.103.27	\$	399.436.17	92.23%	1	\$ 254.727.00	\$	22.925.43	9.00%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN										
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN										
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIU E INDUSTRIA	1	\$ 178.633.46	\$	128.395.45	71.88%	2	\$ 151.885.95	\$	57.144.30	37.62%
29	PARLAMENTU NASIONAL						3	\$ 542.841.24	\$	63.126.05	11.63%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA										
31	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE										
32	SAMES										
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN										
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU						1	\$ 1.636.624.69	\$	925.534.68	56.55%
35	SEFOPE						1	\$ 210.824.50	\$	40.056.65	19.00%
36	TRADE INVEST										
37	TRIBUNAL RECUSSO										
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE										
Grand Total		77	\$ 30.086.425.19	\$	17.417.451.88	57.89%	38	\$ 158.323.210.88	\$	109.322.345.26	69.05%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Viqueque				GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC					1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	100.00%
2	Centro Nacional Chega					1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
3	CFP					3	\$ 190,090.64	\$ 119,464.90	62.85%
4	CONSELHO DA EMPRENSA					1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
5	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P					1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
6	ESTATAL					1	\$ 292,653.74	\$ -	0.00%
7	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	2	\$ 355,840.92	\$ 322,956.45	90.76%	43	\$ 4,917,942.57	\$ 2,557,874.41	52.01%
8	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					12	\$ 14,487,230.67	\$ 7,871,882.61	54.34%
9	IGREJA PROTESTANTE TIMOR					3	\$ 182,074.26	\$ 150,824.94	82.84%
10	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
11	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS					1	\$ 512,279.04	\$ -	0.00%
12	MINISTERIO DA DEFESA	3	\$ 5,472,502.45	\$ 4,232,344.51	77.34%	19	\$ 8,566,442.56	\$ 5,483,675.25	64.01%
13	MINISTERIO DA JUSTICA					16	\$ 5,071,754.70	\$ 3,017,093.14	59.49%
14	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					8	\$ 899,319.17	\$ 516,704.14	57.46%
15	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS					2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
16	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA	40	\$ 60,966,091.25	\$ 29,593,091.23	48.54%	592	\$ 975,048,941.35	\$ 682,535,987.40	70.00%
17	MINISTERIO DO INTERIOR					1	\$ 3,961,658.78	\$ -	0.00%
18	MINISTERIO EDUKASAU JUVENTUDE E DESPORTU					9	\$ 12,321,278.76	\$ 596,827.15	4.84%
19	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	20	\$ 2,379,145.51	\$ 393,227.62	16.53%	239	\$ 30,324,267.15	\$ 9,558,898.47	31.52%
20	MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 482,583.06	\$ 263,331.74	54.57%
21	Ministerio Koordinator Asuntus Ekonomikus					5	\$ 6,638,605.10	\$ 4,731,031.13	71.27%
22	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					1	\$ 119,578.85	\$ 110,325.82	92.26%
23	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 275,004.50	\$ 2,911.53	1.06%	12	\$ 3,991,501.52	\$ 1,465,014.12	36.70%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS	2	\$ 242,346.13	\$ -	0.00%	23	\$ 31,068,261.25	\$ 19,654,605.87	63.26%
25	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 327,232.66	\$ 163,850.75	50.07%	77	\$ 13,360,426.00	\$ 8,884,455.95	66.50%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	\$ 805,366.41	\$ 149,313.64	18.54%	6	\$ 2,694,349.02	\$ 895,135.76	33.22%
27	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUIN					9	\$ 74,921,262.05	\$ 68,491,359.28	91.42%
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA					14	\$ 2,266,168.79	\$ 792,327.30	34.96%
29	PARLAMENTU NASIONAL					2	\$ 69,221.96	\$ 27,033.43	39.05%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					2	\$ 1,266,687.38	\$ 1,015,299.68	80.15%
31	RADIO TELEVISAUIN TIMOR LESTE					1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
32	SAMES					1	\$ 69,792.94	\$ 29,956.90	42.92%
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUIN					2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					8	\$ 5,321,672.26	\$ 3,514,595.85	66.04%
35	SEFOPE					5	\$ 1,156,831.47	\$ 753,757.16	65.16%
36	TRADE INVEST					1	\$ 37,562.90	\$ 18,900.89	50.29%
37	TRIBUNAL RECUSSO					4	\$ 12,092,434.96	\$ 3,890,689.93	32.17%
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE					7	\$ 4,122,424.25	\$ 2,026,832.22	49.17%
Grand Total		71	\$ 70,968,799.31	\$ 34,857,695.72	49.12%	1136	\$ 1,217,600,935.43	\$ 829,402,036.34	68.12%

Prepara Husi:

Santika Husi:

Apriva Husi:

(Eng. Trifânia Ciolândia Guterres Omal)
Ekipa Validasau e Base de Dados,
ADN, I.P.

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Assistente Executivo-GADE,
ADN, I.P.

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
39	SAND CONE TEST			2 SET	2	-	COMPLETO PASIR HOTU, MARETA NO KANURU MAK A'AT
40	CORE DRILLING MACHINE INCLUDED DIAMOND BIT		RD TL - 10889/2020 - 10890/2020	2 UNIT	2	-	IDA A'AT IDA RODA MAK LA DIAK 'NO BE'E SAI LA DUN DIAK
41	REBAR DETECTION SYSTEM + CONCRETE COVER METER		RD TL - 10897/2020 - 10906/2020	3 UNIT	3	-	COMPLETO
42	REFLUX EXTRATOR TEST		RD TL- 10894/2020	2 SET	2	-	COMPLETO PEMANAS LA DIAK NO KONDISAUN A'AT



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
43	CURRENT METER		RDTL - 10896/2020	1 SET	1		COMPLETO
44	HANDELD GPS		RDTL -10897/2020 - 10906/2020	10	10	-	COMPLETO
45	SINGLE RANGE METRIC ELECTRONIC BALANCE			1	1	-	COMPLETO NIA CAS MAK LA IHA
46	BENGKLEMAN BEAM			1 SET	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
47	PENETRATION TEST			2 SET	2	-	COMPLETO
48	DUCTILITY MACHINE			1	1	-	COMPLETO
49	WATERBATH – 1450 WATT			1 SET	1	-	COMPLETO DOBRALISA HO REDI MAK A'AT (KONDISAUN A'AT)
50	THING WALL DIAMON 3 INCH RESETTABLEK TYPE DILENGKAPI EXPANDING ADAPTER (KIIK)			4 BH	4	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
51	THIN WALL DIAMOND (BOOT)			3 BH	1	2	COMPLETO
52	MARSHALL TEST		RDTL- 12502/2020	1 SET	1	-	COMPLETO NIA PARFUJU NO BESI KAIT MAK DOL (KONDISAUN A'AT)
53	CENTRIFUGAL EXTRACTOR TEST SET			1 SET	-	1	A'AT TAMBA AKONTESE AHI HAN LAB
54	VACUUM STAND (GMM)			1 SET	1	-	COMPLETO KRAN TORNEIRA A'AT NO NIA OLI MESIN MAK HOTU (MANUTENSAUN)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
55	COMPRESSION MACHINE			1 UNIT	1	-	COMPLETO JARUM DEAL MAK LA DIAK NO OLI HYDROLIT MAK MENUS (MANUTENSAUN)
56	TIME OF SETTING OF HIDRAULIK CEMENT BY VICAT NEEDLE		RDTL - 12507/2020	4 SET	4	-	COMPLETO
57	UNIT WEIGHT (ALAT PENAKAR BULK DENSITY TEST) YIELD BUCKET 2.8 LTRS YIELD BUCKET 9.3 LTRS			1 SET	1	-	COMPLETO (Boot 1 & kiik 1)
58	SOIL SODIUM & SAUNITY TEST			1 SET	1		COMPLETO UJA HOTU



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
59	SETTING TIME BY PENETRATION RESISTANCE			1 SET	1	-	COMPLETO
60	CYLINDER SPECIMENT CAPPING SET			1 UNIT	1	-	COMPLETO (Diameter 15 ida & Diameter 10 ida)
61	CONCRETE BEAM MOLD			4 PCS	4	-	COMPLETO




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
62	HYDRAULIC CONCRETE BEAM TESTING MACHINE		RDTL - 12493/2020	1 UNIT	1	-	COMPLETO
63	ABRASSION MACHINE		RDTL - 12491/2020	1 SET	1	-	COMPLETO BAUT TUTUPAN MAK DOL (MANUTENSAUN)
64	HYDROMETER ANALYSIS TEST SET		RDTL - 11000/2020	1 SET	1	-	COMPLETO (BAHAN KIMIA HOTU SODIUM HEXA IHA 2014)
65	SAND EQUIVALENT TEST SET			1 SET	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
66	SAMPLE EJECTOR 6"		RDTL - 12492/2020	1 SET	1	-	COMPLETO (MANUTENSAUN)
67	CENT O GRAM BALANCE 311 G CAP X 0.01 GR SENSITIVITY			1 UNIT	1	-	COMPLETO
68	DESSICATOR			1 UNIT	1	-	COMPLETO
69	DIGITAL BALANCE 6000 G		RDTL - 404245159/2020	1 UNIT	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
70	ADJUSTABLE WRENCH (KUNCI INGGRIIS BOOT & KIIK)			2 UNIT	2	-	COMPLETO
71	FLAKINESS GAGUE		RDTL - 12499/2020	1 SET	1	-	COMPLETO
72	ELONGATION INDEX		RDTL - 12500/2020	1 SET	1	-	COMPLETO
73	METER DORONG			2 PC	1	1	IDA (1) CONDISAUN A'AT ENTREGA ONA BA LOGISTIC



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
74	SAMPLE SPLITER (FA) FINE AGGREGATE ¼ * 32		RDTL - 12498/2014	1 SET	-	1	STEING LISTH (A'AT)
75	SAMPLE SPLITER (CA) COARSE AGGREGATE SAMPLE SPLITER "1"		RDTL - 12496/2014	1 SET	1	-	COMPLETO
76	SAMPLE SPLITER "1/2"		RDTL - 12497/2014	1 SET	1	-	COMPLETO
77	CAT PILOX			1 DOS	-	-	UJA HOTU




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
78	FARDA LAB			4 UNIT	3	-	FALTA IDA (1)
79	MASKER, KACA MATA, RAMBU-RAMBU			4 SET	-	-	A'AT HOTU / UJA HOTU
80	SINGLE RANGE ELECTRONIC BALANCE 5000 G			1 UNIT	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
81	CALIBRATION ANVIL			1 UNIT	1	-	COMPLETO
82	CBR LAB TEST SET		RDTL - 12505/2020	1 SET	1	-	COMPLETO MANUTENSAUN
83	GELAS UKUR 1000 ML			3 SET (6)	5	1	COMPLETO IDA MAK RAHUN
84	GELAS UKUR 100 ML			1 UNIT	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
85	GELAS UKUR 500 ML			1	1	-	COMPLETO
86	ARMARI BESI			4 UNIT	4	-	COMPLETO (DOUBLE LIST)
87	GELAS UKUR 1000 ML			3 SET (6)	5	1	COMPLETO IDA MAK RAHUN
88	CBR ON SITE			1 SET			KOMPLETO NO KONDISAUN DIAK



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
89	METRO 10 M x 33 FT			2	-	-	LAKON
90	METRO 3M			1	1	-	COMPLETO
91	BRIKET TEST			1 SET			KONDISAUN LA DUN DIAK




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

92	KERUCUT CONE & TAMPER			1 SET			KONDISAUN DIAK
93	KERANJANG KAWAT SAMPLE BASKET			1 SET			KONDISAUN DIAK
94	WADAH PEMBESAR SAMPLE TANAH			4			KONDISAUN DIAK
95	LIQUIT LIMIT DEVICE			1 SET			KONDISAUN DIAK




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

96	MORTAR MIXER			1 SET			KONDISAUN DIAK
97	KOMPOR+ TABUNG GAS 12 KG			1 SET			KONDISAUN DIAK
98	ACRILYC TEMPAT SAMPEL TULANGAN			1			KONDISAUN DIAK
99	MEJA LABORATORIUM 530 x 75 x 85 CM			2			KONDISAUN DIAK




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
100	MEJA LABORATORIUM 240 x 120 x 85 CM			2			KONDISAUN DIAK

Aneksu C

Lista Ekipamentus no Mesuramentu Mecânica e Elétrica

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	Naran Ekipamentus or Mesuramento	Funsaun	Qty (unit)	Kondisaun
1	Digital AVO Meter 	Sukat: - Voltajen (Voltagen) - Korrente Eletrica (Corrente) - Rejistencia (Resistencia)	1	Diak
2	Ultrasonic Thickness Gauge 	Sukat mahar (Daimeter) husi Poste eletricidade no material besi seluk	3	Diak
3	Clamp meter/tang amper(AC/DC) 	Sukat Arus Beban	2	Diak
4	Hypsometer 	Atu sukat Distancia Horijontal no vertikal	2	Diak
5	Film/Coating Thickness Gauge 	Sukat mahar (Daimeter) husi tinta (Galvanize) poste nian	2	Diak

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	Naran Ekipamentus or Mesuramento	Funsaun	Qty (unit)	Kondisaun
6	Digital Insulation Resistance Tester & Multitester 	Sukat Rejistencia Isolasi husi Fiu	2	Diak
7	Power Analyser 	Sukat ka Analiza Daya (W, VA, Whr), Power Factor, Voltajen no Arus	2	Diak
8	Earth Tester 	Atu sukat Rejistencia husi ligasaun Grounding	2	Diak
9	High Voltage Insulation Tester 	Sukat Isolasi Voltajen Alta Tensaun nian	1	Diak

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	Naran Ekipamentus or Mesuramento	Funsaun	Qty (unit)	Kondisaun
10	Megger 	Sukat Rejistencia Instalasaun fasa R - S - T, N & G, wainhira atu hatama Enerjia	2	Diak
11	Toolkit Box	Fatin atu Guarda ekipamentu alat ukur	2	Diak
12	Measure Tape 50 m 	Sukat Distancia	1	Diak
13	Measure Taoe 5m 	Sukat Distancia	1	Diak
14	Measure wheel 	Sukat Distancia	1	Diak

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	Naran Ekipamentus or Mesuramento	Funsaun	Qty (unit)	Kondisaun
15	Handy Talky (HT) 	Uja ba komunikasaun	2	Diak
16	Caliper 	Sukat mahar (Diameter) husi Poste eletricidade no material besi seluk	1	Diak
17	GPS 	Rekolha pontu kordinado fatin projetu	1	Diak
18	binoculars/Terompong 	Hare koneksaun no asesores iha poste tutun	2	Diak

Aneksu D

Checklist Completidade & Validasaun Dokumentus Teknika

Fund :		CHECKLIST No. 1 (Public Building)		Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:			
Objective:		Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verification Date:	
Stage:		Verification Request, Phase 1 (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:	
Project Location:		a) District:		c) Village:	
		b) Sub-district:			
Item for Verification		Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items	
A. DRAWING					
Architectural Drawing					
1	Cover Page				
2	Table of Contents				
3	Point of Coordinates, or Site Plan	Validation of the Project Site & Status of the Land.			
4	Topography				
5	Layout	Benefits, and Objective of the Building.			
6	3D View (Optional)				
7	Floor Plan				
8	Existing Plan & New Plan (for building rehabilitation only)				
9	Building Front View				
10	Building Rear View				
11	Building Left/Right View				
12	Section (Transverse and Longitudinal)				
13	Roof Plan (Top View)				
14	Roof Frame				
15	Ceiling Plan				
16	Ceiling Frame				
17	Ceiling Details				
18	Door/Window Plan				
19	Door/Window Details				
20	Tile Plan				
21	Architectural Details (for ornaments and other architectural works)				
22	Architectural Details for Doors & Windows				
23	Access for Disability				
Structural Drawing					
1	Foundation Plan				
2	Sloof / Ground Beam Plan				
3	Column Plan				
4	Beam/Top Beam Plan				
5	Slab Plan				
6	Structural Section (for more than 1 storey building)				
7	Foundation Details	Reinforced Concrete Schedule.			
8	Sloof/Ground Beam Details	Reinforced Concrete Schedule.			
9	Column Details	Reinforced Concrete Schedule.			
10	Top Beam Details	Reinforced Concrete Schedule.			
11	Slab Details	Reinforced Concrete Schedule.			
12	Stairs Details	Reinforced Concrete Schedule.			

CHECKLIST No. 1 (Public Building)				Verified by:	Validated by:
Fund :	Project Name:				
Program:	Items/checklist necessary for verification by UAP team			Verification Date:	
Objective:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)			Project Owner:	
Stage:	a) District:			c) Village:	
Project Location:	b) Sub-district:				
Item for Verification		Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items	
	13 Roof Details (Truss Details)				
	14 Other Structural Details If Needed	Reinforced Concrete Schedule.			
B STRUCTURAL ANALYSIS					
1	Soil Investigation Report (For more than 1 storey building)	Sondir, or Boring.			
2	Structural Analysis Using Software (STAAD, SAP2K, ETABS, etc)				
2.1	Design Criteria	General Description of Structure, Structure System, Design Standard and References, Material Property, Load and Load Combinations, Modelling and Structural Analysis.			
2.3	Structural Member Design	Truss design if there is construction, Reinforced Concrete Beam Design, Reinforced Concrete Column Design, Foundation Analysis Design, and Concrete Slab Design.			
C BILL OF QUANTITY (BoQ)					
1	Bill of Quantity (BoQ)	BoQ, Overhead.			
2	Time Schedule (S Curve)				
3	Unit Price Analysis				
4	Basic Price	Reference of Local Material/Quarry & Manufacturing Resource & Cost			
5	Back Up Quantity				
6	Technical Specification				
D MECHANICAL AND ELECTRICAL					
1	Layout				
1.1	Lighting	Safety, comfort & Function.			
1.2	Soaked Outlets	Safety, comfort & Function.			
1.3	Other Material M/E	Safety, comfort & Function.			
2	Single Diagram Line				
2.1	Schedule Diagram Main Panels	Description, Connected Load, Phase, CB/MCB, Cable, Current RST & Load			
2.2	Schedule Diagram Sub Panels	Description, Connected Load, Phase, CB/MCB, Cable, Current RST & Load			
2.3	Lighting Calculation Summary	Service Area, WLH, Working Plan, Vertical Distance, Lux, Room, etc (see ADN, I.P. Format)			
2.4	Demand & Connected Load Summary	Description, Connected Load, Current, Demand Factor & Demand Load.			
2.5	Panel Details, MDP & SDP	Technical Specification.			
3	System Protection	Details & Specification of Arrester, Grounding, Lightning Protection, etc			
4	Main Power Supply 220/380 V & 20 KV	Low Voltage/Average Voltage , and Approval by EDTL, I.P.			
5	Standard, Reference, Consideration & Literature	Related to the Referred Works.			
E TIC					
1	Local Area Network, Metropolitan Area Network, Wide Area Network				

Fund :		CHECKLIST No. 1 (Public Building)		Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:			
Objective:		Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verification Date:	
Stage:		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:	
Project Location:		a) District:	b) Sub-district:	c) Village:	
Item for Verification		Point for Verification		Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
1.1	General Requirement	Study and Assessment, Data, Voice, Data Center, Security System and Software.			
1.2	Specific Requirement	Layout of Data, Voice, Security System, software Specification, Technical Specification, and Bill of Quantity.			
2	Software Application and Design				
2.1	User Requirement	Describe Plans and Needs of the Project Owner.			
2.2	System Requirement Study	Initial Assessment by the Project Owner regarding system Requirement Study Corresponding to the Owner's User Requirement			
2.3	Detailed Specification	Cost of Each Line Item Described in the System Requirement Study.			
F PLUMBING AND SANITATION					
1	Pipe Installation Plan				
1.1	Clean Water Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
1.2	Waste Water Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2	Detailed Drawing				
2.1	Toilet/WC	Outlet, Dimension, Inclined Pipe Installation & Construction Drawing and Absorption.			
2.2	Septic Tank and Infiltration	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.3	Floor Drain	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.4	Urinoir	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.5	Wastafel	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.6	Kitchen Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.7	Drain Detail	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.8	Rain Water Detail	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.9	Vent Pipe Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.1	Isometric Waste Pipe	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.1	Isometric Clean Water Pipe	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
G	All hard copy, and electronic copy files (excel file for cost estimates, backup quantity & AutoCad for drawing).				

Fund :		CHECKLIST No. 2 (Bridge)			Verified by	Validated by
Program		Project Name				
Objective	Items/checklist necessary for verification by UAP team			Verification Date		
Stage	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)			Project Owner		
Project Location	a) District :		b) Sub district :	c) Village:		
	Item for Verification			Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
A Drawing						
1	Cover Page	Owner's logo, Project Name, Designer, Location, etc.				
2	Approval Sheet	Signatures (Designer & Owner).				
3	Table of Contents	Drawing list.				
4	Standard Drawings	Typical drawings of bridge.				
5	Structural Notes	Load standards, and Material used.				
6	General Notes	Load standards, and Material used.				
7	Location Map	Position of the bridge including the coordinates point.				
8	Legends and Abbreviations					
9	Topography	Contour lines, and Bench Marks (BM).				
10	Plan, Elevation and Details	Bridge layout, elevations, and section drawings of bridge.				
11	Foundation Plan & Details of Bridge	Type, Dimensions, Layout, and Depth.				
12	Sub Structure Plan & Details of Bridge	Layout, Dimensions, Reinforcement Details & Bar Bending Schedule.				
13	Super Structure Plan & Details of Bridge	Dimensions, reinforcement details & bar bending schedule.				
14	Drainage Plan & Details of Bridge	Layout, dimensions, reinforcement details & bar bending schedule.				
15	Construction Method	Method of works to be used in constructing the bridge.				
16	Bridge Accessories	Guide Post, Bridge Illumination, Railings, etc.				
17	Access Road Plan	Cross section, Elevation, Foundation and Pavement Details.				
18	River Training Plan & Details	Layout, Sections, Details.				
19	3D Views (Optional)					
B Cost Estimation		Owner's approval.				
1	Back Up Quantity Computation	Signatures (Designer & Owner).				
2	Unit Price Analysis	Signatures (Designer & Owner).				
2.1	Reference of Local Material/Quarry	Quarry map, Capacity, and Distance to the Project Site.				
2.2	Reference of Manufacture Resource & Cost	Reference of Imported Materials Basic Price, and Delivery Cost.				
2.3	Transportation Rate	From Supply Point to the Project Site.				
3	Overhead					

Fund :		CHECKLIST No. 2 (Bridge)				Verified by	Validated by
Program		Project Name					
Objective	Items/checklist necessary for verification by UAP team					Verification Date	
Stage	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)					Project Owner	
Project Location	a) District : b) Sub district :					c) Village:	
	Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items			
C	Time Schedule (S-Curve)	Signatures (Designer & Owner).					
D	Design Report	Design Criteria, Studies Conducted, Design Result, etc.					
E	Bidding Documents						
F	Technical Specification						
G	All hard copy, and electronic copy files (excel file for cost estimates, backup quantity & AutoCad for drawing).						

Fund:		CHECKLIST No. 3 (Roads- New and Rehabilitation)				Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:		Verification Date:			
Objective:		Items/checklist necessary for verification by UAP team		Project Owner:			
Stage:		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:			
Project Location:		a) District:		b) Sub-district:		c) Village:	
Item for Verification		Point for Verification		Verify (Yes/No)		Comments for unavailable items	
A	Drawing						
1	Cover Page						
2	Approval Sheet						
3	Table of Content						
4	Standard Drawing						
	4.1 Location Map	Status of the Land					
	4.2 Legend & Abbreviations						
	4.3 General Notes						
	4.4 Typical Roadway Cross Sections						
	4.5 Standard Drawing of Road Geometric Design						
	4.6 Typical Drawing of Drainage and Slope Protection Structures						
	4.7 Standard Drawing & Detail of Miscellaneous Structures						
5	Schedule						
	5.1 Schedule of Drainage & Slope Protection Structures						
	5.2 Schedule of Miscellaneous Structures						
	5.3 Schedule of Intersections						
6	Plan & Profile						
7	Cross Sections						
8	Drainage Cross Sections						
9	Structures						
	9.1 General notes						
	9.2 Detailed Drawing of structures						
10	Bio Engineering						
	10.1 Bio Engineering Schedule						
	10.2 Bio Engineering Details						
11	Intersection Details						
12	Road Marking Plan						
13	Other Plan and Details						
14	Appendix						

Fund:		CHECKLIST No. 3 (Roads- New and Rehabilitation)				Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:		Verification Date:			
Objective:		Items/checklist necessary for verification by UAP team		Project Owner:			
Stage:		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:			
Project Location:		a) District:		b) Sub-district:		c) Village:	
Item for Verification		Point for Verification		Verify (Yes/No)		Comments for unavailable items	
B	Cost Estimation						
1	Back-Up Quantity Computation						
2	Unit Price Analysis						
2.1	Reference Price of Local Material/Quarry						
2.2	Reference Price of Material Import or Fabrication						
2.3	Transportation Rate						
3	Overhead						
C	Time Schedule (S-Curve)						
D	Technical Specification						
E	Design report						
F	Bidding documents						
G	All hard copy, and electronic copy files (excel file for cost estimates, backup quantity & AutoCad for drawing).						

CHECKLIST No. 4 (FS, DED, SC, AS & Geotechnical Investigation)				Verified by:	Validated by:
Fund :	Project Name:	Verification Date:			
Program:	Items/Checklist necessary for verification by UAP team	Project Owner:			
Objective:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)	c) Village:			
Stage:	a) District:	b) Sub-district:			
Project Location:	Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items	
A TOR Feasibility Study					
TOR should follow MPS FS Guidelines					
1	Objective of Project				
2	Background				
3	Scope of Works				
3.1	General Requirement of FS				
3.2	Specific Request				
3.3	Cooperation				
3.4	Responsibility of the Government				
3.5	Services and Facilities provided by the Employer				
4	Assignment of Experts				
4.1	Period of FS				
4.2	Assignment of Experts				
5	Reports and documents				
5.1	Reports to be submitted	Inception Report, Monthly Progress Report, Draft Final Report, and Final Report.			
5.2	Contents of Reports				
5.3	Reports copy number and submission date				
5.4	Attachment to study report	Checklist for Survey / Investigation and Study, Sample table of rough cost estimate, Location map, etc.			
6	Outline of Project				
B TOR Detailed Engineering Design					
1	Introduction				
1.1	Definitions	Name of Activity, Project Owner, Management of Activities, Procurement Process & Design Consultant.			
1.2	Background				
1.3	Objective				
1.4	Scope of Service				
1.5	Project Location	Location map (with coordinates, if necessary) & Status of the Land.			
2	Scope of Works				
3	Responsibilities of Design Consultant				
4	Design Cost				
5	Output of Design Activities				
5.1	Inception Report				
5.2	Interim Report				
5.3	Draft Final Report				
5.4	Final Report				
6	Principle				
7	Design Criteria				
7.1	General Criteria				
7.2	Specific Criteria				
8	Design Process				
9	Design Input				
9.1	Information				
9.2	Personnel	Key experts and their experiences.			
9.3	Person-Month Requirement	Table of the person month requirement.			
9.4	Facilities Provided by the Government				
9.5	Facilities Provided by the Consultant				
10	Payment	Schedule of payment to be paid for the Design Consultant.			
11	Work Program				
12	Cost Estimation	Submitted.			

CHECKLIST No. 4 (PS, DED, SC, AS & Geotechnical Investigation)				Verified by:	Validated by:
Fund :	Project Name:	Verification Date:			
Program:	Items/Checklist necessary for verification by UAP team	Project Owner:			
Stage:	Verification Request Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)	to Village:			
Project Location:	a) District:	b) Sub-district:			
Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items		
GTOR Supervision Consultant					
1	Introduction				
1.1	Definitions		Name of Activity, Project Owner, Management of Activities, Procurement Process, and Supervision Consultant.		
1.2	Background				
1.3	Objective				
1.4	Scope of Service				
1.5	Project Location		Location map & Site plan.		
2	Scope of Works				
3	Responsibilities of Supervision Consultant				
4	Construction Supervision Cost				
5	Output of Construction Supervision Activities				
5.1	Inception Report				
5.2	Daily Record				
5.3	Daily Report				
5.4	Weekly Report				
5.5	Monthly Report				
5.6	Time Schedule				
5.7	Construction Progress Reports				
5.8	Shop Drawings				
5.9	Document of Design Changes				
5.10	Document of Quality Control				
5.11	Document of Extra Items or Extra Claims				
5.12	Minutes of Site Meeting				
5.13	Photographs				
5.14	As-built drawings				
5.15	Manuals				
5.16	Record of Commissioning				
5.17	Construction Supervision Completion Report				
6	Principles				
7	Construction Supervision Criteria				
7.1	General Criteria				
7.2	Objective Criteria				
7.3	Functional Criteria				
7.4	Procedure Criteria				
7.5	Technical Criteria				
8	Construction Supervision Process				
8.1	Preparation				
8.2	Implementation				
8.3	Consultation				
8.4	Reports				
8.5	Document				
9	Construction Supervision Input				
9.1	Information				
9.2	Personnel		Key experts and their experiences.		
9.3	Person-Month of Consulting Services		Table of the person month requirement.		
9.4	Facilities Provided by the Government of Timor-Leste				
9.5	Facilities Provided by the Supervision Consultant				
10	Work Program				
11	Payment		The type of payment to Supervision Consultant (time or progress based).		
12	Cost Estimation		Submitted.		

Dezembro

**Projeto 13 Municipios
Por Fundos
Financiamento**



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	FI				LM-CD			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	21	\$ 52,113,041.32	\$ 37,261,099.35	71.50%	19	\$ 4,550,538.63	\$ 2,159,870.98	47.46%
2	Ainaro	29	\$ 91,212,374.94	\$ 80,542,709.16	88.30%	20	\$ 4,216,180.42	\$ 1,386,012.11	32.87%
3	Baucau	31	\$ 137,746,167.40	\$ 106,017,182.86	76.97%	17	\$ 5,215,877.62	\$ 3,415,772.91	65.49%
4	Bobonaro	39	\$ 47,840,551.50	\$ 31,406,830.72	65.65%	31	\$ 7,343,352.28	\$ 3,923,984.98	53.44%
5	Covalima	32	\$ 125,305,153.33	\$ 107,872,666.80	86.09%	17	\$ 3,893,209.62	\$ 1,821,139.94	46.78%
6	Dili	66	\$ 81,552,602.60	\$ 42,108,280.31	51.63%	81	\$ 20,786,664.81	\$ 12,969,615.95	62.39%
7	Ermera	21	\$ 21,217,838.65	\$ 15,311,578.46	72.16%	10	\$ 2,536,341.41	\$ 829,766.12	32.72%
8	Lautem	14	\$ 32,905,711.12	\$ 26,741,519.95	81.27%	24	\$ 7,339,477.40	\$ 3,225,323.16	43.94%
9	Liquica	18	\$ 22,464,030.61	\$ 12,968,564.90	57.73%	25	\$ 3,314,058.24	\$ 1,736,219.29	52.39%
10	Manatuto	13	\$ 131,516,647.81	\$ 113,705,785.71	86.46%	18	\$ 4,295,931.05	\$ 2,136,645.28	49.74%
11	Manufahi	24	\$ 21,950,711.71	\$ 13,157,959.03	59.94%	19	\$ 3,122,336.26	\$ 2,274,889.72	72.86%
12	Nasional	25	\$ 108,165,134.03	\$ 78,460,249.20	72.54%	6	\$ 49,561,546.94	\$ 30,822,556.01	62.19%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%				
14	Regional	2	\$ 32,032,062.14	\$ 13,236,182.25	41.32%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
15	Viqueque	24	\$ 59,413,345.74	\$ 33,974,312.80	57.18%	23	\$ 9,038,254.98	\$ 2,139,237.74	23.67%
	Grand Total	363	\$ 967,788,694.55	\$ 714,617,489.35	73.84%	311	\$ 178,239,370.66	\$ 106,427,923.31	59.71%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	PDIM				LM-BS			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	6	\$ 445,124.22	\$ -	0.00%	4	\$ 1,568,065.11	\$ 982,502.76	62.66%
2	Ainaro	8	\$ 931,596.86	\$ 740,313.15	79.47%	3	\$ 565,845.40	\$ 527,769.63	93.27%
3	Baucau	8	\$ 863,550.68	\$ 393,950.98	45.62%	6	\$ 1,107,575.09	\$ 704,918.32	63.65%
4	Bobonaro	8	\$ 746,047.73	\$ 594,615.47	79.70%	4	\$ 860,900.42	\$ 768,255.38	89.24%
5	Covalima	3	\$ 592,720.70	\$ 576,717.26	97.30%	3	\$ 575,995.90	\$ 249,756.10	43.36%
6	Dili	7	\$ 1,054,664.27	\$ 898,320.43	85.18%	61	\$ 5,510,147.00	\$ 3,811,945.20	69.18%
7	Ermera	5	\$ 845,470.49	\$ 764,831.78	90.46%	3	\$ 367,250.73	\$ 89,239.28	24.30%
8	Lautem	2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%	6	\$ 1,103,542.01	\$ 541,687.21	49.09%
9	Liquica	5	\$ 722,133.98	\$ 321,934.29	44.58%	11	\$ 1,574,555.51	\$ 1,191,432.05	75.67%
10	Manatuto	12	\$ 1,596,152.81	\$ 1,163,062.73	72.87%	6	\$ 1,160,391.31	\$ 516,239.85	44.49%
11	Manufahi	10	\$ 1,450,922.99	\$ 1,162,413.76	80.12%	5	\$ 1,464,659.68	\$ 1,024,526.15	69.95%
12	Nasional					9	\$ 1,508,152.96	\$ 888,182.62	58.89%
13	Oe-cusse								
14	Regional					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
15	Viqueque	2	\$ 355,840.92	\$ 351,445.47	98.76%	3	\$ 300,989.41	\$ 133,133.69	44.23%
	Grand Total	76	\$ 10,001,564.50	\$ 6,967,605.32	69.67%	125	\$ 18,041,736.53	\$ 11,691,153.84	64.80%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	LM-TP				Fundo Covid-19			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	\$ 1,617,454.43	\$ 744,562.01	46.03%	3	\$ 475,384.99	\$ 452,904.28	95.27%
2	Ainaro	17	\$ 1,665,991.99	\$ 509,379.36	30.58%	3	\$ 242,067.62	\$ 231,855.72	95.78%
3	Baucau	29	\$ 3,000,775.19	\$ 1,210,271.68	40.33%	1	\$ 469,360.62	\$ 396,897.54	84.56%
4	Bobonaro	23	\$ 3,106,600.00	\$ 1,144,715.56	36.85%	7	\$ 789,577.60	\$ 707,002.29	89.54%
5	Covalima	17	\$ 2,921,378.69	\$ 1,795,441.96	61.46%	4	\$ 533,488.64	\$ 467,028.49	87.54%
6	Dili	25	\$ 13,242,016.93	\$ 5,120,912.98	38.67%	8	\$ 2,054,627.67	\$ 1,248,775.21	60.78%
7	Ermera	20	\$ 2,252,742.01	\$ 961,385.11	42.68%	2	\$ 334,327.32	\$ 316,352.77	94.62%
8	Lautem	16	\$ 1,702,312.60	\$ 727,238.50	42.72%	2	\$ 373,420.03	\$ 334,169.80	89.49%
9	Liquica	15	\$ 1,246,545.83	\$ 289,076.09	23.19%	4	\$ 433,364.88	\$ 343,449.48	79.25%
10	Manatuto	10	\$ 872,256.79	\$ 185,489.61	21.27%	4	\$ 665,658.27	\$ 578,884.53	86.96%
11	Manufahi	15	\$ 1,685,752.39	\$ 673,548.96	39.96%	4	\$ 433,103.27	\$ 399,436.17	92.23%
12	Nasional								
13	Oe-cusse								
14	Regional								
15	Viqueque	19	\$ 2,031,344.83	\$ 772,626.11	38.04%				
	Grand Total	220	\$ 35,345,171.68	\$ 14,134,647.93	39.99%	42	\$ 6,804,380.91	\$ 5,476,756.28	80.49%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	Emergency				TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					67	\$ 60,769,608.70	\$ 41,600,939.38	68.46%
2	Ainaro	1	\$ 23,993.19	\$ 21,593.87	90.00%	81	\$ 98,858,050.42	\$ 83,959,633.00	84.93%
3	Baucau					92	\$ 148,403,306.60	\$ 112,138,994.29	75.56%
4	Bobonaro	1	\$ 345,314.85	\$ -		113	\$ 61,032,344.38	\$ 38,545,404.40	63.16%
5	Covalima					76	\$ 133,821,946.88	\$ 112,782,750.54	84.28%
6	Dili	27	\$ 10,592,634.27	\$ 4,389,749.89	41.44%	275	\$ 134,793,357.55	\$ 70,547,599.97	52.34%
7	Ermera					61	\$ 27,553,970.61	\$ 18,273,153.52	66.32%
8	Lautem					64	\$ 43,821,802.01	\$ 31,569,938.62	72.04%
9	Liquica	1	\$ 502,473.28	\$ 441,060.32	87.78%	79	\$ 30,257,162.33	\$ 17,291,736.42	57.15%
10	Manatuto					63	\$ 140,107,038.04	\$ 118,286,107.71	84.43%
11	Manufahi					77	\$ 30,107,486.30	\$ 18,692,773.79	62.09%
12	Nasional					40	\$ 159,234,833.93	\$ 110,170,987.83	69.19%
13	Oe-cusse					4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional					4	\$ 85,431,329.14	\$ 51,084,636.97	59.80%
15	Viqueque	1	\$ 44,219.72	\$ 39,797.75	90.00%	72	\$ 71,183,995.60	\$ 37,410,553.57	52.55%
	Grand Total	31	\$ 11,508,635.31	\$ 4,892,201.83	42.51%	1168	\$ 1,227,729,554.14	\$ 864,207,777.86	70.39%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Serifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Assistente Executivo-GADE,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariang Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Dezembro

**Projeto 13 Municipios
Por Sector**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Alieu				Ainaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	2	\$ 862,274.82	\$ 74,466.90	8.64%				
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	6	\$ 1,352,303.90	\$ 636,201.74	47.05%	6	\$ 940,813.03	\$ 493,397.99	52.44%
8	EDUKASAUN	13	\$ 1,313,542.97	\$ 527,557.73	40.16%	19	\$ 2,292,232.62	\$ 873,560.76	38.11%
9	ELÉCTRICIDADE	3	\$ 1,001,069.36	\$ 760,462.94	75.97%	10	\$ 7,999,431.74	\$ 5,762,955.29	72.04%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	22	\$ 20,163,896.81	\$ 14,943,062.61	74.11%	18	\$ 24,595,796.03	\$ 15,793,631.77	64.21%
12	FLOOD CONTROL	3	\$ 137,301.98	\$ -	0.00%	2	\$ 108,153.47	\$ 95,396.55	88.20%
13	IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL								
14	IMPRESTIMO	4	\$ 32,063,280.07	\$ 22,393,473.37	69.84%	3	\$ 59,201,316.40	\$ 58,556,522.00	98.91%
15	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA								
16	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
17	JUVENTUDE NO DESPORTU								
18	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	\$ 1,320,533.03	\$ 855,554.72	64.79%	17	\$ 3,237,083.74	\$ 2,125,236.91	65.65%
19	PORTOS								
20	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	2	\$ 1,025,800.00	\$ 642,292.50	62.61%				
21	SAUDE	3	\$ 554,052.07	\$ 433,044.79	78.16%	3	\$ 274,369.70	\$ 134,898.34	49.17%
22	SEGURANCA NASIONAL								
23	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 505,151.90	\$ -	0.00%				
24	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	2	\$ 166,490.33	\$ 117,817.80	70.77%				
25	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	2	\$ 176,533.97	\$ 91,713.67	51.95%
26	TURISMO								
Grand Total		67	\$ 60,769,608.70	\$ 41,600,939.38	68.46%	81	\$ 98,858,050.42	\$ 83,959,633.00	84.93%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	1	\$ 316,447.42	\$ 315,897.63	99.83%	4	\$ 468,728.90	\$ 229,984.60	49.07%
3	AGUA E SANEAMENTO					4	\$ 528,691.23	\$ 454,802.40	86.02%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					1	\$ 1,007,800.00	\$ 272,106.00	27.00%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	13	\$ 2,353,608.98	\$ 1,217,543.84	51.73%	8	\$ 1,240,299.69	\$ 699,506.58	56.40%
8	EDUKASAUN	31	\$ 3,743,421.04	\$ 1,841,412.21	49.19%	23	\$ 2,946,152.70	\$ 1,073,043.56	36.42%
9	ELÉCTRICIDADE	10	\$ 3,110,591.49	\$ 2,685,982.34	86.35%	8	\$ 2,152,484.95	\$ 1,666,236.37	77.41%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	24	\$ 25,966,563.53	\$ 13,970,235.65	53.80%	37	\$ 26,563,960.12	\$ 14,167,239.34	53.33%
12	FLOOD CONTROL					2	\$ 437,194.54	\$ 61,897.78	14.16%
13	IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL								
14	IMPRESTIMO	4	\$ 109,889,602.64	\$ 89,486,559.45	81.43%	1	\$ 20,748,566.21	\$ 16,829,655.23	81.11%
15	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA								
16	IRIGASAUN								
17	JUVENTUDE NO DESPORTU								
18	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	8	\$ 2,553,710.88	\$ 2,224,465.63	87.11%	3	\$ 781,244.32	\$ 570,112.50	72.97%
19	PORTOS								
20	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
21	SAUDE	1	\$ 469,360.62	\$ 396,897.54	84.56%	19	\$ 2,647,241.86	\$ 2,226,875.48	84.12%
22	SEGURANCA NASIONAL					2	\$ 627,596.53	\$ -	0.00%
23	SEGURANCA NO DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 293,944.56	33.31%
24	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
25	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
26	TURISMO								
Grand Total		92	\$ 148,403,306.60	\$ 112,138,994.29	75.56%	113	\$ 61,032,344.38	\$ 38,545,404.40	63.16%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Covallima				Dili			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%				
2	AGRICULTURA					2	\$ 1,263,645.70	\$ 191,289.49	15.14%
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	16	\$ 2,028,400.35	\$ 1,225,386.59	60.41%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL					6	\$ 284,300.00	\$ 78,204.00	27.51%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					2	\$ 1,098,317.68	\$ 716,475.96	65.23%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	9	\$ 2,585,789.57	\$ 1,715,464.76	66.34%	69	\$ 36,552,972.61	\$ 16,653,550.29	45.56%
8	EDUKASAUN	18	\$ 2,722,556.08	\$ 1,111,148.24	40.81%	22	\$ 3,236,071.31	\$ 1,561,771.53	48.26%
9	ELÉCTRICIDADE	5	\$ 2,730,729.02	\$ 1,670,874.34	61.19%	21	\$ 7,103,218.29	\$ 4,752,306.23	66.90%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO					3	\$ 1,246,800.98	\$ 1,021,783.00	81.95%
11	ESTRADAS E PONTES	26	\$ 49,523,367.01	\$ 38,141,643.84	77.02%	57	\$ 53,121,853.23	\$ 32,943,949.55	62.02%
12	FLOOD CONTROL	3	\$ 1,338,610.18	\$ 999,031.44	74.63%	15	\$ 5,868,793.50	\$ 4,423,745.59	75.38%
13	IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL					1	\$ 1,385,389.88	\$ 51,712.75	3.73%
14	IMPRESTIMO								
15	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA								
16	IRIGASAUN								
17	JUVENTUDE NO DESPORTU					7	\$ 1,364,930.47	\$ 855,828.70	62.70%
18	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	\$ 1,507,681.83	\$ 988,629.74	65.57%	23	\$ 2,413,316.15	\$ 1,286,355.68	53.30%
19	PORTOS					2	\$ 846,710.87	\$ 503,309.32	59.44%
20	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					6	\$ 1,590,223.35	\$ 855,161.35	53.78%
21	SAUDE	4	\$ 687,870.35	\$ 625,648.15	90.95%	16	\$ 3,509,010.39	\$ 2,412,483.07	68.75%
22	SEGURANCA NASIONAL								
23	SEGURANCA NO DEFESA					2	\$ 10,771,988.20	\$ 174,219.47	1.62%
24	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	1	\$ 29,968.50	\$ 18,231.33	60.83%				
25	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
26	TURISMO					4	\$ 657,804.36	\$ 489,810.84	74.46%
	Grand Total	76	\$ 133,821,946.88	\$ 112,782,750.54	84.28%	275	\$ 134,793,357.55	\$ 70,547,599.97	52.34%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	4	\$ 448,959.83	\$ 146,375.20	32.60%	3	\$ 815,564.95	\$ 286,056.46	35.07%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 585,351.48	\$ 237,897.44	40.64%	8	\$ 2,714,339.43	\$ 1,511,167.31	55.67%
8	EDUKASAUN	23	\$ 3,012,002.58	\$ 1,302,968.22	43.26%	18	\$ 2,166,673.93	\$ 997,628.41	46.04%
9	ELÉCTRICIDADE	9	\$ 6,825,025.51	\$ 5,788,150.06	84.81%	2	\$ 1,026,193.79	\$ 718,131.88	69.98%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	12	\$ 14,534,946.18	\$ 9,499,874.57	65.36%	26	\$ 35,620,706.11	\$ 26,793,569.20	75.22%
12	FLOOD CONTROL								
13	IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL								
14	IMPRESTIMO								
15	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA								
16	IRIGASAUN								
17	JUVENTUDE NO DESPORTU								
18	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	4	\$ 1,124,835.61	\$ 366,144.79	32.55%	3	\$ 601,385.25	\$ 496,363.23	82.54%
19	PORTOS								
20	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
21	SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 931,743.24	91.09%	2	\$ 373,420.03	\$ 334,169.80	89.49%
22	SEGURANCA NASIONAL								
23	SEGURANCA NO DEFESA								
24	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
25	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
26	TURISMO					1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
Grand Total		61	\$ 27,553,970.61	\$ 18,273,153.52	66.32%	64	\$ 43,821,802.01	\$ 31,569,938.62	72.04%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Liquida				Manatuto			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	2	\$ 91,877.21	\$ 80,662.08	87.79%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
3	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 293,629.77	\$ 167,315.56	56.98%	1	\$ 162,377.94	\$ 67,961.57	41.85%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS	4	\$ 333,652.02	\$ 33,401.02	10.01%	9	\$ 1,430,360.48	\$ 900,468.58	62.95%
8	EDUKASAUN	19	\$ 2,649,444.03	\$ 824,668.95	31.13%	12	\$ 1,236,740.28	\$ 537,128.14	43.43%
9	ELÉCTRICIDADE	8	\$ 7,578,728.67	\$ 3,305,765.06	43.62%	2	\$ 1,076,003.44	\$ 845,364.30	78.57%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES	29	\$ 15,853,217.30	\$ 10,853,761.67	68.46%	20	\$ 16,656,163.58	\$ 12,895,819.38	77.42%
12	FLOOD CONTROL					1	\$ 242,560.14	\$ 154,455.92	63.68%
13	IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL								
14	IMPRESTIMO					4	\$ 115,112,106.35	\$ 100,095,785.23	86.96%
15	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA								
16	IRIGASAUN								
17	JUVENTUDE NO DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
18	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	6	\$ 1,070,017.57	\$ 870,806.88	81.38%	2	\$ 157,560.52	\$ 66,113.10	41.96%
19	PORTOS	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
20	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
21	SAUDE	4	\$ 433,364.88	\$ 343,449.48	79.25%	7	\$ 840,178.96	\$ 651,195.77	77.51%
22	SEGURANCA NASIONAL	1	\$ 58,107.88	\$ 50,129.80	86.27%				
23	SEGURANCA NO DEFESA								
24	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
25	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
26	TURISMO	2	\$ 500,373.00	\$ 104,500.00	20.88%	2	\$ 305,556.27	\$ 87,571.99	28.66%
	Grand Total	79	\$ 30,257,162.33	\$ 17,291,736.42	57.15%	63	\$ 140,107,038.04	\$ 118,286,107.71	84.43%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					1	\$ 1,100,000.00	\$ 600,000.00	54.55%
2	AGRICULTURA					1	\$ 69,978.38	\$ 67,978.38	97.14%
3	AGUA E SANEAMENTO	5	\$ 444,587.79	\$ 184,573.83	41.52%	6	\$ 7,557,238.90	\$ 4,833,544.42	63.96%
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL					1	\$ 79,200.00	\$ 30,096.00	38.00%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					6	\$ 27,104,043.03	\$ 17,770,511.90	65.56%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 610,160.22	\$ 511,249.81	83.79%	3	\$ 776,166.05	\$ 440,736.13	56.78%
8	EDUKASAUN	16	\$ 5,647,411.17	\$ 673,548.96					
9	ELÉCTRICIDADE	6	\$ 3,946,641.94	\$ 3,004,275.07	76.12%	1	\$ 46,872,339.00	\$ 29,682,899.05	63.33%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO					2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	91.99%
11	ESTRADAS E PONTES	24	\$ 14,260,134.18	\$ 10,423,571.46	73.10%	8	\$ 15,248,775.01	\$ 11,965,710.31	78.47%
12	FLOOD CONTROL	4	\$ 514,865.29	\$ 285,700.13	55.49%	1	\$ 189,578.02	\$ 88,843.95	46.86%
13	IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL								
14	IMPRESTIMO					1	\$ 48,314,975.87	\$ 35,849,928.14	74.20%
15	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA					1	\$ 173,608.24	\$ 49,478.35	28.50%
16	IRIGASAUN								
17	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 23,697.55	\$ 21,127.51	89.15%	1	\$ 1,636,624.69	\$ 925,534.68	56.55%
18	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	11	\$ 3,618,830.48	\$ 2,682,017.79	74.11%				
19	PORTOS								
20	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					2	\$ 902,708.00	\$ 681,929.60	75.54%
21	SAUDE	3	\$ 361,691.07	\$ 336,547.64	93.05%	1	\$ 254,727.00	\$ 91,701.72	36.00%
22	SEGURANCA NASIONAL								
23	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 76,149.37	\$ -	0.00%				
24	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					2	\$ 5,291,216.00	\$ 3,998,253.84	75.56%
25	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 536,957.37	\$ 524,347.13	97.65%	1	\$ 74,828.00	\$ -	0.00%
26	TURISMO	1	\$ 66,359.87	\$ 45,814.46	69.04%	1	\$ 225,573.00	\$ -	0.00%
	Grand Total	77	\$ 30,107,486.30	\$ 18,692,773.79	62.09%	40	\$ 159,234,833.93	\$ 110,170,987.83	69.19%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO								
4	COMERCIO								
5	DEFESA NACIONAL								
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
7	EDIFICIOS PUBLICOS								
8	EDUKASAUN								
9	ELÉCTRICIDADE	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
10	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
11	ESTRADAS E PONTES					2	\$ 8,552,552.44	\$ 6,897,044.48	80.64%
12	FLOOD CONTROL								
13	IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL								
14	IMPRESTIMO					1	\$ 23,853,175.70	\$ 6,600,703.37	27.67%
15	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA								
16	IRIGASAUN								
17	JUVENTUDE NO DESPORTU								
18	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN								
19	PORTOS								
20	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS								
21	SAUDE								
22	SEGURANCA NASIONAL								
23	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%				
24	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
25	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
26	TURISMO								
Grand Total		4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 51,084,636.97	59.80%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Viqueque				Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	3	\$ 5,472,502.45	\$ 4,232,344.51	77.34%	14	\$ 8,053,691.31	\$ 5,176,802.56	64.28%
3	AGUA E SANEAMENTO					45	\$ 13,406,107.38	\$ 7,704,864.73	57.47%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 129,753.97	84.29%
5	DEFESA NACIONAL					7	\$ 363,500.00	\$ 108,300.00	29.79%
6	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					9	\$ 29,210,160.71	\$ 18,759,093.86	64.22%
7	EDIFICIOS PUBLICOS	29	\$ 4,745,401.90	\$ 1,921,344.98	40.49%	170	\$ 56,221,219.36	\$ 26,971,930.47	47.97%
8	EDUKASAUN					214	\$ 30,966,248.71	\$ 11,324,436.71	36.57%
9	ELÉCTRICIDADE	4	\$ 2,296,509.09	\$ 1,504,022.77	65.49%	93	\$ 147,437,716.54	\$ 100,092,727.52	67.89%
10	EQUIPAMENTO INFROMATICO					5	\$ 4,610,055.72	\$ 4,115,624.36	89.27%
11	ESTRADAS E PONTES	34	\$ 58,060,561.11	\$ 29,546,832.48	50.89%	339	\$ 378,722,492.64	\$ 248,835,946.31	65.70%
12	FLOOD CONTROL					31	\$ 8,837,057.12	\$ 6,109,071.36	69.13%
13	IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL					1	\$ 1,385,389.88	\$ 51,712.75	3.73%
14	IMPRESTIMO					18	\$ 409,183,023.24	\$ 329,812,626.79	80.60%
15	INVESTIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA					1	\$ 173,608.24	\$ 49,478.35	28.50%
16	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72	100.00%
17	JUVENTUDE NO DESPORTU					10	\$ 5,388,229.15	\$ 3,598,334.78	66.78%
18	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	\$ 206,008.83	33.83%	91	\$ 18,995,220.43	\$ 12,737,809.80	67.06%
19	PORTOS					3	\$ 2,241,460.87	\$ 1,160,585.24	51.78%
20	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					10	\$ 3,518,731.35	\$ 2,179,383.45	61.94%
21	SAUDE					69	\$ 11,428,136.35	\$ 8,918,655.02	78.04%
22	SEGURANCA NACIONAL					3	\$ 685,704.41	\$ 50,129.80	7.31%
23	SEGURANCA NO DEFESA					6	\$ 13,895,855.20	\$ 1,962,319.18	14.12%
24	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					3	\$ 5,321,184.50	\$ 4,016,485.17	75.48%
25	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					7	\$ 1,645,809.66	\$ 1,354,597.82	82.31%
26	TURISMO					14	\$ 2,321,696.72	\$ 1,107,091.24	47.68%
Grand Total		72	\$ 71,183,995.60	\$ 37,410,553.57	52.55%	1168	\$ 1,227,729,554.14	\$ 864,207,777.86	70.39%

Prepara Husi :

Será Husi :

Aprova Husi :

(Eng. Trifânia Clotária Guterres Ormai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Assistente Executivo-GADE,
ADN, I.P.

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P.

Dezembro

**Projeto 13 Municípios
Por Ministério**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Ailau			Ainaro			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)					
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL, INSTITUTO PUBLICO												
2	CAC												
3	Centro Nacional Chega												
4	CFP												
5	CONSELHO DA EMPRESA												
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	6	\$ 445,124.22	\$ -	0.00%	3	\$ 260,605.35	\$ 233,937.39					89.77%
7	ESTATAL												
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO												
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES												
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR												
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS												
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS					1	\$ 32,319.72	\$ 32,319.72					100.00%
13	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 505,151.90	\$ -	0.00%								
14	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	\$ 178,371.29	89.19%								
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS												
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	36	\$ 55,926,989.27	\$ 39,412,580.54	70.47%	47	\$ 94,543,521.27	\$ 82,008,694.94					86.74%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA												
18	MINISTERIO DO INTERIOR												
19	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	14	\$ 1,484,622.27	\$ 619,533.62	41.73%	20	\$ 2,316,678.62	\$ 895,562.16					38.66%
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	\$ 256,732.50	54.05%								
21	MINISTERIO FINANÇAS												
22	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonómiklus												
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	\$ 84,428.57	71.09%	1	\$ 489,653.83	\$ 229,243.50					46.82%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 7,700.00	\$ 6,930.00					90.00%
25	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 835,189.25	\$ 714,181.98	85.51%	5	\$ 484,439.64	\$ 336,131.40					69.39%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	\$ 118,106.60	24.87%	1	\$ 546,598.02	\$ 125,100.22					22.89%
27	MINISTERIO TRANSPORTE E KOMUNIKASAUN												
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA												
29	PARLAMENTU NASIONAL					1	\$ 80,277.25	\$ 5,481.12					6.83%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA												
31	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE												
32	SAMES												
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN												
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU												
35	SEFOPE	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55					89.59%
36	TRADE INVEST												
37	TRIBUNAL RECUSSO												
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE												
Grand Total		67	\$ 60,769,608.70	\$ 41,600,939.38	68.45%	81	\$ 96,858,050.42	\$ 83,959,633.00					84.93%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Baucau			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Bobonaro			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NASIONAL, INSTITUTO PUBLICO								
2	CAC								
3	Centro Nacional Chega								
4	CFP								
5	CONSELHO DA EMPRESA								
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P				41.16%	1	\$ 15,508.35	\$ 9,975.03	64.32%
7	ESTATAL	7	\$ 798,108.36	\$ 328,508.66		1	\$ 564,695.97	\$ 221,586.70	39.24%
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 316,447.42	\$ 315,897.63	99.83%	4	\$ 468,728.90	\$ 229,984.60	49.07%
13	MINISTERIO DA DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 293,944.56	33.31%
14	MINISTERIO DA JUSTICA								
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	47	\$ 141,540,306.57	\$ 108,385,097.30	76.58%	54	\$ 51,346,267.29	\$ 33,857,620.38	65.94%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO DO INTERIOR					2	\$ 627,596.53	\$ -	0.00%
19	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	31	\$ 3,743,421.04	\$ 1,841,412.21	49.19%	24	\$ 3,078,544.70	\$ 1,152,478.76	37.44%
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
21	MINISTERIO FINANÇAS					7	\$ 677,674.37	\$ 479,214.41	70.71%
22	Ministerio Koordinator Asuntlu Ekonómikus								
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	2	\$ 1,136,504.96	\$ 532,539.11	46.86%				
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					2	\$ 1,227,990.97	\$ 485,981.07	39.58%
25	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 748,725.31	\$ 647,185.27	86.44%	16	\$ 2,092,005.72	\$ 1,805,491.50	86.30%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
27	MINISTERIO TRANSPORTE E KOMUNIKASAUN								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 50,000.00	\$ 30,483.00	60.97%				
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
31	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
32	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ 57,871.11	82.92%	1	\$ 50,948.25	\$ 9,127.39	17.92%
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
35	SEFOPE								
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSO								
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		92	\$ 148,403,306.60	\$ 112,138,994.29	75.56%	113	\$ 61,032,344.38	\$ 38,545,404.40	63.16%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	CovaLima			Dili		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL, INSTITUTO PUBLICO						
2	CAC					\$ 256,843.00	\$ 177,425.04
3	Centro Nacional Chega					\$ 190,090.64	\$ 144,229.27
4	CFP					\$ 35,500.00	\$ 33,725.00
5	CONSELHO DA EMPRESA					\$ 97,498.81	\$ 83,740.72
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P						
7	ESTATAL					\$ 885,797.97	\$ 501,799.70
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	\$ 1,196,660.00	\$ 941,722.09	78.70%	\$ 11,356,062.56	\$ 4,088,060.42
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					\$ 218,099.53	\$ 188,720.06
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR						
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS						
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 260,523.18	\$ 228,675.29	87.78%	\$ 512,279.04	\$ 165,783.88
13	MINISTERIO DA DEFESA					\$ 1,282,894.73	\$ 209,738.52
14	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 149,292.80	\$ 126,446.74	84.70%	\$ 2,017,097.07	\$ 1,388,424.35
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					\$ 360,694.51	\$ 236,315.60
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	\$ 54,839,864.86	\$ 41,571,504.07	75.81%	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA					\$ 73,586,175.59	\$ 46,938,262.32
18	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 337,328.10	\$ 86,498.64	25.64%	\$ 10,861,982.32	\$ 258,728.10
19	MINISTERIO EDUKASAU JUVVENTUDE E DESPORTU	19	\$ 2,905,884.88	\$ 1,168,479.70	40.21%	\$ 3,646,371.22	\$ 1,803,864.89
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					\$ 254,392.36	\$ 64,933.99
21	MINISTERIO FINANÇAS	1	\$ 29,968.50	\$ 18,231.33	60.83%		
22	Ministerio Koordinator Asuritu Ekonomikus					\$ 119,578.85	\$ 110,325.82
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					\$ 2,869,530.23	\$ 1,146,888.92
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	\$ 1,147,292.19	\$ 911,553.53
25	MINISTERIO SAUDE	8	\$ 1,373,959.16	\$ 1,110,882.64	80.85%	\$ 3,615,003.82	\$ 2,452,336.89
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					\$ 449,600.23	\$ 350,256.56
27	MINISTERIO TRANSPORTE E KOMUNIKASAUIN	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%	\$ 943,633.56	\$ 529,242.15
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 33,091.06	\$ 18,231.33	55.09%	\$ 756,542.64	\$ 294,507.14
29	PARLAMENTU NASIONAL					\$ 69,221.96	\$ 27,033.43
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					\$ 556,612.74	\$ 552,002.81
31	RADIO TELEVISAUIN TIMOR LESTE					\$ 37,605.25	\$ 33,844.72
32	SAMES					\$ 61,067.75	\$ 49,707.50
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUIN					\$ 412,212.00	\$ 76,000.00
34	SECRETARIADO ESTADO JUVVENTUDE E DESPORTU					\$ 1,322,071.13	\$ 825,183.89
35	SEFOPE					\$ 460,254.00	\$ 339,787.68
36	TRADE INVEST					\$ 37,582.90	\$ 18,900.89
37	TRIBUNAL RECURSUO					\$ 12,092,434.96	\$ 3,913,047.81
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE					\$ 4,122,424.25	\$ 2,611,612.95
	Grand Total	76	\$ 133,821,946.88	\$ 112,782,750.54	84.28%	\$ 134,793,357.55	\$ 70,547,599.97



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NASIONAL, INSTITUTO PUBLICO	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	100.00%				
2	CAC								
3	Centro Nacional Chega								
4	CFP								
5	CONSELHO DA EMPRESA								
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
7	ESTATAL	1	\$ 66,560.00	\$ -	0.00%	2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								
13	MINISTERIO DA DEFESA								
14	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 160,056.02	\$ 72,030.85	45.00%				
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	28	\$ 22,931,987.13	\$ 15,798,744.62	68.89%	34	\$ 38,063,850.10	\$ 28,294,120.77	74.33%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO DO INTERIOR								
19	MINISTERIO EDUKASAU JUVENTUDE E DESPORTU	23	\$ 3,012,002.58	\$ 1,302,968.22	43.26%	19	\$ 2,474,390.58	\$ 1,140,240.17	46.08%
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
21	MINISTERIO FINANÇAS					1	\$ 56,783.85	\$ 45,907.81	80.85%
22	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus								
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 358,735.46	\$ 165,866.59	46.24%				
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					2	\$ 962,218.72	\$ 530,085.51	55.09%
25	MINISTERIO SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 931,743.24	91.09%	3	\$ 653,626.75	\$ 581,213.86	88.92%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
27	MINISTERIO TRANSPORTE E KOMUNIKASAUIN								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					1	\$ 710,074.64	\$ 545,518.17	76.83%
31	RADIO TELEVISAUIN TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUIN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
35	SEFOPE								
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSSO								
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
	Grand Total	61	\$ 27,553,970.61	\$ 18,273,153.52	66.32%	64	\$ 43,821,802.01	\$ 31,569,938.62	72.04%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Líquida				Manatuto			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NASIONAL, INSTITUTO PUBLICO								
2	CAC								
3	Centro Nacional Chega								
4	CFP								
5	CONSELHO DA EMPRESA								
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
7	ESTATAL	3	\$ 387,568.54	\$ -	0.00%	4	\$ 567,521.53	\$ 349,537.06	61.59%
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$ 139,176.53	\$ 121,406.22	87.23%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
13	MINISTERIO DA DEFESA								
14	MINISTERIO DA JUSTICA								
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	43	\$ 24,471,875.69	\$ 15,074,402.34	61.60%	30	\$ 133,406,771.97	\$ 114,125,499.50	85.55%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 58,107.88	\$ 50,129.80	86.27%				
19	MINISTERIO EDUKASAU JUVENITUDE E DESPORTU	19	\$ 2,649,444.03	\$ 824,668.95	31.13%	13	\$ 1,303,638.79	\$ 574,459.09	44.07%
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
21	MINISTERIO FINANÇAS								
22	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus								
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	2	\$ 123,016.98	\$ 33,401.02	27.15%	1	\$ 408,460.73	\$ 318,953.66	78.09%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 99,484.80	\$ 82,502.69	82.93%	1	\$ 277,330.43	\$ -	0.00%
25	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 433,364.88	\$ 343,449.48	79.25%	9	\$ 1,175,863.67	\$ 911,017.70	77.48%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
27	MINISTERIO TRANSPORTE E KOMUNIKASAU	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 500,373.00	\$ 104,500.00	20.88%	2	\$ 204,687.39	\$ 147,490.09	72.06%
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
31	RADIO TELEVISAU TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAU								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
35	SEFOPE								
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSO								
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
	Grand Total	79	\$ 30,257,162.33	\$ 17,291,736.42	57.15%	63	\$ 140,107,038.04	\$ 118,286,107.71	84.43%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Manufahi			Nasional			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)						
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NASIONAL, INSTITUTO PUBLICO												
2	CAC												
3	Centro Nacional Chega												
4	CFP												
5	CONSELHO DA EMPRESA												
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P	1	\$ 292,653.74	\$ -				0.00%					
7	ESTATAL	5	\$ 575,943.14	\$ 556,747.80				96.67%	1	\$ 479,146.05	\$ 397,950.03	\$ 397,950.03	83.05%
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	\$ 3,093,841.36	91.99%
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES												
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR												
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS												
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								2	\$ 223,338.38	\$ 97,116.78	\$ 97,116.78	43.48%
13	MINISTERIO DA DEFESA								2	\$ 268,778.02	\$ 118,939.95	\$ 118,939.95	44.25%
14	MINISTERIO DA JUSTICA												
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS												
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	47	\$ 22,477,117.72	\$ 16,568,865.12				73.71%	15	\$ 118,022,105.80	\$ 82,348,984.89	\$ 82,348,984.89	69.77%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA	1	\$ 3,961,658.78	\$ -				0.00%					
18	MINISTERIO DO INTERIOR	2	\$ 436,263.93	\$ 319,965.83				73.34%					
19	MINISTERIO EDUKASAUIN JUVENTUDE E DESPORTU	15	\$ 1,685,752.39	\$ 673,548.96				39.96%					
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA												
21	MINISTERIO FINANÇAS								3	\$ 6,391,216.00	\$ 4,598,253.84	\$ 4,598,253.84	71.95%
22	Ministerio Koordinator Asunttu Ekonomikulus												
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 66,359.87	\$ 45,814.46				69.04%	1	\$ 74,828.00	\$ -	\$ -	0.00%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU								5	\$ 26,893,218.53	\$ 17,730,455.25	\$ 17,730,455.25	65.93%
25	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 433,103.27	\$ 399,436.17				92.23%	1	\$ 254,727.00	\$ 91,701.72	\$ 91,701.72	36.00%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN												
27	MINISTERIO TRANSPORTE E KOMUNIKASAUIN												
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 178,633.46	\$ 128,395.45				71.88%	3	\$ 873,930.98	\$ 665,026.63	\$ 665,026.63	76.10%
29	PARLAMENTU NASIONAL								3	\$ 542,841.24	\$ 63,126.05	\$ 63,126.05	11.63%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA												
31	RADIO TELEVISAUIN TIMOR LESTE												
32	SAMES												
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUIN												
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								1	\$ 1,636,624.69	\$ 925,534.68	\$ 925,534.68	56.55%
35	SEFOPE								1	\$ 210,824.50	\$ 40,056.65	\$ 40,056.65	19.00%
36	TRADE INVEST												
37	TRIBUNAL RECUSO												
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE												
Grand Total		77	\$ 30,107,486.30	\$ 18,692,773.79				62.09%	40	\$ 199,234,833.93	\$ 110,170,987.83	\$ 110,170,987.83	69.19%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Oe-cusse			Regional				
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NASIONAL,INSTITUTO PUBLICO								
2	CAC								
3	Centro Nacional Chega								
4	CFP								
5	CONSELHO DA EMPRENSA								
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P								
7	ESTATAL								
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS								
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								
13	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%				
14	MINISTERIO DA JUSTICA								
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 51,084,636.97	59.80%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO DO INTERIOR								
19	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU								
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
21	MINISTERIO FINANÇAS								
22	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonómikus								
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU								
25	MINISTERIO SAUDE								
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
27	MINISTERIO TRANSPORTE E KOMUNIKASAUN								
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
29	PARLAMENTU NASIONAL								
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
31	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
32	SAMES								
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
35	SEFOPE								
36	TRADE INVEST								
37	TRIBUNAL RECUSSO								
38	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
	Grand Total	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 51,084,636.97	59.80%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Viqueque				GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO NASIONAL, INSTITUTO PUBLICO					1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	100.00%
2	CAC					1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
3	Centro Nacional Chaga					3	\$ 190,090.64	\$ 144,229.27	75.87%
4	CFP					1	\$ 33,725.00	\$ 33,725.00	95.00%
5	CONSELHO DA EMPRESA					1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
6	ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P					1	\$ 292,653.74	\$ -	0.00%
7	ESTATAL	2	\$ 355,840.92	\$ 351,445.47	98.76%	45	\$ 5,235,063.28	\$ 2,729,901.14	52.15%
8	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					13	\$ 16,480,693.27	\$ 8,345,210.57	50.64%
9	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					4	\$ 218,099.53	\$ 188,720.06	86.53%
10	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
11	INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS					1	\$ 512,279.04	\$ 165,783.88	32.36%
12	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$ 5,472,502.45	\$ 4,232,344.51	77.34%	19	\$ 8,566,442.56	\$ 5,526,129.14	64.51%
13	MINISTERIO DA DEFESA					18	\$ 5,333,582.72	\$ 3,295,464.01	61.79%
14	MINISTERIO DA JUSTICA					8	\$ 899,319.17	\$ 617,825.33	68.70%
15	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
16	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	\$ 60,966,091.25	\$ 31,256,864.08	51.27%	599	\$ 978,247,382.90	\$ 707,084,290.54	72.28%
17	MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR, CIENCIA E CULTURA					1	\$ 3,961,658.78	\$ -	0.00%
18	MINISTERIO DO INTERIOR					9	\$ 12,321,278.76	\$ 715,322.37	5.81%
19	MINISTERIO EDUKASAUIN JUVENTUDE E DESPORTU	21	\$ 2,594,341.80	\$ 859,551.56	33.13%	241	\$ 30,895,092.90	\$ 12,856,768.29	41.61%
20	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					3	\$ 729,392.36	\$ 321,666.49	44.10%
21	MINISTERIO FINANÇAS					12	\$ 7,155,642.72	\$ 5,141,607.39	71.85%
22	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus					1	\$ 119,578.85	\$ 110,325.82	92.26%
23	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 275,004.50	\$ 185,697.06	67.53%	15	\$ 5,920,864.26	\$ 2,742,832.89	46.32%
24	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	2	\$ 242,346.13	\$ -	0.00%	24	\$ 31,121,963.57	\$ 20,011,889.85	64.30%
25	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 327,232.66	\$ 264,456.78	80.82%	78	\$ 13,450,090.55	\$ 10,589,228.63	78.73%
26	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	\$ 805,366.41	\$ 260,194.11	32.31%	6	\$ 2,694,349.02	\$ 1,215,833.82	45.13%
27	MINISTERIO TRANSPORTE E KOMUNIKASAUIN					10	\$ 75,643,307.08	\$ 69,099,241.61	91.35%
28	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA					15	\$ 2,346,446.04	\$ 792,214.18	33.76%
29	PARLAMENTU NASIONAL					2	\$ 69,221.96	\$ 27,033.43	39.05%
30	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					2	\$ 1,266,687.38	\$ 1,097,520.98	86.64%
31	RADIO TELEVISAUIN TIMOR LESTE					1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
32	SAMES					3	\$ 181,808.94	\$ 116,706.00	64.19%
33	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUIN					2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
34	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					8	\$ 5,321,672.26	\$ 3,546,562.46	66.64%
35	SEFOPE					5	\$ 1,156,831.47	\$ 753,757.16	65.16%
36	TRADE INVEST					1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
37	TRIBUNAL RECUSO					4	\$ 12,092,434.96	\$ 3,913,047.81	32.36%
38	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E					7	\$ 4,122,424.25	\$ 2,611,612.95	63.35%
Grand Total		72	\$ 71,183,995.60	\$ 37,410,553.57	52.55%	1163	\$ 1,227,729,554.14	\$ 864,207,777.86	70.39%

Prepara Husi :

Servisa Husi

Aprova Husi :

(Eng. Tifânia Cidália Guterres Ormál)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Assistente Executivo-GADE,
ADN, I.P

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Aneksu B

Lista Ekipamentus no Mesuramentu Laboratorio ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

LISTA INVENTARISASI LABORATORY EQUIPMENT ADN, I.P.
NO EQUIPAMENTOS NEBE SUPORTA SERVISU LABORATORI ADN, I.P.
2013 – 2022



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

LISTA INVENTARISASI LABORATORY EQUIPMENT ADN, I.P.

2013 - 2022

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
1	CORE DRILL BETON HUSGVARNA & MATA BOX			1 SET	1	-	COMPLETO
2	PRD REFUSAL DENSITY			1 SET	1	-	COMPLETO
3	SIEVE ANALYSIS			84	77	7	COMPLETO SARINGAN NEBE MAK A'AT NO. 3,=1, 1 1/2=1, 1/2=1 3/4=2, 200=1, 12=1



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
4	TERMOMETER AIR KACA			2 PCS	2	-	COMPLETO
5	TERMOMETER ASPHALT OTOMATIS			2 PCS	2	-	COMPLETO
6	THERMOMETER ASPHALT			13	6	3	RUA A'AT IHA LAB IDA A'AT IHA MUNICIPIO NO RESTU SEI IHA MUNICIPIO (SEI CHECK IHA MUNICIPIO)




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
7	OVEN			2 UNIT	-	2	COMPLETO IDA LAKAN MAIS LA MANAS IDA LA LAKAN
8	PICNOMETER TANAH 50 ML			2 PCS	2	-	COMPLETO
9	PICNOMETER TANAH 100 ML			2 PCS	2	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



KADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
10	PICNOMETER TANAH 100 ML			2 PCS	-	2	COMPLETO (Rahun)
11	TIMBANGAN ELETRIC			2 UNIT	2	-	COMPLETO IDA NIA AIN MAK TOHAR
12	MOL PROCTOR MODIFIT			3+3 UNIT	6	-	COMPLETO PARFUJU MAK DOL




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
13	MOLD PROCTOR STANDAR			3 +1UNIT	4	-	COMPLETO
14	MOLD CBR			3 + 3UNIT	6	-	COMPLETO 3 PARFUJU MAK DOL
15	MIXER CONCRETE FOUN			1 UNIT	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
16	KERTAS FILTER EXTRASI			2 SET	-	-	UIA HOTU
17	BOTLE CHATELIAR			1 PCS	1	-	COMPLETO
18	AIR ENTERTIMEN						?
19	ARMARI BESI			4 UNIT	4	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

N O	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	CODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAU N			REMARKS
					DIA K	A'A T		
20	CYLINDER CAPPING 6'' Bot ho kiik			2 SET	2	-		COMPLETO
21	AUTOMATIC COMPACTION ASPHALT			1 SET	1	-		COMPLETO A'at
22	FILTER PAPER ASPHALT			5 BOX	-	-		BOX 4 HOTU FALTA BOX 1



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
23	CYLINDER MOLD 15 X 30 CM			12 PCS	12	-	COMPLETO PARFUJU BALU MAK LA IHA
24	TRIPLE BEAM SCALE CAPACITY 2610r		RDTL - 10998/2020 - 10999/2020	3	3	-	COMPLETO IDA A'AT TAMBA NABEN IDA NIA 500 GR MAK LA IHA
25	HIDRAN 3 KG			5 PCS	-	-	UJA 3 FALTA 2
26	ALAT P3K			3 PCS	-	-	UJA HOTU



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
27	TCE 50 LTR			50 LTR	-	-	UJA HOTU
28	TOTAL STATION PRIME LESS			1 SET	1	-	COMPLETO fALTA CAS HO BATRIA MK LAKON
29	CETAKAN 15 X 15 X 75			2 PCS	2	-	COMPLETO
30	KUBUS 15 X 15 X 15 CM			12 PCS	12	-	COMPLETO PARFUJU BALU LA IHA BALU DOL



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAM	A'AT	
31	DYNAMIC CONE PENETROMETER / DCP			3 SET	3	-	COMPLETO
32	CONCRETE HAMMER (SCHMIDT HAMMER)		RDTL – 10856/2013 – 10868/2020	13	12		FALTA 1 (IDA)
33	POCKET PENETROMETER			8 SET	8		COMPLETO
34	SLUMP TEST SET+SCOOP MATERIAL			13 SET	13	-	BESI IDA LAKON, BESI IDA SEI IHA KOMPANHIA CHETLY NO PLAT IDA SEI IHA KOMPANHIA LIGELINA



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	CODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
35	SIEVE SHAKER			4 SET	3	1	COMPLETO IDA A'AT TOLU LA LAKAN
36	SPEEDY MOISTURE TESTER		RDTL- 10870/2013 – 10884/2020	15 SET	15	-	COMPLETO CARVIT HOTU
37	SOFTENING POINT TEST		RDTL – 10888/2020 – 10887/2020	2 SET	1	1	COMPLETO IDA KONDISAUN A'AT HO GAS HOTU
38	FLASH AND FIRE POINT BY CLEVELAND OPEN CUP		RDTL – 10886/2020 – 10885/2020	2 SET	2	-	COMPLETO IDA KONDISAUN A'AT (GAS HOTU)

Fund :		CHECKLIST No. 4 (FS, DED, SC, AS & Geotechnical Investigation)			Verified by:	Validated by:
Program:	Objective:	Project Name:	Verification Date:			
Stage:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)	Project Owner:	Project Owner:			
Project Location:	a) District:	b) Sub-district:	c) Village:			
Item for Verification		Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items		
D	T.O.R Advisory Service					
1	1 Introduction					
	1.1 Background	A background of the project.				
	1.2 Project Location	Map.				
	1.3 Objective					
	1.4 Project Scope	A description of the project scope.				
2	2 The Services					
	2.1 Assessment					
	2.1.1 Legal	Legal due diligence.				
	2.1.2 Technical	Technical due diligence.				
	2.1.3 Financial	Financial due diligence.				
	2.1.4 Environmental and Social (E & S) If needed	E&S Scoping.				
	2.2 Findings and Recommendation	Legal, Technical, Financial, and E&S findings and recommendations (subject to the project type).				
	2.2.1 Present Findings and/or Recommendation	Minutes of Meeting reflecting recommendation, comments, and decision from the client.				
	2.2.2 Reports					
3	3 Report Outputs/Deliverables					
	3.1 Report to be Submitted	Interim Report, and Final Report.				
	3.2 Contents of Report	Legal framework and regulatory requirements. Financial Model, Financial Projections, Internal Rate of Return (IRR) etc-subject to the project type. Development Plan, Design, Cost estimate etc. E&S risks and impacts and their corresponding mitigation measures (e.g. Resettlement action plan, IEE, EIA, SIA, or ESIA, E&S Management Plan). Summary of the Legal, Technical, Financial, E&S Findings, Conclusions, and Recommendations.				
	3.3 Reports Copy Number and Submission Date					
	3.4 Attachment to Study Report	Project Information, Photographs, Project Scope in Details, Services in Details, Staffing in details with target timetable commencement and completion date, Case Studies (if required), Work Program and Indicative Timetable, etc.				
4	4 Principle					
	4.1 Work Program					
	4.2 Indicative Timetable or Schedule	Schedule per each deliveries.				
	4.3 Personnel Required	Appropriate educational degree, relevant training and adequate years of experience.				
	4.4 Remuneration	Table of the person month requirement.				
	4.5 Ownership of Information and Confidentiality					
E	T.O.R Geotechnical Investigation (Stand Alone)					
1	1 Introduction					
	1.1 Background	Location map (with coordinates, if necessary) & Status of the Land.				
	1.2 Project Location	A description of project objectives.				
	1.3 Objective					
	1.4 Project Scope	A description of the project scope.				
2	2 Scope of Work					
	2.1 Subsurface Soil Exploration Work	Sondir Testing or Boreholes: Results of the field work and laboratory tests, report with conclusions on the geotechnical properties of the soil strata underlying the site in relation to the usage of the site and any recommendations for further action if needed.				

CHECKLIST No. 4 (FS, DED, SC, AS & Geotechnical Investigation)									
Fund :		Project Name:		Verification Date:		Verified by:		Validated by:	
Program:		Items/Checklist necessary for verification by UAP team		Project Owner:					
Objective:		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:					
Stage:		a) District:		b) Sub-district:					
Project Location:		Item for Verification		Point for Verification		Verify (Yes/No)		Comments for unavailable items	
		2.2 Reports and Documents							
3		Deliverables		Inception Report, Interim Report, and Final Report.					
		3.1 Report to be Submitted							
		3.2 Contents of Report		Site/location (soil morphology and site geology), procedure or methodology used in investigation, ground investigations work carried out, field works/ tests with tests results, ground conditions, geotechnical characteristics/sections (description of the soil stratigraphy based on the boreholes, if required), hydrological conditions, geotechnical considerations, recommendations based on the investigation.					
		3.3 Reports Copy Number and Submission Date							
		3.4 Attachment to Study Report		Photograph, Plots of location, Diagram, Test Certificates, etc.					
4		Principle							
		4.1 Work Program							
		4.2 Indicative Timetable		Schedule per each deliverables.					
		4.3 Personnel Required		Educational degree, relevant training and adequate years of experience.					
		4.4 Remuneration		Table of the person month requirement.					
		4.5 Ownership of Information and Confidentiality							
5		Duration		Total number of working days, from commencement to completion.					
6		File (Hard copies and Electronic Copies)		Submitted.					

Fund :		CHECKLIST No. 5 (Clean Water and Irrigation)				Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:					
Objective:		Items/checklist necessary for verification by UAP team				Verification Date:	
Stage:		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)				Project Owner:	
Project Location:		a) District:				c) Village:	
Item for Verification		Point for Verification				Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
A Clean Water – Gravitation							
1	Clean Water Data /Water Source with Debit						
2	Population Data of the Referred Location						
3	Clean Water Debit Plan for the Referred Location						
4	Water Source Coordinates and Community Area Coordinates						
5	General Map (Google Map)						
6	Topography (Hand Level, and Total Station)						
7	Long Section /Profile						
8	Installation Plan based on the Survey Data						
9	Capturing: Section and Detail						
10	Reservoir, Section and Detail						
11	Bpt Placement (if needed)						
12	Public Faucet Placement						
13	Hydraulic Analysis						
14	Community Map						
		Attribution from the Relevant Line Ministries.					
B Clean Water – Drilling							
1	Drill Location Plan						
2	Referred Water Location Coordinates						
3	Public Location (Require Authorization Letter from the Land and Property)						
4	License Issuance Letter / Authorization from I.P.G						
5	Debit Plan Needed						
6	Electrical Resistivity Test Data/ Survey.						
7	Hydraulic Analysis						
8	Population Data of the Referred Location						
9	Clean Water Debit Plan for the Referred Location						
10	Water Source Coordinates and Community Area Coordinates						
		Attribution from the Relevant Line Ministries.					
C							
1	Coordinates of the Referred Location						
2	Water Source Data : Debit						
3	Agricultural Area (Ha)						
4	Debit Plan needed						
5	General Map (Google Map)						
6	Topography Survey (Hand Level, or Total Station)						
7	Long Section / Profile						
8	Cross Section						
9	Distribution Map / Principal Line						
10	Hydraulic Analysis						
11	Population Data (Farmers)						

Fund :		CHECKLIST No. 5 (Clean Water and Irrigation)		Verified by:	Validated by:
Program:	Project Name:				
Objective:	Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verification Date:		
Stage:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:		
Project Location:	a) District:	b) Sub-district:	c) Village:		
	Item for Verification	Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items	
12	General Layout of the Agricultural Area				
13	Primary Line Plan				
14	Secondary Line Plan				
15	Tertiary Line Plan				
16	Specification for Utilities Prepared in the Design				
17	All hard copy and electronic copy files (excel file for cost estimates, backup quantity & AutoCad for drawing).				

Fund :		CHECKLIST No. 6 (Monument & Gardens)		Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:			
Objective:		Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verification Date:	
Stage:		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:	
Project Location:		a) District:	b) Sub-district:	c) Village:	
Item for Verification		Point for Verification		Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
A DRAWING					
Architectural Drawing		Aprezentasaun dezenho hotu-hotu ho formatu meter (m)			
1	Cover Page				
2	Table of Contents				
3	Point of Coordinates, or Site Plan	Validation of the Project Site & Status of the Land.			
4	Topography				
5	Layout	Benefits, and Objective of the Building.			
6	3D View (Optional)				
7	Floor Plan				
8	Existing Plan & New Plan (for building rehabilitation only)				
9	Building Front View				
10	Building Rear View				
11	Building Left/Right View				
12	Section (Transverse and Longitudinal)				
13	Roof Plan (Top View)				
14	Roof Frame				
15	Ceiling Plan				
16	Ceiling Frame				
17	Ceiling Details				
18	Door/Window Plan				
19	Door/Window Details				
20	Tile Plan				
21	Architectural Details (for ornaments and other architectural works)				
22	Architectural Details for Doors & Windows				
23	Access for Disability				
Structural Drawing					
1	Foundation Plan				
2	Sloof / Ground Beam Plan				
3	Column Plan				
4	Beam/Top Beam Plan				
5	Slab Plan				
6	Structural Section (for more than 1 storey building)				
7	Foundation Details	Reinforced Concrete Schedule.			
8	Sloof/Ground Beam Details	Reinforced Concrete Schedule.			
9	Column Details	Reinforced Concrete Schedule.			
10	Top Beam Details	Reinforced Concrete Schedule.			
11	Slab Details	Reinforced Concrete Schedule.			
12	Stairs Details	Reinforced Concrete Schedule.			

Fund :		CHECKLIST No. 6 (Monument & Gardens)		Verified by:	Validated by:
Program:		Project Name:			
Objective:		Items/checklist necessary for verification by UAP team		Verification Date:	
Stage:		Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)		Project Owner:	
Project Location:		a) District:	b) Sub-district:	c) Village:	
Item for Verification		Point for Verification		Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items
13	Roof Details (Truss Details)				
14	Other Structural Details If Needed	Reinforced Concrete Schedule.			
B STRUCTURAL ANALYSIS					
1	Soil Investigation Report (For more than 1 storey building)	Sondir, or Boring.			
2	Structural Analysis Using Software (STAAD, SAP2K, ETABS, etc)				
2.1	Design Criteria	General Description of Structure, Structure System, Design Standard and References, Material Property, Load and Load Combinations, Modelling and Structural Analysis.			
2.3	Structural Member Design	Truss design if there is construction, Reinforced Concrete Beam Design, Reinforced Concrete Column Design, Foundation Analysis Design, and Concrete Slab Design.			
C BILL OF QUANTITY (BoQ)					
1	Bill of Quantity (BoQ)	BoQ, Overhead.			
2	Time Schedule (S Curve)				
3	Unit Price Analysis	Reference of Local Material/Quarry & Manufacturing Resource & Co			
4	Basic Price				
5	Back Up Quantity				
6	Technical Specification				
D MECHANICAL AND ELECTRICAL					
1	Layout				
1.1	Lighting	Safety, comfort & Function.			
1.2	Socked Outlets	Safety, comfort & Function.			
1.3	Other Material M/E	Safety, comfort & Function.			
2	Single Diagram Line				
2.1	Schedule Diagram Main Panels	Description, Connected Load, Phase, CB/MCB, Cable, Current RST &			
2.2	Schedule Diagram Sub Panels	Description, Connected Load, Phase, CB/MCB, Cable, Current RST & Load			
2.3	Lighting Calculation Summary	Service Area, WLH, Working Plan, Vertical Distance, Lux, Room, etc (see ADN, LP Format)			
2.4	Demand & Connected Load Summary	Description, Connected Load, Current, Demand Factor & Demand Load.			
2.5	Panel Details, MDP & SDP	Technical Specification.			
3	System Protection	Details & Specification of Arrester, Grounding, Lightning Protection, et			
4	Main Power Supply 220/380 V & 20 KV	Low Voltage/Average Voltage , and Approval by EDTL, I.P.			
5	Standard, Reference, Consideration & Literature	Related to the Referred Works.			
E TIC					
1	Local Area Network, Metropolitan Area Network, Wide Area Network				

CHECKLIST No. 6 (Monument & Gardens)				Verified by:	Validated by:
Fund :	Project Name:				
Program:	Items/checklist necessary for verification by UAP team			Verification Date:	
Objective:	Verification Request, Phase I (The Completeness & Validation of Technical Documents)			Project Owner:	
Stage:	a) District:			c) Village:	
Project Location:	b) Sub-district:				
Item for Verification		Point for Verification	Verify (Yes/No)	Comments for unavailable items	
1.1	General Requirement	Study and Assessment, Data, Voice, Data Center, Security System and Software.			
1.2	Specific Requirement	Layout of Data, Voice, Security System, software Specification, Technical Specification, and Bill of Quantity.			
2	Software Application and Design				
2.1	User Requirement	Describe Plans and Needs of the Project Owner.			
2.2	System Requirement Study	Annual Assessment by the Project Owner regarding system Requirement Study Corresponding to the Owner's User Requirement			
2.3	Detailed Specification	Cost of Each Line Item Described in the System Requirement Study.			
F PLUMBING AND SANITATION					
1	Pipe Installation Plan				
1.1	Clean Water Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
1.2	Waste Water Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2	Detailed Drawing				
2.1	Toilet/WC	Outlet, Dimension, Inclined Pipe Installation & Construction Drawing and Absorption.			
2.2	Septic Tank and Infiltration	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.3	Floor Drain	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.4	Urinoir	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.5	Wastafel	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.6	Kitchen Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.7	Drain Detail	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.8	Rain Water Detail	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.9	Vent Pipe Plan	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.1	Isometric Waste Pipe	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
2.1	Isometric Clean Water Pipe	Technical Specification, Detailed Drawing, and BoQ.			
G	All hard copy, and electronic copy files (excel file for cost estimates, backup quantity & AutoCad for drawing).				

Aneksu E

Perfil Fungsionarios ADN, I.P.



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022				
NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
I Diretor Executivo - ADN, I.P.				
1	Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M. Eng.	Escritorio Diretor Executivo	Diretor Executivo ADN, I.P.	
II Gabinete Apoio ao Diretor Executivo (GADE) - ADN, I.P.				
II.1. Diretor Adjunto - ADN, I.P.				
1	Januario Maia Guterres, S.T.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Diretor Adjunto	
2	DR. Manuel Moita da Silva Júnior	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Assesor Jurídico	
II.2. Secretariado Unidade Apoio ao Diretor Exekutivo - ADN, I.P.				
1	Joedia Marni Tavares	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Secretaria e Asistente Administrasaun Diretor Executivo	
2	Marfa Zita Cristovão do Carmo Vieira, Lic. CSH.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Secretaria e Asistente Administrasaun Diretor Executivo	
3	Engracia Fernandes Brito Amaral, S.S.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Secretaria e Asistente Administrasaun Diretor Executivo	
4	Basilio Da Conceição Silva	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Motoristas & Administrasaun Unidade ao Apoio Diretor Exekutivo	
5	Mateus da Silva	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Motoristas & Administrasaun Unidade ao Apoio Diretor Exekutivo	
II.3. Equipa de Validação e Base de Dados -ADN, I.P.				
1	Susana Sinala do Rego Amaral, S.T.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Chefe Equipa - VBD	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
2	Fernão Antonio Lopes Nobre Mouzinho, L.Inf, M. Eng.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Assesor GIS	
3	Ana Maria Lourdes da Costa Guterres, B.ETT.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (Mecânica e Elétrica)	
4	Johanes Hornay, S.T.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (Edifício Publicas)	
5	João Paulo Amaral, S.T.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (Pontes, Estrada e Seias)	
6	Olivia Soares, B.EC.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	En. Equipa - VBD (Pontes, Estrada e Seias)	
7	Nencia Filomena Oliveira do Rego, S.Kom.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (TIC)	
8	Tifânia Clotária Guterres Ormai, Lic. Eng.	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Eng. Equipa - VBD (Kompiladora Dadus Projetus e GIS-Geographic Information System)	
II.4 Equipa de Mídia - ADN, I.P.				
1	Samuel Soares	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Assesor Nacional da Mídia	
2	David da Silva	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Designer de Mídia	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
3	Franzela Pinto	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Assistente Mídia	
III Unidade Gestão Administrativa (UGA) - ADN, I.P.				
III.1. Departamento Administração & Finanças - ADN, I.P.				
1	Nelson Soares Pinto, L. Ec.	UGA - Administração & Finanças	Koordenador- UGA	
2	Epi Orleães, Lic. Educ., M.M.	UGA - Administração & Finanças	Public Finance Management and Gender & Social Inclusion Advisor	
3	Amélia da Costa, L. Ec.	UGA - Administração & Finanças	Chefe Departamento - Adm & Finanças	
4	Angela Merisia Egong Correia, S.E.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Finanças	
5	Abelito da Costa, L.Agrn.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Finanças	
6	Ferdiana Maia Duarte, Lic. Eco.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Contabilidade	
7	Elizabeth do Nascimento Cabral, L. CS	UGA - Administração & Finanças	adm & Financas Official	
8	Aquilino Soares Ferreira, Lic. AP	UGA - Administração & Finanças	Planejamento Oficial	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
9	Sonyta Mariana Elisabeth Da Silva Henuk, S.I.P.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Administrasaun	
10	Elisabeth Felizarda Ximenes, S.T.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Administrasaun	
11	Nelson Teotonio Barros Fernandes Magno, Lic. CSH.	UGA - Administração & Finanças	Oficial Administrasaun	
12	Edivijes Soares Lobo	UGA - Administração & Finanças	Assistente Official Administrasaun	
13	Ana Eusebia Ximenes, Lic. Eco	UGA - Administração & Finanças	Oficial Administrasaun	
14	Carlos Mendonça Calapes	UGA - Administração & Finanças	Assistente Official Administrasaun	
III.2. Departamento Aproxionamento - ADN, I.P.				
1	Jose Antonio Filomeno Gago Exposto, Lic. Eco.	UGA - Aproxionamento	Oficial Aproxionamento	
2	Sertorio Martins	UGA - Aproxionamento	Oficial Aproxionamento	
3	Lidia da Cruz Monteiro, B. Educ.	UGA - Aproxionamento	Assistente Official Aproxionamento	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
4	Maria Auxiladora Aleixo dos Santos, Lic. Eco.	UGA - Aproximamento	Official Aproximamento	
III.3. Departamento Recursos Humanos e Formação - ADN, I.P.				
1	Tomas Magno do Carmo, S.E., M. Eco.	UGA - Recursos Humanos e Formação	Acting & Assessor Nacional Recursos Humanos e Formação	
2	Isabel Gomes Lopes, Lic. Eco.	UGA - Recursos Humanos e Formação	Assesora Politicas Publicas	
3	Gicella Jong Gonçalves, Lic. Eco.	UGA - Recursos Humanos e Formação	Official Recursos Humanos	
4	Angela Beatriz Mita Freitas, Lic. Buss.	UGA - Recursos Humanos e Formação	Official rekursu Humanos	
III.4. Departamento Logística e Patrimonio - ADN, I.P.				
1	Jose Amaral, S.I.P.	UGA - Logística e Patrimonio	Chefe Dept. Logística e Patrimonio	
2	Sandra Ribeiro Belo, Lic. Eco.	UGA - Logística e Patrimonio	Assistente Administracao da Logística e Patrimonio	
3	Marcelino Soares do Carmo, S.T.	UGA - Logística e Patrimonio	Assistente da Logística e Patrimonio	
4	Sergio Gomes	UGA - Logística e Patrimonio	Assistente da Logística e Patrimonio	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
5	Arcenio Magno Do Rego	UGA - Logística e Patrimonio	Mecânico de Automóveis	
6	Jony Maia da Silva dos Santos	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Bobonaro	
7	João Pedro Cortereal	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Aileu	
8	Silveiro da Costa	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Manufahi	
9	Bernado Da Cruz Amaral Perreira	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
10	Manuel Antonio Soriano	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
11	Bendito Mendes Bento	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Viqueque	
12	Domingos Da Costa	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
13	Agostinho Amaral	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Covalima	
14	Rui Antonio Gaio	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Liquisa	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
15	Gilroy Marcal da Cunha Braz	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
16	Rafael Joaquim Mousaco Galucho	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
17	Timoteo Da Silva Morais	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Manatuto	
18	Joel Barreto Abrantes	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Laboratório)	
19	Delio Abel Manuel Perreira	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Lautem	
20	Anacleto de Sousa Belo	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Baucau	
21	Salvador Ruas Amaral	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
22	Siltonio Pinto de Araujo	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Dili (Operacional - Nasional)	
23	Rosario Soares de Deus	UGA - Logística e Patrimonio	Motorista Ermera	
24	Lucas Alberto Soares Pereira	UGA - Logística e Patrimonio	Motoristas Ainaro	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
IV	Unidade de Avaliação de Projetos (UAP) - ADN, I.P.			
IV.1.	Secretariado UAP - ADN, I.P.			
1	Melenia da Costa Barros, B. EC., S.T.	UAP	Koordenadora - UAP	
2	Miguel Marques Monteiro de Jesus, S.T., M. Eng.	UAP	Assesor Nacional Mecânica e Elétrica (UAP & UCVQ)	
3	Joanito Doutel Pereira, B. Eng.	UAP	Assesor Nacional Water & Irrigation (UAP no UCVQ)	
4	Rosaria Elizabeth Aniceto Cardoso Amaral, B.S, M.S.	UAP	Assesora Nacional Project Management (UAP no UCVQ)	
5	Maryanti Kota dos Santos, Lic. Eco.	UAP	Official Administração - UAP	
6	Fidelia Auxiliadora da Conceicao Freitas, Lic. Eco.	UAP	Asistente Administração - UAP	
IV.2.	Departamento Avaliação de Projetos Infraestruturas Transportes, Irrigação, Agua e Saneamento (ITIAS) - ADN, I.P.			
1	Rogério Marçal Pires, B. EC., Lic. Eng.	UAP-ITIAS	Eng. Senior - ITIAS	
2	Daniel Arcanjo Alves, S.T.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	
3	Martinho da Costa Graciano, B. EC., Lic. Eng.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
4	Mario Gusmao Mendeita da Cruz Nunes Silva, S.T.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	
5	Anjelita Maria de Jesus Cardoso, S.T.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	
6	Olivio Marcos da Silva Correia, S.T.	UAP-ITIAS	Eng. ITIAS	
IV.3.	Departamento Avaliação de Projetos Edificio Públicos, Mecanica e Energia Electrica, TIC, Jardins e Monumentos (EMETIJM) - ADN, I.P.			
1	Amorin Soriano Menezes, ST	UAP-EMETIJM	Eng. Senior - EMETIJM	
2	Arlindo Sarmento Monteiro, S.T.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
3	Paulino Abrantes Correia, B. EC.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
4	Oscar Monteiro Gomes, S.T.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
5	Maria Melania Mendonça Oca, S.T.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
6	Angelica da Costa, B. ETT.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
7	Jonas das Dolres Henriques Gomes, S. Kom.	UAP-EMETIJM	Eng. EMETIJM	
V	Unidade Controlo e Validação de Qualidade (UCVQ) - ADN, I.P.			
V.1.	Secretariado UCVQ - ADN, I.P.			
1	Emerenciana da Costa Maia Freitas, S.T., M.T.	UCVQ	Koordenadora - UCVQ	
2	Santoso, S.T.	UCVQ	Assesor Internasional Estrutura (UCVQ & UAP)	
3	Aleixo Amaral do Carmo, S.T.	UCVQ	Assesor Nasional Pontes Estradas (UCVQ & UAP)	
4	Francisco Incio Filho Dos Reis Corsino, Lic. EC, M. Eng.	UCVQ	Assesor Nasional UCVQ	
5	Joaninha da Costa	UCVQ	Official Administrasaun	
6	Brijita Joanila Fernandes	Gabinete Apoio ao Diretor Executivo	Secretaria Diretor Adjunto	
7	João Marcos Napoleão Gracia	UCVQ	Assistente Official Administrasaun	
V.2.	Departamento Infraestruturas de Transportes e Irigasaun - ITI			
1	Remigio da Conceição Soares dos Santos, S.T.	UCVQ-ITI	Eng Senior - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
2	Aniceto da Costa, B. EC, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
3	Manuel Bany da Silva Cristovão de Carvalho, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Ainaro - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
4	Jaulino Henriques Rodrigues, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Ainaro - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
5	Jacob da Costa Camões, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Baucau - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
6	Leonito Pereira, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Baucau - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
7	Jose Aparicio Sanches Soares, B.EC.	UCVQ-ITI	Eng Bobonaro - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
8	Noe Menezes Madeira, B. Eng.	UCVQ-ITI	Eng Bobonaro - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
9	Salvador Martins, S,T,	UCVQ-ITI	Eng. Viqueque - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
10	Camilio Maia, B. EC.	UCVQ-ITI	Eng. Viqueque - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
11	Domingos Soares Martins, B. EC.	UCVQ-ITI	Eng. Covalima - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
12	Bosco Dinis de Sousa, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Covalima - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
13	Joao Quintao do Rego, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Dili - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
14	Eduardo dos Santos, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Dili - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
15	Antonio Mendonça Faria Da Silva, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Ermera - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
16	Julio Jacob Soares, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Ermera - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
17	Marcus Ximenes de Araujo, S.T.	UCVQ-ITI	Eng. Liquisa - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
18	Luduvina Maria Helena Guterres, Lic. EC.	UCVQ-ITI	Eng. Liquisa - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
19	Geovanio Mateus Xavier Carlos Aleixo, B.EC.	UCVQ-ITI	Eng. Lautem - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
20	Elnino Junior Araújo Mota, L. Eng. Civ.	UCVQ-ITI	Eng. Lautem - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
21	Deomentino Henrique Lopes, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Lautem - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
22	Augusta da Costa Ferreira, B.EC.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
23	Jose Roberto Carlos Gusmao, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng.Manututo (Siksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	
24	Domingos da Costa Ximenes e Silva, B. EC.	UCVQ-ITI	Eng.Manututo (Siksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	
25	Romulo João Marques Henrique, S.T.	UCVQ-ITI	Eng Manufahi (Siksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	
26	Majorico Cele Tali, Lic. Tech.	UCVQ-ITI	Eng Manufahi (Siksaun Infra. Transporte no Sek. Irigasaun)	
27	Celvio Justino Alves, B.EC, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng Aileu - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
28	Roberto Maria Martins, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng.Viqueque - Infrastrutura, Transporte e Irigasaun	
29	Vidal Guterres, B.EC, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
30	Tito Edgar Fatima Napoleão de Jesus, S.T.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
31	Terresa Gomes, S.T.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
32	Lourdes Pereira, S.T.	UCVQ-ITI	Mini PMU (Imprestimo, Consultant & Kontractor ba Projecto Imprestimo)	
33	Rui Lopes, Lic. Eng.	UCVQ-ITI	Eng. Aileu - Infraestrutura, Transporte e Irigasaun	
V.3. Departamento Edifícios Públicos no Be'e Mos - EPBM				
1	Francisco Xavier de Jeronimo, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng Senior - Edificio Publicas no Be'e Mos	
2	Ir. Musalam Bin Umar Bassarewan	UCVQ-EPBM	Assesor Nasional Edificio Publicas (UCVQ & UAP)	
3	Julmira Soares Sampaio, B. EC.	UCVQ-EPBM	Eng. Edificio Dili - Konsultan ba Edifisio Publiko, Agua e Saneamento	
4	Egídio Gonçalves, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Edificio Dili - Konsultan ba Edifisio Publiko, Agua e Saneamento	
5	Aleixo da Costa Andrade, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Manututo - Edifisio no Be'e mos	
6	Fabiano Fitalis Maria Madeira, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Manututo - Edifisio no Be'e mos	
7	Bebiano Crecêncio De Jesus Lopes, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Viqueque - Edifisio no Be'e mos	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
8	Fidelis Mardiano da Costa, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Manufahi Edifisiu no Be'e mos	
9	Merinho Cuco Lopes de Araujo, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Aileu - Edifisiu no Be'e mos	
10	Joaquim de Carvalho Madeira, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Ainaro Edifisiu no Be'e mos	
11	Claodino Soares Dos Santos, B. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Ainaro Edifisiu no Be'e mos	
12	Agostinho Aranda, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Baucau Edifisiu no Be'e mos	
13	Jerry Gil Maia Pereira, L. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Baucau Edifisiu no Be'e mos	
14	Zulkarnaen Depari, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Bobonaro - Edifisiu no Be'e mos	
15	Moises Angelico Marques Freitas, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Bobonaro - Edifisiu no Be'e mos	
16	Madelino Deonizio Jose Magno, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Covalima - Edifisiu no Be'e mos	
17	Prezencio Legorio Carmo Dias Ximenes, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Covalima - Edifisiu no Be'e mos	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
18	Manuel Estrela Soares de Oliveira, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Dili - Edifisiu no Be'e mos	
19	Pedro de Lourdes Alves, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Dili - Edifisiu no Be'e mos	
20	Jaimito Manuel Quintao, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Ermera - Edifisiu no Be'e mos	
21	Juninho Antonio Abrantes da Cruz, B. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Liquisa - Edifisiu no Be'e mos	
22	Antonia de Fatima Moraes Soares, S. Ds.	UCVQ-EPBM	Eng. Liquisa - Edifisiu no Be'e mos	
23	Inocencio dos Reis Costa Maria, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Lautem -Edifisiu no Be'e mos	
24	Quico Adelino Junior, S.T.	UCVQ-EPBM	Eng. Lautem -Edifisiu no Be'e mos	
25	Rosalia de Fatima, Lic. Eng.	UCVQ-EPBM	Eng. Dili -Edifisiu no Be'e mos	
V.4. Departamento Mecânica & Energia Eléctrica				
1	Deolindo de Fatima Marques, B.ETT	UCVQ-M & E	Eng Senior - Mecânica e Energia	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
2	Silvino Domingos Rita Rebelo Soares, S.T.	UCVQ-M & E	Eng. Mecânica e Eletrica	
3	Camilio de Jesus, B.ETT.	UCVQ-M & E	Eng. Mecânica e Eletrica	
4	Adonis Julio Fernandes, B.ETT.	UCVQ-M & E	Eng. Mecânica e Eletrica	
V.5. Departamento Tecnogia da Infomação e Comunicação - TIC				
1	Romualdo Duarte Guterres	UCVQ- TIC	Assesor Nacional TIC (UAP, UCVQ, e UGA)	
2	Ezequiel Ricardo de Oliveira, S.T.	UCVQ- TIC	Eng. Senior - Official ICT (UCVQ, UAP e UGA)	
V.6. Departamento Laboratório				
1	Jony Rodrigues Varela, S.T.	UCVQ - Laboratório	Eng. Senior Laboratorio	
2	Angelina Amaral, S.T.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Manufahi, Aileu e Manatuto	
3	Lizete Magno de Jesus, Lic. Eng.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório Baucau, Viqueque e Lautem	
4	Guido Carceres Tilman, Lic. Tec.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Maliana, Covalima e Ainaro	



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
5	Abel Soares da Silva, Lic. Eng.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Maliana, Covalima e Ainaro	
6	Alcino Francisco Paicheco, Lic. Eng.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Baucau, Viqueque e Lautem	
7	Barbara Carmelinda Gusmao, S.T.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Manufahi, Aileu e Manatuto	
8	Abel Fernando, S.T.	UCVQ - Laboratório	Eng. Laboratório - Dili, Liquisa e Ermera	
VI	Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências - UEDC			
VI.1.	Secretariado UEDC - ADN, I.P.			
1	Valentina Violet Correia Bianco, S.T.	UEDC	Koordenadora - UEDC	
2	Maria José Rosário de Jesus, B. B.	UEDC	Official Administração - UEDC	
VI.2	Departamento Pesquisa			
1	Jose Fernando Liu Soares, S.T.	UEDC - Pesquisa	Eng. Senior Pesquisa	
2	Joaquim da Silva Pinto, B. EC., Lic Eng.	UEDC - Pesquisa	Eng. Pesquisa	
3	Hindun Nofitri da Conceição Isya, B.S. MSE.	UEDC - Pesquisa	Eng. Pesquisa	
VI.3.	Departamento Estandardização			



PERFIL FUNSIONARIOS ADN, I.P. TERCEIRO TRIMESTRAL TINAN 2022

NU	NARAN	UNIDADE/DEPT.	POSISAUN	FOTOGRAFIA
1	Demistocles Graciliano Ximenes Fernandes Cabral, S.T.	UEDC - Estandardização	Eng. Senior - Estandardização	
2	Marcelino Amaral, B. EC.	UEDC - Estandardização	Eng. Estandardização	
VI.4. Departamento Capacitação				
1	To be Name	UEDC - Capacitação	Chefe Dept. Capacitação	
2	To be Name	UEDC - Capacitação	Eng. Dept. Capacitação	
